# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 09 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221183 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER CONTRATO DE MANDATO No. 221009 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

## 1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO:** | ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "***CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSÉ ANTONIO GALÁN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER",*** el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Santander." | |
| **PARTICIPANTES** | ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)<br>Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) | |
| **ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO** | Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) | |
| **VALOR APORTES** | **ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)** | $11.999.999.870,13 |
| | **Incluir demás entidades que aporten al contrato especifico** | |
| | **TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO** | $11.999.999.870,13 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | DIECISIETE (17) MESES | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | DIECINUEVE (19) DIAS DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA CAS** | ROCIO AYALA MORENO<br>Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental | |

| **SUPERVISORES ANTERIORES** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO** | 20/01/2023 | | |
| **MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO** | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | **JUSTIFICACIÓN** | | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** |
| **MODIFICACIONES** | | | |
| **ADICIONES O PRÓRROGAS** | | | |
| **SUSPENSIONES Y REINICIOS** | | | |
| **FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO** | 20/06/2024 | | |
| **VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA** | $11.214.953.149,65 | **VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA** | $785.046.720,48 |
| **% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)** | 40,88% | **% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)** | 5,03% |

## GARANTÍAS DEL CONTRATO

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3532798-2 | 11/01/2023 | Cumplimiento | $1.199.999.987 | 23/12/2022 | 23/01/2023 |
| Actualización de Póliza 3532798-2 | 28/03/2023 | Cumplimiento | $1.199.999.987 | 20/01/2023 | 20/02/2025 |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($11.999.999.870,13) son desembolsados así:

| DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES | FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| SOLCITUD PRIMER DESEMBOLSO | 09/03/2023 | | $1.980.000.000 |
| PRIMER DESEMBOLSO | | 16/03/2023 | **$1.980.000.000** |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | | | |
| TERCER DESEMBOLSO | | | |
| CUARTO DESEMBOLSO | | | |
| QUINTO DESEMBOLSO | | | |
| **VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO** | | | **$1.980.000.000** |

### RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CUENTA DE AHORROS No. 0479 0011 2039; Banco Davivienda

| MES /AÑO | VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA | VALOR GIRADO A DTN | VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN | FECHA DEL GIRO AL DTN |
|---|---|---|---|---|
| 02/2023 | **N/A** | **0** | | **0** |
| 03/2023 | $ 9.780.012,07 | 0 | | 0 |
| 04/2023 | | $ 9.780.012,07 | | 20/04/2023 |
| 04/2023 | $ 18.434.727.88 | | | |
| 05/2023 | | $ 18.434.727.88 | | 19/05/2023 |
| 05/2023 | $19.095.522.88 | | | |
| 06/2023 | | $19.095.522.88 | | 28906/2023 |
| 06/2023 | $18,536,724.81 | | | 30/06/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2023 | | $18,536,724.81 | | 25/07/2023 |
| 07/2023 | $19,130,448.41 | | | 31/07/2023 |
| 08/2023 | | $19,130,448.41 | | 28/08/2023 |
| 08/2023 | $19,152,566.04 | | | 31/08/2023 |
| 09/2023 | | $19,152,566.04 | | 07/09/2023 |
| 09/2023 | $18,412,825.57 | | | 30/09/2023 |
| 10/2023 | | $18,412,825.57 | | 09/10/2023 |
| 10/2023 | $19,038,382.17 | | | 31/10/2023 |

## 3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|
| Contrato No. 00675-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIA SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL. | $ 784.924.000 |
| **Nombre contratista** | UNIÓN TEMPORAL INTER SAN GIL | |
| **Representante legal** | LUIS FERNANDO QUIÑONES FLOREZ | |
| **Integrantes:** | CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ con C.C. No. 13.722.479-1 en participación del 20%; CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S, con NIT 800.233.670-7 en participación del 20%; CONSTRUCCIONES, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES S.A.S, con NIT 900.713.031-3 en participación del 20% y JGH GESTION SAS, con NIT 900581798-5 en participación del 40%) | |
| **Fecha Firma del contrato** | (29/05/2023) | |
| **Plazo contrato** | (10 meses) | |
| **Fecha del acta de inicio del contrato** | (20/06/2023) | |
| **fecha de Terminación del contrato** | (19/04/2024) | |

## NOVEDADES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCION | JUSTIFICACION | FECHA |
|---|---|---|
| N/A | | |

## PAGOS:

| CONCEPTO | % REQUERIDO | % A PAGAR | VALOR | No. ORDEN DE PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | 0% | 0% | 0$ | # | (dd/mm/año) |
| PRIMER PAGO | | | | | |
| SEGUNDO PAGO | | | | | |
| PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN | | | | | |
| **VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA** | | | | **(VALOR EN PESOS)** | |
| **% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS** | | | | **(PORCENTAJE)** | |

## PÓLIZAS :

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 96-44-101181710 | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | Cumplimiento del contrato | $156.984.800 | 20/06/2023 | 20/08/2024 |
| | | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | $156.984.800 | 20/06/2023 | 20/04/2027 |
| | | Calidad del servicio | $156.984.800 | 19/04/2024 | 19/04/2029 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | | | EN EJECUCIÓN | | |

- ***CONTRATO DE OBRA***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Contrato de obra No. 00667-2023 | Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 Y 2 en el Municipio de San Gil, Santander | $ 11.214.844.432,69 |
| Nombre contratista | UNION TEMPORAL MITIGACIÓN SAN GIL | |
| Representante legal | MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL | |
| Identificación | CC- 91.227.926 | |

| | INTEGRANTES (SI APLICA) | | |
|---|---|---|---|
| | Nombres | Participación | Nit o CC |
| | MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL | 90% | C.C. No. 91.227.926 |
| | MACAM SAS | 10% | NIT 900878133-4 |

| | |
|---|---|
| Fecha Firma del contrato | (16/05/2023) |
| Plazo contrato | (10 meses) |
| Fecha del acta de inicio del contrato | (20/06/2023) |
| Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades) | (19/04/2024) |
| Valor acumulado de recursos ejecutados | $563.665.689,34 |
| Porcentaje acumulado de recursos ejecutados | 5.03% |
| Porcentaje avance físico programado acumulado | 40,88% |
| Porcentaje avance físico ejecutado en el periodo | 0,0% |
| Porcentaje avance físico programado en el periodo | 18,97% |

## NOVEDADES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCION | JUSTIFICACION | FECHA |
|---|---|---|
| N/A | | |

**PAGOS:**

| CONCEPTO | % REQUERIDO | % A PAGAR | VALOR | No. ORDEN DE PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | % | % | $ | # | (dd/mm/año) |
| PRIMER PAGO | | | | | |
| SEGUNDO PAGO | | | | | |
| PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN | | | | | |
| **VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA** | | | | **(VALOR EN PESOS)** | |
| **% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS** | | | | **(PORCENTAJE)** | |

**PÓLIZAS:**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| B-100036402 de cumplimiento | 26/05/2023 | Cumplimiento del contrato | $2.242.968.886,60 | 16/05/2023 | 16/07/2024 |
| | | Prestaciones sociales | $2.242.968.886,60 | 16/05/2023 | 16/03/2027 |
| | | Estabilidad de la obra | $2.242.968.886,60 | 16/05/2023 | 16/03/2029 |
| B-100009196 de responsabilidad civil | 26/05/2023 | Amparo básico, predios laborales y operacionales | $ 580.000.000 | 16/05/2023 | 16/03/2024 |
| | | Patronal | | | |
| | | Contratistas y subcontratistas | | | |
| | | Vehículos propios y no propios | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| extracontractual | | | | | |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | | | **EN EJECUCIÓN** | | |

**POLIZAS ACTUALIZADAS:**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| B-100036402 de cumplimiento | 27/07/2023 | Cumplimiento del contrato | $2.242.968.886,60 | 20/06/2023 | 19/08/2024 |
| | | Prestaciones sociales | $2.242.968.886,60 | 20/06/2023 | 19/04/2027 |
| | | Estabilidad de la obra | $2.242.968.886,60 | 19/04/2024 | 19/04/2029 |
| B-100009196 de responsabilidad civil extracontractual | 25/07/2023 | Amparo básico, predios laborales y operacionales | $ 580.000.000 | 16/05/2023 | 19/04/2024 |
| | | Patronal | $ 174.000.000 | 16/05/2023 | 19/04/2024 |
| | | Contratistas y subcontratistas | | | |
| | | Vehículos propios y no propios | | | |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | | | **EN EJECUCIÓN** | | |

**4. INFORME DEL SUPERVISOR:**

## DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:


### COMPONENTE TÉCNICO:

1. **Avance de la meta establecida:**

   Esta alternativa proyecta la intervención de un área aproximada de 4683,88 donde se incluyen las siguientes actividades:

| | META | % EJECUCION MENSUAL | % EJECUCIÓN ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| 1 | ANCLAJES ACTIVOS: Construcción de 228 und de anclajes activos | % 0 | % 0 |
| 2 | MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO LANZADO: Se proyecta recubrir 4840.39 m2 aproximadamente de superficie del terreno con concreto lanzado, reforzado con malla electrosoldada | % 0 | % 0 |
| 3 | CUNETAS EN MANTO HORMIGÓN: Realización de 515 ml de canaletas flexibles con sistema de geomanto de hormigón. | % 0 | % 0 |
| 4 | DRENES DE PENETRACIÓN: Construcción de 231 unidades de drenes de penetración horizontal. | % 0 | % 0 |
| 5 | CUNETA DISIPADORA EN CONCRETO REFORZADO: Construcción de 113.80 ml de cuneta disipadora en concreto reforzado | % 0 | % 0 |
| 6 | PERFILADO DE LA LADERA MEDIANTE TERRAZAS: Se realizará la conformación de la ladera mediante terrazas. | % 0 | % 0 |

En el periodo de ejecución del 01 al 31 de octubre de 2023 se presentó el siguiente avance de ejecución:

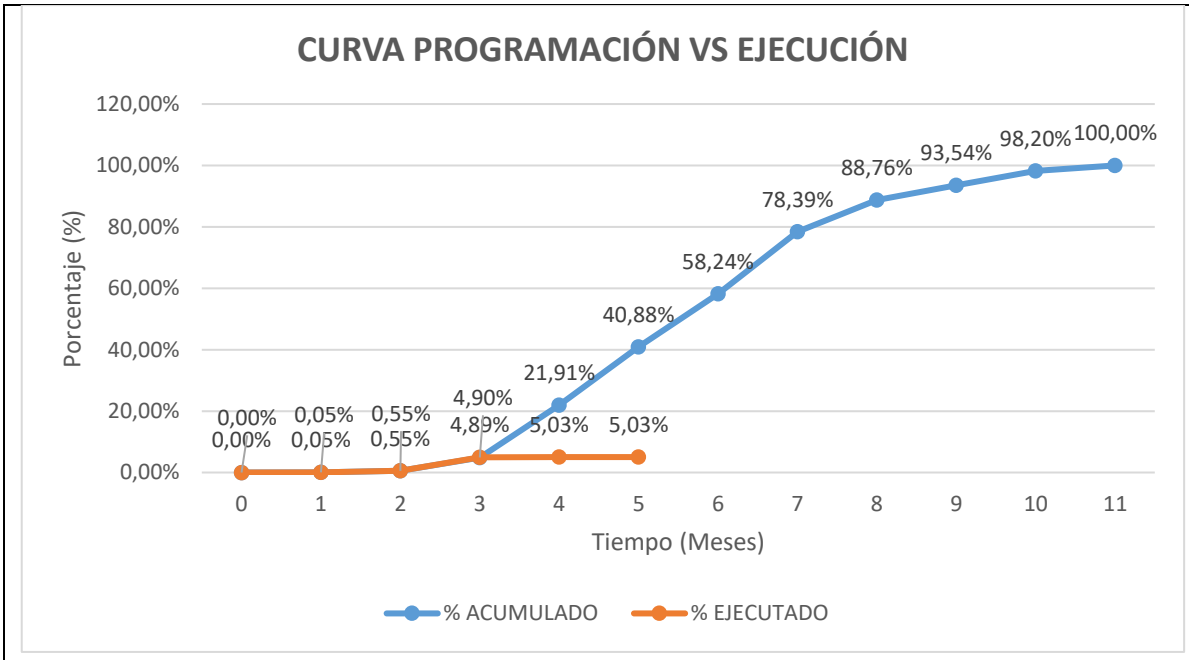


Fuente: Unión temporal Inter San Gil

Ver anexo 04. Flujo de inversión

**2. Actividades desarrolladas en el periodo**

Según los informes presentados por la interventoría, no se realizaron actividades en el periodo de ejecución del 01 de octubre al 31 de octubre de 2023:

Debido a la propuesta presentada por el contratista y revisada por la interventoría después de varios discernimientos y comités se consolido la información la cual fue aprobada por la Interventoría y cuenta el aval por parte de la alcaldía del municipio de San gil y se continua con el trámite del acta modificatoria de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos

:

- Revisión y aprobación de la propuesta de ajuste de los diseños.
- entrega información correspondiente al acta modificatoria de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos
- Seguimiento a la programación de obra y flujo de inversión.
- Se realizan visitas de campo para el reconocimiento de los trabajos.
- Se hace seguimiento a las actividades ejecutadas.
- Se participa de los comités entre contratista de obra e interventoría.
- Se realiza la revisión y subsanación de observaciones por parte de la Interventoría, posterior a esto se presenta el informe al Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos.

**ÍTEM 2.1 EXCAVACIÓN A TAJO ABIERTO EN TALUDES-EXCAVACIÓN CON ACARREO LIBRE-EN MATERIAL GRANULAR A CUALQUIER PROFUNDIDAD**: Para el periodo se tiene programado un avance de 22.58% de la actividad, para lo cual se ejecutó un 0.00%, estando por debajo de lo programado un 22.58%, lo que permite observar que la actividad se debe compensar con otras actividades las cuales estén

con un porcentaje de avance mayor al que deberían estar. Esta actividad debería estar con un 100% de avance programado acumulado a la fecha sin embargo presenta un74,69% de avance acumulado ejecutado por lo que hay un atraso de 25,31%.

**ÍTEM 2.2 EXCAVACIÓN A MANO EN DESCOLGADO DEL TALUD PARA ZAPATAS:** Para el presente periodo se tiene programado avanzar un 50.00% de la actividad, para lo cual se ejecutó un 0.00%, estando por debajo de lo programado un 50.00%, lo que permite observar que la actividad se debe compensar con otras actividades las cuales estén con un porcentaje de avance mayor al que deberían estar. Esta actividad presenta un atraso de 50.00% en el avance acumulado ejecutado.

**ÍTEM 2.3 SOBREACARREOS PARA ACARREOS TOTALES MAYORES DE 1000.00 M**: Para el presente periodo se tiene programado avanzar un 31.00% de la actividad, para lo cual se ejecutó un 0.00%, estando por debajo de lo programado un 31.00%, lo que permite observar que la actividad se debe compensar con otras actividades las cuales estén con un porcentaje de avance mayor al que deberían estar. Esta actividad debería estar tener un 79.00% de avance programado acumulado a la fecha, sin embargo, tiene un 6,16% de avance acumulado ejecutado lo que nos lleva a un atraso de
72,84%.

**ÍTEM 2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN:** Para el presente periodo se tiene programado avanzar un 31.00% de la actividad, para lo cual se ejecutó un 0.00%, estando por debajo de lo programado un 31.00%. a la fecha esta actividad debería tener un porcentaje de avance programado de 79,00% y presenta un porcentaje de avance acumulado ejecutado de 73,96% dejando un retraso de 5,04%.

Ítem 3.3 Inyección de lechada para anclajes
Ítem 4.1 Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2
Ítem 4.2 Suministro y colocación de anclajes 3 cables D =5/8
Ítem 5.1 Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración de 0.00 a 15 mts
Ítem 5.2 Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración mayor a 15 mts
Ítem 6.1 Perforaciones horizontales para anclajes de 0.00 a 15.00 m
Ítem 6.2 Perforaciones horizontales para anclajes mayores a 15.00 m
Ítem 6.3 Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal.

Estas actividades según la programación inicial se realizarían en el periodo actual, sin embargo, debido a los ajustes en los diseños iniciales que el contratista propuso y la interventoría ha venido revisando, no se adelantaron hasta tener la aprobación por la interventoría de la obra y la autorización por pare de la supervisión debido a la magnitud de los cambios en el modelo de mitigación.

Ver anexo seguimiento a cantidades de obra y avance contrato N° 00667-2023.

## 5. ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

En el período reportado del 01 al 31 de octubre de 2023, no se realizó actualización del plan de trabajo, sin embargo el contratista dentro de la información del proyecto de la modificatoria contiene un reprogramación que se está aprobara una vez se suscriba acta de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos.

## 6. ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS

En el período reportado del 01 al 31 de octubre de 2023, el contratista de obra e interventoría no presentó actas parciales de ejecución.

**Registro fotográfico**

**Comité técnico 04 de octubre 2023 -CAS-ALCALDIA DE SAN GIL -CONTRATISTA -INTERVENTOR**








**Comité técnico 05 de octubre 2023 -CAS-ENTERRITORIO-ALCALDIA DE SAN GIL -CONTRATISTA -INTERVENTOR**




**Visita de obra 05 de octubre de 2023 CAS-ENTERRITORIO-ALCALDIA DE SAN GIL - CONTRATISTA -INTERVENTOR**






## COMPONENTE FINANCIERO

Se anexa informe con la descripción de los movimientos financieros (Carpeta 2)

## COMPONENTE JURÍDICO

El contratista presento propuesta de ajuste a los diseños iniciales la cual fue objeto de revisión y observaciones por parte de la Interventoría del proyecto y la supervisión.

La interventoría finalmente presento el día 27 de noviembre de 2023 vía correo electrónico la revisión de la propuesta del contratista y mediante el INFORME DE INTERVENTORÍA A LOS AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOSY AL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS aprueba estos ajustes que dan soporte al acta de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos.

Mediane OFICIO SPL.1653.2023 - 03-10-2023 10:02 nuevamente la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS quien actúa como entidad ejecutora reitera solicitud de acompañamiento a la UNGRD quien fue la entidad de emitió concepto favorable a los diseños iniciales formulados y presentados por el municipio de San Gil ante el DNP.

La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS quien actúa como entidad ejecutora, a través de la supervisión, mediante OFICIO SPL. 1672.2023 - 04-10-2023 03:40 y OFICIO SPL.1746.2023 - 18-10-2023 10:25 notifica a la alcaldía del municipio de San gil para que emita un pronunciamiento frente a la propuesta de ajuste de los diseños teniendo en cuenta que el municipio fue quien formulo inicialmente el proyecto junto con los diseños.

El municipio de San Gil en cabeza de su alcalde, el Arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez, emite documento con fecha 27 de octubre de 2023 de concepto favorable y aval técnico respecto a estos ajustes solicitados por el contratista de obra y revisado y aprobados por la interventoría.

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- En compañía del contratista de obra se realizó la verificación y subsanación de observaciones de los estudios y diseños de acuerdo a las condiciones geotécnicas los cuales dieron como resultado el Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos.
- Se realizan visitas de campo e inspecciones técnicas entre contratista e interventoría para definir la ejecución de las actividades, determinar la ubicación y establecer parámetros en la realización de las actividades proyectadas.
- Se realiza control y seguimiento a la programación de obra y flujo de inversión presentado por el contratista.
- Se efectúa la verificación de las cantidades entregadas por el contratista y se determina el porcentaje de ejecución de obra en el presente periodo es de 0% lo que representa un atraso de 35.85%
- En el presente periodo se tiene un porcentaje acumulado del 5.03% del valor del contrato lo que equivale a QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($563.665.689,34), lo cual supone un atraso del 35.85% ya que según el porcentaje de avance programado debe ser 40.88%.
- Los contratos cuentan con pólizas vigentes y entregadas a la entidad contratante.
- Se realzaron comités técnicos y visita de obra en compañía DE ENTERRITORIO - ALCALDIA DE SAN GIL-CAS-CONTRATISTA E INETREVENTORIA. El día 05 de octubre de 2023.

- Se realizaron revisiones y observaciones a la información entregada por la Interventoría respecto a la propuesta de los ajustes a los diseños iniciales con el fin de continuar con el trámite y autorización de los mismos.
- Una vez suscrita el acta modificatoria de cantidades mayores y menores e ítems no previstos se debe actualizar el programa de obra.

**ANEXOS**

Se anexar al presente informe lo siguiente:
1. componente técnico
• Informe de actividades contrato de obra No. 00667-2023 y anexos
• Informe de actividades contrato de Interventoría No. 00675-2023 y anexos
• Flujo de inversión
• Seguimiento cantidades y avances
2. componente financiero
• Extracto bancario correspondiente al mes de octubre de 2023.
• Informe financiero mes de octubre de 2023
• Rendimientos financieros mes de octubre 2023
3 componente jurídico
4 registro fotográfico
5 flujo de inversión
6 seguimiento cantidades y avances

Lo anterior, podrá ser consultado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_QpiQvC2Yt5Dqr1yApbxpOcMcnmWVgOy

**SUPERVISOR**

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación de este:

**ROCIO AYALA MORENO**
SUPERVISORA

icontec ISO 14001 SA367-1
icontec ISO 45001 ST-CER944508
icontec ISO 9001 SC3264-1
icontec Norsok S WA-006
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
