INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 10 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221183 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER CONTRATO DE MANDATO No. 221009 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

OBJETO:	ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "***CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSÉ ANTONIO GALÁN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER",*** el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Santander."	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**	$11.999.999.870,13
	Incluir demás entidades que aporten al contrato especifico	
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	$11.999.999.870,13
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISIETE (17) MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	DIECINUEVE (19) DIAS DE DICIEMBRE DE 2022	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA CAS	ROCIO AYALA MORENO Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental	

SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/01/2023		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES			
ADICIONES O PRÓRROGAS			
SUSPENSIONES Y REINICIOS			
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/06/2024		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA	$11.214.953.149,65	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA**	$785.046.720,48
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	8,79 %	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)**	30,05%

GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3532798-2	11/01/2023	Cumplimiento	$1.199.999.987	23/12/2022	23/01/2023
Actualización de Póliza 3532798-2	28/03/2023	Cumplimiento	$1.199.999.987	20/01/2023	20/02/2025

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($11.999.999.870,13) son desembolsados así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
SOLCITUD PRIMER DESEMBOLSO	09/03/2023		$1.980.000.000
PRIMER DESEMBOLSO		16/03/2023	**$1.980.000.000**
SEGUNDO DESEMBOLSO			
TERCER DESEMBOLSO			
CUARTO DESEMBOLSO			
QUINTO DESEMBOLSO			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$1.980.000.000**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CUENTA DE AHORROS No. 0479 0011 2039; Banco Davivienda

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
02/2023	**N/A**	**0**		**0**
03/2023	$ 9.780.012,07	0		0
04/2023		$ 9.780.012,07		20/04/2023
04/2023	$ 18.434.727.88			
05/2023		$ 18.434.727.88		19/05/2023
05/2023	$19.095.522.88			
06/2023		$19.095.522.88		28906/2023
06/2023	$18,536,724.81			30/06/2023

07/2023		$18,536,724.81		25/07/2023
07/2023	$19,130,448.41			31/07/2023
08/2023		$19,130,448.41		28/08/2023
08/2023	$19,152,566.04			31/08/2023
09/2023		$19,152,566.04		07/09/2023
09/2023	$18,412,825.57			30/09/2023
10/2023		$18,412,825.57		09/10/2023
10/2023	$19,038,382.17			31/10/2023
11/2023		$19,038,382.17		07/11/2023
11/2023	$18,412.612.81			30/11/2023

18

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato No. 00675-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIA SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	$ 784.924.000
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL INTER SAN GIL	
Representante legal	LUIS FERNANDO QUIÑONES FLOREZ	
Integrantes:	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ con C.C. No. 13.722.479-1 en participación del 20%; CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S, con NIT 800.233.670-7 en participación del 20%; CONSTRUCCIONES, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES S.A.S, con NIT 900.713.031-3 en participación del 20% y JGH GESTION SAS, con NIT 900581798-5 en participación del 40%)	
Fecha Firma del contrato	(29/05/2023)	
Plazo contrato	(10 meses)	
Fecha del acta de inicio del contrato	(20/06/2023)	

fecha de Terminación del contrato	(19/04/2024)

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
N/A		

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	0%	0%	0$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**(VALOR EN PESOS)**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(PORCENTAJE)**	

PÓLIZAS :

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
96-44-101181710	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Cumplimiento del contrato	$156.984.800	20/06/2023	20/08/2024
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$156.984.800	20/06/2023	20/04/2027
		Calidad del servicio	$156.984.800	19/04/2024	19/04/2029
ESTADO DEL CONTRATO			EN EJECUCIÓN		

- ***CONTRATO DE OBRA***

OF.PRINCIPAL- SAN GIL
Carrera 12 N° 9-06
Barrio La Playa
Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Calle 36 N° 26-48
Edificio Sura Oficina 303
Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002
Celular:(310)8157695
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Carrera 9 N° 11-41
Barrio Centro
Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 N° 12-38
Tel:(607)7238925
Ext.2001-2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 N° 9-14
Barrio Aquileo Parra
Tel: (607)7238925 Ext.3001-3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de obra No. 00667-2023	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 Y 2 en el Municipio de San Gil, Santander		$ 11.214.844.432,69
Nombre contratista	UNION TEMPORAL MITIGACIÓN SAN GIL		
Representante legal	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL		
Identificación	CC- 91.227.926		
	INTEGRANTES (SI APLICA)		
	Nombres	Participación	Nit o CC
	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL	90%	C.C. No. 91.227.926
	MACAM SAS	10%	NIT 900878133-4
Fecha Firma del contrato	(16/05/2023)		
Plazo contrato	(10 meses)		
Fecha del acta de inicio del contrato	(20/06/2023)		
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(19/04/2024)		
Valor acumulado de recursos ejecutados	$563.665.689,34		
Porcentaje acumulado de recursos ejecutados	30,05%		
Porcentaje avance físico programado acumulado	8,79%		
Porcentaje avance físico ejecutado en el periodo	25,02%		
Porcentaje avance físico programado en el periodo	2,69%		

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
MODIFICATORIA N°1 AL CONTRATO DEOBRA N° 00667-2023	Debido a ajuste de los diseños iniciales revisados y aprobados por la interventoría fue necesario suscribir acta modificatoria al contrato N° 00667-2023	10/11/2023

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	%	%	$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**(VALOR EN PESOS)**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(PORCENTAJE)**	

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
B-100036402 de cumplimiento	26/05/2023	Cumplimiento del contrato	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/07/2024
		Prestaciones sociales	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/03/2027
		Estabilidad de la obra	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/03/2029

B-100009196 de responsabilidad civil extracontractual	26/05/2023	Amparo básico, predios laborales y operacionales Patronal Contratistas y subcontratistas Vehículos propios y no propios	$ 580.000.000	16/05/2023	16/03/2024
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

POLIZAS ACTUALIZADAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
B-100036402 de cumplimiento	27/07/2023	Cumplimiento del contrato	$2.242.968.886,60	20/06/2023	19/08/2024
		Prestaciones sociales	$2.242.968.886,60	20/06/2023	19/04/2027
		Estabilidad de la obra	$2.242.968.886,60	19/04/2024	19/04/2029
B-100009196 de responsabilidad	25/07/2023	Amparo básico, predios laborales y operacionales	$ 580.000.000	16/05/2023	19/04/2024
		Patronal Contratistas y subcontratistas Vehículos propios y no propios	$ 174.000.000	16/05/2023	19/04/2024

civil extracontractual					
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

4. INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:


COMPONENTE TÉCNICO:

1. **Avance de la meta establecida:**

Esta alternativa proyecta la intervención de un área aproximada de 4683,88 donde se incluyen las siguientes actividades:

	META	% EJECUCION MENSUAL	% EJECUCIÓN ACUMULADO
1	ANCLAJES ACTIVOS: Construcción de 228 und de anclajes activos	32,98%	32,98% 0
2	MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO LANZADO: Se proyecta recubrir 4840.39 m2 aproximadamente de superficie del terreno con concreto lanzado, reforzado con malla electrosoldada	% 0	% 0
3	CUNETAS EN MANTO HORMIGÓN: Realización de 515 ml de canaletas flexibles con sistema de geomanto de hormigón.	% 0	% 0
4	DRENES DE PENETRACIÓN: Construcción de 231 unidades de drenes de penetración horizontal.	23,81%	23,81%
5	CUNETA DISIPADORA EN CONCRETO REFORZADO: Construcción de 113.80 ml de cuneta disipadora en concreto reforzado	% 0	% 0
6	PERFILADO DE LA LADERA MEDIANTE TERRAZAS: Se realizará la conformación de la ladera mediante terrazas.	% 0	% 0

En el periodo de ejecución del 01 al 30 de noviembre de 2023 se presentó el siguiente avance de ejecución:

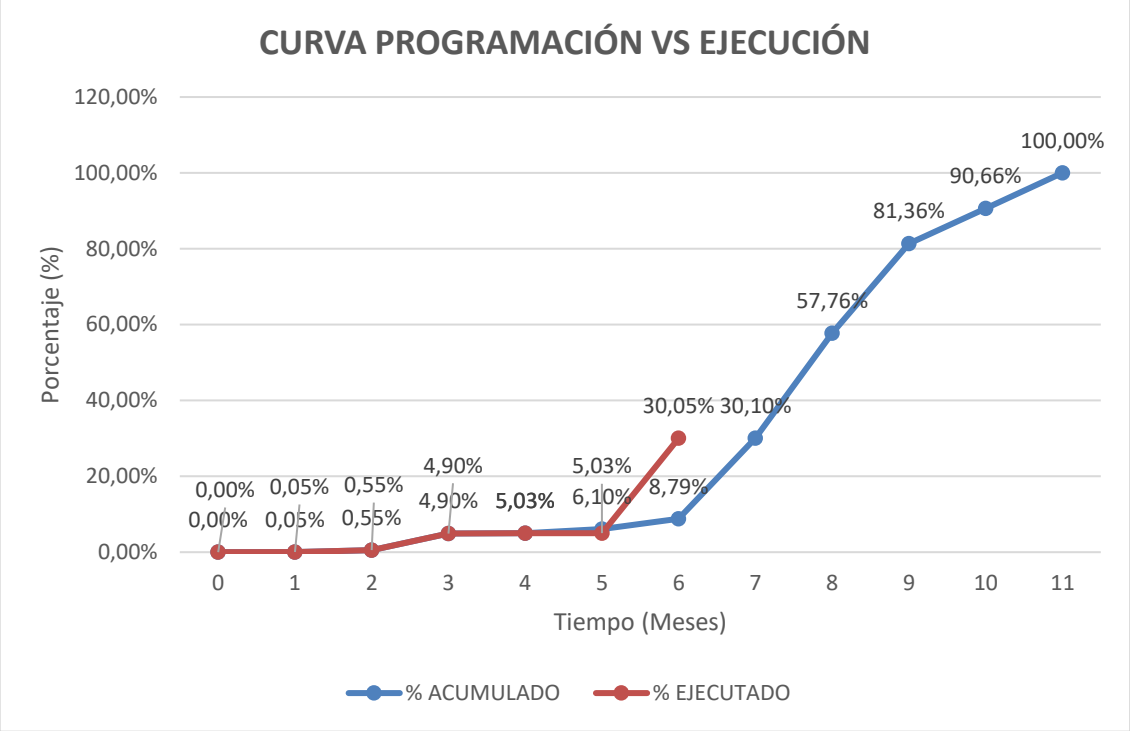

Fuente: Unión temporal Inter San Gil

Ver anexo 04. Flujo de inversión

2. Actividades desarrolladas en el periodo

Según los informes presentados por la interventoría, no se realizaron actividades en el periodo de ejecución del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023:

- Ítem 4.1 suministro y colocación de anclajes 3 cables D=5/8:

Para el periodo no se tiene programado un avance de la actividad y se ejecutó un 32.98%, reportando un adelanto de 32.98% y un porcentaje ejecutado acumulado de 32.98%. Estos porcentajes son comparados con los documentos aprobados por la supervisión de obra de la modificación.

- Ítem 5.1 Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración de 0.00 a 15 mts:

Para el presente periodo no se tiene porcentaje programado para esta actividad y se ejecutó un 23.81%, reportando un adelanto de 23.81% y un porcentaje ejecutado acumulado de 23.81%. Estos porcentajes son comparados con los documentos aprobados por la supervisión de obra de la modificación.

• Ítem 5.2 Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración mayores a 15 mts:

Para el presente periodo no se tiene porcentaje programado para esta actividad y se ejecutó un 23.81%, reportando un adelanto de 23.81% y un porcentaje ejecutado acumulado de 23.81%. Estos porcentajes son comparados con los documentos aprobados por la supervisión de obra de la modificación.

• Ítem 6.1 Perforaciones horizontales para anclajes de 0.00 a 15.00 m:

Para el presente periodo no se tiene porcentaje programado para esta actividad y se ejecutó un 32.98%, reportando un adelanto de 32.98% y un porcentaje ejecutado acumulado de 32.98%. Estos porcentajes son comparados con los documentos aprobados por la supervisión de obra de la modificación.

• Ítem 6.2 Perforaciones horizontales para anclajes mayores a 15 m:

Para el presente periodo no se tiene porcentaje programado para esta actividad y se ejecutó un 32.98%, reportando un adelanto de 32.98% y un porcentaje ejecutado acumulado de 32.98%. Estos porcentajes son comparados con los documentos aprobados por la supervisión de obra de la modificación.

• Ítem 6.3 Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal:

Para el presente periodo no se tiene porcentaje programado para esta actividad y se ejecutó un 30.25%, reportando un adelanto de 30.25% y un porcentaje ejecutado acumulado de 30.25%. Estos porcentajes son comparados con los documentos aprobados por la supervisión de obra de la modificación.

• Ítem NP1 Micropilotes diámetro 0.25 m incluye refuerzo:

Para el presente periodo se tiene programado un avance del 7.94% para esta actividad y se ejecutó un 33.33%, reportando un adelanto de 25.39% y un porcentaje ejecutado acumulado de 33.33%. Estos porcentajes son comparados con los documentos aprobados por la supervisión de obra de la modificación.

:

- Revisión y aprobación de la propuesta de ajuste de los diseños.
- entrega información correspondiente al acta modificatoria de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos
- Seguimiento a la programación de obra y flujo de inversión.
- Se realizan visitas de campo para el reconocimiento de los trabajos.
- Se hace seguimiento a las actividades ejecutadas.
- Se participa de los comités entre contratista de obra e interventoría.

Ver anexo seguimiento a cantidades de obra y avance contrato N° 00667-2023.

5. ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

En el período reportado del 01 al 31 de noviembre de 2023, se realizó actualización del plan de trabajo, sin el contratista dentro de la información del proyecto de la modificatoria contiene un reprogramación aprobada con el acta de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos.

6. ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS

En el período reportado del 01 al 30 de noviembre de 2023, el contratista de obra e interventoría no presentó actas parciales de ejecución.

Registro fotográfico

Fotografía aérea estado actual de la obra
 
Corte de guaya, armado de anclajes y figurado de acero para viga cabezal










Excavación de Micropilotes diámetro 0,25 incluye refuerzo



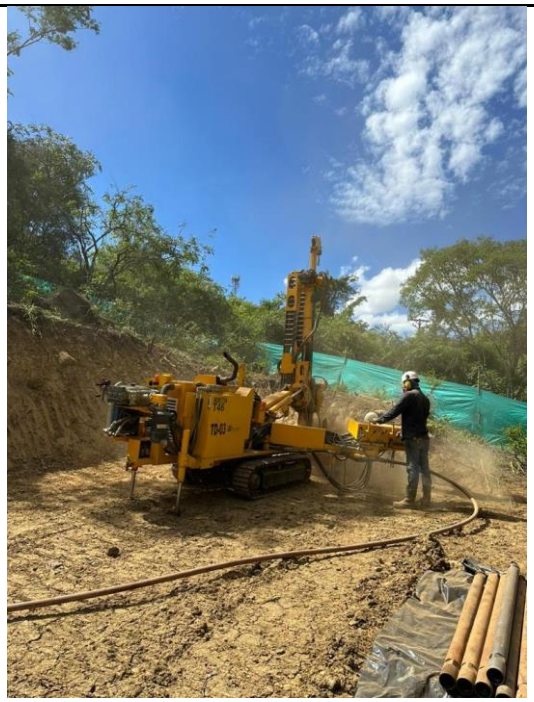





OF.PRINCIPAL- SAN GIL
Carrera 12 N° 9-06
Barrio La Playa
Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Calle 36 N° 26-48
Edificio Sura Oficina 303
Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002
Celular:(310)8157695
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Carrera 9 N° 11-41
Barrio Centro
Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 N° 12-38
Tel:(607)7238925
Ext.2001-2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 N° 9-14
Barrio Aquileo Parra
Tel: (607)7238925 Ext.3001-3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co





Perforaciones horizontales para anclajes





COMPONENTE FINANCIERO

Se anexa informe con la descripción de los movimientos financieros (Carpeta 2)

COMPONENTE JURÍDICO

- El Municipio de San Gil radica mediante correo electrónico el día 02 de noviembre documento de informa de viabilidad técnica junto con el aval técnico del ingeniero diseñador inicial del proyecto que fue presentado ante el DNP.
- El día 02 de noviembre de 2023 se realiza un comité para definir el trámite del acta modificatoria N°1 al contrato de obra N°01 al contrato N°00667-2023.

- El día 10 de noviembre de 2023 se suscribe acta de modificación de cantidades mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos ° 01 al contrato N°00667-2023.
- El día 30 de noviembre de 2023 se lleva a cabo comité de seguimiento N°5 con Enterritorio.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- En compañía del contratista de obra se realizó la verificación y subsanación de observaciones de los estudios y diseños de acuerdo con las condiciones geotécnicas los cuales dieron como resultado el Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos.
- Se realizan visitas de campo e inspecciones técnicas entre contratista e interventoría para definir la ejecución de las actividades, determinar la ubicación y establecer parámetros en la realización de las actividades proyectadas.
- Se realiza control y seguimiento a la programación de obra y flujo de inversión presentado por el contratista.
- Se realiza fracturamiento de rocas que presento la excavación con el objetivo de adecuarlas para su transporte o disposición final.
- Se efectúa la verificación de las cantidades entregadas por el contratista y se determina el porcentaje de ejecución de obra.
- Durante el periodo del presente informe se ejecutaron las actividades cumpliendo con los lineamientos descritos en los planos y especificaciones técnicas del contrato y acatando las indicaciones dadas por la interventoría.
- En el presente periodo se tiene un porcentaje acumulado del 30.05% del valor del contrato lo que equivale a TRES MIL TRECIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($3.370.155.453,27), lo cual corresponde a un adelanto del 21.26% ya que según el porcentaje de avance programado acumulado debe ser 8.79% según la documentación de la modificación presentada y aprobada.
- Se verificó que el personal del contratista se encontrara afiliado a la seguridad social y contara con los elementos de protección personal y dotación indicados para la actividad a ejecutar.
- Los contratos cuentan con pólizas vigentes y entregadas a la entidad contratante.
- Se verifica el cumplimiento por parte del contratista de los planes de gestión ambiental, plan de calidad, y seguridad y salud en el trabajo.
- Se verifica que el contratista cumpla con la gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se desarrollaron actividades tales como inducciones al personal, entrega de dotaciones, charlas y capacitaciones, además, se verifica el desarrollo seguro y las medidas de intervención adoptadas por el contratista.
- Como se puede evidenciar en el informe general del estado del tiempo no hubo precipitaciones que afectaran la ejecución.
- Se viene dando cumplimiento a la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo realizando las actividades correspondientes a salvaguardar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores,

evaluando los riesgos y tomando las medidas de prevención necesarias para mitigar y controlar los riesgos y peligros a los que están expuestos los colaboradores en la ejecución del contrato de Interventoría.

- Durante el tiempo transcurrido en el desarrollo de las actividades se ha evidenciado el cumplimiento de las normas de seguridad implementado por la organización y el compromiso por parte de los trabajadores de acuerdo con lo indicado en las charlas de seguridad, tomando conciencia de la importancia del uso de los Elementos de Protección Personal y las medidas de promoción y prevención de enfermedades laborales.
- Se evidencia el compromiso por parte de todo el personal de interventoría al cumplir con los requerimientos de seguridad tomando conciencia de la importancia del autocuidado, uso de los Elementos de Protección Personal y las medidas de prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Se realizan las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo al contratista de obra, pudiendo verificar que sus actividades se encuentran bajo la normatividad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, evidenciando el cumplimento de los procedimientos correspondientes a este periodo.

ANEXOS

Se anexar al presente informe lo siguiente:

1. componente técnico
• Informe de actividades contrato de obra No. 00667-2023 y anexos
• Informe de actividades contrato de Interventoría No. 00675-2023 y anexos
• Flujo de inversión
• Seguimiento cantidades y avances
2. componente financiero
• Extracto bancario correspondiente al mes de noviembre de 2023.
• Informe financiero mes de noviembre de 2023
• Rendimientos financieros mes de noviembre 2023
3 componente jurídico
4 registro fotográfico
5 flujo de inversión
6 seguimiento cantidades y avances

Lo anterior, podrá ser consultado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1dQJZ1Xq80nxy__aSa1nWC-28wM18LMAX?usp=sharing

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación de este:



ROCIO AYALA MORENO
SUPERVISORA

	Nombre	Firma
Proyectó	Fernando Álvarez Agudelo.	
