INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 14 DEL CONTRATO ESPECIFICO N° 2221183 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER CONTRATO DE MANDATO No. 221009 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

OBJETO:	ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "***CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSÉ ANTONIO GALÁN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER",*** el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Santander."		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**		$11.999.999.870,13
	Incluir demás entidades que aporten al contrato especifico		
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$11.999.999.870,13
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISIETE (17) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	DIECINUEVE (19) DIAS DE DICIEMBRE DE 2022		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA CAS	ROCIO AYALA MORENO Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental		
	NOMBRE	**DESDE**	**HASTA**

SUPERVISORES ANTERIORES			
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/01/2023		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES			
ADICIONES O PRÓRROGAS			
SUSPENSIONES Y REINICIOS			
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/06/2024		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA	$11.214.953.149,65	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA**	$785.046.720,48
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	90,66%	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)**	90,74%

GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZA No.		**AMPAROS**		**VIGENCIAS**

OF.PRINCIPAL- SAN GIL
Carrera 12 N° 9-06
Barrio La Playa
Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Calle 36 N° 26-48
Edificio Sura Oficina 303
Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002
Celular:(310)8157695
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Carrera 9 N° 11-41
Barrio Centro
Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 N° 12-38
Tel:(607)7238925
Ext.2001-2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 N° 9-14
Barrio Aquileo Parra
Tel: (607)7238925 Ext.3001-3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co

	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALORES ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
3532798-2	11/01/2023	Cumplimiento	$1.199.999.987	23/12/2022	23/01/2023
Actualización de Póliza 3532798-2	28/03/2023	Cumplimiento	$1.199.999.987	20/01/2023	20/02/2025

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($11.999.999.870,13) son desembolsados así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
SOLCITUD PRIMER DESEMBOLSO	09/03/2023		$1.980.000.000,00
PRIMER DESEMBOLSO		16/03/2023	**$1.980.000.000,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO	5/04/2024		$3.000.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	5/04/2024		$ 2.819.999.883,12
CUARTO DESEMBOLSO			
QUINTO DESEMBOLSO			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$1.980.000.000,00**

Nota: Durante el mes de abril del año 2024, se tramitaron los desembolsos dos y tres quedando publicado en el Secop II la solicitud el día 5/04/2024. Pendiente desembolso por parte de ENTerritorio

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CUENTA DE AHORROS No. 0479 0011 2039; Banco Davivienda

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
02/2023	**N/A**	**0**		**0**
03/2023	$ 9.780.012,07	0		31/03/2023

04/2023		$ 9.780.012,07		20/04/2023
04/2023	$ 18.434.727.88			30/04/2023
05/2023		$ 18.434.727.88		19/05/2023
05/2023	$19.095.522.88			30/05/2023
06/2023		$19.095.522.88		29/06/2023
06/2023	$18,536,724.81			30/06/2023
07/2023		$18,536,724.81		25/07/2023
07/2023	$19,130,448.41			31/07/2023
08/2023		$19,130,448.41		28/08/2023
08/2023	$19,152,566.04			31/08/2023
09/2023		$19,152,566.04		07/09/2023
09/2023	$18,412,825.57			30/09/2023
10/2023		$18,412,825.57		09/10/2023
10/2023	$19,038,382.17			31/10/2023
11/2023		$19,038,382.17		07/11/2023
11/2023	$18,412.612.81			30/11/2023
12/2023		$18,412.612.81		07/12/2023
12/2023	16.129.700,90			31/12/2023
01/2024		16.129.700,90		07/01/2024
01/2024	$ 3,877,190.14			31/01/2024
02/2024		$ 3,877,190.14		06/02/2024
02/2024	$ 2,633,996.16			29/02/2024
03/2024		$ 2,633,996.16		07/03/2024
03/2024	$ 1.737.281,41			31/03/2024
04/2024		$ 1.737.281,41		4/04/2024

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato No. 00675-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIA SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	$784.924.000
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL INTER SAN GIL	
Representante legal	LUIS FERNANDO QUIÑONES FLOREZ	
Integrantes:	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ con C.C. No. 13.722.479-1 en participación del 20%; CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S, con NIT 800.233.670-7 en participación del 20%; CONSTRUCCIONES, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES S.A.S, con NIT 900.713.031-3 en participación del 20% y JGH GESTION SAS, con NIT 900581798-5 en participación del 40%)	
Fecha Firma del contrato	(29/05/2023)	
Plazo contrato	(10 meses)	
Fecha del acta de inicio del contrato	(20/06/2023)	
fecha de Terminación del contrato	(19/04/2024)	

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
N/A		

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO					(dd/mm/año)
PRIMER PAGO	15%	15%	$117.738.600,00	Acta 01	15/02/2024
SEGUNDO PAGO	25%	25%	$196.231.000,00	Acta 02	

PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				$117.738.600,00	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**15%**	

Nota 1: Se realizó pago del acta parcial 01 por el 15% por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($117.738.600,00).

Nota 2: En proceso de trámite de acta parcial 02, por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 196.231.000,00) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00% del objeto contractual. Pendiente de desembolso por parte de ENTerritorio a la CAS para poder tramitar el acta parcial.

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
96-44-101181710	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Cumplimiento del contrato	$156.984.800	20/06/2023	20/08/2024
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$156.984.800	20/06/2023	20/04/2027
		Calidad del servicio	$156.984.800	19/04/2024	19/04/2029
ESTADO DEL CONTRATO			EN EJECUCIÓN		

- ***CONTRATO DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de obra No. 00667-2023	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San	$ 11.214.844.432,69

	Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 Y 2 en el Municipio de San Gil, Santander	
Nombre contratista	UNION TEMPORAL MITIGACIÓN SAN GIL	
Representante legal	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL	
Identificación	CC- 91.227.926	
	INTEGRANTES (SI APLICA)	
	Nombres / Participación / Nit o CC	
	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL — 90% — C.C. No. 91.227.926	
	MACAM SAS — 10% — NIT 900878133-4	
Fecha Firma del contrato	(16/05/2023)	
Plazo contrato	(10 meses)	
Fecha del acta de inicio del contrato	(20/06/2023)	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(19/04/2024)	
Valor acumulado de recursos ejecutados	$10.176.789.158,44	
Porcentaje acumulado de recursos ejecutados	90,74%	
Porcentaje avance físico programado acumulado	90,66%	
Porcentaje avance físico ejecutado en el periodo	23,81%	
Porcentaje avance físico programado en el periodo	9,29%	

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
MODIFICATORIA N°1 AL CONTRATO DEOBRA N° 00667-2023	Debido a ajuste de los diseños iniciales revisados y aprobados por la interventoría fue necesario suscribir acta modificatoria al contrato N° 00667-2023	10/11/2023

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	%	%	$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO	15%	15%	$1.682.226.664,90	Acta parcial 01	26/12/2023
SEGUNDO PAGO	25%	25%	$2.803.711.108,17	Acta parcial 02	
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				(1.682.226.664,90)	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				(15%)	

Nota: En tramite de acta parcial No. 02 por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00% del objeto contractual. Acta que se pagará una vez se realice el segundo desembolso de ENTerritirio a la CAS.

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
B-100036402 de cumplimiento	26/05/2023	Cumplimiento del contrato	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/07/2024
		Prestaciones sociales	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/03/2027
		Estabilidad de la obra	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/03/2029
B-100009196	26/05/2023	Amparo básico, predios laborales y operacionales	$ 580.000.000	16/05/2023	16/03/2024
		Patronal			
		Contratistas y subcontratistas			

de responsabilidad civil extracontractual		Vehículos propios y no propios			
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

POLIZAS ACTUALIZADAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
B-100036402 de cumplimiento	27/07/2023	Cumplimiento del contrato	$2.242.968.886,60	20/06/2023	19/08/2024
		Prestaciones sociales	$2.242.968.886,60	20/06/2023	19/04/2027
		Estabilidad de la obra	$2.242.968.886,60	19/04/2024	19/04/2029
B-100009196 de responsabilidad civil extracontractual	25/07/2023	Amparo básico, predios laborales y operacionales	$ 580.000.000	16/05/2023	19/04/2024
		Patronal	$ 174.000.000	16/05/2023	19/04/2024
		Contratistas y subcontratistas			
		Vehículos propios y no propios			
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

4. INFORME DEL SUPERVISOR:


DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
COMPONENTE TÉCNICO:

- **Avance de la meta establecida:**

Esta alternativa proyecta la intervención de un área aproximada de 4.683,88 donde se incluyen las siguientes actividades:

	META	% EJECUCION MENSUAL	% EJECUCIÓN ACUMULADO
1	ANCLAJES ACTIVOS: Construcción de 188 und de anclajes activos	25%	100%
2	MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO LANZADO: Se proyecta recubrir 4840.39 m2 aproximadamente de superficie del terreno con concreto lanzado, reforzado con malla electrosoldada	% 0	% 0
3	CUNETAS EN MANTO HORMIGÓN: Realización de 515 ml de canaletas flexibles con sistema de geomanto de hormigón.	33,21%	33,21%
4	DRENES DE PENETRACIÓN: Construcción de 231 unidades de drenes de penetración horizontal.	51,41%	51,41%
5	CUNETA DISIPADORA EN CONCRETO REFORZADO: Construcción de 113.80 ml de cuneta disipadora en concreto reforzado	% 0	% 0
6	PERFILADO DE LA LADERA MEDIANTE TERRAZAS: Se realizará la conformación de la ladera mediante terrazas.	100%	100%

En el periodo de ejecución del 01 al 31 de marzo de 2024 se presentó el siguiente avance de ejecución:

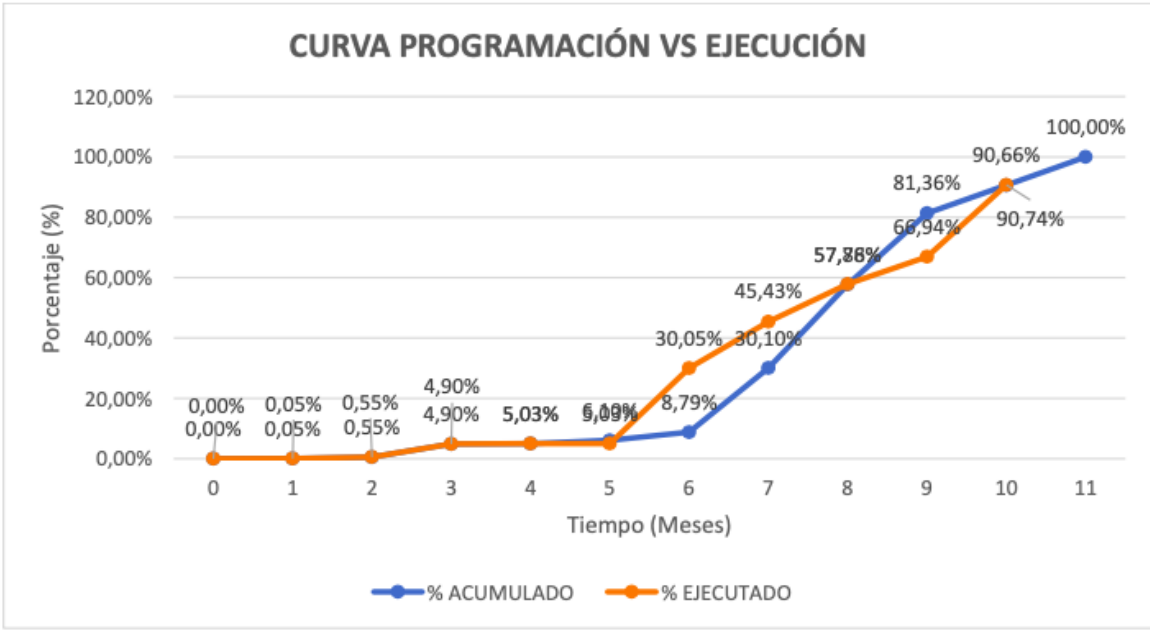

Fuente: Unión temporal Inter San Gil

Ver anexo 02. Flujo de inversión informe interventoría

Se observa un avance del 0.08% ya que según el porcentaje de avance programado acumulado es de 90.66%. De acuerdo con lo anterior se evidencia que se puso en acción el plan de contingencia presentado en el periodo anterior para el cumplimiento del cronograma.

2. Actividades desarrolladas en el periodo:

Según los informes presentados por la interventoría, se realizaron las siguientes actividades en el periodo de ejecución del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024:

- **Ítem 3.3 inyección de lechada para anclajes:**

Para el periodo se tiene programado un porcentaje de avance del 11.25% y se ejecutó un 20.74%, que sumado al porcentaje anterior nos da un porcentaje de avance acumulado del 95.74% reportando un atraso del 4.26% con respecto al porcentaje programado acumulado el cual es de 100.00%. El ítem presenta un atraso con respecto a lo programado el cual debe compensarse con otras.

- **Ítem 4.1 Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2:**

Para el periodo analizado no se tiene programado un porcentaje de avance ya que esta actividad termina en enero y para este periodo se reporta un avance de 47.21% y un porcentaje de avance acumulado de 75.00% reportando un atraso acumulado del 25.00% por lo que se hace necesario compensar este atraso con otras actividades realizadas..

- **Ítem 4.2 suministro y colocación de anclajes 3 cables D=5/8:**

Para el periodo no se tiene programado un avance ya que la actividad debió terminar en el mes de febrero y se ejecutó un 25.00%. por otra parte, este ítem reporta un porcentaje de avance acumulado del 100.00% el cual nos indica que ya finalizó la actividad.

- **Ítem 5.1 Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración de 0.00 a 15 mts:**

En este ítem se tiene programado un avance del 41.33% del cual en este periodo se ejecutó 51.43%. Por otra parte, el porcentaje de avance acumulado de este ítem es de 100.00% que, comparándolo con el porcentaje programado acumulado, el cual es de 82.67%, reporta un avance del 17.33% el cual ayuda a otras actividades que reportan un atraso en este periodo.

- **Ítem 5.2 Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración mayor a 15 mts:**

En este ítem se tiene programado un avance del 41.33% del cual en este periodo se ejecutó 51.43%. Por otra parte, el porcentaje de avance acumulado de este ítem es de 100.00% que, comparándolo con el porcentaje programado acumulado, el cual es de 82.67%, reporta un avance del 17.33% el cual ayuda a otras actividades que reportan un atraso en este periodo.

- **Ítem 6.1 Perforaciones horizontales para anclajes de 0.00 a 15.00 m:**

Para el periodo no se tiene programado un avance ya que la actividad debió terminar en el mes de febrero y se ejecutó un 25.00%. por otra parte, este ítem reporta un porcentaje de avance acumulado del 100.00% el cual nos indica que ya finalizó la actividad.

- **Ítem 6.2 Perforaciones horizontales para anclajes mayores a 15 m:**

Para el periodo no se tiene programado un avance ya que la actividad debió terminar en el mes de febrero y se ejecutó un 25.00%. por otra parte, este ítem reporta un porcentaje de avance acumulado del 100.00% el cual nos indica que ya finalizó la actividad.

- **Ítem 6.3 Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal:**

cas.gov.co contactenos@cas.gov.co Línea Gratuita 01 8000 917600

OF.PRINCIPAL- SAN GIL
Carrera 12 N° 9-06
Barrio La Playa
Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Calle 36 N° 26-48
Edificio Sura Oficina 303
Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002
Celular:(310)8157695
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Carrera 9 N° 11-41
Barrio Centro
Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 N° 12-38
Tel:(607)7238925
Ext.2001-2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 N° 9-14
Barrio Aquileo Parra
Tel: (607)7238925 Ext.3001-3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co

Para el periodo se tiene programado un avance de 23.85% y se ejecutó un 32.88% reportando un adelanto en el periodo de 9.03%. por otra parte, esta actividad reporta un porcentaje de avance acumulado de 100.00% que comparado con el porcentaje programado acumulado que es de 90.00%, reporta un adelanto de 10.00% en general lo que ayuda a otras actividades que no reportan avance y están programadas.

- **Ítem 7.2 Cuneta flexible en manto hormigón**

Para el periodo se tiene programado un avance de 27.54% y se ejecutó un 33.21% reportando un adelanto en el periodo de 5.67%. por otra parte, esta actividad inicia en este periodo por lo que este avance ayuda a otras actividades que tenían atraso.

- **Ítem 7.2 Filtro Francés**

Para el periodo se tiene programado un avance de 49.92% y no se ejecutaron actividades relacionadas a este ítem reportando un atraso en el periodo de 49.92%. por otra parte, esta actividad inicia en este periodo.

- **Ítem NP1 Micropilotes diámetro 0.25 m incluye refuerzo:**

Para el periodo no se tiene programado actividades ya que este ítem finalizó en el mes de febrero y se ejecutó un 15.87%. Este ítem reporta un porcentaje de avance acumulado del 100.00% finalizando esta actividad en el presente periodo.

- **Ítem NP2 Concreto de 3000 psi:**

Para el periodo se tiene programado un avance de 24.85% y se ejecutó un 31.49%. Esta actividad tiene un porcentaje acumulado ejecutado de 47.18% que comparado con el porcentaje programado acumulado a la fecha el cual es de 85.79% se presenta un retraso acumulado de 38.61% lo que hace necesario compensar este atraso con otras actividades realizadas

- **ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO**

En el período reportado del 01 al 31 de marzo de 2024, no se realizó actualización del plan de trabajo.

- **ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS**

Dentro del mes de marzo está en trámite acta parcial 02 para el respectivo pago, por cuanto esta sujeta al segundo desembolso de ENTerritorio.

El valor corresponde a DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física del y financiera del 25.00 %

del objeto contractual. Acta que se culminará el trámite una vez se realice el segundo desembolso de ENTerritirio a la CAS.

- **SOLICITUD DE SEGUNDO DESEMBOLSO RECURSOS CONTRATO ESPECIFICO N° 2221183**

El día 05 de abril de 2024, se realizó solicitud de segundo desembolso dando alcance al clausulado del contrato especifico 221183 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSÉ ANTONIO GALÁN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER, se remitió los documentos para el trámite del segundo desembolso de los recursos, de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato párrafo FORMA DE TRANSFERENCIAS A LA CAS NUMERAL 2:

2) Una segunda transferencia por valor de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000,00) una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 15% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se Requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

Para el trámite de cobro se anexó:

- Certificación de la cuenta con las características específicas del contrato especifico (exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser marcada como inembargable)
- Formato F-FI-06 y F-FI-10 (modelo cuenta de cobro) Firmado por el Director General.
- Documentos de representación legal del director general (e)
- Informe de supervisión con el cual se evidencia la ejecución demás del 15% de avance físico.

- **SOLICITUD DE TERCER DESEMBOLSO RECURSOS CONTRATO ESPECIFICO N° 2221183**

El día 05 de abril de 2024, se realizó solicitud de tercer desembolso dando alcance al clausulado del contrato especifico 221183 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSÉ ANTONIO GALÁN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER, se remitió los documentos para el trámite del tercer desembolso de los recursos, de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato párrafo FORMA DE TRANSFERENCIAS A LA CAS NUMERAL 3:

3) Una tercera transferencia por valor de ***DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE ($2.819.999.883,12),*** *una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 35% que deberá ser presen- tado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desem- bolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.*

Para el trámite de cobro se anexó:

- Certificación de la cuenta con las características específicas del contrato especifico (exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser marcada como inembargable)
- Formato F-FI-06 y F-FI-10 (modelo cuenta de cobro) Firmado por el Director General.
- Documentos de representación legal del director general (e)
- Informe de supervisión con el cual se evidencia la ejecución demás del 35% de avance físico.

De lo anterior, el día 05 de abril de 2024, se cargaron los documentos al SECOP II para el respectivo tramite del segundo y tercer desembolso.

Registro fotográfico

Fotografía aérea estado actual de la obra

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL NO. 10	
Registro Fotográfico 1. Suministro y colocación Acero de refuerzo	**Registro Fotográfico 2.** Suministro y colocación Acero de refuerzo
	
Registro Fotográfico 3. Micropilotes diámetro 0,25 incluye refuerzo	**Registro Fotográfico 4.** Inyección de lechada para anclajes
	
Registro Fotográfico 5. Perforaciones horizontales para anclajes	**Registro Fotográfico 6**. Perforaciones horizontales para anclajes
	
Registro Fotográfico 7. Concreto de 3000 PSI	**Registro Fotográfico 8.** Concreto de 3000 PSI
	

Registro Fotográfico 9. Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración	Registro Fotográfico 10. Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración
	

COMPONENTE FINANCIERO

En el periodo del mes de marzo se tiene un porcentaje acumulado del 90.74% del valor del contrato lo que equivale a **DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($10.176.789.158,44)** lo cual corresponde a un adelanto del 0.08% ya que según el porcentaje de avance programado acumulado debe ser 90.66% según la documentación de la modificación presentada y aprobada.

Se verificó que el personal del contratista se encontrara afiliado a la seguridad social y contara con los elementos de protección personal y dotación indicados para la actividad a ejecutar.

Los contratos cuentan con pólizas vigentes y entregadas a la entidad contratante.

Referente al contrato de interventoría No.00675-2023, se realizó pago de cuenta parcial No. 01 por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($117.738.600,00), la cual contablemente se encontraba en cuenta por pagar.

En el mes de marzo se dio inicio al tramite del acta parcial 02, por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 196.231.000,00) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00 % del objeto contractual. Pendiente de desembolso por parte de ENTerritorio a la CAS para poder tramitar el acta parcial.

Respecto al contrato de obra No. 00667-2023, se dio inicio al tramite del acta parcial No. 02 por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física del y financiera del 25.00% del objeto contractual. Acta que se podrá pagar una vez se realice el segundo desembolso de ENTerritirio a la CAS.

En cuanto al informe financiero y reintegro de rendimientos financieros, se anexa informe con la descripción de los movimientos financieros (Carpeta 2)

COMPONENTE JURÍDICO

- Supervisión de la correcta ejecución de las actividades de obra cumpliendo con las especificaciones técnicas y normas de seguridad.
- Se realiza el control de la documentación de interventoría y su archivo.
- Se hace seguimiento de la programación de obra, flujo de inversión, plan de contingencia, plan de gestión ambiental y plan de calidad presentado por el contratista
- Se presentó por parte de los contratistas, los documentos para el pago parcial No.2.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se realizan visitas de campo e inspecciones técnicas entre contratista e interventoría para supervisar la ejecución de las actividades, determinar la ubicación y establecer parámetros en la realización de las actividades proyectadas.
- Se realiza control y seguimiento a la programación de obra y flujo de inversión presentado por el contratista.
- Se efectúa la verificación de las cantidades entregadas por el contratista y se determina el porcentaje de ejecución de obra.
- Durante el periodo del presente informe se ejecutaron las actividades cumpliendo con los lineamientos descritos en los planos y especificaciones técnicas de la modificatoria realizada al contrato y acatando las indicaciones dadas por la interventoría
- En el presente periodo se tiene un porcentaje acumulado del 90.74% del valor del contrato lo que equivale a **DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($10.176.789.158,43)**, lo cual corresponde a un adelanto del 0.08% ya que según el porcentaje de avance programado acumulado debe ser 90.66% según la documentación de la modificación presentada y aprobada
- De acuerdo con lo anterior se evidencia que se puso en acción el plan de contingencia presentado en el periodo anterior para el cumplimiento del cronograma.

ANEXOS

Se anexar al presente informe lo siguiente:

1. componente técnico
• Informe de actividades contrato de obra No. 00667-2023 y anexos
• Informe de actividades contrato de Interventoría No. 00675-2023 y anexos
• Flujo de inversión
• Seguimiento cantidades y avances
2. componente financiero
• Informe financiero mes de marzo de 2024
• soportes de traslado de rendimientos financieros mes de marzo de 2024
5 flujo de inversión
6 seguimiento cantidades y avances

Lo anterior, podrá ser consultado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ADBeZzurHKgZqHSXF_t6dVzyBRauY4Km

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación de este:

ROCIO AYALA MORENO
SUPERVISORA

	Nombre	Firma
Proyectó	Alexandra Niño Wilches	
Revisó:	Leonardo A. Pacheco	
