INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 15 DEL CONTRATO ESPECIFICO N°2221183 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER CONTRATO DE MANDATO No. 221009

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

OBJETO:	ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado ***"CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSÉ ANTONIO GALÁN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER",*** el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Santander."	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**	$11.999.999.870,13
	Incluir demás entidades que aporten al contrato especifico	
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	$11.999.999.870,13
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISIETE (17) MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	DIECINUEVE (19) DIAS DE DICIEMBRE DE 2022	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA CAS	ROCIO AYALA MORENO Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental	

SUPERVISORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**

ANTERIORES			
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/01/2023		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES			
ADICIONES O PRÓRROGAS			
SUSPENSIONES Y REINICIOS			
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/06/2024		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA	$11.214.953.149,65	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA**	$785.046.720,48
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	100%	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)**	100%

GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3532798-2	11/01/2023	Cumplimiento	$1.199.999.987	23/12/2022	23/01/2023
Actualización de Póliza 3532798-2	28/03/2023	Cumplimiento	$1.199.999.987	20/01/2023	20/02/2025

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($11.999.999.870,13) son desembolsados así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
SOLCITUD PRIMER DESEMBOLSO	09/03/2023		$1.980.000.000,00
PRIMER DESEMBOLSO		16/03/2023	**$1.980.000.000,00**
SOLCITUD SEGUNDO DESEMBOLSO	5/04/2024		$3.000.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		15/04/2024	**$3.000.000.000,00**
SOLCITUD TERCER DESEMBOLSO	5/04/2024		$ 2.819.999.883,12
TERCER DESEMBOLSO		15/04/2024	**$ 2.819.999.883,12**
CUARTO DESEMBOLSO		23/04/2024	**$3.000.000.000,00**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$10.799.999.883,12**

Nota: Durante el mes de abril del año 2024, se recibieron los desembolsos dos, tres y cuatro para un total de **$10.799.999.883,12**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CUENTA DE AHORROS No. 0479 0011 2039; Banco Davivienda

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
02/2023	**N/A**	**0**		**0**
03/2023	$ 9.780.012,07	0		31/03/2023
03/2023		$ 9.780.012,07		20/04/2023
04/2023	$ 18.434.727.88			30/04/2023
04/2023		$ 18.434.727.88		19/05/2023
05/2023	$19.095.522.88			30/05/2023

05/2023		$19.095.522.88		26/06/2023
06/2023	$18,536,724.81			30/06/2023
06/2023		$18,536,724.81		25/07/2023
07/2023	$19,130,448.41			31/07/2023
07/2023		$19,130,448.41		28/08/2023
08/2023	$19,152,566.04			31/08/2023
08/2023		$19,152,566.04		07/09/2023
09/2023	$18,412,825.57			30/09/2023
09/2023		$18,412,825.57		06/10/2023
10/2023	$19,038,382.17			31/10/2023
10/2023		$19,038,382.17		07/11/2023
11/2023	$18,412.612.81			30/11/2023
11/2023		$18,412.612.81		07/12/2023
12/2023	16.129.700,90			31/12/2023
12/2023		16.129.700,90		05/01/2024
01/2024	$ 3,877,190.14			31/01/2024
01/2024		$ 3,877,190.14		06/02/2024
02/2024	$ 2,633,996.16			29/02/2024
02/2024		$ 2,633,996.16		07/03/2024
03/2024	$ 1.737.281,41			31/03/2024
03/2024		$ 1.737.281,41		4/04/2024
03/2024	$ 34.990.001,49			30/04/2024
04/2024		$ 34.990.001,49		7/05/2024

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato No. 00675-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSE	$784.924.000

	ANTONIO GALAN, ANTONIA SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL INTER SAN GIL	
Representante legal	LUIS FERNANDO QUIÑONES FLOREZ	
Integrantes:	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ con C.C. No. 13.722.479-1 en participación del 20%; CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S, con NIT 800.233.670-7 en participación del 20%; CONSTRUCCIONES, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES S.A.S, con NIT 900.713.031-3 en participación del 20% y JGH GESTION SAS, con NIT 900581798-5 en participación del 40%)	
Fecha Firma del contrato	(29/05/2023)	
Plazo contrato	(10 meses)	
Fecha del acta de inicio del contrato	(20/06/2023)	
fecha de Terminación del contrato	(19/04/2024)	

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
N/A		

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO					(dd/mm/año)
PRIMER PAGO	15%	15%	$117.738.600,00	Acta 01	15/02/2024
SEGUNDO PAGO	25%	25%	$196.231.000,00	Acta 02	
TERCER PAGO	25%	25%	$196.231.000,00	Acta 03	
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				$117.738.600,00	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**15%**	

Nota 1: Se realizó pago en el mes de febrero del acta parcial 01 por el 15% por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($117.738.600,00).

Nota 2: En proceso de trámite de pago acta parcial 02, por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 196.231.000,00) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00% del objeto contractual.

Nota 3: En proceso de trámite de acta parcial 03, por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 196.231.000,00) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00% del objeto contractual.

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
96-44-101181710	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Cumplimiento del contrato	$156.984.800	20/06/2023	20/08/2024
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$156.984.800	20/06/2023	20/04/2027
		Calidad del servicio	$156.984.800	19/04/2024	19/04/2029
ESTADO DEL CONTRATO			EN EJECUCIÓN		

- ***CONTRATO DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de obra No. 00667-2023	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 Y 2 en el Municipio de San Gil, Santander	$ 11.214.844.432,69
Nombre contratista	UNION TEMPORAL MITIGACIÓN SAN GIL	
Representante legal	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL	
Identificación	CC- 91.227.926	

	INTEGRANTES (SI APLICA)		
	Nombres	Participación	Nit o CC
	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL	90%	C.C. No. 91.227.926
	MACAM SAS	10%	NIT 900878133-4
Fecha Firma del contrato	(16/05/2023)		
Plazo contrato	(10 meses)		
Fecha del acta de inicio del contrato	(20/06/2023)		
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(19/04/2024)		
Valor acumulado de recursos ejecutados	$ 11.214.844.432,69		
Porcentaje acumulado de recursos ejecutados	100,00%		
Porcentaje avance físico programado acumulado	100,00%		
Porcentaje avance físico ejecutado en el periodo	9,26%		
Porcentaje avance físico programado en el periodo	9,34%		

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
MODIFICATORIA N°1 AL CONTRATO DEOBRA N°00667-2023	Debido a ajuste de los diseños iniciales revisados y aprobados por la interventoría fue necesario suscribir acta modificatoria al contrato N°00667-2023	10/11/2023

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	%	%	$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO	15%	15%	$1.682.226.664,90	Acta parcial 01	26/12/2023

SEGUNDO PAGO	25%	25%	$2.803.711.108,17	Acta parcial 02	
TERCER PAGO	25%	25%	$2.803.711.108,17	Acta parcial 03	
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				(1.682.226.664,90)	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				(15%)	

Nota 1: En trámite de pago acta parcial No. 02 por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00% del objeto contractual.

Nota 2: En inicio de trámite de acta parcial No. 03 por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00% del objeto contractual.

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
B-100036402 de cumplimiento	26/05/2023	Cumplimiento del contrato	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/07/2024
		Prestaciones sociales	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/03/2027
		Estabilidad de la obra	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/03/2029
B-100009196 de responsabilidad civil extracontractual	26/05/2023	Amparo básico, predios laborales y operacionales	$ 580.000.000	16/05/2023	16/03/2024
		Patronal			
		Contratistas y subcontratistas			
		Vehículos propios y no propios			

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN

POLIZAS ACTUALIZADAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
B-100036402 de cumplimiento	27/07/2023	Cumplimiento del contrato	$2.242.968.886,60	20/06/2023	19/08/2024
		Prestaciones sociales	$2.242.968.886,60	20/06/2023	19/04/2027
		Estabilidad de la obra	$2.242.968.886,60	19/04/2024	19/04/2029
B-100009196 de responsabilidad civil extracontractual	25/07/2023	Amparo básico, predios laborales y operacionales	$ 580.000.000	16/05/2023	19/04/2024
		Patronal	$ 174.000.000	16/05/2023	19/04/2024
		Contratistas y subcontratistas			
		Vehículos propios y no propios			
ESTADO DEL CONTRATO			EN EJECUCIÓN		

4. INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

COMPONENTE TÉCNICO:


- **Avance de la meta establecida:**

Esta alternativa proyecta la intervención de un área aproximada de 4.683,88 donde se incluyen las siguientes actividades:

META		% EJECUCION MENSUAL	% EJECUCIÓN ACUMULADO
1	ANCLAJES ACTIVOS: Construcción de 188 und de anclajes activos	100%	100%
2	MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO LANZADO: Se proyecta	% 0	% 0

	recubrir 4840.39 m2 aproximadamente de superficie del terreno con concreto lanzado, reforzado con malla electrosoldada		
3	CUNETAS EN MANTO HORMIGÓN: Realización de 602,30 ml de canaletas flexibles con sistema de geomanto de hormigón.	66,79%	100%
4	DRENES DE PENETRACIÓN: Construcción de 133 unidades de drenes de penetración horizontal.	48,59%	100%
5	CUNETA DISIPADORA EN CONCRETO REFORZADO: Construcción de 113.80 ml de cuneta disipadora en concreto reforzado	% 0	% 0
6	PERFILADO DE LA LADERA MEDIANTE TERRAZAS: Se realizará la conformación de la ladera mediante terrazas.	100%	100%

En el periodo de ejecución del 01 al 30 de abril de 2024 se presentó el siguiente avance de ejecución:

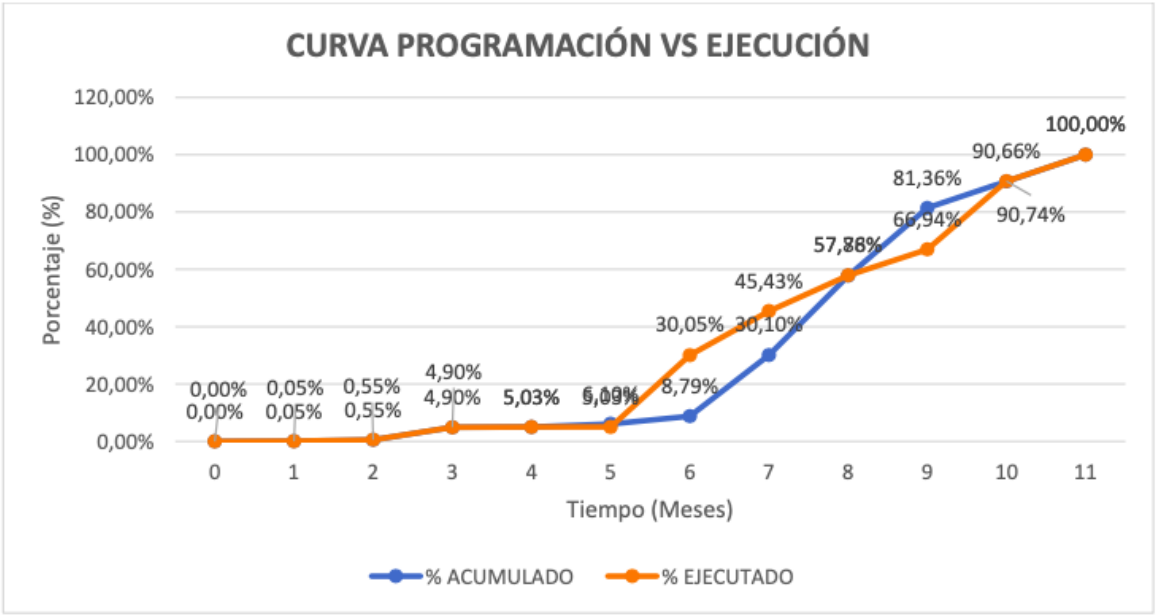

Fuente: Unión temporal Inter San Gil

Ver anexo 02. Flujo de inversión informe interventoría

Se culmino en el 100% las actividades de lo programado.

2. Actividades desarrolladas en el periodo:

Según los informes presentados por la interventoría, se realizaron las siguientes actividades en el periodo de ejecución del 01 de abril al 30 de abril de 2024:

- **Ítem 2.1 Excavación a tajo abierto en taludes - Excavación con acarreo libre - En material granular a cualquier profundidad:**

Para el periodo no se tiene programado un porcentaje de avance y se ejecutó un 0.00032%, que sumado al porcentaje anterior nos da un porcentaje de avance acumulado del 100% terminando con esta actividad en este periodo.

- **Ítem 2.3 Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m:**

Para el periodo analizado no se tiene programado un porcentaje de avance y para este periodo se reporta un avance de 0,000024% y un porcentaje de avance acumulado de 100%.

- **Ítem 2.4 Transporte de material de excavación:**

Para el periodo no se tiene programado un avance y se ejecutó un 0,28%. por otra parte, este ítem reporta un porcentaje de avance acumulado del 100.00% el cual nos indica que ya finalizó la actividad.

- **Ítem 3.3 inyección de lechada para anclajes:**

En este ítem no se tiene programado un avance en este periodo y se ejecutó 0,000437%. Por otra parte, el porcentaje de avance acumulado de este ítem es de 100.00% lo que nos reporta una finalización de este ítem en el presente periodo.

- **Ítem 4.1 Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2:**

En este ítem no se tiene programado un avance para este periodo y se ejecutó 25.00%. Por otra parte, el porcentaje de avance acumulado de este ítem es de 100.00% finalizando la actividad.

- **Ítem 4.3 Tensionamiento de anclajes:**

Para el periodo se tiene programado un avance de 100% de la actividad del cual se ejecutó un 100% finalizando este ítem.

- **Ítem 4.5 Suministro e instalación platinas metálicas:**

Para el periodo se tiene programado un avance de 100% de la actividad del cual se ejecutó un 100% finalizando este ítem.

- **Ítem 4.6 Suministro e instalación de Popora de 3 agujeros cónicos para cuña de 5/8":**

Para el periodo se tiene programado un avance de 100% de la actividad del cual se ejecutó un 100% finalizando este ítem

- **Ítem 4.7 Suministro e instalación Cuña de 5/8":**

Para el periodo se tiene programado un avance de 100% de la actividad del cual se ejecutó un 100% finalizando este ítem..

- **Ítem 7.2 Filtro Francés**

Para el periodo se tiene programado un avance de 49.92% y no se ejecutaron actividades relacionadas a este ítem reportando un atraso en el periodo de 49.92%. por otra parte, esta actividad inicia en este periodo.

- **Ítem 6.3 Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal:**

Para el periodo se tiene programado un avance de 10.00% y se ejecutó un 0.00%dado que esta actividad reporta un porcentaje de avance acumulado de 100.00% en el mes anterior dando por finalizado este item.

- **Ítem 7.2 Cuneta flexible en manto hormigón:**

Para el periodo se tiene programado un avance de 72.46% y se ejecutó un 66.79%. Por otra parte, el porcentaje acumulado de esta actividad es de 100% dando por finalizada esta actividad.

- **Ítem 7.3 Filtro Francés:**

Para el periodo se tiene programado un avance de 50.08% y se ejecutó el 100% de las actividades relacionadas a este ítem.

- **Ítem NP2 Manto tipo 5D:**

Para el periodo se tiene programado un avance de 72.00% y se ejecutó el 100%. Dando por terminada esta actividad.

- **Ítem NP3 Empradización con hidrosiembra:**

Para el periodo se tiene programado un avance de 72.00% y se ejecutó el 100%. Dando por terminada esta actividad.

- **Ítem NP4 Concreto de 3000 PSI:**

Para el periodo se tiene programado un avance de 14,21% y se ejecutó el 52,82%. Por otra parte, se completó el 1005 de esta actividad.

- **ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO**

En el período reportado del 01 al 30 de abril de 2024, no se realizó actualización del plan de trabajo.

- **ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS**

Dentro del mes de abril se trámite del acta parcial 02 para el respectivo pago:

El valor corresponde a DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física del y financiera del 25.00 % del objeto contractual. Acta que se culminará el trámite una vez se realice el segundo desembolso de ENTerritirio a la CAS.

Dentro del mes de abril se da inicio al trámite del acta parcial 03 para el respectivo pago.

El valor corresponde a DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física del y financiera del 25.00 % del objeto contractual.

Registro fotográfico

Registro Fotográfico 1. Suministro y colocación Acero de refuerzo	**Registro Fotográfico 2.** Inyección de lechada para anclajes
	
Registro Fotográfico 3. Tensionamiento de Anclajes	**Registro Fotográfico 4.** Suministro e Instalacion de Platinas Metalicas
	
Registro Fotográfico 5. Suministro e instalacion de Popora de 3 agujeros conicos para cuña de 5/8"	**Registro Fotográfico 6.** Suministro e instalación Cuña de 5/8"

	
Registro Fotográfico 7. Cuneta flexible en manto hormigón	**Registro Fotográfico 8.** Concreto de 3000 psi
	
Registro Fotográfico 9. Manto tipo 5D	**Registro Fotográfico 10.** Empradización con hidrosiembra





Registro fotográfico obra terminada.













COMPONENTE FINANCIERO

En el periodo del mes de abril se tiene un porcentaje acumulado del 100% del valor del contrato de obra que equivale a **ONCE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($11.214.884.432,69)**

Se verificó que el personal del contratista se encontrara afiliado a la seguridad social y contara con los elementos de protección personal y dotación indicados para la actividad a ejecutar.

Los contratos cuentan con pólizas vigentes y entregadas a la entidad contratante.

Referente al contrato de interventoría No.00675-2023, se realizó pago de cuenta parcial No. 01 por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($117.738.600,00).

En el mes de marzo se dio trámite del acta parcial 02, por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 196.231.000,00) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00 % del objeto contractual.

En el mes de abril se dio inicio al trámite del acta parcial 03, por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 196.231.000,00) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00 % del objeto contractual.

Respecto al contrato de obra No. 00667-2023, se dio tramite del acta parcial No. 02 por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física del y financiera del 25.00% del objeto contractual.

En el mes de abril se dio inicio al trámite del acta parcial No. 03 por valor de DOS MIL

OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física del y financiera del 25.00% del objeto contractual.

En cuanto al informe financiero y reintegro de rendimientos financieros, se anexa informe con la descripción de los movimientos financieros (Carpeta 2)

COMPONENTE JURÍDICO

- Supervisión de la correcta ejecución de las actividades de obra cumpliendo con las especificaciones técnicas y normas de seguridad.
- Se realiza el control de la documentación de interventoría y su archivo.
- Se hace seguimiento de la programación de obra, flujo de inversión, plan de contingencia, plan de gestión ambiental y plan de calidad presentado por el contratista
- Se presentó por parte de los contratistas, los documentos para el pago parcial No.3.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se realizan visitas de campo e inspecciones técnicas entre contratista e interventoría para supervisar la ejecución de las actividades, determinar la ubicación y establecer parámetros en la realización de las actividades proyectadas
- Se realiza control y seguimiento a la programación de obra y flujo de inversión presentado por el contratista.
- Se efectúa la verificación de las cantidades entregadas por el contratista y se determina el porcentaje de ejecución de obra.
- Durante el periodo del presente informe se ejecutaron las actividades cumpliendo con los lineamientos descritos en los planos y especificaciones técnicas de la modificatoria realizada al contrato y acatando las indicaciones dadas por la interventoría.
- En el presente periodo se tiene un porcentaje acumulado del 100% del valor del contrato lo que equivale a **ONCE MIL DOCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($11.214.844.432,69),** según la documentación de la modificación presentada y aprobada.

De acuerdo con lo anterior se evidencia que se puso en acción el plan de contingencia presentado en el periodo anterior para el cumplimiento del cronograma.

ANEXOS

Se anexar al presente informe lo siguiente:
1. componente técnico
• Informe de actividades contrato de obra No. 00667-2023 y anexos
• Informe de actividades contrato de Interventoría No. 00675-2023 y anexos
• Flujo de inversión
• Seguimiento cantidades y avances
2. componente financiero
• Informe financiero mes de abril de 2024
• soportes de traslado de rendimientos financieros mes de abril de 2024
5 flujo de inversión
6 seguimiento cantidades y avances

Lo anterior, podrá ser consultado en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1Mtv-OsrUJQiRuZUN-_G1zAIZEuoms6jZ

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación de este:

ROCIO AYALA MORENO
SUPERVISORA

	Nombre	Firma
Proyectó	Alexandra Niño Wilches	
Revisó:	Leonardo A. Pacheco	
