INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 16 DEL CONTRATO ESPECIFICO N°2221183 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER CONTRATO DE MANDATO No. 221009

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

OBJETO:	ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado ***"CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSÉ ANTONIO GALÁN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER",*** el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Santander."	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**	$11.999.999.870,13
	Incluir demás entidades que aporten al contrato especifico	
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	$11.999.999.870,13
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISIETE (17) MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	DIECINUEVE (19) DIAS DE DICIEMBRE DE 2022	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA CAS	OSCAR MIGUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental	

SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/01/2023		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES			
ADICIONES O PRÓRROGAS			
SUSPENSIONES Y REINICIOS			
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/06/2024		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA	$11.214.953.149,65	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA**	$785.046.720,48
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	100%	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)**	100%

GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3532798-2	11/01/2023	Cumplimiento	$1.199.999.987	23/12/2022	23/01/2023
Actualización de Póliza 3532798-2	28/03/2023	Cumplimiento	$1.199.999.987	20/01/2023	20/02/2025

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($11.999.999.870,13) son desembolsados así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
SOLCITUD PRIMER DESEMBOLSO	09/03/2023		$1.980.000.000,00
PRIMER DESEMBOLSO		16/03/2023	**$1.980.000.000,00**
SOLCITUD SEGUNDO DESEMBOLSO	5/04/2024		$3.000.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		15/04/2024	**$3.000.000.000,00**
SOLCITUD TERCER DESEMBOLSO	5/04/2024		$ 2.819.999.883,12
TERCER DESEMBOLSO		15/04/2024	**$ 2.819.999.883,12**
CUARTO DESEMBOLSO		23/04/2024	**$3.000.000.000,00**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$10.799.999.883,12**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CUENTA DE AHORROS No. 0479 0011 2039; Banco Davivienda

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
02/2023	**N/A**	**0**		**0**
03/2023	$ 9.780.012,07	0		31/03/2023
03/2023		$ 9.780.012,07		20/04/2023
04/2023	$ 18.434.727.88			30/04/2023
04/2023		$ 18.434.727.88		19/05/2023
05/2023	$19.095.522.88			30/05/2023
05/2023		$19.095.522.88		26/06/2023
06/2023	$18,536,724.81			30/06/2023
06/2023		$18,536,724.81		25/07/2023
07/2023	$19,130,448.41			31/07/2023
07/2023		$19,130,448.41		28/08/2023

08/2023	$19,152,566.04			31/08/2023
08/2023		$19,152,566.04		07/09/2023
09/2023	$18,412,825.57			30/09/2023
09/2023		$18,412,825.57		06/10/2023
10/2023	$19,038,382.17			31/10/2023
10/2023		$19,038,382.17		07/11/2023
11/2023	$18,412.612.81			30/11/2023
11/2023		$18,412.612.81		07/12/2023
12/2023	16.129.700,90			31/12/2023
12/2023		16.129.700,90		05/01/2024
01/2024	$ 3,877,190.14			31/01/2024
01/2024		$ 3,877,190.14		06/02/2024
02/2024	$ 2,633,996.16			29/02/2024
02/2024		$ 2,633,996.16		07/03/2024
03/2024	$ 1.737.281,41			31/03/2024
03/2024		$ 1.737.281,41		4/04/2024
04/2024	$ 34.990.001,49			30/04/2024
04/2024		$ 34.990.001,49		7/05/2024
05/2024	$ 62.774.493,48			31/05/2024
05/2024		$ 62.774.493,48		7/06/2023

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato No. 00675-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIA SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	$784.924.000
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL INTER SAN GIL	

Representante legal	LUIS FERNANDO QUIÑONES FLOREZ
Integrantes:	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ con C.C. No. 13.722.479-1 en participación del 20%; CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S, con NIT 800.233.670-7 en participación del 20%; CONSTRUCCIONES, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES S.A.S, con NIT 900.713.031-3 en participación del 20% y JGH GESTION SAS, con NIT 900581798-5 en participación del 40%)
Fecha Firma del contrato	(29/05/2023)
Plazo contrato	(10 meses)
Fecha del acta de inicio del contrato	(20/06/2023)
fecha de Terminación del contrato	(19/04/2024)

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
N/A		

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO					(dd/mm/año)
PRIMER PAGO	15%	15%	$117.738.600,00	Acta 01	15/02/2024
SEGUNDO PAGO	25%	25%	$196.231.000,00	Acta 02	15/05/2024
TERCER PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				$313.969.600	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**40%**	

Nota 1: Se realizó pago en el mes de febrero de 2024 del acta parcial 01 por el 15% por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($117.738.600,00).

Nota 2: Se realizó pago en el mes de mayo de 2024 del acta parcial 02 por el 25% por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($196.231.000,00)

Nota 3: En proceso de trámite de acta parcial 03, por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($196.231.000,00) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00% del objeto contractual.

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
96-44-101181710	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Cumplimiento del contrato	$156.984.800	20/06/2023	20/08/2024
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$156.984.800	20/06/2023	20/04/2027
		Calidad del servicio	$156.984.800	19/04/2024	19/04/2029
ESTADO DEL CONTRATO			EN EJECUCIÓN		

- ***CONTRATO DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de obra No. 00667-2023	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 Y 2 en el Municipio de San Gil, Santander	$ 11.214.844.432,69
Nombre contratista	UNION TEMPORAL MITIGACIÓN SAN GIL	
Representante legal	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL	
Identificación	CC- 91.227.926	
	INTEGRANTES (SI APLICA)	
	Nombres	Participación / Nit o CC
	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL	90% / C.C. No. 91.227.926

	MACAM SAS	10%	NIT 900878133-4
Fecha Firma del contrato	(16/05/2023)		
Plazo contrato	(10 meses)		
Fecha del acta de inicio del contrato	(20/06/2023)		
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(19/04/2024)		
Valor acumulado de recursos ejecutados	$ 11.214.844.432,69		
Porcentaje acumulado de recursos ejecutados	100,00%		
Porcentaje avance físico programado acumulado	100,00%		
Porcentaje avance físico ejecutado en el periodo	9,26%		
Porcentaje avance físico programado en el periodo	9,34%		

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
MODIFICATORIA N°1 AL CONTRATO DEOBRA N°00667-2023	Debido a ajuste de los diseños iniciales revisados y aprobados por la interventoría fue necesario suscribir acta modificatoria al contrato N°00667-2023	10/11/2023

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	%	%	$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO	15%	15%	$1.682.226.664,90	Acta parcial 01	20/12/2023
SEGUNDO PAGO	25%	25%	$2.803.711.108,17	Acta parcial 02	15/05/2024
TERCER PAGO					

PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				$ 4.485.937.773,07	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				40%	

Nota 1: Se realizó pago en el mes de diciembre de 2023 del acta parcial 01 por el 15% por valor de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($1.682.226.664,90).

Nota 2: Se realizó pago en el mes de mayo del acta parcial 02 por el 25% por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17)

Nota 3: En inicio de trámite de acta parcial No. 03 por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00% del objeto contractual.

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
B-100036402 de cumplimiento	26/05/2023	Cumplimiento del contrato	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/07/2024
		Prestaciones sociales	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/03/2027
		Estabilidad de la obra	$2.242.968.886,60	16/05/2023	16/03/2029
B-100009196 de responsabilidad civil extracontractual	26/05/2023	Amparo básico, predios laborales y operacionales	$ 580.000.000	16/05/2023	16/03/2024
		Patronal			
		Contratistas y subcontratistas			
		Vehículos propios y no propios			
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

POLIZAS ACTUALIZADAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
B-100036402 de cumplimiento	27/07/2023	Cumplimiento del contrato	$2.242.968.886,60	20/06/2023	19/08/2024
		Prestaciones sociales	$2.242.968.886,60	20/06/2023	19/04/2027
		Estabilidad de la obra	$2.242.968.886,60	19/04/2024	19/04/2029
B-100009196 de responsabilidad civil extracontractual	25/07/2023	Amparo básico, predios laborales y operacionales	$ 580.000.000	16/05/2023	19/04/2024
		Patronal	$ 174.000.000	16/05/2023	19/04/2024
		Contratistas y subcontratistas			
		Vehículos propios y no propios			
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

4. INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:


COMPONENTE TÉCNICO:

- **Avance de la meta establecida:**

Esta alternativa proyecta la intervención de un área aproximada de 4.683,88 donde se incluyen las siguientes actividades:

	META	% EJECUCION MENSUAL	% EJECUCIÓN ACUMULADO
1	ANCLAJES ACTIVOS: Construcción de 188 und de anclajes activos	100%	100%
2	Micropilotes diámetro 0,25 de 2.835 ml, incluye refuerzo	100%	100%
3	CUNETAS EN MANTO HORMIGÓN: Realización de 602,30 ml de canaletas flexibles con sistema de geomanto de hormigón.	100%	100%
4	DRENES DE PENETRACIÓN: Construcción de 105 unidades de drenes de penetración horizontal.	100%	100%
5	CUNETA DISIPADORA EN CONCRETO	% 0	% 0

	REFORZADO: Construcción de 113.80 ml de cuneta disipadora en concreto reforzado		
6	PERFILADO DE LA LADERA MEDIANTE TERRAZAS: Se realizará la conformación de la ladera mediante terrazas.	100%	100%

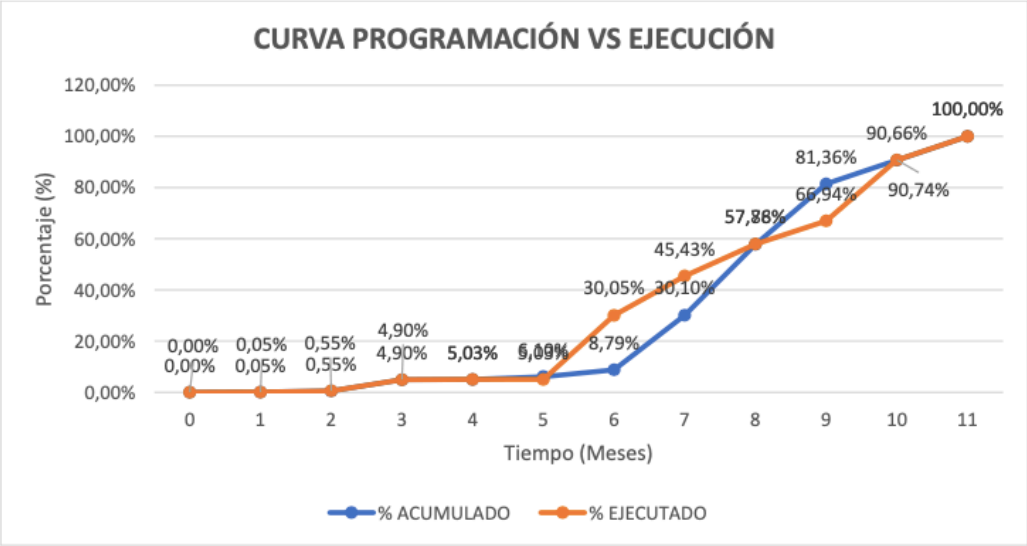

Fuente: Unión temporal Inter San Gil

Ver anexo 02. Flujo de inversión informe interventoría

Se culmino en el 100% las actividades de lo programado.

2. Actividades desarrolladas en el periodo:

No aplica ya que el contrato especifico se terminó el 19 de abril de 2024

- **ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO**

En el período reportado del 01 al 30 de mayo de 2024, no se realizó actualización del plan de trabajo.

- **ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS**

Se realizó pago en el mes de mayo del acta parcial 02 por el 25% por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 196.231.000,00) del contrato de interventoría No. 675-2023

Se realizó pago en el mes de mayo del acta parcial 02 por el 25% por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) del contrato de obra No. 677-2023


Dentro del mes de mayo se da inicio al trámite del acta parcial 03 de contrato de interventoría No. 675-2023 por un valor de: CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN

MIL PESOS M/CTE ($ 196.231.000,00) del contrato de interventoría No. 675-2023 correspondiente a una ejecución física del y financiera del 25.00 % del objeto contractual.

Dentro del mes de mayo se da inicio al trámite del acta parcial 03 de contrato de obra No. 677-2023 por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física del y financiera del 25.00 % del objeto contractual.

Registro fotográfico

Registro fotográfico obra terminada.

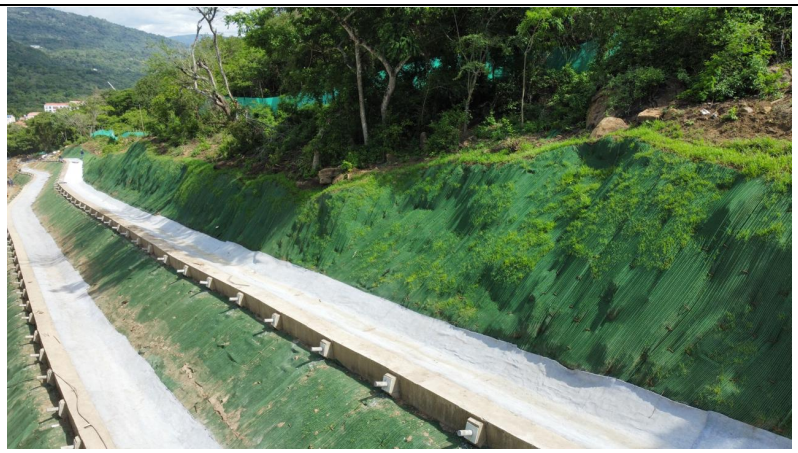











COMPONENTE FINANCIERO

En el periodo del mes de mayo se tiene un porcentaje acumulado del 100% del valor del contrato de obra que equivale a **ONCE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($11.214.884.432,69).** La fecha de terminación se realizó el 19 de abril de 2024

Se verificó que el personal del contratista se encontrara afiliado a la seguridad social y contará con los elementos de protección personal y dotación indicados para la actividad a ejecutar.

Los contratos cuentan con pólizas vigentes y entregadas a la entidad contratante.

Referente al contrato de interventoría No.00675-2023, se realizó pago de cuenta parcial No. 01 por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($117.738.600,00).

En el mes de mayo se realiza pago del acta parcial 02, por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 196.231.000,00) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00 % del objeto contractual.

En el mes de mayo se dio inicio al trámite del acta parcial 03, por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 196.231.000,00) correspondiente a una ejecución física y financiera del 25.00 % del objeto contractual.

Referente al contrato de obra No.00677-2023, se realizó pago de cuenta parcial No. 01 por valor de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($1.682.226.664,90).

En el mes de mayo se realiza pago del acta parcial 02, por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS

CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física del y financiera del 25.00% del objeto contractual.

En el mes de mayo se dio inicio al trámite del acta parcial No. 03 por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($2.803.711.108,17) correspondiente a una ejecución física del y financiera del 25.00% del objeto contractual.

En cuanto al informe financiero y reintegro de rendimientos financieros, se anexa informe con la descripción de los movimientos financieros (Carpeta 2)

COMPONENTE JURÍDICO

- Supervisión de la correcta ejecución de las actividades de obra cumpliendo con las especificaciones técnicas y normas de seguridad.
- Se realiza el control de la documentación de interventoría y su archivo.
- Se hace seguimiento de la programación de obra, flujo de inversión, plan de contingencia, plan de gestión ambiental y plan de calidad presentado por el contratista
- Se presentó por parte de los contratistas, los documentos para el pago parcial No.3.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- La obra se ejecutó en un plazo de 10 meses comprendidos entre el 20 de junio de 2023 y el 19 de abril de 2024 lo que nos indica que se cumplió con la programación contractual.
- Como se pueden observar en los diferentes periodos, se realizaron visitas de campo e inspecciones técnicas entre contratista e interventoría para supervisar la ejecución de las actividades, determinar la ubicación y establecer parámetros en la realización de las actividades proyectadas.
- El contrato tuvo una modificatoria, la cual contemplo un cambio de diseño, con el fin de mejorar la estabilidad de las obras a construir. Esta modificatoria fue aprobada por interventoría y supervisión después de realizar un acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos.
- Esta modificatoria no afecto el valor contractual ni el plazo de ejecución establecidos inicialmente.
- Se realizó control y seguimiento a la programación de obra y flujo de inversión presentado por el contratista.
- Se efectúa la verificación de las cantidades entregadas por el contratista y se determina el porcentaje de ejecución de obra.
- Se ejecutaron las actividades cumpliendo con los lineamientos descritos en los planos y especificaciones técnicas de la modificación realizada al contrato y acatando las indicaciones dadas por la interventoría.

- Se obtuvo un porcentaje acumulado del 100% del valor del contrato lo que equivale a ONCE MIL DOCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($11.214.844.432,69), según la documentación de la modificación presentada y aprobada, lo que nos indica que el contratista cumplió con la totalidad del presupuesto.

De acuerdo con lo anterior se evidencia que se puso en acción el plan de contingencia presentado en el periodo anterior para el cumplimiento del cronograma.

ANEXOS

Se anexar al presente informe lo siguiente:
1. componente técnico
• Informe de actividades contrato de obra No. 00667-2023 y anexos
• Informe de actividades contrato de Interventoría No. 00675-2023 y anexos
• Flujo de inversión
• Seguimiento cantidades y avances
2. componente financiero
• Informe financiero mes de mayo de 2024
• soportes de traslado de rendimientos financieros mes de mayo de 2024
5 flujo de inversión
6 seguimiento cantidades y avances

Lo anterior, podrá ser consultado en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/159Aux2mjaNZ4Ak7b6f44lEfwgvG-XBQG

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación de este:

OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ
Fecha: 2024.06.25 10:49:08 -05'00'

OSCAR MIGUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUPERVISOR

	Nombre	Firma
Proyectó	Alexandra Niño Wilches	
Revisó	Yuleimy Ramírez	
