**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 016 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221184 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER**
**CONTRATO DE MANDATO No. 221009**
**PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024**

## 1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO:** | ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "***CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER. FASE I SECTOR 2***", el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2022 del Pacto Funcional Santander. | |
| **PARTICIPANTES** | En Territorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)<br>Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) | |
| **ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO** | Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) | |
| **VALOR APORTES** | **ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)** | $29.731.676.848,07 |
| | **Incluir demás entidades que aporten al contrato especifico** | |
| | **TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO** | $29.731.676.848,07 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | VEINTISÉIS (26) MESES | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA CAS** | OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ<br>Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental | |

| **SUPERVISORES ANTERIORES** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
|---|---|---|---|
| | ROCIO AYALA MORENO | 20/01/2023 | 31/05/2024 |

| | |
|---|---|
| **FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO** | 20/01/2023 |

| **MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO** | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **JUSTIFICACIÓN** | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** |
| **MODIFICACIONES** | | |
| **ADICIONES O PRÓRROGAS** | | |
| **SUSPENSIONES Y REINICIOS** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO** | 19/02/2025 | | |
| **VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA** | $27.786.613.876,7 | **VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA** | $1.945.062.971,37 |
| **% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)** | 10.33% | **% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)** | 2,85% |

**Nota:**

- De acuerdo a las actividades reportadas y las cantidades ejecutadas en el presente periodo se presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 2.85%, comparado con el programado del 10.33%.

- Durante el periodo del presente informe no se han realizado cambios técnicos ni modificaciones al contrato.

**GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| **PÓLIZA No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***FECHA INICIO*** | ***FECHA FINAL*** |
| 3532750-1 | 11/01/2023 | CUMPLIMIENTO | $2.973.167.685,0 | 23/12/2022 | 23/10/2025 |
| ACTUALIZACIÓN DE POLIZA 3532750-1 | 28/03/2023 | CUMPLIMIENTO | $2.973.167.685,0 | 20/01/2023 | 20/11/2025 |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($29.731.676.848,07) cuyos desembolsos se dan así:

| **DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES** | **FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio** | **FECHA DE PAGO** | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | 09/03/2023 | 16/03/2023 | $5.997.227.641,07 |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | | | |
| TERCER DESEMBOLSO | | | |
| CUARTO DESEMBOLSO | | | |
| QUINTO DESEMBOLSO | | | |
| **VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO** | | | $5.997.227.641,07 |

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

| MES /AÑO | VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA | VALOR GIRADO A DTN | VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN | FECHA DEL GIRO AL DTN |
|---|---|---|---|---|
| 02/2023 | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 03/2023 | $ 29.622.706,50 | 0 | 0 | 0 |
| 03/2023 | | $ 29.622.706,50 | | 31/03/2023 |
| 04/2023 | $55.837.000,08 | | | 20/04/2023 |
| 04/2023 | | $55.837.000,08 | | 19/05/2023 |
| 05/2023 | $ 57.838.484,11 | | 0 | |
| 06/2023 | | $57.838.484,11 | | 28/06/2023 |
| 06/2023 | $ 56.145.938,79 | | | 30/06/2023 |
| 07/2023 | | $ 56.145.938,79 | | 25/07/2023 |
| 07/2023 | $ 57.944.269,92 | | | 31/07/2023 |
| 08/2023 | | $ 57.944.269,92 | | 28/08/2023 |
| 08/2023 | $ 58.011.262,20 | | | 31/08/2023 |
| 09/2023 | | $58.011.262,20 | | 07/09/2023 |
| 09/2023 | $ 55.770.660,08 | | | 30/09/2023 |
| 10/2023 | | $ 55.770.660,08 | | 09/10/2023 |
| 10/2023 | $57.665.411,96 | | | 31/10/2023 |
| 11/2023 | | $57.665.411,96 | | 07/11/2023 |
| 11/2023 | $55.770.015.69 | | | 30/11/2023 |
| 12/2023 | | $55.770.015.69 | | 07/12/2023 |
| 12/2023 | $57.098.160,56 | | | 30/12/2023 |
| 01/2024 | | $57.098.160,56 | | 05/01/2024 |
| 01/2024 | $53.278.267,05 | | | 31/01/2024 |
| 01/2024 | | $53.278.267,05 | | 06/02/2024 |
| 02/2024 | $ 49.841.853,32 | | | 29/02/2024 |
| 02/2024 | | $ 49.841.853,32 | | 07/03/2024 |
| 03/2024 | $ 53.298.544,47 | | | 31/03/2024 |
| 03/2024 | | $ 53.298.544,47 | | 04/04/2024 |
| 04/2024 | $ 51.534.695,53 | | | 30/04/2024 |
| 05/2024 | | $ 51.534.695,53 | | 07/05/2024 |
| 31/05/2024 | $47.986.620,84 | | | 31/05/2024 |
| 07/06/2024 | | 47.986.620,84 | | 07/06/2024 |

Se registra traslado de rendimientos financieros generados en el mes mayo de 2024 por valor de $47.986.620.84 realizado el traslado el día 07 de Junio de 2024.

## 3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

➢ ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|
| Contrato No 00674-2023 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para el proyecto construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander Fase I Sector 2. | $1.944.936.000 |
| **Nombre contratista** | UNION TEMPORAL INTER MÁLAGA | |
| **Representante legal** | MARIA ANGELICA ROMERO ASCANIO | |
| **Integrantes:** | CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ con C.C. No. 13.722.479-1 en participación del 20%; CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S, con NIT 800.233.670-7 en participación del 20%; CONSTRUCCIONES, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES S.A.S, con NIT 900.713.031-3 en participación del 20% y JGH GESTION SAS, con NIT 900581798-5 en participación del 40% | |
| **Fecha Firma del contrato** | (18/05/2023) | |
| **Plazo contrato** | (20 meses) | |
| **Fecha del acta de inicio del contrato** | 20/06/2023 | |
| **fecha de Terminación del contrato** | 19/02/2025 | |

**NOVEDADES CONTRACTUALES:**

| DESCRIPCION | JUSTIFICACION | FECHA |
|---|---|---|
| N/A | | |

**PAGOS:**

| CONCEPTO | % REQUERIDO | % A PAGAR | VALOR | No. ORDEN DE PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | 0% | 0% | 0$ | # | (dd/mm/año) |
| PRIMER PAGO | | | | | |
| SEGUNDO PAGO | | | | | |
| PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN | | | | | |
| **VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA** | | | | **(VALOR EN PESOS)** | |

| % ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS | (PORCENTAJE) |
|---|---|

**PÓLIZAS:**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 96-44-101181673 | 08 DE JUNIO DE 2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 388.987.200 | 29-MAY-2023 | 29-MAY-2025 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 388.987.200 | 29-MAY-2023 | 29-ENE-2028 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | 388.987.200 | 29-ENE-2025 | 27-DIC-2029 |
| | | | | NOTA ACLARATORIA: Este amparo inicia cobertura una vez se suscriba el acta de recibo final | |
| ESTADO DEL CONTRATO | | | EN EJECUCIÓN | | |

➢ ***CONTRATO DE OBRA***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| No. Contrato | 00668-2023 | | **$ 27.786.363.566,24** |
| **Nombre contratista** | UNIÓN TEMPORAL MITIGACIÓN MÁLAGA | | |
| **Representante legal** | MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL | | |
| **Identificación** | 91.227.926 | | |
| | INTEGRANTES (SI APLICA) | | |
| | Nombres | Participación | Nit o CC |
| | MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL | 90% | 91.227.926 |
| | MACAM SAS | 10% | 900.878.133-4 |
| **Fecha Firma del contrato** | 16/05/2023 | | |
| **Plazo contrato** | 20 meses | | |
| **Fecha del acta de inicio del contrato** | 20/06/2023 | | |
| **Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)** | 19/02/2025 | | |
| **Valor acumulado de recursos ejecutados** | $792.738.173,50 | | |

| | |
|---|---|
| **Porcentaje acumulado de recursos ejecutados** | 2,52% |
| **Porcentaje avance físico programado acumulado** | 10,33% |
| **Porcentaje avance físico ejecutado en el periodo** | 2,85% |
| **Porcentaje avance físico programado en el periodo** | 10.33% |

**NOVEDADES CONTRACTUALES:**

| DESCRIPCION | JUSTIFICACION | FECHA |
|---|---|---|
| N/A | | |

**PAGOS:**

| CONCEPTO | % REQUERIDO | % A PAGAR | VALOR | No. ORDEN DE PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | 0% | 0% | 0$ | # | (dd/mm/año) |
| PRIMER PAGO | | | | | |
| SEGUNDO PAGO | | | | | |
| PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN | | | | | |
| **VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA** | | | | **($0)** | |
| **% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS** | | | | **(0%)** | |

No se ha realizado pagos al contratista.

**PÓLIZAS:**

**Cumplimiento inicial**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 96-44-101181237 | 29/05/2023 | cumplimiento del contrato | 5.557.272.713,25 | 16-may-2023 | 16-may-2025 |
| | | pago de salarios | 5.557.272.713,25 | 16-may-2023 | 16-ene-2028 |
| | | estabilidad y calidad de la obra | 5.557.272.713,25 | Inicia cobertura de 5 años contados a partir del acta de recibo final | |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | | | **EN EJECUCIÓN** | | |

Pólizas actualizadas:

| PÓLIZA No. | | AMPAROS | | VIGENCIAS |
|---|---|---|---|---|

| | FECHA DE EXPEDICIÓN | | VALORES ASEGURADOS | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
|---|---|---|---|---|---|
| 96-44-101181237 | 28/07/2023 | cumplimiento del contrato | 5.557.272.713,25 | 20-06-2023 | 20-06-2025 |
| | | pago de salarios | 5.557.272.713,25 | 20-06-2023 | 20-02-2028 |
| | | estabilidad y calidad de la obra | 5.557.272.713,25 | Inicia cobertura de 5 años contados a partir del acta de recibo final | |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | | | **EN EJECUCIÓN** | | |

**Responsabilidad Civil inicial**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 96-40-101064079 | 29/05/2023 | predios labores y operaciones | 1.389.318.178,31 | 16-may-2023 | 16-may-2025 |
| | | contratistas y subcontratistas | | | |
| | | Vehículos propios y no propios | | | |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | | | **EN EJECUCIÓN** | | |

**Responsabilidad Civil actualizada**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 96-40-101064079 | 28/07/2023 | predios labores y operaciones | 1.389.318.178,31 | 20-06-2023 | 20-02-2025 |
| | | contratistas y subcontratistas | | | |
| | | Vehículos propios y no propios | | | |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | | | **EN EJECUCIÓN** | | |


**4. INFORME DEL SUPERVISOR:**

| DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO: |
|---|
| Desde la supervisión del contrato especifico en el cumplimiento de sus obligaciones se han llevado acabo las siguientes obligaciones durante el periodo: |

1. Seguimiento, supervisión y control a la ejecución de los recursos que le sean transferidos en cumplimento del contrato especifico suscrito, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y al parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 del Decreto 740 de 2016 y demás normas aplicables.

**COMPONENTE TÉCNICO:**

1. **AVANCE DE LA META ESTABLECIDA:** De acuerdo a las actividades reportadas y las cantidades ejecutadas en el presente periodo se presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 2.85% que equivale a $792.738.173,50 comparado con el programado del 10.33% que equivale a $2.871.039.967,47, por lo cual se observa un atraso de 7.48%

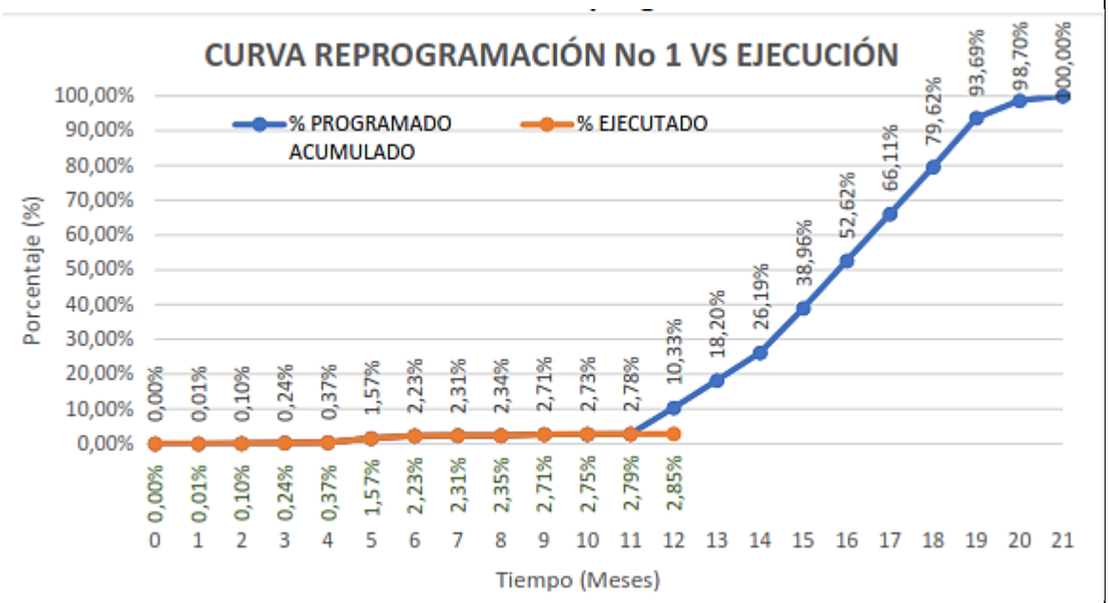


***FUENTE:*** *UT INTER MALAGA*

1. **Actividades desarrolladas en el periodo:**

Según los informes presentados por el contratista de obra e interventoría, se realizaron las siguientes actividades en el periodo de ejecución del 01 al 31 de Mayol de 2024:

1.1 ACTIVIDADES GEOTECNICAS

- Durante el presente periodo se realiza la revisión de los estudios, diseños, planos, cantidades de obra y especificaciones técnicas para la ejecución de los trabajos.
- Se realiza el análisis de los estudios geotécnicos realizados en el área de intervención de proyecto, esto con el fin de verificar las condiciones actuales del terreno

1.2 ACTIVIDADES HIDRAULICAS

- Durante el presente periodo se lleva a cabo la revisión de los estudios y diseños del proyecto.
- Se realiza la verificación de los planos, cantidades de obra y especificaciones técnicas de cada una de las actividades de obra a ejecutar.

1.3 ACTIVIDADES ESTRUCTURALES

- Se realiza la verificación de los estudios, diseños del proyecto, planos, cantidades de obra y especificaciones técnicas de las actividades de obra a ejecutar.

1.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS

- Supervisión de la correcta ejecución de las actividades de obra cumpliendo con las especificaciones técnicas normas de seguridad.
- Se realiza el control de la documentación de interventoría y su archivo.
- Se participa en los comités y reuniones entre contratista, interventoría y CAS.
- Se hace seguimiento de la programación de obra, flujo de inversión, plan de contingencia, plan de gestión ambiental y plan de calidad presentado por el contratista.
- Se hace verificación de las especificaciones técnicas y planos de las actividades ejecutadas.
- Se hace entrega del registro fotográfico de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.
- Se mantiene comunicación permanente con la comunidad.
- Se lleva control de la correspondencia.

1.5 ACTIVIDADES TECNICAS

- Se realiza seguimiento en campo para el reconocimiento de los trabajos y de las cantidades de obra de las actividades ejecutadas.
- Revisión y seguimiento a la programación de obra y flujo de inversión.
- Se hace seguimiento a las actividades ejecutadas.
- Se participa de los comités entre contratista de obra e interventoría.
- Se verifica y brinda acompañamiento en obra las actividades de obra desarrolladas por parte del contratista: Localización y replanteo, Desmonte y descapote, Excavación a tajo abierto en taludes- Excavación con acarreo libre En material granular a cualquier profundidad, Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m.
- Por parte del equipo de profesionales de la interventoría se realiza la revisión de los estudios, diseños, especificaciones técnicas, cantidades y planos entregados por la entidad.

## 2. ÍTEMS EJECUTADOS DURANTE EL PRESENTE PERIODO:

- **Ítem 1.1 Localización y replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topografía):**

Se continúa realizando el control y demarcación topográfica en el área de intervención para la ejecución de las actividades de obra. Se implantan demarcaciones para el control del avance de obra, Se continúa replanteando y señalizando la zona de trabajo de acuerdo al corte propuesto en los diseños.

Para el presente periodo de acuerdo a la programación se tiene programado avanzar 0.00% de la actividad, sin embargo, durante el presente mes se ejecutó un 0.11% llegando a un acumulado de 99.80%; presentando un atraso del 0.2%.

- **Ítem 1.3 Desmonte y descapote:**

Se continua con las labores de desmonte y descapote, acopiando el material en el sitio. Esta actividad se realiza bajo el acompañamiento por parte del área ambiental en los sectores de intervención, con el fin de que se realice de manera adecuada y su acopio no interfiera con las demás actividades.

Para el presente periodo se programó avanzar un 0.18% de la actividad con un acumulado de 99.64%; se ejecutó un 0.11% en el periodo llegando a un acumulado de 99.80%, Presentando un adelanto de 0.16%.

- **Ítem 2.1 Excavación a tajo abierto en taludes - Excavación con acarreo libre - En material granular a cualquier profundidad**

Se continua con la actividad, ejecutando perfilado del talud, de acuerdo a los diseños a fin de preparar la superficie para la realización de perforación para drenes y anclajes, de acuerdo a la zona demarcada previamente, con la verificación y acompañamiento constante de la comisión topográfica. Para el presente

periodo se programó avanzar un 1.06% de la actividad con un porcentaje programado acumulado de 94.87%; se ejecutó un 2.59% en el periodo llegando a un acumulado de 96.82%,

**Ítem 2.3 Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m**

Se ejecuta sobreacarreo de material producto de la actividad de excavación a tajo abierto, a medida que se requiere a fin de disponer adecuadamente el material, en la parte superior del talud para posteriormente poder cargarla y transportarla. Para el presente periodo, se programó un 12.40% para un porcentaje programado acumulado de 34.92%; durante este mes se ejecutó un 0.77% para un total acumulado ejecutado de 28.25%. Se presenta un atraso de 6.67% en esta actividad

3. **RELACIÓN DE LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:** Al presente informe se anexa el informe de interventoría el cual relaciona las cantidades verificadas, avaladas y aprobadas en el cumplimiento de sus obligaciones.

4. **ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** Durante el presente periodo no fue necesario llevar a cabo una actualización del programa de ejecución

5. **ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS**

Para el período comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2024, no se realizaron actas parciales al contratista de obra e interventoría.

**Registro fotográfico:**

**1.1 Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)**





**2.1 Excavación a tajo abierto en taludes - Excavación con acarreo libre - En material granular a cualquier profundidad**









**2.3 Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m**







**GUANENTINA – SAN GIL**
Carrera12 N° 9 – 06 Barrio La Playa
**Tel:** + 57 60(7) 7249729
**Celular:** +57 (311) 2039075
contactenos@cas.gov.co

**SOCORRO**
Calle 16 Nº 12 – 36
**Tel:** +57 60( 7) 7249729 Ext. 2001–2002
**Celular:** +57 (310)6807295
socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**
Carrera 6 Nº 9 - 14 Barrio Aquileo Parra
**Tel:** +57 60(7 ) 7249729 Ext. 3001–3002
**Celular:** +57 (310)8157697
velez@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**
Calle 36 N° 26 - 48 Edificio Sura
Oficina 303 Int. 110
**Tel:** +57 60(7) 7249729 Ext. 4001–4002
**Celular:** +57 (310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

**BARRANCABERMEJA**
Calle 48 con Cra 28 esquina Barrio Palmira
**Tel:** +57 60 (7 ) 7249729 Ext. 5001–5002
**Celular:** +57 (310)8157696
mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**
Carrera 9 Nº 11 – 41 Barrio Centro.
**Tel:** +57 60 (7) 7249729 Ext. 6001–6002
**Celular:** +57 (310)2742600
malaga@cas.gov.co

## 5.CONCLUSIONES OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

### ➢ CONCLUSIONES

- Se ejecuta por parte del contratista, con el la vigilancia y control de la interventoría las siguientes actividades: Localización y replanteo, Desmonte y descapote, Excavación a tajo abierto en taludes-Excavación con acarreo libre-En material granular a cualquier profundidad, Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m.
- Por parte de la interventoría se efectúa la verificación de las cantidades entregadas por el contratista y se determina el porcentaje de ejecución de obra.
- Durante el presente periodo se logró un avance acumulado de 2.85% del valor del contrato lo que equivale a $792.738.173,50, teniendo en cuenta el avance cumulado programado de 10.33% equivalente a $2.871.039.967,47; correspondiente a las actividades: Localización y replanteo, Desmonte y descapote, Excavación a tajo abierto en taludes-Excavación con acarreo libre-En material granular a cualquier profundidad, Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m. con lo cual se presenta un atraso respecto de lo gramado del 7.48%.
- Como se puede evidenciar en el informe general del estado del tiempo, las precipitaciones del presente periodo fueron de 45.0 horas en el mes de mayo de 2024, por lo que no se ocasiono ninguna interrupción significativa a las actividades.
- A la fecha se encuentra en revisión la modificatoria No 01

### ➢ OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- La CAS remite revisión de informe entregado por la interventoría, en el cual realiza la revisión de los estudios, diseños, planos, cantidades de obra y especificaciones técnicas de las obras geotécnicas, hidráulicas y estructurales para la ejecución de los trabajos y así garantizar un mejor control y seguimiento en las actividades a desarrollarse.
- Pendiente respuesta por parte de la interventoría sobre las observaciones enviadas, sobre la viabilidad de la modificación.
- Se realiza seguimiento al trámite de la propuesta de ajuste a los diseños presentada por el contratista y en consecuencia la CAS se encuentra a la espera de la respuesta de la Interventoria.

**ANEXOS**

Se anexa al presente informe lo siguiente:

1. **COMPONENTE TECNICO**
   - Informe de actividades contrato de obra No. 00668-2023 y anexos
   - Informe de actividades contrato de Interventoría No. 00674-2023 y anexos
   - Cantidades de obra ejecutadas N°12.
   - Flujo de inversión mensual 12.
   - Memorias de cantidades N°12.
   - Seguimiento a cantidades y avance N°12.

2. **COMPONENTE FINANCIERO**
   - Extracto bancario correspondiente al mes de Mayo de 2024.
   - Informe financiero mes de Mayo de 2024
   - Rendimientos financieros

3 **COMPONENTE JURIDICO**
4 **REGISTRO FOTROGRAFICO**
5 **FLUJO DE INVERSION**
6 **SEGUIMIENTO CANTIDADES Y AVANCES**

**SUPERVISOR**

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ
Fecha: 2024.06.26 21:50:14 -05'00'

**OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ**
SUPERVISOR

*EL PRESENTE INFORME FUE ELABORADO CON LA INFORMACIÓN ENTREGADA DURANTE EL PROCESO DE EMPALME DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL, TENIENDO EN CUENTA QUE PARA EL PRESENTE PERIODO LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO Y CONTRATOS DERIVADOS FUE EJERCIDA POR ROCIO AYALA MORENO,*

| | Nombre | Firma |
|---|---|---|
| **Proyecto** | WILLIAM JAIME RUEDA RIVERA<br>CONTRATISTAI SPL-CAS | |
| **Proyecto** | LEONEL RINCON GARCIA<br>CONTRATISTAI SPL-CAS | |
