INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°2

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS ENCONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DELCAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LAVEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTAYANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 063 DE 2024

CONTRATISTA:
CONSORCIO INTER RECUPERACIÓN
NIT: 901.899.921-5

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS

PERIODO DE REPORTE
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. RESUMEN DE ESTADO GENERAL DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO 7
3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA. 8
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 10
   4.1. LOCALIZACIÓN. 10
   4.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 11
   4.3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO. 12
   4.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 18
5. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO. 21
   5.1. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 21
   5.2. SEGUIMIENTO A GARANTÍAS DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
6. SEGUIMIENTO FINANCIERO. 23
7. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO. 24
   7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO. 24
   7.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO AL AVANCE EJECUTADO. 36
   7.3. SEGUIMIENTO A LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. 41
   7.4. REPORTE EJECUTIVO MENSUAL CONTRATO DE OBRA. 41
   7.5. Avance físico y financiero. 43
   7.6. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 44
   7.7. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA. 44
   7.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 45
   7.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 46
   7.10. Actas de comité de obra. 46
   7.11. Valla informativa. 46
8. SEGUIMIENTO MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 47
   8.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 48
   8.2. PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 48
   8.3. EQUIPOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 49

8.4. PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA. 49
8.5. Seguimiento a la correspondencia enviada y recibida. 50
8.5.1. Recibida. 50
8.5.2. Enviada. 50
9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 52
10. SEGUIMIENTO PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA. 53
11. PQR DE LA COMUNIDAD. 54
12. CONCLUSIONES DE INTERVENTORÍA. 55
13. RECOMENDACIONES. 57
15. ANEXOS. 58

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Avance físico ejecutado del contrato. 7
Tabla 2. Avance acumulado ejecutado del contrato acumulado. 7
Tabla 3. Información legal Contrato de Obra. 8
Tabla 4. Información contrato interventoría. 9
Tabla 5. Relación de coordenadas del punto inicial y final del tramo Arroyo Aguas Prietas a Intervenir. 11
Tabla 6. Pólizas iniciales contrato de obra. 21
Tabla 7. Pólizas Actualizadas con Acta de Inicio. 21
Tabla 8. Póliza iniciales - Contrato de Interventoría. 22
Tabla 9. Póliza Actualizadas con Acta de Inicio. 22
Tabla 10. Relación de Pagos Contrato de Obra. 23
Tabla 11. Relación de Pagos Contrato de Interventoría. 23
Tabla 12. Resumen Porcentaje ejecutado. 37
Tabla 13. Plazo de ejecución contrato de obra. 41
Tabla 14. Resumen de cumplimiento de productos de actividades de obra. 42
Tabla 15. reporte del estado del tiempo. 45
Tabla 16. relación de actas de comité. 46
Tabla 17. Porcentaje de Avance - Contrato de interventoría. 47
Tabla 18.Avance Físico Interventoría. 47
Tabla 19. Resumen de ejecución de interventoría dentro del periodo. 48
Tabla 20. Relación de personal de interventoría. 48
Tabla 21. equipos utilizados en el periodo. 49
Tabla 22. Presupuesto de interventoría. 50
Tabla 23. Correspondencia recibida por interventoría. 50
Tabla 24. correspondencia enviada por interventoría. 51

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación inicio de tramo a intervenir – Cabecera Municipal del Municipio de Ciénaga de Oro Córdoba. 10
Ilustración 2. Sección típica proyectada del cauce. 18
Ilustración 3. Sección típica proyectada del revestimiento. 19
Ilustración 4. Trazado de proyecto designado para la ejecución. 24
Ilustración 5. diseño de valla informativa. 46

LISTADO DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Tramo a intervenir del K4+000 12
Fotografía 2. Tramo a intervenir del K4+000 13
Fotografía 3. Tramo a intervenir del K5+000 13
Fotografía 4. Tramo a intervenir del K5+000 14
Fotografía 5. Tramo a intervenir del K6+000 14
Fotografía 6. Tramo a intervenir del K6+000 15
Fotografía 7. Tramo a intervenir del K7+000 15
Fotografía 8. Tramo a intervenir del K7+000 16
Fotografía 9. Tramo a intervenir del K8+000 16
Fotografía 10. Tramo a intervenir del K8+000 17
Fotografía 11. Tramo a intervenir del K8+440 17
Fotografía 12. levantamiento topográfico. 25
Fotografía 13. Limpieza y descapote zona a intervenir. 26
Fotografía 14. Verificación y chequeos de control de excavación. 27
Fotografía 15. Verificación y chequeos de control de nivel. 28
Fotografía 16. Verificación y chequeos de control de nivel. 29
Fotografía 17. Excavación a orillas del Caño Aguas prietas – Punta Yánez. 30
Fotografía 18. Optimización de la sección hidráulica. 31
Fotografía 19. Optimización de la sección hidráulica. 32
Fotografía 20. Optimización de la sección hidráulica. 33
Fotografía 21. Nivel del agua alto del caño de Aguas Prietas – Punta Yánez. 34
Fotografía 22. Nivel de agua alto del Caño de Aguas Prietas – Punta Yánez. 34
Fotografía 23. Acercamientos propietarios para la elaboración actas de vecindad. 35

LISTA DE GRÁFICOS.

Gráfico 1. Resumen Ejecutivo - Avance Físico. 36
Gráfico 2. Relación de Porcentaje Ejecutado vs Programado Acumulado. 37
Gráfico 3. Indicadores de seguimiento mes de enero. 38
Gráfico 4. Indicadores de seguimiento mes de enero 39
Gráfico 5. Curva S avance físico. 40
Gráfico 6. Porcentaje de Tiempo Ejecutado vs Pendiente por ejecutar. 41

Gráfico 7. Avance de Obra. 43
Gráfico 8. relación de equipos y maquinaria. 44
Gráfico 9. relación de personal del periodo. 45
Gráfico 10. Porcentaje de Tiempo Ejecutado vs Pendiente por ejecutar. 48

1. INTRODUCCIÓN

El 11 de diciembre de 2024 fue expedida por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge la resolución N° 3-3355 por la cual se adjudicó al proponente **consorcio inter recuperaciones** el concurso de Merito Abierto No. 012-2024, lo cual derivo en el contrato 063 de 2024**;** con el fin, de dar cumplimiento a las obligaciones legales de interventoría y las demás establecidas en el contrato, el cual tiene como objeto: "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"** en el cual se debe efectuar las siguientes obligaciones.

- Cumplir en la realización del objeto del contrato con los requerimientos técnicos metodológicos elaborados por la Corporación.
- El contratista debe conseguir por sus propios medios todos y cada uno de los elementos, materiales e insumos requeridos para adelantar las labores de Interventoría.
- Someterse a las recomendaciones que con referencia a la realización del objeto del contrato le haga el Supervisor designado por la CVS.
- Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad a los pliegos de condiciones. El Contratista debe mantener permanentemente al personal ofrecido en la oferta con la dedicación estipulada en la misma realizando las labores de la Interventoría, la que en ningún caso debe ser inferior al requerimiento de la entidad que se señala en el formulario de cantidades y precios.
- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.
- Cumplir los requisitos de ejecución del contrato y asumir los costos que ello demande.
- Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riegos laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar.
- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la CVS a través del funcionario responsable del control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las

demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

- Avisar oportunamente y por escrito a la CVS de las situaciones previsibles que puedan afectar la ejecución del contrato de Interventoría, así como cualquier novedad o anomalía que se presente durante la ejecución del mismo.

Por lo cual en este segundo mes de ejecución del proyecto correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025, la presente interventoría hace entrega de este informe mensual en el cual se da cumplimiento a los compromisos antes mencionados.

2. RESUMEN DE ESTADO GENERAL DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Preliminares	Localización, trazado y replanteo	m	4440,00	4440,00
Movimientos de Tierra	Optimización Sección Hidráulica	m3	40257.50	40257.50
	Conformación de diques y dentellones	m3	0,00	0,00
	Retiro de material proveniente de excavación	m3	42688.80	42688.80
	Mejoramiento con piedra rajón e=1.0 m	m3	0,00	0,00
	Instalación de geotextil NT2000	m2	0,00	0,00
Realizar Actividades de sensibilización	Talleres de manejo de residuos solidos	taller	0,00	0,00
	Realizar de cuidado de las obras	taller	0,00	0,00

Tabla 1. Avance físico ejecutado del contrato.

DESCRIPCIÓN	BÁSICO	AIU	IVA	TOTAL, MES	ACUMULADO
Localización, trazado y replanteo	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.535.606,00
Optimización Sección Hidráulica	$ 693.354.923,00	$ 208.006.477,00	$ 6.586.872,00	$ 907.948.272,00	$ 907.948.272,00
Conformación de diques y dentellones	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Retiro de material proveniente de excavación	$ 126.614.981,00	$ 37.984.494,00	$ 1.202.842,00	$ 165.802.317,00	$ 165.802.317,00
Mejoramiento con piedra rajón e=1.0 m	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Instalación de geotextil NT2000	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Talleres de manejo de residuos solidos	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Realizar de cuidado de las obras	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 819.969.904,00**	**$ 245.990.971,00**	**$ 7.789.714,00**	**$ 1.073.750.589,00**	**$ 1.092.286.195,00**

Tabla 2. Avance acumulado ejecutado del contrato acumulado.

3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.

CONTRATO No.	060 de 2024
ENTIDAD CONTRATANTE:	LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE –CVS
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	NIT 901895986-5
	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.038.056 de Ciénaga de Oro
OBJETO DEL CONTRATO:	"RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MIL TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($8.031.375.289).
ANTICIPO (40%):	TRES MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS MCTE ($3.212.550.115)
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER RECUPERACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2025

Tabla 3. Información legal Contrato de Obra.

CONTRATO No.	063 de 2024
ENTIDAD CONTRATANTE:	LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE –CVS
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER RECUPERACIÓN
	NIT: 901.899.921-5
	HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA identificado con cédula de ciudadanía No. 10.781.112 de Montería
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($509.422.340)
ANTICIPO (30%):	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS DOS MCTE ($152.826.702)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2025

Tabla 4. Información contrato interventoría.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

4.1. LOCALIZACIÓN.

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Ciénega de Oro.





Ilustración 1. Ubicación inicio de tramo a intervenir – Cabecera Municipal del Municipio de Ciénaga de Oro Córdoba.

Dentro del alcance de proyecto se contempla la intervención de 261.008 m3 para la optimización del Caño Aguas Prietas, localizado en las siguientes coordenadas geográficas:

REGIÓN	MUNICIPIO	COORDENADA INICIO		COORDENADA FINAL		CÓDIGO DIVIPOLA
		N	O	N	O	
		CORREGIMIENTO EL SIGLO VEREDA EL SALADO		CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ VEREDA EL HIGAL		
MEDIO SINÚ	CIENAGA DE ORO	8°56'20.27" 8.9389638	75°36'07.33" -75.602036	8°58'40.09" 8.977803	75°36'08.03" -75.602231	23189016 23189005

Tabla 5. Relación de coordenadas del punto inicial y final del tramo Arroyo Aguas Prietas a Intervenir.

4.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Rehabilitar la conectividad hidrológica del Caño de Aguas Prietas localizado en el municipio de Ciénaga de Oro.

El objeto del proyecto se logrará mediante la optimización del cauce del caño aguas prietas conformando un canal trapezoidal. El caño presenta una sección hidráulica poco definida en la que se presenta un intercambio de flujo con sistemas cenagosos y redes de drenaje pluvial.

De conformidad con lo anterior, dentro de los beneficios o alcance a cumplir, se tiene:

- Aumentar la capacidad hidráulica del cauce.
- Incrementar la cultura Ambiental de las comunidades.
- Aminorar la afectación a la integridad de las personas, viviendas e infraestructura.
- Disminuir los vectores de transmisión de enfermedades.
- Reducir el riesgo de inundaciones.
- Reducir la acumulación localizada de aguas y basuras.
- Rehabilitar la conectividad hidrológica del Caño de Aguas Prietas localizado en los municipios de San Carlos y Ciénaga de Oro.
- Reducir la afectación de cauces por sedimentación.
- Ampliar la oferta en jornadas de sensibilización ambiental informal.

4.3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO.

Realizando el diagnóstico detallado del estado del caño Aguas Prietas, se tiene lo siguiente:

- El cauce no tiene capacidad hidráulica para transportar el caudal de diseño (Tr: 100 años).
- El fondo del cauce es irregular y presenta tramos en contrapendiente que disminuyen la capacidad hidráulica y el flujo del agua de forma continua.
- Existe acumulación de residuos sólidos que reducen la capacidad hidráulica del caño.
- La pendiente del fondo actual está limitada por la topografía de la zona, caracterizada por ser una planicie con zonas inundables y cuerpos cenagosos.
- El tramo está limitado por el comportamiento aguas abajo, debido a que hay secciones del cauce con secciones irregulares donde se generan remansos.
- Se evidencian procesos de sedimentación aguas abajo del tramo de estudio.
- El caño aguas abajo del tramo de estudio, no presenta sección hidráulica definida.
- Conforme la modelación hidráulica realizada al tramo del caño a intervenir (periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años), se evidencia que el nivel de las aguas en cada una de las secciones estudiadas, supera los bordes del cauce actualmente, lo que permite inferir que el tramo no cuenta con capacidad hidráulica suficiente para transportar el caudal de diseño.



Fotografía 1. Tramo a intervenir del K4+000



Fotografía 2. Tramo a intervenir del K4+000



Fotografía 3. Tramo a intervenir del K5+000



Fotografía 4. Tramo a intervenir del K5+000



Fotografía 5. Tramo a intervenir del K6+000



Fotografía 6. Tramo a intervenir del K6+000



Fotografía 7. Tramo a intervenir del K7+000



Fotografía 8. Tramo a intervenir del K7+000



Fotografía 9. Tramo a intervenir del K8+000



Fotografía 10. Tramo a intervenir del K8+000



Fotografía 11. Tramo a intervenir del K8+440

4.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para lograr los beneficios planteados se realiza la formulación de actividades como la limpieza del cauce del Caño Aguas Prietas a través de actividades de movimientos de tierra y talleres de sensibilización en las comunidades aledañas al caño a intervenir.

- Localización, trazado y replanteo
- Optimización de sección hidráulica de canales en tierra
- Conformación de diques y dentellones a máquina con material seleccionado de la excavación
- Retiro de material proveniente de la excavación
- Mejoramiento con piedra rajón. e = 1.0m.
- Talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos
- Talleres de sensibilización en el cuidado de las obras

Entre las abscisas K4+000 y K8+440, se propone una sección trapezoidal de:

- ancho de base 31,0 m
- alto de 4,5 m
- internos de 1.5:1 (H:V)
- externos 1:1 (H:V).

La sección hidráulica de diseño, tendría las siguientes dimensiones:



Ilustración 2. Sección típica proyectada del cauce.

Entre las abscisas K4+620 y K4+680, K4+940 y K5+030 y K6+980 y K7+050, se propone realizar un revestimiento en piedra tipo RIP RAP, con el fin de controlar los procesos erosivos generados por las descargas de otros cauces. Dicho revestimiento tendría la siguiente sección:

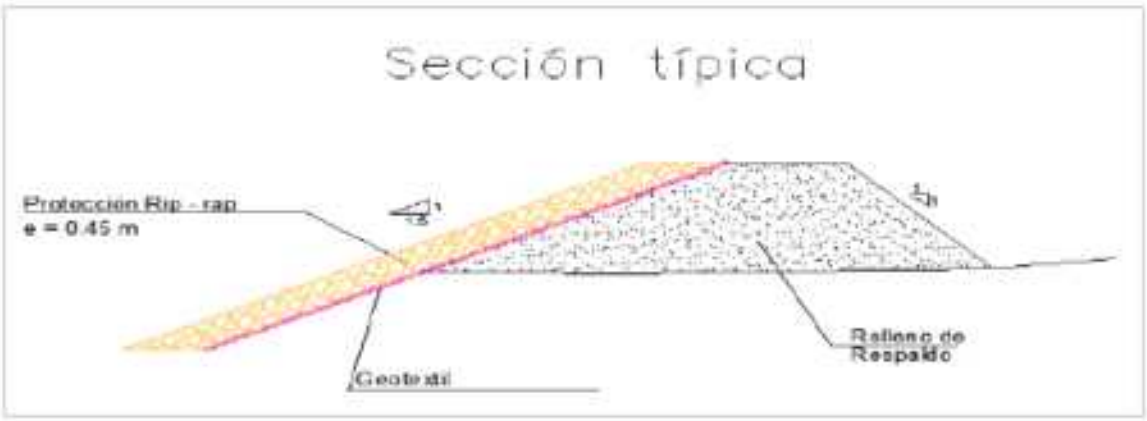


Ilustración 3. Sección típica proyectada del revestimiento.

Durante este periodo, el contratista ha informado que el tramo de 4.4 km que se va a intervenir presenta una densa vegetación, con un gran número de árboles. Según las condiciones de diseño iniciales del proyecto, sería necesario talar árboles; sin embargo, el objetivo principal del proyecto es la recuperación del ecosistema, con un enfoque en la conectividad hidrológica, lo que implica restaurar y mejorar la calidad ecológica del ecosistema fluvial.

La densa vegetación arbórea puede representar un reto para el diseño hidráulico original, ya que las raíces, troncos y hojas de los árboles pueden interferir con la sección hidráulica del canal, disminuyendo el caudal disponible y causando obstrucciones en el flujo natural del agua. No obstante, la tala de estos árboles no es la única alternativa, ya que hay opciones que permiten conservar la vegetación sin afectar los objetivos del proyecto.

El rediseño propuesto y expuesto por el contratista se centra en adaptar la sección hidráulica del canal para mantener la conectividad hidrológica sin necesidad de eliminar la vegetación existente. Algunas de las alternativas incluyen:

- Minimizar el impacto hidráulico de la vegetación mediante técnicas de manejo que eviten obstrucciones en el flujo de agua, como la poda selectiva de ramas que interfieren con el caudal, sin dañar la estructura de los árboles.
- Rehabilitar y reconfigurar el cauce para permitir un flujo adecuado sin intervenciones destructivas, lo que podría incluir la creación de canales laterales o ajustes en la pendiente para asegurar un flujo eficiente sin perjudicar los árboles.

BENEFICIOS AMBIENTALES DE EVITAR LA TALA DE ARBOLES:

- **Preservación del ecosistema:** los árboles son hábitats cruciales para la fauna local, estabilizan el suelo y son importantes para la filtración del agua y la mejora de la calidad del aire. Mantener la vegetación es vital para no alterar el equilibrio ecológico.
- **Conservación de la biodiversidad:** La vegetación arbórea es esencial para la fauna local, por lo que evitar la tala de árboles contribuye a mantener la biodiversidad y a ofrecer refugio a diversas especies.
- **Minimización del impacto ambiental:** El rediseño permitirá reducir el impacto ecológico del proyecto, alineándose con los principios de sostenibilidad y recuperación del ecosistema de manera más respetuosa con el medio ambiente.

REDISEÑO DE LA SECCION HIDRAULICA CON ENFOQUE EN LA CONSERVACION:

- **Optimización del flujo de agua sin tala:** A traves de la remodelación del canal y la modificación de su sección hidráulica, se puede garantizar que el agua fluya adecuadamente sin que la vegetación interfiera. Se puede utilizar técnicas de modelado hidráulico para determinar la sección optima del canal, ajustando para metros como la pendiente, el ancho y la profundidad esto sin necesidad de tala árboles.
- **Manejo sostenible de la vegetación:** Implementar un manejo adecuado de los árboles y la vegetación circundante mediante poda selectiva, control de especies invasoras y prácticas de manejo sostenible. Esto asegura un flujo hidráulico eficiente sin realizar alteraciones destructivas en el paisaje.

Para garantizar que el rediseño del canal funcione de manera eficiente, es necesario realizar un análisis detallado de la hidrodinámica local, considerando el comportamiento del caudal, la topografía del terreno y la interacción de la vegetación con el flujo de agua, porque se tiene que tener en cuenta la simulación hidráulica, verificar que el nuevo diseño mantenga la conectividad hidrológica y ajustar el diseño que este permita el paso del agua de manera fluida, optimizando el flujo sin requerir la tal de vegetación significativa.

Con este rediseño se permitirá cumplir con los objetivos del proyecto de una forma ecológicamente sostenible, manteniendo la vegetación y promoviendo una mejor gestión del agua.

5. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.

A continuación, se relacionan las Garantías y/o Pólizas de Contrato del contrato de obra e interventoría Aprobadas por la CVS.

5.1. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO - INICIALES CON CONTRATO DE OBRA			
SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZA No.**	**11-44-101244053**	
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	10/12/2024	10/04/2026	1.606.275.057,80
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	10/12/2024	10/04/2026	3.212.550.115,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	10/10/2025	10/10/2027	1.606.275.057,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10/12/2024	10/10/2028	803.137.528,90
PÓLIZA DE RCE - INICIALES CON CONTRATO DE OBRA			
SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZA No.**	**11-40-101072071**	
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10/12/2024	10/10/2025	650.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10/12/2024	10/10/2025	650.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/12/2024	10/10/2025	650.000.000,00

Tabla 6. Pólizas iniciales contrato de obra.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA			
SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZA No.**	**11-44-101244053**	
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	30/12/2024	30/04/2026	$1.606.275.057,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/12/2024	30/10/2028	$803.137.528,90
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	30/12/2024	30/04/2026	$3.212.550.115,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$1.606275.057,80
PÓLIZA DE RCE - ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA			
SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZA No.**	**11-40-101072071**	
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	30/12/2024	30/10/2025	$650.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	30/12/2024	30/10/2025	$650.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30/12/2024	30/10/2025	$650.000.000,00

Tabla 7. Pólizas Actualizadas con Acta de Inicio.

5.2. SEGUIMIENTO A GARANTÍAS DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO - INICIALES CON CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	**POLIZA No.**	**CBC-100062819**	
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	23/12/2024	23/04/2026	50.942.234,00
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	23/12/2024	23/04/2026	152.826.702,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/12/2024	23/10/2028	50.942.234,00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/10/2025	23/10/2027	101.884.468,00

Tabla 8. Póliza iniciales - Contrato de Interventoría.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO - ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	**POLIZA No.**	**CBC-100062819**	
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	30/12/2024	30/04/2026	50.942.234,00
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	30/12/2024	30/04/2026	152.826.702,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/12/2024	30/10/2028	50.942.234,00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/10/2025	30/10/2027	101.884.468,00

Tabla 9. Póliza Actualizadas con Acta de Inicio.

6. SEGUIMIENTO FINANCIERO.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	PAGADO/TRAMITE	ESTADO	SALDO PENDIENTE POR PAGAR
Anticipo	$ 8.031.375.289	$ 3.212.550.115	PAGADO	$ 4.818.825.178
ACTA No. 1		NO SE HA TRAMITADO ACTAS DE COBRO		
TOTAL	$ 8.031.375.289	$ 3.212.550.115		$ 4.818.825.178

Tabla 10. Relación de Pagos Contrato de Obra.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	PAGADO/TRAMITE	ESTADO	SALDO PENDIENTE POR PAGAR
Anticipo	$ 509.422.340,00	$ 152.826.702	Se renuncio al anticipo	$ 509.422.340,00
ACTA N°1		NO SE HA TRAMITADO ACTAS DE COBRO		
TOTAL	$ 509.422.340,00			$ 509.422.340,00

Tabla 11. Relación de Pagos Contrato de Interventoría.

- Dentro del presente periodo el contratista se le hizo efectivo el anticipo por un valor de *Tres mil doscientos doce millones quinientos cincuenta mil ciento quince pesos mcte ($3.212.550.115).*
- La presente interventoría renuncia al anticipo del 30% y realizara los cobros por medio de cuentas parciales. A la fecha no se ha tramitado cuenta de cobro.

7. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO.

7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO.

La presente interventoría en cumplimiento de sus obligaciones hace revisión de los documentos técnicos suministrados por la entidad contratante y realiza el seguimiento a contrato de obra 060 de 2024.

A continuación, se indica el tramo a intervenir.



Ilustración 4. Trazado de proyecto designado para la ejecución.

Durante el segundo periodo de ejecución, se realizaron actividades preliminares de localización, trazado y replanteo, se iniciaron actividades de movimientos de tierra, así mismo se continua dentro con el acompañamiento social a cada uno de los predios colindantes del proyecto para el debido levantamiento de actas de vecindad y exposición de las actividades a ejecutar para su debido conocimiento y aceptación de las mismas.

Durante el periodo se presentaron lluvias fuertes en la zona, esta se presentó de manera frecuente aumentando así los niveles del cauce.

- **Actividades de Localización, trazado y replanteo:** Durante el periodo de reporte del presente informe el contratista adelanto labores de levantamiento topográfico del terreno natural del tramo a intervenir con la finalidad de realizar una verificación de las condiciones actuales que se presentan en campo y compararlas con las condiciones dispuestas en los diseños iniciales,

dado que debido al paso del tiempo las condiciones del terreno natural pueden variar significativamente debido a procesos tales como la temporada de lluvia y el proceso de sedimentación del cauce.

Desde esta interventoría realizamos seguimiento a estas actividades verificando que las mismas se realizaran de manera adecuada y los quipos utilizados sean los idóneos para la ejecución de estas, por parte de la interventoría también realizaremos el debido levantamiento con nuestro equipo de trabajo en pro de verificar las cantidades, los niveles y los parámetros dispuestos en los diseños suministrados por la entidad contratante, además de hacer a debida revisión de los datos recolectados por el contratista por medio de esta actividad.



Fotografía 12. levantamiento topográfico.

- **Actividades de Movimientos de tierra Optimización de la sección hidráulica:** esta se refiere al proceso de diseñar y ajustar la forma y dimensiones del canal para mejorar su capacidad de transporte de agua, minimizar la erosión y maximizar la eficiencia hidráulica. La topografía juega un papel importante en la optimización de la sección hidráulica, se puede verificar las pendientes de fondo, cotas de fondo, dimensiones, condiciones del terreno y flujo del agua.



Fotografía 13. Limpieza y descapote zona a intervenir.



Fotografía 14. Verificación y chequeos de control de excavación.



Fotografía 15. Verificación y chequeos de control de nivel.



Fotografía 16. Verificación y chequeos de control de nivel.

La interventoría en su seguimiento diario que realiza en campo superviso y verifico que:

- Se evaluarán las pendientes del terreno para asegurar que el canal tenga inclinación adecuado para el flujo de agua.
- Se midieran las dimensiones del canal existente y se compararan con las dimensiones optimas calculadas durante el diseño.
- Se verifico se puedan realizar mediciones para observar el comportamiento del agua en el canal y ajustar el diseño según sea necesario.

- Durante el periodo el contratista inicio actividades de excavación de material para la optimización de la sección hidráulica del canal.



Fotografía 17. Excavación a orillas del Caño Aguas prietas – Punta Yánez.



Fotografía 18. Optimización de la sección hidráulica.



Fotografía 19. Optimización de la sección hidráulica.



Fotografía 20. Optimización de la sección hidráulica.

La interventoría en su seguimiento diario supervisó y verifico que:

- Verifico que las condiciones de trabajabilidad tanto de maquinarias como de equipos fueran las idóneas, como los certificados de calibración del nivel de precisión, los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a la maquinaria y el correcto funcionamiento de estos y así garantizar el desarrollo de la actividad.
- Se verificaron los procedimientos de seguridad durante el proceso de excavación incluyendo la identificación de posibles peligros.
- Se verifico que el personal de trabajo contara con el uso de equipo de protección personal y la implementación de medidas de seguridad en el lugar de trabajo.

En el periodo se vieron suspendidas las actividades por motivo de lluvias presentadas mencionadas anteriormente.



Fotografía 21. Nivel del agua alto del caño de Aguas Prietas – Punta Yánez.



Fotografía 22. Nivel de agua alto del Caño de Aguas Prietas – Punta Yánez.

- **Componente Social:** Entre el periodo de 01 y el 28 de febrero de 2025 el componente social del Consorcio Punta Yánez CVS, llevo a cabo diversas actividades para cumplir con el PGIO. Se realizo un encuentro comunitario con la veeduría ciudadana en la vereda el Higal, en el marco del contrato de obra N°060-2024. Donde el objetivo del encuentro fue guiar a los participantes en la elaboración de su reglamento interno abordando aspectos como: función principal, funciones de la veeduría, estructura organizativa, frecuencia de las reuniones, las normas de ética y conducta y las prohibiciones de la veeduría ciudadana entre otros.
  Este acercamiento se realizó con el fin de identificar el estado de las cerca de cada propietario que esta frente al caño Aguas Prietas, se realizó un recorrido en conjunto para observar las condiciones y caracteristicas de las cercas antes de abordar los trabajos de obra.



Fotografía 23. Acercamientos propietarios para la elaboración actas de vecindad.

7.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO AL AVANCE EJECUTADO.

Para el periodo No.2 comprendido entre el 01 y el 28 de FEBRERO de 2025 el contratista de interventoría **CONSORCIO INTER RECUPERACIONES** presenta el **informe técnico de interventoría N°2** en el cual realiza hace seguimiento y control al contrato de obra No. 060 de 2024 que tiene como objeto **RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA,** cuenta con un plazo de ejecución de 10 meses y una valor total de OCHO MIL TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($8.031.375.289).

Durante el presente periodo el contratista de obra **CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS** deja un avance físico del mes correspondiente al 13.37% ejecutado, alcanzando así un acumulado a la fecha de 13,60%, frente al avance físico programado de 13.60%. con un cumplimiento al flujo de caja e inversión enviado por el contratista de obra.

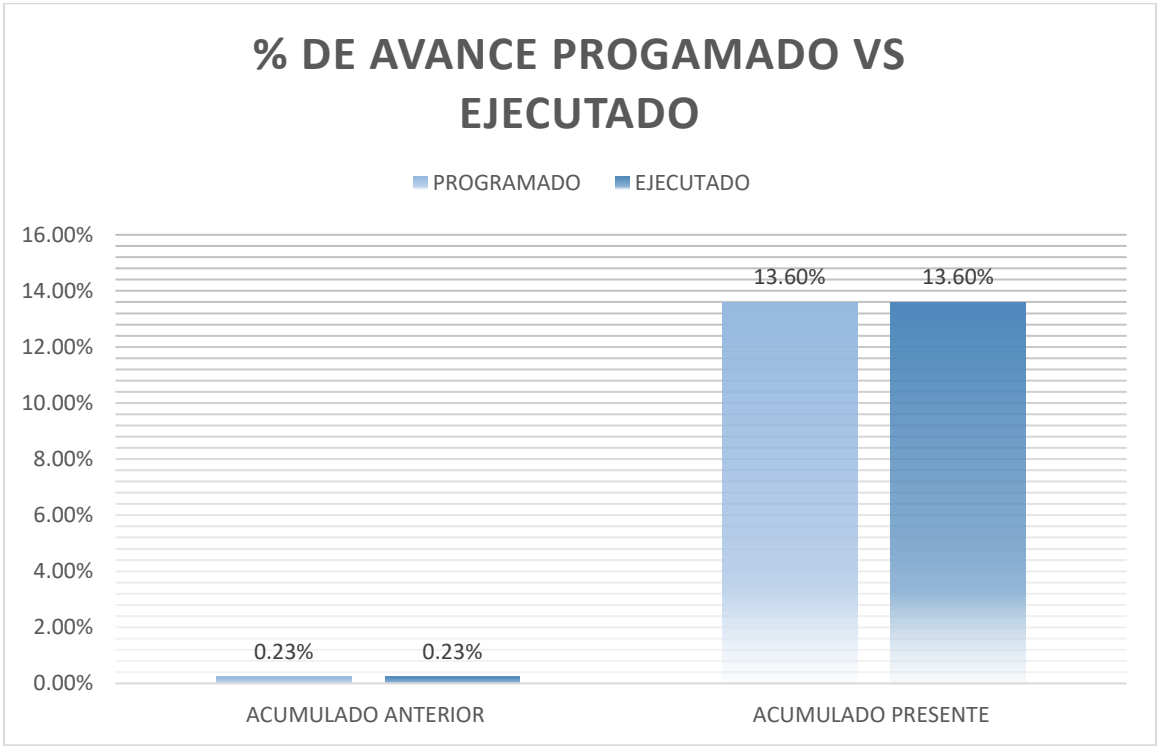


Gráfico 1. Resumen Ejecutivo - Avance Físico.

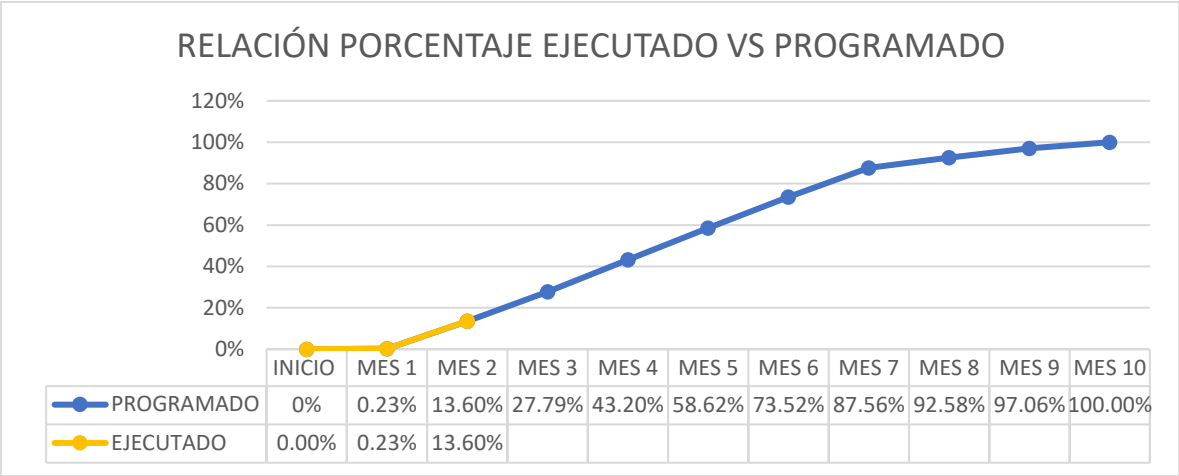


Gráfico 2. Relación de Porcentaje Ejecutado vs Programado Acumulado.

Durante el presente periodo correspondiente entre el 01 al 28 de febrero de 2025, el contratista de obra presentó un avance total acumulado del 13.60%, equivalente a un valor de $ 1.092.286.195,00.

DESCRIPCIÓN	EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO TOTAL
Porcentaje ejecutado	0,23%	13.37%	13.60%
Valor ejecutado	$ 18.535.606,00	$ 1.073.750.589,00	$ 1.092.286.195,00

Tabla 12. Resumen Porcentaje ejecutado.

De conformidad con lo expuesto anteriormente el contratista se encuentra al día con el avance programado dentro del cronograma del proyecto, se espera en los siguientes periodos que el contratista tenga avances ejecutados cercano a los programados de 27.79%, esto si se continúan con los rendimientos que se tienen durante este periodo.

La presente interventoría realiza su labor de seguimiento y verifica el cumplimiento de las actividades programadas y su correcta ejecución de conformidad a las especificaciones establecida en el anexo técnico del proyecto.

A continuación, se muestran los Indicadores de Seguimiento en lo que se evidencia el avance superior presentado a la fecha:

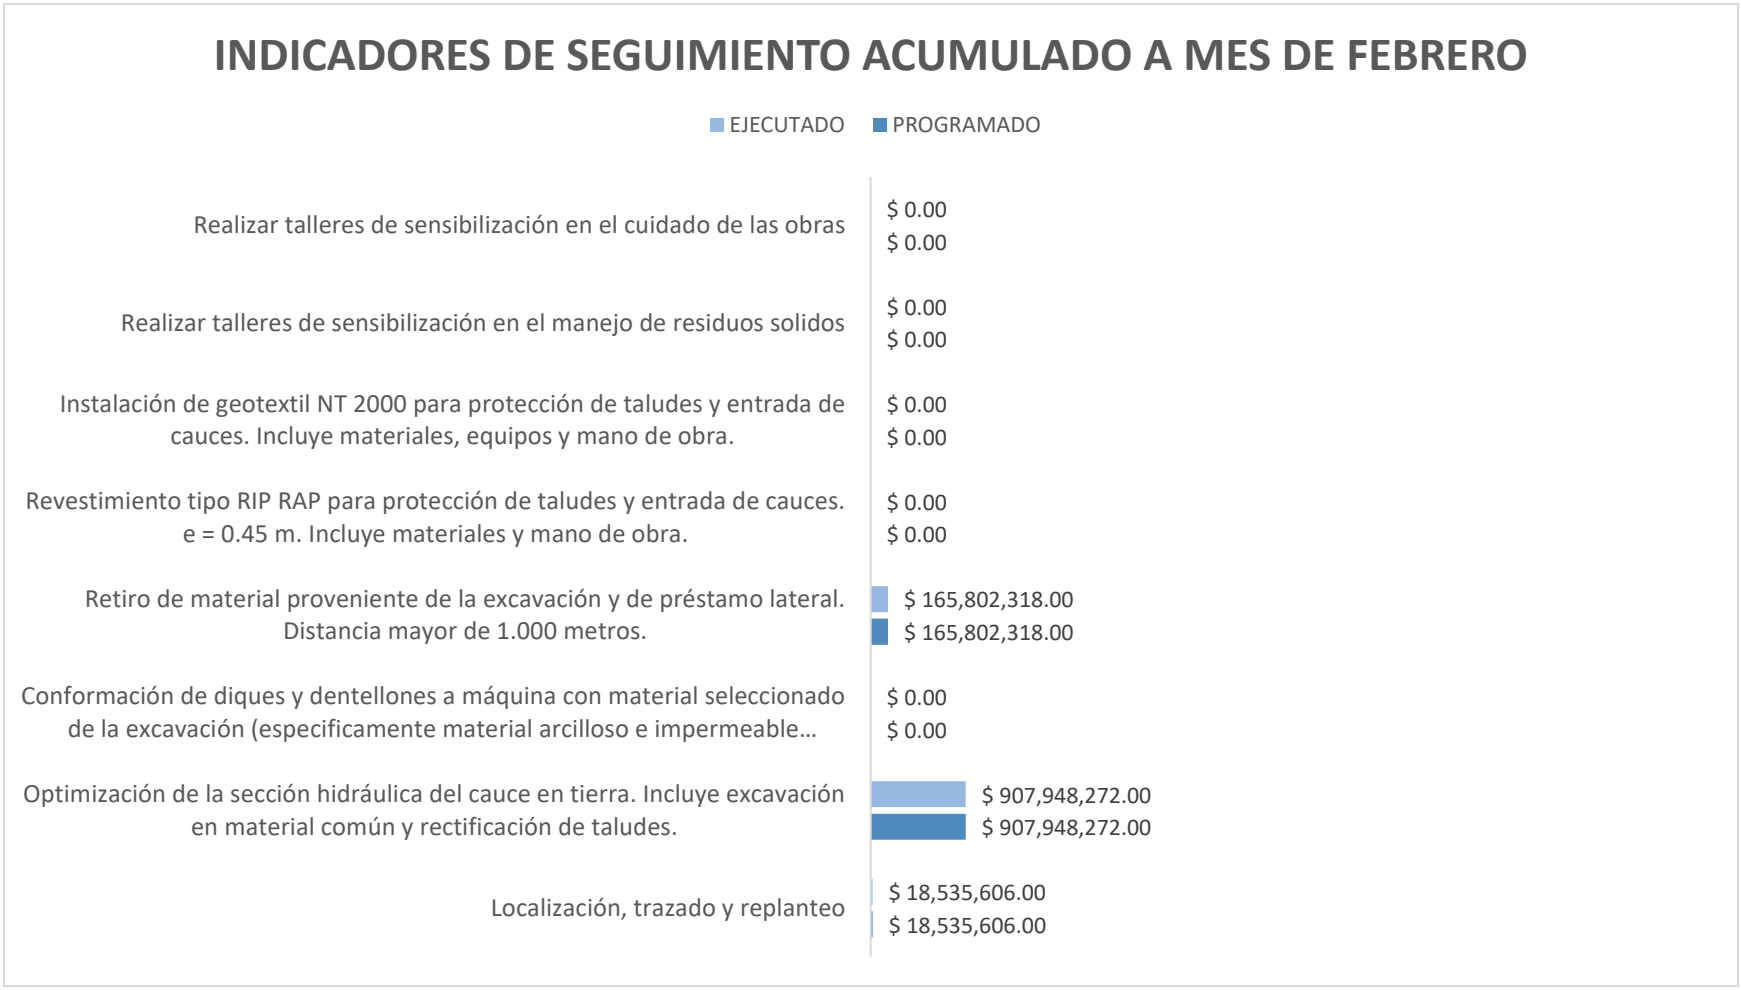


Gráfico 3. Indicadores de seguimiento mes de febrero.

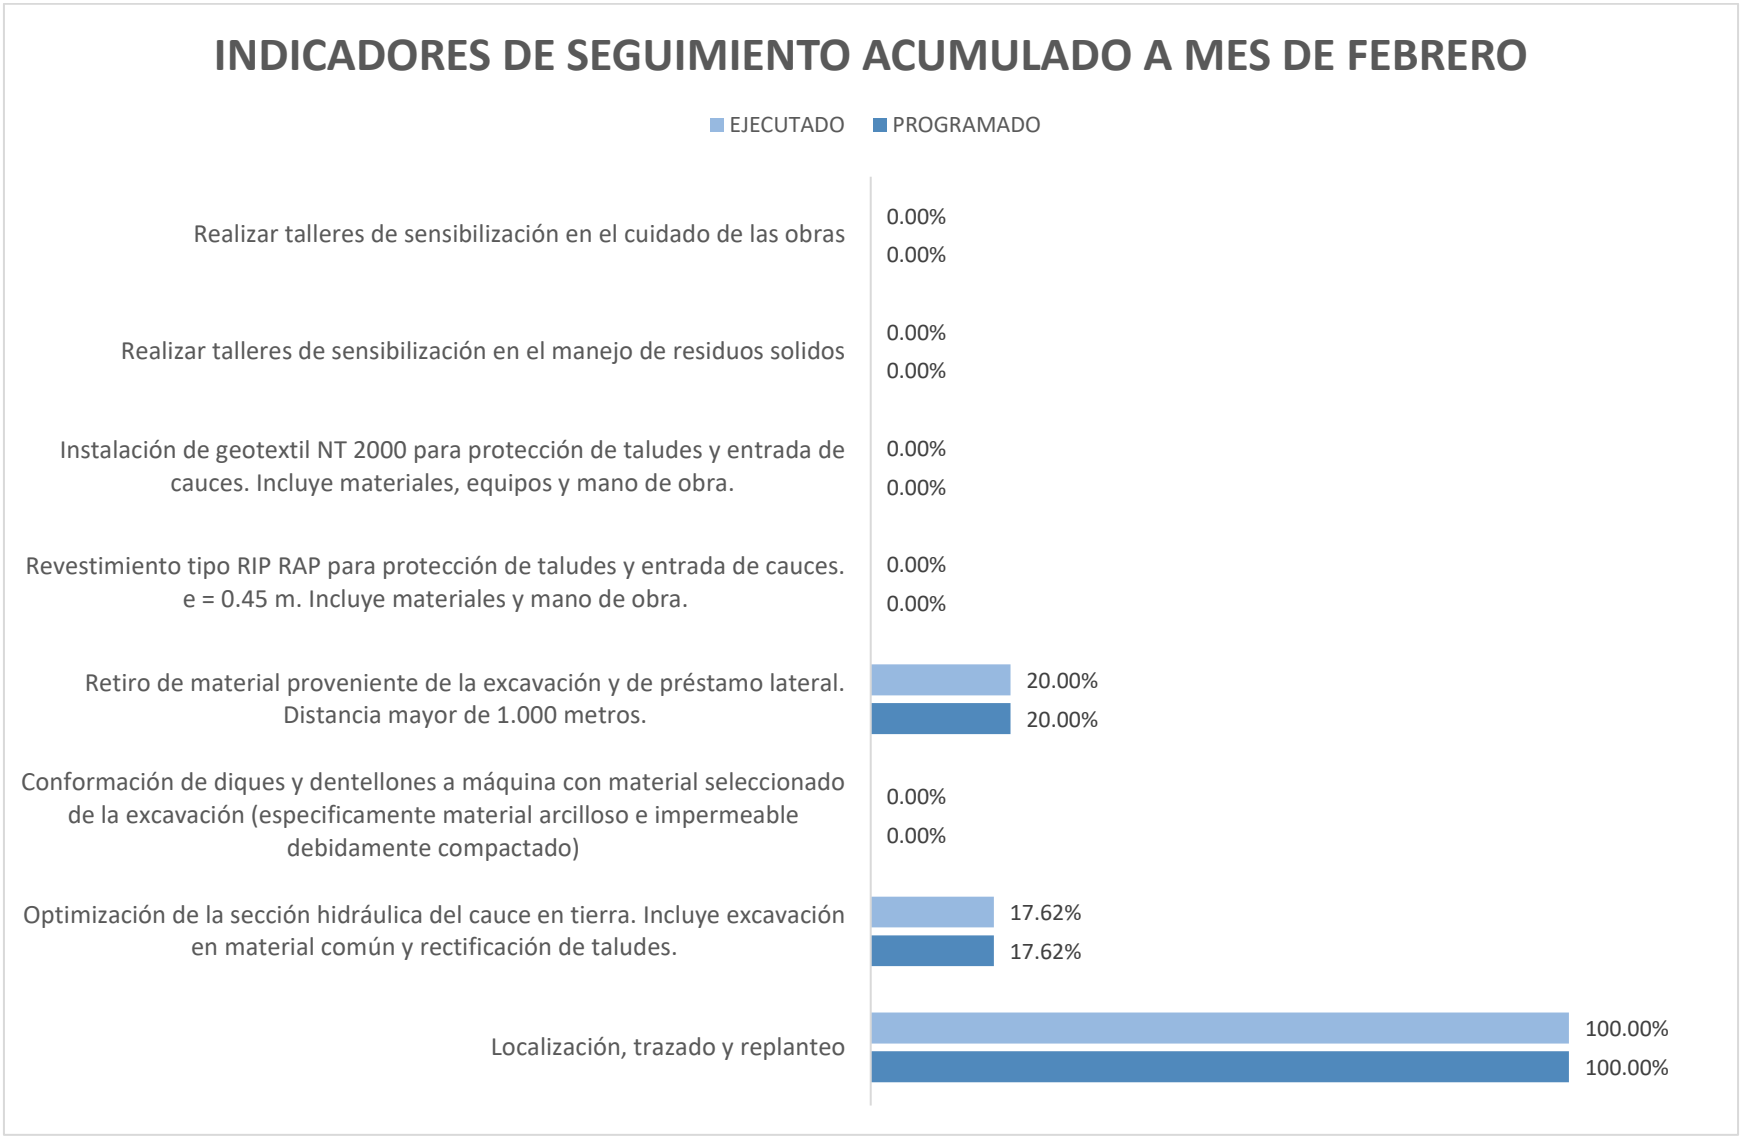


Gráfico 4. Indicadores de seguimiento mes de febrero

Cabe destacar que los avances que se presentan en los Indicadores gráficos de seguimiento de las actividades de ejecución corresponden a la medición en campo realizada mediante equipo topográfico de verificación de carteras y cotas finales propio de la presente interventoría.

El proyecto a la fecha de corte del presente informe presenta un porcentaje de avance ejecutado acumulado del 13.60%

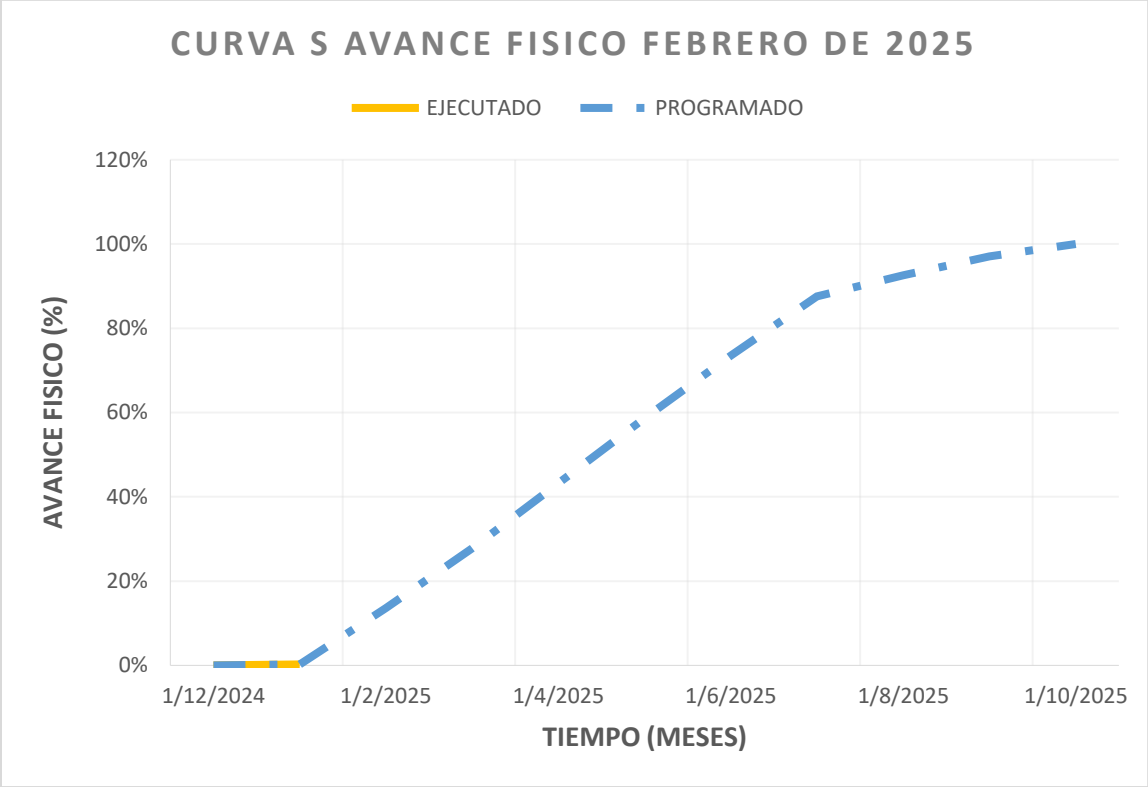


Gráfico 5. Curva S avance físico.

7.3. SEGUIMIENTO A LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.

De conformidad con el cronograma de actividades y el flujo de inversión del proyecto presentados por el contratista dispuestos a un periodo de 10 meses se elabora el siguiente diagrama del tiempo que se lleva ejecutado del proyecto versus el tiempo restante del mismos según los tiempos contractuales.

FECHA DE INICIO	TIEMPO TRANSCURRIDO	FECHA DE CORTE PERIODO
30 DE DICIEMBRE DE 2024	DOS (02) MES DE DIEZ (10) MESES	28 DE FEBRERO DE 2025

Tabla 13. Plazo de ejecución contrato de obra.

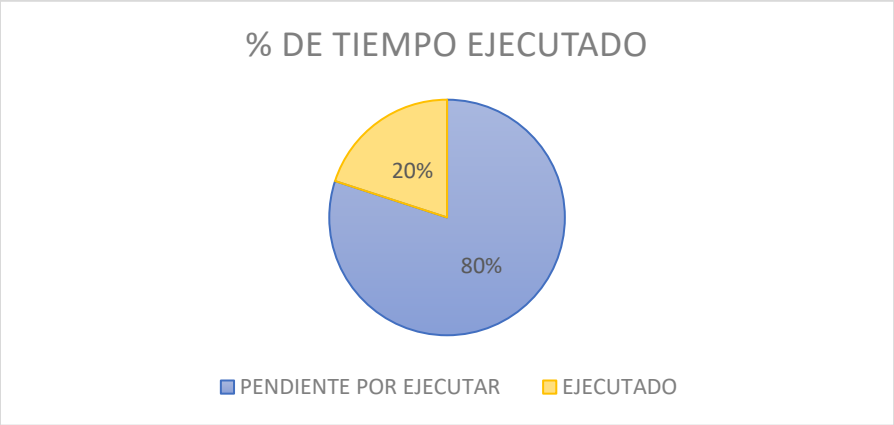


Gráfico 6. Porcentaje de Tiempo Ejecutado vs Pendiente por ejecutar.

7.4. REPORTE EJECUTIVO MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

Dentro del análisis del proyecto, la presente interventoría adicionalmente realiza a detalle una evaluación del cumplimiento de los productos establecidos en la MGA del proyecto, a modo de verificar el cumplimiento de las metas establecidas dentro de esta.

Por tanto, se presenta a continuación la relación de cumplimiento de los productos del contrato de obra:

Objetivo específico (1)	PRODUCTOS				ACTIVIDADES				Valor de la distribución de los recursos de la vigencia actual que se debe ingresar al SUIFP de acuerdo a las actividades	ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL INDICADOR DE GESTIÓN	AVANCE ACUMULADO A 31/01/2025	
	Producto	Indicador de Producto	META INDICADOR DE PRODUCTO	Unidad de Medida	Actividad	Indicador de Gestión	Unidad de medida Ind. Gestión	META INDICADOR DE GESTIÓN 2024	2024		AVANCE EN META INDICADOR DE GESTIÓN	VALOR
Aumentar la capacidad hidráulica del cauce	Servicio de dragado (Producto principal del proyecto)	Volumen de dragado	228.449	M3	Realizar obras preliminares	Obras preliminares realizadas	Número	1	$ 18.541.420,00	Localización, trazado y replanteo	1,00	18.535.606,00
					Realizar movimientos de tierra	Movimiento de tierras	M3	228.449	$ 7.982.750.658,00	Optimización de sección hidráulica de canales en tierra, incluye excavación material común y rectificación de taludes Conformación de diques y dentellones a máquina con material seleccionado de la excavación (específicamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado) Retiro de material proveniente de la excavación de los canales y de préstamo lateral. Distancia mayor de 1.000 metros. Mejoramiento con piedra rajón. e = 1.0m. Instalación de geotextil NT2000 incluye materiales, equipos y mano de obra	40257,50	$ 1.073.750.588,30
									$ 8.001.292.078,00			**$ 1.092.286.194,30**
Objetivo específico (2)												
Desarrollar una estrategia de educación ambiental informal en las comunidades	Servicio de educación informal en el marco de la reducción y mitigación del riesgo de desastres	Número de personas	100	Número	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	Talleres realizados	Número	10	$ 25.201.748,00	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	0	$ 0,00
				Número	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	Talleres realizados	Número	2	$ 5.040.350,00	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	0	$ 0,00
									$ 30.242.098,00			**$ 0,00**
TOTAL PROYECTO									**$ 8.031.534.176,00**			**$ 1.092.286.194,30**

Objetivo específico	PRODUCTOS				ACTIVIDADES				Valor de la distribución de los recursos de la vigencia actual que se debe ingresar al SUIFP de acuerdo a las actividades	ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL INDICADOR DE GESTIÓN	AVANCE ACUMULADO A 31/01/2025	
	Producto	Indicador de Producto	META INDICADOR DE PRODUCTO	Unidad de Medida	Actividad	Indicador de Gestión	Unidad de medida Ind. Gestión	META INDICADOR DE GESTIÓN 2024	2024		AVANCE EN META INDICADOR DE GESTIÓN	VALOR
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO	Meses	10	Meses	Realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental del proyecto.	Meses transcurridos	Meses	10	$ 509.422.340,00	Realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental del proyecto.	2	$ 101.884.468,00

Tabla 14. Resumen de cumplimiento de productos de actividades de obra.

7.5. Avance físico y financiero.

Para más detalles se presenta a continuación corte de avance durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025 y avance acumulado:

"RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"						AVANCE DE OBRA			ACUMULADO		
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS						AVANCE MES 2					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	%	CANT	VR. PARCIAL	%
1	**Preliminares**						**$ 14.154.720,00**			**$ 14.154.720,00**	
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	4.440,0	$ 3.188,0	$ 14.154.720,0	0,00	$ 0,00	0,00%	4440,00	**$ 14.154.720,00**	100%
2	**Movimientos de Tierra**						**$ 0,00**			**$ 0,00**	
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	m3	228.449,0	$ 17.223,0	$ 3.934.577.127,0	40257,50	$ 693.354.923,00	17,62%	40257,50	$ 693.354.923,00	17,62%
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material seleccionado de la excavación (específicamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado)	m3	15.005,0	$ 33.446,0	$ 501.857.230,0	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral. Distancia mayor de 1.000 metros.	m3	213.444,0	$ 2.966,0	$ 633.074.904,0	42688,80	$ 126.614.981,00	20,00%	42688,80	$ 126.614.981,00	20,00%
2.4	Revestimiento tipo RIP RAP para protección de taludes y entrada de cauces. e = 0.45 m. Incluye materiales y mano de obra.	m3	4.509,0	$ 174.286,0	$ 785.855.574,0	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.5	Instalación de geotextil NT2000 para protección de taludes y entra dade cauces. Incluye materiales, equipos y mano de obra.	m2	10.119,0	$ 23.781,0	$ 240.639.939,0	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
				COSTO DIRECTO OBRAS	**$ 6.110.159.494,0**		**$ 819.969.904,00**	13,42%		**$ 834.124.624,00**	13,65%
				ADMINISTRACION 23,0%	$ 1.405.336.684,0		$ 188.593.078,00	13,42%		$ 191.848.664,00	13,65%
				UTILIDAD 5,0%	$ 305.507.975,0		$ 40.998.495,00	13,42%		$ 41.706.231,00	13,65%
				IMPREVISTO 2,0%	$ 122.203.189,0		$ 16.399.398,00	13,42%		$ 16.682.492,00	13,65%
				COSTOS INDIRECTOS 30,0%	**$ 1.833.047.848,0**		**$ 245.990.971,00**	13,42%		**$ 250.237.387,00**	13,65%
				IVA SOBRE UTILIDAD 19,0%	**$ 58.046.515,0**		$ 7.789.714,00	13,42%		$ 7.924.184,00	13,65%
				COSTO TOTAL OBRAS	**$ 8.001.253.857,0**		**$ 1.073.750.589,00**	13,42%		**$ 1.092.286.195,00**	13,65%
3	**Realizar actividades de sensibilización**										
3.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	TALLER	10,0	$ 2.109.344,0	$ 21.093.440,0	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	**$ 0,00**	0%
3.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	TALLER	2,0	$ 2.109.344,0	$ 4.218.688,0	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	**$ 0,00**	0%
					$ 25.312.128,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0%
				IVA (19%)	**$ 4.809.304,0**		**$ 0,00**	0,00%		**$ 0,00**	0%
				COSTO TOTAL ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	**$ 30.121.432,0**		**$ 0,00**	0,00%		**$ 0,00**	0%
				COSTO TOTAL (OBRAS + SENSIBILIZACION)	**$ 8.031.375.289,0**		**$ 1.073.750.589,00**	13,37%		**$ 1.092.286.195,00**	13,6%

Gráfico 7. Avance de Obra.

7.6. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

EQUIPO Y MAQUINARIA	CANTIDAD
Estación Total	1
Nivel Automático	2
Equipo GPS	1
RTK	1
GPS	1

Gráfico 8. relación de equipos y maquinaria.

7.7. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

A continuación, se relaciona el personal del CONSORCIO PUNTA YANEZ:

NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	DEDICACIÓN
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	30.685.544	DIRECTOR DE OBRA	01/02/2025	50%
JOSE FAWCETT HERNÁNDEZ MIER	1042424437	RESIDENTE DE OBRA 1	30/12/2024	100%
LIBARDO JOSE FRANCO CAUSIL	2.754.272	RESIDENTE DE OBRA 2	01/02/2025	100%
NIKOLLE TATIANA FETECUA GUTIÉRREZ	1075652455	PROFESIONAL SOCIAL	30/12/2024	100%
MÓNICA ORTEGA MORENO	52547455	ESPECIALISTA AMBIENTAL	30/12/2024	100%
GERMAN MONSALVE SÁENZ	10221652	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	30/12/2024	100%
LUIS FERNANDO GUERRERO ALARCÓN	80539487	ESPECIALISTA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	30/12/2024	100%
CLEIDER BERASTEGUI BARRANCO	1067940558	INGENIERO AUXILIAR 1	30/12/2024	100%
OSCAR CORONADO	78366613	OFICIOS VARIOS	30/12/2024	100%
SANTIAGO LOPEZ BALLESTEROS	1062424908	OFICIOS VARIOS	30/12/2024	100%
GLINDON JOSE PEREZ YANEZ	1007765951	CELADOR	30/12/2024	100%
JULIO CESAR OSPINO BENAVIDES	77165580	TOPÓGRAFO	30/12/2024	100%
ALBERT TAMARA NIETO	7369165	CADENERO	30/12/2024	100%
JAIDIR ANTONIO ORTEGA ANTONIO	1068661447	OFICIOS VARIOS	18/01/2025	100%
NATALY GONZALES TORRES	1003434150	AUX. SISO	22/01/2025	100%
FABIAN ANDRES CASTILLO OSORIO	1019082635	OPERADOR HYUNDAU HX2205	10/02/2025	100%
ALEXANDER NICANOR VELAZQUEZ DIAZ	10966603	OPERADOR XCMG XE210CU	10/02/2025	100%

DANIEL EDUARDO BOHORQUEZ HERNANDEZ	1104010316	OPERADOR KOBELCO 211	11/02/2025	100%
NAYID SALOMON CORONADO RETAMOSO	78038246	CELADOR	18/02/2025	100%
ARNULFO MANUEL MONTIEL ROMERO	7369636	TOPOGRAFO	19/02/2025	100%

Gráfico 9. relación de personal del periodo.

7.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Dentro del presente informe, se realiza el reporte climatológico en obra, donde se puede apreciar el comportamiento del clima en obra y su influencia sobre las actividades realizadas en cada frente de trabajo.

La metodología de verificación adicional a la presentada en campo y lo relacionado en toda extensión del tramo, es realizar un análisis de estaciones meteorológicas cercanas al proyecto y que dentro del análisis de resultados presentados bajo los datos abiertos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.

FECHA	SALADO EL [13075020]	SAHAGUN [25020140]	BITACORA
01/02/2025	0	3	SOLEADO
02/02/2025	0	0	SOLEADO
03/02/2025	0	0	SOLEADO
04/02/2025	0	0	SOLEADO
05/02/2025	0	0	SOLEADO
06/02/2025	0.5	0	SOLEADO
07/02/2025	0	0	SOLEADO
08/02/2025	0	0	SOLEADO
09/02/2025	1.4	0	LLUVIOSO
10/02/2025	0	0	SOLEADO
11/02/2025	0	0.5	SOLEADO
12/02/2025	0	0	SOLEADO
13/02/2025	4.2	4.2	LLUVIOSO
14/02/2025	4.8	0	LLUVIOSO
15/02/2025	1.4	0	LLUVIOSO
16/02/2025	0	0	SOLEADO
17/02/2025	23.2	0	LLUVIOSO
18/02/2025	7.2	0	LLUVIOSO
19/02/2025	0	4	SOLEADO
20/02/2025	0	0	SOLEADO
21/02/2025	0	0	SOLEADO
22/02/2025	0	0	SOLEADO
23/02/2025	0	0	SOLEADO
24/02/2025	0	0	SOLEADO
25/02/2025	0	0	SOLEADO
26/02/2025	0	0	SOLEADO
27/02/2025	0	0	SOLEADO
28/02/2025	0	0	SOLEADO

Tabla 15. reporte del estado del tiempo.

En el presente mes de labores, las condiciones del clima predominaron los días soleados y así mismo, lo cual permitió el libre desarrollo de las actividades, pero se presentaron lluvias en 6 de los 23 días del periodo.

7.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Dentro de este segundo mes de ejecución, no se realizaron ensayos de laboratorio, dado a que las actividades que se vienen desarrollando no necesitan de estos para su ejecución.

7.10. Actas de comité de obra.

A la fecha de corte del presente informe, se han presentado las siguientes actas.

ACTA No.	FECHA	TIPO DE ACTA	OBSERVACIÓN
1	30/12/2024	Inicio	Se da inicio al contrato de obra e interventoría
2	20/01/2025	Comité de seguimiento	Comité de seguimiento al contrato No. 060 DE 2024
3	31/01/2025	Socialización	Socialización de proyecto con la comunidad de los Barrios santa Lucia y San Martin, vereda las Palmas y propietarios de los predios donde incide el proyecto del Municipio de Ciénaga de Oro

Tabla 16. relación de actas de comité.

7.11. Valla informativa.

El contratista de obra, cuenta con un diseño que ha sido aprobado por la supervisión del proyecto.



Ilustración 5. diseño de valla informativa.

El contratista durante este periodo se encuentra elaborando la valla informativa.

8. SEGUIMIENTO MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Consorcio inter recuperación a la presente fecha de corte de 28 de febrero de 2025 presenta un avance acumulado de 20.0%.

PERIODO	INICIO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
	30/12/2024	30/12/2024	30/01/2025	28/02/2025	30/03/2025	30/04/2025	30/05/2025	30/06/2025	30/07/2025	30/08/2025	30/09/2025
	30/12/2024	30/01/2025	28/02/2025	30/03/2025	30/04/2025	30/05/2025	30/06/2025	30/07/2025	30/08/2025	30/09/2025	30/10/2025
MESES	**0**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance físico programado (%)	**0%**	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Avance físico programado acumulado (%)	**0%**	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
Avance físico ejecutado acumulado (%)	**0%**	10,00%	20,00%								

Tabla 17. Porcentaje de Avance - Contrato de interventoría.

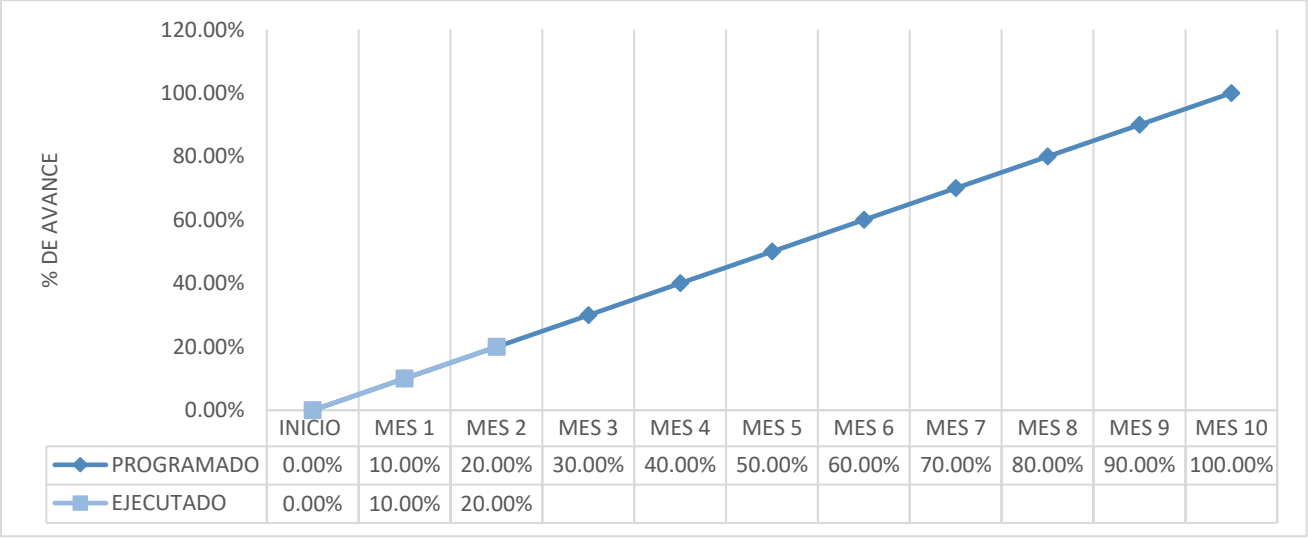


Tabla 18.Avance Físico Interventoría.

8.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR O CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	FEB-25		ACUMULADO	
				Cantidad	Vr a ejecutar	Cantidad	Vr a ejecutar
Realizar interventoría	N° Periodos.	10	$509.422.340,00	1,00	$50.942.234,00	2	$101.884.468,00

Tabla 19. Resumen de ejecución de interventoría dentro del periodo.

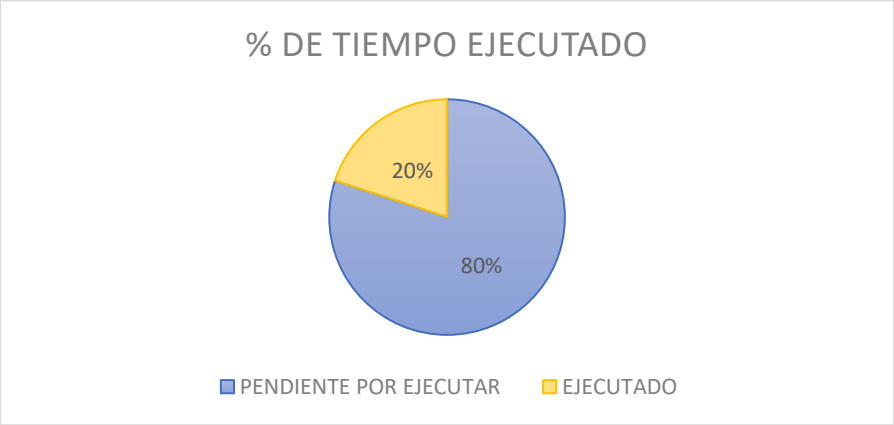


Gráfico 10. Porcentaje de Tiempo Ejecutado vs Pendiente por ejecutar.

8.2. PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Cargo	Nombre	Dedicación
Director de interventoría	Hugo Yúnior Vergara Sotelo	30%
Especialista en hidráulica	Nelson Augusto Rengifo Villalba	50%
Especialista ambiental o ecosistémico	Iván Camilo Vuelvas Serpa	50%
Profesional social	Erlinda Del Socorro Lugo Hernández	50%
profesional para el aseguramiento de la salud y la seguridad en el trabajo	Juan Carlos Herrera Catalán	50%
Residente de interventoría	Alfredo Antonio Cabarcas Buelvas	100%
Topógrafo	Jonathan Alexander López Guerrero	100%

Tabla 20. Relación de personal de interventoría.

8.3. EQUIPOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

EQUIPOY MAQUINARIA	CANTIDAD
Estación Total	1
Nivel Automático	2
Equipo GPS	1
RTK	1
GPS	1

Tabla 21. equipos utilizados en el periodo.

8.4. PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS					
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO"RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"					
PRESUPUESTO OFICIAL (10 MESES)					
COSTO DE PERSONAL					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN**	**No. DE MESES**	**VR. MES**	**VR. TOTAL**
Director de Interventoría	1	30%	10	$5.600.000	$16.800.000
Especialista en Hidráulica	1	50%	10	$5.000.000	$25.000.000
Especialista Ambiental o Ecosistémico	1	50%	10	$5.000.000	$25.000.000
Profesional en Gestión Social	1	50%	10	$3.500.000	$17.500.000
Profesional para el aseguramiento de la salud y la seguridad en el trabajo	1	50%	10	$3.500.000	$17.500.000
Ingeniero Residente de interventoría	1	100%	10	$3.500.000	$35.000.000
Topógrafo	1	100%	10	$2.900.000	$29.000.000
				COSTO DE PERSONAL	**$165.800.000**
				FACTOR MULTIPLICADOR	**2,47**
				A. SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	**$409.526.000**
COSTOS OPERATIVOS					
CONCEPTO	**CANTIDAD**	**ASIGNACION MES 1**	**No. DE MESES**	**VR. MES**	**VR. TOTAL MES 1**
Alquiler de equipo de topografía	1	100%	10	$1.856.000,00	$18.560.000
				B. SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS	**$18.560.000**

C. SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE INTERVENTORIA (A + B)	**$428.086.000**
D. IVA (19%)	**$81.336.340**
COSTO TOTAL INTERVENTORIA (C + D)	**$509.422.340**

Tabla 22. Presupuesto de interventoría.

8.5. Seguimiento a la correspondencia enviada y recibida.

8.5.1. Recibida.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
ENTIDAD	**FECHA**	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**
CONSORCIO PUNTA YÁNEZ CVS	17/01/2025	OF-OBR-002	ENTREGA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
CONSORCIO PUNTA YÁNEZ	22/01/2025	OF-OBR-002B	SOLICITUD HOMOLOGACION DIRECTOR DE OBRA – RESIDENTE DE OBRA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE – CVS	24/01/2025	20252100971	RESPUESTA AL RADICADO 20251100476: ENTREGA DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 063-2024
CONSORCIO PUNTA YÁNEZ CVS	27/01/2025	OF-OBR-009	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO A SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO NO. 060-2024
CONSORCIO PUNTA YÁNEZ CVS	27/01/2025	OF-OBR-016	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA Y PGIO N°1
CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	12/02/2025	OF-OBR-017	ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD Y DEMÁS DOCUMENTOS
CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	28/02/2025	OF-OBR-018	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA N°2

Tabla 23. Correspondencia recibida por interventoría.

8.5.2. Enviada.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			
DESTINATARIO.	**FECHA**	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**
CONSORCIO PUNTA YANEZ	03 de enero de 2025	OF-001-CINRE	OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
CONSORCIO PUNTA YANEZ	03 de enero de 2025	OF-002-CINRE	VALLA INFORMATIVA – ESPECIFICACIONES
CONSORCIO PUNTA YANEZ	03 de enero de 2025	OF-003-CINRE	SOLICITUD ENTREGA DE INFORMACION.
CONSORCIO PUNTA YANEZ	07 de enero de 2025	OF-004-CINRE	SOLICITUD LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
CONSORCIO PUNTA YANEZ	10 de enero de 2025	OF-005-CINRE	TRAMITES SOCIALIZACION DEL PROYECTO: “RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL

			MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONSORCIO PUNTA YANEZ	17 de enero de 2025	OF-006-CINRE	SOLICITUD INFORME MENSUAL N°1 DE OBRA, INFORME PGIO N°1 CON TODOS SUS ANEXOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE-CVS	22 de enero de 2025	OF-007-CINRE	ENTREGA DE ACTAS DE ENTREGA DE SITIO Y VERIFICACION
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE-CVS	22 de enero de 2025	OF-008-CINRE	ENTREGA DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA N°063 DE 2024
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE-CVS	22 de enero de 2025	OF-009-CINRE	RENUNCIA DE ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°063-2024
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE-CVS	24 de enero de 2025	OF-009-CINRE	ENTREGA DE DOCUMENTACION HOMOLOGACION PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA N°060-2024
CONSORCIO PUNTA YANEZ	28 de enero de 2025	OF-006B-CINRE	REITERACION SOLICITUD INFORME MENSUAL N°1 DE OBRA, INFORME PGIO N°1 CON TODOS SUS ANEXOS
CONSORCIO PUNTA YANEZ	29 de enero de 2025	OF-003B-CINRE	REITERACION SOLICITUD ENTREGA DE INFORMACION.
CONSORCIO PUNTA YANEZ	28 de enero de 2025	OF-006C-CINRE	REITERACION N°3 SOLICITUD INFORME MENSUAL N°1 DE OBRA, INFORME PGIO N°1 CON TODOS SUS ANEXOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE-CVS	10 de febrero de 2025	OF-010-CINRE	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°1
CONSORCIO PUNTA YANEZ	11 de febrero de 2025	OF-011-CINRE	SOLICITUD ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD
CONSORCIO PUNTA YANEZ	17 de febrero de 2025	OF-013-CINRE	SOLICITUD INFORME MENSUAL N°2 DE OBRA, INFORME PGIO N°2 CON TODOS SUS ANEXOS
CONSORCIO PUNTA YANEZ	24 de febrero de 2025	OF-013B-CINRE	REITERACION SOLICITUD INFORME MENSUAL N°2 DE OBRA, INFORME PGIO N°2 CON TODOS SUS ANEXOS

Tabla 24. correspondencia enviada por interventoría.

9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

En la etapa de inicio de obra, la interventoría realizó los siguientes requerimientos:

- Supervisión de actividades sociales con las comunidades aledañas al proyecto.
- Revisión de diseños y planos de obra.
- Supervisión de cumplimiento de los profesionales mínimos requerido del contrato de obra e interventoría.
- Supervisión del seguimiento de gestión de permisos ambientales otorgados para la ejecución del contrato.
- Supervisar la ejecución de las actividades realizadas durante el periodo.
- Realizar seguimiento al presupuesto y cronograma de obra, para el control de cantidades y tiempos de ejecución de las actividades del proyecto.
- Control de avance de obra y evaluación periódico del cumplimiento de actividades ejecutadas.
- Verificación del estado de maquinaria y equipos en campo.
- Participar en los comités de obra para la toma de decisiones de orden técnico de manera conjunta con el supervisor del contrato.
- Llevar registro fotográfico de los eventos en obra.
- Elaboración de informes mensuales para reporte de avance en obra y acciones a seguir dentro del proyecto.
- Seguimiento de cumplimiento del PGIO.

10. SEGUIMIENTO PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA.

El Consorcio Punta Yánez CVS continua con la implementación del Plan de Gestión Integral de Obra teniendo en cuenta la Normatividad vigente (ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001) con el objetivo de establecer los lineamientos y criterios para prestar los servicios relacionados con la ejecución del proyecto, para de esta forma definir la forma en cómo se van a desarrollar las actividades para que estén plenamente identificadas, organizadas y controladas desde su inicio hasta su fecha de finalización, permitiendo su trazabilidad.

La presente interventoría ha realizado control y seguimiento a todas las actividades durante el desarrollo del proyecto en lo que concierne a registros, metodologías y controles necesarios para el correcto desarrollo del proyecto, es importante realizar un seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones dentro de este Plan, esta interventoría realiza el seguimiento de que las acciones realizadas respecto a los componentes de calidad, seguridad y salud en el trabajo, y ambiental.

11. PQR DE LA COMUNIDAD.

Durante este periodo no se ha presentado ningún tipo de petición, queja o reclamo formal por parte de la comunidad.

12. CONCLUSIONES DE INTERVENTORÍA.

1. El avance físico mensual en el MES 2 periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025 es de 13.37 % ejecutado, para obtener así un avance acumulado del 13.60%, frente a un programado del 13.60%, lo cual nos muestra un cumplimiento de la programación del MES 2.

2. A fecha del presente corte no se presenta atrasó con respecto a la programación. se sugiere al contratista continuar con las actividades contractuales a conformidad con la programación.

3. La Interventoría mantiene seguimiento, control y supervisión constante a las labores administrativas para tratar de iniciar las actividades lo antes posible.

4. La interventoría hace acompañamiento al contratista de obra en la ejecución de las obras a ejecutar.

5. Para el segundo mes el contratista e interventoría realiza acompañamiento al trabajo social con las comunidades directamente influenciadas en el proyecto realizando socializaciones y acercamientos con las mismas para que las mismas se familiaricen con el proyecto.

6. La interventoría durante este periodo rectifico que la obra se está ejecutando con los controles, seguimientos, adicional, realizó revisión de diseños y documentos previos para verificación de obligaciones durante la ejecución de la obra, así mismo, se hace acompañamiento a las actividades de previas de localización y replanteo ejecutadas por el contratista, así mismo, los trabajos de limpieza de canales, descapote y optimización de la sección hidráulica.

7. El nivel de compromiso del personal que labora en la obra con el uso de elementos de protección personal (EPP) es el adecuado para realización de las actividades en ejecución; el índice de accidentalidad es se mantiene en 0, el número de accidentes registrados en el periodo comprendido entre el inicio de la obra, 30 de diciembre de 2024 y la presente fecha, 28 de febrero de 2025 es cero (0).

8. Todo el personal vinculado a la obra como de la presente interventoría se encuentra afiliado al sistema general de riesgos y se encuentran al día con los pagos.

9. El contratista ha reportado el pago de las planillas de seguridad social del listado de personal vinculado al proyecto, con lo cual se verificó el cumplimiento del contratista respecto al pago de aportes a la seguridad social y parafiscales para el período de cotización del mes del presente informe.

10. Mediante el libro de la bitácora se registran las actividades ejecutadas diariamente y los hechos complementarios que ocurrieron en obra durante el periodo del presente informe.

13. RECOMENDACIONES.

1. Se le recomienda al contratista de obra dar cumplimiento a cabalidad del Plan de Gestión integral de obras en lo que respecta de dotar completamente al personal que se encuentra laborando en obra.
2. Se le recomienda al contratista informar a la interventoría cuando sea el caso, de que a medida que se vaya ingresando personal a laborar en la obra nos presenten las afiliaciones respectivas para realizar el debido seguimiento y control.
3. Mantener al personal de obra necesario para ejecutar las actividades contempladas en el proyecto a tiempo.
4. Verificar las condiciones hidráulicas de los cuerpos de agua que fluyen al caño Aguas Prietas para su posible intervención, dada la necesidad de conectividad hidráulica de todo el sistema de cauces que contine el cauce en intervención.
5. Reiteramos la recomendación de afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal que labore en el proyecto, esto es un requerimiento de Ley y de estricto cumplimiento.
6. Se le recomienda al contratista de obra dar cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) dado que el proyecto se desarrolla en una zona con alto tránsito vehicular.

HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
RL. CONSORCIO INTER RECUPERACION
NIT. 901899921-5


HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
Director Interventoría
C. C. No. 15.670.767 de planeta rica

15. ANEXOS.

- Anexo 1. Cronograma de obra
- Anexo 2. Flujo de fondos
- Anexo 3. Actas de comité
- Anexo 4. Correspondencia enviada y recibida
- Anexo 5. Bitácora
- Anexo 6. Informe de seguimiento PGIO interventoría
- Anexo 7. Informe de seguimiento PGIO obra
- Anexo 8. Informe Ambiental
- Anexo 9. Informe Hidráulico
- Anexo 10. Planillas seguridad social Interventoría
- Anexo 11. Planillas seguridad social Obra
- Anexo 12. Informe Técnico obra

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE OBRA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**RECUPERACIÓN AMBIENTAL CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DEL CAÑO DE AGUAS PRIETAS EN EL MUNIICPIO DE CIENAGA DE ORO-DEPARTAMENTO DE CORDOBA.**	**294,63 días**	**lun 30/12/24**	**jue 30/10/25**	
2		**INICIO OBRA**	1 día	lun 30/12/24	lun 30/12/24	
3		Actas de Vencindad	30 días	lun 30/12/24	mié 29/01/25	
4		**Preliminares**	**20 días**	**lun 30/12/24**	**sáb 18/01/25**	
5		Localización, trazado y replanteo	20 días	lun 30/12/24	sáb 18/01/25	
6		**Movimientos de Tierra**	**248 días**	**mar 4/02/25**	**sáb 18/10/25**	
7		Optimización de sección hidráulica del cauce en tierra, incluye excavación material común y rectificación de taludes	165 días	mar 4/02/25	jue 24/07/25	5CC+35 días
8		Conformación de diques y dentellones a máquina con material seleccionado de la excavación (especificamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado)	120 días	sáb 22/03/25	jue 24/07/25	7CC+30 días
9		Retiro de material proveniente de la excavación de los canales y de préstamo lateral. Distancia mayor de 1.000 metros.	160 días	mar 11/02/25	sáb 26/07/25	7FF+2 días
10		Instalación de geotextil NT 2000. Incluye materiale, equipos y mano de obra.	30 días	mié 9/07/25	sáb 9/08/25	7FF+15 días
11		Mejoramiento con piedra rajon. e = 0,45 cm	90 días	jue 17/07/25	sáb 18/10/25	10CC+8 días
12		**Realizar actividades de sensibilización**	**29 días**	**mar 30/09/2**	**mié 29/10/25**	
13		Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	15 días	mar 30/09/25	mié 15/10/25	
14		Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	14 días	mié 15/10/25	mié 29/10/25	13
15		**FIN OBRA**	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25	14FF

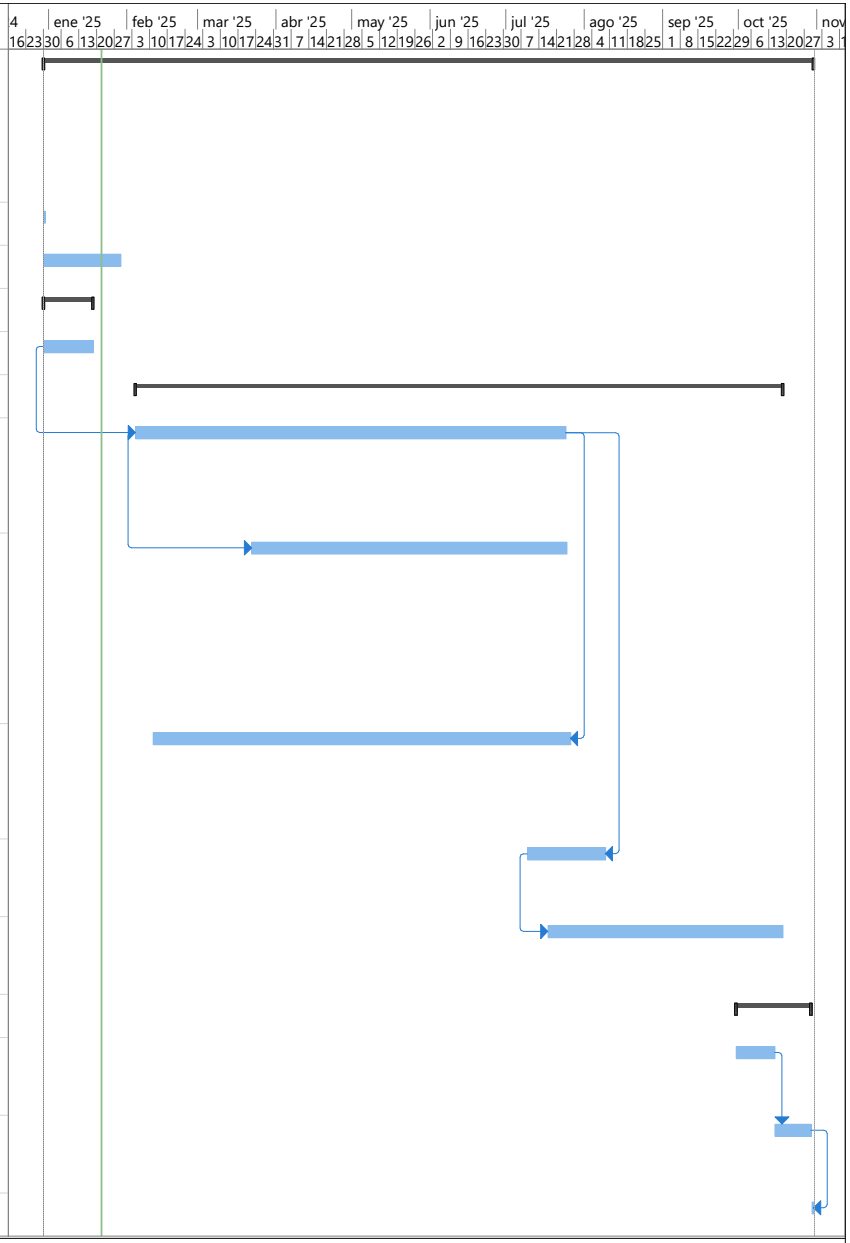

Proyecto: PROGRAMACION AG
Fecha: mié 22/01/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

ANEXO 2. FLUJO DE FONDOS

CRONOGRAMA - CONTRATO 060 - 2024

Presupuesto										ene-25			feb-25			mar-25			abr-25			may-25			jun-25	
Id	Nombre de tarea	Duracion	Comienzo	Fin	Cantidad	Unidad	Vl Unitario	Costo directo	Costo Incluye AIU - IVA	TOTAL	Cant	CD	CD + AIU + IVA	Cant	CD	CD + AIU + IVA	Cant	CD	CD + AIU + IVA	Cant	CD	CD + AIU + IVA	Cant	CD	CD + AIU + IVA	Cant	CD
0	**RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO**	**295**	**30/12/2024**	**30/10/2025**				$ 6,135,471,622.00	$ 8,031,375,289.00	$ 8,031,375,289.00		$ 14,154,720.00	$ 18,535,606.00		$ 819,969,904.00	$ 1,073,750,590.00		$ 870,155,627.00	$ 1,139,468,794.00		$ 945,434,212.00	$ 1,238,046,101.00		$ 945,434,212.00	$ 1,238,046,101.00		$ 913,780,467.00
1	**Preliminares**	**30**	**30/12/2024**	**30/1/2025**				**$ 14,154,720.00**	**$ 18,535,606.00**	**$ 18,535,606.00**		**$ 14,154,720.00**	**$ 18,535,606.00**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**
1.1	Localización, trazado y replanteo	**30**	**30/12/2024**	**30/1/2025**	4440.00	m	$ 3,188.00	$ 14,154,720.00	$ 18,535,606.00	$ 18,535,606.00	4440.00	$ 14,154,720.00	$ 18,535,606.00														
2	**Movimiento de tierras**	**248**	**4/2/2025**	**18/10/2025**				**$ 6,096,004,774.00**	**$ 7,982,718,252.00**	**$ 7,982,718,252.00**		**$ -**	**$ -**		**$ 819,969,904.00**	**$ 1,073,750,590.00**		**$ 870,155,627.00**	**$ 1,139,468,794.00**		**$ 945,434,212.00**	**$ 1,238,046,101.00**		**$ 945,434,212.00**	**$ 1,238,046,101.00**		**$ 913,780,467.00**
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	**165**	**4/2/2025**	**24/7/2025**	228449.00	m3	$ 17,223.00	$ 3,934,577,127.00	$ 5,152,328,748.00	$ 5,152,328,748.00				40257.50	$ 693,354,923.00	$ 907,948,272.00	40257.5	$ 693,354,923.00	$ 907,948,272.00	40257.5	$ 693,354,923.00	$ 907,948,272.00	40257.5	$ 693,354,923.00	$ 907,948,272.00	40257.5	$ 693,354,923.00
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material seleccionado de la excavación (especificamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado)	**120**	**22/3/2025**	**24/7/2025**	15005.00	m3	$ 33,446.00	$ 501,857,230.00	$ 657,182,043.00	$ 657,182,043.00							1500.5	$ 50,185,723.00	$ 65,718,204.00	3751.25	$ 125,464,308.00	$ 164,295,511.00	3751.25	$ 125,464,308.00	$ 164,295,511.00	3751.25	$ 125,464,308.00
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral. Distancia mayor de 1.000 metros.	**160**	**11/2/2025**	**26/7/2025**	213444.00	m3	$ 2,966.00	$ 633,074,904.00	$ 829,011,587.00	$ 829,011,587.00				42688.80	$ 126,614,981.00	$ 165,802,318.00	42688.8	$ 126,614,981.00	$ 165,802,318.00	42688.8	$ 126,614,981.00	$ 165,802,318.00	42688.8	$ 126,614,981.00	$ 165,802,318.00	32016.6	$ 94,961,236.00
2.4	Revestimiento tipo RIP RAP para protección de taludes y entrada de cauces. e = 0.45 m. Incluye materiales y mano de obra.	**30**	**17/7/2025**	**18/10/2025**	4509.00	m3	$ 174,286.00	$ 785,855,574.00	$ 1,029,077,874.00	$ 1,029,077,874.00																	
2.5	Instalación de geotextil NT 2000 para protección de taludes y entrada de cauces. Incluye materiales, equipos y mano de obra.	**90**	**9/7/2025**	**9/8/2025**	10119.00	m2	$ 23,781.00	$ 240,639,939.00	$ 315,118,000.00	$ 315,118,000.00																	

COSTO TOTAL DE LA OBRA INCLUYE AIU	$ 8,001,253,858.00

3	**Realizar actividades de sensibilización**	**29**	**30/9/2025**	**29/10/2025**				$ 25,312,128.00	$ 30,121,432.00			**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**
3.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	15.00	**30/9/2025**	**15/10/2025**	10.00	TALLER	$ 2,109,344.00	$ 21,093,440.00	$ 25,101,194.00																		
3.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	14.00	**15/10/2025**	**29/10/2025**	2.00	TALLER	$ 2,109,344.00	$ 4,218,688.00	$ 5,020,238.00																		

COSTO DE TALLER INCLUYE IVA	$ 30,121,432.00

VALOR TOTAL									$ 8,031,375,289.00		$ 18,535,606.00		$ 1,073,750,590.00		$ 1,139,468,794.00		$ 1,238,046,101.00		$ 1,238,046,101.00		$
VALOR ACUMULADO									$ -		$ 18,535,606.00		$ 1,092,286,196.00		$ 2,231,754,990.00		$ 3,469,801,091.00		$ 4,707,847,192.00		$
PORCENTAJE PROGRAMADO									0%		0.23%		13.37%		14.19%		15.42%		15.42%		14.90%
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO									0%		0.23%		13.60%		27.79%		43.20%		58.62%		73.52%

ANEXO 3. ACTAS DE COMITÉ

Nombre del Comité: Comité Técnico para tratar temas correspondientes a la ejecución del Contrato de obra No. 060 de 2024.	
Tema/Proyecto/asunto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	**Fecha:** 20 de enero de 2025. **Hora de inicio:** 9:00 A.M. **Hora Fin:** 10:00 A.M.
Objetivo de la Reunión: Seguimiento contrato de obra No. 060 de 2024.	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CESAR AUGUSTO BUELVAS MERCADO	Personal Especializado CVS, supervisor contratos 047 y 048 de 2024	
RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	Representante Legal Consorcio Punta Yanez CVS	
HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA	Representante Legal CONSORCIO INTER-RECUPERACION	

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de asistentes.
2. Intervención de los asistentes
3. Conclusiones.
4. Compromisos.

DESARROLLO

1.	Los asistentes a la reunión son: Cesar Augusto Buelvas Mercado– Personal Especializado CVS. Supervisor. Hernán Alonso Velásquez Cabeza – Representante Legal Consorcio Inter-Recuperación. Rafael Eduardo Montes Cabeza – Representante Legal Consorcio Punta Yánez CVS.
2.	Se inicia el comité, verificando los compromisos adquiridos para la entrega de documentos requeridos propios de levantamiento topográfico para verificación técnica y económica de las variaciones encontradas actualmente en el terreno natural. Seguidamente manifiesta que, el comité fue convocado con el fin de dar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. 060 de 2024 y 063 de 2024, así mismo, indicar los inconvenientes que se han presentado dentro de la ejecución del proyecto. El supervisor de la CVS, sede la palabra al representante legal de la firma contratista, quien manifiesta que, a día de hoy entregó la documentación de implantación del proyecto frente a las condiciones actualizadas e inicia indicando que para que se realice un trabajo acorde a las necesidades, es necesario realizar una tala de un número considerable de árboles en ambos costados del canal dado que estos presentan vegetación abundante. Posteriormente, la interventoría toma la palabra, e indica que la documentación se encuentra en revisión por parte de los profesionales, los cuales evidencian la problemática e indican que las dimensiones iniciales del proyecto deben entrar en estudio y plantearse un rediseño debido a que al ser un proyecto con énfasis ecosistémico no se puede realizar la deforestación planteada por el contratista. Por todo lo anterior, se indica al contratista que debe entregar una propuesta para una nueva sección en la cual cumpla con las capacitades Hidráulicas de la sección inicial y a su vez pueda ser desarrollada sin afectar en gran medida la vegetación de la zona dado que esto conllevaría aun impacto ambiental considerable. Una vez finalizadas las intervenciones, el ingeniero Cesar Buelvas– supervisor del proyecto, toma la palabra e indica que se encuentra de acuerdo con la formulación de una nueva sección de diseño, indica que se realice la entrega de todos los productos requeridos como evaluaciones técnicas, conceptos de profesionales, balance de obra y aval de la interventoría para evaluar la alternativa.

CONCLUSIONES

De lo planteado en el comité, se concluye lo siguiente:

1. Que el contratista debe entregar la nueva propuesta de sección de diseño con todos los documentos técnicos que esta requiera.

2. Que el interventor, dará seguimiento a las evaluaciones y estudios que el contratista realice.

3. El interventor indica que, en caso de presentarse un ajuste, este no presentará modificaciones a las metas del proyecto.

4. Que se realizará actualización de las condiciones contractuales de conformidad a la alternativa viabilizada.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entregar la nueva propuesta de sección junto con la documentación técnica y estudios correspondientes para su evaluación.	Contratista	07/02/2025
Seguimiento a las evaluaciones y estudios que el contratista realice.	Interventor	07/02/2025

ANEXO 4. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Montería, 10 de febrero de 2025

Señores:
CESAR AUGUSTO BUELVAS MERCADO
SUPERVISOR
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE – CVS
Carrera 6 N° 61 – 25 Barrio los Bongos
Montería - Córdoba
E. S. M.

OF-010-CINRE

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°1

REFERENCIA: CONTRATO No. 063 DE 2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

En cumplimiento de nuestras funciones como Interventores, como seguimiento al desarrollo del contrato N° 060 DE 2024, cuyo objeto es: **"RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA",** nos permitimos enviar informe mensual de interventoría N°1, correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2024 y el 31 de enero de 2025

Cordialmente,

HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
RL. CONSORCIO INTER RECUPERACION
NIT. 901899921-5

Montería, 11 de febrero de 2025

Señores:
CONSORCIO PUNTA YANEZ
Sr. Rafael Eduardo Montes Navas
Representante Legal
CL 62 A # 7-67
Montería – Córdoba
consorciopuntayanezcvs@gmail.com
E. S. M.

OF-011-CINRE

ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA DE ACTAS DE VECIDAD

REFERENCIA: CONTRATO No. 063 DE 2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

De acuerdo a nuestras obligaciones como interventores del proyecto del contrato de obra N°060 de 2024 y teniendo en cuenta la **CLAUSULA SEXTA – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 10. – "**Hacer controles y seguimientos", esta interventoría solicita se nos envié las actas de vecindad debidamente diligenciadas por el contratista, ya que las actividades se dieron inicio el día 30 de diciembre de 2024, día en que se firmó acta de inicio.

Se agradece la atención prestada, así como su pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente,

HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
RL. CONSORCIO INTER RECUPERACION
NIT. 901899921-5

Montería, 17 de febrero de 2025

Señores:
CONSORCIO PUNTA YANEZ
Sr. Rafael Eduardo Montes Navas
Representante Legal
CL 62 A # 7-67
Montería – Córdoba
consorciopuntayanezcvs@gmail.com
E. S. M.

OF-013-CINRE

ASUNTO: SOLICITUD INFORME MENSUAL N°2 DE OBRA, INFORME PGIO N°2 CON TODOS SUS ANEXOS

REFERENCIA: CONTRATO No. 063 DE 2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

Mediante la presente se le recuerda al contratista la presentación del informe mensual de obra a corte de 28 de febrero de 2025 y la presentación del informe de seguimiento a la implementación del PGIO N°2, el cual deberá ser presentado máximo hasta el 21 de febrero de 2025 para su posterior revisión por la presente interventoría, por tal razón le recordamos la entrega de los informes en la fecha oportuna.

Se agradece la atención prestada, así como su pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente,

HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
RL. CONSORCIO INTER RECUPERACION
NIT. 901899921-5

Montería, 24 de febrero de 2025

Señores:
CONSORCIO PUNTA YANEZ
Sr. Rafael Eduardo Montes Navas
Representante Legal
CL 62 A # 7-67
Montería – Córdoba
consorciopuntayanezcvs@gmail.com
E. S. M.

OF-013B-CINRE

ASUNTO: REITERACION SOLICITUD INFORME MENSUAL N°2 DE OBRA, INFORME PGIO N°2 CON TODOS SUS ANEXOS

REFERENCIA: CONTRATO No. 063 DE 2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

Mediante la presente se le hace reiteración al contratista la presentación del informe mensual de obra a corte de 28 de febrero de 2025 y la presentación del informe de seguimiento a la implementación del PGIO N°2, el cual debió presentarse el 21 de febrero de 2025 para su posterior revisión por la presente interventoría, por tal razón le recordamos la entrega de los informes en la fecha oportuna.

Se agradece la atención prestada, así como su pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente,

HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
RL. CONSORCIO INTER RECUPERACION
NIT. 901899921-5

12 de Febrero de 2025

Señor.
HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
RL. CONSORCIO INTER RECUPERACION

E. S. M.

OF-OBR-017

REF: CONTRATO DE OBRA 060-2024 "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

ASUNTO: Entrega de Actas de vecindad y demás documentos

Cordial saludo.

En cumplimiento de las disposiciones establecidas y con el fin de hacer entrega formal de los documentos solicitados, me permito remitir a ustedes la siguiente información:

1. Acta de vecindad levantadas en el período de Diciembre de 2024 a Enero 2025
2. Acta de conformación de veeduría
3. Acta de socialización

Los documentos mencionados se adjuntan en este oficio para su conocimiento y archivo. Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier comentario o requerimiento adicional relacionado con los mismos.

Sin más en particular, me despido de ustedes, reiterando nuestra disposición para cualquier inquietud.

Cordialmente,



CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
NIT. 901.895.986-5
R. L. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

FORMATO

ACTA DE VECINDAD INICIAL

PROCESO

Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACT No:
DD	MM	AA			
27	01	2025	CONTRATO OBRA No 060-2024	069 DE 2024.	1

OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIBU Y LA VEREDA EL USAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Virgilio Manuel Alcazar Lopez
CC propietario	1100855894
Teléfono	3145726262
Correo electrónico	
Dirección	Cabal cr 1-43
Long. del frente (mts)	22 mts Predio 1 No. de predio 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☑	cocina con pipeta gas propana
2. Acueducto	☐	☑	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garaje			

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI ☑ NO ☐

Tipo de Cultivos:	Platano y yuca
Estado:	Buenas condiciones
# de cultivos en total:	1 cercafeon de tierra Sembrado
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	1 cercafeon ☐ ☐

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. SI 2. NO

3. Cual? N-A

4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención?

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YAREZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

La vivienda tiene las Principales caracteristicas: es de color Verde. techo de Eternit y otra parte de zinc, tiene una Bodega, y otro rancho de techo de zinc. tiene dos habitaciones. una cocina. un baño, un lavadero de ropa. al lado de la vivienda tiene cerbito de platano y yuca. el Piso de la terraza de la Vivienda es de Tablon rajo con piedras. ventas y Pedazos de madera. el piso de la cocina Presenta grietas. Hay un Rancho de palma. El techo de una de las habitaciones tiene huecos
el baño tiene baldosa de color verde en la Pared
la cocina tiene Baldosa en la Pared y el mezón (color azul)
En general la vivienda esta en buen Estado

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD INICIAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	



Foto No 1-2
Descripción El piso de la cocina presenta grietas
El techo en buenas condiciones



Foto No 3-4
Descripción El techo de esa habitacion tiene Sucio
las Paredes se encuentran sin grietas



Foto No 5-6
Descripción Baño con baldosa de color Verde
Lavadero de ropa con piso Bato.



Foto No 7-8
Descripción La terraza con tablon y Piedras un
Rancho de Palma; Protegido con Malla de
Sucio y piso buen estado

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YAREZ CVS	
ACTA DE VECINDAD BARRIAL		
PROCESO		

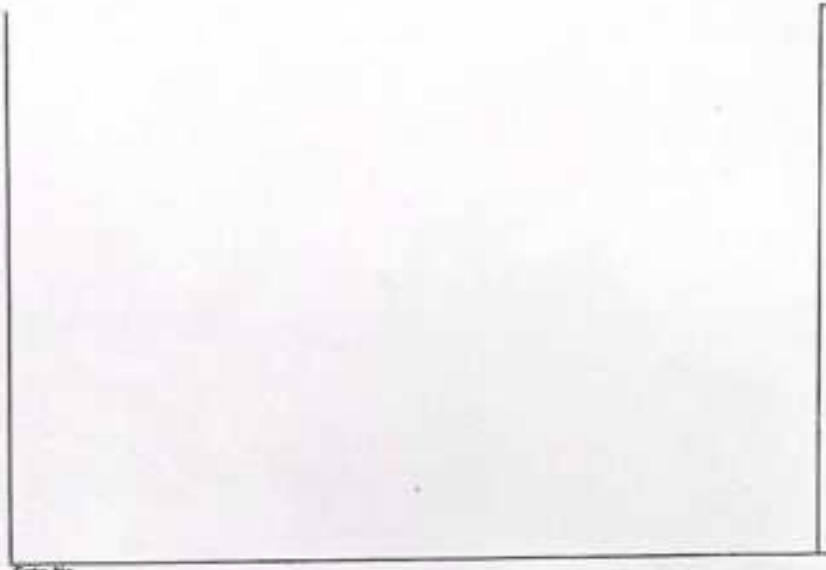


Foto No ____
Descripción _____

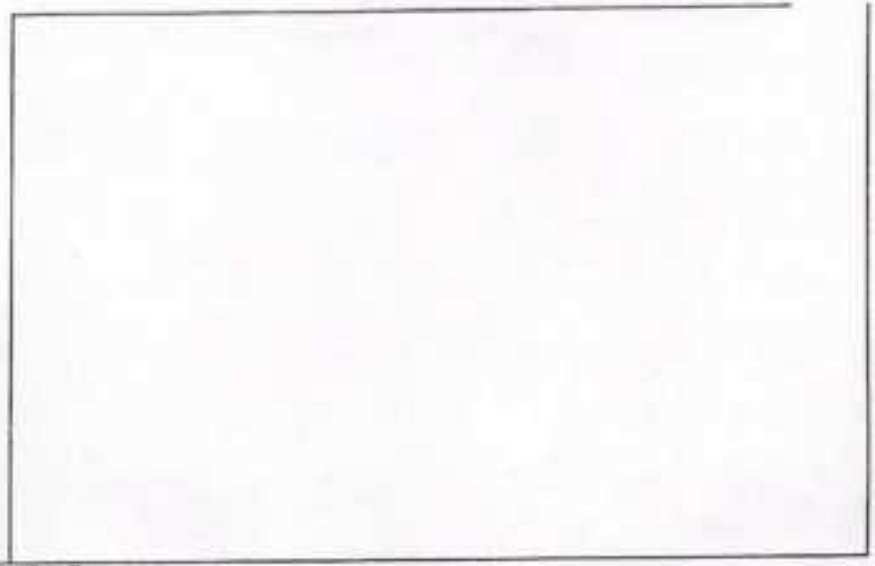


Foto No ____
Descripción _____

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Ciénaga de oro a los 27 días del mes de enero de 2015

ELABORÓ:
(Firma) Nikolle tatiana fetecua6.
(Nombre) Nikolle tatiana fetecua6.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Interventoría

Vo.Bo
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Contratista

(Firma) Virgilio Manuel Moreno Mejía
(Nombre) Virgilio Manuel Moreno Mejía
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO

ACTA DE VECINDAD INICIAL

PROCESO:

Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACT No:	OBJETO:
DD	MM	AA				
27	Enero	2025	CONTRATO OBRA No 060-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No. 065 DE 2024.	ACT No: 1	OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL LIBANO DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Filadelfo Muñoz Argumedo
CC propietario: 1.193.059.891
Teléfono: 323 [illegible] 5380
Correo electrónico:
Dirección: Cl 1 El Higuel No. de predio: 1
Long. del frente (mts): 15 metros Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☑	
2. Alcantarillado	☐	☑	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TV/Cable	☐	☑	
6. Licencia de construcción			#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje	

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI ☑ NO ☐

Tipo de Cultivos:	Platano - Yuca Naranja
Estado:	Buen Estado
# de cultivos en total:	30 m/s.
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	Todo los 30 m/s ☐ ☐

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. SI 2. NO

3. Cual? Construccion de la vivienda

4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención? 3 años.

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ
ACTA DE VECINDAD INICIAL	CVS
PROCESO	
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

La vivienda tiene las principales Caracteristicas: Es de Bloque Sin repellar. no tiene Ventanas. las puertas son de Madera y Estan Sin Instalar. Techo de Zinc. Hay una sala comedor. Una habitacion. un baño y una cocina al aire libre en la parte de afuera de la vivienda.

El baño esta Sin repello. presenta unas hecos en la Pared El techo del baño es de eternit.

El Piso de la Sala. y la habitacion es liso no se observa con grietas.

en la parte de afuera de la vivienda se observa una grieta. en la pared.

La vivienda esta en buenas condiciones.

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YAREZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1-2
Descripción Habitacion con piso liso y Paredes sin repello una pequeña grieta



Foto No 3-4
Descripción Entrada principal de la vivienda con Sala comedor piso liso techo de Zinc



Foto No 5-6
Descripción techo del baño con cerra- Paredes de bloque sin repello y Unos en la pared pisos rotos



Foto No 7-8
Descripción Se observa pared con grieta cocina en la Parte posterior sin piso solo tierra

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA TAREZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO		

Foto No____
Descripción _____

Foto No ____
Descripción _____

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Chinigadon, a los 27 días del mes de Enero de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Nikolle tatiana Jeterva G.
(Nombre) Nikolle tatiana Jeterva G.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Contratista

(Firma) Filadelfo Muñoz
(Nombre) Filadelfo Muñoz
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

FECHA			CONTRATO OBRA No 060-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No. 063 DE 2024.	ACT No: 1	OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL BIJAO Y LA VEREDA EL UVAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DD	MM	AA				
27	01	2025				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Fany Mirtle Montalvo López
CC propietario	43.048.380
Teléfono	3233726239
Correo electrónico	
Dirección	cl 15a 1-35
Long. del frente (mts)	39 mts.
No. de pisos	1
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☑	
2. Alcantarillado	☐	☑	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción			#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garaje	

ACCESOS VEHICULARES

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI ☐ NO ☑

Tipo de Cultivos:	N/A
Estado:	N/A
# de cultivos en total:	N/A
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	☐ ☐

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. Si 2. No

3. Cual? N/A.

4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención?:

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD INICIAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	CONSORCIO PUNTA YAREZ CVS	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

la vivienda tiene las principales características: es de color verde, puerta de madera color caoba, ventanas de vidrio con madera. Piso de cemento, se observa la terraza con grietas. los pisos, las paredes las habitaciones: los pisos y las paredes presentan grietas tiene techo de eternit. la sala comedor están unidas y la cocina esta ubicada en la parte exterior; al aire libre. Cocina con leña.

la vivienda tiene 4 habitaciones y en la actualidad solo estan ocupando una. donde duermen los propietarios de la vivienda la Sra: Fany y su esposo.

tienen un baño pero este no tiene pozo septico para hacer las necesidad fisiologicas

En la parte de atras de la vivienda tienen un Rancho de palma el cual una parte tiene piso que presentan grietas y la otra parte de tierra.

El techo de la vivienda es de zinc.

En general la vivienda no esta en optimas condiciones

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1-2
Descripción Sala comedor con grietas en las paredes y piso con grietas.



Foto No 3
Descripción El piso y paredes de la habitacion con grietas





Foto No 4-5
Descripción el baño paredes con grietas Sin sanitarios





Foto No 6-7
Descripción Cocina en el patio. Piso de tierra con grietas

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA TANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO		

Foto No ___
Descripción _____

Foto No ___
Descripción _____

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Ciénaga Magdalena a los 27 días del mes de Enero de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Nikolle tatiana Tetecua. Nikolle-tatiana Tetecua6.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Interventoría

Vo.Bo
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Contratista

Profesional social - Interventoría
(Firma) Jorge Montes
(Nombre) Jorge Montes
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO

ACTA DE VECINDAD INICIAL

PROCESO

Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía

CONSORCIO PUNTA YAMEZ
CVS

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACT No:	OBJETO:
DD	MM	AA				
27	01	2025	CONTRATO OBRA No 060-2024	DE 2024.	1	RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL BIGUI Y LA VEREDA EL USAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YAMEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ezequiel Manuel Caamit López
CC propietario	78.731.371
Telefono	311 401 9311
Correo electrónico	
Dirección	Cl 1Cr 1-33
Long. del Perfil (mts)	No. de casas 1
	Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☑	Cocinan con pipeta de gas propano
2. Alcantarillado	☐	☑	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Sitio de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garaje			

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI ☐ NO ☑

Tipo de Cultivos:	N/A
Estado:	N/A
# de cultivos en total:	N/A
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	N/A ☐

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. SI 2. No

3. Cual? N/A

4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención?:

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD INICIAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

La vivienda tiene las Principales Caracteristicas: Es de color azul - Ventas de madera con vidrio - puertas de madera techo de Eternit - tienen un rancho con techo de palma piso liso. tienen un baño, una cocina, una habitacion los pisos presentan grietas, el Piso de la Ranchita es de tierra. no esta Pareja se observa terminado y con attitapes no tienen taza Sanitaria. el baño solo es para bañarse se observan grietas en la pared de la entrada de la vivienda. y grietas en el Piso de la entrada de la terraza el Piso del baño Presenta Grietas
el patio tiene una ranchita con techo de palma
la vivienda una parte Esta en buenas condicionesy la otra no se observa en optimas condiciones

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YAREZ C/S	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		





Foto No 1-2
Descripción Piso de la terraza Presenta Grietas





Foto No 3-4
Descripción La cocina es interna de la vivienda y cocinan con gas de bipata (propano)





Foto No 5-6
Descripción La habitación en malas condiciones, El techo: El PVC tiene grietas sin taza Sanitaria





Foto No 7-8
Descripción El Rancho es de Palma - Pisos de tierra

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YAREZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO		

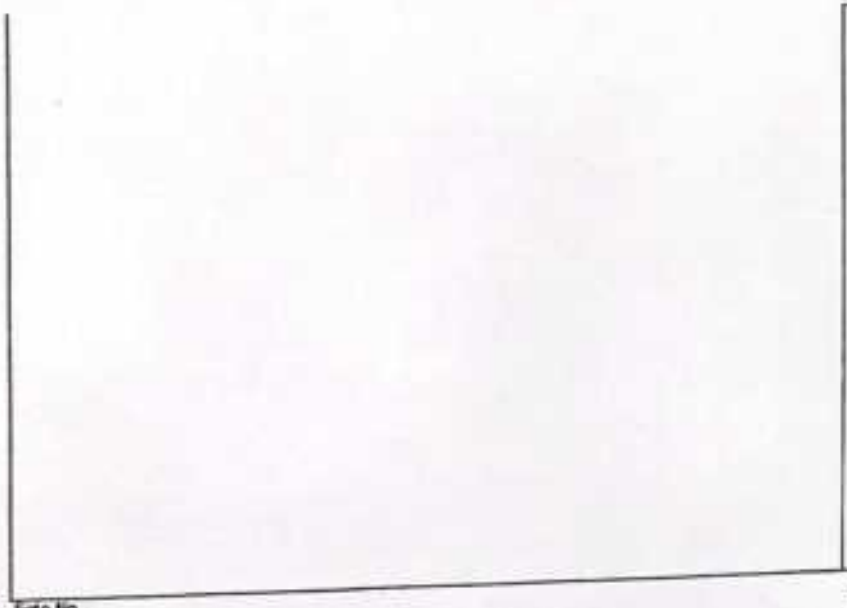


Foto No ___
Descripción _____

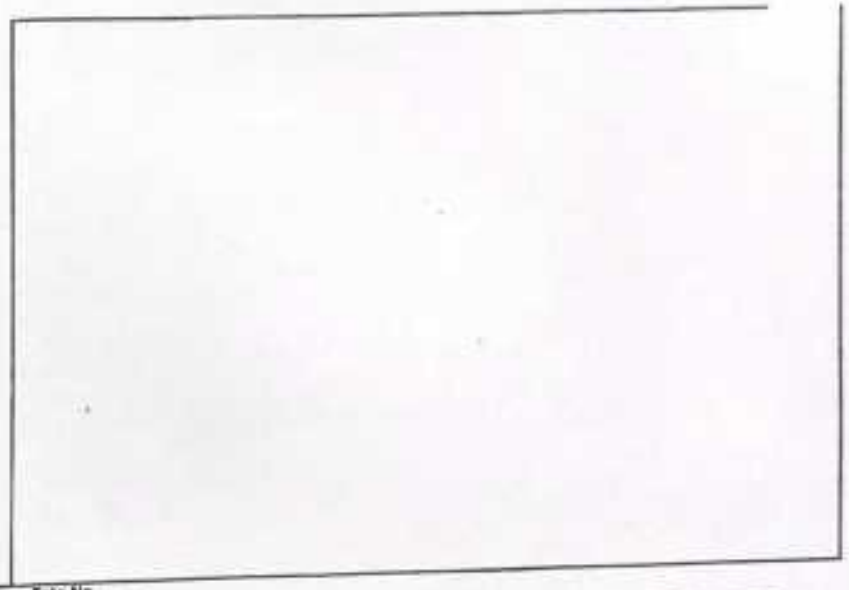


Foto No ___
Descripción _____

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Ciénaga de Oro a los 27 días del mes de enero de 2015

ELABORÓ:
(Firma) Nikolle Tatiana Tetuan6.
(Nombre) Nikolle Tatiana Tetuan6.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - interventoria

Vo.Bo
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Contratista

(Firma) Ezequiel Cassel
(Nombre) Ezequiel Manuel Cassil
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO

ACTA DE VECINDAD PREDIAL

PROCESO

Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía

CONSORCIO PUESTA YANEZ CVS

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACT No:	OBJETO:
DD	MM	AA				
27	01	2025	CONTRATO OBRA No 060-2024	INTERVENTORIA No. 065 DE 2024.	ACT No: 1	OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL BOLO Y LA VEREDA EL USAL DEL CORREGIMIENTO PUESTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Kendry Del Carmen Cogollo Ruiz
CC propietario: 1068.656.959
Teléfono: 323 726 82 39
Correo electrónico:
Dirección: C/1 CR 1 - 87
Long. del frente (mts): 29 mts 20 Cm Estrato: 1 No. de predio: N/A

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☑	
2. Alcantarillado	☐	☑	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	
9. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Gastro	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☑
Cuantos:
Uso del garaje:
Comercio: SI ☐ NO ☐
Ancho de garaje:

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI ☐ NO ☑

Tipo de Cultivos:	N/A
Estado:	N/A
# de cultivos en total:	N/A
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	☐ ☐

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. Si 2. No

3. Cual? N/A

4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención?

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD INICIAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	CONSORCIO PUNTA YAREZ CVS	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

La vivienda tiene las principales caracteristicas: Es de ladrillos techo de zinc- piso de tierra- puertas de maderas. Ventanas de maderas, se observa la parte inferior de la terraza repello no en optimas condiciones- tiene dos habitaciones, dos cocinas una interna y la otra Externa. El comedor esta en la parte exterior- pisos de tierra.

tiene un baño, con sanitario (letrina) las paredes del baño en la parte interna izquierda presenta grieta.

El zinc presenta deterioro (oxido).

El baño esta sin repellar- piso Bruto.

La parte interna de las paredes de la vivienda estan sin repellar.

La vivienda se observa en Buenas condiciones.

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YAREZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1-2
Descripción Piso de tierra - Se observa el tbo en malas condiciones



Foto No 3
Descripción La habitacion Piso de tierra, Paredes de ladrillo Sin grieta



Foto No 4-5
Descripción Hay dos cocinas las cuales funcionan en optimas condiciones ambas sin pisos



Foto No 6
Descripción El baño presenta Grieta en la parte interna la de lizquierdo. Sin Repello piso Bruto.

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO		

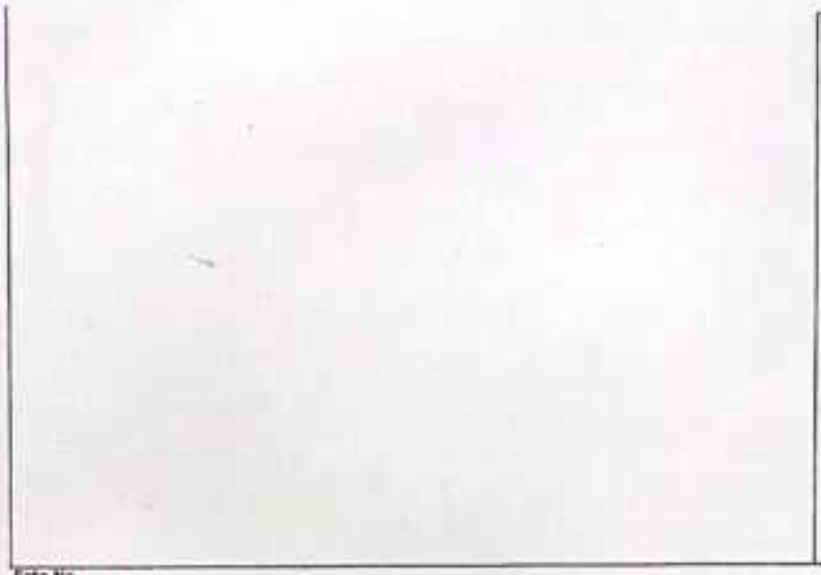


Foto No.____
Descripción _____

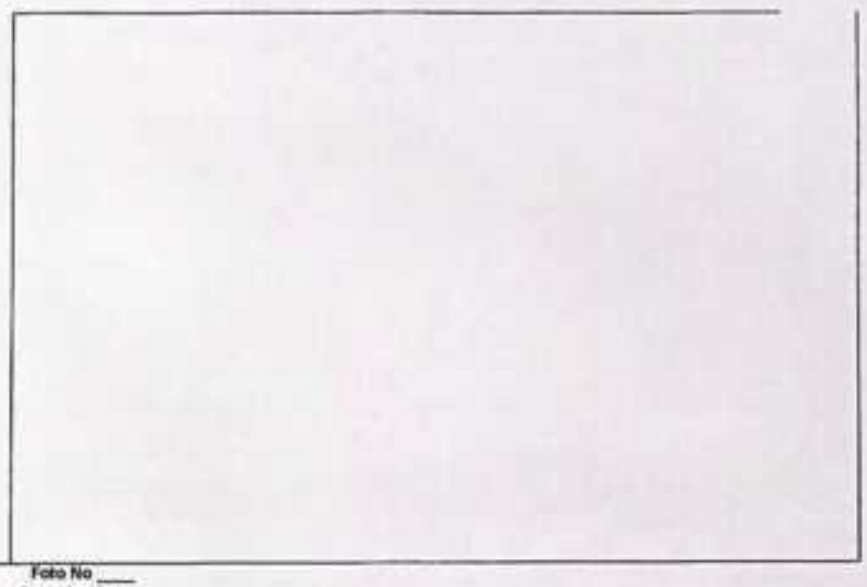


Foto No ____
Descripción _____

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Ciénaga de oro a los 27 días del mes de Enero de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Nikolle tatiana fetecua 6.
(Nombre) Nikolle tatiana fetecua 6.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Interventoría

Vo.Bo
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Contratista

(Firma) Kendri cogollo
(Nombre) Kendri cogollo
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO						CONSORCIO PUNTA YAREZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL							
PROCESO							
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía							
FECHA			CONTRATO OBRA No 060-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No. 063 DE 2024.	ACT No: 1	OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ENFOQUE EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRETINI LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SINÚ Y LA VEREDA EL UGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YAREZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	
DD	MM	AA					
27	01	2025					

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Genesis Carolina Regino Martinez
CC propietario	1.068.651.209
Teléfono	3225047337
Correo electrónico	
Dirección	Cll 1 El Ugal No. de piso 1
Long. del frente (m/a)	8 mts Estado 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☑	
2. Alcantarillado	☐	☑	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garaje			

CULTIVOS

Poseé Cultivos? SI ☑ NO ☐

Tipo de Cultivos:	coco (Tiene 10 matas de coco).
Estado:	Buenas condiciones
# de cultivos en total:	10 matas de coco
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	Estan ubicados a lo orilla del caño

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. SI 2. No

3. Cual? N. A

4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención?

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YAMEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

La vivienda tiene las siguientes Características: Esta Construida en Bloque y la cocina en madera. techo de palma - hay una sala habitación - Sala comedor. No Hay Baño.
el Piso de la cocina y de la habitación presenta grieta donde esta el chiquero que es de palma el Piso es de tierra.
las ventanas son de madera. Puertas de madera.
la vivienda no tiene baño.
Tienen cultivos de lo matas de coco sembrada en la orilla del caño.

La Vivienda se observa en regulares condiciones.

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YAREZ CVS	
ACTA DE VECINDAD VIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1- Foto
Descripción Sala comedor piso con grieta



Foto No 2
Descripción Habitacion el piso presenta grieta



Foto No 3
Descripción El piso de la cocina presenta grieta y las tablas estan separadas.



Foto No 4
Descripción Techo de la vivienda de palma y la otra parte de lamina con tejas de zinc

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO		

Foto No___
Descripción

Foto No ___
Descripción

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Genagadero a los 27 días del mes de enero de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Nikolle Tatiana Feteca G
Nikolle Tatiana Feteca G.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Representante - Interventoría

Vo.Bo
(Firma)
(Nombre)
Representante - Contratista

(Firma) Genesis Regino
(Nombre) Genesis Regino
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO					CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL						
PROCESO						
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía						
FECHA			CONTRATO OBRA No 060-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No. 065 DE 2024.	ACT No: 1	OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PUESTAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL GIGLIO Y LA VEREDA EL USAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DD	MM	AA				
27	01	2025				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Rosa Pacheco de Osorio
CC propietario	25.869.837
Teléfono	314 836 8370
Correo electrónico	
Dirección:	Cl 1 El Higuel
Long. del frente (mts)	2 mts y 1/2 mts. Estrato 1 No. de predio 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☑	
2. Alcantarillado	☐	☑	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje	

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI ☐ NO ☑

Tipo de Cultivos:	N/A
Estado:	N/A
# de cultivos en total:	N/A
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	☐ ☐

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. Si ☑ 2. No

3. Cual? cobra el techo de zinc a la vivienda

4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención? Hace 3 meses

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD RADAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Las vivienda tiene las Principales caracteristicas: esta Pintada de Blanco con Verde, Paredes de concreto, Piso Bruto, Techo de Zin. tiene Sala y Comedor, hay dos Habitaciones, no tiene taza Sanitaria tiene una cocina en la Parte Exterior de la vivienda el techo de la cocina es de Palma y no esta con paredes de Concreto. las Puertas y ventanas son de madera

las paredes estan con grafiti en la Sala comedor. Habitacion frente de la vivienda en las partes Exteriol.

En el patio tiene una Ranchita de Zin techo de palma el baño esta Construido en material de Bolsa solo para bañarse.

la cocina en la Parte Exteriol.

la casa no se encuentra en optimas condiciones.

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YAREZ CVS	
ACTA DE VECINDAD PREDIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1-2
Descripción Piso de Suelo - Techo colocado hace 3 meses



Foto No 3-4
Descripción Paredes de la sala y Patio con grietas



Foto No 5-6
Descripción Pared de las habitaciones con grietas



Foto No 7-8
Descripción Cocina de Palma - Rancho de Palma Piso de tierra -

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD BARCIAL PROCESO	CONSORCIO PUNTA YAREZ CVS	

Foto No____
Descripción _____

Foto No ____
Descripción _____

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Cienaga de oro a los 27 días del mes de enero de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Dikelle tatiana Feteva G.
(Nombre) Dikelle tatiana Feteva G
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Interventoría

Vo.Bo
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Contratista

(Firma) Rosa P deosorio
(Nombre) Rosa Pacheco de Osorio
Propietario

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°060.**	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Socializar el contrato de obra N°060 de 2024 suscrito entre consorcio Punta de Yánez CVS y la corporación autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge -CVS, cuyo objeto es RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YÁNEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

TEMAS TRATADOS	
1	Saludos de bienvenida a los asistentes, invitados y comunidad en general
2	Socialización del contrato de obra N°060 de 2024, presentación del equipo de trabajo
3	Inquietudes de la comunidad y cierre.

DESARROLLO DE AGENDA

Se dio inicio a la socialización siendo las 3:00 PM, la coordinadora del contrato de obra N°060 de 2024, brinda el saludo de bienvenida y hace la apertura de la reunión, a todas las personas presentes, actores locales, miembros de la JAC, lideres comunitarios y comunidad en general.
Seguido de esto, la supervisión CVS y contratista dieron a conocer el alcance del proyecto:
RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
El alcance del proyecto:

- Intervención de 4.440 metros de longitud localizados entre la vereda el salado del corregimiento el Siglo y la vereda el Higal del corregimiento Punta Yánez en los cuales se realizará la optimización de la sección transversal del caño aguas prietas
- 228.449 m3 de extracción de material y sedimentos con el fin de aumentar la capacidad hidráulica del caño aguas prietas
- Conformación 15.005 m3 para diques y dentellones a máquina con material seleccionado de la excavación
- Instalación de revestimiento RIP RAP para protección de taludes (4.509 m3), el cual consiste en la colocación de Geotextil seguido de piedra rajón.
- Realización de talleres de sensibilización en manejo de residuos sólidos (10) y sensibilización en el cuidado de las obras (2)

Así mismo, se dieron a conocer los entregables, productos, servicios o resultados que se generaran con la ejecución del proyecto.

NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DEL PRODUCTO	CANTIDAD META DEL PRODUTO
Servicio de dragado (Producto principal del proyecto)	Volumen del dragado	228.449
Servicio de educación informal	Numero de personas	100

En ese mismo orden, se socializaron los objetivos que busca el proyecto como son:

- Mejorar la conectividad hidrológica y ecosistémica del caño aguas prietas.
- Mejorar la calidad de vida de la población ubicada en la zona de influencia del caño aguas prietas en el tramo a intervenir.
- Contribuir en el aumento de la productividad de las actividades realizadas por la comunidad en su diario vivir
- Disponer de infraestructura adecuada para la gestión del riesgo alrededor del agua
- Mejorar la calidad de agua del caño aguas prietas.

Se recalcó, que con la implementación del proyecto se busca beneficiar a la comunidad, esto para evitar inundaciones en tiempos futuro, para esto la comunidad deben cuidar el caño de aguas prietas, para evitar se contamine evitando arrojar basura al caño.

En el desarrollo de la socialización también se describieron las ventajas que trae el proyecto a la comunidad como son:

- Reducción de la sedimentación en taludes y fondo del caño aguas prietas.
- Disminución del impacto generado por la temporada de lluvias en la comunidad.
- Aumento de la capacidad hidráulica del cauce.
- Se mejora la dinámica hídrica entre el sistema de humedales y la red de drenaje conformada por otros cuerpos de agua como el Arroyo Trementino, el Caño Sierra Chiquita, entre otros.
- Se incrementa el conocimiento y la cultura ambiental de las comunidades.

También se conversó, que todo esto se logra con la responsabilidad y conciencia de cuidado de su entorno de parte de la comunidad.
Seguidamente el ing. Informa de donde inicia el proyecto:
Se informó que el proyecto se implementará entre la vereda El Salado y la vereda El Higal del municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba.

Por medio del plano se dio a conocer el inicio del proyecto.

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°060.**	




Se mostró por medio de imágenes, el esquema de la obra que se llevará acabo en el caño de aguas prietas, el cual se desarrollará entre la vereda El Salado y la vereda El Higal del municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba.

ESQUEMA DE LA OBRA



Sección transversal

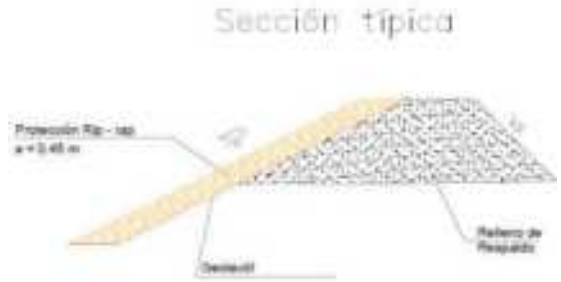

Revestimiento en taludes

También se socializó los contratos suscritos para la ejecución del proyecto.

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°060.**	

Se les socializó el numero del contrato, quienes son los contratistas a cargo del proyecto, el objetivo, valor del contrato, el plazo para la entrega del contrato y las fechas de inicio, todo esto con el fin que la comunidad en general tenga conocimiento del desarrollo del proyecto.



No.	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO	FECHA DE INICIO
060-2024	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ENFOQUE EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$ 8.031.375.289,0	Prorroga 03 de octubre de 2025	03 / DIC / 2024
060 de 2024	CONSORCIO AUTEX RECUPERACION	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACION ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA TOTAL	$ 509.422.340 $ 8.540.797.629	Prorroga 03 de octubre de 2025	04 / DIC / 2024

Se dieron a conocer las situaciones que se han evidenciado antes del inicio del proyecto:

- Se presenta acumulación de residuos que disminuyen la capacidad hidráulica del cauce, generando encharcamientos, desbordes e inundaciones
- Se encontraron tapones de material vegetal, sedimentos, residuos sólidos y troncos caídos que no permitían el flujo normal del agua, lo que causaba que el agua no circulara adecuadamente
- Conforme los modelos hidráulicos, el nivel de las aguas supera los bordes del cauce, lo que genera desbordamientos e inundaciones en la zona
- El fondo del cauce es irregular y presenta tramos en contra pendiente que no permiten el normal flujo del agua
- Se evidencia ausencia de mantenimiento periódico del cauce
- Existe una gran cantidad de árboles que deben ser intervenidos.

Del mismo se conversó sobre las situaciones que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto como son:

- Altos niveles de agua en el caño que imposibilitan el ingreso de maquinaria
- En el primer mes de ejecución del proyecto se adelantan labores preliminares de replanteo, trabajo social, acercamiento a las comunidades, socialización y conformación de veedurías ciudadanas
- Fuertes precipitaciones en la región

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°060.**	

La comunidad escuchó muy atenta la socialización del proyecto y se mostraron receptivos y agradecidos con el consorcio Punta Yánez CVS y la CVS, por el proyecto que se va ha ejecutar en el caño de Aguas Prietas, el cual es un beneficio para toda la comunidad, debido a que va ayudar a evitar inundaciones y así los cultivos no se pierden- voz de un participante de la comunidad.

Por otro lado, el delegado de la veeduría ciudadana, hizo su intervención, manifestando que, terminada la socialización del proyecto, la asamblea elige la veeduría ciudadana, para que las personas que estuvieran interesadas quedaran atentas.

Finalmente, surgieron preguntas e inquietudes de parte de la comunidad, a las cuales se les dio respuestas, relacionadas con los árboles que se corten en el desarrollo del proyecto, se le entregaron respuestas que estos serán utilizados para las necesidades de la comunidad como arreglo de puente entre otras.

En la socialización estuvieron presentes delegados de la personería y de planeación municipal y personal de la comunidad de incidencia en el proyecto.

Se hizo el cierre del espacio, agradeciendo a los-as presentes por la atención prestada, la socialización se dio por terminada a las 5:30 PM

	Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)	
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
-Responsabilidad de la comunidad en desarrollar practicas de cuidado y consciencia ambiental para la conservación y mantenimiento del caño aguas prietas. -Cumplimiento del contratista	A lo largo del desarrollo del proyecto, para que sea sostenible.	Comunidad beneficiada. Consorcio contratista.

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°060.**	









Socialización del contrato de obra N°60 de 2024 suscrito entre consorcio Punta de Yánez CVS y la corporación autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge -CVS,

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE REUNIÓN**	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

Fecha	Dia	Mes	Año	Hora de inicio	3:00 PM	Hora de finalización	5:30PM
	31	01	2025				

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos	Cargo	Cédula	Firma
Efren López Cogollo	Sec. Planeacion	1007153041	
Raquel Flórez V.	Sec. Planeación	1068.666.600	
Gustavo D.	Asocomunal	70 050 807	
Victor Rocno	Aspromhigal	78036.603	
Juan Flórez	Concejal	2. 760 087	Juan Flórez Ruiz
Manuel Causil	Capitan	2.761.598	Manuel C.
Angel Lopez M.	Aspromhigal	1.064.981366	angel lopez
Sixto A. Martinez	Aspromhigal	2.786.350	Sixto Martinez
Pedro Causil M.	Aspromhigal	2.784418	
Andres Martinez	Aspromhigal	2.761.765	Andres M
Edinson Mejia	Aspromhigal	2.759.717	Edinson Mejia
Orlando Pacheco	Aspromhigal	2753569	
Demer Arguello	Miembro Comunidad	1.007.152.359.	Demer Arguello.
Francisco Flórez	Miembro comunidad	78.035.509.	

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE REUNIÓN**	

Fecha	Dia	Mes	Año	Hora de inicio	3:00 PM	Hora de finalización	5:30 PM
	31	01	2025				

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos	Cargo	Cédula	Firma
Hader Rivero	Miembro comunidad	1.007.152632	Hader Rivero
Salomon Coronado	Miembro comunidad	78.028.296	Salomon Coronado
Maira Martinez	Miembro comunidad	1034577733	Maira Martinez.
Sara Coronado	Miembro comunidad.	25.876.142	Sara coronado
Deivis Coronado	Miembro comunidad.	1003457193	Deivis coronado
Daniel Rosario	Miembro comunidad	78-730.625	Daniel Rosario
Armando Coronado	Miembro comunidad	2-761.879	Armando C.
Sara Rivero	Miembro comunidad	1-007396.189	Sara R.
Harold López	Miembro de la comunidad	27601418	Harold Lopez
Nadid Viggiani	Miembro de la comunidad	78731856	Nadid viggiani
Frey López	Miembro de la comunidad	1068662111	FREY LOPEZ
Carlos Pacheco	Miembro comunidad	1068.666.670	CARLOS PACHECO
Oscar D. Rivero	Miembro comunidad	1.065.292.996	Oscar Coronado
Jorge Udal	Miembro comunidad	78732468	Jorge Udal

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE REUNIÓN**	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

Fecha	Dia	Mes	Año	Hora de inicio	3:00PM	Hora de finalización	5:30 PM
	31	01	2025				

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos	Cargo	Cédula	Firma
Juan A. Mesa	Miembro comunidad	2-758740	Juan Antonio Mesa
Manuel Maldonado A	Rector	2758051	
Juan Bautista B	Miembro Comité	2-755 176	
Francisco Lopez	Miembro comunidad	2-756 347	
Oxendo Martinez	Miembro comunidad	2-787.640	Oxendo martinez
Daniel Rafael R	Asoprohujer	2-757.638	
Estela Martinez	Asoprohujer	1069662522	
Dario Mesa	Miembro comunidad	1-5035189	
Melany Hiela F	Miembro comunidad	52 35354	
Manuel Conde	Miembro comunidad	2-754.684	
Manuel Cantil	Miembro Comunidad	2 754 688	
Jose Lespers	Miembro comunidad	7-377 313	Jose Luis
Luis Roberto Ruiz	Miembro comunidad	6-809690	
Victor Martinez	Miembro comunidad	2-754.684	

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE REUNIÓN**	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	3:00PM	Hora de finalización	5:30PM
	31	01	2025				

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos	Cargo	Cédula	Firma
Enberto H. Polano	Miembro de la comunidad	2.515.121	
Yudis del carmen lopez	Miembro de la comunidad	52698773	Yudis LoPez
Enith ortega	Presidenta JAC	1.007152520	Enith Ortega
Juan jose Verbel	Fiscal JAC	1193214402	Juan Jose Verbel
Maria Diaz G.	Delegada punta yanez	1007596224	Maria Diaz
Arledys Sisaraday	Miembro JAC	50954.462	Arledys Araujo
Filadelfo Hernandez	Miembro de la Comunidad	1.193.059.891	Filadelfo
Yuliethh Moreno	Conciliadora JAC	1192756303	Juliethh Moreno
Everly de la Cruz	Miembro comunidad	1236441334	Everly
wilfindobro	Delegado JAC	2760369	WILFIDO
Rosa Pacheco	Miembro comunidad	25.869.062	Rosa P de osorio
Jose Mejia.	Indigena	2792234	JOSÉ MEJIA
Julio Santos	Indigena	2761123	Julio Santos
Maria Vasquez	Sec JAC	50.650.033	Maria V

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE REUNIÓN**	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

Fecha	Dia	Mes	Año	Hora de inicio	3:00 pm	Hora de finalización	5:30 pm
	31	01	2025				

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos	Cargo	Cédula	Firma
Joselis Mepa	Miembro comunidad	2.788.738	Joselis Mepa
Rafael Rivera	Miembro de la comunidad	78729.541	
Yesenia Rivera	Miembro de la comunidad.	1.068 663429	Yesenia Rivera
Pedro Rivero	Miembro de la comunidad.	78038021	PedroRivero

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA N°060 DE 2024.**	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Elegir democráticamente la veeduría ciudadana, por medio de asamblea comunitaria, con el fin de hacer vigilancia y control social al contrato N° 060 de 2024 suscrito entre el consorcio Punta Yánez CVS y la Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y san Jorge CVS.

TEMAS TRATADOS	
1	Conformación de la veeduría ciudadana, para hacer control social al proyecto N°060 de 2024

DESARROLLO DE AGENDA

PUNTOS DE LA AGENDA:

1. Saludo y bienvenida
2. Socializar el objetivo de la asamblea.
3. Explicación del mecanismo de veeduría ciudadana.
4. Elección de los veedores
5. Aprobación de parte de la asamblea por medio del listado de asistencia.
6. Compromisos.
7. Cierre.

DESARROLLO: Se realizó el espacio de asamblea, dándoles un saludo de bienvenida a todos los-as asistentes al espacio, se agradeció por acudir al llamado.

Así mismo, se explicó el objetivo de la asamblea como es elegir la veeduría ciudadana con participantes de la vereda el Higal, en el marco del contrato N° 060 de 2024 suscrito entre el consorcio Punta Yánez CVS y la Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y san Jorge CVS, cuyo objeto es "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ".

En este mismo sentido, personería municipal explicó a los-as presentes en qué consiste la veeduría ciudadana y por qué es importante conformarla, se les comentó que una veeduría ciudadana, es un mecanismo de participación comunitaria ciudadana, para hacer control social, sobre los bienes y servicios que se ofrecen en el país.

Es un mecanismo de control y seguimiento a los entes públicos, un órgano ciudadano en pro de la lucha Contra la corrupción.

Del mismo, se les mencionó que es importante conformarla debido a que los veedores velan por los intereses y derechos de la comunidad, permiten hacer control social, garantizando el cuidado de lo público, las veedurías permiten mejorar la calidad de vida y desarrollo comunitario.

Se explicó que los veedores se vinculan de manera libre y voluntaria, las veedurías son organizaciones sin ánimo de lucro, no gubernamentales y estos se deben elegir democráticamente.

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA N°060 DE 2024.**	

Se argumentó que los veedores deben contar con vocación de servicio, interés de ayudar a la comunidad, deben ser consciente de la seriedad, responsabilidad y compromiso sin esperar nada a cambio, ni remuneración económica.

Seguido de haber explicado el concepto de veeduría ciudadana, se motivó a los-as presentes a postularse como veedores, una vez postulados los veedores e identificar que no estén impedidos para ejercer los cargos, la asamblea eligió y aprobó los veedores por medio del listado de asistencia.

En este orden de ideas, la veeduría quedó de esta manera:
Presidente: Orlando Pacheco
Vicepresidente: Pedro Manuel Causil
secretario: Ana Milena López Fuentes
Vocal-1: Luber Manuel Ortega Regino
Vocal-2: Víctor Manuel Moreno Estrada

Una vez elegidos los veedores, se explicó a la comunidad, que conformar e inscribir la veeduría requiere un trámite como es levantar un acta de constitución con el nombre de los integrantes elegidos veedores, sus documentos de identidad, el objeto de la vigilancia de la veeduría, el nivel territorial, la duración, el lugar de residencia, se debe radicar el acta de constitución en la personería municipal y que los veedores elegidos serán capacitados por la personería municipal.

Una vez, explicado lo anterior, los veedores elegidos suministraron sus documentos de identidad, dirección, correos electrónicos, números de contactos y procedieron a firmar el acta de constitución.

Finalmente, se hizo el cierre de la asamblea agradeciendo a la comunidad por la participación en el proceso de elección de la veeduría.

	Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)	
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Los veedores deben asistir a capacitación en la personería municipal de Ciénaga de oro. -Hacer el radicado del acta de constitución de la veeduría- Recuperación ecosistémica de un tramo del caño aguas prietas vereda el Higal.	De manera inmediata	Veedores elegidos en el marco del contrato de obra N°060 de 2024.

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA N°060 DE 2024.**	

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





Elección de veeduría ciudadana en el marco del contrato de obra N°060 de 2024.

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de veeduria en el marco del proyecto recuperacion ecosistemica con enfasis en caracterizacion Hidrologica de entorno del caño Agues Prieta locadia entre la ciudad de Sahagun y la vereda Hojas C. Poligono

Objetivo de la Reunión: Eleccion de un grupo de personas con el fin de hacer parte del control social, para vigilar el proyecto que se llevara acabo en la caño de Agues Prieta

Lugar: I.E. Punta de Yanez Sede el Higuero	Fecha: 31-01-2025	Hora: 3:00 PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Evelys de la Cruz	1.236.44.334	Miembro Comunidad	323 7676580		Evelys
Wilfrido López	2760369	Delegado SAC	3042739063		Wilfrido
Rosa Pacheco de Osorio	25.869062	Miembro Comunidad	3234184765		Rosa P de Osorio
JOSÈ MEJIA	276723	Indigena	3234184165		JOSÈ MEJIA
Julio Yuncos	89792734	indigena	3234048730		Julio Yuncos
maria b Vasquez	50650033	Secretaria SAC	3234048730		maria b vasquez
Efren H López Cogollo	1007152041	Sec. Planeación M	3043450863		
Raquel J. Pérez Villero	1.068.666.600	Sec planeación M	3004590080		Raquel Pérez V.

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de veeduria en el marco del Proyecto Recuperacion ecosistemica con enfoque en conectividad Hidrologica en el frente del caño de Aguas Prieta localizado a la derecha del Salado conjunto el Big Le y hacienda el Miral Alto Playon

Objetivo de la Reunión: Eleccion de un grupo de personas con el fin de llevar parte del control social para vigilar el proyecto que se llevara acabo en el caño de Aguas Prieta

Lugar: I.E Punta de yanez sede El Hgl **Fecha:** 31-01-2025 **Hora:** 3:00PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Gustavo Jaramillo M.	70.060.507	Asocomunal	3107400051	gdvarongoss@gmail.com	
Victor Moreno	78036605	Aspromhigul	3106779587	victor766m	
Juan Florez Ruiz	2-760.087	COPREGLBOR	3116800166		Juan Florez Ruiz
Manuel Causil P.	2.761598	Capitan	3105495576		Manuel C.
Angel Lopez Mejia	1066991366	Aspromihgul	3213318820		Angel Lopez
Arfo Antonio Pacheco	2.756.350	Aspromihgal	3		Sixto Martinez
Pedro Causil Haeca	2.764.418	Asprohigal	3137621400		Pedro Causil
Andres Pacheco D.	2.761.765	Asprohigal	3137621400		Andres M.

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de veedores en el marco del proyecto recuperacion ecosistemica con enfasis en caracterizacion hidrologica de un tramo del caño de Aguas prietas localizado entre la vereda el Salado y el higal corregimiento de Punta Yanez		
Objetivo de la Reunión: Eleccion de un grupo de personas con el fin de hacer parte del control social para apoyar el proyecto que se llevara acabo en el caño de Aguas prietas		
Lugar: I.E. punta de yanez sede el Higal	**Fecha:** 31-01-2025	**Hora:** 3:00 PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Edinson Hoyos Machado	2.769.717	Asoprohigal	3207095167		Edinson Hoyos M.
Orlando Cesa Pacheco	2.763.569	Asoprohigal	3207095167		Orlando Cesa
Deiner Argumedo L.	1.007.152.359	Miembro Comunidad	350 245 32 94		Deiner Argumedo
Hader Rivero	1.007.152.632	Miembro comunidad	320 625 23 54		Hader Rivero
Francisco Flórez	78.035.509.	Miembro Comunidad	3209078312		Francisco Flórez
Salomon Coronado	7903824	Miembro Comunidad	3120208225		Salomon Coronado
Maira Martinez	1034577...	Miembro Comunidad	304 680 8675		Maira Martinez
Sara Victoria Coronado	25876142	Miembro Comunidad	3233559691		Sara Coronado

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de vereda en el marco del proyecto recuperacion ecosistemica con enfasis en conocimiento Hidrologico de un tramo del caño de Agua Prieta entre la vereda de Sulao y El Hogal corregimiento de Juan Arias		
Objetivo de la Reunión: Eleccion de un grupo de personas con el fin de hacer parte del Comité Seco del Rio Arias el proyecto que se llevara acabo en el caño de Agua Prieta		
Lugar: I.E. punta de yanez del Hogal	**Fecha:** 31-01-2025	**Hora:** 3:00 PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Deivis Coronado	1003454793	Mesa de Comité	3232940977		Deivis Coronado
Daniel José Rosario	78730625	Mesa de comité	3205706229		Daniel Rosario
Armando Coronado	2.761.879	Mesa de comité	3248145046		+ Armando C.
Jose Bueno	1007396189	Mesa de comité	3113404039		
Manuel Lopez	2760111 8	Mesa de Comité	3248141942		+ Manuel Lopez
Nadiol Viggiani	78731856	Mesa de comité	3012312279		Nadiol Viggiani
Frey López	1068662111	Mesa de comité	3234162844		+ Frey López
Carlos Pacheco	106866650	Mesa de Comité	3237676677		Carlos Pacheco

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de veedores en el Tramo del Proyecto recuperacion ecosistemica con enfasis en conectividad Hidrologica de un tramo del Caño de Agua Nueva entre Vereda el Salto y El Higal C.P Yanez		
Objetivo de la Reunión: Elegir de un Grupo de personas con el fin de hacer parte del control Social para vigilar el proyecto que se llevara acabo en el Caño de Agua Nueva		
Lugar: La punta de yanez Sde Higal	**Fecha:** 31-01-2025	**Hora:** 3:00PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Oscar david rivero correa	1.065242996	Miembro comunidad	3105274465		Oscar Coronado
Dorfa vida	58732468	Miembro comunidad	3002368336		Dorfa vida
Juan Antonio Mejia	2758740	Miembro comunidad	316 346 8457		Juan Antonio Mejia
Manuel Villadiego A	2758051	Sdcordoba	3107132674	villadiegomanuel@yahoo.es	
Juan Bautista Bolaño	2.755.176	Miembro Comunidad	3227755176		
Francisco Bolaño López	2.756.317	Miembro comunidad	3163465457		
Olvendo Martinez	2.757.640	Miembro comunidad	3227755176		Olvendo martinez
Daniel Rafael M	2.757.638	Asprom higal	3023072308		Daniel M

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de la vereda en el Tramo del proyecto recuperacion ecosistemica con enfasis en arqueologia Historica de entorno del caño de Agua Prieta entre Vereda el Salo y El Higal Cor. Puntagudo		
Objetivo de la Reunión: Eleccion de un Grupo de personas con el fin de hacer parte del control social para Vigilar el Proyecto del caño de Agua Prieta		
Lugar: I.E. Punta de Yanez y de Higal	**Fecha:** 31-01-2025	**Hora:** 3:00 PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
+Estela Martinez B	1068662527	ASPROM Higal	3003072308	mabe-10@Hotmail.es	Estela
David Mejia	1603547189	Miembro Comunidad	3125595586		David Mejia
Helangi Haila de	5235354	Miembro Comunidad	3125595586		Helangi H.
Manuel Gonzalez	78759.744	ASPROM Higal	3046522608		Manuel Gonzalez
Victor Nieto	78731855	Comite deporte	3001127690		Victor Nieto
Manuel E. Causil	2754.684	Miembro comunidad	3152858818		Manuel Causil R.
Jose Luis Perez	7397313	Miembro comunidad	3186244229		Jose Luis Perez
Luis Roberto Ruiz Fernandez	6.899.690	Miembro Comunidad	3002306866		Luis Roberto Ruiz F.

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS **ASISTENCIA**	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

TEMA: Eleccion de la veeduria de un frente del proyecto recuperacion ecosistema con enfasis en Compensacion Ambiental de un frente del canal de Aguas arriba entre la cienaga del Sello y El Higal-Puntas Social y ejecucion del proyecto del canal de Aguas arriba

Objetivo de la Reunión: Eleccion de un grupo de personas con el fin de hacer parte del Control Social a ejecucion del proyecto del canal de Aguas arriba

Lugar: I.E. Punta de Yanez Sector El Higal **Fecha:** 31-01-2025 **Hora:** 3:00 PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
JOSE LUIS HEJIA GARABALLO	2758738	Miembro Comunidad	3133151101		Jose Luis Hejia
RAFAEL RIVERO	78.729.541	Miembro Comunidad	3217887762		
Yesenia Rivero Lopez	1068663429	Miembro Comunidad	3217887762		Yesenia Rivero
pedro rivero	78038021	Miembro comunidad	3145553141		pedro rivero

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de la vocalia de un tramo del proyecto de asistencia con enfasis competitividad de la Hidrologica de un tramo del canal de Aguas Prieta - Varcel de Julao y El Hijar Concejo Alto de Aguas Prieta		
Objetivo de la Reunión: Eleccion de un Jurado de persona para tener fuente del control Social y vigilar el proceso de Aguas Prieta		
Lugar: Inspección de Puerto de San Angel	Fecha: 31-01-2025	Hora: 3:00 PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Enberto M. Rosario Pajaro	2.515.121	Elector de la Comunidad	3006241116		
Yudis del Carmen Lopez	52698793	Elector de la Comunidad	3116811847		Yudis Lopez
Enith Ortega	1007152520	Presidenta JAC	3022411506		Enith Ortega
Juan Jose Verbel M.	1193214402	Fiscal JAC	3022411506		Juan Jose Verbel
Maria Diaz Guzman	1007596224	Habitante Punta de Yanez	3003633626		Maria Diaz
Arledys Josefa Araujo V	50.954.462	Habitante de la Comunidad	3113066773	proyectos.arledysjosefa	Arledys Araujo
Filomeno Muñoz	11	Miembro Comunidad	3237676580		Filomeno Muñoz
Yuneth Moreno Villalba	1192756303	Conciliadora JAC	3016556719	morenovillalbayuneth	Yuneth Moreno

Powered by CamScanner

Ciénaga de Oro, 31 de Enero de 2025

Doctora:
NAZLY PAOLA CHAAR MONTES
Personera de Ciénaga de Oro
Ciudad

ASUNTO: Solicitud de Reconocimiento e Inscripción de Veeduría Ciudadana.

Respetuoso Saludo,

Respetada Dra. NAZLY PAOLA CHAAR MONTES, la presente tiene como fin solicitarle el Reconocimiento e inscripción de la Veeduría Ciudadana Recuperación Ecosistemica de un tramo del caño aguas prietas en la vereda a Urrsal para el ejercicio de control social al **CONTRATO DE OBRA 060-2024 "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".** En el registro público de Veedurías de acuerdo a la facultad otorgada por el ARTICULO 3 DE LA LEY 850 DE 2003 a las Personerías Municipales.
Teniendo en Cuenta los principios rectores de *Democratización, Autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, eficacia, objetividad y Legalidad* establecidos en la Ley por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas Ley 850 DE 2003.

Atentamente,

Nombre Orlando Pacheco
C.C. 2759569.

Powered by CamScanner

CONSTITUCIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANÍA

Los suscritos Ciudadanos del **Municipio de Ciénaga de Oro**, residentes de la vereda el Higal, corregimiento de Punta Yánez, perteneciente a la cabecera municipal, reunidos hoy treinta y uno (31) de Enero del año 2025, en la Institución Educativa de Punta de Yánez, sede el Higal de este municipio, manifestamos la intensión de conformar una **Veeduría Ciudadana** para el contrato de obra **No. 060-2024 de 2024** suscrito entre **CONSORCIO PUNTA DE YÁNEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS** cuyo objeto es La **"RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"** y ejercer vigilancia sobre la gestión pública, de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes sobre participación social y ciudadana.

CONSIDERANDO

1. Qué la constitución política de 1991, fundada en claros principios de democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.

2. Qué el derecho constitucional facilita la participación ciudadana para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos para que las entidades y organizaciones de la sociedad civil lo ejerzan en forma autónoma e independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y propositivo.

3. Que la Ley 134 de 1994 sobre los mecanismos de participación ciudadana en su artículo 100, se refiere a las veedurías así: "Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancias a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos.

4. Que la Ley 850 de 2003 autoriza que los ciudadanos se organicen en veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre la administración pública. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y la Ley que reglamenta el artículo 270 de la Constitución Política.

5. Que el artículo 4 de la Ley 850 de 2003 establece que las veedurías ciudadanas podrán vigilar especialmente:

   - La correcta aplicación de los recursos y la forma como estos se asigne de acuerdo con la ley y lo planeado.

Powered by CamScanner

- La cobertura efectiva de beneficiarios, conforme a la Ley y los planes.
- La calidad, oportunidad y efectividad de la intervención pública.
- La calidad, oportunidad y efectividad de la contratación pública.
- La diligencia de las autoridades en garantizar los objetivos del Estado.

Que la población reunida considera de especial importancia hacer seguimiento a la ejecución del Contrato de obra **No. 060 de 2024** suscrito entre **EL CONSORCIO PUNTA YANÉZ CVS Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE-CVS** cuyo objeto es **"RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

DECLARAN

ARTICULO PRIMERO: Constituirse de manera autónoma e independiente en una **Veeduría Ciudadana** conformada por los habitantes residentes de la vereda el Higal, corregimiento de Punta Yánez, durante Diez **(10) meses**, con el objeto de Vigilar el contrato de obra **No. 060 de 2024 "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**

ARTICULO SEGUNDO: Que su acción en el ejercicio constitucional de participar en la vigilancia y fiscalización de la gestión se regirá por los principios de representatividad, democratización, autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, neutralidad política y legalidad.

ARTICULO TERCERO: Que sus actos serán públicos y con carácter propositivo y preventivo para evitar la desviación de las acciones y demás aspectos relacionados con esta veeduría y colaborar así en asegurar la eficacia social.

ARTICULO CUARTO: Que su función será autónoma y su finalidad lograr la mayor eficacia y control ciudadano de los PROGRAMAS DE INVERSIÓN SOCIAL.

Powered by CamScanner

ARTICULO QUINTO: Que al ejercer un derecho y deber ciudadano las acciones que adelante la veeduría en ejercicio de la vigilancia y fiscalización de la gestión pública, no generarán para los integrantes de la veeduría ninguna contraprestación económica por parte del estado.

ARTICULO SEXTO: Divulgar masivamente por los medios de comunicación de este sector y del municipio, la presente declaración e informar a la comunidad y a los organismos de control de los resultados de la gestión.

ARTICULO SÉPTIMO: De la constitución de esta veeduría ciudadana se informará a través del depósito de esta acta, a la personería municipal organismo de control que vela porque en el municipio se dé cumplimiento a la participación de la comunidad.

ARTICULO OCTAVO: Vigencia y elección de veedores ciudadanos. El termino de duración de la veeduría ciudadana es de Diez (10) meses.

ARTICULO NOVENO: La asamblea reunida hoy, ha dispuesto elegir como miembros y por un periodo de Diez (10) meses, a los siguientes ciudadanos, quienes aceptan el cargo y declaran bajo gravedad de juramento no encontrarse impedidos para ejercerlo:

Cargo	Nombre y Apellido	Dirección	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Presidente	Orlando Pacheco	El Higal Barrio Alfi	3116277101	orlandopacheco276@gmail.com	
Vicepresidente	Pedro Manuel Castro Blanco	El Higal	3137621700	Pedromanuel@hotmail.com	
Vocal 1	Luber Manuel Ortega Negrete	Vereda El Higal	3002204346		
Vocal 2	Victor Manuel Herrera Estrada	El Higal abajo	3106579587	victorm@hotmail.com	
Secretario	Ana Negrete Lopez Fuentes	El Higal	3225497999		

ARTICULO DECIMO: Se fija como datos de contacto

Domicilio de la veeduría: El Higal - Casa del S Orlando Pacheco (Presidente)

Teléfono: 3116277101

Correo Electrónico: Orlandopacheco276@gmail.com

Powered by CamScanner

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Veeduria tendrá como nombre:

Recuperación ecosistémica de un tramo del caño Aguas Prietas, vereda el higal.

No siendo más, el objeto de la presente reunión se dio por terminada a las 5:55 PM.

Para constancia, se firma a los 31 días de Enero del 2025.



Firma Orlando Cesar Pacheco
cc 2753509

Pedro Cavil

Firma
cc 2.754.418

Albeiro ortega

Firma
cc. 1065292971

Jesus Ovalle

Firma
cc 78036663

Ana Milena Fajardo

Firma
cc. 50954479.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 2.753.569
PACHECO DIAZ

APELLIDOS
ORLANDO CESAR

NOMBRES



NO FIRMA
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-1944
CIENAGA DE ORO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.63
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

29-DIC-1965 CIENAGA DE ORO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 2.754.418
CAUSIL MACEA

APELLIDOS
PEDRO MANUEL

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 26-NOV-1949
CIENAGA DE ORO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-MAR-1971 CIENAGA DE ORO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.065.292.971
ORTEGA REGINO

APELLIDOS

LUBER MANUEL

NOMBRES

Luber Ortega

FIRMA





HUELLA DERECHA

FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1964
CIENAGA DE ORO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-SEP-2006 CIENAGA DE ORO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS SALDAÑA VACA



A-1067292971-0036243-M-1065292971-20160907 0062533456A 1 48777763

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 50.954.479

Apellidos
LOPEZ FUENTES

Nombres
ANA MILENA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
F

Fecha de nacimiento
06 AGO 1976

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
CIENAGA DE ORO (CORDOBA)

Fecha y lugar de expedición
31 OCT 1994, CIENAGA DE ORO

Firma

Fecha de vencimiento
28 AGO 2034

ICCOL0535181300130l3<<<<<<<<<<
7608069F3408283COL50954479<<<3
LOPEZ<FUENTES<<ANA<MILENA<<<<<

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de veeduria en el marco del proyecto recuperacion ecosistemica con enfasis en caracterizacion Hidrologica de entorno del caño Agues Prieta locadia entre la ciudad de Sahagun y la vereda Hojas C. Poligono

Objetivo de la Reunión: Eleccion de un grupo de personas con el fin de hacer parte del control social, para vigilar el proyecto que se llevara acabo en la caño de Agues Prieta

Lugar: I.E. Punta de Yanez Sede el Higuero	Fecha: 31-01-2025	Hora: 3:00 PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Evelys de la Cruz	1.236.44.334	Miembro Comunidad	323 7676580		Evelys
Wilfrido López	2760369	Delegado SAC	3042739063		Wilfrido
Rosa Pacheco de Osorio	25.869062	Miembro Comunidad	3234184765		Rosa P de Osorio
JOSÈ MEJIA	276723	Indigena	3234184165		JOSÈ MEJIA
Julio Yuncos	89792734	indigena	3234048730		Julio Yuncos
maria b Vasquez	50650033	Secretaria SAC	3234048730		maria b vasquez
Efren H López Cogollo	1007152041	Sec. Planeación M	3043450863		
Raquel J. Pérez Villero	1.068.666.600	Sec planeación M	3004590080		Raquel Pérez V.

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de veeduria en el marco del Proyecto Recuperacion ecosistemica con enfoque en conectividad Hidrologica en el frente del caño de Aguas Prieta localizado a la derecha del Salado conjunto el Big Le y hacienda el Miral Alto Playon

Objetivo de la Reunión: Eleccion de un grupo de personas con el fin de llevar parte del control social para vigilar el proyecto que se llevara acabo en el caño de Aguas Prieta

Lugar: I.E Punta de yanez sede El Hgl **Fecha:** 31-01-2025 **Hora:** 3:00PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Gustavo Jaramillo M.	70.060.507	Asocomunal	3107400051	gdvarongoss@gmail.com	
Victor Moreno	78036605	Aspromhigul	3106779587	victor766m	
Juan Florez Ruiz	2-760.087	COPREGLBOR	3116800166		Juan Florez Ruiz
Manuel Causil P.	2.761598	Capitan	3105495576		Manuel C.
Angel Lopez Mejia	1066991366	Aspromihgul	3213318820		Angel Lopez
Arfo Antonio Pacheco	2.756.350	Aspromihgal	3		Sixto Martinez
Pedro Causil Haeca	2.764.418	Asprohigal	3137621400		Pedro Causil
Andres Pacheco D.	2.761.765	Asprohigal	3137621400		Andres M.

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de veedores en el marco del proyecto recuperacion ecosistemica con enfasis en caracterizacion hidrologica de un tramo del caño de Aguas prietas localizado entre la vereda el Salado y el higal corregimiento de Punta Yanez		
Objetivo de la Reunión: Eleccion de un grupo de personas con el fin de hacer parte del control social para apoyar el proyecto que se llevara acabo en el caño de Aguas prietas		
Lugar: I.E. punta de yanez sede el Higal	**Fecha:** 31-01-2025	**Hora:** 3:00 PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Edinson Hoyos Machado	2.769.717	Asoprohigal	3207095167		Edinson Hoyos M.
Orlando Cesa Pacheco	2.763.569	Asoprohigal	3207095167		Orlando Cesa
Deiner Argumedo L.	1.007.152.359	Miembro Comunidad	350 245 32 94		Deiner Argumedo
Hader Rivero	1.007.152.632	Miembro comunidad	320 625 23 54		Hader Rivero
Francisco Flórez	78.035.509.	Miembro Comunidad	3209078312		Francisco Flórez
Salomon Coronado	7903824	Miembro Comunidad	3120208225		Salomon Coronado
Maira Martinez	1034577...	Miembro Comunidad	304 680 8675		Maira Martinez
Sara Victoria Coronado	25876142	Miembro Comunidad	3233559691		Sara Coronado

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de vereda en el marco del proyecto recuperacion ecosistemica con enfasis en conocimiento Hidrologico de un tramo del caño de Agua Prieta entre la vereda de Sulao y El Hogal corregimiento de Juan Arias		
Objetivo de la Reunión: Eleccion de un grupo de personas con el fin de hacer parte del Comité Seco del Rio Arias el proyecto que se llevara acabo en el caño de Agua Prieta		
Lugar: I.E. punta de yanez del Hogal	**Fecha:** 31-01-2025	**Hora:** 3:00 PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Deivis Coronado	1003454793	Mesa de Comité	3232940977		Deivis Coronado
Daniel José Rosario	78730625	Mesa de comité	3205706229		Daniel Rosario
Armando Coronado	2.761.879	Mesa de comité	3248145046		+ Armando C.
Jose Bueno	1007396189	Mesa de comité	3113404039		
Manuel Lopez	2760111 8	Mesa de Comité	3248141942		+ Manuel Lopez
Nadiol Viggiani	78731856	Mesa de comité	3012312279		Nadiol Viggiani
Frey López	1068662111	Mesa de comité	3234162844		+ Frey López
Carlos Pacheco	106866650	Mesa de Comité	3237676677		Carlos Pacheco

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de veedores en el Tramo del Proyecto recuperacion ecosistemica con enfasis en conectividad Hidrologica de un tramo del Caño de Agua Nueva entre Vereda el Salto y El Higal C.P Yanez		
Objetivo de la Reunión: Elegir de un Grupo de personas con el fin de hacer parte del control Social para vigilar el proyecto que se llevara acabo en el Caño de Agua Nueva		
Lugar: La punta de yanez Sde Higal	**Fecha:** 31-01-2025	**Hora:** 3:00PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Oscar david rivero correa	1.065242996	Miembro comunidad	3105274465		Oscar Coronado
Dorfa vida	58732468	Miembro comunidad	3002368336		Dorfa vida
Juan Antonio Mejia	2758740	Miembro comunidad	316 346 8457		Juan Antonio Mejia
Manuel Villadiego A	2758051	Sdcordoba	3107132674	villadiegomanuel@yahoo.es	
Juan Bautista Bolaño	2.755.176	Miembro Comunidad	3227755176		
Francisco Bolaño López	2.756.317	Miembro comunidad	3163465457		
Olvendo Martinez	2.757.640	Miembro comunidad	3227755176		Olvendo martinez
Daniel Rafael M	2.757.638	Asprom higal	3023072308		Daniel M

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de la vereda en el Tramo del proyecto recuperacion ecosistemica con enfasis en arqueologia Historica de entorno del caño de Agua Prieta entre Vereda el Salo y El Higal Cor. Puntagudo		
Objetivo de la Reunión: Eleccion de un Grupo de personas con el fin de hacer parte del control social para Vigilar el Proyecto del caño de Agua Prieta		
Lugar: I.E. Punta de Yanez y de Higal	**Fecha:** 31-01-2025	**Hora:** 3:00 PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
+Estela Martinez B	1068662527	ASPROM Higal	3003072308	mabe-10@Hotmail.es	Estela
David Mejia	1603547189	Miembro Comunidad	3125595586		David Mejia
Helangi Haila de	5235354	Miembro Comunidad	3125595586		Helangi H.
Manuel Gonzalez	78759.744	ASPROM Higal	3046522608		Manuel Gonzalez
Victor Nieto	78731855	Comite deporte	3001127690		Victor Nieto
Manuel E. Causil	2754.684	Miembro comunidad	3152858818		Manuel Causil R.
Jose Luis Perez	7397313	Miembro comunidad	3186244229		Jose Luis Perez
Luis Roberto Ruiz Fernandez	6.899.690	Miembro Comunidad	3002306866		Luis Roberto Ruiz F.

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS **ASISTENCIA**	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

TEMA: Eleccion de la veeduria de un frente del proyecto recuperacion ecosistema con enfasis en Compensacion Ambiental de un frente del canal de Aguas arriba entre la cienaga del Sello y El Higal-Puntas Social y ejecucion del proyecto del canal de Aguas arriba

Objetivo de la Reunión: Eleccion de un grupo de personas con el fin de hacer parte del Control Social a ejecucion del proyecto del canal de Aguas arriba

Lugar: I.E. Punta de Yanez Sector El Higal **Fecha:** 31-01-2025 **Hora:** 3:00 PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
JOSE LUIS HEJIA GARABALLO	2758738	Miembro Comunidad	3133151101		Jose Luis Hejia
RAFAEL RIVERO	78.729.541	Miembro Comunidad	3217887762		
Yesenia Rivero Lopez	1068663429	Miembro Comunidad	3217887762		Yesenia Rivero
pedro rivero	78038021	Miembro comunidad	3145553141		pedro rivero

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Eleccion de la vocalia de un tramo del proyecto de asistencia con enfasis competitividad de la Hidrologica de un tramo del canal de Aguas Prieta - Varcel de Julao y El Hijar Concejo Alto de Aguas Prieta		
Objetivo de la Reunión: Eleccion de un Jurado de persona para tener fuente del control Social y vigilar el proceso de Aguas Prieta		
Lugar: Inspección de Puerto de San Angel	Fecha: 31-01-2025	Hora: 3:00 PM

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Enberto M. Rosario Pajaro	2.515.121	Elector de la Comunidad	3006241116		
Yudis del Carmen Lopez	52698793	Elector de la Comunidad	3116811847		Yudis Lopez
Enith Ortega	1007152520	Presidenta JAC	3022411506		Enith Ortega
Juan Jose Verbel M.	1193214402	Fiscal JAC	3022411506		Juan Jose Verbel
Maria Diaz Guzman	1007596224	Habitante Punta de Yanez	3003633626		Maria Diaz
Arledys Josefa Araujo V	50.954.462	Habitante de la Comunidad	3113066773	proyectos.arledysjosefa	Arledys Araujo
Filomeno Muñoz	11	Miembro Comunidad	3237676580		Filomeno Muñoz
Yuneth Moreno Villalba	1192756303	Conciliadora JAC	3016556719	morenovillalbayuneth	Yuneth Moreno

Powered by CamScanner

28 de Febrero de 2025

Señor.
HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
RL. CONSORCIO INTER RECUPERACION

E. S. M.

OF-OBR-018

REF: CONTRATO DE OBRA 060-2024 "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

ASUNTO: Entrega de informe mensual de obra y PGIO N°2

Cordial saludo.

Por medio de la presente se hace entrega del informe mensual de obra y PGIO N°2 del contrato de la referencia que comprende las actividades ejecutadas en el período del 01 de Febrero de 2025 al 28 de Febrero de 2025.

Cordialmente,



CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
NIT. 901.895.986-5
R. L. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

ANEXO 5. BITÁCORA

31 de enero de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Esp. Si y SO (1)
- Esp. Hidraulico (1)
- Esp. Ambiental (1)
- Profesional social (1)
- Ingeniero auxiliar (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (2)

Actividades realizadas

-Se finaliza la actividad de Localizacion trazado y replanteo.

Res. Obra.

Interventoria

1 febrero de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Personal en Obra
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Esp Si y So (1)
- Esp hidraulico (1)
- Esp. Ambiental (1)
- Profesional social (1)
- Ingeniero auxiliar (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios Varios (2)

Actividades realizadas.
- Se inician labores de optimizacion de la seccion hidraulica del cause en tierra desde [redacted] K0+000.

Res Obra

Interventoria

Powered by CamScanner

3 de febrero de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional Social (1)
- Esp. Ambiental (1)
- Esp. Hidraulico (1)
- Esp SI y SO (1)
- Aux. Ingeniera (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios Varios (2)
- Operadores (2)
- Celador (1)

Actividades Realizadas.
- Se continuan actividades de excavación con la retroexcavadora, con la ayuda de la cuadrilla topografica para el correcto chequeo de nivel de excavación.

Res. Obra

Interventoría.

4 de Febrero de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra.
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional social (1)
- Esp Ambiental (1)
- Esp. Hidraulico (1)
- Esp. SI y SO (1)
- Aux Ingeniera (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (2)
- Operadores (2)
- Celador (1)

Powered by CamScanner

Actividades realizadas.
- Se continuan actividades de excavacion con la maquinaria.

Res. Obra | Interventoria.

5 de Febrero de 2025
Estado del Tiempo: Sabado

Personal en obra.
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional social (1)
- Esp. Ambiental (1)
- Esp. Hidraulico (1)
- Esp SI y SO (1)
- Aux. Ingeniera (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (2)
- Operadores (2)
- Celador (1)

Actividades realizadas.
- Se continuan ejecutando actividades de excavacion con las retroexcavadora.

Res. Obra | Interventoria.

Powered by CamScanner

6 de febero de 2025
Estado de tiempo: Soleado.

Personal en obra.
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional social (1)
- Esp. Ambiental (1)
- Esp Hidraulico (1)
- Esp. Si y SO (1)
- Aux Ingeniero (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios Varios (2)
- Operadores (3)
- Celador (1)

Actividades realizadas.
- Se continuan las actividades de optimización de la seccion hidraulico del cauce en tierra.

Res. Obra

Interventoría.

7 de Febrero de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional social (1)
- Esp Ambiental (1)
- Esp Hidraulico (1)
- Esp. Si y So (1)
- Aux Ingenieria (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios Varios (2)
- Operadores (3)
- Celador (1)

Actividades realizadas.
- Se continuan ejecutando las actividades de excavacion con la maquinaria.

Powered by CamScanner

Res Obra Interventoría.

8 de febrero de 2025
Estado del tiempo Soleado

Personal en obra.
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional social (1)
- Esp. Ambiental (1)
- Esp. Hidraulico (1)
- Esp SI y SO (1)
- Aux. Ingeniera (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (2)
- operadores (3)
- Celador (1)

-Actividades realizados.
- Se continuan actividades de excavación con la retroexcavadora, con apoyo de la comitiva topografico para el correcto chequeo del nivel de excavación.

Res Obra

Interventoría.

10 de Febrero de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra (*)
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional social (1)
- Esp Ambiental (1)
- Esp Hidraulico (1)
- Esp. SI y SO (1)
- Aux. Ingeniera (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- oficios varios (3)
- Operadores (3)
- Celador (1)

Powered by CamScanner

Actividades realizadas:
- Se continuan las actividades de optimización de la sección hidraulica del canal en tierra.

Res. Obra

Interventoria.

11 de Febrero de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra.

- Director de obra (1)	- Aux. Ingeniería (1)
- Residente de obra (2)	- Topografo (1)
- Profesional social (1)	- Cadenero (1)
- Esp. Ambiental (1)	- Oficios varios (3)
- Esp. Hidraulico (1)	- Operadores (2)
- Esp SI y SO (1)	- Celador (1)

observación: No se presentó a trabajar un operador de retroexcavadora, solo trabajan dos maquinas.

Actividades realizadas.
- Se continuan ejecutando las actividades de excavación con la maquinaria.

Res obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

12 de febrero de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional social (1)
- Esp Ambiental (1)
- Esp. Hidraulico (1)
- Esp SI y SO (1)
- Aux. Ingeniera (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (3)
- Operadores (2)
- Celador (1)

Observación: No se presentó a trabajar un operador de retroexcavadora, al iniciar actividades de excavación se vara una maquina, solo trabaja una maquina.

Actividades realizadas
- Se continuan ejecutando las actividades de excavación con la maquinaria.

Res obra

Interventoria.

13 de febrero de 2025.
Estado del tiempo: Soleado

Personal de obra
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional social (1)
- Esp. Ambiental (1)
- Esp. Hidraulico (1)
- Esp. SI y SO (1)
- Aux. Ingeniera (1)
- Topógrafo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (3)
- Operadores (3)
- Celador (1)

Powered by CamScanner

Actividades realizadas
- Se continuan las actividades de optimizacion de la seccion hidraulica del canal en tierra.

Fes Obra | Interventoria

14 de febrero de 2023.
Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra

- Director de obra	(1)	- Aux. Ingenieria	(1)
- Residente de obra	(2)	- Topografo	(1)
- Profesional social	(1)	- Cadenero	(1)
- Esp. Ambiental	(1)	- Oficios varios	(3)
- Esp Hidraulico	(1)	- Operadores	(3)
- Esp. SE y SO	(1)	- Celador	(1).

Observacion: Retroexcavadora para actividades en jornada tarde por falta de combustible, continuan trabajando 2 retroexcavadoras.

Actividades realizadas.
- Se continuan ejecutando las actividades de excavacion.

Fes Obra | Interventoria

Powered by CamScanner

15 de febrero de 2025
Estado del tiempo: Nublado

Personal en obra
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional social (1)
- Esp Ambiental (1)
- Esp Hidraulico (1)
- Esp SI y SO (1)
- Aux Ingeniería (4)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (5)
- Operadores (3)
- Celador (1)

Observación: El dia anterior se presentaron lluvias en la noche por lo tanto el rendimiento no fue el programado.

Actividades Realizadas.
- Se adelantan actividades de excavación durante la jornada con la maquinaria.

Res Obra

Interventoria.

17 de Febrero de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional social (1)
- Esp. Ambiental (1)
- Esp Hidraulico (1)
- Esp SI y SO (1)
- Aux. Ingeniería (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (5)
- Operadores (3)
- Celador (1)

Observación: Se varia retroexcavadora por daños electricos solo trabajan 2 maquinas. Caen fuertes lluvias al final

Powered by CamScanner

de la jornada.

Actividades realizadas:
- Se continuan las actividades de optimización de la sección hidraulica del canal en tierra.

Res. Obra

Interventoria.

18 de Febrero de 2025.
Estado del tiempo: Nublado.

Personal en obra

- Director de obra (1)	- Aux. Ingeniera (1)
- Residente de obra (2)	- Topografo (1)
- Profesional social (1)	- Cadenero (1)
- Esp. Ambiental (1)	- Oficios varios (3)
- Esp. Hidraulica (1)	- Operadores (3)
- Esp SST y SO (1)	- Celador (1).

Observación: No se realizan actividades debido a las fuertes lluvias del dia anterior, puesto que el nivel del caño creció impidiendo laboros.

Res. Obra

Interventoria.

Powered by CamScanner

19 de Febrero de 2025
- Estado del tiempo: Nublado

Personal en obra
- Directo de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional social (1)
- Esp Ambiental (1)
- Esp Hidraulico (1)
- Esp SI y SO (1)
- Aux. Ingeniero (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (3)
- Operadores (3)
- Celador (1)

Observación: No se realizan labores por el alto nivel del caño.

Res. Obra

Interventoría.

20 de Febrero de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra
- Director de obra (1)
- Residente de obio (2)
- Profesional social (1)
- Esp Ambiental (1)
- Esp Hidraulico (1)
- Esp. SI y SO (1)
- Aux Ingeniero (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (3)
- Operadores (3)
- Celador (1)

Observación: No se realizan actividades por el alto nivel de las aguas del caño.

Res. Obra

Interventoría.

Powered by CamScanner

21 de febrero de 2023
- Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional social (1)
- Esp Ambiental (1)
- Esp Hidraulico (1)
- Esp SST y SO (1)
- Aux Ingeniero (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (3)
- Operadores (3)
- Celador (1)

Observación: Retroexcavadora presenta fallas mecanicas, operador de la retroexcavadora XCMG no continua labores, solo se encuentra operando una maquina.

Actividades realizadas
- Se continuan actividades de la optimización de la sección hidraulica del canal en tierra.

Res Obra

Interventoria.

22 de Febrero de 2023
Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra
- Director de obra (1)
- Residente de Obra (2)
- Profesional Social (1)
- Esp. Ambiental (1)
- Esp. Hidraulico (1)
- Esp SST y SO (1)
- Aux Ingeniero (1)
- Topógrafo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (3)
- Operadores (2)
- Celador (1)

Powered by CamScanner

Actividades realizadas
- Se continuen ejecutando actividades de excavación con las retroexcavadoras.

Res. Obra

Interventoria

24 de Febrero de 2025
Estado del tiempo:

Personal en obra

- Director de obra	(1)	- Aux. Ingeniera	(1)
- Residente de obra	(2)	- Topografo	(1)
- Profesional social	(1)	- Cadenero	(1)
- Esp Ambiental	(1)	- Oficios varios	(8)
- Esp. Hidraulica	(1)	- Operadores	(2)
- Esp. SST y SO	(1)	- Celador	(1)

Actividades Realizadas.
- Se continuan actividades de la optimizacion de la seccion hidraulica del canco en tierra.

Res. Obra

Enterventona.

25 de febrero de 2025
Estado del tiempo:

Personal en obra
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional Social (1)
- Esp. Ambiental (1)
- Esp Hidraulica (1)
- Esp SI y SO. (1)
- Aux. Ingeniería (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (3)
- Operadores (2)
- Celadores (1)

Actividades realizadas.
-Se continuan ejecutando actividades de excavación con las retroexcavadoras.

Res Obra

Interventoria

26 de Febrero de 2025
Estado del tiempo:

Personal en obra
- Director de obra (1)
- Residente de obra (2)
- Profesional social (1)
- Esp Ambiental (1)
- Esp. Hidraulica (1)
- Esp SI y SO (1)
- Aux Ingeniería (1)
- Topografo (1)
- Cadenero (1)
- Oficios varios (3)
- Operadores (2)
- Celadores (1)

Powered by CamScanner

Actividades realizadas.
- Se continuan actividades de la optimización de la sección hidraulica del cauce en tierra.

Res. Obra

Interventoria.

27 de febrero de 2025
Estado del tiempo:

Personal en obra

- Director de obra	(1)	- Aux. Ingeniero	(1)
- Residente de obra	(2)	- Topografo	(1)
- Profesional social	(1)	- Cadenero	(1)
- Esp Ambiental	(1)	- Oficios varios	(3)
- Esp Hidraulica	(1)	- Operadores	(2)
- Esp SI y SO	(1)	- Celadores	(1)

Actividades realizadas.
- Se continuan ejecutando labores de excavación con la maquinaria.

Res. Obra

Interventoria

28 de Febrero de 2023
Estado del tiempo:

Personal en obra

- Director de Obra	(1)	- Aux. Ingeniería	(1)
- Residente de obra	(2)	- Topografo	(1)
- Profesional social	(1)	- Cadenero	(1)
- Esp Ambiental	(1)	- Oficios varios	(3)
- Esp. Hidraulica	(1)	- Operadores	(2)
- Esp SI y SO	(1)	- Celadores	(1)

Actividades realizadas:
- Se continuan actividades de la optimización de la sección hidraulica del cauce en tierra.

Res. Obra

Interventoria.

ANEXO 6. INFORME DE SEGUIMIENTO PGIO INTERVENTORÍA



REVISION DE INFORME PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA PGIO N°2

CONTRATO N°063 DE 2024

Este reporte ha sido preparado por CONSORCIO INTER-RECUPERACION con la asesoría del Ingeniero Industrial Especialista en Higiene y Seguridad Industrial JUAN CARLOS HERRERA CATALAN, con amplia experiencia y conocimiento técnico en lo referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El profesional SST de la empresa, ejerce una labor implementación del SG—SST diseñado para este proyecto conforme a los requisitos de ley y contractuales, para lo cual realiza vistas técnicas y revisiones documentales que permiten mantener el proyecto bajo condiciones adecuadas. Dado el caso que se identifique aspectos y/o situaciones no deseadas, éstas se informarán tanto al Director, como al Residente de Obra, para que se tomen las medidas de carácter técnico, administrativo u operativo correspondientes, encaminadas a dar soluciones eficaces y oportunas.

PERIODO: 01 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 4
2. OBJETIVOS 5
2.1 OBJETIVO GENERAL: 5
3. INFORMACION CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS 6
3.1 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA. 6
3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 7
4. HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATOS 8
5. GENERALIDADES SST DE LA OBRA 10
5.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 10
5.1.1 AVANCE EN OBRA 10
5.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 11
6. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE GESTION REALIZADAS DURANTE EL PERIODO. 12
6.1 ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA. 12
Políticas 12
Higiene y seguridad industrial 12
Bodega 12
Hidratación 13
Reporte e investigación de accidentes. 13
Elementos de protección personal. 13
Inspecciones de seguridad 14
Señalización de la obra (PMT) 15
Programa de inducción. 15
Sustancias quimias e inflamables 16
Capacitaciones 16
Orden y aseo 16
Recursos 16
Listado de personal 17
Análisis de riesgo y plan de contingencia. 19
Brigadas de emergencia. 19
Procedimiento para la identificación de peligros y valoración de riesgos. 19
COPASST. 19
Comité de convivencia laboral (CCL). 20
Control de ausentismo laboral 20

Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 20
Primeros auxilios 20
Evaluación médica ocupacional. 20
Sistema integral de seguridad social. 22
Programa de gestión social. 22
6.2 ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE CALIDAD. 22
Pólizas del contrato de obra 23
Valla informativa 23
Control de materiales 23
Calidad de los materiales 23
Compra de material y subcontratos 23
Planificación y control del proyecto 24
6.3 ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL. 24
Matriz de impactos ambientales. 24
Licencias, permisos y autorizaciones ambientales. 24
Punto ecológico 24
Plan de capacitaciones. 25
Saneamiento básico. 25
Materiales pétreos 25
7. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 25
Señalización Propuesta 25
8. CONCLUSIONES 32

1. INTRODUCCION

El presente documento describe la supervisión del plan de gestión integral de obra (PGIO) al contrato de obra pública cuyo objeto es **RECUPERACION ECOSISTEMATICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA**, durante el periodo comprendido entre el 01 Y EL 28 de febrero de 2025.

Este documento es presentado a, quien es la entidad que figura como ente interventor, cuyo propósito es garantizar que las obras que se adelantan bajo esta figura organizacional, generen un impacto mínimo a los recursos naturales y comunidad directamente afectada. Para lograr tal fin, se desarrolló el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, del cual se desarrollan las actividades a garantizar la seguridad integral de los trabajadores y comunidad vecina. Se detallan los procedimientos adoptados para la gestión integral de la obra, los métodos de monitoreo y los indicadores clave de desempeño utilizados. Además, se incluyen las principales observaciones derivadas de la interventoría, así como las recomendaciones y acciones correctivas implementadas para garantizar el éxito del proyecto.

El propósito de este informe es ofrecer una evaluación exhaustiva de la ejecución del PGIO, destacando tanto los logros alcanzados como las áreas de mejora identificadas. Asimismo, se busca promover la transparencia en la gestión de los recursos y establecer una base sólida para la optimización de futuros proyectos de obra mediante prácticas de interventoría efectivas.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el SGSST para cumplir con la normatividad y legislación vigente en materia de SST, Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y accidentes de tránsito o afectaciones a terceros durante la construcción del proyecto cuyo objeto es la **RECUPERACION ECOSISTEMATICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Describir las actividades realizadas por el contratista en el área SST durante el proyecto.

- Entregar mediante el presente informe, copia de cada una de las evidencias y demás documentos de soporte suscritos en el proceso de implementación, así como los formatos de seguimiento y control que competen a la Interventoría, debidamente diligenciados.

3. INFORMACION CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS

3.1 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO No.	060 DE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	NIT: 901.895.986-5
	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS identificada con cédula de ciudadanía No. 78.038.056 de Ciénaga de oro
OBJETO DEL CONTRATO:	“RECUPERACION ECOSISTEMATICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MIL TREITA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($8.031.375.289)
ANTICIPO (40%):	TRES MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUNTA MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE ($3.212.550.115)
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER-RECUPERACION
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2025

Tabla 1. Información Contrato de obra.

3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO No.	063 DE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER-RECUPERACION
	NIT: 901.899.921-5
	HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.781.112 de Montería
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($509.422.340).
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2025

Tabla 2. Información Contrato de Interventoría.

4. HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATOS

4.1 HOJA DE VIDA CONTRATO DE OBRA.

1. CONTRATO DE OBRA N°	060 DE 2024	2. FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024
3. REPRESENTANTE LEGAL			RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
4. OBJETIVO DEL CONTRATO DE OBRA	"RECUPERACION ECOSISTEMATICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".		
5. VALOR DEL CONTRATO	$8.031.375.289		
6. PLAZO DE EJECUCION	10 MESES	DESDE	HASTA
		30 de diciembre de 2024	30 de octubre de 2025
7. SUPERVISOR	NOMBRE	DESDE	HASTA
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS	30 de diciembre de 2024	30 de diciembre de 2025
8. INTERVENTORÍA	NOMBRE	DESDE	HASTA
	CONSORCIO INTER-RECUPEACION	30 de diciembre de 2024	30 de octubre de 2025
9. ENTIDAD ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO S.A
10. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	11-44-101244053	11. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	11-40-101072071
12. FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA DE CONTRATO	10 de diciembre de 2024	13. RESOLUCIÓN Y FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	10 de diciembre de 2024
14. FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA DE ACTA INICIO	30 de diciembre de 2024	15. RESOLUCIÓN Y FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	30 de diciembre de 2024
16. ACTAS	TIPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
	INICIO	30 de diciembre de 2024	30 de octubre de 2025

Tabla 3. Hoja de vida Contrato de Obra.

4.2 HOJA DE VIDA CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	063 DE 2024	2. FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024
3. REPRESENTANTE LEGAL		HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA	
4. OBJETIVO DEL CONTRATO DE OBRA	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
5. VALOR DEL CONTRATO	$509.826.702		
6. PLAZO DE EJECUCION	10 MESES	DESDE	HASTA
		30 de diciembre de 2024	30 de octubre de 2025
7. SUPERVISOR	NOMBRE	DESDE	HASTA
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS	30 de diciembre de 2024	30 de diciembre de 2025
8. ENTIDAD ASEGURADORA		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
9. FECHA DE EXPEDICION POLIZA DE CONTRATO	28 de diciembre de 2024	10. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	CBC-100062819
11. FECHA DE EXPEDICION POLIZA DE ACTA DE INICIO	30 de diciembre de 2024	12. POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CBC-100062819
13. ACTAS	TIPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
	INICIO	30 de diciembre de 2024	30 de octubre de 2025

Tabla 4. Hoja de vida Contrato de Interventoría.

5. GENERALIDADES SST DE LA OBRA

5.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

El presente informe se enmarca en el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2025, donde se describen las actividades realizadas en el desarrollo de la obra **"RECUPERACION ECOSISTEMATICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".**

El avance de las actividades en este periodo se detalla a continuación


5.1.1 AVANCE EN OBRA

Durante la ejecución del proyecto se realizaron las siguientes actividades constructivas:

- ACTIVIDADES DE LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO
- OPTIMIZACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL CAUCE EN TIERRA. INCLUYE EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN Y RECTIFICACIÓN DE TALUDES.
- RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN Y DE PRÉSTAMO LATERAL. DISTANCIA MAYOR DE 1.000 METROS.

Los detalles de cada ítem se encuentran en el presupuesto de obra.

5.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

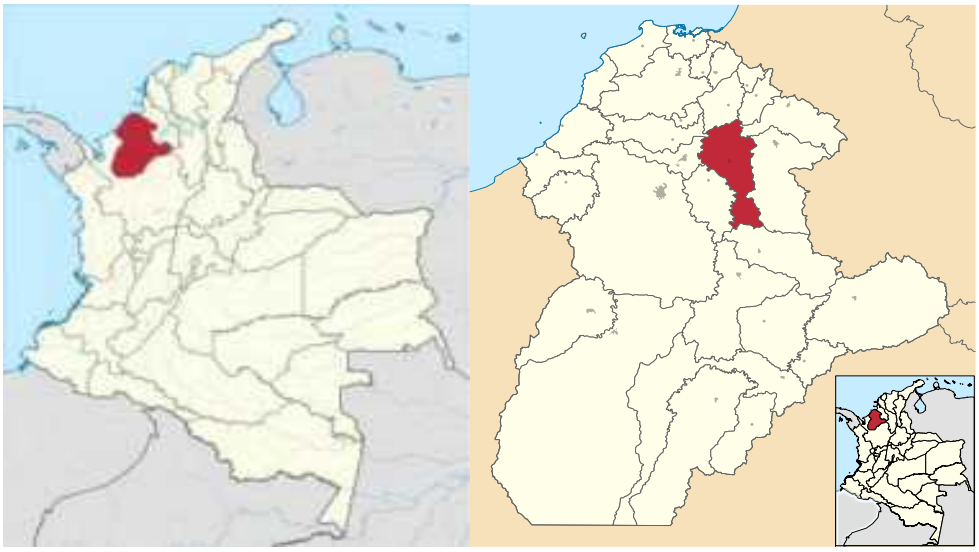

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Ciénaga de oro, departamento de Córdoba, Colombia.



Ilustración 1. Localización del proyecto a ejecutar.

6. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE GESTION REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

6.1 ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA.

La presente interventoría dentro de sus obligaciones legales y contractuales evidencia la entrega de la matriz de control del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la cual revisamos y verificamos que toda la información dispuesta en ella este correcta y evidenciada.

Políticas

El contratista ha establecido las políticas correspondientes, las cuales se socializan con el personal nuevo que ingresa al proyecto. Estas políticas serán visibles en el lugar de ejecución de la obra una vez iniciadas las actividades. La interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, realizará el seguimiento y verificación del cumplimiento de cada una de estas políticas. Las políticas establecidas por el contratista son las siguientes:

- Política de gestión integral (calidad, ambiente y SST)
- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política de prevención de consumo de alcohol y drogas
- Política preventiva contra el acoso laboral
- Política para atención de emergencias
- Política de orden y aseo

Higiene y seguridad industrial

La presente interventoría en cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales realiza el seguimiento en el cual se verifica el cumplimiento del reglamento socializado con los trabajadores y publicado por el contratista, de manera que el personal cumpla los lineamientos establecidos dentro de sus labores y convivencia laboral.

Por medio del personal de interventoría dispuesto en obra se verifico la disposición de un baño para el personal de obra, este perteneciente a una de las viviendas aledañas a la zona de ejecución.

Bodega

La presente interventoría en cumplimientos con sus responsabilidades legales y contractuales hará revisión en obra de la disponibilidad de la bodega para el almacenamiento de materiales, equipos y herramientas para, además se hará el registro del cumplimiento mediante registro fotográfico.



Fotografía 1. Zona de bodega o campamento

Hidratación

Esta interventoría dentro de sus obligaciones legales y contractuales hará seguimiento a la entrega de hidratación en los frentes de trabajo de acuerdo con lo establecido en el PGIO y en la normativa legal vigente a la fecha en los periodos donde se haya dado inicio a las actividades de construcción, el contratista evidenciará el cumplimiento de dicha actividad por medio del registro fotográfico suministrado en los informes de PGIO correspondientes.

Para el segundo periodo de ejecución del contrato el contratista suministro el debido registro fotográfico de la entrega de hidratación al personal en campo, esto se complementa con el seguimiento diario que se viene realizando en obra por parte de esta interventoría.

Reporte e investigación de accidentes.

La presente interventoría dentro de sus responsabilidades legales y contractuales realizará el seguimiento al control de la accidentalidad en la ejecución del proyecto, por medio de los reportes ante ARL, también se supervisará el seguimiento al contratista por medio de los indicadores de accidentalidad que se deben anexar en los informes PGIO.

Durante este periodo no se presentaron accidentes laborales por lo que hasta la fecha los reportes de e investigacion de accidentes se mantienen en 0.

Elementos de protección personal.

Durante el presente periodo contratista de obra presento los formatos de entrega de protección personal.



Ilustración 2. Formatos entrega de dotación personal de obra.

Inspecciones de seguridad

La presente interventoría dentro del cumplimiento de sus responsabilidades legales y contractuales realizará el seguimiento correspondiente con la finalidad que se cumplan las garantías de un ambiente de trabajo seguro para el personal.



Ilustración 3. Formatos de inspección de seguridad y salud en el trabajo.

Contratista para el periodo correspondiente presenta inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.

Señalización de la obra (PMT)

La presente interventoría dentro del cumplimiento de sus responsabilidades legales y contractuales realizará el seguimiento correspondiente donde se verificará la correcta delimitación de las áreas de operación, circulación de vehículos y personal, acopio de material, una vez se de inicio a las actividades de obra civil el contratista deberá disponer y dar cumplimiento a los puntos anteriormente mencionados.

Programa de inducción.

La presente interventoría dentro de sus obligaciones legales y contractuales da seguimiento a las actividades realizadas por el contratista en cumplimiento con el PGIO presentado, en estas se evidencia la entrega de los formatos de inducción y evaluación de la misma para el personal de nuevo ingreso al proyecto, en esta se da a conocer al personal nuevo las políticas del contratista respecto a SST, calidad y ambiental.

Contratista de obra para el periodo presenta evidencias de inducción realizado a todo el personal nuevo de ingreso a obra.



Ilustración 4. Formatos de inducción personal de ingreso a obra.

Sustancias quimias e inflamables

La presente interventoría dentro de sus responsabilidades legales y contractuales requerirá la entrega de las hojas de seguridad de los productos utilizados durante la ejecución por medio de los anexos del informe de PGIO una vez se dispongan de estas sustancias en obra, además se hará vigilancia a su correcta demarcación y señalización.

Durante este periodo el contratista entrego la ficha de seguridad de las sustancias químicas o inflamables que se están utilizando en obra en este caso se entregó la ficha del combustible de las maquinarias.

Capacitaciones

El contratista dentro de las obligaciones en el cumplimiento de PGIO este debe realizar capacitaciones en temática de SST y P&P, estas serán realizadas y los formatos de evidencias se adjuntarán por medio de los anexos de los informes de PGIO.

Durante este periodo la presente interventoría cercioro la ejecución de las capacitaciones en términos de SST por parte del contratista en las siguientes temáticas:

- Identificar y reportar los actos y condiciones inseguras en el lugar de trabajo.
- Comité de convivencia laboral.

Orden y aseo

El contratista suministrará registro fotográfico que evidencia la realización de dichas jornadas, las cuales se llevaran a cabo en el transcurso de los siguientes periodos, la presente interventoría dentro de sus obligaciones contractuales hará seguimiento para verificar que se mantenga el orden de las áreas de trabajo para garantizar el cumplimiento de lo establecido en PGIO.

Recursos

La presente interventoría en cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales verificará que se cumpla con el suministro de los insumos y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades SST, una vez se inicien las actividades el contratista tiene como compromiso suministra los siguientes recursos:

- Camillas
- Extintores
- Botiquín
- Punto ecológico
- Punto de hidratación
- EPP
- Dotación
- Cinta de peligro
- Señales preventivas e informativas
- Paletas pare y siga
- Barricadas
- Conos

- Chalecos reflectivos naranjas
- Otros insumos

Durante este periodo el contratista presento ante interventoría los formatos de inspecciones a los equipos de emergencias descritos anteriormente dentro del informe de PGIO correspondiente.

Listado de personal

La presente interventoría en cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, realizo el seguimiento a las actividades realizadas por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG – SST del contratista **CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS,** en el cumplimiento del contrato 060 DE 2024; para lo cual, a continuación, se presenta el resumen de las siguientes actividades desarrolladas durante el periodo del **INFORME PGIO N°2** presentado por el contratista correspondientes al periodo del **01 al 28 de febrero de 2025.**

En el informe de PGIO N°2 el contratista entrega del listado de personal vinculado para el proyecto, como se relaciona en la siguiente tabla.

PERSONAL TECNICO				
NOMBRE Y APELLIDOS		IDENTIFICACION	CARGO	DEDICACION %
1	ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO	52.254.090	DIRECTOR DE OBRA	50%
2	JOSE FAWCETT HERNANDEZ MIER	1.042.424.437	RESIDENTE DE OBRA 1	100%
3	JOSE FRANCISCO FIORILLO SARMIENTO	8.686.400	RESIDENTE DE OBRA 2	100%
4	NIKOLLE TATIANA FETECUA GUTIERREZ	1.075652.455	PROFESIONAL SOCIAL	100%
5	MONICA ORTEGA MORENO	52.547.455	ESPECIALISTA AMBIENTAL	100%
6	GERMAN MONSALVE SAENZ	10.221.652	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	100%
7	LUIS FERNANDO GUERRERO ALARCON	80.539.487	ESPECIALISTA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	100%
8	CLEIDER BERASTEGUI BARRANCO	1.067.940.558	INGENIERO AUXILIAR	100%

Tabla 5. Listado personal técnico.

PERSONAL INDIRECTO DE OBRA				
NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICACION	CARGO	DEDICACION %
1	NATALY GONZALES TORRES	1.003.434.150	AUX. SISO	100%
2	ALBERT TAMARA NIETO	7.369.165	CADENERO	100%
3	JULIO CESAR BENAVIDEZ ESPINO	77.165.580	TOPOGRAFO	100%
4	FABIAN ANDRES CASTILLO OSORIO	1.019.082.635	OPERADOR XCMG XE210CU	100%
5	ALEXANDER NICANOR VELAZQUEZ DIAZ	10.966.603	OPERADOR XCMG XE210CU	100%
6	DANIEL EDUARDO BOHORQUEZ HERNANDEZ	1.104.010.316	OPERADOR KOBELCO 211	100%
7	ARNULFO MANUEL MONTIEL ROMERO	7.369.636	TOPOGRAFO	100%

Tabla 6. Personal indirecto de obra.

MANO DE OBRA NO CALIFICADA				
NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICACION	CARGO	DEDICACION %
1	OSCAR LUIS CORONADO PATERNINA	78.036.613	OFICIOS VARIOS	100%
2	SANTIAGO LOPEZ BALLESTEROS	1.062.424.908	OFICIOS VARIOS	100%
3	NAYID SALOMON CORONADO RETAMOSO	78.038.246	CELADOR	100%
4.	GLINDON JOSE PEREZ YANEZ	1.007.765.951	CELADOR	100%
5.	JAIDER ANTONIO ORTEGA	1.068.661.447	OFICIOS VARIOS	100%

Tabla 7. Listado personal mano de obra no calificada.

CLASIFICACION DE PERSONAL	N° DE TRABAJADORES
Profesional	8
Personal indirecto	7
Mano de obra no calificada	5
TOTAL	20

Tabla 8. Clasificación de personal.

NOVEDAD DE PERSONAL	N° DE TRABAJADORES
Nuevo	11
TOTAL	10

Tabla 9. Novedades en el personal.

Análisis de riesgo y plan de contingencia.

EL contratista deberá suministras en obra al iniciar las labores constructivas los siguientes equipos para la atención de emergencias y desastres para dar cumplimiento a los requisitos del plan de seguridad y salud en el trabajado estipulado en el PGIO, además se deberán cumplir con las inspecciones mensuales de cada uno de estos elementos:

- Kit de emergencia (camilla con cuellos, botiquín y extintor).
- Señalizaciones de seguridad de las rutas de evacuación y salidas de emergencia, avisos informativos y de seguridad, además de señalización interna de la obra.

Brigadas de emergencia.

Una vez se de inicio a las obras civiles el contratista deberá conformar la brigada de emergencia, debido a que aún no se cuenta con personal operativo en obra en el presente periodo no se conforma la brigada, la presente interventoría dentro de sus obligaciones contractuales verificara el cumplimiento de este compromiso conforme a los establecido en el PGIO, además de realizar el seguimiento del cumplimiento mensual de los deberes pertinentes en cuanto a las demás responsabilidades que se deriven de esta.

Procedimiento para la identificación de peligros y valoración de riesgos.

La interventoría dentro de sus responsabilidades legales y contractuales verificará y hará seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de las medidas de seguridad establecidas, con base en la matriz de peligros que este ha dispuesto, conforme a la Guía Técnica Colombiana - GTC 45. La interventoría enfocará su verificación en las medidas preventivas implementadas y los controles pertinentes, asegurando que estas acciones se lleven a cabo en busca de la mejora continua.

COPASST.

El contratista deberá suministrar los formatos diligenciados de reunión mensual de COPASST una vez sean requeridos de acuerdo al inicio de las actividades.

Contratista para el presente corte el formato de acta de reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST)

Comité de convivencia laboral (CCL).

La presente interventoría dentro de sus obligaciones legales y contractuales llevará a cabo el seguimiento al cumplimiento de las políticas de seguridad y salud en el trabajo estipuladas en PGIO para el CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS por lo cual se hará el requerimiento de la realización y entrega de evidencia de estos dentro de los periodos correspondientes.

Contratista de obra en el periodo presenta evidencia de realización de capacitación como anexo en el Informe PGIO.

Control de ausentismo laboral

Para el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2024 y el 31 de enero de 2025, no presentaron control de ausentismo laboral, el cual incluye el registro de asistencia de los trabajadores. La interventoría llevara a cabo el seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de obra.

Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales

No se llevaron a cabo investigaciones durante el periodo correspondiente a este informe. No obstante, la interventoría realiza el seguimiento pertinente de la accidentabilidad por parte del contratista en caso de que ocurra algún evento que lo requiera.

Primeros auxilios

El contratista deberá disponer en la obra, una vez inicien las actividades de obra civil, de los siguientes elementos para la atención de accidentes laborales o casos de emergencia: botiquín, camilla con collarines, extintor, entre otros. La interventoría llevará a cabo el seguimiento al contratista en lo referente a la disponibilidad de estos elementos en la obra, así como la inspección rutinaria para verificar su buen estado.

Evaluación médica ocupacional.

La presente interventoría en cumplimiento de sus responsabilidades legales y contractuales hace seguimiento al cumplimiento de las políticas de SST del CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS, por lo cual revisando el personal diligenciado por medio del informe de PGIO N°2 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, se evidencia que el contratista presenta el ingreso de personal de los cuales presentó 4 exámenes de ingreso.

NOMBRE Y APELLIDOS		IDENTIFICACION	CARGO	EXAMENES MEDICOS
1	RGOER JOSE ATENCIA GARCIA	1.067.958.138	AUX. DE INGENIERIA	PRESENTA
2	NAYID SALOMON CORONADO RETAMOSO	78.038.246	CELADOR	PRESENTA
3	NATALY GONZALEZ TORRES	1.003.434.150	AUX. SISO	PRESENTA

4	JAIDIR ANTONIO ORTEGA REGINO	1.068.661.447	OFICIOS VARIOS	PRESENTA

Tabla 10. Listado de Personal.



Ilustración 5. Exámenes de ingreso personal nuevo.

Sistema integral de seguridad social.

La presente interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, hará seguimiento que el contratista, en conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, anexe las planillas de seguridad social correspondientes al personal en obra.

Planillas de seguridad social del personal de contratista de obra:

Razón Social	No. Planilla	Periodo	
		Pensión	Salud
CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	9481315754	2025-01	2025-02

Programa de gestión social.

Dentro del cumplimiento de sus responsabilidades legales y contractuales esta interventoría realiza seguimiento a la gestión del apartado social concerniente al proyecto donde evidenciamos que el contratista realizo y hace entrega de evidencia de:

- Relación de correspondencia emitida y recibida desde el 01 al 28 de febrero de 2025.
- Se realizo acompañamiento constante a la comunidad, brindándoles información sobre los alcances del proyecto, ofreciéndoles respaldo y atender las peticiones, quejas y reclamos que surjan durante la ejecución de la obra.
- Realización de actas de vecindad a predios.



Fotografía 2. Acercamiento a la comunidad.

6.2 ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE CALIDAD.

La presente interventoría dentro de sus obligaciones legales y contractuales hace seguimiento a las actividades de cumplimiento del sistema de gestión integral de obra en el apartado de calidad.

Pólizas del contrato de obra

El contratista cuenta con las pólizas actualizadas conforme al acta de inicio, las cuales se encuentran adjuntas en el anexo del componente de calidad del informe PGIO No 1.

Valla informativa

El contratista durante este periodo cuenta con un diseño que fue aprobado por la supervisión del proyecto. La presente interventoría dentro de sus obligaciones contractuales realizó el seguimiento para el cumplimiento de este requisito.

El contratista durante este periodo se encuentra elaborando la valla informativa.



Ilustración 6. Diseño de valla informativa.

Control de materiales

La presente interventoría dentro del cumplimiento de sus responsabilidades legales y contractuales realizará el seguimiento al control de los materiales requeridos para la ejecución de las obras civiles.

Calidad de los materiales

Dado que una no se ha iniciado las actividades de obra civil en el presente periodo no se reportan ensayos y/o pruebas de materiales, de igual forma la presente interventoría llevara a cabo el seguimiento en cuanto a la realización de los ensayos requeridos una vez se cuenten con estos en obra y se inicien las actividades correspondientes.

Compra de material y subcontratos

En cumplimiento a lo establecido en el PGIO dentro del presente periodo el contratista realiza la evaluación de proveedores para la selección de la comisión topográfica, siguiendo lo

establecido para la selección del contratista en base a calidad, control de costos, relación a largo plazo, reputación y responsabilidad.

Planificación y control del proyecto

La presente interventoría en cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales realiza el seguimiento, control y vigilancia sobre las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe. La evidencia del seguimiento se registra en las anotaciones de la bitácora de obra, en la cual se hace la descripción de la ejecución de actividades, los requerimientos de la interventoría, personal presente en obra y equipos utilizados.

6.3 ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL.

Matriz de impactos ambientales.

Esta interventoría evidencia la entrega de la matriz de impactos ambientales por medio del anexo 2 del componente ambiental del Informe de PGIO N°1, por medio de la cual se valoran los impactos y se indican las gestiones a tener en cuenta con la finalidad de minimizar los riesgos de contaminación debido a la ejecución de las actividades.

Licencias, permisos y autorizaciones ambientales.

De acuerdo al seguimiento por parte de la interventoría de los permisos, licencias o autorizaciones requeridas, en el periodo correspondiente a este informe se reporta por parte del contratista que actualmente los permisos de ocupación del cauce y aprovechamiento forestal se encuentran actualmente en trámite ante las entidades competentes.

Punto ecológico.

Con el fin de facilitar al personal en obra la identificación de tipos de residuos para su adecuada disposición final, al interior de la obra, el contratista debe contar con un punto ecológico basado en los tres criterios existentes para clasificar los residuos de acuerdo con la resolución No. 2184 de 2019 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible: Según su origen, segundo su biodegradabilidad y según su peligrosidad.



Fotografía 3. Punto ecológico en obra.

Plan de capacitaciones.

El contratista dentro de las obligaciones en el cumplimiento de PGIO este debe realizar capacitaciones periódicas tanto en temática de manejo ambiental como en temática de SST y P&P, estas serán realizadas y se anexarán los formatos de evidencia por medio del informe de PGIO una vez se den inicio las actividades de obra civiles.

Saneamiento básico.

Esta interventoría en cumplimento de sus obligaciones legales y contractuales realizara un seguimiento a la disposición de las instalaciones sanitarias para el uso del personal en obra, de acuerdo con lo establecido en el PGIO y la normativa legal vigente a la fecha. El cumplimiento de esta actividad por parte del contratista se evidenciará mediante el registro fotográfico que será suministrado en el informe del PGIO, una vez se hayan iniciado las actividades civiles.

Materiales pétreos



El contratista deberá disponer de debida forma el acopio de los materiales, los cuales deben estar cubiertos con plástico negro para prevenir contaminaciones. El cumplimiento de esta actividad por parte del contratista se evidenciará mediante el registro fotográfico que será suministrado en el informe del PGIO, una vez se reporte el ingreso de estos materiales.



7. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El PMT es una herramienta técnica que plantea las estrategias alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado en las condiciones normales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas y comunidad en general) causados por la ejecución de una obra vial o aquellas que interve3ngan el espacio público, de manera que siempre se favorezca la seguridad de los usuarios de la vía, de los ciudadanos en general y de quienes participan en la construcción de la obra.

La interventoría realiza una inspección una inspección sobre el Plan de Manejo de tránsito que esta ejecutado por el contratista de obra, para así verificar que se está cumpliendo con el desarrollo oportuno de estas actividades para así prevenir, mitigar, compensar los aspectos de impacto generados por las obras durante la construcción del proyecto.


Señalización Propuesta.

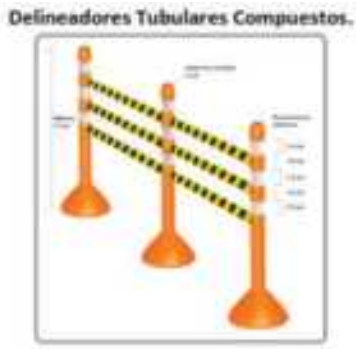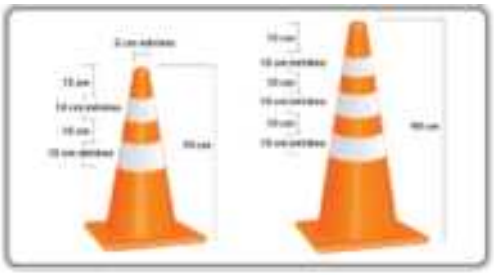TIPOS DE SEÑAL FRENTE DE OBRA	
Tipos de señal	Observaciones
 Conos	Estos delineadores se utilizan tanto para definir transiciones por angostamiento para delinear el borde de la calzada, para hacer cerramientos en obras y para el control de peatones. Tienen como mínimo tres franjas de material retrorreflectivo flexible tipo lll o de caracteristicas de retrorreflexión superior, separadas 0.15 m, deben contar con un mínimo de dos (2) orificios o pasadores que permitan canalizar cintas plásticas demarcadoras de un mínimo de 0.075 m de ancho y de color predominante amarillo o naranja. Manual de señalización 2015 – Ministerio de Transporte
	Los conos de delineación serán de color rojo o anaranjado y de la forma y dimensiones que aparecen en la figura. Se emplearán para la formación de carriles de tránsito que entran a zonas de reglamentación especial o en general cuando el flujo de tránsito ha de ser desviado temporalmente de su ruta. Los conos de tránsito y dispositivos tubulares deberán tener un mínimo de 0.45 m de alto, con base más ancha.

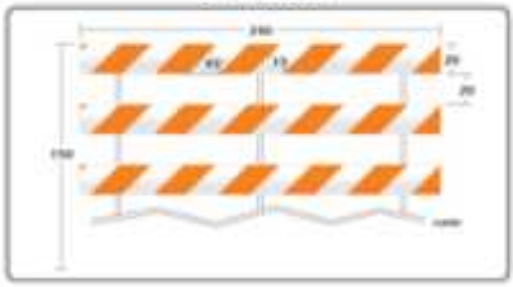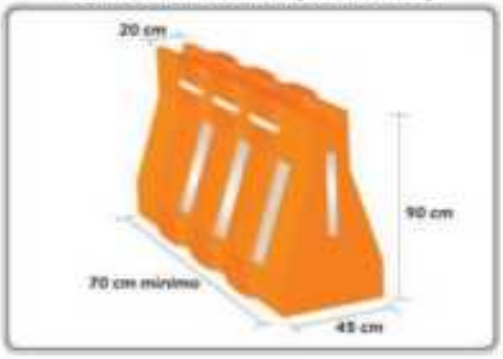	Manual de señalización 2015 – Ministerio de Transporte
Barricadas 	Las barricadas se utilizan para hacer cierres de carriles o calzadas, para cercar áreas de trabajo y para delinear angostamientos. Cuando se emplean para cerrar vías o carriles se colocan de forma perpendicular al eje de la via,y se instalan secuencialmente obstruyendo la calzada o los carriles inhabilitados para la circulación del transito vehicula, incluyendo bermas. Manual de señalización 2015 – Ministerio de Transporte
Barreras Plásticas (Maletines) 	Estos dispositivos se pueden utilizar como elementos de canalización de transito en los casos en que sea necesario definir una variación en el perfil transversal disponible para el tránsito de vehículos o para indicar el alineamiento en tramos rectos y curvas o para aislar excavaciones hasta de 1.0 m de profundidad. También se usan para separar flujos peatonales de flujos de ciclo usuarios o de flujos vehiculares. Manual de señalización 2015 – Ministerio de Transporte

SEÑALES PREVENTIVAS	
	Esta señal es obligatoria su instalacion y se utiliza para advertir a los conductores que las condiciones de transito se modifican mas adelante por la realización de obras en la vía. Se debe ubicar antes del área de transición o canalización, a una distancia que depende de la velocidad máxima permitida antes de la zona de trabajo, y de aquella autorizada en la zona misma y otras variables, como tiempo de reacción. Manual de señalización 2015 – Ministerio de Transporte
	Esta señal se utiliza para advertir sobre la presencia de maquinaria en la zona de trabajo, la que generalmente circula a baja velocidad o puede encontrarse entrando o saliendo de la vía o estacionada. Manual de señalización 2015 – Ministerio de Transporte
	Esta señal se utiliza para advertir que mas adelante el transito por la zona de obra es controlado por un auxiliar de transito que utilizara señales manuales tipo “bandero”. Por motivos de seguridad de este trabajador, la velocidad máxima permitida en el sector que se ubica el auxiliar de transito no debe superar los 50 km/h. En zonas de obras con velocidades máximas superiores, deben adoptarse medidas para disminuir la velocidad gradualmente, hasta 50 km/h, por lo menos 200 m antes en vías rurales y 100 m en urbanas. Manual de señalización 2015 – Ministerio de Transporte

SPO-05 ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA, SPO-06 ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA. 	Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada, cuando dicho estrechamiento implique la eliminación de uno o mas carriles, puede utilizarse la leyenda “A XXX CARRIL (ES)” que indica el numero de carriles disponibles mas adelante en la vía. Manual de señalización 2015 – Ministerio de Transporte
SEÑALES PREVENTIVAS	
SRO-01 VÍA CERRADA: SRO-01 	Esta señal se debe emplear para notificar a los conductores el inicio de un tramo de vía por el cual no se permite circular. Manual de señalización 2015 – Ministerio de Transporte
SIO-07 DESVIO: 	Esta señal se utiliza para indicar a los usuarios el tipo de maniobra requerida para continuar circulando a traves de la zona de obras. Se debe ubicar justo antes del lugar donde nace el desvió, con la flecha indicando en que dirección y sentido continua la vía. A lo largo del desvió puede ser retirada cuando se produzcan cambios de dirección importantes. Manual de señalización 2015 – Ministerio de Transporte

SRO- INICIO DE OBRA Y FIN DE OBRA 	Esta señal se utiliza para indicar que la circulación a traves de la zona de obras ha concluido y se restablecen las condiciones que existían antes de ella. Para reforzar el mensaje se debe agregar una placa adicional con la leyenda “FIN DE OBRA”. Esta señal se debe instalar a no menos de 120 m del punto donde finaliza el área de seguridad, en vías rurales y a no menos de 25 m cuando se trata de vías urbanas. Manual de señalización 2015 – Ministerio de Transporte
Auxiliar de Tránsito 	En el sistema de control PARA/SIGA el auxiliar de transito es responsable de la seguridad de los usuarios de la vía, por lo que debe ser seleccionado cuidadosamente, debiendo cumplir a lo menos, con los siguientes requisitos: 1. Debe haber terminado mínimo el ciclo de educación primaria. 2. Haber aprobado una capacitación y entrenamiento con certificado físico que lo habilite como auxiliar de tránsito para obras en vías. 3. Poseer buenas condiciones físicas, visión y audición compatibles con sus labores a desarrollar, aceptándose que estos aspectos puedan estar corregidos por dispositivos tales como lentes o audífonos. 4. Contar con aptitudes adecuadas de comportamiento ciudadano, 5. Debe tener sentido de responsabilidad por la seguridad de los transeúntes y ser capaz de reconocer situaciones peligrosas. El auxiliar de transito debe ser visibles a una distancia mínima de

	200 m para todos los conductores, por ello debe usar permanentemente la vestimenta especificada en la Sección 4.12.2 de este capítulo. Manual de señalización 2015 – Ministerio de Transporte

Tabla 11. Tipos de señal frente de obra.

8. CONCLUSIONES

- El ingeniero Director de obra y/o el ingeniero residente son los responsables de implementar de manera adecuada el Plan de Manejo de Transito para la construccion de las obras.

- La señalizacion que se va a emplear en el (PMT) una vez inciada los trabajos de obras civiles, Contempla las señales informativas, preventivas y reglamanetarias, ademas de dispositivos especiales como son las barricadas, delineadores tubulares, cinta plastica, conos y maletienes recomendados en el Manual de Señalizacion Vial del Ministerio de Transporte, la cual esta interventoria estara verificando que se use de la mejor manera adecuada.

- En en el tiempo de la ejecucion del proyecto, se evaluaron parametros que se encuentran incluidos dentro del SG-SST para la “RECUPERACION ECOSISTEMATICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”, durante el periodo evaluado entre el 01 y el 28 de febrero de 2025.

- Contratista cumplio parcialmente con las actividades establecidad en en SG-SST y acepto con buen agrado todas las recomendaciones que fueron dadas por parte del equipo de interventoria, para mejorar la seguridad del proyecto.



JUAN CARLOS HERRERA CATALAN
PROFESIONAL SISO INTERVENTORIA.

ANEXO 7. INFORME DE SEGUIMIENTO PGIO OBRA



INFORME N°2

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS-PGIO

(Calidad, Ambiente y SST)

ENERO – FEBRERO 2025

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

INFORME No. 2

PERIODO DEL 01 FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025

INFORME DE PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS- PGIO (CALIDAD, AMBIENTE Y SST)

CONTRATO DE OBRA 060 DE 2024.RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CIENAGA DE ORO-CÓRDOBA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 5
2. OBJETIVO. 6
3. ALCANCE DEL INFORME. 6
4. DESCRIPCION GENERAL DE PROYECTO. 7
5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 8
6. IMPLEMENTACIÓN DEL PGIO 10
7. COMPONENTE DE CALIDAD. 10
7.1. PLAZO DEL CONTRATO. 10
7.2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 10
7.3. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA. 12
7.4. PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA. 13
7.6. EJECUCIONES DEL CONTRATO DE OBRA 15
7.7. CONTROL DE ACCESO DE MATERIALES. 20
7.8. ENSAYO, PRUEBAS Y CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 20
7.9. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTROLES DE CALIDAD. 21
7.10. INCONVENIENTES PRESENTADOS. 23
7.11. AVANCE DE LAS OBRAS: 24
7.12. REVISION DEL CONTRATO. 24
7.13. CONTROL DE DISEÑO. 24
7.14. INFORMACIÓN DOCUMENTADA. 24
7.15. APOYO (GESTION DE LOS RECURSOS). 25
7.15.1. PROVISIÓN DE RECURSOS 25
7.16. MATERIALES. 25
7.17. INFRAESTRUCTURA. 25
7.18. AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS. 25
7.19. COMPRAS DE MATERIALES Y SUBCONTRATOS. 25
7.20. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO. 26
7.20.1. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA OBRA. 26

8. COMPONENTE AMBIENTAL. 26
8.1. IDENTIFICACIÓN, EVOLUCIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: 27
8.2. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES. 27
8.3. PROGRAMA DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL- COMUNIDAD CIURDANTE. 28
8.4. PUNTO ECOLOGICO: 31
8.5. CHARLAS Y CAPACITACIÓN. 32
8.6. BAÑO: 32
9. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 35
9.1. POLÍTICAS. 35
9.2. SOCIALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS. 36
9.3. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 36
9.4. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 37
9.5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS VERSUS EJECUTADAS. 37
9.6. RECURSOS. 39
9.7. RECURSO HUMANO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 40
9.8. JORNADA LABORAL. 41
10. ANÁLISIS DE RIESGO Y PLAN DE CONTINGENCIA 41
10.1. BRIGADA DE EMERGENCIA. 41
11. PROGRAMA DE HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 41
11.1. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 42
11.2. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 43
11.3. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 46
12. GESTIÓN SOCIAL: 52
13. ANEXOS: 55

TABLA DE CONTENIDO

TABLA 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 7
TABLA 2 CONDICIONES DEL CONTRATO. 11
TABLA 3 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 12
TABLA 4 PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 12
TABLA 5 PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA. 13
TABLA 6 PERSONAL INDIRECTO 14
TABLA 7 MODELO DE VALLA INFORMATIVA PARA INSTALAR. 15
TABLA 8 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS MES N°2. 16
TABLA 9 RESUMEN DE AVANCE DE OBRA. 24
TABLA 10 PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS. 27
TABLA 11 INDICADOR SOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS. 28
TABLA 12 CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA. 29
TABLA 13 GENERACIÓN DE EMPLEOS. 30
TABLA 14 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES AMBIENTALES 33
TABLA 15 ACTIVIDADES DE SST PROGRAMADAS VS EJECUTADAS. 38
TABLA 16 PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA. 40
TABLA 17 RESUMEN DEL PERSONAL CONTRATADO 41
TABLA 18 CONTROL DE AUSENTISMO LABORAL. 43
TABLA 19 REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE ACTIVIDADES 47
TABLA 20 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LABOR SOCIAL. 53

1. INTRODUCCIÓN.

El proyecto denominado RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA., se adjudicó mediante el Contrato No. 060 de 2024.

El objetivo principal del proyecto es rehabilitar la conectividad hidrológica del Caño de Aguas Prietas localizado en el municipio de Ciénaga de Oro entre la vereda El Salado del corregimiento El Siglo y la vereda el Higal del corregimiento Punta Yánez, para mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuir con el desarrollo sostenible del municipio.

El proyecta busca aportar al desarrollo sostenible de la región, mitigar los efectos del cambio climático y generar espacios de gobernanza del agua que permita que las comunidades sean menos vulnerables y más resilientes, minimizando las condiciones de riesgo y los usos inadecuados del recurso hídrico.

A continuación, se informan las actividades desarrollas entre los periodos del 30 de enero hasta 28 febrero de 2025, contempladas en el PGIO, dentro de cada uno de sus ejes de calidad, ambiente y seguridad y salud en trabajo; las cuales se desarrollaron para garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales del proyecto, el cuidado del ambiente, la prevención de enfermedades y de accidente laborales, el cuidado de la propiedad del cliente y de la comunidad de la zona de influencia del proyecto.

2. OBJETIVO.

Informar las actividades realizadas para garantizar a la entidad contratante el cumplimiento de los requisitos de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo del Plan de Gestión Integral de Obras- PGIO durante la ejecución del contrato de obra No. 060-2024 cuyo objeto es: “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. Dentro de los periodos del 01 de Febrero hasta el 28 de Febrero de 2025.

3. ALCANCE DEL INFORME.

Ejecutar las actividades contempladas dentro del Plan de Gestión Integral de Obras- PGIO del contrato de obra No. 060-2024 cuyo objeto es: “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

4. DESCRIPCION GENERAL DE PROYECTO.

En el presente ítem se describen la información general del proyecto.

Tabla 1 Descripción general del proyecto.

DESCRIPCION DEL CONTRATO	
CONTRATO No:	060 DE 2024.
OBJETO:	"RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
VALOR:	OCHO MIL TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($8.031.375.289).
PLAZO DE EJECUCIÒN:	DIEZ (10) MESES.
CONTRATANTE:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE – CVS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER RECUPERACION.
SUPERVISOR:	CESAR BUELVAS MERCADO.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 699 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2024.
RESOLUCIÓN APROBACIÓN POLIZAS:	No. 0-2138 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2024.
PORCENTAJE ANTICIPO:	CUARENTA POR CIENTO (40%).
VALOR DEL ANTICIPO:	TRES MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS MCTE ($3.212.550.115).
FECHA DE INICIO:	30 E DICIEMBRE DE 2024.

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto cuyo objeto es: “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. Se ejecuta en el municipio de Ciénega de Oro, en el departamento de Córdoba.

El municipio de Ciénaga de Oro esta localizado al Nororiente del Departamento de Córdoba, a los 8° 52’ 41” de Latitud Norte y 75° 37’ 27” de Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich. Limita al Norte con los municipios de San Andrés de Sotavento y Chima. Al Sur con los Municipios de Pueblo Nuevo, al Oeste con Cereté y San Carlos y al Este con Chinú y Sahagún.

Ciénaga de Oro se encuentra ubicada a 35 kilómetros aproximadamente de Montería, capital del departamento de Córdoba, rodeado de colinas que vienen a ser una desmembración de la Serranía de San Jerónimo. Se sienta al costado del Caño de Aguas Prietas o del Floral, que baja de las serranías de San Carlos, después de recibir las aguas de varias ciénagas que le hacen aumentar su caudal, va a confundirse con las aguas del río Sinú frente a Lorica.



Localización Ciénaga de Oro, Córdoba

Es por esto que la CVS intervendrá una longitud de 4.4 Km, mediante la ejecución del proyecto “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, el cual tiene como meta mitigar la problemática ambiental que se presenta en cada temporada de lluvias debido el desbordamiento del Caño Aguas Prietas en el municipio de Ciénaga de Oro.

El desarrollo de la obra busca disminuir el riesgo de desbordamiento del Caño de Aguas Prietas, así como avanzar en la recuperación ambiental del caño de Aguas prietas y contribuir a mejorar la calidad de vida los habitantes donde se localiza el proyecto; fortaleciendo el crecimiento y desarrollo del municipio de ciénaga de oro.

Por otro lado, con el proyecto se pretende apoyar gradualmente a los municipios en la solución, en gran medida, de la problemática de desabastecimiento de agua, contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural del departamento y mitigar los efectos del cambio climático.

6. IMPLEMENTACIÓN DEL PGIO

Cumpliendo con la implementación del Plan de Gestión Integral de Obras- PGIO durante el periodo N°2, se informan las actividades ejecutadas en los componentes de calidad de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

A continuación, se informan las actividades ejecutadas en cada componente.

7. COMPONENTE DE CALIDAD.

Se informan las actividades ejecutadas y los controles aplicados durante el periodo del 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2025; garantizando el cumplimiento de los requisitos de la calidad, especificaciones técnicas y demás contractuales del proyecto.

7.1. PLAZO DEL CONTRATO.

El contrato tiene un plazo estimado de DIEZ (10) meses para ser ejecutado, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo perfeccionamiento del contrato y suscripción de las pólizas.

7.2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Se describe la información general del Contrato No. 060-2024 cuyo objeto de contrato es: “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

Tabla 2 Condiciones del contrato.

DESCRIPCION DEL CONTRATO	
CONTRATO No:	060 DE 2024.
OBJETO:	"RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
VALOR:	OCHO MIL TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($8.031.375.289).
PLAZO DE EJECUCIÒN:	DIEZ (10) MESES.
CONTRATANTE:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE – CVS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER RECUPERACION.
SUPERVISOR:	CESAR BUELVAS MERCADO.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 699 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2024.
RESOLUCIÓN APROBACIÓN POLIZAS:	No. 0-2138 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2024.
PORCENTAJE ANTICIPO:	CUARENTA POR CIENTO (40%).
VALOR DEL ANTICIPO:	TRES MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA

	MIL CIENTO QUINCE PESOS MCTE ($3.212.550.115).
FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2024.
ARL	SURA
NIVEL DE RIESGO:	V

7.3. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA.

7.3.1 CUMPLIMIENTO CON FECHA DEL ACTA DE INICIO.

Tabla 3 Póliza de Cumplimiento

COMPAÑÍA	**NACIONAL DE SEGUROS**		
N° DE PÓLIZA	**CUMPLIMIENTO**	**400050213 - ANEXO 2**	
RIESGO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento general del contrato	$1.606.275.057.80	30/12/2024	30/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	$803.137.528.90	30/12/2024	30/10/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$3.212.550.115.00	30/12/2024	30/04/2026
Estabilidad de la obra	$1.606.275.057.80	Ampara	2 años

7.32.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CON FECHA DEL ACTA DE INICIO

Tabla 4 Póliza responsabilidad civil extracontractual

COMPAÑÍA	**NACIONAL DE SEGUROS**		
N° DE PÓLIZA	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**400050214 - ANEXO 2**	
RIESGO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**

Predios Laborales y Operaciones	$650.000.000,00	30/12/2024	30/10/2025
Contratistas y subcontratistas	$650.000.000,00	30/12/2024	30/10/2025
Vehículos propios y no propios	$650.000.000,00	30/12/2024	30/10/2025

7.4. PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA.

De conformidad con el documento técnico el personal mínimo en obra aprobado, por la interventoría es el siguiente:

Tabla 5 Personal Técnico del contrato de obra.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO DEL PROFESIONAL	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
52.254.090	ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO	DIRECTOR DE OBRA	50,00%
1.042.424.437	JOSE FAWCETT HERNÁNDEZ MIER	RESIDENTE DE OBRA 1	100,00%
8.686.400	JOSE FRANCISCO FIORILLO SARMIENTO	RESIDENTE DE OBRA 2	100,00%
1.075.652.455	NIKOLLE TATIANA FETECUA GUTIERREZ	PROFESIONAL SOCIAL	100,00%
52.547.455	MÓNICA ORTEGA MORENO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	100,00%
10.221.652	GERMÁN MONSALVE SAENZ	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	100,00%
80.539.487	LUIS FERNANDO GUERRERO ALARCON	ESPECIALISTA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	100,00%
78.036.613	OSCAR CORONADO	OFICIOS	100.00%

		VARIOS	
1.062.424.908	SANTIAGO LOPEZ BALLESTEROS	OFICOS VARIOS	100.00%
78.038.246	NAYID SALOMON CORONADO RETAMOSO	VIGILANTE	100.00%
1.007.765.951	GLINDON JOSE PEREZ YANEZ	VIGILANTE	100.00%
1.068.661.447	JAIDIR ANTONIO ORTEGA	OFICIOS VARIOS	100.00%

Tabla 6 Personal Indirecto

PERSONAL INDIRECTO DE OBRA					
NOMBRE	**N° DE CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**DEDICACIÓN (%)**
NATALY GONZALES TORRES	1.003.434.150	AUX SISO	22/01/2025		100%
ALBERT TAMARA NIETO	7.369.165	CADENERO	7/01/2025		100%
JULIO CESAR BENAVIDEZ ESPINO	77.165.580	TOPOGRAFO	7/01/2025	15/02/2025	100%
FABIAN ANDRES CASTILLO OSORIO	1.019.082.635	OPERADOR HYUNDAI HX 2205	10/02/2025		100%
ALEXANDER NICANOR VELAZQUEZ DIAZ	10.966.603	OPERADOR XCMG XE210CU	10/02/2025		100%
DANIEL EDUARDO BOHORQUEZ HERNANDEZ	1.104.010.316	OPERADOR KOBELCO 211	11/02/2025	21/02/2025	100%
ARNULFO MANUEL MONTIEL ROMERO	7.369.636	TOPOGRAFO	19/02/2025		100%

7.5. VALLA INFORMATIVA.

El CONTRATISTA para este periodo no realizó la instalación de la valla, debido a que no conto con la aprobación por parte de la CVS para la fecha, por tanto, para el próximo periodo se tendrá la evidencia fotográfica de esta actividad.

Tabla 7 Modelo de Valla Informativa para instalar.

Modelo de Valla Informativa Aprobada, para instalar


7.6. EJECUCIONES DEL CONTRATO DE OBRA.

Se informan los aspectos o condiciones a resaltar presentados en el periodo N°2, del 01 de febrero hasta el 28 de febrero de 2025 de la ejecución de la obra, donde El Contratista ha realizado las siguientes actividades:

7.6.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Levantamiento topográfico
- Llegada de maquinaria
- Descapote
- Optimización hidráulica del canal
- Visitas para acercamiento con la comunidad

Tabla 8 Evidencia fotográfica de las actividades ejecutadas mes N°2.

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025	
	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	**LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO**
	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	**LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO**

	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	**LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO**
	
LLEGADA DE LA MAQUINARIA	**LLEGADA DE LA MAQUINARIA**
	
LLEGADA DE LA MAQUINARIA	**LLEGADA DE LA MAQUINARIA**

	
OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL	**OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL**
	
DESCAPONE	
	
OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL	**OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL**

	
OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL	**OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL**
	
OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL	**OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL**
	

OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL	**OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL**
	
OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL	**OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL**
	
ACERCAMIENTO CON LA COMUNIDAD	**ACERCAMIENTO CON LA COMUNIDAD**

7.7. CONTROL DE ACCESO DE MATERIALES.

Para el periodo N°2 no hubo acceso de materiales debido a que aún no se han iniciado las actividades de revestimiento en piedra rajón, que es la donde se estarán recibiendo los materiales pétreos.

7.8. ENSAYO, PRUEBAS Y CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

El CONTRATISTA para este periodo no realizó los ensayos debido a que a la fecha no se ha iniciado las actividades de conformación de diques, que donde se requiere realizar esta actividad de control de calidad.

7.9. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTROLES DE CALIDAD.

Se tuvieron en cuenta los siguientes procedimientos de control de calidad para la ejecución de las actividades de topografía y la optimización hidráulica del canal, ejecutadas entre los periodos del 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2025.

7.9.1. PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD REALIZADOS:

- **LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO.**

Se refiere a la localización, trazado y replanteo de las obras a ejecutar mediante topografía de detalle. Establece la línea base de ejecución de las obras para el cálculo de cantidades de obra y georreferenciación del proyecto.

METODOLOGÍA:

- Se realiza la topografía del proyecto con acompañamiento de la interventoría.
- Se realiza la georreferenciación del proyecto y se define la línea base constructiva.
- Herramientas menores.
- Camioneta.
- Equipo de topografía.

MANO DE OBRA:

El contratista utilizará topógrafos y sus auxiliares para adelantar estas labores. Además, tendrá en cuenta los costos asociados a las medidas de seguridad y elementos de protección personal.

- **MOVIMIENTO DE TIERRA (RETIRO DE SEDIMENTOS, CONFORMACIÓN DE DIQUES Y DE DENTELLONES, RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO CON PIEDRA RAJÓN).**

Esta actividad comprende el retiro de sedimentos del cauce, conformación de diques y el cargue y el transporte de material sobrante proveniente de la excavación, de acuerdo con lo indicado en los diseños y planos constructivos (remitirse a anexos: 3. Estudio HEC y 4. Planos).

El mejoramiento con piedra rajón se hará donde se presente terreno reblandecido producto de la acumulación de agua que satura el suelo y/o a la putrefacción de material vegetal. La consultoría recomienda que en la base del dique se construya un cajón en piedra rajón de un (1) metro de espesor.

El retiro de sedimentos deberá ejecutarse por métodos mecánicos de acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones de la Interventoría. En las excavaciones que representen un peligro de derrumbe, debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes. La entidad contratante, no se hace responsable de daños que se causen a terceros, por causas imputables al Contratista.

Las excavaciones, sobrexcavaciones y retiros hechos para conveniencia del Contratista y ejecutadas sin autorización de la interventoría, así como las actividades que sean necesarias para reponer las condiciones existentes, serán por cuenta y riesgo del Contratista. La entidad contratante, no reconocerá adicionales no contemplados en los diseños, tampoco por las dificultades de acceso de equipos y materiales al sitio de obras.

METODOLOGÍA:

- Iniciar las actividades una vez la interventoría de la orden.
- Verificar los niveles de excavación con los expresados en los planos del proyecto.
- Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear.
- Cuantificar la cantidad de metros cúbicos de excavación a realizar.
- Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno.
- Evitar las mayores cantidades para restablecer los niveles requeridos.
- Prever posibles alteraciones del terreno.

EQUIPOS:

- Equipos mecánicos para excavación (retroexcavadoras), conformación de diques
- (buldócer, vibro compactador, carrotanques) y retiro de sobrantes (volquetas).
- Equipo de topografía (cuando se requiera).

MANO DE OBRA:

El contratista utilizará mano de obra experta para la operación de la maquinaria y equipos. Además, tendrá en cuenta los costos asociados a las medidas de seguridad y elementos de protección personal.

7.10. INCONVENIENTES PRESENTADOS.

Durante el periodo del 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2025 el contratista tuvo los siguientes inconvenientes:
Durante los días 17 al 20 de febrero las actividades relacionadas con la optimización hidráulica del canal se vieron suspendidas debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante esos días, este retraso y suspensión temporal de las actividades se les atribuye a condiciones meteorológicas poco comunes durante esta época del año.

Las fuertes lluvias que se presentaron en el municipio de Ciénaga de Oro y áreas aledañas generaron un aumento súbito en los niveles del caño de Aguas Prietas. Esta crecida imprevista del caño impidió el acceso adecuado y seguro a la zona de trabajo, lo que afectó directamente el desempeño de las actividades previstas.

Debido a la creciente súbita, se vio comprometida la seguridad de la maquinaria en el sitio. La intensidad del fenómeno meteorológico generó un alto riesgo de daños a los equipos, por lo que se tomó la decisión de suspender las actividades de manera temporal para evitar perjuicios mayores tanto a los recursos como al personal.

Además, las condiciones de trabajo se volvieron inapropiadas y peligrosas, lo que obligó a paralizar las labores en la zona.

El fenómeno descrito puede considerarse como un evento de fuerza mayor, ya que las lluvias intensas y la posterior crecida del caño no fueron previsibles ni controlables por el equipo de trabajo ni por los responsables del proyecto. Este tipo de evento no solo afectó la ejecución de las obras, sino que también generó condiciones inusuales para realizar las actividades de manera eficiente y segura.

Una vez que las condiciones meteorológicas mejoraron y el nivel del caño volvió a la

normalidad, las actividades fueron reanudadas inmediatamente

7.11. AVANCE DE LAS OBRAS:

En el periodo del presente Informe el Contratista presentó un porcentaje de Avance de Obra del 13.37%.

Tabla 9 Resumen de Avance de Obra.

Plazo Ejecución	10 meses
Tiempo Transcurrido	2 mes
Avance Porcentual	13.37%

7.12. REVISION DEL CONTRATO.

El CONSORCIO determinó los siguientes requisitos, para la revisión del contrato.

- Los requisitos para las actividades de entrega del proyecto a la finalización de éste.
- Requisitos por desarrollar antes, durante y en la entrega.
- Requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para la ejecución del proyecto.
- Requisitos legales y reglamentarios determinados a partir de los documentos que rigen la ejecución del proyecto, ya sea el contrato, los términos de referencia, pliegos de licitación especificaciones técnicas.

7.13. CONTROL DE DISEÑO.

Los diseños fueron entregados por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE –CVS, para su revisión y aprobación por parte de la Interventoría y Contratista.

7.14. INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

La información del proyecto reposa y se encuentra disponible en la oficina principal del CONTRATISTA.

7.15. APOYO (GESTION DE LOS RECURSOS).

7.15.1. PROVISIÓN DE RECURSOS

El CONTRATISTA dispuso de los siguientes recursos en el periodo No. 2:

- Personal técnico.
- Recursos financieros
- Comisión topográfica.

7.16. MATERIALES.

En el mes N°2 no se tuvo suministro de materiales, a que aún no se han iniciado las actividades de revestimiento en piedra rajón, que es la donde se estarán recibiendo los materiales pétreos.

7.17. INFRAESTRUCTURA.

En el periodo evaluado se tuvieron disponibles los siguientes recursos de infraestructura para dar cumplimiento a las responsabilidades contractuales del proyecto.

- Oficina
- Computadores
- Teléfonos celulares
- Impresora multifuncional y entre otros.

7.18. AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS.

El Contratista deberá disponer de una Oficina de Atención al Usuario -SAU en la obra, que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad industrial y comodidad para la atención al público y del personal de obra.

7.19. COMPRAS DE MATERIALES Y SUBCONTRATOS.

Durante el periodo del 30 de enero hasta el 28 febrero de 2025 no se realizó compra de materiales, se subcontrató la maquinaria, y se suministraron equipos y herramientas menores.

7.20. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO.

7.20.1. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA OBRA.

El CONTRATISTA dispone de una programación de obra, la cual fue verificada por la Interventoría y por el supervisor del contrato, quienes realizaron seguimiento, vigilancia y control sobre las actividades ejecutadas el mes N°2.

La información se registró diariamente en las Bitácoras de obra; donde se describen las actividades ejecutadas, los conceptos de la Interventoría, el personal en obra, el estado del tiempo, maquinaria y equipos utilizados.

7.21. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.

Se realizó el control de las actividades ejecutadas bajo supervisión de la interventoría, durante los periodos del 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2025.

Para este periodo el Contratista presentó un porcentaje de Avance de Obra del 13.37%.

8. COMPONENTE AMBIENTAL.

Dentro del componente ambiental se realiza el análisis de los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución de las actividades constructivas, con el fin de valorar los impactos de estos, y así mismo, poder ofrecer alternativas para mitigar o compensar los impactos que se puedan generar por el desarrollo del proyecto; ya que en algunos casos se producen consumos energéticos antes, durante y después de la creación de la obra, ocasionando deterioros en la calidad del ambiente por la manipulación de los recursos naturales.

En el periodo N°2 se desarrollaron las siguientes actividades, aplicando los controles necesarios a fin de disminuir los riesgos de contaminación al ambiente.

8.1. IDENTIFICACIÓN, EVOLUCIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES:

El Contratista dispone de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, para valorar los impactos e indicar la gestión que se debe tener en cuenta para el control de los impactos producidos, con el fin de prevenir y minimizar el riesgo de contaminación ambiental por el desarrollo de las actividades el periodo evaluado.

Para este periodo no se realizaron cambios en la matriz.

8.2. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES.

Durante el 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2025 se verificaron permisos, licencias ambientales o autorizaciones para el desarrollo de proyecto, y se describen a continuación en la siguiente tabla.

Tabla 10 Permisos, autorizaciones y licencias.

DESCRIPCION	REQUIERE (SI/NO)	OBSERVACION
Licencia ambiental	NO	No se requiere para la ejecución del proyecto
Permisos ambientales de cantera.	**SI**	Se solicitará a la cantera la copia vigente de título minero y de la licencia ambiental, cuando se inicie el suministro de los materiales pétreos.
Permiso de aprovechamiento forestal.	NO	Hasta la fecha no se hace necesario tener este permiso para la ejecución del proyecto.
Permiso de ocupación de cause o depósito de agua.	**SI**	Se realizó el trámite ante la entidad competente.
Salvoconductos para movilización de madera provenientes de los	NO	Según el alcance del proyecto no se requiere.

tratamientos realizados a la vegetación.		
Permisos relacionados con el patrimonio historio o arqueológico, si el proyecto afecta alguna zona con estas características.	NO	Según el alcance del proyecto no se requiere.

8.3. PROGRAMA DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL- COMUNIDAD CIURDANTE.

En el mes N°2 se realizaron labores de acercamiento y acompañamiento a la comunidad del área de influencia del proyecto, para brindarles información sobre los alcances del proyecto y así mismo, ofrecerles respaldo y atender las peticiones, quejas y reclamos que surjan durante la ejecución de la obra; cumpliendo con la implementación del plan de gestión social- comunidad circundante.

- **PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS:**

En el periodo evaluado no se presentó ninguna solicitud por parte de la comunidad. El contratista se compromete a brindar la atención al usuario durante la ejecución del proyecto, ya sean por usuarios de la comunidad aledaña, empresas de servicios públicos y privados y a los trabajadores de la obra.

El CONTRATISTA dispondrá de un Equipo de Gestión Social que será el encargado de la atención del usuario en la oficina (SAU), liderado por la trabajadora social y el acompañamiento de los demás profesionales de la obra (Ingenieros residentes y Auxiliar de SST).

Se tiene previsto establecer un horario de atención de 8:00 am a 12: pm y de 2: 00 pm a 5: 00 pm, para la atención en el sitio de la obra.

Tabla 11 Indicador solución de quejas y reclamos.

NOMBRE DEL INDICADOR	**Indicador solución de quejas y reclamos**
FORMULA DEL INDICADOR	AIQ= (CRQ/ CRQ) X 100
	CRQ: Cantidad de Quejas Respondidas

	CRQ: Cantidad de Quejas Recibidas.		
FUENTE:	Registro solución quejas y reclamos		
META:	**EXCELENTE**	**BUENO**	**MALO**
	100%		
FRECUENCIA DEL ANALISIS:	Mensual	**RESPONSABLE:**	Auxiliar de Trabajo Social
PERIODO: Del 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2025.	**NEUMERADOR**	**DENOMINADOR**	**RESULTADO**
	0	0	0%
INTERPRETACION DEL RESULTADO	No se presentaron quejas y reclamos el mes N°2		

- **RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.**

Se informa la relación de la correspondencia emitida y recibida durante el periodo comprendido del 01 febrero de enero hasta el 28 de febrero de 2025.

Tabla 12 Correspondencia Recibida y Enviada.

REPORTE DE OFICIOS ENVIADOS			
FECHA	**DIRIGIDO**	**CODIGO**	**ASUNTO**
27/01/2025	INTERVENTORÍA	OF-OBR-016	ENTREGA INFORME Nª1
12/02/2025	INTERVENTORÍA	OF-OBR-017	ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD

- **INCREMENTO DE DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS:**

Con la ejecución de la obra se espera contribuir con el incremento de la producción de bienes y servicios en la zona de influencia del proyecto; con el fin de beneficiar a la comunidad impactándolos positivamente con la oportunidad de ofrecer sus servicios y bienes que les permita generar ingresos.

Se tiene previsto generar un impacto positivo para todos los miembros actores directos e indirectos del proyecto, lo que define una incidencia directa, positiva, segura, de intensidad alta, de duración temporal, local, es no mitigable, pero si es compensable

considerándose un IIS.

- **GENERACIÓN DE EMPLEO:**

El contratista realiza la contratación de personal de mano de obra no calificada en la zona de ubicación de proyecto, con el apoyo del equipo social que realiza el reclutamiento de las hojas de vida, teniendo como prioridad las personas de los barrios de influencia directa al proyecto y también a las personas en condición de discapacidad que buscan una inclusión en el proyecto.

|

Para este periodo se realizó la contratación del personal técnico, de un trabajador de oficios varios y la comisión topográfica. La empresa tendrá en cuenta el procedimiento de la contratación para ejecutar dicha actividad y esta se hará de forma directa y personal contratista.

Tabla 13 Generación de empleos.

NOMBRE DEL INDICADOR	Generación d empleos		
FORMULA DEL INDICADOR	AIQ= (CTS/ CTR) X 100		
	CTS: Cantidad de trabajadores solicitados.		
	CTR: Cantidad de trabajadores Recibidos.		
FUENTE	Registro listado récord de personal en obra		
META	EXCELENTE	BUENO	MALO
	100%	X	
FRECUENCIA DEL ANALISIS		RESPONSABLE:	Profesional SST
PERIODO: Del 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2025.	**EXCELENTE**	**BUENO**	**MALO**
	100%		
INTERPRETACION DEL RESULTADO	Ingresó a la obra personal nuevo en el mes 2.		

- **EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL).**

Para el mes N°2 se realizó la remoción de tierra, ya que se para este período se realizó la optimización d hidráulica del canal y por tanto se requirió realizar excavaciones.

- **IDENTIFICACIÓN DE ACCESOS VIALES:**

Dentro del periodo evaluado no se realizaron accesos viales, debido a que para el mes N°2 no se iniciaron las actividades que implicaran la movilidad de maquinarias y vehículos.

- **DESVÍO Y CERRAMIENTOS:**

Para este periodo si hubo maquinaria en movimiento, pero no fue necesario implementar los desvíos y cerramientos como medida de control para la prevención de accidentes.

- **IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIA EN LOS ACCESOS A LAS VIVIENDAS.**

No se requirió hacer intervención sobre los accesos a las viviendas para la ejecución de las actividades durante este periodo.

- **RECORRIDO EN LOS FRENTES DE TRABAJO.**

Para este periodo se realizaron los recorridos diarios en la obra para inspeccionar las condiciones del trabajo y supervisar el desarrollo de las actividades, con el fin de verificar que los trabajadores adopten las medidas de seguridad y salud en el trabajo y del cuidado ambiental, con el de mitigar los impactos ambientales y de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

8.4. PUNTO ECOLOGICO:

Para este periodo se contó con el punto ecológico en la obra con el fin de realizar clasificación y disposición de los residuos, de acuerdo al código de colores establecidos mediante la resolución No. 2184 de 2019 expedida por El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante; donde se indican los colores blanco, negro

y verde, para la separación de residuos en la fuente; y así mismo facilitar la clasificación, permitiendo que todo el personal de obra pueda identificar y asociar los tipos de residuos para su correcta disposición.

Con el punto ecológico se contribuye a la disminución de la contaminación ambiental, y a su vez sirve para el aprovechamiento de los residuos, a fin de facilitar el reciclaje y contribuir con la reducción de extracción de nuevas materias primas para la producción de materiales de construcción.

8.5. CHARLAS Y CAPACITACIÓN.

Diariamente se realizaron las charlas de seguridad y desarrollaron capacitaciones, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

El objetivo de capacitar e instruir al personal es para crear conciencia sobre la importancia del cuidado ambiental, de los daños que se puede ocasionar y las recomendaciones que se deberán tener en cuenta para prevenir y compensar la contaminación y el deterioro de este y también para adoptar las medidas necesarias preventivas y de autocuidado para evitar que ocurran accidentes y enfermedades durante la ejecución del proyecto.
A continuación, se informan las capacitaciones realizadas:

- Capacitación del comité de convivencia laboral.
- Capacitación sobre actos y condiciones inseguras
- Capacitación al COPASST
- Capacitación pausas saludables.

8.6. BAÑO:

El CONTRATISTA se encuentra gestionando el suministro para las instalaciones sanitarias para uso de las personas que laboran en la obra. Se espera que para el próximo mes se tenga en la obra la instalación sanitaria.

Tabla 14 Registro Fotográfico Actividades Ambientales

<table>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">INSTALACIONES SANITARIAS</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>PUNTO ECOLOGICO</td><td>INSPECCIÓN DEL PUNTO ECOLÓGICO</td></tr>
</table>

	
KIT ANTIDERRAME	**KIT ANTIDERRAME**
	
CHARLAS AMBIENTALES	**CAPACITACIÓN AMBIENTAL**

9. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

9.1. POLÍTICAS.

Para la ejecución del contrato, la empresa estableció varias políticas que deben ser acatadas por todo el personal de obra, independientemente del tipo de su vinculación y cargo; con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento administrativo, técnico, y operativo del proyecto.

El CONTRATISTA estableció las siguientes políticas:

- **POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, AMBIENTE Y SST):** Realizamos la ejecución el proyecto cuyo objeto es: RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTAYANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA., generando un entorno seguro y saludable que promueva la seguridad y salud de los trabajadores, con el fomento de la cultura preventiva y del autocuidado; que disminuya los accidentes y enfermedades laborales, los daños a la propiedad y también que promueva el cuidado del ambiente y el cumplimiento de los requisitos legales y la satisfacción del cliente.

- **POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** El Consorcio realiza el Proyecto cuyo objeto es: “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTAYANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, satisfaciendo las necesidades del cliente, generando un ambiente, promoviendo la seguridad y salud de los colaboradores de los accidentes y enfermedades laborales, los daños a la propiedad e impactos a la sociedad y al ambiente y el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo.

- **POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS:** CONSORCIO se compromete a concientizar a todos sus trabajadores de los riesgos que representa para la salud el consumo excesivo de alcohol, cigarrillo y drogas; estableciendo la prohibición total del consumo de cigarrillo dentro de las instalaciones y el presentarse a trabajar en estado de embriaguez, drogadicción y del incumplimiento que origina las sanciones descritas en el reglamento interno.

- **POLÍTICA PREVENTIVA CONTRA EL ACOSO LABORAL:** La empresa en cumplimiento de sus compromisos durante la ejecución del proceso constructivo y administrativo establece como prioridad el mantenimiento de un clima laboral en el que se evidencie el respeto por los derechos humanos y una relación de armonía entre los diferentes actores que hacen del proyecto.

- **POLÍTICA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:** Para la empresa es importante tener un Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias, para reducir la severidad y las consecuencias de pérdidas por Accidentes, Emergencias Ambientales y Desastres Naturales.

- **POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO**: EL CONSORCIO está comprometido en adelantar el programa de orden, aseo y limpieza para la detección, prevención y mitigación de accidentes, evitando que las actividades desarrolladas ocasionen amenazas a la salud de los colaboradores, contratistas y visitantes.

9.2. SOCIALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS.

El CONTRATISTA realizó la socialización de las políticas al personal que ingreso a laborar en la obra durante el periodo evaluado, y también se realizó la publicación de estas.

9.3. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

- Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo y promoviendo el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales, así como de otros requisitos considerados adecuados por la Empresa.

- Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de Gestión de la Prevención destinado a la mejora continua de las Condiciones de Trabajo y de la gestión y el desempeño en la Prevención de Riesgos Laborales.
- Integrar dicho sistema en la gestión de la organización, de manera que la prevención se incorpore en todas las actividades que se desarrollan en la Empresa, con potencial incidencia sobre la seguridad, salud o bienestar de sus trabajadores.

- Desarrollar, aplicar y mantener actualizados los Planes de Prevención de todas nuestras actividades.

- Vigilar el estado de salud de los trabajadores a través de protocolos relacionados con la actividad y el riesgo asociado a la misma.

- Los objetivos indicados en esta Política reflejan el compromiso que la dirección de la empresa tiene establecido para, en la mayor medida de lo posible, prevenir los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores de esta empresa.

9.4. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El Contratista cuenta un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial que fue socializado a los trabajadores que ingresaron a trabajar en este periodo, y también fue publicado en un lugar visible de la obra.

El reglamento regula los deberes y limitaciones a los que deben ceñirse todos los trabajadores con relación a sus labores y a la convivencia dentro de la empresa.

9.5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS VERSUS EJECUTADAS.

Para este mes se programaron quince (15) actividades en el componente de seguridad y salud en el trabajo, de fueron ejecutadas en su totalidad, para un avance de ejecución del 100%.

Tabla 15 Actividades de SST programadas vs ejecutadas.

ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Socialización de las políticas.	El contratista dispone de varias políticas que son de obligatorio cumplimiento Los documentos fueron socializados al personal que ingreso a la obra.
2	Socialización del reglamento de higiene y seguridad industrial.	El reglamento regula los deberes y limitaciones a los que deben ceñirse todos los trabajadores con relación a sus labores y a la convivencia dentro de la empresa. Este documento fue socializado al personal que ingreso a la obra.
3	Socialización de plan de emergencia.	Con el plan de emergencias se busca la prevención y protección ante la aparición de eventualidades no deseadas. El documento fue socializado al personal que ingreso a la obra.
4	Se llenaron los formatos de SST	Se llenaron los formatos para recolectar la evidencia de cumplimiento del PGIO en el componente de SST.
5	Socialización de la matriz de peligros	La matriz se realizó con base a la Guía Técnica Colombiana - GTC 45, para la identificación y valoración de los riesgos de las actividades desarrolladas por los trabajadores. El documento fue socializado al personal que ingreso a la obra.
6	Cuestionario nórdico	Se aplico la encuesta a cada trabajador para detectar molestias sobre los desórdenes musculo esqueléticos.
7	Capacitaciones	Se realizó capacitación ambiental y sobre SST.
8	Encuesta de perfil sociodemográfico	Se aplico la encuesta a cada trabajador con el fin de conocer los aspectos sociodemográficos de la población trabajadores,

9	Perfil sociodemográfico	Se realizo base de datos de los trabajadores, para conocer los aspectos realizados con el nivel de escolaridad, tipo de vivienda, nivel de estudios, estado civil, contacto de emergencia, datos de nacimiento, tipo de sexo, etc.
10	Inducciones	Se realizaron las inducciones a cada colaborador, con el fin de dar a conocer los aspectos generales de la empresa, aspectos de seguridad, ambientales y sobre la naturaleza del cargo, entre otros aspectos relevantes.
11	Evaluación de inducción SST	Se realizo la evaluación sobre las inducciones realizadas a cada colaborador.
12	Entrega de EPP	Se entregaron los EPP a cada trabajador según las actividades realizadas.
13	Conformación de COPASST	Se realizo la conformación del COPASST, debido a que en campo contamos con mas de 10 trabajadores.
14	Afiliaciones de seguridad social	Se realizaron las afiliaciones al personal contratado directamente y también se les solicitaron los documentos soporte a los contratistas.
15	Inspecciones	Se realizaron las inspecciones ambientales y de seguridad en el periodo evaluado.

9.6. RECURSOS.

El CONTRATISTA realizó el suministro de los insumos y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de SST, dentro de los cuales se tienen los siguientes:

Elementos de SST.

- Camillas
- Extintores
- Botiquín
- EPP
- Dotación

El compromiso será de suministrar los recursos necesarios que se requieran para el desarrollo de las actividades y el cumplir con la implementación mensual del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

9.7. RECURSO HUMANO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El personal técnico fue contratado de acuerdo con lo establecido en pliego de condiciones de proyecto, el cual estuvo disponible del 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2025.

En la siguiente tabla se describe la información de los profesionales contratados.

Tabla 16 Personal Técnico del contrato de obra.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO DEL PROFESIONAL	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
52.254.090	ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO	DIRECTOR DE OBRA	50,00%
1.042.424.437	JOSE FAWCETT HERNÁNDEZ MIER	RESIDENTE DE OBRA 1	100,00%
8.686.400	JOSE FRANCISCO FIORILLO SARMIENTO	RESIDENTE DE OBRA 2	100,00%
1.075.652.455	NIKOLLE TATIANA FETECUA GUTIERREZ	PROFESIONAL SOCIAL	100,00%
52.547.455	MÓNICA ORTEGA MORENO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	100,00%
10.221.652	GERMÁN MONSALVE SAENZ	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	100,00%
80.539.487	LUIS FERNANDO GUERRERO ALARCON	ESPECIALISTA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	100,00%

Tabla 17 Resumen del personal contratado

ITEM	TIPO DE VINCULACION	CANTIDAD
Periodo: del 30/1/2025 hasta 28/2/2025		
1	PROFESIONALES	13
2	CONTRATISTAS (comisión topográfica)	3
3	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	3
4	ADMINISTRATIVO	1
	TOTAL, ACTIVOS	**20**

9.8. JORNADA LABORAL.

Se tiene previsto al iniciar las actividades constructivas, establecer un horario para el personal operativo que iría desde las 07:00 A.M. hasta 12:00 P.M. y posteriormente de 1:30 P.M. hasta las 5:00 P.M, de lunes a viernes y los sábados de 07:00 A.M. hasta las 12:00 P.M.

Para el personal el personal de la oficina principal se tiene previsto un horario que iniciaría desde las 08:00 A.M. hasta 12:00 P.M. y posteriormente desde 2:00 P.M. hasta las 6:00 P.M. de lunes A viernes.

10. ANÁLISIS DE RIESGO Y PLAN DE CONTINGENCIA

La Contratita realizó el análisis de los riesgos en la obra, para tener disponible un plan de contingencia ante eventos que puedan interferir en el avance mensual proyectado de la obra.

10.1. BRIGADA DE EMERGENCIA.

Para este periodo no se reporta la conformación de la Brigada de Emergencia, se espera que para el próximo mes se realice la conformación de esta.

11. PROGRAMA DE HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Se realizan los recorridos en las áreas de trabajo para verificar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo y los actos que seguros e inseguros en el desarrollo de la

tarea por los trabajadores. Esta actividad se realiza para identificar la eficiencia y efectividad de los controles implementados para prevenir los AT y EL.

Se realizaron las siguientes actividades para el cumplimiento del subprograma.

- Charlas de seguridad y ambientales
- Capacitaciones
- Entrega de EPP.
- Recorridos en los frentes de trabajo

11.1. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para el programa tiene como prioridad la prevención del riesgo y el cuidado integridad de la salud física y mental de los colaboradores, razón por la que se deberán implementar las medidas de prevención y los diferentes controles en la fuente, en el medio y en el trabajador.

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades para el desarrollo del subprograma.

- **DENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS LABORALES.**

Se realizo socializo la personal que ingreso a la obra la matriz de peligros, que está basada en la Guía Técnica Colombiana - GTC 45, para realizar la identificación de peligros en los sitios trabajo y se evaluar los riesgos asociados a la tarea, con el fin de eliminar o minimizar las causas, haciendo énfasis en las medidas preventivas y estableciendo los controles pertinentes, en la búsqueda de la mejora continua.

- **EL COPASST (COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO).**

Para este mes se reporta la conformación del COPASST, debido a que en la obra se encuentran más de 10 trabajadores. Al comité se le notificaron los roles y responsabilidades frente a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, durante la ejecución del proyecto.

- **COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL:**

Para este mes se reporta la conformación del comité de convivencia laboral, Al comité se le notificaron los roles y responsabilidades frente a la gestión del bienestar laboral, manejo de las relaciones interpersonales y la sana convivencia en el entorno laboral del proyecto.

11.2. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El objetivo principal es la promoción, la prevención y el control para garantizar la promoción de la salud de los colaboradores, protegiéndolos de los factores de riesgos ocupacionales y también brindándoles seguridad al realizar las actividades laborales.
El Contratista desarrolló las actividades necesarias para la implementación del subprograma de medicina preventiva y del trabajo, dentro de las cuales se tienen las siguientes:

- **PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO:** Se llevó el registro de la población trabajadora, con el fin de definir el tamaño y las principales características sociales de la población trabajadora.

- **CONTROL DE AUSENTISMO LABORAL:** Diariamente se llevó el control y el registro de la asistencia de los trabajadores, para verificar el ausentismo laboral.

  El registro se llevó para medir la ausencia o abandono del puesto de trabajo por parte de los trabajadores, ya sea por causa medica de enfermedad común o por accidentes de trabajo.

Tabla 18 Control de ausentismo laboral.

PERIODO: DEL 30 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025.			
INDICADOR	**RESULTADOS**	**OBSERVACION**	**FORMULACION**
N° de accidentes	0	Se presentaron 0 AT	

N° de días perdidos por accidentes	0	Se presentaron 0 días perdidos por incapacidad de AT	
Tasa de accidentalidad	0%	La tasa de AT, para el periodo se mantiene en 0%, ya que no ocurrió evento	N° AT / N° Promedio de trabajadores
Índice de frecuencia de AT	0%	el índice es de 0% porque no ha ocurrido AT en el mes.	(N° total de AT en el año / N° HHT año) x 1.000.000
Índice de severidad de At	0%	El índice se mantiene en 0%, porque no ha ocurrido AT	(N° AT con incapacidad en el año / N ° HHT año) x 1.000.000
Índice de lesiones Incapacitantes	0,00%	No se presentó ninguna lesión incapacitante	Índice de frecuencia x Índice de severidad / 1000
Total, horas hombres trabajadas	10,560 Hr.	Se laboraron 30 días con una intensidad diaria de 8 horas y un número de trabajadores de mano de obra no calificada de 44, no se tuvieron horas extras en el mes	(Total días trabajados x 8 x Número de trabajadores) + Horas extras

- **VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**: EL contratista realiza la implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica con el fin de poder detectar las posibles lesiones o enfermedades en los trabajadores y desarrollar programas de prevención, control o erradicación de estas. Para este periodo se aplicó el Cuestionario Nórdico a los trabajadores, para recopilar la información sobre el estado de salud de los mimos.

- **INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES:** Toda vez que ocurra un evento se deberá realizar la investigación del AT y se hace el seguimiento de la accidentabilidad, para determinar y ordenar las causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia de un accidente, incidente o enfermedad. No se realizaron investigaciones dentro del periodo No. 2.
- **PRIMEROS AUXILIOS:** El contratista dispone de botiquín, camilla con cuellos, extintor y entre otros elementos de que hacen parte de la dotación de la brigada de emergencia, para atender los casos de accidentes laborales u otros casos de emergencia que se lleguen a presentar.

- **ESTILOS DE VIDA SALUDABLES:** La empresa promueve una cultura del autocuidado y estilos de vida saludables y realiza acciones de intervención en los factores de riesgo modificables, para la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, y enfermedades respiratorias. Para este periodo se hicieron charlas de sensibilización al personal sobre este tema.

- **EXAMEN OCUPACIONALES:** El Contratista realiza los exámenes ocupacionales a los trabajadores para conocer si estos encuentran aptos, para desempeñar las funciones de cargo y también al momento de retirarlos para conocer el estado de salud de los mimos en el que salen de la empresa. Para el periodo se elaboraron los exámenes ocupaciones del personal que ingreso a la obra.

- **PAUSAS ACTIVAS:** Se realizó la socialización de la importancia de implementar el programa de las pausas saludables diariamente durante la jornada laboral, las cuales permiten a los trabajadores eliminar fatigas y estrés por el desarrollo de las labores.

11.3. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Con la aplicación e implementación de las medidas de la Seguridad e Higiene Industrial el Consorcio busca fomentar una cultura de prevención; estudiando las condiciones del medio de trabajo, de tal manera que se identifique, evalúe y controlen los agentes contaminantes que puedan provocar accidentes.

- **HIDRATACIÓN DE LOS TRABAJADORES:** El Contratista suministra a los trabajadores agua para el consumo para prevenir el riesgo de deshidratación provenientes de los golpes de calor por las altas temperas.

- **NOTIFICACIÓN DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS DE TRABAJO:** Los trabajadores no realizaron notificaciones sobre aspectos que pueden representar un peligro durante las jornadas laborales.

- **REPORTE DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES:** La empresa lleva un control sobre la materialización este tipo de eventos con el fin de tomar medidas en caso de ser necesario para disminuir la tasa de la accidentalidad. Para este periodo no se reportó ninguna materialización de estos eventos.

- **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP:** El Contratista realizó el suministró a cada colaborador los EPP necesarios y adecuados para la ejecución de la tarea.
- **INSPECCIONES DE SEGURIDAD:** Durante los recorridos diarios se inspeccionaron las áreas de trabajo para identificar los peligros y controlar los riesgos para prevenir que estos, puedan ocasionar daños a las personas o al lugar de trabajo.

- **SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA:** El contratista conoce la importancia de realizar la instalación de las señales en la obra diariamente para la prevención de los riesgos de accidentes labores y de tránsito por la circulación de vehículos y maquinaría pesadas y del personal de la obra.

- **INDUCCIONES Y REINDUCCIONES:** Se realizaron las inducciones al personal que ingreso en este periodo a la obra, a fin de dar a conocer los aspectos generales

del consorcio, políticas, reglamentos, medidas de seguridad y las funciones del cargo y entre otros aspectos de la empresa.

- **SUSTACIAS QUMICAS E INFLAMABLES**: Las sustancias químicas e inflamables en cada periodo fueron debidamente rotuladas y señalizadas, y también se dispone de las fichas de seguridad de cada sustancia almacenada.

- **CAPACITACIONES:** Se desarrollaron varias capacitaciones durante el periodo evaluado, con el objeto de mejorar las destrezas y habilidades de los trabajadores al momento de realizar las actividades.

  Dentro de las capacitaciones realizadas se hicieron las siguientes:
  - Capacitación del comité de convivencia laboral.
  - Capacitación sobre actos y condiciones inseguras
  - Capacitación al COPASST
  - Capacitación pausas saludables.
- **ORDEN Y ASEO:** se mantuvieron las áreas de trabajo limpias con el fin de prevenir los accidentes y cuidar el ambiente.

- **CONTROLES DE SST APLICADOS:** En este periodo se aplicaron los controles en la fuente, el medio y en el trabajador, con el fin prevenir los accidentes y enfermedades laborales durante el desarrollo de las actividades.

Tabla 19 Registros fotográficos de actividades

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 30 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	
	

ENTREGA DE DOTACIÓN Y DE EPP	ENTREGA DE DOTACIÓN Y DE EPP
	
CHARLAS DE SEGURIDAD	**CAPACITACIONES**
	
CAPACITACIONES	**ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO**

	
PUNTO ECOLÓGICO	**CALIFICACIÓN DE INDUCIONES**
	
INDUCCIONES	**SEÑALIZACIÓN**

	
BOTIQUÍN	**CAMILLA**
	

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	BOTIQUÍN Y EXTINTORES



PUNTO DE HIDRATACIÓN



PUBLICACIÓN DE POLÍTICAS Y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



SUSTANCIAS INFLAMABLES Y QUÍMICAS

12. GESTIÓN SOCIAL:

12.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.

El programa de gestión social tiene como objetivo mantener a la comunidad informada sobre los alcances del proyecto, de brindar respaldo constante a la comunidad, y atender las quejas y reclamos que surjan por el desarrollo de las actividades de obra, dando soluciones oportunas y en el menor tiempo de respuesta según el caso.

- **INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN**

En el periodo N°2 se realizó el acercamiento a la comunidad de influencia directa a la obra, con el fin de realizar la socialización del proyecto y dar a conocer los alcances de este.

Tabla 20 Evidencia fotográfica labor social.

LABOR SOCIAL DEL 30 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025	
	
VISITA A PERSONAL DE LA COMUNIDAD	**VISITA A PERSONAL DE LA COMUNIDAD**
	
VOLANTE DE INVITACIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD	

9. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

El periodo comprendido entre el 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2025 se realizó la implementación del Plan de Gestión Integral de Obras- PGIO, periodo durante el cual se desarrollaron varias actividades las actividades en cada uno de sus ejes, de calidad, ambiente y de SST; que anteriormente fueron descritas ene le presente plan, todo los anterior, con el objetivo de garantizar que se realicen los procesos constructivos con calidad, se realicen buenas prácticas de trabajo cuidando el medioambiente, fomentando la prevención de los riesgos de enfermedades y accidentes laborales, el cuidado de la propiedad del cliente; y el cumplimiento de los requisitos legales, durante la ejecución de la obra.

Se recomienda que El CONTRATISTA continue desarrollando las actividades contempladas en el Plan de Gestión Integral de Obras- PGIO, a fin de ccumplir con la implementación de este y garantizar el desarrollo sostenible del proyecto.

Firman,

		
ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Cargo: Profesional SST	**Cargo: director de Interventoría**	**Cargo: Supervisor Del Contrato**

13. ANEXOS:

ANEXO 1 AFILIACIONES
ANEXO 2. COMITÉ CONVIVENCIA LABORA
ANEXO 3. COPASST
ANEXO 4. DOCUMENTOS DE MAQUINARIA
ANEXO 5. EXAMENES DE INGRESO
ANEXO 6. FORMATOS DE EVIDENCIAS E ACTIVIDADES PGIO
ANEXO 7. LISTADO PERSONAL
ANEXO 8. REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO

ANEXO 1: AFILIACIONES

Consorcio Punta Yamesay 18 febrero 2023





Dirección: Vereda El Higal, municipio de Ciénaga de oro
Cargo: Vigilante
Salario: $1.423.500
ARL: SURA
Global Ser
Colpensiones

ARL | sura

Medellín, 17 de February de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL CORDOBA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C78038246	CORONADO RETAMOSO NAYID SALOMON	18/02/2025		223J3821	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 17/02/2025 09:18:41 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.146.15.25, 198.143.41.43, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **NAYID SALOMON CORONADO RETAMOSO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **78038246,** se encuentra afiliado/a desde **11/07/2017** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 17 de febrero de 2025.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

mutualser
NIT 806.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No. de Radicación:

Fecha de Radicación: 18/02/2025

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] -Cotizante o Cabeza de Familia [X] -Beneficiario o afiliado adicional [ ] D. De oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS) [ ]

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

A. AFILIACIÓN

6. Apellidos y nombres			
CORONADO	RETAMOSO	NAYID	SALOMON

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	78038246	Femenino [ ] Masculino [X]	27/12/1981

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [ ] Condición [ ]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
SURA	COLPENSIONES	1.423.500

18. Residencia			
VEREDA EL HIGAL	3205412863		
CIENEGA DE ORO (Municipio/Distrito)	Zona: Urbana [ ] Rural [X]	Localidad/Comuna	CORDOBA (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
01					D D M M A A A A
02					D D M M A A A A
03					D D M M A A A A
04					D D M M A A A A
05					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P
01							
02							
03							
04							
05							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
0		
0		
0		
0		
0		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	NIT	901895986 -5	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
CL 62 A 7 67	3002104416		MONTERIA	CORDOBA

- 3a. COPIA: AFILIADO -

Página 1 de 2

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

mutualser

NIT 806.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

II. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [x] 6. Reinscripción en la EPS.
- [x] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo. [ ] B. Régimen Subsidiado.
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen. [ ] B. Diferente Régimen.
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
CORONADO	RETAMOSO	NAYID	SALOMON

Tipo de documento de identidad	Número de identificación	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	78.038.246	Femenino [ ] Masculino [x]	27 12 1981	18 02 2025

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [x] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [x] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [x] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [x] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de Oficio
nayib coronado	SELENE SALLESTEROS L.

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ]		

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Consorcio
Punta yayneg cv3
18 Febrero 2023





Dirección: Vereda El Higal - Ciénaga de oro
Cargo: Auxiliar de oficios varios
Salario: $ 1.423.500
ARL: SURA
Mutual ser
Proteccion

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

mutualser
NIT 806.008.394-1

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No. de Radicación:

Fecha de Radicación: 18/02/2025

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): [ ]

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

A. AFILIACIÓN

6. Apellidos y nombres			
ORTEGA	REGINO	JAIDIR	ANTONIO

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1.066.061.447	Femenino [ ] Masculino [X]	08/02/1987

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [ ] Condición [ ]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
SURA		1.423.500

18. Residencia			
VEREDA EL HIGAL		3227554122	
CIENEGA DE ORO (Municipio/Distrito)	Zona: Urbana [ ] Rural [X]	(Localidad/Comuna)	CORDOBA (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P
01							
02							
03							
04							
05							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
0		
0		
0		
0		
0		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	NIT	901895986 -5	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
CL 62 A 7 67	3002104416		MONTERIA	CORDOBA

- 5a. COPIA: AFILIADO -

Página 1 de 2

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

mutualser

NIT 800.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

II. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [x] 6. Reinscripción en la EPS.
- [x] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo. [ ] B. Régimen Subsidiado.
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen. [ ] B. Diferente Régimen.
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
ORTEGA	REGINO	JAIDIR	ANTONIO

Tipo de documento de identidad	Número de identificación	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	1.068.661.447	Femenino [ ] Masculino [x]	08 02 1987	18 02 2025

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [x] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [x] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [x] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [x] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de Oficio
Jaidiv ortega	SELENE BALLESTEROS L.

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC
  Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Página 1 de 2

ARL | sura

Medellín, 17 de February de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL CORDOBA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1068661447	ORTEGA REGINO JAIDIR ANTONIO	18/02/2025		13996207	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 17/02/2025 09:17:16 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.146.15.25, 198.143.41.43, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Consorcio Punta Yamesca 3 Febrero 2023


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.067.958.138
ATENCIA GARCIA
APELLIDOS
ROGER JOSE
NOMBRES
Roger Atencia
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 27-ENE-1998
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-ENE-2016 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

Dirección: Manzana 7 Lote 1 Barrio Panamá
EPS: Nueva EPS
AFP: Protección
ARL: SURA
Salario: $1'423.500

Ingeniero residente
3023348717

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

SOPORTE DE NOVEDADES DE REINGRESOS

nueva eps
gente cuidando gente

CÓDIGO ASESOR Y/O PROMOTOR

AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
ATENCIA	GARCIA	ROGER	JOSE

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9. SEXO (M/F)
CC - Cédula de Ciudadanía	1.067.958.138	✓

SEXO DE IDENTIFICACIÓN					10. FECHA NACIMIENTO				PAÍS DE NACIMIENTO	11. NACIONALIDAD
		✓				27	ENERO	1998	COLOMBIA	

ANEXO COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ZONA	TELÉFONO MÓVIL
MONTERIA	CÓRDOBA	RURAL DISPERSO	3023348717

TELÉFONO FIJO	EXT.	CORREO ELECTRÓNICO	IPS	IPS ODONTOLÓGICA
		consorciopuntayanezcvs@gmail.com		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO

39. Nombre o Razón Social	40. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	41. Número documento de identidad	DV	42. Tipo de aportante o pagador de pensiones
CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	NI - Número Identificación Tributaria	901895986	5	

43. UBICACIÓN O DIRECCIÓN	TIPO NOMENCLATURA	URBANA	RURAL				COMPLEMENTO DIRECCIÓN		
Calle 62		2	# 2				CASTELLANA	MONTERIA	CÓRDOBA

				FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL			CARGO	OCUPACIÓN	SALARIO
				07	02	2025	RESIDENTE		$ 1.423.500

IX. FIRMAS

Roger Atencia
61. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique

62. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

ARL | sura

Medellín, 06 de February de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL CORDOBA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1067958138	ATENCIA GARCIA ROGER JOSE	07/02/2025		12315423	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/02/2025 17:52:35 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.146.15.25, 198.143.41.34, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **ATENCIA GARCIA ROGER JOSE** identificado(a) con **CC** número **1.067.958.138** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 29 de julio de 2019 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 06 de febrero de 2025.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante**: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **ARNULFO MANUEL MONTIEL ROMERO** identificado con **CC** No. **7369636**, registra la siguiente información.

Datos de la Relación Laboral
Fecha de inicio de cobertura: 19/02/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE VOLUNTARIO **Clase de Riesgo:** 2

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501012656279.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 18 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) ARNULFO MANUEL MONTIEL ROMERO identificado(a) con C.C No. 7.369.636, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 18 de febrero del 2025.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 601 748 48 88, Barranquilla 605 386 98 88, Bucaramanga 607 698 58 88, Cali 602 489 98 88, Cartagena 605 694 98 88, Medellín 604 604 28 88 y en el resto del país 01 800 05 10000.



Leonardo Cáceres García
Gerente Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

Medellín, 14 de Febrero de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JORGE ANTONIO VILLEGAS GONZALEZ, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1104010316	BOHORQUEZ HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	01/02/2025		20037247	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C716473052504538280

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 45.176.232.70, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **DANIEL EDUARDO BOHORQUEZ HERNANDEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1104010316,** se encuentra afiliado/a desde **06/02/2008** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 14 de febrero de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá, 10/02/2025

Señor(a)
FABIAN ANDRES CASTILLO OSORIO
C – 1019082635

Referencia: certificado radicación de afiliación
Formulario No.: 4014165777
Fecha Radicación: 02/10/2025

Apreciado afiliado:

Reciba un cordial saludo en nombre de Salud Total EPS-S S.A., y nuestros agradecimientos por habernos escogido como su Entidad Promotora de Salud (EPS) de su preferencia.

Salud Total EPS-S S.A., certifica que su solicitud de afiliación y/o Novedad de la afiliación se encuentra radicada al Plan de Beneficios del Régimen Contributivo como trabajador dependiente de la empresa JJMO CONSTRUCCIONES S A S N 901622879, bajo el tipo de cotizante C con una base de cotización para el 2025 de $ 1423500.

A continuación, relacionamos la información de los miembros del grupo familiar asociados a este formulario:

Nombre y Apellido	Documento / Tipo	Fecha Nacimiento (mm/dd/aaaa)	Parentesco	Sexo	Anexos pendientes
FABIAN ANDRES CASTILLO OSORIO	C	05/31/1993	COTIZANTE	M	

Información Afiliación
EPS Anterior: NINGUNA
Posible inicio vigencia afiliación: 03/10/2025 **(sujeto a autorización de traslado)**

Información Laboral
Dirección Empleador: CL 72 No 39 175
Dirección Laboral: CL 72 No 39 175
Fondo de Pensiones:
Administradora Riesgos Profesionales: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A
Fecha Ingreso a laborar(mm/dd/aaaa): 02/08/2025

Es importante que tenga en cuenta que este documento hace las veces de **copia de formulario de afiliación.** Recuerde que la información relacionada con los derechos y deberes se encuentra en la página web www.saludtotal.com.co. Si usted requiere algún tipo de información adicional puede comunicarse con el asesor que lo atendió, el Sr (a) AFILIACION EMPRESA SIN ASESOR Código: X019, o dirigirse a la oficina de SALUD TOTAL EPS-S S.A. más cercana.

Señor usuario, con el ánimo de brindar a usted y a sus beneficiarios un mejor servicio, le solicitamos por favor que los documentos relacionados como Anexos pendientes sean entregados

al asesor a la mayor brevedad. De Acuerdo al decreto 780 de 2016, estos documentos son parte integral de la afiliación y de no ser entregados pueden ocasionar la suspensión de la afiliación de los beneficiarios.

Descripción de anexos:

Documentos exigidos	Cod.	Documentos exigidos	Cod.	Documentos exigidos	Cod.
Documento de identidad	A	Registro civil de matrimonio	B	Declaración extrajuicio de convivencia	C
Certificado de escolaridad (renovable cada periodo escolar)	F	Certificado de incapacidad permanente	G	Certificado de dependencia económica	H
Registro civil prueba de parentesco	S	Carta certificación representante legal	T	Carta contrato de aprendizaje	W
AFP para cotizantes cooperativas	1	ARP para cotizantes cooperativas	2	Certificación ARP	11

Cordialmente,

GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS-S S.A.

Si al momento de recibir esta comunicación, usted ya solucionó dicha situación, por favor haga caso omiso de esta información. ¿Sabía usted que, si nos suministra una dirección válida de correo electrónico, podemos comunicarnos de manera rápida, efectiva y, además, evitamos el uso exagerado de hojas de papel? Ingrese ya mismo a nuestra página WEB www.saludtotal.com.co, y en la opción “Te Escuchamos” registre la información que desea actualizar, y ayúdenos a preservar el planeta.

ARL | sura

Medellin, 07 de February de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de JJMO CONSTRUCCIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 CORDOBA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1019082635	CASTILLO OSORIO FABIAN ANDRES	06/02/2025		046149a	DEPENDIENTE	POR INICIAR

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

FABIAN ANDRES CASTILLO OSORIO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.019.082.635**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Febrero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Bogotá, Febrero 8 de 2025

Señor:
CAMARGO PEREIRA MANUEL ANTONIO
CC. 1007411579
KM 6 VIA MONTERIA PLATA RICA - 0
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Enero 31 de 2020. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliacion	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliacion	Fecha de desafiliacion EPS	Estado Actual	Discapacidad
CAMARGO PEREIRA MANUEL ANTONIO	1007411579	C	Ene-31-2020	52	26	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
VILLEGAS GONZALEZ JORGE ANTONIO	1007411579	Dependiente	VIGENTE

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos

Medellín, 08 de Febrero de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JORGE ANTONIO VILLEGAS GONZALEZ, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1007411579	CAMARGO PEREIRA MANUEL ANTONIO	01/02/2025		17317123	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C716473052503935510

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/02/2025 09:51:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 45.176.232.70, 192.230.104.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

MANUEL ANTONIO CAMARGO PEREIRA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.007.411.579**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 8 de Febrero del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS S

NIT 800.130.907-4

Lea las instrucciones que se encuentran antes de diligenciar

CONSECUTIVO No.

No. de Radicación

Fecha de Radicación: 27 / 01 / 2025

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ] — Cotizante o Cabeza de Familia [ ] Beneficiario o afiliado adicional [ ]

3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [X] C. Pensionado [ ] — Código (a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
GONZALEZ	TORRES	NATALY	
7. Tipo de documento de identidad: CC	8. Número del documento de identidad: 1003434150	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	10. Fecha de nacimiento: 25 / 07 / 2000

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo [ ] Condición [ ]	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales -ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de cotización (IBC)
ARL POSITIVA	PORVENIR	$ 1.423.500

18. Residencia			
CL 1 NO 2-52		3116110576	NATALYGONZALEZTORRES44@GMAIL.COM
CERETE (Municipio-Distrito)	Zona: Urbana [ ] Rural [X]	BERASTEGUI-CIENAGA DE ORO	CORDOBA (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P
01							
02							
03							
04							
05							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
0		
0		
0		
0		
0		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y/O DEL APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
INDEPENDIENTE			

39. Ubicación

Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento

F385-RVA V.1.0-2016

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS

NIT 800.130.907-4

CONSECUTIVO No.

No. de Radicación | Fecha de Radicación: 2 2 0 1 2 0 2 5

II. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código: [ ]
- [X] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

III. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Tipo de documento de identidad [ ]		Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento	42. Fecha: 2 2 0 1 2 0 2 5
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

Nabel Gonzalez CC 1003424150.

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexa copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. CAMPOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificador de la Entidad Territorial: Código del Municipio [ ]	Código del Departamento [ ]	67. Datos del SISBEN: Número de Ficha [ ]	Puntaje [ ]	Nivel [ ]	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
70. Datos del funcionario que realiza la validación						
Tipo de documento de identidad [ ]	Número de documento de identidad		71. Firma del funcionario			

OBSERVACIONES

Recuerde que con la firma del formulario el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

F385-RIVA V.1 9-2016

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

NATALY GONZALEZ TORRES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.003.434.150**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Enero del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **NATALY GONZALEZ TORRES** identificado con **CC** No. **1003434150**, registra la siguiente información.

Datos de la Relación Laboral
Fecha de inicio de cobertura: 28/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE VOLUNTARIO **Clase de Riesgo:** 5

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501011729915.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 27 días del mes de enero de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900479957-4	GRUAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA S.A.S		CALLE 41 N 16A-135	3126441435	comercial@gruasytransporte.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PS	PS 02	CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	Y	11/02/2025	84113668	$976.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	225.500	0		0		0	0	0	0	225.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	118.700	0		0		0	0	0	0	118.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.600	0	0	0	0	0	0		288.600	2
231001	Colfondos	800227940-6	151.900	0	0	0	0	0	0		151.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	191.700				191.700	0	0	191.700			1.917	191.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	344.200	344.200
Pensión	2	440.500	440.500
Riesgos Laborales	1	191.700	191.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	976.400	976.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900479957-4	GRUAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA S.A.S		CALLE 41 N 16A-135	3126441435	comercial@gruasytransporte.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PS	PS 02	CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	Y	11/02/2025	84113668	$976.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1066749190	MONTES CACERES XIOMARA DAYANA	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1067849469	MARTINEZ TORRES JAVIER ENRIQUE	59	0			N	X																231001	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	118.700	14-11	949.000	5	66.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	10966603	VELASQUEZ DIAZ ALEXANDER NICANOR	59	0			N	X																230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS002	379.600	47.500	14-11	379.600	5	26.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 2: COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	CÓDIGO: CAP-SST-F-008
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30-12-2024

ACTA DE REUNIÓN DEL COCOLAB

Fecha: 29-01-2025	Lugar: Obra	
Hora Inicial: 6:45am	Hora Final: 7:15am	Acta N° 1.

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Revisión del acta anterior. 2. Seguimiento acciones pendientes. 3. Informe de accidentes ocurridos en el mes. 4. Varios y acciones pendientes. 5. Definición de fecha próxima reunión. 6. Cierre de la reunión. 7. Firma del acta	José Hernandez	Presidente
	Nikolle Jeleva	Suplente
	Nayid Coronado	Secretario
	Jaidy Ortega	Coplente

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Este Corresponde a la primera acta de reunión

2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.

No hay Acciones pendientes se implementaran a partir de la reunión N°2.

Powered by CamScanner

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	CÓDIGO: CAP-SST-F-008
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30-12-2024

3. VARIOS Y ACCIONES.

Para esta acta se discuten temas tratados con los habitos de vida Saludable, los cuales son importantes para poder llevar una vida sana, una mente sana entre otros aspectos que hacen parte de una vida duradera

4. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

28-03-2025

5. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Esta acta se cierra estableciendo los compromisos de Tratar temas con los trabajadores a cerca de estilo de vida Saludable

6. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Jose Hernandez.	1.042.424	
Nicolle Fetova	1.075.652.455	
Nayid Coronado	98.038.240	
Faidy Ortega	1.003.971.54	

Powered by CamScanner

	FORMATO CONVOCATORIA A PARTICIPAR DE LA ELECCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	CÓDIGO: CAP-SST-F009
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/12/2024

CONVOCATORIA A PARTICIPAR DE LA ELECCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS, invita a todo el personal vinculado a participar de la convocatoria para elegir al nuevo Comité de Convivencia Laboral 2024 – 2026.

Este comité tiene por objeto la prevención de conductas de acoso laboral y la atención de los casos en que tales conductas pudieran presentarse, además procurará por medio de las actividades de sensibilización, capacitación y vigilancia periódica, promover relaciones laborales propicias para la salud mental y el respeto a la dignidad de los empleados, de todos los niveles jerárquicos de la Universidad, mediante estrategias de promoción, prevención e intervención para la resolución de conflictos.

Para la conformación del comité se nombran 2 representante(s) por parte del empleador y 2 representante(s) por parte de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Los empleados elegirán sus representantes mediante libre votación.

Atentamente,



_____

RAFEL MONTES

Representante legal

	FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	CÓDIGO: CAP-SST-F-010
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/12/2024

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

EMPRESA: PUNTA YANEZ CVS

PERIODO: 2 años

NOMBRE	CARGO	FECHA
Jose Hernandez	Paisajista.	08-02-2025
Dilcolle Tatiana Tejeda	Profesional Social	08-02-2025
David Coronado	Vigilante	08-02-2025
Yaidir Ortega	Operarios	02-02-2025

Responsable: Lou Guerrero.

Fecha de inscripción: 08-02-2025

Powered by CamScanner

	FORMATO CONVOCATORIA DE CANDIDATOS AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	CÓDIGO: CAP-SST-F-011
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/12/2024

FORMATO PARA VOTACIÓN DE CANDIDATOS AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

Comité de Convivencia Laboral

VOTO PARA ELECCIÓN

Candidato 1: José Fernandez.	5
Candidato 2: Yicolle Feleora	3
Candidato 3: Dayiol Coronado	3
Candidato 4: Jaidir Ortega	2

Powered by CamScanner

	FORMATO ACTA DE ESCRUTINIO Y VOTACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	CÓDIGO: CAP-SST–012
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/12/2024

ACTA DE ESCRUTINIO Y VOTACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

EMPRESA: CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

El día 08 del mes febrero del año 2025, se dio apertura al proceso de votación para la elección de los candidatos al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL para el período que va de 30 de Dic a 2024 de 30 Dic 2026.

En calidad de jurados de votación se encargó a los señores

Luis fernando Guerrero.

Después del conteo de votos se obtuvieron los siguientes resultados:

NOMBRE	VOTOS
Jose Hernandez.	6
Nicolle Fetaua	3
Dayid Coronado	3
Jaidi Ortega	2

Rafael Montes
Coordinador de la mesa

Colaborador de la mesa

Powered by CamScanner

	FORMATO ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	CÓDIGO: CAP-SST-F-013
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/12/2024

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El día 08 del mes de Febrero del 2025 en las instalaciones del **CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS,** se reunió el representante legal y sus trabajadores para conformar el Comité de Convivencia dando cumplimiento a la Resolución 652 de 2012, Resolución 2646 de 2008 y a la Ley 1010 de 2006, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El periodo de los miembros del Comité es de dos años (2) y el empleador proporcionara los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones de los miembros al Comité, así como la capacitación requerida.

El representante legal de la empresa nombro a las siguientes personas:

Por parte de la empresa: José Hernandez - Nicolle Feleuca

Y los trabajadores nombraron a: Dayid Coronado - Jaidir Ortega

Estos últimos nombrados por votación en asamblea general de trabajadores.

Integrado el Comité de Convivencia se procedió de acuerdo con la Resolución 652 de 2012 a nombrar presidente y al secretario del mismo, con el objetivo de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del Comité.

Por votación interna del Comité se designa:

Jose Hernandez. presidente del Comité y
Jaidir Ortega secretario(a) del mismo.

Firma del presidente

Firma del secretario

Powered by CamScanner

ANEXO 3: COPASST

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: CAP-SST-F-008
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/12/2024

ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST

Fecha: 27-02-2025	Lugar: obra	
Hora Inicial: 6:45am	Hora Final: 7:15am	Acta N° 1

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Revisión del acta anterior. 2. Seguimiento acciones pendientes. 3. Informe de accidentes ocurridos en el mes. 4. Varios y acciones pendientes. 5. Definición de fecha próxima reunión. 6. Cierre de la reunión. 7. Firma del acta	Luis Guerrero	Re pincipal prof SST
	Santiago lopez	Rt Empleador Suplente
	Oscar Granado	OF Varios (Empleador)
	Valaly Gonzalez	Aux Siso (Empleador)

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Este Corresponde a la primera reunión que se realiza.

2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.

No hay acciones pendientes Sin embargo se estima:

- se deben identificar los riesgos físicos - químicos psicosociales y tratar de minimizarlos
- Se dese continuar con el plan de capacitaciones para los trabajadores

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

* la fecha no se reportan Accidentes o incidentes de obra ocurridos.

Powered by CamScanner

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: CAP-SST-F-008
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/12/2024

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES.

- Evaluar riesgos
- vigilancia salud trabajador
- verificar areas de trabajo

5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

28 Marzo 2025

6. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Se da cierre a la reunión y se plan los compromisos establecidos en el punto (4).

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Luis Guerrero.	80539467	
Santiago Lopez	1.062.924.908	Santiago Lopez
Oscar Coronado	78036613	Osca. C.
Dalaly Gonzalez	1.003.431.57	Dalaly G.

Powered by CamScanner

	FORMATO CONVOCATORIA ELECCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST	CÓDIGO: CAP-SST-F-001
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/01/2024

CONVOCATORIA ELECCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

Ciudad y fecha: 08-01-2025

El suscrito Representante Legal del **CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS**, Convoca a todos los trabajadores para elegir sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, tanto los principales como sus respectivos suplentes.

La elección se realizará en las oficinas del **CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS** el día 09 del mes de Enero del 2025 a las 10:00 am; para lo cual se facilitarán los medios necesarios, además de publicar en cartelera las planchas inscritas antes de la fecha y la hora anteriormente enunciada.

RAFEL MONTES
Representante legal

Powered by CamScanner

	FORMATO DE APERTURA DE ELECCIÓN A LOS CANDIDATOS DEL COPASST.	CÓDIGO: CAP-SST-F-004
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/12/2024

ACTA DE APERTURA DE ELECCIÓN A LOS CANDIDATOS DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

EMPRESA: CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

PERIODO: 2 Años

Siendo las 10:00 am del día 08 del mes 01 del año 2025, se dio apertura al proceso de votación para elección de candidatos al **Comité Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST** para el periodo que de 30 Diciembre de 2024 a 30 Diciembre de 2026.

En calidad de jurados de votación se encargó los señores:

LUIS FERNANDO GUERRERO ALARCON

Nombre y firma del coordinador de la mesa de votación

LUIS FERNANDO GUERRERO ALARCON
PROFESINAL SISO

Powered by CamScanner

	FORMATO REGISTRO DE VOTANTES COPASST	CÓDIGO: CAP-SST-F-005
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/12/2024

REGISTRO DE VOTANTES
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

EMPRESA: CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

Nº	NOMBRE	Nº CEDULA	FIRMA DE TRABAJADOR
1	Rosibel Chavarro C.	52 254010	
2	Jose Fausto Hernandez	1.072424	
3	Jose Francisco Prieto	8. 686. 400	
4	Nicolle Tatiana Fetecua	1.075652.455	
5	Monica Ortega	52. 547. 435	
6	Geimun Gonsalve	10. 221.652	
7	Luis Fdo Guarero	80.534.487	
8	Oscar Coronado	7.803 6613	
9	Santiago Lopez	1062424902	
10	Gliniston Perez	1007765951	
11	Noyid Coronado	78.038 240	
12	Soldir Antonio Ortega	1.066661477	
13	Dalaly Gonsalez	1.003 43154	

Responsable: LUIS FERNANDO GUERRERO ALARCON

Fecha: 08/01/2025

Powered by CamScanner

	FORMATO DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA LA ELECCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST	CÓDIGO: CAP-SST-F-006
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/12/2024

ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA LA ELECCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

EMPRESA: CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

PERIODO: 2 Años

Siendo las 11: 00pm del día 08 del mes Diciembre del año 2025, se dio por finalizado el proceso de votación para elección de candidatos al **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST** para el periodo que de 30 Diciembre de 2024 a 30 Diciembre de 2025.

Como jurados de mesa estuvieron los señores (as)

LUIS FERNANDO GUERRERO ALARCON

Powered by CamScanner

	FORMATO PARA VOTACIÓN DE CANDIDATOS AL COPASST.	CÓDIGO: CAP-SST-F-003
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/12/2024

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

VOTO PARA ELECCIÓN

Candidato 1: luis fernando Quendo	6
Candidato 2: Santiago Lopez.	3
Candidato 3: Oscar Coronado.	2
Candidato 4: Dalaly Gonzalez	1

Powered by CamScanner

	FORMATO ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST	CÓDIGO: CAP-SST-F-007
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/12/2024

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST

El día 08 del mes de Diciembre del año 2024, se eligió el **Comité Paritario de Salud en el Trabajo (COPASST)** del **CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS**, para el periodo 2023-2025, dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 de 1986, el Decreto 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002 y Decreto 1072 de 2015.

La modalidad utilizada para su elección fue votación en cuestionario interactivo, con un número total de votos que asciende a la suma de 13 y los resultados son los siguientes:

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR			
NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA	
		PRINCIPAL	SUPLENTE
Luis Guerrero	Aux Apoyo	✓	
Santiago lopez	Of varios		✓

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES			
NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA	
		PRINCIPAL	SUPLENTE
Oscar Coronado	Of varios	✓	
Nataly Gonzalez	Aux Sigo		✓

Powered by CamScanner

	FORMATO ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST	CÓDIGO: CAP-SST-F-007
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 30/12/2024

El representante legal del **CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS**, designa al funcionario(a , como presidente del comité, y por votación del Comité se nombra al funcionario(a) como secretario(a) del mismo.

Firman.

Presidente Del Comité

Secretario Del Comité

Powered by CamScanner

ANEXO 4 DOCUMENTOS DE MAQUINARÍA

GyT GRÚAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA
NIT: 900.479.957-4
CEL: 314 570 50 39

DATOS EQUIPO

Placa: XCMG 164
Nombre: EXCAVADORA XCMG 164
Modelo: XE210CU
Año: 2017
Combustible: DIESEL
Descripción: RETROEXCAVADORA XCMG XE210CU MODELO 2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 120531

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC665976	XCMG	XE210CU	2017

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	XUG02103LHKA00164

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	22256217	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
22180 Kg	3100 mm	3190 mm	9550 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
GRUAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA S.	NIT 900.479.957

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTEYTTO MONTERIA


FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
13-09-2023	13-09-2023	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482023000469631	23/08/2023

VALID 121553 05/18

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM06000013506

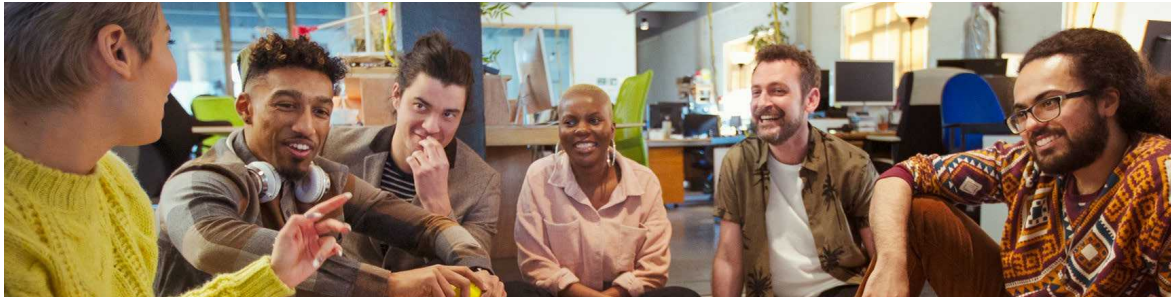

INFORMACIÓN GENERAL

Ciudad y fecha	Oficina radicación	Número de cotización	Número de póliza	Documento
MONTERIA, 2023-08-25	003 - PROMOTORA MONTERIA	03039421230824754650	900001028994	EXPEDICIÓN POLIZA NUEVA

Vigencia del seguro
Desde las 24:00 horas del 2023-08-24 | Hasta las 24:00 horas del 2024-08-24 | Días de vigencia del seguro: 366

Moneda
COP

ASESOR

Nombre	Código
CATALINA FERNANDEZ JALLER	33734

TOMADOR

Nombre	Tipo de identificación	Número de identificación	Tomador principal	Calidad Tomador	Dirección de correspondencia
GRUAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA S.A.S.	NIT	9004799574	✓	En nombre propio	monteria

Actividad económica del tomador principal
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.



RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE MAQUINARIA

ASEGURADO

Nombre	Tipo de identificación	Número de identificación
GRUAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA S.A.S.	NIT	9004799574

BENEFICIARIO

TERCEROS AFECTADOS

Número de maáuinas: 1 | Valor asegurado: $150.000.000

Fecha de retroactividad: 24/08/2023

COBERTURA	SUBLÍMITE EVENTO	SUBLÍMITE VIGENCIA	DEDUCIBLE
Bienes bajo cuidado, tenencia y control	100%	100%	10% de la pérdida, mínimo 3 SMMLV
Responsabilidad civil contratistas y subcontratistas	100%	100%	10% de la pérdida, mínimo 3 SMMLV
Responsabilidad civil cruzada	50%	50%	10% de la pérdida, mínimo 3 SMMLV
Responsabilidad del empleador	50%	50%	10% de la pérdida, mínimo 3 SMMLV
Gastos de Defensa (Civiles)	100%	100%	10% de la pérdida, mínimo 3 SMMLV
Gastos de Defensa (Penales)	50%	30%	10% de la pérdida, mínimo 3 SMMLV
Gastos médicos	2%	4%	0% de la pérdida, mínimo 0 SMMLV
Predios y operaciones	100%	100%	10% de la pérdida, mínimo 3 SMMLV

CONDICIONES PARTÍCULARES

Cláusulas

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Clausula de compensación

Si debes dinero a SURA y, a su vez, SURA tiene saldos a tu favor, pendientes de pago, la Compañía compensará dichos valores, de acuerdo con las reglas del Código Civil.

Ampliación del plazo para el aviso del siniestro a diez (10) días hábiles

Ampliación del plazo para el aviso del siniestro a diez (10) días hábiles.

Único valor asegurado

Los valores especificados como límites y/o sublímites, se entenderán incluidos dentro del valor asegurado pactado.

No se acepta restablecimiento del límite asegurado en forma automática

No se acepta restablecimiento del límite asegurado en forma automática.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALOR A PAGAR RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE MAQUINARIA

Tasa	Valor asegurado	Valor a pagar	Valor IVA	Valor total a pagar
7%o	$150.000.000	$1.050.000	$199.500	$1.249.500
			Valor total a pagar más IVA	**$1.249.500**



MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA

EXCAVADORA

Dirección	Ciudad	Departamento	Tipo modalidad	Actividad de la máquina/Equipo	Indice variable	Valor total del riesgo
CL 78 # 6 - 225	Montería	Cordoba	Valor Comercial	Construcción de vías e infraestructura vial	2%	$300.000.000

ASEGURADO

Nombre	Tipo de identificación	Número de identificación
GRUAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA S.A.S.	NIT	9004799574

BENEFICIARIO

Nombre	Tipo de identificación	Número de identificación
GRUAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA S.A.S.	NIT	9004799574

COBERTURAS

Cobertura	Valor asegurado	Sublímite evento	Deducible
Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga y actos mal intencionados y terrorismo	$300.000.000	100%	20% de la pérdida, mínimo 15 SMMLV
Cobertura básica (todo riesgo daño material)	$300.000.000		10% de la pérdida, mínimo 5 SMMLV
Sustracción con violencia	100%		15% de la pérdida, mínimo 5 SMMLV
Terremoto, temblor o erupción volcánica	$300.000.000		10% de la pérdida, mínimo 3 SMMLV

Accidentes al conductor

Muerte Accidental	Gastos de curación
$20.000.000	$3.000.000

Máquinas / Equipos

Tipo de Equipo	Marca	Modelo	Año de Fabricación	Serial o Número de Motor	Valor de la Máquina
Excavadoras o Retroexcavadoras	TRACKED	2017	2017	XUG02103LHKA00164	$300.000.000

VALOR A PAGAR EXCAVADORA

Valor a pagar	Valor IVA	VALOR TOTAL A PAGAR	Tasa
$2.334.807	$443.613	$2.778.420	7,7827%o

CONDICIONES PARTÍCULARES

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cláusulas

Cláusula de ubicación de los bienes asegurados

Queda convenido que para efectos del presente seguro, la cobertura para los bienes amparados en la póliza, opera en cualquier lugar donde estén ubicados dentro del Territorio Nacional. En este sentido, la dirección o ubicación descrita en el certificado de seguro, solo se especifica con la finalidad de propiciar controles de orden administrativo. Se acepta que los bienes se trasladen a los diferentes predios asegurados en la póliza, dentro del Territorio Colombiano, con ocasión del desarrollo de la actividad realizada por el asegurado.

Cláusula de limitación y exclusión de sanciones (ofac - lma3100)

No estará cubierta ninguna reclamación cuyo pago dé lugar a que la aseguradora o sus reaseguradores sean sancionados o incurran en cualquier tipo de responsabilidad, por ir en contravía de las sanciones, prohibiciones o restricciones impuestas por las resoluciones de las Naciones Unidas o en contravía de las sanciones comerciales o económicas, leyes o regulaciones de la Unión Europea, Reino Unido o Estados Unidos de América. Sin embargo, en caso de que cese la sanción, prohibición o restricción que impedía el pago, el reasegurador deberá proceder con el mismo, si está permitido legalmente hacerlo en virtud de la sanción correspondiente, ley o reglamento.

Cláusula protección al demerito

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones y cláusulas contenidos en la Póliza, la condición de demerito, calculado como la proporción entre el tiempo de uso y su vida útil, se modificará tomando en consideración las siguientes reglas: 1. Si el tiempo de uso es inferior a 2.000 horas o el cálculo del demerito es inferior al 15%, no se aplicará tal condición. 2. Si el demerito se encuentra entre el 15% y el 75%, el porcentaje calculado será reducido en un 15%. 3. Si el demerito es superior al 75%, el porcentaje calculado corresponderá a un 75%. Esta cobertura no aplicará para equipos que hayan sufrido repotenciaciones o bienes para los cuales no sea posible determinar su tiempo de uso.

Cláusula cobertura para asistencia de orientación jurídica telefónica

SURA por solicitud del Asegurado brindará, vía telefónica, los servicios de Consultoría Legal en cualquiera de las ramas del derecho relacionadas a continuación, quedando excluida de responsabilidad SURA de cualquier determinación que adopte el Asegurado por la consulta jurídica. DERECHO CIVIL: El Asegurado recibirá asesoría jurídica en adquisición de bienes muebles, inmuebles, y sujetos a registro, garantías hipotecarias y prendarias, contratos para remodelación de vivienda, régimen de propiedad horizontal (conjuntos/edificios), responsabilidad civil contractual y extracontractual en eventos de tránsito, celebración, ejecución y finalización de contratos, etc. DERECHO COMERCIAL: El Asegurado recibirá asesoría en actos de comercio, obligaciones y contratos mercantiles, venta y adquisición de establecimientos de comercio, títulos valores, entre otros. DERECHO CONSUMIDOR: El Asegurado recibirá orientación frente a la aplicación del estatuto de protección al consumidor, cumplimiento de garantías de bienes y servicios, publicidad engañosa, entre otros. DERECHO ADMINISTRATIVO: El Asegurado recibirá asesoría en derechos de petición, quejas y trámites ante entidades públicas, acción de tutela y derechos fundamentales, servicios públicos domiciliarios, entre otros. DERECHO POLICIVO: El Asegurado recibirá asesoría en reclamaciones ante autoridades de policía, impugnación de comparendos, obtención de permisos para funcionamiento de negocios entre otros. DERECHO NOTARIAL: El Asegurado recibirá orientación frente a trámites de documentos ante las notarías tales como sucesiones, matrimonio, registros del estado civil y su corrección, declaraciones extrajudiciales, cancelación de gravámenes a la propiedad, tradición de bienes sujetos a registro, entre otros. DERECHO FAMILIAR: El Asegurado recibirá orientación en régimen legal del matrimonio, régimen económico, afectaciones al patrimonio de familia, patria potestad, custodia, sucesiones con o sin testamento, entre otros. DERECHO LABORAL: El Asegurado podrá recibir orientación en la contratación de empleados domésticos, liquidaciones, modalidades de vinculación laboral, invalidez, incapacidades, pensiones. PROCESO DE PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO: SURA recibirá solicitudes directamente desde el #888, siendo éste el único autorizado para la activación de asistencias. La atención de los servicios estará condicionada a lo siguiente: 1. La cobertura está limitada a un total de 2 servicios o eventos durante la vigencia del seguro. 2. Los usuarios podrán acceder al servicio las 24 horas del día los 7 días de la semana, 365 días del año. 3. El tiempo máximo en línea será de 60 minutos por evento. 4. Se podrá brindar la asistencia en cualquier ciudad siempre y cuando se tenga recepción de las llamadas telefónicas. 2. La línea de Asistencia de SURA recibirá la llamada, solicitando los siguientes datos al usuario: Nombre y Apellidos. Ciudad. Identificar aseguradora, cliente y plan. (número de póliza). Teléfonos de contacto. Preferencia de horario de atención. RESPONSABILIDAD: SURA será responsable por la prestación de los servicios convenidos, pero deja expresa constancia que este amparo ES DE MEDIO Y NO DE RESULTADOS, por lo cual el Asegurado acepta que SURA no será responsable de los resultados de las acciones emprendidas por él o por las personas que él autorice, con ocasión de la asesoría recibida.

Exclusiones

Toda clase de equipos cuya actividad este directamente relacionada a la operación en gaseoductos, poliductos y oleoductos.

Toda clase de equipos cuya actividad este directamente relacionada a la operación en gaseoductos, poliductos y oleoductos.

Daños o pérdidas materiales ocurridos a todo tipo de vehículos

Daños o pérdidas materiales ocurridos a todo tipo de vehículos.

Daños o pérdidas materiales ocurridas a los equipos por no encontrarse a cargo de una persona o empresa responsable por su seguridad.

Daños o pérdidas materiales ocurridas a los equipos por no encontrarse a cargo de una persona o empresa responsable por su seguridad.

Maquinaria asegurada que no cuente con extintores manuales en sus ubicaciones y/o frentes de obra.

Maquinaria asegurada que no cuente con extintores manuales en sus ubicaciones y/o frentes de obra.

Cualquier reclamación relacionada directa o indirectamente con un sistema informático

Cualquier reclamación relacionada directa o indirectamente con un sistema informático, hardware, programa, software, datos, almacenamiento de información, microchip, circuito integrado o un dispositivo similar en equipos informáticos y no informáticos (ya sea o no propiedad del titular de la póliza asegurada), están excluidos excepto que se trate de daños materiales en los bienes asegurados que surjan a raíz de uno o varios de los siguientes riesgos: incendio, rayo, explosión, impacto de aeronave o vehículo, caída de objetos, tempestad, granizada, tornado, ciclón, huracán, terremoto, volcán, maremoto, inundación, helada o peso de la nieve, o eventos amparados en la póliza.

Equipos electrónicos fijos, móviles y portátiles

Equipos electrónicos fijos, móviles y portátiles, a menos que estos equipos electrónicos hagan parte del valor asegurado declarado para la maquinaria asegurada, e incorporados de fábrica.

Daños cuya causa u origen se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor de la póliza

Daños cuya causa u origen se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor de la póliza, aun cuando las consecuencias se manifiesten durante la vigencia de la misma.

Cualquier pérdida directa o indirectamente relacionada con levantamiento de cargas en equipos tales como

Cualquier pérdida directa o indirectamente relacionada con levantamiento de cargas en equipos tales como, pero no limitado a grúas, torre grúas, equipos de construcción de puentes, que excedan las capacidades nominales de los equipos establecidos o publicados en manuales, folletos y/o tablas del fabricante o que deben estar adecuadas de acuerdo con las especificaciones originales con alarmas operacionales de sobrecarga e indicadores de velocidad de vientos y dichas alarmas o indicadores no se encuentran en operación.

Todo tipo de responsabilidad civil

Todo tipo de responsabilidad civil

Responsabilidad civil cruzada

Responsabilidad civil cruzada

Daños generados a los bienes objeto de izaje o cargue u operaciones similares realizadas con la maquinaria o equipo

Daños generados a los bienes objeto de izaje o cargue u operaciones similares realizadas con la maquinaria o equipo

Se excluyen tuneladoras (tbm), jumbos, drilling rigs, rozadoras (roadheaders), equipos de transporte y carga de explosivos y similares.

Se excluyen tuneladoras (TBM), jumbos, drilling rigs, rozadoras (roadheaders), equipos de transporte y carga de explosivos y similares.

Daños o el hurto de vehículos automotores.

Daños o el hurto de vehículos automotores.

Transporte de maquinaria o equipo diferentes a los denominados como aplicativos como se describe en el numeral 6 de la presente póliza

Transporte de maquinaria o equipo diferentes a los denominados como aplicativos como se describe en el numeral 6 de la presente póliza

Responsabilidad civil generada por accidente de tránsito

Responsabilidad civil generada por accidente de tránsito

Responsabilidad civil extracontractual del chasis o vehículo que transporta el aditamento

Responsabilidad civil extracontractual del chasis o vehículo que transporta el aditamento

Movilización por sus propios medios

Movilización por sus propios medios

Perdida de contenidos

Perdida de contenidos

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALOR A PAGAR MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA

VALOR A PAGAR GRUPO DE MÁQUINAS	$2.334.807
VALOR TOTAL A PAGAR	$2.334.807
VALOR TOTAL A PAGAR IVA	$443.613
VALOR TOTAL A PAGAR MAS IVA	$2.778.420

VALOR A PAGAR DEL SEGURO

Solución	Valor a pagar	Valor IVA	Valor total a pagar
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA	$2.334.807	$443.613	$2.778.420
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE MAQUINARIA	**$1.050.000**	**$199.500**	$1.249.500
VALOR TOTAL	**$3.384.807**	**$643.113**	**$4.027.920**



ASESORES

Código	Nombre del asesor principal	Lider
33734	CATALINA FERNANDEZ JALLER	✓

CONDICIONES GENERALES

DATOS DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Solución	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación de la proforma
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE MAQUINARIA	2017-03-06	13-18	P	013	F-01-13-066
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA	2020-01-30	13-18	P	012	F-13-18-0032-022

DEFINICIONES

SMMLV
Salario mínimo mensual legal vigente.

SMDLV
Salario mínimo diario legal vigente.

SUBLÍMITE
Todos los valores establecidos como sublimites en cualquiera de las coberturas de esta póliza se entienden incluidosdentro de la suma asegurada o límite máximo de responsabilidad asegurado, y por lo tanto no adicionan valor asegurado.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas deseguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009965 de 2010. "Responsablede impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención"

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Firma autorizada

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482023000469631-6

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social			
900479957	4	GRUAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA S.A.S			
13. Dirección	**15. Teléfono**	**12. Cód. Admón.**	**16. Cód. Dpto**	**17. Cód. Ciudad Municipio**	
CL 41 16 A 135	3145705039	48	05	001	

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
800187197	7	AGENCIA DE ADUANAS ASCOINTER S.A.S. NIVEL 1	26	0202
29. Número documento de identificación		**30. Apellidos y nombres**		
1065610272		NIETO CASTILLEJO ANA KARINA		

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	25506	No. 116575013640553	2023 - 08 - 14	No. NYKS300031976	2023 - 08 - 07

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
RITCHIE BROS IRON PLANET	PLEASANTON, CA	249
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	**50. E-mail**	
5667 GIBRALTAR DRIVE SUITE 200 PLEASANTON, CA	833 675 0619	

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
586492-8360190	2023 - 05 - 18	249	1	077	23	NAVEMAR SAS	4,144.79

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	249	19,958.00	19,958.00	PK	1	1	U	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
[redacted]	[redacted]
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
[redacted]	[redacted]
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
[redacted]	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia** / **86. Número**
[redacted]	L / 40014987
87. Cod. oficina / **88. Año**	**89. Programa No** / **90. Cód Interno del Producto**
3 / 2023	XXXXXXXXXX / 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 [redacted]	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 [redacted]	99 [redacted]	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 [redacted]		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO ICA230387 PEDIDO IRON PLANET BL NYKS300031976 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):586492-8360190;// MERCANCIA USADA. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DE 2018. // ADJUNTAMOS CERTIFICADO ICA. // 1 UNIDAD PRODUCTO: EXCAVADORA HIDRAULICA / 2017 XCMG XE210 CU TRACKED EXCAVATOR. MARCA: XCMG. MODELO: XE210CU. REFERENCIA: XE210CU. SERIAL: XUG02103LHKA00164. USO O DESTINO: OBRAS DE INGENIERIA. AÑO DE FABRICACION 2017. PAIS DE ORIGEN. CHINA. PRECIO CUANDO NUEVA USD: $100.000. CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y NORMAL FUNCIONAMIENTO. MOTOR CUMMINS, MODELO QSB6.7, NUMERO DE MOTOR: 22256217 XXXXXXXXXXXXX

GyT GRÚAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA
NIT: 900.479.957-4
CEL: 314 570 50 39

BITÁCORA

Fecha	Detalles
2025-01-01	Actividad: Chasis Descripción: MOTOR CUMMINS QSB6,7 155 KW 6 GALONES 15W40 CK4 FILTRO ACEITE(1): (BALDWIN B7177 $60.000 LLANTAS Y FILTROS) FILTRO DE ACPM(3): (BALDWIN BF7922 $99.960 LLANTAS Y FILTROS) (DONALDSON P551077) (BALDWIN BF1385 $160.000 LLANTAS Y FILTROS) FILTRO DE AIRE (2): PRIMARIO (HYUNDAI 11Q8-20320 $440.000 NAVITRANS) SECUNDARIO: (HYUNDAI 11Q8-20310 $200.000 NAVITRANS) (DONALDSON P537877) BOMBA HIDRAULICA KAWASAKI (10LG7A1V-MZ) (F771352-3S) (2902440-2976A) VASTAGO CILINDRO BALDE 800mm VASTAGO CILINDRO BOOM 850mm - carevaca 75 x 30.5 x 30 - Bujes balde 80 x 90 x 70 mm - bujes gato 80 x 90 x 90 mm - Filtro aire acondicionado premium filter 903
2024-05-15	Actividad: Eléctrico Horómetro: 2,829 Descripción: Copia llave encendido switch principal - $25.000 - llaves Yea
2024-04-18	Actividad: Aceite Horómetro: 2,683 Descripción: Cambio de aceite 15W 40 Full Protect 6 galones $ 463.974, Filtro aceite LF3970 $48.400, Filtro combustible P550880 $63602, Filtro separador de combustible FS19732 $95.158, Filtro aire primario AF25437 $ 226.272, Filtro aire secundario AF25523 $140.096 – Navitrans, Filtro separador con frenaje BF9818 $ 70.588 – Lubricantes y filtros medellin – precios antes de iva – total $1.108.090
2024-03-26	Actividad: Transmisión Descripción: Elaboración de pasador master oruga - ($156.000) - Taller industrial soldatorno
2024-02-20	Actividad: Motor Horómetro: 2,331 Descripción: Cambio 6 galones de aceite Mobil del delvac modern - 15W40 full protection ($463.974), Filtro aire Primario y secundario, filtro aceite, combustible y aire ($1.080.000- Lubrisinu - llantas y filtros - total $1.543.974 - Próximo cambio 2681
2024-01-31	Actividad: Chasis Horómetro: 1,281 Descripción: Cambio carevaca balde, pasadores(2) 80 x 540 mm ($1.800.000), Ñato Caucasia - Balde grasa chasis ($230.000) - Llanta y Filtros. Total $2.030.000

GyT GRÚAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA
NIT: 900.479.957-4
CEL: 314 570 50 39

Fecha	Detalles
2023-12-23	Actividad: Chasis Horómetro: 2,058 Descripción: Engrase general de tornamesa grasa global ($230.000) - Llantas y filtros del sinu
2023-12-23	Actividad: Transmisión Horómetro: 2,058 Descripción: Cambio de aceite valvulina(ACEITE DIFERENCIAL TERPEL ULTREK 85W140) motor de traslacion derecho e izquierdo ($394.377) - Lubrisinu
2023-11-28	Actividad: Aceite Horómetro: 1,930 Descripción: Cambio aceite motor 15w 40 ck4 pro (431.718) - lubrisinu - 3 filtros aceite B7177 ($50.420), Filtro ACPM BF 7922 ($84.033), Filtro ACPM BF9818 ($226.890), Filtro ACPM BF1385 ($130.252), Filtro aire Primario RS 3744 = DA2881 Donson($306.722), Filtro aires Secundario RS 3745 = DA4881 Donson ($84.033) precios más iva - subtotal filtros $950.000 - Gran total $1.381.718 - Próximo cambio 2280 horas
2023-11-18	Actividad: Motor Horómetro: 1,895 Descripción: Compra filtros combustible: Filtro baldwin BF7922 - 20 * 1.5. ($84.033), filtro baldwin RS 3744 = DA2881(306.722), filtro baldwinBF1385 ($130.252), filtro baldwin BF9818 ($226.890), filtro baldwin B7177 ($50.420) - Precios + IVA. LLantas y filtros sinu
2023-10-30	Actividad: Chasis Horómetro: 1,797 Descripción: Compra de un balde de grasa proveedor todo filtros $250.000
2023-09-27	Actividad: Eléctrico Descripción: CAMBIO DE AUTOMATICO AUXILIAR DE ARRANQUE, MARCA NEW ERA TIPO PESADO 24V.
2023-09-25	Actividad: Herramientas Descripción: Compra de caja de herramientas, llaves inglesas, rachets, destornilladores, caja de herramienta.
2023-09-25	Actividad: Eléctrico Descripción: Instalacion pito de seguridad movimiento orugas.

GyT GRÚAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA
NIT: 900.479.957-4
CEL: 314 570 50 39

Fecha	Detalles
2023-09-20	Actividad: Chasis Horómetro: 1,615 Descripción: COMPRA DE BALDE 1M3. 5 DIENTES. VALOR BALDE $13.650.000, TRANSPORTE $700.000 VIATICOS $150.000
2023-08-29	Actividad: Hidráulico Descripción: EMPAQUE CILINDRO BALDE Y LIJADA DE VASTAGO EN CROMO.
2023-08-26	Actividad: Motor Horómetro: 1,612 Descripción: CAMBIO DE ACEITE (6 GALONES $500.000 LUBRISINU) Y FILTRO DE ACEITE ($60.000). 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE ($260.000) 2 FILTROS DE AIRE ($640.000 NAVITRANS) PROXIMO CAMBIO 1912 HORAS.
2023-08-25	Actividad: Chasis Horómetro: 1,611 Descripción: LLEGADA DE MAQUINA A NUESTRAS INSTALACIONES. RETRO XCMG164

ANEXO 5: EXAMENES DE INGRESO

MAXIMUS S&B SAS

Código del Prestador: 230010185701 **Nit:** 900944634
Dirección: CL 27 10 24 P 1
Teléfono: 3164659413-6047812042
Web: WWW.MAXIMUSSYB.COM
Email: maximus.syb@gmail.com - Licencia : S.O 042

Fecha de Impresión: **2025/02/06 10:53:30**
Impreso por: **MTORDECILLA**
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Datos del Paciente

Identificación:	CC - 1067958138	Paciente:	ATENCIA GARCIA ROGER JOSE	
Fecha Ingreso:	2025/02/06	Hora Ing:	08:01	Ingreso:**161388**
Telefono:	**3023448717**	Municipio:	**MONTERIA**	
Fecha Nacimiento:	**1998-01-27**	Edad:	**27 años**	
Dirección:	**MZ 7 LOTE 1**			
Empresa:	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS			
Contrato:	CONTRATO No 802 : CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS : CONSOLIDADO			
Ocupación:	INGENIERO CIVIL			



CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

ENFASIS
OSTEOMUSCULAR

TIPO DE EXAMEN
INGRESO

CONCEPTO MEDICO LABORAL
SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

USO DE EPP
HIGIENE POSTURAL
PAUSAS ACTIVAS
ACTIVIDAD FISICA-EJERCICIO
CONTROL NUTRICIONAL Y PESO
MANEJO ADECUADO DE CARGAS

PARACLINICOS REVISADOS

AUDIOMETRIA
VISIOMETRIA

INGRESO A SVE

SVE CARDIOVASCULAR

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDICAS
HABITOS SALUDABLES - AUTOCUIDADO - CONTROL DE PESO

CUMPLIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS . LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FRECUENTE. DISTANCIAMIENTO SOCIAL TENER ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA PARA COVID 19.El examinado manifiesta que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y sobre el oficio a desempeñar, y que toda la información expresada en este documento es cierta, así mismo manifiesta que los síntomas y hallazgos encontrados corresponden al examen que le ha sido practicado y se compromete a atender las orientaciones, instrucciones, recomendaciones del medico ocupacional, los representantes del empleador y las autoridades de salud y a efectuar todas las acciones para lograr el mantenimiento o mejoría de su estado de salud. MAXIMUS S & B SAS Lic. S.O.042. Certifica que tiene la custodia de las evaluaciones medico ocupacionales y de las historia clínica ocupacional según resolución 1918 de 2009

Maximo Tordecilla Diaz
Esp. En Salud Ocupacional
RM. 14654MS
Lic (SST) 202130003279

ATENDIDO POR
MAXIMO SEGUNDO TORDECILLA DIAZ - Esp: SALUD OCUPACIONAL - Reg Médico: 202130002379

Roger Atencia

FIRMA DEL TRABAJADOR

Copyright 2010-2011 Zeus Salud. Todos los Derechos Reservados.

MAXIMUS S&B SAS

Código del Prestador: 230010185701 **Nit:** 900944634
Dirección: CL 27 10 24 P 1
Teléfono: 3164659413-6047812042
Web: WWW.MAXIMUSSYB.COM
Email: maximus.syb@gmail.com - Licencia : S.O 042

Fecha de Impresión: **2025/02/14 15:30:02**
Impreso por: **LLUNA**
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Datos del Paciente

Identificación:	CC - 78038246	Paciente:	CORONADO RETAMOSO NAYID SALOMON		
Fecha Ingreso:	2025/02/14	Hora Ing:	08:48	Ingreso:	**161654**
Telefono:	**3122018225**	Municipio:	**CIENAGA DE ORO**	**Sexo:**	M
Fecha Nacimiento:	**1981-12-27**	Edad:	**43 años**		
Dirección:	**HIGAL**				
Empresa:	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS				
Contrato:	CONTRATO No 802 : CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS : CONSOLIDADO				
Ocupación:	VIGILANTE				



CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

ENFASIS
OSTEOMUSCULAR

TIPO DE EXAMEN
INGRESO

CONCEPTO MEDICO LABORAL
SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

USO DE EPP
ACTIVIDAD FISICA-EJERCICIO
HIGIENE POSTURAL
CONTROL NUTRICIONAL Y PESO
CONTROL OPTOMETRICO ANUAL
PAUSAS ACTIVAS
MANEJO ADECUADO DE CARGAS


PARACLINICOS REVISADOS

AUDIOMETRIA
VISIOMETRIA

INGRESO A SVE


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDICAS
AUTOCUIDADO / HABITOS SALUDABLES

CUMPLIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS . LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FRECUENTE. DISTANCIAMIENTO SOCIAL TENER ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA PARA COVID 19.El examinado manifiesta que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y sobre el oficio a desempeñar, y que toda la información expresada en este documento es cierta, así mismo manifiesta que los síntomas y hallazgos encontrados corresponden al examen que le ha sido practicado y se compromete a atender las orientaciones, instrucciones, recomendaciones del medico ocupacional, los representantes del empleador y las autoridades de salud y a efectuar todas las acciones para lograr el mantenimiento o mejoría de su estado de salud. MAXIMUS S & B SAS Lic. S.O.042. Certifica que tiene la custodia de las evaluaciones medico ocupacionales y de las historia clínica ocupacional según resolución 1918 de 2009



ATENDIDO POR

CARLOS ALFONSO PADRON PEREZ - Esp: MEDICINA DEL TRABAJO - Reg Médico: Lic ESO 565



FIRMA DEL TRABAJADOR

Copyright 2010-2011 Zeus Salud. Todos los Derechos Reservados.

MAXIMUS S&B SAS

Código del Prestador: 230010185701 **Nit:** 900944634
Dirección: CL 27 10 24 P 1
Teléfono: 3164659413-6047812042
Web: WWW.MAXIMUSSYB.COM
Email: maximus.syb@gmail.com - Licencia : S.O 042

Fecha de Impresión: **2025/01/22 11:04:57**
Impreso por: **CPADRON**
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Datos del Paciente

Identificación:	CC - 1003434150	Paciente:	GONZALEZ TORRES NATALY	
Fecha Ingreso:	2025/01/22	Hora Ing:	10:33	Ingreso:**160923**
Telefono:	**3116110576**	Municipio:	**CIENAGA DE ORO**	
Fecha Nacimiento:	**2000-07-25**	Edad:	**24 años**	
Dirección:	**BERASTEGUI**			
Empresa:	PARTICULAR			
Contrato:	CONTRATO No 43 : PARTICULAR :			
Ocupación:	INSPECTOR SG-SST			



CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

ENFASIS
OSTEOMUSCULAR

TIPO DE EXAMEN
INGRESO

CONCEPTO MEDICO LABORAL
SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

USO DE EPP
HIGIENE POSTURAL
PAUSAS ACTIVAS
ACTIVIDAD FISICA-EJERCICIO
CONTROL NUTRICIONAL Y PESO
MANEJO ADECUADO DE CARGAS


PARACLINICOS REVISADOS

AUDIOMETRIA
VISIOMETRIA

INGRESO A SVE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDICAS
AUTOCUIDADO / HABITOS SALUDABLES

CUMPLIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS . LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FRECUENTE. DISTANCIAMIENTO SOCIAL TENER ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA PARA COVID 19.El examinado manifiesta que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y sobre el oficio a desempeñar, y que toda la información expresada en este documento es cierta, así mismo manifiesta que los síntomas y hallazgos encontrados corresponden al examen que le ha sido practicado y se compromete a atender las orientaciones, instrucciones, recomendaciones del medico ocupacional, los representantes del empleador y las autoridades de salud y a efectuar todas las acciones para lograr el mantenimiento o mejoría de su estado de salud. MAXIMUS S & B SAS Lic. S.O.042. Certifica que tiene la custodia de las evaluaciones medico ocupacionales y de las historia clínica ocupacional según resolución 1918 de 2009



ATENDIDO POR

CARLOS ALFONSO PADRON PEREZ - Esp: MEDICINA DEL TRABAJO - Reg Médico: Lic ESO 565



FIRMA DEL TRABAJADOR

Copyright 2010-2011 Zeus Salud. Todos los Derechos Reservados.

MAXIMUS S&B SAS

Código del Prestador: 230010185701 **Nit:** 900944634
Dirección: CL 27 10 24 P 1
Teléfono: 3164659413-6047812042
Web: WWW.MAXIMUSSYB.COM
Email: maximus.syb@gmail.com - Licencia : S.O 042

Fecha de Impresión: **2025/02/14 15:26:05**
Impreso por: **LLUNA**
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Datos del Paciente

Identificación:	CC - 1068661447	Paciente:	ORTEGA REGINO JAIDIR ANTONIO		
Fecha Ingreso:	2025/02/14	Hora Ing:	07:56	Ingreso:	**161644**
Telefono:	**3234581251**	Municipio:	**CIENAGA DE ORO**	**Sexo:**	M
Fecha Nacimiento:	**1987-02-08**	Edad:	**38 años**		
Dirección:	**VEREDA EL LIGAL**				
Empresa:	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS				
Contrato:	CONTRATO No 802 : CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS : CONSOLIDADO				
Ocupación:	OFICIOS VARIOS				



CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

ENFASIS
OSTEOMUSCULAR

TIPO DE EXAMEN
INGRESO

CONCEPTO MEDICO LABORAL
SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

CONTINUAR MANEJO MEDICO EPS

USO DE EPP

ACTIVIDAD FISICA-EJERCICIO

HIGIENE POSTURAL

PAUSAS ACTIVAS

MANEJO ADECUADO DE CARGAS

PARACLINICOS REVISADOS

AUDIOMETRIA

VISIOMETRIA

INGRESO A SVE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDICAS
HABITOS SALUDABLES - AUTOCUIDADO - EVALUACION POR CONSULTA EXTERNA DE SU EPS PARA CONTROL DE LESIONES EN PIEL

CUMPLIR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS . LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FRECUENTE. DISTANCIAMIENTO SOCIAL TENER ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA PARA COVID 19.El examinado manifiesta que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y sobre el oficio a desempeñar, y que toda la información expresada en este documento es cierta, así mismo manifiesta que los síntomas y hallazgos encontrados corresponden al examen que le ha sido practicado y se compromete a atender las orientaciones, instrucciones, recomendaciones del medico ocupacional, los representantes del empleador y las autoridades de salud y a efectuar todas las acciones para lograr el mantenimiento o mejoría de su estado de salud. MAXIMUS S & B SAS Lic. S.O.042. Certifica que tiene la custodia de las evaluaciones medico ocupacionales y de las historia clínica ocupacional según resolución 1918 de 2009



ATENDIDO POR

MAXIMO SEGUNDO TORDECILLA DIAZ - Esp: SALUD OCUPACIONAL - Reg Médico: 202130002379

FIRMA DEL TRABAJADOR

Copyright 2010-2011 Zeus Salud. Todos los Derechos Reservados.

ANEXO 6: INSPECCIONES

	Control de Asistencia a Capacitaciones		
CODIGO CAP-GH-F-012	Fecha: 10-02-2025		Versión 01

FECHA 10-02-2025 TEMA TRATADO CAPACITACION ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

CAPACITADOR Luis Guerrero HORAS DE CAPACITACIÓN 7:00 am A 7:30 am

OBJETIVO Capacitar a los trabajadores para que puedan identificar y reportar actos y condiciones inseguras en el lugar de trabajo y aplicar practicas de trabajo seguro y saludable para prevenir accidentes y enfermedades laborales.

NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FIRMA
Santiago Ballesteros	OFICIOS Varios	1062424908	Santiago Ballesteros
Oscar Coronado	OFICIOS Varios	78036613	Oscar Coronado
Julio Benavides	TOPOGRAFO	77105580	Julio Benavidez
Albert Nieto	Cadenero	7369165	Albert Nieto
Rosibel Chaverra	Director obra	52254090	Rosibel Chaverra
Jose Hernandez	Res. obra 1	1042424437	JOSE HERNANDEZ
Jose Fiorillo	Res obra 2	8686400	Jose Fiorillo
Nikolle Fetecua	PROF. Social	1075652455	Nicole Fetecua
Monica Ortega	ESP ambiental	52547455	monica Ortega
German Monsalve	ESP Hidrahulico	10221652	German Monsalve
Luis Guerrero	ESP SST SO	80539487	Luis Guerrero
Nataly Gonzales	Inspector SISO	1003434150	Nataly Gonzales
Roger ATENCIA	Ingeniero Aux	1067958138	Roger Atencia
NAVID CORONADO	Vigilante	78038246	Navid Coronado
Alexander Velasquez	Operador	10966603	Alexander Velasquez
Manuel Camargo	operador	1007411579	manuel Camargo
Daniel Bohorquez	Operador	1049010316	daniel Bohorquez
Fabian Castillo	Operador	1019087635	Fabian Castillo
Jander Ortega	Oficios Varios	1068661497	Jander Ortega

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo: CAP-GH-F-018 Version: 01 Fecha:

INDUCCION/CAPACITACION [X] CHARLA [ ] TALLER/CURSO [ ] REUNIÓN [ ] OTRO [ ]

TEMA: Capacitacion de comite de Convivencia laboral FECHA: 05-02-2025

RESPONSABLE: Luis Fernando Guerrero CARGO: Profesional S.L y S.O

LUGAR/PROYECTO: Consorcio Pantoyanes CVS HORA INICIO: 7:00am DURACIÓN: 7:30am

ÍTEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Santiago Ballesteros	Oficios Varios	1062424908	Santiago Ballesteros
2	Oscar Coronado	Oficios Varios	78036613	Oscar Coronado
3	Julio Benavidez	Topografo	77105580	Julio Benavidez
4	Albert Nieto	Cadenero	7369165	Albert Nieto
5	Rosibel Chaverra	Director obr	52254090	Rosibel Chaverra
6	Jose Hernandez	Res. Obra 1	1049242437	Jose Hernandez
7	Jose Fiorillo	Res obra 2	8686400	Jose Fiorillo
8	Nikolle Fetecua	Prof Social	1075659455	Nikolle Fetecua
9	Monica Ortega	Esp ambiental	52547455	Monica Ortega
10	German Monsalve	Esp Hidraulico	10221652	German Monsalve
11	Luis Guerrero	Esp S.L y S.O	80539487	Luis Guerrero
12	Nataly Gonzalez	Inspector SSO	1003434150	Nataly Gonzalez
13	Roger Atencia	Ingeniero rox	1067958138	Roger Atencia
14	Nayid Coronado	Vigilante	78038246	Nayid Coronado
15	Alexandra Velasque	Operador	10966603	Alexandra Velasque
16	Fabian Castillo	Operador	1019082635	Fabian Castillo
17	Manuel Camargo	Operador	1007411579	Manuel Camargo
18	Daniel Bohorquez	Operador	1104010316	Daniel Bohorquez
19	Jaider Ortega	Oficios Vari	1068661447	Jaider Ortega.
20				

OBSERVACIONES (Indicar temas tratados):

Luis Fernando Guerrero
FIRMA CAPACITADOR/ASESOR/ ENCARGADO
C.C

Powered by CamScanner

	Control de Asistencia a Capacitaciones		
CODIGO CAP-GH-F-012	Fecha: 09-02-2025		Versión: 01

FECHA 05-07-2025 TEMA TRATADO CAPACITACION DE COMITE DE CONVIVENCIA Y ACOSO

CAPACITADOR Luis Guerrero HORAS DE CAPACITACIÓN 7:00 am A 7:30 am

OBJETIVO Fortalecer la convivencia laboral y prevenir el acoso laboral y la violencia en el lugar de trabajo

NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FIRMA
Rosibel Chaverra	Director obra	52254090	Rosibel Chaverra
Jose Hernandez	Res obra 1	1042424437	JOSE HERNANDEZ
Jose Fiorillo	Res obra 2	8686400	Jose Fiorillo
Nikolle Fetecua	Prof Social	1075652455	Nikolle Fetecua
Monica ortega	ESP ambiental	52547455	Monica Ortega
German Monsalve	ESP Hidraulico	10221652	German Monsalve
Luis Guerrero	ESP SIYSO	80539487	Luis Guerrero
Nayid Coronado	Vigilante	78038246	Nayid Coronado
Alexander Velasquez	Operador	10966603	Alexander Velasquez
Manuel Camargo	operador	1007411579	manuel Camargo
Daniel Bohaquez	operador	1040010316	Daniel Bohaquez
Fabian Castillo	operador	1019 082635	Fabian Castillo
Nataly Gonzalez	Inspector SST	1003434150	Nataly Gonzalez
Roger Atencia	Ingeniero Aux	1067958138	Roger Atencia
Santiago Ballesteros	Oficios Varios	1067424908	Santiago Ballesteros
OSCar Coronado	OFICIOS VARIOS	78036613	OSCar Coronado
Julio Benavidez	Topografo	77105580	Julio Benavidez
Albert Nieto	Cadenero	7369165	Albert Nieto
Jaider OAega	OFICIOS VARIOS	1008661447	Jaider Ortega

Powered by CamScanner

	ASISTENCIA A EVENTOS		Código:FO-3 Version :01 Fecha: 30-12-2024 Página 1 de 1
CONTRATO	060-2025	FECHA	05 / 02 / 25
UBICACIÓN	Consorcio Punta Gaine 3 CVS		
NOMBRE DEL EVENTO	Fortalecer la convivencia laboral y Prevenir acoso		
TEMA U OBJETO	Capacitacion de Comite de Convivencia laboral		
TIPO DE EVENTO	☒ CAPACITACIÓN ☐ CHARLA ☐ ENTRENAMIENTO ☐ OTRO Cual:		

Asistentes (Favor coloque su nombre en letra clara)

ITEN	Nombre y Apellidos	No de Cedula	Firma
1	Rosibel Chaverra	Director Obra	Rosibel Chaverra
2	Jose Hernandez	Res obra 1	JOSE HERNANDEZ
3	Jose Fiorillo	Res obra 2	Jose Fiorillo.
4	Nikolle Fetecua	PROF Social	Nikolle Fetecua
5	Monica Ortega	ESP ambiental	monica ortega
6	Germian Monsalve	ESP Hidraulico	German monSalve
7	Luis Guerrero	ESP SI y SO	CVS Guerrero
8	Nayid Coronado	Vigilante	nayid coronado
9	Alexander Velasquez	Operador	Alexander velasquez
10	Manuel Camargo	Operador	manuel camargo
11	Daniel Bolivar	Operador	Daniel Bolivar
12	Fabian Castillo	Operador	Fabian castillo
13	Nataly Gonzalez	Inspector SST	Nataly Gonzalez
14	Roger Atencia	Ingeniero AMX	Roger Atencia
15	Santiago Ballesteros	OFICIOS VARIOS	Santiago Ballesteros
16	OSCar Coronado	OFICIOS VARIOS	OSCar Coronado
17	Julio Benavides	TOPOGRAFO	Julio Benavides
18	Albert Nieto	Cocinero	Albert Nieto
19	Julder ortega	OFICIOS VARIOS	Julder Ortega
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Datos del expositor: JUS Fernando Guerrero

Powered by CamScanner

	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código:FO-8 Versión:1 Fecha: 30/12/2024 Página:1 de 1

CONTRATO Nº: 060-2024 | UBICACIÓN: Consorcio Punta Yarí Cus

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jaider Ortega

OBSERVACIONES: Con el animo de proteger su salud, le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que a continuación relacionamos, los cuales debe utilizar siempre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o pérdida, informe a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

FECHA			DESCRIPCIÓN EPP	MOTIVO DE ENTREGA			CANT.	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA RESPONSABLE DE LA EMPRESA
DIA	MES	AÑO		NUEVO	DETERIORO	PERDIDA				
8	02	25	Guantes ☒ Casco ☒ Gafas ☒ Botas ☒ Camisa ☒ Otro,¿Cual?____	X			1	OFICIOS VARIOS	Jaider Ortega	Luis Guerrero
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro,¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro,¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro,¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro,¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro,¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro,¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro,¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro,¿Cual?____							

ACTA DE COMPROMISO

El trabajador recibe los elementos de protección personal previo a inducción de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de protección personal.
2. Colocar los equipos y elementos de protección personal después de su utilización en el lugar indicado para ello.
3. Informar al responsable de seguridad industrial cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en los equipos y elementos de protección personal utilizados con el fin de hacer el cambio para lo cual debe devolver los deteriorados, en caso contrario lo será descontado.
4. Devolver los Elementos de protección personal y dotación entregada una vez se finalicen los trabajos, en caso de perdida de los EPPs durante o al final de la obra, le será descontado.
5. El no uso de la dotacion y EPPs es causal de despido.

Para constancia de ello se firma el documento.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jaider ortega	FIRMA DEL TRABAJADOR	Jaider Ortega
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE EMPRESA	Luis Fernando Guerrero	FIRMA	Luis Guerrero

Powered by CamScanner

	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FO-8 Versión: 1 Fecha: 30/12/2024 Página: 1 de 1

CONTRATO No: 022-2024 | UBICACIÓN: Centro Comercial Santa Isabel Cali

NOMBRE DEL TRABAJADOR: David Coronado

OBSERVACIONES: Con el animo de protegerr su salud le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que a continuación relacionamos, los cuales debe utilizar siempre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o pérdida, informe a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

FECHA			DESCRIPCIÓN EPP	MOTIVO DE ENTREGA			CANT	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA RESPONSABLE DE LA ENTREGA
DIA	MES	AÑO		NUEVO	REPOSICIÓN	PERDIDA				
04	02	25	Guantes ☒ Casco ☒ Gafas ☒ Botas ☒ Camisa ☒ Otro, ¿Cual? ____	X			1	Cortes Varios	David Coronado	Luis Guerrero
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro, ¿Cual? ____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro, ¿Cual? ____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro, ¿Cual? ____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro, ¿Cual? ____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro, ¿Cual? ____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro, ¿Cual? ____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro, ¿Cual? ____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro, ¿Cual? ____							

ACTA DE COMPROMISO

El trabajador recibe los elementos de protección personal previo a inducción de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de protección personal.
2. Colocar los equipos y elementos de protección personal después de su utilización en el lugar indicado para ello.
3. Informar al responsable de seguridad industrial cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en los equipos y elementos de protección personal utilizados con el fin de hacer la sustitución o sus daños deterioro los deteriorados, en caso contrario le será descontado.
4. Devolver los Elementos de protección personal y dotación entregada una vez se finalicen los trabajos, en caso de perdida de los EPPs cuando ya se halla de la obra, le será descontado.
5. El no uso de la dotación y EPPs es causal de despido.

Para constancia de ello se firma el documento.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	David Coronado	FIRMA DEL TRABAJADOR	David Cor
NOMBRE DEL RESPONSABLE ENTREGA	Luis Fernando Guerrero	FIRMA	Luis Guerrero

Powered by CamScanner

CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código: FO-8
Versión: 1
Fecha: 05/12/2024
Página 1 de 1

CONTRATO No: 060-2024 UBICACIÓN: Obregón Puerto Wilches Cis

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Roger Atencia

OBSERVACIONES: Con el animo de protegar su salud le estamos entregando las herramientas y/o equipos necesarios para realizar su actividad que a continuación relacionamos. no olvide usarlos siempre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o pérdida informe a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo

FECHA			DESCRIPCIÓN EPP	MOTIVO DE ENTREGA			CANT	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA RESPONSABLE DE LA EMPRESA
DIA	MES	AÑO		NUEVO	REPOSICIÓN	PERDIDA				
07	02	25	Guantes ☐ Casco ☒ Gafas ☒ Botas ☐ Camisa ☒ Otro ¿Cual?____	X			1	Ingeniero Amb	Roger Atencia	Luis Guerrero
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro ¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro ¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro ¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro ¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro ¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro ¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro ¿Cual?____							
			Guantes ☐ Casco ☐ Gafas ☐ Botas ☐ Camisa ☐ Otro ¿Cual?____							

ACTA DE COMPROMISO

El trabajador recibe los elementos de protección personal previo a instrucción de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de protección personal
2. Colocar los equipos y elementos de protección personal después de su utilización en el lugar indicado para ello
3. Informar al responsable de seguridad industrial cualquier defecto anomalía o daño apreciado en los equipos y elementos de protección personal utilizados con el fin de hacer el cambio para o que sean retirados los deteriorados, en caso contrario se será sancionado
4. Conservar los Elementos de protección personal y dotación entregada una vez se finalicen los trabajos, en caso de perdida de los EPPs durante o al final de la obra, se será sancionado
5. El no uso de la dotación y EPPs es causal de despido

Para constancia de ello se firma el documento

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Roger Atencia	FIRMA DEL TRABAJADOR	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ENTREGA	Luis Fernando Guerrero	CARGO	Ingeniero

Página 1 de 1

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046
		Versión:001
		Fecha:30-12-2024
		Página 1 de 1


CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Fabian Castillo
Cargo: operador

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN				
Fecha consulta 10-02-25	Sexo F ___ M X	Año nacimiento 31-05-93	Peso 67	Talla 41
¿Cuanto tiempo lleva realizando el mismo tipo de trabajo? Años: X	Meses ___			
En promedio: ¿cuantas horas a la semana trabaja?	Horas: 46			

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos				
¿En algun momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:				
Cuello	No X	Si		
Hombro	No X	Si	Izq	Der
Codo	No X	Si	Izq	Der
Muñeca	No X	Si	Izq	Der
Espalda alta (región dorsal)	No X	Si		
Espalda baja (región lumbar	No X	Si		
Una o ambas caderas / piernas	No X	Si		
Una o ambas rodillas	No X	Si		
Uno o ambos tobillos / pies	No X	Si		



El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Daniel Bohorquez

Cargo: Operador

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN

Fecha consulta 10-02-25 | Sexo F ___ M X | Año nacimiento 06-03-98 | Peso 68 | Talla 42

¿Cuanto tiempo lleva realizando el mismo tipo de trabajo? Años X Meses ___


En promedio ¿cuantas horas a la semana trabaja? Horas: 46

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algun momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en

Cuello	No X	Si		
Hombro	No X	Si	Izq	Der
Codo	No X	Si	Izq	Der
Muñeca	No X	Si	Izq	Der
Espalda alta (region dorsal)	No X	Si		
Espalda baja (region lumbar	No X	Si		
Una o ambas caderas / piernas	No X	Si		
Una o ambas rodillas	No X	Si		
Uno o ambos tobillos / pies	No X	Si		

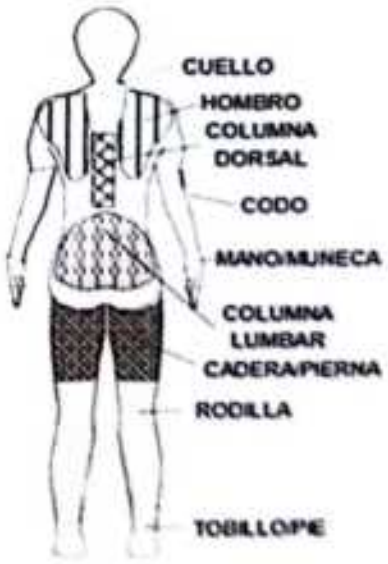

El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Hanel Camago

Cargo: Operador


CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN				
Fecha consulta 10-02-25	Sexo: F ___ M X	Año nacimiento 08-02-85	Peso 69	Talla 40
¿Cuanto tiempo lleva realizando el mismo tipo de trabajo? Años X Meses ___				
En promedio, ¿cuantas horas a la semana trabaja? Horas: 46				

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algun momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:

Cuello	No X	Si		
Hombro	No X	Si	Izq	Der
Codo	No X	Si	Izq	Der
Muñeca	No X	Si	Izq	Der
Espalda alta (región dorsal)	No X	Si		
Espalda baja (region lumbar	No X	Si		
Una o ambas caderas / piernas	No X	Si		
Una o ambas rodillas	No X	Si		
Uno o ambos tobillos / pies	No X	Si		



El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Alexander Velasquez
Cargo: operador

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN

Fecha consulta 10-02-25	Sexo: F ___ M X	Año nacimiento 08-09-84	Peso 72	Talla 40

¿Cuánto tiempo lleva realizando el mismo tipo de trabajo? Años: X Meses: ___


En promedio ¿cuantas horas a la semana trabaja? Horas: 46

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algun momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:

Cuello	No: X	Si:		
Hombro	No: X	Si:	Izq:	Der:
Codo	No: X	Si:	Izq:	Der:
Muñeca	No: X	Si:	Izq:	Der:
Espalda alta (región dorsal)	No: X	Si:		
Espalda baja (region lumbar	No: X	Si:		
Una o ambas caderas / piernas	No: X	Si:		
Una o ambas rodillas	No: X	Si:		
Uno o ambos tobillos / pies	No: X	Si:		

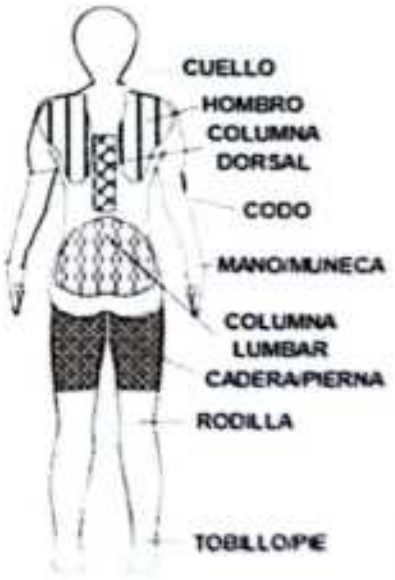

El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Nayid Coronado
Cargo: Vigilante

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN				
Fecha consulta 10-02-25	Sexo F ___ M X	Año nacimiento 27-12-81	Peso 58	Talla 41
¿Cuanto tiempo lleva realizando el mismo tipo de trabajo? Años ___ Meses X				
En promedio, ¿cuantas horas a la semana trabaja? Horas: 46				

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algun momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:

Cuello	No X	Si	
Hombro	No X	Si	Izq. Der.
Codo	No X	Si	Izq. Der.
Muñeca	No X	Si	Izq. Der.
Espalda alta (región dorsal)	No X	Si	
Espalda baja (región lumbar	No X	Si	
Una o ambas caderas / piernas	No X	Si	
Una o ambas rodillas	No X	Si	
Uno o ambos tobillos / pies	No X	Si	



El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: ROGER ATENCIA
Cargo: INGENIERO AUXILIAR

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN

Fecha consulta 10-02-25 | Sexo: F ___ M X | Año nacimiento 27-01-97 | Peso 68 | Talla 39

¿Cuanto tiempo lleva realizando el mismo tipo de trabajo? Años: X Meses: ___

En promedio, ¿cuantas horas a la semana trabaja? Horas: 46

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algun momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:

Cuello	No: X	Si:		
Hombro	No: X	Si:	Izq:	Der:
Codo	No: X	Si:	Izq:	Der:
Muñeca	No: X	Si:	Izq:	Der:
Espalda alta (región dorsal)	No: X	Si:		
Espalda baja (región lumbar	No: X	Si:		
Una o ambas caderas / piernas	No: X	Si:		
Una o ambas rodillas	No: X	Si:		
Uno o ambos tobillos / pies	No: X	Si:		



El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1


CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Rosibel Chaverra
Cargo: Director obra

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN				
Fecha consulta 10-02-25	Sexo F X M__	Año nacimiento 16-11-74	Peso 60 K	Talla 37
¿Cuanto tiempo lleva realizando el mismo tipo de trabajo? Años X Meses __				
En promedio, ¿cuantas horas a la semana trabaja? Horas 46				

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos				
¿En algun momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:				
Cuello	No X	Si		
Hombro	No X	Si	Izq	Der
Codo	No X	Si	Izq	Der
Muñeca	No X	Si	Izq	Der
Espalda alta (región dorsal)	No X	Si		
Espalda baja (región lumbar	No X	Si		
Una o ambas caderas / piernas	No X	Si		
Una o ambas rodillas	No X	Si		
Uno o ambos tobillos / pies	No X	Si		

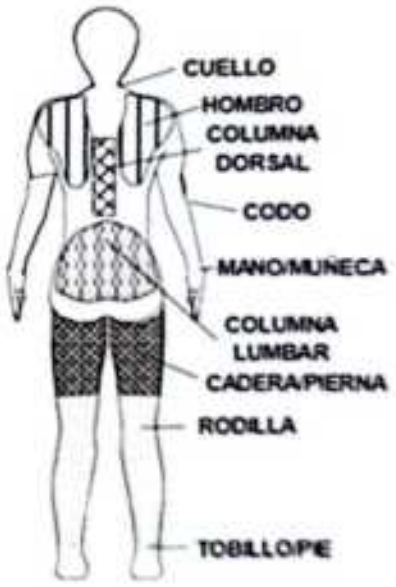

El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Jose Hernandez
Cargo: Residente obra 1

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN				
Fecha consulta 10-02-25	Sexo F ___ M X	Año nacimiento 26-09-87	Peso 65	Talla 39
¿Cuánto tiempo lleva realizando el mismo tipo de trabajo? Años X	Meses ___			
En promedio ¿cuantas horas a la semana trabaja?	Horas 46			

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algún momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en

Cuello	No X	Si	
Hombro	No X	Si	Izq. Der.
Codo	No X	Si	Izq. Der.
Muñeca	No X	Si	Izq. Der.
Espalda alta (región dorsal)	No X	Si	
Espalda baja (región lumbar)	No X	Si	
Una o ambas caderas / piernas	No X	Si	
Una o ambas rodillas	No X	Si	
Uno o ambos tobillos / pies	No X	Si	



El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Jose Fiorillo
Cargo: Residente obra 2

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN

Fecha consulta 10-02-25	Sexo F ___ M X	Año nacimiento 22-09-57	Peso 59	Talla 39

¿Cuanto tiempo lleva realizando el mismo tipo de trabajo? Años X Meses ___


En promedio ¿cuantas horas a la semana trabaja? Horas 46

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algun momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:

Cuello	No X	Si		
Hombro	No X	Si	Izq	Der
Codo	No X	Si	Izq	Der
Muñeca	No X	Si	Izq	Der
Espalda alta (región dorsal)	No X	Si		
Espalda baja (región lumbar	No X	Si		
Una o ambas caderas / piernas	No X	Si		
Una o ambas rodillas	No X	Si		
Uno o ambos tobillos / pies	No X	Si		



El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Nikolle Fetecua
Cargo: Profesional social

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN				
Fecha consulta 10-02-25	Sexo F X M	Año nacimiento 28-10-86	Peso 58	Talla 38
¿Cuánto tiempo lleva en el mismo tipo de trabajo? Años X	Meses			
En promedio ¿cuantas horas a la semana trabaja?	Horas 46			

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algún momento durante los últimos 12 meses ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:

Cuello	No X	Si		
Hombro	No X	Si	Izq	Der
Codo	No X	Si	Izq	Der
Muñeca	No X	Si	Izq	Der
Espalda alta (región dorsal)	No X	Si		
Espalda baja (región lumbar	No X	Si		
Una o ambas caderas / piernas	No X	Si		
Una o ambas rodillas	No X	Si		
Uno o ambos tobillos / pies	No X	Si		



El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Monica ortega
Cargo: Especialista ambiental

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN

Fecha consulta 10-02-25 | Sexo: F X M __ | Año nacimiento 20-08-98 | Peso 52 | Talla 37

¿Cuánto tiempo lleva realizando el mismo tipo de trabajo? Años X Meses ___


En promedio ¿cuantas horas a la semana trabaja? Horas 46

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algun momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:

Cuello	No X	Si		
Hombro	No X	Si	Izq.	Der.
Codo	No X	Si	Izq.	Der.
Muñeca	No X	Si	Izq.	Der.
Espalda alta (region dorsal)	No X	Si		
Espalda baja (region lumbar	No X	Si		
Una o ambas caderas / piernas	No X	Si		
Una o ambas rodillas	No X	Si		
Uno o ambos tobillos / pies	No X	Si		

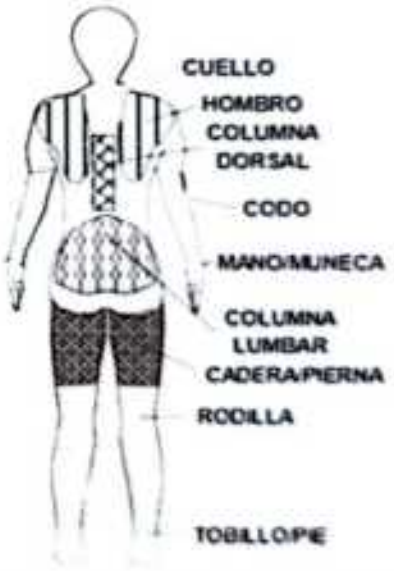

El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Gaman Hansalve
Cargo: Especialista hidraulico

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN

Fecha consulta 10-02-25	Sexo F ___ M X	Año nacimiento 13-08-51	Peso 65	Talla 41

¿Cuanto tiempo lleva ha usted en mismo tipo de trabajo? Años X Meses ___

En promedio ¿cuantas horas a la semana trabaja? Horas 46

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algun momento durante los ultimos 12 meses ha tenido problemas (dolor molestias disconfort) en

Cuello	No X	Si		
Hombro	No X	Si	Izq	Der
Codo	No X	Si	Izq	Der
Muñeca	No X	Si	Izq	Der
Espalda alta (region dorsal)	No X	Si		
Espalda baja (region lumbar	No X	Si		
Una o ambas caderas / piernas	No X	Si		
Una o ambas rodillas	No X	Si		
Uno o ambos tobillos / pies	No X	Si		



El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Luis Guerrero
Cargo: Especialista Seguridad Industrial y salud ocupacional

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN

Fecha de nacimiento 10-02-75 | Sexo: F ___ M X | Año de ingreso 11-02-75 | Peso 63 | Talla 90

¿Cuánto tiempo llevas en este mismo tipo de trabajo? Años 7 Meses ___


En promedio ¿cuantas horas a la semana trabaja? Horas 46

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algún momento durante los últimos 12 meses ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:

Cuello	No X	Si		
Hombro	No X	Si	Izq	Der
Codo	No X	Si	Izq	Der
Muñeca	No X	Si	Izq	Der
Espalda alta (región dorsal)	No X	Si		
Espalda baja (región lumbar)	No X	Si		
Una o ambas caderas / piernas	No X	Si		
Una o ambas rodillas	No X	Si		
Uno o ambos tobillos / pies	No X	Si		

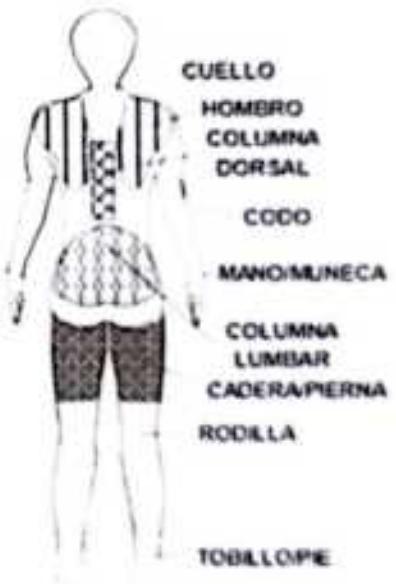

El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Nataly Gontalez
Cargo: Inspector SST

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN

Fecha consulta 10-02-25 | Sexo F X M__ | Año nacimiento 25-07-00 | Peso 62 | Talla 38

¿Cuanto tiempo lleva realizando el mismo tipo de trabajo? Años ___ Meses X

En promedio ¿cuantas horas a la semana trabaja? Horas 46

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algún momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:

Cuello	No X Si
Hombro	No X Si Izq. Der.
Codo	No X Si Izq. Der.
Muñeca	No X Si Izq. Der.
Espalda alta (region dorsal)	No X Si
Espalda baja (region lumbar	No X Si
Una o ambas caderas / piernas	No X Si
Una o ambas rodillas	No X Si
Uno o ambos tobillos / pies	No X Si



El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Santiago Ballesteros
Cargo: Oficios Varios

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN

Fecha diligencia: 10-02-25	Sexo: F ___ M X	Año nacimiento: 02-12-03	Peso: 58	Talla: 41

¿Cuánto tiempo lleva realizando el mismo tipo de trabajo? Años: Y Meses: ___

En promedio ¿cuantas horas a la semana trabaja? Horas: 46

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algun momento durante los ultimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:

Cuello	No: X	Si:		
Hombro	No: X	Si:	Izq:	Der:
Codo	No: X	Si:	Izq:	Der:
Muñeca	No: X	Si:	Izq:	Der:
Espalda alta (region dorsal)	No: X	Si:		
Espalda baja (region lumbar	No: X	Si:		
Una o ambas caderas / piernas	No: X	Si:		
Una o ambas rodillas	No: X	Si:		
Uno o ambos tobillos / pies	No: X	Si:		



El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Oscar Coronado
Cargo: Oficios Varios

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN

10-02-25	Sexo: M X	17-10-77	Peso: 62	Talla: 91

¿Cuánto tiempo lleva en este municipio de trabajo? Años: X Meses:

En promedio ¿cuántas horas a la semana trabaja? Horas: 46

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algún momento durante los últimos 12 meses ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:

Cuello	No X	Si		
Hombro	No X	Si	Izq	Der
Codo	No X	Si	Izq	Der
Muñeca	No X	Si	Izq	Der
Parte alta espalda (región dorsal)	No X	Si		
Parte baja espalda (región lumbar)	No X	Si		
Una o ambas caderas / piernas	No X	Si		
Una o ambas rodillas	No X	Si		
Uno o ambos tobillos / pies	No X	Si		



El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Julio Benavidez
Cargo: Topografo

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN

Fecha consulta 10-02-25	Sexo F ___ M X	Año nacimiento 18-07-75	Peso 65	Talla 41

¿Cuánto tiempo lleva ya usted en el mismo tipo de trabajo? Años: X Meses: ___


En promedio ¿cuantas horas a la semana trabaja? Horas: 46

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algún momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:

Cuello	No: X	Si:		
Hombro	No: X	Si:	Izq:	Der:
Codo	No: X	Si:	Izq:	Der:
Muñeca	No: X	Si:	Izq:	Der:
Espalda alta (región dorsal)	No: X	Si:		
Espalda baja (región lumbar	No: X	Si:		
Una o ambas caderas / piernas	No: X	Si:		
Una o ambas rodillas	No: X	Si:		
Uno o ambos tobillos / pies	No: X	Si:		

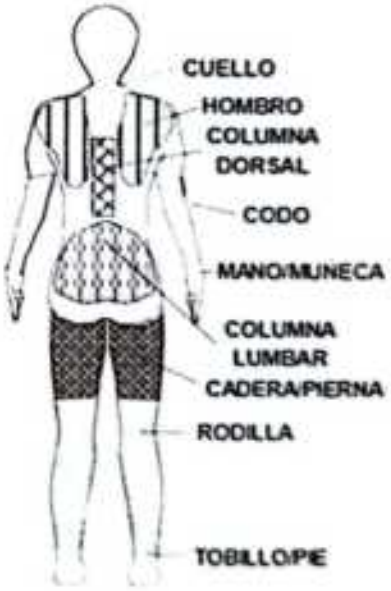

El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	CUESTIONARIO NORDICO	CÓDIGO: FOR-046 Versión:001 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1

CUESTIONARIO NÓRDICO AJUSTADO

Nombres y Apellidos: Albert Nieto
Cargo: Cadenero

CUESTIONARIO ACERCA DE PROBLEMAS EN LOS ORGANOS DE LA LOCOMOCIÓN				
Fecha consulta 10-02-25	Sexo F ___ M X	Año nacimiento 13-03-83	Peso 61	Talla 40
¿Cuanto tiempo lleva realizando el mismo tipo de trabajo? Años 16	Meses ___			
En promedio ¿cuantas horas a la semana trabaja?	Horas: 46			

PROBLEMAS EN EL APARATO LOCOMOTOR

Para ser respondido por todos

¿En algun momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas (dolor, molestias, disconfort) en:

Cuello	No X	Si	
Hombro	No X	Si	Izq Der
Codo	No X	Si	Izq Der
Muñeca	No X	Si	Izq Der
Espalda alta (region dorsal)	No X	Si	
Espalda baja (región lumbar	No X	Si	
Una o ambas caderas / piernas	No X	Si	
Una o ambas rodillas	No X	Si	
Uno o ambos tobillos / pies	No X	Si	



El presente cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales. Es importante que el trabajador informe si presenta molestias, dolor o incomodidad en alguna parte de su cuerpo, con el fin de prevenir lesiones o enfermedades laborales.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. *Le solicitamos responder señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando los cuadros de las páginas siguientes.*

Powered by CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN EXCAVADORA	Código: CAP-031-025 Versión:05 Fecha: 02/12/2022

CÓDIGO INTERNO: Kobelco PROYECTO: Consorcio P y CVS FRENTE: Cloaca 018

OPERADOR: Daniel Bolivar Quez

	DÍA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	FECHA	13/01/25	14/01/25	15/01/25	16/01/25	17/01/25		
	INSPECCIÓN EXTERNA							
Nº	QUÉ INSPECCIONAR	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO
1	DESAJO DE LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK	OK		
2	BALDE	OK	OK	OK	OK	OK		
3	BRAZO BALDE	OK	OK	OK	OK	OK		
4	GATOS, MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES BRAZO Y BALDE	OK	OK	OK	OK	OK		
5	LUCES Y REFLECTORES FRONTALES	OK	OK	OK	OK	OK		
6	ESPEJOS	OK	OK	OK	OK	OK		
7	ORUGA Y SISTEMA DE RODAMIENTO IZQUIERDO	OK	OK	OK	OK	OK		
8	FILTRO DE AIRE EXTERNO O COLECTOR	OK	OK	OK	OK	OK		
9	ORUGA Y SISTEMA DE RODAMIENTO DERECHO	OK	OK	OK	OK	OK		
10	LICUADORA	OK	OK	OK	OK	OK		
11	ESCALONES, ESTRIBOS, PASAMANOS Y AGARRADERAS	OK	OK	OK	OK	OK		
	INSPECCIÓN COMPUERTAS LATERALES							
12	FILTROS DE AIRE	OK	OK	OK	OK	OK		
13	NIVEL DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	OK	OK	OK	OK	OK		
14	NIVEL LÍQUIDO REFRIGERANTE	OK	OK	OK	OK	OK		
15	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES	OK	OK	OK	OK	OK		
16	BOMBAS HIDRAULICAS	OK	OK	OK	OK	OK		
17	SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	OK	OK	OK	OK	OK		
18	NIVEL, TANQUE Y FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	OK	OK	OK	OK	OK		
	INSPECCIÓN MOTOR COMPUERTA SUPERIOR							
19	NIVEL ACEITE DEL MOTOR	OK	OK	OK	OK	OK		
20	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES	OK	OK	OK	OK	OK		
21	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y LÍNEA DE COMBUSTIBLE	OK	OK	OK	OK	OK		
22	BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	OK	OK	OK	OK	OK		
23	CORREAS, POLEAS, ALTERNADOR Y VENTILADOR	OK	OK	OK	OK	OK		
24	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES MOTOR	OK	OK	OK	OK	OK		
25	CABLES Y CONEXIONES ELECTRICAS MOTOR	OK	OK	OK	OK	OK		
	INSPECCIÓN ZONA DE LA TORNAMESA O TORRETA							
26	ACEITE DEL MOTOR(ES) DE GIRO	OK	OK	OK	OK	OK		
27	BANCO DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN	OK	OK	OK	OK	OK		
	INSPECCIÓN ACCESORIO(S)							
28	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES	OK	OK	OK	OK	OK		
29	INSPECCION SOPORTE Y ESTADO GENERAL ACCESORIO	OK	OK	OK	OK	OK		
30	INSPECCIÓN HERRAMIENTAL	OK	OK	OK	OK	OK		
	INSPECCIÓN EN LA CABINA							
31	PUERTA (CHAPAS Y APERTURA)	OK	OK	OK	OK	OK		
32	ASIENTO	OK	OK	OK	OK	OK		
33	CINTURON DE SEGURIDAD	OK	OK	OK	OK	OK		
34	VENTANAS	OK	OK	OK	OK	OK		
35	INDICADORES, DISPLAYS, ALARMAS	OK	OK	OK	OK	OK		
36	LIMPIAPARABRISAS Y PLUMILLA	OK	OK	OK	OK	OK		
37	PITO	OK	OK	OK	OK	OK		
38	AIRE ACONDICIONADO A/C	OK	OK	OK	OK	OK		
39	LUZ AUXILIAR INTERIOR	OK	OK	OK	OK	OK		
40	EXTINTOR	OK	OK	OK	OK	OK		
41	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	OK	OK	OK	OK	OK		

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES INSPECCIÓN: SI NO EXISTE LA CONVENCIÓN ESCRIBIR "OTRO" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

OK: TODO ESTA EN REGLA	FR: FISURA O GRIETA	FD: BOMBILLO FUNDIDO	SU: SUCIEDAD, CASCO O HERRAMIEN.	DE: DESCARGADO
FU: FUGA	DR: DAÑO O ROPTURA	TP: TAPONAMIENTO	CS: CONEXIONES SUELTAS/AS	VE: VENCIDO
DG: DESGASTE	AB: ABOLLADURA	NB: NIVEL BAJO	MF: MAL FUNCIONAMIENTO	TR: FILTRACIÓN
FA: ELEMENTO FALTANTE	AJ: AJUSTE	JG: JUEGO	CC: CORTO CIRCUITO	NA: NO APLICA

Powered by CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN EXCAVADORA	Código: DAP-031-005 Versión:01 Fecha: 06/12/2024

CONDICIONES DE OPERACIÓN								
Nº	PARÁMETRO	UNIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	HORÓMETRO	HORAS	17-09-25	18-09-25	19-09-25	20-09-25			
2	TEMPERATURA DEL MOTOR EN OPERACIÓN	°C ó °F	OK	OK	OK	OK			
3	TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO EN OP	°C ó °F	OK	OK	OK	OK			
4	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERADOR MÍNIMO	700 - 800 RPM	OK	OK	OK	OK			
5	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERADOR MÁXIMO	900 - 1100 RPM	OK	OK	OK	OK			
6	RPM MÁXIMAS DEL MOTOR EN OPERACIÓN	2000 RPM	OK	OK	OK	OK			
7	VOLTAJE BATERÍA	27 - 29 VOLT	OK	OK	OK	OK			
8	PRESIÓN BOMBA FRONTAL EN RALENTÍ	30 - 33 BAR	OK	OK	OK	OK			
9	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA FRONTAL	330 - 350 BAR	OK	OK	OK	OK			
10	PRESIÓN BOMBA TRASERA EN RALENTÍ	28 - 31 BAR	OK	OK	OK	OK			
11	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA TRASERA	320 - 330 BAR	OK	OK	OK	OK			
12	ACCESORIOS UTILIZADOS (CUÁL?)	SI / NO	OK	OK	OK	OK			
13	MODO DE ZONA UTILIZADO?	SI / NO	OK	OK	OK	OK			
14	OPCIÓN DE MÁXIMA POTENCIA UTILIZADA?	SI / NO	OK	OK	OK	OK			
ALARMAS PRESENTADAS DURANTE LA OPERACIÓN									
ALARMA GENERAL DEL MOTOR ESPECIFICAR CÓDIGO									
PRESIÓN DE ACEITE MOTOR BAJA									
NIVEL DE ACEITE MOTOR BAJO									
TEMPERATURA DE ACEITE MOTOR ALTA									
NIVEL DE REFRIGERANTE BAJO									
TEMPERATURA DEL MOTOR ALTA									
FILTRO DE AIRE ADMISIÓN MOTOR SATURADO									
NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO BAJO									
TEMPERATURA DE ACEITE HIDRÁULICO ALTA									
FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO SATURADO									
NIVEL DE COMBUSTIBLE BAJO									
VOLTAJE DE LA BATERIA BAJO									
CAUSAS DE PARADAS NO PROGRAMADAS									
1		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
2		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
3		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
4		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
REPOSICIONES Y CALIBRACIONES									
PARÁMETRO		UNIDAD							
REPOSICIÓN DE ACEITE MOTOR		GALONES							
REPOSICIÓN DE REFRIGERANTE		GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO		GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE TORNAMESA O TORRETA		GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE TRANSMISIÓN		GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE MANDOS FINALES		GALONES							
CAMBIO DE PUNTA MARTILLO HIDRÁULICO		CANTIDAD							
FIRMAS									
Firma OPERARIO									
Vo Bo INGENIERO RESIDENTE									

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES PARADAS NO PROGRAMADAS: SI NO EXISTE LA CONVENCIÓN ESCRIBIR "OTRO" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

FC: FALTA DE COMBUSTIBLE	AM: AVERÍA MOTOR	RH: ROPTURA MANGUERA HIDRÁULICA	BD: BATERÍA DESCARGADA
FA: FALTA DE ACEITE MOTOR	AB: AVERÍA BOMBA HIDRÁULICA	RR: ROPTURA RACOR O ACOPLE	DS: DAÑO SWITCH
FR: FALTA DE REFRIGERANTE	AH: AVERÍA MOTOR HIDRÁULICO	RC: ROPTURA CORREA MOTOR	DF: DAÑO FUSIBLE
FH: FALTA DE ACEITE HIDRÁULICO	AV: AVERÍA VÁLVULA DE VÍAS	RM: ROPTURA MANGUERA MOTOR	DS: DAÑO SOLENOIDE
FP: FALTA DE AGUA PLUMILLAS	AG: AVERÍA GATO HIDRÁULICO	OR: DAÑO ORUGA	RC: ROPTURA CABLE

Juis Fernando Guerrero

Vo Bo Dir Operativo

1 bar = 100 kPa = 14,5 psi = 1,02 kg/cm2

1 bar = 0,708 ft

Powered by CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN ESCAVADORA	Código: FAP-001-024 Versión: 02 Fecha: 02/11/2014

CÓDIGO INTERNO: Kobelco PROYECTO: Consorcio PYCS FRENTE: Cienaga cav.

OPERADOR: David Bolivar

DÍA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FECHA					09/3	10/3	12/3	13/3	

	INSPECCIÓN EXTERNA							
Nº	QUÉ INSPECCIONAR	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO
1	DESBASTE DE LA MÁQUINA					OK	OK	
2	BALDE					OK	OK	
3	BRAZO BALDE					OK	OK	
4	DATOR, MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES BRAZO Y BALDE					OK	OK	
5	LUCES Y REFLECTORES FRONTALES					OK	OK	
6	ESPEJOS					OK	OK	
7	ORUGA Y SISTEMA DE RODAMIENTO IZQUIERDO					OK	OK	
8	FILTRO DE AIRE EXTERNO O COLECTOR					OK	OK	
9	ORUGA Y SISTEMA DE RODAMIENTO DERECHO					OK	OK	
10	LICUADORA					OK	OK	
11	ESCALONES, ESTRIBOS, PASAMANOS Y AGARRADERAS					OK	OK	
	INSPECCIÓN COMPUERTAS LATERALES							
12	FILTROS DE AIRE					OK	OK	
13	NIVEL DE AGUA LIMPIAPARABRISAS					OK	OK	
14	NIVEL LÍQUIDO REFRIGERANTE					OK	OK	
15	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES					OK	OK	
16	BOMBAS HIDRÁULICAS					OK	OK	
17	SEPARADOR DE COMBUSTIBLE					OK	OK	
18	NIVEL, TANQUE Y FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO					OK	OK	
	INSPECCIÓN MOTOR COMPUERTA SUPERIOR							
19	NIVEL ACEITE DEL MOTOR					OK	OK	
20	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES					OK	OK	
21	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y LÍNEA DE COMBUSTIBLE					OK	OK	
22	BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE					OK	OK	
23	CORREAS, POLEAS, ALTERNADOR Y VENTILADOR					OK	OK	
24	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES MOTOR					OK	OK	
25	CABLES Y CONEXIONES ELECTRICAS MOTOR					OK	OK	
	INSPECCIÓN ZONA DE LA TORNAMESA O TORRETA							
26	ACEITE DEL MOTOR(ES) DE GIRO					OK	OK	
27	BANCO DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN					OK	OK	
	INSPECCIÓN ACCESORIO(S)							
28	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES					OK	OK	
29	INSPECCION SOPORTE Y ESTADO GENERAL ACCESORIO					OK	OK	
30	INSPECCIÓN HERRAMENTAL					OK	OK	
	INSPECCIÓN EN LA CABINA							
31	PUERTA (CHAPAS Y APERTURA)					OK	OK	
32	ASIENTO					OK	OK	
33	CINTURON DE SEGURIDAD					OK	OK	
34	VENTANAS					OK	OK	
35	INDICADORES, DISPLAYS, ALARMAS					OK	OK	
36	LIMPIAPARABRISAS Y PLUMILLA					OK	OK	
37	PITO					OK	OK	
38	AIRE ACONDICIONADO A/C					OK	OK	
39	LUZ AUXILIAR INTERIOR					OK	OK	
40	EXTINTOR					OK	OK	
41	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					OK	OK	

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES INSPECCIÓN: SI NO EXISTE LA CONVENCIÓN ESCRIBIR "OTRO" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

OK: TODO ESTA EN BUEN	FR: FISURA O GRIETA	FD: BOMBILLO FUNDIDO	BA: BUES/JAS, USADO O HERRAMIENTA	DE: DESGARRADO			
FU: FUGA	RO: DAÑO O ROPTURA	TP: TAPONAMIENTO	CA: CORREA/NER RAJATADAS	VE: VENCIDO			
DG: DESGASTE	AB: ABOLLADURA	NB: NIVEL BAJO	MF: MAL FUNCIONAMIENTO	FI: FILTRACIÓN			
FA: ELEMENTO FALTANTE	AJ: AJUSTE	JU: JUEGO	CC: CORTO CIRCUITO	NA: NO APLICA			

Powered by CamScanner

FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN
EXCAVADORA

Nº	CONDICIONES DE OPERACIÓN	UNIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	HORÓMETRO	HORAS					07077	07082	
2	TEMPERATURA DEL MOTOR EN OPERACIÓN	°C ± 1 / 10					OK	OK	
3	TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO EN OP.	°C ± 1 / 10					OK	OK	
4	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERADOR MÍNIMO	700 - 900 RPM					OK	OK	
5	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERADOR MÁXIMO	900 - 1100 RPM					OK	OK	
6	RPM MÁXIMAS DEL MOTOR EN OPERACIÓN	2000 RPM					OK	OK	
7	VOLTAJE BATERÍA	27 - 28 VOLT					OK	OK	
8	PRESIÓN BOMBA FRONTAL EN RALENTÍ	26 - 31 BAR					OK	OK	
9	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA FRONTAL	320 - 330 BAR					OK	OK	
10	PRESIÓN BOMBA TRASERA EN RALENTÍ	26 - 31 BAR					OK	OK	
11	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA TRASERA	320 - 330 BAR					OK	OK	
12	ACCESORIOS UTILIZADOS (CUÁL?)	SI / NO					OK	OK	
13	MODO DE ZANJA UTILIZADO?	SI / NO					OK	OK	
14	OPCIÓN DE MÁXIMA POTENCIA UTILIZADA?	SI / NO					OK	OK	
	ALARMAS PRESENTADAS DURANTE LA OPERACIÓN								
	ALARMA GENERAL DEL MOTOR (ESPECIFICAR CÓDIGO								
	PRESIÓN DE ACEITE MOTOR BAJA								
	NIVEL DE ACEITE MOTOR BAJO								
	TEMPERATURA DE ACEITE MOTOR ALTA								
	NIVEL DE REFRIGERANTE BAJO								
	TEMPERATURA DEL MOTOR ALTA								
	FILTRO DE AIRE ADMISIÓN MOTOR SATURADO								
	NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO BAJO								
	TEMPERATURA DE ACEITE HIDRÁULICO ALTA								
	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO SATURADO								
	NIVEL DE COMBUSTIBLE BAJO								
	VOLTAJE DE LA BATERIA BAJO								
	CAUSAS DE PARADAS NO PROGRAMADAS								
1	HORA PARADA	HH:MM							
	HORA ARRANQUE	HH:MM							
2	HORA PARADA	HH:MM							
	HORA ARRANQUE	HH:MM							
3	HORA PARADA	HH:MM							
	HORA ARRANQUE	HH:MM							
4	HORA PARADA	HH:MM							
	HORA ARRANQUE	HH:MM							
	REPOSICIONES Y CALIBRACIONES								
	PARÁMETRO	UNIDAD							
	REPOSICIÓN DE ACEITE MOTOR	GALONES							
	REPOSICIÓN DE REFRIGERANTE	GALONES							
	REPOSICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO	GALONES							
	REPOSICIÓN DE ACEITE TORNAMESA O TORRETA	GALONES							
	REPOSICIÓN DE ACEITE TRANSMISIÓN	GALONES							
	REPOSICIÓN DE ACEITE MANDOS FINALES	GALONES							
	CAMBIO DE PUNTA MARTILLO HIDRÁULICO	CANTIDAD							
	FIRMAS								
	Firma OPERARIO								
	Vo Bo INGENIERO RESIDENTE								

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES PARADAS NO PROGRAMADAS: SI NO EXISTE LA CONVENCIÓN ESCRIBIR "OTRO" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

- FC: FALTA DE COMBUSTIBLE
- FA: FALTA DE ACEITE MOTOR
- FR: FALTA DE REFRIGERANTE
- FH: FALTA DE ACEITE HIDRÁULICO
- FP: FALTA DE AGUA PLUMILLAS
- AM: AVERIA MOTOR
- AB: AVERÍA BOMBA HIDRÁULICA
- AH: AVERÍA MOTOR HIDRÁULICO
- AV: AVERÍA VÁLVULA DE VÍAS
- AG: AVERIA GATO HIDRÁULICO
- RH: ROPTURA MANGUERA HIDRAULICA
- RR: ROPTURA RACOR O ACOPLE
- RC: ROPTURA CORREA MOTOR
- RM: ROPTURA MANGUERA MOTOR
- DR: DAÑO ORUGA
- BD: BATERÍA DESCARGADA
- DS: DAÑO SWITCH
- DF: DAÑO FUSIBLE
- DS: DAÑO SOLENOIDE
- RC: ROPTURA CABLE

Luis Fernando Moreno

Vo Bo Dir. Operativo

1 BAR = 100 kPa = 14,5 psi = 1,02 Kg/cm2
1 Gal = 3,788 lt

Powered by CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN EXCAVADORA	Código: CAP-SST-024 Versión:03 Fecha: 09/12/2024

CÓDIGO INTERNO: Kobelco PROYECTO: Consorcio PyG MUNICIPIO: Cienaga de oro

OPERADOR: Daniel Bohorquez

	DÍA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	FECHA	10	02	25	11	03	25	12	03	25	13	03	25	14	03	25	15	03	25			
	INSPECCIÓN EXTERNA																					
Nº	QUÉ INSPECCIONAR	CONCEPTO			CONCEPTO			CONCEPTO			CONCEPTO			CONCEPTO			CONCEPTO			CONCEPTO		
1	CRIBAJO DE LA MÁQUINA	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
2	BALDE	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
3	BRAZO BALDE	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
4	GATOS, MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES BRAZO Y BALDE	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
5	LUCES Y REFLECTORES FRONTALES	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
6	ESPEJOS	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
7	ORUGA Y SISTEMA DE RODAMIENTO IZQUIERDO	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
8	FILTRO DE AIRE EXTERNO O COLECTOR	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
9	ORUGA Y SISTEMA DE RODAMIENTO DERECHO	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
10	LICUADORA	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
11	ESCALONES, ESTRIBOS, PASAMANOS Y AGARRADERAS	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
	INSPECCIÓN COMPUERTAS LATERALES																					
12	FILTROS DE AIRE	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
13	NIVEL DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
14	NIVEL LÍQUIDO REFRIGERANTE	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
15	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
16	BOMBAS HIDRÁULICAS	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
17	SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
18	NIVEL, TANQUE Y FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
	INSPECCIÓN MOTOR COMPUERTA SUPERIOR																					
19	NIVEL ACEITE DEL MOTOR	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
20	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
21	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y LÍNEA DE COMBUSTIBLE	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
22	BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
23	CORREAS, POLEAS, ALTERNADOR Y VENTILADOR	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
24	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES MOTOR	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
25	CABLES Y CONEXIONES ELECTRICAS MOTOR	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
	INSPECCIÓN ZONA DE LA TORNAMESA O TORRETA																					
26	ACEITE DEL MOTOR(ES) DE GIRO	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
27	BANCO DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
	INSPECCIÓN ACCESORIO(S)																					
28	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
29	INSPECCION SOPORTE Y ESTADO GENERAL ACCESORIO	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
30	INSPECCIÓN HERRAMENTAL	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
	INSPECCIÓN EN LA CABINA																					
31	PUERTA (CHAPAS Y APERTURA)	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
32	ASIENTO	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
33	CINTURON DE SEGURIDAD	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
34	VENTANAS	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
35	INDICADORES, DISPLAYS, ALARMAS	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
36	LIMPIAPARABRISAS Y PLUMILLA	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
37	PITO	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
38	AIRE ACONDICIONADO A/C	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
39	LUZ AUXILIAR INTERIOR	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
40	EXTINTOR	OK			OK			OK			OK			OK			OK					
41	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	OK			OK			OK			OK			OK			OK					

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES INSPECCIÓN: SI NO EXISTE LA CONVENCIÓN ESCRIBIR "OTRO" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

OK: TODO ESTA EN REGLA	FR: FISURA O GRIETA	FD: BOMBILLO FUNDIDO	BU: BUCSEDAD, DAÑO O HERRAMIENTA		DE: DESCARGADO		
FU: FUGA	DÑ: DAÑO O ROPTURA	TP: TAPONAMIENTO	CS: CONEXIONES SULFATADAS		VE: VENCIDO		
DG: DESGASTE	AB: ABOYADURA	NB: NIVEL BAJO	MF: MAL FUNCIONAMIENTO		FI: FILTRACIÓN		
FA: ELEMENTO FALTANTE	AJ: AJUSTE	JU: JUEGO	CC: CORTO CIRCUITO		NA: NO APLICA		

Powered by CamScanner

FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN EXCAVADORA

Nº	CONDICIONES DE OPERACIÓN	UNIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	HORÓMETRO	HORAS	10-07-25	11-07-25	12-07-25	13-07-25	14-07-25	15-07-25	
2	TEMPERATURA DEL MOTOR EN OPERACIÓN	°C ó F / 10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO EN OP	°C ó F / 10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
4	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERADOR MÍNIMO	750 - 800 RPM	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
5	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERADOR MÁXIMO	900 - 1100 RPM	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
6	RPM MÁXIMAS DEL MOTOR EN OPERACIÓN	2000 RPM	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
7	VOLTAJE BATERÍA	27 - 29 VOLT	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
8	PRESIÓN BOMBA FRONTAL EN RALENTÍ	29 - 31 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
9	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA FRONTAL	320 - 330 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
10	PRESIÓN BOMBA TRASERA EN RALENTÍ	29 - 31 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
11	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA TRASERA	320 - 330 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ACCESORIOS UTILIZADOS (CUÁL?)	SI / NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
13	MODO DE ZONA UTILIZADO?	SI / NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
14	OPCIÓN DE MÁXIMA POTENCIA UTILIZADA?	SI / NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ALARMAS PRESENTADAS DURANTE LA OPERACIÓN								
	ALARMA GENERAL DEL MOTOR ESPECIFICAR CÓDIGO								
	PRESIÓN DE ACEITE MOTOR BAJA								
	NIVEL DE ACEITE MOTOR BAJO								
	TEMPERATURA DE ACEITE MOTOR ALTA								
	NIVEL DE REFRIGERANTE BAJO								
	TEMPERATURA DEL MOTOR ALTA								
	FILTRO DE AIRE ADMISIÓN MOTOR SATURADO								
	NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO BAJO								
	TEMPERATURA DE ACEITE HIDRÁULICO ALTA								
	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO SATURADO								
	NIVEL DE COMBUSTIBLE BAJO								
	VOLTAJE DE LA BATERIA BAJO								
	CAUSAS DE PARADAS NO PROGRAMADAS								
1	HORA PARADA	HH:MM							
	HORA ARRANQUE	HH:MM							
2	HORA PARADA	HH:MM							
	HORA ARRANQUE	HH:MM							
3	HORA PARADA	HH:MM							
	HORA ARRANQUE	HH:MM							
4	HORA PARADA	HH:MM							
	HORA ARRANQUE	HH:MM							
	REPOSICIONES Y CALIBRACIONES								
	PARÁMETRO	UNIDAD							
	REPOSICIÓN DE ACEITE MOTOR	GALONES							
	REPOSICIÓN DE REFRIGERANTE	GALONES							
	REPOSICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO	GALONES							
	REPOSICIÓN DE ACEITE TORNAMESA O TORRETA	GALONES							
	REPOSICIÓN DE ACEITE TRANSMISIÓN	GALONES							
	REPOSICIÓN DE ACEITE MANDOS FINALES	GALONES							
	CAMBIO DE PUNTA MARTILLO HIDRÁULICO	CANTIDAD							
	FIRMAS								
	Firma OPERARIO								
	Vo Bo INGENIERO RESIDENTE								

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES PARADAS NO PROGRAMADAS: SI NO EXISTE LA CONVENCIÓN ESCRIBIR "OTRO" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

FC: FALTA DE COMBUSTIBLE	AM: AVERÍA MOTOR	RH: ROPTURA MANGUERA HIDRAULICA	BD: BATERÍA DESCARGADA		
FA: FALTA DE ACEITE MOTOR	AB: AVERÍA BOMBA HIDRÁULICA	RR: ROPTURA RACOR O ACOPLE	DS: DAÑO SWITCH		
FR: FALTA DE REFRIGERANTE	AH: AVERÍA MOTOR HIDRÁULICO	RC: ROPTURA CORREA MOTOR	DF: DAÑO FUSIBLE		
FH: FALTA DE ACEITE HIDRÁULICO	AV: AVERÍA VALVULA DE VÍAS	RM: ROPTURA MANGUERA MOTOR	DS: DAÑO SOLENOIDE		
FP: FALTA DE AGUA PLUMILLAS	AG: AVERÍA GATO HIDRÁULICO	OR: DAÑO ORUGA	RC: ROPTURA CABLE		

Juis Fernando Guerrero.

Vo Bo Dir. Operativo

1 BAR = 100 KPa = 14,5 psi = 1,02 Kg/cm2

1 Gal = 3,785 lt

Powered by CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN EXCAVADORA	Código: CAP-007-003 Versión: 01 Fecha: 30/11/2020

CÓDIGO INTERNO: Excavadora XCM6164 PROYECTO: Construcción P y CVS FRENTE: Cienaga de oro

OPERADOR: Alexander Velasquez

DÍA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FECHA	16/03/21	17/03/21	18/03/21	19/03/21			

	INSPECCIÓN EXTERNA							
Nº	QUÉ INSPECCIONAR	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO
1	DEBAJO DE LA MAQUINA	OK	OK	OK	OK			
2	BALDE	OK	OK	OK	OK			
3	BRAZO BALDE	OK	OK	OK	OK			
4	CILINDROS, MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES BRAZO Y BALDE	OK	OK	OK	OK			
5	LUCES Y REFLECTORES FRONTALES	OK	OK	OK	OK			
6	ESPEJOS	OK	OK	OK	OK			
7	ORUGA Y SISTEMA DE RODAMIENTO IZQUIERDO	OK	OK	OK	OK			
8	FILTRO DE AIRE EXTERNO O COLECTOR	OK	OK	OK	OK			
9	ORUGA Y SISTEMA DE RODAMIENTO DERECHO	OK	OK	OK	OK			
10	LICUADORA	OK	OK	OK	OK			
11	ESCALONES, ESTRIBOS, PASAMANOS Y AGARRADERAS	OK	OK	OK	OK			
	INSPECCIÓN COMPUERTAS LATERALES							
12	FILTROS DE AIRE	OK	OK	OK	OK			
13	NIVEL DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	OK	OK	OK	OK			
14	NIVEL LÍQUIDO REFRIGERANTE	OK	OK	OK	OK			
15	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES	OK	OK	OK	OK			
16	BOMBAS HIDRÁULICAS	OK	OK	OK	OK			
17	SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	OK	OK	OK	OK			
18	NIVEL, TANQUE Y FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	OK	OK	OK	OK			
	INSPECCIÓN MOTOR COMPUERTA SUPERIOR							
19	NIVEL ACEITE DEL MOTOR	OK	OK	OK	OK			
20	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES	OK	OK	OK	OK			
21	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y LÍNEA DE COMBUSTIBLE	OK	OK	OK	OK			
22	BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	OK	OK	OK	OK			
23	CORREAS, POLEAS, ALTERNADOR Y VENTILADOR	OK	OK	OK	OK			
24	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES MOTOR	OK	OK	OK	OK			
25	CABLES Y CONEXIONES ELECTRICAS MOTOR	OK	OK	OK	OK			
	INSPECCIÓN ZONA DE LA TORNAMESA O TORRETA							
26	ACEITE DEL MOTOR(ES) DE GIRO	OK	OK	OK	OK			
27	BANCO DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN	OK	OK		OK			
	INSPECCIÓN ACCESORIO(S)							
28	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES	OK	OK	OK	OK			
29	INSPECCION SOPORTE Y ESTADO GENERAL ACCESORIO	OK	OK	OK	OK			
30	INSPECCIÓN HERRAMIENTAL	OK	OK	OK	OK			
	INSPECCIÓN EN LA CABINA							
31	PUERTA (CHAPAS Y APERTURA)	OK	OK	OK	OK			
32	ASIENTO	OK	OK	OK	OK			
33	CINTURON DE SEGURIDAD	OK	OK	OK	OK			
34	VENTANAS	OK	OK	OK	OK			
35	INDICADORES, DISPLAYS, ALARMAS	OK	OK	OK	OK			
36	LIMPIAPARABRISAS Y PLUMILLA	OK	OK	OK	OK			
37	PITO	OK	OK	OK	OK			
38	AIRE ACONDICIONADO A/C	OK	OK	OK	OK			
39	LUZ AUXILIAR INTERIOR	OK	OK	OK	OK			
40	EXTINTOR	OK	OK	OK	OK			
41	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	OK	OK	OK	OK			

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES INSPECCIÓN: SI NO EXISTE LA CONVENCIÓN ESCRIBIR "OTRO" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

OK: TODO ESTA EN REGLA	FI: FISURA O GRIETA	FD: BOMBILLO FUNDIDO	BU: BUCHILLA, CUCHO O HERRAMIENTA		DE: DESCARGADO		
FU: FUGA	DA: DAÑO O ROPTURA	TP: TAPONAMIENTO	CS: CONEXIONES SULFATADAS		VE: VENCIDO		
DG: DESGASTE	AB: ABOLLADURA	NB: NIVEL BAJO	MF: MAL FUNCIONAMIENTO		FI: FILTRACIÓN		
FA: ELEMENTO FALTANTE	AJ: AJUSTE	JU: JUEGO	CC: CORTO CIRCUITO		NA: NO APLICA		

Powered by CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN EXCAVADORA	Código CAF-001-005 Versión 01 Fecha 09/12/2016

CONDICIONES DE OPERACIÓN								
Nº	PARÁMETRO	UNIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	HORÓMETRO	HORAS	7707.75	7707.75	7707.75	7709.75			
2	TEMPERATURA DEL MOTOR EN OPERACIÓN	°C ± 1 / °F	OK	OK	OK	OK			
3	TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO EN OP	°C ± 1 / °F	OK	OK	OK	OK			
4	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERADOR MÍNIMO	700 - 900 RPM	OK	OK	OK	OK			
5	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERADOR MÁXIMO	900 - 1100 RPM	OK	OK	OK	OK			
6	RPM MÁXIMO DEL MOTOR EN OPERACIÓN	1900 RPM	OK	OK	OK	OK			
7	VOLTAJE BATERÍA	27 - 29 VOLT	OK	OK	OK	OK			
8	PRESIÓN BOMBA FRONTAL EN RALENTÍ	29 - 31 BAR	OK	OK	OK	OK			
9	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA FRONTAL	320 - 330 BAR	OK	OK	OK	OK			
10	PRESIÓN BOMBA TRASERA EN RALENTÍ	29 - 31 BAR	OK	OK	OK	OK			
11	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA TRASERA	320 - 330 BAR	OK	OK	OK	OK			
12	ACCESORIOS UTILIZADOS (CUÁL?)	SI / NO	OK	OK	OK	OK			
13	MODO DE FAENA UTILIZADO?	SI / NO	OK	OK	OK	OK			
14	OPCIÓN DE MÁXIMA POTENCIA UTILIZADA?	SI / NO	OK	OK	OK	OK			
ALARMAS PRESENTADAS DURANTE LA OPERACIÓN									
ALARMA GENERAL DEL MOTOR ESPECIFICAR CÓDIGO									
PRESIÓN DE ACEITE MOTOR BAJA									
NIVEL DE ACEITE MOTOR BAJO									
TEMPERATURA DE ACEITE MOTOR ALTA									
NIVEL DE REFRIGERANTE BAJO									
TEMPERATURA DEL MOTOR ALTA									
FILTRO DE AIRE ADMISIÓN MOTOR SATURADO									
NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO BAJO									
TEMPERATURA DE ACEITE HIDRÁULICO ALTA									
FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO SATURADO									
NIVEL DE COMBUSTIBLE BAJO									
VOLTAJE DE LA BATERÍA BAJO									
CAUSAS DE PARADAS NO PROGRAMADAS									
1		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
2		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
3		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
4		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
REPOSICIONES Y CALIBRACIONES									
PARÁMETRO		UNIDAD							
REPOSICIÓN DE ACEITE MOTOR		GALONES							
REPOSICIÓN DE REFRIGERANTE		GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO		GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE TORNAMESA O TORRETA		GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE TRANSMISIÓN		GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE MANDOS FINALES		GALONES							
CAMBIO DE PUNTA MARTILLO HIDRÁULICO		CANTIDAD							
FIRMAS									
Firma OPERARIO									
Vo Bo INGENIERO RESIDENTE									

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES PARADAS NO PROGRAMADAS: SI NO EXISTE LA CONVENCIÓN ESCRIBIR "OTRO" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES.

FC: FALTA DE COMBUSTIBLE	AM: AVERÍA MOTOR	RM: ROPTURA MANGUERA HIDRÁULICA	BD: BATERÍA DESCARGADA		
FA: FALTA DE ACEITE MOTOR	AB: AVERÍA BOMBA HIDRÁULICA	RR: ROPTURA RACOR O ACOPLE	SW: DAÑO SWITCH		
FR: FALTA DE REFRIGERANTE	AH: AVERÍA MOTOR HIDRÁULICO	RC: ROPTURA CORREA MOTOR	DF: DAÑO FUSIBLE		
FH: FALTA DE ACEITE HIDRÁULICO	AV: AVERÍA VALVULA DE VIAS	RM: ROPTURA MANGUERA MOTOR	SS: DAÑO SOLENOIDE		
FP: FALTA DE AGUA PLUMILLAS	AG: AVERÍA GATO HIDRÁULICO	OR: DAÑO ORUGA	RC: ROPTURA CABLE		

Luis Fernando Guerrero

Vo Bo Op. Operativo

1 BAR = 100 kPa = 14.5 psi = 1.02 Kg/cm2

1 Gal = 3.785 lt

Powered by CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN EXCAVADORA	

EQUIPO INTERNO: Excavadora XCM 611A PROYECTO: Contrato P.Y CVS FRENTE: Chirajara

OPERADOR: Alexander Velasquez

	DÍA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	FECHA			12/08/25	13/08/25	14/08/25	15/08/25	

Nº	INSPECCIÓN EXTERNA QUÉ INSPECCIONAR	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO
1	CHASIS DE LA MÁQUINA			OK	OK	OK	OK	
2	BALDE			OK	OK	OK	OK	
3	BRAZO BALDE			OK	OK	OK	OK	
4	CILINDROS, MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES BRAZO Y BALDE			OK	OK	OK	OK	
5	LUCES Y REFLECTORES FRONTALES			OK	OK	OK	OK	
6	ESPEJOS			OK	OK	OK	OK	
7	ORUGA Y SISTEMA DE RODAMIENTO IZQUIERDO			OK	OK	OK	OK	
8	FILTRO DE AIRE EXTERNO O COLECTOR			OK	OK	OK	OK	
9	ORUGA Y SISTEMA DE RODAMIENTO DERECHO			OK	OK	OK	OK	
10	LICUADORA			OK	OK	OK	OK	
11	ESCALONES, ESTRIBOS, PASAMANOS Y AGARRADERAS			OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN COMPUERTAS LATERALES							
12	FILTROS DE AIRE			OK	OK	OK	OK	
13	NIVEL DE AGUA LIMPIAPARABRISAS			OK	OK	OK	OK	
14	NIVEL LÍQUIDO REFRIGERANTE			OK	OK	OK	OK	
15	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES			OK	OK	OK	OK	
16	BOMBAS HIDRAULICAS			OK	OK	OK	OK	
17	SEPARADOR DE COMBUSTIBLE			OK	OK	OK	OK	
18	NIVEL, TANQUE Y FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO			OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN MOTOR COMPUERTA SUPERIOR							
19	NIVEL ACEITE DEL MOTOR			OK	OK	OK	OK	
20	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES			OK	OK	OK	OK	
21	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y LINEA DE COMBUSTIBLE			OK	OK	OK	OK	
22	BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE			OK	OK	OK	OK	
23	CORREAS, POLEAS, ALTERNADOR Y VENTILADOR			OK	OK	OK	OK	
24	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES MOTOR			OK	OK	OK	OK	
25	CABLES Y CONEXIONES ELECTRICAS MOTOR			OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN ZONA DE LA TORNAMESA O TORRETA							
26	ACEITE DEL MOTOR(ES) DE GIRO			OK	OK	OK	OK	
27	BANCO DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN			OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN ACCESORIO(S)							
28	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES			OK	OK	OK	OK	
29	INSPECCION SOPORTE Y ESTADO GENERAL ACCESORIO			OK	OK	OK	OK	
30	INSPECCIÓN HERRAMIENTAL			OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN EN LA CABINA							
31	PUERTA (CHAPAS Y APERTURA)			OK	OK	OK	OK	
32	ASIENTO			OK	OK	OK	OK	
33	CINTURON DE SEGURIDAD			OK	OK	OK	OK	
34	VENTANAS			OK	OK	OK	OK	
35	INDICADORES, DISPLAYS, ALARMAS			OK	OK	OK	OK	
36	LIMPIAPARABRISAS Y PLUMILLA			OK	OK	OK	OK	
37	PITO			OK	OK	OK	OK	
38	AIRE ACONDICIONADO A/C			OK	OK	OK	OK	
39	LUZ AUXILIAR INTERIOR			OK	OK	OK	OK	
40	EXTINTOR			OK	OK	OK	OK	
41	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			OK	OK	OK	OK	

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES INSPECCIÓN: SI NO EXISTE LA CONVENCIÓN ESCRIBIR "OTRO" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

OK: TODO ESTA EN ORDEN	FS: FISURA O GRIETA	FO: BOMBEO O FUNDIDO	BA: BUENO/AS, DAÑO O HERRAMIENTA	DE: DESCARGADO
FU: FUGA	DÑ: DAÑO O RUPTURA	TP: TAPONAMIENTO	CB: CONEXIONES SUELTAS/ATADAS	VE: VENCIDO
DG: DESGASTE	AB: ABOLLADURA	NB: NIVEL BAJO	MF: MAL FUNCIONAMIENTO	FI: FILTRACIÓN
FA: ELEMENTO FALTANTE	AJ: AJUSTE	AV: AVISO	CC: CORTO CIRCUITO	NA: NO APLICA

Powered by CamScanner

FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN
EXCAVADORA

EQUIPO INTERNO: EXCAVADORA 9 VENGUA PROYECTO: CENTRO P.Y C.V.S. FECHA: 06/09/2024

OPERADOR: Alexander Velasquez

		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
				11/09/24	12/09/24	13/09/24	14/09/24	15/09/24
	INSPECCIÓN EXTERNA							
Nº	ÍTEM DE INSPECCIÓN	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO
1	ESTADO DE LA MÁQUINA			OK	OK	OK	OK	
2	SALPICADERO			OK	OK	OK	OK	
3	ESTADO DE SALPICADERO			OK	OK	OK	OK	
4	CAPOTS, MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES BRAZO Y BALDE			OK	OK	OK	OK	
5	LUCES Y REFLECTORES FRONTALES			OK	OK	OK	OK	
6	ESPEJOS			OK	OK	OK	OK	
7	BRAZO Y SISTEMA DE ROTAMIENTO IZQUIERDO			OK	OK	OK	OK	
8	FILTRO DE AIRE EXTERNO O COLECTOR			OK	OK	OK	OK	
9	BRAZO Y SISTEMA DE ROTAMIENTO DERECHO			OK	OK	OK	OK	
10	LICUADORA			OK	OK	OK	OK	
11	ESCALONES, ESTRIBOS, PASAMANOS Y AGARRADERAS			OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN COMPUERTAS LATERALES							
12	FILTROS DE AIRE			OK	OK	OK	OK	
13	NIVEL DE AGUA LIMPIAPARABRISAS			OK	OK	OK	OK	
14	NIVEL LÍQUIDO REFRIGERANTE			OK	OK	OK	OK	
15	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES			OK	OK	OK	OK	
16	BOMBAS HIDRAULICAS			OK	OK	OK	OK	
17	SEPARADOR DE COMBUSTIBLE			OK	OK	OK	OK	
18	NIVEL, TANQUE Y FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO			OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN MOTOR COMPUERTA SUPERIOR							
19	NIVEL ACEITE DEL MOTOR			OK	OK	OK	OK	
20	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES			OK	OK	OK	OK	
21	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y LÍNEA DE COMBUSTIBLE			OK	OK	OK	OK	
22	BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE			OK	OK	OK	OK	
23	CORREAS, POLEAS, ALTERNADOR Y VENTILADOR			OK	OK	OK	OK	
24	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES MOTOR			OK	OK	OK	OK	
25	CABLES Y CONEXIONES ELECTRICAS MOTOR			OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN ZONA DE LA TORNAMESA O TORNETA							
26	ACEITE DEL MOTOR(ES) DE GIRO			OK	OK	OK	OK	
27	BANCO DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN			OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN ACCESORIO(S)							
28	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES			OK	OK	OK	OK	
29	INSPECCIÓN SOPORTE Y ESTADO GENERAL ACCESORIO			OK	OK	OK	OK	
30	INSPECCIÓN HERRAMENTAL			OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN EN LA CABINA							
31	PUERTA (CHAPAS Y APERTURA)			OK	OK	OK	OK	
32	ASIENTO			OK	OK	OK	OK	
33	CINTURÓN DE SEGURIDAD			OK	OK	OK	OK	
34	VENTANAS			OK	OK	OK	OK	
35	INDICADORES, DISPLAYS, ALARMAS			OK	OK	OK	OK	
36	LIMPIAPARABRISAS Y PLUMILLA			OK	OK	OK	OK	
37	BOCINA			OK	OK	OK	OK	
38	AIRE ACONDICIONADO/CALEFACCIÓN			OK	OK	OK	OK	
39	LUZ INTERIOR			OK	OK	OK	OK	
40	EXTINTOR			OK	OK	OK	OK	
41	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			OK	OK	OK	OK	

OBSERVACIONES

CONVENCIONES INSPECCIÓN SI NO EXISTE LA CONVENCIÓN ESCRIBIR "OTRO" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

OK: TODO ESTA EN ORDEN
FU: FUGA
DG: DESGASTE
FA: ELEMENTO FALTANTE
FR: FISURA O GRIETA
RA: RAYÓN O ROPTURA
AB: ABOLLADURA
AJ: AJUSTE
FC: FUNCIONAMIENTO
TP: TAPONAMIENTO
NB: NIVEL BAJO
AN: ANCLAJE
CE: CONEXIONES SUELTAS
NF: NO FUNCIONAMIENTO
CC: CORTO CIRCUITO
VE: VENCIDO
FI: FILTRACIÓN
NA: NO APLICA

Powered by CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN **EXCAVADORA**	

	CONDICIONES DE OPERACIÓN								
#	**PARÁMETRO**	**UNIDAD**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**
1	HORAS	HORAS			17171	17571	17671	17771	
2	TEMPERATURA DEL MOTOR EN OPERACIÓN	°C 8 1 / 10			OK	OK	OK	OK	
3	TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO EN OP	°C 8 1 / 10			OK	OK	OK	OK	
4	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERACIÓN MÍNIMA	700 - 800 RPM			OK	OK	OK	OK	
5	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERACIÓN MÁXIMA	900 - 1100 RPM			OK	OK	OK	OK	
6	RPM MÁXIMO DEL MOTOR EN OPERACIÓN	2000 RPM			OK	OK	OK	OK	
7	VOLTAJE BATERÍA	27 - 29 VOLT			OK	OK	OK	OK	
8	PRESIÓN BOMBA FRONTAL EN RALENTÍ	29 - 31 BAR			OK	OK	OK	OK	
9	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA FRONTAL	320 - 330 BAR			OK	OK	OK	OK	
10	PRESIÓN BOMBA TRASERA EN RALENTÍ	29 - 31 BAR			OK	OK	OK	OK	
11	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA TRASERA	320 - 330 BAR			OK	OK	OK	OK	
12	ACCESORIOS UTILIZADOS (CUÁL?)	SI / NO			OK	OK	OK	OK	
13	NIVEL DE CARGA UTILIZADO	SI / NO			OK	OK	OK	OK	
14	OPCIÓN DE MÁXIMA POTENCIA UTILIZADA?	SI / NO			OK	OK	OK	OK	
ALARMAS PRESENTADAS DURANTE LA OPERACIÓN									
ALARMA GENERAL DEL MOTOR (ESPECIFICAR CÓDIGO)									
PRESIÓN DE ACEITE MOTOR BAJA									
NIVEL DE ACEITE MOTOR BAJO									
TEMPERATURA DE ACEITE MOTOR ALTA									
NIVEL DE REFRIGERANTE BAJO									
TEMPERATURA DEL MOTOR ALTA									
FILTRO DE AIRE ADMISIÓN MOTOR SATURADO									
NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO BAJO									
TEMPERATURA DE ACEITE HIDRÁULICO ALTA									
FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO SATURADO									
NIVEL DE COMBUSTIBLE BAJO									
VOLTAJE DE LA BATERÍA BAJO									
CAUSAS DE PARADAS NO PROGRAMADAS									
1		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
2		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
3		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
4		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
REPOSICIONES Y CALIBRACIONES									
PARAMETRO		**UNIDAD**							
REPOSICIÓN DE ACEITE MOTOR		GALONES							
REPOSICIÓN DE REFRIGERANTE		GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO		GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE TRANSMISIÓN O TORNETA		GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE TRANSMISIÓN		GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE MANDOS FINALES		GALONES							
CAMBIO DE PUNTA MARTILLO HIDRÁULICO		CANTIDAD							
FIRMA									
FIRMA OPERARIO									
V°B° INGENIERO RESIDENTE									

OBSERVACIONES

CONVENCIONES PARADAS NO PROGRAMADAS: SI NO EXISTE LA CONVENCIÓN ESCRIBIR "OTRO" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

FC: FALTA DE COMBUSTIBLE	AM: AVERÍA MOTOR	RM: ROTURA MANGUERA HIDRÁULICA	MO: MOTORES DESCONTROLADOS
FA: FALTA DE ACEITE MOTOR	AB: AVERÍA BOMBA HIDRÁULICA	RR: ROTURA RACOR O ACOPLE	DM: DAÑO EMOTOR
FR: FALTA DE REFRIGERANTE	AH: AVERÍA MOTOR HIDRÁULICO	RC: ROTURA CORREA MOTOR	DT: DAÑO TUNDRA
FH: FALTA DE ACEITE HIDRÁULICO	AT: AVERÍA VÁLVULAS DE VIAS	RM: ROTURA MANGUERA MOTOR	DS: DAÑO SUSPENSIÓN
FP: FALTA DE AGUA PLUMILLAS	AH: AVERÍA MOTOR HIDRÁULICO	OR: DAÑO ORUGA	RL: ROTURA LINEAS

Luis Fernando Guerrero

V°B° DE Operador

1 bar = 100 kPa = 14.5 psi = 1.02 kg/cm²
1 bar = 0.100 N

Powered by CamScanner

FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN
EXCAVADORA

Código: CAP-MT-015
Versión: 01
Fecha: 28/11/2018

OPERADOR INTERNO: Wilmer Day — PROYECTO: ampliación P.Y OBRAS VIALES — Chinagradero

OPERADOR: Fabian Castillo

		DÍA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
		FECHA	10/25/25	11/25/25	12/25/25	13/25/25	14/25/25	15/25/25	16/25/25
	INSPECCIÓN EXTERNA								
Nº	ÍTEM DE INSPECCIÓN		CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO
1	DETALLES EN LA MAQUINA		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	BALDE		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	BRAZO BALDE		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
4	DIENTES, MANIGUETAS, ACOPLES Y RACORES BRAZO Y BALDE		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
5	LUCES Y REFLECTORES FRONTALES		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ESPEJOS		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
7	LIMPIA Y SISTEMA DE ROCIAMIENTO IZQUIERDO		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
8	FILTRO DE AIRE EXTERNO O COLECTOR		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
9	LIMPIA Y SISTEMA DE ROCIAMIENTO DERECHO		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
10	CARROCERIA		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ESCALONES, ESTRIBOS, PASAMANOS Y AGARRADERAS		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN COMPUERTAS LATERALES								
12	FILTROS DE AIRE		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
13	NIVEL DE AGUA LIMPIAPARABRISAS		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
14	NIVEL LÍQUIDO REFRIGERANTE		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
15	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
16	BOMBAS HIDRÁULICAS		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
17	SEPARADOR DE COMBUSTIBLE		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
18	NIVEL, TANQUE Y FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN MOTOR COMPUERTA SUPERIOR								
19	NIVEL ACEITE DEL MOTOR		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
20	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
21	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y LÍNEA DE COMBUSTIBLE		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
22	BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
23	CORREAS, POLEAS, ALTERNADOR Y VENTILADOR		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
24	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES MOTOR		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
25	CABLES Y CONEXIONES ELECTRICAS MOTOR		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN ZONA DE LA TORNAMESA O TORRETA								
26	ACEITE DEL MOTOR(ES) DE GIRO		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
27	BANCO DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN ACCESORIO(S)								
28	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
29	INSPECCION SOPORTE Y ESTADO GENERAL ACCESORIO		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
30	INSPECCIÓN HERRAMIENTAL		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	INSPECCIÓN EN LA CABINA								
31	PUERTA (CHAPAS Y APERTURAS)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
32	ASIENTO		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
33	CINTURON DE SEGURIDAD		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
34	VENTANAS		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
35	INDICADORES, DISPLAYS, ALARMAS		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
36	LIMPIAPARABRISAS Y PLUMILLA		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
37	PITO		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
38	AIRE ACONDICIONADO A/C		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
39	LUZ AUXILIAR INTERIOR		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
40	EXTINTOR		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
41	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		OK	OK	OK	OK	OK	OK	

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES INSPECCIÓN: SI NO ES EXACTO LA CONVENCIÓN ESCRIBIR TOTALMENTE Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

CM: CUMPLE CON LA NORMA	FD: FISURA DE UNA TA	FB: BOMBA LUBRICACIÓN	RG: RUIDOS AL GIRO O HIDRAULICOS	DE: DESALINEADO			
FU: FUGA	DB: DAÑO O ROPTURA	EP: ENTRAMIENTO	CS: CONEXIONES SUELTAS/AIRE	VE: VENCIDO			
DG: DESGASTE	AR: ARRITMIA	NB: NIVEL BAJO	MT: MAL FUNCIONAMIENTO	FI: FILTRACIÓN			
FA: ELEMENTO FALTANTE	AJ: AJUSTE	AS: ASEO	CC: CUMPLE CONCEPTO	NA: NO APLICA			

Powered by CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN EXCAVADORA	

	CONDICIONES DE OPERACIÓN									
Nº	PARÁMETRO	UNIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
1	HORÓMETRO	HORAS	10.07	11.07	12.07	13.07	14.07	15.07		
2	TEMPERATURA DEL MOTOR EN OPERACIÓN	°C ± 2 / 3	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
3	TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO EN OP.	°C ± 2 / 3	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
4	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERADOR MÍNIMO	700 - 900 RPM	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
5	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERADOR MÁXIMO	800 - 1100 RPM	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
6	RPM MÁXIMO DEL MOTOR EN OPERACIÓN	2000 RPM	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
7	VOLTAJE BATERÍA	27 - 29 VOLT	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
8	PRESIÓN BOMBA FRONTAL EN RALENTÍ	30 - 50 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
9	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA FRONTAL	220 - 250 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
10	PRESIÓN BOMBA TRASERA EN RALENTÍ	25 - 35 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
11	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA TRASERA	220 - 250 BAR	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
12	ACCESORIOS UTILIZADOS (CUÁL?)	SI / NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
13	MODO DE ZANJA UTILIZADO?	SI / NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
14	OPCIÓN DE MÁXIMA POTENCIA UTILIZADA?	SI / NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
ALARMAS PRESENTADAS DURANTE LA OPERACIÓN										
ALARMA GENERAL DEL MOTOR ESPECIFICAR CÓDIGO										
PRESIÓN DE ACEITE MOTOR BAJA										
NIVEL DE ACEITE MOTOR BAJO										
TEMPERATURA DE ACEITE MOTOR ALTA										
NIVEL DE REFRIGERANTE BAJO										
TEMPERATURA DEL MOTOR ALTA										
FILTRO DE AIRE ADMISIÓN MOTOR SATURADO										
NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO BAJO										
TEMPERATURA DE ACEITE HIDRÁULICO ALTA										
FILTRO DE ACEITE HORÑÁULICO SATURADO										
NIVEL DE COMBUSTIBLE BAJO										
VOLTAJE DE LA BATERIA BAJO										
CAUSAS DE PARADAS NO PROGRAMADAS										
1		HORA PARADA	HH:MM							
		HORA ARRANQUE	HH:MM							
2		HORA PARADA	HH:MM							
		HORA ARRANQUE	HH:MM							
3		HORA PARADA	HH:MM							
		HORA ARRANQUE	HH:MM							
4		HORA PARADA	HH:MM							
		HORA ARRANQUE	HH:MM							
REPOSICIONES Y CALIBRACIONES										
PARÁMETRO		**UNIDAD**								
REPOSICIÓN DE ACEITE MOTOR		GALONES								
REPOSICIÓN DE REFRIGERANTE		GALONES								
REPOSICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO		GALONES								
REPOSICIÓN DE ACEITE TRANSMISIÓN O TORRETA		GALONES								
REPOSICIÓN DE ACEITE TRANSMISIÓN		GALONES								
REPOSICIÓN DE ACEITE MANDOS FINALES		GALONES								
CAMBIO DE PUNTA MARTILLO HIDRÁULICO		CANTIDAD								
FIRMAS										
Firma Operador(a)										
V°B° INGENIERO RESIDENTE										

OBSERVACIONES

CUANDO SURJAN PARADAS NO PROGRAMADAS SE DEBE USAR LA CODIFICACIÓN INDICADA "CÓDIGO" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

FC: FALTA DE COMBUSTIBLE	AM: AVERÍA MOTOR	RM: RUPTURA MANGUERA HIDRÁULICA	BM: BATERÍA DESCARGADA
FA: FALTA DE ACEITE MOTOR	AB: AVERÍA BOMBA HIDRÁULICA	RA: RUPTURA RACOR O ACOPLE	DM: DAÑO MOTOR
FR: FALTA DE REFRIGERANTE	AH: AVERÍA MOTOR HIDRÁULICO	RC: RUPTURA CORONA MOTOR	DF: DAÑO FUNDIDO
FH: FALTA DE ACEITE HIDRÁULICO	AV: AVERÍA VÁLVULAS DE VIAS	RM: RUPTURA MANGUERA MOTOR	DM: DAÑO MAQUINARIA
FP: FALTA DE AGUA PLUMILLAS	AH: AVERÍA GATO HIDRÁULICO	DR: DAÑO ORUGA	RL: RUPTURA CABLE

Luis Fernando Guerrero.

V°B° Dir. Operativo

1 BAR = 100 kPa = 14.5 psi = 1.02 kg/cm2

1 bar = 0.750 ft

FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN
EXCAVADORA

OPERADOR INTERNO: Hyundai PROYECTO: Andrews Pyro FRENTE: Obregón drop

OPERADOR: Fabian Castillo DÍA / FECHA: 17/09/25 | 18/09/25 | 19/09/25 | 20/09/25 | 21/09/25 | 22/09/25 | 23/09/25

Nº	QUÉ INSPECCIONAR	LUNES CONCEPTO	MARTES CONCEPTO	MIERCOLES CONCEPTO	JUEVES CONCEPTO	VIERNES CONCEPTO	SABADO CONCEPTO	DOMINGO CONCEPTO
	INSPECCIÓN EN TIERRA							
1	PERNO EN LA MINERIA	OK	OK	OK	OK			
2	BALDE	OK	OK	OK	OK			
3	BRAZO BALDE	OK	OK	OK	OK			
4	CILINDRO, MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES BRAZO Y BALDE	OK	OK	OK	OK			
5	LUCES Y REFLECTORES FRONTALES	OK	OK	OK	OK			
6	CEPO 670	OK	OK	OK	OK			
7	CABINA Y SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (CALENTADOR)	OK	OK	OK	OK			
8	FILTRO DE AIRE EXTERNO O COLECTOR	OK	OK	OK	OK			
9	CABINA Y SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (REFRIGERANTE)	OK	OK	OK	OK			
10	EXTINTORA	OK	OK	OK	OK			
11	ESCALONES, ESTRIBOS, PASAMANOS Y AGARRADERAS	OK	OK	OK	OK			
	INSPECCIÓN COMPUERTAS LATERALES							
12	FILTROS DE AIRE	OK	OK	OK	OK			
13	NIVEL DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	OK	OK	OK	OK			
14	NIVEL LIQUIDO REFRIGERANTE	OK	OK	OK	OK			
15	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES	OK	OK	OK	OK			
16	BOMBAS HIDRAULICAS	OK	OK	OK	OK			
17	SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	OK	OK	OK	OK			
18	NIVEL, TANQUE Y FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	OK	OK	OK	OK			
	INSPECCIÓN MOTOR COMPUERTA SUPERIOR							
19	NIVEL ACEITE DEL MOTOR	OK	OK	OK	OK			
20	RADIADORES, ENFRIADORES Y CONDENSADORES	OK	OK	OK	OK			
21	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y LÍNEA DE COMBUSTIBLE	OK	OK	OK	OK			
22	BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	OK	OK	OK	OK			
23	CORREAS, POLEAS, ALTERNADOR Y VENTILADOR	OK	OK	OK	OK			
24	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES MOTOR	OK	OK	OK	OK			
25	CABLES Y CONEXIONES ELECTRICAS MOTOR	OK	OK	OK	OK			
	INSPECCIÓN ZONA DE LA TORNAMESA O TORRETA							
26	ACEITE DEL MOTOR REDUCTOR GIRO	OK	OK	OK	OK			
27	BANCO DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN	OK	OK	OK	OK			
	INSPECCIÓN ACCESORIOS(S)							
28	MANGUERAS, ACOPLES Y RACORES	OK	OK	OK	OK			
29	INSPECCION SOPORTE Y ESTADO GENERAL ACCESORIO	OK	OK	OK	OK			
30	INSPECCION HERRAMIENTAS	OK	OK	OK	OK			
	INSPECCIÓN EN LA CABINA							
31	PUERTA (CHAPAS Y APERTURA)	OK	OK	OK	OK			
32	ASIENTO	OK	OK	OK	OK			
33	CINTURON DE SEGURIDAD	OK	OK	OK	OK			
34	VENTANAS	OK	OK	OK	OK			
35	INDICADORES, DISPLAYS, ALARMAS	OK	OK	OK	OK			
36	LIMPIAPARABRISAS Y PLUMILLA	OK	OK	OK	OK			
37	ESTO	OK	OK	OK	OK			
38	AIRE ACONDICIONADO/CALOR	OK	OK	OK	OK			
39	LUZ ALUMBRADO INTERIOR	OK	OK	OK	OK			
40	EXTINTOR	OK	OK	OK	OK			
41	MANUAL DE OPERACIÓN PERMITE AMBIENTE	OK	OK	OK	OK			

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS INSPECCIÓN: SI NO EXISTE LA CONDICIÓN DESCRIBIR "EXISTE" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

OK: TODO ESTA EN ORDEN
FU: FUGA
DA: DESGASTE
FA: ELEMENTO EN FALTANTE
FR: FISURA O GRIETA
RA: RAYADO
DE: DAÑO O ROPTURA
AB: ABOLLADURA
FP: FALLA O FUNCIONAMIENTO
BA: BAJO
RB: ROTO O FUNDIDO
NB: NIVEL BAJO
CA: CONEXIONES FLOJAS
CC: CUMPLE CON LO ESPERADO
NA: NO APLICA
DE: DESCARGADO
VE: VENCIDO
FI: FILTRACIÓN

Powered by CamScanner

FORMATO DE INSPECCIÓN Y OPERACIÓN
EXCAVADORA

Nº	PARÁMETRO	UNIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	HORÓMETRO	HORAS	7107.8	7109.7	7111.9	7113.7			
2	TEMPERATURA DEL MOTOR EN OPERACIÓN	°C 8.1 / 15	OK	OK	OK	OK			
3	TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO EN OP	°C 8.1 / 15	OK	OK	OK	OK			
4	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERADOR MÍNIMO	700 - 800 RPM	OK	OK	OK	OK			
5	RPM MOTOR EN RALENTÍ ACELERADOR MÁXIMO	800 - 1100 RPM	OK	OK	OK	OK			
6	RPM MÁXIMAS DEL MOTOR EN OPERACIÓN	2000 RPM	OK	OK	OK	OK			
7	VOLTAJE BATERÍA	27 - 29 VOLT	OK	OK	OK	OK			
8	PRESIÓN BOMBA FRONTAL EN RALENTÍ	29 - 31 BAR	OK	OK	OK	OK			
9	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA FRONTAL	320 - 330 BAR	OK	OK	OK	OK			
10	PRESIÓN BOMBA TRASERA EN RALENTÍ	29 - 31 BAR	OK	OK	OK	OK			
11	PRESIÓN MÁXIMA BOMBA TRASERA	320 - 330 BAR	OK	OK	OK	OK			
12	ACCESORIOS UTILIZADOS (CUÁL?)	SI / NO	OK	OK	OK	OK			
13	MODO DE FALLA UTILIZADO?	SI / NO	OK	OK	OK	OK			
14	OPCIÓN DE MÁXIMA POTENCIA UTILIZADA?	SI / NO	OK	OK	OK	OK			

ALARMAS PRESENTADAS DURANTE LA OPERACIÓN

ALARMA GENERAL DEL MOTOR ESPECIFICAR CÓDIGO							
PRESIÓN DE ACEITE MOTOR BAJA							
NIVEL DE ACEITE MOTOR BAJO							
TEMPERATURA DE ACEITE MOTOR ALTA							
NIVEL DE REFRIGERANTE BAJO							
TEMPERATURA DEL MOTOR ALTA							
FILTRO DE AIRE ADMISIÓN MOTOR SATURADO							
NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO BAJO							
TEMPERATURA DE ACEITE HIDRÁULICO ALTA							
FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO SATURADO							
NIVEL DE COMBUSTIBLE BAJO							
VOLTAJE DE LA BATERÍA BAJO							

CAUSAS DE PARADAS NO PROGRAMADAS

1		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
2		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
3		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						
4		HORA PARADA	HH:MM						
		HORA ARRANQUE	HH:MM						

REPOSICIONES Y CALIBRACIONES

PARÁMETRO	UNIDAD							
REPOSICIÓN DE ACEITE MOTOR	GALONES							
REPOSICIÓN DE REFRIGERANTE	GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO	GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE TORNAMESA O TORRETA	GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE TRANSMISIÓN	GALONES							
REPOSICIÓN DE ACEITE MANDOS FINALES	GALONES							
CAMBIO DE PUNTA MARTILLO HIDRÁULICO	CANTIDAD							

FIRMAS

FIRMA OPERARIO							
FIRMA SUPERVISOR RESPONSABLE							

OBSERVACIONES

CONVENCIONES PARADAS NO PROGRAMADAS SI NO EXISTE LA CONVENCIÓN ESCRIBIR "OTRO" Y ESPECIFICAR EN LAS OBSERVACIONES

FC. FALTA DE COMBUSTIBLE	AM. AVERÍA MOTOR	RM. RUPTURA MANGUERA HIDRÁULICA	MA. MANTENIMIENTO
FA. FALTA DE ACEITE MOTOR	AB. AVERÍA BOMBA HIDRÁULICA	RB. RUPTURA RACOR O ACOPLE	MA. CAMBIO HERRAMIENTA
FR. FALTA DE REFRIGERANTE	AH. AVERÍA MOTOR HIDRÁULICO	RC. RUPTURA CORREA MOTOR	MH. CAMBIO PLUMILLA
FH. FALTA DE ACEITE HIDRÁULICO	AV. AVERÍA VÁLVULA DE VIAS	RM. RUPTURA MANGUERA MOTOR	DA. CAMBIO RODAMIENTOS
FP. FALTA DE ACEITE PLANETARIO	AG. AVERÍA GATO HIDRÁULICO	CR. CAMBIO ORUGA	RC. RUPTURA CABLE

Juis Fernando Guerrero

V° Bo Del Operador

1 BAR = 100 KPa = 14.5 psi = 1.02 Kg/cm2

1 Hora = 3.784 lt

Powered by CamScanner

	FORMATO INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	Código: FO-4 Versión: 1 Fecha: 30-12-2024
CONTRATO NO.	060-2024	Fecha de ultima revisión: 16-02-2024
Fecha de Elaboración:	16-02-2024	Observaciones: N/A
Quien Elaboró:	Profesional SST	
Lugar:	Consorcio Punto Yarey CUS	

Nº	NOMBRE COMÚN	USO	COMPONENTES QUÍMICOS	ESTADO	HOJA DE SEGURIDAD		CLASE / DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO	RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO- Incompatibilidades	EPP RECOMENDADOS PARA SU USO	RIESGOS PARA LA SALUD
					SI	NO				
	ACPM	Maquina	Cloruro de Polialomino	Solido	X		Irritacion, toxicidad Por ingestion o inhalacion	El ACPM no se debe almacenado en ningun recipiente cuando luego se dispone en la maquina	Guantes, Gafas, mascara, ropa de trabajo	Problemas respiratorios Irritacion ocular

Powered by CamScanner

Código: FO-2 Versión:01 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1	**INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN**	

CONTRATO No	060-2024	OBJETO	Recuperacion ambiental
Nombre:	Nayid Coronado	Area donde realizara la labor:	Consorcio Punta Yuruai CUS
Cargo:	Vigilante	Fecha de Inducción:	07-02-2025

N°	Temas a Tratar	SI	NO	N/A
	GENERALIDADES DE LA EMPRESA			
1	Aspectos generales de la empresa	Y		
2	Divulgacion de la politica de del Plan Integral en Gestión de Obras- PGIO	Y		
3	Proceso al que pertenecen.	X		
	CONDICIONES DE TRABAJO			
4	Reglamento interno de trabajo	X		
5	Informacion del sistema de seguridad social.	X		
6	Funciones del cargo	Y		
7	Documentacion utilizada (Procedimientos, planes , programas , etc aplicables al cargo)	Y		
	SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE			
8	COPASST (Funciones y responsabilidades)	Y		
9	Divulgacion de Política de Seguridad y salud en el trabajo,Politica de prevencion de consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo,reglamento de higiene y seguridad Industrial.	Y		
10	Plan de emergencias(identificación de equipos contra incendio, punto de reunión en caso de emergencia, kit de emergencia, rutas de evacuación.)	X		
11	Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles	Y		
12	Preparación para emergencias (Cuando aplique).	X		
13	Responsabilidades generales en SG-ST	X		
14	Procedimientos seguros para el desarrollo de la tareas	Y		
15	Derechos y deberes en el sistema general de riesgos laborales	X		
16	Elementos de protección personal utilizados en la tarea. (Basicos y especificos).	X		
17	Procedimiento en caso de Accidente de Trabajo.	X		
18	Funciones del Comité Investigador y comité de convivencia laboral	Y		

OBSERVACIONES:

Nombre del trabajador	Nayid Coronado	Firma	Nayid Coro.
Nombre del Responsable de inducción	Luis Fernando Guevara	Firma	Luis Guevara

Powered by CamScanner

Código: FO-2 Versión:01 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1	**INDUCCIÒN Y REINDUCCIÓN**	

CONTRATO No	060-2024	**OBJETO**	Recuperacion awberta
Nombre:	Roger Atencia	**Area donde realizara la labor:**	Consorcio Ruta yuma CUS
Cargo:	Ingeniero Aux	**Fecha de Inducción:**	07-02-2025

N°	Temas a Tratar	SI	NO	N/A
	GENERALIDADES DE LA EMPRESA			
1	Aspectos generales de la empresa	X		
2	Divulgacion de la politica de del Plan Integral en Gestión de Obras- PGIO	X		
3	Proceso al que pertenecen.	X		
	CONDICIONES DE TRABAJO			
4	Reglamento interno de trabajo	X		
5	Informacion del sistema de seguridad social.	X		
6	Funciones del cargo	X		
7	Documentacion utilizada (Procedimientos, planes , programas , etc aplicables al cargo)	X		
	SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE			
8	COPASST (Funciones y responsabilidades)	X		
9	Divulgacion de Politica de Seguridad y salud en el trabajo,Politica de prevencion de consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo,reglamento de higiene y seguridad Industrial.	X		
10	Plan de emergencias(identificación de equipos contra incendio, punto de reunión en caso de emergencia, kit de emergencia, rutas de evacuación.)	X		
11	Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles	X		
12	Preparación para emergencias (Cuando aplique).	X		
13	Responsabilidades generales en SG-ST	X		
14	Procedimientos seguros para el desarrollo de la tareas	X		
15	Derechos y deberes en el sistema general de riesgos laborales	X		
16	Elementos de protección personal utilizados en la tarea. (Basicos y especificos).	X		
17	Procedimiento en caso de Accidente de Trabajo.	X		
18	Funciones del Comité Investigador y comité de convivencia laboral	X		

OBSERVACIONES:

Nombre del trabajador	Roger Atencia	**Firma**	Roger Atencia
Nombre del Responsable de inducción	Luis Fernando Guerrero	**Firma**	Luis Guerrero

Powered by CamScanner

Código: FO-2 Versión:01 Fecha:30-12-2024 Página 1 de 1	INDUCCIÒN Y REINDUCCIÒN	

CONTRATO No	060-2024	OBJETO	Recuperacion Ambiental
Nombre: Jaider Ortega		Area donde realizara la labor: Consorcio Puerto Yopal COS	
Cargo: Oficios Varios		Fecha de Inducción: 07-07-2025	

N°	Temas a Tratar	SI	NO	N/A
	GENERALIDADES DE LA EMPRESA			
1	Aspectos generales de la empresa	Y		
2	Divulgacion de la politica de del Plan Integral en Gestión de Obras- PGIO	Y		
3	Proceso al que pertenecen.	Y		
	CONDICIONES DE TRABAJO			
4	Reglamento interno de trabajo	Y		
5	Informacion del sistema de seguridad social.	Y		
6	Funciones del cargo	Y		
7	Documentacion utilizada (Procedimientos, planes , programas , etc aplicables al cargo)	Y		
	SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE			
8	COPASST (Funciones y responsabilidades)	Y		
9	Divulgacion de Politica de Seguridad y salud en el trabajo,Politica de prevencion de consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo,reglamento de higiene y seguridad Industrial.	Y		
10	Plan de emergencias(identificación de equipos contra incendio, punto de reunión en caso de emergencia, kit de emergencia, rutas de evacuación.)	Y		
11	Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles	Y		
12	Preparación para emergencias (Cuando aplique).	Y		
13	Responsabilidades generales en SG-ST	Y		
14	Procedimientos seguros para el desarrollo de la tareas	X		
15	Derechos y deberes en el sistema general de riesgos laborales	X		
16	Elementos de protección personal utilizados en la tarea. (Basicos y especificos).	X		
17	Procedimiento en caso de Accidente de Trabajo.	X		
18	Funciones del Comité Investigador y comité de convivencia laboral	X		

OBSERVACIONES:

Nombre del trabajador	Jaider ortega	Firma	Jaider ortega
Nombre del Responsable de inducción	Luis Fernando Guevara	Firma	Luis Guevara

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: CBU-SST-F-027
		Versión: 001
	PROCESO HSEQ	Fecha: 30/12/2024

FECHA	07-02-2025	LUGAR/PROYECTO	Campo Punta Yarot CVS

Nombres y Apellidos	Cargo	Camisa	Pantalon	Casco de Seguridad	Gafas de seguridad	Botas punta acero	Botas de invierno	Dotacion de invierno	Guantes tipo ingeniero	Guantes Nitrilo	barboquejo de 3 puntos	Protección auditiva	Protección respiratoria	Otro
Fabian Castillo	Operador	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	B	B	
Daniel Bolivar Q7	Operador	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	B	B	
Manuel Camargo	Operador	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	B	B	
Alexander velosq-01	Operador	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	B	B	

Calificación	B = Buen estado	R = Regular estado (Proximo para cambio)	M = Mal estado (Cambio Inmediato)	X = No tiene	NA = No aplica

Responsable de la inspeccion	Luis Fernando Guerrero	Cargo	Profesional SST	Firma	Luis Guerrero
Responsable del cambio		Cargo		Firma	

Powered by CamScanner

	INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código :FO-5 Versión:1 Fecha:05-12-2024 Página 1 de 5

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA INSPECCIÓN: 20-02-2023 | **CRITERIOS DE CALIFICACIÓN** | B: BUENO R: REGULAR M: MALO N.A: NO APLICA

No.	UBICACIÓN	TIPO	CAPACIDAD	REVISIÓN ESTADO GENERAL														FECHA DE VENCIMIENTO(Fecha prox recarga)	OBSERVACIONES
				CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS		
				PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	Campamento	ABC	10lb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30/10/25	

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIAS	Código: CAP-SST-F-026 Versión: 001 Fecha: 05/12/2024

Fecha de inspección: 10-02-2025

Lugar: Consorcio Ponta Yanet CUS

1. BOTIQUIN

ELEMENTO	PRESENTACIÓN	STOCK	CANTIDAD EXISTENTE (UND)	CANTIDAD FALTANTE (UND)	FECHA DE VENCIMIENTO
MALETIN/CANGURO	Maletín / Cubetín	1	1		11/09/2028
GASAS LIMPIAS	Paquete x 20	1	1		11/09/2028
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Rollo	1	1		11/09/2028
BAJALENGUAS	Paquete x 20	1	1		11/09/2028
GUANTES DE LATEX	Caja X 100	1	1		11/04/2025
VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	Rollo	1	1		11/08/2025
VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	Rollo	1	1		11/08/2025
VENDA ELÁSTICA 4X5 YARDAS	Rollo	1	1		11/08/2025
VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	Rollo	1	1		11/08/2025
VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS	p	1	1		11/08/2025
YODOPOVIDONA SOLUCIÓN	Frasco x 120ml	1	1		11/09/2028
YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	Frasco x 120ml	1	1		11/09/2028
SOLUCION SALINA 250ml	Unidad	2	1		11/08/2028
TERMOMETRO MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1	1		11/09/2028
ALCOHOL ANTISEPTICO X 275ml	Unidad	1	1		11/09/2028

2. EXTINTOR

NUMERO	UBICACIÓN	TIPO DE AGENTE QUIMICO	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA		CONDICIONES DEL EXTINTOR																	
						PRESION		SELLO GARANTIA		MANOMETRO		RECIPIENTE		MANIJA		MANGUERA		PINTURA		SEÑALIZACION/DEMARCACION		FIN DE SEGURIDAD	
				ACTUAL	PROXIMA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	C/O	PQUO		octubre 2025	octubre 2026	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		X	

3. CAMILLA

NUMERO	CONDICIONES DE LA CAMILLA												OBSERVACIONES
	PROTECTOR DE CAMILLA		ARMESURATA		ASEO		UBICACIÓN		SEÑALIZACIÓN		ACCESO		
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Inspección realizada por

Nombre: Luis Fernando Guerrero

Cargo: Profesional SST

Firma: Luis Guerrero

Inspección comunicada a

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Fecha de la próxima inspección: 10-03-2025

BUENA: B MALA: M

Powered by CamScanner

	INSPECCION PARA KIT DE DERRAMES	Código: CAP-SST-063 Versión: 01 Fecha: 30/12/2024

INSPECCIONADO POR: Luis Guerrero.

FECHA DE INSPECCION: 14-02-2025

EQUIPO / PROYECTO: Consacio Puntayanez CVS

	B	M	N.A	OBSERVACIONES
Pala anti chispas	X			
Almádana de caucho	X			
Estacas de madera	X			
Guantes de nitrilo	X			
Bolsas rojas	X			
Tapaboca	X			
Telas oleofilicas			X	
Barreras de contención de derrame	X			
Gafas de seguridad	X			
Masilla epóxica			X	
Absorbente industrial biodegradable			X	
Cinta Peligro	X			
Cuerda	X			
Chaleco reflectivo	X			
Desengrasante industrial	X			
Jabon en barra	X			
Linterna recargable	X			
Cinta pegante industrial	X			
SEGURIDAD PERSONAL				
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	Si			
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo (tapa oidos, gafas de seguridad, guantes, tapabocas, botas de seguridad)	Si			
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	Si			
FIRMA DEL SUPERVISOR	Luis Guerrero			

Powered by CamScanner

	INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FT-S-S Versión: 2 Fecha: 09-12-2024 Página 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	DIA	20	MES	02	AÑO	2025

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

Ubicación del botiquín	campamento	Ubicación de la camilla	campamento

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI	X	NO		Localizado en lugar visible?	SI	X		NO	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	X	NO		El botiquín se encuentra señalizado?	SI	X		NO	
Fecha de recepción de elementos del botiquín	20/02/25				El botiquín es de:	Lona			Metálico	

Bueno	B	-	Regular	R	-	Malo	M

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Bueno	Regular	Malo	No tiene	Cantidad	Fecha vencimiento	Observaciones
1	Estado del botiquín	X				1	N/A	
2	Gasa limpia paquete x 20	X				1	11/09/28	
3	Esparadrapo de tela rollo de 4"					1	11/09/28	
4	Bajalenguas					1	11/09/28	
5	Guantes de látex					1	11/09/25	
6	Venda elástica 2 x 5 yardas					1	11/08/25	
7	Venda elástica 3 x 5 yardas					1	11/08/25	
8	Venda elástica 5 x 5 yardas					1	11/08/25	
9	Venda de algodón 3x5 yardas					1	11/08/25	
10	Yodopovidona (Jabón quirurgico) x120 ml					1	11/09/28	
11	Solución salina 250 cc o 550 cc (2)					1	11/09/28	
12	Termómetro de mercurio o digital					1	N/A	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml					1	11/08/28	
14	Manual uso de botiquín					1	N/A	
15	Collar cervical					1	N/A	
16	Tapabocas					1	N/A	
17	Aplicadores de algodón					1	N/A	
18	Curas					1	N/A	
19	Tijera trauma					1	N/A	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2	Señalización	X				
3	Estado del soporte	X				
4	Correas de seguridad	X				
5	Sujetadores para agarre	X				
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				

Otras observaciones:

Inspeccionó:	
Nombre:	Luis Guerrero
Firma:	LuisGuerrero
Cargo:	profesional SST

Powered by CamScanner

Consorcio Punta Yanet CVS

901395985

Optimización Sección hidráulica del Canal

Sura

		Rosa Maria	M	27-01-93	27	Nombre	Soltero	0	Ing Aux	Profes	3 años	5 M	Directa	Sura						51
		Falcon Castillo	M	23-05-93	31	Antioquia	Unión L	2	Operador	Tec	Ramos	5 M	Indirecta	Sura						51
		David Echeverri	M	06-03-86	36	San Francisco	Unión L	4	operador	Bachiller	3 años	5 M	Indirecta	Sura						51
		Manuel Camargo	M	06-01-82	41	Medellin	Unión L	3	Operador	TEC	3 años	5 M	Indirecta	Sura						51
		Alexander Velasquez	M	01-01-80	40	Montebello	Soltero	1	operador	rec	5 años	5 M	Indirecta	Sura						51
		David Coronado	M	27-05-91	43	Amagá	Unión L	3	operador	Bachiller	3 años	5 M	Directa	Sura						51
		Jaider Ortega	M	16-02-1987	38	Santa Rosa	Unión L	2	Oficios Var	Bachiller	3 años	5 M	Directa	Sura						51

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	Codigo: FO -18 Versión: 1 Fecha: 05-12-2024

NOMBRE Rogel Alencia FECHA 17-02-25 CARGO Ingeniero Auxiliar

Marque con una X

1. EDAD
a. 18 - 27 años
X b. 28 - 37 años
c. 38 - 47 años
d. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
X a. Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X a. Hombre
b. Mujer
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X 1 – 3 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
X d. Universitario
e. Ninguna

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
X c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
X c. Recreación y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
X a. Mínimo Legal (S.M.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.M.L.
c. Entre 4 a 6 S.M.M.L.
d. Más de 7 S.M.M.L.

9. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE
a. Si
a. Exámenes de laboratorio y otros
b. Salud Oral
X c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

10. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
X a. No
Cual: _____

11. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
Frecuencia
a. Si
X b. No

12. PRACTICA ALGUN DEPORTE
X a. Si
b. No

13. FUMA
a. Si Promedio diario: _____
X b. No

14. CUALES DE LAS SIGUIENTES MOLESTIAS HA SENTIDO CON FRECUENCIA EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES

SINTOMA	SI	NO	¿COMO LO HA SENTIDO?
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	Código: FO -18 Versión: 1 Fecha: 30-12-2024	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		X	
Dificultad para oír		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	Codigo: FO -18 Versión: 1 Fecha: 30-12-2024

NOMBRE: Fabian Costillo FECHA 17-02-25 CARGO: operador

Marque con una X:

1. EDAD
a. 18 – 27 años
X b. 28 – 37 años
c. 38 _ 47 años
d. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
X c. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X a. Hombre
b. Mujer
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X c. 1 – 3 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
X c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Ninguna

6. TENENCIA DE VIVIENDA
X a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreación y deporte
d. Estudio
X e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
X a. Mínimo Legal (S.M.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.M.L.
c. Entre 4 a 6 S.M.M.L.
d. Más de 7 S.M.M.L.

9. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE
a. Si
a. Exámenes de laboratorio y otros
b. Salud Oral
X c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

10. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
X a. No
Cual: _____

11. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
Frecuencia
a. Si
X b. No

12. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. Si
X b. No

13. FUMA
a. Si Promedio diario: _____
X b. No

14. CUALES DE LAS SIGUIENTES MOLESTIAS HA SENTIDO CON FRECUENCIA EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES

SINTOMA	SI	NO	¿COMO LO HA SENTIDO?
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, úlcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	Codigo: FO -18 Version: 1 Fecha: 30-12-2024	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oidos		X	
Dificultad para oir		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	Codigo: FO -18 Versión: 1 Fecha: 30-12-2024

NOMBRE: Daniel Bohorquez FECHA 17-02-25 CARGO: operador

Marque con una X:

1. EDAD
a. 18 – 27 años
X 28 – 37 años
c. 38 _ 47 años
d. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
X Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
X Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Ninguna

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreación y deporte
d. Estudio
X Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
X Mínimo Legal (S.M.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.M.L.
c. Entre 4 a 6 S.M.M.L.
d. Más de 7 S.M.M.L.

9. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE
a. Si
a. Exámenes de laboratorio y otros
b. Salud Oral
X Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

10. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
X No
Cual: _____

11. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
Frecuencia
a. Si
X No

12. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. Si
X No

13. FUMA
a. Si
X No
Promedio diario: _____

14. CUALES DE LAS SIGUIENTES MOLESTIAS HA SENTIDO CON FRECUENCIA EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES

SINTOMA	SI	NO	¿COMO LO HA SENTIDO?
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO		Codigo: FO -18 Versión: 1 Fecha: 30-12-2024
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitantes en los oídos		X	
Dificultad para oir		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	Codigo: FO -18 Versión: 1 Fecha: 30-12-2024

NOMBRE: Nanvel Camargo FECHA 17-02-25 CARGO: Operador

Marque con una X:

1. EDAD
a. 18 – 27 años
b. 28 – 37 años
X. 38 _ 47 años
d. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
X. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
a. Hombre
b. Mujer
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X. – 3 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
X. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Ninguna

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
X. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreación y deporte
d. Estudio
X. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.L)
X. Mínimo Legal (S.M.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.M.L.
c. Entre 4 a 6 S.M.M.L.
d. Más de 7 S.M.M.L.

9. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE:
a. Si
a. Exámenes de laboratorio y otros
b. Salud Oral
X. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

10. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
X. No
Cual: _____

11. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
Frecuencia
a. Si
X. No

12. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. Si
X. No

13. FUMA
a. Si Promedio diario: _____
X. No

14. CUALES DE LAS SIGUIENTES MOLESTIAS HA SENTIDO CON FRECUENCIA EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES

SINTOMA	SI	NO	¿COMO LO HA SENTIDO?
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	Codigo: FO -18 Versión: 1 Fecha: 30-12-2024	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		X	
Dificultad para oir		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	Codigo: FO -18 Versión: 1 Fecha: 30-12-2024

NOMBRE: Alexander Velasquez FECHA 17-02-25 CARGO Operador

Marque con una X

1. EDAD
a. 18 – 27 años
b. 28 – 37 años
X c. 38 _ 47 años
d. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
X b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X a. Hombre
b. Mujer
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X b. 1 – 3 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
X c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Ninguna

6. TENENCIA DE VIVIENDA
X a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreación y deporte
d. Estudio
X e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
X a. Mínimo Legal (S.M.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.M.L.
c. Entre 4 a 6 S.M.M.L.
d. Más de 7 S.M.M.L.

9. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE
a. Si
a. Exámenes de laboratorio y otros
b. Salud Oral
X c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

10. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
X No
Cual: _____

11. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
Frecuencia
a. Si
X b. No

12. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. Si
X No

13. FUMA
a. Si Promedio diario: _____
b. No

14. CUALES DE LAS SIGUIENTES MOLESTIAS HA SENTIDO CON FRECUENCIA EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES

SINTOMA	SI	NO	¿COMO LO HA SENTIDO?
Dolor de cabeza			
Dolor de cuello, espalda y cintura			
Dolores musculares			
Dificultad para algún movimiento			
Tos frecuente			
Dificultad respiratoria			
Gastritis, ulcera			
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo			
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)			
Dificultad para concentrarse			

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	Codigo: FO -18 Versión: 1 Fecha: 30-12-2024	
Mal genio			
Nerviosismo			
Cansancio mental			
Palpitaciones			
Dolor en el pecho (angina)			
Cambios visuales			
Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual			
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos			
Dificultad para oir			
Sensación permanente de cansancio			
Alteraciones en la piel			
Otras alteraciones no anotadas			

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	Codigo: FO -18 Versión: 1 Fecha: 30-12-2024

NOMBRE: Nayid Caviado FECHA 17-02-25 CARGO: Operador

Marque con una X

1. EDAD
a. 18 – 27 años
b. 28 – 37 años
X 36 _ 47 años
d. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
X Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
X Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Ninguna

6. TENENCIA DE VIVIENDA
X Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreación y deporte
d. Estudio
X Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
X Mínimo Legal (S.M.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.M.L.
c. Entre 4 a 6 S.M.M.L.
d. Más de 7 S.M.M.L.

9. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE
a. Si
a. Exámenes de laboratorio y otros
b. Salud Oral
X Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

10. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
X No
Cual: _____

11. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
Frecuencia
a. Si
X No

12. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. Si
X No

13. FUMA
a. Si Promedio diario: _____
X No

14. CUALES DE LAS SIGUIENTES MOLESTIAS HA SENTIDO CON FRECUENCIA EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES

SINTOMA	SI	NO	¿COMO LO HA SENTIDO?
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO		Codigo: FO -18 Versión: 1 Fecha: 30-12-2024
Mal genio		Y	
Nerviosismo		7	
Cansancio mental		4	
Palpitaciones		0	
Dolor en el pecho (angina)		0	
Cambios visuales		0	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual		0	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		0	
Dificultad para oir		0	
Sensación permanente de cansancio		4	
Alteraciones en la piel		4	
Otras alteraciones no anotadas		0	

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	Codigo: FO -18 Versión: 1 Fecha: 05-12-2024

NOMBRE: Jaider ortega FECHA 17-02-75 CARGO: Oficios Varios

Marque con una X.

1. EDAD
a. 18 – 27 años
b. 28 – 37 años
X 38 _ 47 años
d. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
X Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X Hombre
b. Mujer
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X 1 – 3 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
X Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Ninguna

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
X Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
X Recreación y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
X Mínimo Legal (S.M.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.M.L.
c. Entre 4 a 6 S.M.M.L.
d. Más de 7 S.M.M.L.

9. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE
a. Si
a. Exámenes de laboratorio y otros
b. Salud Oral
X Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

10. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
X No
Cual: _____

11. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
Frecuencia
a. Si
X No

12. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. Si
X No

13. FUMA
a. Si Promedio diario: _____
b. No

14. CUALES DE LAS SIGUIENTES MOLESTIAS HA SENTIDO CON FRECUENCIA EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES

SINTOMA	SI	NO	¿COMO LO HA SENTIDO?
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		✓	

Powered by CamScanner

	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO		Codigo: FO -18 Versión: 1 Fecha: 30-12-2024
Mal genio		4	
Nerviosismo		4	
Cansancio mental		4	
Palpitaciones		4	
Dolor en el pecho (angina)		4	
Cambios visuales		4	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual		4	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		4	
Dificultad para oir		4	
Sensación permanente de cansancio		4	
Alteraciones en la piel		4	
Otras alteraciones no anotadas		4	

Powered by CamScanner

ANEXO 7: LISTADO DE PERSOANAL

CONTRATO DE OBRA 060-2024 "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

PERSONAL PROFESIONAL INCLUIDO EN LA PROPUESTA

NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	DEDICACIÓN (%)	SALARIO MENSUAL
ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO	52.254.090	**DIRECTOR DE OBRA**	12/30/2024		50.00%	$ 2,150,000.00
JOSE FAWCETT HERNÁNDEZ MIER	1.042.424.437	**RESIDENTE DE OBRA 1**	12/30/2024		100.00%	$ 1,750,000.00
JOSE FRANCISCO FIORILLO SARMIENTO	8.686.400	**RESIDENTE DE OBRA 2**	12/30/2024		100.00%	$ 1,750,001.00
NIKOLLE TATIANA FETECUA GUTIERREZ	1.075.652.455	**PROFESIONAL SOCIAL**	12/30/2024		100.00%	$ 1,750,000.00
MÓNICA ORTEGA MORENO	52.547.455	**ESPECIALISTA AMBIENTAL**	12/30/2024		100.00%	$ 1,750,000.00
GERMÁN MONSALVE SAENZ	10.221.652	**ESPECIALISTA EN HIDRAULICA**	12/30/2024		100.00%	$ 1,750,000.00
LUIS FERNANDO GUERRERO ALARCON	80.539.487	**ESPECIALISTA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL**	12/30/2024		100.00%	$ 1,750,000.00
CLEIDER BERASTEGUI BARRANCO	1.067.940.558	**INGENIERO AUXILIAR 1**	12/30/2024	1/31/2025	100.00%	$ 1,423,500.00

CONTRATO DE OBRA 060-2024 “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA C
PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORRE
DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA

PERSONAL

NOMBRE	N° DE CEDULA
NATALY GONZALES TORRES	1,003,434,150
ALBERT TAMARA NIETO	7,369,165
JULIO CESAR BENAVIDEZ ESPINO	77,165,580
FABIAN ANDRES CASTILLO OSORIO	1,019,082,635
ALEXANDER NICANOR VELAZQUEZ DIAZ	10,966,603
DANIEL EDUARDO BOHORQUEZ HERNANDEZ	1,104,010,316
ARNULFO MANUEL MONTIEL ROMERO	7,369,636

CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS GIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, A DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

L INDIRECTO DE OBRA

CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	DEDICACIÓN (%)
AUX SISO	1/22/2025		100%
CADENERO	1/7/2025		100%
TOPOGRAFO	1/7/2025	2/15/2025	100%
OPERADOR HYUNDAI HX 2205	2/10/2025		100%
OPERADOR XCMG XE210CU	2/10/2025		100%
OPERADOR KOBELCO 211	2/11/2025	2/21/2025	100%
TOPOGRAFO	2/19/2025		100%

ANEXO 8: PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900479957-4	GRUAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA S.A.S		CALLE 41 N 16A-135	3126441435	comercial@gruasytransporte.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PS	PS 02	CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	Y	11/02/2025	84113668	$976.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	225.500	0		0		0	0	0	0	225.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	118.700	0		0		0	0	0	0	118.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.600	0	0	0	0	0	0		288.600	2
231001	Colfondos	800227940-6	151.900	0	0	0	0	0	0		151.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	191.700				191.700	0	0	191.700			1.917	191.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	344.200	344.200
Pensión	2	440.500	440.500
Riesgos Laborales	1	191.700	191.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	976.400	976.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900479957-4	GRUAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA S.A.S		CALLE 41 N 16A-135	3126441435	comercial@gruasytransporte.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PS	PS 02	CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	Y	11/02/2025	84113668	$976.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1066749190	MONTES CACERES XIOMARA DAYANA	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1067849469	MARTINEZ TORRES JAVIER ENRIQUE	59	0			N	X																231001	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	118.700	14-11	949.000	5	66.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	10966603	VELASQUEZ DIAZ ALEXANDER NICANOR	59	0			N	X																230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS002	379.600	47.500	14-11	379.600	5	26.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-14, 10:31:55 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 75837291

Periodo Cotización 202501 **Periodo Servicio** 202502

PAGADA 2025-02-06 13:15:59.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ANTONIO VILLEGAS GONZALEZ				
Documento	CC 71647305	**Dirección**	CR 9 #68 - 70 TORRE 1 APT 102		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7851988		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	10
Ciudad	MONTERIA	**Departamento**	CORDOBA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1104010316		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BOHORQUEZ HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	23001000 - 23		CORDOBA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF16	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFACOR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-14, 10:31:55 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 75837291

Periodo Cotización 202501 **Periodo Servicio** 202502

PAGADA 2025-02-06 13:15:59.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ANTONIO VILLEGAS GONZALEZ				
Documento	CC 71647305	**Dirección**	CR 9 #68 - 70 TORRE 1 APT 102		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7851988		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	10
Ciudad	MONTERIA	**Departamento**	CORDOBA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1104010316		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BOHORQUEZ HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	23001000 - 23		CORDOBA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF16	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFACOR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	consorciopuntayanezcvs@gmail.com	MONTERIA-CORDOBA	3008055838

Clave: 9481315754

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/02/04	13	$2,800	$253,300
2025/02/05	14	$3,000	$253,500
2025/02/06	15	$3,200	$253,700
2025/02/07	16	$3,300	$253,800
2025/02/10	19	$3,700	$254,200
2025/02/11	20	$3,900	$254,400
2025/02/12	21	$3,900	$254,400
2025/02/13	22	$4,100	$254,600
2025/02/14	23	$4,200	$254,700
2025/02/17	26	$5,100	$255,600

Periodo Pensión: 2024-12 **Periodo Salud: 2025-01**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	10	$84,300
COLPENSIONES		3	$26,100
PORVENIR		4	$32,100
PROTECCION		3	$26,100
ARL	1	11	$41,300
ARL SURA		11	$41,300
CCF	1	11	$23,500
COMFACOR		11	$23,500
EPS	6	11	$73,400
COMPENSAR		2	$14,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		3	$21,400
MUTUAL SER		1	$6,100
NUEVA E.P.S.		1	$6,100
SALUD TOTAL		2	$12,100
SANITAS		2	$13,300
ICBF	1	11	$18,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		11	$18,400
SENA	1	11	$12,400
SENA		11	$12,400
SUBTOTAL			$253,300
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$253,300

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Cajas registradoras de los almacenes Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	cl 62a 7-67	MONTERIA-CORDOBA	7895858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01		9481315754	E	2025/01/22			13	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MONTERIA (11 Afiliados)																							**$519,585**	**$83,400**			**$576,252**	**$72,500**			**$576,252**	**$23,300**			**$576,252**		**$40,900**		**$576,252**	**$30,400**		**$250,500**
Centro de Trabajo: CVS (11 Afiliados)																							**$519,585**	**$83,400**			**$576,252**	**$72,500**			**$576,252**	**$23,300**			**$576,252**		**$40,900**		**$576,252**	**$30,400**		**$250,500**
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (11 Afiliados)																							**$519,585**	**$83,400**			**$576,252**	**$72,500**			**$576,252**	**$23,300**			**$576,252**		**$40,900**		**$576,252**	**$30,400**		**$250,500**
1	CC	1062424908	BALLESTEROS SANTIAGO	X																	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$6,000	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
2	CC	1067940558	BERASTEGUI CLEIDER	X																	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$6,000	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
3	CC	52254090	CHAVERRA ROSIBEL	X																	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$6,000	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
4	CC	78036613	CORONADO OSCAR	X																	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$6,000	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
5	CC	1075652455	FETECUA NIKOLLE	X																	230301	1	$55,667	$9,000	EPS010	1	$55,667	$7,000	CCF16	1	$55,667	$2,300	14-11	1	$55,667	6.960%	$3,900	1	$55,667	$2,900	No	$25,100
6	CC	8686400	FIORILLO JOSE	X																		0	$0	$0	EPS010	1	$56,667	$7,100	CCF16	1	$56,667	$2,300	14-11	1	$56,667	6.960%	$4,000	1	$56,667	$3,000	No	$16,400
7	CC	80539487	GUERRERO LUIS	X																	230201	1	$56,667	$9,100	EPS008	1	$56,667	$7,100	CCF16	1	$56,667	$2,300	14-11	1	$56,667	6.960%	$4,000	1	$56,667	$3,000	No	$25,500
8	CC	1042424437	HERNANDEZ JOSE	X																	230201	1	$56,667	$9,100	EPS010	1	$56,667	$7,100	CCF16	1	$56,667	$2,300	14-11	1	$56,667	6.960%	$4,000	1	$56,667	$3,000	No	$25,500
9	CC	10221652	MONSALVE GERMAN	X																	25-14	1	$56,667	$9,100	EPS005	1	$56,667	$7,100	CCF16	1	$56,667	$2,300	14-11	1	$56,667	6.960%	$4,000	1	$56,667	$3,000	No	$25,500
10	CC	52547455	ORTEGA MONICA	X																	25-14	1	$56,667	$9,100	EPS008	1	$56,667	$7,100	CCF16	1	$56,667	$2,300	14-11	1	$56,667	6.960%	$4,000	1	$56,667	$3,000	No	$25,500
11	CC	1007765951	PEREZ GLINDON	X																	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$6,000	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
Total			**Afiliados(11)**																				$519,585	$83,400			$576,252	$72,500			$576,252	$23,300			$576,252		$40,900		$576,252	$30,400		$250,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	cl 62a 7-67	MONTERIA-CORDOBA	7895858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01		9481315754	E	2025/01/22			13	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$83,400	$900	$0	$84,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$25,800	$300	$0	$26,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$31,800	$300	$0	$32,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$25,800	$300	$0	$26,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$40,900	$400	$0	$41,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$40,900	$400	$0	$41,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$23,300	$200	$0	$23,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$23,300	$200	$0	$23,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$72,500	$900	$0	$73,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$14,200	$200	$0	$14,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$21,200	$200	$0	$21,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$6,000	$100	$0	$6,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$6,000	$100	$0	$6,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$12,000	$100	$0	$12,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$13,100	$200	$0	$13,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$18,200	$200	$0	$18,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$18,200	$200	$0	$18,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$12,200	$200	$0	$12,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$12,200	$200	$0	$12,400
TOTAL				**11**	**$250,500**	**$2,800**	**$0**	**$253,300**

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	consorciopuntayanezcvs@gmail.com	MONTERIA-CORDOBA	3008055838

Clave: 9481317663

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/02/19	0	$0	$7,416,100
2025/02/20	0	$0	$7,416,100
2025/02/21	1	$5,700	$7,421,800
2025/02/24	4	$20,300	$7,436,400
2025/02/25	5	$25,100	$7,441,200
2025/02/26	6	$30,100	$7,446,200
2025/02/27	7	$35,200	$7,451,300
2025/02/28	8	$39,800	$7,455,900

Periodo Pensión: 2025-01 **Periodo Salud: 2025-02**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	10	$2,494,200
COLPENSIONES		3	$771,800
PORVENIR		4	$950,600
PROTECCION		3	$771,800
ARL	1	11	$1,203,800
ARL SURA		11	$1,203,800
CCF	1	11	$691,800
COMFACOR		11	$691,800
EPS	6	11	$2,161,300
COMPENSAR		2	$425,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		3	$633,800
MUTUAL SER		1	$178,000
NUEVA E.P.S.		1	$178,000
SALUD TOTAL		2	$356,000
SANITAS		2	$390,500
ICBF	1	11	$519,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		11	$519,100
SENA	1	11	$345,900
SENA		11	$345,900
SUBTOTAL			$7,416,100
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$7,416,100

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Cajas registradoras de los almacenes Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	cl 62a 7-67	MONTERIA-CORDOBA	7895858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02		9481317663	E	2025/02/20			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MONTERIA (11 Afiliados)																								**$15,587,500**	**$2,494,200**			**$17,287,500**	**$2,161,300**			**$17,287,500**	**$691,800**			**$17,287,500**		**$1,203,800**		**$17,287,500**	**$865,000**		**$7,416,100**
Centro de Trabajo: CVS (11 Afiliados)																								**$15,587,500**	**$2,494,200**			**$17,287,500**	**$2,161,300**			**$17,287,500**	**$691,800**			**$17,287,500**		**$1,203,800**		**$17,287,500**	**$865,000**		**$7,416,100**
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (11 Afiliados)																								**$15,587,500**	**$2,494,200**			**$17,287,500**	**$2,161,300**			**$17,287,500**	**$691,800**			**$17,287,500**		**$1,203,800**		**$17,287,500**	**$865,000**		**$7,416,100**
1	CC	1062424908	BALLESTEROS SANTIAGO																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
2	CC	1067940558	BERASTEGUI CLEIDER		X																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
3	CC	52254090	CHAVERRA ROSIBEL		X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
4	CC	78036613	CORONADO OSCAR																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
5	CC	1075652455	FETECUA NIKOLLE																			23030 1	30	$1,670,000	$267,200	EPS010	30	$1,670,000	$208,800	CCF16	30	$1,670,000	$66,800	14-11	30	$1,670,000	6.960%	$116,300	30	$1,670,000	$83,500	No	$742,600
6	CC	8686400	FIORILLO JOSE	X	X																		0	$0	$0	EPS010	30	$1,700,000	$212,500	CCF16	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$1,700,000	$85,000	No	$483,900
7	CC	80539487	GUERRERO LUIS																			23020 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$212,500	CCF16	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$1,700,000	$85,000	No	$755,900
8	CC	1042424437	HERNANDEZ JOSE																			23020 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS010	30	$1,700,000	$212,500	CCF16	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$1,700,000	$85,000	No	$755,900
9	CC	10221652	MONSALVE GERMAN																			25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$212,500	CCF16	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$1,700,000	$85,000	No	$755,900
10	CC	52547455	ORTEGA MONICA																			25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$212,500	CCF16	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$1,700,000	$85,000	No	$755,900
11	CC	1007765951	PEREZ GLINDON																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total			**Afiliados(11)**																					$15,587,500	$2,494,200			$17,287,500	$2,161,300			$17,287,500	$691,800			$17,287,500		$1,203,800		$17,287,500	$865,000		$7,416,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	cl 62a 7-67	MONTERIA-CORDOBA	7895858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02		9481317663	E	2025/02/20			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,494,200	$0	$0	$2,494,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$771,800	$0	$0	$771,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$950,600	$0	$0	$950,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$771,800	$0	$0	$771,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,203,800	$0	$0	$1,203,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,203,800	$0	$0	$1,203,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$691,800	$0	$0	$691,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$691,800	$0	$0	$691,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$2,161,300	$0	$0	$2,161,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$425,000	$0	$0	$425,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$633,800	$0	$0	$633,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$356,000	$0	$0	$356,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$390,500	$0	$0	$390,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$519,100	$0	$0	$519,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$519,100	$0	$0	$519,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$345,900	$0	$0	$345,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$345,900	$0	$0	$345,900
TOTAL				11	$7,416,100	$0	$0	$7,416,100

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
NIT 901.895.986-5
CL 62 A 7 67
Teléfono: (604) 3008055836
Montería - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO No.	CC-34-72
Fecha de elaboración	2025-02-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	616015 - Otros costos	Aportes en Linea S.A.		PLANILLA MES DE DICIEMBRE DE 2024- PROFESIONALES	253,800.00	0.00
2	11050501 - Caja general	Aportes en Linea S.A.		Caja general	0.00	253,800.00
				Total	253,800.00	253,800.00

Observaciones

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Profesionales.

Datos Generales Del Aportante

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad Departamento	Celular
NIT 901895986	1	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	consorciopuntayanezcvs@gmail.com	MONTERIA-CORDOBA	3008055838

Clave: 9481315754

Periodo Pensión: 2024-12 **Periodo Salud:** 2025-01

Pagar Hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/02/04	13	$2,800	$253,300
2025/02/05	14	$3,000	$253,500
2025/02/06	15	$3,200	$253,700
2025/02/07	16	$3,300	$253,800
2025/02/10	19	$3,700	$254,200
2025/02/11	20	$3,900	$254,400
2025/02/12	21	$3,900	$254,400
2025/02/13	22	$4,100	$254,600
2025/02/14	23	$4,200	$254,700
2025/02/17	26	$5,100	$255,600

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	10	$84,300
COLPENSIONES		3	$26,100
PORVENIR		4	$32,100
PROTECCION		3	$26,100
ARL	1	11	$41,300
ARL SURA		11	$41,300
CCF	1	11	$23,500
COMFACOR		11	$23,500
EPS	6	11	$73,400
COMPENSAR		2	$14,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		3	$21,400
MUTUAL SER		1	$6,100
NUEVA E.P.S.		1	$6,100
SALUD TOTAL		2	$12,100
SANITAS		2	$13,300
ICBF	1	11	$18,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		11	$18,400
SENA	1	11	$12,400
SENA		11	$12,400
SUBTOTAL			$253,300
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$253,300

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SUPERMAX

Cajas registradoras de las almacenes
Monto máximo por transacción: $5.000.000

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 CS0000001 ####0637 T15
FT:07/02/25 08:10H.MOD80 Norte de M
202501 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009481315754
Identificacion901895986
VALOR PLANILLA:253,800.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:253,800.00

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
NIT 901.895.986-5
CL 62 A 7 67
Teléfono: (604) 3008055838
Montería - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO No.	**CC-34-73**
Fecha de elaboración	2025-02-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	616015 - Otros costos	Aportes en Línea S.A.		PLANILLA MES DE ENERO DE 2024- PROFESIONALES	7,416,100.00	0.00
2	11050501 - Caja general	Aportes en Línea S.A.		Caja general	0.00	7,416,100.00
				Total	7,416,100.00	7,416,100.00

Observaciones

aportes en línea

Comprobante Liquidacion

Profesionales.

Datos Generales Del Aportante

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad Departamento	Celular
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	consorciopuntayanezcvs@gmail.com	MONTERIA-CORDOBA	3008055838

Clave: 9481317663

Pagar hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/02/19	0	$0	$7,416,100
2025/02/20	0	$0	$7,416,100
2025/02/21	1	$5,700	$7,421,800
2025/02/24	4	$20,300	$7,436,400
2025/02/25	5	$25,100	$7,441,200
2025/02/26	6	$30,100	$7,446,200
2025/02/27	7	$35,200	$7,451,300
2025/02/28	8	$39,800	$7,455,900

Periodo Pensión: 2025-01 **Periodo Salud: 2025-02**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	10	$2,494,200
COLPENSIONES		3	$771,800
PORVENIR		4	$950,600
PROTECCION		3	$771,800
ARL	1	11	$1,303,800
ARL SURA		11	$1,303,800
CCF	1	11	$691,800
COMFACOR		11	$691,800
EPS	8	11	$2,161,300
COMPENSAR		2	$425,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		3	$633,800
MUTUAL SER		1	$178,000
NUEVA E.P.S.		1	$178,000
SALUD TOTAL		2	$356,000
SANITAS		2	$390,500
ICBF	1	11	$519,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		11	$519,100
SENA	1	11	$345,900
SENA		11	$345,900
SUBTOTAL			$7,416,100
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$7,416,100

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · exito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de las almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Banco de Bogotá - RECAUDO PILA
2060 CS000001 ####0637 T13
FTx07/02/25 08:07H.N0000 Forma de P
202502 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009481317663
Identificacion901895986
VALOR PLANILLA:7,416,100.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:7,416,100.00

ANEXO 8. INFORME AMBIENTAL

INFORME AMBIENTAL

01 AL 28 DE MARZO DE 2025

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

CONSORCIO
INTER - RECUPERACIÓN

CVS

TABLA DE CONTENIDO

1 RESUMEN DEL INFORME. 3

2 Sistema de Gestión Ambiental. 3

2.1 Licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales 3

2.2 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 5

2.3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 6

2.4 MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSPORTE 6

2.5 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS 7

2.6 MANEJO DE LA OBRA, ESTRUCTURAS Y ASEO 7

2.7 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 8

2.8 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 8

2.9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 9

2.10 MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO 9

2.11 MANEJO DE COBERTURA VEGETAL 9

2.12 COMPONENTE SOCIAL 9

3 COMPONENTE DE CALIDAD 11

5. RECOMENDACIONES. 12

1 RESUMEN DEL INFORME.

El presente informe ambiental corresponde al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025. Contiene las actividades realizadas por el contratista e Interventoría, de acuerdo a los programas que forman parte del Plan de Manejo Ambiental como son:

- LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES AMBIENTALES
- PROGRAMA N°1: ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- PROGRAMA N°2: MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES
- PROGRAMA 3: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS
- PROGRAMA 4: MANEJO DE LA OBRA, ESTRUCTURAS Y ASEO
- PROGRAMA 5: MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
- PROGRAMA 6: MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS
- PROGRAMA 7: CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO
- PROGRAMA 8: MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO
- PROGRAMA N°9: MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

Los programas buscan evitar, mitigar y/o compensar las afectaciones que se produzcan con ocasión del desarrollo del Contrato Estatal: Nº 060 de 2024, **"RECUPERACIÓN AMBIENTAL CON ENFÁSIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA".**

A continuación, se presenta un resumen de las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS, en los diferentes programas que integran el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, los cuales fueron objeto de seguimiento por parte de la Interventoría. de acuerdo del Plan de Manejo Ambiental (PMA) presentado por el contratista.

2 Sistema de Gestión Ambiental.

2.1 Licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales

En la siguiente tabla se evaluó la necesidad de licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales en el periodo evaluado correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2025 de acuerdo a las actividades constructivas y recursos utilizados.

DESCRIPCIÓN	REQUIERE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Permiso ambiental minero de extracción de materiales de canteras, ladrilleras, asfalteras.	SI	Presentar Licencia ambiental cuando sea requerido.
Aprobación diseño paisajístico	NO	Según el alcance del proyecto no se requiere diseño paisajístico.
Permiso o autorización de tala, trasplante o reubicación de árboles	SI	Resolución n°037 fecha: 10 abril 2024 corporación autónoma regional de los valles del Sinú y del San Jorge, cvs
Permiso de ocupación de cauce o depósito de agua.	SI	Resolución no. 3-1586 fecha: 27 de octubre de 2023 corporación autónoma regional de los valles del sinú y del san Jorge, cvs.
Salvoconductos para la movilización de la madera proveniente de los tratamientos realizados a la vegetación.	NO	Las actividades que se realizarán en el proyecto no requieren la movilización de madera que demande de permisos especiales.
Concesión de agua	NO	El agua requerida para el proyecto se obtendrá del acueducto Municipal.
Permiso de vertimientos	NO	alcance del proyecto no requiere permiso de vertimientos.
Permiso de emisiones atmosféricas	NO	El alcance del proyecto no requiere permiso de emisiones atmosféricas.
Permiso para operación de equipos de construcción o	NO	No se realiza trabajo en horario restringido.

demolición, generadores de ruido ambiental en horarios restringidos		
Permisos relacionados con patrimonio arqueológico o histórico, si el proyecto afecta alguna zona con estas características	NO	No se realiza uso de patrimonio arqueológico o histórico.
Certificado de designación del sitio de disposición final de residuos de demolición emitido por la Secretarla de Planeación del Municipio Y/O Certificado de donación	SI	Planeación municipal otorgo la autorización de disponer los RCD.

La Interventoría realizó durante el periodo verificación del cumplimiento de las normas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y aspectos asociados a la gestión social del proyecto

2.2 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El equipo de interventoría superviso durante todo el proyecto el orden y aseo en los frentes de trabajo e identifico que el contratista se encuentra brindando las condiciones que permitieron un normal desarrollo de las actividades constructivas.
El líder ambiental oriento al personal a cerca de la importancia de mantener limpios y organizados los frentes de obra.
Los materiales de construcción que son necesarios para realizar las actividades contratadas, en los frentes de trabajo deberán mantenerse ordenados, carpados, demarcados y debidamente señalizados.

MATERIALES EN OBRA

2.3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

El contratista en el transcurso de la obra cuento con un campamento/oficina OAC de atención al ciudadano el cual se encuentra localizado en el frente de obra.

El frente de obra cuenta con un baño que fue tomado en arriendo en una finca aledaña pero muy cerca al frente de trabajo.



ZONA DE CAMPAMENTO

2.4 MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSPORTE

La interventoría verifica que el contratista cuenta con una serie de herramientas y equipos, los cuales antes de su funcionamiento son verificados por el profesional SST, que estos se encuentren en óptimas condiciones para su uso.

El contratista cuenta con los siguientes equipos:

EQUIPO Y MAQUINARIA	CANTIDAD
Estación Total	1
Nivel Automático	2
Equipo GPS	1
RTK	1
GPS	1

2.5 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS

- En el desarrollo del proyecto no se utilizaron sustancias de alto riesgo que ameritaran la activación del plan de contingencia.
- No se realizo lavado o mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada en obra.
- El abastecimiento de los equipos que requieren combustible se realizó en el frente de obra con todas las precauciones y medidas necesarias para evitar derrames de esta sustancia.
- En el frente de obra no se presentaron situaciones que requiriera la implementación del plan de emergencia, sin embargo, se contó con los recursos para contener de manera oportuna la situación.

2.6 MANEJO DE LA OBRA, ESTRUCTURAS Y ASEO

PUNTO ECOLOGICO

Con el fin de facilitar al personal en obra la identificación de tipos de residuos para su adecuada disposición final, al interior de la obra, el contratista debe contar con un punto ecológico basado en los tres criterios existentes para clasificar los residuos de acuerdo con la resolución No. 2184 de 2019 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible: Según su origen, segundo su biodegradabilidad y según su peligrosidad.



PUNTO ECOLOGICO

OBSERVACION: La presente interventoría en cumplimento de sus obligaciones legales y contractuales una vez inicien las actividades de obra civil, realizara el seguimiento, control y vigilancia a la clasificación y disposición de residuos de acuerdo al código de colores establecidos, con el fin de facilitar a la persona en obra la identificación de tipos de residuos para su adecuada disposición final.

2.7 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

• La oficina del contratista se encuentra conectado a la red de alcantarillado.

• El contratista no realizo vertimiento de residuos líquidos en el área de trabajo.

• Para el lavado de herramientas; el contratista conto en los frentes de obra, con canecas de almacenamiento de agua y en este lugar donde se realiza el lavado de las herramientas menores.

2.8 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS

- El contratista antes de realizar las intervenciones en la obra, deberá señalizar el frente, utilizando dispositivos y elementos temporales consistentes en señales preventivas e informativas, malla naranja y cinta preventiva que permita minimizar los riesgos de accidentes.

TRANSPORTE DE MATERIALES

2.9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO

- Los equipos que se utilizan en los frentes de trabajo son utilizados en horarios adecuados establecidos en los horarios de 7:00a. a 5:00 pm, la utilización de estos equipos son muy puntuales.
- Los materiales que se acumulan en obra y se mantuvieron tapados con plástico para evitar el arrastre con el viento.

2.10 MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO

Durante el periodo no se realizó intervención a redes de servicios públicos.

2.11 MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

- Durante el presente periodo no fueron realizados aprovechamientos forestales.

2.12 COMPONENTE SOCIAL

INSTALACIÒN DE VALLA INFORMATIVA

El contratista de obra cuenta con un diseño que ha sido aprobado por la supervisión del proyecto.



DISEÑO VALLA INFORMATIVA DE OBRA

EL Contratista durante este periodo se encuentra elaborando la valla informativa.

ACTAS DE VECINDAD


En el presente periodo el contratista adelanto las actividades de actas de vecindad realizadas a los predios aledaños a la zona del proyecto acompañadas de la parte social en la cual se identificaron cada una de las condiciones de estos.





Lo cual se manifestó por parte del contratista dejar las zonas que se intervengan (cercas con postes, cercas con alambre eléctrico) tal cual como se encontraron, la respuesta fue totalmente positiva en el momento de levantar las actas.



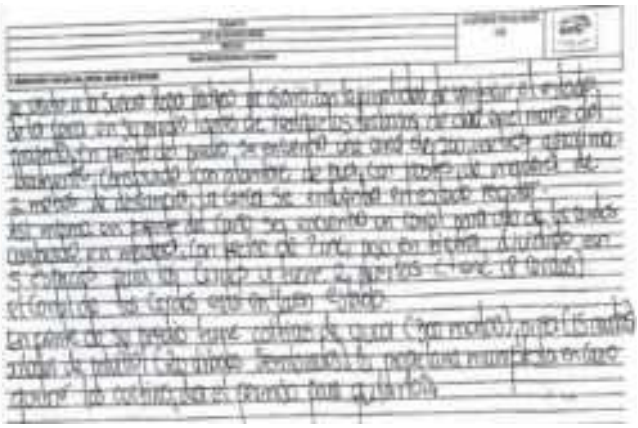

3 COMPONENTE DE CALIDAD

IDENTIFICACIÒN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

Bitácora de obra:

Del 01 al 28 de febrero de 2025 se desarrollan las actividades de; Localización y replanteo, optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra incluyendo excavación y rectificación de taludes. Estas actividades se registran en la Bitácora de Obra.

INSPECCIÒN Y ENSAYO

Ensayos y resultados de laboratorio (ver anexo):

El contratista con el fin de garantizar que los materiales utilizados en obra cumplan con todas las especificaciones técnicas a lugar, deberá realiza cuando sea requerido ensayos necesarios, para este periodo no se reportan ensayos realizados. **Interventoría hará seguimiento de la presentación de estos ensayos en el tiempo que sean requeridos su elaboración.**

4. CONCLUSIONES.

- Con relación al cumplimiento del PMA, de acuerdo a la evaluación del desempeño del Contratista, el contratista cumplió con la ejecución de las actividades del componente de Sistema de Gestión Ambiental durante toda la ejecución del proyecto.

- Con relación al componente de Gestión Ambiental en las actividades de Construcción. El Contratista mantuvo los frentes de obra organizados después de la jornada laboral, dando cumplimiento a las medidas establecidas en el PMA.

5. RECOMENDACIONES.

- Mantener las buenas prácticas ambientales observadas y seguir fortaleciendo la cultura de responsabilidad ambiental entre todos los actores del proyecto.

- Implementar las mejoras identificadas y seguir monitoreando de cerca las actividades para asegurar el cumplimiento constante del PMA.

- Continuar fomentando la participación de la comunidad local en las actividades del proyecto, promoviendo la transparencia y la colaboración.



Iván Camilo Buelvas S.
Ing. Sanitario y Ambiental
Mp: No. 22236138053COR
Especialista Ambiental o Ecosistémico del CONSORCIO INTER RECUPERACION

ANEXO 9. INFORME HIDRAULICO

INFORME HIDRAULICO No. 01

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

REALIZADO POR:

NELSON AUGUSTO RENGIFO VILLALBA

OBJETO:

Seguimiento al CONTRATO DE OBRA No. 060 DE 2024. “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

28 de febrero de 2025

INTRODUCCION

En el análisis del recurso hídrico, el movimiento del agua a traves de canales es de gran importancia, es por ellos que la hidráulica, en particular la hidráulica de canales toma relevancia al ser la diciplina encaminada a canalizar los fluidos, generalmente agua, que se encuentran a flujo libre (la superficie del flujo está bajo presión atmosférica). Los canales son obras que conducen el agua entre dos puntos determinados, que pueden tener condiciones particulares de topografía, tipología de suelos etc., por lo que el comportamiento y diseño de estas son un reto para los ingenieros hidráulicos.

Se encuentra diversidad de canales abiertos que puede ser naturales o hechos por el hombre, normalmente la superficie del flujo esta descubierta como los ríos, arroyos, estuarios, canales de riego etc. La clasificación también puede estar de acuerdo con sus caracteristicas geométricas como la sección transversal, dimensiones, la pendiente longitudinal y caracteristicas hidráulicas.

Los flujos en los canales abiertos son comunes, su característica es la superficie libre. Como los ríos y canales, zanjas de drenaje y cunetas; estos flujos pueden ser variados o uniformes.

LOCALIZACIÓN.

El Municipio de Ciénaga de Oro se encuentra localizado al oriente del departamento a 35 kilómetros de Montería. Limita por el norte con San Andrés de Sotavento y Chima; por el sur, con Pueblo Nuevo; por el oriente, con los municipios de Chinú y Sahagún y por el occidente, con los municipios de Cereté, San Carlos y San Pelayo. Se halla localizado a los 8º53' latitud norte y 75º53' de longitud al occidente del meridiano de Greenwich. El proyecto se encuentra ubicado entre la vereda El Salado y la vereda El Higal del municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba.



Imagen 1. *Localización del proyecto.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

Durante el mes de febrero, se inició con la conformación de la sección hidráulica del canal conforme a las condiciones establecidas en el diseño entre las abscisas K0+000 aguas arriba del proyecto en intervención, teniendo en cuenta un total de intervención de 4.4 km. El proceso comenzó con las excavaciones en el fondo del canal, buscando alcanzar las cotas necesarias para definir la pendiente proyectada que permita satisfacer la capacidad estimada del canal. Al inicio de estas actividades, los trabajos se han llevado a cabo bajo condiciones desafiantes, caracterizadas por altos niveles de lámina de agua en el área de intervención, como resultado de las constantes lluvias registradas en la zona durante el desarrollo de las excavaciones en mención.



***Fotografía 1**. Condición del tramo en ejecución.*
***Fuente**: Elaboración propia.*



***Fotografía 2**. Condición del tramo en ejecución*
***Fuente**: Elaboración propia.*



***Fotografía 3**. Condición del tramo en ejecución*
***Fuente**: Elaboración propia.*





Se recomienda realizar mediciones periódicas de los niveles de agua para monitorear su evolución y, controlar las condiciones bajo las cuales se adelantan las actividades, para así garantizar que se ejecuten los trabajos necesarios para optimizar la capacidad hidráulica.


CONCLUSIONES.

Durante este período, se continua con la ejecución de las actividades de excavación conforme a las especificaciones proyectadas para el canal en cuestión. Se han llevado a cabo las visitas a los distintos frentes de trabajo, verificando las cotas de fondo de los tramos establecidos para el período en curso.

Se realizará la verificación de los niveles de inundación para asegurar la continuidad de los trabajos, de acuerdo con las especificaciones establecidas.

Entre las observaciones, se destaca la presencia de material vegetal flotante debido al arrastre de la corriente, lo cual evidencia el flujo del agua. Asimismo, se asegura la continuidad de los trabajos conforme a las condiciones y parámetros establecidos en la obra y definidos en el Balance del proyecto, con el fin de cumplir con los parámetros de diseño hidráulico del cauce y alcanzar los objetivos estipulados en el contrato.

Se destaca que, a medida que avance la intervención en los tramos siguientes del cuerpo de agua, se busca mejorar su capacidad hidráulica y ajustar su comportamiento conforme a los requerimientos del proyecto. Se monitorearán los cambios en los niveles de agua, aunque es importante considerar que las condiciones críticas de la presencia de lluvias constantes en la región pueden llegar a representar un factor influyente en este sistema.



NELSON AUGUSTO RENGIFO VILLALBA
Ingeniero Civil - MP 25202-29852
Especialista en Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente
Profesional Hidráulico Consorcio Inter Recuperación

ANEXO 10. PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899921	5	CONSORCIO INTER RECUPERACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFESIONALES	CRA 8 No 45-35 of 924	MONTERIA-CORDOBA	3104551342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	9483096214	9483096214	E	2025/02/06	2025/02/06	BANCO DE BOGOTA	0	$6,749,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1073816829	BANDA BARLEY	X																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1067952752	BARON YONIS	X																	230301	30	$1,959,424	$313,600	EPS037	30	$1,959,424	$78,400	CCF16	30	$1,959,424	$78,400	14-11	30	$1,959,424	$136,400	30	$0	$0	Si	$606,800
3	CC	10966341	BUELVAS IVAN	X																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
4	CC	10770721	CABARCAS ALFREDO	X																	231001	29	$1,691,667	$270,700	EPS010	29	$1,691,667	$67,700	CCF16	29	$1,691,667	$67,700	14-11	29	$1,691,667	$117,800	29	$0	$0	Si	$523,900
5	CC	78744748	HERRERA JUAN	X																	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS042	30	$3,500,000	$140,000	CCF16	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
6	CC	1063274318	LOPEZ JONATHAN	X																	230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF16	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
7	CC	42272321	LUGO ERLINDA	X																	231001	30	$1,750,000	$280,000	EPS002	30	$1,750,000	$70,000	CCF16	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0	Si	$541,800
8	CC	1069505906	OTERO JOSE	X																	230301	29	$1,894,110	$303,100	EPS037	29	$1,894,110	$75,800	CCF16	29	$1,894,110	$75,800	14-11	29	$1,894,110	$131,900	29	$0	$0	Si	$586,600
9	CC	93356070	RENGIFO NELSON	X																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
10	CC	15670767	VERGARA HUGO	X																	25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF16	30	$1,680,000	$67,200	14-11	30	$1,680,000	$117,000	30	$0	$0	Si	$520,200
Total	**Afiliados(10)**																						$21,798,701	$3,488,000			$21,798,701	$872,100			$21,798,701	$872,100			$21,798,701	$1,517,500		$0	$0		$6,749,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899921	5	CONSORCIO INTER RECUPERACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFESIONALES	CRA 8 No 45-35 of 924	MONTERIA-CORDOBA	3104551342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	9483096214	9483096214	E	2025/02/06	2025/02/06	BANCO DE BOGOTA	0	$6,749,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,488,000	$0	$0	$3,488,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$550,700	$0	$0	$550,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$828,800	$0	$0	$828,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,880,700	$0	$0	$1,880,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,517,500	$0	$0	$1,517,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,517,500	$0	$0	$1,517,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$872,100	$0	$0	$872,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	10	$872,100	$0	$0	$872,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$872,100	$0	$0	$872,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$140,000	$0	$0	$140,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$67,700	$0	$0	$67,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$221,400	$0	$0	$221,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$170,000	$0	$0	$170,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$216,000	$0	$0	$216,000
TOTAL				10	$6,749,700	$0	$0	$6,749,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899921	5	CONSORCIO INTER RECUPERACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFESIONALES	CRA 8 No 45-35 of 924	MONTERIA-CORDOBA	3104551342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	9483096246	9483096246	E	2025/03/06	2025/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$6,787,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1073816829	BANDA BARLEY																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1067952752	BARON YONIS																		230301	30	$1,959,424	$313,600	EPS037	30	$1,959,424	$78,400	CCF16	30	$1,959,424	$78,400	14-11	30	$1,959,424	$136,400	30	$0	$0	Si	$606,800
3	CC	10966341	BUELVAS IVAN																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
4	CC	10770721	CABARCAS ALFREDO																		231001	30	$1,750,000	$280,000	EPS010	30	$1,750,000	$70,000	CCF16	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0	Si	$541,800
5	CC	78744748	HERRERA JUAN																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS042	30	$3,500,000	$140,000	CCF16	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
6	CC	1063274318	LOPEZ JONATHAN																		230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF16	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
7	CC	42272321	LUGO ERLINDA																		231001	30	$1,750,000	$280,000	EPS002	30	$1,750,000	$70,000	CCF16	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0	Si	$541,800
8	CC	1069505906	OTERO JOSE																		230301	30	$1,959,424	$313,600	EPS037	30	$1,959,424	$78,400	CCF16	30	$1,959,424	$78,400	14-11	30	$1,959,424	$136,400	30	$0	$0	Si	$606,800
9	CC	93356070	RENGIFO NELSON																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
10	CC	15670767	VERGARA HUGO																		25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF16	30	$1,680,000	$67,200	14-11	30	$1,680,000	$117,000	30	$0	$0	Si	$520,200
Total	**Afiliados(10)**																						$21,922,348	$3,507,800			$21,922,348	$877,000			$21,922,348	$877,000			$21,922,348	$1,526,000		$0	$0		$6,787,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899921	5	CONSORCIO INTER RECUPERACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFESIONALES	CRA 8 No 45-35 of 924	MONTERIA-CORDOBA	3104551342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	9483096246	9483096246	E	2025/03/06	2025/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$6,787,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,507,800	$0	$0	$3,507,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,000	$0	$0	$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$828,800	$0	$0	$828,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,891,200	$0	$0	$1,891,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,526,000	$0	$0	$1,526,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,526,000	$0	$0	$1,526,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$877,000	$0	$0	$877,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	10	$877,000	$0	$0	$877,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$877,000	$0	$0	$877,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$140,000	$0	$0	$140,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,000	$0	$0	$70,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$224,000	$0	$0	$224,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$170,000	$0	$0	$170,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$216,000	$0	$0	$216,000
TOTAL				10	$6,787,800	$0	$0	$6,787,800

ANEXO 11. PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL OBRA

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	consorciopuntayanezcvs@gmail.com	MONTERIA-CORDOBA	3008055838

Clave: 9481315754

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/02/04	13	$2,800	$253,300
2025/02/05	14	$3,000	$253,500
2025/02/06	15	$3,200	$253,700
2025/02/07	16	$3,300	$253,800
2025/02/10	19	$3,700	$254,200
2025/02/11	20	$3,900	$254,400
2025/02/12	21	$3,900	$254,400
2025/02/13	22	$4,100	$254,600
2025/02/14	23	$4,200	$254,700
2025/02/17	26	$5,100	$255,600

Periodo Pensión: 2024-12 **Periodo Salud: 2025-01**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	10	$84,300
COLPENSIONES		3	$26,100
PORVENIR		4	$32,100
PROTECCION		3	$26,100
ARL	1	11	$41,300
ARL SURA		11	$41,300
CCF	1	11	$23,500
COMFACOR		11	$23,500
EPS	6	11	$73,400
COMPENSAR		2	$14,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		3	$21,400
MUTUAL SER		1	$6,100
NUEVA E.P.S.		1	$6,100
SALUD TOTAL		2	$12,100
SANITAS		2	$13,300
ICBF	1	11	$18,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		11	$18,400
SENA	1	11	$12,400
SENA		11	$12,400
SUBTOTAL			$253,300
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$253,300

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Cajas registradoras de los almacenes Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	cl 62a 7-67	MONTERIA-CORDOBA	7895858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01		9481315754	E	2025/01/22			13	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MONTERIA (11 Afiliados)																							**$519,585**	**$83,400**			**$576,252**	**$72,500**			**$576,252**	**$23,300**			**$576,252**		**$40,900**		**$576,252**	**$30,400**		**$250,500**
Centro de Trabajo: CVS (11 Afiliados)																							**$519,585**	**$83,400**			**$576,252**	**$72,500**			**$576,252**	**$23,300**			**$576,252**		**$40,900**		**$576,252**	**$30,400**		**$250,500**
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (11 Afiliados)																							**$519,585**	**$83,400**			**$576,252**	**$72,500**			**$576,252**	**$23,300**			**$576,252**		**$40,900**		**$576,252**	**$30,400**		**$250,500**
1	CC	1062424908	BALLESTEROS SANTIAGO	X																	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$6,000	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
2	CC	1067940558	BERASTEGUI CLEIDER	X																	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$6,000	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
3	CC	52254090	CHAVERRA ROSIBEL	X																	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$6,000	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
4	CC	78036613	CORONADO OSCAR	X																	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$6,000	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
5	CC	1075652455	FETECUA NIKOLLE	X																	230301	1	$55,667	$9,000	EPS010	1	$55,667	$7,000	CCF16	1	$55,667	$2,300	14-11	1	$55,667	6.960%	$3,900	1	$55,667	$2,900	No	$25,100
6	CC	8686400	FIORILLO JOSE	X																		0	$0	$0	EPS010	1	$56,667	$7,100	CCF16	1	$56,667	$2,300	14-11	1	$56,667	6.960%	$4,000	1	$56,667	$3,000	No	$16,400
7	CC	80539487	GUERRERO LUIS	X																	230201	1	$56,667	$9,100	EPS008	1	$56,667	$7,100	CCF16	1	$56,667	$2,300	14-11	1	$56,667	6.960%	$4,000	1	$56,667	$3,000	No	$25,500
8	CC	1042424437	HERNANDEZ JOSE	X																	230201	1	$56,667	$9,100	EPS010	1	$56,667	$7,100	CCF16	1	$56,667	$2,300	14-11	1	$56,667	6.960%	$4,000	1	$56,667	$3,000	No	$25,500
9	CC	10221652	MONSALVE GERMAN	X																	25-14	1	$56,667	$9,100	EPS005	1	$56,667	$7,100	CCF16	1	$56,667	$2,300	14-11	1	$56,667	6.960%	$4,000	1	$56,667	$3,000	No	$25,500
10	CC	52547455	ORTEGA MONICA	X																	25-14	1	$56,667	$9,100	EPS008	1	$56,667	$7,100	CCF16	1	$56,667	$2,300	14-11	1	$56,667	6.960%	$4,000	1	$56,667	$3,000	No	$25,500
11	CC	1007765951	PEREZ GLINDON	X																	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$6,000	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
Total			**Afiliados(11)**																				$519,585	$83,400			$576,252	$72,500			$576,252	$23,300			$576,252		$40,900		$576,252	$30,400		$250,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	cl 62a 7-67	MONTERIA-CORDOBA	7895858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01		9481315754	E	2025/01/22			13	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$83,400	$900	$0	$84,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$25,800	$300	$0	$26,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$31,800	$300	$0	$32,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$25,800	$300	$0	$26,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$40,900	$400	$0	$41,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$40,900	$400	$0	$41,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$23,300	$200	$0	$23,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$23,300	$200	$0	$23,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$72,500	$900	$0	$73,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$14,200	$200	$0	$14,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$21,200	$200	$0	$21,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$6,000	$100	$0	$6,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$6,000	$100	$0	$6,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$12,000	$100	$0	$12,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$13,100	$200	$0	$13,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$18,200	$200	$0	$18,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$18,200	$200	$0	$18,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$12,200	$200	$0	$12,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$12,200	$200	$0	$12,400
TOTAL				**11**	**$250,500**	**$2,800**	**$0**	**$253,300**

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	consorciopuntayanezcvs@gmail.com	MONTERIA-CORDOBA	3008055838

Clave: 9481317663

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/02/19	0	$0	$7,416,100
2025/02/20	0	$0	$7,416,100
2025/02/21	1	$5,700	$7,421,800
2025/02/24	4	$20,300	$7,436,400
2025/02/25	5	$25,100	$7,441,200
2025/02/26	6	$30,100	$7,446,200
2025/02/27	7	$35,200	$7,451,300
2025/02/28	8	$39,800	$7,455,900

Periodo Pensión: 2025-01 **Periodo Salud: 2025-02**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	10	$2,494,200
COLPENSIONES		3	$771,800
PORVENIR		4	$950,600
PROTECCION		3	$771,800
ARL	1	11	$1,203,800
ARL SURA		11	$1,203,800
CCF	1	11	$691,800
COMFACOR		11	$691,800
EPS	6	11	$2,161,300
COMPENSAR		2	$425,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		3	$633,800
MUTUAL SER		1	$178,000
NUEVA E.P.S.		1	$178,000
SALUD TOTAL		2	$356,000
SANITAS		2	$390,500
ICBF	1	11	$519,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		11	$519,100
SENA	1	11	$345,900
SENA		11	$345,900
SUBTOTAL			$7,416,100
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$7,416,100

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Cajas registradoras de los almacenes Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	cl 62a 7-67	MONTERIA-CORDOBA	7895858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02		9481317663	E	2025/02/20			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MONTERIA (11 Afiliados)																								**$15,587,500**	**$2,494,200**			**$17,287,500**	**$2,161,300**			**$17,287,500**	**$691,800**			**$17,287,500**		**$1,203,800**		**$17,287,500**	**$865,000**		**$7,416,100**
Centro de Trabajo: CVS (11 Afiliados)																								**$15,587,500**	**$2,494,200**			**$17,287,500**	**$2,161,300**			**$17,287,500**	**$691,800**			**$17,287,500**		**$1,203,800**		**$17,287,500**	**$865,000**		**$7,416,100**
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (11 Afiliados)																								**$15,587,500**	**$2,494,200**			**$17,287,500**	**$2,161,300**			**$17,287,500**	**$691,800**			**$17,287,500**		**$1,203,800**		**$17,287,500**	**$865,000**		**$7,416,100**
1	CC	1062424908	BALLESTEROS SANTIAGO																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
2	CC	1067940558	BERASTEGUI CLEIDER		X																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
3	CC	52254090	CHAVERRA ROSIBEL		X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
4	CC	78036613	CORONADO OSCAR																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
5	CC	1075652455	FETECUA NIKOLLE																			23030 1	30	$1,670,000	$267,200	EPS010	30	$1,670,000	$208,800	CCF16	30	$1,670,000	$66,800	14-11	30	$1,670,000	6.960%	$116,300	30	$1,670,000	$83,500	No	$742,600
6	CC	8686400	FIORILLO JOSE	X	X																		0	$0	$0	EPS010	30	$1,700,000	$212,500	CCF16	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$1,700,000	$85,000	No	$483,900
7	CC	80539487	GUERRERO LUIS																			23020 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$212,500	CCF16	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$1,700,000	$85,000	No	$755,900
8	CC	1042424437	HERNANDEZ JOSE																			23020 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS010	30	$1,700,000	$212,500	CCF16	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$1,700,000	$85,000	No	$755,900
9	CC	10221652	MONSALVE GERMAN																			25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$212,500	CCF16	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$1,700,000	$85,000	No	$755,900
10	CC	52547455	ORTEGA MONICA																			25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$212,500	CCF16	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$1,700,000	$85,000	No	$755,900
11	CC	1007765951	PEREZ GLINDON																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total			**Afiliados(11)**																					$15,587,500	$2,494,200			$17,287,500	$2,161,300			$17,287,500	$691,800			$17,287,500		$1,203,800		$17,287,500	$865,000		$7,416,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	cl 62a 7-67	MONTERIA-CORDOBA	7895858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02		9481317663	E	2025/02/20			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,494,200	$0	$0	$2,494,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$771,800	$0	$0	$771,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$950,600	$0	$0	$950,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$771,800	$0	$0	$771,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,203,800	$0	$0	$1,203,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,203,800	$0	$0	$1,203,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$691,800	$0	$0	$691,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$691,800	$0	$0	$691,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$2,161,300	$0	$0	$2,161,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$425,000	$0	$0	$425,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$633,800	$0	$0	$633,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$356,000	$0	$0	$356,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$390,500	$0	$0	$390,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$519,100	$0	$0	$519,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$519,100	$0	$0	$519,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$345,900	$0	$0	$345,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$345,900	$0	$0	$345,900
TOTAL				11	$7,416,100	$0	$0	$7,416,100

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
NIT 901.895.986-5
CL 62 A 7 67
Teléfono: (604) 3008055836
Montería - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO No.	CC-34-72
Fecha de elaboración	2025-02-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	616015 - Otros costos	Aportes en Linea S.A.		PLANILLA MES DE DICIEMBRE DE 2024- PROFESIONALES	253,800.00	0.00
2	11050501 - Caja general	Aportes en Linea S.A.		Caja general	0.00	253,800.00
				Total	253,800.00	253,800.00

Observaciones

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Profesionales.

Datos Generales Del Aportante

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad Departamento	Celular
NIT 901895986	1	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	consorciopuntayanezcvs@gmail.com	MONTERIA-CORDOBA	3008055838

Clave: 9481315754

Periodo Pensión: 2024-12 **Periodo Salud:** 2025-01

Pagar Hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/02/04	13	$2,800	$253,300
2025/02/05	14	$3,000	$253,500
2025/02/06	15	$3,200	$253,700
2025/02/07	16	$3,300	$253,800
2025/02/10	19	$3,700	$254,200
2025/02/11	20	$3,900	$254,400
2025/02/12	21	$3,900	$254,400
2025/02/13	22	$4,100	$254,600
2025/02/14	23	$4,200	$254,700
2025/02/17	26	$5,100	$255,600

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	10	$84,300
COLPENSIONES		3	$26,100
PORVENIR		4	$32,100
PROTECCION		3	$26,100
ARL	1	11	$41,300
ARL SURA		11	$41,300
CCF	1	11	$23,500
COMFACOR		11	$23,500
EPS	6	11	$73,400
COMPENSAR		2	$14,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		3	$21,400
MUTUAL SER		1	$6,100
NUEVA E.P.S.		1	$6,100
SALUD TOTAL		2	$12,100
SANITAS		2	$13,300
ICBF	1	11	$18,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		11	$18,400
SENA	1	11	$12,400
SENA		11	$12,400
SUBTOTAL			$253,300
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$253,300

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SUPERMAX

Cajas registradoras de las almacenes
Monto máximo por transacción: $5.000.000

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 CS0000001 ####0637 T15
FT:07/02/25 08:10H.MOD80 Norte de M
202501 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009481315754
Identificacion901895986
VALOR PLANILLA:253,800.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:253,800.00

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
NIT 901.895.986-5
CL 62 A 7 67
Teléfono: (604) 3008055838
Montería - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO No.	**CC-34-73**
Fecha de elaboración	2025-02-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	616015 - Otros costos	Aportes en Línea S.A.		PLANILLA MES DE ENERO DE 2024- PROFESIONALES	7,416,100.00	0.00
2	11050501 - Caja general	Aportes en Línea S.A.		Caja general	0.00	7,416,100.00
				Total	7,416,100.00	7,416,100.00

Observaciones

aportes en línea

Comprobante Liquidacion

Profesionales.

Datos Generales Del Aportante

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad Departamento	Celular
NIT 901895986	5	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MONTERIA	consorciopuntayanezcvs@gmail.com	MONTERIA-CORDOBA	3008055838

Clave: 9481317663

Pagar hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/02/19	0	$0	$7,416,100
2025/02/20	0	$0	$7,416,100
2025/02/21	1	$5,700	$7,421,800
2025/02/24	4	$20,300	$7,436,400
2025/02/25	5	$25,100	$7,441,200
2025/02/26	6	$30,100	$7,446,200
2025/02/27	7	$35,200	$7,451,300
2025/02/28	8	$39,800	$7,455,900

Periodo Pensión: 2025-01 **Periodo Salud: 2025-02**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	10	$2,494,200
COLPENSIONES		3	$771,800
PORVENIR		4	$950,600
PROTECCION		3	$771,800
ARL	1	11	$1,303,800
ARL SURA		11	$1,303,800
CCF	1	11	$691,800
COMFACOR		11	$691,800
EPS	8	11	$2,161,300
COMPENSAR		2	$425,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		3	$633,800
MUTUAL SER		1	$178,000
NUEVA E.P.S.		1	$178,000
SALUD TOTAL		2	$356,000
SANITAS		2	$390,500
ICBF	1	11	$519,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		11	$519,100
SENA	1	11	$345,900
SENA		11	$345,900
SUBTOTAL			$7,416,100
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$7,416,100

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · exito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de las almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Banco de Bogotá - RECAUDO PILA
2060 CS000001 ####0637 T13
FTx07/02/25 08:07H.N0000 Forma de P
202502 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009481317663
Identificacion901895986
VALOR PLANILLA:7,416,100.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:7,416,100.00

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900479957-4	GRUAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA S.A.S		CALLE 41 N 16A-135	3126441435	comercial@gruasytransporte.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PS	PS 02	CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	Y	11/02/2025	84113668	$976.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	225.500	0		0		0	0	0	0	225.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	118.700	0		0		0	0	0	0	118.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.600	0	0	0	0	0	0		288.600	2
231001	Colfondos	800227940-6	151.900	0	0	0	0	0	0		151.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	191.700				191.700	0	0	191.700			1.917	191.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	344.200	344.200
Pensión	2	440.500	440.500
Riesgos Laborales	1	191.700	191.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	976.400	976.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900479957-4	GRUAS Y TRANSPORTE DE LA SABANA S.A.S		CALLE 41 N 16A-135	3126441435	comercial@gruasytransporte.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PS	PS 02	CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	Y	11/02/2025	84113668	$976.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1066749190	MONTES CACERES XIOMARA DAYANA	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1067849469	MARTINEZ TORRES JAVIER ENRIQUE	59	0			N	X																231001	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	118.700	14-11	949.000	5	66.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	10966603	VELASQUEZ DIAZ ALEXANDER NICANOR	59	0			N	X																230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS002	379.600	47.500	14-11	379.600	5	26.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-14, 10:31:55 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 75837291

Periodo Cotización 202501 **Periodo Servicio** 202502

PAGADA 2025-02-06 13:15:59.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ANTONIO VILLEGAS GONZALEZ				
Documento	CC 71647305	**Dirección**	CR 9 #68 - 70 TORRE 1 APT 102		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7851988		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	10
Ciudad	MONTERIA	**Departamento**	CORDOBA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1104010316		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BOHORQUEZ HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	23001000 - 23		CORDOBA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF16	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFACOR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-14, 10:31:55 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 75837291

Periodo Cotización 202501 **Periodo Servicio** 202502

PAGADA 2025-02-06 13:15:59.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ANTONIO VILLEGAS GONZALEZ				
Documento	CC 71647305	**Dirección**	CR 9 #68 - 70 TORRE 1 APT 102		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7851988		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	10
Ciudad	MONTERIA	**Departamento**	CORDOBA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1104010316		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BOHORQUEZ HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	23001000 - 23		CORDOBA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF16	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFACOR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

ANEXO 12. INFORME TECNICO OBRA

INFORME DE OBRA No 2

CONTRATO DE OBRA No. 060 DE 2024

OBJETO:
“RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER RECUPERACION

CONSTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

PERÍODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 2
2. OBJETIVOS 3
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
5. LOCALIZACIÓN DE LA VALLA 27
6. FICHA GENERAL DEL CONTRATO 28
7. GARANTÍAS VIGENTES DEL CONTRATO 29
8. ACTIVIDADES A EJECUTAR 30
9. CRONOGRAMA DE OBRA 32
10. ACTIVIDADES REALIZADAS PERÍODO 30 DIC 2024 – 30 ENE 2025 34
11. CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LA ZONA DEL PROYECTO. 45
12. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO. 46

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo detallar la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de recuperación ecosistémica con énfasis en la conectividad hidrológica de un tramo del Caño Aguas Prietas, ubicado entre la vereda El Salado del corregimiento El Siglo y la vereda El Higal del corregimiento Punta Yáñez, en el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba durante el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de Febrero de 2025. Es conocido que la dinámica hídrica de muchos cuerpos de agua en el Departamento de Córdoba, se encuentra considerablemente alterada debido al inadecuado uso del recurso hídrico, la ocupación de las riberas de ríos, caños y otros cuerpos de agua, y la colmatación excesiva de los cauces, lo que trae grandes afectaciones a las comunidades, no solamente a familias vulnerables, sino también a la infraestructura educativa, vial y de servicios públicos.

Este proyecto se enmarca dentro de la necesidad de restaurar y preservar los ecosistemas acuáticos y terrestres de la región, los cuales se han visto comprometidos por la actividad humana y la alteración de los cauces naturales.

La recuperación ecosistémica tiene como propósito mejorar las condiciones de conectividad hidrológica en esta área, promoviendo el flujo adecuado de agua a través del caño, lo que facilitará la regeneración de los ecosistemas acuáticos y terrestres adyacentes. Asimismo, se busca fortalecer la capacidad de las comunidades locales para gestionar de manera sostenible sus recursos naturales, a la vez que se promueve la resiliencia ante eventos climáticos extremos, tales como sequías e inundaciones.

Este informe describe las actividades realizadas, los avances en la ejecución de las obras, los resultados obtenidos hasta la fecha y los impactos ambientales y sociales previstos, todo ello con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto y garantizar la mejora continua en la gestión de los recursos hídricos de la región.

2. OBJETIVOS

- Reportar las actividades del contrato de obra 060 de 2024 “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YÁNEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2025.

- Analizar el avance de ejecución obtenido durante el período con el fin de evidenciar rendimientos realizar la proyección de las próximas actividades dentro de la programación.

- Determinar la ruta crítica y posibles amenazas para la correcta y optima ejecución del proyecto.

- Presentar a la interventoría la ejecución detallada del proyecto durante el período en cuestión.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto que tiene por objeto la "**RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YÁNEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**", se desarrollará entre la vereda El Salado y la vereda El Higal del municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba.



Imagen 1. Localización del tramo a intervenir.

El Municipio de Ciénaga de Oro se encuentra localizado al oriente del departamento a 35 kilómetros de Montería. Limita por el norte con San Andrés de Sotavento y Chima; por el sur, con Pueblo Nuevo; por el oriente, con los municipios de Chinú y Sahagún y por el occidente, con los municipios de Cereté, San Carlos y San Pelayo. Se halla localizado a los 8º53' latitud norte y 75º53' de longitud al occidente del meridiano de Greenwich.



Imagen 2. Localización del municipio de Ciénaga de Oro en Córdoba (Colombia)

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Es conocido que la dinámica hídrica de muchos cuerpos de agua en el Departamento de Córdoba, se encuentra considerablemente alterada debido al inadecuado uso del recurso hídrico, la ocupación de las riberas de ríos, caños y otros cuerpos de agua, y la colmatación excesiva de los cauces, lo que trae grandes afectaciones a las comunidades, no solamente a familias vulnerables, sino también a la infraestructura educativa, vial y de servicios públicos.

Las poblaciones asentadas en el valle aluvial y la planicie de inundación del río Sinú, se encuentran vulnerables a afectaciones debido a inundaciones recurrentes que año tras año se presentan en gran parte de la cuenca del río Sinú, esto debido principalmente a las fuertes lluvias que se presentan en la zona, al cambio climático y a otros fenómenos naturales exacerbados por las actividades antrópicas, por lo que el nivel del agua en los cauces naturales y redes de drenaje conectadas a estos cuerpos de agua y corrientes, aumentan hasta causar el desbordamiento y las consecuentes inundaciones.

Así mismo, se destaca que las zonas que por naturaleza están destinadas para el amortiguamiento natural de crecientes, han sido utilizadas por comunidades de bajos recursos y propietarios de predios para sus actividades económicas, perdiéndose esta función vital, ocasionándose una problemática compleja a causa de las inundaciones.

Es por esto que después de ir realizando un diagnóstico y análisis del estado actual de los cuerpos de agua del Departamento de Córdoba, se pudo evidenciar que la mayor problemática de alteración de la dinámica hídrica y degradación ambiental de dichos cuerpos de agua, son la inadecuada utilización y alto grado de sedimentación y obstrucción de los mismos, lo cual origina desbordes e inundaciones y en consecuencia pérdidas económicas, alteración social y mayores gastos en atención de emergencias.

Se considera entonces que el precario estado de los cauces naturales del departamento es un tema relevante que requiere intervención inmediata para la adecuada gestión de las cuencas y el recurso hídrico, problemática igualmente evidenciada en el Caño Aguas Prietas.

El Caño Aguas Prietas tiene una longitud aproximada de 78 Km desde su nacimiento hasta su entrega al río Sinú en el municipio de Lorica, siendo que en los 4.4 Km que se analizaron, se evidencian zonas inundables y cuerpos de agua loticos, debido en parte a la forma del terreno ya que es una planicie de inundación del río Sinú. Así mismo se evidencia la acumulación de residuos que afecta la capacidad hidráulica del tramo de estudio, generando encharcamientos y desbordamientos.

El tramo de análisis, se caracteriza por presentar una sección hidráulica poco definida en la que se presenta un intercambio de flujo con el sistema de ciénagas de la zona. La red de drenaje que vierte al caño, se encuentra conformada por varios cuerpos de agua entre ellos el Arroyo Trementino, el Arroyo Grande, la Quebrada El Pital, el Arroyo La Palma, el Caño San Carlos, el Arroyo El Charcón, el Arroyo Torrentes y el Caño Sierra Chiquita

(El Purgatorio, el cual recibe aguas de escorrentía del sur de Montería).

Es por esto que la CVS intervendrá una longitud de 4.4 Km, mediante la ejecución del proyecto “RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, el cual tiene como meta mitigar la problemática ambiental que se presenta en cada temporada de lluvias debido el desbordamiento del Caño Aguas Prietas en el municipio de Ciénaga de Oro.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la modelación hidráulica del cuerpo de agua, se dedujo que en la actualidad el nivel de aguas al interior del

caño de acuerdo a la variabilidad del fondo y el comportamiento del nivel de aguas máximas a lo largo del cauce para los periodos de retorno de 2.33. 5. 10. 25. 50 y 100 años, el nivel de aguas supera tanto el borde izquierdo como el derecho del cauce en algunos puntos de curvatura, es decir, que el cauce no cuenta con la capacidad hidráulica suficiente para transportar el caudal de diseño correspondiente, lo cual podría generar desbordamientos y por tanto se presentarán inundaciones constantes en cada período o temporada de lluvias en las poblaciones cercanas al cuerpo de agua, más cuando se vienen presentando situaciones extremas debido al cambio climático.

Ahora bien, teniendo en cuenta las proyecciones y modelaciones hidráulicas (caudal de diseño con período de retorno de 100 años), el cauce tendrá la capacidad hidráulica suficiente para que no se presenten eventos de inundación extremos y prolongados en las áreas adyacentes al tramo intervenido.

El proyecto plantea que se mejorarán las condiciones ambientales del sector, se mitigarán los eventos de inundación y se coadyuvará en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Ciénaga de Oro.

4.1 BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Con la ejecución de las actividades objeto del contrato se pretende lograr que una vez las obras estén culminadas podamos tener los siguientes beneficios.

- **Restauración de los ecosistemas acuáticos y terrestres**: La recuperación de la conectividad hidrológica permitirá la restauración de hábitats naturales, tanto acuáticos como terrestres, que son esenciales para la biodiversidad local. Esto contribuirá a la regeneración de la flora y fauna autóctona, promoviendo un entorno más saludable y sostenible.

- **Mejora de la calidad del agua**: La recuperación de los ecosistemas del caño Aguas Prietas mejorará la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación y la promoción de procesos naturales de filtración, lo que garantizará un recurso hídrico más limpio y saludable para las comunidades cercanas.

- **Fortalecimiento de la conectividad hídrica**: Al restablecer la conectividad entre los diferentes cuerpos de agua y humedales a lo largo del caño, se facilitará el flujo natural de agua, lo que permitirá un mejor balance hídrico, crucial para la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y la agricultura en las zonas cercanas.

- **Recuperación de la biodiversidad y de especies en peligro**: El proyecto favorecerá la recuperación de especies nativas y la conservación de aquellas en riesgo, tanto acuáticas como terrestres. El restablecimiento de hábitats adecuados para la fauna contribuirá a la preservación de la biodiversidad en la región.

- **Aumento de la resiliencia frente al cambio climático**: La restauración ecológica fortalecerá la resiliencia de la región ante fenómenos climáticos extremos, como sequías o lluvias intensas. La conectividad hidrológica permitirá que los ecosistemas puedan adaptarse de manera más eficiente a los cambios en los patrones climáticos.

- **Beneficios sociales y económicos para las comunidades locales**: La mejora de la calidad del agua y el entorno natural brindará mejores condiciones de vida para las comunidades cercanas. Además, el proyecto promoverá el ecoturismo y otras actividades sostenibles que pueden generar nuevas fuentes de ingreso para la población local.

- **Fortalecimiento de la gestión ambiental**: A través de la implementación de este proyecto, se fortalecerán las capacidades de gestión ambiental local, promoviendo la participación comunitaria en la conservación de los recursos naturales y en la toma de decisiones relacionadas con la gestión hídrica y ecológica.

4.2 ESTADO INICIAL DE LA OBRA





Foto 1 y 2: Imágenes aéreas de K4+000





Foto 3 y 4: Imágenes aéreas de K5+000



Foto 5: Imágenes aéreas de K5+000





Foto 6 y 7: Imágenes aéreas de K6+000



Foto 8: Imágenes aéreas de K6+000





Foto 9 y 10: Imágenes aéreas de K7+000



Foto 11: Imágenes aéreas de K7+000





Foto 12 y 13: Imágenes aéreas de K8+000



Foto 14: Imágenes aéreas de K8+000





Foto 15 y 16: Imágenes aéreas de K8+440





Foto 17 y 18: Imágenes aéreas de K8+440

Con el proyecto, se pretende intervenir un tramo del caño Aguas Prietas en jurisdicción del municipio de Ciénaga de Oro, el cual se caracteriza por presentar una sección hidráulica reducida y que no tiene la capacidad hidráulica suficiente para transportar las aguas provenientes de la red de drenaje que inicia su recorrido en el municipio de Montería, pasa por el municipio de San Carlos y entrega al caño Aguas Prietas en el municipio de Ciénaga de Oro, la cual está conformada por el Arroyo Trementino, el arroyo Grande, la quebrada El Pital, el arroyo La Palma, el Caño San Carlos, el Arroyo charcón, el arroyo Torrentes y el Caño Sierra Chiquita (El Purgatorio).

La dinámica anteriormente descrita, explican en gran medida, la problemática que se presenta en el área objeto de estudio, donde miles de familias habitan y que se encuentran expuestas a inundaciones recurrentes en cada temporada de lluvias.

Realizando el diagnóstico detallado del estado del caño Aguas Prietas, se tiene lo siguiente:

- El cauce no tiene capacidad hidráulica para transportar el caudal de diseño (Tr: 100 años).
- El fondo del cauce es irregular y presenta tramos en contrapendiente que disminuyen la capacidad hidráulica y el flujo del agua de forma continua.
- Existe acumulación de residuos sólidos que reducen la capacidad hidráulica del caño.
- La pendiente del fondo actual está limitada por la topografía de la zona, caracterizada por ser una planicie con zonas inundables y cuerpos cenagosos.

El tramo está limitado por el comportamiento aguas abajo, debido a que hay secciones del cauce con secciones irregulares donde se generan remansos.

- Se evidencian procesos de sedimentación aguas abajo del tramo de estudio.
- El caño aguas abajo del tramo de estudio, no presenta sección hidráulica definida.
- Conforme la modelación hidráulica realizada al tramo del caño a intervenir (periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años), se evidencia que el nivel de las aguas en cada una de las secciones estudiadas, supera los bordes del cauce actualmente, lo que permite inferir que el tramo no cuenta con capacidad hidráulica suficiente para transportar el caudal de diseño.

Cabe indicar que dada la topografía de la zona y la naturaleza propia de este tipo de sistemas los procesos de sedimentación y acumulación de todo tipo de elementos al interior del cauce y cuerpos de agua del sector son acelerados y el normal drenaje de las aguas se ve afectado.

El proyecto plantea realizar la intervención de un tramo del caño de aguas prietas, entre las siguientes coordenadas geográficas:

REGIÓN	MUNICIPIO	COORDENADA INICIO		COORDENADA FINAL		CÓDIGO DIVIPOLA
		N	O	N	O	
		CORREGIMIENTO EL SIGLO VEREDA EL SALADO		CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ VEREDA EL HIGAL		
MEDIO SINÚ	CIENAGA DE ORO	8°56'20.27" 8.9389638	75°36'07.33" -75.602036	8°58'40.09" 8.977803	75°36'08.03" -75.602231	23189016 23189005

Cuadro 1. Ubicación geográfica del tramo del cauce en estudio. Fuente. Elaborado por la consultoría.

La sección hidráulica del canal se propone realizarse en forma trapezoidal con las siguientes características geotécnicas:

Abscisa	Base (m)	Altura (m)	Ancho Superior (m)	Ancho de Corona (m)	Talud interno del cauce (H:V)	Talud externo del cauce (H:V)
K8+440 a K4+000	31.00	4.50	41.50	1.50	1.5:1	1:1

Cuadro 2. Secciones típicas del cauce en estudio. Fuente. Elaborado por la consultoría.

Entre las abscisas K4+000 y K8+440, se propone una sección trapezoidal de ancho de base 31,0 m y alto de 4,5 m; con taludes internos de 1.5:1 (H:V) y externos 1:1 (H:V). La sección hidráulica de diseño, tendría las siguientes dimensiones:



Figura 1: Sección típica proyectada del cauce. Fuente: Elaborado por la Consultoría.

Entre las abscisas K4+620 y K4+680, K4+940 y K5+030 y K6+980 y K7+050, se propone realizar un revestimiento en piedra tipo RIP RAP, con el fin de controlar los procesos erosivos generados por las descargas de otros cauces. Dicho revestimiento tendría la siguiente sección:

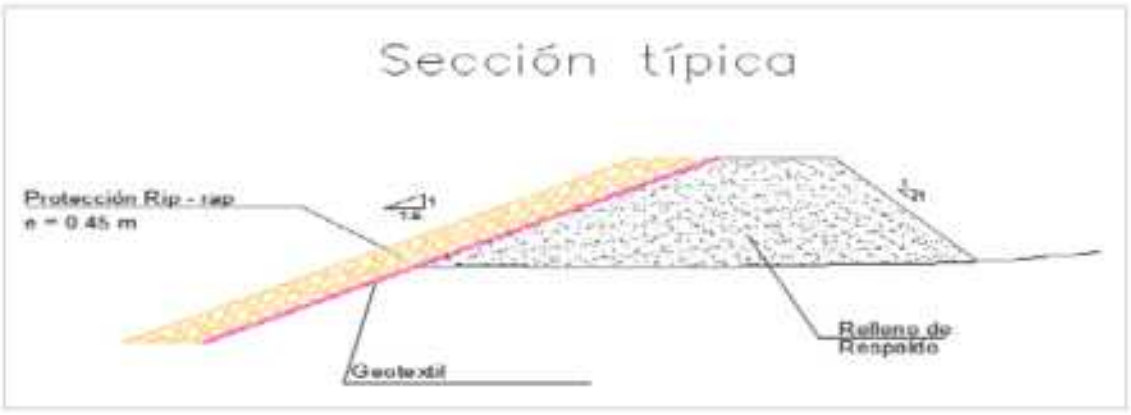


Figura 2. Sección típica proyectada del revestimiento. Fuente: Elaborado por la Consultoría.

Para este período se ha reportado por parte del contratista que el tramo a intervenir a lo largo de los 4.4 km presenta una vegetación espesa en donde se encuentra un gran número de árboles los cuales sí se desarrolla el proyecto de acuerdo a las condiciones de diseño iniciales, estos arboles se deben talar,

En este orden de ideas el proyecto tiene como finalidad la recuperación ecosistémica con énfasis en conectividad hidrológica, lo que implica restaurar y mejorar la calidad ecológica del ecosistema fluvial. El proyecto busca promover la biodiversidad y el equilibrio ecológico en la zona, lo cual debe ser compatible con la conservación de la vegetación existente y el manejo responsable del entorno.

La vegetación espesa de árboles puede representar un desafío para el diseño hidráulico inicial, ya que las raíces, troncos y follaje de los árboles pueden afectar la sección hidráulica del canal, reduciendo el caudal disponible y generando obstrucciones al flujo natural del agua. Sin embargo, talar estos árboles no es necesariamente la única opción, ya que existen alternativas que permiten conservar la vegetación sin comprometer los objetivos del proyecto.

El rediseño propuesto se enfoca en la adaptación de la sección hidráulica del canal para que se mantenga la conectividad hidrológica sin la necesidad de eliminar la vegetación existente. Algunas alternativas incluyen:

- Reducción del impacto hidráulico de la vegetación mediante técnicas de manejo adecuado que eviten la obstrucción del flujo de agua, como la poda selectiva de ramas que interfieren directamente con el caudal, sin destruir la estructura arbórea.
- Rehabilitación y reconfiguración del cauce para permitir un flujo adecuado sin necesidad de intervención destructiva. Esto puede incluir la creación de canales laterales o el ajuste de la pendiente para asegurar que el agua fluya de manera eficiente sin dañar los árboles.

- Beneficios Ambientales de Evitar la Tala de Árboles:

- Preservación del ecosistema: Los árboles proporcionan hábitats esenciales para la fauna local, actúan como estabilizadores de suelos, y juegan un papel importante en la filtración del agua y en la mejora de la calidad del aire. Mantener la vegetación es esencial para no alterar el equilibrio ecológico.
- Conservación de la biodiversidad: La vegetación arbórea es fundamental para la fauna local, por lo que evitar la tala de árboles ayuda a mantener la biodiversidad y a promover el refugio de especies.
- Minimización del impacto ambiental: El rediseño permitirá reducir el impacto ecológico del proyecto, cumpliendo con los principios de sostenibilidad y recuperación ecosistémica de una forma más respetuosa con el medio ambiente.

- Rediseño de la Sección Hidráulica con Enfoque en la Conservación:

- Optimización del flujo de agua sin talar: A través de la remodelación del canal y la modificación de su sección hidráulica, es posible asegurar que el agua circule adecuadamente sin que la vegetación interfiera negativamente. Se pueden emplear técnicas de modelado hidráulico para

determinar la sección ideal del canal, ajustando parámetros como la pendiente, el ancho y la profundidad, sin que esto implique la tala de los árboles.

- Manejo sostenible de la vegetación: Realizar un manejo adecuado de los árboles y la vegetación circundante mediante poda selectiva, control de especies invasoras y la implementación de prácticas de manejo sostenible. Esto garantiza que el flujo hidráulico sea eficiente, sin necesidad de realizar alteraciones destructivas en el paisaje.

- Ajuste de la Propuesta según la Hidrodinámica Local: Para asegurar que el rediseño del canal funcione eficientemente, se debe realizar un análisis detallado de la hidrodinámica local, considerando el comportamiento del caudal, la topografía del terreno y la interacción de la vegetación con el flujo de agua. Esto incluiría:

- La simulación hidráulica para comprobar el comportamiento del canal con los árboles presentes.
- Verificar que el nuevo diseño mantenga la conectividad hidrológica sin comprometer la capacidad de evacuación de aguas.
- Ajustar el diseño para permitir el paso del agua de manera fluida, optimizando el flujo sin requerir la tala de vegetación significativa.

- Resultados Esperados:

- Conservación de la vegetación y ecosistemas asociados: Se logrará una recuperación ecosistémica sin los impactos negativos de la tala masiva de árboles.
- Mejora de la conectividad hidrológica sin comprometer la biodiversidad. El proyecto alcanzará los objetivos de restauración hidrológica mientras preserva los componentes naturales del ecosistema.
- Cumplimiento de objetivos sostenibles: El rediseño permitirá cumplir con los objetivos del proyecto de una forma ecológicamente sostenible, manteniendo la vegetación y promoviendo una mejor gestión del agua.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO

Dentro de las actividades que se tienen contempladas ejecutar y que están inmersas dentro del contrato de obra, están las siguientes actividades:

1. Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.

La optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra tiene como objetivo mejorar la capacidad de conducción de las aguas en un cauce natural o modificado, asegurando un flujo eficiente y evitando problemas de erosión, sedimentación y desbordes. Esta actividad se lleva a cabo mediante dos procesos principales:

- **Excavación en material común**:
  Se realiza la remoción de materiales presentes en el cauce, como tierra, sedimentos, piedras con el propósito de adecuar las características geométricas de la sección del cauce. La excavación puede ser parcial o total, dependiendo de las necesidades del proyecto y de las características del cauce en su estado natural. Este proceso busca garantizar que el cauce tenga las dimensiones y la forma adecuadas para asegurar que el caudal de agua pueda ser transportado de manera eficiente, sin provocar acumulación excesiva de sedimentos o alteraciones en el flujo natural.
- **Rectificación de taludes**:
  Consiste en la adecuación y estabilización de las paredes del cauce para evitar deslizamientos y erosión. Se lleva a cabo mediante la modificación de los taludes (paredes laterales del cauce) para corregir irregularidades en su perfil, asegurando que tengan una pendiente adecuada que facilite el flujo del agua sin que se presenten riesgos de colapsos o acumulación de materiales que bloqueen el cauce. Esta acción puede implicar la eliminación de material inestable y el perfilado de los taludes, creando superficies más suaves que permitan un mayor control sobre el flujo del

agua, reduciendo riesgos de desbordamiento y garantizando la estabilidad a largo plazo.

2. Conformación de diques y dentellones a maquina con material seleccionado de la excavación (específicamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado).

La actividad de conformación de diques y dentellones tiene como objetivo la construcción de barreras o estructuras en el cauce, utilizando material proveniente de la excavación previamente realizada. Este proceso es fundamental para el control de flujos hídricos, la protección de áreas adyacentes y la regulación del paso del agua en ciertas zonas, como en los sistemas de drenaje o en áreas de embalses. La conformación se lleva a cabo con maquinaria pesada y utilizando materiales específicos, como arcilla e impermeables, debidamente seleccionados y compactados para asegurar su efectividad.

Los pasos principales de esta actividad son los siguientes:

- **Conformación de diques:** Se construyen barreras lineales (dique) en el cauce o en zonas específicas donde se desea controlar o redirigir el flujo de agua. Los diques son estructuras de contención que tienen como objetivo evitar el desbordamiento o la erosión en áreas específicas.

  La construcción se realiza utilizando material arcilloso e impermeable, proveniente de la excavación, el cual se selecciona por sus propiedades de baja permeabilidad, lo que impide que el agua se infiltre a través de la estructura.
- **Conformación de dentellones:** Los dentellones son pequeñas elevaciones o salientes que se colocan a lo largo de los diques para aumentar la estabilidad de la estructura y mejorar su resistencia al flujo de agua. La creación de estos elementos geométricos se realiza con la misma técnica y material que el dique, permitiendo que la estructura final sea más

robusta frente a la acción del agua y con una mayor capacidad para resistir presión hidráulica.

- **Uso de material arcilloso e impermeable**: El material seleccionado para la conformación de los diques y dentellones debe ser arcilloso e impermeable, debido a sus propiedades naturales para evitar la filtración de agua. Este tipo de material es especialmente adecuado para construir barreras efectivas que mantengan el agua dentro de los límites establecidos sin que se filtre hacia el terreno circundante.
- **Compactación del material:** Durante la conformación de los diques y dentellones, se utiliza maquinaria especializada para la compactación del material. Esto es crucial para garantizar que la estructura sea lo suficientemente densa y resistente para soportar las presiones generadas por el agua. La compactación también reduce el riesgo de asentamientos y aumenta la estabilidad de la estructura a lo largo del tiempo.

3. Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral, distancia mayor de 1000 metros.

Esta actividad tiene como objetivo el transporte y retiro del material excavado en el proyecto, así como de material proveniente de zonas de préstamo lateral, con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones del diseño o liberación de espacio para las siguientes fases del proyecto. El material retirado puede incluir tierra, escombros o cualquier otro material que no se utilice en el proceso de construcción o que se haya extraído para cumplir con las obras de adecuación del terreno.

Los puntos clave de la actividad son los siguientes:

- **Retiro de material de excavación**: El material extraído durante el proceso de excavación, que puede consistir en tierra, grava, piedras u otros

sedimentos, debe ser transportado fuera de la zona de trabajo. Este material puede ser reutilizado o dispuesto en sitios específicos, según los requisitos del proyecto. El retiro de este material es necesario para liberar el área de trabajo, mantener las condiciones de seguridad en el sitio y preparar el terreno para otras actividades constructivas.

4. Revestimiento tipo RIP RAP para protección de taludes y entrada de cauces e= 0.45m: Incluye materiales y mano de obra.

La actividad consiste en la aplicación de un revestimiento tipo RIP RAP para la protección de taludes y entradas de cauces con el fin de evitar la erosión del terreno debido a la acción del agua. Este revestimiento está compuesto por piedras de tamaño adecuado, dispuestas de manera específica para formar una capa resistente que proteja la estructura del cauce o talud.

Los elementos clave de esta actividad son los siguientes:

- **Revestimiento tipo RIP RAP**: El *RIP RAP* es un tipo de revestimiento estructural que se utiliza para proteger taludes, márgenes de cauces y otras áreas expuestas al flujo de agua. Está compuesto por piedras de gran tamaño que se colocan de manera densa y ordenada sobre la superficie a proteger, de forma que impidan la erosión y el deslizamiento del material subyacente. Estas piedras suelen ser seleccionadas por su resistencia a la abrasión y su capacidad para resistir la presión del agua sin desplazarse fácilmente.
- **Protección de taludes y entrada de cauces**: El revestimiento de RIP RAP se utiliza para proteger tanto los taludes laterales de un cauce, como las áreas de entrada y salida del agua, que son particularmente vulnerables a la erosión. Al ser áreas donde el flujo de agua genera fuerza y movimientos en el terreno, el revestimiento ayuda a estabilizar el suelo, reduciendo el riesgo de deslizamientos y desgaste del talud debido a la acción del agua.

1. **Espesor del revestimiento (e = 0.45m)**: El revestimiento de RIP RAP se instalará con un espesor específico de 0.45 metros, lo que asegura una cobertura adecuada para las condiciones hidráulicas del área. Este espesor proporciona suficiente protección contra la erosión y permite una distribución uniforme del peso de las piedras, lo cual es clave para la estabilidad a largo plazo del revestimiento.
2. **Materiales y mano de obra**: La actividad incluye tanto los materiales necesarios para la colocación del revestimiento como la mano de obra especializada para realizar la instalación. Los materiales incluyen las piedras seleccionadas para el RIP RAP, que deben cumplir con las especificaciones de tamaño y calidad requeridas para garantizar su durabilidad y efectividad. La mano de obra abarca tanto la preparación del terreno como la disposición y colocación precisa de las piedras, asegurando que el revestimiento quede firme y estable.

5. Instalación de Geotextil NT 2000 para protección de taludes y entrada de cauces. Incluye materiales, equipos y mano de obra.

La actividad consiste en la instalación de Geotextil NT 2000, un material utilizado para la protección de taludes y la entrada de cauces, con el fin de evitar la erosión y mejorar la estabilidad del terreno. Esta tarea incluye el suministro e instalación del Geotextil, así como los materiales, equipos y la mano de obra necesaria para su correcta implementación. El Geotextil NT 2000 se coloca en áreas específicas, garantizando que se cubran adecuadamente las superficies expuestas a erosión o a procesos de desestabilización por el agua. Además, se asegurará la correcta fijación y ajuste del material para maximizar su eficacia en la protección de los taludes y cauces.

6. LOCALIZACIÓN DE LA VALLA

Se cuenta con el diseño de la valla el cual ha sido aprobado por parte de la Supervisión, está actualmente se encuentra en elaboración, ya se cuenta con el espacio para la instalación, se espera que en los primeros días del mes de Marzo de 2025, se pueda estar realizando dicha instalación.



Imagen 1: Banner de Valla para ser instalada en el proyecto.

7. FICHA GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No	060 DE 2024
OBJETO	"RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS
CONTRATISTA	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
REP. LEGAL CONTRATISTA	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER RECUPERACION
REP. LEGAL INTERVENTORIA	HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
SUPERVISOR CVS	CESAR BUELVAS MERCADO
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MIL TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($8.031.375.289),
PLAZO DE EJECUCIÓN	(10) DIEZ MESES
FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024

Tabla 1. Ficha del contrato

8. GARANTÍAS VIGENTES DEL CONTRATO

De acuerdo con las obligaciones del contratista, estipuladas en el contrato de obra, el contratista debe mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras

8.1 CUMPLIMIENTO CON FECHA DEL ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA	NACIONAL DE SEGUROS		
N° DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO	400050213 - ANEXO 2	
RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento general del contrato	$1.606.275.057.80	30/12/2024	30/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	$803.137.528.90	30/12/2024	30/10/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$3.212.550.115.00	30/12/2024	30/04/2026
Estabilidad de la obra	$1.606.275.057.80	Ampara	2 años

Tabla 2. Póliza de Cumplimiento

8.2 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CON FECHA DEL ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA	NACIONAL DE SEGUROS		
N° DE PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	400050214 - ANEXO 2	
RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Predios Laborales y Operaciones	$711.750.000,00	30/12/2024	30/10/2025
Contratistas y subcontratistas	$711.750.000,00	30/12/2024	30/10/2025
Vehículos propios y no propios	$711.750.000,00	30/12/2024	30/10/2025

Tabla 3. Póliza responsabilidad civil extracontractual

COMPAÑÍA	NACIONAL DE SEGUROS		
N° DE PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	400050214 - ANEXO 2	
RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Responsabilidad civil patronal	$711.750.000,00	30/12/2024	30/10/2025
Daño emergente y lucro cesante	$711.750.000,00	30/12/2024	30/10/2025
Perjuicios extrapatrimoniales	$711.750.000,00	30/12/2024	30/10/2025

9. ACTIVIDADES A EJECUTAR

El presente contrato tiene para realizar las siguientes actividades que se describen a continuación.

"RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

PRESUPUESTO OBRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**Preliminares**				
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	4.440,00	$ 3.188,0	$ 14.154.720,0
2					
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	m3	228.449,00	$ 17.223,0	$ 3.934.577.127,0
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material seleccionado de la excavación (especificamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado)	m3	15.005,00	$ 33.446,0	$ 501.857.230,0
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral. Distancia mayor de 1.000 metros.	m3	213.444,00	$ 2.966,0	$ 633.074.904,0
2.4	Revestimiento tipo RIP RAP para protección de taludes y entrada de cauces. e = 0.45 m. Incluye materiales y mano de obra.	m3	4.509,00	$ 174.286,0	$ 785.855.574,0
2.5	Instalación de geotextil NT 2000 para protección de taludes y entrada de cauces. Incluye materiales, equipos y mano de obra.	m2	10.119,00	$ 23.781,0	$ 240.639.939,0
				COSTO DIRECTO OBRAS	**$ 6.110.159.494,0**
				COSTOS INDIRECTOS (AUI) 30,0%	**$ 1.833.047.848,0**
				IVA SOBRE UTILIDAD (U) 19,0%	**$ 58.046.515,0**
				COSTO TOTAL OBRAS	**$ 8.001.253.857,0**
3	**Realizar actividades de sensibilización**				
3.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	TALLER	10,0	$ 2.109.344,0	$ 21.093.440,0
3.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	TALLER	2,0	$ 2.109.344,0	$ 4.218.688,0
				COSTO DIRECTO ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	**$ 25.312.128,0**
				IVA (19%)	**$ 4.809.304,0**
				COSTO TOTAL ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	**$ 30.121.432,0**
				COSTO TOTAL (OBRAS + SENSIBILIZACION)	**$ 8.031.375.289,0**

Tabla 4. Presupuesto de obra Inicial

10. CRONOGRAMA DE OBRA

Ver gráfica de cronograma de obra para el corte del 28 de febrero de 2025.

En cuanto al cronograma de obra tenemos los siguientes % de ejecución:

% de avance de obra programado = 13.37%

% de avance de obra ejecutado = 13.37%

El porcentaje antes mencionado corresponde al avance en la actividad de optimización de la sección hidráulica del canal.

10.1 EQUIPOS Y PERSONAL DEL CONSORCIO

Equipos y Maquinaria

EQUIPO Y MAQUINARIA	CANTIDAD
Estación Total	1
Nivel Automático	2
Equipo GPS	1
RTK	1
GPS	1
RETROEXCVADORA KOBLECO 211	1
RETROEXCAVADORA HYUNDAI HX 2205	1
RETOEXCAVADORA XCMG XE 210 CU	1

Tabla 5: Equipos y maquinaría

En este mes las actividades que se reportan son las que están relacionadas con la optimización de la sección hidráulica del canal, iniciando desde el K0+000 hacia aguas arriba del proyecto en intervención, teniendo un total de intervención de 4.4 km.

Personal:

Para este mes el personal que se reporta en la tabla 6 es el personal que se exige en el pliego de condiciones.

CONTRATO DE OBRA 060-2024 "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"						
PERSONAL PROFESIONAL INCLUIDO EN LA PROPUESTA						
NOMBRE	Nº DE CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	DEDICACIÓN (%)	SALARIO MENSUAL
ROSIBEL CHAVERRA CAICEDO	52.254.090	DIRECTOR DE OBRA	30/12/2024		50,00%	$ 2.150.000,00
JOSE FAWCETT HERNÁNDEZ MIER	1.042.424.437	RESIDENTE DE OBRA 1	30/12/2024		100,00%	$ 1.750.000,00
JOSE FRANCISCO FIORILLO SARMIENTO	8.686.400	RESIDENTE DE OBRA 2	30/12/2024		100,00%	$ 1.750.001,00
NIKOLLE TATIANA FETECUA GUTIERREZ	1.075.652.455	PROFESIONAL SOCIAL	30/12/2024		100,00%	$ 1.750.000,00
MÓNICA ORTEGA MORENO	52.547.455	ESPECIALISTA AMBIENTAL	30/12/2024		100,00%	$ 1.750.000,00
GERMÁN MONSALVE SAENZ	10.221.652	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	30/12/2024		100,00%	$ 1.750.000,00
LUIS FERNANDO GUERRERO ALARCON	80.539.487	ESPECIALISTA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	30/12/2024		100,00%	$ 1.750.000,00
CLEIDER BERASTEGUI BARRANCO	1.067.940.558	INGENIERO AUXILIAR 1	30/12/2024	31/01/2025	100,00%	$ 1.423.500,00
OSCAR CORONADO	78036613	OFICIOS VARIOS	30/12/2024		100,00%	$ 1.423.500,00
SANTIAGO LOPEZ BALLESTEROS	1062424908	OFICIOS VARIOS	30/12/2024		100,00%	$ 1.423.500,00
GLINDON JOSE PEREZ YANEZ	1007765951	VIGILANTE	30/12/2024	17/02/2025	100,00%	$ 1.423.500,00
NAYID SALOMON CORONADO RETAMOSO	78.038.246	VIGILANTE	18/02/2024		100,00%	$ 1.423.500,00
JAIDIR ANTONIO ORTEGA ANTONIO	1.068.661.447	OFICIOS VARIOS	18/01/2025		100,00%	$ 1.423.500,00

Tabla 5: Personal profesional AUI

CONTRATO DE OBRA 060-2024 "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"					
PERSONAL INDIRECTO DE OBRA					
NOMBRE	Nº DE CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	DEDICACIÓN (%)
NATALY GONZALES TORRES	1.003.434.150	AUX SISO	22/01/2025		100%
ALBERT TAMARA NIETO	7.369.165	CADENERO	7/01/2025		100%
JULIO CESAR BENAVIDEZ ESPINO	77.165.580	TOPOGRAFO	7/01/2025	15/02/2025	100%
FABIAN ANDRES CASTILLO OSORIO	1.019.082.635	OPERADOR HYUNDAI HX 2205	10/02/2025		100%
ALEXANDER NICANOR VELAZQUEZ DIAZ	10.966.603	OPERADOR XCMG XE210CU	10/02/2025		100%
DANIEL EDUARDO BOHORQUEZ HERNANDEZ	1.104.010.316	OPERADOR KOBELCO 211	11/02/2025	21/02/2025	100%
ARNULFO MANUEL MONTIEL ROMERO	7.369.636	TOPOGRAFO	19/02/2025		100%

Tabla 6: Personal administrativo

11. ACTIVIDADES REALIZADAS PERÍODO 1 - 28 DE FEBRERO DE 2025

11.1 COMPONENTE SOCIAL

Para este período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025 desde el componente social se realizaron las siguientes actividades para dar cumplimiento a lo establecido el PGIO.

La trabajadora social del Consorcio Punta Yánez CVS para este mes reporta las siguientes actividades:

El día 03 de Febrero del 2025, se generó un encuentro comunitario con miembros de la veeduría ciudadana denominada “Recuperación ecosistémica de un tramo del caño aguas prietas de la vereda el Higal del corregimiento de Punta de Yánez”, en el marco del contrato de obra N°060-2024.

El encuentro fue generado con el fin de acompañar a los-as participantes de la veeduría y orientarlos en la construcción del reglamento interno de la veeduría ciudadana, se les dieron pautas para que estos construyeran su manual de funciones en cuanto a:

-Función principal de la veeduría ciudadana- “Recuperación ecosistémica de un tramo del caño aguas prietas de la vereda el Higal del corregimiento de Punta de Yánez”, en el marco del contrato de obra N°060-2024, de manera que puedan representar los intereses de la comunidad, evitando cualquier impacto negativo en la salud pública, infraestructura o el medio ambiente.

-Funciones principales de la veeduría: Vigilancia del cumplimiento del plan de limpieza, control de uso y recursos, informar a la comunidad del avance de actividades de obras, recoger inquietudes comunitarias entre otros.

-Estructura orgánica y funciones de los órganos directivos: Se les orientó en cuanto las funciones y tareas específicas del presidente, vicepresidente, secretario, vocales.

-Frecuencia de las reuniones, mensuales, extraordinarias y visitas al canal.

-Normas de ética y conducta de la veeduría ciudadana.

-Prohibiciones de la veeduría ciudadana etc.

De la misma manera se les entregó el acta de constitución de la veeduría ciudadana, el listado de asistencia de elección de veeduría y se les dieron pautas en cuanto a la construcción del reglamento interno, con el fin que los veedores tuvieran las claridades, realizaran los tramites siguientes de inscripción de veeduría ciudadana en la personería y les den la resolución para que puedan ejercer la veeduría en el marco del proyecto iniciado.

Así mismo, se creó un grupo de whatsApp, con el fin de crear una constante comunicación con las actividades a desarrollar en el marco del proyecto y se les facilitó el correo del consorcio punta Yánez CVS en caso del solicitar algún documento relacionado con el contrato de obra.




Imagen 1-2 : Reunión con la veeduría en el marco del contrato de obra N° 060-2024

Se realizó recorrido del PR 08 al PR 12, con el fin de identificar los propietarios que tienen predios en la zona derecha en relación con el sentido del flujo del caño Aguas Prietas.

Este acercamiento con el fin de identificar el estado de la cerca de cada propietario que está frente al caño Aguas prietas, se observaron las condiciones y características de las cercas antes de realizar los trabajos de obra en el marco del proyecto.

En este sentido se logró acercamiento con once propietarios, de los cuales se levantaron 11 actas de vecindad de las cercas que tienen frente al caño aguas prietas, zona de intervención del proyecto.

En estas actas se dejó documentado el estado de la viviendas, cercas, potreros, entre otros aspectos importantes y relevantes.

De manera general se puede decir que las cercas observadas se encuentran en estado regular, la mayoría están construidas con postes redondos, estillas, alambre de púa y alambre eléctrico, se encontró cercas que no tienen alambres, sólo hay nacederos de árboles, se encontró cerca que tienen tramos cubiertos de vegetación totalmente.

Así mismo, se encontró en cuatro predios, que en la orilla de la cerca tienen corrales y embarcaderos, los cuales fueron identificados y se tomó evidencia fotográfica de cada uno de ellos documentando las condiciones encontradas.

Queda como resultado y producto de estas dos actividades:

-11 actas de vecindad

Los once Propietarios visitados fueron:

1-Jorge Eliecer Vásquez Pacheco.

2-Jorge Vidal Pacheco.

3-Henry Montalvo.

4.Ines Janeth Morales Suárez.

5-Francisco Javier López Sibaja-Predio 1

6-Francisco Javier López Sibaja-predio 2.

7.Génesis Regino.

8.Rosa pacheco de Osorio.

9.Fabian Romero González.

10.Marcela Retamoso.

11.Nadid Viggiani.





Imagen 3-4: Acercamiento con los propietarios de los predios, para la realización de actas de vecindad





Imagen 5-6: Acercamiento con los propietarios de los predios, para la realización de actas de vecindad

11.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

Para el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

11.3.1 OPTIMIZACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL CAUCE EN TIERRA

Esta actividad está relacianada con la excavacion y ampliacion de la zona del caño aguas prietas, con maquinaria como lo es la retroexcavadora de oruga.

Durante este mes se realizó esta actividad con el acompañamiento de la comitiva topografica de obra y de interventoría, se controlaron los niveles de cota de fondo de excavación con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en los diseños. Se reporta la realización de actividades que tiene que ver con la realización de cortes en la sección hidráulica del caño de aguas prietas, se realizan las actividades con la maquinaria descrita en el frente de obra.

De acuerdo a las actividades que se estan realizando permitirá que se incremente la capacidad para transportar mayores volumenes de agua , lo cual es importante en los períodos de lluvias intensas o cuando hay aumento del canal, con esto se puede garantizar o prevenir el desbordamiento.

Para este período como ya se ha indicado se inciaron las actividades aguas debajo de la intervención iniciando desde el K0+000, se cuenta en campo con maquinaria (retroexcavadoras) para las excavaciones y para el retiro de material se cuenta con volquetas, los retiros del material se disponen en sitios solicitado por la comunidad que lo requiera bien sea para el relleno de terrenos que se encuentran bajos e inundables.

A la fecha se tiene un buen rendimiento en las actividades de excavaciones, sin embargo se puede indicar que durante los días 18,19 y 20 de febrero 2025, no se pudieron realizar actividades en el caño de aguas prietas, ya que desde el 17 de febrero de 2025 se evidenciaron fuertes lluvias en el sector y en areas

aledañas, agua que influyó directamente en los niveles del cauce del caño, las actividades durante estos 3 días se tivieron que suspender ya que los altos niveles del caño, repercutian directamente en la seguridad de la maquinaria y tdoos los trabajadores en general.




Imagen 7-8: Llegada de retroexcavadoras a obra caño aguas prietas Punta Yánez.




Imagen 9-10: Excavación caño aguas prietas Punta Yánez.





Imagen 11-12: Limpieza, descapote a las orillas del caño aguas prietas





Imagen 13-14: Control de cartera de excavación.





Imagen 15-16: Excavación a orillas del caño aguas prietas Punta Yánez.





Imagen 17-18: Optimización de la sección hidráulica del canal





Imagen 17-18: Comisión topográfica controlando niveles de excavación.





Imagen 19-20: Niveles alto de caño (suspendida actividades)





Imagen 21-22: Niveles alto de caño (suspendida actividades)





Imagen 23-24: Niveles alto de caño (suspendida actividades)





Imagen 25-26: Niveles alto de caño (suspendida actividades)





Imagen 27-28: Actividades de excavación después de la subida de niveles del caño Aguas Prietas.

12. CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LA ZONA DEL PROYECTO.

A continuación, se muestra la tabla de precipitaciones del mes de enero con respecto a la estación Meteorológica el Salado (13075020) perteneciente al instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales IDEAM.

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (24/02/2025 18:07)

Nombre estacion:	SALADO EL [13075020]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Climática Ordinaria
Latitud:	8.9138888890	**Longitud:**	-75.58222222	**Elevación:**	40
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA	**Area Operativa:**	Area Operativa 02 - Atlánti	**Departamento:**	Cordoba
Municipio:	Ciénaga De Oro	**Fecha instalacion:**	15/10/1964 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/02/2025 00:00-24/02/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (conven	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-02-01 00:00	0	Preliminar
2025-02-02 00:00	0	Preliminar
2025-02-03 00:00	0	Preliminar
2025-02-04 00:00	0	Preliminar
2025-02-05 00:00	0	Preliminar
2025-02-06 00:00	0	Preliminar
2025-02-07 00:00	0	Preliminar
2025-02-08 00:00	0	Preliminar
2025-02-09 00:00	1.4	Preliminar
2025-02-10 00:00	0	Preliminar
2025-02-11 00:00	0	Preliminar
2025-02-12 00:00	0	Preliminar
2025-02-13 00:00	4.2	Preliminar
2025-02-14 00:00	4.8	Preliminar
2025-02-15 00:00	1.4	Preliminar
2025-02-16 00:00	0	Preliminar
2025-02-17 00:00	23.2	Preliminar
2025-02-18 00:00	7.2	Preliminar
2025-02-19 00:00	0	Preliminar
2025-02-20 00:00	0	Preliminar
2025-02-21 00:00	0	Preliminar
2025-02-22 00:00	0	Preliminar
2025-02-23 00:00	0	Preliminar

Durante este periodo, las condiciones climáticas en la zona del proyecto se caracterizaron principalmente por días soleados, aunque se presentaron, nuvarrones, se presentaron lluvias en 6 de los 23 días del periodo que se estan reportando, las cuales no afectaron el normal desarrollo de las obras. A continuacion se presente el resumen de temperaturas diarias durante el mes de Febrero de 2025.

13. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO.

Avance físico ejecutado Mes: 13.37%
Avance financiero: $1.073.750.589
Avance físico ejecutado acumulado: 13.60%
Avance financiero acumulado: $1.092.286.195
Avance programado: 13.60%

14. CONCLUSIONES

Para este período de acuerdo a las actividades adelantadas en los 28 días de ejecución del contrato, se puede concluir lo siguiente:

A lo largo del mes se realizaron actividades de control de niveles de excavación con los equipos de la comisión topográfica que se tiene en campo.

A la fecha de presentación de este informe se tuvo un buen rendimiento en cuanto a la optimización de la sección hidráulica del canal, se realizaron los cortes de acuerdo a los niveles establecidos en los diseños.

Durante los días comprendidos entre el 18 – 20 de Febrero se tuvieron 3 dias de suspensión debido a los altos niveles del caño de aguas prietas, el alza en los niveles del caño se debió a las fuertes lluvias presentadas desde el día 17 de febrero de 2025, las lluvias incidieron directamente en el punto de intervención, se puede indicar que la zona a intervenir tiene influencia directa de algunos afluentes de agua, lo cual hacen que el caño principal arrastre un gran volumen de agua en los días de alta pluviosidad, es por esto que las intervención en la ampliación de la sección hidráulica del canal se hacen para que la capacidad hidráulica del canal aumente.

Se puede indicar además que durante los recorridos en obra y la localización y replanteo de la obra hay algunos punto de intervención a lo largo de los 4.4 km hay punto en donde de acuerdo al diseño establecido entregado por la entidad contratante existe una vegetación bastante espesa, con arboles de gran tamaño y nativos de la región, por lo que de acuerdo al comité del día 20 de Enero de 2024, se indicó que la documentación referente a la implantación del proyecto frente a las condiciones actualizadas se encuentra en revisión por parte de los profesionales de la Interventoría, sin embargo indican que han evidenciado la problemática y este proyecto debe entrar en un estudio y plantearse un rediseño

debido a que el ser un proyecto con énfasis ecosistémico no se puede realizar un deforestación, por lo que se debe entregar una nueva sección el cual cumpla con las capacidades hidráulicas de la sección inicial y a su vez pueda se desarrollado sin afectar en gran medida la vegetación existente de la zona ya que esto conllevaría a un impacto ambiental, el contratista se compromete a realizar la entrega de los rediseños.

Se han realizado acercamientos con la comunidad en general para realizar las actas de vecindad de los predios que se encuentran aledaños a la intervención del caño, la comunidad ha sido receptiva y atendido los acercamientos que a realizado la trabajadora social del proyecto.

"RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"						AVANCE DE OBRA			ACUMULADO		
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS						AVANCE MES 2					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**%**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**%**
1	**Preliminares**						**$ 14.154.720,00**			**$ 14.154.720,00**	
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	4.440,0	$ 3.188,0	$ 14.154.720,0	0,00	$ 0,00	0,00%	4440,00	**$ 14.154.720,00**	100%
2	**Movimientos de Tierra**						**$ 0,00**			**$ 0,00**	
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	m3	228.449,0	$ 17.223,0	$ 3.934.577.127,0	40257,50	$ 693.354.923,00	17,62%	40257,50	$ 693.354.923,00	17,62%
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material seleccionado de la excavación (específicamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado)	m3	15.005,0	$ 33.446,0	$ 501.857.230,0	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral. Distancia mayor de 1.000 metros.	m3	213.444,0	$ 2.966,0	$ 633.074.904,0	42688,80	$ 126.614.981,00	20,00%	42688,80	$ 126.614.981,00	20,00%
2.4	Revestimiento tipo RIP RAP para protección de taludes y entrada de cauces. e = 0.45 m. Incluye materiales y mano de obra.	m3	4.509,0	$ 174.286,0	$ 785.855.574,0	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.5	Instalación de geotextil NT2000 para protección de taludes y entra dade cauces. Incluye materiales, equipos y mano de obra.	m2	10.119,0	$ 23.781,0	$ 240.639.939,0	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
				COSTO DIRECTO OBRAS	**$ 6.110.159.494,0**		**$ 819.969.904,00**	13,42%		**$ 834.124.624,00**	13,65%
				ADMINISTRACION 23,0%	$ 1.405.336.684,0		$ 188.593.078,00	13,42%		$ 191.848.664,00	13,65%
				UTILIDAD 5,0%	$ 305.507.975,0		$ 40.998.495,00	13,42%		$ 41.706.231,00	13,65%
				IMPREVISTO 2,0%	$ 122.203.189,0		$ 16.399.398,00	13,42%		$ 16.682.492,00	13,65%
				COSTOS INDIRECTOS 30,0%	**$ 1.833.047.848,0**		**$ 245.990.971,00**	13,42%		**$ 250.237.387,00**	13,65%
				IVA SOBRE UTILIDAD 19,0%	**$ 58.046.515,0**		$ 7.789.714,00	13,42%		$ 7.924.184,00	13,65%
				COSTO TOTAL OBRAS	**$ 8.001.253.857,0**		**$ 1.073.750.589,00**	13,42%		**$ 1.092.286.195,00**	13,65%
3	**Realizar actividades de sensibilización**										
3.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	TALLER	10,0	$ 2.109.344,0	$ 21.093.440,0	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	**$ 0,00**	0%
3.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	TALLER	2,0	$ 2.109.344,0	$ 4.218.688,0	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	**$ 0,00**	0%
					$ 25.312.128,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0%
				IVA (19%)	**$ 4.809.304,0**		**$ 0,00**	0,00%		**$ 0,00**	0%
				COSTO TOTAL ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	**$ 30.121.432,0**		**$ 0,00**	0,00%		**$ 0,00**	0%
				COSTO TOTAL (OBRAS + SENSIBILIZACION)	**$ 8.031.375.289,0**		**$ 1.073.750.589,00**	13,37%		**$ 1.092.286.195,00**	13,6%

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE REUNIÓN**	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar acercamiento con la propietaria del predio para pedir permiso y disponer el material extraído del caño en su predio, como también quitar la cerca para disponer el material extraído y pasar la máquina en caso de ser necesario.

TEMAS TRATADOS

1	Acercamiento con la propietaria del predio
2	Solicitud de permiso
3	Acuerdos con la propietaria del predio.
4	Firma del acta de compromiso.
5	Cierre

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE REUNIÓN**	

DESARROLLO DE AGENDA

El día 10 de febrero del 2025, se realizó acercamiento con la propietaria del predio La señora Génesis Regino, con el fin de solicitar permiso para:

- Disponer el material extraído del caño en su predio.
-Quitar la cerca, para poder disponer el material en su predio.
-Pasar la maquina en parte de su predio

La señora Génesis Regino, manifiesta dar el permiso solicitado por el contratista, para realizar los trabajos de obra en el marco del proyecto.

Así mismo, solicita que el material extraído del caño se le extienda en frente de su vivienda y al lado de su predio con el fin de rellenar un espacio bajo que se encuentra.

En este sentido, el contratista se comprometió con la propietaria del predio, teniendo en cuenta la recomendación dada, sin generar afectaciones en su predio.

Se aprovechó el acercamiento, realizando un recorrido por el predio de la señora Génesis con el fin de identificar el estado de la cerca antes de realizar los trabajos de obra.

Se firmó el acta de compromiso y se hizo el cierre del acercamiento agradeciendo a la propietaria del predio por la atención prestada.

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE REUNIÓN**	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**RESPONSABLE**
Tener en cuenta la recomendación de la propietaria del predio, para dar cumplimiento.	Sujeto a los trabajos de obra en campo	Consorcio Punta Yánez CVS.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.



Acercamiento con la propietaria del predio.

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS ASISTENCIA	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

TEMA: Acercamiento con la propietaria del predio, para Solicitud de permiso

Objetivo de la Reunión: Solicitud de permiso a la señora Génesis Regino (propietaria del Predio), Con el fin de solicitar permiso para disponer el material extraído del Caño.

Lugar: Poblado el Higal Ciénaga de oro | Fecha: 10/02/2025 | Hora: 1:20 pm.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Genesis Regino	1.068 697 509	Propietaria	3225473355	—	GENESIS REGINO
Nikoletxano Peñaranda	1075.682455	Profesional Social	3023819382	—	Nikoletxano Peñaranda

Powered by CamScanner

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE REUNIÓN**	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Acompañar a los-as participantes de la veeduría ciudadana en el marco del proyecto y orientarlos en la construcción del reglamento interno y entrega de documentos de conformación de veeduría ciudadana en el marco del proyecto.

TEMAS TRATADOS

1	Apertura
2	Acompañar a la veeduría ciudadana, dándole claridades en la construcción del reglamento interno de la veeduría ciudadana conformada en el marco del contrato de obra N°060.
3	Entrega de documentos de inscripción de veeduría ciudadana.
4	Comentarios
5	Cierre

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE REUNIÓN**	

DESARROLLO DE AGENDA

El día 03 de febrero del 2025, se inició la reunión con un espacio de bienvenida y saludo a los miembros de la veeduría ciudadana.
Así mismo se le explicó a los-as participantes el objetivo del encuentro comunitario con la veeduría ciudadana denominada ***"Recuperación ecosistémica de un tramo del caño aguas prietas de la vereda el Higal del corregimiento de Punta de Yánez",*** en el marco del contrato de obra **N°060-2024.**
Se les explicó que el espacio fue generado con el fin de acompañarlos y orientarlos en la construcción del reglamento interno de la veeduría ciudadana, se les dieron pautas para que estos construyeran su manual de funciones en cuanto a:
-Función principal de la veeduría ciudadana- ***"Recuperación ecosistémica de un tramo del caño aguas prietas de la vereda el Higal del corregimiento de Punta de Yánez",*** en el marco del contrato de obra **N°060-2024,** de manera que puedan representar los intereses de la comunidad, evitando cualquier impacto negativo en la salud pública, infraestructura o el medio ambiente.
-Funciones principales de la veeduría: Vigilancia del cumplimiento del plan de limpieza, control de uso y recursos, informar a la comunidad del avance de actividades de obras, recoger inquietudes comunitarias entre otros.

-Estructura orgánica y funciones de los órganos directivos: Se les orientó en cuanto las funciones y tareas específicas del presidente, vicepresidente, secretario, vocales.

-Frecuencia de las reuniones, mensuales, extraordinarias y visitas al canal.

-Normas de ética y conducta de la veeduría ciudadana.

-Prohibiciones de la veeduría ciudadana etc.

De la misma manera se les entregó el acta de constitución de la veeduría ciudadana, el listado de asistencia de elección de veeduría y se les dieron pautas en cuanto a la construcción del reglamento interno, con el fin que los veedores tuvieran las claridades, realizaran los tramites siguientes de inscripción de veeduría ciudadana en la personería y les den la resolución para que puedan ejercer la veeduría en el marco del proyecto iniciado.

Así mismo, se creó un grupo de WhatsApp, con el fin de crear una constante comunicación con las actividades a desarrollar en el marco del proyecto, se les facilitó el correo del consorcio punta Yánez en caso del solicitar algún documento relacionado con el contrato de obra.

Se escucharon comentarios y recomendaciones y se hizo el cierre agradeciéndoles a los-as participantes por asistir al llamado.

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS. **ACTA DE REUNIÓN**	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**RESPONSABLE**
Hacer seguimiento al proceso de inscripción de veeduría y lograr tener la resolución para el control social en el marco del proyecto.	De acuerdo a la fecha de entrega de parte de la personería municipal de ciénaga de oro.	Consorcio Punta Yánez CVS.
Estar en constante comunicación con la veeduría ciudadana, acompañando los procesos.	En el momento que se requiera.	Profesional social.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.





Reunión con la veeduría en el marco del contrato de obra N°060.

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	CONTRATO OBRA No 060-2024 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS Y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE -CVS	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS
	ASISTENCIA	

TEMA: Reunión con Veeduría Ciudadana Conformada en el marco del Contrato de obra No 060

Objetivo de la Reunión: Dar Orientaciones y pautas a la veeduría ciudadana en la construcción del reglamento interno, hacer entrega de documentos para inscribir la veeduría en personería

Lugar: Vereda el Hogal - Ciénaga de Oro | Fecha: 03/02/2025 | Hora: 3:00 pm.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Orlando Cesar Pacheco Diaz	2.753.569	Presidente veeduria	—	—	Orlando C
Victor Moreno	78036605	Vocal Veeduria	3106579	invictor16@	
Pedro Causil	2.754.615	Vicepresidente	3137621400	—	Pedro Causil
Marta Cecilia Mejia Lopez	45690734	Presidente de JAC	3146351061	martamejia.lopez09@gmail.com	Marta Mejia
Juan Andres Majia Herrera	1007152363	comunidad	3103628180	juanmajia.ingenieria@outlook.com	Juan Majia
Antonia Bernarda Ortiz	50.953.058	comunidad	3215625488	—	Antonia Ortiz
Francisco Regino	1007584637	comunidad	3003338432	—	Francisco Regino
Ismaldo Mendoza	1068656859	Cajinal	3024204429	—	
Nikolle Peñaranda Gutierrez	1.075.692.455	Profesional Social	3023819382	—	Nikolle Peñaranda Gutierrez
—	—	—	—	—	—

Powered by CamScanner

FORMATO

ACTA DE VECINDAD VIAL

PREDIO

Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía

CONSORCIO PUENTE MONTE
CVS

DÍA	MES	AÑO	CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	ACT No.
10	febrero	2025	080-2024	083-DE-2023.	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Anca Pachesa de osorio
CC propietario: 25.861.085
Teléfono: 3002253023
Correo electrónico: N/A
Dirección: vereda el Jugal
Long. del frente (m's): 2000 mts — Predio: 1 — No. de pisos: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Teléfono			
5. Gas			
6. TCS			
7. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial		6. Baldío	
2. Comercial		7. Espacio público cultural	
3. Industrial		8. Vivia	
4. Institucional		9. Otro?	
5. Recreacional		Cual?	Predio

ACCIONES REMEDIADAS

Cerca	SI		NO
Cuarto			
Una sola pendiente			
Cimiento	SI		NO
Ancho de pendiente			

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI [x] NO [ ]

Tipo de Cultivos:	yuca, piña, arboles maderables
Estado:	Sembrado
# de cultivos en total:	yuca (300 matas), Piña (15 matas), Platillo (20)
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	SI [x] NO [ ]

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención: 1. SI [x] 2. No

3. Cual? Mantenimiento de la cerca

4. Tiempo que considera el predio no ha sido intervenido? Hace 4 meses.

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD RURAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se visito a la Señora Rosa Pacheco de Osorio, con la finalidad de verificar el estado de la cerca en su predio antes de realizar los trabajos de cbd en el marco del proyecto, En frente del predio se encuentra una cerca de 200 metros aproximadamente, Construida con alambre de pua, con postes de madera de 2 metros de distancia, la cerca se encuentra en estado regular.
Así mismo, en frente del corral se encuentra un corral para cría de los cerdos construido en madera, con techo de zinc, piso en tierra, dividido en 5 espacios para los cerdos y tiene 2 puertas. (tiene 18 cerdos)
el corral de los cerdos está en buen estado.
En frente de su predio tiene cultivos de yuca (300 matas), piña (15 matas) arboles de palillo (20 arboles sembrados). la propietaria manifiesta en caso de cortar los cultivos, dar el permiso para quitarlos.

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD RURAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1
Descripción Cerca de 200 metros de distancia aproximadamente.



Foto No 2
Descripción Cerca Construida con alambre de pua y postes de madera.



Foto No 3
Descripción Cerca en estado regular



Foto No 4
Descripción postes en estado regular con metros de distancia entre Poste de 2 metros.

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD RURAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 5
Descripción Conal para uso de cerdos



Foto No 6
Descripción El conal está divido en 5 espacios para los cerdos.

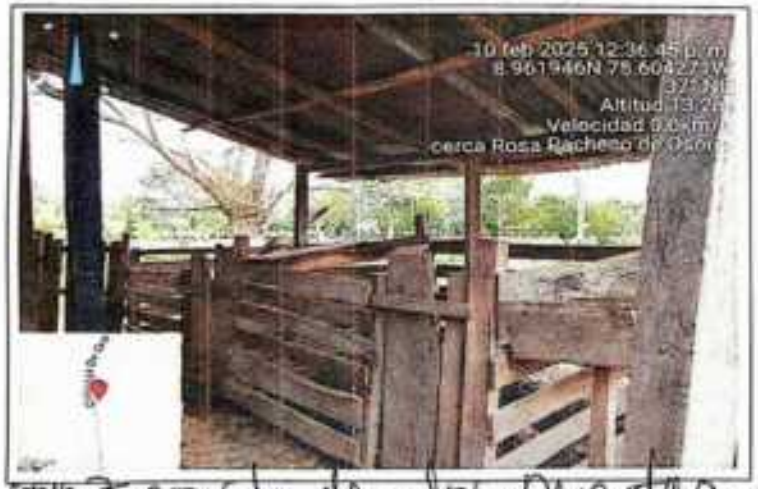


Foto No 7
Descripción consta de dos puertas. el conal esta en buen estado.



Foto No 8
Descripción construido en madera con techo de zinc

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO		

Foto No ____
Descripción _____

Foto No ____
Descripción _____

Para constancia de lo anterior, se firma la presente actividad la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Cienaga de oro a los 10 días del mes de febrero de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Nikolle tatiana Tefequa 6.
(Nombre) Nikolle tatiana Tefequa 6.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Interventoría

Vo.Bo
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Contratista

(Firma) Rosa P de osario
(Nombre) Rosa P de osario
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD INICIAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía					COOSOBICO PUNTA YAMEZ CIS	
FECHA			CONTRATO OBRA No 060-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No. 063 DE 2024.	ACT No: 1	OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL BISO Y LA VEREDA EL UGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YAMEZ, DIS. MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DÍA: 11	MES: 02	A.A: 2025				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Nadid Urrego
CC propietario: 78.731.886
Teléfono: 3012312279
Correo electrónico:
Dirección: Vereda el Ugal — No. de predio: 1
Long. del frente (m.ts): 200 mts — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Vivienda	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	
5. Recreacional	☐	Cual?	ganadería

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	☐	NO	☑		
Cuantos					
Uso del garaje					
Cerrado	☐	NO	☐		
Ancho de garaje					

CULTIVOS

Posee Cultivos? ☐ NO ☑

Tipo de Cultivos:	
Estado:	
# de cultivos en total:	
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	☐ ☐

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. SI — 2. No ☑

3. Cual? N/A

4. Tiene los permisos a la fecha en lo que realizó la intervención? N/A.

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD INICIAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	GESTORES PLANTA YMBX CVT	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se visita el predio del Señor Isabid Viaggiani "no hay como Dios" de 7 hectareas. En este predio, se trabajan actividades ganaderas, Se encuentran 10 animales 5 Vacas y 5 machos.
Asi mismo Se identificó las caracteristicas de la cerca del Señor Isabid que está frente al cano aguas prietas, zona de intervención del proyecto. Tiene una Cerca que tiene 300 metros de frente, construida con postes de Campano de viejo, Cada poste con una distancia de 4 metros.
La Cerca es electrica, Consta de tres pitas de alambre electrico
La Cerca esta en buenas Condiciones.

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD INICIAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	



Foto No 1
Descripción Cerca con postes de Campana distancia de 4 metros entre poste.



Foto No 2
Descripción Cerca con alambre electrico de tres patas.



Foto No 3
Descripción Cerca en buenas condiciones



Foto No 4
Descripción frente de la cerca de 300 metros.

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD BARRIAL PROCESO	CONSORCIO PISTA YAWIZ CPS	



Foto No____
Descripción

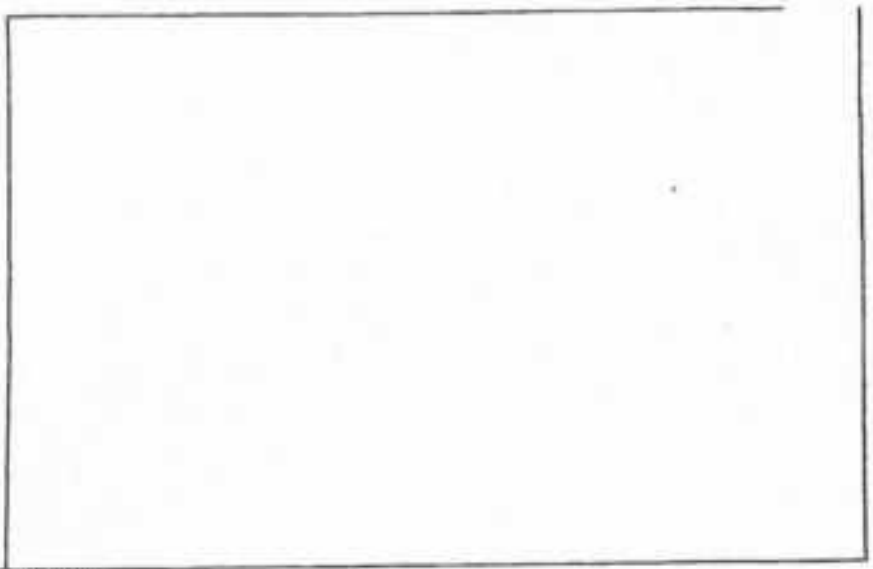


Foto No ____
Descripción

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Ciénaga de oro a los 11 días del mes de febrero de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Nikolle Tatiana Feteca6.
Nikolle Tatiana Feteca6.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Representante - Interventoría

Vo.Bo
(Firma)
(Nombre)
Representante - Contratista

(Firma) Nadid Viggiani L
(Nombre) Nadid Viggiani
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD RURAL
PROCESO
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía

CONSORCIO PUNTA YAMUZ
EVS

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACT No:	OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO ARGUIS PREVIO LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIBUJÍ Y LA VEREDA EL LIMPIO DEL CORREGIMIENTO PUNTA YAMUZ, EVS, MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DÍA	MES	AÑO				
11	Febrero	2025	060-2024	063 DE 2024.		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Fabian Javier López Sibaja
CC propietario: 1.140.842.340
Teléfono: 3135693510
Correo electrónico:
Dirección: El Higal
Long. del frente (mts): 570 metros — Fondo: — No. de pisos:

	SI	NO
1. Agua		
2. Alcantarillado		
3. Energía		
4. Teléfono		
5. Gas		
6. TICS		
7. Licencia de construcción		

OBSERVACIONES: No Aplica.

USO ACTUAL

1. Residencial		6. Baldío	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9. Otro?	
5. Recreacional		Cual:	productivo

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI		NO	✓
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI		NO	
Ancho de garaje				

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI NO ✓

Tipo de Cultivos:	N/A
Estado:	N/A
# de cultivos en total:	N/A
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención
1. SI
2. No ✓
3. Cual?
4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención? N/A

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUENTA YAMEZ CAS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se visitó el predio "Pura gusto" propiedad del Señor Francisco López, con el fin de identificar el estado de la cerca del predio antes de iniciar los trabajos de obra en el marco del proyecto.
Se encontró naderos de arboles y de especies de pimiento, cerca existida entre otras especies no se encontró cerca construida, ni alambres. Solo árboles naderos.
Tiene de frente 370 metros que da al cano aguas pretas.

FORMATO	CONSORCIO PUNTA TARTZ CVS	
ACTA DE VECINDAD VIGIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1
Descripción Cerca con nacederos de especie de pamento. Cano fistola etc.



Foto No 2
Descripción cerca solo con nacederos de arboles. Sin alambres.



Foto No 3
Descripción distancia general de la cerca 370 metros.



Foto No 4
Descripción nacederos de arboles puente al cerro cerca puertos

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDARIO PROCESO	CONSORCIO PUESTA DEL SOL C/S	



Foto No___
Descripción

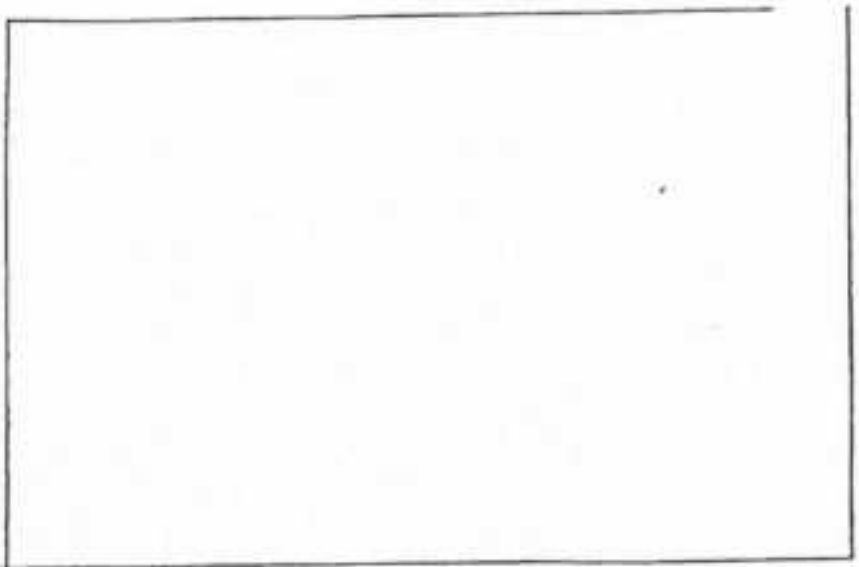


Foto No ___
Descripción

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Cádiz de Oro a los 11 días del mes de Febrero de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Nikolle Tatiana Peteuo 6.
Nikolle Tatiana Peteuo 6.
Profesional Social - Constructor

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Constructor

(Firma) Francisco Lopez S
(Nombre) Francisco Lopez S
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO

ACTA DE VECINDAD RURAL

PROYECTO

Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía

CONSORCIO PUNTA YAREZ
CVS

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACT No:	OBJETO:
DD	MM	AA				
11	02	2025	080-2024	083 DE 2024,	1	RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS HUERTAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL LIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YAREZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Francisco Javier Lopez Sibaja
CC propietario: 1.101.697.446
Teléfono: 3135837310 - 3126714447
Correo electrónico: 100 edificar
Dirección: vereda el Hogar
Long. del frente (mts): 72 metros
No. de pisos: 1
Sector: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
0. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Salud	☐		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐		
3. Industrial	☐	8. Vivir	☐		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐		
5. Recreacional	☐	Cual:			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI ☐ NO ☒

Tipo de Cultivos:	N/A
Estado:	N/A
# de cultivos en total:	N/A
# de cultivos que tienen influencia directa en el propietario:	☐ ☐

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. SI 2. No ✓

3. Cual?

4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención? N/A

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD INICIAL PROCESO Gestión Social y Gerencia a la Ciudadanía	CONSORCIO PERLA AMBIZ CVS	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se visita el predio "Villa Martha" propiedad del Señor Francisco López Sibaja para identificar el estado de su cerca que está frente a la zona de intervención del proyecto antes de realizar los trabajos de obra. En frente del predio "Villa Martha" no se encontró cerca, solamente se encontró árboles nativos de especie de muñeco, pimiento y Sembradera; no hay alambres!

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD RADIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1
Descripción Cerca con arboles naderos sin alambre.



Foto No 2
Descripción especies de arboles naderos de monteo, pimiento entre otros.



Foto No 3
Descripción naderos frente del cano hojas pretas.



Foto No 4
Descripción distancia aproximadamente de un metro del cano hojas pretas

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUESTA VANZ	
ACTA DE VECINDAD SOCIAL	CPS	
PROCESO		



Foto No:____
Descripción _____

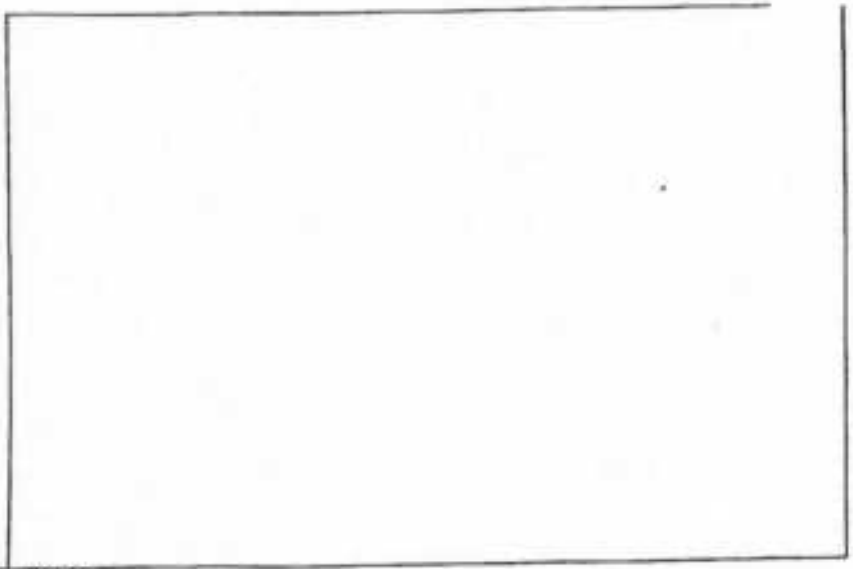


Foto No: ___
Descripción _____

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Ciénaga de oro a los 11 días del mes de Febrero de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Nikolle Tatiana Tejeda 6.
Nikolle Tatiana Tejeda 6.
Profesional Social - Contable

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Interventoría

Vo.Bo
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Contratista

(Firma) Francisco Lopez S
(Nombre) Francisco Lopez S
Proponente

Powered by CamScanner

FORMATO

ACTA DE VECINDAD PREDIAL

PROCESO

Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía

CONSORCIO PUNTA YAMEZ CVS

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACT No:	OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL USIAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YAMEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DD	MM	AA				
13	02	2025	060-2024	063 DE 2024.		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sara Coronado
CC propietario	25.836.145
Teléfono	3233266691
Correo electrónico	N/A
Dirección	Vereda El Sigal
Long. del frente (mts)	150 metros Estrato 1 No. de predio 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Sitio de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	productivo

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garaje				

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI ☒ NO ☐

Tipo de Cultivo:	yuca (1000 matas).
Estado:	En producción
# de cultivos en total:	1000 matas.
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	☐ ☐

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. SI ☑ 2. No

3. Cual? Mantenimiento, cambio de postes, limpieza a la cerca, como tambien al canal.

4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención?: hace 1 mes.

Powered by CamScanner

FORMATO	GOBERNACIÓN PUNTA YANEZ	
ACTA DE VECINDAD RURAL	CAS	
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se visita el predio "Aguanta el clavo" propiedad de la Señora Sara Coronado, con el fin de identificar el estado de la cerca antes de realizar los trabajos de obra. La cerca tiene una distancia de 150 metros de frente, esta construida en postes redondos, estillas de madera con distancia entre estillas y poste de 1 metro, la cerca tiene alambre de pua de tres pitas, el alambre está en buen estado, la cerca tiene un portillo de acceso al predio con tres pitas de alambre.
La cerca en su frente tiene 6 arboles maderables de especies de campano y pimiento.
La cerca esta a un metro de distancia del caño aguas prietas de la misma manera, se identifico en la orilla de la cerca del predio un corral construido con postes redondos, alambre de pua, la distancia de los postes a 50 cm, un corral para uso de ganado de semovientes con un area de 8 metros de largo por 10 metros de ancho el corral tiene 10 pitas de alambre de pua en general esta en buenas condiciones. Se encontro un segundo corral, ubicado del anterior de 15 metros de ancho por 15 de largo con postes de un metro y alumbre de pua de 4 pitas. para uso de ordeño de vacas. En general el corral esta en buenas condiciones

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD PREDIAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	



Foto No 1
Descripción: Cerca construida con astillas de madera, postes redondos.



Foto No 2
Descripción: Cerca con alambre de púa de tres pitas en buen estado.



Foto No 3
Descripción: Cerca aun metro de distancia del cauce aguas pretas.



Foto No 4
Descripción: La cerca está rodeada de especies de árboles maderables

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD FINCAL		
PROCESO		





Foto No 5
Descripción A la orilla de la cerca se encontro un corral con postes redondos y alambre pua de pua en buenas condiciones

Foto No 6
Descripción corral con 10 pitas de alambre

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Ciénaga de oro a los 13 días del mes de Febrero de 2025.

ELABORÓ:
(Firma) Nikolle tahana Tekapa6.
(Nombre) Nikolle tahana Tekapa6.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Interventoría

Vo.Bo
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Contratista

(Firma) Sara Coronado
(Nombre) Sara Coronado
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD INICIAL
PROCESO
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía

CONSORCIO PUNTA YAMEZ
CVS

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACT No:
DD	MM	AA			
17	02	2025	060-2024		1

OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SINGLO Y LA VEREDA EL URAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YAMEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Fabian Romero (Administrador). Alexander Vasquez Castaño (propietario).
CC propietario	16.199.556
Teléfono	3004150093
Correo electrónico	alexvasquez82@hotmail.com.
Dirección	Vereda el Ural.
Long. del frente (mts)	1000 mts.
Predio	No. de predio 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Salón	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9 Cuál?	☐
5. Recreacional	☐	Cuál: ganadería.	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑	
Cuantos			
Uso del garaje			
Cerrado	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garaje			

CULTIVOS

Poseé Cultivos? SI ☐ NO ☑

Tipo de Cultivos:	N/A
Estado:	N/A
# de cultivos en total:	N/A
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	N/A.

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. SI ☑ 2. No ☐

3. Cual? Mantenimiento a la cerca.

4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención?: 8 días

Powered by CamScanner

FORMATO	GUSTAVO PEDRO VANEZ
ACTA DE VECINDAD INICIAL	CVS
PROCESO	
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se visita el predio San Nicolas, propiedad del Señor Alexander Vasquez Castaño, recibe la visita el administrador (Fabian Romero).
Se realiza identificación del estado de la cerca, antes de realizar los trabajos de dota en el marco del proyecto.
La cerca encontrada presentaba las siguientes caracteristicas: Tiene un tramo construido con postes, varederos, alambre de pua con 2 pitas, con distancia de 6 metros cada poste, tiene una divisoria con postes y alambre de pua que está ubicada en una boca.
Asi mismo, tiene otro tramo de aproximadamente 800 metros, la cerca tiene alambre electrico, de una pita, construida con estillas y postes redondos con distancia de 10 metros, la cerca esta pegada en todo el borde del caño.
Se encontró otro tramo desde el puente de madera peatonal, que da acceso a la via de carretera - hasta otro boca que se encuentra en frente del caño, tiene 80 metros, tiene 2 pitas de alambre electrico.
-también se encontró otro tramo hasta el final del predio, de 300 metros con una sola pita de alambre electrico, con postes redondos con distancia de 15 metros entre postes.
Se encontraron 6 divisiones en el predio, que pegan al caño aguas pretas. (a la cerca). Alrededor de la cerca se encontraron diferentes especies de arboles, tambien se encontro un puente colgante peatonal. Frente de la vivienda, construido en madera y guayd
En frente del predio se encontro tambien un embarcadero en un area de 10x10 construido en estacon y varetas, consta de un embarcadero, corral y embarcadero

FORMATO ACTA DE VECINDAD INICIAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	CONSORCIO PUENTA YAMEZ CVS	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Tiene 3 puertas, está pintado de color negro, el uso es para embarque y desembarque de ganado.
El piso del embarradero es de balastro tanto en la parte interna como externa.
El embarradero está en buen estado.

Powered by CamScanner

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD INICIAL	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1
Descripción cerca con postes y rolederos y alambre electrico



Foto No 2
Descripción tramo de la cerca con dos pitas de alambre electrico



Foto No 3
Descripción tramo de la cerca con alambre electrico



Foto No 4
Descripción cerca en alambre electrico con postes redondos

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD FINAL PROCESO	CONSORCIO PUENTA YANUZ C/S	



Foto No 5 Embarcadero construido en un área de 10 x 10



Foto No 6 Consta de embalde, coral y embarca dero.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Cáenga de oro a los 17 días del mes de febrero de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Nikolle Tatiana Tefaya G.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Representante - Interventoría

Vo.Bo
(Firma)
(Nombre)
Representante - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD RURAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía					CONSORCIO PUNTA YAMIZ CVS	
FECHA			CONTRATO OBRA No 060-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No. 063 DE 2024.	ACT No:	OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ENFOQUE EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE LAS TIRANTE DEL CAÑO AGUAS (PESTRE LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL LEGUELDE, CORREGIMIENTO PUNTA YAMIZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DD 13	MM febrero	AA 2025				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jorge Eliecer Vasquez Pacheco
CC propietario	78.629.470
Teléfono	3236626066
Correo electrónico	N/A
Dirección	Vda El Salado
Long. del frente (mts)	2065 mts
Estrato	1
No. de pisos	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción			#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Cuál?	producción
2. Comercial	☐	7. Otro(s) Interés cultural?	☐		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐		
5. Recreacional	☐	Cuál:			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Cerrenda	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garaje				

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI ☐ NO ☑

Tipo de Cultivos:	N/A
Estado:	N/A
# de cultivos en total:	N/A
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	☐ ☐

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. SI ☑ 2. No

3. Cual? instalación de cerca

4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención? Hace 2 años

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD INICIAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	CONSORCIO PUENTE YAREZ CVS	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se visita el predio del Señor Jorge Vásquez, con el fin de identificar el estado de la cerca, que está frente del Caño aguas prietas, lugar de intervención del Caño Aguas prietas.
Se encontró una cerca que tiene 2.500 metros de distancia, fué instalada hace dos años, tiene las siguientes características.
Está construida con estacones o postes de arboles de diferentes especies, con distancia de 1 metro entre poste y poste, con alambre de púa de 3 pitas.
Actualmente, la cerca se encontró con tramos caídos, ocultos de maleza poco visible y el alambre no se encontró templado en partes y postes podridos.
Tambien se encontró tramos de la cerca que tienen sus tres pitas de alambre, como tambien se identificó tramos que el alambre está en el piso, caído y sólo con dos pitas.
Se encontraron tramos, que gran parte de la cerca tiene sus tres pitas de alambre de púa y sus postes instalados.
La cerca se encontró con gran cantidad de arboles de diferentes especies a su alrededor.
La cerca está a 5 metros de distancia del caño Aguas prietas.
En general el estado de la cerca es regular.

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD PREDIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1
Descripción Cerca con estacones y postes de arboles de diferentes especies



Foto No 2
Descripción Cerca - un tramo con tres pitas de alambre de pua.



Foto No 3
Descripción Cerca bordeada de arboles de diferentes especies



Foto No 4
Descripción Tramo de la cerca con sus postes instalados.

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD MEJA PROCESO	CONSORCIO PUNTA YANEZ C/S	





Foto No. 5
Descripción: tramos de la cerca con dos o tres pitas de alambre

Foto No. 6
Descripción: cerca con distancia de 5 metros del uno ciegues pretos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en ciénaga de oro a los 13 días del mes de febrero de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Nikole tatiana fetecua6.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Representante - interventoría

Vo.Bo
(Firma)
(Nombre)
Representante - Contratista

(Firma) Jorge Vasquez.
(Nombre) Jorge Vásquez - P.
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO

ACTA DE VECINDAD INICIAL

PROCESO

Gestion Social y Servicio a la Ciudadanía

CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACT No:	OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SINU Y LA VEREDA EL URAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DD	MM	AA				
10	02	2025	CONTRATO OBRA No 060-2024	065 DE 2024.		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Génesis Regino
CC propietario	1068.657.209
Teléfono	322.5843333
Correo electrónico	N/A
Dirección	vereda el Ungal
Long. del frente (mts)	115 mts

Estrato: 1 No. de pisos: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	productivo

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garaje				

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI ☒ NO ☐

Tipo de Cultivos:	frutales - coco
Estado:	Sembrado en cosecha.
# de cultivos en total:	10 arboles de coco
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	10 arboles

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. SI 2. No X

3. Cual?

4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención?: N/A

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD INICIAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	CONSORCIO PUENTA YAMEZ CVS	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se visita el predio de la señora Génesis Pegmo, con el fin de identificar el estado de la cerca antes de realizar los trabajos de obra en el marco del proyecto. El predio no tiene cerca, se encuentran naciederos frente del canal fuente es una cerca que divide un predio con el otro, una cerca de 10 metros de distancia del canal, la cerca es de alambre de pua, con postes de madera, de 3 metros de distancia y se encuentra en estado regular.

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD RURAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1
Descripción no se encontró cerca, solo rastrojos en frente del canó aguas pretas



Foto No 2
Descripción Nacederos frente el canó aguas pretas.



Foto No 3
Descripción cerca que divide un predio con el otro.



Foto No 4
Descripción 10 metros de distancia del canó. es de alambre de púa.

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD PREDIAL		
PROCESO		

Foto No____
Descripción

Foto No ____
Descripción

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en ciénaga de oro a los 10 días del mes de febrero de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Nikolle Tatiana Fetecua6.
Nikolle Tatiana Fetecua6.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Interventoría

Vo.Bo
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Contratista

(Firma) *Gerdesis Regido
(Nombre) *Gerdesis Regido Martínez
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO

ACTA DE VECINDAD PREDIAL

PROCESO

Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía

CONSORCIO PUNTA YAMEZ
CMS

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACT No:	OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL DIQUE Y LA VEREDA EL UVAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YAMEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DD: 11	MM: 02	AA: 2025	060-2024	065 DE 2024.		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Henry Montalvo
CC propietario: 3.761.622
Teléfono: 3233662359
Correo electrónico: No tiene
Dirección: Vereda el Uvigal
Long. del frente (mts): No mide — Estrato: 1 — No. de pisos: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción			#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	
2. Comercial	☐	7. Bienes interés cultural*	☐	
3. Industrial	☐	8. Vías	☐	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	
5. Recreacional	☐	Cual:	productivo	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garaje				

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI ☑ NO ☐

Tipo de Cultivos:	Maiz, yuca
Estado:	Sembrado
# de cultivos en total:	Maiz (2 cabezones), yuca 1250 m2
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	☐ ☐

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención

1. SI 2. NO ✓

3. Cual?

4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención? 3 años.

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD PREDIAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	CONSORCIO PUENTA SAMBEZ CVS	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se visita al Señor Henry Montalvo, con el fin de identificar el estado de su cerca que está frente al caño aguas prietas lugar de intervención del proyecto.
La cerca presenta las siguientes Caracteristicas: Consta de 40 metros de cerca con 9 pitas de alambre de pua, con postes de robles y estillas de campano, también tiene 40 metros de cerca con alambre electrico con postes de roble con una distancia de dos metros y medio cada poste con tres pitas de alambre electrico.
La cerca se encuentra en estado regular.
Asi mismo se encontró un portillo de madera que da acceso a las colindancias.

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD INICIAL		
PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1
Descripción 40 metros de cerca con alambre electrico



Foto No 2
Descripción cerca con tres pitas de alambre electrico.



Foto No 3
Descripción cerca con 9 pitas de alambre de pua.



Foto No 4
Descripción cerca con postes de roble y estilas de campano - cerca de alambre pua.

Powered by CamScanner

FORMATO	DISTRITO PUNTA GARZ	
ACTA DE VISITA DOMICILIARIA	C/S	
PROCESO		

Foto No____
Descripción

Foto No ____
Descripción

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Ciénaga de oro, a los 11 días del mes de Febrero de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Nikolle tatiana Febrero 6.
(Nombre) Nikolle tatiana Febrero 6.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante - Contratista

(Firma) HERRIMENTALVO
(Nombre) HERRIMENTALVO
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE VECINDAD RURAL
PROYECTO
Gestión Social y Ambiental a la Ciudadanía

CONSORCIO PUNTA YAMEZ
CPS

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACT No:	OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO JARAMI FRENTE LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIRILO Y LA VEREDA EL UVAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YAMEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DÍA	MES	AÑO				
17	febrero	2025	060-2024	063 DE 2024.		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luis Gareth Morales Suarez
CC propietario: 10.852.324
Teléfono: 315 582 2316.
Correo electrónico: N/A
Dirección: El Uval
Long. del frente (mts): 120 metros. Estrato: 1 No. de pisos: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción			

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Uso de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	parcheles

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del parqje				
Cerramiento	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajem				

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI ☐ NO ☑

Tipo de Cultivos:	N/A
Estado:	N/A
# de cultivos en total:	N/A
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	☐ ☐

INTERVENCIONES

Ha realizado alguna intervención
1. SI 2. No ☑
3. Cual?
4. Tiempo transcurrido a la fecha en la que realizó la intervención?: N/A.

Powered by CamScanner

FORMATO ALTA DE VECINDAD INICIAL PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	CONSORCIO PUENTE VARIZ CVS	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se visitó el predio de la Señora Ines Janeth Morales Suarez, con el fin de identificar el estado de su cerca, antes de realizar los trabajos de obra en el marco del proyecto.

Este predio tiene de frente 180 metros, que dan alcance aguas arriba se encontró maderos de arboles de diferentes especies, bastante distanciados uno del otro, no se encontró alambres.

Se encontró un corral construido con postes y alambre de púa, tiene 2 divisiones una para encierro de los terneros, y otro para ordeño de las vacas el corral se encuentra en buen estado.

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA TARIFE CVS	
ACTA DE VECINDAD PREDIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1
Descripción cerca con naciderros de arboles de diferentes especies



Foto No 2
Descripción El frente en general de la cerca es de 180 metros



Foto No 3
Descripción nacederos bastante distanciado uno del otro.



Foto No 4
Descripción no se encontró alambres

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUESTA SANTIZ GIS	
ACTA DE VECINDAD RIGIN		
PROCESO		



Foto No 5
Descripción corral construido con postes y alambre de pua.



Foto No 6
Descripción corral con dos divisiones - Encierro de terneros y otro con ordeño.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Cidrogudeord a los 17 días del mes de Febrero de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Wilfredo Tatiana Tefeya6.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Representante - Interventoría

Vo.Bo
(Firma)
(Nombre)
Representante - Contratista

(Firma) Enes Yaneth
(Nombre) Enes Yaneth
Propietario

Powered by CamScanner

FORMATO

ACTA DE VISITA INICIAL

PROCESO

Desarrollo Social y Servicio a la Ciudadanía

CONSORCIO PUNTA GÁMEZ EJS

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACT No:	OBJETO: RECUPERACIÓN ECOSISTEMICA CON ENFOQUE EN CONECTIVIDAD HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS FRESCAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL OSO Y LA VEREDA EL VIGIA DEL CORREGIMIENTO PUNTA GAMEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DD: 07	MM: 02	AA: 2025	060-2024	063 DE 2024.		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jorge y torcero vidal pacheco
CC propietario: 1.100.737.468
Teléfono: 3007360336
Correo electrónico: jvidalp@agromonte.com
Dirección: vereda. [illegible]
Long. del lente (mts): 17 mts y medio
Estrato: 1
No. de predio: 10

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. TICS		X	
6. Licencia de construcción			#

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Salón	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9.Cual?	
5. Recreacional		Cual:	ganadería

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI		NO	X	
Cuantos					
Uso del garaje					
Cubierta	SI		NO		
Ancho de garajes					

CULTIVOS

Posee Cultivos? SI NO

Tipo de Cultivos:	no aplica.
Estado:	N/A
# de cultivos en total:	N/A
# de cultivos que tienen influencia directa en el proyecto:	N/A

INTERVENCIONES

Ha recibido alguna intervención

1. Si X 2. No

3. Cual? Restauración del corral.

4. Tiempo transcurrido de la fecha en la que recibió la intervención?: 1 año y 3 meses

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YAREZ CVS	
ACTA DE VECINDAD PREDIAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se visita el predio del Señor Jorge Lorenzo Vidal con el fin de identificar el estado de la cerca del predio, antes de realizar los trabajos de obra.
Se encontró una cerca eléctrica de tres pitas de alambre eléctrico construida con estillas y postes con distancia de cuatro metros y medio entre poste y estillas.
La distancia general de la cerca es de 600 metros, está en buenas condiciones, la cerca se encuentra rodeada de arboles (6) maderables (10) palmitos dañados en un tramo de la cerca.
Así mismo, en el mismo frente al caño Aguas prietas zona de intervención del proyecto. Se encontró un corral de varetas de caño negro, en un área aproximada de 17 metros de frente por 17 metros de ancho.
Tiene dos divisiones, un embudo y una manga para pasar el ganado.
Tiene 5 puertas.
El corral está ubicado a tres metros y medio del caño, está a la margen derecha, una punta de ganez, el acceso al corral es por un portillo de alambre de púa, a la entrada del corral se encuentra un corral de alambre para maternidad.

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUNTA YAKEZ CVS	
ACTA DE VECINDAD RURAL		
PROCESO		
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		



Foto No 1
Descripción cerca electrica de tres pitas de alambre electrico



Foto No 2
Descripción la cerca se encuentra rodeada de diboles maderables



Foto No 3
Descripción construido con estillas y postes



Foto No 4
Descripción la distancia general de la cerca es de 600 metros.

Powered by CamScanner

FORMATO	CONSORCIO PUESTA VANTE E/S	
ACTA DE VISITA DE INICIO		
PROCESO		



Foto No 5
Descripción corral de varetas con un area de 17 metros de frente por 17 metros de ancho



Foto No 6
Descripción corral con un embudo y una manga en buen estado

En constancia de lo anterior, en firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Ciénaga de oro a los 07 días del mes de febrero de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Nikolle tatiana Tejeda G.
Nikolle tatiana Tejeda G.
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Representante - Interventoría

Vo.Bo
(Firma)
(Nombre)
Representante - Contratista

(Firma) Jorge vidal
(Nombre) Jorge vidal
Propietario

Powered by CamScanner
