SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL		ACUMULADO
Obra programada (%)	11,53%		39,27%
Valor básico de la Obra programada:	$ 213.115.377,00	$	83.690.408,55

	SEMANAL		ACUMULADO
Obra Física	67,98%		70,00%
Valor básico de	144.875.833,28	$	149.180.763,90

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA




IMAGEN OFICINA

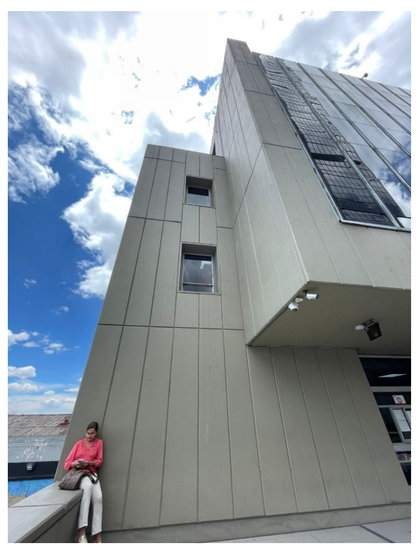

AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO DIEZ SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LAS ACTIVIADADES DE MANTENIMIENTO DE MUROS, ESTUCO, Y PINTURA DE LA PLAZOLETA CENTRAL EN GRIS NUBE , SE INSTALO AL CIEN POR CIENTO EL VINISOL CUARTO DE LACTANCIA. ADICIONALMENTE SE HA VENIDO DILIGENCIANDO LA BITACORA DE OBRA JUNTO CON INTERVENTORIA CON LAS NOVEDADES Y REPORTE DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO EJECUTADO.

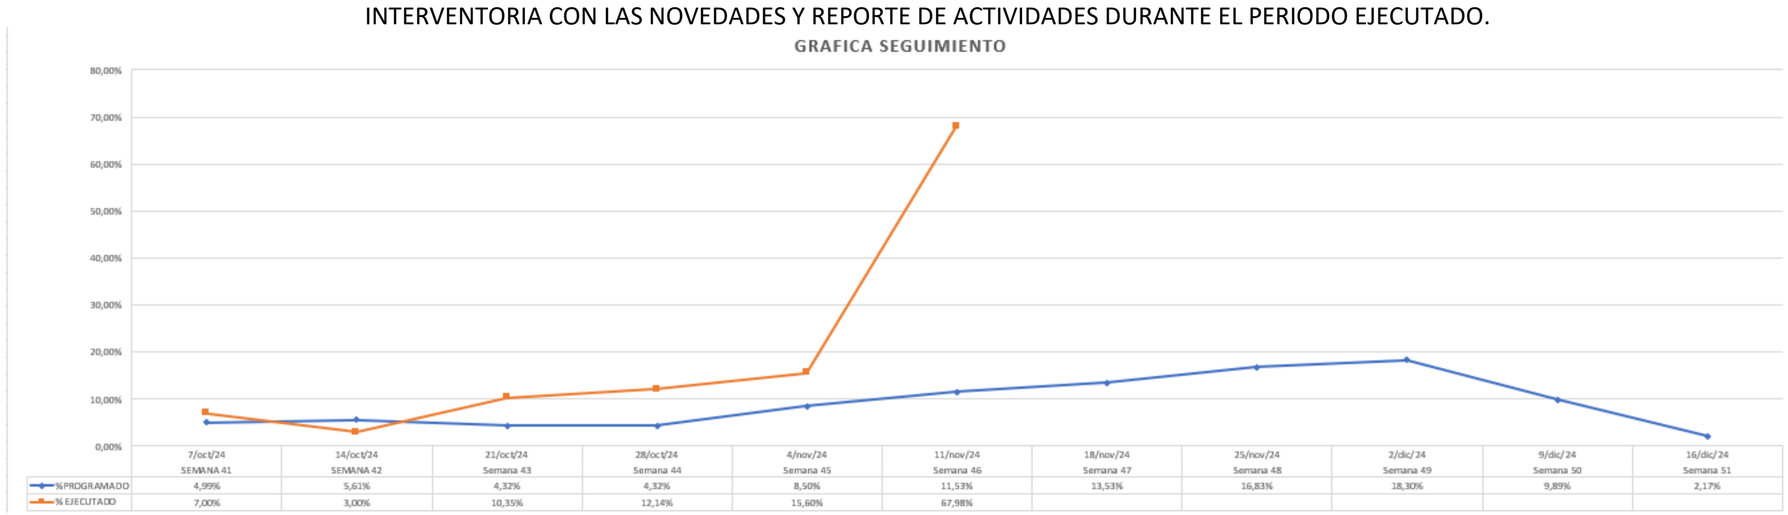

	7/oct/24 SEMANA 41	14/oct/24 SEMANA 42	21/oct/24 Semana 43	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50	16/dic/24 Semana 51
%PROGRAMADO	4,99%	5,61%	4,32%	4,32%	8,50%	11,53%	13,53%	16,83%	18,30%	9,89%	2,17%
% EJECUTADO	7,00%	3,00%	10,35%	12,14%	15,60%	67,98%					

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MUROS VINILO Y GRIS BASALTO EN PLAZOLETA CENTRAL



Comentario: CAMBIO DE PISO Y GUARDA ESCOBA VINISOL NUEVO CUARTO LACTANCIA PISO 1



Comentario: MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MUROS VINILO Y GRIS BASALTO EN PLAZOLETA CENTRAL



Comentario: MANTENIMIENTO MUROS PINTURA VINILO EN FRENTE DE ASCENSORES.

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días


ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MUROS GRIS BASALTO ENTRAMADO CUBIERTA

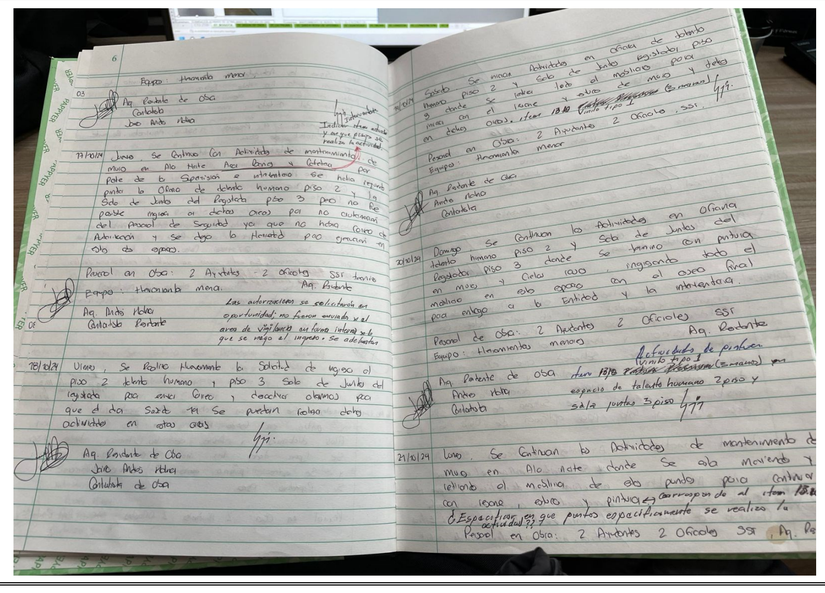

Comentario: ACTUALIZACION Y DILIGENCIAMIENTO DE LA BITACOR DE OBRA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **AGUA DE DIOS / CUND** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	15,46%	63,63%
Valor básico de la Obra programada:	$ 59.371.523,00	37.778.100,08

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	70,00%	73,00%
Valor básico de la Obra	$ 41.560.066,10	$ 43.341.211,79

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **AGUA DE DIOS / CUND** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

AVANCE

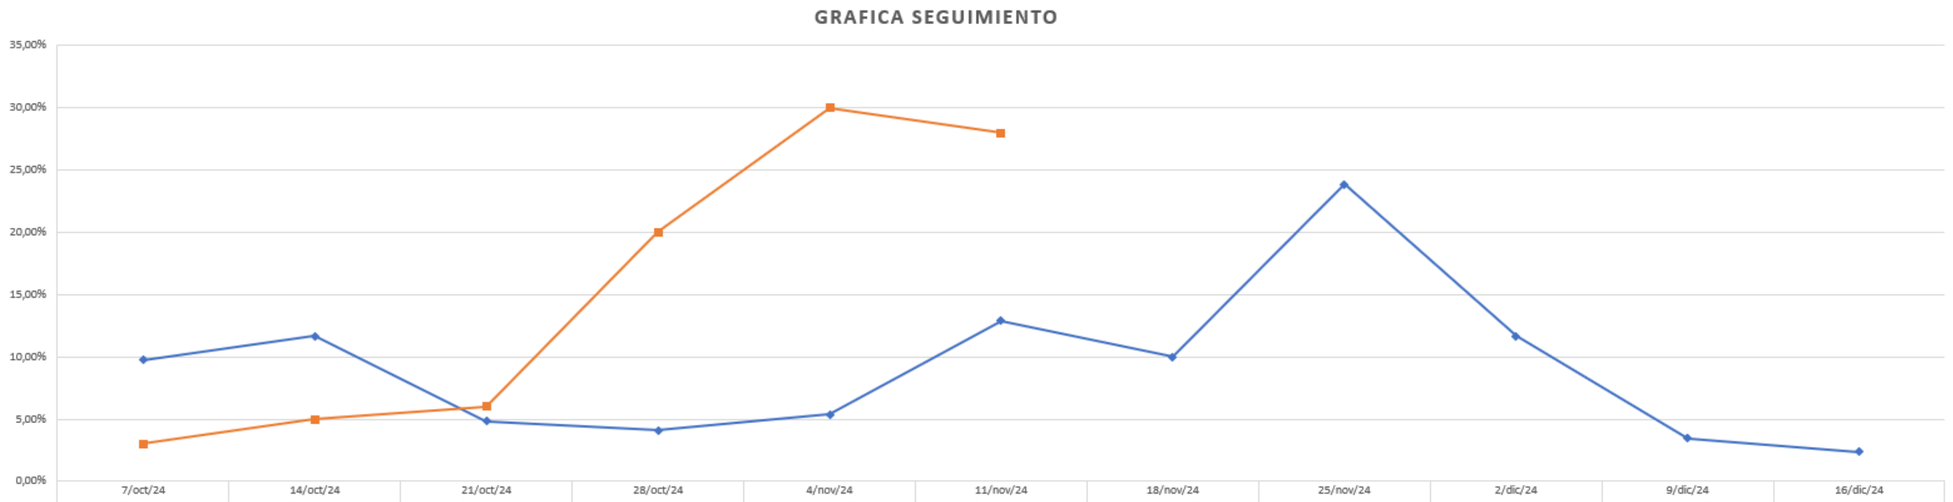

	7/oct/24 SEMANA 41	14/oct/24 SEMANA 42	21/oct/24 Semana 43	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50	16/dic/24 Semana 51
%PROGRAMADO	9,76%	11,68%	4,83%	4,12%	5,36%	12,90%	9,97%	23,85%	11,69%	3,48%	2,37%
% EJECUTADO	3,00%	5,00%	6,00%	20,00%	30,00%	28,00%					

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **AGUA DE DIOS / CUND** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: SE REALIZAN TRABAJOS INSTALACION REJA TIPO BANCO EN ZONA CUARTO MAQUINAS PATIO



Comentario: SE REALIZAN TRABAJOS INSTALACION REJA TIPO BANCO EN ZONA CUARTO MAQUINAS PATIO



Comentario: SE INICIA CON AVISO IDENTIFICACION ORIP



Comentario: SE REALIZAN REMATES DE ESTRUCTURA EN ZONA CUBIERTA ESCALERA



Comentario: SE REALIZAN TRABAJOS INSTALACION REJA TIPO BANCO EN ZONA CUARTO MAQUINAS PATIO



Comentario: SE REALIZA INSTALACION DE MUEBLE SUPERIOR Y MUEBLE INFERIOR EN ZONA COCINA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días


ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **AGUA DE DIOS / CUND** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: SE REALIZA INSTALACION DE MUEBLE SUPERIOR Y MUEBLE INFERIOR EN ZONA COCINA

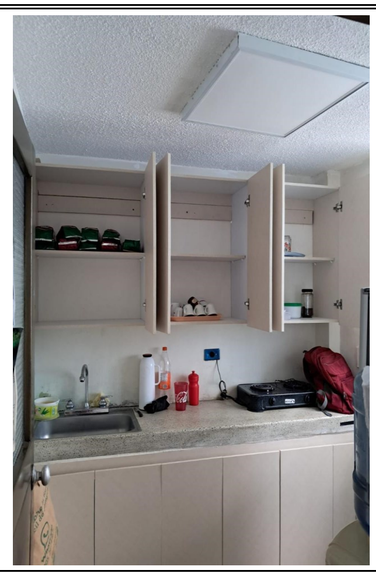

Comentario: SE REALIZA INSTALACION DE MUEBLE SUPERIOR Y MUEBLE INFERIOR EN ZONA COCINA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **LA PALMA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	15,46%	63,63%
Valor básico de la Obra programada:	$ 126.341.463,00	$ 80.391.072,91

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	70,00%	81,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	88.439.024,10	102.336.585,03

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA

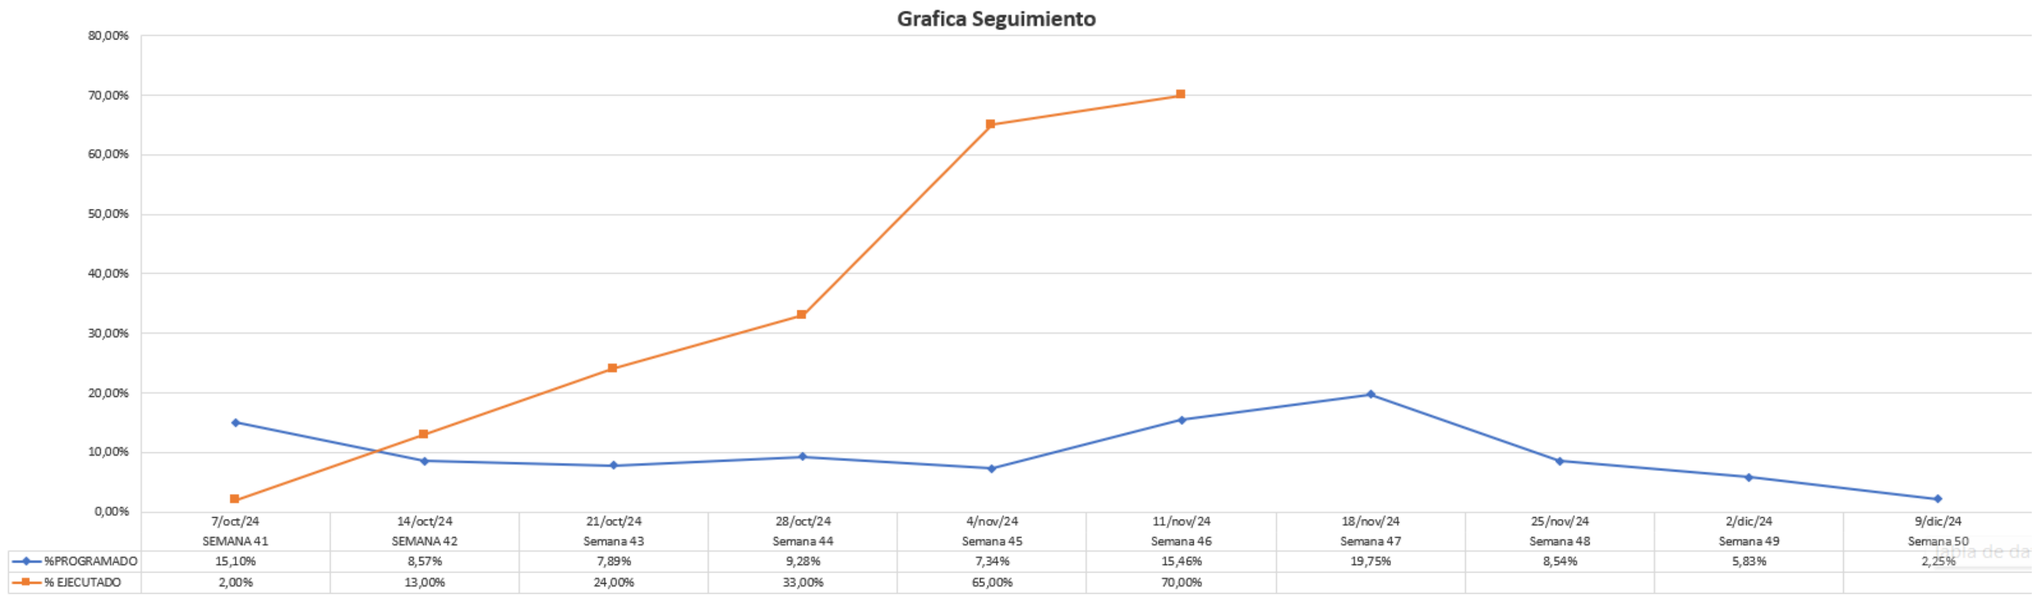


IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA DIEZ (10) SE HA AVANZADO EN OBRA EN LAS SIGUENTES ACTIVIDADES: INSTALACION GENERAL DE CIELO RASO EN PVC, DESMONTE DE CABLEADO Y TUBERIA ELECTRICA E INSTALACION DE TOMAS, INTERRUPTORES Y LUMINARIAS, LAVADO GENERAL DE FACHADA E INSTALACION DE ENCHAPE EN COCINA, DESMONTE E INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



	7/oct/24 SEMANA 41	14/oct/24 SEMANA 42	21/oct/24 Semana 43	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50
%PROGRAMADO	15,10%	8,57%	7,89%	9,28%	7,34%	15,46%	19,75%	8,54%	5,83%	2,25%
% EJECUTADO	2,00%	13,00%	24,00%	33,00%	65,00%	70,00%				

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **LA PALMA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE




Comentario: DESMONTE E INSTALACION TANQUES DE AGUA



Comentario: ESTRUCTURACION E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC



Comentario: VERIFICACIÓN DE RED EN CAJA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA

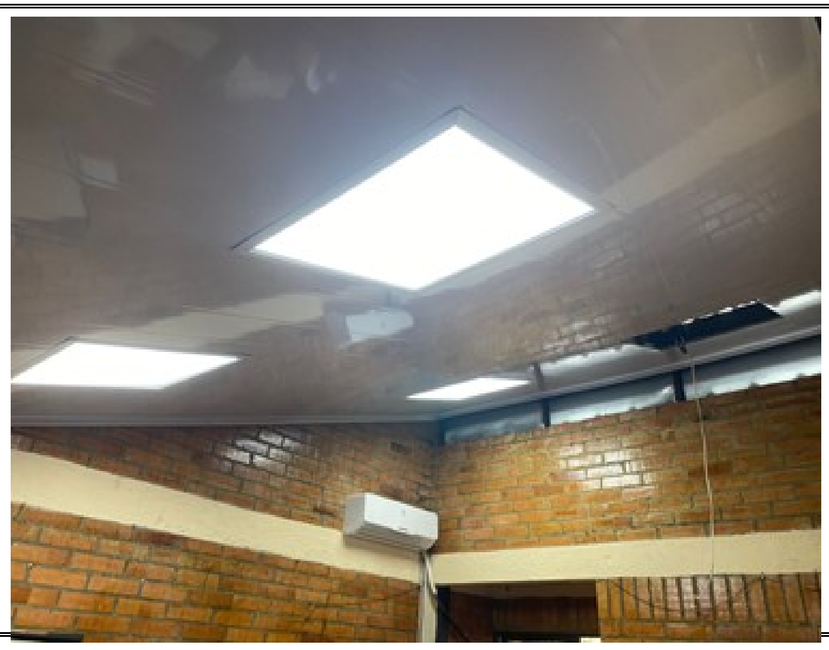

Comentario: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **LA PALMA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: LAVADO DE FACHADA



Comentario: IINSTALACIÓN DE ENCHAPE MUROS COCINA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTA ROSA DE VITERBO** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	18,26%	63,57%
Valor básico de la Obra programada:	$ 129.729.468,00	$ 82.469.022,81

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	61,00%	84,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 79.134.975	108.972.753,12

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA

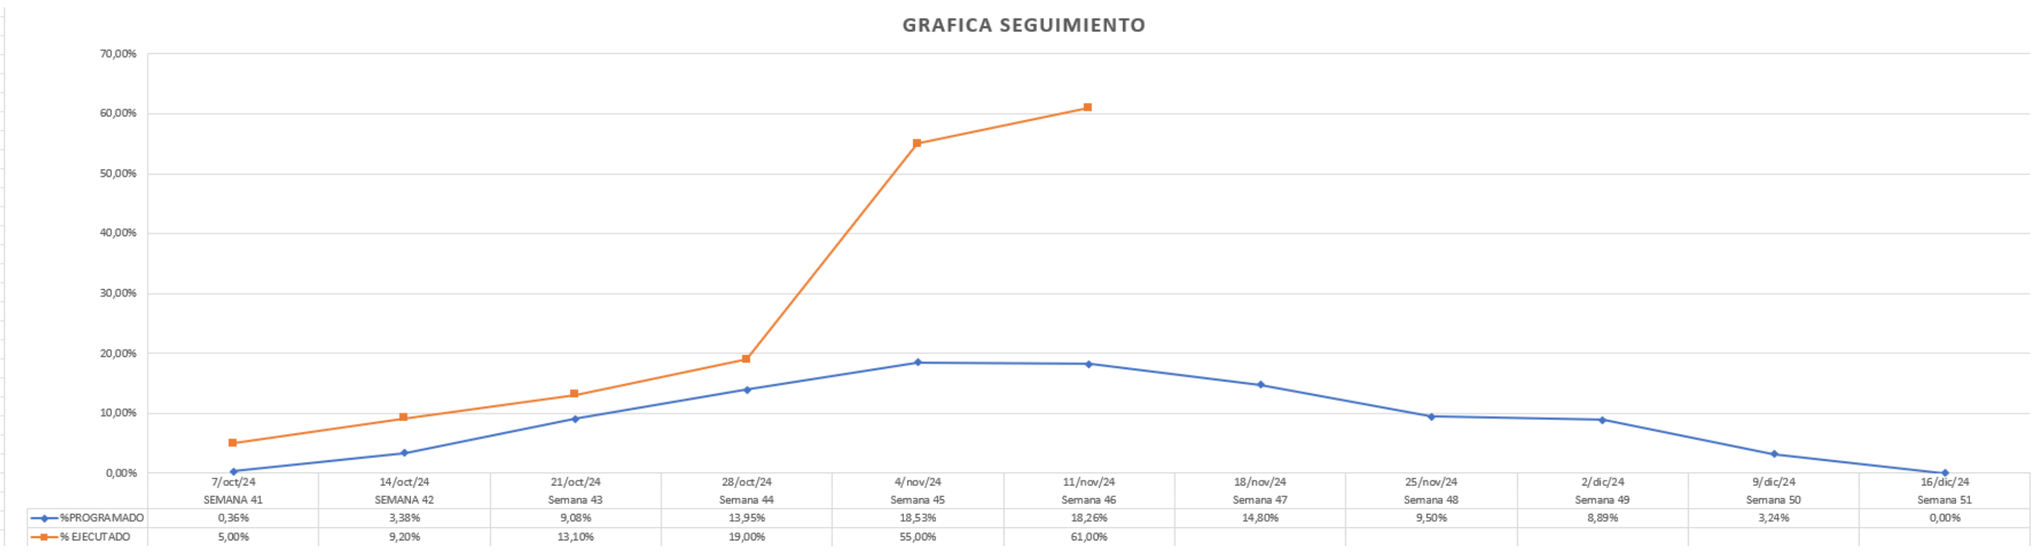


IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO DIEZ (10) SE ADELANTARON ACTIVIDADES COMO: INSTALACIÓN DE PVC EN SECTOR ATENCION AL USUARIO VENTANILLA PASILLO INTERNO SEGUNDO PISO, BANO DESPACHO REGISTRADOR, BANO HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO PISO LUMINARIAS SOBRE PUESTAS, LUMIARIAS DE 1.20X30 DE INCRUSTAR Y SOBREPONER EN LA SEGUNDA PLANTA , RESANES SOBRE MUROS, VINILO TIPO 1, PINTURA EXTERIOR LAVABLE SOBRE LA FACHADA EN LA PRIMERA PLANTA



	7/oct/24 SEMANA 41	14/oct/24 SEMANA 42	21/oct/24 Semana 43	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50	16/dic/24 Semana 51
%PROGRAMADO	0,36%	3,38%	9,08%	13,95%	18,53%	18,26%	14,80%	9,50%	8,89%	3,24%	0,00%
% EJECUTADO	5,00%	9,20%	13,10%	19,00%	55,00%	61,00%					

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTA ROSA DE VITERBO** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: INSTALACIÓN CIELORRASO TABLILLA PVC E ILUMINARIAS



Comentario: INSTALACIÓN LUMINARIAS DE INCRUSTAR



Comentario: RESANES



Comentario: RESANES EXTERIOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTA ROSA DE VITERBO** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: RESANE



Comentario: PINTURA INTERIOR VINILO TIPO 1

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GUATEQUE** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,60%	85,63%
Valor básico de la Obra programada:	$ 140.521.985,00	$ 120.328.975,76

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	98,00%	98,20%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	137.711.545,30	137.992.589,27

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA




IMAGEN OFICINA

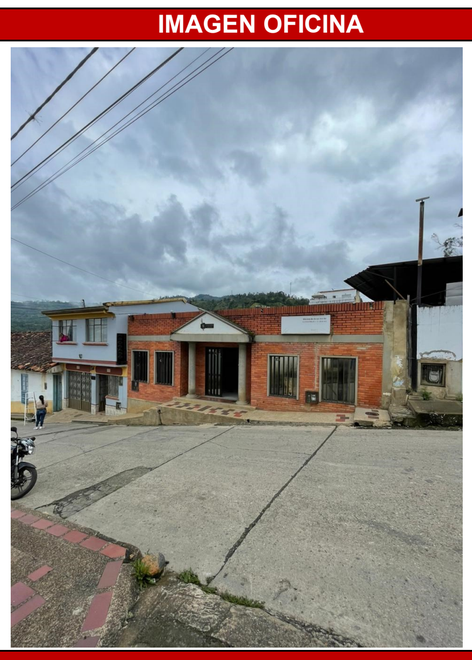

AVANCE

EN LA SEMANA DIEZ (10) SE HA AVANZADO EN OBRA EN LAS SIGUENTES ACTIVIDADES:DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SECTOR RECEPCIÓN, OFICINA 1, OFICINA REGISTRADOR Y PASILLO 5 COMPLETANDO 100%, INSTALACIÓN PVC EN LOS MISMO SECTORES COMPLETANDO 100%, DESMONTE E INSTALACIÓN LUMINARIAS EN LOS MISMOS SECTORES COMPLETANDO EL 100%, TRABAJOS DE DEMOLICION DE PAÑETE, PAÑETE IMPERMEABILIZADO, ESTUCO, PINTURA SECTOR OFICINA REGISTRADOR Y OFICINA 1 ALCANZANDO EL 100%, INSTALACIÓN PELICULA ANTIREFLEJO DE 4 MICRAS ALCANZANDO EL 100%

GRAFICA SEGUIMIENTO

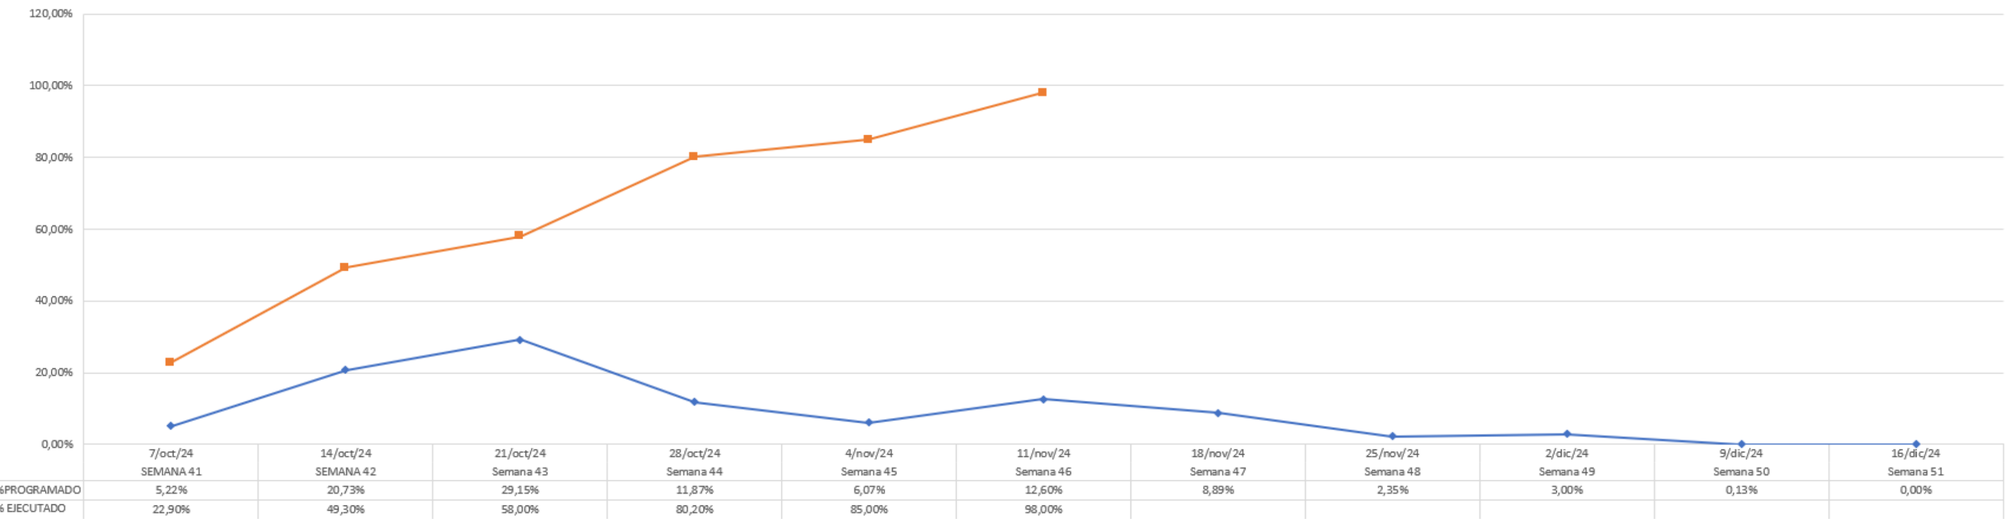

	7/oct/24 SEMANA 41	14/oct/24 SEMANA 42	21/oct/24 Semana 43	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50	16/dic/24 Semana 51
%PROGRAMADO	5,22%	20,73%	29,15%	11,87%	6,07%	12,60%	8,89%	2,35%	3,00%	0,13%	0,00%
% EJECUTADO	22,90%	49,30%	58,00%	80,20%	85,00%	98,00%					

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GUATEQUE** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: DESMONTE DE CIELO RASO OFICINA REGISTRADOR



Comentario: INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 30CMX9MM



Comentario: INSTALACION ILUMINARIAS



Comentario: ESTUCO PLASTICO

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GUATEQUE** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: PAÑETE IMPERMEABILIZADO



Comentario: INSTALACION PELICULA EN OFICINA REGISTRADOR

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **CONVENCION- N. SANTANDER** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	24,10%	60,28%
Valor básico de la Obra programada:	$ 105.053.125,00	$ 63.326.023,75

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	50,00%	74,16%
Valor básico de la Obra	$ 52.526.562,50	$ 77.907.397,50

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA

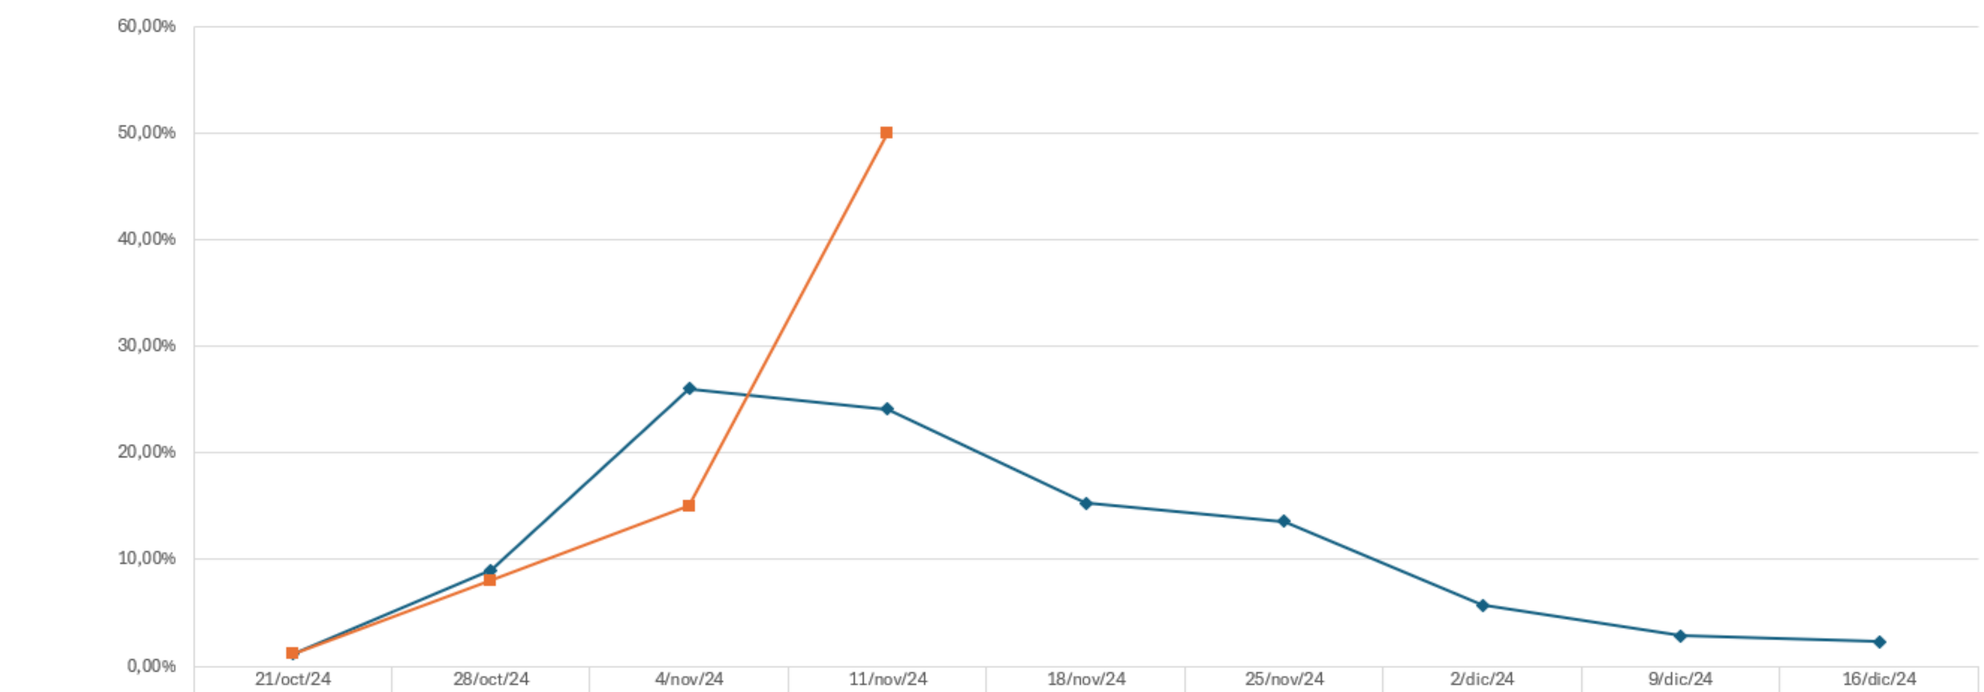


IMAGEN OFICINA



AVANCE

GRAFICA SEGUIMIENTO



	21/oct/24 Semana 43	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50	16/dic/24 Semana 51
%PROGRAMADO	1,16%	9,02%	26,01%	24,10%	15,27%	13,58%	5,71%	2,87%	2,28%
% EJECUTADO	1,16%	8,00%	15,00%	50,00%					

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **CONVENCION- N. SANTANDER** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: INSTALACION ESTRUCTURA, CUBIERTA EN TEJA UPVC EN TODA EL AREA



Comentario: ESTRUCTURACION PARA CIELO RASO EN PVC



Comentario: INSTALACION DE CIELO RASO EN LAS DIFERENTES AREAS



Comentario: INSTALACION DE CIELO RASO EN LAS DIFERENTES AREAS

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL


Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **CONVENCION- N. SANTANDER** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

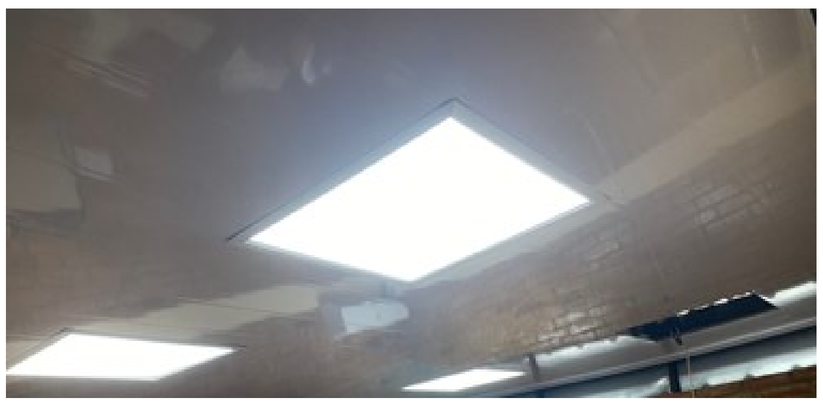

Comentario: CONTINUA ESTRUCTURACION CIELO RASO



Comentario: INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, ADECUACION DE ESPACIOS PARA ILUMINACION

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **NEIVA - HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	32,50%	53,00%
Valor básico de la Obra programada:	$ 200.238.984,00	$ 106.126.661,52

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	25,00%	65,00%
Valor básico de la Obra	$ 50.059.746,00	$ 130.155.339,60

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **NEIVA - HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

AVANCE

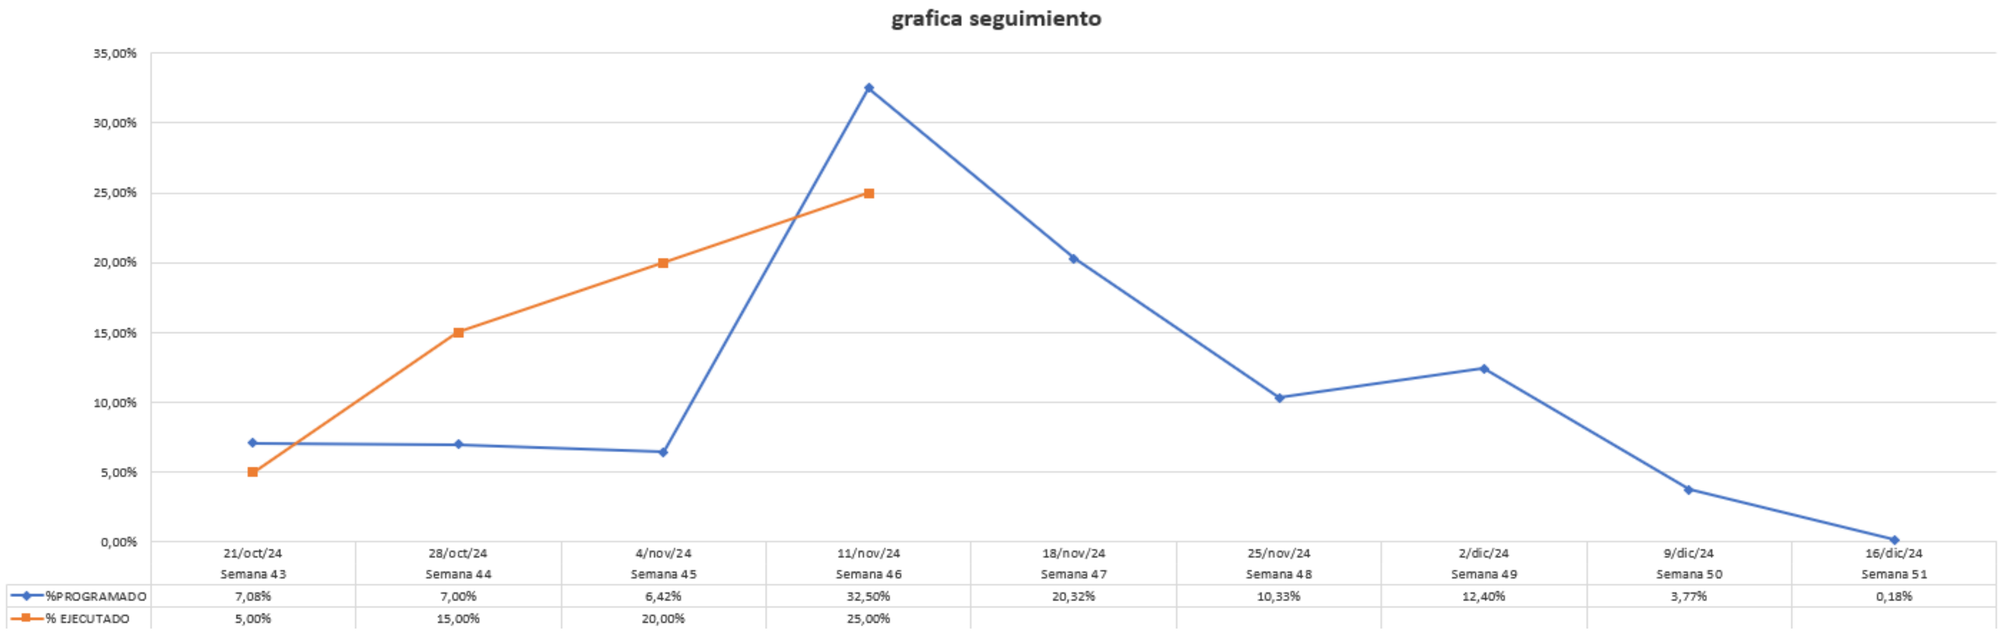

	21/oct/24 Semana 43	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50	16/dic/24 Semana 51
%PROGRAMADO	7,08%	7,00%	6,42%	32,50%	20,32%	10,33%	12,40%	3,77%	0,18%
% EJECUTADO	5,00%	15,00%	20,00%	25,00%					

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **NEIVA - HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA



Comentario: INSTALACION DE LAMPARAS EN ZONA BAÑOS



Comentario: DESTRONQUE DE PISO EN ZONA ATENCION PUBLICO PRIMER PISO



Comentario: PINTURA DE ESCALERA



Comentario: PULIDO DE PISO EN ZONA ATENCION A PUBLICO PRIMER PISO



Comentario: CONTINUAN TRABAJOS DE APLICACIÓN PINTURA BAJO PLACA EN ZONA SEGUNDO PISO Y GESTION DISPOSICION RCD.

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **NEIVA - HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GARZON- HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	17,44%	22,37%
Valor básico de la Obra programada:	$ 143.094.539,00	$ 32.010.248,37

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	35,00%	65,00%
Valor básico de la Obra	$ 50.083.088,65	$ 93.011.450,35

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

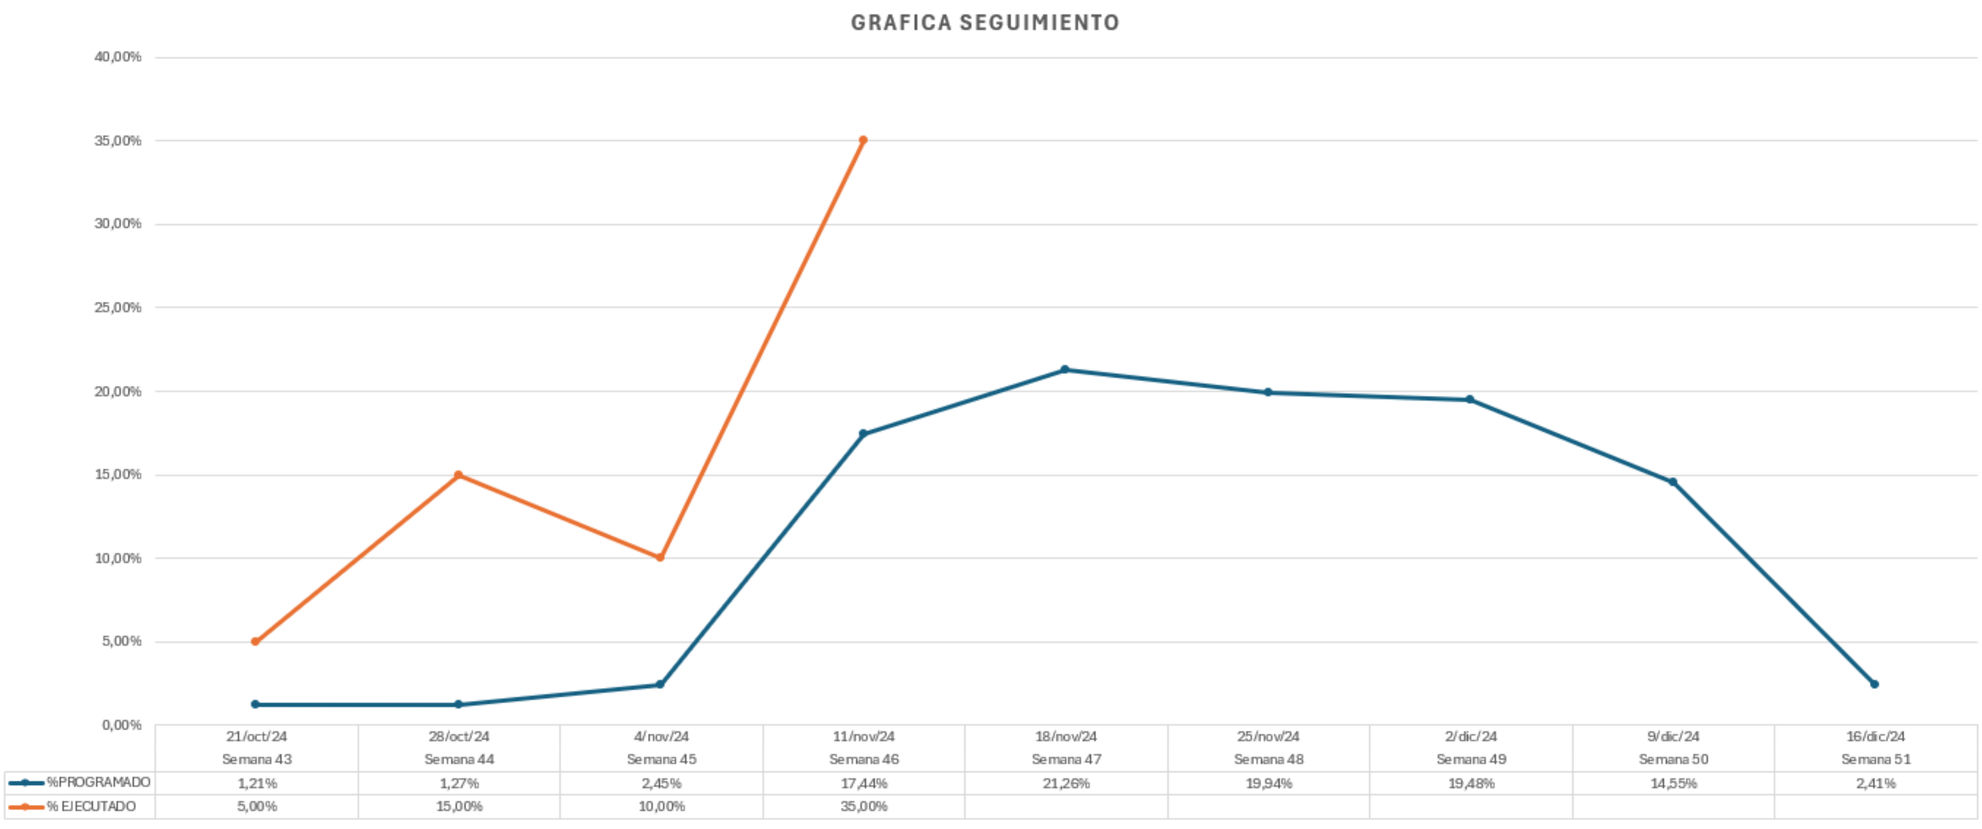

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GARZON- HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: CONTINUAN DESMONTES DE CUBIERTA, ESTRUCTURA EN MADERA



Comentario: INSTALACION DE CUBIERTA UPVC ANTICORROSIVO



Comentario: INSTALACION DE CUBIERTA, ESTRUCTURA CIELO RASO



Comentario: DEMOLICION DE PISO, ADECUACION PROVISIONAL DE OFICINA







Comentario: ARREGLO Y MATENIMIENTO PUERTA ACCESO GARAJE



Comentario: CAMBIO DE CUBIERTA EN EL 90% DEL AREA, TEMAS DE LLUVIA RESTRINGEN TERMINACION DE LA INSTALACION AL 100%

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GARZON- HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **FILANDIA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6,28%	20,83%
Valor básico de la Obra programada:	$ 46.740.812,00	$ 9.736.111,14

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	27,00%	32,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 12.620.019,24	$ 14.957.059,84

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA

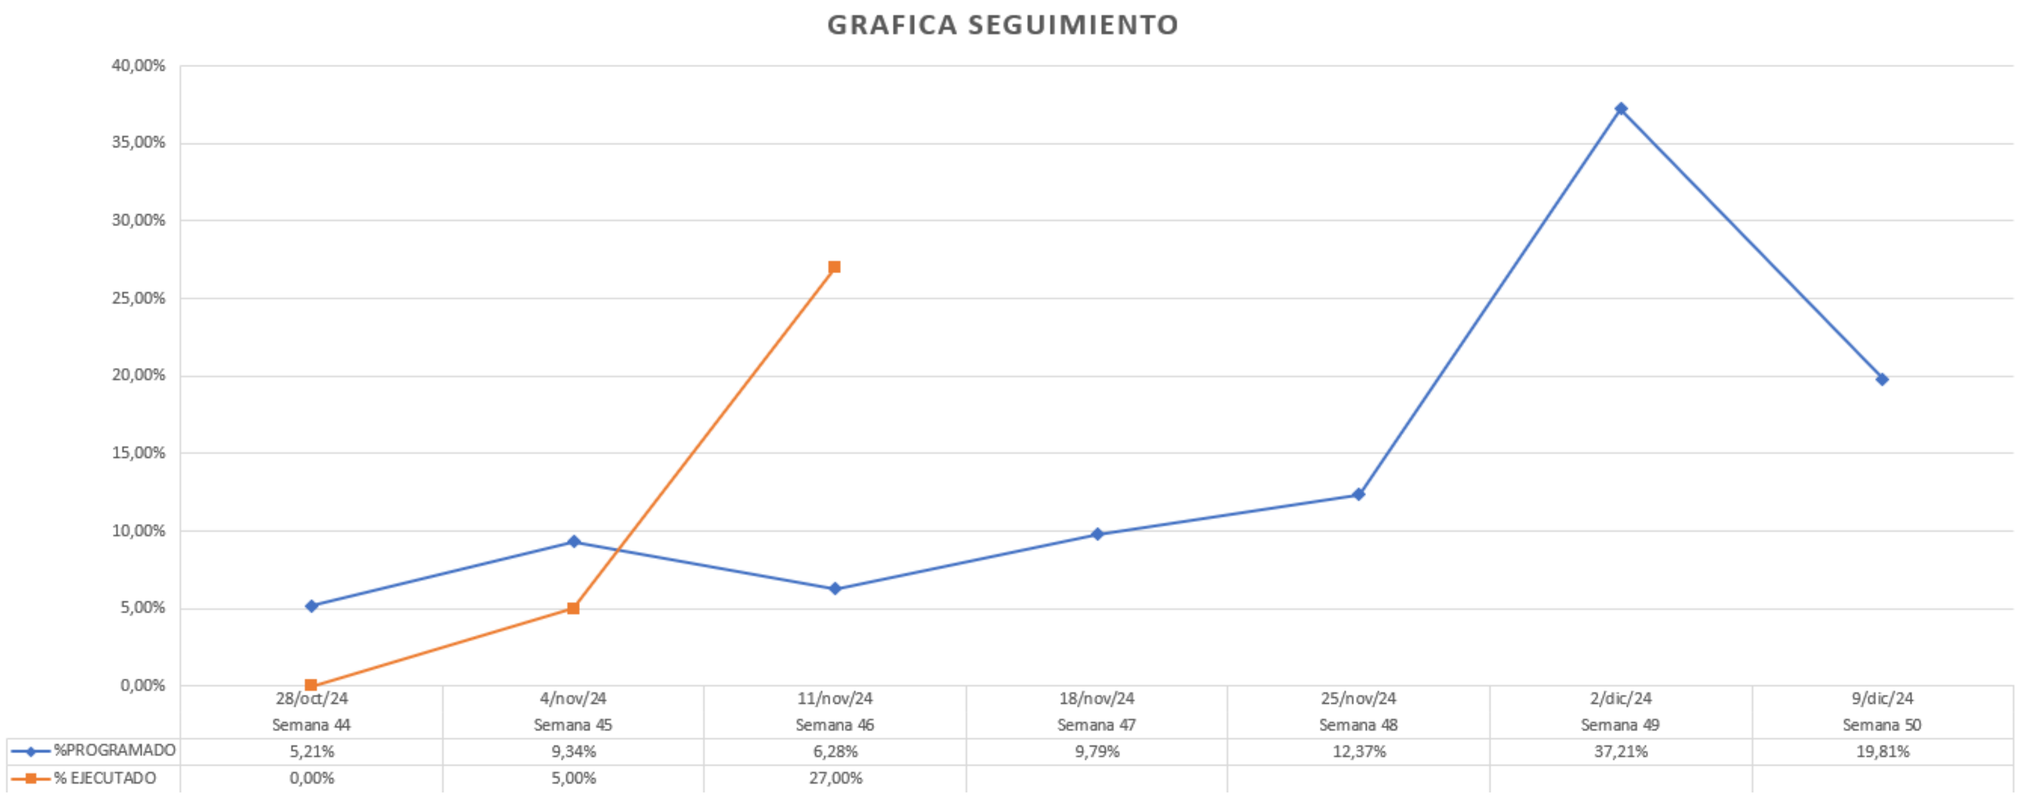


IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO DIEZ SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VIGAS CANALES EN CUBIERTA, MANTENIMIENTO DE TANQUE Y ESTRUCTURACION DESMONTE E INSTALACION DE CIELO RASO EN PISO 3 OFICINA REGISTRADOR.



	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50
%PROGRAMADO	5,21%	9,34%	6,28%	9,79%	12,37%	37,21%	19,81%
% EJECUTADO	0,00%	5,00%	27,00%				

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **FILANDIA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: RETIRO DE VEGETACION Y MANTENIMIENTO DE VIGAS CANALES



Comentario: INSTALACION DE CIELO RASO EN OFICINA PISO 3



Comentario: RETIRO DE VEGETACION Y MANTENIMIENTO DE VIGAS CANALES



Comentario: LIMPIEZA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **10** Del: **5 de noviembre de 2024** Al: **12 de noviembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **70** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **FILANDIA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: ESTRUCTURACION CIELO RASO PISO 3



Comentario: MANTENIMIENTO EN CUBIERTA Y TANQUE

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098
