CONSORCIO RIO GRANDE
CONSORCIO RIO GRANDE
901.668.549-7
CR 19 N 55 - 59 BRR TORCOROMA
TEL: 6023465
CORREO: facturacion@cscriogrande.com
compras@cscriogrande.com

CLIENTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
ID: 890201900
DIRECCIÓN: CRA 4 50 2A 50 88 **TEL:** - 3133316191
CIUDAD: Barrancabermeja
EMAIL: isolina.tirado@barrancabermeja.gov.co
FORMA DE PAGO: CREDITO
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria
FECHA GENERACIÓN: 2025-03-11 14:53:41
FECHA EXPEDICIÓN: 2025-03-11 21:17:09
MONEDA: Peso colombiano
COD. POSTAL:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No FCRG4

CONCEPTO: ACTA PARCIAL Nº2 //CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT	IMPUESTOS	VALOR
1	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - COSTO DIRECTO	1,000 u	2.920.566.689,92		2.920.566.689,92
2	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - ADMINISTRACION	1,000 u	834.723.773,42		834.723.773,42
3	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - IMPREVISTOS	1,000 u	29.205.666,90		29.205.666,90
4	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - UTILIDAD	1,000 u	146.028.334,50		146.028.334,50

CANT ITEMS: 4

DETALLE DE IMPUESTOS [*]	BASE	VALOR

SUBTOTAL (BASE)	3.930.524.464,74
[*] TOTAL IMPUESTOS	0,00
DESCUENTOS	0,00
TOTAL	**3.930.524.464,74**

- - - OBSERVACIONES - - -

VALOR EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

FECHAS DE PAGO (VENCIMIENTO)

Elaboró: GISSELLA MARTINEZ PEDROZO |

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio. Esta factura es un título valor (Art. 722 C. Co) exigible en la "Fecha de Pago" la cancelación extemporánea se rige por el Art. 65 L45/90 a una y media veces el bancario corriente (Art. 884 C. Co).
RESOLUCION DIAN AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN N.º 18764082502321 **DEL** 2024-10-30 **HASTA EL** 2025-10-30**RANGO AUTORIZADO DEL** FCRG1 **HASTA** FCRG100

MEDIOS DE PAGO

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE 670844703 A NOMBRE DE INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS NIT 900.096.609-1

CUFE: d5f1682b452598246e555560bee23066d1a937b291cf261578f18b86967d1bb54e286ce705087285ac017289b37dcd70

Banco de Occidente

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que nuestro cliente **INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS** Identificado con CC o NIT **900.096.609-1** es cuentahabiente en la oficina Barrancabermeja Principal, con la Cuenta corriente No **670-84470-3** la cual se encuentra activa. El Gerente que atiende al cliente es la Dra. **MARTHA EUGENIA CRUZ JIMENEZ**

Por lo anterior podemos afirmar que la **INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS** Es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación dirigida a **solicitud del titular** Hoy **17** de **febrero de 2025.**

Cordialmente,

MARTHA EUGENIA CRUZ JIMENEZ
Gerente de Relación Banca Empresarial
Oficina de Barrancabermeja
Banco de Occidente
Tel: 601 0100 Ext 72001

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

CONTRATO DE OBRA N°	:	N° 0401-23
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO RÍO GRANDE
NIT	:	901.668.549-7
REP. LEGAL	:	FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLÓN
CEDULA	:	37.580.244
DIRECCIÓN	:	CR 19 55 59 BARRIO URIBE URIBE
TELÉFONO	:	3132852957
CORREO ELECTRÓNICO	:	ingenieriamydsas@gmail.com
INTERVENTORÍA		
CONTRATISTA		CONSORCIO INTERMIRADOR
NIT.		901.669.152-1
REP. LEGAL	:	DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDES
C.C.	:	1.110.506.512 DE IBAGUÉ
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA
OBJETO	:	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER**
VALOR	:	El valor estimado del contrato es de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($25.466.325.369,80) exenta de IVA incluido AIU
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	:	FEBRERO 06 DE 2023
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	El plazo de duración del presente contrato será de TRECE (13) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El valor total del presente contrato será soportado con recursos para la vigencia fiscal 2023 según certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda No. 23-00540 del 30 de Enero de 2023, con rubros 1) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: ECOPETROL, por valor de: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($22.255.868.626); 2) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

		DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE, por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($746.235.772.00); 3) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS, por valor de MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.708.933.037.00), para un valor total de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($24.711.037.435.00). El valor restante corresponde a la vigencia 2024 y está soportado mediante el ACUERDO DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES No. 053 de 2022 de fecha 3 de noviembre de 2022.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	23-00540 DE ENERO 30 DE 2023 POR VALOR DE $24.711.037.435,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	23-00673 DE FEBRERO 07 DE 2023 POR VALOR DE $24.711.037.435
APROBACIÓN DE GARANTÍA		CO1.WRT.11144623 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023
BANCO DE PROYECTOS	:	2022680810072 DEL 18 DE ENERO DE 2023
CEPAA		0552 DEL 27 DE ENERO DE 2023
ACTA DE INICIO	:	MARZO 14 DE 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	:	0.00%
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	:	ABRIL 11 DE 2023
ACTA DE REINICIACIÓN N°1	:	MAYO 08 DE 2023
PERIODO DE LA SUSPENSIÓN N°1	**:**	**27 DÍAS CALENDARIO**
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	:	SEPTIEMBRE 19 DE 2023
ACTA DE REINICIACIÓN N°2	:	OCTUBRE 03 DE 2023
PERIODO DE LA SUSPENSIÓN N°2		**14 DÍAS CALENDARIO**
ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	OCTUBRE 12 DE 2023
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°3 DE LA PRESENTE ACTA Y SUS PRORROGAS	**:**	**110 DÍAS CALENDARIO**
ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	NOVIEMBRE 01 DE 2023
ACTA DE PRORROGA N°1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	NOVIEMBRE 10 DE 2023
ACTA DE PRORROGA N°2 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	DICIEMBRE 11 DE 2023
ACTA DE PRORROGA N°3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	ENERO 10 DE 2024
ACTA DE PRORROGA N°4 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	FEBRERO 09 DE 2024
ACTA DE PRORROGA N°5 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	FEBRERO 19 DE 2024

ACTA REINICIO No.3	:	MARZO 11 DE 2024
APROBACIÓN DE GARANTÍAS PARA EL REINICIO N°3	:	CO1.WRT.13926440 DEL 20 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO N°3	:	**SEPTIEMBRE 24 DE 2024**
FECHA DE ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS N°1	:	AGOSTO 5 DE 2024
ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS N°1	:	AGOSTO 12 DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°1		19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONADO N°1	:	TRECE (13) MESES
FECHA DE ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS N°2	:	ENERO 31 DE 2025
ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS N°2	:	ENERO 31 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°1	:	**24 DE OCTUBRE DE 2025**
OTROSÍ ACLARATORIO N°1 AL ADICIONAL EN PLAZO N°1	:	SEPTIEMBRE 23 DE 2024
VALOR DEL ACTA PARCIAL N°1	:	$5.238.494.256,52
VALOR DEL ACTA PARCIAL N°2	:	$3.930.524.464,74
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	:	36,00%
FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO	:	13 DE MARZO DE 2025

En Barrancabermeja, a los trece (13) días del mes de MARZO de 2025, se reunieron las siguientes personas: Ing. **JOHANNA PAOLA SANTOS REY,** Secretaria de Infraestructura identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, quien para los efectos de este contrato se denominará EL DISTRITO CONTRATANTE, el Ing. **LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA** profesional universitario grado 01, funcionario de la Secretaría de infraestructura del Municipio de Barrancabermeja, **FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLÓN** con cedula de Ciudadanía N° 37.580.244, representante legal de **CONSORCIO RÍO GRANDE,** y el **Ing. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDES** con cedula de ciudadanía 1.110.506.512 de Ibagué, Representante legal de **CONSORCIO INTERMIRADOR** con el fin de elaborar y suscribir el ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2 del contrato de obra 0401-23:

ACUERDAN:

1. El interventor delegado certifica que reviso, verifico y constato el cumplimiento de los recursos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. El interventor certifica que reviso, verifico y constato el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista de la obra, con base en los soportes presentados por este.

3. Las cantidades y los valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones de campo y las revisiones efectuadas por la supervisión.

4. La presente acta se elabora de acuerdo con las cantidades de obra medidas y verificadas en campo por la interventoría delegada, quien considero viable la cuantificación y facturación de las mismas, según ejercicio aritmético entre valores unitarios y cantidades contractuales, cuyas memorias de cálculos de anexan.

5. El Acta parcial N°2 comprende las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el **17 octubre 2024 al 10 de febrero 2025**

6. Que se autoriza el pago de la presenta acta que se relaciona a continuación y cuyo anexo se adjunta:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje de Ejecución	Amortización del anticipo	Neto a Pagar
Acta parcial N°1	17/09/2024	$ 5.238.494.256,52	20,57%	0,00	$ 5.238.494.256,52
Acta parcial N°2	13/03/2025	$3.930.524.464,74	15.43%	0,00	$3.930.524.464,74
TOTALES		**$ 9.169.018.721,26**	**36,00%**		**$ 9.169.018.721,26**

7. Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente, autorizar el pago, por valor de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($3.930.524.464,74), a CONSORCIO RIO GRANDE, con **NIT.** 901.668.549-7.

8. Que la presente acta se pagara con cargo al decreto de recursos de pasivos de vigencias expiradas 089 del 8 de marzo de 2025 de la siguiente manera:

Identificación Presupuestal:	2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14
Detalle:	Otros edificios no residenciales (Pasivos de vigencias expiradas)
COD FUENTE:	R023
Fuente de financiación:	ECOPETROL
Valor de la fuente:	**$17.017.374.369,48**
Valor a pagar:	**$2.356.133.821,28**

Identificación Presupuestal: 2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14

Identificación Presupuestal:	2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14
Detalle:	Otros edificios no residenciales (Pasivos de vigencias expiradas)
COD FUENTE:	R061
Fuente de financiación:	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE
Valor de la fuente:	**$3.423.546.859,00**
Valor a pagar:	**$1.574.390.643,46**

"Por medio del cual se adicionan recursos del balance de los pasivos exigibles de vigencias expiradas al Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal 2025"

Rubro Presupuestal	Detalle	Código Fuente	Fuente de Financiación	BPIN	Valor
2.3-35-3502-0200-3502113-02	PROYECTO: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER (Pasivos de Vig. Expiradas)			2022680810072	20.440.921.228,48
2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14	Otros Edificios no Residenciales (Pasivos de Vig. Expiradas	R023	ECOPETROL		17.017.374.369,48
2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14	Otros Edificios no Residenciales (Pasivos de Vig. Expiradas)	R061	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE		3.423.546.859,00
	TOTAL INCORPORACION DE RECURSOS DEL BALANCE PRESUPUESTO DE GASTOS 2024				20.440.921.228,48

En constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron el día 13 de marzo de 2025.

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ING. ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Cargo: Jefe de la dependencia

CONTRATISTA
FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLÓN
Rep. Legal de CONSORCIO RIO GRANDE

SUPERVISOR
ING. LUIS FERNANDO FONSECA V.
Cargo: Profesional Universitario I

INTERVENTOR
ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDES
Rep. Legal de CONSORCIO
INTERMIRADOR

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Reviso aspectos jurídicos	Erich Samir Gomez - CPS		
Proyectó:	Luis Fernando Fonseca V. - Supervisor		
Revisó - Aprobó:	Ing. Johanna Paola Santos Rey		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.230.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.824.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.230.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.648,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.325.369,80				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	38,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
01	OBRAS PRELIMINARES																
1,01	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	13,00	$ 5.547.957,00	$ 72.123.441,00	13,00	72.123.441,00	13,00	72.123.441,00	12,00	$ 66.575.484,00	13,00		26,00	$ 144.246.882,00	14,00	$ 77.671.398,00
1,02	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION.	ML	211,78	$ 28.589,00	$ 6.054.578,42	0,00	-	0,00	-	-	$ 0,00			0,00	$ 0,00		
1,03	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	133,53	$ 10.527,00	$ 1.405.670,31	133,53	1.405.670,31	133,53	1.405.670,31	133,53	$ 1.405.670,31			133,53	$ 1.405.670,31		
1,04	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	184,56	$ 115.497,00	$ 21.316.126,32	184,56	21.316.126,32	184,56	21.316.126,32	184,56	$ 21.316.126,32			184,56	$ 21.316.126,32		
1,05	DEMOLICIÓN DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	328,00	$ 27.395,00	$ 8.985.560,00	328,00	8.985.560,00	328,00	8.985.560,00	328,00	$ 8.985.560,00			328,00	$ 8.985.560,00		
1,06	DESMONTE DE CUBIERTA PREDIO EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.894,66	$ 11.395,00	$ 21.532.810,90	1894,66	21.532.810,90	1894,66	21.532.810,90	1.894,66	$ 21.532.810,90			1894,66	$ 21.532.810,90		
1.07 NP	Cerramiento en lamina de zinc de dimensiones 3m * 0,8 m reforzada con madera rolliza de 2"x2" empotrada 50cm en concreto de 14 Mpa y triple refuerzo transversal con listones de 2x2', incluye dos puertas para entrada de camiones en lamina y bordillo perimetral	ML		$ 208.345,00				211,76	44.123.304,10	210,00	$ 43.752.450,00	170,00		381,76	$ 79.541.954,10	171,78	$ 35.789.504,10
1.08 NP	Instalación eléctrica provisional (Incluye un TABLERO PROVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN, COMPRENDE PROTECCIÓN GENERAL, 8 SALIDAS 110V, 4 SALIDAS 220V BIFÁSICAS Y 2 SALIDAS A 220V TRIFÁSICAS.)	UND		$ 30.723.358,00				1,00	30.723.358,00	1,00	$ 30.723.358,00			1,00	$ 30.723.358,00		
	TOTAL EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)				$ 131.418.186,95		$ 125.363.608,53		$ 200.210.270,63		$ 194.291.459,53				$ 307.752.361,63		$ 113.460.902,10
							-		-								
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACION						-		-								
2,01	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ACARREO INTERNO	M3	497,02	$ 34.682,00	$ 17.237.647,64	1360,86	47.197.388,14	1360,86	47.197.346,52	1.360,86	$ 47.197.346,52			1360,86	$ 47.197.346,52		
2,02	RELLENO EN MATERIAL DE SELECCIONADO COMPACTADO	M3	828,37	$ 48.972,00	$ 40.566.935,64	1785,05	87.417.468,60	1785,05	87.417.468,60	1.772,48	$ 86.801.890,56	3993,90		5778,95	$ 283.006.739,40	4006,47	$ 196.204.848,84
2,03	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	27,19	$ 121.460,00	$ 3.302.497,40	27,19	3.302.497,40	27,19	3.302.497,40		$ 0,00	413,07		440,26	$ 53.473.979,60	413,07	$ 50.171.482,20
2,04	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTACTO	M3	75,73	$ 123.800,00	$ 9.375.374,00	75,73	9.375.374,00	75,73	9.375.374,00		$ 0,00	181,93		257,66	$ 31.898.308,00	181,93	$ 22.522.934,00
2,05	RELLENO DE RESPALDO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	M3	431,53	$ 19.271,00	$ 8.316.014,63	0,00	-	0,00	-		$ 0,00			0,00	$ 0,00		$ 0,00
2,06	EXCAVACIÓN Y CONCRETO PARA PILOTES F'C= 28 MPA	M3	346,83	$ 1.470.278,00	$ 509.936.518,74	346,83	509.936.518,74	346,83	509.936.518,74	346,56	$ 509.539.543,68	161,17		508,00	$ 746.901.224,00	161,44	$ 237.361.680,32
2,07	EXCAVACIÓN PARA TANQUE, SEMISÓTANO, DADOS, ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	1.095,71	$ 36.790,00	$ 40.311.170,90	1095,71	40.311.170,90	1095,71	40.311.170,90		$ 0,00	1187,21		2282,92	$ 83.988.626,80	2282,92	$ 83.988.626,80
2,08	CONCRETO PARA SOLADO F'C= 14 MPA (E=0.05M)	M2	235,53	$ 26.914,00	$ 6.339.054,42	235,53	6.339.054,42	235,53	6.339.054,42	235,50	$ 6.338.247,60	239,29		474,82	$ 12.779.305,48	239,32	$ 6.441.058,48
2,09	RELLENO EN PEDRAPLEN PARA MEJORAMIENTO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS	M3	122,06	$ 104.279,00	$ 12.728.294,74	321,84	33.560.684,10	321,84	33.561.153,36	157,44	$ 16.417.685,76	1967,25		2289,09	$ 238.704.016,11	2131,65	$ 222.286.330,35
2,10	CONCRETO PARA DADOS DE CIMENTACIÓN F'C= 35 MPA	M3	253,18	$ 671.545,00	$ 170.021.763,10	253,18	170.021.763,10	253,18	170.021.763,10	185,24	$ 124.396.995,80			253,18	$ 170.021.763,10	67,94	$ 45.624.767,30
2,11	CONCRETO PARA LOSA DE FONDO DEL TANQUE F'C= 28 MPA (E=0.3M)	M3	38,88	$ 739.576,00	$ 28.754.714,88	38,88	28.754.714,88	38,88	28.754.714,88		$ 0,00	12,55		51,43	$ 38.036.393,68	51,43	$ 38.036.393,68
2,12	CONCRETO PARA PEDESTAL F'C= 28 MPA	M3	20,08	$ 624.396,00	$ 12.537.871,68	20,08	12.537.871,68	20,08	12.537.871,68	11,88	$ 7.417.624,48	4,08		24,16	$ 15.085.407,36	12,28	$ 7.667.562,88
2,13	CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE F'C= 28 MPA	M3	56,23	$ 721.865,00	$ 40.590.468,95	56,23	40.590.468,95	56,23	40.590.468,95	53,96	$ 38.951.835,40	14,26		70,49	$ 50.884.263,85	16,53	$ 11.932.428,45
2.14 NP	Demolicion de estructuras de cimientos existente	M3		$ 192.626,00				807,96	155.633.295,00	807,96	$ 155.633.295,00			807,96	$ 155.633.295,00		$ 0,00
2.15 NP	Descabezado de pilotes	UND		$ 181.807,00				84,00	15.271.788,00	60,00	$ 10.908.420,00			84,00	$ 15.271.788,00	24,00	$ 4.363.368,00
2.16 NP	Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2000 o similar	M2		$ 16.051,00				541,40	8.695.425,40		$ 0,00			541,40	$ 8.695.425,40	541,40	$ 8.695.425,40
2.17 NP	Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2500 o similar	M2		$ 19.087,00				1995,00	38.078.565,00		$ 0,00			1995,00	$ 38.078.565,00	1995,00	$ 38.078.565,00
2.18 NP	Muro de contencion temporal, mediante tablaestacado en modulos metalicos H:6.0 Mts, incluye tuberia 4" Tipo Peaado con punta de lapiz	M2		$ 852.870,00				341,76	291.476.851,20	341,76	$ 291.476.851,20	392,17		733,93	$ 625.946.028,23	392,17	$ 334.469.175,03
2.19 NP	Bombeo y manejo de aguas	DIA		$ 422.228,00				150,00	63.334.200,00	149,00	$ 62.911.972,00	150,00		300,00	$ 126.668.400,00	151,00	$ 63.756.428,00
2.20 NP	PROJUNTA DE EXPANSION CON CINTA PVC O-32, INCLUYE SELLADOR	ML		$ 77.730,00				71,96	5.593.450,80		$ 0,00			71,96	$ 5.593.450,80		$ 0,00
2.21 NP	Impermeabilizacion externa del tanque de agua subterraneo, sistema de Geo-compuesto	M2		$ 290.255,00				176,94	51.180.779,70		$ 0,00			176,94	$ 51.180.779,70	0,00	$ 0,00
2.22 NP	Tuberia de acero para camisas no recuperables con profundidad de 10.0 mts, diametro entre 60 y 80 cm y espesor 3/8"	ML		$ 2.346.157,00				120,00	281.538.840,00	119,00	$ 279.192.683,00			120,00	$ 281.538.840,00		$ 0,00
	TOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACION				$ 900.018.326,72		$ 989.344.974,91		$ 1.900.148.597,66		$ 1.837.184.599,40				$ 3.080.583.944,03		$ 1.371.601.094,73
03	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS																
3,01	CONCRETO PARA COLUMNAS F'C= 35 MPA	M3	205,25	$ 1.233.019,00	$ 253.077.149,75	205,25	253.077.149,75	205,25	253.077.149,75		$ 0,00		205,00	0,25	$ 308.254,75		$ 0,00
3,02	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE TANQUE F'C= 28 MPA	M3	21,67	$ 1.055.962,00	$ 22.882.696,54	21,67	22.882.696,54	21,67	22.882.696,54		$ 0,00	22,72		44,39	$ 46.874.153,18	44,39	$ 46.874.153,18
3,03	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN F'C= 28 MPA	M3	21,72	$ 1.088.072,00	$ 23.632.923,84	21,72	23.632.923,84	21,72	23.632.923,84		$ 0,00	34,02		55,74	$ 60.849.133,28	21,44	$ 23.328.263,68
3,04	CONCRETO PARA LOSA SUPERIOR DEL TANQUE CON VIGAS DESCOLGADAS F'C= 28 MPA	M3	44,57	$ 1.287.270,00	$ 57.373.623,90	44,57	57.373.623,90	44,57	57.373.623,90		$ 0,00		4,03	40,54	$ 52.185.925,80		$ 0,00
3,05	CONCRETO PARA LOSETA AÉREA E=0,12m F'C= 28 MPA	M2	1.409,00	$ 177.628,00	$ 250.277.852,00	1409,00	250.277.852,00	1409,00	250.277.852,00		$ 0,00			1409,00	$ 250.277.852,00		$ 0,00
3,06	CONCRETO PARA VIGAS AEREAS F'C= 28 MPA	M3	758,41	$ 981.876,00	$ 744.664.577,16	758,41	744.664.577,16	758,41	744.664.577,16		$ 0,00			758,41	$ 744.664.577,16		$ 0,00
3,07	CONCRETO PARA LOSA DE CONTRAPISO F'C= 28 MPA	M3	138,32	$ 782.643,00	$ 108.255.179,76	138,32	108.255.179,76	138,32	108.255.179,76		$ 0,00			138,32	$ 108.255.179,76		$ 0,00
3,08	CONCRETO PARA ESCALERA F'C= 28 MPA	M2	56,55	$ 282.709,00	$ 15.987.193,95	56,55	15.987.193,95	56,55	15.987.193,95		$ 0,00			56,55	$ 15.987.193,95		$ 0,00
3,09	JUNTA DE DILATACION DE 16 CM METALICA CON SISTEMA DE BANDEJA CENTRAL	ML	46,80	$ 1.948.641,00	$ 91.196.398,80	46,80	91.196.398,80	46,80	91.196.398,80		$ 0,00			46,80	$ 91.196.398,80		$ 0,00
3,10	ACERO PARA ESTRUCTURA METALICA (Incluye perfileria en acero estructural. Incluye suministro, corte, fabricación de piezas con curvatura, pintura de acabado, transporte e instalación en el malecón de Barrancabermeja)	KG	110.620,31	$ 18.701,00	$ 2.068.710.417,31	110620,31	2.068.710.417,31	110620,31	2.068.710.417,31		$ 0,00		110000,00	620,31	$ 11.600.417,31		$ 0,00
3,11	ACERO DE REFUERZO	KG	258.611,69	$ 6.727,00	$ 1.739.680.838,63	258611,69	1.739.680.838,63	258611,69	1.739.680.838,63	89.185,08	$ 599.948.033,16			258611,69	$ 1.739.680.838,63	68603,61	$ 461.496.484,47
3,12 NP	EXCAVACIÓN MECANIZADA PARA PILOTES DE 10 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 0,80 y 0,60 mts (Pilotes entre 60 y 80 cms)	ML		$ 1.166.654,00				1008,18	1.166.115.429,72	1.008,18	$ 1.166.115.429,72			1008,18	$ 1.166.115.429,72		$ 0,00
3,13 NP	Acarreo y retiro de lodos producto de perforación de pilotes (material saturado contaminado)	M3		$ 151.872,00				1738,48	264.026.434,56	1.737,72	$ 263.911.011,84	4553,42		6291,90	$ 955.563.436,80	4554,18	$ 691.652.424,96
3,14 NP	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE PARA COLUMNAS F'C= 35 MPA	M3		$ 2.004.298,38					-			205,57		205,57	$ 412.023.618,47	62,55	$ 125.368.863,82
3,15 NP	FORMALETA FIGURADO ESPECIAL PARA VIGAS Y LOSETAS AEREAS	UND		$ 147.391,06					-			1,00		2515,51	$ 370.763.692,03		
	TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS				$ 5.375.738.851,64		$ 6.375.738.851,64		$ 6.805.880.716,92		$ 2.029.974.474,72				$ 6.026.146.101,84		$ 1.348.720.190,11
04	MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS																
4,01	LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 5 12 X 20 X 30 CM	M2	2.474,51	$ 50.277,00	$ 124.410.939,27	2474,51	124.410.939,27	2474,51	124.410.939,27		$ 0,00			2474,51	$ 124.410.939,27	170,00	$ 8.547.090,00
4,02	LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 3 7 X 20 X 30 CM	M2	104,89	$ 45.555,00	$ 4.779.312,85	104,89	4.779.312,85	104,89	4.779.312,85		$ 0,00			104,89	$ 4.779.312,85		$ 0,00

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.238.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.524.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.648,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.568.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.890-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.326.369,80				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025							

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
4,03	MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM POR AMBAS CARAS CON AISLAMIENTO TERMICO	M2	21,97	$ 126.409,00	$ 2.777.205,73	21,97	2.777.205,73	21,97	2.777.205,73		$ 0,00			21,97	$ 2.777.205,73		$ 0,00
4,04	TRASDOSADO 7.52 CM CON PLACA YESO CARTON 1/2 PULGADA RESISTENTE A LA HUMEDAD	M2	266,93	$ 55.173,00	$ 14.727.328,89	266,93	14.727.328,89	266,93	14.727.328,89		$ 0,00			266,93	$ 14.727.328,89		$ 0,00
4,05	TRASDOSADO 7.52 CM EN PLACA YESO CARTON 1/2 PULGADA RESISTENTE A LA HUMEDAD CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN LANA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 6.35 CM	M2	114,49	$ 65.341,00	$ 7.480.891,09	114,49	7.480.891,09	114,49	7.480.891,09		$ 0,00			114,49	$ 7.480.891,00		$ 0,00
	TOTAL MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS				$ 154.175.677,83		$ 154.175.677,83		$ 154.175.677,83		$ 0,00				$ 154.175.677,83		$ 8.547.090,00
05	PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA																
5,01	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	3.800,55	$ 30.476,00	$ 115.821.761,25	3800,55	115.821.761,25	3800,55	115.821.761,25		$ 0,00			3800,55	$ 115.821.761,25		$ 0,00
5,02	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	609,22	$ 34.127,00	$ 20.790.850,94	609,22	20.790.850,94	609,22	20.790.850,94		$ 0,00	1816,27		2425,49	$ 82.774.697,23	340,00	$ 11.603.180,00
5,03	ESTUCO PLASTICO SOBRE PAÑETE ALLANADO	M2	2.114,09	$ 17.191,00	$ 36.343.321,19	2114,09	36.343.321,19	2114,09	36.343.321,19		$ 0,00			2114,09	$ 36.343.321,19		$ 0,00
5,04	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR TIPO 1 ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, TRES MANOS	M2	1.862,48	$ 16.622,00	$ 30.958.142,56	1862,48	30.958.142,56	1862,48	30.958.142,56		$ 0,00			1862,48	$ 30.958.142,56		$ 0,00
5,05	PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA, BASE AGUA, CON POLIMEROS ACRILICOS, DOS MANOS	M2	304,61	$ 25.086,00	$ 7.641.446,46	304,61	7.641.446,46	304,61	7.641.446,46					304,61	$ 7.641.446,46		
	TOTAL PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA				$ 211.555.622,40		$ 211.555.622,40		$ 211.555.622,40		$ 0,00				$ 273.539.368,69		$ 11.603.180,00
06	PISOS																
6,01	PISO AFINADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO E = 8 CM INCLUYE CORTE DE JUNTAS	M2	1.577,61	$ 105.951,00	$ 167.170.547,31	1.577,61	167.170.547,31	1.577,61	167.170.547,31		$ 0,00			1577,61	$ 167.170.547,31		$ 0,00
6,02	PISO DECORATIVO EN BALDOSA HIDRAULICA TIPO MOSAICO 20 X 20 CM, SEGÚN DISEÑO ARQ.	M2	105,52	$ 208.202,00	$ 21.969.475,04	105,52	21.969.475,04	105,52	21.969.475,04		$ 0,00			105,52	$ 21.969.475,04		$ 0,00
6,03	PISO DE BAÑOS EN CERAMICA DE FORMATO 20 X 20 CM, ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN MOSAICO SEGÚN DISEÑO ARQ.	M2	136,07	$ 71.674,00	$ 9.752.681,18	136,07	9.752.681,18	136,07	9.752.681,18		$ 0,00			136,07	$ 9.752.681,18		$ 0,00
6,04	PISO DE COCINAS EN BALDOSA DE CERAMICA BLANCA 30 X 30 CM, ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	M2	530,34	$ 60.489,00	$ 32.079.736,26	530,34	32.079.736,26	530,34	32.079.736,26		$ 0,00			530,34	$ 32.079.736,26		$ 0,00
6,05	PISO DE TERRAZA EN DECK WPC VETEADO TEKA 0.14M X 2.8M	M2	516,10	$ 174.715,00	$ 90.170.411,50	516,10	90.170.411,50	516,10	90.170.411,50		$ 0,00			516,10	$ 90.170.411,50		$ 0,00
6,06	ANDEN EN ADOQUIN PEATONAL DE CONCRETO PREFABRICADO COLOR 10 X 20 CMS, incluye arena y sello	M2	248,35	$ 115.333,00	$ 28.642.950,55	248,35	28.642.950,55	248,35	28.642.950,55		$ 0,00			248,35	$ 28.642.950,55		$ 0,00
6,07	ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO GUIA COLOR GRIS 0.40 X 0.40, incluye arena y sello	M2	45,77	$ 91.481,00	$ 4.187.085,37	45,77	4.187.085,37	45,77	4.187.085,37		$ 0,00			45,77	$ 4.187.085,37		$ 0,00
6,08	ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO ALERTA COLOR GRIS 0.40 X 0.40, incluye arena y sello	M2	49,07	$ 96.202,00	$ 4.720.632,14	49,07	4.720.632,14	49,07	4.720.632,14		$ 0,00			49,07	$ 4.720.632,14		$ 0,00
6,09	RAMPA PEATONAL DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS TACTIL DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO	M2	13,95	$ 262.111,00	$ 3.656.448,45	13,95	3.656.448,45	13,95	3.656.448,45		$ 0,00			13,95	$ 3.656.448,45		$ 0,00
6,10	ESTAMPADO DE PISO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, INCLUYE PIGMENTANTE Y SELLANTE	M2	400,20	$ 59.718,00	$ 23.899.143,60	400,20	23.899.143,60	400,20	23.899.143,60		$ 0,00			400,20	$ 23.899.143,60		$ 0,00
6,11	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=40 KG/CM2, 1" ASENTAMIENTO 5 " ESPESOR=0.15 METROS, INCLUYE PASADORES DE LARGO 0.35 M Y D = 3/4" LISO A CADA 0,30 METROS Y BARRAS DE AMARRE DE 1/2" CORRUGADO DE 0.85 METROS DE LARGO Y 1.20 METRO DE SEPARACIÓN, INCLUYE ACERO PARA LOSAS REFORZADAS (VER ANEXO 1. PLANO MODULACION DE LOSAS) CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	271,87	$ 132.524,00	$ 36.029.299,88	271,87	36.029.299,88	271,87	36.029.299,88		$ 0,00			271,87	$ 36.029.299,88		$ 0,00
	TOTAL PISOS				$ 422.278.411,28		$ 422.278.411,28		$ 422.278.411,28		$ 0,00				$ 422.278.411,28		$ 0,00
07	CUBIERTA - IMPERMEABLIZACION - ASILAMIENTO																
7,01	Suministro y montaje de Cubierta tipo ATAC en cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de lámina estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante, y accesorios, fijados mecánicamente a correa estructural. Incluso parte proporcional de elementos de fijación, accesorios y juntas. Estructura metálica ligera autoportante en cubiertas, formada por perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío y galvanizados, según diseño estructural. Incluso p/p de elementos de anclaje.	M2	1.028,90	$ 321.141,00	$ 330.421.974,90	28,90	9.280.974,90	28,90	9.280.974,90		$ 0,00			28,90	$ 9.280.974,90		$ 0,00
7,02	Suministro e instalacion de sistema de impermeabilizacion membrana PVC Danopol FV 1.2 o equivalente (incluye preparacion de superficie, equipos, herramientas y materiales para su correcta instalacion) Bajo superficie en Deck Flotante	M2	973,50	$ 172.560,00	$ 167.987.160,00	973,50	167.987.160,00	973,50	167.987.160,00		$ 0,00			973,50	$ 167.987.160,00		$ 0,00
7,03	Suministro e instalacion de Aislamiento Termico en laminas Danopren TR 60 o equivalente (incluye equipos, herramientas y materiales para su correcta instalacion) Bajo superficie en Deck Flotante	M2	523,10	$ 148.092,00	$ 77.466.925,20	523,10	77.466.925,20	523,10	77.466.925,20		$ 0,00			523,10	$ 77.466.925,20		$ 0,00
7,04	Suministro e instalacion de sistema de Danolosa color gris de 7,5 cm de espesor o equivalente (Incluye preparacion de superficie, equipos, herramientas y materiales para su correcta instalacion) para Cubierta en Danolosa	M2	150,00	$ 298.151,00	$ 44.722.650,00	150,00	44.722.650,00	150,00	44.722.650,00		$ 0,00			150,00	$ 44.722.650,00		$ 0,00
	TOTAL CUBIERTA - IMPERMEABLIZACION - ASILAMIENTO				$ 620.598.710,10		$ 299.457.710,10		$ 299.457.710,10		$ 0,00			0,00	$ 299.457.710,10		$ 0,00
08	ENCHAPE																
8,01	ENCHAPE PARA MURO DE ZONAS HUMEDAS EN CERAMICA MARFIL 30 X 60 CMS ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE	M2	287,17	$ 57.249,00	$ 16.440.195,33	287,17	16.440.195,33	287,17	16.440.195,33		$ 0,00			287,17	$ 16.440.195,33		$ 0,00
8,02	ENCHAPE PARA MURO COCINAS EN CERAMICA 30 X 60 CM, ALTA RESITENCIA AL DESGASTE COLOR SEGÚN DISEÑO ARQ.	M2	1.044,77	$ 60.449,00	$ 63.155.301,73	1.044,77	$ 63.155.301,73	1044,77	63.155.301,73		$ 0,00			1044,77	$ 63.155.301,73		$ 0,00

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.238.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.830.524.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.648,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.500-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.325.369,80				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025							

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
8,03	ENCHAPE PARA MURO VESTIER EN CERAMICA BLANCA 30 X 60 CM	M2	143,30	$ 57.888,00	$ 8.295.350,40	143,30	$ 8.295.350,40	143,30	8.295.350,40		$ 0,00			143,30	$ 8.295.350,40		$ 0,00
	TOTAL ENCHAPE				$ 87.890.847,46		$ 87.890.847,46		$ 87.890.847,46		$ 0,00				$ 87.890.847,46		$ 0,00
09	APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS BAÑOS																
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL CON ENTRADA SUPERIOR, CUMPLIMIENTO REQUERMIENTO A.D.A, DESCARGA CON FLUXOMETRO Y SENSOR	UND	24,00	$ 1.051.455,00	$ 25.234.920,00	24,00	25.234.920,00	24,00	25.234.920,00		$ 0,00			24,00	$ 25.234.920,00		$ 0,00
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO, INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	2,00	$ 663.696,00	$ 1.327.392,00	2,00	1.327.392,00	2,00	1.327.392,00		$ 0,00			2,00	$ 1.327.392,00		$ 0,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL DE TANQUE, ANTIVANDALICO, DESCARGA TURBOFLUSH	UND	2,00	$ 1.136.872,00	$ 2.273.744,00	2,00	2.273.744,00	2,00	2.273.744,00		$ 0,00			2,00	$ 2.273.744,00		$ 0,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL REF. MEDIANO ENTRADA POSTERIOR TIPO INSTITUCIONAL CON VALVULA DUPLEX	UND	8,00	$ 1.261.000,00	$ 10.088.000,00	8,00	10.088.000,00	8,00	10.088.000,00		$ 0,00			8,00	$ 10.088.000,00		$ 0,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA, 53.5 X 34.5 CM	UND	16,00	$ 337.490,00	$ 5.399.840,00	16,00	5.399.840,00	16,00	5.399.840,00		$ 0,00			16,00	$ 5.399.840,00		$ 0,00
9,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON FRENTE CONCAVO, CERTIFICADO A.D.A	UND	4,00	$ 469.665,00	$ 1.878.660,00	4,00	1.878.660,00	4,00	1.878.660,00		$ 0,00			4,00	$ 1.878.660,00		$ 0,00
9,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ANTIVANDALICA CON REGADERA EMPOTRADA	UND	8,00	$ 534.096,00	$ 4.272.768,00	8,00	4.272.768,00	8,00	4.272.768,00		$ 0,00			8,00	$ 4.272.768,00		$ 0,00
9,08	MESON EN GRANITO	M2	11,95	$ 449.460,00	$ 5.371.047,00	11,95	5.371.047,00	11,95	5.371.047,00		$ 0,00			11,95	$ 5.371.047,00		$ 0,00
9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE MESÓN PARA LAVAMANOS. FUNCIONAMIENTO CON SENSOR INFRARROJO. ACABADO: CROMADO	UND	16,00	$ 1.645.320,00	$ 26.325.120,00	16,00	26.325.120,00	16,00	26.325.120,00		$ 0,00			16,00	$ 26.325.120,00		$ 0,00
9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP, CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	UND	20,00	$ 692.619,00	$ 13.856.380,00	20,00	13.856.380,00	20,00	13.856.380,00		$ 0,00			20,00	$ 13.856.380,00		$ 0,00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	UND	7,00	$ 736.359,00	$ 5.154.513,00	7,00	5.154.513,00	7,00	5.154.513,00		$ 0,00			7,00	$ 5.154.513,00		$ 0,00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO 4 MM RECTANGULAR 250 X 100 CMS	UND	4,00	$ 1.230.930,00	$ 4.923.720,00	4,00	4.923.720,00	4,00	4.923.720,00		$ 0,00			4,00	$ 4.923.720,00		$ 0,00
9,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO 4 MM RECTANGULAR 70 X 50 CMS	UND	6,00	$ 368.010,00	$ 2.208.060,00	6,00	2.208.060,00	6,00	2.208.060,00		$ 0,00			6,00	$ 2.208.060,00		$ 0,00
9,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR VERTICAL DE SOBRE PONER PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, CON CERRADURA	UND	8,00	$ 397.087,00	$ 3.176.696,00	8,00	3.176.696,00	8,00	3.176.696,00		$ 0,00			8,00	$ 3.176.696,00		$ 0,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE SOBREPONER EN PARED, PARA JABÓN LÍQUIDO, METÁLICO CROMADO.	UND	12,00	$ 344.621,00	$ 4.135.452,00	12,00	4.135.452,00	12,00	4.135.452,00		$ 0,00			12,00	$ 4.135.452,00		$ 0,00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO CON SENSOR AUTOMÁTICO EN ALUMINIO	UND	8,00	$ 1.279.020,00	$ 10.232.160,00	8,00	10.232.160,00	8,00	10.232.160,00		$ 0,00			8,00	$ 10.232.160,00		$ 0,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR JUMBO DE SOBREPONER PARA PAPEL HIGIÉNICO, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	26,00	$ 291.505,00	$ 7.579.130,00	26,00	7.579.130,00	26,00	7.579.130,00		$ 0,00			26,00	$ 7.579.130,00		$ 0,00
9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 8 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS.	UND	22,00	$ 70.576,00	$ 1.552.672,00	22,00	1.552.672,00	22,00	1.552.672,00		$ 0,00			22,00	$ 1.552.672,00		$ 0,00
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA METÁLICA EN ACERO INOXIDABLE 304 CAPACIDAD 12 LT. MEDIDAS 40X31X13 CM	UND	8,00	$ 421.844,00	$ 3.374.752,00	8,00	3.374.752,00	8,00	3.374.752,00		$ 0,00			8,00	$ 3.374.752,00		$ 0,00
	TOTAL APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS BAÑOS				$ 138.365.026,00		$ 138.365.026,00		$ 138.365.026,00		$ 0,00				$ 138.365.026,00		$ 0,00
10	CIELO RASO Y DIVISIONES																
10,01	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2", INCLUYE AISLAMIENTO EN LANA DE VIDRIO	M2	762,09	$ 55.145,00	$ 42.025.453,05	762,09	42.025.453,05	762,09	42.025.453,05		$ 0,00			762,09	$ 42.025.453,05		$ 0,00
10,02	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" RH	M2	552,30	$ 53.396,00	$ 29.490.610,80	552,30	29.490.610,80	552,30	29.490.610,80		$ 0,00			552,30	$ 29.490.610,80		$ 0,00
10,03	ELEMENTOS DECORATIVOS DESCOLGADOS EN ALUZINC PARA CIELO FALSO EXTERIOR, COLORES SEGÚN DISEÑO ARQ. INCLUIDO PINTURA DE ACABADO	M2	389,14	$ 484.872,00	$ 188.683.090,08	389,14	188.683.090,08	389,14	188.683.090,08		$ 0,00		385,00	4,14	$ 2.007.370,08		$ 0,00
10,04	ELEMENTOS DECORATIVOS DESCOLGADOS EN MDF PARA CIELO FALSO INTERIOR COLORES SEGÚN DISEÑO ARQ. INCLUIDO PINTURA DE ACABADO	M2	418,75	$ 724.587,00	$ 303.420.806,25	18,75	13.586.006,25	18,75	13.586.006,25		$ 0,00			18,75	$ 13.586.006,25		$ 0,00
	TOTAL CIELO RASO Y DIVISIONES				$ 563.619.960,18		$ 273.785.160,18		$ 273.785.160,18		$ 0,00				$ 87.109.440,18		$ 0,00
11	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA																
11,01	VENTANA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCOLORO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO	M2	6,96	$ 713.492,00	$ 4.965.904,32	6,96	4.965.904,32	6,96	4.965.904,32		$ 0,00			6,96	$ 4.965.904,32		$ 0,00
11,02	ESTERA METÁLICA PARA CERRAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES CON VARILLA DE ACERO INTERNA	M2	85,84	$ 686.126,00	$ 58.897.055,84	85,84	58.897.055,84	85,84	58.897.055,84		$ 0,00			85,84	$ 58.897.055,84		$ 0,00
11,03	PUERTA BATIENTE EN MALLA METÁLICA 2.40m x 2.05m CON ABERTURAS DE 0.4m. TUBULAR EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 2,5mm	UND	1,00	$ 1.521.622,00	$ 1.521.622,00	1,00	1.521.622,00	1,00	1.521.622,00		$ 0,00			1,00	$ 1.521.622,00		$ 0,00
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE CORREDIZA EN MALLA METALICA 7m x 2.05m TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 2.5mm	UND	2,00	$ 4.245.597,00	$ 8.491.194,00	2,00	8.491.194,00	2,00	8.491.194,00		$ 0,00			2,00	$ 8.491.194,00		$ 0,00
11,05	PUERTA BATIENTE CORTA FUEGOS 60 mins, HOJA 22 Y ACABADO RAL 9018 1m x 2.15m	UND	2,00	$ 3.441.079,00	$ 6.882.158,00	2,00	6.882.158,00	2,00	6.882.158,00		$ 0,00			2,00	$ 6.882.158,00		$ 0,00
11,06	PUERTA DOBLE BATIENTE CORTA FUEGOS 60min CALIBRE 22 ACABADO RAL 9018 1.2m. x 2.15m	UND	1,00	$ 3.897.574,00	$ 3.897.574,00	1,00	3.897.574,00	1,00	3.897.574,00		$ 0,00			1,00	$ 3.897.574,00		$ 0,00
11,07	PUERTA BATIENDE CON HOJA DE 38mm DE ESPESOR EN ACERO GALVANIZADO de 0.05mm Y RELLENO EN POLIURENATNO DE 1mm	M2	49,93	$ 278.517,00	$ 13.906.353,81	49,93	13.906.353,81	49,93	13.906.353,81		$ 0,00			49,93	$ 13.906.353,81		$ 0,00
11,08	PUERTA DOBLE BATIENTE CON HOJA DE 38mm DE ESPESOR EN ACERO GALVANIZADO de 0.05mm Y RELLENO EN POLIURENATNO DE 1mm	M2	35,47	$ 301.043,00	$ 10.677.995,21	35,47	10.677.995,21	35,47	10.677.995,21		$ 0,00			35,47	$ 10.677.995,21		$ 0,00
11,09	PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANODIZADO DE 1m DE ANCHO x 2.5m DE ALTO	M2	79,95	$ 568.033,00	$ 45.414.238,35	79,95	45.414.238,35	79,95	45.414.238,35		$ 0,00			79,95	$ 45.414.238,35		$ 0,00

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

Alcaldía Distrital de

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.238.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.524.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.648,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.325.369,80				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
11,10	PUERTA DOBLE BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANODIZADO	M2	13,50	$ 624.187,00	$ 8.426.524,50	13,50	8.426.524,50	13,50	8.426.524,50		$ 0,00			13,50	$ 8.426.524,50		$ 0,00
11,11	PUERTA DOBLE CORREDIZA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANODIZADO	M2	10,50	$ 644.715,00	$ 6.769.507,50	10,50	6.769.507,50	10,50	6.769.507,50		$ 0,00			10,50	$ 6.769.507,50		$ 0,00
	TOTAL CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA				$ 169.850.127,53		$ 169.850.127,53		$ 169.850.127,53		$ 0,00				$ 169.850.127,53		$ 0,00
12	OBRAS EXTERIORES Y FACHADA																
12,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DOBLE 5+6 MM CAMARA 12 MM INCOLORO PERFILERIA COLOR NATURAL	M2	610,27	$ 2.091.000,00	$ 1.276.074.570,00	610,27	1.276.074.570,00	610,27	1.276.074.570,00		$ 0,00		600,00	10,27	$ 21.474.570,00		$ 0,00
12,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE TERMOACUSTICO TIPO SANDWICH E= 5 CM	M2	371,51	$ 374.574,00	$ 139.157.986,74	371,51	139.157.986,74	371,51	139.157.986,74		$ 0,00		300,00	71,51	$ 26.785.786,74		$ 0,00
12,03	FACHADA METALICA PREFABRICADA SEGÚN DISEÑO ARQ.	ML	2.043,00	$ 1.139.726,00	$ 2.328.460.218,00	338,38	386.343.198,22	386,38	440.371.799,11		$ 0,00		370,00	16,38	$ 18.673.179,11		$ 0,00
12,04	ASCENSOR PASAJEROS CAP 800 KG, SIN CUARTO DE MAQUINA	UND	1,00	$ 218.187.152,00	$ 218.187.152,00	1,00	218.187.152,00	1,00	218.187.152,00		$ 0,00			1,00	$ 218.187.152,00		$ 0,00
12,05	ASCENSOR SERVICIO 450 KG, SIN CUARTO DE MAQUINA	UND	1,00	$ 159.886.855,00	$ 159.886.855,00	1,00	159.886.855,00	1,00	159.886.855,00		$ 0,00			1,00	$ 159.886.855,00		$ 0,00
12,06	CHAPA METALICA MICROPERFORADA	M2	72,46	$ 919.097,00	$ 66.597.768,62	72,46	66.597.768,62	72,46	66.597.768,62		$ 0,00			72,46	$ 66.597.768,62		$ 0,00
12,07	BARANDA EN TUBO ACERO INOXDIABLE SECCION CUADRADA CON PARALES SEPARACIÓN CADA 15cm, H= 1.1m	ML	399,43	$ 181.323,00	$ 72.425.845,89	399,43	72.425.845,89	399,43	72.425.845,89		$ 0,00			399,43	$ 72.425.845,89		$ 0,00
12,08	BARANDA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE SECCION CUADRADA, H=1.1m, CON ANTEPECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM	ML	184,70	$ 365.808,00	$ 67.564.737,60	184,70	67.564.737,60	184,70	67.564.737,60		$ 0,00			184,70	$ 67.564.737,60		$ 0,00
12,09 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA PARA COCINAS	UND		$ 5.687.624,88							$ 0,00	52,00		52,00	$ 295.756.493,97		$ 0,00
12,10 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUEADERO CON DUPLICADOR INTELIGENTE	UND		$ 99.517.073,72							$ 0,00	2,00		2,00	$ 199.034.147,44		$ 0,00
	TOTAL OBRAS EXTERIORES Y FACHADA				$ 4.328.355.133,85		$ 2.386.238.114,07		$ 2.440.266.714,96		$ 0,00				$ 1.146.386.536,37		$ 0,00
13	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																
13,10	Excavación A Mano (No incluye retiro del material sobrante)	M3	341,98	$ 36.498,00	$ 12.481.586,04	341,98	12.481.586,04	341,98	12.481.586,04		$ 0,00			341,98	$ 12.481.586,04	341,98	$ 12.481.586,04
									-		$ 0,00						$ 0,00
13,2	SISTEMA AGUA POTABLE								-		$ 0,00						$ 0,00
13.2.1	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 13.5 D=1/2" (Incluye Accesorios)	ML	403,23	$ 6.708,00	$ 2.704.867	403,23	2.704.866,84	403,23	2.704.866,84		$ 0,00			403,23	$ 2.704.866,84		$ 0,00
13.2.2	Suministro e instalación De Válvula D = 1/2"	Und	6,00	$ 22.825,00	$ 136.950	6,00	136.950,00	6,00	136.950,00		$ 0,00			6,00	$ 136.950,00		$ 0,00
13.2.3	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=3/4" (Incluye Accesorios)	ML	10,40	$ 14.628,00	$ 152.131	10,40	152.131,20	10,40	152.131,20		$ 0,00			10,40	$ 152.131,20		$ 0,00
13.2.4	Suministro e instalación De Válvula D = 3/4"	Und	52,00	$ 26.150,00	$ 1.359.800	52,00	1.359.800,00	52,00	1.359.800,00		$ 0,00			52,00	$ 1.359.800,00		$ 0,00
13.2.5	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=1-1/2" (Incluye Accesorios)	ML	337,27	$ 21.924,00	$ 7.394.307	337,27	7.394.307,48	337,27	7.394.307,48		$ 0,00			337,27	$ 7.394.307,48		$ 0,00
13.2.6	Suministro e instalación Válvula de bola tipo pesado D=1-1/2"	Und	10,00	$ 57.936,00	$ 579.360	10,00	579.360,00	10,00	579.360,00		$ 0,00			10,00	$ 579.360,00		$ 0,00
13.2.7	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=2" (Incluye Accesorios)	ML	99,02	$ 29.975,00	$ 2.968.125	99,02	2.968.124,50	99,02	2.968.124,50		$ 0,00			99,02	$ 2.968.124,50		$ 0,00
13.2.8	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=3" (Incluye Accesorios)	ML	12,02	$ 61.495,00	$ 739.182	12,02	739.181,92	12,02	739.181,92		$ 0,00			12,02	$ 739.181,92		$ 0,00
13.2.9	Suministro e instalación de punto potable de D= 1/2" para ducha	Und	8,00	$ 53.748,00	$ 429.984	8,00	429.984,00	8,00	429.984,00		$ 0,00			8,00	$ 429.984,00		$ 0,00
13.2.10	Suministro e instalación de punto potable de D= 1/2" para lavamanos / fregaderos de cocina / punto de aseo	Und	118,00	$ 36.639,00	$ 4.323.402	118,00	4.323.402,00	118,00	4.323.402,00		$ 0,00			118,00	$ 4.323.402,00		$ 0,00
13.2.11	Suministro e instalación de punto potable de D= 1-1/2" para inodoro / orinal	Und	34,00	$ 99.766,00	$ 3.392.044	34,00	3.392.044,00	34,00	3.392.044,00		$ 0,00			34,00	$ 3.392.044,00		$ 0,00
13.2.12	Suministro e instalación Sistema bombeo Agua Potable (2 Bombas con Q=5.50 l/s y Hd=45.00 mca + 1 tanque hidroacumulador P=50-70 PSI y V=200 L)	GB	1,00	$ 22.724.205,00	$ 22.724.205	1,00	22.724.205,00	1,00	22.724.205,00		$ 0,00			1,00	$ 22.724.205,00		$ 0,00
13.2.13	Suministro e Instalación de Medidor D=3"	UND	1,00	$ 3.335.696,00	$ 3.335.696	1,00	3.335.696,00	1,00	3.335.696,00		$ 0,00			1,00	$ 3.335.696,00		$ 0,00
13.2.14	Suministro e instalación de Medidor D=2" para tanque	UND	1,00	$ 2.694.894,00	$ 2.694.894	1,00	2.694.894,00	1,00	2.694.894,00		$ 0,00			1,00	$ 2.694.894,00		$ 0,00
13.2.15	Suministro e instalación de Medidor D=3/4" para locales	UND	52,00	$ 587.413,00	$ 30.545.476	52,00	30.545.476,00	52,00	30.545.476,00		$ 0,00			52,00	$ 30.545.476,00		$ 0,00
13,3	SISTEMA SANITARIO					0,00			-		$ 0,00						$ 0,00
13.3.1	Suministro e instalación de tubería PVC D=2" (Incluye Accesorios)	ML	203,84	$ 36.576,00	$ 7.455.651,84	203,84	7.455.651,84	203,84	7.455.651,84		$ 0,00	23,90		227,74	$ 8.329.818,24	84,91	$ 3.105.668,16
13.3.2	Suministro e instalación Sifón de Piso D=2"	Und	70,00	$ 38.580,00	$ 2.700.600,00	70,00	2.700.600,00	70,00	2.700.600,00		$ 0,00			70,00	$ 2.700.600,00		$ 0,00
13.3.3	Suministro e instalación de tubería PVC D=4" (Incluye Accesorios)	ML	257,97	$ 51.764,00	$ 13.353.559,08	257,97	13.353.559,08	257,97	13.353.559,08		$ 0,00	21,26		279,23	$ 14.454.061,72	90,95	$ 4.707.935,80
13.3.4	Suministro e instalación de tubería PVC D=6" (Incluye Accesorios)	ML	87,67	$ 101.453,00	$ 8.894.384,51	87,67	8.894.384,51	87,67	8.894.384,51		$ 0,00	60,02		147,69	$ 14.983.593,57	129,55	$ 13.143.235,15
13.3.5	Suministro e instalación Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 2" (Incluye Accesorios)	Und	78,00	$ 58.019,00	$ 4.525.482,00	78,00	4.525.482,00	78,00	4.525.482,00		$ 0,00			78,00	$ 4.525.482,00		$ 0,00
13.3.6	Suministro e instalación Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 4" (Incluye Accesorios)	Und	26,00	$ 92.257,00	$ 2.398.682,00	26,00	2.398.682,00	26,00	2.398.682,00		$ 0,00			26,00	$ 2.398.682,00		$ 0,00
13.3.7	Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mampostería, Mortero De Pega 1:4, Pañetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado, Tapa En Concreto De 3000 Psi	Und	3,00	$ 330.481,00	$ 991.443,00	3,00	991.443,00	3,00	991.443,00		$ 0,00	10,00		13,00	$ 4.296.253,00	11,00	$ 3.635.291,00
13.3.8	Suministro e instalación Válvula Antirretorno PVC Sanitaria D=6"	Und	1,00	$ 808.146,00	$ 808.146,00	1,00	808.146,00	1,00	808.146,00		$ 0,00		1,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
13,4	SISTEMA DE VENTILACIÓN					0,00			-		$ 0,00						$ 0,00
13.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC D=2" (Incluye Accesorios)	ML	13,20	$ 19.240,00	$ 253.968,00	13,20	253.968,00	13,20	253.968,00		$ 0,00			13,20	$ 253.968,00		$ 0,00
13.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC D=4" (Incluye Accesorios)	ML	5,40	$ 32.958,00	$ 177.973,20	5,40	177.973,20	5,40	177.973,20		$ 0,00			5,40	$ 177.973,20		$ 0,00
13.4.3	Suministro e instalación de Válvula de admisión de aire tipo Minivent D=2"	Und	66,00	$ 163.349,00	$ 10.781.034,00	66,00	10.781.034,00	66,00	10.781.034,00		$ 0,00			66,00	$ 10.781.034,00		$ 0,00
13.4.4	Suministro e instalación de Válvula de admisión de aire tipo Maxivent D=4"	Und	5,00	$ 269.394,00	$ 1.346.970,00	5,00	1.346.970,00	5,00	1.346.970,00		$ 0,00			5,00	$ 1.346.970,00		$ 0,00
13,5	SISTEMA CONTRA INCENDIOS (UNIONES RANURADAS)					0,00		0,00	-		$ 0,00			0,00			$ 0,00
13.5.1	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH40 1" (Incluye Accesorios)	ML	70,69	$ 51.321,00	$ 3.627.881,49	70,69	3.627.881,49	70,69	3.627.881,49		$ 0,00			70,69	$ 3.627.881,40		$ 0,00
13.5.2	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 2" (Incluye Accesorios)	ML	954,45	$ 80.843,00	$ 77.160.601,35	954,45	77.160.601,35	954,45	77.160.601,35		$ 0,00			954,45	$ 77.160.601,35		$ 0,00
13.5.3	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 2-1/2" (Incluye Accesorios)	ML	30,00	$ 101.271,00	$ 3.038.130,00	30,00	3.038.130,00	30,00	3.038.130,00		$ 0,00			30,00	$ 3.038.130,00		$ 0,00
13.5.4	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 4" (Incluye Accesorios)	ML	19,60	$ 140.650,00	$ 2.756.740,00	19,60	2.756.740,00	19,60	2.756.740,00		$ 0,00			19,60	$ 2.756.740,00		$ 0,00
13.5.5	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 6" (Incluye Accesorios)	ML	11,36	$ 204.265,00	$ 2.320.450,40	11,36	2.320.450,40	11,36	2.320.450,40		$ 0,00			11,36	$ 2.320.450,40		$ 0,00
13.5.6	Suministro e instalación Válvula antirretorno BRONCE 4" BxB	Und	1,00	$ 979.508,00	$ 979.508,00	1,00	979.508,00	1,00	979.508,00		$ 0,00			1,00	$ 979.508,00		$ 0,00
13.5.7	Suministro e instalación Válvula de compuerta BRONCE 4" BxB	Und	1,00	$ 2.308.054,00	$ 2.308.054,00	1,00	2.308.054,00	1,00	2.308.054,00		$ 0,00			1,00	$ 2.308.054,00		$ 0,00
13.5.8	Suministro e instalación Válvula siamesa BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" BxB	Und	1,00	$ 999.756,00	$ 999.756,00	1,00	999.756,00	1,00	999.756,00		$ 0,00			1,00	$ 999.756,00		$ 0,00
13.5.9	Suministro e instalación Cabezal de Prueba BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" BxB	Und	1,00	$ 871.013,00	$ 871.013,00	1,00	871.013,00	1,00	871.013,00		$ 0,00			1,00	$ 871.013,00		$ 0,00
13.5.10	Suministro e instalación de tubería PVC C900 DR 14 4" (Incluye Accesorios)	ML	8,60	$ 1.704.298,00	$ 14.656.962,80	8,60	14.656.962,80	8,60	14.656.962,80		$ 0,00			8,60	$ 14.656.962,80		$ 0,00
13.5.11	Suministro e instalación de tubería PVC C900 DR 14 6" (Incluye Accesorios)	ML	45,10	$ 618.117,00	$ 27.877.076,70	45,10	27.877.076,70	45,10	27.877.076,70		$ 0,00			45,10	$ 27.877.076,70		$ 0,00
13.5.12	Suministro e instalación de VRP (Incluye Accesorios) Ver detalle	UND	6,00	$ 12.114.016,00	$ 72.684.096,00	6,00	72.684.096,00	6,00	72.684.096,00		$ 0,00			6,00	$ 72.684.096,00		$ 0,00

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.238.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.524.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.648,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.666.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.325.369,80				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
13.5.13	Suministro e instalación Conexión de Bomberos- Clase I	Und	4,00	$ 675.237,00	$ 2.700.948,00	4,00	2.700.948,00	4,00	2.700.948,00		$ 0,00			4,00	$ 2.700.948,00		$ 0,00
13.5.14	Suministro e instalación Rociadores tipo Pendent. K=5.6	Und	281,00	$ 141.695,00	$ 39.872.776,00	281,00	39.872.776,00	281,00	39.872.776,00		$ 0,00			281,00	$ 39.872.776,00		$ 0,00
13.5.15	Suministro e instalación Bomba RCI (Q=750 GPM, Hd= 120 PSI) y equipo Jockey (Q=20 GPM, Hd=132 PSI)	Und	1,00	$ 122.372.896,00	$ 122.372.896,00	1,00	122.372.896,00	1,00	122.372.896,00		$ 0,00		1,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
13.5.16 NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA RCI, EQUIPO LISTADO UL/FM (Q=750 GPM, HD= 120 PSI) Y EQUIPO JOCKEY (Q=20 GPM, HD=175 PSI), DIESEL TURBINA SUCCIÓN FINA, CON SUCCION VERTICAL	Und		$ 622.397.855,46								1,00		1,00	$ 622.397.855,46		
13,60	SISTEMA AGUAS LLUVIA										$ 0,00						$ 0,00
13.6.1	Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 4" (Incluye Accesorios)	ML	28,24	$ 40.451,00	$ 1.142.336,24	28,24	1.142.336,24	28,24	1.142.336,24		$ 0,00			28,24	$ 1.142.336,24	13,84	$ 559.841,84
13.6.2	Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 6" (Incluye Accesorios)	ML	205,53	$ 100.330,00	$ 20.620.824,90	205,53	20.620.824,90	205,53	20.620.824,90		$ 0,00	41,54		247,07	$ 24.788.533,10	87,00	$ 8.728.710,00
13.6.3	Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 8" (Incluye Accesorios)	ML	76,08	$ 149.705,00	$ 11.389.556,40	76,08	11.389.556,40	76,08	11.389.556,40		$ 0,00	66,38		142,46	$ 21.326.974,30	122,00	$ 18.264.010,00
13.6.4	Suministro e instalación Sifón de Piso D=4"	Und	6,00	$ 91.150,00	$ 546.900,00	6,00	546.900,00	6,00	546.900,00		$ 0,00			6,00	$ 546.900,00		$ 0,00
13.6.5	Suministro e instalación de rejilla cupula tragante 6"	Und	9,00	$ 152.215,00	$ 1.369.935,00	9,00	1.369.935,00	9,00	1.369.935,00		$ 0,00			9,00	$ 1.369.935,00		$ 0,00
13.6.6	Suministro e instalación Canaleta Polester Reforzado Fibra Vidrio 0.30 m x 0.20 m	ML	83,40	$ 230.474,00	$ 19.221.531,60	83,40	19.221.531,60	83,40	19.221.531,60		$ 0,00			83,40	$ 19.221.531,60		$ 0,00
13.6.7	Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mampostería, Mortero De Pega 1:4, Pañetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado, Tapa En Concreto De 3000 Psi	Und	6,00	$ 334.659,00	$ 2.007.954,00	6,00	2.007.954,00	6,00	2.007.954,00		$ 0,00	2,00		8,00	$ 2.677.272,00	6,00	$ 2.007.954,00
13.6.8	Suministro e instalación Válvula Antirretorno PVC Sanitaria D=6"	Und	2,00	$ 2.038.352,00	$ 4.076.704,00	2,00	4.076.704,00	2,00	4.076.704,00		$ 0,00	2,00		4,00	$ 8.153.408,00		$ 0,00
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ 584.252.534,49		$ 584.252.534,49		$ 584.252.534,49		$ 0,00				$ 1.113.689.184,16		$ 66.634.232,99
14	INSTALACIONES ELECTRICAS																
14.1	ALIMENTADORES DE BAJA TENSION																
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCALES : 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	2.074,00	$ 45.147,00	$ 93.634.878,00	2074,00	93.634.878,00	2074,00	93.634.878,00		$ 0,00			2074,00	$ 93.634.878,00		$ 0,00
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR GABINETE TRANSFERENCIA PRINCIPAL : 3X6#500 KCMIL Cu + 6#500 KCMIL Cu + 1#250KCMIL T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	30,00	$ 4.179.990,00	$ 125.399.700,00	30,00	125.399.700,00	30,00	125.399.700,00		$ 0,00			30,00	$ 125.399.700,00		$ 0,00
14.1.3	ALIMENTADOR 3X2#4/0 AWG Cu + 2#4/0 AWG Cu + 1#4T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	30,00	$ 666.861,00	$ 20.005.830,00	30,00	20.005.830,00	30,00	20.005.830,00		$ 0,00			30,00	$ 20.005.830,00		$ 0,00
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ARMARIO DE MEDIDAS 3 : 3#300KCMIL Cu + 1#300 KCMIL Cu + 1#4T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	10,00	$ 533.358,00	$ 5.333.580,00	10,00	5.333.580,00	10,00	5.333.580,00		$ 0,00			10,00	$ 5.333.580,00		$ 0,00
14.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR BANCO CONDENSADORES 150KVAR : 3X3#4/0 AWG Cu + 3#4/0 AWG Cu + 1#2T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	15,00	$ 984.555,00	$ 14.768.325,00	15,00	14.768.325,00	15,00	14.768.325,00		$ 0,00			15,00	$ 14.768.325,00		$ 0,00
14.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3#6 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	65,00	$ 66.466,00	$ 4.320.290,00	65,00	4.320.290,00	65,00	4.320.290,00		$ 0,00			65,00	$ 4.320.290,00		$ 0,00
14.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3#1/0 AWG Cu + 1#1/0 AWG Cu + 1#6T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	35,00	$ 239.186,00	$ 8.371.510,00	35,00	8.371.510,00	35,00	8.371.510,00		$ 0,00			35,00	$ 8.371.510,00		$ 0,00
14.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-AC1-P3-2: 3#2 AWG Cu + 1#2 AWG Cu + 1#6T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	20,00	$ 122.562,00	$ 2.451.240,00	20,00	2.451.240,00	20,00	2.451.240,00		$ 0,00			20,00	$ 2.451.240,00		$ 0,00
14.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-REFRIGRERACION: 3#4/0 AWG Cu + 1#4/0 AWG Cu + 1#6T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	30,00	$ 346.039,00	$ 10.381.170,00	30,00	10.381.170,00	30,00	10.381.170,00		$ 0,00			30,00	$ 10.381.170,00		$ 0,00
14.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-DATOS: 3#6 AWG Cu + 1#4 AWG Cu + 1#10T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	25,00	$ 77.120,00	$ 1.928.000,00	25,00	1.928.000,00	25,00	1.928.000,00		$ 0,00			25,00	$ 1.928.000,00		$ 0,00
14.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3#4 AWG Cu + 1#4 AWG Cu + 1#10T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	55,00	$ 91.440,00	$ 5.029.200,00	55,00	5.029.200,00	55,00	5.029.200,00		$ 0,00			55,00	$ 5.029.200,00		$ 0,00
14.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3X2#2/0 AWG Cu + 1#2T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	100,00	$ 442.569,00	$ 44.256.900,00	100,00	44.256.900,00	100,00	44.256.900,00		$ 0,00			100,00	$ 44.256.900,00		$ 0,00
14.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-UMAS (UNIDADES MANEJADORAS): 3#1/0 AWG Cu + 1#1/0 AWG Cu + 1#6T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	30,00	$ 242.217,00	$ 7.266.510,00	30,00	7.266.510,00	30,00	7.266.510,00		$ 0,00			30,00	$ 7.266.510,00		$ 0,00
14.2	CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS							0,00	-		$ 0,00			0,00			$ 0,00
14.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: PARA LLEGADA A ARMARIO DE MEDIDORES Y TABLERO DE LOCAL :TUBERIA EMT 1", CURVA EMT 1", ADAPTADOR EMT 1")	ML	2.074,00	$ 45.159,00	$ 93.659.766,00	2074,00	93.659.766,00	2074,00	93.659.766,00		$ 0,00			2074,00	$ 93.659.766,00		$ 0,00

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,00	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.238.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.524.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,00	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.648,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.325.369,00				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025							

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
14.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 1-1/4", CURVA EMT 1-1/4", ADAPTADOR EMT 1-1/4"	ML	75,00	$ 49.017,00	$ 3.676.275,00	75,00	3.676.275,00	75,00	3.676.275,00		$ 0,00			75,00	$ 3.676.275,00		$ 0,00
14.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 2", CURVA EMT 2", ADAPTADOR EMT 2"	ML	45,00	$ 67.994,00	$ 3.059.730,00	45,00	3.059.730,00	45,00	3.059.730,00		$ 0,00			45,00	$ 3.059.730,00		$ 0,00
14.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-AC1-P3-2: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 1-1/2", CURVA EMT 1-1/2", ADAPTADOR EMT 1-1/2"	ML	10,00	$ 54.569,00	$ 545.690,00	10,00	545.690,00	10,00	545.690,00		$ 0,00			10,00	$ 545.690,00		$ 0,00
14.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 3", CURVA EMT 3", ADAPTADOR EMT 3"	ML	230,00	$ 140.852,00	$ 32.405.160,00	230,00	32.405.160,00	230,00	32.405.160,00		$ 0,00			230,00	$ 32.405.160,00		$ 0,00
14.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO PARA CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN DE 0.3MTX0.3MT, INCLUYE MARCACIONES PARA IDENTIFICACION DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS	UND	33,00	$ 222.714,00	$ 7.349.562,00	33,00	7.349.562,00	33,00	7.349.562,00		$ 0,00			33,00	$ 7.349.562,00		$ 0,00
14.3	INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL							0,00	-		$ 0,00			0,00			$ 0,00
14.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"	UND	801,00	$ 124.144,00	$ 99.439.344,00	801,00	99.439.344,00	801,00	99.439.344,00		$ 0,00			801,00	$ 99.439.344,00		$ 0,00
14.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION EMERGENCIA 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"	UND	35,00	$ 108.141,00	$ 3.784.935,00	35,00	3.784.935,00	35,00	3.784.935,00		$ 0,00			35,00	$ 3.784.935,00		$ 0,00
14.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"	UND	13,00	$ 97.734,00	$ 1.270.542,00	13,00	1.270.542,00	13,00	1.270.542,00		$ 0,00			13,00	$ 1.270.542,00		$ 0,00
14.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR SENCILLO, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"	UND	21,00	$ 134.376,00	$ 2.821.896,00	21,00	2.821.896,00	21,00	2.821.896,00		$ 0,00			21,00	$ 2.821.896,00		$ 0,00
14.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA EXTRACTOR LOCALES COCINA CALIENTE, 3#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2". TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"	UND	31,00	$ 182.801,00	$ 5.666.831,00	31,00	5.666.831,00	31,00	5.666.831,00		$ 0,00			31,00	$ 5.666.831,00		$ 0,00
14.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PVC SCH 40 1/2" - 1#12F + 1#12 N + 1#12 T	ML	1.200,00	$ 24.737,00	$ 29.684.400,00	1200,00	29.684.400,00	1200,00	29.684.400,00		$ 0,00			1200,00	$ 29.684.400,00		$ 0,00
14.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 1#12F + 1#12 N + 1#12 T PVC 1/2"	ML	50,00	$ 19.903,00	$ 995.150,00	50,00	995.150,00	50,00	995.150,00		$ 0,00			50,00	$ 995.150,00		$ 0,00
14.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA, 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"	UND	3,00	$ 172.046,00	$ 516.138,00	3,00	516.138,00	3,00	516.138,00		$ 0,00			3,00	$ 516.138,00		$ 0,00
14.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MANEJADORA AIRES ACONDICIONADOS 220VAC, 2#12F+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", CORAZA LT 1/2" (CUARTO DATOS, OFICINA)	UND	2,00	$ 268.372,00	$ 536.744,00	2,00	536.744,00	2,00	536.744,00		$ 0,00			2,00	$ 536.744,00		$ 0,00
14.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONDENSADORA AIRES ACONDICIONADOS 220 VAC, 3#10F+1#10T EN TUBERIA EMT 1", CORAZA LT 1" (CUARTO DATOS, OFICINA)	UND	2,00	$ 484.058,00	$ 968.116,00	2,00	968.116,00	2,00	968.116,00		$ 0,00			2,00	$ 968.116,00		$ 0,00
14.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2"	UND	35,00	$ 100.828,00	$ 3.528.980,00	35,00	3.528.980,00	35,00	3.528.980,00		$ 0,00			35,00	$ 3.528.980,00		$ 0,00
14.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL GFCI 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2"	UND	8,00	$ 144.227,00	$ 1.153.816,00	8,00	1.153.816,00	8,00	1.153.816,00		$ 0,00			8,00	$ 1.153.816,00		$ 0,00
14.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 220 VAC, 2#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2"	UND	8,00	$ 160.779,00	$ 1.286.232,00	8,00	1.286.232,00	8,00	1.286.232,00		$ 0,00			8,00	$ 1.286.232,00		$ 0,00
14.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR COCINA, 3#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" (UBICADOS EN PISO 1)	UND	3,00	$ 153.012,00	$ 459.036,00	3,00	459.036,00	3,00	459.036,00		$ 0,00			3,00	$ 459.036,00		$ 0,00
14.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CUARTO FRIO, 2#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"	UND	3,00	$ 174.816,00	$ 524.448,00	3,00	524.448,00	3,00	524.448,00		$ 0,00			3,00	$ 524.448,00		$ 0,00
14.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE BAÑO 220VAC , 2#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"	UND	5,00	$ 178.304,00	$ 891.520,00	5,00	891.520,00	5,00	891.520,00		$ 0,00			5,00	$ 891.520,00		$ 0,00
14.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE BAÑO 120VAC , 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"	UND	4,00	$ 163.685,00	$ 654.740,00	4,00	654.740,00	4,00	654.740,00		$ 0,00			4,00	$ 654.740,00		$ 0,00
14.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA RECUPERADORAS DE AIRE 220VAC, 3#12+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"	UND	3,00	$ 246.915,00	$ 740.745,00	3,00	740.745,00	3,00	740.745,00		$ 0,00			3,00	$ 740.745,00		$ 0,00
14.3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA UMA 220VAC, 3#8+1#10T EN TUBERIA PVC SCH 40 1", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1"	UND	3,00	$ 510.447,00	$ 1.531.341,00	3,00	1.531.341,00	3,00	1.531.341,00		$ 0,00			3,00	$ 1.531.341,00		$ 0,00
14.3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO VRF 220VAC, 3#6+1#10T EN TUBERIA EMT 1", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1"	UND	1,00	$ 561.206,00	$ 561.206,00	1,00	561.206,00	1,00	561.206,00		$ 0,00			1,00	$ 561.206,00		$ 0,00
14.3.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO VRF 220VAC, 3#4+1#8T EN TUBERIA EMT 1-1/4", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1-1/4"	UND	2,00	$ 975.230,00	$ 1.950.460,00	2,00	1.950.460,00	2,00	1.950.460,00		$ 0,00			2,00	$ 1.950.460,00		$ 0,00
14.3.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONDENSADORA 220VAC, 3#12+1#12+1#12T EN TUBERIA EMT 3/4", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 3/4"	UND	3,00	$ 385.282,00	$ 1.155.846,00	3,00	1.155.846,00	3,00	1.155.846,00		$ 0,00			3,00	$ 1.155.846,00		$ 0,00
14.4	LUMINARIAS							0,00	-		$ 0,00			0,00			$ 0,00
14.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL LED CUADRADO POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120VAC, 4000K, 60X60 CM, IP 40, 4800LM, PARA MONTAJE EN CIELO RASO (OFICINAS ADMINISTRATIVAS)	UND	7,00	$ 216.645,00	$ 1.516.515,00	7,00	1.516.515,00	7,00	1.516.515,00		$ 0,00			7,00	$ 1.516.515,00		$ 0,00
14.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TENSOFLEX CON CINTA LED 4000K, 24W, 24V, IP65. INCLUYE DRIVER 24V, 96W 120-277V Y SOPORTE PLANO PARA CINTA LED. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION/FIJACION	UND	5,00	$ 5.469.465,00	$ 27.347.325,00	5,00	27.347.325,00	5,00	27.347.325,00		$ 0,00			5,00	$ 27.347.325,00		$ 0,00

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.238.494.266,52	VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.524.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:							
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.266,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.646,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.261.909-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.325.369,80			PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA DEL PRESENTA ACTA:	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025						

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
14.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 3W, 3000K, 120V, IP54. (GUIA DE JARDINERAS)	UND	15,00	$ 346.718,00	$ 5.200.770,00	15,00	5.200.770,00	15,00	5.200.770,00		$ 0,00			15,00	$ 5.200.770,00		$ 0,00
14.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACION 120VAC, 4200LM, IP 65, IRC 80 (CUARTOS TECNICOS, PASILLOS)	UND	107,00	$ 187.026,00	$ 20.011.782,00	107,00	20.011.782,00	107,00	20.011.782,00		$ 0,00			107,00	$ 20.011.782,00		$ 0,00
14.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO CAMPANA DECORATIVA (MATERIAL RATAN O MIMBRE) CON SOPORTE EN MADER. PORTALAMPARAS E27 Y BOMBILLA LED FILAMENTADA LUZ CALIDA (3000K)	UND	103,00	$ 531.265,00	$ 54.720.295,00	103,00	54.720.295,00	103,00	54.720.295,00		$ 0,00			103,00	$ 54.720.295,00		$ 0,00
14.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE , VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277VAC, AUTONOMIA 180 MINS, IP20, 2X100LM. IRC 7, MONTAJE DE SOPREPONER, POTENCIA 3W, 6500K (AREAS COMUNES, ESCALERAS)	UND	35,00	$ 117.664,00	$ 4.118.240,00	35,00	4.118.240,00	35,00	4.118.240,00		$ 0,00			35,00	$ 4.118.240,00		$ 0,00
14.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC (BAÑOS)	UND	12,00	$ 56.751,00	$ 681.012,00	12,00	681.012,00	12,00	681.012,00		$ 0,00			12,00	$ 681.012,00		$ 0,00
14.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED - FUSION FIXED 4000K, 950 LM, CRI 83, 11W (AREAS COMUNES)	UND	262,00	$ 811.343,00	$ 212.571.866,00	262,00	212.571.866,00	262,00	212.571.866,00		$ 0,00			262,00	$ 212.571.866,00		$ 0,00
14.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL CINTA LED BLANCO 4000K, 72W, 24V, IP65. INCLUYE DRIVER 24W/89W 120-277VAC - PERFIL DE ALUMINIO Y TAPA DE ALUMINIO (ESCALERAS ACCESO)	UND	17,00	$ 412.391,00	$ 7.010.647,00	17,00	7.010.647,00	17,00	7.010.647,00		$ 0,00			17,00	$ 7.010.647,00		$ 0,00
14.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL CINTA LED BLANCO 4000K, 72W, 24V, IP65. INCLUYE DRIVER 24W/89W 120-277VAC - PERFIL DE ALUMINIO Y TAPA DE ALUMINIO (BAÑOS)	UND	14,00	$ 762.557,00	$ 10.675.798,00	14,00	10.675.798,00	14,00	10.675.798,00		$ 0,00			14,00	$ 10.675.798,00		$ 0,00
14.4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED INDIRECTA PARA CUBIERTA, 20W-4000K	UND	24,00	$ 1.491.645,00	$ 35.799.480,00	24,00	35.799.480,00	24,00	35.799.480,00		$ 0,00			24,00	$ 35.799.480,00		$ 0,00
14.4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO KARDANICA 3000K, 120V-14W	UND	9,00	$ 698.773,00	$ 6.288.957,00	9,00	6.288.957,00	9,00	6.288.957,00		$ 0,00			9,00	$ 6.288.957,00		$ 0,00
14.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO, POTENCIA DE ENTRADA6.5W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120VAC, IP65, PARA INCRUSTAR EN PISO, (JARDINERAS)	UND	30,00	$ 200.567,00	$ 6.017.010,00	30,00	6.017.010,00	30,00	6.017.010,00		$ 0,00			30,00	$ 6.017.010,00		$ 0,00
14.4.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO BALA 120V, 7.5W, 4000K (FACHADA)	UND	190,00	$ 409.394,00	$ 77.784.860,00	190,00	77.784.860,00	190,00	77.784.860,00		$ 0,00			190,00	$ 77.784.860,00		$ 0,00
14.4.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO BALA MOON 120V, 4000K, 7W	UND	18,00	$ 85.824,00	$ 1.544.832,00	18,00	1.544.832,00	18,00	1.544.832,00		$ 0,00			18,00	$ 1.544.832,00		$ 0,00
14.5	**PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCIÓN**							0,00	-		$ 0,00			0,00			$ 0,00
14.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CTOS CON TAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (LOCALES)	UND	52,00	$ 269.640,00	$ 13.865.280,00	52,00	13.865.280,00	52,00	13.865.280,00		$ 0,00			52,00	$ 13.865.280,00		$ 0,00
14.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 42 CTOS CON TAPA (AREAS COMUNES)	UND	7,00	$ 723.485,00	$ 5.064.395,00	7,00	5.064.395,00	7,00	5.064.395,00		$ 0,00			7,00	$ 5.064.395,00		$ 0,00
14.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 18 CTOS CON TAPA. (SISTEMA REGULADO)	UND	1,00	$ 686.767,00	$ 686.767,00	1,00	686.767,00	1,00	686.767,00		$ 0,00			1,00	$ 686.767,00		$ 0,00
14.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 5 KVA TRIFASICA 208VAC. AUTONOMIA 90MINS	UND	1,00	$ 8.909.893,00	$ 8.909.893,00	1,00	8.909.893,00	1,00	8.909.893,00		$ 0,00			1,00	$ 8.909.893,00		$ 0,00
14.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 1X20A	UND	250,00	$ 19.637,00	$ 4.909.250,00	250,00	4.909.250,00	250,00	4.909.250,00		$ 0,00			250,00	$ 4.909.250,00		$ 0,00
14.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 2X20A	UND	42,00	$ 61.678,00	$ 2.590.476,00	42,00	2.590.476,00	42,00	2.590.476,00		$ 0,00			42,00	$ 2.590.476,00		$ 0,00
14.5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 3x30A	UND	35,00	$ 129.588,00	$ 4.535.580,00	35,00	4.535.580,00	35,00	4.535.580,00		$ 0,00			35,00	$ 4.535.580,00		$ 0,00
14.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	6,00	$ 1.028.045,00	$ 6.168.270,00	6,00	6.168.270,00	6,00	6.168.270,00		$ 0,00			6,00	$ 6.168.270,00		$ 0,00
14.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X40A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE N°8AWG COBRE.	UND	53,00	$ 271.818,00	$ 14.406.354,00	53,00	14.406.354,00	53,00	14.406.354,00		$ 0,00			53,00	$ 14.406.354,00		$ 0,00
14.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X80 COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE N°6AWG COBRE.	UND	7,00	$ 473.899,00	$ 3.317.293,00	7,00	3.317.293,00	7,00	3.317.293,00		$ 0,00			7,00	$ 3.317.293,00		$ 0,00
14.6	**SUBESTACION ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXION**							0,00	-		$ 0,00			0,00			$ 0,00
14.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE N.2 AWG COBRE 133% 15KV (RECORRIDO DESDE SUBESTACION HASTA PUNTO DE CONEXION)	ML	100,00	$ 180.497,00	$ 18.049.700,00	100,00	18.049.700,00	100,00	18.049.700,00		$ 0,00			100,00	$ 18.049.700,00		$ 0,00
14.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" (2 TUBOS) (RECORRIDO DESDE SUBESTACION HASTA PUNTO DE CONEXION). INCLUYE ALAMBRE GUIA EN SU INTERIOR Y SEÑALIZACION CON CINTA DE PELIGRO. INCLUYE CRUCE DE VIA DE APROXIMADAMENTE 10 MTS CON TOPO	ML	100,00	$ 88.853,00	$ 8.885.300,00	100,00	8.885.300,00	100,00	8.885.300,00		$ 0,00			100,00	$ 8.885.300,00		$ 0,00
14.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA EN NIVEL II (3 TCS 40/5A , 3 TPS 13200/208V, MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRONICO, BLOQUE DE PRUEBAS). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED	UND	1,00	$ 17.970.560,00	$ 17.970.560,00	1,00	17.970.560,00	1,00	17.970.560,00		$ 0,00			1,00	$ 17.970.560,00		$ 0,00
14.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12MTS X 1050 KGF, INCLUYE BASE DE CONCRETO	UND	1,00	$ 2.590.268,00	$ 2.590.268,00	1,00	2.590.268,00	1,00	2.590.268,00		$ 0,00			1,00	$ 2.590.268,00		$ 0,00
14.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES EN POSTE (3 CORTACIRCUITOS , 3 DPS, CRUCETA METALICA)	UND	1,00	$ 3.041.001,00	$ 3.041.001,00	1,00	3.041.001,00	1,00	3.041.001,00		$ 0,00			1,00	$ 3.041.001,00		$ 0,00
14.6.6	SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3", PARA BAJANTE DE ACOMETIDA EN POSTE	ML	6,00	$ 601.981,00	$ 3.611.886,00	6,00	3.611.886,00	6,00	3.611.886,00		$ 0,00			6,00	$ 3.611.886,00		$ 0,00
14.6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2AWG COBRE XLPE 133%	UND	1,00	$ 2.515.635,00	$ 2.515.635,00	1,00	2.515.635,00	1,00	2.515.635,00		$ 0,00			1,00	$ 2.515.635,00		$ 0,00
14.6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA MEDIA TENSION EN PISO PARA REDES SUBTARRANEAS (13.2KV), SEGÚN NORMA ESSA. INCLUYE MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS.	UND	4,00	$ 1.351.862,00	$ 5.407.448,00	4,00	5.407.448,00	4,00	5.407.448,00		$ 0,00			4,00	$ 5.407.448,00		$ 0,00
14.6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CODOS TIPO INTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2AWG COBRE XLPE 133%	UND	1,00	$ 2.081.204,00	$ 2.081.204,00	1,00	2.081.204,00	1,00	2.081.204,00		$ 0,00			1,00	$ 2.081.204,00		$ 0,00

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

Alcaldía Municipal de

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.238.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.524.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.648,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.325.369,80				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025							

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
14.6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 500 KVA 13200/208 120 VAC. INCLUYE TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 62.061.680,00	$ 62.061.680,00	1,00	62.061.680,00	1,00	62.061.680,00		$ 0,00			1,00	$ 62.061.680,00		$ 0,00
14.6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ESPECIAL AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x) TRANSFERENCIA PRINCIPAL 208VAC EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO, FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 40.584.157,00	$ 40.584.157,00	1,00	40.584.157,00	1,00	40.584.157,00		$ 0,00			1,00	$ 40.584.157,00		$ 0,00
14.6.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CORRECCION DE FACTOR DE PONTENCIA, GABINETE ESPECIAL AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x) BANCO DE CONDENSADORES 150KVAR - 208VAC EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA IINCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO, FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 22.310.543,00	$ 22.310.543,00	1,00	22.310.543,00	1,00	22.310.543,00		$ 0,00			1,00	$ 22.310.543,00		$ 0,00
14.6.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES N°1 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 14.696.537,00	$ 14.696.537,00	1,00	14.696.537,00	1,00	14.696.537,00		$ 0,00			1,00	$ 14.696.537,00		$ 0,00
14.6.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES N°2 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 14.696.537,00	$ 14.696.537,00	1,00	14.696.537,00	1,00	14.696.537,00		$ 0,00			1,00	$ 14.696.537,00		$ 0,00
14.6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES N°3 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 10.128.134,00	$ 10.128.134,00	1,00	10.128.134,00	1,00	10.128.134,00		$ 0,00			1,00	$ 10.128.134,00		$ 0,00
14.6.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ESPECIAL AUTOSOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x)GABINETE AREAS COMUNES 208 VAC FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO, FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 23.071.944,00	$ 23.071.944,00	1,00	23.071.944,00	1,00	23.071.944,00		$ 0,00			1,00	$ 23.071.944,00		$ 0,00
14.6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOGENERADOR INSONORIZADA DE 500 KVA - POTENCIA STAND BY EFECTICA HASTA 1500 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR, SILENCIADOR TIPO CRITICO,TANQUE COMBUSTIBLE PARA 7 HORAS DE AUTONOMIA Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 293.801.020,00	$ 293.801.020,00	1,00	293.801.020,00	1,00	293.801.020,00		$ 0,00			1,00	$ 293.801.020,00		$ 0,00
14.6.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE AUTOSOPORTADO IP20 TABLERO DE DISTRIBUCION BOMBA-AP 208VAC. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABA EN PINTURA ELECTROSTATICA. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 2.591.775,00	$ 2.591.775,00	1,00	2.591.775,00	1,00	2.591.775,00		$ 0,00			1,00	$ 2.591.775,00		$ 0,00
14.6.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALITICA GENERAL SEGÚN NORMATIVA RETIE PARA TABLEROS ELECTRICOS, TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, TUBERIAS, BANDEJDAS, REGISTROS ELECTRICOS, CONDUCTORES, ETC	GL	1,00	$ 1.504.142,00	$ 1.504.142,00	1,00	1.504.142,00	1,00	1.504.142,00		$ 0,00			1,00	$ 1.504.142,00		$ 0,00
14.6.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABIENTE CONTRA INCNEDIO (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO) PLANTA EBAR 3. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 14.190.491,00	$ 14.190.491,00	1,00	14.190.491,00	1,00	14.190.491,00		$ 0,00			1,00	$ 14.190.491,00		$ 0,00
14.6.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA LOCALES (MEDIDA DIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED	UND	52,00	$ 768.530,00	$ 39.963.560,00	52,00	39.963.560,00	52,00	39.963.560,00		$ 0,00			52,00	$ 39.963.560,00		$ 0,00
14.6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA AREAS COMUNES (MEDIDA SEMIDIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED	UND	1,00	$ 4.204.437,00	$ 4.204.437,00	1,00	4.204.437,00	1,00	4.204.437,00		$ 0,00			1,00	$ 4.204.437,00		$ 0,00
14.6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP REFRIGERACION (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 5.789.657,00	$ 5.789.657,00	1,00	5.789.657,00	1,00	5.789.657,00		$ 0,00			1,00	$ 5.789.657,00		$ 0,00

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

Alcaldía Distrital de

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.238.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.524.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.648,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.325.369,80				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
14.6.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-RECUPERADORAS DE AIRE (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 5.789.657,00	$ 5.789.657,00	1,00	5.789.657,00	1,00	5.789.657,00		$ 0,00			1,00	$ 5.789.657,00		$ 0,00
14.6.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-UMAS (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 6.165.901,00	$ 6.165.901,00	1,00	6.165.901,00	1,00	6.165.901,00		$ 0,00			1,00	$ 6.165.901,00		$ 0,00
14.6.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-ASCENSOR 1 (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 3.810.015,00	$ 3.810.015,00	1,00	3.810.015,00	1,00	3.810.015,00		$ 0,00			1,00	$ 3.810.015,00		$ 0,00
14.6.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-ASCENSOR 2 (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 3.810.015,00	$ 3.810.015,00	1,00	3.810.015,00	1,00	3.810.015,00		$ 0,00			1,00	$ 3.810.015,00		$ 0,00
14.6.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABIENTE PRINCIPAL (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1,00	$ 42.847.456,00	$ 42.847.456,00	1,00	42.847.456,00	1,00	42.847.456,00		$ 0,00			1,00	$ 42.847.456,00		$ 0,00
14.6.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO BANDERA 13.2 KV EN POSTE	UND	1,00	$ 1.453.878,00	$ 1.453.878,00	1,00	1.453.878,00	1,00	1.453.878,00		$ 0,00			1,00	$ 1.453.878,00		$ 0,00
14.6.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA BAJA TENSION EN PISO PARA REDES SUBTARRANEAS (208VAC). INCLUYE MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS.	UND	2,00	$ 1.409.344,00	$ 2.818.688,00	2,00	2.818.688,00	2,00	2.818.688,00		$ 0,00			2,00	$ 2.818.688,00		$ 0,00
14.6.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA (ANALIZADOR DE RED CON COMUNICACIÓN MODBUS 96 X 96) PARA MONTAJE EN TABLERO DE TRANSFERENCIA PRINCIPAL	UND	1,00	$ 5.573.962,00	$ 5.573.962,00	1,00	5.573.962,00	1,00	5.573.962,00		$ 0,00			1,00	$ 5.573.962,00		$ 0,00
14.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA								-		$ 0,00			0,00			$ 0,00
14.7.1	Suministro e instalación de barraje equipotencial de 1000A, incluye aisladores y conexión a malla por medio de cable n. 2/0 AWG y soldadura exotérmica.	UND	3,00	$ 1.386.037,00	$ 4.158.111,00	3,00	4.158.111,00	3,00	4.158.111,00		$ 0,00			3,00	$ 4.158.111,00		$ 0,00
14.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA EN ALUMINIO REDONDEADA EN UN EXTREMO. LONGITUD 1CM, DIAMETRO 16MM, INCLUYE BASE Y CONECTOR CON CONDUCTOR	UND	16,00	$ 209.762,00	$ 3.356.192,00	16,00	3.356.192,00	16,00	3.356.192,00		$ 0,00			16,00	$ 3.356.192,00		$ 0,00
14.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO, DIAMETRO 8MM, PARA INSTALACION EN ANILLO SUPERIOR EN CUBIERTA. SEGÚN PLANOS ADJUNTOS	ML	220,00	$ 13.207,00	$ 2.905.540,00	220,00	2.905.540,00	220,00	2.905.540,00		$ 0,00			220,00	$ 2.905.540,00		$ 0,00
14.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0AWG, PARA SISTEMA DE PUESTA DE TIERRA.	ML	210,00	$ 74.456,00	$ 15.635.760,00	210,00	15.635.760,00	210,00	15.635.760,00		$ 0,00			210,00	$ 15.635.760,00		$ 0,00
14.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0AWG, PARA LOS BAJANTES. SEGÚN PLANOS ADJUNTOS	ML	165,00	$ 16.538,00	$ 2.728.770,00	165,00	2.728.770,00	165,00	2.728.770,00		$ 0,00			165,00	$ 2.728.770,00		$ 0,00
14.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA VARILLA - CABLE DE COBRE	UND	13,00	$ 62.126,00	$ 807.638,00	13,00	807.638,00	13,00	807.638,00		$ 0,00			13,00	$ 807.638,00		$ 0,00
14.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 25X25CM, IP666, CARA CONEXIÓN BIMETALICA POR BAJANTE	UND	9,00	$ 63.962,00	$ 575.658,00	9,00	575.658,00	9,00	575.658,00		$ 0,00			9,00	$ 575.658,00		$ 0,00
14.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE DE 2.4MTS DE LONGITUD Y 5/8" DE DIAMETRO.	UND	13,00	$ 312.329,00	$ 4.060.277,00	13,00	4.060.277,00	13,00	4.060.277,00		$ 0,00			13,00	$ 4.060.277,00		$ 0,00
14.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE PELIGRO DE BAJANATE DE DESCARGAS ATMOSFERICAS	UND	9,00	$ 49.565,00	$ 446.085,00	9,00	446.085,00	9,00	446.085,00		$ 0,00			9,00	$ 446.085,00		$ 0,00
14.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA ANILLO SUPERIOR EN POLIAMIDA CON ROSCA, PARA CALIBRE 8-10MM	UND	220,00	$ 14.426,00	$ 3.173.720,00	220,00	3.173.720,00	220,00	3.173.720,00					220,00	$ 3.173.720,00		
14.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION DE 30 X 30 CM CON TAPA REMOVIBLE	UND	2,00	$ 457.438,00	$ 914.876,00	2,00	914.876,00	2,00	914.876,00		$ 0,00			2,00	$ 914.876,00		$ 0,00
14.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC de 3/4" PARA BAJANTE EXPUESTO O EN MURO	ML	165,00	$ 19.751,00	$ 3.258.915,00	165,00	3.258.915,00	165,00	3.258.915,00		$ 0,00			165,00	$ 3.258.915,00		$ 0,00
14.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO ENTRE CABLE 1/0 AWG ALUMINIO Y CABLE 2/0 AWG COBRE	UND	9,00	$ 62.494,00	$ 562.446,00	9,00	562.446,00	9,00	562.446,00					9,00	$ 562.446,00		
14.8	OBRAS CIVILES							0,00	-					0,00			
14.8.1	EXCAVACION DE 40CM X 30CM, INCLUYE TAPE, COMPACTACION PARA LINEAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	ML	200,00	$ 9.197,00	$ 1.839.400,00	200,00	1.839.400,00	200,00	1.839.400,00		$ 0,00			200,00	$ 1.839.400,00		$ 0,00
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 1.910.149.305,00		$ 1.910.149.305,00		$ 1.910.149.305,00		$ 0,00				$ 1.910.149.305,00		$ 0,00
15	TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA																
15.1.	SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES																
15.1.1	Suministro e instalación Cable Categoría 6A F/UTP Violeta LSOH.	ML	3.355,00	$ 6.921,00	$ 23.219.955,00	3355,00	23.219.955,00	3355,00	23.219.955,00		$ 0,00			3355,00	$ 23.219.955,00		$ 0,00
15.1.2	Suministro e instalación. Incluye Jack, patchcord de área de trabajo, patchcord de administración, faceplate doble, tapa ciega, marquillas y certificación de punto de datos.	UND	70,00	$ 283.656,00	$ 19.855.920,00	70,00	19.855.920,00	70,00	19.855.920,00		$ 0,00			70,00	$ 19.855.920,00		$ 0,00
15.1.3	Suministro e instalación de bandeja de fibra óptica completa, debe incluir mínimo 1 adaptador de 12 hilos de fibra LC, Break Out, 1 tapa ciega, bandeja porta fusión, fusión de hilos de fibra y certificación de hilos, mismo fabricante que cableado de cobre.	UND	1,00	$ 3.959.642,00	$ 3.959.642,00	1,00	3.959.642,00	1,00	3.959.642,00		$ 0,00			1,00	$ 3.959.642,00		$ 0,00
15.1.4	Suministro e instalación de gabinete de piso 1,80x58x51 cm, 40 U. Incluye herrajes, kit de tierra, organizadores horizontales, bandeja sencilla ventilada, kit de ventilación, multitoma horizontal de 12 salidas y consumibles de instalación.	UND	1,00	$ 6.740.507,00	$ 6.740.507,00	1,00	6.740.507,00	1,00	6.740.507,00		$ 0,00			1,00	$ 6.740.507,00		$ 0,00
15.2.	NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS					0,00	-	0,00	-		$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

Alcaldía Distrital de

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.238.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.824.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOYAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.648,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.325.369,80				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025							

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
15.2.1	Suministro e Instalación de Switch L2 Administrable web, 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch -24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802,3u, ab); 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports; 2SFP+ (10gb), Latency: <5µs, <5µs, <1,5µs; Throughput: up to 95,2Mpps; Switching Capacity 128Gbps, MAC Address 16384 entries, 1 RJ-45 console port to access limited CLI port, IMC, Web browser, limited command-line interface, SNMP Manager, IEEE 802,3 Ethernet MIB.	UND	3,00	$ 4.942.987,00	$ 14.828.961,00	3,00	14.828.961,00	3,00	14.828.961,00		$ 0,00			3,00	$ 14.828.961,00		$ 0,00
15.2.2	Suministro e Instalación de Switch 24G 2SFP Switch, L2, Administrable web, 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802,3u, ab); 2SFP (1GB) ports Latency: <7µs, <2µs; Throughput: up to 38,6 Mpps; Switching Capacity 52 Gbps, MAC Address 8000 entries.	UND	1,00	$ 2.065.016,00	$ 2.065.016,00	1,00	2.065.016,00	1,00	2.065.016,00		$ 0,00			1,00	$ 2.065.016,00		$ 0,00
15.3.	SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)					0,00	-		-		$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00
15.3.1	Suministro e Instalación de Cámara minidomo 4 MP, Lente F 2,8mm, 120DB, Metálica, H.265+, IP67, IK10. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.	UND	17,00	$ 1.431.299,00	$ 24.332.083,00	17,00	24.332.083,00	17,00	24.332.083,00		$ 0,00			17,00	$ 24.332.083,00		$ 0,00
15.3.2	Suministro e Instalación de Cámara Bala 4 MP, D/N, Lente 2,8mm, 120DB, H.265+, IP67. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.	UND	11,00	$ 1.382.610,00	$ 15.208.710,00	11,00	15.208.710,00	11,00	15.208.710,00		$ 0,00			11,00	$ 15.208.710,00		$ 0,00
15.3.3	Suministro e Instalación de Cámara PTZ 2MP DARKF, 25XZOOM H265+, WDR REAL DEFOG EIS HLC 3D-DNR POE+ 100 MTS IR. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.	UND	6,00	$ 4.079.566,00	$ 24.477.396,00	6,00	24.477.396,00	6,00	24.477.396,00		$ 0,00			6,00	$ 24.477.396,00		$ 0,00
15.3.4	Suministro e Instalación de NVR 32 canales HD 16 canales POE 256MBPS 4 Bahías Disco/8TB H.265 PRO. Incluye almacenamiento para 30 días de grabación	UND	2,00	$ 7.081.834,00	$ 14.163.668,00	2,00	14.163.668,00	2,00	14.163.668,00		$ 0,00			2,00	$ 14.163.668,00		$ 0,00
15.3.5	Suministro e Instalación de Workstation Precisión Intel Xeon Processor W-2223 (4C, 3.60Hz 3.9GHz Turbo HT 8.25MB (120W)) DDR4-2666 RAM: 8GB 1x8GB DDR4 2933MHz RDIMM ECC Memory | 3.5" 1TB 7200rpm SATA Hard Drive | Windows 10 Pro for Workstations (up to 4 Cores) Multi - English, French, Spanish | NVIDIA® Quadro® P1000, 4GB, 4 mDP (6820T). Incluye pantalla de 24", teclado, mouse.	UND	1,00	$ 15.131.909,00	$ 15.131.909,00	1,00	15.131.909,00	1,00	15.131.909,00		$ 0,00			1,00	$ 15.131.909,00		$ 0,00
15.3.6	Suministro e Instalación de Monitor Industrial Tamaño: 46", Resolución 1920X1080 (16:9), Brillo 500nit, Contraste: 3500:1, Características: uso 24 horas/día, Bisel 3.5mm (borde a borde). Incluye soporte en pared y accesorios de fijación.	UND	2,00	$ 9.121.904,00	$ 18.243.808,00	2,00	18.243.808,00	2,00	18.243.808,00		$ 0,00			2,00	$ 18.243.808,00		$ 0,00
15.3.7	Suministro e Instalación de Extensor ethernet y PoE sobre UTP conecta a FLEX-Link o FLEX-C. Incluye terminal de 1 puerto FLEX ethernet sobre UTP 50W potencia, fuente 55VAC 60W para NV-FLXLK, NV-FLXLK-BSE, NV-ECLK-PLS.	UND	3,00	$ 2.682.829,00	$ 8.048.487,00	3,00	8.048.487,00	3,00	8.048.487,00		$ 0,00			3,00	$ 8.048.487,00		$ 0,00
15.3.8	Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de CCTV.	UND	1,00	$ 5.101.920,00	$ 5.101.920,00	1,00	5.101.920,00	1,00	5.101.920,00		$ 0,00			1,00	$ 5.101.920,00		$ 0,00
15.4.	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS					0,00	-		-		$ 0,00						$ 0,00
15.4.1.	DETECCIÓN DE INCENDIOS ÁREA ADMINISTRATIVA, DE SERVICIOS Y LOCALES					0,00	-		-		$ 0,00						$ 0,00
15.4.1.1	Suministro e Instalación de Panel Detección de Incendio FACP proporciona un bucle de dispositivo inteligente de Clase A o Clase B que admite hasta 250 direcciones de dispositivo. Los módulos de controlador de bucle se pueden agregar en combinación para expandir la capacidad total del sistema en incrementos de 250 puntos hasta un máximo de 1,000 direcciones de dispositivos. Los paneles VS4 incluyen cuatro NAC que pueden conectarse para la operación Clase A o Clase B. Incluye módulo expansor de 2 lazos, dos baterías de respaldo, y transporte.	UND	1,00	$ 8.560.347,00	$ 8.560.347,00	1,00	8.560.347,00	1,00	8.560.347,00		$ 0,00			1,00	$ 8.560.347,00		$ 0,00
15.4.1.2	Suministro e Instalación de Interfaz puerto Ethernet, RJ45. La tarjeta proporciona una conexión de red Ethernet 10/100 Base T estándar para conectarse a una intranet, una red local o Internet. La tarjeta se puede usar para descargar la programación de configuración desde el VS-CU al panel. La tarjeta Ethernet se instala en el conjunto de plástico y se conecta a la placa de circuito principal a través de un cable plano. Incuye transporte.	UND	1,00	$ 1.708.902,00	$ 1.708.902,00	1,00	1.708.902,00	1,00	1.708.902,00		$ 0,00			1,00	$ 1.708.902,00		$ 0,00
15.4.1.3	Suministro e Instalación de Detector de Humo con Tecnología Multisensor. Proporciona un sensor de humo óptico y un sensor de calor de tasa de aumento con un ajuste de temperatura fijo. Juntos, estos sensores detectan de manera eficiente incendios latentes, así como incendios de llamas rápidas. El sensor de calor de tasa de aumento integrado de KI-PHD proporciona una temperatura de 15 ° F (9 ° C) por minuto para la detección de incendios de rápido desarrollo, al mismo tiempo que proporciona un umbral de detección fijo de 135 ° F (57,2 ° C). Los sensores de calor controlan la temperatura del aire y determinan si se debe iniciar una alarma. Operating voltage 15.20 to 19.95 VDC. Normal operating current 51 µA. Alarm current 68 µA. Smoke Sensitivity Range UL/ULC: 0.53 to 3.94 %/ft. (1.7 to 12.35 %/m) obscuration. Rate-of-rise rating 15°F/min (8°C/min). Fixed temperature rating 135°F (57.2°C). Actual alarm point 129 to 141°F (53.9 to 60.6°C). Air velocity 0 to 4,000 ft./min (0 to 20.32 m/s). Wall mounting 12 in. (305 mm) max. from ceiling. Operating environment 32 to 100°F (0 to 38°C), 0 to 93% RH, noncondensing. Incluye caja 4x4 Rawelt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte.	UND	39,00	$ 453.669,00	$ 17.693.091,00	39,00	17.693.091,00	39,00	17.693.091,00		$ 0,00			39,00	$ 17.693.091,00		$ 0,00
15.4.1.4	Suministro e Instalación de Detector de Temperatura Rate-of-rise. Detector de incendios inteligente con índice de aumento. Monitorea la temperatura del aire circundante y analiza los datos del sensor para determinar si se debe iniciar una alarma. La función de calor de tasa de aumento detecta rápidamente un fuego rápido y en llamas. La función de calor de temperatura fija detecta fuego cuando la temperatura del aire cerca del detector excede el punto de alarma. Operating voltage 15.20 to 19.95 VDC. Normal operating current 51 µA. Alarm current 68 µA. Vibration level 10 to 35 Hz, with an amplitude of 0.01 in. Rate-of-rise rating 15°F/min (8°C/min). Fixed temperature rating 135°F (57.2°C). Actual alarm point 129 to 141°F (53.9 to 60.6°C). Incluye caja 4x4 Rawelt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte.	UND	55,00	$ 294.785,00	$ 16.213.175,00	55,00	16.213.175,00	55,00	16.213.175,00		$ 0,00			55,00	$ 16.213.175,00		$ 0,00

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

Alcaldía Distrital de

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.238.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.524.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.648,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.666.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.325.369,80				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
15.4.1.6	Suministro e Instalación de Detector de Monóxido de Carbono Alertar sobre niveles potencialmente peligrosos de CO en el área protegida. El sensor electroquímico interno se comunica con un sofisticado microprocesador integrado que rastrea con precisión los niveles de CO a lo largo del tiempo. Esta tecnología de detección da como resultado una respuesta rápida, detección confiable, tiempo de restablecimiento rápido y una inmunidad superior a falsas alarmas. Incluye módulo monitor, caja 4x4 Rawelt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte.	UND	4,00	$ 786.985,00	$ 3.147.940,00	4,00	3.147.940,00	4,00	3.147.940,00		$ 0,00			4,00	$ 3.147.940,00		$ 0,00
15.4.1.8	Suministro e Instalación de Estación de Alarma de fuego de doble acción. Hechos de zinc fundido a presión y terminados con pintura en polvo epoxi roja complementada con rayas y marcas de color aluminio. Están equipadas con un interruptor de llave de alarma general (GA) para aplicaciones donde se requiere la operación en dos etapas. Operating Temperature: 32°F to 120°F (0°C to 49°C) Storage Temperature: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) Humidity: 0 to 93%. Construction & Finish: Lexan - Red with white markings. Operating Current: Standby = 250µA, Activated = 400µA. Addressing Requirements: Uses 1 Module Address. Incluye módulo monitor, caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte.	UND	16,00	$ 309.382,00	$ 4.950.112,00	16,00	4.950.112,00	16,00	4.950.112,00		$ 0,00			16,00	$ 4.950.112,00		$ 0,00
15.4.1.7	Suministro e Instalación de Carcaza stopper sin sirena para Estación Manual. Este dispositivo único y patentado ayuda a prevenir falsas alarmas de incendio sin restringir las alarmas legítimas. Consiste en un protector y marco de policarbonato Lexan transparente a prueba de manipulaciones que se ajusta fácilmente a las estaciones de extracción manual. Incluye transporte.	UND	9,00	$ 184.102,00	$ 1.656.918,00	9,00	1.656.918,00	9,00	1.656.918,00		$ 0,00			9,00	$ 1.656.918,00		$ 0,00
15.4.1.8	Suministro e Instalación de Sirena-estrobo pared 15, 30, 75 y 110 cd. Utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de menores requisitos de corriente. Las luces estroboscópicas cuentan con salida de luz de 15, 30, 75 o 110 cd seleccionable en campo. Operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR. Horn signal type Constant or TC3 temporal. Light output 15, 30, 75, or 110 candela. Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx. Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source. Synchronization Sources CC Series Signal Modules, Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels. Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2). Dimensions (W×H×D) 4.95 x 5.78 x 1.82 in (12.57 x 14.68 x 4.11 cm). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios y transporte.	UND	20,00	$ 350.080,00	$ 7.001.600,00	20,00	7.001.600,00	20,00	7.001.600,00		$ 0,00			20,00	$ 7.001.600,00		$ 0,00
15.4.1.9	Suministro e Instalación de Módulo de entrada. Dispositivos direccionables analógicos inteligentes que se utilizan para conectar una alarma clase B normalmente abierta, supervisar o monitorear circuitos de dispositivos iniciadores de contacto seco (IDC). Description Single Input Module. Type Code 48 (factory set) Four sub-types (personality codes) are available. Address Requirements Uses One Module Address. Operating Current Standby = 250µA; Activated = 400µA; Operating Voltage 15.2 to 19.95 Vdc (19 Vdc nominal). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte.	UND	6,00	$ 325.732,00	$ 1.954.392,00	6,00	1.954.392,00	6,00	1.954.392,00		$ 0,00			6,00	$ 1.954.392,00		$ 0,00
15.4.1.10	Suministro e Instalación de Módulo de control simple. Dispositivos direccionables analógicos inteligentes que se utilizan para conectar, a pedido del controlador de bucle, señales supervisadas de clase B o circuitos telefónicos a sus respectivas entradas de alimentación. Description Single Input (Riser) Signal Module. Type Code 50 (factory set) Two sub-types (personality codes) are available. Address Requirements Uses one module address. Wiring Terminations Suitable for #12 to #18 AWG (2.5 mm² to 0.75mm²). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte.	UND	10,00	$ 284.846,00	$ 2.848.460,00	10,00	2.848.460,00	10,00	2.848.460,00		$ 0,00			10,00	$ 2.848.460,00		$ 0,00
15.4.1.11	Suministro e Instalación de Anunciador LCD de 80 caracteres, indicadores comunes de sistema y controles, beige. Incluye accesorios, regata y transporte.	UND	1,00	$ 1.380.394,00	$ 1.380.394,00	1,00	1.380.394,00	1,00	1.380.394,00		$ 0,00			1,00	$ 1.380.394,00		$ 0,00
15.4.1.12	Suministro e Instalación de fuente para sirenas de 10 A, 120 VAC. Incluye dos baterías de respaldo, módulo monitor, y transporte.	UND	1,00	$ 1.923.651,00	$ 1.923.651,00	1,00	1.923.651,00	1,00	1.923.651,00		$ 0,00			1,00	$ 1.923.651,00		$ 0,00
15.4.1.13	Suministro e Instalación de Cable de incendio 18 AWG FPLR. Overal Cabling Color Code: 1 Black, 1 Red. Number conductors: 2. Stranding Solid. Conductor material: BC-Bare Copper. Operating Temperature Range: -20°C To +75°C. UL Temperature Rating: 75°C. Max. Recommended Puling Tension: 39.200 lbs. Incluye transporte.	ML	3.355,00	$ 4.139,00	$ 13.886.345,00	3355,00	13.886.345,00	3355,00	13.886.345,00		$ 0,00			3355,00	$ 13.886.345,00		$ 0,00
15.4.1.14	Mano de obra para configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del Sistema de Detección de Incendios de acuerdo con Norma NFPA 72.	UND	1,00	$ 5.258.725,00	$ 5.258.725,00	1,00	5.258.725,00	1,00	5.258.725,00		$ 0,00			1,00	$ 5.258.725,00		$ 0,00
15.4.2.	**DETECCIÓN DE INDENCIOS ÁREA DE COMEDOR**					0,00	-		-		$ 0,00			0,00	$ 0,00		$ 0,00
15.4.2.1	Suministro e Instalación de detector de Humo por Detección de partículas mediante longitud de onda dual (infrarroja y ultravioleta). Reproductor de imágenes con campo de visión de 80°. Tipo de lente de la imagen: 90°. Campo de visión útil: Horizontal: 80°, Vertical: 48°. Capacidad Estándar: Mínima: 6m, Máxima 34m. Máximo Número de emisores: 7. Al utilizar dos longitudes de onda de luz para detectar partículas, el sistema puede distinguir los tamaños de partículas. La longitud de onda UV más corta interactúa intensamente con ambas partículas, las pequeñas y las grandes, mientras que la longitud de onda IR más larga se ve afectada solo por las partículas más grandes. Por tanto, las mediciones de caída de señal en cada longitud de onda permiten al receptor óptico diferenciar el humo de otros agentes suspendidos en el aire o de objetos que puedan obstaculizar el haz luminoso. Incluye módulo monitor, accesorios de fijación y soporte, cable de configuración, kit de instalación y configuración.	UND	6	$ 4.682.564	$ 28.095.384,00	6,00	28.095.384,00	6,00	28.095.384,00		$ 0,00			6,00	$ 28.095.384,00		$ 0,00

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

Alcaldía Distrital de

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.238.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.524.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENYE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.287.306.648,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.325.369,80				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
15.4.2.2	Suministro e Instalación de detector de Humo por Detección de partículas mediante longitud de onda dual (infrarroja y ultravioleta). Emisor de Rayo de Luz Estándar con Batería. Emisor con alimentación por pilas alcalinas. Al utilizar dos longitudes de onda de luz para detectar partículas, el sistema puede distinguir los tamaños de partículas. La longitud de onda UV más corta interactúa intensamente con ambas partículas, las pequeñas y las grandes, mientras que la longitud de onda IR más larga se ve afectada solo por las partículas más grandes. Por tanto, las mediciones de caída de señal en cada longitud de onda permiten al receptor óptico diferenciar el humo de otros agentes suspendidos en el aire o de objetos que puedan obstaculizar el haz luminoso. Incluye accesorios de fijación y soporte, cable de configuración, kit de instalación y configuración.	UND	11	$ 2.898.930	$ 31.888.230,00	11,00	31.888.230,00	11,00	31.888.230,00		$ 0,00			11,00	$ 31.888.230,00		$ 0,00
15.5.	SISTEMA DE RED INALÁMBRICA - WIFI					0,00	-	0,00	-		$ 0,00			0,00	$ 0,00		$ 0,00
15.5.1	Suministro e Instalación de Access Point ZoneFlex dual-band 802.11abgn/ac Wireless Access Point Indoor, 3x3:3 streams, BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support. Incluye power adapter or PoE injector y accesorios de fijación y soporte, licencia de suscripción por 1 año de Cloud Wifi.	UND	15,00	$ 3.538.315,00	$ 53.074.725,00	15,00	53.074.725,00	15,00	53.074.725,00		$ 0,00			15,00	$ 53.074.725,00		$ 0,00
15.5.2	Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de la Red Inalámbrica.	UND	1,00	$ 3.184.131,00	$ 3.184.131,00	1,00	3.184.131,00	1,00	3.184.131,00		$ 0,00			1,00	$ 3.184.131,00		$ 0,00
15.6.	INFRAESTRUCTURA	0	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	-	0,00	-		$ 0,00			0,00	$ 0,00		$ 0,00
15.6.1	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4". Incluye accesorios de fijación y soporte.	ML	900,00	$ 24.470,00	$ 22.023.000,00	900,00	22.023.000,00	900,00	22.023.000,00		$ 0,00			900,00	$ 22.023.000,00		$ 0,00
15.6.2	Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios de fijación y soporte.	ML	33,00	$ 29.039,00	$ 958.287,00	33,00	958.287,00	33,00	958.287,00		$ 0,00			33,00	$ 958.287,00		$ 0,00
15.6.3	Suministro e instalación de tubería EMT 3". Incluye accesorios de fijación y soporte.	ML	117,00	$ 104.431,00	$ 12.218.427,00	117,00	12.218.427,00	117,00	12.218.427,00		$ 0,00			117,00	$ 12.218.427,00		$ 0,00
15.6.4	Suministro e instalación de tubería PVC 3/4". Incluye accesorios de fijación y soporte.	ML	648,00	$ 9.935,00	$ 6.437.880,00	648,00	6.437.880,00	648,00	6.437.880,00		$ 0,00			648,00	$ 6.437.880,00		$ 0,00
15.6.5	Suministro e instalación de tubería PVC 1". Incluye accesorios de fijación y soporte.	ML	12,00	$ 10.118,00	$ 121.416,00	12,00	121.416,00	12,00	121.416,00		$ 0,00			12,00	$ 121.416,00		$ 0,00
15.6.6	Suministro e instalación de tubería PVC 3". Incluye accesorios de fijación y soporte.	ML	144,00	$ 28.860,00	$ 4.155.840,00	144,00	4.155.840,00	144,00	4.155.840,00		$ 0,00			144,00	$ 4.155.840,00		$ 0,00
15.6.7	Suministro e instalación de bandeja portacable de 400MM. Incluye accesorios, cable y conector de tierra.	ML	270,00	$ 211.608,00	$ 57.133.620,00	270,00	57.133.620,00	270,00	57.133.620,00		$ 0,00			270,00	$ 57.133.620,00		$ 0,00
15.6.8	Suministro e instalación de bandeja portacable de 600MM . Incluye accesorios, cable y conector de tierra.	ML	51,00	$ 243.137,00	$ 12.399.987,00	51,00	12.399.987,00	51,00	12.399.987,00		$ 0,00			51,00	$ 12.399.987,00		$ 0,00
15.6.9	Suministro e instalación de Caja Plástica de 310x240x124mm.	UND	49,00	$ 392.899,00	$ 19.252.051,00	49,00	19.252.051,00	49,00	19.252.051,00		$ 0,00			49,00	$ 19.252.051,00		$ 0,00
15.6.10	Suministro e instalación Gabinete para Operadores de Telecomunicaciones. Incluye accesorios de fijación.	UND	1,00	$ 2.171.070,00	$ 2.171.070,00	1,00	2.171.070,00	1,00	2.171.070,00		$ 0,00			1,00	$ 2.171.070,00		$ 0,00
15.6.11	Suministro e instalación de registro 40x40cm con marco y tapa.	UND	2,00	$ 1.122.716,00	$ 2.245.432,00	2,00	2.245.432,00	2,00	2.245.432,00		$ 0,00			2,00	$ 2.245.432,00		$ 0,00
15.6.12	Suministro e instalación de Barraje para Conexión de Tierra.	UND	1,00	$ 2.835.666,00	$ 2.835.666,00	1,00	2.835.666,00	1,00	2.835.666,00		$ 0,00			1,00	$ 2.835.666,00		$ 0,00
15.6.13	Suministro e instalación Cable Grounding Bus #6.	ML	45,00	$ 15.076,00	$ 678.420,00	45,00	678.420,00	45,00	678.420,00		$ 0,00			45,00	$ 678.420,00		$ 0,00
	Total TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA				$ 542.435.600,00		$ 542.435.600,00		$ 542.435.600,00		$ 0,00			0,00	$ 542.435.600,00		$ 0,00
16	SISTEMA DE AA Y EXTRACCION																
16,10	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO																
16.1.1	Suministro e instalación de sistema VRF para una capacidad de 382.200 btu/hr, con alimentación para 1 equipo internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F.	UND	2,00	$ 61.884.059,00	$ 123.768.118,00	2,00	123.768.118,00	2,00	123.768.118,00		$ 0,00			2,00	$ 123.768.118,00		$ 0,00
16.1.2	Suministro e instalación de sistema VRF para una capacidad de 229,300 btu/hr, con alimentación para 1 equipo internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F.	UND	1,00	$ 35.741.591,00	$ 35.741.591,00	1,00	35.741.591,00	1,00	35.741.591,00		$ 0,00			1,00	$ 35.741.591,00		$ 0,00
16.1.3	Suministro e instalacion de equipos tipo Manejadora tipo en L de 12692CFM con una capacidad de enfriamiento de 374.470Btuh, Doble pared, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante	UND	2,00	$ 76.410.357,00	$ 152.820.714,00	2,00	152.820.714,00	2,00	152.820.714,00		$ 0,00			2,00	$ 152.820.714,00		$ 0,00
16.1.4	Suministro e instalacion de equipos tipo Manejadora tipo en L de 8578CFM con una capacidad de enfriamiento de 242460Btuh, Doble pared, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante	UND	1,00	$ 55.092.646,00	$ 55.092.646,00	1,00	55.092.646,00	1,00	55.092.646,00		$ 0,00			1,00	$ 55.092.646,00		$ 0,00
16.1.5	Suministro e instalación de equipos tipo fan coil Piso techo con una capacidad de enfriamiento de 36.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UND	1,00	$ 2.562.029,00	$ 2.562.029,00	1,00	2.562.029,00	1,00	2.562.029,00		$ 0,00			1,00	$ 2.562.029,00		$ 0,00
16.1.6	Suministro e instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter	UND	1,00	$ 1.972.283,00	$ 1.972.283,00	1,00	1.972.283,00	1,00	1.972.283,00		$ 0,00			1,00	$ 1.972.283,00		$ 0,00
16.1.7	Suministro e Intalacion Controlador principal interno para el control de la unidades internas de las variables: Temperatura, velocidad del aire, encendido y apagado del equipo.	UND	1,00	$ 3.246.176,00	$ 3.246.176,00	1,00	3.246.176,00	1,00	3.246.176,00		$ 0,00			1,00	$ 3.246.176,00		$ 0,00
16.1.8	Suministro e instalacion de Recuperadora de calor de 2000CFM y 0.5inWc de lujo cruzado con una eficiencia de 67.3%.	UND	2,00	$ 61.765.414,00	$ 123.530.828,00	2,00	123.530.828,00	2,00	123.530.828,00		$ 0,00			2,00	$ 123.530.828,00		$ 0,00
16.1.9	Suministro e instalacion de Recuperadora de calor de 1273CFM y 0.4inWc de lujo cruzado con una eficiencia de 66.7%.	UND	1,00	$ 34.279.834,00	$ 34.279.834,00	1,00	34.279.834,00	1,00	34.279.834,00		$ 0,00			1,00	$ 34.279.834,00		$ 0,00
16,20	TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS							0,00	-		$ 0,00			0,00			$ 0,00
16,2,1	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 5/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	30,00	$ 101.077,00	$ 3.032.310,00	30,00	3.032.310,00	30,00	3.032.310,00		$ 0,00			30,00	$ 3.032.310,00		$ 0,00
16,2,2	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 3/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	10,00	$ 94.627,00	$ 946.270,00	10,00	946.270,00	10,00	946.270,00		$ 0,00			10,00	$ 946.270,00		$ 0,00
16,2,3	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 1/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	22,00	$ 85.387,00	$ 1.878.514,00	22,00	1.878.514,00	22,00	1.878.514,00		$ 0,00			22,00	$ 1.878.514,00		$ 0,00
16,2,4	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/4"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	30,00	$ 59.623,00	$ 1.788.690,00	30,00	1.788.690,00	30,00	1.788.690,00		$ 0,00			30,00	$ 1.788.690,00		$ 0,00
16,2,5	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 5/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	75,00	$ 48.350,00	$ 3.626.250,00	75,00	3.626.250,00	75,00	3.626.250,00		$ 0,00			75,00	$ 3.626.250,00		$ 0,00
16,2,6	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	12,00	$ 39.056,00	$ 468.672,00	12,00	468.672,00	12,00	468.672,00		$ 0,00			12,00	$ 468.672,00		$ 0,00
16,2,7	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	63,00	$ 27.413,00	$ 1.727.019,00	63,00	1.727.019,00	63,00	1.727.019,00		$ 0,00			63,00	$ 1.727.019,00		$ 0,00

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

Alcaldía Distrital de

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.230.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.524.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.848,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-8 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.325.369,80				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	

				CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
													MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO.	CANT	VALOR PARCIAL	
16,2,8	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4"Ø , incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	12,00	$ 19.972,00	$ 239.664,00	12,00	239.664,00	12,00	239.664,00		$ 0,00			12,00	$ 239.664,00		$ 0,00	
16,2,9	Suministro e instalación de Branche y accesorios de conexión	UN	4,00	$ 526.368,00	$ 2.105.472,00	4,00	2.105.472,00	4,00	2.105.472,00		$ 0,00			4,00	$ 2.105.472,00		$ 0,00	
16,30	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					0,00	-		-		$ 0,00			0,00			$ 0,00	
16,3,1	Suministro e instalación de tubería metálica EMT de 1/2"para canalizado de comunicación de control de los equipos	ML	25,00	$ 29.157,00	$ 728.925,00	25,00	728.925,00	25,00	728.925,00		$ 0,00			25,00	$ 728.925,00		$ 0,00	
16,3,2	Suministro e instalación de Cable 3x18 para señal comunicación de control entre los equipos y el controlador principal	ML	35,00	$ 12.653,00	$ 442.855,00	35,00	442.855,00	35,00	442.855,00		$ 0,00			35,00	$ 442.855,00		$ 0,00	
16,40	SISTEMA DE AA					0,00	-		-		$ 0,00			0,00			$ 0,00	
16,4,1	Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada	M2	1.812,29	$ 121.656,00	$ 220.475.952,24	1812,29	220.475.952,24	1812,29	220.475.952,24		$ 0,00		1.800,00	12,29	$ 1.495.152,24		$ 0,00	
16,4,2	Suministro e instalacion de Aislamiento Interno en Armalex de 1"	M2	1.736,78	$ 97.748,00	$ 169.766.771,44	1736,78	169.766.771,44	1736,78	169.766.771,44		$ 0,00		1.012,42	601,25	$ 58.771.090,43		$ 0,00	
16,4,3	Suministro e instalacion de Difusor circular de 14" Aleta Fija con Damper	UN	24,00	$ 411.698,00	$ 9.880.752,00	24,00	9.880.752,00	24,00	9.880.752,00		$ 0,00			24,00	$ 9.880.752,00		$ 0,00	
16,4,4	Suministro e instalacion de Rejilla de difusion de 24"X10" Aleta Fija con Damper	UN	4,00	$ 374.369,00	$ 1.497.476,00	4,00	1.497.476,00	4,00	1.497.476,00		$ 0,00			4,00	$ 1.497.476,00		$ 0,00	
16,4,5	Suministro e instalacion de Rejilla de Retorno 24x24 con damper	UN	12,00	$ 604.708,00	$ 7.256.496,00	12,00	7.256.496,00	12,00	7.256.496,00		$ 0,00			12,00	$ 7.256.496,00		$ 0,00	
16,4,6	Suministro e instalacion de Rejilla de Retorno 20x20 con damper	UN	6,00	$ 425.556,00	$ 2.553.336,00	6,00	2.553.336,00	6,00	2.553.336,00		$ 0,00			6,00	$ 2.553.336,00		$ 0,00	
16,4,7	Suministro e instalacion de Rejilla Tipo Louver de 24"X24" con malla atrapa insecto y polvo	UN	3,00	$ 865.973,00	$ 2.597.919,00	3,00	2.597.919,00	3,00	2.597.919,00		$ 0,00			3,00	$ 2.597.919,00		$ 0,00	
16,50	SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS					0,00	-	0,00	-		$ 0,00			0,00			$ 0,00	
16,5,1	Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada	M2	88,20	$ 121.662,00	$ 10.730.588,40	88,20	10.730.588,40	88,20	10.730.588,40		$ 0,00			88,20	$ 10.730.588,40		$ 0,00	
16,5,2	Suministro e instalacion Rejillas de extraccion 10X6 aleta fija	UND	28,00	$ 162.458,00	$ 4.548.824,00	28,00	4.548.824,00	28,00	4.548.824,00		$ 0,00			28,00	$ 4.548.824,00		$ 0,00	
16,5,3	Suministro e instalacion de extractor Centrifugo en linea de 660CFM	UND	2,00	$ 2.997.965,00	$ 5.995.930,00	2,00	5.995.930,00	2,00	5.995.930,00		$ 0,00			2,00	$ 5.995.930,00		$ 0,00	
16,5,4	Suministro e instalacion de extractor Centrifugo en linea de 600CFM	UND	2,00	$ 2.836.919,00	$ 5.673.838,00	2,00	5.673.838,00	2,00	5.673.838,00		$ 0,00			2,00	$ 5.673.838,00		$ 0,00	
16,5,5	Suministro e instalacion de extractor Centrifugo en linea de 300CFM	UND	2,00	$ 1.829.183,00	$ 3.658.366,00	2,00	3.658.366,00	2,00	3.658.366,00		$ 0,00			2,00	$ 3.658.366,00		$ 0,00	
16,60	SISTEMA DE EXTRACCION COCINAS					0,00	-		-		$ 0,00			0,00			$ 0,00	
16,6,1	Suministro e instalacion de Conducto en lamina Cold Roll, en calibre 16.	KG	4.207,20	$ 37.233,00	$ 156.646.677,60	4207,20	156.646.677,60	4207,20	156.646.677,60		$ 0,00			4207,20	$ 156.646.677,60		$ 0,00	
16,6,2	Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada	M2	425,88	$ 121.440,00	$ 51.718.867,20	425,88	51.718.867,20	425,88	51.718.867,20		$ 0,00			425,88	$ 51.718.867,20		$ 0,00	
16,6,3	Suministro e instalacion de Campana de solo extraccion en acero inoxidable 430, de 2Mt de largo por 0.6 Mt de ancho, con ventilacion frontal por medio de dos difusoras de 18x10, Tipo Pared, filtro en acero inoxidable tipo baja eficiencia. Incluye 5 bombillas de iluminacion serie L55 de ensamble para alta temperatura, limpiza termica y cubierta resistente a los golpes.	UND	30,00	$ 7.799.950,00	$ 233.998.500,00	30,00	233.998.500,00	30,00	233.998.500,00		$ 0,00			30,00	$ 233.998.500,00		$ 0,00	
16,6,4	Suministro e instalacion de Campana de solo extraccion en acero inoxidable 430, de 1.4Mt de largo por 0.6 Mt de ancho, con ventilacion frontal por medio de dos difusoras de 18x10, Tipo Pared, filtro en acero inoxidable tipo baja eficiencia. Incluye 5 bombillas de iluminacion serie L55 de ensamble para alta temperatura, limpiza termica y cubierta resistente a los golpes.	UND	12,00	$ 6.733.563,00	$ 80.802.756,00	12,00	80.802.756,00	12,00	80.802.756,00		$ 0,00			12,00	$ 80.802.756,00		$ 0,00	
16,6,5	Suministro e Instalacion de Ventilador tipo hongo descarga vertical hacia arriba, centrifugo de acople directo de alta velocidad con switch de desconexion, y 18" de diametro 3300CFM @ 2.5" wc, 1325RPM, motor de 2.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3).	UND	30,00	$ 5.549.201,00	$ 166.476.030,00	30,00	166.476.030,00	30,00	166.476.030,00		$ 0,00			30,00	$ 166.476.030,00		$ 0,00	
16,6,6	Suministro e Instalacion de Ventilador tipo hongo descarga vertical hacia arriba, centrifugo de acople directo de alta velocidad con switch de desconexion, y 16" de diametro.2700CFM @ 2.2" wc, 1400 RPM, motor de 1.5 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3).	UND	12,00	$ 4.613.148,00	$ 55.357.776,00	12,00	55.357.776,00	12,00	55.357.776,00		$ 0,00			12,00	$ 55.357.776,00		$ 0,00	
16,6,7	Suministro e Instalacion de Ventilador tipo Centrifugo descarga horizontal , centrifuga de acople mediante poleas de alta velocidad con switch de desconexion, y Tamaño 12"x12" 3200CFM @ 1.12" wc, 1050 RPM, motor de 2.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3).	UND	30,00	$ 5.323.080,00	$ 159.692.400,00	30,00	159.692.400,00	30,00	159.692.400,00		$ 0,00			30,00	$ 159.692.400,00		$ 0,00	
16,6,8	Suministro e Instalacion de Ventilador tipo Centrifugo descarga horizontal , centrifuga de acople mediante poleas de alta velocidad con switch de desconexion, y Tamaño 12"x12" 2600CFM @ 1.1" wc, 990 RPM, motor de 1.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3).	UND	12,00	$ 4.475.704,00	$ 53.708.448,00	12,00	53.708.448,00	12,00	53.708.448,00		$ 0,00			12,00	$ 53.708.448,00		$ 0,00	
16,70	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO					0,00	-		-		$ 0,00			0,00			$ 0,00	
16,7,1	Suministro e Instalacion Evaporador Bajo Perfil de 7000 Btu/h- 220V, 1PH, 60HZ, CF #1, #2 , #3	UND	3,00	$ 3.304.195,00	$ 9.912.585,00	3,00	9.912.585,00	3,00	9.912.585,00		$ 0,00			3,00	$ 9.912.585,00		$ 0,00	
16,7,2	Suministro e Instalacion Condensador Remoto de 7900 Btu/h con compresor Tipo Scroll 220/1Ph. CF #1, #2,#3	UND	3,00	$ 4.196.485,00	$ 12.589.455,00	3,00	12.589.455,00	3,00	12.589.455,00		$ 0,00			3,00	$ 12.589.455,00		$ 0,00	
16,7,3	Suministro e Instalacion de Panel 100 mm muros y techos, Acabado en Lamina Galvanizada, 035/035. Color Blanco 9002	M2	220,80	$ 185.708,00	$ 41.004.326,40	220,80	41.004.326,40	220,80	41.004.326,40		$ 0,00			220,80	$ 41.004.326,40		$ 0,00	
16,7,4	Suministro e Instalacion de Panel de piso en 80 mm	M2	10,80	$ 169.741,00	$ 1.833.202,80	10,80	1.833.202,80	10,80	1.833.202,80		$ 0,00			10,80	$ 1.833.202,80		$ 0,00	
16,7,5	Suministro e Instalacion de Puerta Batiente de 1 x 2 m, Inyectada en poliuretano de 80 mm de espesor - Acabado en lamina prepintada Cal. 26 - Marco PVC	UND	3,00	$ 3.407.573,00	$ 10.222.719,00	3,00	10.222.719,00	3,00	10.222.719,00		$ 0,00			3,00	$ 10.222.719,00		$ 0,00	
16,7,6	Suministro e instalacion de Tableros de Potencia y control Equipos, incluye gabinete metalico, controlador Carel, Breaker para Evap, contactor para resistencia, marquilla, selector de dos posiciones, cableado interno.	UND	3,00	$ 1.389.213,00	$ 4.167.639,00	3,00	4.167.639,00	3,00	4.167.639,00		$ 0,00			3,00	$ 4.167.639,00		$ 0,00	
	Total SISTEMA DE AA Y EXTRACCION				$ 2.032.766.491,08		$ 2.032.766.491,08		$ 2.032.766.491,08		$ 0,00			0,00	$ 1.702.790.010,07		$ 0,00	
17	INSTALACIONES DE GAS																	
17,1	OBRAS PRELIMINARES																	
17.1.1	Señalización y seguridad de la obra																	
17.1.1.1	Soporte para Cinta demarcadora	un	30,00	$ 20.699,00	$ 620.970,00	30,00	620.970,00	30,00	620.970,00		$ 0,00			30,00	$ 620.970,00		$ 0,00	
17.1.1.2	Cinta demarcadora, sin soporte	m	150,00	$ 2.024,00	$ 303.600,00	150,00	303.600,00	150,00	303.600,00		$ 0,00			150,00	$ 303.600,00		$ 0,00	
17.1.1.3	Valla Móvil Tipo 2. Barrera Tubular	un	2,00	$ 300.621,00	$ 601.242,00	2,00	601.242,00	2,00	601.242,00		$ 0,00			2,00	$ 601.242,00		$ 0,00	
17,20	RED DE GAS					0,00	-		-		$ 0,00			0,00	$ 0,00		$ 0,00	
17.2.1	Centro de Regulación					0,00	-		-		$ 0,00			0,00			$ 0,00	
17.2.1.1	Regulador de Primera Etapa para 80 m3/h (23 mbar)	un	3	$ 759.855,00	$ 2.279.565,00	3,00	2.279.565,00	3,00	2.279.565,00		$ 0,00		3,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	
17.2.1.2	Regulador de Segunda Etapa para 30 m3/h (23 mbar)	un	8	$ 301.520,00	$ 2.412.160,00	8,00	2.412.160,00	8,00	2.412.160,00		$ 0,00		8,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	
17.2.1.3	Válvula de corte ø1"	un	8	$ 75.549,00	$ 604.392,00	8,00	604.392,00	8,00	604.392,00		$ 0,00		8,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	
17.2.1.4	Válvula Bola M26	un	8	$ 25.287,00	$ 202.296,00	8,00	202.296,00	8,00	202.296,00		$ 0,00		8,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	
17.2.1.5	Elevador 3/4"	un	8	$ 42.626,00	$ 341.008,00	8,00	341.008,00	8,00	341.008,00		$ 0,00		8,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

Alcaldía Distrital de

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.238.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.524.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.648,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.900-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.325.369,80				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025							

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
17.2.1.6	Universal galvanizada ø1"	un	9	$ 7.632,00	$ 61.056,00	8,00	61.056,00	8,00	61.056,00		$ 0,00		8,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.1.7	Codo acero galvanizado ø1"	un	27	$ 3.680,00	$ 99.360,00	27,00	99.360,00	27,00	99.360,00		$ 0,00		27,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.1.8	Manómetro de 0 a 600 mbar con válvula de guarda	un	3	$ 274.585,00	$ 823.755,00	3,00	823.755,00	3,00	823.755,00		$ 0,00		3,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.1.9	Tubería acero galvanizado ø1"	m	4	$ 28.803,00	$ 115.212,00	4,00	115.212,00	4,00	115.212,00		$ 0,00		4,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.1.10	Tubería acero galvanizado ø1/2"	m	16	$ 28.485,00	$ 455.760,00	16,00	455.760,00	16,00	455.760,00		$ 0,00		16,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.1.11	Codo acero galvanizado ø1"	un	18	$ 9.795,00	$ 176.310,00	18,00	176.310,00	18,00	176.310,00		$ 0,00	654,00		672,00	$ 6.582.240,00		$ 0,00
17.2.1.12	Codo acero galvanizado ø1/2"	un	63	$ 8.273,00	$ 521.199,00	63,00	521.199,00	63,00	521.199,00		$ 0,00		63,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.1.13	Tee acero galvanizado ø1"	un	10	$ 12.346,00	$ 123.460,00	10,00	123.460,00	10,00	123.460,00		$ 0,00		10,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.1.14	Tee acero galvanizado ø1/2"	un	40	$ 10.890,00	$ 435.600,00	40,00	435.600,00	40,00	435.600,00		$ 0,00		40,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.1.15	Medidor G 4,0 Q= 6 m3/h	un	30	$ 311.288,00	$ 9.338.940,00	30,00	9.338.940,00	30,00	9.338.940,00		$ 0,00		30,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.1.16	Medidor G 2,5 Q= 4 m3/h	un	12	$ 216.173,00	$ 2.594.076,00	12,00	2.594.076,00	12,00	2.594.076,00		$ 0,00		12,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.1.17	Armario de lámina galvanizada - Para 16 Medidores	un	2	$ 1.627.533,00	$ 3.255.066,00	2,00	3.255.066,00	2,00	3.255.066,00		$ 0,00		2,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.1.18	Armario de lámina galvanizada - Para 12 Medidores	un	1	$ 1.341.201,00	$ 1.341.201,00	1,00	1.341.201,00	1,00	1.341.201,00		$ 0,00		1,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.2	**Red Interna (Baja Presión)**					0,00	-		-		$ 0,00						$ 0,00
17.2.2.1	**Codo Pesipe ø1"**	un	776,00	$ 2.524,00	$ 1.943.480,00	770,00	1.943.480,00	770,00	1.943.480,00		$ 0,00		770,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.2.2	**Codo Polietileno ø1"**	un	6,00	$ 3.582,00	$ 21.492,00	6,00	21.492,00	6,00	21.492,00		$ 0,00		6,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.2.3	**Tapón Galvanizado ø1"**	un	126,00	$ 2.191,00	$ 276.066,00	126,00	276.066,00	126,00	276.066,00		$ 0,00		126,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.2.4	Tubería polietileno 1"	m	78,00	$ 16.544,00	$ 1.290.432,00	78,00	1.290.432,00	78,00	1.290.432,00		$ 0,00		78,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.2.5	Tubería Pesipe 1/2"	m	1.905,00	$ 14.579,00	$ 27.772.995,00	1905,00	27.772.995,00	1905,00	27.772.995,00		$ 0,00		1905,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.2.6	Válvula de corte 1"	un	126,00	$ 33.765,00	$ 4.246.830,00	126,00	4.246.830,00	126,00	4.246.830,00		$ 0,00		126,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.2.7	Buje Fusión (1"x1/2")	un	10,00	$ 6.832,00	$ 68.320,00	10,00	68.320,00	10,00	68.320,00		$ 0,00		10,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.2.8	Unión Pesipe 1"	un	24,00	$ 1.258,00	$ 30.192,00	24,00	30.192,00	24,00	30.192,00		$ 0,00		24,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
17.2.2.9 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA SCH 40 DE 1" PARA GAS INCLUYE, SELLANTE, ROSCAS), INCLUYE PINTURA AMARILLA POR NORMA	ML		$ 212.296,23								1687,76		1687,76	$ 358.305.091,88		
17.2.2.10 NP	SUMINISTRO E INTALACION DE ANCLAJE METALICO PARA TUBERIA DESCOLGADA	UND		$ 44.159,76								96,00		96,00	$ 4.239.336,59		
17.2.2.11 NP	SUMININSTRO E INSTALACION PANEL CONTROL VALVULA GALV 3/4" INCLUYE UNIVERASL NIPLES 3/4" Y TEE GALV 3/4"	UND		$ 565.305,74								42,00		42,00	$ 23.746.621,08		
17.2.2.12 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA SCH 40 DE 3/4" PARA GAS INCLUYE, SELLANTE, ROSCAS), INCLUYE PINTURA AMARILLA POR NORMA	ML		174.907,03								630,00		630,00	$ 110.191.429,62		
17.2.2.13 NP	CODO GALVANIZADO DE 3/4"	UND		9.159,15								882,00		882,00	$ 8.078.373,96		
17.2.2.14 NP	INSTALACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN A EQUIPOS, INCLUYE TAPONES	UND		77.454,79								126,00		126,00	$ 9.759.302,91		
17.2.2.15 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 1,50M INCLUYE REDUCION 3/4" A 1/2"	UND		129.667,87								126,00		126,00	$ 16.338.151,62		
17.2.2.16 NP	SUMINISISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE CENTO DE MEDICION C/U 21 MEDIDORES	UND		5.729.057,42								2,00		2,00	$ 11.458.114,84		
17.2.2.17 NP	PRUEBA HERMETICA INICIAL ANTES DE PROCESO DE FUNDIDA DE PLACA PISO 1	UND		116.144,16								42,00		42,00	$ 4.962.054,78		
17.2.2.18 NP	PRUEBA HERMETICA FINAL INSTALACION INTERNA TERMINADA.	UND		201.512,26								42,00		42,00	$ 8.463.514,91		
17.2.2.19 NP	SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR ASOCIADO SEGUNDA ETAPA SIN VENTEO INCLUYE UNIVERSALES DE 3/4", VALVULA DE CONTROL 3/4" Y NIPLES DE 3/4", INCLUYE REJILLA DE PROTECCION METALICA	UND		1.032.882,18								42,00		42,00	$ 43.381.051,46		
17.2.2.20 NP	MEDIDOR DE GAS REFERENCIA G-10 INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y MATRICULA, CERTIFICACION PLANO ISOMETRICO Y SOPORTES CERTIFICACION DE COMPETENCIA	UND		3.957.000,00								42,00		42,00	$ 166.194.000,00		
17.3	**Obras civiles e Instalación**						-		-								
17.3.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	M3	150	$ 48.926,00	$ 7.338.900,00	150,00	7.338.900,00	150,00	7.338.900,00		$ 0,00			150,00	$ 7.338.900,00		$ 0,00
17.3.2	Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima	M3	45	$ 103.673,00	$ 4.665.285,00	45,00	4.665.285,00	45,00	4.665.285,00		$ 0,00			45,00	$ 4.665.285,00		$ 0,00
17.3.3	Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Procter Modificado	M3	105	$ 25.827,00	$ 2.711.835,00	105,00	2.711.835,00	105,00	2.711.835,00		$ 0,00			105,00	$ 2.711.835,00		$ 0,00
17.40	**Obras complementarias**					0,00					$ 0,00						$ 0,00
17.4.1	Prueba del sistema Media y baja Presión	Un	3	$ 463.086,00	$ 1.389.258,00	3,00	1.389.258,00	3,00	1.389.258,00		$ 0,00			3,00	$ 1.389.258,00		$ 0,00
	Total INSTALACIONES DE GAS				$ 78.461.313,00		$ 78.461.313,00		$ 78.461.313,00						$ 765.330.373,55		
18	**EQUIPAMIENTO Y DECORACION**																
18,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE MESON DE COCINAS EN ACERO INOXIDABLE	M2	164,54	$ 329.514,00	$ 54.218.233,56	164,54	54.218.233,56	164,54	54.218.233,56		$ 0,00			164,54	$ 54.218.233,56		$ 0,00
18,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE BARRA DE COCINAS EN GRANITO NATURAL, INCLUYE ZOCALO DE 10 CM Y BISELES	M2	101,08	$ 453.214,00	$ 45.810.871,12	101,08	45.810.871,12	101,08	45.810.871,12		$ 0,00			101,08	$ 45.810.871,12		$ 0,00
18,03	NUBES ACÚSTICAS DIÁMETRO 1.20M ESPESOR 4CM. MEMBRANA ACÚSTICA TENSADA. COLORES SEGÚN NIVEL. (INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE Y MONTAJE)	UND	30	$ 284.906,00	$ 8.547.180,00	30,00	8.547.180,00	30,00	8.547.180,00		$ 0,00			30,00	$ 8.547.180,00		$ 0,00
18,04	TELAS DECORATIVAS COLGANTES. COLORES SEGÚN DISEÑO.	M2	1066	$ 26.704,00	$ 28.466.464,00	1066,00	28.466.464,00	1066,00	28.466.464,00		$ 0,00			1066,00	$ 28.466.464,00		$ 0,00
18,05	ESCULTURA CENTRAL DE 15.50M DE ALTURA X 3.52M APROXIMADAMENTE. CON ELEMENTOS ARTESANALES: AVES, PECES Y TORTUGAS ESCULPIDAS ARTESANALMENTE, ACOMPAÑADAS DE UNA RED DE PESCA Y ELEMENTOS DECORATIVOS.	UND	1	$ 51.267.639,00	$ 51.267.639,00	1,00	51.267.639,00	1,00	51.267.639,00		$ 0,00			1,00	$ 51.267.639,00		$ 0,00
18,06	RELIGAS METÁLICAS ACABADO NEGRO. ANCLADAS A LOSA SEGÚN PISO. 1.20M X 1.80M	UND	21	$ 300.539,00	$ 6.311.319,00	21,00	6.311.319,00	21,00	6.311.319,00		$ 0,00			21,00	$ 6.311.319,00		$ 0,00
18,07	BARRA EN MICROCEMENTO ACABADO BRILLANTE, TINTURADO SEGÚN COLORES	M2	6,3	$ 600.874,00	$ 3.785.506,20	6,30	3.785.506,20	6,30	3.785.506,20		$ 0,00			6,30	$ 3.785.506,20		$ 0,00
	Total EQUIPAMIENTO Y DECORACION				$ 198.407.212,88		$ 198.407.212,88		$ 198.407.212,88		$ 0,00				$ 198.407.212,88		$ 0,00
19	**ITEMS NO PREVISTOS**																

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0401-23
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

Alcaldía Distrital de

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N°1	5 DE AGOSTO 2023	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1:	$ 5.238.494.256,52		VALOR DEL PRESENTE ACTA:	$ 3.930.624.464,74
	VALOR ADICIONAL N°1:								
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.466.325.369,80	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	12 DE AGOSTO DE 2024	VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 0,00		VALOR DEL ACTA DE COBRO ANTERIOR:	$ 5.238.494.256,52
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 20.227.831.113,28		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 16.297.306.648,54
CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE / NIT.901.668.549-7 REP LEGAL FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON	PLAZO ADICIONAL N°1:	13 MESES	ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	2 DE OCTUBRE DE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	20,57%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN OBRA EN EL PERIODO:	15,43%
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERMIRADOR / NIT. 890.201.560-6 REP LEGALDAVID ANDRES RAMIREZ VALDES	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	26 MESES	VALOR DEL ACTA	$ 25.466.326.369,80				PORCENTAJE ACUMULADO EN OBRA	36,00%
SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA : ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA.	FECHA DE INICIO:	MARZO 14 DE 2023							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 OCTUBRE DE 2025	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ -	PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	14 DE MARZO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DEL PRESENTA ACTA:	

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
												MAYOR CANT	MENOR CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL			CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
19,1	Cerramiento en lamina de zinc de dimensiones 3m * 0,8 m reforzada con madera rolliza de 2"X2" empotrada 50cm en concreto de 14 Mpa y triple refuerzo transversal con listones de 2x2", incluye dos puertas para entrada de camiones en lamina y bordillo perimetral	ML		$ 32.700,00		211,78	44.123.304,10		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
19,2	Instalación eléctrica provisional (incluye un TABLERO PROVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN, COMPRENDE PROTECCIÓN GENERAL, 8 SALIDAS 110V, 4 SALIDAS 220V BIFÁSICAS Y 2 SALIDAS A 220V TRIFÁSICAS.)	UND		Vr.Parcial		1,00	30.723.358,00		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
19,3	Demolicion de estructuras de cimientos existente	M3		$ 1.046.945,93		807,97	155.634.460,76		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
19,4	EXCAVACIÓN MECANIZADA PARA PILOTES DE 10 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 0,80 y 0,60 mts (Pilotes entre 60 y 80 cms)	ML		$ 28.158,00		1008,18	1.166.115.429,72		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
19,5	Acarreo y retiro de todos producto de perforación de pilotes (material saturado contaminado)	M3		Vr.Parcial		1738,48	264.026.434,56		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
19,6	Descabezado de pilotes	UND		$ 5.057,00		84,00	23.288.412,00		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
19,7	Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2000 o similar	M2		$ 5.355,00		541,40	8.695.425,40		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
19,8	Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2500 o similar	M2		Vr.Parcial		1995,00	30.078.565,00		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
19,9	Muro de contencion temporal, mediante tablaestacado en modulos metalicos H:6.0 Mts, incluye tuberia 4" Tipo Pesado con punta de lapiz	M2		$ 0,00		341,76	291.476.851,20		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
19,10	Bombeo y manejo de aguas	DIA		Vr.Parcial		160,00	63.334.200,00		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
19,11	PROJUNTA DE EXPANSIÓN CON CINTA PVC O-32, INCLUYE SELLADOR	ML		Vr.Parcial		71,96	5.593.450,80		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
19,12	Impermeabilizacion externa del tanque de agua subterraneo, sistema de Geo-compuesto	M2		Vr.Parcial		175,94	51.179.683,91		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
19,13	Tuberia de acero para camisas no recuperables con profundidad de 10.0 mts, diametro entre 60 y 80 cm y espesor 3/8"	ML		$ 0,00		120,00	281.538.840,00		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
TOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS							$ 2.423.808.405,44		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
COSTO DIRECTO DE LA OBRA					$ 18.450.337.238,39		$ 18.404.324.893,82		$ 18.450.337.238,39		$ 3.861.460.524,65				$ 18.450.337.238,39		$ 2.920.566.689,93
ADMINISTRACIÓN	28,58%				$ 5.273.269.456,11		$ 5.260.118.721,35		$ 5.273.269.456,11		$ 1.103.636.689,39				$ 5.273.269.456,11		$ 834.723.773,42
IMPREVISTOS	1,00%				$ 184.503.372,38		$ 184.043.248,94		$ 184.503.372,38		$ 38.614.606,25				$ 184.503.372,38		$ 29.205.666,90
UTILIDAD	5,00%				$ 922.516.861,92		$ 920.216.244,69		$ 922.516.861,92		$ 193.072.626,23				$ 922.516.861,92		$ 146.028.334,50
VALOR DE LA OBRA (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)					$ 24.830.626.928,80		$ 24.768.703.108,80		$ 24.830.626.928,80		$ 5.196.774.245,52				$ 24.830.626.928,80		$ 3.930.524.464,74
TRAMITE DE RED Y CERTIFICACIONES RETIE					$ 23.276.400,00		$ 23.276.400,00		$ 23.276.400,00		$ 0,00				$ 23.276.400,00		
PMA					$ 61.923.820,00		$ 94.349.017,00		$ 32.425.197,00		$ 32.424.960,00				$ 32.425.197,00		
PMT					$ 9.302.225,00		$ 9.302.225,00		$ 9.302.225,00		$ 9.295.051,00				$ 9.302.225,00		
PROTOCOLO COVID					$ 32.425.197,00		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00		
MOBILIARIO					$ 570.694.619,00		$ 570.694.619,00		$ 570.694.619,00						$ 570.694.619,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 25.466.325.369,80		$ 25.466.325.369,80		$ 25.466.326.369,80		$ 5.238.494.256,52				$ 25.466.325.369,80		$ 3.930.524.464,74

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

ING. LUIS FERNANDO FONSECA VALENCIA
SUPERVISOR ALCALDIA DISTRITAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO I
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPÍTULO	01	ITEM	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)			UNIDAD: MES
SUB-CAPITULO	01					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO


LOCALIZACION:





LOCALIZACIÓN	TIEMPO						CANTIDAD MESES
	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	
CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROV							0,00
	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	
							0,00
	MES 13	MES ADI 14	MES ADI 15	MES ADI 16	MES ADI 17	MES ADI 18	
	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,00
	MES ADI 19	MES ADI 20	MES ADI 21	MES ADI 22	MES ADI 23	MES ADI 24	
	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,00
	MES ADI 25	MES ADI 26					
	1,0	1,0					2,00

LOCALIZACION:

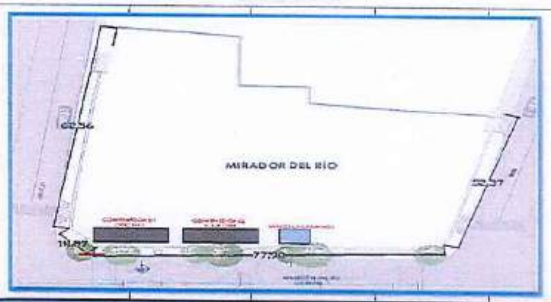

TOTAL ACTIVIDAD	14,00
ACUMULADO	14,00

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande


MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.689.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	

CAPÍTULO	1,00	ITEM	Cerramiento en lamina de zinc de dimensiones 3m * 0,8 m reforzada con madera rolliza de 2"x2" empotrada 50cm en concreto de 14 Mpa y triple refuerzo transversal con lisiones de 2x2", incluye dos puertas para entrada de camiones en lamina y bordillo perimetral	UNIDAD	ML
SUB-CAPITULO	1.07 NP				

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO


LOCALIZACION:

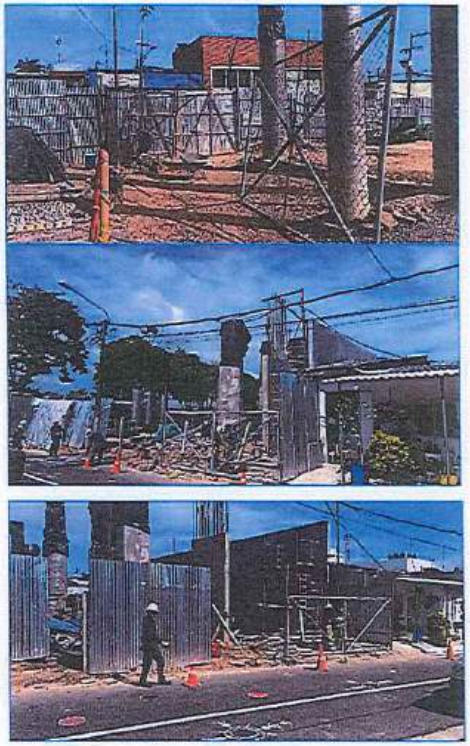

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
MURO PERIMETRAL VECINO			13,00			1	13,00
MURO PERIMETRAL CERRAMIENTO			1,78			1	1,78
REPOSICION DE MURO POR DETERIORO, INCLUYE PORTONES			157,00			1	157,00

LOCALIZACION:



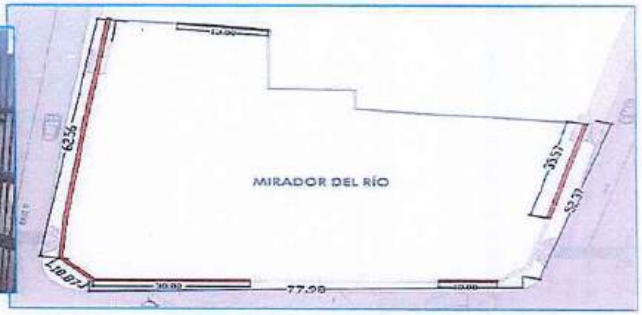

TOTAL ACTIVIDAD 171,78

ACUMULADO 171,78

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R/L. FARLEIDYS YAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R/L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	

CAPITULO	02	ITEM	2,02	RELLENO EN MATERIAL DE SELECCIONADO COMPACTADO	UNIDAD	M3
SUB-CAPITULO	2,02					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO


LOCALIZACION/EVIDENCIA:









LOCALIZACIÓN	TABLA TOTAL DE VOLUMEN MOVIMIENTO DE TIERRA				OBSERVACIONES
	ESPESOR	AREA	No. DE ELEMENTOS	VOLUMEN TOTAL (M3)	
MEJORAMIENTO AREA MODULO 1	1,2	10,5	1,00	12,57	
REPOSICION Nº 1 DE MATERIAL MEJORAMIENTO AREA MODULO 1	1,2	1256,0	1,00	1507,20	
REPOSICION Nº 2 DE MATERIAL MEJORAMIENTO AREA MODULO 1	1,5	1256,0	1,00	1884,00	
RELLENO AREA SOTANO Y TANQUE	4,1	147,00	1,00	602,70	

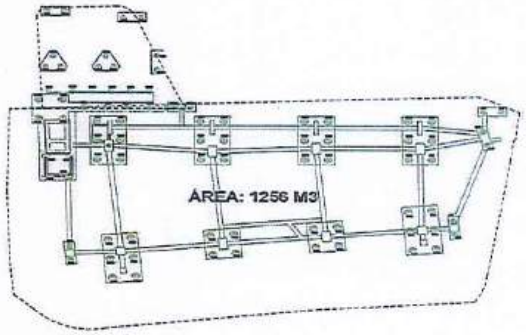

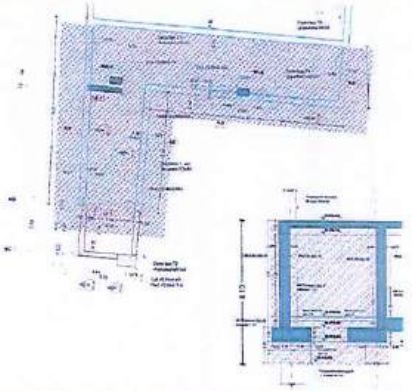

OBSERVACION: Ver Anexo 01. Carteras topograficas

TOTAL ACTIVIDAD	4006,47
ACUMULADO	4006,47

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR		NIT	901.669.152-1	N° CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE		NIT	901.668.549-7	N° CONTRATO	0401-23	
CAPÍTULO	02	ITEM	2,03	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO		UNIDAD	M3
SUB-CAPITULO	02						

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO








LOCALIZACIÓN	TABLA TOTAL DE VOLUMEN MOVIMIENTO DE TIERRA				OBSERVACIONES
	ESPESOR	AREA	No. DE ELEMENTOS	VOLUMEN TOTAL (M3)	
TERRENO DE VIA					
MEJORAMIENTO PARA FUNDIDA DE PLACA 1- AREA EXTERNA	0,30	459,2	1,00	137,75	
MEJORAMIENTO PARA FUNDIDA DE PLACA 1 AREA INTERNA	0,30	250,2	1,00	75,06	
PARQUEADERO	1	109,0	1,00	108,99	
AREA DE BASURA	1	91,3	1,00	91,27	



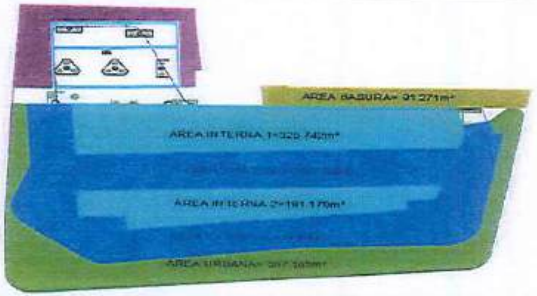

TOTAL ACTIVIDAD	413,07
ACUMULADO	413,07

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.659.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	

CAPÍTULO	02	ITEM	2,04	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTACTO	UNIDAD	M3
SUB-CAPITULO	2,04					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO








LOCALIZACIÓN	TABLA TOTAL DE VOLUMEN MOVIMIENTO DE TIERRA				OBSERVACIONES
	ESPESOR	AREA	No. DE ELEMENTOS	VOLUMEN TOTAL (M3)	
TERRAZA EXTERIOR					
ANDÉN					
MEJORAMIENTO PARA FUNDIDA DE PLACA 1- AREA EXTERNA	0,20	459,2	1,00	91,84	
MEJORAMIENTO PARA FUNDIDA DE PLACA 1 AREA INTERNA	0,20	250,2	1,00	50,04	
PARQUEADERO	0,20	109,0	1,00	21,80	
AREA DE BASURA	0,20	91,3	1,00	18,25	



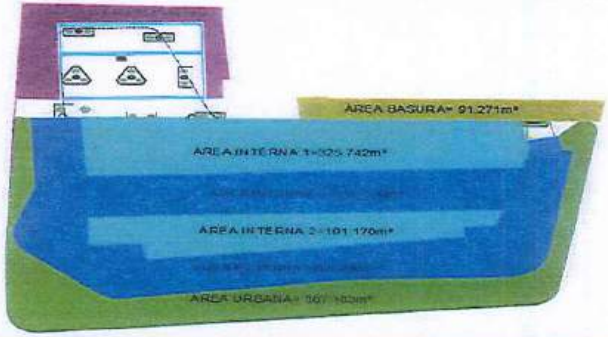

TOTAL ACTIVIDAD	181,93
ACUMULADO	181,93

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS VAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.668.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	


CAPÍTULO	02	ITEM	2,06	EXCAVACIÓN Y CONCRETO PARA PILOTES F'C= 28 MPA	UNIDAD	M3
SUB-CAPITULO	02					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO












LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
LONG PILOTES DE 80 CM	80 CM	11,000		0,503	5,53	10	55,29
DESPERDICIO (30%)					1,66	10	16,59
DESPERDICIO (30%)					0,55	50	27,65
LONG PILOTES DE 60 CM	60 CM	11,000		0,283	3,11	14	43,54
DESPERDICIO (25%)					0,99	14	13,86
DESPERDICIO (25%)					0,45	10	4,51

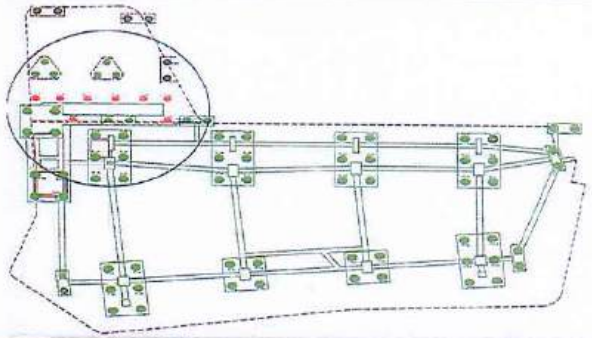

TOTAL ACTIVIDAD	161,44
ACUMULADO	161,44

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2


INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPÍTULO	02	ITEM	2,07	EXCAVACIÓN PARA TANQUE, SEMISÓTANO, DADOS, ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	UNIDAD	M3
SUB-CAPITULO	02					


DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
AREA SOTANO Y TANQUE		4,50		280,00	1260,00	1	1260,00
VIGAS DE AMARRE	0,55	0,70	205,50		79,12	1	79,12
DADOS TIPO 4		1,00		3,19	3,19	3	9,57
DADOS TIPO 3		1,000		5,420	5,42	2	10,84
ZARPA CORRIDA	1,10	1,00	12,50		13,75	1	13,75
MEJORAMIENTO PARA FUNDIDA DE PLACA 1- AREA EXTERNA	1,00			459,183	459,18	1,00	459,18
MEJORAMIENTO PARA FUNDIDA DE PLACA 1 AREA INTERNA	1,00			250,198	250,20	1,00	250,20
PARQUEADERO	1,00			108,986	108,99	1,00	108,99
AREA DE BASURA	1,00			91,271	91,27	1,00	91,27



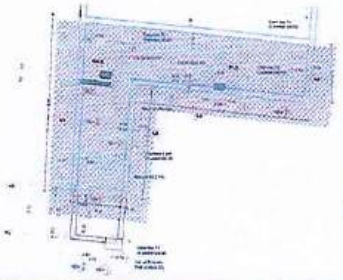



TOTAL ACTIVIDAD	2282,92
ACUMULADO	2282,92

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ


CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPÍTULO	02	ITEM	CONCRETO PARA SOLADO F'C= 14 MPA (E=0.05M)			UNIDAD M2
SUB-CAPITULO	2,08					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

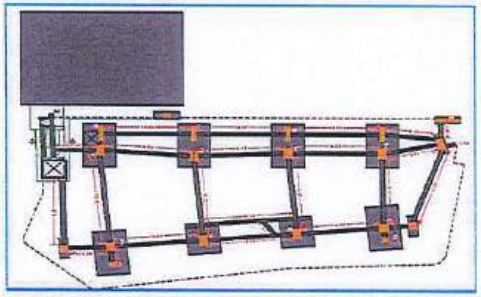









LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ANCHO	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
DADO TIPO 5		1,30	3,70	4,81			0,00
DADO TIPO 1		3,70	6,10	22,57			0,00
DADO TIPO 2		3,70	3,70	13,69		1	13,69
DADO TIPO 4		1,10	2,90	3,19		4	12,76
DADO TIPO 3				5,42		2	10,84
DADO M-2		1,85	3,70	6,85		1	6,85
DADO A9-2		1,85	3,70	6,85		1	6,85
VIGA P2- P3		0,70	10,10	7,07		1	7,07
VIGA P2- P1		0,70	10,00	7,00		1	7,00
VIGA D-4A A E-4A		0,70	9,70	6,79		1	6,79
VIGA D-4A A C-4A		0,70	9,70	6,79		1	6,79
VIGA B-4 A C-4A		0,70	9,75	6,83		1	6,83
VIGA E-5' A F-5'		0,70	2,30	1,61			0,00
VIGA E-4A A E-5'		0,70	9,00	6,30		1	6,30
VIGA D-4A A D-5'		0,70	9,79	6,85		1	6,85
VIGA C-4A A C-5'		0,70	10,30	7,21		1	7,21
VIGA B-4 A B-5'		0,70	12,13	8,49		1	8,49
VIGA B-7 A B-5'		0,70	1,60	1,12		1	1,12
VIGA A-5 a A1-4C		0,70	8,87	6,21		1	6,21
VIGA M-1 A M-2		0,70	5,30	3,71		2	7,42
VIGA ARRANQUE ESCALERA CENTRAL		0,70	12,05	8,44		1	8,44
FONDO DEL TANQUE		15,64	13,02	203,65		1	101,82

TOTAL ACTIVIDAD 239,32

ACUMULADO 239,32

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2


INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	


CAPÍTULO	02	ITEM	2,09	RELLENO EN PEDRAPLEN PARA MEJORAMIENTO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS	UNIDAD	M3
SUB-CAPITULO	02					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



LOCALIZACIÓN	TABLA TOTAL DE VOLUMEN MOVIMIENTO DE TIERRA				OBSERVACIONES
	ESPESOR	AREA	No. DE ELEMENTOS	VOLUMEN TOTAL (M3)	
SECTOR TANQUE Y SOTANO	3,50	280,0	1,00	980,00	
MEJORAMIENTO PARA FUNDIDA DE PLACA 1- AREA EXTERNA	1,20	459,18	1,00	551,02	
MEJORAMIENTO PARA FUNDIDA DE PLACA 1 AREA INTERNA	1,20	250,20	1,00	300,24	
PARQUEADERO	1,50	108,99	1,00	163,48	
AREA DE BASURA	1,50	91,27	1,00	136,91	

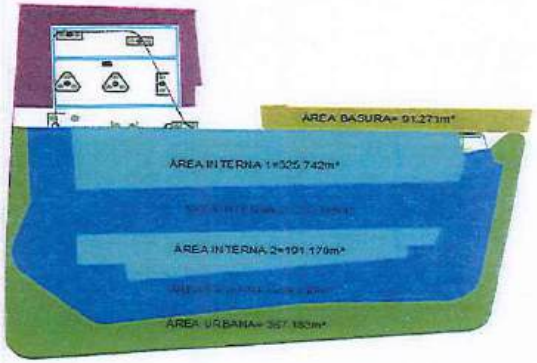

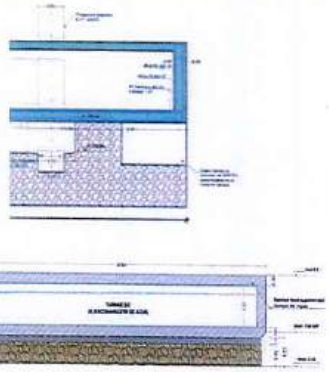

OBSERVACION:

TOTAL ACTIVIDAD	2131,65
ACUMULADO	2131,65

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande


MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR		NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE		NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPÍTULO	02	ITEM	2,10	CONCRETO PARA DADOS DE CIMENTACIÓN F'C= 35 MPA		UNIDAD	M3
SUB-CAPITULO	2,10						

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
DADO REFUERZO BASE DE TANQUE	1,00	1,50	11,29		16,94	1	16,94
DADO TIPO 3	1,00		5,42		5,42	2	10,84
DADO TIPO 2	1,00	3,70	3,70		13,69	2	27,38
DADO TIPO 4	1,00	1,10	2,90		3,20	4	12,78

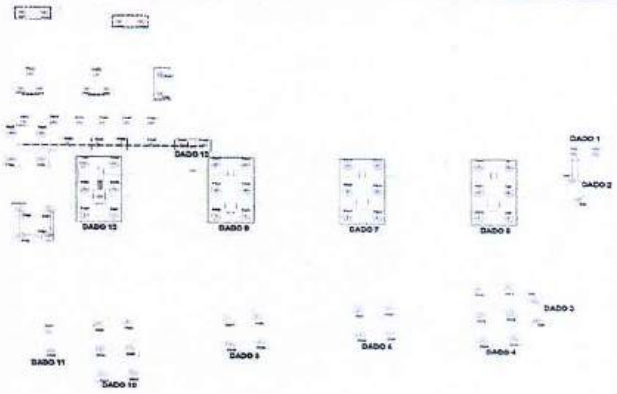

TOTAL ACTIVIDAD	67,94
ACUMULADO	67,94

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2


INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23		
CAPÍTULO	02	ITEM	2,11	CONCRETO PARA LOSA DE FONDO DEL TANQUE F'C= 28 MPA (E=0.3M)		UNIDAD	M3
SUB-CAPITULO	02						

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					VOLUMEN
	ESPESOR	ANCHO	LONGITUD	ÁREA	Nº DE ELEMENTO	
LOSA DE FONDO DEL TANQUE	0,30	11,01	15,57		1,00	51,43

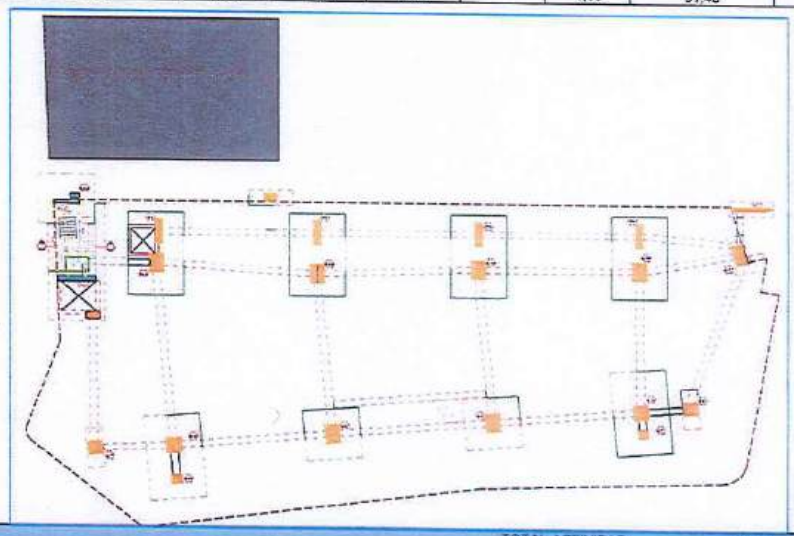

TOTAL ACTIVIDAD	51,43
ACUMULADO	51,43

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2


INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPÍTULO	02	ITEM	2,12	CONCRETO PARA PEDESTAL F'C= 28 MPA	UNIDAD	M2
SUB-CAPITULO	02					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
COLUMNA A1-4C	0,55	2,40	0,90		1,19	1	1,19
COLUMNA M1	0,40	2,40	2,85		2,74	1	2,74
COLUMNA M2	0,30	2,40	1,70		1,22	1	1,22
COLUMNA A0-2	0,35	2,40	0,60		0,50	1	0,50
COLUMNA B'-2	0,35	2,40	0,60		0,50	1	0,50
MUROS MONTACARGA 2	0,25	2,80	6,44		4,51	1	4,51
MUROS MONTACARGA 1	0,20	1,90	5,88		2,23		0,00
FONDO FOSA MONTACARGA	2,01	0,30	2,26		1,36		0,00
FONDO FOSA MONTACARGA 2	2,44	0,30	2,21		1,62	1	1,62

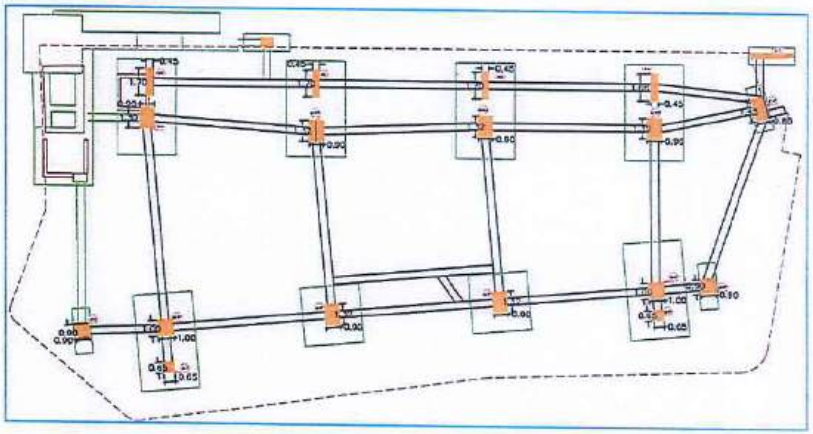

TOTAL ACTIVIDAD	12,28
ACUMULADO	12,28

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR		NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE		NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPÍTULO	02	ITEM	2,13	CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE F'C= 28 MPA		UNIDAD	M3
SUB-CAPITULO	02						

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO










LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
VIGA C-4A A C-5'	0,50	0,70	1,90		0,67	1	0,67
VIGA B-4 A B-5'	0,50	0,70	12,13		4,25	1	4,25
VIGA B-7 A B-5'	0,50	0,70	1,66		0,58	1	0,58
VIGA A-5 a A1-4C	0,50	0,70	8,91		3,12	1	3,12
VIGA M-1 A M-2	0,50	0,70	5,32		1,86	1	1,86
VIGA B-4 A VIGA ESCALERA	0,50	0,70	4,50		1,58	1	1,58
VIGA ARRANQUE ESCALERA CENTRAL	0,45	0,55	12,06		2,98	1	2,98
COLUMNA A1-4C	0,55	0,70	0,90		0,35	1	0,35
COLUMNA M1	0,40	0,70	2,85		0,80	1	0,80
COLUMNA M2	0,30	0,70	1,70		0,36	1	0,36

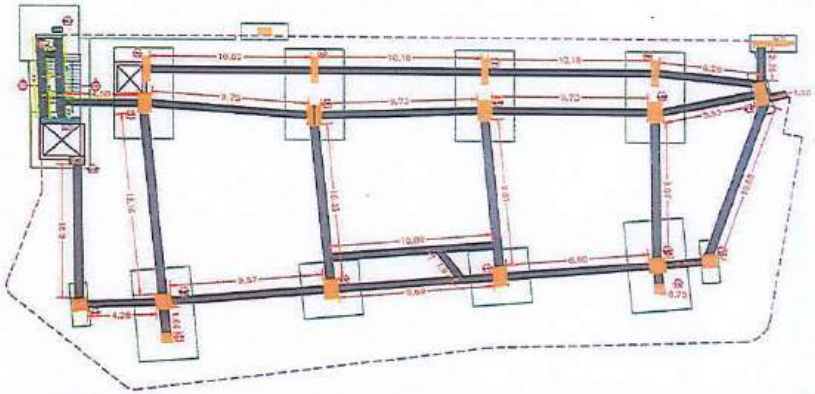

TOTAL ACTIVIDAD	16,53
ACUMULADO	16,53

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPITULO	02	ITEM	Descabezado de pilotes			UNIDAD: UND
SUB-CAPITULO	2.15 NP					


DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO








LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
PILOTES DE DIAMETRO EXCAVACION 0.8 MTS						10	10,00
PILOTES DE DIAMETRO EXCAVACION 0.6 MTS						14	14,00
							0,00
SUBTOTAL							24,00
TOTAL							24,00

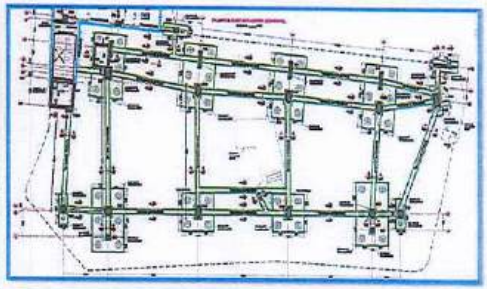





TOTAL ACTIVIDAD 24,00

ACUMULADO 24,00

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE BOLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2


INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPÍTULO	02	ITEM	Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2000 o similar			UNIDAD: M2
SUB-CAPITULO	2.16 NP					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	PERIMETRO	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
SECTOR TANQUE	17,57		15,41	270,70		2	541,40



TOTAL ACTIVIDAD 541,40

ACUMULADO 541,40

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAIAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE MODIFICACIÓN Nº 01


INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPÍTULO	02	ITEM	Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2500 o similar			UNIDAD M2
SUB-CAPITULO	2.17 NP					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO






LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
CAPA 1				997,50		1	997,50
CAPA 2				997,50		1	997,50
SUBTOTAL							1995,00
TOTAL							1995,00

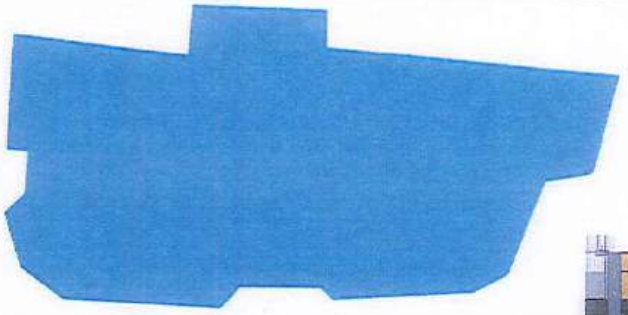

ÁREA: 997.5 M²



TOTAL ACTIVIDAD 1995,00

ACUMULADO 1.995,00

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEY S YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPÍTULO	02	ITEM	Muro de contencion temporal, mediante tablaestacado en modulos metalicos H:6.0 Mts, incluye tuberia 4" Tipo Pesado con punta de lapiz		UNIDAD	M2
SUB-CAPITULO	2.18 NP					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO












LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
ADICIONAL ESTABILIZACION DE TALUD		7,00	21,00	147,00		1	147,00
ADICIONAL ESTABILIZACION DE TALUD CASAS VECINAS		7,00	35,02	245,17		1	245,17
SUBTOTAL							392,17
TOTAL							392,17

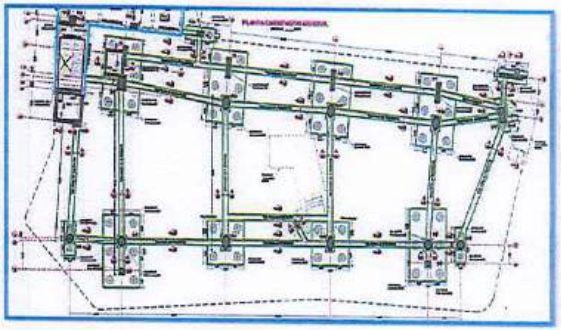





TOTAL ACTIVIDAD 392,17

ACUMULADO 392,17

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPÍTULO	02	ITEM	Bombeo y manejo de aguas			UNIDAD: DIA
SUB-CAPITULO	2.19 NP					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO










LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
OBRA EN GENERAL						151	151,00
SUBTOTAL							151,00
TOTAL							151,00

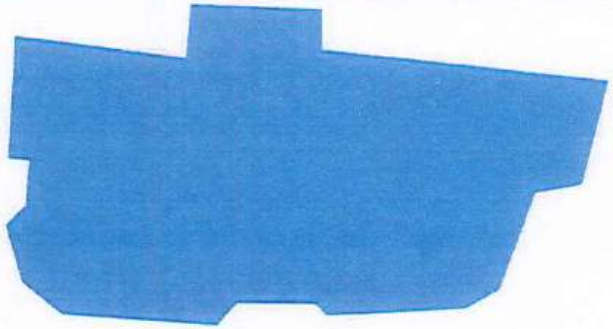

ÁREA: 997.5 M²



TOTAL ACTIVIDAD 151,00

ACUMULADO 151,00

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	

CAPÍTULO	03	ITEM	3,02	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE TANQUE F'C= 28 MPA	UNIDAD	M3
SUB-CAPITULO	3,02					


DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
PEDESTAL A0-1		1,20		0,38	0,46	1	0,46
PEDESTAL A0-1'		1,20		0,38	0,46	1	0,46
PEDESTAL A2-1'		1,20		0,50	0,60	1	0,60
PEDESTAL B1-1'		1,20		0,38	0,46	1	0,46
PEDESTAL B2-1'		1,20		0,38	0,46	1	0,46
MUROS TRANSVERSAL T-1	0,30	1,24	10,41		3,87	1	3,87
MUROS TRANSVERSAL T-2	0,30	1,24	10,41		3,87	1	3,87
MURO FONDO LONGITUDINAL	0,30	1,24	14,57		5,42	1	5,42
MURO DIVISORIO	0,30	1,24	13,97		5,20	1	5,20
MURO ZARPA	0,30	2,46	14,57		10,75	1	10,75
ZARPA DE MURO T-2	1,10	0,80	14,57		12,82	1	12,82





TOTAL ACTIVIDAD	44,39
ACUMULADO	44,39

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	

CAPÍTULO	03	ITEM	3,03	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN F'C= 28 MPA	UNIDAD	M3
SUB-CAPITULO	3,03					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO










LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
BASE MURO PERIMETRAL	1,00	0,80	24,50		19,60	1	19,60
VIGA AMARRE MURO PERIMETRAL	0,25	0,30	24,50		1,84	1	1,84

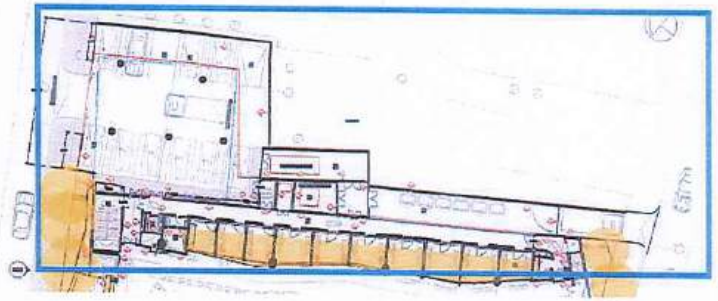

TOTAL ACTIVIDAD	21,44
ACUMULADO	21,44

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.659.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	

CAPÍTULO	03	ITEM	ACERO DE REFUERZO	UNIDAD	KG
SUB-CAPITULO	3,11				

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO









LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	KG/ML	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
DADO 20 y 22	3/4"	2,235	175,11			2	782,73
DADO 14	7/8"	3,042	153,00			1	465,43
	1"	3,973	226,20			1	898,69
DADO M-2 y DADO A0-2	7/8"	3,042	171,40			1	521,40
	1"	3,973	291,20			1	1156,94
DADO 15, 16, 17, 18 y 19	3/4"	2,235	105,80			5	1182,32
DADO BASE DE TANQUE	3/4"	2,235	334,50			1	747,61
MURO M-2	1"	3,973	619,50			1	2461,27
	3/8"	0,560	1211,04			1	678,18
MURO M-1	1"	3,973	1113,50			1	4423,94
	3/8"	0,560	2878,02			1	1611,69
COLUMNA A2-1"	1"	3,973	316,75			1	1258,45
	3/8"	0,560	318,24			1	178,21
COLUMNA A0-1", B2-1", A0-1 y B1-1"	1"	3,973	304,75			4	4843,09
	3/8"	0,560	318,24			4	712,86
COLUMNA A0-2	7/8"	3,042	713,40			1	2170,16
	3/8"	0,560	653,49			1	365,95
COLUMNA A1-4C	1"	3,973	256,00			1	1017,09
	7/8"	3,042	193,60			1	588,93
	3/8"	0,560	806,45			1	451,61
COLUMNA B'-2	1"	3,973	286,00			1	1136,28
	7/8"	3,042	228,60			1	695,40
	3/8"	0,560	653,49			1	365,95
ZARPA TANQUE	3/4"	2,235	384,20			1	858,69
	5/8"	1,552	956,40			1	1484,33
ESCALERA AUX 01	7/8"	3,042	434,40			1	1321,44
	1/2"	0,994	448,20			1	445,51
MURO PERIMETRAL	1/2"	0,994	1668,00			1	1657,99
	3/8"	0,560	1584,90			1	887,54
FOSO DE ASCENSOR	5/8"	1,552	180,60			1	280,29
	1/2"	0,994	550,20			1	546,90
TANQUE-HASTA MURO	5/8"	1,552	6781,54			1	10524,95
	1/2"	0,994	187,00			1	185,88
VIGAS AMARRE (A-5 a A1-4C), (M1 a M2) y (B4 a VIGA M1M2)	3/4"	2,235	217,60			1	486,34
	5/8"	1,552	87,20			1	135,33
	3/8"	0,560	497,10			1	278,38
PLACAS (VIGAS AEREAS)	3/8"	0,560	14370,00			1	8047,20
	1"	3,973	1284,00			1	5101,33

	7/8"	3,042	1440,00		1	4380,48
TOTAL ACERO BARRA						65336,77
ALAMBRE NEGRO (5%)						3266,84
OBSERVACION: VER ANEXO 02. CARTLLAS Y MEMORIAS DE ACERO						
					TOTAL ACTIVIDAD	68603,61
					ACUMULADO	68603,61

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE RISLOW
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	


CAPÍTULO	03	ITEM	Acarreo y retiro de lodos producto de perforación de pilotes (material saturado contaminado)	UNIDAD	M3
SUB-CAPITULO	3,13 NP				

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO






LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
AREA GENERAL OBRA	0,65	27,00	57,00		1012,65	1	1012,65
AREA SOTANO	3,50	8,00	14,00		392,00	1	392,00
AREA TANQUE	1,84	11,60	18,10		386,33	1	386,33
REPOSICION Nº 1 DE MATERIAL MEJORAMIENTO AREA MODULO 1	1,20			1256,00		1	1507,20
REPOSICION Nº 2 DE MATERIAL MEJORAMIENTO AREA MODULO 1	1,00			1256,00		1	1256,00



OBSERVACION: Ver Anexo 01. Carteras topograficas

TOTAL ACTIVIDAD	4554,18
ACUMULADO	4.554,18

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPÍTULO	03	ITEM	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE PARA COLUMNAS F'C= 35 MPA			UNIDAD: M3
SUB-CAPITULO	3,14 NP					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO








LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
A-5		4,50		0,39	1,73	1	1,73
B-5'		4,50		0,50	2,26	1	2,26
B-7		4,50		0,16	0,72	1	0,72
C-5'		4,50		0,61	2,75	1	2,75
D-5'		4,50		0,61	2,75	1	2,75
E-5'		4,50		0,50	2,26	1	2,26
E-6		4,50		0,16	0,72	1	0,72
F-5'		4,50		0,39	1,73	1	1,73
F'-3'		4,50		0,75	3,38	1	3,38
M-3		4,50		0,76	3,40	1	3,40
P4,P3,P2,P1		4,50		0,38	1,69	4	6,75
E-4A		4,50		0,61	2,75	1	2,75
D-4A		4,50		0,61	2,75	1	2,75
C-4A		4,50		0,61	2,75	1	2,75
B-4		4,50		0,77	3,47	1	3,47
A1-4C		4,50		0,32	1,42	1	1,42
M1		4,50		1,02	4,59	1	4,59
M-2		4,50		0,42	1,87	1	1,87
A0-2, B'-2, B3-2		4,50		0,21	0,95	3	2,84
A0-1", A0-1,B1-1', B2-1", A2-1"		4,50		0,28	1,27	5	6,37
Muros Montacarga	0,20	4,50	5,88		5,29	1	5,29
						TOTAL ACTIVIDAD	62,55
						ACUMULADO	62,55

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	


CAPÍTULO	04	ITEM	LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 5 12 X 20 X 30 CM	UNIDAD	M2
SUB-CAPITULO	4,01				

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
MURO PERIMETRAL		5,00	34,00	170,00		1,00	170,00

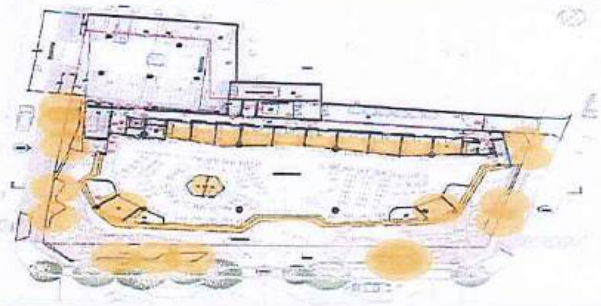

TOTAL ACTIVIDAD	170,00
ACUMULADO	170,00

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVIS ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	


CAPÍTULO	05	ITEM	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	UNIDAD	M2
SUB-CAPITULO	5,02				

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
MURO PERIMETRAL		5,00	34,00	170,00		2,00	340,00

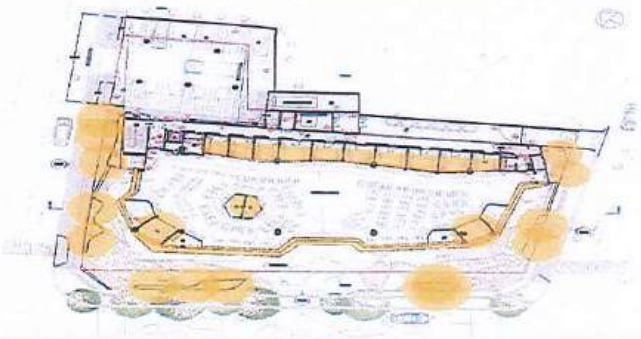

TOTAL ACTIVIDAD	340,00
ACUMULADO	340,00

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPITULO	13	ITEM	Excavación A Mano (No incluye retiro del material sobrante)			UNIDAD: M3
SUB-CAPITULO	13,10					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO













LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ALTURA	LONGITUD	ANCHO	VOLUMEN		
Redes hidrosanitarias menores	0,50	580,12	0,60	174,04	1,00	191,44
Red sanitaria externa	1,00	45,20	0,70	31,64	1,00	34,80
Red Pluvial externa	1,20	82,93	0,70	69,66	1,00	76,63
Redes contraincendio	1,20	59,26	0,50	35,55	1,00	39,11

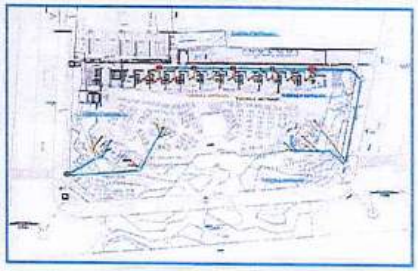

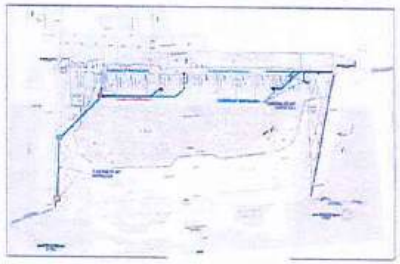

TOTAL ACTIVIDAD	341,98
ACUMULADO	341,98

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	


CAPÍTULO	13	ITEM	Suministro e instalación de tubería PVC D=2" (Incluye Accesorios)	UNIDAD	ML
SUB-CAPITULO	13.3.1				

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
NIVEL 1			84,91			1,00	84,91

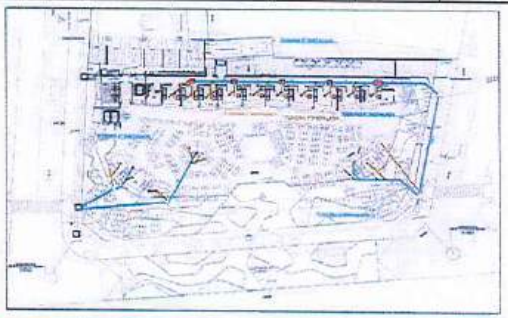

TOTAL ACTIVIDAD	84,91
ACUMULADO	84,91

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEYS YAJAIRA CUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.658.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	


CAPÍTULO	13	ITEM	Suministro e instalación de tubería PVC D=4" (Incluye Accesorios)	UNIDAD	ML
SUB-CAPITULO	13.3.3				

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
NIVEL 1			90,95			1,00	90,95

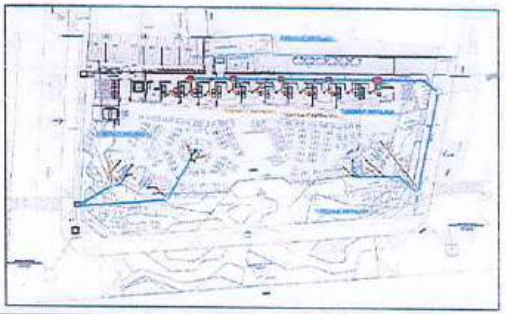

TOTAL ACTIVIDAD	90,95
ACUMULADO	90,95

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR


Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	


CAPITULO	13	ITEM	Suministro e instalación de tubería PVC D=6" (Incluye Accesorios)	UNIDAD	ML
SUB-CAPITULO	13.3.4				

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

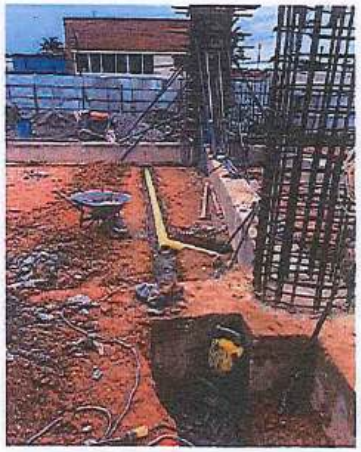



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
URBANISMO			87,00			1,00	87,00
NIVEL 1			42,55			1,00	42,55

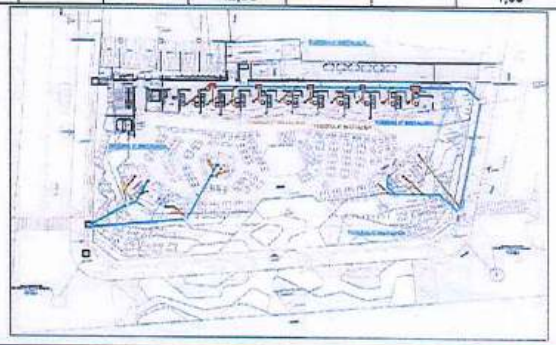

TOTAL ACTIVIDAD	129,55
ACUMULADO	129,55

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	

CAPÍTULO	13	ITEM	Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mamposteria, Mortero De Pega 1:4, Pañetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado, Tapa En Concreto De 3000 Psi	UNIDAD	Und
SUB-CAPITULO	13.3.7				

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO










LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
URBANISMO						3,00	3,00
NIVEL 1						8,00	8,00

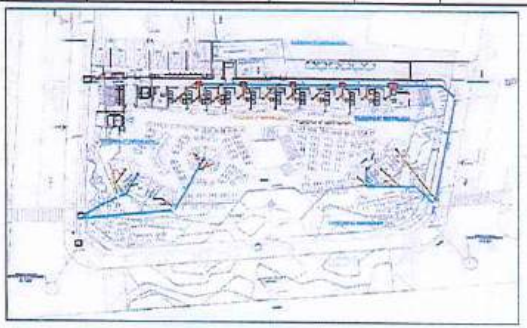

TOTAL ACTIVIDAD	11,00
ACUMULADO	11,00

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR


Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2


INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	

CAPÍTULO	13	ITEM	Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 4" (Incluye Accesorios)	UNIDAD	ML
SUB-CAPITULO	13.6.1				

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

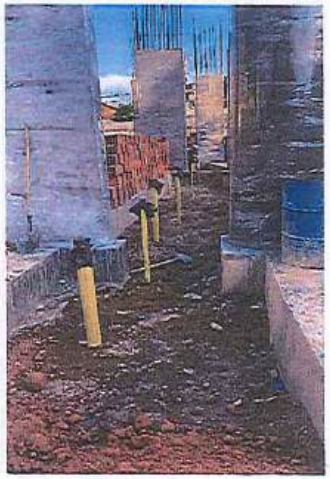

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
URBANISMO							
NIVEL 1			13,84			1,00	13,84

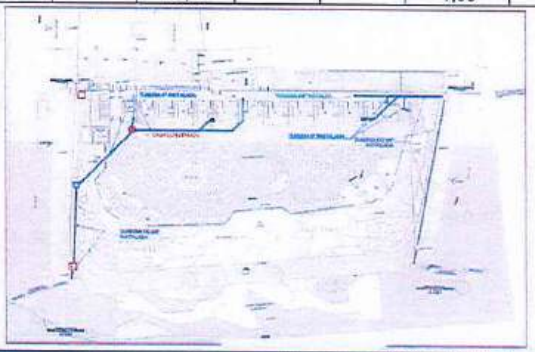

TOTAL ACTIVIDAD	13,84
ACUMULADO	13,84

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2


INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0632-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	

CAPÍTULO	13	ITEM	Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 6" (Incluye Accesorios)	UNIDAD	ML
SUB-CAPITULO	13.6.2				

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
URBANISMO							
NIVEL 1			87,00			1,00	87,00

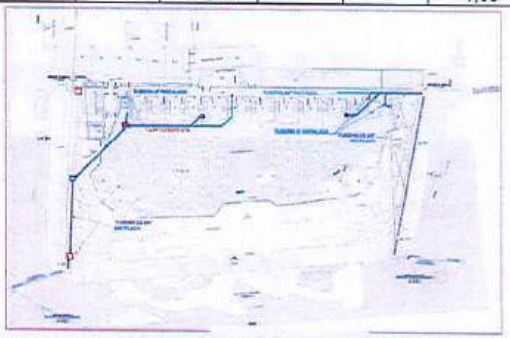

TOTAL ACTIVIDAD	87,00
ACUMULADO	87,00

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	
CAPÍTULO	13	ITEM	Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 8" (Incluye Accesorios)			UNIDAD: ML
SUB-CAPITULO	13.6.3					


DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
OBRA EN GENERAL			122,00			1,00	122,00

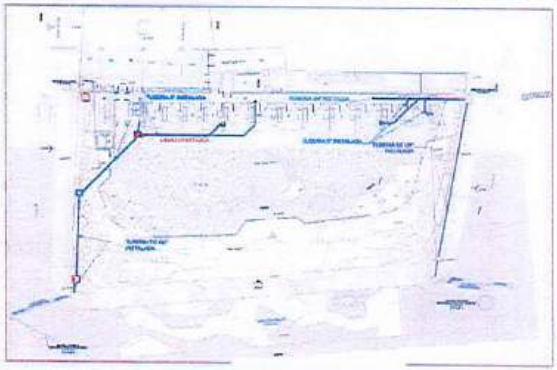

TOTAL ACTIVIDAD	122,00
ACUMULADO	122,00

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR


Consorcio Río Grande

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2


INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIRADOR	NIT	901.669.152-1	Nº CONTRATO	0532-23	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO GRANDE	NIT	901.668.549-7	Nº CONTRATO	0401-23	

CAPÍTULO	13	ITEM	Registro De 0.80 X 0.60 X 1.00-1.20 Mts En Mamposteria, Mortero De Pega 1:4, Pañetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado, Tapa En Concreto De 3000 Psi	UNIDAD	Und
SUB-CAPITULO	13.6.7				

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

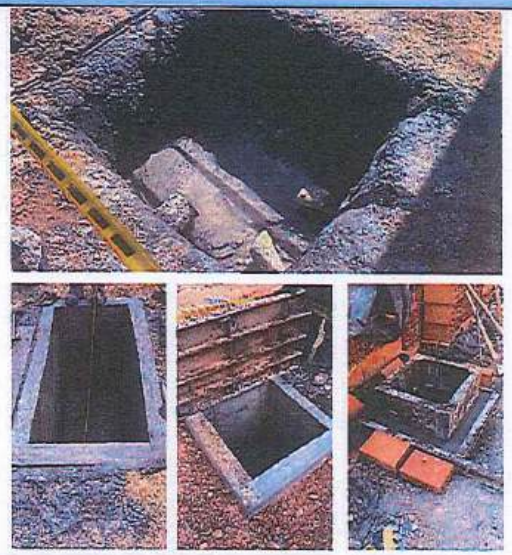

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	VOLUMEN		
OBRA GENERAL						6,00	6,00

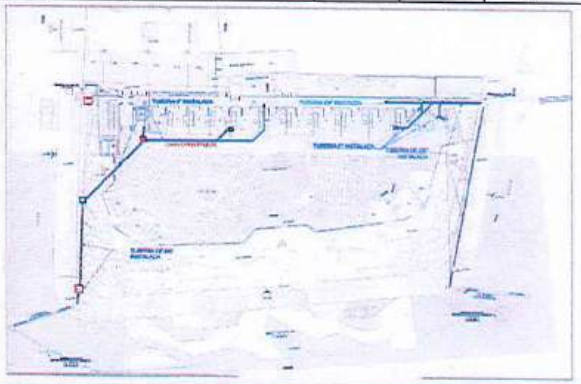

TOTAL ACTIVIDAD	6,00
ACUMULADO	6,00

ELABORÓ

CONSORCIO RIO GRANDE
R.L. FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON
CONTRATISTA DE OBRA


REVISÓ

CONSORCIO INTERMIRADOR
R.L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
INTERVENTOR

Consorcio
Río Grande

INFORME DE COBRO PARCIAL DE OBRA No.2

"CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

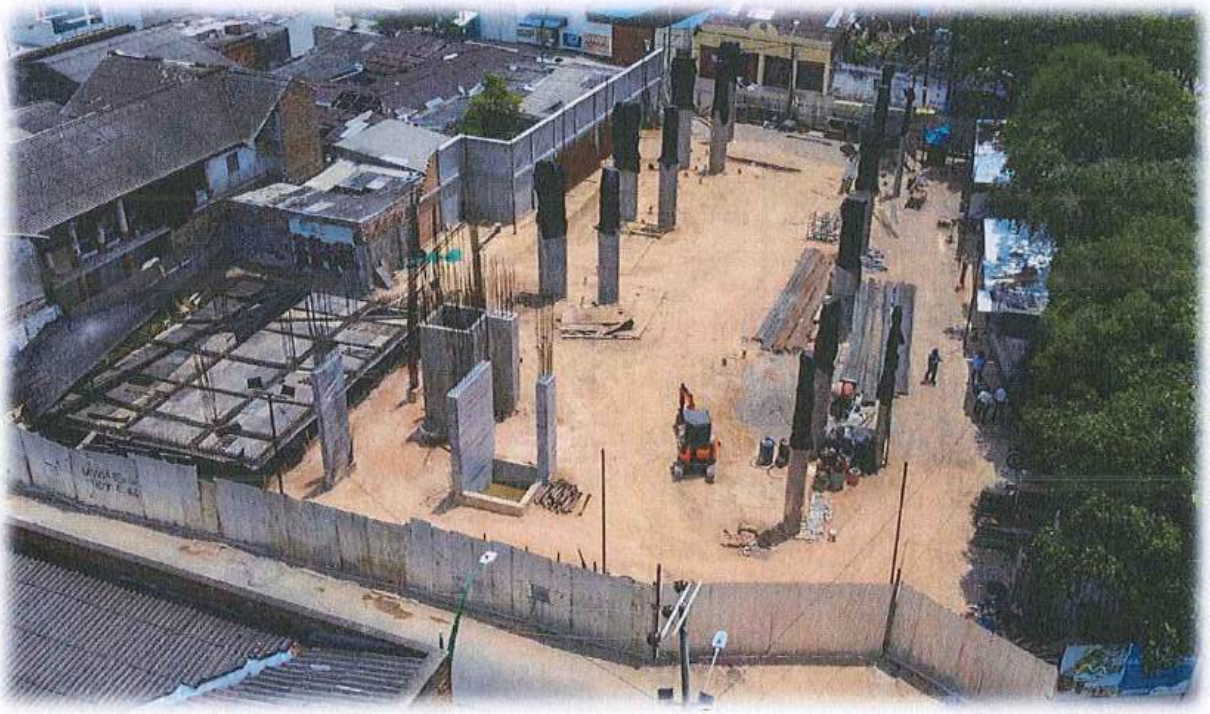

LUIS ADOLFO MEJÍA ÁLVAREZ
Residente de Obra
PERIODO: OCTUBRE DE 16 DE 2024 – FEBRERO 11 DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN 2
1. OBJETIVOS 5
I ESPECÍFICOS 5
2. CAPITULO I. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6
2.1. Localización del Proyecto 6
2.2 Antecedentes del Proyecto 8
2.3 Condiciones Técnicas del Proyecto 9
2.4 Plazo de Ejecución 11
2.5 Información soporte del Proyecto 11
2.6 Anexos: Formato CON-FR-041 Informe Ejecutivo Mensual 12
3. CAPÍTULO II. CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS. 13
3.1. Actividades Desarrolladas 13
3.3.2. Instalación de Bajantes de Aguas Lluvias en Tubería PVC de 8" y 6" 109
3.3.3. Pañete Impermeabilizado sobre Muro Perimetral 109
3.3.4. Excavación Manual 109
3.3.5. Relleno con Material Seleccionado de Sitio 109
3.3.6. Relleno de Zanjas 110
3.3.7. Vaciado de Concreto en Zarpa para Muro Tanque de Almacenamiento de Agua y Vigas de Amarre 110
3.3.8. Ampliación de Cerramiento Perimetral 110
3.3.9. Instalación de Geotextil 110
3.3.10. Acarreo y retiro de lodos por Nivel freático y Perforación para pilotes 110
4. 1.5.10 Bombeo y Manejo de Aguas 111
3.3.11. Muro de contención temporal, mediante tablestacado en módulos metálicos 111
3.3.12. Rellenos con Subbase y Base Granular 111
4. Plazo de ejecución 126
5. CAPITULO II. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. 126
6. CAPITULO III. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONTRATO DE OBRA 126
6.1. Seguimiento técnico por parte de interventoría 126
6.2. Seguimiento Semanal 127

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

6.4. Seguimiento administrativo por parte de interventoría 129
6.5. Seguimiento jurídico por parte de interventoría 130
6.6. Seguimiento ambiental por parte de Interventoría. 130
6.7. Cantidad de obra 130

1. OBJETIVOS

- **GENERAL**

✓ Presentar el estado técnico, administrativo y financiero del contrato ejecutado por el contratista durante el periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2024 y el 11 de febrero de 2025.


- **ESPECÍFICOS**

✓ Informar a la entidad contratante el avance físico y financiero de las actividades contractuales ejecutadas.
✓ Dar conocimiento de las diferentes actividades que desarrolló el contratista durante el presente periodo de ejecución del proyecto.
✓ Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo de ejecución.

2. CAPITULO I. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

2.1. Localización del Proyecto

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER

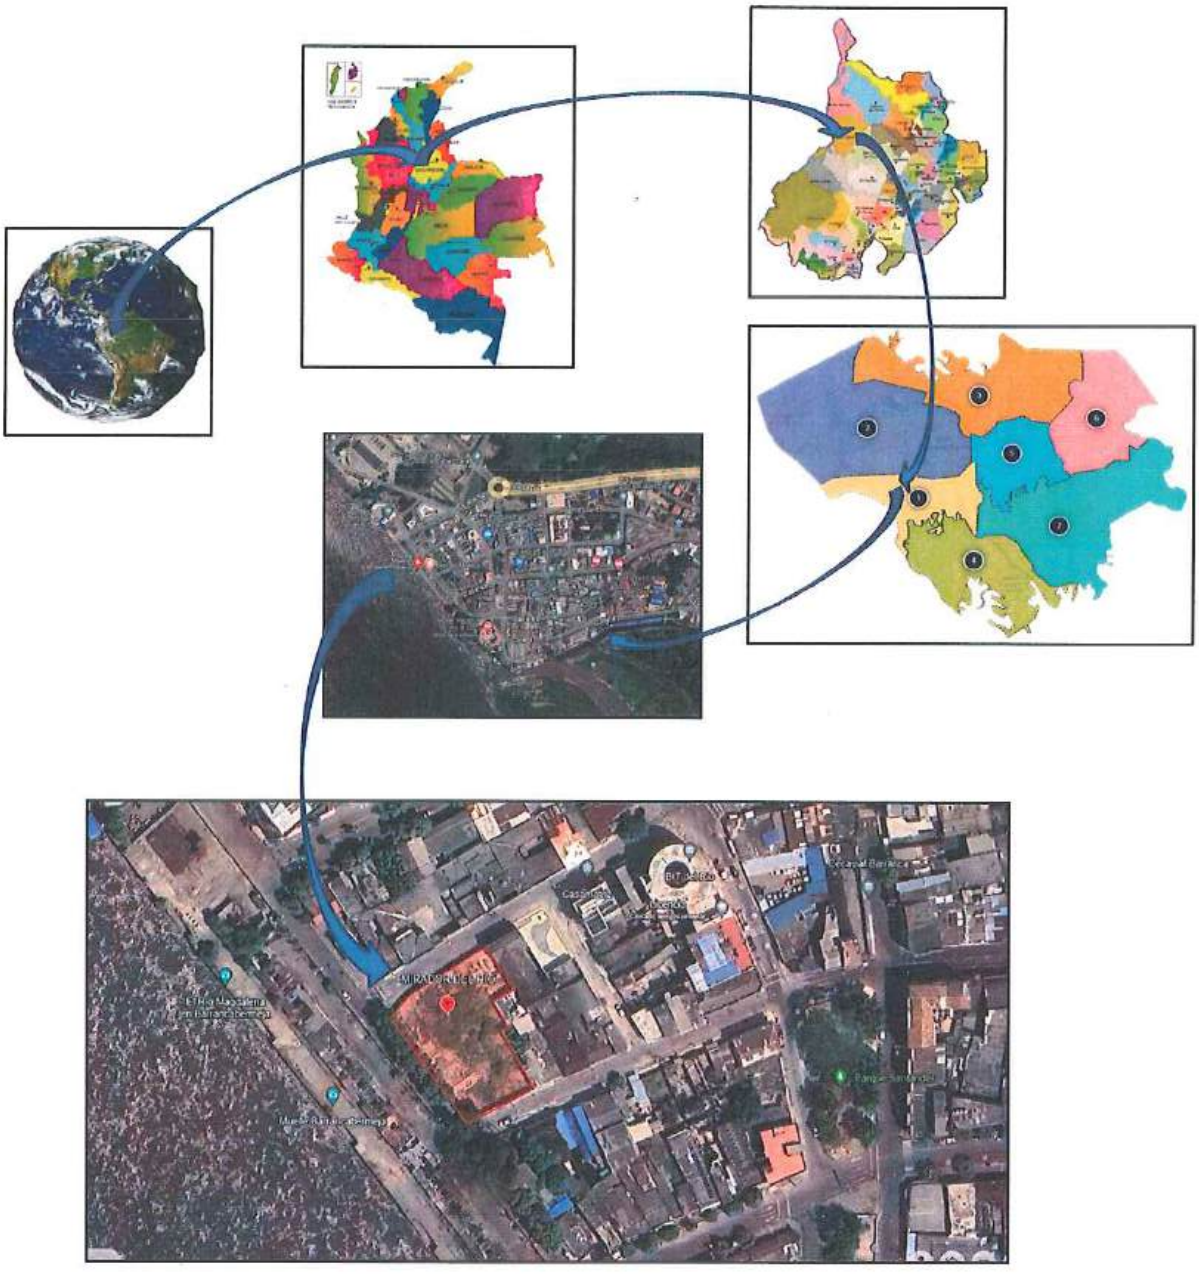

Año de constitución:	1536
Inauguración como Municipio:	25 de julio de 1536
Ordenanza Departamental:	Ordenanza 2080.
Alcalde:	Jonathan Stivel Vásquez Gómez

Barrancabermeja, es un distrito colombiano ubicado a orillas del río Magdalena, en la parte occidental del departamento de Santander. Es la ciudad industrial más importante del departamento de Santander, sede de la refinería de petróleo más grande del país y es la capital de la Provincia de Yariguíes. Dista 114 km de Bucaramanga hacia el occidente. Es la ciudad más grande en la subregión natural del denominado Magdalena Medio; sede de la Policía del Magdalena Medio, de la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena, de la Diócesis de Barrancabermeja.

Limita al norte con el municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al oriente con el municipio de San Vicente de Chucurí y Girón, y al occidente con el Río Magdalena y el municipio de Yondó, departamento de Antioquia.

2.2 Antecedentes del Proyecto

Debido a la urgente necesidad de realizar acciones contundentes que soporten un sistema de infraestructuras estratégicas del Distrito que apoyen el fortalecimiento comercial, industrial, turístico y en general todas las gestiones que permitan construir, mejorar y adecuar toda la estrategia territorial desde la dimensión técnica, profundizando en las gestiones prediales, sociales, de consolidación de identidad y cultura ciudad.

En general este proyecto se soporta en los productos generados a partir de Contrato Interadministrativo 1000-20, no solo a nivel de estudios y diseños, también dentro del análisis de la zona de influencia del muelle, planteando proyectos que no solo generaran nueva infraestructura, también fortalecerán la estrategia reposicionamiento, identidad y reasentamiento de las poblaciones vulnerables del sector, con lo cual se plantea la actualización o la estructuración de nuevos productos para la construcción de edificaciones y espacio público de alto impacto positivo, esto ante la necesidad que tiene la ciudad de sumar espacios comunitarios relevantes toda vez que Barrancabermeja es un referente en la escala territorial regional, necesitando desarrollar proyectos de integración comunitaria para la cultura, la educación, la economía, el comercio, la tecnología y el turismo entre otras dimensiones sociales.
Para continuar de manera eficiente las actividades propuestas para la consolidación de los proyectos estratégicos, entre los cuales se encuentra el denominado Distrito Malecón como una de las principales apuestas de la Administración Distrital y que se deriva principalmente de los productos entregados por la empresa PUERTA DE ORO EMPRESA DESARROLLO CARIBE SAS, se hizo necesario activar acciones complementarias que incluyan adquisición de predios, avalúos, seguimiento a las acciones sociales, económicas y prediales, estrategias de divulgación, generación de identidad, imagen y marca de ciudad.

Las difíciles condiciones actuales en las que se desarrollan los servicios de gastronomía en el sector del Muelle, dificultades de diferentes escalas entre las que encontramos la económica, ambiental, de salubridad, son las razones que fortalecen la construcción del Mirador del Rio, una estrategia a nivel de edificación, que también incluye otras acciones culturales, de emprendimiento, sociales, económicas y de productividad, siendo esta la razón por la cual Ecopetrol se ha vinculado, aprobando el cierre técnico y financiero, que garantizara aportes por más de 20.000 millones de pesos, como una estrategia de fortalecimiento para toda la región del magdalena Medio.
A partir de todo este análisis, se determinó inicialmente que una de las acciones estratégicas sería el Mercado Gastronómico, hoy denominado Mirador del Rio, que será el corazón de la estrategia de preservación de la gastronomía tradicional, que a partir del fortalecimiento que se brindara a las vendedoras del paseo del rio en temas de gastronomía, finanzas y servicio al cliente, implantando un modelo de economía regional, financiera y jurídicamente sostenible, que dará a la cultura y tradición condiciones dignas para su consolidación.

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydcsas@gmail.com

En general, los ítems principales son

- Obras preliminares
- Movimiento de tierra y cimentación
- Estructuras de concreto
- Muros divisorios y prefabricados
- Pañetes, estuco y pintura
- Pisos
- Cubierta, impermeabilización y aislamiento
- Enchape
- Aparatos sanitarios, accesorios baños
- Cielo raso y divisiones
- Carpintería metálica y de madera
- Obras exteriores y fachada
- Instalaciones hidrosanitarias
- Instalaciones eléctricas
- Telecomunicaciones e infraestructura
- Sistema de AA y extracción
- Instalaciones de Gas
- Equipamiento y decoración

2.3 Condiciones Técnicas del Proyecto

De acuerdo con el ejercicio técnico realizado el área mínima requerida de predios para el desarrollo del MERCADO GASTRONÓMICO es de 1800 m2 Esta área incluye: área construida, aislamientos según norma urbana, parqueaderos, antejardín y andén.

El área se obtiene a partir de:

- Área primer piso, 915,5 m2, que equivale al área ocupada, que según la norma es el 60% del predio a desarrollar.
- Con base en el punto anterior, se establece que el 40% restante, que obedece a aislamientos, corresponde a 610,5 m2.

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydass@gmail.com

En total suma 1526 m2, se lleva a 1800 m2, previendo que los aislamientos no se pueden hallar de manera exacta.

En general los diseños pretenden proponer espacio activo de calidad, en donde el servicio de venta de alimentos preparados se pueda llevar a cabo en óptimas condiciones técnicas y sanitarias, incluyendo áreas de servicios, técnicas, galerías, balcones, terrazas y además áreas de atención para servicio a la mesa, miradores y áreas complementarias.



Ilustración 1. Tipo de cocinas

El edificio busca atender aproximadamente 1000 usuarios a la mesa, con amplios criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, a partir de la propuesta de sistemas de energía fotovoltaicos, utilización de materiales con altos factores de calidad termo acústica y sistemas de iluminación y ventilación eficientes, entre otras decisiones de diseño.



Ilustración 2. Sostenibilidad

Sea pertinente indicar que los diseñadores han emitido una viabilidad del proyecto (Project Checklist o documento correspondiente) en el cual se evalúan los criterios para acceder a la certificación LEED (Leadership in energy and Environmental Design) que nos indica que el proyecto en sí, al cumplir con sus especificaciones técnicas es susceptible de ser objeto de tal certificación.

En tal sentido, tanto en el alcance como en las obligaciones del constructor, se exigirá que cumplan con estos

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydaa@gmail.com

requerimientos a fin de lograr entregar la obra certificada en LEED en la calificación más alta posible.

De la misma manera, los conceptos de diseño pretenden hacer una abstracción de los elementos bióticos del entorno, como una manera de homenajear la riqueza natural de magdalena medio

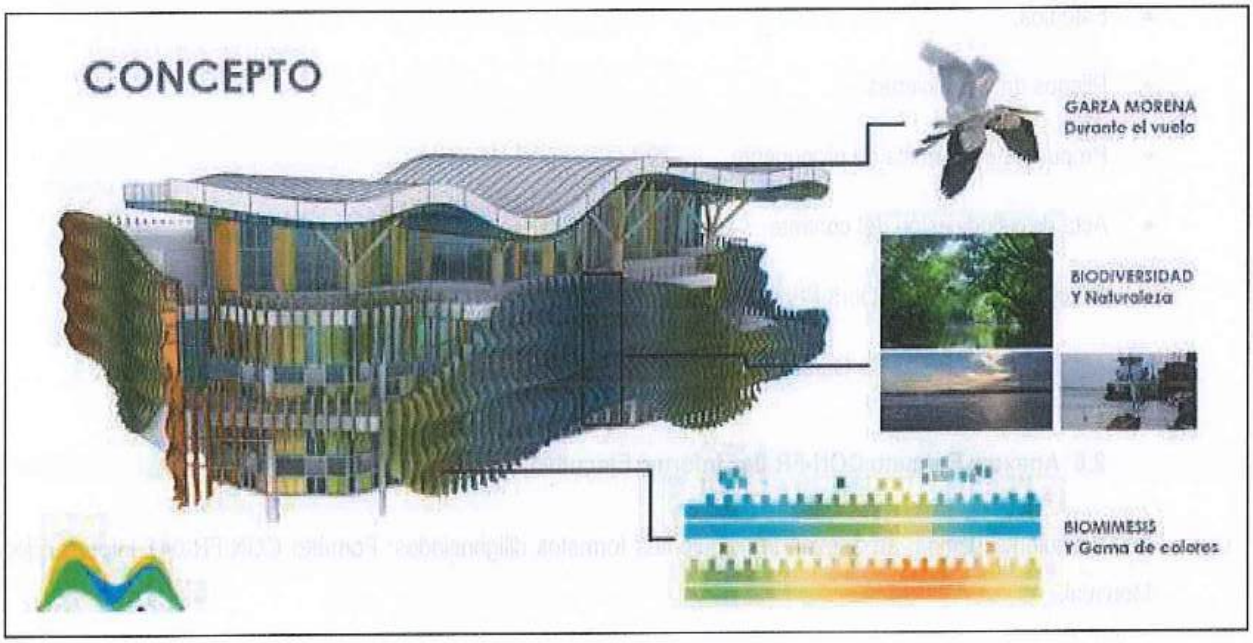


Ilustración 3. Concepto del Diseño

2.4 Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución del proyecto es de trece (13) meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato (Suscripción del acta de inicio).

2.5 Información soporte del Proyecto

El proyecto cuenta con el siguiente soporte técnico:

- Estudios Previos.
- Especificaciones Técnicas de construcción.
- Presupuesto Detallado.
- Análisis de Precios Unitarios.

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyclas@gmail.com

- Planos.
- Diseños.
- Estudios.
- Pliegos de Condiciones.
- Propuesta económica de proponente.
- Acta de adjudicación del contrato.
- Minuta de contrato de Obra Pública.
- Aprobación de Póliza de Garantías.

2.6 Anexos: Formato CON-FR-041 Informe Ejecutivo Mensual

En la siguiente página, se anexan los siguientes formatos diligenciados: Formato CON-FR-041 Informe Ejecutivo Mensual.

3. CAPÍTULO II. CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS.


3.1. Actividades Desarrolladas

El día once (11) del mes de marzo del año 2024, se firmó el ACTA DE REINICIO N°3 entre las partes que intervienen en el proceso (contratista y supervisión), de igual forma se da continuidad al registro diario de obra (bitácora). A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el presente periodo y los porcentajes acumulados alcanzados:

Consorcio Río Grande	PRESUPUESTO DE OBRA MIRADOR DEL RIO BARRANCABERMEJA					
PROYECTO:	MIRADOR DEL RIO					
DEPARTAMENTO:	SANTANDER					
MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA					
FECHA:	2/11/2025					
ELABORÓ:	CONSORCIO RIO GRANDE					
CUADRO RESUMEN				COBRO No. 2		
01	OBRAS PRELIMINARES	$ 307,752,362	1.67%	$ 113,460,902.100	0.45%	36.87%
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACION	$ 3,080,583,944	16.70%	$ 1,371,601,094.73	5.39%	44.52%
03	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS	$ 6,026,146,102	32.66%	$ 1,348,720,190.109	5.30%	22.38%
04	MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS	$ 154,175,678	0.84%	$ 8,547,090.00	0.03%	0.00%
05	PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA	$ 273,539,369	1.48%	$ 11,603,180.00	0.05%	0.00%
06	PISOS	$ 422,278,411	2.29%	$ -	0.00%	0.00%
07	CUBIERTA - IMPERMEABLIZACION - ASILAMIENTO	$ 299,457,710	1.62%	$ -	0.00%	0.00%
08	ENCHAPE	$ 87,890,847	0.48%	$ -	0.00%	0.00%
09	APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS BAÑOS	$ 138,365,026	0.75%	$ -	0.00%	0.00%
10	CIELO RASO Y DIVISIONES	$ 87,109,440	0.47%	$ -	0.00%	0.00%
11	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	$ 169,850,128	0.92%	$ -	0.00%	0.00%
12	OBRAS EXTERIORES Y FACHADA	$ 1,146,386,536	6.21%	$ -	0.00%	0.00%
13	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 1,113,689,184	6.04%	$ 66,634,232.99	0.26%	0.00%
14	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 1,910,149,305	10.35%	$ -	0.00%	0.00%
15	TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA	$ 542,435,600	2.94%	$ -	0.00%	0.00%
16	SISTEMA DE AA Y EXTRACCION	$ 1,702,790,010	9.23%	$ -	0.00%	0.00%
17	INSTALACIONES DE GAS	$ 789,330,374	4.28%	$ -	0.00%	0.00%
18	EQUIPAMIENTO Y DECORACION	$ 198,407,213	1.08%	$ -	0.00%	0.00%
COSTO DIRECTO		$ 18,450,337,238.39		$ 2,920,566,689.93	11.47%	
Administracion	28.58%	$ 5,273,269,456		$ 834,723,773	3.28%	
Imprevisto	1.00%	$ 184,503,372		$ 29,205,667	0.11%	
Utilidad	5.00%	$ 922,516,862		$ 146,028,334	0.57%	
COSTO INDIRECTO		$ 6,380,289,690		$ 1,009,957,774.82		
COSTO DIRECTO + INDIRECTO		$ 24,830,626,928.69		$ 3,930,524,464.74		
TRAMITE DE RED Y CERTIFICACIONES RETIE		$ 23,276,400				
PMA		$ 32,425,197			0.00%	0.00%
PMT		$ 9,302,225			0.00%	0.00%
PROTOCOLOS COVID		$ -				
MOBILIARIO		$ 570,694,619				
Interventoria		$ -				
COSTO TOTAL		$ 25,466,325,369.69		$ 3,930,524,464.74	15.43%	

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydass@gmail.com

3.2. PROGRAMACIÓN DE OBRA Y EJECUCIÓN EN PERIODO DE COBRO No. 2.

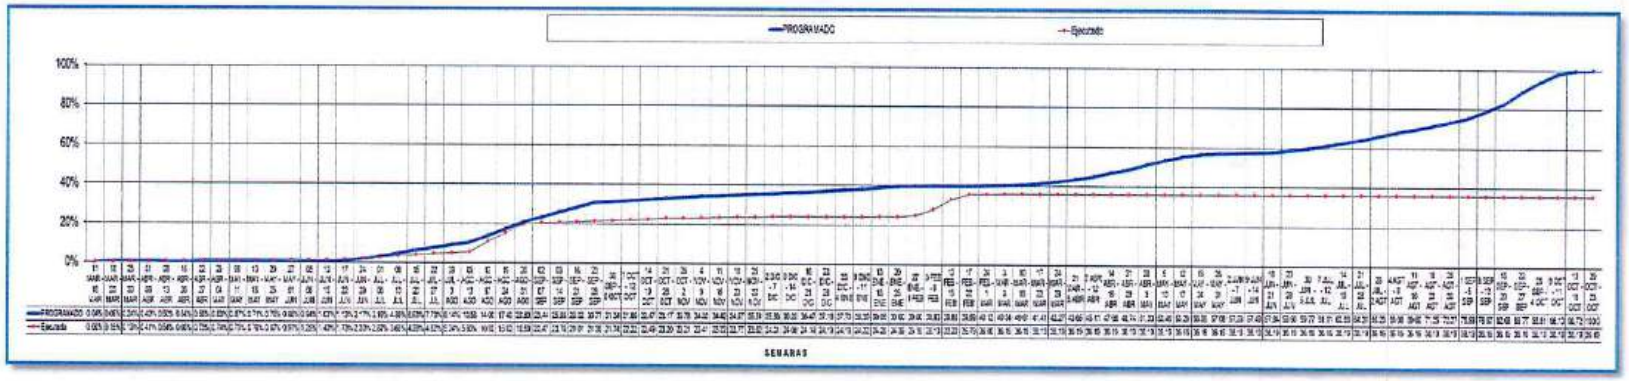

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydcas@gmail.com

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA ACLARATORIA No. 1 DE LA MODIFICATORIA No. 1 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1		ACTA DE MODIFICATORIA No. 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT MODF 01	VR. TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADO	CANT	VALOR PARCIAL
01	OBRAS PRELIMINARES														
1.01	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	13.00	$ 5,547,957.00	$ 72,123,441.00	13.00	72,123,441.00	13.00	72,123,441.00	12.00	$ 66,575,484.00	26.00	$ 144,246,882.00	14.00	$ 77,671,398.00
1.02	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION.	ML	211.78	$ 28,589.00	$ 6,054,578.42	0.00	-	0.00	-	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00		
1.03	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	133.53	$ 10,527.00	$ 1,405,670.31	133.53	1,405,670.31	133.53	1,405,670.31	133.53	$ 1,405,670.31	133.53	$ 1,405,670.31		
1.04	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	184.56	$ 115,497.00	$ 21,316,126.32	184.56	21,316,126.32	184.56	21,316,126.32	184.56	$ 21,316,126.32	184.56	$ 21,316,126.32		

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

1.05	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	328.00	$ 27,395.00	$ 8,985,560.00	328.00	8,985,560.00	328.00	8,985,560.00	328.00	$ 8,985,560.00	328.00	$ 8,985,560.00		
1.06	DESMONTE DE CUBIERTA PREDIO EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,894.66	$ 11,365.00	$ 21,532,810.90	1894.66	21,532,810.90	1894.66	21,532,810.90	1,894.66	$ 21,532,810.90	1894.66	$ 21,532,810.90		
1.07 NP	Cerramiento en lamina de zinc de dimensiones 3m * 0,8 m reforzada con madera rolliza de 2"x2" empotrada 50cm en concreto de 14 Mpa y triple refuerzo transversal con listones de 2x2", incluye dos puertas para entrada de camiones en lamina y bordillo perimetral	ML		$ 206,345.00				211.78	44,123,304.10	210.00	$ 43,752,450.00	381.78	$ 79,541,954.10	171.78	$ 35,789,504.10
1.08 NP	Instalación eléctrica provisional (Incluye un TABLERO PROVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN, COMPRENDE PROTECCIÓN GENERAL, 8 SALIDAS 110V, 4 SALIDAS 220V BIFÁSICAS Y 2 SALIDAS A 220V TRIFÁSICAS.)	UND		$ 30,723,358.00				1.00	30,723,358.00	1.00	$ 30,723,358.00	1.00	$ 30,723,358.00		
TOTAL EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)					$ 131,418,186.95		$ 125,363,608.53		$ 200,210,270.63		$ 194,291,459.53		$ 307,752,361.63		$ 113,460,902.10
							-		-						
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACION						-		-						
2.01	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL,	M3	497.02	$ 34,682.00	$ 17,237,647.64	1360.86	47,197,388.14	1360.86	47,197,346.52	1,360.86	$ 47,197,346.52	1360.86	$ 47,197,346.52		

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyclas@gmail.com

	INCLUYE ACARREO INTERNO														
2.02	RELLENO EN MATERIAL DE SELECCIONADO COMPACTADO	M3	828.37	$ 48,972.00	$ 40,566,935.64	1785.05	87,417,466.60	1785.05	87,417,468.60	1,772.48	$ 86,801,890.56	5778.95	$ 283,006,739.40	4006.47	$ 196,204,848.84
2.03	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	27.19	$ 121,460.00	$ 3,302,497.40	27.19	3,302,497.40	27.19	3,302,497.40		$ 0.00	440.26	$ 53,473,979.60	413.07	$ 50,171,482.20
2.04	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTACTO	M3	75.73	$ 123,800.00	$ 9,375,374.00	75.73	9,375,374.00	75.73	9,375,374.00		$ 0.00	257.66	$ 31,898,308.00	181.93	$ 22,522,934.00
2.05	RELLENO DE RESPALDO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	M3	431.53	$ 19,271.00	$ 8,316,014.63	0.00	-	0.00	-		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
2.06	EXCAVACIÓN Y CONCRETO PARA PILOTES F'C= 28 MPA	M3	346.83	$ 1,470,278.00	$ 509,936,518.74	346.83	509,936,518.74	346.83	509,936,518.74	346.56	$ 509,539,543.68	508.00	$ 746,991,224.00	161.44	$ 237,361,680.32
2.07	EXCAVACIÓN PARA TANQUE, SEMISÓTANO, DADOS, ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE	M3	1,095.71	$ 36,790.00	$ 40,311,170.90	1095.71	40,311,170.90	1095.71	40,311,170.90		$ 0.00	2262.92	$ 83,986,626.80	2282.92	$ 83,986,626.80
2.08	CONCRETO PARA SOLADO F'C= 14 MPA (E=0.05M)	M2	235.53	$ 26,914.00	$ 6,339,054.42	235.53	6,339,054.42	235.53	6,339,054.42	235.50	$ 6,338,247.00	474.82	$ 12,779,305.46	239.32	$ 6,441,058.46
2.09	RELLENO EN PEDRAPLEN PARA MEJORAMIENTO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS	M3	122.06	$ 104,279.00	$ 12,728,294.74	321.84	33,560,684.10	321.84	33,561,153.36	157.44	$ 16,417,685.76	2289.09	$ 238,704,016.11	2131.65	$ 222,286,330.35
2.10	CONCRETO PARA DADOS DE CIMENTACIÓN F'C= 35 MPA	M3	253.18	$ 671,545.00	$ 170,021,763.10	253.18	170,021,763.10	253.18	170,021,763.10	185.24	$ 124,396,995.80	253.18	$ 170,021,763.10	67.94	$ 45,624,767.30
2.11	CONCRETO PARA LOSA DE FONDO DEL TANQUE F'C= 28 MPA (E=0.3M)	M3	38.88	$ 739,576.00	$ 28,754,714.88	38.88	28,754,714.88	38.88	28,754,714.88		$ 0.00	51.43	$ 38,036,393.68	51.43	$ 38,036,393.68

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

2.12	CONCRETO PARA PEDESTAL F'C= 28 MPA	M3	20.08	$ 624,396.00	$ 12,537,871.68	20.08	12,537,871.68	20.08	12,537,871.68	11.88	$ 7,417,824.48	24.16	$ 15,085,407.36	12.28	$ 7,667,582.88
2.13	CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE F'C= 28 MPA	M3	56.23	$ 721,865.00	$ 40,590,468.95	56.23	40,590,468.95	56.23	40,590,468.95	53.96	$ 38,951,835.40	70.49	$ 50,884,263.85	16.53	$ 11,932,428.45
2.14 NP	Demolicion de estructuras de cimientos existente	M3		$ 192,625.00				807.96	155,633,295.00	807.96	$ 155,633,295.00	807.96	$ 155,633,295.00		$ 0.00
2.15 NP	Descabezado de pilotes	UND		$ 181,807.00				84.00	15,271,788.00	60.00	$ 10,908,420.00	84.00	$ 15,271,788.00	24.00	$ 4,363,368.00
2.16 NP	Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2000 o similar	M2		$ 16,061.00				541.40	8,695,425.40		$ 0.00	541.40	$ 8,695,425.40	541.40	$ 8,695,425.40
2.17 NP	Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2500 o similar	M2		$ 19,087.00				1995.00	38,078,565.00		$ 0.00	1995.00	$ 38,078,565.00	1995.00	$ 38,078,565.00
2.18 NP	Muro de contencion temporal, mediante tablaestacado en modulos metalicos H:6.0 Mts, incluye tuberia 4" Tipo Pesado con punta de lapiz	M2		$ 852,870.00				341.76	291,476,851.20	341.76	$ 291,476,851.20	733.93	$ 625,946,026.23	392.17	$ 334,469,175.03
2.19 NP	Bombeo y manejo de aguas	DIA		$ 422,228.00				150.00	63,334,200.00	149.00	$ 62,911,972.00	300.00	$ 126,668,400.00	151.00	$ 63,756,428.00
2.20 NP	PROJUNTA DE EXPANSIÓN CON CINTA PVC O-32, INCLUYE SELLADOR	ML		$ 77,730.00				71.96	5,593,450.80		$ 0.00	71.96	$ 5,593,450.80		$ 0.00
2.21 NP	Impermeabilizacion externa del tanque de agua subterraneo, sistema de Geo-compuesto	M2		$ 289,255.00				176.94	51,180,779.70		$ 0.00	176.94	$ 51,180,779.70		$ 0.00
2.22 NP	Tuberia de acero para camisas no recuperables con profundidad de 10.0 mts, diametro entre 60	ML		$ 2,346,157.00				120.00	281,538,840.00	119.00	$ 279,192,683.00	120.00	$ 281,538,840.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3665 ingenieriamyasc@gmail.com

	y 80 cm y espesor 3/8"															
TOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACION					$ 900,018,326.72		$ 989,344,974.91		$ 1,900,148,597.65		$ 1,637,184,590.40		$ 3,080,583,944.03		$ 1,371,601,094.73
03	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS															
3.01	CONCRETO PARA COLUMNAS F'C= 35 MPA	M3	205.25	$ 1,233,019.00	$ 253,077,149.75	205.25	253,077,149.75	205.25	253,077,149.75		$ 0.00	0.25	$ 308,254.75		$ 0.00
3.02	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE TANQUE F'C= 28 MPA	M3	21.67	$ 1,055,962.00	$ 22,882,696.54	21.67	22,882,696.54	21.67	22,882,696.54		$ 0.00	44.39	$ 46,874,153.18	44.39	$ 46,874,153.18
3.03	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN F'C= 28 MPA	M3	21.72	$ 1,088,072.00	$ 23,632,923.84	21.72	23,632,923.84	21.72	23,632,923.84		$ 0.00	56.74	$ 60,649,133.28	21.44	$ 23,328,263.68
3.04	CONCRETO PARA LOSA SUPERIOR DEL TANQUE CON VIGAS DESCOLGADAS F'C= 28 MPA	M3	44.57	$ 1,287,270.00	$ 57,373,623.90	44.57	57,373,623.90	44.57	57,373,623.90		$ 0.00	40.54	$ 52,186,925.60		$ 0.00
3.05	CONCRETO PARA LOSETA AÉREA E=0,12m F'C= 28 MPA	M2	1,409.00	$ 177,628.00	$ 250,277,852.00	1409.00	250,277,852.00	1409.00	250,277,852.00		$ 0.00	1409.00	$ 250,277,852.00		$ 0.00
3.06	CONCRETO PARA VIGAS AEREAS F'C= 28 MPA	M3	758.41	$ 981,876.00	$ 744,664,577.16	758.41	744,664,577.16	758.41	744,664,577.16		$ 0.00	758.41	$ 744,664,577.16		$ 0.00
3.07	CONCRETO PARA LOSA DE CONTRAPISO F'C= 28 MPA	M3	138.32	$ 782,643.00	$ 108,255,179.76	138.32	108,255,179.76	138.32	108,255,179.76		$ 0.00	138.32	$ 108,255,179.76		$ 0.00
3.08	CONCRETO PARA ESCALERA F'C= 28 MPA	M2	56.55	$ 282,709.00	$ 15,987,193.95	56.55	15,987,193.95	56.55	15,987,193.95		$ 0.00	56.55	$ 15,987,193.95		$ 0.00
3.09	JUNTA DE DILATACION DE 16 CM METALICA CON SISTEMA DE	ML	46.80	$ 1,948,641.00	$ 91,196,398.80	46.80	91,196,398.80	46.80	91,196,398.80		$ 0.00	46.80	$ 91,196,398.80		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingconsoriomyrsas@gmail.com

	BANDEJA CENTRAL														
3.10	ACERO PARA ESTRUCTURA METALICA (Incluye perfilería en acero estructural. Incluye suministro, corte, fabricación de piezas con curvatura, pintura de acabado, transporte e instalación en el malecón de Barrancabermeja)	KG	110,620.31	$ 18,701.00	$ 2,068,710,417.31	110620.31	2,068,710,417.31	110620.31	2,068,710,417.31		$ 0.00	620.31	$ 11,600,417.31		$ 0.00
3.11	ACERO DE REFUERZO	KG	258,611.69	$ 6,727.00	$ 1,739,680,838.63	258611.69	1,739,680,838.63	258611.69	1,739,680,838.63	89,185.08	$ 599,948,033.16	258611.69	$ 1,739,680,838.63	68803.61	$ 461,496,484.47
3,12 NP	EXCAVACIÓN MECANIZADA PARA PILOTES DE 10 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 0.80 y 0.60 mts (Pilotes entre 60 y 80 cms)	ML		$ 1,156,654.00				1008.18	1,166,115,429.72	1,008.18	$ 1,166,115,429.72	1008.18	$ 1,166,115,429.72		$ 0.00
3,13 NP	Acarreo y retiro de lodos producto de perforación de pilotes (material saturado contaminado)	M3		$ 151,872.00				1738.48	264,026,434.56	1,737.72	$ 263,911,011.84	6291.90	$ 955,563,436.80	4554.18	$ 691,652,424.96
3,14 NP	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE PARA COLUMNAS F'C= 35 MPA	M3		$ 2,004,298.38					-			205.57	$ 412,023,618.47	62.55	$ 125,388,863.82
3,15 NP	FORMALETA FIGURADO ESPECIAL PARA VIGAS Y LOSETAS AEREAS	UND		$ 147,391.06					-			2515.51	$ 370,763,692.03		
TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS					$ 5,375,738,851.64		$ 5,375,738,851.64		$ 6,805,880,715.92		$ 2,029,974,474.72		$ 6,026,146,101.64		$ 1,348,720,190.11
04	MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS														

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

4.01	LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 5 12 X 20 X 30 CM	M2	2,474.51	$ 50,277.00	$ 124,410,939.27	2474.51	124,410,939.27	2474.51	124,410,939.27		$ 0.00	2474.51	$ 124,410,939.27	170.00	$ 8,547,090.00
4.02	LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 3 7 X 20 X 30 CM	M2	104.89	$ 45,565.00	$ 4,779,312.85	104.89	4,779,312.85	104.89	4,779,312.85		$ 0.00	104.89	$ 4,779,312.85		$ 0.00
4.03	MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM POR AMBAS CARAS CON AISLAMIENTO TERMICO	M2	21.97	$ 126,409.00	$ 2,777,205.73	21.97	2,777,205.73	21.97	2,777,205.73		$ 0.00	21.97	$ 2,777,205.73		$ 0.00
4.04	TRASDOSADO 7.52 CM CON PLACA YESO CARTON 1/2 PULGADA RESISTENTE A LA HUMEDAD	M2	266.93	$ 55,173.00	$ 14,727,328.89	266.93	14,727,328.89	266.93	14,727,328.89		$ 0.00	266.93	$ 14,727,328.89		$ 0.00
4.05	TRASDOSADO 7.52 CM EN PLACA YESO CARTON 1/2 PULGADA RESISTENTE A LA HUMEDAD CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN LANA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 6.35 CM	M2	114.49	$ 65,341.00	$ 7,480,891.09	114.49	7,480,891.09	114.49	7,480,891.09		$ 0.00	114.49	$ 7,480,891.09		$ 0.00
TOTAL MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS					$ 154,175,677.83		$ 154,175,677.83		$ 154,175,677.83		$ 0.00		$ 154,175,677.83		$ 8,547,090.00
05	PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA														
5.01	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	3,800.55	$ 30,475.00	$ 115,821,761.25	3800.55	115,821,761.25	3800.55	115,821,761.25		$ 0.00	3800.55	$ 115,821,761.25		$ 0.00
5.02	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO	M2	609.22	$ 34,127.00	$ 20,790,850.94	609.22	20,790,850.94	609.22	20,790,850.94		$ 0.00	2425.49	$ 82,774,697.23	340.00	$ 11,603,180.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriaydsas@gmail.com

	1:4 IMPERMEABILIZADO														
5.03	ESTUCO PLASTICO SOBRE PAÑETE ALLANADO	M2	2,114.09	$ 17,191.00	$ 36,343,321.19	2114.09	36,343,321.19	2114.09	36,343,321.19		$ 0.00	2114.09	$ 36,343,321.19		$ 0.00
5.04	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR TIPO 1 ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, TRES MANOS	M2	1,862.48	$ 16,622.00	$ 30,958,142.56	1862.48	30,958,142.56	1862.48	30,958,142.56		$ 0.00	1862.48	$ 30,958,142.56		$ 0.00
5.05	PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA, BASE AGUA, CON POLIMEROS ACRILICOS, DOS MANOS	M2	304.61	$ 25,086.00	$ 7,641,446.46	304.61	7,641,446.46	304.61	7,641,446.46			304.61	$ 7,641,446.46		
TOTAL PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA					$ 211,555,522.40		$ 211,555,522.40		$ 211,555,522.40		$ 0.00		$ 273,539,368.69		$ 11,603,180.00
06	PISOS														
6.01	PISO AFINADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO E = 8 CM INCLUYE CORTE DE JUNTAS	M2	1,577.81	$ 105,951.00	$ 167,170,547.31	1,577.81	167,170,547.31	1,577.81	167,170,547.31		$ 0.00	1577.81	$ 167,170,547.31		$ 0.00
6.02	PISO DECORATIVO EN BALDOSA HIDRAULICA TIPO MOSAICO 20 X 20 CM, SEGÚN DISEÑO ARQ.	M2	105.52	$ 208,202.00	$ 21,969,475.04	105.52	21,969,475.04	105.52	21,969,475.04		$ 0.00	105.52	$ 21,969,475.04		$ 0.00
6.03	PISO DE BAÑOS EN CERAMICA DE FORMATO 20 X 20 CM, ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN MOSAICO SEGÚN DISEÑO ARQ.	M2	136.07	$ 71,674.00	$ 9,752,681.18	136.07	9,752,681.18	136.07	9,752,681.18		$ 0.00	136.07	$ 9,752,681.18		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriaraydsas@gmail.com

6.04	PISO DE COCINAS EN BALDOSA DE CERAMICA BLANCA 30 X 30 CM, ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	M2	530.34	$ 60,489.00	$ 32,079,736.26	530.34	32,079,736.26	530.34	32,079,736.26		$ 0.00	530.34	$ 32,079,736.26		$ 0.00
6.05	PISO DE TERRAZA EN DECK WPC VETEADO TEKA 0.14M X 2.8M	M2	516.10	$ 174,715.00	$ 90,170,411.50	516.10	90,170,411.50	516.10	90,170,411.50		$ 0.00	516.10	$ 90,170,411.50		$ 0.00
6.06	ANDEN EN ADOQUIN PEATONAL DE CONCRETO PREFABRICADO COLOR 10 X 20 CMS, incluye arena y sello	M2	248.35	$ 115,333.00	$ 28,642,950.55	248.35	28,642,950.55	248.35	28,642,950.55		$ 0.00	248.35	$ 28,642,950.55		$ 0.00
6.07	ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO GUIA COLOR GRIS 0.40 X 0.40, incluye arena y sello	M2	45.77	$ 91,481.00	$ 4,187,085.37	45.77	4,187,085.37	45.77	4,187,085.37		$ 0.00	45.77	$ 4,187,085.37		$ 0.00
6.08	ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO ALERTA COLOR GRIS 0.40 X 0.40, incluye arena y sello	M2	49.07	$ 96,202.00	$ 4,720,632.14	49.07	4,720,632.14	49.07	4,720,632.14		$ 0.00	49.07	$ 4,720,632.14		$ 0.00
6.09	RAMPA PEATONAL DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS TACTIL DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN	M2	13.95	$ 262,111.00	$ 3,656,448.45	13.95	3,656,448.45	13.95	3,656,448.45		$ 0.00	13.95	$ 3,656,448.45		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	MATERIAL SELECCIONADO														
6.10	ESTAMPADO DE PISO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, INCLUYE PIGMENTANTE Y SELLANTE	M2	400.20	$ 59,718.00	$ 23,899,143.60	400.20	23,899,143.60	400.20	23,899,143.60		$ 0.00	400.20	$ 23,899,143.60		$ 0.00
6.11	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=40 KG/CM2, 1" ASENTAMIENTO S " ESPESOR=0.15 METROS, INCLUYE PASADORES DE LARGO 0.35 M Y D = 3/4" LISO A CADA 0,30 METROS Y BARRAS DE AMARRE DE 1/2" CORRUGADO DE 0.85 METROS DE LARGO Y 1.20 METRO DE SEPARACIÓN, INCLUYE ACERO PARA LOSAS REFORZADAS (VER ANEXO 1. PLANO MODULACION DE Llosas) CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	271.87	$ 132,524.00	$ 36,029,299.88	271.87	36,029,299.88	271.87	36,029,299.88		$ 0.00	271.87	$ 36,029,299.88		$ 0.00
TOTAL PISOS					$ 422,278,411.28		$ 422,278,411.28		$ 422,278,411.28		$ 0.00		$ 422,278,411.28		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

07	CUBIERTA - IMPERMEABLIZACION - ASILAMIENTO														
7.01	Suministro y montaje de Cubierta tipo ATAC en cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de lámina estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante, y accesorios, fijados mecánicamente a correa estructural. Incluso parte proporcional de elementos de fijación, accesorios y juntas. Estructura metálica ligera autoportante en cubiertas, formada por perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío y galvanizados, según diseño estructural. Incluso p/p de	M2	1,028.90	$ 321,141.00	$ 330,421,974.90	28.90	9,280,974.90	28.90	9,280,974.90		$ 0.00	28.90	$ 9,280,974.90		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	elementos de anclaje.														
7.02	Suministro e instalacion de sistema de impermeabilizacion membrana PVC Danopol FV 1.2 o equivalente (Incluye preparacion de superficie, equipos, herramientas y materiales para su correcta instalacion) Bajo superficie en Deck Flotante	M2	973.50	$ 172,560.00	$ 167,987,160.00	973.50	167,987,160.00	973.50	167,987,160.00		$ 0.00	973.50	$ 167,987,160.00		$ 0.00
7.03	Suministro e instalacion de Aislamiento Termico en laminas Danopren TR 60 o equivalente (Incluye equipos, herramientas y materiales para su correcta instalacion) Bajo superficie en Deck Flotante	M2	523.10	$ 148,092.00	$ 77,466,925.20	523.10	77,466,925.20	523.10	77,466,925.20		$ 0.00	523.10	$ 77,466,925.20		$ 0.00
7.04	Suministro e instalacion de sistema de Danolosas color gris de 7,5 cm de espesor o	M2	150.00	$ 298,151.00	$ 44,722,650.00	150.00	44,722,650.00	150.00	44,722,650.00		$ 0.00	150.00	$ 44,722,650.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriaymyicos@gmail.com

	equivelente (Incluye preparacion de superficie, equipos, herramientas y materiales para su correcta instalacion) para Cubierta en Dandosa														
TOTAL CUBIERTA - IMPERMEABLIZACION - ASILAMIENTO					$ 620,598,710.10		$ 299,457,710.10		$ 299,457,710.10		$ 0.00	0.00	$ 299,457,710.10		$ 0.00
08	ENCHAPE														
8.01	ENCHAPE PARA MURO DE ZONAS HUMEDAS EN CERAMICA MARFIL 30 X 60 CMS ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE	M2	287.17	$ 57,249.00	$ 16,440,195.33	287.17	$ 16,440,195.33	287.17	16,440,195.33		$ 0.00	287.17	$ 16,440,195.33		$ 0.00
8.02	ENCHAPE PARA MURO COCINAS EN CERAMICA 30 X 60 CM. ALTA RESITENCIA AL DESGASTE COLOR SEGÚN DISEÑO ARQ.	M2	1,044.77	$ 60,449.00	$ 63,155,301.73	1,044.77	$ 63,155,301.73	1044.77	63,155,301.73		$ 0.00	1044.77	$ 63,155,301.73		$ 0.00
8.03	ENCHAPE PARA MURO VESTIER EN CERAMICA BLANCA 30 X 60 CM	M2	143.30	$ 57,888.00	$ 8,295,350.40	143.30	$ 8,295,350.40	143.30	8,295,350.40		$ 0.00	143.30	$ 8,295,350.40		$ 0.00
TOTAL ENCHAPE					$ 87,890,847.46		$ 87,890,847.46		$ 87,890,847.46		$ 0.00		$ 87,890,847.46		$ 0.00
09	APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS BAÑOS														
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL CON ENTRADA SUPERIOR, CUMPLIMIENTO	UND	24.00	$ 1,051,455.00	$ 25,234,920.00	24.00	25,234,920.00	24.00	25,234,920.00		$ 0.00	24.00	$ 25,234,920.00		$ 0.00

Barrocebermeja - Santander (607) 602 3465 ingconsultoriaymedes@gmail.com

	REQUERMIENTO A.D.A, DESCARGA CON FLUXOMETRO Y SENSOR														
9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	2.00	$ 663,696.00	$ 1,327,392.00	2.00	1,327,392.00	2.00	1,327,392.00		$ 0.00	2.00	$ 1,327,392.00		$ 0.00
9.03	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL DE TANQUE, ANTIVANDALICO , DESCARGA TURBOFLUSH	UND	2.00	$ 1,136,872.00	$ 2,273,744.00	2.00	2,273,744.00	2.00	2,273,744.00		$ 0.00	2.00	$ 2,273,744.00		$ 0.00
9.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL REF. MEDIANO ENTRADA POSTERIOR TIPO INSTITUCIONAL CON VALVULA DUPLEX	UND	8.00	$ 1,261,000.00	$ 10,088,000.00	8.00	10,088,000.00	8.00	10,088,000.00		$ 0.00	8.00	$ 10,088,000.00		$ 0.00
9.05	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA, 53.5 X 34.5 CM	UND	16.00	$ 337,490.00	$ 5,399,840.00	16.00	5,399,840.00	16.00	5,399,840.00		$ 0.00	16.00	$ 5,399,840.00		$ 0.00
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON FRENTE CONCAVO, CERTIFICADO A.D.A	UND	4.00	$ 469,665.00	$ 1,878,660.00	4.00	1,878,660.00	4.00	1,878,660.00		$ 0.00	4.00	$ 1,878,660.00		$ 0.00
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ANTIVANDALICA	UND	8.00	$ 534,096.00	$ 4,272,768.00	8.00	4,272,768.00	8.00	4,272,768.00		$ 0.00	8.00	$ 4,272,768.00		$ 0.00

Barrancabermeja – Santander (607) 602 3465 ingenieriamyclas@gmail.com

	CON REGADERA EMPOTRADA														
9.08	MESON EN GRANITO	M2	11.95	$ 449,460.00	$ 5,371,047.00	11.95	5,371,047.00	11.95	5,371,047.00		$ 0.00	11.95	$ 5,371,047.00		$ 0.00
9.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE MESÓN PARA LAVAMANOS. FUNCIONAMIENTO CON SENSOR INFRARROJO. ACABADO: CROMADO	UND	16.00	$ 1,645,320.00	$ 26,325,120.00	16.00	26,325,120.00	16.00	26,325,120.00		$ 0.00	16.00	$ 26,325,120.00		$ 0.00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	UND	20.00	$ 692,819.00	$ 13,856,380.00	20.00	13,856,380.00	20.00	13,856,380.00		$ 0.00	20.00	$ 13,856,380.00		$ 0.00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE	UND	7.00	$ 736,359.00	$ 5,154,513.00	7.00	5,154,513.00	7.00	5,154,513.00		$ 0.00	7.00	$ 5,154,513.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydas@gmail.com

	DISEÑO EXCLUSIVO.														
9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO 4 MM RECTANGULAR 250 X 100 CMS	UND	4.00	$ 1,230,930.00	$ 4,923,720.00	4.00	4,923,720.00	4.00	4,923,720.00		$ 0.00	4.00	$ 4,923,720.00		$ 0.00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO 4 MM RECTANGULAR 70 X 50 CMS	UND	6.00	$ 368,010.00	$ 2,208,060.00	6.00	2,208,060.00	6.00	2,208,060.00		$ 0.00	6.00	$ 2,208,060.00		$ 0.00
9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR VERTICAL DE SOBRE PONER PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, CON CERRADURA	UND	8.00	$ 397,087.00	$ 3,176,696.00	8.00	3,176,696.00	8.00	3,176,696.00		$ 0.00	8.00	$ 3,176,696.00		$ 0.00
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE SOBREPONER EN PARED, PARA JABÓN LÍQUIDO, METÁLICO CROMADO.	UND	12.00	$ 344,621.00	$ 4,135,452.00	12.00	4,135,452.00	12.00	4,135,452.00		$ 0.00	12.00	$ 4,135,452.00		$ 0.00
9.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO CON SENSOR AUTOMÁTICO EN ALUMINIO	UND	8.00	$ 1,279,020.00	$ 10,232,160.00	8.00	10,232,160.00	8.00	10,232,160.00		$ 0.00	8.00	$ 10,232,160.00		$ 0.00
9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR JUMBO DE SOBREPONER PARA PAPEL	UND	26.00	$ 291,505.00	$ 7,579,130.00	26.00	7,579,130.00	26.00	7,579,130.00		$ 0.00	26.00	$ 7,579,130.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3665 ingenieriaymydas@gmail.com

	HIGIÉNICO, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO														
9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 8 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS.	UND	22.00	$ 70,576.00	$ 1,552,672.00	22.00	1,552,672.00	22.00	1,552,672.00		$ 0.00	22.00	$ 1,552,672.00		$ 0.00
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA METALICA EN ACERO INOXIDABLE 304 CAPACIDAD 12 LT. MEDIDAS 40X31X13 CM	UND	8.00	$ 421,844.00	$ 3,374,752.00	8.00	3,374,752.00	8.00	3,374,752.00		$ 0.00	8.00	$ 3,374,752.00		$ 0.00
TOTAL APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS BAÑOS					$ 138,365,026.00		$ 138,365,026.00		$ 138,365,026.00		$ 0.00		$ 138,365,026.00		$ 0.00
10	CIELO RASO Y DIVISIONES														
10.01	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2", INCLUYE AISLAMIENTO EN LANA DE VIDRIO	M2	762.09	$ 55,146.00	$ 42,025,453.05	762.09	42,025,453.05	762.09	42,025,453.05		$ 0.00	762.09	$ 42,025,453.05		$ 0.00
10.02	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" RH	M2	552.30	$ 53,396.00	$ 29,490,610.80	552.30	29,490,610.80	552.30	29,490,610.80		$ 0.00	552.30	$ 29,490,610.80		$ 0.00
10.03	ELEMENTOS DECORATIVOS DESCOLGADOS EN ALUZINC PARA CIELO FALSO EXTERIOR, COLORES SEGÚN DISEÑO ARQ. INCLUIDO PINTURA DE ACABADO	M2	389.14	$ 484,872.00	$ 188,683,090.08	389.14	188,683,090.08	389.14	188,683,090.08		$ 0.00	4.14	$ 2,007,370.08		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyrsas@gmail.com

10.04	ELEMENTOS DECORATIVOS DESCOLGADOS EN MDF PARA CIELO FALSO INTERIOR COLORES SEGÚN DISEÑO ARQ. INCLUIDO PINTURA DE ACABADO	M2	418.75	$ 724,587.00	$ 303,420,806.25	18.75	13,586,006.25	18.75	13,586,006.25		$ 0.00	18.75	$ 13,586,006.25		$ 0.00
	TOTAL CIELO RASO Y DIVISIONES				$ 563,619,960.18		$ 273,785,160.18		$ 273,785,160.18		$ 0.00		$ 87,109,440.18		$ 0.00
11	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA														
11.01	VENTANA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCOLORO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO	M2	6.96	$ 713,492.00	$ 4,965,904.32	6.96	4,965,904.32	6.96	4,965,904.32		$ 0.00	6.96	$ 4,965,904.32		$ 0.00
11.02	ESTERA METALICA PARA CERRAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES CON VARILLA DE ACERO INTERNA	M2	85.84	$ 686,128.00	$ 58,897,055.84	85.84	58,897,055.84	85.84	58,897,055.84		$ 0.00	85.84	$ 58,897,055.84		$ 0.00
11.03	PUERTA BATIENTE EN MALLA METÁLICA 2.40m x 2.05m CON ABERTURAS DE 0.4m, TUBULAR EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 2,5mm	UND	1.00	$ 1,521,622.00	$ 1,521,622.00	1.00	1,521,622.00	1.00	1,521,622.00		$ 0.00	1.00	$ 1,521,622.00		$ 0.00
11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE CORREDIZA EN MALLA METÁLICA 7m x 2.05m TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 2.5mm	UND	2.00	$ 4,245,597.00	$ 8,491,194.00	2.00	8,491,194.00	2.00	8,491,194.00		$ 0.00	2.00	$ 8,491,194.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyclaa@gmail.com

11.05	PUERTA BATIENTE CORTA FUEGOS 60 mins, HOJA 22 Y ACABADO RAL 9018 1m x 2.15m	UND	2.00	$ 3,441,079.00	$ 6,882,158.00	2.00	6,882,158.00	2.00	6,882,158.00		$ 0.00	2.00	$ 6,882,158.00		$ 0.00
11.06	PUERTA DOBLE BATIENTE CORTA FUEGOS 60min CALIBRE 22 ACABADO RAL 9018 1.2m. x 2.15m	UND	1.00	$ 3,897,574.00	$ 3,897,574.00	1.00	3,897,574.00	1.00	3,897,574.00		$ 0.00	1.00	$ 3,897,574.00		$ 0.00
11.07	PUERTA BATIENDE CON HOJA DE 38mm DE ESPESOR EN ACERO GALVANIZADO de 0,05mm Y RELLENO EN POLIURENATNO DE 1mm	M2	49.93	$ 278,517.00	$ 13,906,353.81	49.93	13,906,353.81	49.93	13,906,353.81		$ 0.00	49.93	$ 13,906,353.81		$ 0.00
11.08	PUERTA DOBLE BATIENTE CON HOJA DE 38mm DE ESPESOR EN ACERO GALVANIZADO de 0,05mm Y RELLENO EN POLIURENATNO DE 1mm	M2	35.47	$ 301,043.00	$ 10,677,995.21	35.47	10,677,995.21	35.47	10,677,995.21		$ 0.00	35.47	$ 10,677,995.21		$ 0.00
11.09	PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANODIZADO DE 1m DE ANCHO x 2.5m DE ALTO	M2	79.95	$ 568,033.00	$ 45,414,238.35	79.95	45,414,238.35	79.95	45,414,238.35		$ 0.00	79.95	$ 45,414,238.35		$ 0.00
11.10	PUERTA DOBLE BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANODIZADO	M2	13.50	$ 624,187.00	$ 8,426,524.50	13.50	8,426,524.50	13.50	8,426,524.50		$ 0.00	13.50	$ 8,426,524.50		$ 0.00
11.11	PUERTA DOBLE CORREDIZA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO	M2	10.50	$ 644,715.00	$ 6,769,507.50	10.50	6,769,507.50	10.50	6,769,507.50		$ 0.00	10.50	$ 6,769,507.50		$ 0.00

Barroncabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydcas@gmail.com

	SOBRE MARCO DE ALUMINO ANODIZADO														
TOTAL CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA					$ 169,850,127.53		$ 169,850,127.53		$ 169,850,127.53		$ 0.00		$ 169,850,127.53		$ 0.00
12	OBRAS EXTERIORES Y FACHADA														
12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DOBLE 5+6 MM CAMARA 12 MM INCOLORO PERFILERIA COLOR NATURAL	M2	610.27	$ 2,091,000.00	$ 1,276,074,570.00	610.27	1,276,074,570.00	610.27	1,276,074,570.00		$ 0.00	10.27	$ 21,474,570.00		$ 0.00
12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE TERMOACUSTICO TIPO SANDWICH E= 5 CM	M2	371.51	$ 374,574.00	$ 139,157,986.74	371.51	139,157,986.74	371.51	139,157,986.74		$ 0.00	71.51	$ 26,785,786.74		$ 0.00
12.03	FACHADA METALICA PREFABRICADA SEGÚN DISEÑO ARQ.	ML	2,043.00	$ 1,139,726.00	$ 2,328,460,218.00	338.98	386,343,198.22	386.38	440,371,799.11		$ 0.00	16.38	$ 18,673,179.11		$ 0.00
12.04	ASCENSOR PASAJEROS CAP 800 KG, SIN CUARTO DE MAQUINA	UND	1.00	$ 218,187,152.00	$ 218,187,152.00	1.00	218,187,152.00	1.00	218,187,152.00		$ 0.00	1.00	$ 218,187,152.00		$ 0.00
12.05	ASCENSOR SERVICIO 450 KG, SIN CUARTO DE MAQUINA	UND	1.00	$ 159,886,855.00	$ 159,886,855.00	1.00	159,886,855.00	1.00	159,886,855.00		$ 0.00	1.00	$ 159,886,855.00		$ 0.00
12.06	CHAPA METALICA MICROPERFORADA	M2	72.46	$ 919,097.00	$ 66,597,768.62	72.46	66,597,768.62	72.46	66,597,768.62		$ 0.00	72.46	$ 66,597,768.62		$ 0.00
12.07	BARANDA EN TUBO ACERO INOXDIABLE SECCION CUADRADA CON PARALES SEPARACIÓN CADA 15cm, H= 1.1m	ML	399.43	$ 181,323.00	$ 72,425,845.89	399.43	72,425,845.89	399.43	72,425,845.89		$ 0.00	399.43	$ 72,425,845.89		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydas@gmail.com

12.08	BARANDA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE SECCION CUADRADA, H=1.1m, CON ANTEPECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM	ML	184.70	$ 365,808.00	$ 67,564,737.60	184.70	67,564,737.60	184.70	67,564,737.60		$ 0.00	184.70	$ 67,564,737.60		$ 0.00
12.09 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA PARA COCINAS	UND		$ 5,687,624.88							$ 0.00	52.00	$ 295,756,493.97		$ 0.00
12.10 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUEADERO CON DUPLICADOR INTELIGENTE	UND		$ 99,517,073.72							$ 0.00	2.00	$ 199,034,147.44		$ 0.00
TOTAL OBRAS EXTERIORES Y FACHADA					$ 4,328,355,133.85		$ 2,386,238,114.07		$ 2,440,266,714.96		$ 0.00		$ 1,146,386,536.37		$ 0.00
13	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS														
13.10	Excavación A Mano (No incluye retiro del material sobrante)	M3	341.98	$ 36,498.00	$ 12,481,586.04	341.98	12,481,586.04	341.98	12,481,586.04		$ 0.00	341.98	$ 12,481,586.04	341.98	$ 12,481,586.04
									-		$ 0.00				$ 0.00
13.2	SISTEMA AGUA POTABLE								-		$ 0.00				$ 0.00
13.2.1	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 13.5 D=1/2" (Incluye Accesorios)	ML	403.23	$ 6,708.00	$ 2,704,867	403.23	2,704,866.84	403.23	2,704,866.84		$ 0.00	403.23	$ 2,704,866.84		$ 0.00
13.2.2	Suministro e Instalación De Válvula D = 1/2"	Und	6.00	$ 22,825.00	$ 136,950	6.00	136,950.00	6.00	136,950.00		$ 0.00	6.00	$ 136,950.00		$ 0.00
13.2.3	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=3/4" (Incluye Accesorios)	ML	10.40	$ 14,628.00	$ 152,131	10.40	152,131.20	10.40	152,131.20		$ 0.00	10.40	$ 152,131.20		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydas@gmail.com

13.2.4	Suministro e Instalación De Válvula D = 3/4"	Und	52.00	$ 26,150.00	$ 1,359,800	52.00	1,359,800.00	52.00	1,359,800.00		$ 0.00	52.00	$ 1,359,800.00		$ 0.00
13.2.5	Suministro e Instalación de tubería PVC RDE 21 D=1-1/2" (Incluye Accesorios)	ML	337.27	$ 21,924.00	$ 7,394,307	337.27	7,394,307.48	337.27	7,394,307.48		$ 0.00	337.27	$ 7,394,307.48		$ 0.00
13.2.6	Suministro e Instalación Válvula de bola tipo pesado D=1-1/2"	Und	10.00	$ 57,936.00	$ 579,360	10.00	579,360.00	10.00	579,360.00		$ 0.00	10.00	$ 579,360.00		$ 0.00
13.2.7	Suministro e Instalación de tubería PVC RDE 21 D=2" (Incluye Accesorios)	ML	99.02	$ 29,975.00	$ 2,968,125	99.02	2,968,124.50	99.02	2,968,124.50		$ 0.00	99.02	$ 2,968,124.50		$ 0.00
13.2.8	Suministro e Instalación de tubería PVC RDE 21 D=3" (Incluye Accesorios)	ML	12.02	$ 61,496.00	$ 739,182	12.02	739,181.92	12.02	739,181.92		$ 0.00	12.02	$ 739,181.92		$ 0.00
13.2.9	Suministro e instalación de punto potable de D= 1/2" para ducha	Und	8.00	$ 53,748.00	$ 429,984	8.00	429,984.00	8.00	429,984.00		$ 0.00	8.00	$ 429,984.00		$ 0.00
13.2.10	Suministro e instalación de punto potable de D= 1/2" para lavamanos / fregaderos de cocina / punto de aseo	Und	118.00	$ 36,639.00	$ 4,323,402	118.00	4,323,402.00	118.00	4,323,402.00		$ 0.00	118.00	$ 4,323,402.00		$ 0.00
13.2.11	Suministro e instalación de punto potable de D= 1-1/2" para inodoro / orinal	Und	34.00	$ 99,766.00	$ 3,392,044	34.00	3,392,044.00	34.00	3,392,044.00		$ 0.00	34.00	$ 3,392,044.00		$ 0.00
13.2.12	Suministro e instalación Sistema bombeo Agua Potable (2 Bombas con Q=5.50 l/s y Hd=45.00 mca + 1 tanque hidroacumulador P=50-70 PSI y V=200 L)	GB	1.00	$ 22,724,205.00	$ 22,724,205	1.00	22,724,205.00	1.00	22,724,205.00		$ 0.00	1.00	$ 22,724,205.00		$ 0.00
13.2.13	Suministro e Instalación de Medidor D=3"	UND	1.00	$ 3,335,696.00	$ 3,335,696	1.00	3,335,696.00	1.00	3,335,696.00		$ 0.00	1.00	$ 3,335,696.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamycesa@gmail.com

13.2.14	Suministro e instalación de Medidor D=2" para tanque	UND	1.00	$ 2,694,894.00	$ 2,694,894	1.00	2,694,894.00	1.00	2,694,894.00		$ 0.00	1.00	$ 2,694,894.00		$ 0.00
13.2.15	Suministro e instalación de Medidor D=3/4" para locales	UND	52.00	$ 587,413.00	$ 30,545,476	52.00	30,545,476.00	52.00	30,545,476.00		$ 0.00	52.00	$ 30,545,476.00		$ 0.00
13.3	SISTEMA SANITARIO					0.00			-		$ 0.00				$ 0.00
13.3.1	Suministro e instalación de tubería PVC D=2" (Incluye Accesorios)	ML	203.84	$ 36,576.00	$ 7,455,651.84	203.84	7,455,651.84	203.84	7,455,651.84		$ 0.00	227.74	$ 8,329,818.24	84.91	$ 3,105,666.16
13.3.2	Suministro e instalación Sifón de Piso D=2"	Und	70.00	$ 38,580.00	$ 2,700,600.00	70.00	2,700,600.00	70.00	2,700,600.00		$ 0.00	70.00	$ 2,700,600.00		$ 0.00
13.3.3	Suministro e instalación de tubería PVC D=4" (Incluye Accesorios)	ML	257.97	$ 51,764.00	$ 13,353,559.08	257.97	13,353,559.08	257.97	13,353,559.08		$ 0.00	279.23	$ 14,454,061.72	90.95	$ 4,707,935.80
13.3.4	Suministro e instalación de tubería PVC D=6" (Incluye Accesorios)	ML	87.67	$ 101,453.00	$ 8,894,384.51	87.67	8,894,384.51	87.67	8,894,384.51		$ 0.00	147.69	$ 14,983,593.57	129.55	$ 13,143,236.15
13.3.5	Suministro e instalación Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 2" (Incluye Accesorios)	Und	78.00	$ 58,019.00	$ 4,525,482.00	78.00	4,525,482.00	78.00	4,525,482.00		$ 0.00	78.00	$ 4,525,482.00		$ 0.00
13.3.6	Suministro e instalación Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 4" (Incluye Accesorios)	Und	26.00	$ 92,257.00	$ 2,398,682.00	26.00	2,398,682.00	26.00	2,398,682.00		$ 0.00	26.00	$ 2,398,682.00		$ 0.00
13.3.7	Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mamposteria, Mortero De Pega 1:4, Peñetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado , Tapa En Concreto De 3000 Psi	Und	3.00	$ 330,461.00	$ 991,443.00	3.00	991,443.00	3.00	991,443.00		$ 0.00	13.00	$ 4,296,253.00	11.00	$ 3,635,291.00
13.3.8	Suministro e instalación Válvula	Und	1.00	$ 808,146.00	$ 808,146.00	1.00	808,146.00	1.00	808,146.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	Antirretorno PVC Sanitaria D=6"														
13.4	**SISTEMA DE VENTILACIÓN**					0.00			-		$ 0.00				$ 0.00
13.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC D=2" (Incluye Accesorios)	ML	13.20	$ 19,240.00	$ 253,968.00	13.20	253,968.00	13.20	253,968.00		$ 0.00	13.20	$ 253,968.00		$ 0.00
13.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC D=4" (Incluye Accesorios)	ML	5.40	$ 32,958.00	$ 177,973.20	5.40	177,973.20	5.40	177,973.20		$ 0.00	5.40	$ 177,973.20		$ 0.00
13.4.3	Suministro e instalación de Válvula de admisión de aire tipo Minivent D=2"	Und	66.00	$ 163,349.00	$ 10,781,034.00	66.00	10,781,034.00	66.00	10,781,034.00		$ 0.00	66.00	$ 10,781,034.00		$ 0.00
13.4.4	Suministro e instalación de Válvula de admisión de aire tipo Maxivent D=4"	Und	5.00	$ 269,394.00	$ 1,346,970.00	5.00	1,346,970.00	5.00	1,346,970.00		$ 0.00	5.00	$ 1,346,970.00		$ 0.00
13.5	**SISTEMA CONTRA INCENDIOS (UNIONES RANURADAS)**					0.00		0.00	-		$ 0.00	0.00			$ 0.00
13.5.1	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH40 1" (Incluye Accesorios)	ML	70.69	$ 51,321.00	$ 3,627,881.49	70.69	3,627,881.49	70.69	3,627,881.49		$ 0.00	70.69	$ 3,627,881.49		$ 0.00
13.5.2	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 2" (Incluye Accesorios)	ML	954.45	$ 80,843.00	$ 77,160,601.35	954.45	77,160,601.35	954.45	77,160,601.35		$ 0.00	954.45	$ 77,160,601.35		$ 0.00
13.5.3	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 2-1/2" (Incluye Accesorios)	ML	30.00	$ 101,271.00	$ 3,038,130.00	30.00	3,038,130.00	30.00	3,038,130.00		$ 0.00	30.00	$ 3,038,130.00		$ 0.00
13.5.4	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 4" (Incluye Accesorios)	ML	19.60	$ 140,650.00	$ 2,756,740.00	19.60	2,756,740.00	19.60	2,756,740.00		$ 0.00	19.60	$ 2,756,740.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyd@gmail.com

13.5.5	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 6" (Incluye Accesorios)	ML	11.36	$ 204,265.00	$ 2,320,450.40	11.36	2,320,450.40	11.36	2,320,450.40		$ 0.00	11.36	$ 2,320,450.40		$ 0.00
13.5.6	Suministro e instalación Válvula antiretorno BRONCE 4" BxB	Und	1.00	$ 979,508.00	$ 979,508.00	1.00	979,508.00	1.00	979,508.00		$ 0.00	1.00	$ 979,508.00		$ 0.00
13.5.7	Suministro e instalación Válvula de compuerta BRONCE 4" BxB	Und	1.00	$ 2,308,054.00	$ 2,308,054.00	1.00	2,308,054.00	1.00	2,308,054.00		$ 0.00	1.00	$ 2,308,054.00		$ 0.00
13.5.8	Suministro e instalación Válvula siamesa BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" BxB	Und	1.00	$ 999,756.00	$ 999,756.00	1.00	999,756.00	1.00	999,756.00		$ 0.00	1.00	$ 999,756.00		$ 0.00
13.5.9	Suministro e instalación Cabezal de Prueba BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" BxB	Und	1.00	$ 871,013.00	$ 871,013.00	1.00	871,013.00	1.00	871,013.00		$ 0.00	1.00	$ 871,013.00		$ 0.00
13.5.10	Suministro e instalación de tubería PVC C900 DR 14 4" (Incluye Accesorios)	ML	8.60	$ 1,704,298.00	$ 14,656,962.80	8.60	14,656,962.80	8.60	14,656,962.80		$ 0.00	8.60	$ 14,656,962.80		$ 0.00
13.5.11	Suministro e instalación de tubería PVC C900 DR 14 6" (Incluye Accesorios)	ML	45.10	$ 618,117.00	$ 27,877,076.70	45.10	27,877,076.70	45.10	27,877,076.70		$ 0.00	45.10	$ 27,877,076.70		$ 0.00
13.5.12	Suministro e instalación de VRP (Incluye Accesorios) Ver detalle	UND	6.00	$ 12,114,016.00	$ 72,684,096.00	6.00	72,684,096.00	6.00	72,684,096.00		$ 0.00	6.00	$ 72,684,096.00		$ 0.00
13.5.13	Suministro e instalación Conexión de Bomberos- Clase I	Und	4.00	$ 675,237.00	$ 2,700,948.00	4.00	2,700,948.00	4.00	2,700,948.00		$ 0.00	4.00	$ 2,700,948.00		$ 0.00
13.5.14	Suministro e instalación Rociadores tipo Pendent, K=5.6	Und	281.00	$ 141,896.00	$ 39,872,776.00	281.00	39,872,776.00	281.00	39,872,776.00		$ 0.00	281.00	$ 39,872,776.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

13.5.15	Suministro e instalación Bomba RCI (Q=750 GPM, Hd= 120 PSI) y equipo Jockey (Q=20 GPM, Hd=132 PSI)	Und	1.00	$ 122,372,896.00	$ 122,372,896.00	1.00	122,372,896.00	1.00	122,372,896.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
13.5.16 NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA RCI, EQUIPO LISTADO UL/FM (Q=750 GPM, HD= 120 PSI) Y EQUIPO JOCKEY (Q=20 GPM, HD=175 PSI), DIESEL TURBINA SUCCIÓN FINA, CON SUCCION VERTICAL	Und		$ 622,397,855.46								1.00	$ 622,397,855.46		
13.60	**SISTEMA AGUAS LLUVIA**								-		$ 0.00				$ 0.00
13.6.1	Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 4" (Incluye Accesorios)	ML	28.24	$ 40,451.00	$ 1,142,336.24	28.24	1,142,336.24	28.24	1,142,336.24		$ 0.00	28.24	$ 1,142,336.24	13.84	$ 559,841.84
13.6.2	Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 6" (Incluye Accesorios)	ML	205.53	$ 100,330.00	$ 20,620,824.90	205.53	20,620,824.90	205.53	20,620,824.90		$ 0.00	247.07	$ 24,788,533.10	87.00	$ 8,726,710.00
13.6.3	Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 8" (Incluye Accesorios)	ML	76.08	$ 149,705.00	$ 11,389,556.40	76.08	11,389,556.40	76.08	11,389,556.40		$ 0.00	142.46	$ 21,326,974.30	122.00	$ 18,264,010.00
13.6.4	Suministro e instalación Sifón de Piso D=4"	Und	6.00	$ 91,150.00	$ 546,900.00	6.00	546,900.00	6.00	546,900.00		$ 0.00	6.00	$ 546,900.00		$ 0.00
13.6.5	Suministro e instalación de rejilla cupula tragante 6"	Und	9.00	$ 152,215.00	$ 1,369,935.00	9.00	1,369,935.00	9.00	1,369,935.00		$ 0.00	9.00	$ 1,369,935.00		$ 0.00
13.6.6	Suministro e instalación Canaleta Poliester Reforzado Fibra	ML	83.40	$ 230,474.00	$ 19,221,531.60	83.40	19,221,531.60	83.40	19,221,531.60		$ 0.00	83.40	$ 19,221,531.60		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydcas@gmail.com

	Vidrio 0.30 m x 0.20 m														
13.6.7	Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mamposteria, Mortero De Pega 1:4, Pañetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado , Tapa En Concreto De 3000 Psi	Und	6.00	$ 334,659.00	$ 2,007,954.00	6.00	2,007,954.00	6.00	2,007,954.00		$ 0.00	8.00	$ 2,677,272.00	6.00	$ 2,007,954.00
13.6.8	Suministro e instalación Válvula Antirretorno PVC Sanitaria D=8"	Und	2.00	$ 2,038,352.00	$ 4,076,704.00	2.00	4,076,704.00	2.00	4,076,704.00		$ 0.00	4.00	$ 8,153,408.00		$ 0.00
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					$ 584,252,534.49		$ 584,252,534.49		$ 584,252,534.49		$ 0.00		$ 1,113,689,184.15		$ 66,634,232.99
14	INSTALACIONES ELECTRICAS														
14.1	ALIMENTADORES DE BAJA TENSION														
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCALES : 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	2,074.00	$ 45,147.00	$ 93,634,878.00	2074.00	93,634,878.00	2074.00	93,634,878.00		$ 0.00	2074.00	$ 93,634,878.00		$ 0.00
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR GABINETE TRANSFERENCIA PRINCIPAL : 3X6#500 KCMIL Cu + 6#500 KCMIL Cu + 1#250KCMIL T Cud (Fase con conductores con aislamiento	ML	30.00	$ 4,179,990.00	$ 125,399,700.00	30.00	125,399,700.00	30.00	125,399,700.00		$ 0.00	30.00	$ 125,399,700.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)														
14.1.3	ALIMENTADOR 3X2#4/0 AWG Cu + 2#4/0 AWG Cu + 1#4T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	30.00	$ 666,861.00	$ 20,005,830.00	30.00	20,005,830.00	30.00	20,005,830.00		$ 0.00	30.00	$ 20,005,830.00		$ 0.00
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ARMARIO DE MEDIDAS 3 : 3#300KCMIL Cu + 1#300 KCMIL Cu + 1#4T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	10.00	$ 533,358.00	$ 5,333,580.00	10.00	5,333,580.00	10.00	5,333,580.00		$ 0.00	10.00	$ 5,333,580.00		$ 0.00
14.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR BANCO CONDENSADORES 150KVAR : 3X3#4/0 AWG Cu + 3#4/0 AWG Cu + 1#2T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro	ML	15.00	$ 984,555.00	$ 14,768,325.00	15.00	14,768,325.00	15.00	14,768,325.00		$ 0.00	15.00	$ 14,768,325.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)														
14.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3#6 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	65.00	$ 66,466.00	$ 4,320,290.00	65.00	4,320,290.00	65.00	4,320,290.00		$ 0.00	65.00	$ 4,320,290.00		$ 0.00
14.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3#1/0 AWG Cu + 1#1/0 AWG Cu + 1#8T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	35.00	$ 239,186.00	$ 8,371,510.00	35.00	8,371,510.00	35.00	8,371,510.00		$ 0.00	35.00	$ 8,371,510.00		$ 0.00
14.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-AC1-P3-2: 3#2 AWG Cu + 1#2 AWG Cu + 1#8T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra	ML	20.00	$ 122,562.00	$ 2,451,240.00	20.00	2,451,240.00	20.00	2,451,240.00		$ 0.00	20.00	$ 2,451,240.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyclas@gmail.com

	con conductor de cobre desnudo)														
14.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-REFRIGRERACION: 3#4/0 AWG Cu + 1#4/0 AWG Cu + 1#6T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	30.00	$ 346,039.00	$ 10,381,170.00	30.00	10,381,170.00	30.00	10,381,170.00		$ 0.00	30.00	$ 10,381,170.00		$ 0.00
14.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-DATOS: 3#6 AWG Cu + 1#4 AWG Cu + 1#10T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	25.00	$ 77,120.00	$ 1,928,000.00	25.00	1,928,000.00	25.00	1,928,000.00		$ 0.00	25.00	$ 1,928,000.00		$ 0.00
14.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3#4 AWG Cu + 1#4 AWG Cu + 1#10T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro	ML	55.00	$ 91,440.00	$ 5,029,200.00	55.00	5,029,200.00	55.00	5,029,200.00		$ 0.00	55.00	$ 5,029,200.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyclass@gmail.com

	con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)														
14.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3X2#2/0 AWG Cu + 1#2T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	100.00	$ 442,569.00	$ 44,256,900.00	100.00	44,256,900.00	100.00	44,256,900.00		$ 0.00	100.00	$ 44,256,900.00		$ 0.00
14.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-UMAS (UNIDADES MANEJADORAS) : 3#1/0 AWG Cu + 1#1/0 AWG Cu + 1#6T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)	ML	30.00	$ 242,217.00	$ 7,266,510.00	30.00	7,266,510.00	30.00	7,266,510.00		$ 0.00	30.00	$ 7,266,510.00		$ 0.00
14.2	**CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS**							0.00			$ 0.00	0.00			$ 0.00
14.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: PARA LLEGADA A ARMARIO DE MEDIDORES Y TABLERO DE LOCAL	ML	2,074.00	$ 45,159.00	$ 93,659,766.00	2074.00	93,659,766.00	2074.00	93,659,766.00		$ 0.00	2074.00	$ 93,659,766.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydas@gmail.com

	;TUBERIA EMT 1", CURVA EMT 1", ADAPTADOR EMT 1")														
14.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 1-1/4", CURVA EMT 1-1/4", ADAPTADOR EMT 1-1/4"	ML	75.00	$ 49,017.00	$ 3,676,275.00	75.00	3,676,275.00	75.00	3,676,275.00		$ 0.00	75.00	$ 3,676,275.00		$ 0.00
14.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 2", CURVA EMT 2", ADAPTADOR EMT 2"	ML	45.00	$ 67,994.00	$ 3,059,730.00	45.00	3,059,730.00	45.00	3,059,730.00		$ 0.00	45.00	$ 3,059,730.00		$ 0.00
14.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-AC1-P3-2: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 1-1/2", CURVA EMT 1-1/2", ADAPTADOR EMT 1-1/2"	ML	10.00	$ 54,569.00	$ 545,690.00	10.00	545,690.00	10.00	545,690.00		$ 0.00	10.00	$ 545,690.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydaa@gmail.com

14.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES ; TUBERIA EMT 3", CURVA EMT 3", ADAPTADOR EMT 3"	ML	230.00	$ 140,692.00	$ 32,405,160.00	230.00	32,405,160.00	230.00	32,405,160.00		$ 0.00	230.00	$ 32,405,160.00		$ 0.00
14.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO PARA CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN DE 0.3MTX0.3MT, INCLUYE MARCACIONES PARA IDENTIFICACION DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS	UND	33.00	$ 222,714.00	$ 7,349,562.00	33.00	7,349,562.00	33.00	7,349,562.00		$ 0.00	33.00	$ 7,349,562.00		$ 0.00
14.3	**INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL**							0.00	-		$ 0.00	0.00			$ 0.00
14.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAC, 1#12F+1#12N+1 #12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"	UND	801.00	$ 124,144.00	$ 99,439,344.00	801.00	99,439,344.00	801.00	99,439,344.00		$ 0.00	801.00	$ 99,439,344.00		$ 0.00
14.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION EMERGENCIA 120VAC, 1#12F+1#12N+1 #12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"	UND	35.00	$ 108,141.00	$ 3,784,935.00	35.00	3,784,935.00	35.00	3,784,935.00		$ 0.00	35.00	$ 3,784,935.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriaydsas@gmail.com

14.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC, 1#12F+1#12N+1 #12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"	UND	13.00	$ 97,734.00	$ 1,270,542.00	13.00	1,270,542.00	13.00	1,270,542.00		$ 0.00	13.00	$ 1,270,542.00		$ 0.00
14.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR SENCILLO, 1#12F+1#12N+1 #12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"	UND	21.00	$ 134,376.00	$ 2,821,896.00	21.00	2,821,896.00	21.00	2,821,896.00		$ 0.00	21.00	$ 2,821,896.00		$ 0.00
14.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA EXTRACTOR LOCALES COCINA CALIENTE, 3#12F+1#12N+1 #12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"	UND	31.00	$ 182,801.00	$ 5,666,831.00	31.00	5,666,831.00	31.00	5,666,831.00		$ 0.00	31.00	$ 5,666,831.00		$ 0.00
14.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PVC SCH 40 1/2" - 1#12F + 1#12 N + 1#12 T	ML	1,200.00	$ 24,737.00	$ 29,684,400.00	1200.00	29,684,400.00	1200.00	29,684,400.00		$ 0.00	1200.00	$ 29,684,400.00		$ 0.00
14.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 1#12F + 1#12 N + 1#12 T PVC 1/2"	ML	50.00	$ 19,903.00	$ 995,150.00	50.00	995,150.00	50.00	995,150.00		$ 0.00	50.00	$ 995,150.00		$ 0.00
14.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIEN	UND	3.00	$ 172,046.00	$ 516,138.00	3.00	516,138.00	3.00	516,138.00		$ 0.00	3.00	$ 516,138.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyfsas@gmail.com

	TE TIERRA AISLADA, 120VAC, 1#12F+1#12N+1 #12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"														
14.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MANEJADORA AIRES ACONDICIONADOS 220VAC, 2#12F+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", CORAZA LT 1/2" (CUARTO DATOS, OFICINA)	UND	2.00	$ 268,372.00	$ 536,744.00	2.00	536,744.00	2.00	536,744.00		$ 0.00	2.00	$ 536,744.00		$ 0.00
14.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONDENSADORA AIRES ACONDICIONADOS 220 VAC, 3#10F+1#10T EN TUBERIA EMT 1", CORAZA LT 1" (CUARTO DATOS, OFICINA)	UND	2.00	$ 484,058.00	$ 968,116.00	2.00	968,116.00	2.00	968,116.00		$ 0.00	2.00	$ 968,116.00		$ 0.00
14.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2"	UND	35.00	$ 100,828.00	$ 3,528,980.00	35.00	3,528,980.00	35.00	3,528,980.00		$ 0.00	35.00	$ 3,528,980.00		$ 0.00
14.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL GFCI 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2"	UND	8.00	$ 144,227.00	$ 1,153,816.00	8.00	1,153,816.00	8.00	1,153,816.00		$ 0.00	8.00	$ 1,153,816.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingcarrismyd.sas@gmail.com

14.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 220 VAC, 2#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2"	UND	8.00	$ 160,779.00	$ 1,286,232.00	8.00	1,286,232.00	8.00	1,286,232.00		$ 0.00	8.00	$ 1,286,232.00		$ 0.00
14.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR COCINA, 3#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" (UBICADOS EN PISO 1)	UND	3.00	$ 153,012.00	$ 459,036.00	3.00	459,036.00	3.00	459,036.00		$ 0.00	3.00	$ 459,036.00		$ 0.00
14.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CUARTO FRIO, 2#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"	UND	3.00	$ 174,816.00	$ 524,448.00	3.00	524,448.00	3.00	524,448.00		$ 0.00	3.00	$ 524,448.00		$ 0.00
14.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE BAÑO 220VAC , 2#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"	UND	5.00	$ 178,304.00	$ 891,520.00	5.00	891,520.00	5.00	891,520.00		$ 0.00	5.00	$ 891,520.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydasa@gmail.com

14.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE BAÑO 120VAC , 1#12F+1#12N+1 #12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"	UND	4.00	$ 163,685.00	$ 654,740.00	4.00	654,740.00	4.00	654,740.00		$ 0.00	4.00	$ 654,740.00		$ 0.00
14.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA RECUPERADORAS DE AIRE 220VAC, 3#12+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2"	UND	3.00	$ 246,915.00	$ 740,745.00	3.00	740,745.00	3.00	740,745.00		$ 0.00	3.00	$ 740,745.00		$ 0.00
14.3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA UMA 220VAC, 3#6+1#10T EN TUBERIA PVC SCH 40 1", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1"	UND	3.00	$ 510,447.00	$ 1,531,341.00	3.00	1,531,341.00	3.00	1,531,341.00		$ 0.00	3.00	$ 1,531,341.00		$ 0.00
14.3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO VRF 220VAC, 3#8+1#10T EN TUBERIA EMT 1", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1"	UND	1.00	$ 561,206.00	$ 561,206.00	1.00	561,206.00	1.00	561,206.00		$ 0.00	1.00	$ 561,206.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydeas@gmail.com

14.3.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO VRF 220VAC, 3#4+1#8T EN TUBERIA EMT 1-1/4", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1-1/4"	UND	2.00	$ 975,230.00	$ 1,950,460.00	2.00	1,950,460.00	2.00	1,950,460.00		$ 0.00	2.00	$ 1,950,460.00		$ 0.00
14.3.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONDENSADOR A 220VAC, 3#12+1#12+1#12T EN TUBERIA EMT 3/4", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 3/4"	UND	3.00	$ 385,282.00	$ 1,155,846.00	3.00	1,155,846.00	3.00	1,155,846.00		$ 0.00	3.00	$ 1,155,846.00		$ 0.00
14.4	**LUMINARIAS**							0.00	-		$ 0.00	0.00			$ 0.00
14.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL LED CUADRADO POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120VAC, 4000K, 60X60 CM, IP 40, 4800LM, PARA MONTAJE EN CIELO RASO (OFICINAS ADMINISTRATIVAS)	UND	7.00	$ 216,645.00	$ 1,516,515.00	7.00	1,516,515.00	7.00	1,516,515.00		$ 0.00	7.00	$ 1,516,515.00		$ 0.00
14.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TENSOFLEX CON CINTA LED 4000K, 24W, 24V, IP65. INCLUYE DRIVER 24V, 96W 120-277V Y SOPORTE	UND	5.00	$ 5,469,465.00	$ 27,347,325.00	5.00	27,347,325.00	5.00	27,347,325.00		$ 0.00	5.00	$ 27,347,325.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydas@gmail.com

	PLANO PARA CINTA LED, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION/FIJACION														
14.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 3W, 3000K, 120V, IP54. (GUIA DE JARDINERAS)	UND	15.00	$ 346,718.00	$ 5,200,770.00	15.00	5,200,770.00	15.00	5,200,770.00		$ 0.00	15.00	$ 5,200,770.00		$ 0.00
14.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACION 120VAC, 4200LM, IP 65, IRC 80 (CUARTOS TECNICOS, PASILLOS)	UND	107.00	$ 187,028.00	$ 20,011,782.00	107.00	20,011,782.00	107.00	20,011,782.00		$ 0.00	107.00	$ 20,011,782.00		$ 0.00
14.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO CAMPANA DECORATIVA (MATERIAL RATAN O MIMBRE) CON SOPORTE EN MADER, PORTALAMPARAS E27 Y BOMBILLA LED FILAMENTADA LUZ CALIDA (3000K)	UND	103.00	$ 531,265.00	$ 54,720,295.00	103.00	54,720,295.00	103.00	54,720,295.00		$ 0.00	103.00	$ 54,720,295.00		$ 0.00
14.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE , VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277VAC, AUTONOMIA 180 MINS, IP20,	UND	35.00	$ 117,664.00	$ 4,118,240.00	35.00	4,118,240.00	35.00	4,118,240.00		$ 0.00	35.00	$ 4,118,240.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydesa@gmail.com

	2X100LM. IRC 7', MONTAJE DE SOPREPONER, POTENCIA 3W, 6500K (AREAS COMUNES, ESCALERAS)														
14.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC (BAÑOS)	UND	12.00	$ 56,751.00	$ 681,012.00	12.00	681,012.00	12.00	681,012.00		$ 0.00	12.00	$ 681,012.00		$ 0.00
14.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED - FUSION FIXED 4000K, 950 LM, CRI 83, 11W (AREAS COMUNES)	UND	262.00	$ 811,343.00	$ 212,571,866.00	262.00	212,571,866.00	262.00	212,571,866.00		$ 0.00	262.00	$ 212,571,866.00		$ 0.00
14.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL CINTA LED BLANCO 4000K, 72W, 24V, IP65. INCLUYE DRIVER 24W/89W 120-277VAC - PERFIL DE ALUMINIO Y TAPA DE ALUMINIO (ESCALERAS ACCESO)	UND	17.00	$ 412,391.00	$ 7,010,647.00	17.00	7,010,647.00	17.00	7,010,647.00		$ 0.00	17.00	$ 7,010,647.00		$ 0.00
14.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL CINTA LED BLANCO 4000K, 72W, 24V, IP65. INCLUYE DRIVER 24W/89W 120-277VAC - PERFIL DE ALUMINIO Y TAPA DE ALUMINIO (BAÑOS)	UND	14.00	$ 762,557.00	$ 10,675,798.00	14.00	10,675,798.00	14.00	10,675,798.00		$ 0.00	14.00	$ 10,675,798.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydeas@gmail.com

14.4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED INDIRECTA PARA CUBIERTA, 20W-4000K	UND	24.00	$ 1,491,645.00	$ 35,799,480.00	24.00	35,799,480.00	24.00	35,799,480.00		$ 0.00	24.00	$ 35,799,480.00		$ 0.00
14.4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO KARDANICA 3000K, 120V-14W	UND	9.00	$ 698,773.00	$ 6,288,957.00	9.00	6,288,957.00	9.00	6,288,957.00		$ 0.00	9.00	$ 6,288,957.00		$ 0.00
14.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO, POTENCIA DE ENTRADA6.5W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120VAC, IP65, PARA INCRUSTAR EN PISO, (JARDINERAS)	UND	30.00	$ 200,567.00	$ 6,017,010.00	30.00	6,017,010.00	30.00	6,017,010.00		$ 0.00	30.00	$ 6,017,010.00		$ 0.00
14.4.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO BALA 120V, 7.5W, 4000K (FACHADA)	UND	190.00	$ 409,394.00	$ 77,784,860.00	190.00	77,784,860.00	190.00	77,784,860.00		$ 0.00	190.00	$ 77,784,860.00		$ 0.00
14.4.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO BALA MOON 120V, 4000K, 7W	UND	18.00	$ 85,824.00	$ 1,544,832.00	18.00	1,544,832.00	18.00	1,544,832.00		$ 0.00	18.00	$ 1,544,832.00		$ 0.00
14.5	**PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCIÓN**							0.00	-		$ 0.00	0.00			$ 0.00
14.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CTOS CON TAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (LOCALES)	UND	52.00	$ 266,640.00	$ 13,865,280.00	52.00	13,865,280.00	52.00	13,865,280.00		$ 0.00	52.00	$ 13,865,280.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydses@gmail.com

14.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 42 CTOS CON TAPA (AREAS COMUNES)	UND	7.00	$ 723,485.00	$ 5,064,395.00	7.00	5,064,395.00	7.00	5,064,395.00		$ 0.00	7.00	$ 5,064,395.00		$ 0.00
14.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 18 CTOS CON TAPA (SISTEMA REGULADO)	UND	1.00	$ 686,767.00	$ 686,767.00	1.00	686,767.00	1.00	686,767.00		$ 0.00	1.00	$ 686,767.00		$ 0.00
14.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 5 KVA TRIFASICA 208VAC. AUTONOMIA 90MINS	UND	1.00	$ 8,909,893.00	$ 8,909,893.00	1.00	8,909,893.00	1.00	8,909,893.00		$ 0.00	1.00	$ 8,909,893.00		$ 0.00
14.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 1X20A	UND	250.00	$ 19,637.00	$ 4,909,250.00	250.00	4,909,250.00	250.00	4,909,250.00		$ 0.00	250.00	$ 4,909,250.00		$ 0.00
14.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 2X20A	UND	42.00	$ 61,678.00	$ 2,590,476.00	42.00	2,590,476.00	42.00	2,590,476.00		$ 0.00	42.00	$ 2,590,476.00		$ 0.00
14.5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 3x30A	UND	35.00	$ 129,588.00	$ 4,535,580.00	35.00	4,535,580.00	35.00	4,535,580.00		$ 0.00	35.00	$ 4,535,580.00		$ 0.00
14.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	6.00	$ 1,028,045.00	$ 6,168,270.00	6.00	6,168,270.00	6.00	6,168,270.00		$ 0.00	6.00	$ 6,168,270.00		$ 0.00
14.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X40A COMO TOTALIZADOR	UND	53.00	$ 271,818.00	$ 14,406,354.00	53.00	14,406,354.00	53.00	14,406,354.00		$ 0.00	53.00	$ 14,406,354.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydeas@gmail.com

	DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE N°8AWG COBRE.														
14.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X80 COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE N°6AWG COBRE.	UND	7.00	$ 473,899.00	$ 3,317,293.00	7.00	3,317,293.00	7.00	3,317,293.00		$ 0.00	7.00	$ 3,317,293.00		$ 0.00
14.6	**SUBESTACION ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN**							0.00			$ 0.00	0.00			$ 0.00
14.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE N.2 AWG COBRE 133% 15KV (RECORRIDO DESDE SUBESTACION HASTA PUNTO DE CONEXION)	ML	100.00	$ 180,497.00	$ 18,049,700.00	100.00	18,049,700.00	100.00	18,049,700.00		$ 0.00	100.00	$ 18,049,700.00		$ 0.00
14.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" (2 TUBOS) (RECORRIDO DESDE SUBESTACION HASTA PUNTO DE CONEXION). INCLUYE ALAMBRE GUIA EN SU INTERIOR	ML	100.00	$ 88,853.00	$ 8,885,300.00	100.00	8,885,300.00	100.00	8,885,300.00		$ 0.00	100.00	$ 8,885,300.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	Y SEÑALIZACION CON CINTA DE PELIGRO. INCLUYE CRUCE DE VIA DE APROXIMADAMENTE 10 MTS CON TOPO														
14.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA EN NIVEL II (3 TCS 40/5A , 3 TPS 13200/208V, MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRONICO, BLOQUE DE PRUEBAS). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED	UND	1.00	$ 17,970,560.00	$ 17,970,560.00	1.00	17,970,560.00	1.00	17,970,560.00		$ 0.00	1.00	$ 17,970,560.00		$ 0.00
14.6.4	SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12MTS X 1050 KGF, INCLUYE BASE DE CONCRETO	UND	1.00	$ 2,590,268.00	$ 2,590,268.00	1.00	2,590,268.00	1.00	2,590,268.00		$ 0.00	1.00	$ 2,590,268.00		$ 0.00
14.6.5	SUMINSTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES EN POSTE (3 CORTACIRCUITOS , 3 DPS, CRUCETA METALICA)	UND	1.00	$ 3,041,001.00	$ 3,041,001.00	1.00	3,041,001.00	1.00	3,041,001.00		$ 0.00	1.00	$ 3,041,001.00		$ 0.00
14.6.6	SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3", PARA BAJANTE DE ACOMETIDA EN POSTE	ML	6.00	$ 601,981.00	$ 3,611,886.00	6.00	3,611,886.00	6.00	3,611,886.00		$ 0.00	6.00	$ 3,611,886.00		$ 0.00
14.6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15KV	UND	1.00	$ 2,515,635.00	$ 2,515,635.00	1.00	2,515,635.00	1.00	2,515,635.00		$ 0.00	1.00	$ 2,515,635.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	PARA CABLE PRIMARIO EN 2AWG COBRE XLPE 133%														
14.6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA MEDIA TENSION EN PISO PARA REDES SUBTARRANEAS (13.2KV), SEGÚN NORMA ESSA. INCLUYE MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS.	UND	4.00	$ 1,351,862.00	$ 5,407,448.00	4.00	5,407,448.00	4.00	5,407,448.00		$ 0.00	4.00	$ 5,407,448.00		$ 0.00
14.6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CODOS TIPO INTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2AWG COBRE XLPE 133%	UND	1.00	$ 2,081,204.00	$ 2,081,204.00	1.00	2,081,204.00	1.00	2,081,204.00		$ 0.00	1.00	$ 2,081,204.00		$ 0.00
14.6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 500 KVA 13200/208-120 VAC. INCLUYE TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1.00	$ 62,061,680.00	$ 62,061,680.00	1.00	62,061,680.00	1.00	62,061,680.00		$ 0.00	1.00	$ 62,061,680.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriaaydsas@gmail.com

14.6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ESPECIAL AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x) TRANSFERENCIA PRINCIPAL 208VAC EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO, FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1.00	$ 40,584,157.00	$ 40,584,157.00	1.00	40,584,157.00	1.00	40,584,157.00		$ 0.00	1.00	$ 40,584,157.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydcas@gmail.com

14.6.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CORRECCION DE FACTOR DE PONTENCIA. GABINETE ESPECIAL AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x) BANCO DE CONDENSADORES 150KVAR - 208VAC EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA IINCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO , FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO	UND	1.00	$ 22,310,543.00	$ 22,310,543.00	1.00	22,310,543.00	1.00	22,310,543.00		$ 0.00	1.00	$ 22,310,543.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyrlses@gmail.com

	HASTA LUGAR DEFINITIVO														
14.6.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES Nº1 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1.00	$ 14,696,537.00	$ 14,696,537.00	1.00	14,696,537.00	1.00	14,696,537.00		$ 0.00	1.00	$ 14,696,537.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingmeriamydss@gmail.com

14.6.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES Nº2 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1.00	$ 14,696,537.00	$ 14,696,537.00	1.00	14,696,537.00	1.00	14,696,537.00		$ 0.00	1.00	$ 14,696,537.00		$ 0.00
14.6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES Nº3 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO	UND	1.00	$ 10,128,134.00	$ 10,128,134.00	1.00	10,128,134.00	1.00	10,128,134.00		$ 0.00	1.00	$ 10,128,134.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriomydsas@gmail.com

	HASTA LUGAR DEFINITIVO														
14.6.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ESPECIAL AUTOSOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x)GABINETE AREAS COMUNES 208 VAC FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO , FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS	UND	1.00	$ 23,071,944.00	$ 23,071,944.00	1.00	23,071,944.00	1.00	23,071,944.00		$ 0.00	1.00	$ 23,071,944.00		$ 0.00

	EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO														
14.6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOGENERADOR INSONORIZADA DE 500 KVA - POTENCIA STAND BY EFECTICA HASTA 1500 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR, SILENCIADOR TIPO CRITICO,TANQUE COMBUSTIBLE PARA 7 HORAS DE AUTONOMIA Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1.00	$ 293,801,020.00	$ 293,801,020.00	1.00	293,801,020.00	1.00	293,801,020.00		$ 0.00	1.00	$ 293,801,020.00		$ 0.00

14.6.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE AUTOSOPORTADO IP20 TABLERO DE DISTRIBUCION BOMBA-AP 208VAC. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABA EN PINTURA ELECTROSTATICA. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1.00	$ 2,591,775.00	$ 2,591,775.00	1.00	2,591,775.00	1.00	2,591,775.00		$ 0.00	1.00	$ 2,591,775.00		$ 0.00
14.6.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALITICA GENERAL SEGÚN NORMATIVA RETIE PARA TABLEROS ELECTRICOS, TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, TUBERIAS, BANDEJDAS, REGISTROS ELECTRICOS, CONDUCTORES, ETC	GL	1.00	$ 1,504,142.00	$ 1,504,142.00	1.00	1,504,142.00	1.00	1,504,142.00		$ 0.00	1.00	$ 1,504,142.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyderas@gmail.com

14.6.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABIENTE CONTRA INCNEDIO (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO) PLANTA EBAR 3, INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1.00	$ 14,190,491.00	$ 14,190,491.00	1.00	14,190,491.00	1.00	14,190,491.00		$ 0.00	1.00	$ 14,190,491.00		$ 0.00
14.6.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA LOCALES (MEDIDA DIRECTA , MEDIDOR DE ENERGIA). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED	UND	52.00	$ 768,530.00	$ 39,963,560.00	52.00	39,963,560.00	52.00	39,963,560.00		$ 0.00	52.00	$ 39,963,560.00		$ 0.00
14.6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA AREAS COMUNES (MEDIDA SEMIDIRECTA , MEDIDOR DE ENERGIA, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED	UND	1.00	$ 4,204,437.00	$ 4,204,437.00	1.00	4,204,437.00	1.00	4,204,437.00		$ 0.00	1.00	$ 4,204,437.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriaanydeas@gmail.com

14.6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP REFRIGERACION (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1.00	$ 5,789,657.00	$ 5,789,657.00	1.00	5,789,657.00	1.00	5,789,657.00		$ 0.00	1.00	$ 5,789,657.00		$ 0.00
14.6.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-RECUPERADORAS DE AIRE (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1.00	$ 5,789,657.00	$ 5,789,657.00	1.00	5,789,657.00	1.00	5,789,657.00		$ 0.00	1.00	$ 5,789,657.00		$ 0.00
14.6.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-UMAS (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE	UND	1.00	$ 6,165,901.00	$ 6,165,901.00	1.00	6,165,901.00	1.00	6,165,901.00		$ 0.00	1.00	$ 6,165,901.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydas@gmail.com

	ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO														
14.6.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-ASCENSOR 1 (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1.00	$ 3,810,015.00	$ 3,810,015.00	1.00	3,810,015.00	1.00	3,810,015.00		$ 0.00	1.00	$ 3,810,015.00		$ 0.00
14.6.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-ASCENSOR 2 (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1.00	$ 3,810,015.00	$ 3,810,015.00	1.00	3,810,015.00	1.00	3,810,015.00		$ 0.00	1.00	$ 3,810,015.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydcas@gmail.com

14.6.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABIENTE PRINCIPAL (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO	UND	1.00	$ 42,847,456.00	$ 42,847,456.00	1.00	42,847,456.00	1.00	42,847,456.00		$ 0.00	1.00	$ 42,847,456.00		$ 0.00
14.6.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO BANDERA 13.2 KV EN POSTE	UND	1.00	$ 1,453,878.00	$ 1,453,878.00	1.00	1,453,878.00	1.00	1,453,878.00		$ 0.00	1.00	$ 1,453,878.00		$ 0.00
14.6.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA BAJA TENSION EN PISO PARA REDES SUBTARRANEAS (208VAC). INCLUYE MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS.	UND	2.00	$ 1,409,344.00	$ 2,818,688.00	2.00	2,818,688.00	2.00	2,818,688.00		$ 0.00	2.00	$ 2,818,688.00		$ 0.00
14.6.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA (ANALIZADOR DE RED CON COMUNICACIÓN MODBUS 96 X 95) PARA MONTAJE EN TABLERO DE	UND	1.00	$ 5,573,962.00	$ 5,573,962.00	1.00	5,573,962.00	1.00	5,573,962.00		$ 0.00	1.00	$ 5,573,962.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyclas@gmail.com

	TRANSFERENCIA PRINCIPAL.														
14.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA								-		$ 0.00	0.00			$ 0.00
14.7.1	Suministro e instalación de barraje equipotencial de 1000A. incluye aisladores y conexión a malla por medio de cable n. 2/0 AWG y soldadura exotérmica.	UND	3.00	$ 1,386,037.00	$ 4,158,111.00	3.00	4,158,111.00	3.00	4,158,111.00		$ 0.00	3.00	$ 4,158,111.00		$ 0.00
14.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA EN ALUMINIO REDONDEADA EN UN EXTREMO. LONGITUD 1CM, DIAMETRO 16MM, INCLUYE BASE Y CONECTOR CON CONDUCTOR	UND	16.00	$ 209,762.00	$ 3,356,192.00	16.00	3,356,192.00	16.00	3,356,192.00		$ 0.00	16.00	$ 3,356,192.00		$ 0.00
14.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO, DIAMETRO 8MM, PARA INSTALACION EN ANILLO SUPERIOR EN CUBIERTA. SEGÚN PLANOS ADJUNTOS	ML	220.00	$ 13,207.00	$ 2,905,540.00	220.00	2,905,540.00	220.00	2,905,540.00		$ 0.00	220.00	$ 2,905,540.00		$ 0.00
14.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0AWG, PARA SISTEMA DE PUESTA DE TIERRA.	ML	210.00	$ 74,456.00	$ 15,635,760.00	210.00	15,635,760.00	210.00	15,635,760.00		$ 0.00	210.00	$ 15,635,760.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydeas@gmail.com

14.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0AWG, PARA LOS BAJANTES. SEGÚN PLANOS ADJUNTOS	ML	165.00	$ 16,538.00	$ 2,728,770.00	165.00	2,728,770.00	165.00	2,728,770.00		$ 0.00	165.00	$ 2,728,770.00		$ 0.00
14.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA VARILLA - CABLE DE COBRE	UND	13.00	$ 62,126.00	$ 807,638.00	13.00	807,638.00	13.00	807,638.00		$ 0.00	13.00	$ 807,638.00		$ 0.00
14.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 25X25CM, IP666, CARA CONEXIÓN BIMETALICA POR BAJANTE	UND	9.00	$ 63,962.00	$ 575,658.00	9.00	575,658.00	9.00	575,658.00		$ 0.00	9.00	$ 575,658.00		$ 0.00
14.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE DE 2.4MTS DE LONGITUD Y 5/8" DE DIAMETRO.	UND	13.00	$ 312,329.00	$ 4,060,277.00	13.00	4,060,277.00	13.00	4,060,277.00		$ 0.00	13.00	$ 4,060,277.00		$ 0.00
14.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE PELIGRO DE BAJANATE DE DESCARGAS ATMOSFERICAS	UND	9.00	$ 49,565.00	$ 446,085.00	9.00	446,085.00	9.00	446,085.00		$ 0.00	9.00	$ 446,085.00		$ 0.00
14.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA ANILLO SUPERIOR EN POLIAMIDA CON ROSCA, PARA CALIBRE 8-10MM	UND	220.00	$ 14,426.00	$ 3,173,720.00	220.00	3,173,720.00	220.00	3,173,720.00			220.00	$ 3,173,720.00		
14.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION DE 30 X 30 CM CON TAPA REMOVIBLE	UND	2.00	$ 457,438.00	$ 914,876.00	2.00	914,876.00	2.00	914,876.00		$ 0.00	2.00	$ 914,876.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydcas@gmail.com

14.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC de 3/4" PARA BAJANTE EXPUESTO O EN MURO	ML	165.00	$ 19,751.00	$ 3,258,915.00	165.00	3,258,915.00	165.00	3,258,915.00		$ 0.00	165.00	$ 3,258,915.00		$ 0.00
14.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO ENTRE CABLE 1/0 AWG ALUMINIO Y CABLE 2/0 AWG COBRE	UND	9.00	$ 62,494.00	$ 562,446.00	9.00	562,446.00	9.00	562,446.00			9.00	$ 562,446.00		
14.8	**OBRAS CIVILES**							0.00	-			0.00			
14.8.1	EXCAVACION DE 40CM X 30CM, INCLUYE TAPE, COMPACTACION PARA LINEAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	ML	200.00	$ 9,197.00	$ 1,839,400.00	200.00	1,839,400.00	200.00	1,839,400.00		$ 0.00	200.00	$ 1,839,400.00		$ 0.00
Total INSTALACIONES ELECTRICAS					**$ 1,910,149,305.00**		**$ 1,910,149,305.00**		**$ 1,910,149,305.00**		**$ 0.00**		**$ 1,910,149,305.00**		**$ 0.00**
15	**TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA**														
15.1.	**SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES**														
15.1.1	Suministro e instalación Cable Categoría 6A F/UTP Violeta LSOH.	ML	3,355.00	$ 6,921.00	$ 23,219,955.00	3355.00	23,219,955.00	3355.00	23,219,955.00		$ 0.00	3355.00	$ 23,219,955.00		$ 0.00
15.1.2	Suministro e Instalación. Incluye Jack, patchcord de área de trabajo, patchcord de administración, faceplate doble, tapa ciega, marquillas y certificación de punto de datos.	UND	70.00	$ 283,656.00	$ 19,855,920.00	70.00	19,855,920.00	70.00	19,855,920.00		$ 0.00	70.00	$ 19,855,920.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyvias@gmail.com

15.1.3	Suministro e instalación de bandeja de fibra óptica completa, debe incluir mínimo 1 adaptador de 12 hilos de fibra LC, Break Out, 1 tapa ciega, bandeja porta fusión, fusión de hilos de fibra y certificación de hilos, mismo fabricante que cableado de cobre.	UND	1.00	$ 3,959,642.00	$ 3,959,642.00	1.00	3,959,642.00	1.00	3,959,642.00		$ 0.00	1.00	$ 3,959,642.00		$ 0.00
15.1.4	Suministro e instalación de gabinete de piso 1,80x58x61 cm, 40 U. Incluye herrajes, kit de tierra, organizadores horizontales, bandeja sencilla ventilada, kit de ventilación, multitoma horizontal de 12 salidas y consumibles de instalación.	UND	1.00	$ 6,740,507.00	$ 6,740,507.00	1.00	6,740,507.00	1.00	6,740,507.00		$ 0.00	1.00	$ 6,740,507.00		$ 0.00
15.2.	**NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS**					0.00	-	0.00	-		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
15.2.1	Suministro e Instalación de Switch L2 Administrable web, 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch -24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802,3u, ab); 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports; 2SFP+ (10gb), Latency: <5µs, <5µs, <1,5µs; Throughput: up to 95.2Mpps;	UND	3.00	$ 4,942,987.00	$ 14,828,961.00	3.00	14,828,961.00	3.00	14,828,961.00		$ 0.00	3.00	$ 14,828,961.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriaaydsas@gmail.com

	Switching Capacity 128Gbps, MAC Address 16384 entries, 1 RJ-45 console port to access limited CLI port, IMC, Web browser, limited command-line interface, SNMP Manager, IEEE 802.3 Ethernet MIB.														
15.2.2	Suministro e Instalación de Switch 24G 2SFP Switch, L2, Administrable web, 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3u, ab); 2SFP (1GB) ports Latency: <7µs, <2µs; Throughput: up to 38,6 Mpps; Switching Capacity 52 Gbps, MAC Address 8000 entries.	UND	1.00	$ 2,065,016.00	$ 2,065,016.00	1.00	2,065,016.00	1.00	2,065,016.00		$ 0.00	1.00	$ 2,065,016.00		$ 0.00
15.3.	**SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)**					0.00	-		-		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
15.3.1	Suministro e Instalación de Cámara minidomo 4 MP, Lente F 2,8mm, 120DB, Metálica, H.265+, IP67, IK10. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.	UND	17.00	$ 1,431,299.00	$ 24,332,083.00	17.00	24,332,083.00	17.00	24,332,083.00		$ 0.00	17.00	$ 24,332,083.00		$ 0.00
15.3.2	Suministro e Instalación de Cámara Bala 4 MP, D/N, Lente 2,8mm, 120DB, H.265+, IP67. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.	UND	11.00	$ 1,382,610.00	$ 15,208,710.00	11.00	15,208,710.00	11.00	15,208,710.00		$ 0.00	11.00	$ 15,208,710.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

15.3.3	Suministro e Instalación de Cámara PTZ 2MP DARKF, 25XZOOM H265+, WDR REAL DEFOG EIS HLC 3D-DNR POE+ 100 MTS IR. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.	UND	6.00	$ 4,079,566.00	$ 24,477,396.00	6.00	24,477,396.00	6.00	24,477,396.00		$ 0.00	6.00	$ 24,477,396.00		$ 0.00
15.3.4	Suministro e Instalación de NVR 32 canales HD 16 canales POE 256MBPS 4 Bahías Disco/8TB H.265 PRO. Incluye almacenamiento para 30 días de grabación	UND	2.00	$ 7,081,834.00	$ 14,163,668.00	2.00	14,163,668.00	2.00	14,163,668.00		$ 0.00	2.00	$ 14,163,668.00		$ 0.00
15.3.5	Suministro e Instalación de Workstation Precisión Intel Xeon Processor W-2223 (4C, 3.6GHz 3.9GHz Turbo HT 8.25MB (120W)) DDR4-2666 [RAM: 8GB 1x8GB DDR4 2933MHz RDIMM ECC Memory] 3.5" 1TB 7200rpm SATA Hard Drive] Windows 10 Pro for Workstations (up to 4 Cores) Multi - English, French, Spanish] NVIDIA® Quadro® P1000, 4GB, 4 mDP (5820T). Incluye pantalla de 24", teclado, mouse.	UND	1.00	$ 15,131,909.00	$ 15,131,909.00	1.00	15,131,909.00	1.00	15,131,909.00		$ 0.00	1.00	$ 15,131,909.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriaeydsas@gmail.com

15.3.6	Suministro e Instalación de Monitor Industrial Tamaño: 46", Resolución 1920X1080 (16:9), Brillo 500nit, Contraste: 3500:1, Caracteristicas: uso 24 horas/día, Bisel 3.5mm (borde a borde). Incluye soporte en pared y accesorios de fijación.	UND	2.00	$ 9,121,904.00	$ 18,243,808.00	2.00	18,243,808.00	2.00	18,243,808.00		$ 0.00	2.00	$ 18,243,808.00		$ 0.00
15.3.7	Suministro e Instalación de Extensor ethernet y PoE sobre UTP conecta a FLEX-Link o FLEX-C, Incluye terminal de 1 puerto FLEX ethernet sobre UTP 50W potencia, fuente 55VAC 60W para NV-FLXLK, NV-FLXLK-BSE, NV-ECLK-PLS.	UND	3.00	$ 2,682,829.00	$ 8,048,487.00	3.00	8,048,487.00	3.00	8,048,487.00		$ 0.00	3.00	$ 8,048,487.00		$ 0.00
15.3.8	Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de CCTV.	UND	1.00	$ 5,101,920.00	$ 5,101,920.00	1.00	5,101,920.00	1.00	5,101,920.00		$ 0.00	1.00	$ 5,101,920.00		$ 0.00
15.4.	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**					0.00	-		-		$ 0.00				$ 0.00
15.4.1.	**DETECCIÓN DE INCENDIOS ÁREA ADMINISTRATIVA, DE SERVICIOS Y LOCALES**					0.00	-		-		$ 0.00				$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydas@gmail.com

15.4.1.1	Suministro e Instalación de Panel Detección de Incendio FACP proporciona un bucle de dispositivo inteligente de Clase A o Clase B que admite hasta 250 direcciones de dispositivo. Los módulos de controlador de bucle se pueden agregar en combinación para expandir la capacidad total del sistema en incrementos de 250 puntos hasta un máximo de 1,000 direcciones de dispositivos. Los paneles VS4 incluyen cuatro NAC que pueden conectarse para la operación Clase A o Clase B. Incluye módulo expansor de 2 lazos, dos baterías de respaldo, y transporte.	UND	1.00	$ 8,560,347.00	$ 8,560,347.00	1.00	8,560,347.00	1.00	8,560,347.00		$ 0.00	1.00	$ 8,560,347.00		$ 0.00
15.4.1.2	Suministro e Instalación de Interfaz puerto Ethernet, RJ45. La tarjeta proporciona una conexión de red Ethernet 10/100 Base T estándar para conectarse a una intranet, una red local o Internet. La tarjeta se puede usar para descargar la programación de configuración desde el VS-CU al panel. La tarjeta	UND	1.00	$ 1,708,902.00	$ 1,708,902.00	1.00	1,708,902.00	1.00	1,708,902.00		$ 0.00	1.00	$ 1,708,902.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	Ethernet se instala en el conjunto de plástico y se conecta a la placa de circuito principal a través de un cable plano. Incuye transporte.														
15.4.1.3	Suministro e Instalación de Detector de Humo con Tecnologia Multisensor. Proporciona un sensor de humo óptico y un sensor de calor de tasa de aumento con un ajuste de temperatura fijo. Juntos, estos sensores detectan de manera eficiente incendios latentes, así como incendios de llamas rápidas. El sensor de calor de tasa de aumento integrado de KI-PHD proporciona una temperatura de 15 ° F (9 ° C) por minuto para la detección de incendios de rápido desarrollo, al mismo tiempo que proporciona un umbral de detección fijo de 135 ° F (57.2 ° C). Los sensores de calor controlan la temperatura del aire y determinan si se debe iniciar una alarma. Operating voltage 15.20 to 19.95 VDC. Normal operating current 51 µA. Alarm	UND	39.00	$ 453,669.00	$ 17,693,091.00	39.00	17,693,091.00	39.00	17,693,091.00		$ 0.00	39.00	$ 17,693,091.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	current 68 µA. Smoke Sensitivity Range UL/ULC: 0.53 to 3.94 %/ft. (1.7 to 12.35 %/m) obscuration. Rate-of-rise rating 15°F/min (8°C/min). Fixed temperature rating 135°F (57.2°C). Actual alarm point 129 to 141°F (53.9 to 60.6°C). Air velocity 0 to 4,000 ft./min (0 to 20.32 m/s). Wall mounting 12 in. (305 mm) max. from ceiling. Operating environment 32 to 100°F (0 to 38°C), 0 to 93% RH, noncondensing. Incluye caja 4x4 Rawelt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte.														
15.4.1.4	Suministro e instalación de Detector de Temperatura Rate-of-rise. Detector de incendios inteligente con índice de aumento. Monitorea la temperatura del aire circundante y analiza los datos del sensor para determinar si se debe iniciar una alarma. La función de calor de tasa de aumento detecta rápidamente un fuego rápido y en	UND	55.00	$ 294,785.00	$ 16,213,175.00	55.00	16,213,175.00	55.00	16,213,175.00		$ 0.00	55.00	$ 16,213,175.00		$ 0.00

	llamas. La función de calor de temperatura fija detecta fuego cuando la temperatura del aire cerca del detector excede el punto de alarma. Operating voltage 15.20 to 19.95 VDC. Normal operating current 51 µA. Alarm current 68 µA. Vibration level 10 to 35 Hz. with an amplitude of 0.01 in. Rate-of-rise rating 15°F/min (8°C/min). Fixed temperature rating 135°F (57.2°C). Actual alarm point 129 to 141°F (53.9 to 60.6°C). Incluye caja 4x4 Rawelt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte.														
15.4.1.5	Suministro e Instalación de Detector de Monóxido de Carbono,Alertar sobre niveles potencialmente peligrosos de CO en el área protegida. El sensor electroquímico interno se comunica con un sofisticado microprocesador integrado que rastrea con precisión los niveles de CO a lo largo del tiempo. Esta tecnología de detección de	UND	4.00	$ 786,985.00	$ 3,147,940.00	4.00	3,147,940.00	4.00	3,147,940.00		$ 0.00	4.00	$ 3,147,940.00		$ 0.00

	como resultado una respuesta rápida, detección confiable, tiempo de restablecimiento rápido y una inmunidad superior a falsas alarmas. Incluye módulo monitor, caja 4x4 Rewelt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte.														
15.4.1.6	Suministro e Instalación de Estación de Alarma de fuego de doble acción. Hechos de zinc fundido a presión y terminados con pintura en polvo epoxi roja complementada con rayas y marcas de color aluminio. Están equipadas con un interruptor de llave de alarma general (GA) para aplicaciones donde se requiere la operación en dos etapas. Operating Temperature: 32°F to 120°F (0°C to 49°C) Storage Temperature: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) Humidity: 0 to 93%. Construction & Finish: Lexan - Red with white markings. Operating Current: Standby = 250µA,	UND	16.00	$ 309,382.00	$ 4,950,112.00	16.00	4,950,112.00	16.00	4,950,112.00		$ 0.00	16.00	$ 4,950,112.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydcas@gmail.com

	Activated = 400µA. Addressing Requirements: Uses 1 Module Address. Incluye módulo monitor, caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte.														
15.4.17	Suministro e Instalación de Carcaza stopper sin sirena para Estación Manual. Este dispositivo único y patentado ayuda a prevenir falsas alarmas de incendio sin restringir las alarmas legítimas. Consiste en un protector y marco de policarbonato Lexan transparente a prueba de manipulaciones que se ajusta fácilmente a las estaciones de extracción manual. Incluye transporte.	UND	9.00	$ 184,102.00	$ 1,656,918.00	9.00	1,656,918.00	9.00	1,656,918.00		$ 0.00	9.00	$ 1,656,918.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

15.4.1.8	Suministro e Instalación de Sirena-estrobo pared 15, 30, 75 y 110 cd. Utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de menores requisitos de corriente. Las luces estroboscópicas cuentan con salida de luz de 15, 30, 75 o 110 cd seleccionable en campo. Operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR. Horn signal type Constant or TC3 temporal. Light output 15, 30, 75, or 110 candela. Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx. Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source. Synchronization Sources CC Series Signal Modules, Booster and Auxiliary Power Supplies,	UND	20.00	$ 350,080.00	$ 7,001,600.00	20.00	7,001,600.00	20.00	7,001,600.00		$ 0.00	20.00	$ 7,001,600.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydcas@gmail.com

	Intelligent and Conventional Control Panels. Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2). Dimensions (WxHxD) 4.95 x 5.78 x 1.62 in (12.57 x 14.68 x 4.11 cm). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios y transporte.														
15.4.1.9	Suministro e instalación de Módulo de entrada. Dispositivos direccionables analógicos inteligentes que se utilizan para conectar una alarma clase B normalmente abierta, supervisar o monitorear circuitos de dispositivos iniciadores de contacto seco (IDC). Description Single Input Module. Type Code 48 (factory set) Four sub-types (personality codes) are available. Address Requirements Uses One Module Address.	UND	6.00	$ 325,732.00	$ 1,954,392.00	6.00	1,954,392.00	6.00	1,954,392.00		$ 0.00	6.00	$ 1,954,392.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3445 ingenieriamydsas@gmail.com

	Operating Current Standby = 250µA; Activated = 400µA; Operating Voltage 15.2 to 19.95 Vdc (19 Vdc nominal). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte.														
15.4.1.10	Suministro e instalación de Módulo de control simple. Dispositivos direccionables analógicos inteligentes que se utilizan para conectar, a pedido del controlador de bucle, señales supervisadas de clase B o circuitos telefónicos a sus respectivas entradas de alimentación. Description Single Input (Riser) Signal Module. Type Code 50 (factory set) Two sub-types (personality codes) are available. Address Requirements Uses one module address. Wiring Terminations Suitable for #12 to #18 AWG (2.5 mm² to 0.75mm²). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte.	UND	10.00	$ 284,846.00	$ 2,848,460.00	10.00	2,848,460.00	10.00	2,848,460.00		$ 0.00	10.00	$ 2,848,460.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

15.4.1.11	Suministro e instalación de Anunciador LCD de 80 caracteres, indicadores comunes de sistema y controles, beige. Incluye accesorios, regata y transporte.	UND	1.00	$ 1,380,394.00	$ 1,380,394.00	1.00	1,380,394.00	1.00	1,380,394.00		$ 0.00	1.00	$ 1,380,394.00		$ 0.00
15.4.1.12	Suministro e Instalación de fuente para sirenas de 10 A, 120 VAC. Incluye dos baterías de respaldo, módulo monitor, y transporte.	UND	1.00	$ 1,923,651.00	$ 1,923,651.00	1.00	1,923,651.00	1.00	1,923,651.00		$ 0.00	1.00	$ 1,923,651.00		$ 0.00
15.4.1.13	Suministro e instalación de Cable de incendio 16 AWG FPLR. Overal Cabling Color Code: 1 Black, 1 Red. Number conductors: 2. Stranding Solid. Conductor material: BC-Bare Copper. Operating Temperature Range: -20°C To +75°C. UL Temperature Rating: 75°C. Max. Recommended Pulling Tension: 39.200 lbs. Incluye transporte.	ML	3,355.00	$ 4,139.00	$ 13,886,345.00	3355.00	13,886,345.00	3355.00	13,886,345.00		$ 0.00	3355.00	$ 13,886,345.00		$ 0.00
15.4.1.14	Mano de obra para configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del Sistema de Detección de Incendios de	UND	1.00	$ 5,258,725.00	$ 5,258,725.00	1.00	5,258,725.00	1.00	5,258,725.00		$ 0.00	1.00	$ 5,258,725.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydeas@gmail.com

	acuerdo con Norma NFPA 72.														
15.4.2 .	DETECCIÓN DE INDENCIOS ÁREA DE COMEDOR					0.00	-		-		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
15.4.2 .1	Suministro e instalación de detector de Humo por Detección de partículas mediante longitud de onda dual (infrarroja y ultravioleta). Reproductor de imágenes con campo de visión de 80°. Tipo de lente de la imagen: 90°. Campo de visión útil: Horizontal: 80°, Vertical: 48°. Capacidad Estándar: Mínima: 6m, Máxima 34m. Máximo Número de emisores: 7. Al utilizar dos longitudes de onda de luz para detectar partículas, el sistema puede distinguir los tamaños de partículas. La longitud de onda UV más corta Interactúa intensamente con ambas partículas, las pequeñas y las grandes, mientras que la longitud de onda IR más larga se ve afectada solo por las partículas más grandes. Por tanto, las mediciones de caída de señal en	UND	6	$ 4,682,564	$ 28,095,384.00	6.00	28,095,384.00	6.00	28,095,384.00		$ 0.00	6.00	$ 28,095,384.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	cada longitud de onda permiten al receptor óptico diferenciar el humo de otros agentes suspendidos en el aire o de objetos que puedan obstaculizar el haz luminoso. Incluye módulo monitor, accesorios de fijación y soporte, cable de configuración, kit de instalación y configuración.														
15.42.2	Suministro e instalación de detector de Humo por Detección de partículas mediante longitud de onda dual (infrarroja y ultravioleta). Emisor de Rayo de Luz Estándar con Batería. Emisor con alimentación por pilas alcalinas. Al utilizar dos longitudes de onda de luz para detectar partículas, el sistema puede distinguir los tamaños de partículas. La longitud de onda UV más corta Interactúa intensamente con ambas partículas, las pequeñas y las grandes,	UND	11	$ 2,898,930	$ 31,888,230.00	11.00	31,888,230.00	11.00	31,888,230.00		$ 0.00	11.00	$ 31,888,230.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 682 3465 ingenieriamyderas@gmail.com

	mientras que la longitud de onda IR más larga se ve afectada solo por las partículas más grandes. Por tanto, las mediciones de caída de señal en cada longitud de onda permiten al receptor óptico diferenciar el humo de otros agentes suspendidos en el aire o de objetos que puedan obstaculizar el haz luminoso. Incluye accesorios de fijación y soporte, cable de configuración, kit de instalación y configuración.														
15.5.	SISTEMA DE RED INALÁMBRICA - WIFI					0.00	-	0.00	-		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
15.5.1	Suministro e Instalación de Access Point ZoneFlex dual-band 802.11abgn/ac Wireless Access Point Indoor, 3x3:3 streams, BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support. Incluye power adapter or PoE injector y accesorios de fijación y soporte, licencia de suscripción por 1 año de Cloud Wifi.	UND	15.00	$ 3,538,315.00	$ 53,074,725.00	15.00	53,074,725.00	15.00	53,074,725.00		$ 0.00	15.00	$ 53,074,725.00		$ 0.00
15.5.2	Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento	UND	1.00	$ 3,184,131.00	$ 3,184,131.00	1.00	3,184,131.00	1.00	3,184,131.00		$ 0.00	1.00	$ 3,184,131.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	de la Red Inalámbrica.														
15.6.	INFRAESTRUCTURA	0	0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	-	0.00	-		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
15.6.1	Suministro e Instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios de fijación y soporte.	ML	900.00	$ 24,470.00	$ 22,023,000.00	900.00	22,023,000.00	900.00	22,023,000.00		$ 0.00	900.00	$ 22,023,000.00		$ 0.00
15.6.2	Suministro e Instalación de tuberia EMT 1". Incluye accesorios de fijación y soporte.	ML	33.00	$ 29,039.00	$ 958,287.00	33.00	958,287.00	33.00	958,287.00		$ 0.00	33.00	$ 958,287.00		$ 0.00
15.6.3	Suministro e Instalación de tuberia EMT 3". Incluye accesorios de fijación y soporte.	ML	117.00	$ 104,431.00	$ 12,218,427.00	117.00	12,218,427.00	117.00	12,218,427.00		$ 0.00	117.00	$ 12,218,427.00		$ 0.00
15.6.4	Suministro e Instalación de tuberia PVC 3/4". Incluye accesorios de fijación y soporte.	ML	648.00	$ 9,935.00	$ 6,437,880.00	648.00	6,437,880.00	648.00	6,437,880.00		$ 0.00	648.00	$ 6,437,880.00		$ 0.00
15.6.5	Suministro e Instalación de tuberia PVC 1". Incluye accesorios de fijación y soporte.	ML	12.00	$ 10,118.00	$ 121,416.00	12.00	121,416.00	12.00	121,416.00		$ 0.00	12.00	$ 121,416.00		$ 0.00
15.6.6	Suministro e Instalación de tuberia PVC 3". Incluye accesorios de fijación y soporte.	ML	144.00	$ 28,860.00	$ 4,155,840.00	144.00	4,155,840.00	144.00	4,155,840.00		$ 0.00	144.00	$ 4,155,840.00		$ 0.00
15.6.7	Suministro e instalación de bandeja portacable de 400MM. Incluye accesorios, cable y conector de tierra.	ML	270.00	$ 211,606.00	$ 57,133,620.00	270.00	57,133,620.00	270.00	57,133,620.00		$ 0.00	270.00	$ 57,133,620.00		$ 0.00
15.6.8	Suministro e instalación de bandeja portacable de 600MM . Incluye	ML	51.00	$ 243,137.00	$ 12,399,987.00	51.00	12,399,987.00	51.00	12,399,987.00		$ 0.00	51.00	$ 12,399,987.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyrlsas@gmail.com

	accesorios, cable y conector de tierra.														
15.6.9	Suministro e Instalación de Caja Plástica de 310x240x124mm.	UND	49.00	$ 392,899.00	$ 19,252,051.00	49.00	19,252,051.00	49.00	19,252,051.00		$ 0.00	49.00	$ 19,252,051.00		$ 0.00
15.6.10	Suministro e instalación Gabinete para Operadores de Telecomunicaciones. Incluye accesorios de fijación.	UND	1.00	$ 2,171,070.00	$ 2,171,070.00	1.00	2,171,070.00	1.00	2,171,070.00		$ 0.00	1.00	$ 2,171,070.00		$ 0.00
15.6.11	Suministro e instalación de registro 40x40cm con marco y tapa.	UND	2.00	$ 1,122,716.00	$ 2,245,432.00	2.00	2,245,432.00	2.00	2,245,432.00		$ 0.00	2.00	$ 2,245,432.00		$ 0.00
15.6.12	Suministro e Instalación de Barraje para Conexión de Tierra.	UND	1.00	$ 2,835,666.00	$ 2,835,666.00	1.00	2,835,666.00	1.00	2,835,666.00		$ 0.00	1.00	$ 2,835,666.00		$ 0.00
15.6.13	Suministro e Instalación Cable Grounding Bus #6.	ML	45.00	$ 15,076.00	$ 678,420.00	45.00	678,420.00	45.00	678,420.00		$ 0.00	45.00	$ 678,420.00		$ 0.00
Total TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA					**$ 542,435,600.00**		**$ 542,435,600.00**		**$ 542,435,600.00**		**$ 0.00**	**0.00**	**$ 542,435,600.00**		**$ 0.00**
16	**SISTEMA DE AA Y EXTRACCION**														
16.10	**EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**														
16.1.1	Suministro e Instalación de sistema VRF para una capacidad de 382,200 btu/hr, con alimentación para 1 equipo internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F.	UND	2.00	$ 61,884,059.00	$ 123,768,118.00	2.00	123,768,118.00	2.00	123,768,118.00		$ 0.00	2.00	$ 123,768,118.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyclass@gmail.com

16.1.2	Suministro e Instalación de sistema VRF para una capacidad de 229,300 btu/hr, con alimentación para 1 equipo internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F.	UND	1.00	$ 35,741,591.00	$ 35,741,591.00	1.00	35,741,591.00	1.00	35,741,591.00		$ 0.00	1.00	$ 35,741,591.00		$ 0.00
16.1.3	Suministro e Instalacion de equipos tipo Manejadora tipo en L de 12692CFM con una capacidad de enfriamiento de 374,470Btuh, Doble pared, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante	UND	2.00	$ 76,410,357.00	$ 152,820,714.00	2.00	152,820,714.00	2.00	152,820,714.00		$ 0.00	2.00	$ 152,820,714.00		$ 0.00
16.1.4	Suministro e Instalacion de equipos tipo Manejadora tipo en L de 8578CFM con una capacidad de enfriamiento de 242460Btuh, Doble pared, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante	UND	1.00	$ 55,092,646.00	$ 55,092,646.00	1.00	55,092,646.00	1.00	55,092,646.00		$ 0.00	1.00	$ 55,092,646.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyd.sas@gmail.com

16.1.5	Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil Piso techo con una capacidad de enfriamiento de 36.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UND	1.00	$ 2,562,029.00	$ 2,562,029.00	1.00	2,562,029.00	1.00	2,562,029.00		$ 0.00	1.00	$ 2,562,029.00		$ 0.00
16.1.6	Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter	UND	1.00	$ 1,972,283.00	$ 1,972,283.00	1.00	1,972,283.00	1.00	1,972,283.00		$ 0.00	1.00	$ 1,972,283.00		$ 0.00
16.1.7	Suministro e Intalacion Controlador principal interno para el control de la unidades internas de las variables: Temperatura, velocidad del aire, encedido y apagado del equipo.	UND	1.00	$ 3,246,176.00	$ 3,246,176.00	1.00	3,246,176.00	1.00	3,246,176.00		$ 0.00	1.00	$ 3,246,176.00		$ 0.00
16.1.8	Suminstro e instalacion de Recuperadora de calor de 2000CFM y 0.5inWc de lujo cruzado con una eficiencia de 57.3%.	UND	2.00	$ 61,765,414.00	$ 123,530,828.00	2.00	123,530,828.00	2.00	123,530,828.00		$ 0.00	2.00	$ 123,530,828.00		$ 0.00
16.1.9	Suminstro e instalacion de Recuperadora de calor de 1273CFM y 0.4inWc de lujo cruzado con una eficiencia de 66.7%.	UND	1.00	$ 34,279,834.00	$ 34,279,834.00	1.00	34,279,834.00	1.00	34,279,834.00		$ 0.00	1.00	$ 34,279,834.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

16,20	**TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS**							0.00	-		$ 0.00	0.00			$ 0.00
16,2,1	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 5/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	30.00	$ 101,077.00	$ 3,032,310.00	30.00	3,032,310.00	30.00	3,032,310.00		$ 0.00	30.00	$ 3,032,310.00		$ 0.00
16,2,2	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 3/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	10.00	$ 94,627.00	$ 946,270.00	10.00	946,270.00	10.00	946,270.00		$ 0.00	10.00	$ 946,270.00		$ 0.00
16,2,3	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 1/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	22.00	$ 85,387.00	$ 1,878,514.00	22.00	1,878,514.00	22.00	1,878,514.00		$ 0.00	22.00	$ 1,878,514.00		$ 0.00
16,2,4	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/4"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	30.00	$ 59,623.00	$ 1,788,690.00	30.00	1,788,690.00	30.00	1,788,690.00		$ 0.00	30.00	$ 1,788,690.00		$ 0.00
16,2,5	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de	ML	75.00	$ 48,350.00	$ 3,626,250.00	75.00	3,626,250.00	75.00	3,626,250.00		$ 0.00	75.00	$ 3,626,250.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydcas@gmail.com

	5/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.														
16.2.6	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	12.00	$ 39,056.00	$ 468,672.00	12.00	468,672.00	12.00	468,672.00		$ 0.00	12.00	$ 468,672.00		$ 0.00
16.2.7	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	63.00	$ 27,413.00	$ 1,727,019.00	63.00	1,727,019.00	63.00	1,727,019.00		$ 0.00	63.00	$ 1,727,019.00		$ 0.00
16.2.8	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	12.00	$ 19,972.00	$ 239,664.00	12.00	239,664.00	12.00	239,664.00		$ 0.00	12.00	$ 239,664.00		$ 0.00
16.2.9	Suministro e instalación de Branche y accesorios de conexión	UN	4.00	$ 526,368.00	$ 2,105,472.00	4.00	2,105,472.00	4.00	2,105,472.00		$ 0.00	4.00	$ 2,105,472.00		$ 0.00
16.30	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**					0.00			-		$ 0.00	0.00			$ 0.00
16.3.1	Suministro e instalación de tubería metálica EMT de 1/2"para canalizado de comunicación de control de los equipos	ML	25.00	$ 29,157.00	$ 728,925.00	25.00	728,925.00	25.00	728,925.00		$ 0.00	25.00	$ 728,925.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydcas@gmail.com

16.3.2	Suministro e instalación de Cable 3x18 para señal comunicación de control entre los equipos y el controlador principal	ML	35.00	$ 12,653.00	$ 442,855.00	35.00	442,855.00	35.00	442,855.00		$ 0.00	35.00	$ 442,855.00		$ 0.00
16.40	**SISTEMA DE AA**					0.00			-		$ 0.00	0.00			$ 0.00
16.4.1	Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada	M2	1,812.29	$ 121,656.00	$ 220,475,952.24	1812.29	220,475,952.24	1812.29	220,475,952.24		$ 0.00	12.29	$ 1,495,152.24		$ 0.00
16.4.2	Suministro e instalacion de Aislamiento Interno en Armalex de 1"	M2	1,736.78	$ 97,748.00	$ 169,766,771.44	1736.78	169,766,771.44	1736.78	169,766,771.44		$ 0.00	601.25	$ 58,771,090.43		$ 0.00
16.4.3	Suministro e intalacion de Difusor circular de 14" Aleta Fija con Damper	UN	24.00	$ 411,698.00	$ 9,880,752.00	24.00	9,880,752.00	24.00	9,880,752.00		$ 0.00	24.00	$ 9,880,752.00		$ 0.00
16.4.4	Suministro e intalacion de Rejilla de difusion de 24"X10" Aleta Fija con Damper	UN	4.00	$ 374,369.00	$ 1,497,476.00	4.00	1,497,476.00	4.00	1,497,476.00		$ 0.00	4.00	$ 1,497,476.00		$ 0.00
16.4.5	Suministro e intalacion de Rejilla de Retorno 24x24 con damper	UN	12.00	$ 604,708.00	$ 7,256,496.00	12.00	7,256,496.00	12.00	7,256,496.00		$ 0.00	12.00	$ 7,256,496.00		$ 0.00
16.4.6	Suministro e intalacion de Rejilla de Retorno 20x20 con damper	UN	6.00	$ 425,556.00	$ 2,553,336.00	6.00	2,553,336.00	6.00	2,553,336.00		$ 0.00	6.00	$ 2,553,336.00		$ 0.00
16.4.7	Suministro e intalacion de Rejilla Tipo Louver de 24"X24" con malla atrapa insecto y polvo	UN	3.00	$ 865,973.00	$ 2,597,919.00	3.00	2,597,919.00	3.00	2,597,919.00		$ 0.00	3.00	$ 2,597,919.00		$ 0.00
16.50	**SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS**					0.00		0.00	-		$ 0.00	0.00			$ 0.00
16.5.1	Suministro e instalacion de conducto en	M2	88.20	$ 121,662.00	$ 10,730,588.40	88.20	10,730,588.40	88.20	10,730,588.40		$ 0.00	88.20	$ 10,730,588.40		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3445 ingconsorciomydsas@gmail.com

	lamina galvanizada														
16.5.2	Suministro e instalacion Rejillas de extraccion 10X6 aleta fija	UND	28.00	$ 162,458.00	$ 4,548,824.00	28.00	4,548,824.00	28.00	4,548,824.00		$ 0.00	28.00	$ 4,548,824.00		$ 0.00
16.5.3	Suministro e instalacion de extractor Centrifugo en linea de 660CFM	UND	2.00	$ 2,997,965.00	$ 5,995,930.00	2.00	5,995,930.00	2.00	5,995,930.00		$ 0.00	2.00	$ 5,995,930.00		$ 0.00
16.5.4	Suministro e instalacion de extractor Centrifugo en linea de 600CFM	UND	2.00	$ 2,836,919.00	$ 5,673,838.00	2.00	5,673,838.00	2.00	5,673,838.00		$ 0.00	2.00	$ 5,673,838.00		$ 0.00
16.5.5	Suministro e instalacion de extractor Centrifugo en linea de 300CFM	UND	2.00	$ 1,829,183.00	$ 3,658,366.00	2.00	3,658,366.00	2.00	3,658,366.00		$ 0.00	2.00	$ 3,658,366.00		$ 0.00
16.60	**SISTEMA DE EXTRACCION COCINAS**					0.00			-		$ 0.00	0.00			$ 0.00
16.6.1	Suministro e instalacion de Conducto en lamina Cold Roll, en calibre 16.	KG	4,207.20	$ 37,233.00	$ 156,646,677.60	4207.20	156,646,677.60	4207.20	156,646,677.60		$ 0.00	4207.20	$ 156,646,677.60		$ 0.00
16.6.2	Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada	M2	425.88	$ 121,440.00	$ 51,718,867.20	425.88	51,718,867.20	425.88	51,718,867.20		$ 0.00	425.88	$ 51,718,867.20		$ 0.00
16.6.3	Suministro e Instalacion de Campana de solo extraccion en acero inoxidable 430, de 2Mt de largo por 0.6 Mt de ancho, con ventilacion frontal por medio de dos difusoras de 18x10, Tipo Pared, filtro en acero inoxidable tipo baja eficiencia. Incluye 5 bombillas de iluminacion serie L55 de ensamble para alta temperatura,	UND	30.00	$ 7,799,950.00	$ 233,998,500.00	30.00	233,998,500.00	30.00	233,998,500.00		$ 0.00	30.00	$ 233,998,500.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	limpiza termica y cubierta resistente a los golpes.														
16.6.4	Suministro e Instalacion de Campana de solo extraccion en acero inoxidable 430, de 1.4Mt de largo por 0.6 Mt de ancho, con ventilacion frontal por medio de dos difusoras de 18x10, Tipo Pared, filtro en acero inoxidable tipo baja eficiencia. Incluye 5 bombillas de iluminacion serie L55 de ensamble para alta temperatura. limpiza termica y cubierta resistente a los golpes.	UND	12.00	$ 6,733,563.00	$ 80,802,756.00	12.00	80,802,756.00	12.00	80,802,756.00		$ 0.00	12.00	$ 80,802,756.00		$ 0.00
16.6.5	Suministro e Instalacion de Ventilador tipo hongo descarga vertical hacia arriba, centrifugo de acople directo de alta velocidad con switch de desconexion, y 18" de diametro 3300CFM @ 2.5" wc, 1325RPM, motor de 2.0 HP, 3 Feses, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3).	UND	30.00	$ 5,549,201.00	$ 166,476,030.00	30.00	166,476,030.00	30.00	166,476,030.00		$ 0.00	30.00	$ 166,476,030.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

16.6.6	Suministro e Instalacion de Ventilador tipo hongo descarga vertical hacia arriba, centrifugo de acople directo de alta velocidad con switch de desconexion, y 16" de diametro.2700CFM @ 2.2" wc, 1400 RPM, motor de 1.5 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3).	UND	12.00	$ 4,613,148.00	$ 55,357,776.00	12.00	55,357,776.00	12.00	55,357,776.00		$ 0.00	12.00	$ 55,357,776.00		$ 0.00
16.6.7	Suministro e Instalacion de Ventilador tipo Centrifugo descarga horizontal , centrifugo de acople mediante poleas de alta velocidad con switch de desconexion, y Tamaño 12"x12" 3200CFM @ 1.12" wc, 1050 RPM, motor de 2.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3).	UND	30.00	$ 5,323,080.00	$ 159,692,400.00	30.00	159,692,400.00	30.00	159,692,400.00		$ 0.00	30.00	$ 159,692,400.00		$ 0.00
16.6.8	Suministro e Instalacion de Ventilador tipo Centrifugo descarga horizontal , centrifugo de acople mediante poleas de alta velocidad con switch de desconexion, y Tamaño 12"x12" 2600CFM @ 1.1" wc, 950 RPM,	UND	12.00	$ 4,475,704.00	$ 53,708,448.00	12.00	53,708,448.00	12.00	53,708,448.00		$ 0.00	12.00	$ 53,708,448.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydesa@gmail.com

	motor de 1.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3).														
16.70	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO					0.00			-		$ 0.00	0.00			$ 0.00
16.7.1	Suministro e Instalacion Evaporador Bajo Perfil de 7000 Btu/h- 220V, 1PH, 60HZ, CF #1, #2 , #3	UND	3.00	$ 3,304,196.00	$ 9,912,585.00	3.00	9,912,585.00	3.00	9,912,585.00		$ 0.00	3.00	$ 9,912,585.00		$ 0.00
16.7.2	Suministro e Instalacion Condensador Remoto de 7900 Btu/h con compresor Tipo Scroll 220/1Ph, CF #1, #2,#3	UND	3.00	$ 4,196,485.00	$ 12,589,455.00	3.00	12,589,455.00	3.00	12,589,455.00		$ 0.00	3.00	$ 12,589,455.00		$ 0.00
16.7.3	Suministro e Instalacion de Panel 100 mm muros y techos, Acabado en Lamina Galvanizada. 035/035. Color Blanco 9002	M2	220.80	$ 185,708.00	$ 41,004,326.40	220.80	41,004,326.40	220.80	41,004,326.40		$ 0.00	220.80	$ 41,004,326.40		$ 0.00
16.7.4	Suministro e Instalacion de Panel de piso en 80 mm	M2	10.80	$ 169,741.00	$ 1,833,202.80	10.80	1,833,202.80	10.80	1,833,202.80		$ 0.00	10.80	$ 1,833,202.80		$ 0.00
16.7.5	Suministro e Instalacion de Puerta Batiente de 1 x 2 m, inyectada en poliuretano de 80 mm de espesor - Acabado en lamina prepintada Cal. 26 - Marco PVC	UND	3.00	$ 3,407,573.00	$ 10,222,719.00	3.00	10,222,719.00	3.00	10,222,719.00		$ 0.00	3.00	$ 10,222,719.00		$ 0.00
16.7.6	Suministro e Instalacion de Tableros de Potencia y control Equipos, incluye gabinete metálico,	UND	3.00	$ 1,389,213.00	$ 4,167,639.00	3.00	4,167,639.00	3.00	4,167,639.00		$ 0.00	3.00	$ 4,167,639.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	controlador Carel, Breaker para Evap, contactor para resistencia, marquilla, selector de dos posiciones, cableado interno.														
	Total SISTEMA DE AA Y EXTRACCION				$ 2,032,766,491.08		$ 2,032,766,491.08		$ 2,032,766,491.08		$ 0.00	0.00	$ 1,702,790,010.07		$ 0.00
17	**INSTALACIONES DE GAS**														
17.1	**OBRAS PRELIMINARES**														
17.1.1	**Señalización y seguridad de la obra**														
17.1.1.1	Soporte para Cinta demarcadora	un	30.00	$ 20,699.00	$ 620,970.00	30.00	620,970.00	30.00	620,970.00		$ 0.00	30.00	$ 620,970.00		$ 0.00
17.1.1.2	Cinta demarcadora, sin soporte	m	150.00	$ 2,024.00	$ 303,600.00	150.00	303,600.00	150.00	303,600.00		$ 0.00	150.00	$ 303,600.00		$ 0.00
17.1.1.3	Valla Móvil Tipo 2. Barrera Tubular	un	2.00	$ 300,621.00	$ 601,242.00	2.00	601,242.00	2.00	601,242.00		$ 0.00	2.00	$ 601,242.00		$ 0.00
17.20	**RED DE GAS**					0.00	-		-		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1	**Centro de Regulación**					0.00			-		$ 0.00	0.00			$ 0.00
17.2.1.1	Regulador de Primera Etapa para 60 m3/h (23 mbar)	un	3	$ 759,855.00	$ 2,279,565.00	3.00	2,279,565.00	3.00	2,279,565.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.2	Regulador de Segunda Etapa para 30 m3/h (23 mbar)	un	8	$ 301,520.00	$ 2,412,160.00	8.00	2,412,160.00	8.00	2,412,160.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.3	Válvula de corte ø1"	un	8	$ 75,549.00	$ 604,392.00	8.00	604,392.00	8.00	604,392.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.4	Válvula Bola M26	un	8	$ 25,287.00	$ 202,296.00	8.00	202,296.00	8.00	202,296.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.5	Elevador 3/4"	un	8	$ 42,626.00	$ 341,008.00	8.00	341,008.00	8.00	341,008.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.6	Universal galvanizada ø1"	un	8	$ 7,632.00	$ 61,056.00	8.00	61,056.00	8.00	61,056.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.7	Codo acero galvanizado ø1"	un	27	$ 3,680.00	$ 99,360.00	27.00	99,360.00	27.00	99,360.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.8	Manómetro de 0 a 600 mbar con válvula de guarda	un	3	$ 274,585.00	$ 823,755.00	3.00	823,755.00	3.00	823,755.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.9	Tubería acero galvanizado ø1"	m	4	$ 28,803.00	$ 115,212.00	4.00	115,212.00	4.00	115,212.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydesa@gmail.com

17.2.1.10	Tubería acero galvanizado ø1/2"	m	16	$ 28,485.00	$ 455,760.00	16.00	455,760.00	16.00	455,760.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.11	Codo acero galvanizado ø1"	un	18	$ 9,795.00	$ 176,310.00	18.00	176,310.00	18.00	176,310.00		$ 0.00	672.00	$ 6,582,240.00		$ 0.00
17.2.1.12	Codo acero galvanizado ø1/2"	un	63	$ 8,273.00	$ 521,199.00	63.00	521,199.00	63.00	521,199.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.13	Tee acero galvanizado ø1"	un	10	$ 12,346.00	$ 123,460.00	10.00	123,460.00	10.00	123,460.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.14	Tee acero galvanizado ø1/2"	un	40	$ 10,890.00	$ 435,600.00	40.00	435,600.00	40.00	435,600.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.15	Medidor G 4,0 Q= 6 m3/h	un	30	$ 311,298.00	$ 9,338,940.00	30.00	9,338,940.00	30.00	9,338,940.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.16	Medidor G 2,5 Q= 4 m3/h	un	12	$ 216,173.00	$ 2,594,076.00	12.00	2,594,076.00	12.00	2,594,076.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.17	Armario de lámina galvanizada - Para 16 Medidores	un	2	$ 1,627,533.00	$ 3,255,066.00	2.00	3,255,066.00	2.00	3,255,066.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.1.18	Armario de lámina galvanizada - Para 12 Medidores	un	1	$ 1,341,201.00	$ 1,341,201.00	1.00	1,341,201.00	1.00	1,341,201.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.2	**Red interna (Baja Presión)**					0.00			-		$ 0.00				$ 0.00
17.2.2.1	Codo Pealpe ø1"	un	770.00	$ 2,524.00	$ 1,943,480.00	770.00	1,943,480.00	770.00	1,943,480.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.2.2	Codo Polietileno ø1"	un	6.00	$ 3,582.00	$ 21,492.00	6.00	21,492.00	6.00	21,492.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.2.3	Tapón Galvanizado ø1"	un	126.00	$ 2,191.00	$ 276,066.00	126.00	276,066.00	126.00	276,066.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.2.4	Tubería polietileno 1"	m	78.00	$ 16,544.00	$ 1,290,432.00	78.00	1,290,432.00	78.00	1,290,432.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.2.5	Tubería Pealpe 1/2"	m	1,905.00	$ 14,579.00	$ 27,772,995.00	1905.00	27,772,995.00	1905.00	27,772,995.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.2.6	Válvula de corte 1"	un	126.00	$ 33,705.00	$ 4,246,830.00	126.00	4,246,830.00	126.00	4,246,830.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.2.7	Buje Fusión (1"x1/2")	un	10.00	$ 6,832.00	$ 68,320.00	10.00	68,320.00	10.00	68,320.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydcas@gmail.com

17.2.2.8	Unión Pealpe 1"	un	24.00	$ 1,258.00	$ 30,192.00	24.00	30,192.00	24.00	30,192.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00
17.2.2.9 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA SCH 40 DE 1" PARA GAS INCLUYE, SELLANTE, ROSCAS), INCLUYE PINTURA AMARILLA POR NORMA	ML		$ 212,296.23								1687.76	$ 358,305,091.88		
17.2.2.10 NP	SUMINISTRO E INTALACION DE ANCLAJE METALICO PARA TUBERIA DESCOLGADA	UND		$ 44,159.75								96.00	$ 4,239,336.50		
17.2.2.11 NP	SUMININSTRO E INSTALACION PANEL CONTROL VALVULA GALV 3/4" INCLUYE UNIVERASL NIPLES 3/4" Y TEE GALV 3/4"	UND		$ 565,395.74								42.00	$ 23,746,621.08		
17.2.2.12 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA SCH 40 DE 3/4" PARA GAS INCLUYE, SELLANTE, ROSCAS), INCLUYE PINTURA AMARILLA POR NORMA	ML		174,907.03								630.00	$ 110,191,429.62		
17.2.2.13 NP	CODO GALVANIZADO DE 3/4"	UND		9,159.15								882.00	$ 8,078,373.96		
17.2.2.14 NP	INSTALACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN A EQUIPOS, INCLUYE TAPONES	UND		77,454.79								126.00	$ 9,759,302.91		

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyesa@gmail.com

17.2.2.15 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 1,50M INCLUYE REDUCION 3/4" A 1/2"	UND		129,667.87								126.00	$ 16,338,151.62		
17.2.2.16 NP	SUMINISISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE CENTO DE MEDICION C/u 21 MEDIDORES	UND		5,729,057.42								2.00	$ 11,458,114.84		
17.2.2.17 NP	PRUEBA HERMETICA INICIAL ANTES DE PROCESO DE FUNDIDA DE PLACA PISO 1	UND		118,144.16								42.00	$ 4,962,054.78		
17.2.2.18 NP	PRUEBA HERMETICA FINAL INSTALACION INTERNA TERMINADA.	UND		201,512.26								42.00	$ 8,463,514.91		
17.2.2.19 NP	SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR ASOCIADO SEGUNDA ETAPA SIN VENTEO INCLUYE UNIVERSALES DE 3/4", VALVULA DE CONTROL 3/4" Y NIPLES DE 3/4", INCLUYE REJILLA DE PROTECCION METALICA	UND		1,032,882.18								42.00	$ 43,381,051.46		
17.2.2.20 NP	MEDIDOR DE GAS REFERENCIA G-10 INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y MATRICULA, CERTIFICACION PLANO ISOMETRICO Y SOPORTES CERTIFICACION	UND		3,957,000.00								42.00	$ 166,194,000.00		

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	DE COMPETENCIA														
17.3	**Obras civiles e Instalación**						-		-						
17.3.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	M3	150	$ 48,926.00	$ 7,338,900.00	150.00	7,338,900.00	150.00	7,338,900.00		$ 0.00	150.00	$ 7,338,900.00		$ 0.00
17.3.2	Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima	M3	45	$ 103,673.00	$ 4,665,285.00	45.00	4,665,285.00	45.00	4,665,285.00		$ 0.00	45.00	$ 4,665,285.00		$ 0.00
17.3.3	Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado	M3	105	$ 25,827.00	$ 2,711,835.00	105.00	2,711,835.00	105.00	2,711,835.00		$ 0.00	105.00	$ 2,711,835.00		$ 0.00
17.40	**Obras complementarias**					0.00					$ 0.00				$ 0.00
17.4.1	Prueba del sistema Media y baja Presión	Un	3	$ 463,086.00	$ 1,389,258.00	3.00	1,389,258.00	3.00	1,389,258.00		$ 0.00	3.00	$ 1,389,258.00		$ 0.00
Total INSTALACIONES DE GAS					**$ 78,461,313.00**		**$ 78,461,313.00**		**$ 78,461,313.00**				**$ 789,330,373.55**		
18	**EQUIPAMIENTO Y DECORACION**														
18.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE MESON DE COCINAS EN ACERO INOXIDABLE	M2	164.54	$ 329,514.00	$ 54,218,233.56	164.54	54,218,233.56	164.54	54,218,233.56		$ 0.00	164.54	$ 54,218,233.56		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

18.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE BARRA DE COCINAS EN GRANITO NATURAL, INCLUYE ZOCALO DE 10 CM Y BISELES	M2	101.08	$ 453,214.00	$ 45,810,871.12	101.08	45,810,871.12	101.08	45,810,871.12		$ 0.00	101.08	$ 45,810,871.12		$ 0.00
18.03	NUBES ACÚSTICAS DIÁMETRO 1.20M ESPESOR 4CM. MEMBRANA ACÚSTICA TENSADA. COLORES SEGÚN NIVEL. (INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE Y MONTAJE)	UND	30	$ 284,906.00	$ 8,547,180.00	30.00	8,547,180.00	30.00	8,547,180.00		$ 0.00	30.00	$ 8,547,180.00		$ 0.00
18.04	TELAS DECORATIVAS COLGANTES. COLORES SEGÚN DISEÑO.	M2	1066	$ 26,704.00	$ 28,466,464.00	1066.00	28,466,464.00	1066.00	28,466,464.00		$ 0.00	1066.00	$ 28,466,464.00		$ 0.00
18.05	ESCULTURA CENTRAL DE 16.50M DE ALTURA X 3.52M APROXIMADAMENTE. CON ELEMENTOS ARTESANALES: AVES, PECES Y TORTUGAS ESCULPIDAS ARTESANALMENTE, ACOMPAÑADAS DE UNA RED DE PESCA Y ELEMENTOS DECORATIVOS.	UND	1	$ 51,267,639.00	$ 51,267,639.00	1.00	51,267,639.00	1.00	51,267,639.00		$ 0.00	1.00	$ 51,267,639.00		$ 0.00
18.06	RELIGAS METÁLICAS ACABADO NEGRO. ANCLADAS A LOSA SEGÚN PISO. 1.20M X 1.80M	UND	21	$ 300,539.00	$ 6,311,319.00	21.00	6,311,319.00	21.00	6,311,319.00		$ 0.00	21.00	$ 6,311,319.00		$ 0.00

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3445 ingenieriomydsas@gmail.com

18.07	BARRA EN MICROCEMENTO ACABADO BRILLANTE, TINTURADO SEGÚN COLORES	M2	6.3	$ 600,874.00	$ 3,785,506.20	6.30	3,785,506.20	6.30	3,785,506.20		$ 0.00	6.30	$ 3,785,506.20		$ 0.00
Total EQUIPAMIENTO Y DECORACION					$198,407,212.88		$198,407,212.88		$ 198,407,212.88		$ 0.00		$198,407,212.88		$ 0.00
COSTO DIRECTO DE LA OBRA					$18,450,337,238.39		$18,404,324,893.82		$18,450,337,238.39		$3,861,450,524.65		$ 18,450,337,238.39		$2,920,566,689.93
ADMINISTRACIÓN		28.58%			$ 5,273,269,455.11		$ 5,260,118,721.35		$ 5,273,269,456.11		$ 1,103,636,689.39		$ 5,273,269,456.11		$ 834,723,773.42
IMPREVISTOS		1.00%			$ 184,503,372.38		$ 184,043,248.94		$ 184,503,372.38		$ 38,614,505.25		$ 184,503,372.38		$ 29,205,666.90
UTILIDAD		5.00%			$ 922,516,861.92		$ 920,216,244.69		$ 922,516,861.92		$ 193,072,526.23		$ 922,516,861.92		$ 146,028,334.50
VALOR DE LA OBRA (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)					$ 24,830,626,928.80		$ 24,768,703,108.80		$ 24,830,626,928.80		$ 5,196,774,245.52		$ 24,830,626,928.80		$ 3,930,524,464.74
TRAMITE DE RED Y CERTIFICACIONES RETIE					$ 23,276,400.00		$ 23,276,400.00		$ 23,276,400.00		$ 0.00		$ 23,276,400.00		
PMA					$ 61,923,820.00		$ 94,349,017.00		$ 32,425,197.00		$ 32,424,960.00		$ 32,425,197.00		
PMT					$9,302,225.00		$ 9,302,225.00		$ 9,302,225.00		$9,295,051.00		$ 9,302,225.00		
PROTOCOLO COVID					$32,425,197.00		$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00		
MOBILIARIO					$570,694,619.00		$570,694,619.00		$570,694,619.00				$570,694,619.00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$25,466,325,369.80		$25,466,325,369.80		$25,466,325,369.80		$5,238,494,256.52		$25,466,325,369.80		$3,930,524,464.74

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydesa@gmail.com

3.3. Obras ejecutadas en el Periodo

3.3.1. Corte y Figurado de Acero, Estribos para Placa de Contrapiso, Estructura foso del Ascensor

Se realizó el corte de barras de acero, utilizando equipos de corte especializados, como sierras de arco y cortadoras de disco. Las barras fueron cortadas a medida según las especificaciones del diseño estructural, posterior al corte, las barras de acero fueron dobladas y figuradas para formar los estribos necesarios para la placa de contrapiso. Esta actividad requirió el uso de dobladoras de barra y plantillas de figurado para asegurar que las piezas alcanzaran las formas y dimensiones precisas

3.3.2. Instalación de Bajantes de Aguas Lluvias en Tubería PVC de 8" y 6"

Se realizaron excavaciones localizadas para instalar las tuberías de bajantes. Este paso incluyó la nivelación del terreno y la creación de zanjas con la pendiente adecuada. Las tuberías de PVC de seis (6) y ocho (8) pulgadas de diámetro fueron alineadas y ensambladas. Se aseguraron las conexiones mediante el uso de adhesivos especiales para PVC y se verificó la estanqueidad de las uniones, finalmente, las tuberías fueron cubiertas con una capa de relleno, compactado cuidadosamente para evitar daños. Se sellaron las salidas y entradas para asegurar un sistema de drenaje eficiente.

3.3.3. Pañete Impermeabilizado sobre Muro Perimetral

Los muros perimetrales fueron limpiados y preparados para recibir el pañete, para esta actividad se realizó la mezcla de los materiales para el pañete impermeabilizado y se aplicaron en capas uniformes sobre los muros. Se utilizó una llana para alisar la superficie y asegurar la adherencia adecuada del material impermeabilizante. Después de aplicar el pañete, se realizaron retoques para asegurar un acabado liso y uniforme. El material se dejó curar adecuadamente para garantizar su durabilidad y resistencia a la humedad.

3.3.4. Excavación Manual

Se demarcó el área de excavación y se delimitó con cuerdas y estacas para guiar el proceso. El equipo de trabajo utilizó palas y picos para excavar el material común. Esta actividad requirió esfuerzo físico significativo y un enfoque meticuloso para alcanzar la profundidad deseada sin dañar estructuras adyacentes.

El material excavado fue seleccionado del sitio y depositado en áreas designadas para su disposición o reutilización.

3.3.5. Relleno con Material Seleccionado de Sitio

Se identificaron y seleccionaron materiales adecuados del sitio para utilizarlos en el relleno. Estos materiales fueron evaluados para asegurar que cumplían con los requisitos de compactación y estabilidad.

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydess@gmail.com

3.3.6. Relleno de Zanjas

Las zanjas excavadas anteriormente fueron rellenadas con el material seleccionado en capas, asegurando una compactación adecuada entre cada capa. Se emplearon herramientas manuales y mecánicas para garantizar una compactación uniforme.

Nivelación y Acabado: Finalmente, se niveló la superficie del relleno y se realizaron ajustes para asegurar que la superficie final cumpliera con las especificaciones requeridas para la construcción.

3.3.7. Vaciado de Concreto en Zarpa para Muro Tanque de Almacenamiento de Agua y Vigas de Amarre

Inicialmente se instala el encofrado alrededor de la zarpa y muro del tanque al igual que la viga de amarre que une los dados A5 y A4-1C, asegurándose de que esté bien nivelado y alineado, se realiza el vaciado de la mezcla de concreto de acuerdo a las especificaciones y se vierte en el encofrado. Se utiliza una vibradora de concreto para eliminar burbujas de aire y asegurar una compactación adecuada. El concreto vaciado se deja curar adecuadamente, manteniéndolo húmedo durante el tiempo necesario para alcanzar la resistencia requerida.

3.3.8. Ampliación de Cerramiento Perimetral

Debido a la ampliación del área de maniobra que se debe tener en el momento de la construcción de las placas de entrepiso y al deterioro o mal estado de las secciones se realiza una demarcaron de las áreas donde se realizó dicha ampliación, de igual manera se realiza la instalación de postes en puntos estratégicos y se fijan paneles o materiales de cerramiento, asegurando una alineación correcta y una fijación segura.

3.3.9. Instalación de Geotextil

Se realiza la instalación de geotextil no tejido NT 2000 y NT 2500, El geotextil es desenrollado y colocado sobre la superficie preparada, asegurando que esté bien extendido y sin arrugas, se fija el geotextil utilizando estacas o anclajes adecuados para asegurar su posición.

3.3.10. Acarreo y retiro de lodos por Nivel freático y Perforación para pilotes

La generación de lodos durante la perforación de pilotes por las condiciones propias del suelo y por el alto nivel freático presente en la zona por la cercanía al Río Magdalena se hace necesaria para garantizar la seguridad del sitio, la calidad del terreno y prevenir colapsos, por tal razón, se lleva a cabo el acarreo y retiro de los lodos producidos. Esta gestión adecuada permitió cumplir con las regulaciones ambientales, minimizar el impacto en el medio ambiente y optimizar los recursos. Al final, logramos mantener un sitio de construcción seguro y eficiente, asegurando la calidad del trabajo realizado.

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

4. 1.5.10 Bombeo y Manejo de Aguas

El bombeo y manejo de aguas implica la extracción y control del agua, especialmente aquella que se encuentra en el nivel freático y la acumulada por lluvias. Esta actividad se realiza principalmente en zonas donde el agua afectaba la estabilidad de construcciones, y ejecución de actividades como los pilotajes y construcción de dados de cimentación. Se utilizan equipos de bombeo específicos para extraer el agua y sistemas de drenaje para dirigirla hacia lugares seguros donde pueda ser almacenada o tratada adecuadamente.


3.3.11. Muro de contención temporal, mediante tablestacado en módulos metálicos


La construcción del muro de contención temporal implica el uso de tablestacado en módulos metálicos de 6.0 metros de altura y tuberías de 4" tipo pesado con punta de lápiz, para prevenir derrumbes en la vía anexa (calle 51) y facilitar los trabajos en el área baja del tanque de agua potable y RCI. Esto incluye la preparación del área, instalación de tuberías, colocación de módulos metálicos, y ajustes necesarios, garantizando la estabilidad.

3.3.12. Rellenos con Subbase y Base Granular


La actividad de relleno con material de subbase granular compactado y base granular compactada se ejecuta para mejorar los suelos y aumentar la capacidad portante del terreno, permitiendo la construcción de placas de contrapiso. Esto incluye la preparación del área, distribución y compactación del material en capas, y la verificación de la compactación mediante pruebas de densidad, asegurando la estabilidad y calidad del trabajo.

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriaymydsas@gmail.com

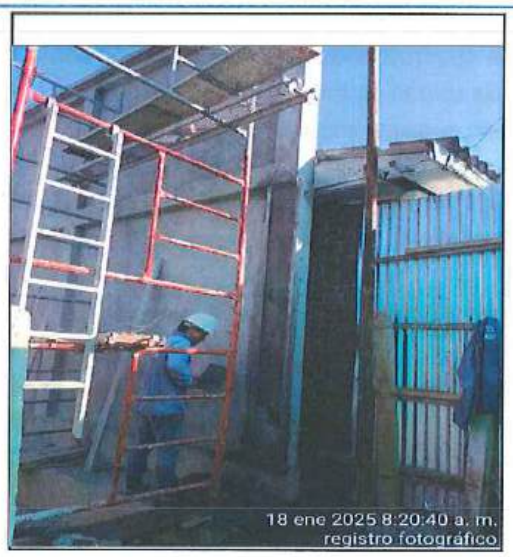


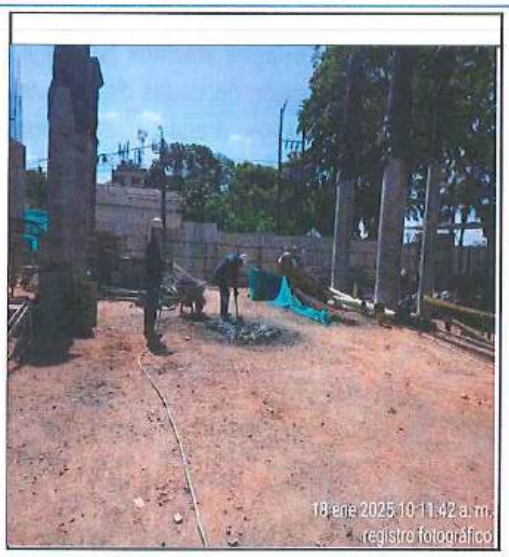




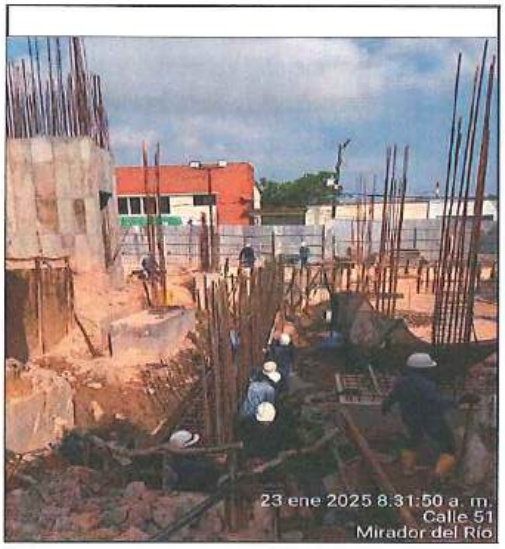

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

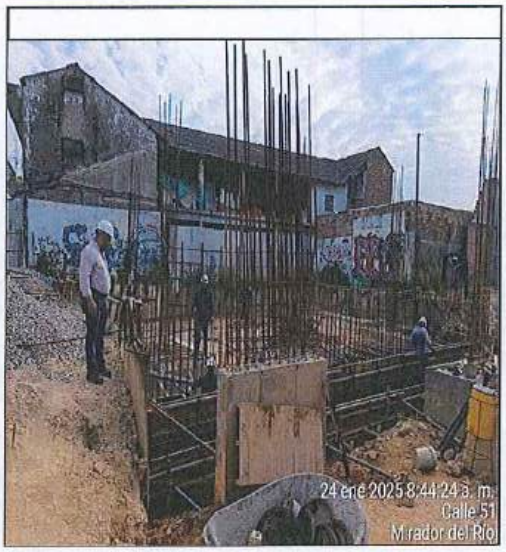





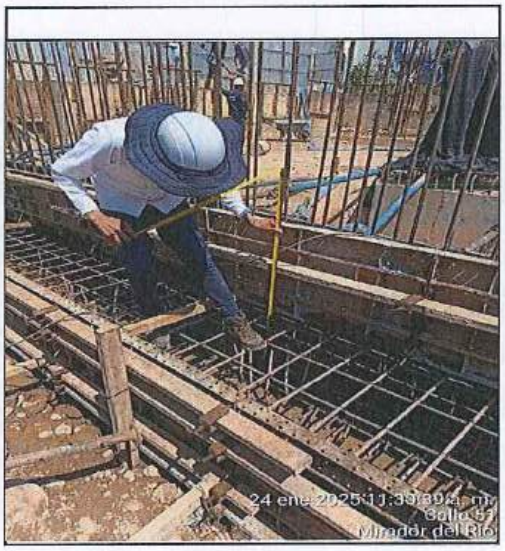





Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

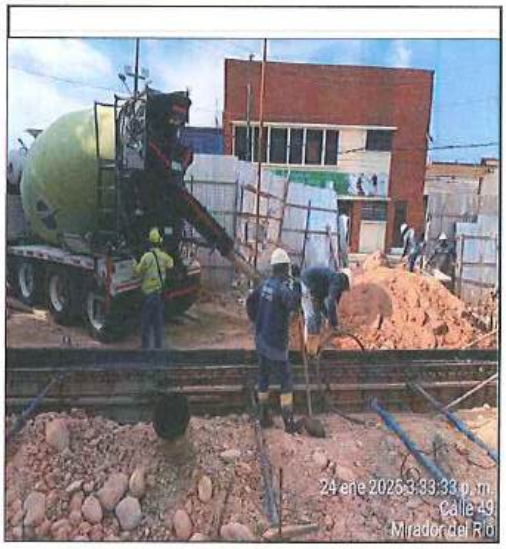

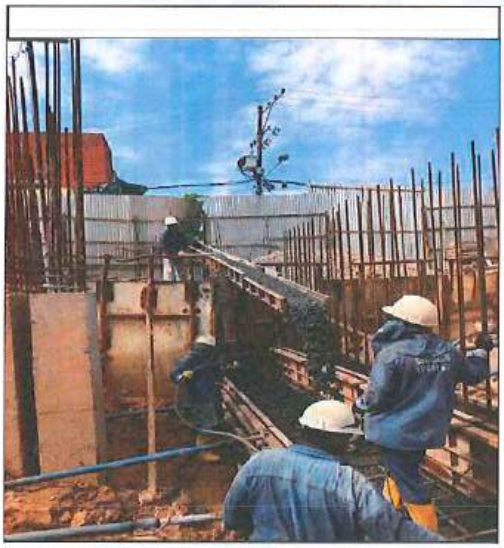


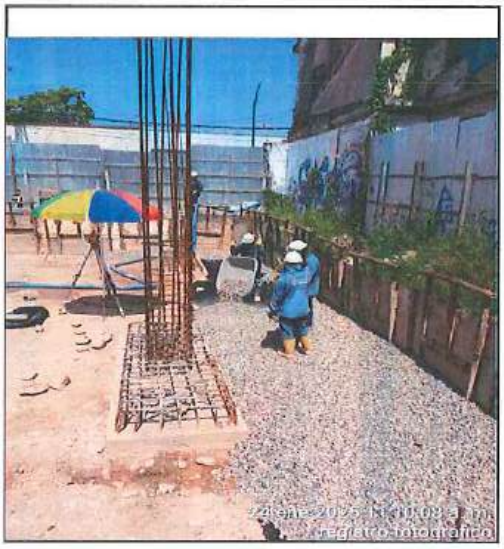


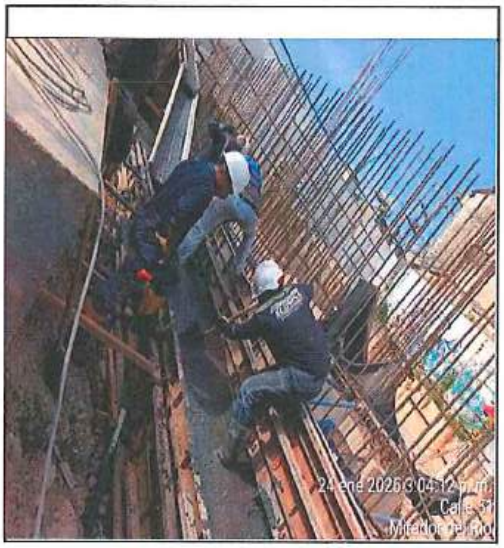


Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydass@gmail.com




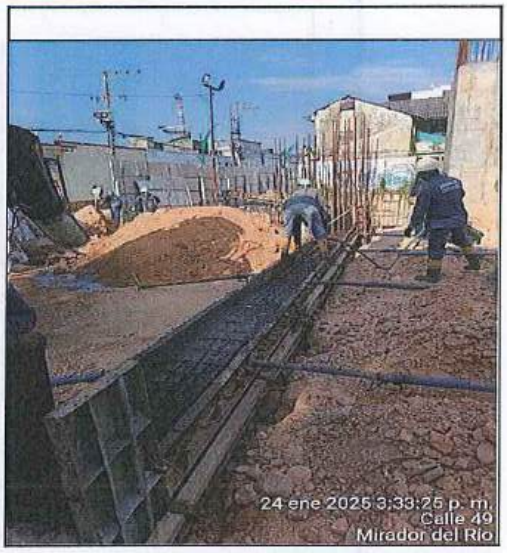


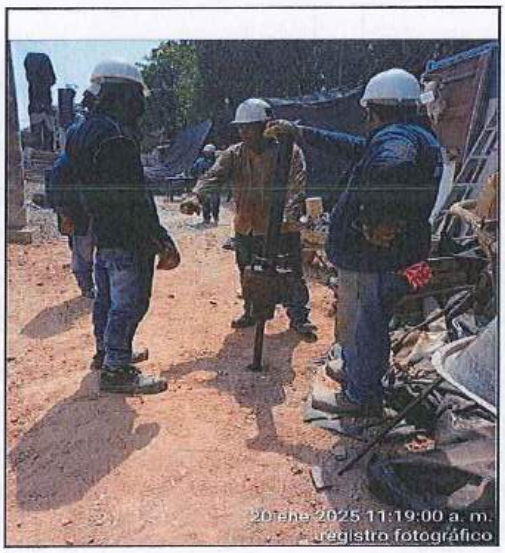

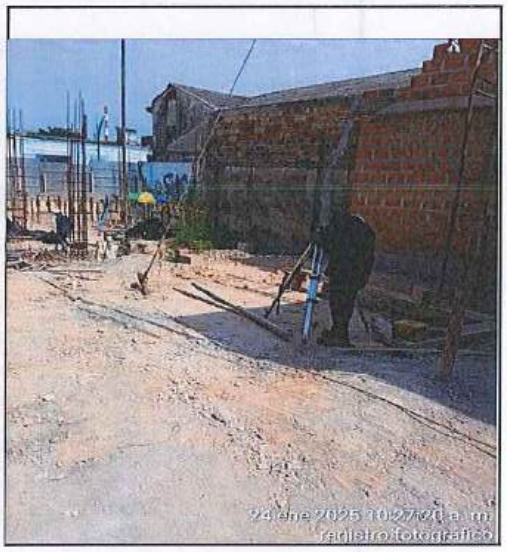


Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamyd66s@gmail.com

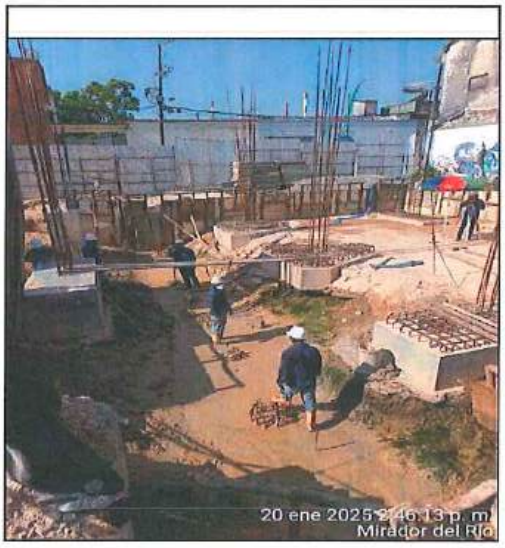


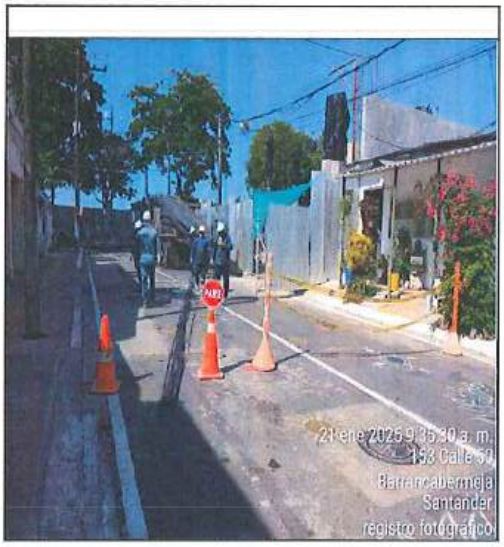





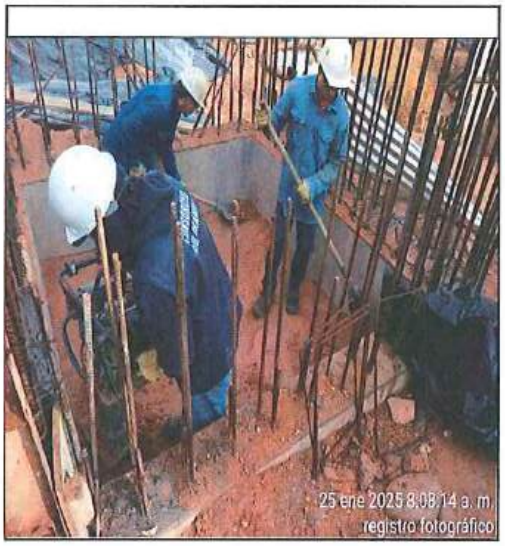

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

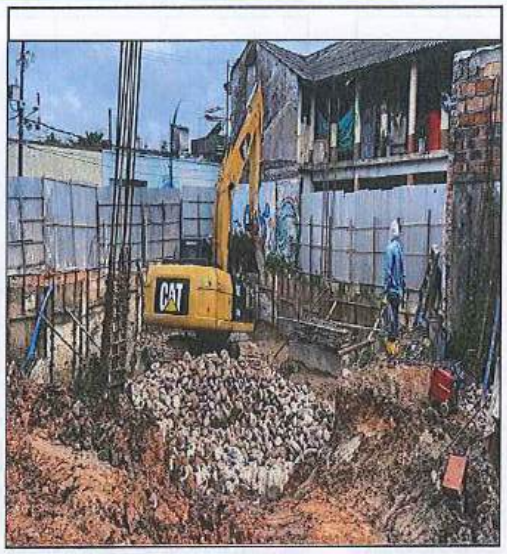


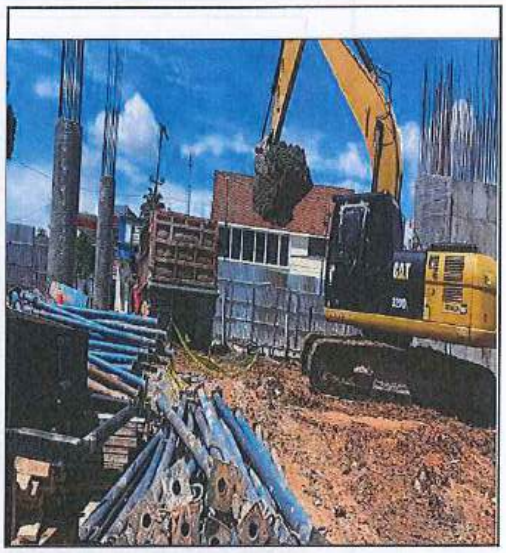


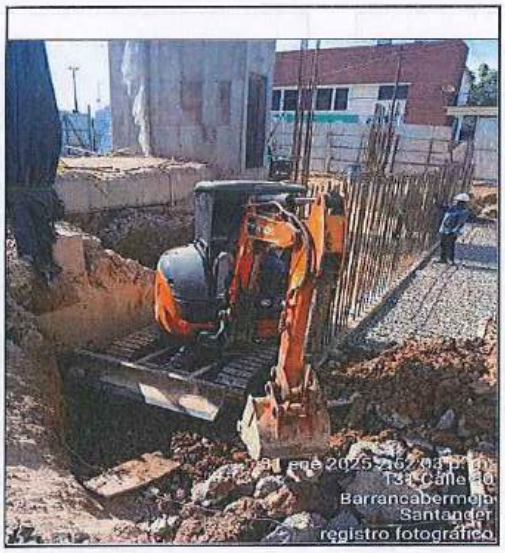




Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

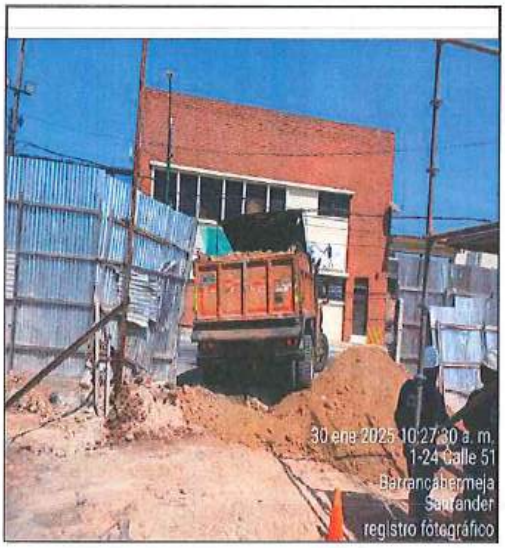

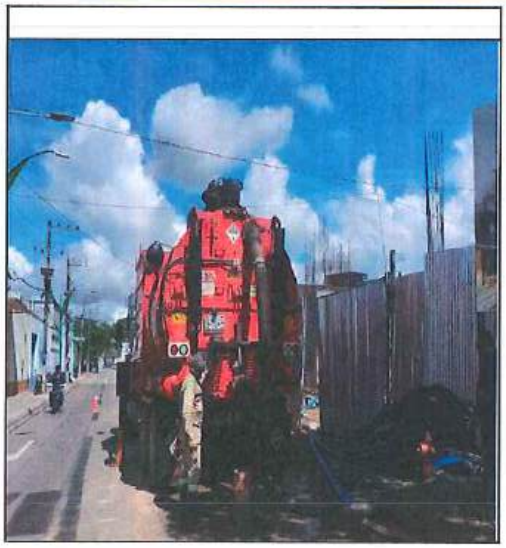


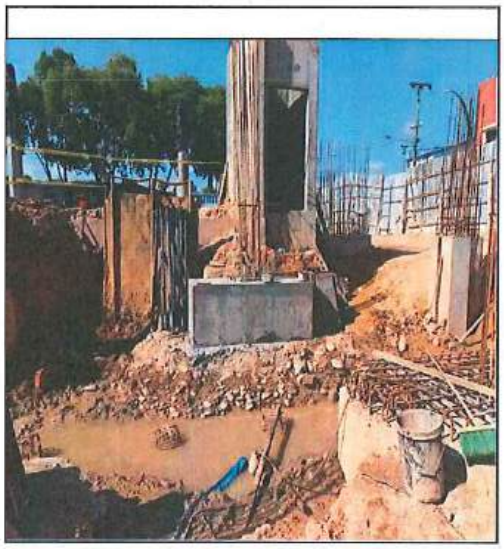





Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com




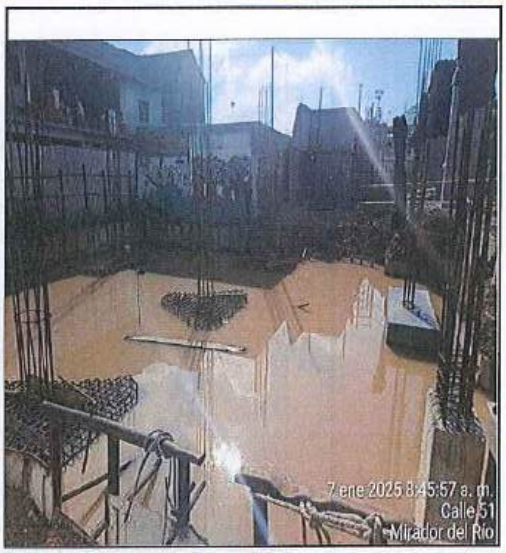


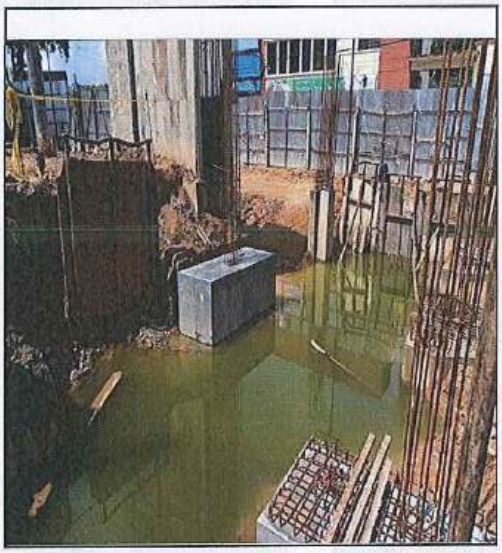


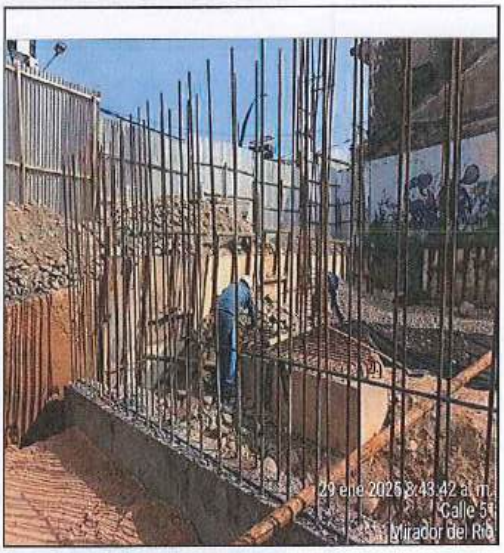


Barrancabermeja - Santander (607) 602 3665 ingenieriamydsss@gmail.com

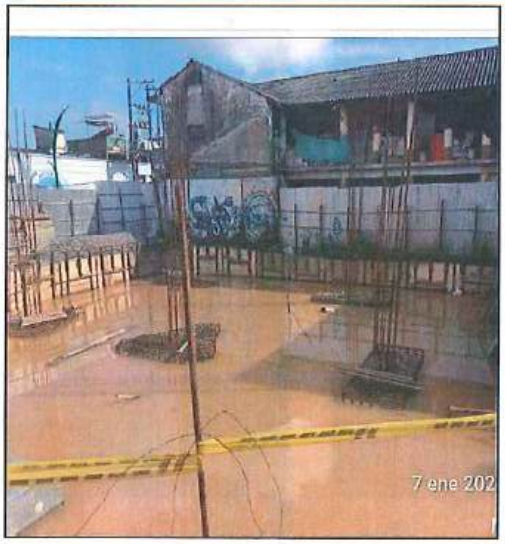


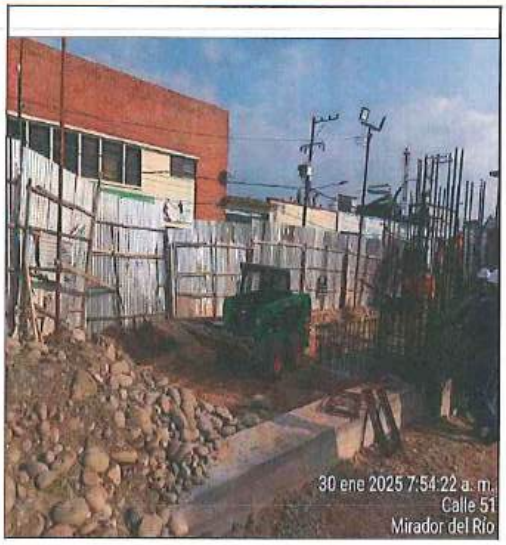

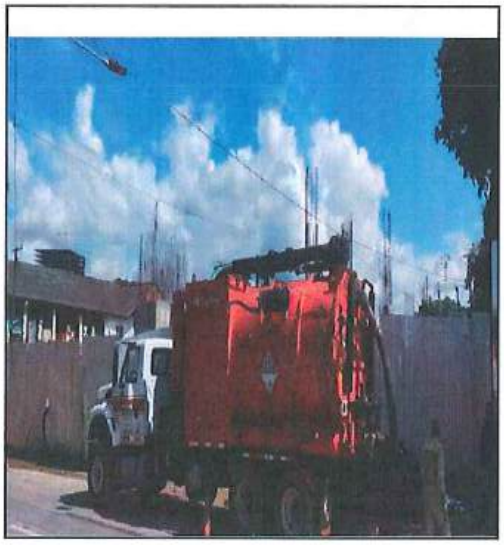

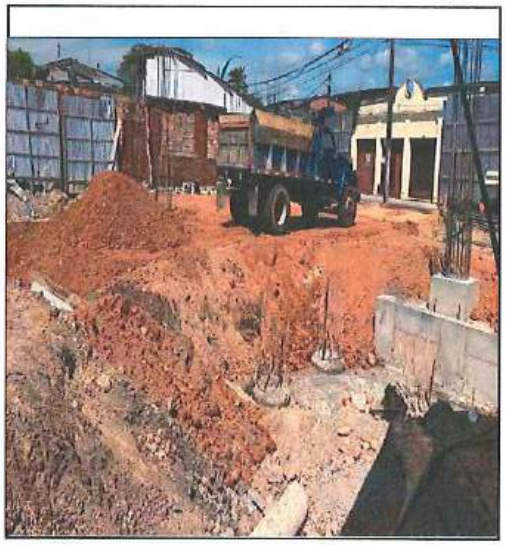


Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

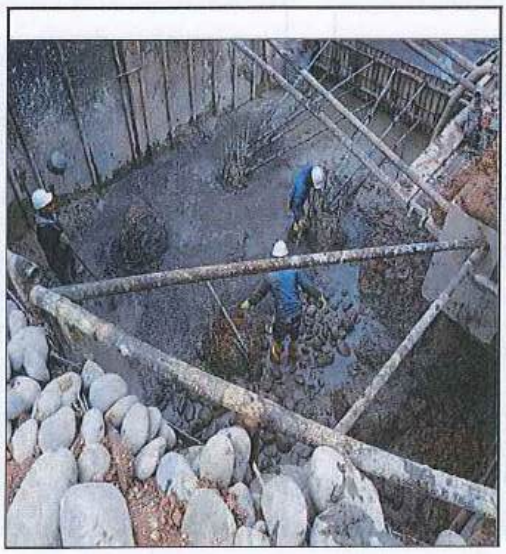







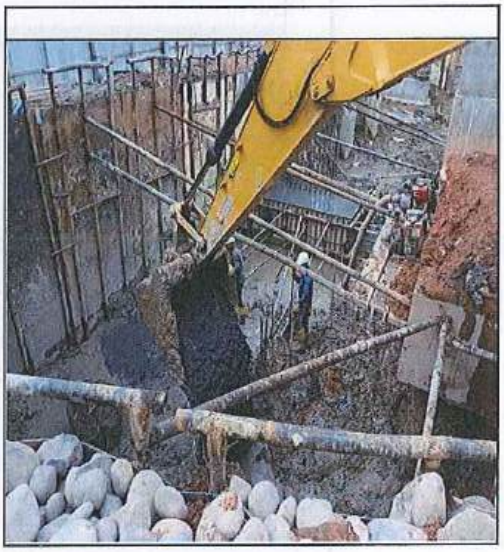


Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydas@gmail.com




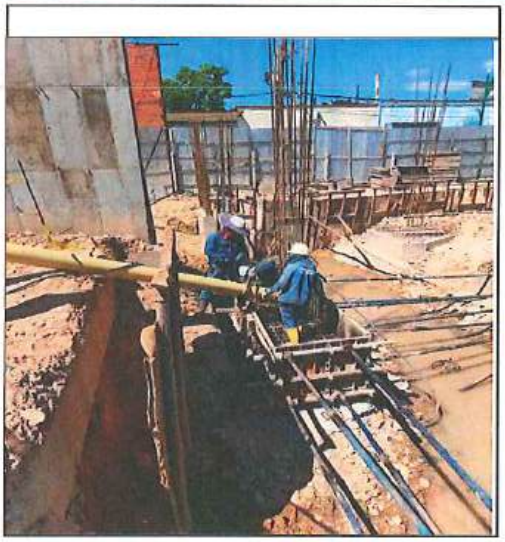


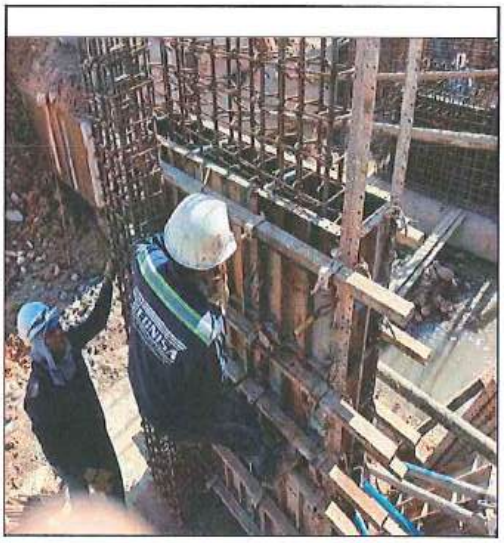


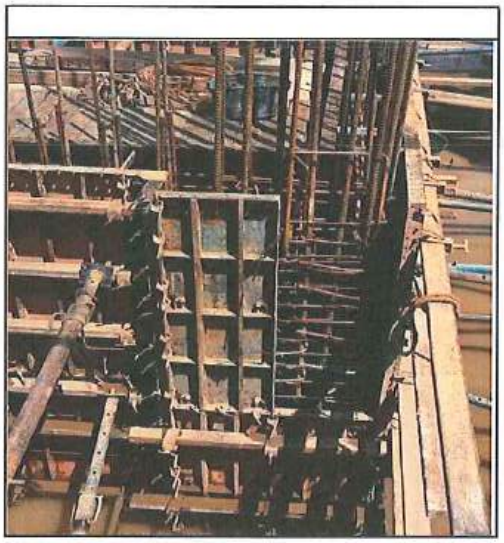


Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenierisamoydsas@gmail.com

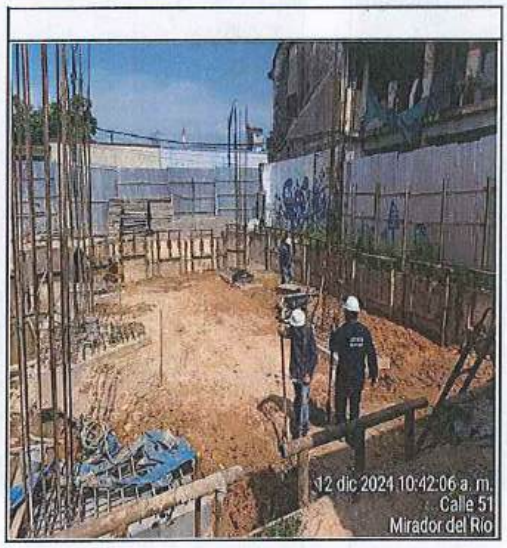

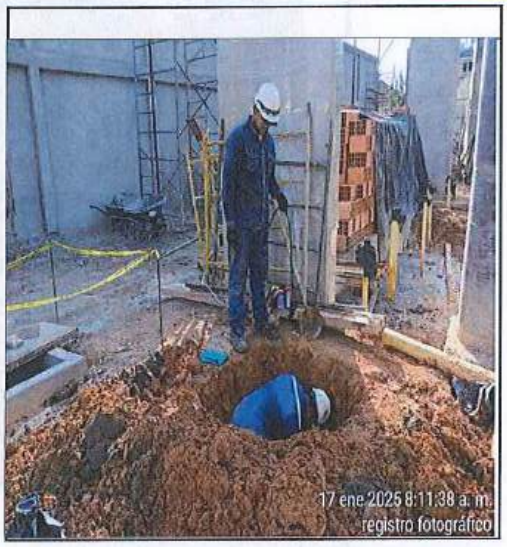


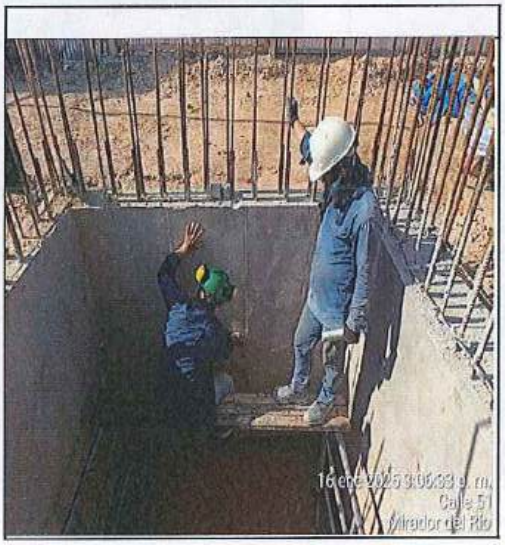


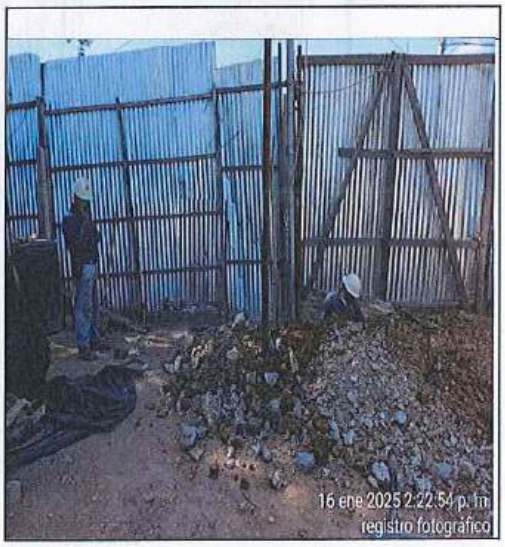


Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydssa@gmail.com



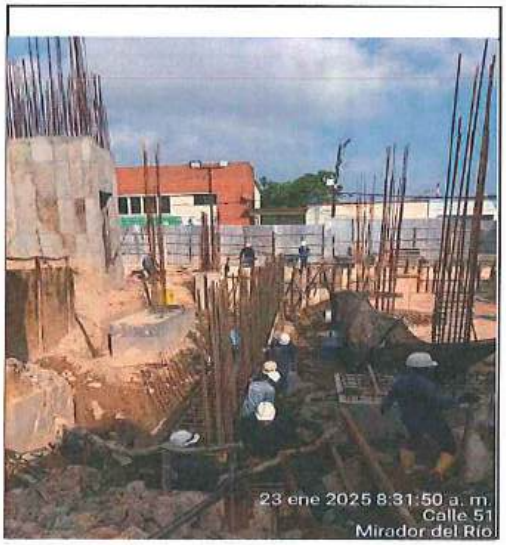


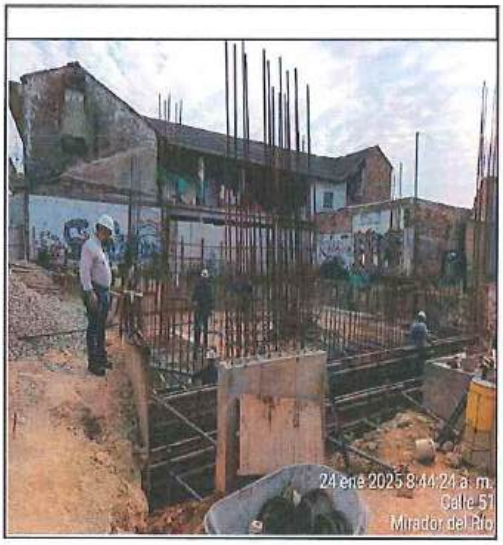


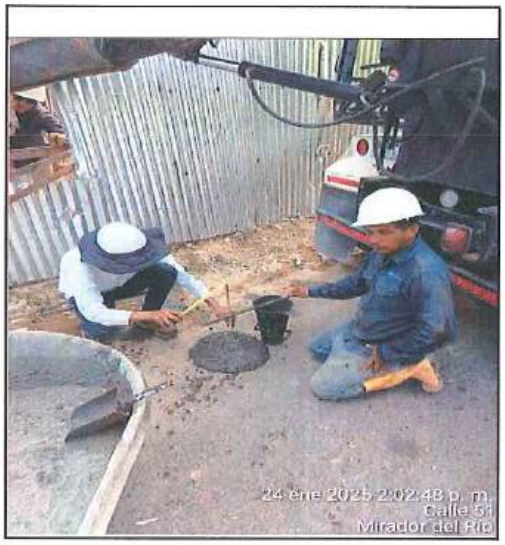


Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydas@gmail.com



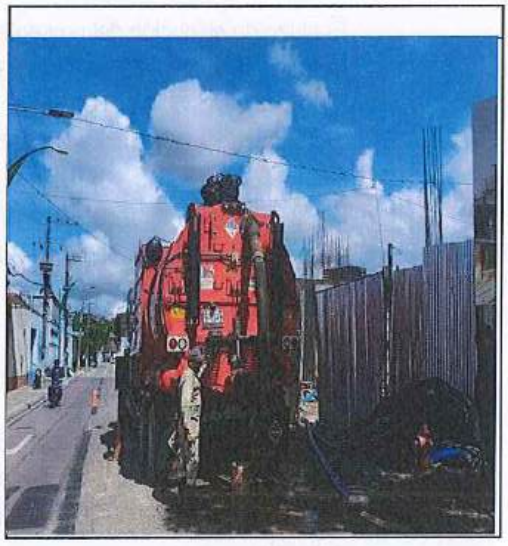

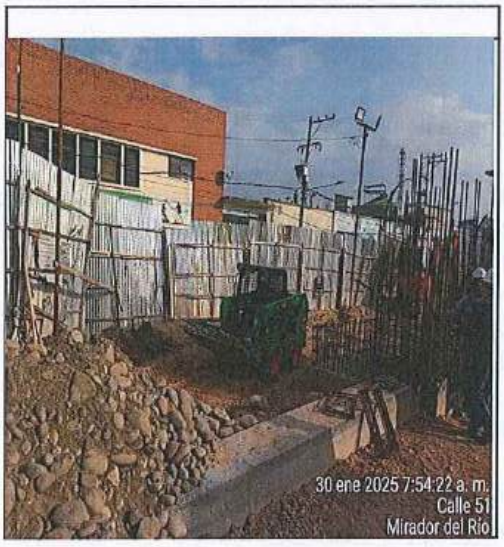

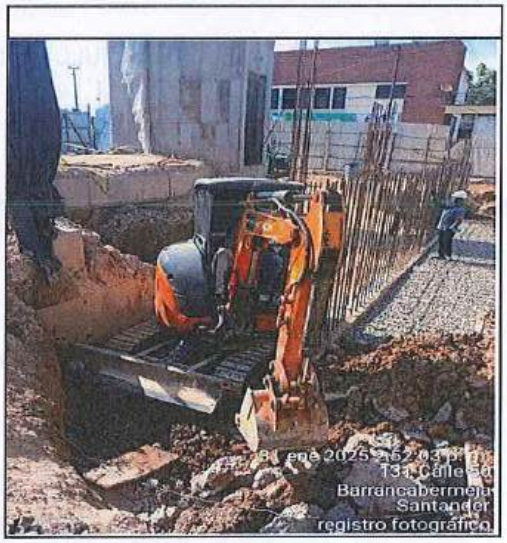

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

4. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución del presente Contrato INICIALMENTE era de TRECE (13) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

El 19 de septiembre se realizó la firma del acta de plazo adicional del contrato N°1, por Trece (13) meses.

El 23 de septiembre se realizó firma de la aclaratoria del acta de adicional de plazo N°1, con fecha de finalización **el 24 de octubre del 2025.**

5. CAPITULO II. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

En el presente documento se adjunta la licencia de Construcción en las modalidades de Obra Nueva y Demolición, solicitada y radicada mediante el No. 68081-1-22-0037 por la Curaduría Urbana 1 Barrancabermeja, el cual a la fecha se encuentra vigente y con el tiempo suficiente para el desarrollo total del proyecto.

6. CAPITULO III. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONTRATO DE OBRA

6.1. Seguimiento técnico por parte de interventoría

- Elaboración de informes semanales y mensuales correspondientes a las actividades ejecutadas para la correcta ejecución del contrato de obra en ejecución correspondiente al mes de agosto y septiembre del presente año.

- Se asistió a comités de obras/reuniones con la alcaldía municipal, contratista e interventoría para socializar trabajos y acciones tomadas.

Adicional se asistió a comités para determinar y programar los cronogramas de trabajos desarrollará.

- Se realizaron actividades de control, supervisión e inspección de la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos.

- Cuantificación de cantidades de obras ejecutadas en las múltiples actividades desarrolladas por el contratista en los tramos viales intervenidos con topografía y medición en sitio por parte del equipo de Interventoría.

- Se realizó registro fotográfico detallado de las actividades ejecutadas.

- Se realizó registro de las actividades de obra, diariamente ejecutadas en el libro de bitácora para el

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

- Informar sobre la supervisión y control que ejerce interventoría consorcio Intermirador a las obras que ejecuta el contratista Consorcio rio grande en la Construcción del Mirador del rio.

- El personal del consorcio Intermirador realiza la supervisión y control de las labores de campo ejecutadas en el proyecto, garantizando las condiciones contractuales, cumplimiento de especificaciones técnicas, términos y plazos con el fin de dar eficiencia y oportuna inversión de los recursos establecidos. Además, llevar al día el diligenciamiento de los formatos generados con respecto al control diario de actividades. En campo se realiza la verificación y el cumplimiento del programa del plan manejo Ambiental PMA, plan de seguridad y salud en el trabajo SST del contrato de obra. Elaboración de informes semanales y mensuales correspondientes a las actividades ejecutadas para la correcta ejecución del contrato de obra correspondientes al mes de marzo y abril del presente año.

- Se realizó registro de las actividades de obra diariamente ejecutadas y de los inconvenientes presentados en el libro bitácora para el contrato de obra No. 0401 de 2023 e interventoría No. 0532 de 2023.

6.2. Seguimiento Semanal

Con el fin de llevar un control de la programación para evaluar el avance o atraso del proyecto, se diligencia el informe semanal; esto con el fin de determinar los planes de contingencia necesarios en el caso de presentarse atrasos; de igual forma se identifican las situaciones y/o problemáticas presentadas durante la ejecución de las actividades del proyecto.

Durante la ejecución del contrato se han realizado los siguientes informes semanales por parte de la interventoría, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

INFORMES SEMANALES	
N°	DESCRIPCIÓN
01	INFORME SEMANAL NO 1- CTO. NO. 0401-23
02	INFORME SEMANAL NO 2- CTO. NO. 0401-23
03	INFORME SEMANAL NO 3- CTO. NO. 0401-23
04	INFORME SEMANAL NO 4- CTO. NO. 0401-23
05	INFORME SEMANAL NO 5. SUSPENSIÓN N°1 DE OBRA E INTERVENTORÍA 11-04-2023
06	INFORME SEMANAL NO 6. REINICIO N°1 DE OBRA E INTERVENTORÍA 08-05-2023
07	INFORME SEMANAL NO 7- CTO. NO. 0401-23
08	INFORME SEMANAL NO 8- CTO. NO. 0401-23
09	INFORME SEMANAL NO 9- CTO. NO. 0401-23
10	INFORME SEMANAL NO 10- CTO. NO. 0401-23

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3665 ingenieriamydsas@gmail.com

11	INFORME SEMANAL NO 11- CTO. NO. 0401-23
12	INFORME SEMANAL NO 12- CTO. NO. 0401-23
13	INFORME SEMANAL NO 13- CTO. NO. 0401-23
14	INFORME SEMANAL NO 14- CTO. NO. 0401-23
15	INFORME SEMANAL NO 15- CTO. NO. 0401-23
16	INFORME SEMANAL NO 16- CTO. NO. 0401-23
17	INFORME SEMANAL NO 17- CTO. NO. 0401-23
18	INFORME SEMANAL NO 18- CTO. NO. 0401-23
19	INFORME SEMANAL NO 19- CTO. NO. 0401-23
20	INFORME SEMANAL NO 20- CTO. NO. 0401-23
21	INFORME SEMANAL NO 21- CTO. NO. 0401-23
22	INFORME SEMANAL NO 22- CTO. NO. 0401-23
23	INFORME SEMANAL NO 23- CTO. NO. 0401-23
24	INFORME SEMANAL NO 24- CTO. NO. 0401-23
25	INFORME SEMANAL NO 25. SUSPENSIÓN N°2 DE OBRA E INTERVENTORÍA 19-09-2023- CTO. NO. 0401-23
26	INFORME SEMANAL NO 26. REINICIO N°2 DE OBRA E INTERVENTORÍA 03-10-2023- CTO. NO. 0401-23
27	INFORME SEMANAL NO 27. SUSPENSIÓN N°3 DE OBRA E INTERVENTORÍA 12-10-2023- CTO. NO. 0401-23
28	INFORME SEMANAL NO 28- CTO. NO. 0401-23
29	INFORME SEMANAL NO 29. REINICIO N°3 DE OBRA E INTERVENTORÍA 11-03-2024- CTO. NO. 0401-23
30	INFORME SEMANAL NO 30- CTO. NO. 0401-23
31	INFORME SEMANAL NO 31- CTO. NO. 0401-23
32	INFORME SEMANAL NO 32- CTO. NO. 0401-23
33	INFORME SEMANAL NO 33- CTO. NO. 0401-23
34	INFORME SEMANAL NO 34- CTO. NO. 0401-23
35	INFORME SEMANAL NO 35- CTO. NO. 0401-23
36	INFORME SEMANAL NO 36- CTO. NO. 0401-23
37	INFORME SEMANAL NO 37- CTO. NO. 0401-23
38	INFORME SEMANAL NO 38- CTO. NO. 0401-23
39	INFORME SEMANAL NO 39- CTO. NO. 0401-23
40	INFORME SEMANAL NO 40- CTO. NO. 0401-23
41	INFORME SEMANAL NO 41- CTO. NO. 0401-23
42	INFORME SEMANAL NO 42- CTO. NO. 0401-23
43	INFORME SEMANAL NO 43- CTO. NO. 0401-23
44	INFORME SEMANAL NO 44- CTO. NO. 0401-23
45	INFORME SEMANAL NO 45- CTO. NO. 0401-23
46	INFORME SEMANAL NO 46- CTO. NO. 0401-23
47	INFORME SEMANAL NO 47- CTO. NO. 0401-23

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

48	INFORME SEMANAL NO 48- CTO. NO. 0401-23
49	INFORME SEMANAL NO 49- CTO. NO. 0401-23
50	INFORME SEMANAL NO 50- CTO. NO. 0401-23
51	INFORME SEMANAL NO 51. ACTA DE PACTACIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA 05-08-2024 ACTA DE MODIFICATORIA DE OBRA E INTERVENTORÍA 12-08-2024
52	INFORME SEMANAL NO 52- CTO. NO. 0401-23
53	INFORME SEMANAL NO 53- CTO. NO. 0401-23
54	INFORME SEMANAL NO 54- CTO. NO. 0401-23
55	INFORME SEMANAL NO 55- CTO. NO. 0401-23
56	INFORME SEMANAL NO 56- CTO. NO. 0401-23
57	INFORME SEMANAL NO 57- CTO. NO. 0401-23 ACTA DE ADICIONAL DE PLAZO 1 DE OBRA E INTERVENTORÍA 19-09-2024. El avance físico Programado reportado Cambia ya que el porcentaje se distribuyó hasta el 24 de octubre del 2025.
58	INFORME SEMANAL NO 58- CTO. NO. 0401-23. ACTA DE ACLARATORIA DE ADICIONAL DE PLAZO 1 DE OBRA E INTERVENTORÍA 23-09-2024. Fecha de finalización 24 de octubre del 2024
59	INFORME SEMANAL NO 59- CTO. NO. 0401-23
60	INFORME SEMANAL NO 60- CTO. NO. 0401-23
61	INFORME SEMANAL NO 61- CTO. NO. 0401-23
62	INFORME SEMANAL NO 62- CTO. NO. 0401-23
63	INFORME SEMANAL NO 63- CTO. NO. 0401-23. Acta aclaratoria N°1 AL ACTA DE PRORROGA N°3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3
64	INFORME SEMANAL NO 64- CTO. NO. 0401-23
65	INFORME SEMANAL NO 65- CTO. NO. 0401-23
66	INFORME SEMANAL NO 66- CTO. NO. 0401-23
67	INFORME SEMANAL NO 67- CTO. NO. 0401-23
68	INFORME SEMANAL NO 68- CTO. NO. 0401-23
69	INFORME SEMANAL NO 69- CTO. NO. 0401-23
70	INFORME SEMANAL NO 70- CTO. NO. 0401-23
71	INFORME SEMANAL NO 71- CTO. NO. 0401-23
72	INFORME SEMANAL NO 72- CTO. NO. 0401-23
73	INFORME SEMANAL NO 73- CTO. NO. 0401-23, Se realiza Asignación del Ing. Luis Fernando Fonseca como Supervisor al contrato 0532-23 de Interventoría por parte de la Secretaría de Infraestructura.
74	INFORME SEMANAL NO 74- CTO. NO. 0401-23
75	INFORME SEMANAL NO 75- CTO. NO. 0401-23, Se realiza Acta Modificatoria N°02, Acta de pactación de precios de Ítem No Previstos de Acuerdo al Acta de Modificatoria N°02 y se realiza reajuste y reprogramación del PDT
76	INFORME SEMANAL NO 76- CTO. NO. 0401-23

Tabla 1. Relación de informes semanales
Fuente: Propia

6.4. Seguimiento administrativo por parte de interventoría

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriasmydsas@gmail.com

- Se realizaron afiliaciones y pagos a la seguridad social del personal administrativo y operativo vinculado al proyecto por parte de la empresa INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMIRADOR.
- Recepción de correspondencia y seguimiento a correspondencia enviada para el Contratista de Obra y Entidad Contratante.
- Se realizó registro de las actividades de obra diariamente ejecutadas en el libro bitácora para el contrato de obra No. 0401 de 2023 e interventoría 0532 de 2023.
- Se realizaron los pagos de parafiscales.
- Se realizó actividades de seguimiento, verificación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales del contrato.
- El porcentaje de avance al corte del informe semanal 76 semana 48 fue del 28,13%.

6.5. Seguimiento jurídico por parte de interventoría

- Se realizó revisión y verificación de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil para el contrato de obra No. 0401 de 2023.

6.6. Seguimiento ambiental por parte de Interventoría.

- Verificación que la disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), se realice en botaderos autorizados.
- Se realizó revisión y verificación de cumplimiento al plan de calidad durante la ejecución de las actividades de obras programadas.
- Se exigió al contratista realizar seguimiento al cumplimiento a las normas de salud e higiene del trabajo.

6.7. Cantidad de obra

A Continuación de resume en el siguiente cuadro los ítem o actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 16 de octubre al 11 de febrero de 2025

Ítem	Descripción	Und.	Cantidad	valor parcial
01	**Obras preliminares**			
1,01	Edu. Campamento e instalaciones provisionales (ver diseño)	Mes	14,00	$ 77.671.398,00
1.07 NP	Cerramiento en lámina de zinc de dimensiones 3m * 0,8 m reforzada con madera rolliza de 2"x2" empotrada 50cm en concreto de 14 mpa y triple refuerzo transversal con listones de 2x2", incluye dos puertas para entrada de camiones en lamina	Ml	171,78	$ 35.789.504,10

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydsas@gmail.com

	y bordillo perimetral			
Total edu. Campamento e instalaciones provisionales (ver diseño)				**$ 113.460.902,10**
2,02	Relleno en material de seleccionado compactado	M3	4006,47	$ 196.204.848,84
2,03	Relleno en material de subbase granular compactado	M3	413,07	$ 50.171.482,20
2,04	Relleno en material de base granular compactado	M3	181,93	$ 22.522.934,00
2,06	Excavación y concreto para pilotes f'c= 28 mpa	M3	161,44	$ 237.361.680,32
2,07	Excavación para tanque, semisótano, dados, zapatas y vigas de amarre	M3	2282,92	$ 83.988.626,80
2,08	Concreto para solado f'c= 14 mpa (e=0.05m)	M2	239,32	$ 6.441.058,48
2,09	Relleno en pedraplén para mejoramiento según estudio de suelos	M3	2131,65	$ 222.286.330,35
2,10	Concreto para dados de cimentación f'c= 35 mpa	M3	67,94	$ 45.624.767,30
2,11	Concreto para losa de fondo del tanque f'c= 28 mpa (e=0.3m)	M3	51,43	$ 38.036.393,68
2,12	Concreto para pedestal f'c= 28 mpa	M3	12,28	$ 7.667.582,88
2,13	Concreto para vigas de amarre f'c= 28 mpa	M3	16,53	$ 11.932.428,45
2.15 NP	Descabezado de pilotes	Und	24,00	$ 4.363.368,00
2.16 NP	Suministro e instalación de geotextil no tejido NT 2000 o similar	M2	541,40	$ 8.695.425,40
2.17 NP	Suministro e instalación de geotextil no tejido NT 2500 o similar	M2	1995,00	$ 38.078.565,00
2.18 NP	Muro de contención temporal, mediante tablaestacado en módulos metálicos h:6.0 mts, incluye tubería 4" tipo pesado con punta de lápiz	M2	392,17	$ 334.469.175,03
2.19 NP	Bombeo y manejo de aguas	Dia	151,00	$ 63.756.428,00
Total movimientos de tierra y cimentación				**$ 1.371.601.094,73**
3,02	Concreto impermeabilizado para muros de tanque f'c= 28 mpa	M3	44,39	$ 46.874.153,18
3,03	Concreto para muros de contención f'c= 28 mpa	M3	21,44	$ 23.328.263,68
3,11	Acero de refuerzo	Kg	68603,61	$ 461.496.484,47
3,13 NP	Acarreo y retiro de lodos producto de perforación de pilotes (material saturado contaminado)	M3	4554,18	$ 691.652.424,96
3,14 NP	Concreto autocompactante para columnas f'c= 35 mpa	M3	62,55	$ 125.368.863,82
Total estructuras en concreto y metálicas				**$ 1.348.720.190,11**
4,01	Levante de mampostería en ladrillo cerámico no. 5 12 x 20 x 30 cm	M2	170,00	$ 8.547.090,00
Total muros divisorios y prefabricados				**$ 8.547.090,00**

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydass@gmail.com

5,02	Pañete allanado sobre muro con mortero 1:4 impermeabilizado	M2	340,00	$ 11.603.180,00
Total pañetes, estuco y pintura				**$ 11.603.180,00**
13,10	Excavación a mano (no incluye retiro del material sobrante)	M3	341,98	$ 12.481.586,04
13.3.1	Suministro e instalación de tubería PVC d=2" (incluye accesorios)	Ml	84,91	$ 3.105.668,16
13.3.3	Suministro e instalación de tubería PVC d=4" (incluye accesorios)	Ml	90,95	$ 4.707.935,80
13.3.4	Suministro e instalación de tubería PVC d=6" (incluye accesorios)	Ml	129,55	$ 13.143.236,15
13.3.7	Registro de 0.80 x 0.80 x 1.00-1.20 mts en mampostería, mortero de pega 1:4, pañetado con mortero 1:6 impermeabilizado, tapa en concreto de 3000 psi	Und	11,00	$ 3.635.291,00
13.6.1	Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias tubería PVC 4" (incluye accesorios)	Ml	13,84	$ 559.841,84
13.6.2	Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias tubería PVC 6" (incluye accesorios)	Ml	87,00	$ 8.728.710,00
13.6.3	Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias tubería PVC 8" (incluye accesorios)	Ml	122,00	$ 18.264.010,00
13.6.7	Registro de 0.80 x 0.80 x 1.00-1.20 mts en mampostería, mortero de pega 1:4, pañetado con mortero 1:6 impermeabilizado, tapa en concreto de 3000 psi	Und	6,00	$ 2.007.954,00
Total instalaciones hidrosanitarias				**$ 66.634.232,99**
Costo directo de la obra				**$ 2.920.566.689,93**
Administración				**$ 834.723.773,42**
Imprevistos				**$ 29.205.666,90**
Utilidad				**$ 146.028.334,50**
Valor de la obra (costos directos + costos indirectos)				**$ 3.930.524.464,74**

Tabla 2. Cantidades de Obras ejecutada en el periodo

Barrancabermeja - Santander (607) 602 3465 ingenieriamydas@gmail.com

Consorcio
Río Grande

EQUIPO MÍNIMO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-10	972508281	9474518337	E	2024/10/10	2024/10/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,414,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (3 Afiliados)							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
Centro de Trabajo: EQ MIN V (3 Afiliados)							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
1	CC	9102427	CORREA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER		23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
2	CC	13923929	GOMEZ BARON JORGE ANTONIO		23010 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
3	CC	73167554	HERRERA HERNANDEZ JAVIER MAURICIO		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total			**Afiliados(3)**				$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-10	972508281	9474518337	E	2024/10/10	2024/10/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,414,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$800,000	$0	$0	$800,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$0	$0	$240,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$542,900	$0	$0	$542,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$542,900	$0	$0	$542,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$312,000	$0	$0	$312,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$312,000	$0	$0	$312,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$312,000	$0	$0	$312,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$260,000	$0	$0	$260,000
TOTAL				3	$2,414,900	$0	$0	$2,414,900

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/10/11 11:48 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO RIO GRANDE identificado(a) con NI 901668549 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FRANCISCO JAVIER CORREA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 9102427

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																	$5,000,000	16%	$800,000
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30																	$5,000,000		$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30																	$5,000,000		$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30																	$0	0%	$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30																	$0	0%	$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																	$5,000,000	6.96%	$348,000
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	$5,000,000	16%	$800,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																	$5,000,000		$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																	$5,000,000		$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																	$0	0%	$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																	$0	0%	$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	$5,000,000	6.96%	$348,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$5,000,000	16%	$800,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30																	$5,000,000		$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30																	$5,000,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30																	$0	0%	$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30																	$0	0%	$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$5,000,000	6.96%	$348,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$5,000,000	16%	$800,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																	$5,000,000		$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																	$5,000,000		$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																	$0	0%	$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																	$0	0%	$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$5,000,000	6.96%	$348,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$5,000,000	4%	$200,000

Este certificado se expide el día 2025-03-13 a las 09:33.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO RIO GRANDE identificado(a) con NI 901668549 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ANTONIO GOMEZ BARON identificado(a) con CC 13923929

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$1,500,000	4%	$60,000
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$1,500,000	16%	$240,000
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30																		$1,500,000		$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30																		$1,500,000		$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30																		$0	0%	$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30																		$0	0%	$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$1,500,000	6.96%	$104,400
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$1,500,000	4%	$60,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$1,500,000	4%	$60,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,500,000	16%	$240,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																		$1,500,000		$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$1,500,000		$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,500,000	6.96%	$104,400
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,500,000	4%	$60,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,500,000	4%	$60,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		$1,500,000	16%	$240,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30																		$1,500,000		$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30																		$1,500,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30																	$0	0%	$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30																	$0	0%	$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$1,500,000	6.96%	$104,400
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$1,500,000	4%	$60,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$1,500,000	4%	$60,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$1,500,000	16%	$240,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																	$1,500,000		$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																	$1,500,000		$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																	$0	0%	$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																	$0	0%	$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$1,500,000	6.96%	$104,400
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$1,500,000	4%	$60,000

Este certificado se expide el día 2025-03-13 a las 09:34.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO RIO GRANDE identificado(a) con NI 901668549 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAVIER MAURICIO HERRERA HERNANDEZ identificado(a) con CC 73167554

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X											$1,423,500	4%	$57,000
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$1,423,500	16%	$227,800
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X											$1,423,500		$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X											$1,423,500		$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X											$0	0%	$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X											$0	0%	$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$1,423,500	6.96%	$99,100
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$1,423,500	4%	$57,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$1,300,000	4%	$52,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	16%	$208,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																		$1,300,000		$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$1,300,000		$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	6.96%	$90,500
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	4%	$52,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	4%	$52,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		$1,300,000	16%	$208,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30																		$1,300,000		$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30																		$1,300,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30																	$0	0%	$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30																	$0	0%	$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$1,300,000	6.96%	$90,500
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$1,300,000	4%	$52,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$1,300,000	4%	$52,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$1,300,000	16%	$208,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																	$1,300,000		$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																	$1,300,000		$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																	$0	0%	$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																	$0	0%	$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$1,300,000	6.96%	$90,500
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$1,300,000	4%	$52,000

Este certificado se expide el día 2025-03-13 a las 09:35.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1049305165	9476717020	E	2024/11/14	2024/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (11 Afiliados)																									$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Centro de Trabajo: EQ MIN V (11 Afiliados)																									$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																									$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
1	CC	1052967294	CASTRO DE LEON TULIO ARMANDO	X	X															X			23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF40	1	$138,890	$5,600	14-4	1	$133,334	6.960%	$9,300	1	$0	$0	SI	$41,700
2	CC	9102427	CORREA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER																				23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
3	CC	74180122	GARCIA AVELLA GUILLERMO ALONSO	X	X															X			23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
4	CC	13923929	GOMEZ BARON JORGE ANTONIO																				23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
5	CC	73167554	HERRERA HERNANDEZ JAVIER MAURICIO																				23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	1098605107	LOPEZ TOBAR YONNE KATHERINE	X	X															X			23100 1	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF40	1	$52,083	$2,100	14-4	1	$50,000	6.960%	$3,500	1	$0	$0	SI	$15,600
7	CC	12647521	MAESTRE ALVAREZ ERIS ENRIQUE																				23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
8	CC	77091383	MEJIA ALVAREZ LUIS ADRIAN																				23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
9	CC	1096244499	SALOM PADILLA JHAN CARLOS	X	X															X			23020 1	1	$100,000	$16,000	EPS041	1	$100,000	$4,000	CCF40	1	$104,167	$4,200	14-4	1	$100,000	6.960%	$7,000	1	$0	$0	SI	$31,200
10	CC	91496077	SILVA RUEDA EDWING ALIRIO	X	X															X			23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
11	CC	1121936429	VELASCO MAYRA ALEJANDRA																				23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total		**Afiliados(11)**																							$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1049305165	9476717020	E	2024/11/14	2024/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,946,800	$0	$0	$2,946,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$808,000	$0	$0	$808,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,061,400	$0	$0	$1,061,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,077,400	$0	$0	$1,077,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$737,900	$0	$0	$737,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	$737,900	$0	$0	$737,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$736,800	$0	$0	$736,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$305,400	$0	$0	$305,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,000	$0	$0	$4,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$54,000	$0	$0	$54,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$373,400	$0	$0	$373,400
TOTAL				11	$5,703,600	$0	$0	$5,703,600

PLANILLA PAGADA

2024/11/14 01:55 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9016685-9	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1115153646	9478573857	E	2024/12/11	2024/12/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (11 Afiliados)																								$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Centro de Trabajo: EQ MIN V (11 Afiliados)																								$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																								$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
1	CC	1052967294	CASTRO TULIO	X	X															X		23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF40	1	$138,890	$5,600	14-4	1	$133,334	6.960%	$9,300	1	$0	$0	SI	$41,700
2	CC	9102427	CORREA FRANCISCO																			23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
3	CC	74180122	GARCIA GUILLERMO	X	X															X		23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
4	CC	13923929	GOMEZ JORGE																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
5	CC	73167554	HERRERA JAVIER																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	1098605107	LOPEZ IVONNE	X	X															X		23100 1	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF40	1	$52,083	$2,100	14-4	1	$50,000	6.960%	$3,500	1	$0	$0	SI	$15,600
7	CC	12647521	MAESTRE ERIS																			23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
8	CC	77091383	MEJIA LUIS																			23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
9	CC	1096244499	SALOM JHAN	X	X															X		23020 1	1	$100,000	$16,000	EPS041	1	$100,000	$4,000	CCF40	1	$104,167	$4,200	14-4	1	$100,000	6.960%	$7,000	1	$0	$0	SI	$31,200
10	CC	91496077	SILVA EDWING	X	X															X		23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
11	CC	1121936429	VELASCO MAYRA																			23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total		**Afiliados(11)**																						$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1115153646	9478573857	E	2024/12/11	2024/12/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,946,800	$0	$0	$2,946,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$808,000	$0	$0	$808,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,061,400	$0	$0	$1,061,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,077,400	$0	$0	$1,077,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$737,900	$0	$0	$737,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	$737,900	$0	$0	$737,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$736,800	$0	$0	$736,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$305,400	$0	$0	$305,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,000	$0	$0	$4,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$54,000	$0	$0	$54,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$373,400	$0	$0	$373,400
TOTAL				11	$5,703,600	$0	$0	$5,703,600

2024/12/16 08:47 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185933980	9479838769	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (11 Afiliados)																									$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Centro de Trabajo: EQ MIN V (11 Afiliados)																									$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																									$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
1	CC	1052967294	CASTRO DE LEON TULIO ARMANDO	X	X															X	23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF40	1	$138,890	$5,600	14-4	1	$133,334	6.960%	$9,300	1	$0	$0	SI	$41,700
2	CC	9102427	CORREA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER																		23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
3	CC	74180122	GARCIA AVELLA GUILLERMO ALONSO	X	X															X	23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
4	CC	13923929	GOMEZ BARON JORGE ANTONIO																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
5	CC	73167554	HERRERA HERNANDEZ JAVIER MAURICIO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	1098605107	LOPEZ TOBAR IVONNE KATHERINE	X	X															X	23100 1	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF40	1	$52,083	$2,100	14-4	1	$50,000	6.960%	$3,500	1	$0	$0	SI	$15,600
7	CC	12647521	MAESTRE ALVAREZ ERIS ENRIQUE																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
8	CC	77091383	MEJIA ALVAREZ LUIS ADRIAN																		23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
9	CC	1096244499	SALOM PADILLA JHAN CARLOS	X	X															X	23020 1	1	$100,000	$16,000	EPS041	1	$100,000	$4,000	CCF40	1	$104,167	$4,200	14-4	1	$100,000	6.960%	$7,000	1	$0	$0	SI	$31,200
10	CC	91496077	SILVA RUEDA EDWING ALIRIO	X	X															X	23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
11	CC	1121936429	VELASCO MAYRA ALEJANDRA																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total			**Afiliados(11)**																						$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185933980	9479838769	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,946,800	$0	$0	$2,946,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$808,000	$0	$0	$808,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,061,400	$0	$0	$1,061,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,077,400	$0	$0	$1,077,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$737,900	$0	$0	$737,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	$737,900	$0	$0	$737,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$736,800	$0	$0	$736,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$305,400	$0	$0	$305,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,000	$0	$0	$4,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$54,000	$0	$0	$54,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$373,400	$0	$0	$373,400
TOTAL				11	$5,703,600	$0	$0	$5,703,600

PLANILLA PAGADA

2025/01/14 10:14 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1261226353	9481353911	E	2025/02/12	2025/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,742,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (11 Afiliados)																										$18,540,168	$2,966,600			$18,540,168	$741,800			$18,565,862	$742,900			$18,540,168		$1,290,700		$0	$0		$5,742,000
Centro de Trabajo: EQ MIN V (11 Afiliados)																										$18,540,168	$2,966,600			$18,540,168	$741,800			$18,565,862	$742,900			$18,540,168		$1,290,700		$0	$0		$5,742,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																										$18,540,168	$2,966,600			$18,540,168	$741,800			$18,565,862	$742,900			$18,540,168		$1,290,700		$0	$0		$5,742,000
1	CC	1052967294	CASTRO TULIO	X	X															X	23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF40	1	$138,890	$5,600	14-4	1	$133,334	6.960%	$9,300	1	$0	$0	SI	$41,700
2	CC	9102427	CORREA FRANCISCO																		23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
3	CC	74180122	GARCIA GUILLERMO	X	X															X	23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
4	CC	13923929	GOMEZ JORGE																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
5	CC	73167554	HERRERA JAVIER							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1098605107	LOPEZ IVONNE	X	X															X	23100 1	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF40	1	$52,083	$2,100	14-4	1	$50,000	6.960%	$3,500	1	$0	$0	SI	$15,600
7	CC	12647521	MAESTRE ERIS																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
8	CC	77091383	MEJIA LUIS																		23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
9	CC	1096244499	SALOM JHAN	X	X															X	23020 1	1	$100,000	$16,000	EPS041	1	$100,000	$4,000	CCF40	1	$104,167	$4,200	14-4	1	$100,000	6.960%	$7,000	1	$0	$0	SI	$31,200
10	CC	91496077	SILVA EDWING	X	X															X	23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
11	CC	1121936429	VELASCO MAYRA																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total			**Afiliados(11)**																							$18,540,168	$2,966,600			$18,540,168	$741,800			$18,565,862	$742,900			$18,540,168		$1,290,700		$0	$0		$5,742,000

2025/02/15 10:01 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1261226353	9481353911	E	2025/02/12	2025/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,742,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,966,600	$0	$0	$2,966,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$808,000	$0	$0	$808,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,061,400	$0	$0	$1,061,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,097,200	$0	$0	$1,097,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,290,700	$0	$0	$1,290,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,290,700	$0	$0	$1,290,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$742,900	$0	$0	$742,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	$742,900	$0	$0	$742,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$741,800	$0	$0	$741,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$305,400	$0	$0	$305,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,000	$0	$0	$4,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$59,000	$0	$0	$59,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$373,400	$0	$0	$373,400
TOTAL				11	$5,742,000	$0	$0	$5,742,000

Consorcio
Río Grande

PERSONAL OPERATIVO

Barrancabermeja - Santander 602 - 34- 65 gestiontecnica@cscriogrande.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	972519236	9474518386	E	2024/10/10	2024/10/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$14,649,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (27 Afiliados)																						$47,483,331	$7,598,500			$47,483,331	$1,900,600			$47,088,841	$1,884,800			$47,483,331		$3,265,100		$0	$0		$14,649,000

2024/10/11 11:49 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: OPE V (27 Afiliados)										$47,483,331	$7,598,500			$47,483,331	$1,900,600			$47,088,841	$1,884,800			$47,483,331		$3,265,100		$0	$0		$14,649,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (27 Afiliados)										$47,483,331	$7,598,500			$47,483,331	$1,900,600			$47,088,841	$1,884,800			$47,483,331		$3,265,100		$0	$0		$14,649,000
1	CC	1102884306	ALTAMIRANDA MARTINEZ ANGIE PAOLA					25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1096204542	AVENDAÑO CUELLAR ERBINSON		X			23030 1	30	$1,773,913	$283,900	EPS037	30	$1,773,913	$71,000	CCF40	30	$1,773,913	$71,000	14-4	30	$1,773,913	6.960%	$123,500	30	$0	$0	SI	$549,400
3	CC	1096253522	AVENDAÑO CUELLAR VICTOR ADOLFO		X			23030 1	30	$1,349,457	$216,000	EPS041	30	$1,349,457	$54,000	CCF40	30	$1,349,457	$54,000	14-4	30	$1,349,457	6.960%	$94,000	30	$0	$0	SI	$418,000
4	CC	92033972	CUELLO CONTRERAS ARGEMIRO MIGUEL		X			23020 1	30	$2,106,078	$337,000	EPS005	30	$2,106,078	$84,300	CCF40	30	$2,106,078	$84,300	14-4	30	$2,106,078	6.960%	$146,600	30	$0	$0	SI	$652,200
5	CC	1096187294	DALLOS RAMIREZ PABLO		X			25-14	30	$1,560,367	$249,700	EPS037	30	$1,560,367	$62,500	CCF40	30	$1,560,367	$62,500	14-4	30	$1,560,367	6.960%	$108,700	30	$0	$0	SI	$483,400
6	CC	1096249196	GUAYARA RAMOS JUAN FELIPE	X	X		X	23100 1	7	$396,124	$63,400	EPS005	7	$396,124	$15,900	CCF40	7	$490,014	$19,700	14-4	7	$396,124	6.960%	$27,600	7	$0	$0	SI	$126,600
7	CC	7368547	GUZMAN TENORIO ARISTIDES JOSE					23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
8	CC	13854239	HERNANDEZ ACEVEDO ALVARO		X			23030 1	30	$1,992,880	$318,900	EPS037	30	$1,992,880	$79,800	CCF40	30	$1,992,880	$79,800	14-4	30	$1,992,880	6.960%	$138,800	30	$0	$0	SI	$617,300
9	CC	91432683	HERNANDEZ RODOLFO		X			23090 1	30	$1,405,978	$225,000	ESSC24	30	$1,405,978	$56,300	CCF40	30	$1,405,978	$56,300	14-4	30	$1,405,978	6.960%	$97,900	30	$0	$0	SI	$435,500
10	CC	1005182950	HERRERA FONSECA ANDRES MAURICIO			X		23020 1	8	$471,866	$75,500	EPS037	8	$471,866	$18,900	CCF40	0	$0	$0	14-4	8	$471,866	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$94,400
11	CC	1005182950	HERRERA FONSECA ANDRES MAURICIO		X			23020 1	22	$1,263,158	$202,200	EPS037	22	$1,263,158	$50,600	CCF40	22	$1,263,158	$50,600	14-4	22	$1,263,158	6.960%	$88,000	22	$0	$0	SI	$391,400
12	CC	1032252127	HERRON RAMIREZ ALVARO JAVIER		X			23030 1	30	$1,764,674	$282,400	EPS037	30	$1,764,674	$70,600	CCF40	30	$1,764,674	$70,600	14-4	30	$1,764,674	6.960%	$122,900	30	$0	$0	SI	$546,500
13	CC	1042213191	HINCAPIE VIDES EVERDE JESUS		X			23020 1	30	$2,043,696	$327,000	EPS037	30	$2,043,696	$81,800	CCF40	30	$2,043,696	$81,800	14-4	30	$2,043,696	6.960%	$142,300	30	$0	$0	SI	$632,900
14	CC	1096193530	LARGO GUARIN MAYCOL YESID		X			23030 1	30	$1,349,457	$216,000	EPS041	30	$1,349,457	$54,000	CCF40	30	$1,349,457	$54,000	14-4	30	$1,349,457	6.960%	$94,000	30	$0	$0	SI	$418,000
15	CC	91429377	LEAL HERAZO ELKIN DARIO		X			23030 1	30	$1,437,772	$230,100	EPS037	30	$1,437,772	$57,600	CCF40	30	$1,437,772	$57,600	14-4	30	$1,437,772	6.960%	$100,100	30	$0	$0	SI	$445,400
16	CC	1096215262	LOPEZ RAMOS KENNETH GIOVANNY		X			23030 1	30	$1,434,239	$229,500	EPS005	30	$1,434,239	$57,400	CCF40	30	$1,434,239	$57,400	14-4	30	$1,434,239	6.960%	$99,900	30	$0	$0	SI	$444,200
17	CC	1096243416	MARTINEZ CARPIO JESUS ALBERTO		X			23030 1	30	$1,614,063	$258,300	EPS037	30	$1,614,063	$64,600	CCF40	30	$1,614,063	$64,600	14-4	30	$1,614,063	6.960%	$112,400	30	$0	$0	SI	$499,900
18	CC	3842012	MEDINA MEDINA JOSE LUIS					25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
19	CC	1094244801	MEZA DE LEON PABLO ANTONIO					23030 1	30	$4,000,000	$640,000	ESSC24	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
20	CC	1005179185	MORA RETAMOSO CARLOS		X			23030 1	30	$1,349,457	$216,000	ESSC24	30	$1,349,457	$54,000	CCF40	30	$1,349,457	$54,000	14-4	30	$1,349,457	6.960%	$94,000	30	$0	$0	SI	$418,000
21	CC	1085045933	MORALES CASTELLARES WILFRIDO		X			23030 1	30	$2,106,078	$337,000	EPS037	30	$2,106,078	$84,300	CCF40	30	$2,106,078	$84,300	14-4	30	$2,106,078	6.960%	$146,600	30	$0	$0	SI	$652,200
22	CC	13571355	NOVOA LAMBIS MARVIN EDUARDO		X			23030 1	30	$1,474,511	$236,000	EPS017	30	$1,474,511	$59,000	CCF40	30	$1,474,511	$59,000	14-4	30	$1,474,511	6.960%	$102,700	30	$0	$0	SI	$456,700
23	CC	1005178116	OSORNO PARRA MIGUEL ANTONIO		X			23030 1	30	$1,621,128	$259,400	EPS041	30	$1,621,128	$64,900	CCF40	30	$1,621,128	$64,900	14-4	30	$1,621,128	6.960%	$112,900	30	$0	$0	SI	$502,100
24	CC	13854433	PALACIO MARQUEZ OSCAR FERNANDO			X		23030 1	2	$118,043	$18,900	EPS037	2	$118,043	$4,800	CCF40	0	$0	$0	14-4	2	$118,043	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$23,700
25	CC	13854433	PALACIO MARQUEZ OSCAR FERNANDO		X			23030 1	28	$1,340,508	$214,500	EPS037	28	$1,340,508	$53,700	CCF40	28	$1,340,508	$53,700	14-4	28	$1,340,508	6.960%	$93,300	28	$0	$0	SI	$415,200
26	CC	1096221092	PUERTA VANEGAS JHON JAIRO	X	X		X	23030 1	7	$467,192	$74,800	EPS037	7	$467,192	$18,700	CCF40	7	$568,721	$22,800	14-4	7	$467,192	6.960%	$32,600	7	$0	$0	SI	$148,900
27	CC	1102580681	RUIZ BOHORQUEZ JESUS MANUEL		X			23030 1	30	$1,398,913	$223,900	EPS037	30	$1,398,913	$56,000	CCF40	30	$1,398,913	$56,000	14-4	30	$1,398,913	6.960%	$97,400	30	$0	$0	SI	$433,300
28	CC	91184269	SAENZ VILLAMIZAR JOSE ALEJANDRO		X			23030 1	30	$3,558,670	$569,400	EPS002	30	$3,558,670	$142,400	CCF40	30	$3,558,670	$142,400	14-4	30	$3,558,670	6.960%	$247,700	30	$0	$0	SI	$1,101,900
29	CC	91442822	TRECO MONSALVE JUAN CARLOS		X			23030 1	30	$1,485,109	$237,700	EPS002	30	$1,485,109	$59,500	CCF40	30	$1,485,109	$59,500	14-4	30	$1,485,109	6.960%	$103,400	30	$0	$0	SI	$460,100
Total	Afiliados(27)									$47,483,331	$7,598,500			$47,483,331	$1,900,600			$47,088,841	$1,884,800			$47,483,331		$3,265,100		$0	$0		$14,649,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	972519236	9474518386	E	2024/10/10	2024/10/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$14,649,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$7,598,500	$0	$0	$7,598,500
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$63,400	$0	$0	$63,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$665,700	$0	$0	$665,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$5,702,700	$0	$0	$5,702,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$941,700	$0	$0	$941,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$3,265,100	$0	$0	$3,265,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	$3,265,100	$0	$0	$3,265,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,884,800	$0	$0	$1,884,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	27	$1,884,800	$0	$0	$1,884,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				27	$1,900,600	$0	$0	$1,900,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$270,300	$0	$0	$270,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$111,000	$0	$0	$111,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$934,900	$0	$0	$934,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$172,900	$0	$0	$172,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$201,900	$0	$0	$201,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$209,600	$0	$0	$209,600
TOTAL				27	$14,649,000	$0	$0	$14,649,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/10/11 11:49 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1049261486	9476716851	E	2024/11/14	2024/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$12,723,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (25 Afiliados)																							$41,009,477	$6,562,400			$41,009,477	$1,641,300			$41,596,848	$1,664,700			$41,009,477		$2,855,500		$0	$0		$12,723,900
Centro de Trabajo: OPE V (25 Afiliados)																							$41,009,477	$6,562,400			$41,009,477	$1,641,300			$41,596,848	$1,664,700			$41,009,477		$2,855,500		$0	$0		$12,723,900
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (25 Afiliados)																							$41,009,477	$6,562,400			$41,009,477	$1,641,300			$41,596,848	$1,664,700			$41,009,477		$2,855,500		$0	$0		$12,723,900
1	CC	1102884306	ALTAMIRANDA MARTINEZ ANGIE PAOLA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1096204542	AVENDAÑO CUELLAR ERBINSON									X									23030 1	30	$1,732,337	$277,200	EPS037	30	$1,732,337	$69,300	CCF40	30	$1,732,337	$69,300	14-4	30	$1,732,337	6.960%	$120,600	30	$0	$0	SI	$536,400
3	CC	1096253522	AVENDAÑO CUELLAR VICTOR ADOLFO									X									23030 1	30	$1,324,728	$212,000	EPS041	30	$1,324,728	$53,000	CCF40	30	$1,324,728	$53,000	14-4	30	$1,324,728	6.960%	$92,300	30	$0	$0	SI	$410,300
4	CC	92033972	CUELLO CONTRERAS ARGEMIRO MIGUEL									X									23020 1	30	$1,894,022	$303,100	EPS005	30	$1,894,022	$75,800	CCF40	30	$1,894,022	$75,800	14-4	30	$1,894,022	6.960%	$131,900	30	$0	$0	SI	$586,600
5	CC	1096187294	DALLOS RAMIREZ PABLO									X									25-14	30	$1,405,978	$225,000	EPS037	30	$1,405,978	$56,300	CCF40	30	$1,405,978	$56,300	14-4	30	$1,405,978	6.960%	$97,900	30	$0	$0	SI	$435,500
6	CC	7368547	GUZMAN TENORIO ARISTIDES JOSE																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
7	CC	13854289	HERNANDEZ ACEVEDO ALVARO		X							X								X	23030 1	21	$1,245,435	$199,300	EPS037	21	$1,245,435	$49,900	CCF40	21	$1,524,048	$61,000	14-4	21	$1,245,435	6.960%	$86,700	21	$0	$0	SI	$396,900
8	CC	91432683	HERNANDEZ RODOLFO									X									23090 1	30	$1,324,728	$212,000	ESSC24	30	$1,324,728	$53,000	CCF40	30	$1,324,728	$53,000	14-4	30	$1,324,728	6.960%	$92,300	30	$0	$0	SI	$410,300
9	CC	1005182950	HERRERA FONSECA ANDRES MAURICIO									X									23020 1	30	$1,416,576	$226,700	EPS037	30	$1,416,576	$56,700	CCF40	30	$1,416,576	$56,700	14-4	30	$1,416,576	6.960%	$98,600	30	$0	$0	SI	$438,700
10	CC	1032252127	HERRON RAMIREZ ALVARO JAVIER									X									23030 1	30	$1,723,098	$275,700	EPS037	30	$1,723,098	$69,000	CCF40	30	$1,723,098	$69,000	14-4	30	$1,723,098	6.960%	$120,000	30	$0	$0	SI	$533,700
11	CC	1042213191	HINCAPIE VIDES EVERDE JESUS									X									23020 1	30	$1,847,826	$295,700	EPS037	30	$1,847,826	$74,000	CCF40	30	$1,847,826	$74,000	14-4	30	$1,847,826	6.960%	$128,700	30	$0	$0	SI	$572,400
12	CC	1096193530	LARGO GUARIN MAYCOL YESID									X									23030 1	30	$1,324,728	$212,000	EPS041	30	$1,324,728	$53,000	CCF40	30	$1,324,728	$53,000	14-4	30	$1,324,728	6.960%	$92,300	30	$0	$0	SI	$410,300
13	CC	91429377	LEAL HERAZO ELKIN DARIO									X									23030 1	30	$1,395,380	$223,300	EPS037	30	$1,395,380	$55,900	CCF40	30	$1,395,380	$55,900	14-4	30	$1,395,380	6.960%	$97,200	30	$0	$0	SI	$432,300
14	CC	1096215262	LOPEZ RAMOS KENNETH GIOVANNY									X									23030 1	30	$1,324,728	$212,000	EPS005	30	$1,324,728	$53,000	CCF40	30	$1,324,728	$53,000	14-4	30	$1,324,728	6.960%	$92,300	30	$0	$0	SI	$410,300
15	CC	1096243416	MARTINEZ CARPIO JESUS ALBERTO									X									23030 1	30	$1,370,652	$219,400	EPS037	30	$1,370,652	$54,900	CCF40	30	$1,370,652	$54,900	14-4	30	$1,370,652	6.960%	$95,400	30	$0	$0	SI	$424,600
16	CC	3842012	MEDINA MEDINA JOSE LUIS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
17	CC	1094244801	MEZA DE LEON PABLO ANTONIO																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
18	CC	1005179185	MORA RETAMOSO CARLOS		X							X								X	23030 1	3	$137,065	$22,000	EPS037	3	$137,065	$5,500	CCF40	3	$202,065	$8,100	14-4	3	$137,065	6.960%	$9,600	3	$0	$0	SI	$45,200
19	CC	1085045933	MORALES CASTELLARES WILFRIDO									X									23030 1	30	$1,894,022	$303,100	EPS037	30	$1,894,022	$75,800	CCF40	30	$1,894,022	$75,800	14-4	30	$1,894,022	6.960%	$131,900	30	$0	$0	SI	$586,600
20	CC	13571355	NOVOA LAMBIS MARVIN EDUARDO									X									23030 1	30	$1,434,239	$229,500	EPS017	30	$1,434,239	$57,400	CCF40	30	$1,434,239	$57,400	14-4	30	$1,434,239	6.960%	$99,900	30	$0	$0	SI	$444,200
21	CC	1005178116	OSORNO PARRA MIGUEL ANTONIO									X									23030 1	30	$1,391,848	$222,700	EPS041	30	$1,391,848	$55,700	CCF40	30	$1,391,848	$55,700	14-4	30	$1,391,848	6.960%	$96,900	30	$0	$0	SI	$431,000
22	CC	13854433	PALACIO MARQUEZ OSCAR FERNANDO		X							X								X	23030 1	7	$320,997	$51,400	EPS037	7	$320,997	$12,900	CCF40	7	$564,755	$22,600	14-4	7	$320,997	6.960%	$22,400	7	$0	$0	SI	$109,300
23	CC	1102580681	RUZ BOHORQUEZ JESUS MANUEL									X									23030 1	30	$1,391,848	$222,700	EPS037	30	$1,391,848	$55,700	CCF40	30	$1,391,848	$55,700	14-4	30	$1,391,848	6.960%	$96,900	30	$0	$0	SI	$431,000
24	CC	91184269	SAENZ VILLAMIZAR JOSE ALEJANDRO									X									23030 1	30	$3,180,981	$509,000	EPS002	30	$3,180,981	$127,300	CCF40	30	$3,180,981	$127,300	14-4	30	$3,180,981	6.960%	$221,400	30	$0	$0	SI	$985,000
25	CC	91442822	TRECO MONSALVE JUAN CARLOS									X									23030 1	30	$1,328,261	$212,600	EPS002	30	$1,328,261	$53,200	CCF40	30	$1,328,261	$53,200	14-4	30	$1,328,261	6.960%	$92,500	30	$0	$0	SI	$411,500

aportes en línea

Planilla Resumen

Total	Afiliados(25)		$41,009,477	$6,562,400		$41,009,477	$1,641,300		$41,596,848	$1,664,700		$41,009,477	$2,855,500	$0	$0	$12,723,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1049261486	9476716851	E	2024/11/14	2024/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$12,723,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$6,562,400	$0	$0	$6,562,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$641,000	$0	$0	$641,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$4,883,900	$0	$0	$4,883,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$825,500	$0	$0	$825,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$212,000	$0	$0	$212,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,855,500	$0	$0	$2,855,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	25	$2,855,500	$0	$0	$2,855,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,664,700	$0	$0	$1,664,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	25	$1,664,700	$0	$0	$1,664,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				25	$1,641,300	$0	$0	$1,641,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$53,000	$0	$0	$53,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$109,400	$0	$0	$109,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$955,900	$0	$0	$955,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$161,700	$0	$0	$161,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$180,500	$0	$0	$180,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$180,800	$0	$0	$180,800
TOTAL				25	$12,723,900	$0	$0	$12,723,900

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1115138282	9478567943	E	2024/12/11	2024/12/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$12,768,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (28 Afiliados)																							$41,208,527	$6,594,300			$41,208,527	$1,649,300			$41,361,998	$1,655,400			$41,208,527		$2,869,100		$0	$0		$12,768,100
Centro de Trabajo: OPE V (28 Afiliados)																							$41,208,527	$6,594,300			$41,208,527	$1,649,300			$41,361,998	$1,655,400			$41,208,527		$2,869,100		$0	$0		$12,768,100
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (28 Afiliados)																							$41,208,527	$6,594,300			$41,208,527	$1,649,300			$41,361,998	$1,655,400			$41,208,527		$2,869,100		$0	$0		$12,768,100
1	CC	1102884306	ALTAMIRANDA ANGIE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1096204542	AVENDAÑO ERBINSON									X									23030 1	30	$1,709,239	$273,500	EPS037	30	$1,709,239	$68,400	CCF40	30	$1,709,239	$68,400	14-4	30	$1,709,239	6.960%	$119,000	30	$0	$0	SI	$529,300
3	CC	1096253522	AVENDAÑO VICTOR									X									23030 1	30	$1,307,065	$209,200	EPS041	30	$1,307,065	$52,300	CCF40	30	$1,307,065	$52,300	14-4	30	$1,307,065	6.960%	$91,000	30	$0	$0	SI	$404,800
4	CC	92033972	CUELLO ARGEMIRO									X									23020 1	30	$2,100,165	$336,100	EPS005	30	$2,100,165	$84,100	CCF40	30	$2,100,165	$84,100	14-4	30	$2,100,165	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,500
5	CC	1096187294	DALLOS PABLO									X									25-14	30	$1,494,294	$239,100	EPS037	30	$1,494,294	$59,800	CCF40	30	$1,494,294	$59,800	14-4	30	$1,494,294	6.960%	$104,100	30	$0	$0	SI	$462,800
6	CC	7368547	GUZMAN ARISTIDES																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
7	CC	91432683	HERNANDEZ RODOLFO									X									23050 1	30	$1,439,185	$230,300	ESSC24	30	$1,439,185	$57,600	CCF40	30	$1,439,185	$57,600	14-4	30	$1,439,185	6.960%	$100,200	30	$0	$0	SI	$445,700
8	CC	1005182950	HERRERA ANDRES									X									23020 1	30	$1,416,576	$226,700	EPS037	30	$1,416,576	$56,700	CCF40	30	$1,416,576	$56,700	14-4	30	$1,416,576	6.960%	$98,600	30	$0	$0	SI	$438,700
9	CC	1032252127	HERRON ALVARO		X							X								X	23030 1	2	$170,001	$27,300	EPS037	2	$170,001	$6,900	CCF40	2	$323,472	$13,000	14-4	2	$170,001	6.960%	$11,900	2	$0	$0	SI	$59,100
10	CC	1042213191	HINCAPIE EVERDE									X									23020 1	30	$1,935,598	$309,700	EPS037	30	$1,935,598	$77,500	CCF40	30	$1,935,598	$77,500	14-4	30	$1,935,598	6.960%	$134,800	30	$0	$0	SI	$599,500
11	CC	1096193530	LARGO MAYCOL									X									23030 1	30	$1,307,065	$209,200	EPS041	30	$1,307,065	$52,300	CCF40	30	$1,307,065	$52,300	14-4	30	$1,307,065	6.960%	$91,000	30	$0	$0	SI	$404,800
12	CC	91429377	LEAL ELKIN									X									23030 1	30	$1,541,630	$246,700	EPS037	30	$1,541,630	$61,700	CCF40	30	$1,541,630	$61,700	14-4	30	$1,541,630	6.960%	$107,300	30	$0	$0	SI	$477,400
13	CC	1096215262	LOPEZ KENNETH									X									23030 1	30	$1,463,913	$234,300	EPS005	30	$1,463,913	$58,600	CCF40	30	$1,463,913	$58,600	14-4	30	$1,463,913	6.960%	$101,900	30	$0	$0	SI	$453,400
14	CC	1096243416	MARTINEZ JESUS									X									23030 1	30	$1,499,239	$239,900	EPS037	30	$1,499,239	$60,000	CCF40	30	$1,499,239	$60,000	14-4	30	$1,499,239	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,300
15	CC	3842012	MEDINA JOSE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
16	CC	1096193299	MENDEZ CRISTIAN		X							X									25-14	6	$267,065	$42,800	EPS041	6	$267,065	$10,700	CCF40	6	$267,065	$10,700	14-4	6	$267,065	6.960%	$18,600	6	$0	$0	SI	$82,800
17	CC	1094244801	MEZA PABLO																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
18	CC	1096242036	MORA JOSE		X																23030 1	6	$260,000	$41,600	ESSC24	6	$260,000	$10,400	CCF40	6	$260,000	$10,400	14-4	6	$260,000	6.960%	$18,100	6	$0	$0	SI	$80,500
19	CC	1085045933	MORALES WILFRIDO									X									23030 1	30	$2,016,606	$322,700	EPS037	30	$2,016,606	$80,700	CCF40	30	$2,016,606	$80,700	14-4	30	$2,016,606	6.960%	$140,400	30	$0	$0	SI	$624,500
20	CC	13571355	NOVOA MARVIN									X									23030 1	30	$1,552,228	$248,400	EPS017	30	$1,552,228	$62,100	CCF40	30	$1,552,228	$62,100	14-4	30	$1,552,228	6.960%	$108,100	30	$0	$0	SI	$480,700
21	CC	1005178116	OSORNO MIGUEL									X									23030 1	30	$1,538,098	$246,100	EPS041	30	$1,538,098	$61,600	CCF40	30	$1,538,098	$61,600	14-4	30	$1,538,098	6.960%	$107,100	30	$0	$0	SI	$476,400
22	CC	8867840	PEREIRA ISRAEL		X							X									25-14	6	$349,239	$55,900	ESSC24	6	$349,239	$14,000	CCF40	6	$349,239	$14,000	14-4	6	$349,239	6.960%	$24,400	6	$0	$0	SI	$108,300
23	CC	8854026	RIOS EDUARDO		X																23020 1	6	$260,000	$41,600	EPS048	6	$260,000	$10,400	CCF40	6	$260,000	$10,400	14-4	6	$260,000	6.960%	$18,100	6	$0	$0	SI	$80,500
24	CC	1039691755	RODAS JUAN		X							X									23030 1	6	$281,196	$45,000	EPS002	6	$281,196	$11,300	CCF40	6	$281,196	$11,300	14-4	6	$281,196	6.960%	$19,600	6	$0	$0	SI	$87,200
25	CC	1102580681	RUZ JESUS									X									23030 1	30	$1,523,967	$243,900	EPS037	30	$1,523,967	$61,000	CCF40	30	$1,523,967	$61,000	14-4	30	$1,523,967	6.960%	$106,100	30	$0	$0	SI	$472,000
26	CC	91184259	SAENZ JOSE									X									23030 1	30	$3,441,167	$550,600	EPS002	30	$3,441,167	$137,700	CCF40	30	$3,441,167	$137,700	14-4	30	$3,441,167	6.960%	$239,600	30	$0	$0	SI	$1,065,600
27	CC	91442822	TRECO JUAN									X									23030 1	30	$1,467,926	$234,900	EPS002	30	$1,467,926	$58,800	CCF40	30	$1,467,926	$58,800	14-4	30	$1,467,926	6.960%	$102,200	30	$0	$0	SI	$454,700
28	CC	13851292	VILORIA WILLINTON		X							X									23030 1	6	$267,065	$42,800	ESSC24	6	$267,065	$10,700	CCF40	6	$267,065	$10,700	14-4	6	$267,065	6.960%	$18,600	6	$0	$0	SI	$82,800
Total Afiliados(28)																							$41,208,527	$6,594,300			$41,208,527	$1,649,300			$41,361,998	$1,655,400			$41,208,527		$2,869,100		$0	$0		$12,768,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1115138282	9478567943	E	2024/12/11	2024/12/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$12,768,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$6,594,300	$0	$0	$6,594,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$753,800	$0	$0	$753,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$4,696,100	$0	$0	$4,696,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$914,100	$0	$0	$914,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$230,300	$0	$0	$230,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$2,869,100	$0	$0	$2,869,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	28	$2,869,100	$0	$0	$2,869,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,655,400	$0	$0	$1,655,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	28	$1,655,400	$0	$0	$1,655,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$1,649,300	$0	$0	$1,649,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$92,700	$0	$0	$92,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$10,400	$0	$0	$10,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,100	$0	$0	$114,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$852,700	$0	$0	$852,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$176,900	$0	$0	$176,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$207,800	$0	$0	$207,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$194,700	$0	$0	$194,700
TOTAL				28	$12,768,100	$0	$0	$12,768,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/12/16 08:47 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185920021	9479838280	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$13,126,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (27 Afiliados)																					$42,546,838	$6,808,500			$42,546,838	$1,694,300			$43,021,475	$1,713,200			$42,546,838		$2,910,000		$0	$0		$13,126,000

2025/01/14 10:15 AM

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: OPE V (27 Afiliados)											$42,546,838	$6,808,500			$42,546,838	$1,694,300			$43,021,475	$1,713,200			$42,546,838		$2,910,000		$0	$0		$13,126,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (27 Afiliados)											$42,546,838	$6,808,500			$42,546,838	$1,694,300			$43,021,475	$1,713,200			$42,546,838		$2,910,000		$0	$0		$13,126,000
1	CC	1102884306	ALTAMIRANDA MARTINEZ ANGIE PAOLA						25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1096204542	AVENDAÑO CUELLAR ERBINSON						230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF40	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	SI	$526,400
3	CC	1096253522	AVENDAÑO CUELLAR VICTOR ADOLFO						230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	92033972	CUELLO CONTRERAS ARGEMIRO MIGUEL		X				230201	30	$1,769,293	$283,100	EPS005	30	$1,769,293	$70,800	CCF40	30	$1,769,293	$70,800	14-4	30	$1,769,293	6.960%	$123,200	30	$0	$0	SI	$547,900
5	CC	1096187294	DALLOS RAMIREZ PABLO		X				25-14	30	$1,314,130	$210,300	EPS037	30	$1,314,130	$52,600	CCF40	30	$1,314,130	$52,600	14-4	30	$1,314,130	6.960%	$91,500	30	$0	$0	SI	$407,000
6	CC	7368547	GUZMAN TENORIO ARISTIDES JOSE						230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
7	CC	91432683	HERNANDEZ RODOLFO						230901	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	1005182950	HERRERA FONSECA ANDRES MAURICIO		X				230201	30	$1,413,043	$226,100	EPS037	30	$1,413,043	$56,600	CCF40	30	$1,413,043	$56,600	14-4	30	$1,413,043	6.960%	$98,400	30	$0	$0	SI	$437,700
9	CC	1042213191	HINCAPIE VIDES EVERDE JESUS		X				230201	30	$1,727,717	$276,500	EPS037	30	$1,727,717	$69,200	CCF40	30	$1,727,717	$69,200	14-4	30	$1,727,717	6.960%	$120,300	30	$0	$0	SI	$535,200
10	CC	1096193530	LARGO GUARIN MAYCOL YESID			X			230301	3	$130,706	$21,000	EPS041	3	$130,706	$0	CCF40	3	$130,706	$0	14-4	3	$130,706	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$21,000
11	CC	1096193530	LARGO GUARIN MAYCOL YESID						230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$46,800	CCF40	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	SI	$362,300
12	CC	91429377	LEAL HERAZO ELKIN DARIO		X				230301	30	$1,314,130	$210,300	EPS037	30	$1,314,130	$52,600	CCF40	30	$1,314,130	$52,600	14-4	30	$1,314,130	6.960%	$91,500	30	$0	$0	SI	$407,000
13	CC	1096215262	LOPEZ RAMOS KENNETH GIOVANNY		X				230301	30	$1,328,261	$212,600	EPS005	30	$1,328,261	$53,200	CCF40	30	$1,328,261	$53,200	14-4	30	$1,328,261	6.960%	$92,500	30	$0	$0	SI	$411,500
14	CC	1096243416	MARTINEZ CARPIO JESUS ALBERTO		X				230301	30	$1,317,663	$210,900	EPS037	30	$1,317,663	$52,800	CCF40	30	$1,317,663	$52,800	14-4	30	$1,317,663	6.960%	$91,800	30	$0	$0	SI	$408,300
15	CC	3842012	MEDINA MEDINA JOSE LUIS						25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
16	CC	1096193299	MENDEZ ALVARADO CRISTIAN		X				25-14	30	$1,349,457	$216,000	EPS041	30	$1,349,457	$54,000	CCF40	30	$1,349,457	$54,000	14-4	30	$1,349,457	6.960%	$94,000	30	$0	$0	SI	$418,000
17	CC	1094244801	MEZA DE LEON PABLO ANTONIO						230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
18	CC	1096242036	MORA RETAMOSO JOSE ARMANDO			X			230301	2	$86,667	$13,900	ESSC24	2	$86,667	$0	CCF40	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$13,900
19	CC	1096242036	MORA RETAMOSO JOSE ARMANDO						230301	28	$1,213,334	$194,200	ESSC24	28	$1,213,334	$48,600	CCF40	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
20	CC	1085045933	MORALES CASTELLARES WILFRIDO				X		230301	8	$537,761	$86,100	EPS037	8	$537,761	$21,600	CCF40	0	$0	$0	14-4	8	$537,761	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$107,700
21	CC	1085045933	MORALES CASTELLARES WILFRIDO		X				230301	22	$1,302,102	$208,400	EPS037	22	$1,302,102	$52,100	CCF40	22	$1,302,102	$52,100	14-4	22	$1,302,102	6.960%	$90,700	22	$0	$0	SI	$403,300
22	CC	13571355	NOVOA LAMBIS MARVIN EDUARDO		X				230301	30	$1,395,380	$223,300	EPS017	30	$1,395,380	$55,900	CCF40	30	$1,395,380	$55,900	14-4	30	$1,395,380	6.960%	$97,200	30	$0	$0	SI	$432,300
23	CC	1005178116	OSORNO PARRA MIGUEL ANTONIO		X				230301	30	$1,321,196	$211,400	EPS041	30	$1,321,196	$52,900	CCF40	30	$1,321,196	$52,900	14-4	30	$1,321,196	6.960%	$92,000	30	$0	$0	SI	$409,200
24	CC	8867840	PEREIRA VILLA ISRAEL		X				25-14	30	$1,755,435	$280,900	ESSC24	30	$1,755,435	$70,300	CCF40	30	$1,755,435	$70,300	14-4	30	$1,755,435	6.960%	$122,200	30	$0	$0	SI	$543,700
25	CC	8854026	RIOS RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE						230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
26	CC	1039691755	RODAS LAGUNA JUAN DAVID		X				230301	30	$1,345,924	$215,400	EPS002	30	$1,345,924	$53,900	CCF40	30	$1,345,924	$53,900	14-4	30	$1,345,924	6.960%	$93,700	30	$0	$0	SI	$416,900
27	CC	1102580681	RUZ BOHORQUEZ JESUS MANUEL		X				230301	30	$1,310,598	$209,700	EPS037	30	$1,310,598	$52,500	CCF40	30	$1,310,598	$52,500	14-4	30	$1,310,598	6.960%	$91,300	30	$0	$0	SI	$406,000
28	CC	91184269	SAENZ VILLAMIZAR JOSE ALEJANDRO	X				X	230301	4	$411,821	$65,900	EPS002	4	$411,821	$16,500	CCF40	4	$1,424,219	$57,000	14-4	4	$411,821	6.960%	$28,700	4	$0	$0	SI	$168,100
29	CC	91442822	TRECO MONSALVE JUAN CARLOS		X				230301	30	$1,482,763	$237,300	EPS002	30	$1,482,763	$59,400	CCF40	30	$1,482,763	$59,400	14-4	30	$1,482,763	6.960%	$103,300	30	$0	$0	SI	$459,400
30	CC	13851292	VILORIA JIMENEZ WILLINTON		X				230301	30	$1,349,457	$216,000	ESSC24	30	$1,349,457	$54,000	CCF40	30	$1,349,457	$54,000	14-4	30	$1,349,457	6.960%	$94,000	30	$0	$0	SI	$418,000
Total		Afiliados(27)									$42,546,838	$6,808,500			$42,546,838	$1,694,300			$43,021,475	$1,713,200			$42,546,838		$2,910,000		$0	$0		$13,126,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185920021	9479838280	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$13,126,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$6,808,500	$0	$0	$6,808,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,123,200	$0	$0	$1,123,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$4,483,600	$0	$0	$4,483,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$993,700	$0	$0	$993,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$2,910,000	$0	$0	$2,910,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	$2,910,000	$0	$0	$2,910,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,713,200	$0	$0	$1,713,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	27	$1,713,200	$0	$0	$1,713,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				27	$1,694,300	$0	$0	$1,694,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$224,900	$0	$0	$224,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$107,900	$0	$0	$107,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$798,000	$0	$0	$798,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$205,700	$0	$0	$205,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$129,800	$0	$0	$129,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$176,000	$0	$0	$176,000
TOTAL				27	$13,126,000	$0	$0	$13,126,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-02	1261214727	9481352471	E	2025/02/12	2025/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$13,757,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (26 Afiliados)																					$44,506,405	$7,122,000			$44,506,405	$1,779,300			$44,628,813	$1,784,200			$44,506,405		$3,072,400		$0	$0		$13,757,900

2025/02/15 10:01 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: OPE V (26 Afiliados)																							$44,506,405	$7,122,000			$44,506,405	$1,779,300			$44,628,813	$1,784,200			$44,506,405		$3,072,400		$0	$0		$13,757,900
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (26 Afiliados)																							$44,506,405	$7,122,000			$44,506,405	$1,779,300			$44,628,813	$1,784,200			$44,506,405		$3,072,400		$0	$0		$13,757,900
1	CC	1102884306	ALTAMIRANDA ANGIE							X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	1096204542	AVENDAÑO ERBINSON							X											23030 1	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$70,100	CCF40	30	$1,751,000	$70,100	14-4	30	$1,751,000	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	1096253522	AVENDAÑO VICTOR							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	92033972	CUELLO ARGEMIRO							X		X									23020 1	30	$1,809,761	$289,600	EPS005	30	$1,809,761	$72,400	CCF40	30	$1,809,761	$72,400	14-4	30	$1,809,761	6.960%	$126,000	30	$0	$0	SI	$560,400
5	CC	1096187294	DALLOS PABLO							X		X									25-14	30	$1,458,314	$233,400	EPS037	30	$1,458,314	$58,400	CCF40	30	$1,458,314	$58,400	14-4	30	$1,458,314	6.960%	$101,500	30	$0	$0	SI	$451,700
6	CC	7368547	GUZMAN ARISTIDES																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
7	CC	91432683	HERNANDEZ RODOLFO										X								23090 1	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$0	CCF40	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,600
8	CC	91432683	HERNANDEZ RODOLFO		X					X		X								X	23090 1	29	$1,399,259	$223,900	ESSC24	29	$1,399,259	$56,000	CCF40	29	$1,853,817	$74,200	14-4	29	$1,399,259	6.960%	$97,400	29	$0	$0	SI	$451,500
9	CC	1005182950	HERRERA ANDRES							X		X									23020 1	30	$1,446,709	$231,500	EPS037	30	$1,446,709	$57,900	CCF40	30	$1,446,709	$57,900	14-4	30	$1,446,709	6.960%	$100,700	30	$0	$0	SI	$448,000
10	CC	1042213191	HINCAPIE EVERDE							X		X									23020 1	30	$1,809,761	$289,600	EPS037	30	$1,809,761	$72,400	CCF40	30	$1,809,761	$72,400	14-4	30	$1,809,761	6.960%	$126,000	30	$0	$0	SI	$560,400
11	CC	1096193530	LARGO MAYCOL							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
12	CC	91429377	LEAL ELKIN							X		X									23030 1	30	$1,454,446	$232,800	EPS037	30	$1,454,446	$58,200	CCF40	30	$1,454,446	$58,200	14-4	30	$1,454,446	6.960%	$101,300	30	$0	$0	SI	$450,500
13	CC	1096215262	LOPEZ KENNETH											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF40	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
14	CC	1096215262	LOPEZ KENNETH							X		X									23030 1	28	$1,375,018	$220,100	EPS005	28	$1,375,018	$55,100	CCF40	28	$1,375,018	$55,100	14-4	28	$1,375,018	6.960%	$95,800	28	$0	$0	SI	$426,100
15	CC	1096243416	MARTINEZ JESUS							X		X									23030 1	30	$1,466,050	$234,600	EPS037	30	$1,466,050	$58,700	CCF40	30	$1,466,050	$58,700	14-4	30	$1,466,050	6.960%	$102,100	30	$0	$0	SI	$454,100
16	CC	3842012	MEDINA JOSE							X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
17	CC	1096193299	MENDEZ CRISTIAN							X		X									25-14	30	$1,466,050	$234,600	EPS041	30	$1,466,050	$58,700	CCF40	30	$1,466,050	$58,700	14-4	30	$1,466,050	6.960%	$102,100	30	$0	$0	SI	$454,100
18	CC	1094244801	MEZA PABLO																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
19	CC	1096242036	MORA JOSE							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
20	CC	1085045933	MORALES WILFRIDO							X		X									23030 1	30	$1,804,864	$288,800	EPS037	30	$1,804,864	$72,200	CCF40	30	$1,804,864	$72,200	14-4	30	$1,804,864	6.960%	$125,700	30	$0	$0	SI	$558,900
21	CC	13571355	NOVOA MARVIN							X		X									23030 1	30	$1,469,918	$235,200	EPS017	30	$1,469,918	$58,800	CCF40	30	$1,469,918	$58,800	14-4	30	$1,469,918	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,200
22	CC	1005178116	OSORNO MIGUEL																X		23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF40	0	$0	$0	14-4	5	$237,250	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$47,500
23	CC	1005178116	OSORNO MIGUEL							X		X									23030 1	25	$1,217,196	$194,800	EPS041	25	$1,217,196	$48,700	CCF40	25	$1,217,196	$48,700	14-4	25	$1,217,196	6.960%	$84,800	25	$0	$0	SI	$377,000
24	CC	8867840	PEREIRA ISRAEL							X		X									25-14	30	$1,804,864	$288,800	ESSC24	30	$1,804,864	$72,200	CCF40	30	$1,804,864	$72,200	14-4	30	$1,804,864	6.960%	$125,700	30	$0	$0	SI	$558,900
25	CC	8854026	RIOS EDUARDO							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
26	CC	1039691755	RODAS JUAN							X		X									23030 1	30	$1,469,918	$235,200	EPS002	30	$1,469,918	$58,800	CCF40	30	$1,469,918	$58,800	14-4	30	$1,469,918	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,200
27	CC	1102580681	RUZ JESUS							X		X									23030 1	30	$1,469,918	$235,200	EPS037	30	$1,469,918	$58,800	CCF40	30	$1,469,918	$58,800	14-4	30	$1,469,918	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,200
28	CC	91442822	TRECO JUAN							X		X									23030 1	30	$1,446,709	$231,500	EPS002	30	$1,446,709	$57,900	CCF40	30	$1,446,709	$57,900	14-4	30	$1,446,709	6.960%	$100,700	30	$0	$0	SI	$448,000
29	CC	13851292	VILORIA WILLINTON							X		X									23030 1	30	$1,466,050	$234,600	ESSC24	30	$1,466,050	$58,700	CCF40	30	$1,466,050	$58,700	14-4	30	$1,466,050	6.960%	$102,100	30	$0	$0	SI	$454,100
Total		**Afiliados(26)**																					$44,506,405	$7,122,000			$44,506,405	$1,779,300			$44,628,813	$1,784,200			$44,506,405		$3,072,400		$0	$0		$13,757,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

 2025/02/15 10:01 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-02	1261214727	9481352471	E	2025/02/12	2025/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$13,757,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$7,122,000	$0	$0	$7,122,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,212,400	$0	$0	$1,212,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$4,639,600	$0	$0	$4,639,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,038,500	$0	$0	$1,038,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$231,500	$0	$0	$231,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$3,072,400	$0	$0	$3,072,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	26	$3,072,400	$0	$0	$3,072,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,784,200	$0	$0	$1,784,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	26	$1,784,200	$0	$0	$1,784,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				26	$1,779,300	$0	$0	$1,779,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$243,900	$0	$0	$243,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$115,800	$0	$0	$115,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$826,700	$0	$0	$826,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$230,900	$0	$0	$230,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$116,700	$0	$0	$116,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$188,300	$0	$0	$188,300
TOTAL				26	$13,757,900	$0	$0	$13,757,900

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA			
	CERTIFICACION EXISTENCIA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS VIGENCIA 2025 El Administrador del plan anual de adquisiciones está facultado mediante el **Decreto No 518 de 2019**			
	Código: SGE-RFI-FO-021	Fecha:02/08/2019	Versión: 001	Página: 1

No CEPAA	**1404**

FECHA DE EMISION 12/03/2025
DD/ MM/AA

DEPENDENCIA SOLICITANTE	**SECRETARIA INFRAESTRUCTURA**

CERTIFICA QUE

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS HACEN PARTE INTEGRAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Códigos UNSPSC	Descripción	Duracion estimada del contrato	Cod. Presupuestal	Cod. Fuente	Valor	CEPÀA
72151100; 72101500	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - PAGO ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No. 0401-23 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"	1 MES	2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14	R061	1.574.390.644	**1404**
			2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14	R023	2.356.133.822	
			3.930.524.466			

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
ADMINISTRADORA DEL PAA

Proyecto:
HEIDY BERMUDEZ

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-10	972508281	9474518337	E	2024/10/10	2024/10/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,414,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (3 Afiliados)							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
Centro de Trabajo: EQ MIN V (3 Afiliados)							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900
1	CC	9102427	CORREA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER		23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
2	CC	13923929	GOMEZ BARON JORGE ANTONIO		23010 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
3	CC	73167554	HERRERA HERNANDEZ JAVIER MAURICIO		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total			**Afiliados(3)**				$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$542,900		$0	$0		$2,414,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-10	972508281	9474518337	E	2024/10/10	2024/10/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,414,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$800,000	$0	$0	$800,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$0	$0	$240,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$542,900	$0	$0	$542,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$542,900	$0	$0	$542,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$312,000	$0	$0	$312,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$312,000	$0	$0	$312,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$312,000	$0	$0	$312,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$260,000	$0	$0	$260,000
TOTAL				3	$2,414,900	$0	$0	$2,414,900

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/10/11 11:48 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO RIO GRANDE identificado(a) con NI 901668549 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FRANCISCO JAVIER CORREA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 9102427

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																	$5,000,000	16%	$800,000
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30																	$5,000,000		$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30																	$5,000,000		$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30																	$0	0%	$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30																	$0	0%	$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																	$5,000,000	6.96%	$348,000
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	$5,000,000	16%	$800,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																	$5,000,000		$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																	$5,000,000		$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																	$0	0%	$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																	$0	0%	$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	$5,000,000	6.96%	$348,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$5,000,000	16%	$800,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30																	$5,000,000		$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30																	$5,000,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30																	$0	0%	$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30																	$0	0%	$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$5,000,000	6.96%	$348,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$5,000,000	4%	$200,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$5,000,000	16%	$800,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																	$5,000,000		$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																	$5,000,000		$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																	$0	0%	$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																	$0	0%	$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$5,000,000	6.96%	$348,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$5,000,000	4%	$200,000

Este certificado se expide el día 2025-03-13 a las 09:33.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO RIO GRANDE identificado(a) con NI 901668549 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ANTONIO GOMEZ BARON identificado(a) con CC 13923929

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$1,500,000	4%	$60,000
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$1,500,000	16%	$240,000
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30																		$1,500,000		$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30																		$1,500,000		$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30																		$0	0%	$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30																		$0	0%	$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$1,500,000	6.96%	$104,400
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$1,500,000	4%	$60,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$1,500,000	4%	$60,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,500,000	16%	$240,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																		$1,500,000		$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$1,500,000		$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,500,000	6.96%	$104,400
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,500,000	4%	$60,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,500,000	4%	$60,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		$1,500,000	16%	$240,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30																		$1,500,000		$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30																		$1,500,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30																	$0	0%	$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30																	$0	0%	$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$1,500,000	6.96%	$104,400
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$1,500,000	4%	$60,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$1,500,000	4%	$60,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$1,500,000	16%	$240,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																	$1,500,000		$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																	$1,500,000		$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																	$0	0%	$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																	$0	0%	$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$1,500,000	6.96%	$104,400
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$1,500,000	4%	$60,000

Este certificado se expide el día 2025-03-13 a las 09:34.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO RIO GRANDE identificado(a) con NI 901668549 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAVIER MAURICIO HERRERA HERNANDEZ identificado(a) con CC 73167554

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X											$1,423,500	4%	$57,000
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$1,423,500	16%	$227,800
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X											$1,423,500		$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X											$1,423,500		$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X											$0	0%	$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X											$0	0%	$0
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$1,423,500	6.96%	$99,100
9481353911	1261226353	E	2025-02-12	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$1,423,500	4%	$57,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$1,300,000	4%	$52,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	16%	$208,000
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																		$1,300,000		$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$1,300,000		$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	6.96%	$90,500
9479838769	1185933980	E	2025-01-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	4%	$52,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$1,300,000	4%	$52,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		$1,300,000	16%	$208,000
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30																		$1,300,000		$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30																		$1,300,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30																	$0	0%	$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30																	$0	0%	$0
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$1,300,000	6.96%	$90,500
9478573857	1115153646	E	2024-12-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$1,300,000	4%	$52,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	$1,300,000	4%	$52,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$1,300,000	16%	$208,000
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																	$1,300,000		$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																	$1,300,000		$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																	$0	0%	$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																	$0	0%	$0
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$1,300,000	6.96%	$90,500
9476717020	1049305165	E	2024-11-14	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	$1,300,000	4%	$52,000

Este certificado se expide el día 2025-03-13 a las 09:35.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1049305165	9476717020	E	2024/11/14	2024/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (11 Afiliados)																									$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Centro de Trabajo: EQ MIN V (11 Afiliados)																									$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																									$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
1	CC	1052967294	CASTRO DE LEON TULIO ARMANDO	X	X															X			23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF40	1	$138,890	$5,600	14-4	1	$133,334	6.960%	$9,300	1	$0	$0	SI	$41,700
2	CC	9102427	CORREA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER																				23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
3	CC	74180122	GARCIA AVELLA GUILLERMO ALONSO	X	X															X			23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
4	CC	13923929	GOMEZ BARON JORGE ANTONIO																				23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
5	CC	73167554	HERRERA HERNANDEZ JAVIER MAURICIO																				23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	1098605107	LOPEZ TOBAR YONNE KATHERINE	X	X															X			23100 1	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF40	1	$52,083	$2,100	14-4	1	$50,000	6.960%	$3,500	1	$0	$0	SI	$15,600
7	CC	12647521	MAESTRE ALVAREZ ERIS ENRIQUE																				23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
8	CC	77091383	MEJIA ALVAREZ LUIS ADRIAN																				23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
9	CC	1096244499	SALOM PADILLA JHAN CARLOS	X	X															X			23020 1	1	$100,000	$16,000	EPS041	1	$100,000	$4,000	CCF40	1	$104,167	$4,200	14-4	1	$100,000	6.960%	$7,000	1	$0	$0	SI	$31,200
10	CC	91496077	SILVA RUEDA EDWING ALIRIO	X	X															X			23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
11	CC	1121936429	VELASCO MAYRA ALEJANDRA																				23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total		**Afiliados(11)**																							$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1049305165	9476717020	E	2024/11/14	2024/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,946,800	$0	$0	$2,946,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$808,000	$0	$0	$808,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,061,400	$0	$0	$1,061,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,077,400	$0	$0	$1,077,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$737,900	$0	$0	$737,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	$737,900	$0	$0	$737,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$736,800	$0	$0	$736,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$305,400	$0	$0	$305,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,000	$0	$0	$4,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$54,000	$0	$0	$54,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$373,400	$0	$0	$373,400
TOTAL				11	$5,703,600	$0	$0	$5,703,600

PLANILLA PAGADA

2024/11/14 01:55 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9016685-9	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1115153646	9478573857	E	2024/12/11	2024/12/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (11 Afiliados)																								$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Centro de Trabajo: EQ MIN V (11 Afiliados)																								$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																								$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
1	CC	1052967294	CASTRO TULIO	X	X															X		23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF40	1	$138,890	$5,600	14-4	1	$133,334	6.960%	$9,300	1	$0	$0	SI	$41,700
2	CC	9102427	CORREA FRANCISCO																			23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
3	CC	74180122	GARCIA GUILLERMO	X	X															X		23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
4	CC	13923929	GOMEZ JORGE																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
5	CC	73167554	HERRERA JAVIER																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	1098605107	LOPEZ IVONNE	X	X															X		23100 1	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF40	1	$52,083	$2,100	14-4	1	$50,000	6.960%	$3,500	1	$0	$0	SI	$15,600
7	CC	12647521	MAESTRE ERIS																			23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
8	CC	77091383	MEJIA LUIS																			23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
9	CC	1096244499	SALOM JHAN	X	X															X		23020 1	1	$100,000	$16,000	EPS041	1	$100,000	$4,000	CCF40	1	$104,167	$4,200	14-4	1	$100,000	6.960%	$7,000	1	$0	$0	SI	$31,200
10	CC	91496077	SILVA EDWING	X	X															X		23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
11	CC	1121936429	VELASCO MAYRA																			23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total		**Afiliados(11)**																						$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1115153646	9478573857	E	2024/12/11	2024/12/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,946,800	$0	$0	$2,946,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$808,000	$0	$0	$808,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,061,400	$0	$0	$1,061,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,077,400	$0	$0	$1,077,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$737,900	$0	$0	$737,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	$737,900	$0	$0	$737,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$736,800	$0	$0	$736,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$305,400	$0	$0	$305,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,000	$0	$0	$4,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$54,000	$0	$0	$54,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$373,400	$0	$0	$373,400
TOTAL				11	$5,703,600	$0	$0	$5,703,600

2024/12/16 08:47 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185933980	9479838769	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (11 Afiliados)																									$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Centro de Trabajo: EQ MIN V (11 Afiliados)																									$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																									$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
1	CC	1052967294	CASTRO DE LEON TULIO ARMANDO	X	X															X	23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF40	1	$138,890	$5,600	14-4	1	$133,334	6.960%	$9,300	1	$0	$0	SI	$41,700
2	CC	9102427	CORREA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER																		23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
3	CC	74180122	GARCIA AVELLA GUILLERMO ALONSO	X	X															X	23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
4	CC	13923929	GOMEZ BARON JORGE ANTONIO																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
5	CC	73167554	HERRERA HERNANDEZ JAVIER MAURICIO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	1098605107	LOPEZ TOBAR IVONNE KATHERINE	X	X															X	23100 1	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF40	1	$52,083	$2,100	14-4	1	$50,000	6.960%	$3,500	1	$0	$0	SI	$15,600
7	CC	12647521	MAESTRE ALVAREZ ERIS ENRIQUE																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
8	CC	77091383	MEJIA ALVAREZ LUIS ADRIAN																		23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
9	CC	1096244499	SALOM PADILLA JHAN CARLOS	X	X															X	23020 1	1	$100,000	$16,000	EPS041	1	$100,000	$4,000	CCF40	1	$104,167	$4,200	14-4	1	$100,000	6.960%	$7,000	1	$0	$0	SI	$31,200
10	CC	91496077	SILVA RUEDA EDWING ALIRIO	X	X															X	23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
11	CC	1121936429	VELASCO MAYRA ALEJANDRA																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total			**Afiliados(11)**																						$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185933980	9479838769	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,946,800	$0	$0	$2,946,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$808,000	$0	$0	$808,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,061,400	$0	$0	$1,061,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,077,400	$0	$0	$1,077,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$737,900	$0	$0	$737,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	$737,900	$0	$0	$737,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$736,800	$0	$0	$736,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$305,400	$0	$0	$305,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,000	$0	$0	$4,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$54,000	$0	$0	$54,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$373,400	$0	$0	$373,400
TOTAL				11	$5,703,600	$0	$0	$5,703,600

PLANILLA PAGADA

2025/01/14 10:14 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1261226353	9481353911	E	2025/02/12	2025/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,742,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (11 Afiliados)																										$18,540,168	$2,966,600			$18,540,168	$741,800			$18,565,862	$742,900			$18,540,168		$1,290,700		$0	$0		$5,742,000
Centro de Trabajo: EQ MIN V (11 Afiliados)																										$18,540,168	$2,966,600			$18,540,168	$741,800			$18,565,862	$742,900			$18,540,168		$1,290,700		$0	$0		$5,742,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																										$18,540,168	$2,966,600			$18,540,168	$741,800			$18,565,862	$742,900			$18,540,168		$1,290,700		$0	$0		$5,742,000
1	CC	1052967294	CASTRO TULIO	X	X															X	23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF40	1	$138,890	$5,600	14-4	1	$133,334	6.960%	$9,300	1	$0	$0	SI	$41,700
2	CC	9102427	CORREA FRANCISCO																		23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
3	CC	74180122	GARCIA GUILLERMO	X	X															X	23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
4	CC	13923929	GOMEZ JORGE																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
5	CC	73167554	HERRERA JAVIER							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1098605107	LOPEZ IVONNE	X	X															X	23100 1	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF40	1	$52,083	$2,100	14-4	1	$50,000	6.960%	$3,500	1	$0	$0	SI	$15,600
7	CC	12647521	MAESTRE ERIS																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
8	CC	77091383	MEJIA LUIS																		23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
9	CC	1096244499	SALOM JHAN	X	X															X	23020 1	1	$100,000	$16,000	EPS041	1	$100,000	$4,000	CCF40	1	$104,167	$4,200	14-4	1	$100,000	6.960%	$7,000	1	$0	$0	SI	$31,200
10	CC	91496077	SILVA EDWING	X	X															X	23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	SI	$52,100
11	CC	1121936429	VELASCO MAYRA																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total			**Afiliados(11)**																							$18,540,168	$2,966,600			$18,540,168	$741,800			$18,565,862	$742,900			$18,540,168		$1,290,700		$0	$0		$5,742,000

2025/02/15 10:01 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1261226353	9481353911	E	2025/02/12	2025/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,742,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,966,600	$0	$0	$2,966,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$808,000	$0	$0	$808,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,061,400	$0	$0	$1,061,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,097,200	$0	$0	$1,097,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,290,700	$0	$0	$1,290,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,290,700	$0	$0	$1,290,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$742,900	$0	$0	$742,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	$742,900	$0	$0	$742,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$741,800	$0	$0	$741,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$305,400	$0	$0	$305,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,000	$0	$0	$4,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$59,000	$0	$0	$59,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$373,400	$0	$0	$373,400
TOTAL				11	$5,742,000	$0	$0	$5,742,000

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA			
	CERTIFICACION EXISTENCIA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS VIGENCIA 2025 El Administrador del plan anual de adquisiciones está facultado mediante el **Decreto No 518 de 2019**			
	Código: SGE-RFI-FO-021	Fecha:02/08/2019	Versión: 001	Página: 1

No CEPAA	**1404**

FECHA DE EMISION 12/03/2025
DD/ MM/AA

DEPENDENCIA SOLICITANTE	**SECRETARIA INFRAESTRUCTURA**

CERTIFICA QUE

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS HACEN PARTE INTEGRAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Códigos UNSPSC	Descripción	Duracion estimada del contrato	Cod. Presupuestal	Cod. Fuente	Valor	CEPÀA
72151100; 72101500	PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - PAGO ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO No. 0401-23 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"	1 MES	2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14	R061	1.574.390.644	**1404**
			2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14	R023	2.356.133.822	
			3.930.524.466			

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
ADMINISTRADORA DEL PAA

Proyecto:
HEIDY BERMUDEZ Z

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA			
	CERTIFICACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION			
	Código: DEP-FO-025	Fecha06/12/2023	Versión: 001	Página: 1 de 1

CERTIFICA:

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA 2024-2027					
Nombre del Proyecto	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER**				
Número BPPID	20220680810080				
Línea Estratégica Distrital	2. EMPLEO Y DERECHOS DE TODOS				
Sector de inversión territorial	35: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO				
Programa Distrital	25. infraestructura estratégica para el fortalecimiento comercial, industrial y turístico **HOMOLOGADO:** 3502. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS				
Indicador de producto plan de desarrollo	IP 216. Numero de estrategias realizadas para la construcción o mejoramiento de infraestructura para el fortalecimiento comercial industrial y turístico **HOMOLOGADO:** 350211300. EQUIPAMIENTOS CONSTRUIDOS				
Número BPIN	2022680810072				
Programa Nacional	3502. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS				
Producto Nacional	3502078 Malecón construido **HOMOLOGADO:** 3502113 EQUIPAMIENTO TURÍSTICO CONSTRUIDO				
Indicador Nacional	350207800 Malecón construido **HOMOLOGADO:** 350211300. EQUIPAMIENTOS CONSTRUIDOS				
Valor Total del Proyecto	$ 27.313.438.085,00				
Valor Total de la Vigencia	$ 27.313.438.085,00				
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS					
Vigencia Actual 2024		**Vigencia Futura** (Ordinaria) **20##**		**Vigencia Futura** (Excepcional) **20##**	
Obra:	$ 25.265.924.265,00	Obra:		Obra:	
Interventoria:	$ 1.349.891.559,00	Interventoría:		Interventoria:	
Otros:	$ 697.622.261,00	Otros:		Otros	
Total:	$ 27.313.438.085,00	Total:		Total	
Solicitud realizada por:		**Nombre: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY**			
		Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
Nota: TERCERA CERTIFICACIÓN CON BASE EN LA PRIMERA ACTUALIZACIÓN 2022 emitida el 5/10/2022. Valor total del proyecto: $27.313.438.085,00; Aporte del distrito $5.057.569.459,00 y Aporte ECOPETROL $22.255.868.626,00. PARA HOMOLOGACION DE PLAN DE DESARROLLO					

Se expide en Barrancabermeja a los tres (03) dias del mes de septiembre de dos mil vèinticuatro (2024) y tiene validez hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
Secretario de Planeación Distrital

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó y elaboró	Lina Marcela Castro Severiche		03.09.24
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA	:	N° 0401-23
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO RÍO GRANDE
NIT	:	9 0 1 6 6 8 5 4 9-7
REP. LEGAL	:	FARLEIDYS DUARTE ROLÓN
CEDULA	:	37.580.244
DIRECCIÓN	:	CR 19 55 59 BARRIO URIBE URIBE
TELÉFONO	:	3 1 3 2 8 5 2 9 5 7
CORREO ELECTRÓNICO	:	cscriogrande@cscriogrande.com
INTERVENTOR		
CONTRATISTA		CONSORCIO INTERMIRADOR
NIT.		9 0 1 6 6 9 1 5 2-1
REP LEGAL		DANIEL EDUARDO BARRERA VESGA
C.C.		1 0 9 8 6 6 0 0 0 8
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
OBJETO	:	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER**
VALOR	:	El valor estimado del contrato es de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($25.466.325.369,80) exenta de IVA incluido AIU.
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	FEBRERO 06 DE 2023
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	El plazo de duración del presente contrato será de TRECE (13) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El valor total del presente contrato será soportado con recursos para la vigencia fiscal 2023 según certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda No. 23-00540 del 30 de Enero de 2023, con rubros 1) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: ECOPETROL, por valor de: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($22.255.868.626); 2) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto:

Powered by CamScanner

		CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE, por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($746.235.772.00); 3) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS, por valor de MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.708.933.037.00); para un valor total de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($24.711.037.435.00). El valor restante corresponde a la vigencia 2024 y está soportado mediante el ACUERDO DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES No. 053 de 2022 de fecha 3 de noviembre de 2022.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	23-00540 DE ENERO 30 DE 2023 POR VALOR DE $24.711.037.435,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	23-00673 DE FEBRERO 07 DE 2023 POR VALOR DE $24.711.037.435
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.11144623 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023
BANCO DE PROYECTOS		2022680810072 DEL 18 DE ENERO DE 2023
CEPAA		0552 DEL 27 DE ENERO DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	:	MARZO 14 DE 2023

En Barrancabermeja, a los CATORCE (14) días del mes de MARZO de 2023, se reunieron la siguientes personas en la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, la **Ing. FARLEIDYS DUARTE ROLON**, Rep. Legal de CONSORCIO RIO GRANDE, Contratista de la obra, el **Ing.** DANIEL EDUARDO BARRERA VESGA**,** Rep legal de CONSORCIO INTERMIRADOR, interventor de la obra, la Ing. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA, Secretaria de Infraestructura identificada con cédula de ciudadanía No. 37.559.594 en su condición de Secretaria de Infraestructura según Decreto de Nombramiento No. 195 del veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022) y Acta de posesión No.032 del veintinueve (29) de julio de la misma anualidad, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja que mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019 que otorgó la Categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al Municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT N°. 890.201.900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas por los Decreto número 238 del 19 de julio de 2021 y Decreto número 0272 del 05 de agosto de 2021; por medio del cual se precisan algunas disposiciones del manual de contratación del municipio de Barrancabermeja y se realizan unas delegaciones y demás normas como el Decreto número 125 del 30 de Junio de 2015, Decreto número 146 del 28 de Julio de 2015, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, Art. 315 numeral 3 de la Constitución Nacional , numeral 5 literal d) de la ley 136 de 1994, artículo 110 del decreto 111 de 1996, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos Reglamentarios y quien para los efectos de esta acta se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** y el **Arq. ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA** como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir **el acta inicio del contrato de obra 0401-23**, en los siguientes términos:

Powered by CamScanner

CONSIDERANDO

1. Que el contrato se encuentra perfeccionado por las partes.
2. Que mediante certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.11144623 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023, la Secretaria Jurídica legalizó el respectivo contrato.
3. Que mediante el Registro Presupuestal No. 23-00673 del 07 de febrero de 2023, la Secretaria de Hacienda del Tesoro expidió el requisito previo para su ejecución.

ACUERDAN

1. Fijar el día catorce (14) del mes de marzo de 2023, como fecha de iniciación del objeto contratado.
2. Fijar el día trece (13) de abril de 2024 con fecha de finalización

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los catorce (14) días del mes de marzo de 2023

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Nombre: Ing. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA
Cargo: Jefe de la dependencia

CONTRATISTA
Nombre: ING. FARLEIDYS DUARTE ROLON
Rep. Legal de CONSORCIO RIO GRANDE

SUPERVISOR
Nombre: Arq. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
Cargo: Profesional Universitario II

INTERVENTOR
Nombre: ING. DANIEL EDUARDO BARRERA VESGA
Cargo: Rep. Legal CONSORCIO INTERMIRADOR

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Reviso aspectos jurídicos	Angelica Martinez - CPS		14/03/2023
Reviso aspectos jurídicos	Erich Samir Gómez - CPS		14/03/2023
Proyectó:	Alejandro Enriquez Mora - Supervisor		14/03/2023
Revisó - Aprobó:	Ing. Luisa Fernanda Orozco Molina		14/03/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Powered by CamScanner

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4358347
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/12/2022 4:11:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 0401-23
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	14/03/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	395 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO RIO GRANDE

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO RIO GRANDE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEIDY JOHANNA JOYA ALONSO* ***Fecha de aprobación:*** *6/02/2023 3:55:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *luisa fernanda orozco molina* ***Fecha de aprobación:*** *6/02/2023 4:15:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4358347_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4358347_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	5			
Fecha límite para entrega de garantías:	30/12/2022 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	12/03/2024 4:03:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13926440	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.733.162.685,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13927633	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.273.316.268,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4 días para terminar *(24/09/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12090891	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.733.162.685,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12091601	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.273.316.268,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle
CO1.WRT.11340468	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.273.316.268,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	13/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4358347
Proveedor CONSORCIO RIO GRANDE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Diagonal 60 Km1 via llanito	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1	CO1.PCCNTR.4358347
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							25.963.546.526,00	25.466.325.369,80
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Servicios de apoyo para la construcción	1,00	UN	25.963.546.526,00	25.466.325.369,80	25.963.546.526,00	25.466.325.369,80

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO DE CONDICIONES.pdf	ANEXO DE CONDICIONES.pdf	(detalle)
CDP MIRADOR.pdf	CDP MIRADOR.pdf	(detalle)
CEPAA MIRADOR.pdf	CEPAA MIRADOR.pdf	(detalle)
Certificados Banco de proyectos MIRADOR.pdf	Certificados Banco de proyectos MIRADOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHANNA PAOLA SANT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37713409	Guardar y notificar
Supervisor	JOHANNA PAOLA SANT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37713409	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOHANNA PAOLA SANTOS REY	18/01/2024 6:00:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jonathan Stivel Vasquez Gomez
Ordenador del Gasto	JOHANNA PAOLA SANTOS REY	18/01/2024 6:00:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jonathan Stivel Vasquez Gomez
Supervisor	luisa fernanda orozco molina	6/02/2023 4:15:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina
Ordenador del Gasto	luisa fernanda orozco molina	6/02/2023 4:15:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	25.466.325.369,8
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	25.466.325.369,8

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680810072	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	23-00540	CDP	No se ha iniciado		24.711.037.435 COP	00-00-00	-	Editar
☐	ACUERDO-053-DE-2022	Vigencia futura extraordinaria	No se ha iniciado		755.287.934,8 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	23-00673	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	24.711.037.435 COP	24.711.037.435 COP	24.711.037.435 COP	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 24.711.037.435 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 24.711.037.435 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.16728693	Modificar el contrato	20/09/2024 10:33 AM *(UTC -5 horas)*	20/09/2024 10:39 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14994910	Modificar el contrato	11/03/2024 5:16 PM *(UTC -5 horas)*	11/03/2024 5:18 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14993789	Reactivar el contrato	11/03/2024 5:14 PM *(UTC -5 horas)*	11/03/2024 5:15 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.13023654	Suspender el contrato	12/10/2023 5:12 PM *(UTC -5 horas)*	12/10/2023 7:09 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.12904109	Modificar el contrato	5/10/2023 7:11 AM *(UTC -5 horas)*	5/10/2023 8:48 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.12901666	Reactivar el contrato	4/10/2023 8:42 PM *(UTC -5 horas)*	4/10/2023 9:16 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.12676388	Suspender el contrato	19/09/2023 4:50 PM *(UTC -5 horas)*	19/09/2023 5:07 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.11121987	Reactivar el contrato	8/05/2023 5:02 PM *(UTC -5 horas)*	8/05/2023 5:34 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.10907050	Suspender el contrato	11/04/2023 12:11 PM *(UTC -5 horas)*	11/04/2023 2:14 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14908448100

(415)7707212489984(8020) 000001490844810 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 8 5 4 9	7	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO RÍO GRANDE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal
CR 19 55 59 BRR URIBE URIBE

42. Correo electrónico facturacion@cscriogrande.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 8 5 2 9 5 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 1 2 0 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	5	2	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 17-02-2025 11:03:14AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908448100

(415)7707212489984(8020) 000001490844810 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 8 5 4 9	7	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 1 2 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 8 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 1 2 0 7	
81. Hasta	2 0 2 5 0 1 2 9	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14908448100

(415)7707212489984(8020) 000001490844810 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 8 5 4 9	7	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 2 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 7 5 8 0 2 4 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	ROLON	FARLEIDYS	YAJAIRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 2 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 0 2 7 1 6 1 6 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JOYA	ALONSO	LEIDY	JOHANNA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908448100

(415)7707212489984(8020) 000001490844810 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 8 5 4 9	7	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 9 6 6 0 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA Y ALQUILERES MD S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 5	2 0 2 2 1 2 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 6 0 1 0 4 7 1	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ESTRUCTURAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 2 1 2 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 4 3 2 7 3	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 2 1 2 0 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja

DECRETO No. 089 DE 2025

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSOS DEL BALANCE DE LOS PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIAS EXPIRADAS AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025"

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,

En ejercicio de sus atribuciones, especialmente conferidas por el artículo 43 del Acuerdo No. 011 de 2024, por medio del cual se aprobó el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de Apropiaciones del Distrito de Barrancabermeja para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025, y

C O N S I D E R A N D O:

1. Que el numeral 1° del artículo 315 de la Constitución Política de 1991 establece que es atribución del alcalde cumplir y hacer cumplir la constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Concejo.

2. Que la Ley 1523 de 2024, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025, establece lo siguiente en el artículo 50 sobre el pago de pasivos exigibles por vigencias expiradas:

   "Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá hacer el pago bajo el concepto de 'Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas'. También procederá la operación prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (...)".

3. Que el Acuerdo No. 101 de 1997, Estatuto Orgánico de Presupuesto de Barrancabermeja, establece en el artículo 102 que las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General de la entidad territorial, que no se ejecuten durante el año de su vigencia, *fenecerán*. En tal sentido, no resulta posible seguir incorporando mediante reserva presupuestal tales recursos debido a su fenecimiento.

4. Que el Acuerdo No. 081 de 2023 aprobó el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de Apropiaciones del Distrito de Barrancabermeja para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024.

5. Que el artículo 43 del Acuerdo No. 081 de 2023 dispone una autorización al Ejecutivo Distrital hasta el treinta (30) de diciembre de 2024, considerando el artículo 313, numeral 3 de la Constitución Política de Colombia, para que mediante Decreto adicione al Presupuesto de la vigencia fiscal 2024 *"los pasivos de vigencias expiradas que cuenten con los recursos en la Tesorería Distrital de la vigencia fiscal en que se efectuó el contrato".*

6. Que el mecanismo de *"vigencias expiradas"* o *"pasivos exigibles"* se utiliza cuando las obligaciones contraídas con los requisitos legales pasan la respectiva vigencia fiscal o la

siguiente vigencia en caso de haber utilizado las reservas, y se quedan sin respaldo presupuestal registrado, a pesar de mantener obligaciones de pago aún exigibles.

7. Que el Alcalde Distrital expidió el Decreto No. 017 del 19 de enero de 2024, *por medio del cual se constituyeron las reservas presupuestales correspondientes al cierre de la vigencia 2023*, el cual determinó la siguiente reserva en el sector "COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO", programa "*Productividad y competitividad de las empresas colombianas*", producto ": *Malecón construido*", proyecto "*Construcción del mirador del rio y acciones complementarias en el distrito de Barrancabermeja Santander*":

RP.2.3-3502-0200-078-220072-02-2.3.2.02.02.008.0001	CONSORCIO INTERMIRADOR - CP23-00924 - CD 23-00879, SEGÚN: PROI - DOC: 2021680810072 Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica para la Construcción del mirador del rio y acciones complementarias en el distrito de Barrancabermeja Santander (VIG. FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 109-887-0872-23	R001	RECURSOS PROPIOS	CP 23-00924	00901669152	3.000,00
RP.2.3-3502-0200-078-220072-02-2.3.2.02.02.008.0001	CONSORCIO INTERMIRADOR - CP23-00924 - CD 23-00879, SEGÚN: PROI - DOC: 2021680810072 Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica para la Construcción del mirador del rio y acciones complementarias en el distrito de Barrancabermeja Santander (VIG. FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 109-887-0872-23	R061	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	CP 23-00924	00901669152	1.246.050.744,00
RP.2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005.0001	CONSORCIO RÍO GRANDE - CP23-00673 - CD 23-00540, SEGÚN: PROI - DOC: 2021680810072 CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER (VIG FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 045-552-0545-23	R001	RECURSOS PROPIOS	CP 23-00673	00901668549	1.708.933.037,00
RP.2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005.0001	CONSORCIO RÍO GRANDE - CP23-00673 - CD 23-00540, SEGÚN: PROI - DOC: 2021680810072 CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER (VIG FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 045-552-0545-23	R061	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	CP 23-00673	00901668549	746.235.772,00
RP.2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005.0001	CONSORCIO RÍO GRANDE - CP23-00673 - CD 23-00540, SEGÚN: PROI - DOC: 2021680810072 CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER (VIG FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 045-552-0545-23	R203	ECOPETROL	CP 23-00673	00901668549	22.255.868.626,00

Tomado de: páginas 134 y 135 del Decreto Distrital No. 017 de 2024.

8. Que de las reservas constituidas reflejadas en la tabla anterior a corte del treinta y uno (31) de diciembre de 2024 quedaron saldos por ejecutar de recursos derivados de pasivos exigibles de vigencias expiradas y reservas de vigencia anterior, que soportan obligaciones contractuales legalmente contraídas por el Distrito de Barrancabermeja y que aún se encuentran vigentes.

"Por medio del cual se adicionan recursos del balance de los pasivos exigibles de vigencias expiradas al Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal 2025"

9. Que en oficio expedido por la Secretaría de Infraestructura *—visado por la Secretaría de Planeación—*, con radicado de recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No. 0710 del 10 de febrero de 2025, se solicita la incorporación de los compromisos del contrato No. 0401 de 2023, cuyo objeto es *"CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"*, que asciende a la suma de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($19.472.543.178,48) MCTE y Contrato 0532 de 2024, cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"*, por el monto de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS ($968.381.050,00) MCTE, correspondientes a reservas presupuestales fenecidas al cierre de la vigencia 2024, como pasivos de vigencias expiradas al presupuesto de la vigencia fiscal 2025.

10. Que la Tesorera General del Distrito de Barrancabermeja expidió certificación del 14 de febrero de 2025, definiendo que el saldo pasivo de vigencias expiradas a favor de a). CONSORCIO INTERMIRADOR, según Registro Presupuestal CP23-00924, el cual tiene como objeto Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica para la Construcción del mirador del rio y acciones complementarias en el distrito de Barrancabermeja Santander; y b). CONSORCIO RÍO GRANDE, según Registro Presupuestal CP23-00673, en las cuentas bancarias existen recursos que ampara la siguiente fuente de financiación, y los cuales deben ser adicionados al presupuesto, así:

RECURSOS PROPIOS	3.000,00
RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	968.378.050,00
RECURSOS PROPIOS	1.708.933.037,00
RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	746.235.772,00
ECOPETROL	5.890.137.231,48

11. Que según certificación de fecha 26 de febrero de 2025, expedida por la Contadora del distrito de Barrancabermeja, existe el Convenio Interadministrativo de Cooperación N° 3044720 DE 2021, Celebrado entre el ECOPETROL S.A y el Municipio de Barrancabermeja, a la fecha presenta la suma de ONCE MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($11.127.237.138,00) MCTE, en cuentas por cobrar por la fuente de financiación Recursos ECOPETROL.

12. Que con fundamento en la autorización establecida en el artículo 42 del Acuerdo No. 011 de 2024, le corresponde al Alcalde Distrital de Barrancabermeja definir mediante Decreto la incorporación al Presupuesto de la vigencia fiscal 2025, de los pasivos referidos de vigencias expiradas que cuentan con los recursos certificados en la Tesorería Distrital.

Continuación del Decreto No. 089 DE 08 MAR 2025

"Por medio del cual se adicionan recursos del balance de los pasivos exigibles de vigencias expiradas al Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal 2025"

Que en mérito de lo expuesto,

D E C R E T A:

ARTÍCULO PRIMERO. ADICIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS. Adiciónese, al Presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal 2025, recursos del balance por la suma de VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE PESOS ($20.440.924.228,48) MCTE, distribuidos así:

Rubro Presupuestales	Detalle	Fuente	Fuente de Financiación	Valor
1	INGRESOS SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL			20.440.921.228,48
1.2	RECURSOS DE CAPITAL			20.440.921.228,48
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE			20.440.921.228,48
1.2.10.02	SUPERÁVIT FISCAL			20.440.921.228,48
1.2.10.02.01	RECURSOS DEL BALANCE - SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS			20.440.921.228,48
1.2.10.02.01.02	Pasivos de Vigencias Expiradas			20.440.921.228,48
1.2.10.02.01.02.01	Recursos Propios Recursos del Balance	R061	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	3.423.546.859,00
1.2.10.02.01.02.02	Recursos ECOPETROL	R023	ECOPETROL	17.017.374.369,48
	TOTAL INCORPORACION DE RECURSOS DEL BALANCE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025			20.440.921.228,48

ARTÍCULO SEGUNDO. ADICIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. Adiciónese, al Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal 2025, recursos del balance por la suma de VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE PESOS ($20.440.924.228,48) MCTE, distribuidos así:

Rubro Presupuestal	Detalle	Código Fuente	Fuente de Financiación	BPIN	Valor
2.3-35	SECTOR: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO				20.440.921.228,48
2.3-35-3502	PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS				20.440.921.228,48
2.3-35-3502-0200	SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO				20.440.921.228,48
2.3-35-3502-0200-3502113	PRODUCTO: EQUIPAMIENTO TURÍSTICO CONSTRUIDO				20.440.921.228,48

Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja

Continuación del Decreto No 089 DE 08 MAR 2025

"Por medio del cual se adicionan recursos del balance de los pasivos exigibles de vigencias expiradas al Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal 2025"

Rubro Presupuestal	Detalle	Código Fuente	Fuente de Financiación	BPIN	Valor
2.3-35-3502-0200-3502113-02	**PROYECTO: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER (Pasivos de Vig. Expiradas)**			**2022680810072**	**20.440.921.228,48**
2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14	Otros Edificios no Residenciales (Pasivos de Vig. Expiradas	R023	ECOPETROL		17.017.374.369,48
2.3-35-3502-0200-3502113-02-2.3.2.01.01.001.02.14	Otros Edificios no Residenciales (Pasivos de Vig. Expiradas)	R061	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE		3.423.546.859,00
	TOTAL INCORPORACION DE RECURSOS DEL BALANCE PRESUPUESTO DE GASTOS 2024				**20.440.921.228,48**

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran existir en el presente Decreto.

ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto empieza a regir a partir de su fecha de su expedición.

Dado en Barrancabermeja, a los 08 MAR 2025

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JONATHAN STIVEL VÁSQUEZ GÓMEZ
Alcalde Distrital de Barrancabermeja

ÓSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMÉNEZ
Secretario de Hacienda y del Tesoro

Acción	Nombre del Responsable	Firma	Fecha
Proyectó:	Deyzi Santamaria Jaimes – Profesional Especializada		Marzo de 2025
Revisó Aspectos Jurídicos:	Valentina Guiza Santana– Abogada Externa Secretaría Jurídica	Valentina Guiza	Marzo de 2025
Vo. Bo. Aspectos Jurídicos:	Dayron O. Aguilera Cárdenas – Secretario Jurídico		Marzo de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo que bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

089

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Secretaria de Hacienda y del Tesoro
Fecha. 10 FEB 2025 Hora: 5:45
Recibido
Radicado No. 0710

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de **Infraestructura**

Barrancabermeja, febrero 10 de 2025

Doctor
OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMÉNEZ
Secretario de Hacienda y del Tesoro
Alcaldía Distrital
Barrancabermeja

ASUNTO: Adición de recursos presupuestales de vigencias expiradas

Con el fin de dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital de Barrancabermeja 2024 -2027, respetuosamente se requiere priorizar proyectos a ejecutarse de acuerdo a las necesidades presentadas por la comunidad, a través de adición de recursos, dentro de los sectores de Inversión, así:

CODIGOS	DETALLE	CÓDIGO FUENTE	DETALLE FUENTE	VALOR
2.3	GASTOS DE INVERSION			
2.3-35	SECTOR: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO			20.440.924.228,48
2.3-35-3502	PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS			
2.3-35-3502-0200	SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO			
2.3-35-3502-0200-3502113	PRODUCTO: EQUIPAMIENTO TURÍSTICO CONSTRUIDO			
2.3-35-3502-0200-3502113-XX	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER			20.440.924.228,48
2.3.2.01.01.001.02.14	Otros Edificios no Residenciales	R023	ECOPETROL	17.017.374.369,48
2.3.2.01.01.001.02.14	Otros Edificios no Residenciales	R061	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	746.235.772,00
2.3.2.01.01.001.02.14	Otros Edificios no Residenciales	R001	RECURSOS PROPIOS	1.708.933.037,00
2.3.2.01.01.001.02.14	Otros Edificios no Residenciales	R001	RECURSOS PROPIOS	3.000,00
2.3.2.01.01.001.02.14	Otros Edificios no Residenciales	R061	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	968.378.050,00
TOTAL ADICIÓN DE RECURSOS VIGENCIAS EXPIRADAS				20.440.924.228,48

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de **Infraestructura**

Justificación:
Se requiere adicionar recursos de vigencias expiradas al presupuesto de la vigencia actual, dentro del proyecto llamado **CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER**, debido a que los contratos de obra **0401-23** y contrato de interventoría **0532-23** derivados del proyecto mencionado, se encuentran en ejecución y tienen un porcentaje de ejecución fisica del **25.61%**, con la incorporación de estos recursos se garantiza el cumplimiento de los pagos en las actas parciales que están por suscribirse y el cumplimiento de las metas de producto a cargo de la Secretaría de Infraestructura, plasmadas en el Plan de Desarrollo Distrital de Barrancabermeja 2024-2027.

Cordialmente,

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura

Vo. Bo. EDWIN ADRIÁN GARCÍA ÁVILA
Secretario de Planeación

	NOMBRE RESPONSABLE	FIRMA	FECHA
Proyecto:	Yureima Medrano Mujica		Febrero 10 de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

LA SUSCRITA TESORERA GENERAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

HACE CONSTAR:

Que, en las cuentas bancarias que amparan las fuentes de financiación que a continuación se relacionan, existen recursos disponibles para las obligaciones a favor de los siguientes procesos contractuales, correspondientes a Pasivos de Vigencias Fenecidas 2024, así;

R001	RECURSOS PROPIOS	CONSORCIO INTERMIRADOR - CP23-00924 - CD 23-00879, SEGÚN: PROI - DOC: 2021680810072 Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica para la Construcción del mirador del rio y acciones complementarias en el distrito de Barrancabermeja Santander (VIG. FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 109-887-0872-23	$ 3,000.00
R061	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	CONSORCIO INTERMIRADOR - CP23-00924 - CD 23-00879, SEGÚN: PROI - DOC: 2021680810072 Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica para la Construcción del mirador del rio y acciones complementarias en el distrito de Barrancabermeja Santander (VIG. FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 109-887-0872-23	$ 968,378,050.00
R001	RECURSOS PROPIOS	CONSORCIO RÍO GRANDE - CP23-00673 - CD 23-00540, SEGÚN: PROI - DOC: 2021680810072 CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER (VIG FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 045-552-0545-23	$ 1,708,933,037.00

R061	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	CONSORCIO RÍO GRANDE - CP23-00673 - CD 23-00540, SEGÚN: PROI - DOC: 2021680810072 CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER (VIG FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 045-552-0545-23	$ 746,235,772.00
R203	ECOPETROL	CONSORCIO RÍO GRANDE - CP23-00673 - CD 23-00540, SEGÚN: PROI - DOC: 2021680810072 CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER (VIG FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 045-552-0545-23	$ 5,890,137,231.48

Dada en Barrancabermeja a los catorce (14) días del mes de febrero de 2025, a solicitud del interesado.

Atentamente,

AURA MARIA ESTRADA GOMEZ
Tesorera General

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Carlos Duarte Quiceno – Prof. Univ.		14-02-2025
Revisó	Carlos Duarte Quiceno – Prof. Univ.		14-02-2025
Aprobó			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por los tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Con el fin de soportar la adición presupuestal de pasivos de vigencia expiradas detallado a continuación, por corresponder al Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 3044720 del 2021 Celebrado entre ECOPTROL S.A. y el Distrito de Barrancabermeja por valor de **VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($27.673.438.085,00)**:

CERTIFICA QUE:

6. El Distrito de Barrancabermeja y Ecopetrol S.A. suscribieron el **Convenio interadministrativo de Cooperación No. 3044720 del 2021** cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MERCADO GASTRONÓMICO MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"* por valor de **VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($27.673.438.085,00).**

7. De acuerdo a la forma de los aportes y esquemas de desembolsos estipulados en el Convenio Interadministrativo de Cooperación, ECOPETROL S.A. aportará la suma de **VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.255.868.626.00)** y el Distrito de Barrancabermeja la suma de **CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.417.569.459,00).**

8. Durante la Vigencia 2024, ECOPETROL realizó desembolsos por valor de **ONCE MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.128.631.488,00)**, de los cuales **CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($5.238.494.256,52)** fueron girados al contratista **CONSORCIO RIO GRANDE** identificado con **NIT 901.668.549-7** correspondiente al pago del Acta parcial No. 01 quienes son los ejecutores del proyecto a través del Contrato de Obra No. 0401-23 y **CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($5.890.137.231,48)** se encuentran disponibles en Tesorería.

9. Por tal razón, el valor pendiente por desembolsar para la Vigencia 2025 ECOPETROL S.A. es de **ONCE MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.127.237.138.00)**, recursos que se encuentran incorporados en los Estados Financieros del Distrito, a través de cuentas de orden.

   El objeto del mencionado proyecto es *"CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" BPIN 2021680810072".*

10. En virtud de incorporar al presupuesto de la vigencia 2025 el pasivo de la vigencia expirada, la Administración Municipal tiene la certeza de la futura recepción de los recursos cuya adición se solicita, toda vez que las obligaciones asumidas por el ECOPETROL tienen respaldo financiero.

Se expide la presente certificación en el Distrito de Barrancabermeja, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2025, con destino a la Secretaría de Hacienda para los fines pertinentes.

CAROLINA HERRERA ENCISO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 231293-T

089 4490

Alcaldía Municipio de Barrancabermeja

Vigencia fiscal 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

NIT. 00890201900

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 24-07137

Fecha de compromiso Septiembre 25 de 2024

Beneficiario : CONSORCIO RÍO GRANDE — Nit : 00901668549 - 7

No. C.D.P : CD : 24-05387 — Fecha de expedición del C.D.P : 05-09-2024

Tipo de compromiso : CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Documento : 20230401 — Fecha : 18-09-2024 — Vence : 31-12-2024

OBJETO : SEGUN: PROI - CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPC ACUERDO 053 DE 2022 233-4559-5574-24

Identificación presupuestal	Concepto	Fuente financiación	Valor
2.3-3502-0200-113-220072 -2.3.2.01.01.001.02.14	Otros Edificios no residenciales	RECURSOS PROPIOS	1,356,346,906.00
		Total compromisos	1,356,346,906.00

Por un valor de: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE.

Proyecto de inversión

Código BPIN	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Valor
202268 310072	PROYECTO. Construcción del mirador del rio y acciones complementarias en el distrito de Barrancabermeja santander	RECURSOS PROPIOS	1,356,346,906.00
		Total total	1,356,346,906.00

TORRES MURALLA ORFILIA

Elaborado

Revisado

SECRETARIA DE HACIENDA

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4358347
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/12/2022 4:11:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 0401-23
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	14/03/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	395 días
Liquidación	☐Si ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO RIO GRANDE

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO RIO GRANDE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *LEIDY JOHANNA JOYA ALONSO* ***Fecha de aprobación:*** *6/02/2023 3:55:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *luisa fernanda orozco molina* ***Fecha de aprobación:*** *6/02/2023 4:15:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4358347_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4358347_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Si ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Si ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Si ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Si ☑No

Seriedad de la

oferta	☑Sí☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí☐No			
	☑No. de SMMLV	5		

Fecha límite para entrega de garantías: 30/12/2022 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 12/03/2024 4:03:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13926440	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.733.162.685,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13927633	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.273.316.268,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4 días para terminar *(24/09/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12090891	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.733.162.685,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12091601	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.273.316.268,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle
CO1.WRT.11340468	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.273.316.268,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	13/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4358347
Proveedor CONSORCIO RIO GRANDE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Diagonal 60 Km1 via llanito	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1 CO1.PCCNTR.4358347

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 25.963.546.526,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 25.466.325.369,80
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Servicios de apoyo para la construcción	1.00	UN	25.963.546.526,00	25.466.325.369,80	25.963.546.526,00	25.466.325.369,80

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO DE CONDICIONES.pdf	ANEXO DE CONDICIONES.pdf	(detalle)
CDP MIRADOR.pdf	CDP MIRADOR.pdf	(detalle)
CEPAA MIRADOR.pdf	CEPAA MIRADOR.pdf	(detalle)
Certificados Banco de proyectos MIRADOR.pdf	Certificados Banco de proyectos MIRADOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHANNA PAOLA SANT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37713409	Guardar y notificar
Supervisor	JOHANNA PAOLA SANT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37713409	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOHANNA PAOLA SANTOS REY	18/01/2024 6:00:46 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jonathan Stivel Vasquez Gomez
Ordenador del Gasto	JOHANNA PAOLA SANTOS REY	18/01/2024 6:00:38 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jonathan Stivel Vasquez Gomez
Supervisor	luisa fernanda orozco molina	6/02/2023 4:15:51 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina
Ordenador del Gasto	luisa fernanda orozco molina	6/02/2023 4:15:46 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	25.466.325.369,8
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	25.466.325.369,8

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680810072	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	23-00540	CDP	No se ha iniciado		24.711.037.435 COP	00-00-00	-	Editar
☐	ACUERDO-053-DE-2022	Vigencia futura extraordinaria	No se ha iniciado		755.287.934,8 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	23-00673	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	24.711.037.435 COP	24.711.037.435 COP	24.711.037.435 COP	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 24.711.037.435 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 24.711.037.435 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.16728693	Modificar el contrato	20/09/2024 10:33 AM *(UTC -5 horas)*	20/09/2024 10:39 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14994910	Modificar el contrato	11/03/2024 5:16 PM *(UTC -5 horas)*	11/03/2024 5:18 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14993789	Reactivar el contrato	11/03/2024 5:14 PM *(UTC -5 horas)*	11/03/2024 5:15 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.13023654	Suspender el contrato	12/10/2023 5:12 PM *(UTC -5 horas)*	12/10/2023 7:09 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.12904109	Modificar el contrato	5/10/2023 7:11 AM *(UTC -5 horas)*	5/10/2023 8:48 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.12901666	Reactivar el contrato	4/10/2023 8:42 PM *(UTC -5 horas)*	4/10/2023 9:16 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.12676388	Suspender el contrato	19/09/2023 4:50 PM *(UTC -5 horas)*	19/09/2023 5:07 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.11121987	Reactivar el contrato	8/05/2023 5:02 PM *(UTC -5 horas)*	8/05/2023 5:34 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.10907050	Suspender el contrato	11/04/2023 12:11 PM *(UTC -5 horas)*	11/04/2023 2:14 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4361431
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/12/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 0532-23
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	14/03/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/09/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Si ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA

★★★★★

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERMIRADOR

COLOMBIA, Puerto Wilches
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTERMIRADOR			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *NESTOR RAUL MARQUEZ URIBE* ***Fecha de aprobación:*** *14/02/2023 2:00:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *luisa fernanda orozco molina* ***Fecha de aprobación:*** *14/02/2023 4:03:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4361431_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4361431_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Si ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Si ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Si ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Si ☑No

089

Seriedad de la oferta ☑Si ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Si ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1 día de tiempo transcurrido *(30/07/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Si ☑No

Fecha limite para entrega de garantias: 30/12/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantias: 20/06/2024 4:45:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14572304	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	674.945.779,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	11/04/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.13991892	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	674.945.779,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	24/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.13941340	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	674.945.779,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	10/05/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.13941615	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	674.945.779,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	10/05/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.11304190	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	674.945.779,00 COP	Seguros del estado	13/04/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4361431
Proveedor CONSORCIO INTERMIRADOR
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Diagonal 60 Km1 via llanito	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1 . CO1.PCCNTR.4361431

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 1.349.891.559,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 1.349.891.558,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111614	SERVICIOS TEMPORALES DE INGENIERIA	1,00	UN	1.349.891.559,00	1.349.891.558,00	1.349.891.559,00	1.349.891.558,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO DE CONDICIONES.pdf	ANEXO DE CONDICIONES.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CEPAA.pdf	CEPAA.pdf	(detalle)
Certificados Banco de proyectos MIRADOR.pdf	Certificados Banco de proyectos MIRADOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHANNA PAOLA SANT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37713409	Guardar y notificar
Supervisor	ALEJANDRO ALFONSO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91497623	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOHANNA PAOLA SANTOS REY	18/01/2024 6:01:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jonathan Stivel Vasquez Gomez
Supervisor	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA	27/02/2023 11:57:21 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALFONSO ELJACH MANRIQUE
Supervisor	luisa fernanda orozco molina	14/02/2023 4:03:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina
Ordenador del Gasto	luisa fernanda orozco molina	14/02/2023 4:03:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.349.891.558
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	1.349.891.558

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680810072	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	23-00879	CDP	No validado		1.246.053.744 COP	00-00-00	Editar
☐	ACUERDO-053-2022	Vigencia futura extraordinaria	No validado		103.837.814 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 23-00924	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.246.053.744 COP	1.246.053.744 COP	1.246.053.744 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.246.053.744 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.246.053.744 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

089

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.16296620	Modificar el contrato	1/08/2024 3:21 PM *(UTC -5 horas)*	1/08/2024 3:26 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14993796	Modificar el contrato	11/03/2024 5:24 PM *(UTC -5 horas)*	11/03/2024 5:26 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14994260	Reactivar el contrato	11/03/2024 5:21 PM *(UTC -5 horas)*	11/03/2024 5:23 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.13023657	Suspender el contrato	12/10/2023 5:14 PM *(UTC -5 horas)*	12/10/2023 8:55 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.12904111	Modificar el contrato	5/10/2023 7:14 AM *(UTC -5 horas)*	5/10/2023 5:07 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.12901667	Reactivar el contrato	4/10/2023 8:48 PM *(UTC -5 horas)*	4/10/2023 8:58 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.12676450	Suspender el contrato	19/09/2023 4:53 PM *(UTC -5 horas)*	20/09/2023 7:24 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.11121993	Reactivar el contrato	8/05/2023 5:07 PM *(UTC -5 horas)*	8/05/2023 5:51 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.10906948	Suspender el contrato	11/04/2023 12:13 PM *(UTC -5 horas)*	11/04/2023 12:19 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle

089

Alcaldía Municipio de Barrancabermeja

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 0967

NIT. 00890201900

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 23-00673

Vigencia Fiscal 2023

Fecha de Compromiso Febrero 07 de 2023

Beneficiario : CONSORCIO RÍO GRANDE **Nit** : 00901668549 - 7

No. C.D.P : CD : 23-00540 **Fecha de Expedicion del C.D.P** : 30-01-2023

Tipo de Compromiso : CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Documento : 20230401 **Fecha** : 06-02-2023 **Vence** : 31-12-2023

OBJETO : CD 23-00540, SEGÚN: PROI - DOC: 2021680810072 CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER (VIG FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 045-552-0545-23

Identificación Presupuestal	Concepto	Fuente Financiación	valor
2.3-3502-0200-078-220072 -2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	ECOPETROL	22,255,868,626.00
2.3-3502-0200-078-220072 -2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	746,235,772.00
2.3-3502-0200-078-220072 -2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	RECURSOS PROPIOS	1,708,933,037.00
		Total Compromisos	**24,711,037,435.00**

TORRES MURALLA ORFILIA

Elaborado

Revisado

SECRETARIA DE HACIENDA

Powered by CamScanner

089

Alcaldía Municipio de Barrancabermeja

Vigencia Fiscal 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

NIT. 00890201900

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

8756

Registro No: 23-00924

Fecha de Compromiso-Febrero 15 de 2023

Beneficiario : CONSORCIO INTERMIRADOR — Nit : 00901669152 - 1

No. C.D.P : CD : 23-00879 — Fecha de Expedicion del C.D.P : 08-02-2023

Tipo de Compromiso : CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Documento : 20230532 — Fecha : 14-02-2023 — Vence : 31-12-2023

OBJETO : CD 23-00879, SEGÚN: PROI - DOC: 2021680810072 Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica para la construcción del mirador del rio y acciones complementarias en el distrito de Barrancabermeja Santander (VIG. FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 109-887-0872-23

Identificación Presupuestal	Concepto	Fuente Financiación	valor
2.3-3502-0200-078-220072 -02-2.3.2.02.02.008	Construcción y servicios de la construcción	RECURSOS PROPIOS	3,000.00
2.3-3502-0200-078-220072 -02-2.3.2.02.02.008	Construcción y servicios de la construcción	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	1,246,050,744.00
		Total Compromisos	1,246,053,744.00

TORRES MURALLA ORFILIA

Elaborado

Revisado

SECRETARIA DE HACIENDA

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL N°1

CONTRATO DE OBRA N°	:	N° 0401-23
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO RÍO GRANDE
NIT	:	901.668.549-7
REP. LEGAL	:	FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLÓN
CEDULA	:	37.580.244
DIRECCIÓN	:	CR 19 55 59 BARRIO URIBE URIBE
TELÉFONO	:	3132852957
CORREO ELECTRÓNICO	:	ingenieriamydsas@gmail.com
INTERVENTORÍA		
CONTRATISTA		CONSORCIO INTERMIRADOR
NIT.		901.669.152-1
REP. LEGAL	:	DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDES
C.C.	:	1.110.506.512 DE IBAGUÉ
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
OBJETO	:	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER**
VALOR	:	El valor estimado del contrato es de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($25.466.325.369,80) exenta de IVA incluido AIU
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	:	FEBRERO 06 DE 2023
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	El plazo de duración del presente contrato será de TRECE (13) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El valor total del presente contrato será soportado con recursos para la vigencia fiscal 2023 según certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda No. 23-00540 del 30 de Enero de 2023, con rubros 1) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: ECOPETROL, por valor de: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

		MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($22.255.868.626); 2) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE, por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($746.235.772.00); 3) 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS, por valor de MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.708.933.037.00), para un valor total de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($24.711.037.435.00). El valor restante corresponde a la vigencia 2024 y está soportado mediante el ACUERDO DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES No. 053 de 2022 de fecha 3 de noviembre de 2022.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	23-00540 DE ENERO 30 DE 2023 POR VALOR DE $24.711.037.435,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	23-00673 DE FEBRERO 07 DE 2023 POR VALOR DE $24.711.037.435
APROBACIÓN DE GARANTÍA		CO1.WRT.11144623 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023
BANCO DE PROYECTOS	:	2022680810072 DEL 18 DE ENERO DE 2023
CEPAA		0552 DEL 27 DE ENERO DE 2023
ACTA DE INICIO	:	MARZO 14 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	ABRIL 13 DE 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**:**	**20.57%**
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	:	ABRIL 11 DE 2023
ACTA DE REINICIACIÓN N°1	:	MAYO 08 DE 2023
PERIODO DE LA SUSPENSIÓN N°1	**:**	**27 DÍAS CALENDARIO**
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	:	SEPTIEMBRE 19 DE 2023
ACTA DE REINICIACIÓN N°2	:	OCTUBRE 03 DE 2023
PERÍODO DE LA SUSPENSIÓN N°2		**14 DÍAS CALENDARIO**
ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	OCTUBRE 12 DE 2023
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°3 DE LA PRESENTE ACTA Y SUS PRORROGAS	**:**	**110 DÍAS CALENDARIO**
ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	NOVIEMBRE 01 DE 2023

ACTA DE PRORROGA N°1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	NOVIEMBRE 10 DE 2023
ACTA DE PRORROGA N°2 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	DICIEMBRE 11 DE 2023
ACTA DE PRORROGA N°3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	ENERO 10 DE 2024
ACTA DE PRORROGA N°4 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	FEBRERO 09 DE 2024
ACTA DE PRORROGA N°5 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	FEBRERO 19 DE 2024
ACTA REINICIO No.3	:	MARZO 11 DE 2024
FECHA DE ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS	:	AGOSTO 5 DE 2024
ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS N°1	:	AGOSTO 12 DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°1		SEPTIEMBRE 19 DE 2024
PLAZO ADICIONADO N°1		13 MESES
PLAZO TOTAL		26 MESES
OTROSÍ ACLARATORIO N°1 AL ADICIONAL EN PLAZO N°1		SEPTIEMBRE 23 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN		OCTUBRE 24 DE 2025
ACTA DE ACLARATORIA No.1 DEL ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.1	:	2 DE OCTUBRE DE 2024
ACTA DE ACLARATORIA No.1 DEL ACTA DE MODIFICACIÓN No.1	:	2 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DEL PRESENTE ACTA	:	30 DE OCTUBRE DE 2024

En Barrancabermeja, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2024, se reunieron las siguientes personas: Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY, Secretaria de Infraestructura identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, quien para los efectos de este contrato se denominará EL DISTRITO CONTRATANTE, el Arq. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA profesional universitario grado 02, funcionario de la Secretaría de infraestructura del Municipio de Barrancabermeja, FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLÓN con cedula de Ciudadanía N° 37.580.244, representante legal de CONSORCIO RÍO GRANDE, y el Ing. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDES con cedula de ciudadanía 1.110.506.512 de Ibagué, Representante legal de CONSORCIO INTERMIRADOR, con el fin de elaborar y suscribir **el Acta Recibo Parcial N°1 del contrato de obra 0401-23**, en los siguientes términos:

ACUERDAN:

1. El interventor delegado certifica que reviso, verificó y constató el cumplimiento de los recursos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista de la obra, con base en los soportes presentados por este.
3. Las cantidades y los valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de

responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones de campo y las revisiones efectuadas por la supervisión.

4. La presente acta se elabora de acuerdo con las cantidades de obra medidas y verificadas en campo por la supervisión, quien considero viable la cuantificación y facturación de las mismas, según ejercicio aritmético entre valores unitarios y cantidades contractuales, cuyas memorias de cálculos de anexan.
5. Que se autoriza el pago de la presenta acta que se relaciona a continuación y cuyo anexo se adjunta:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución con Adicional N°1	Amortización del anticipo	Neto a Pagar
Acta parcial N°1	30/10/2024	$5.238.494.256.52	20.57%	0.00	0,00	$5.238.494.256.52
Totales		$5.238.494.256.52		0.00		$5.238.494.256.52

6. Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente, autorizar el pago, por valor de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE **($5.238.494.256.52)** al CONSORCIO RIO GRANDE, con **NIT.** 901.668.549-7.

7. Que el pago de la presente acta de recibo parcial N°1 se efectuara con cargo a lo estipulado en el decreto de reserva N°017 del 19 de enero de 2024 de la siguiente manera:

Identificación Presupuestal: R.P. 2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005.0001

Detalle: CONSORCIO RIO GRANDE – CP23-00-673-CD 23-00540, SEGÚN: PROI – DOC: 20216808100-72 CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES Y COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER (VIG FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053-2022) 045-552-0545-23

COD FUENTE: R203

Fuente de financiación: ECOPETROL

Valor de la fuente: $22.255.868.626,00

NCP-PTO: CP 23-00673

Valor a pagar: **$5.238.494.256.52.**

RP 2 3 3502-0200 078 220072- 2 3 2 02 02 005 0001	0545-23 CONSORCIO RÍO GRANDE - CP23 00673 CD 23-00540, SEGÚN PROI DOC 20216808107072 CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER (VIG FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 045-562 0545-23 **PRODUCTO: Plazas de mercado**	R203	ECOPETROL	CP 23 00673	0090668549	22 235 868 626,00

VALOR A PAGAR DEL ACTA: $5.238.494.256.52.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día TREINTA (30) de OCTUBRE de 2024.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Cargo: jefe de la dependencia

CONTRATISTA
Nombre: FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLÓN
Rep. Legal de CONSORCIO RIO GRANDE

SUPERVISOR
Nombre: Arq. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
Cargo: Profesional Universitario II
Secretaria de Infraestructura

INTERVENTOR
Nombre: DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDES
Cargo: Rep. Legal CONSORCIO INTERMIRADOR

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Revisó aspectos jurídicos			
Proyectó:	Alejandro Enríquez Mora - Supervisor		30/10/2024
Revisó - Aprobó:	Ing. Johanna Paola Santos Rey		30/10/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de **Infraestructura**

ACTA PARCIAL N°1

CONTRATO DE CONSULTORIA:	:	0532-2023
CONTRATANTE:	:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Nit:	:	890.201.900-6
INTERVENTOR		
CONTRATISTA:	:	CONSORCIO INTERMIRADOR
NIT	:	901.669.152-1
REPRESENTANTE LEGAL	:	DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
IDENTIFICACION:	:	1.110.506.512 DE IBAGUE
CORREO ELECTRÓNICO	:	intermirador2023@gmail.com
TELÉFONO	:	321 485 8765
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA
OBJETO:	:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"
VALOR:	:	El valor estimado del contrato es de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.349.891.558) incluido IVA, costos directos e indirectos que se generen con la presente contratación.
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	:	FEBRERO 14 DE 2023
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN:	:	El plazo de duración del presente contrato será de TRECE (13) MESES
BANCO DE PROYECTO	:	2022680810072 DEL 18 DE ENERO DE 2023
CEPAA	:	0887 DEL 06 DE FEBRERO DE 2023
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El valor del presente contrato será cancelado con recursos de la vigencia fiscal 2023, según certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda No. 23-00879 del 08 de Febrero de 2023, con rubro 2.3-3502-0200-078-220072-02-2.3.2.02.02.008, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS, por valor de: TRES MIL PESOS M/CTE ($3.000.00); 2.3-3502-0200-078-220072-02-2.3.2.02.02.008, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE, por valor de: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.246.050.744.00); El valor restante corresponde a la vigencia 2024 y está soportado mediante el ACUERDO DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES No. 053 de 2022 de fecha 3 de noviembre de 2022.

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de Infraestructura

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	23-00879 DE FEBRERO 08 DE 2023 POR VALOR DE $1.246.053.744,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	23-00924 DE FEBRERO 15 DE 2023 POR VALOR DE $1.246.053.744,00
APROBACION DE GARANTIAS N°:	:	CO1.WRT.11165706 DEL 02 DE MARZO DE 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	:	20,77%
ACTA DE INICIO	:	MARZO 14 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	ABRIL 13 DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	:	ABRIL 11 DE 2023
ACTA DE REINICIACIÓN N°1	:	MAYO 08 DE 2023
PERIODO DE LA SUSPENSIÓN N°1	:	**27 DÍAS CALENDARIO**
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	:	SEPTIEMBRE 19 DE 2023
ACTA DE REINICIACIÓN N°2	:	OCTUBRE 03 DE 2023
PERIODO DE LA SUSPENSIÓN N°2		**14 DÍAS CALENDARIO**
ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	OCTUBRE 12 DE 2023
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°3 DE LA PRESENTE ACTA Y SUS PRORROGAS	:	**110 DÍAS CALENDARIO**
ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	NOVIEMBRE 01 DE 2023
ACTA DE PRORROGA N°1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	NOVIEMBRE 10 DE 2023
ACTA DE PRORROGA N°2 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	DICIEMBRE 11 DE 2023
ACTA DE PRORROGA N°3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	ENERO 10 DE 2024
ACTA DE PRORROGA N°4 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	FEBRERO 09 DE 2024
ACTA DE PRORROGA N°5 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	:	FEBRERO 19 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO N°1	:	**SEPTIEMBRE 24 DE 2024**
ACTA REINICIO No.3	:	MARZO 11 DE 2024
FECHA DE ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS	:	AGOSTO 5 DE 2024
FECHA DE ACTA DE MODIFICACIÓN	:	AGOSTO 12 DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°1		SEPTIEMBRE 19 DE 2024
PLAZO ADICIONAL N°1		13 MESES
PLAZO TOTAL SEGÚN ADICIONAL N°1		26 MESES
OTRO SI ACLARATORIA N°1 AL PLAZO ADICIONAL EN PLAZO N°1		SEPTIEMBRE 23 DE 2024
APROBACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°1		CO1.WRT.15623820 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN		**OCTUBRE 24 DE 2025**
FECHA DEL PRESENTE ACTA	:	NOVIEMBRE 18 DE 2024

En Barrancabermeja, a los dieciocho (18) días del mes de NOVIEMBRE de 2024, se reunieron las siguientes personas: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY, Secretario de Infraestructura identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409 en su condición de Secretario de Infraestructura según Decreto de Nombramiento No. 001 del 01 de enero de 2024 y acta de posesión No.014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja que mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, que otorgó la Categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al Municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT N°. 890.201.900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas por los Decreto número 238 del 19 de julio de 2021 y Decreto número 0272 del 05 de agosto de 2021; por medio del cual se precisan algunas disposiciones del manual de contratación del municipio de Barrancabermeja y se realizan unas delegaciones y demás normas como el Decreto número 125 del 30

de Junio de 2015, Decreto número 146 del 28 de Julio de 2015, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, Art. 315 numeral 3 de la Constitución Nacional , numeral 5 literal d) de la ley 136 de 1994, artículo 110 del decreto 111 de 1996, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos Reglamentarios y quien para los efectos de esta acta se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE,** el Arq. **ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA,** profesional universitario grado 02, funcionario de la Secretaría de infraestructura del Municipio de Barrancabermeja y la **ING. DAVID ANDRÉS RAMIREZ VALDES** con cédula de ciudadanía 1.110.506.512 de Ibagué, Representante legal de **CONSORCIO INTERMIRADOR** con el fin de elaborar y suscribir **el acta de recibo parcial No. 01 del contrato de interventoría No. 0532-23,** en los siguientes términos:

ACUERDAN:

1. El supervisor delegado certifica que reviso, verifico y constato el cumplimiento de los recursos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. El supervisor certifica que reviso, verifico y constato el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista de la obra, con base en los soportes presentados por este.
3. El porcentaje de avance estipulado para la presenta acta de recibo parcial se estableció con el porcentaje de ejecución del contrato de obra N°0401-23 el cual quedó consignado en el presente Acta de recibo parcial N°1 del 30 de octubre de 2024 y cuya responsabilidad es exclusiva entre las mediciones de campo y la multiplicación de la misma con los valores unitarios establecidos por parte de Contratista e interventor.
4. Que se autoriza el pago de la presenta acta que se relaciona a continuación y cuyo anexo se adjunta:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje de Ejecución	Amortización del anticipo	Neto a Pagar
Acta parcial N°1		$ 277.672.694,00	2057%	0,00	$ 277.672.694,00
Totales		$ 277.672.694,00	2057%	0,00	$ 277.672.694,00

5. Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente, autorizar el pago, por valor de **doscientos setenta y siete millones seiscientos setenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro** PESOS MONEDA CORRIENTE (**$277.672.694,00**), a CONSORCIO INTERMIRADOR, con **NIT.** 901.669.152-1.

6. Que la presente acta se pagara con cargo al decreto de reservas presupuestales 017 de 2024 de la siguiente manera:

Identificación Presupuestal:	RP 2.3-3502-0200-078-220072-02-2.3.2.02.02.008.0001
Detalle:	CONSORCIO INTERMIRADOR – CP23 – 00924 -CD-23-00879, SEGÚN PROI-DOC: 2021680810072 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER (VIG FUTURA EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 109-887-0872-23
COD FUENTE:	R061
Fuente de financiación:	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE
Valor de la fuente:	**$1.246.050.744,00**
NCP-PTO:	CP 23-00924
Valor a pagar:	**$277.672.694,00**

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de Infraestructura

RP 2.3-3502-0200-078-220072-02-2.3.2.02.02.008.0001	CONSORCIO INTERMIRADOR CP21 00924 - CD 23-00879, SEGÚN PROI OOC- 20216808100?2 Interventoria técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica para la Construcción del mirador del rio y acciones complementarias en el distrito de Barrancabermeja Santander (VIG. FUTURAS EXCEPCIONAL ACUERDO 053 DE 2022) 109-887-0822-23	R061	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	CP 21-0092-1	0090169152	1.246.050.744,00

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 18 de noviembre de 2024

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Nombre: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Cargo: Jefe de la dependencia

SUPERVISOR
Nombre: ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA
Cargo: Profesional Universitario II

INTERVENTOR
Nombre: Ing. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDES
Rep. Legal de CONSORCIO INTERMIRADOR

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Reviso aspectos jurídicos			
Proyectó:	Alejandro Alfonso Enriquez Mora - Supervisor		
Revisó - Aprobó:	Ing., Johanna Paola Santos Rey		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

089

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA			
	CERTIFICACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION			
	Código: DEP-FO-025	Fecha06/12/2023	Versión: 001	Página 1 de 1

CERTIFICA:

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL BARRANCABERMEJA 2024-2027	
Nombre del Proyecto	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER**
Número BPPID	20220680810080
Línea Estratégica Distrital	2. EMPLEO Y DERECHOS DE TODOS
Sector de inversión territorial	35: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Programa Distrital	3502. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS
Indicador de producto plan de desarrollo	350211300. EQUIPAMIENTOS CONSTRUIDOS
Número BPIN	2022680810072
Programa Nacional	3502. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS
Producto Nacional	3502113 EQUIPAMIENTO TURÍSTICO CONSTRUIDO
Indicador Nacional	350211300. EQUIPAMIENTOS CONSTRUIDOS
Valor Total del Proyecto	$ 27.313.438.085,00
Valor Total de la Vigencia	$ 27.313.438.085,00

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS					
Vigencia Actual		**Vigencia Futura** (Ordinaria) **20##**		**Vigencia Futura** (Excepcional) **20##**	
Obra:	$ 25.265.924.265,00	Obra:		Obra:	
Interventoría:	$ 1.349.891.559,00	Interventoría:		Interventoría:	
Otros:	$ 697.622.261,00	Otros:		Otros	
Total:	$ 27.313.438.085,00	Total:		Total	
Solicitud realizada por:		**Nombre: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY**			
		Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
Nota: SEGUNDA CERTIFICACIÓN CON BASE EN LA PRIMERA ACTUALIZACIÓN 2022 PARA HOMOLOGACION DE PLAN DE DESARROLLO					

Se expide en Barrancabermeja a los dieciséis (16) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024) y tiene validez hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
Secretario de Planeación Distrital

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Revisó y aprobó	Omar Ernesto Prada Rueda		16.07.24
Proyectó y elaboró	Lina Marcela Castro Severiche		16.07.24
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

RUBRO PRESUPUESTAL	RP No.	COD FUENTE	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO ACTA No.1	SALDO POR EJECUTAR		
2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005	23-00673	R023	$ 22.255.868.626	$ 5.238.494.256,52	$ 17.017.374.369,48	PASIVO EXPIRADO	$ 20.440.924.228
2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005		R061	$ 746.235.772	$ 0,00	$ 746.235.772,00	PASIVO EXPIRADO	
2.3-3502-0200-078-220072-2.3.2.02.02.005		R001	$ 1.708.933.037	$ 0,00	$ 1.708.933.037,00	PASIVO EXPIRADO	
2.3-3502-0200-078-220072-02-2.3.2.02.02.008	23-00924	R001	$ 3.000	$ 0,00	$ 3.000,00	PASIVO EXPIRADO	
2.3-3502-0200-078-220072-02-2.3.2.02.02.008		R061	$ 1.246.050.744	$ 277.672.694,00	$ 968.378.050,00	PASIVO EXPIRADO	
2.3-3502-0200-113-220072-2.3.2.01.01.001.02.14	24-07137	R001	$ 1.356.346.906	$ 0,00	$ 1.356.346.906,00	RESERVA	
VALOR TOTAL CONVENIO			**$ 27.313.438.085**	**$ 5.516.166.950,52**	**$ 21.797.271.134**		

680

089

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA			
	CERTIFICACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION			
	Código: DEP-FO-025	Fecha06/12/2023	Versión: 001	Página: 1 de 1

CERTIFICA:

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA 2024-2027	
Nombre del Proyecto	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER**
Número BPPID	**20220680810080**
Línea Estratégica Distrital	2. EMPLEO Y DERECHOS DE TODOS
Sector de inversión territorial	35: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Programa Distrital	3502. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS
Indicador de producto plan de desarrollo	350211300. EQUIPAMIENTOS CONSTRUIDOS
Número BPIN	**2022680810072**
Programa Nacional	3502. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS
Producto Nacional	3502113 EQUIPAMIENTO TURÍSTICO CONSTRUIDO
Indicador Nacional	350211300. EQUIPAMIENTOS CONSTRUIDOS
Valor Total del Proyecto	$ 27.313.438.085,00
Valor Total de la Vigencia	$ 27.313.438.085,00

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

Vigencia Actual 2024		**Vigencia Futura** (Ordinaria) **20##**		**Vigencia Futura** (Excepcional) **20##**	
Obra:	$ 25.265.924.265,00	Obra:		Obra:	
Interventoría:	$ 1.349.891.559,00	Interventoría:		Interventoría:	
Otros:	$ 697.622.261,00	Otros:		Otros	
Total:	$ 27.313.438.085,00	Total:		Total	
Solicitud realizada por:		**Nombre: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY**			
		Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			

Nota: CUARTA CERTIFICACIÓN CON BASE EN LA PRIMERA ACTUALIZACIÓN 2022 emitida el 5/10/2022. Valor total del proyecto: $27.313.438.085,00; Aporte del distrito $5.057.569.459,00 y Aporte ECOPETROL $22.255.868.626,00.

Se expide en Barrancabermeja a los once (11) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025) y tiene validez hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
Secretario de Planeación Distrital

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Revisó y aprobó	Omar Ernesto Prada Rueda		10/02/2025
Elaboró	Lina Marcela Castro Severiche		10/02/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
