| REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL | **Versión: 01** |
|---|---|
| | ***Fecha: 10-11-24*** |

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

| Fecha de inicio del Contrato | Fecha de finalización del Contrato | Fecha de elaboración del Informe de Avance |
|---|---|---|
| 5 de Diciembre 2024 | 30 de Diciembre 2024 | 6 de Diciembre de 2024 |

## 1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

| Actividad Realizada | Fecha de Inicio | Fecha de término | Descripción de avance | Grado de Avance % | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Suministro e instalación de luminarias con tablero de control tipo pedestal, sistema de puesta a tierra y fuente de datos con integrados para inteligencia lumínica de | 06/12/ 2024 | 06/12/ 2024 | Se realizan trabajos de obra civil, para lo cual se evidencia excavación alrededor de la fuente para instalación de tubería que se utilizará | 10 % | Se realiza instalación de doble tubería para cada luminaria, una para conexión eléctrica y otra para envío de datos, tubería en PVC con un diámetro de pulgada y media 1½" esta se entierra a 30 cm de profundidad, al tapar la tubería se deja como aviso preventivo cinta peligro para |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| iluminación led. | | | para tendido eléctrico y cableado para envío de datos, desde tablero principal hasta los puntos de las nuevas luminarias | | excavaciones y/o trabajos a futuro. |
| Suministro e instalación de luminarias con tablero de control tipo pedestal, sistema de puesta a tierra y fuente de datos con integrados para inteligencia lumínica de iluminación led | 06/12/ 2024 | 06/12/ 2024 | Se realizan trabajos de obra civil, para lo cual se evidencia fundición de concreto para formar las bases en las que se instalaran las luminarias. Se realizan pruebas de continuidad en acometidas eléctricas para iluminarias tipo pedestal. | 15 % | Se realiza la fundición de 4 bases para la instalación de las nuevas luminarias, estas cuentan con medidas de 42x42cm de ancho y largo con 10cm de profundidad. Las pruebas de continuidad se realizan a las iluminarias tipo pedestal que ya se encontraban instaladas y conectadas al tablero principal. |
| Suministro e instalación de luminarias con | 06/12/ 2024 | 06/12/ 2024 | Se realizan trabajos de obra civil, | 20 % | Se introdujeron varillas de cobre que formarán el sistema triangular de la |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| tablero de control tipo pedestal, sistema de puesta a tierra y fuente de datos con integrados para inteligencia lumínica de iluminación led | | | para lo cual se evidencia excavación en forma triangular para formar sistema de malla puesta a tierra para tablero principal, también se evidencia excavación e instalación de tubería desde tablero principal hasta el obelisco para instalación de sistema eléctrico y de envío de datos para luminarias nuevas que se instalaran en este punto. | | malla puesta a tierra, estas con medidas de 2,4 m por ½ " , así mismo instalación de tubería en PVC con un diámetro de pulgada y media 1½" esta se entierra a 30 cm de profundidad, al tapar la tubería se deja como aviso preventivo cinta peligro para excavaciones y/o trabajos a futuro. |

## 2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

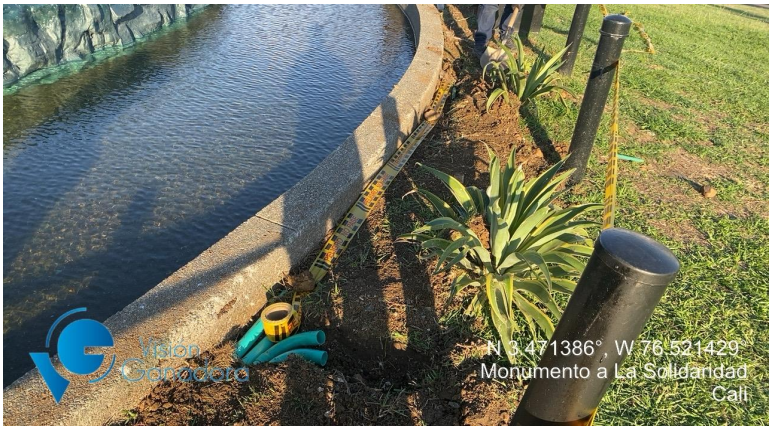
| ACTIVIDAD NO PREVISTA | ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica |

## 3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

| LIMITACIONES | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS | ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR |
|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica |

## 4. REGISTRO FOTOGRAFICO

| IMAGEN No.1 | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Obra civil – excavación alrededor de la fuente para instalación de tubería. |
| **IMAGEN No.2** | **DESCRIPCIÓN** |

| | |
|---|---|
|  | Obra civil – excavación alrededor de la fuente para instalación de tubería. |
| **IMAGEN No.3** | **DESCRIPCIÓN** |
|  | Obra civil – Instalación de tubería PVC 1½". |
| **IMAGEN No.4** | **DESCRIPCIÓN** |
|  | Obra civil – Señalización preventiva al tapar la tubería. |

| IMAGEN No.5 | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|   | Obra civil – Adecuación para fundición de bases para luminarias. |
| **IMAGEN No.6** | **DESCRIPCIÓN** |
|   | Obra civil – Fundición de bases para luminarias. |
| **IMAGEN No.7** | **DESCRIPCIÓN** |
|  | Pruebas de continuidad en acometidas de luminarias tipo pedestal. |

| IMAGEN No.8 | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Pruebas de continuidad en acometidas de luminarias tipo pedestal. |
| **IMAGEN No.9** | **DESCRIPCIÓN** |
|   | Obra civil – Excavación para instalación de sistema triangular de sistema puesta a tierra. |
| **IMAGEN No.10** | **DESCRIPCIÓN** |
|   | Obra civil – excavación para instalación de tubería luminarias obelisco. |

| IMAGEN No.11 | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|   | Obra civil – Instalación de tubería PVC 1½" luminarias obelisco. |

## 5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Se continuarán los trabajos de obra civil y adecuaciones requeridas para el día siguiente.

**Firma,**

VICTOR L. SILVA MORA

***VICTOR LEANDRO SILVA MORA***
C.C 1.118.301.164
*Cargo: Apoyo técnico y operativo*
**VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S**

***RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES***
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
*Coord. apoyo profesional Técnico*
**VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S**

*Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría **VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***
