REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	7 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Grado de Avance %	Observaciones
Instalación de anclajes antivandálicos, reja de tablero y tablero	07/12/2024	07/12/2024	Se realiza la instalación de anclajes de todos los antivandálicos (luminarias redondas de piso, lineales de piso y reja en tablero. Se instala tablero	70 %	Pendiente en ELOY ALFARO: Aportar ficha técnica y certificados de producto vigente (a la fecha de compra) de luminarias a instalar Instalación de Luminarias redondas y lineales

			principal sin circuitos de control interno		Instalación de circuitos de control
Instalación de alimentadores	07/12/2024	07/12/2024	Se realiza instalación de alimentadores en cable 4x16 para 16 luminarias de piso de 3.5 w , 4 luminarias lineales y 2 reflectores	75 %	

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Alistamiento para instalación de anclajes y tablero.
IMAGEN No.2	**DESCRIPCIÓN**
 	Instalación de gabinete y reja de tablero.

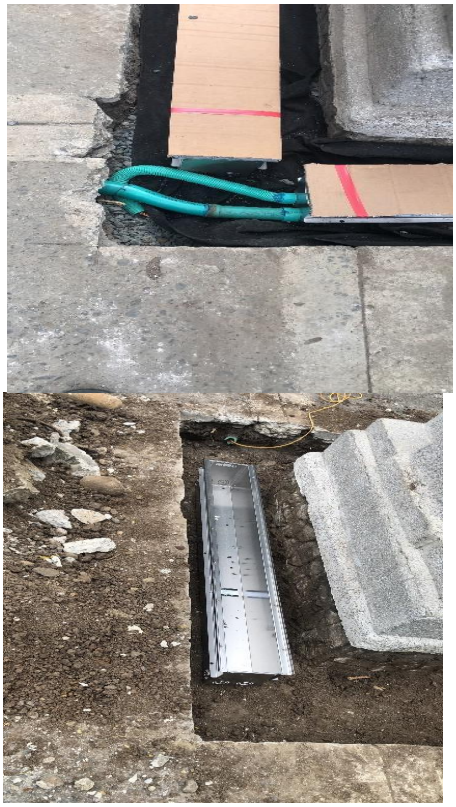
IMAGEN No.3	DESCRIPCIÓN
	Presentación para fundición de bases en acero inoxidable para luminarias lineales

IMAGEN No.4	DESCRIPCIÓN
	Instalación de anclajes para anti vandálicos.

IMAGEN No.5	DESCRIPCIÓN
	Instalación de alimentadores

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Se continuarán los trabajos de obra civil y adecuaciones requeridas para el día siguiente.

Firma,

Victor L. Silva Mora

VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo profesional Técnico
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

*Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría **VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***
