REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	**Fecha de finalización del Contrato**	**Fecha de elaboración del Informe de Avance**
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	7 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	**Fecha de Inicio**	**Fecha de término**	**Descripción de avance**	**Grado de Avance %**	**Observaciones**
Verificación inicio de mantenimiento correctivo	07/12/2024	07/12/2024	Se encienden las 4 luminarias y presentan avanzado deterioro, opacas y algunos leds no encienden. El molde de instalación de la luminaria	100%	No aplica

			presenta agua internamente		
Verificación Retiro de Luminarias	07/12/2024	07/12/2024	Se retiran las 4 luminarias con avanzado estado de deterioro.	100 %	No aplica
Adecuación de soportes de luminarias	07/12/2024	07/12/2024	Se adecua el molde de las luminarias para posterior instalación con sistema antivandálico	100 %	No aplica
Revisión de tablero.	07/12/2024	07/12/2024	Se realiza revisión y mantenimiento de tablero.	100%	No aplica
Instalación de luminarias	07/12/2024	07/12/2024	Se realiza instalación de 4 luminarias nuevas. RGB Sumergibles tipo Dona y se realizan las pruebas de funcionamiento.	100 %	No aplica

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

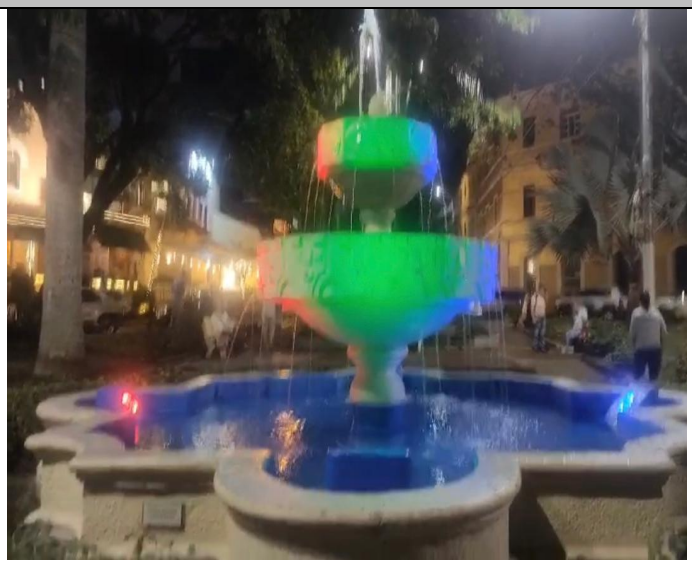
3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Soporte de luminarias. Agua internamente en el soporte

IMAGEN No.2	DESCRIPCIÓN
	Luminarias retiradas.
IMAGEN No.3	**DESCRIPCIÓN**
	Adecuación de soporte con sistema anti vandálico para luminarias
IMAGEN No.4	**DESCRIPCIÓN**
 	Luminaria a instalar

IMAGEN No.5	**DESCRIPCIÓN**
  	Instalación y prueba de luminarias
IMAGEN No.6	**DESCRIPCIÓN**
	Resultado final

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

No aplica

Firma,

VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo profesional Técnico
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

*Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría **VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***
