| **REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL** | **Versión: 01** |
|---|---|
| | ***Fecha: 10-11-24*** |

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

| **Fecha de inicio del Contrato** | **Fecha de finalización del Contrato** | **Fecha de elaboración del Informe de Avance** |
|---|---|---|
| 5 de Diciembre 2024 | 30 de Diciembre 2024 | 9 de Diciembre de 2024 |

## 1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

| **Actividad Realizada** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de término** | **Descripción de avance** | **Grado de Avance %** | **Observaciones** |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento preventivo a los componentes eléctricos del sistema de iluminación ornamental | 9/12/ 2024 | 9/12/ 2024 | Se realiza se inspección del tablero principal, se realiza tareas de limpieza general, tanto en la parte interior como exterior, se remueve polvo y demás artículos encontrados, se realiza ajuste de borneras para todas las conexiones eléctricas del tablero, se proceden a tomar medidas de corriente y voltaje de líneas de alimentación eléctrica para | 100 % | No aplica |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | luminarias, se toman medidas de voltaje que alimenta el circuito, se realizan tomas de medidas para el sistema de puesta a tierra, se realiza tomas y registros de imágenes termo gráficas para todo el circuito eléctrico, se toman medidas de humedad dentro del tablero. | | |

## 2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

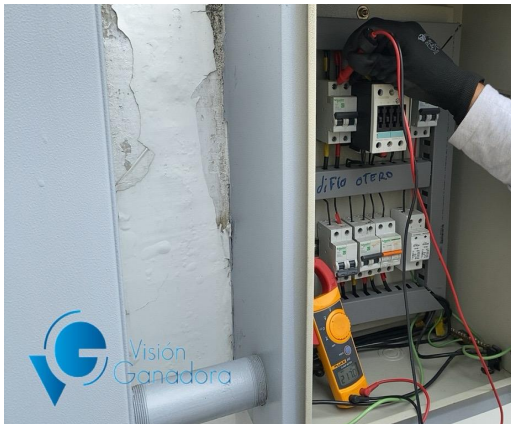
| ACTIVIDAD NO PREVISTA | ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica |

## 3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

| LIMITACIONES | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS | ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR |
|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica |

## 4. REGISTRO FOTOGRAFICO

| IMAGEN No.1 | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Inspección general y verificación del tablero principal. |
| **IMAGEN No.2** | **DESCRIPCIÓN** |
|  | Ajuste de borneras para conexiones del tablero. |

| IMAGEN No.3 | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|   | Toma de medidas (corriente, voltaje, tierra, termografía y humedad) |
| **IMAGEN No.4** | **DESCRIPCIÓN** |
|   | Toma de medidas (corriente, voltaje, tierra, termografía y humedad) |

## 5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

No aplica

**Firma,**

**VICTOR LEANDRO SILVA MORA**
C.C 1.118.301.164
*Cargo: Apoyo técnico y operativo*
**VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S**

***RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES***
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
*Coord. apoyo profesional Técnico*
**VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S**

*Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría* ***VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***
