REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	10 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Grado de Avance %	Observaciones
Mantenimiento preventivo a los componentes eléctricos del hito monumento aves del rio.	10/12/2024	10/12/2024	Se realiza revisión y limpieza general de todos los elementos que componen el sistema como luminarias, tablero	100 %	Para la limpieza de las luminarias que se encuentran alrededor del hito, fue necesario retirar la vegetación que las estaba cubriendo. Se evidencia sobre un costado del hito, resto de

			eléctrico de protección y control, cajas de inspección, cableados, canalizaciones y sistemas antivandálicos. Para la limpieza se utilizaron cepillos de cerdas suaves, paños de microfibras, limpiadores con soluciones neutras no abrasivos, antioxidantes y limpiador de contactos eléctricos.		heces humanas, lo que dificulta el acceso a esa zona para la debida limpieza de las iluminarias.
Mantenimiento preventivo a los componentes eléctricos del hito monumento aves del rio.	10/12/2024	10/12/2024	En el tablero de protección y control se realiza revisión y medición de variables eléctricas como tensión, corriente, resistencia de puesta a tierra, humedad	100%	No aplica

			relativa y toma de termografía.		
Mantenimiento preventivo a los componentes eléctricos del hito monumento aves del rio.	10/12/2024	10/12/2024	Se realiza prueba general de funcionamiento de todo el sistema de iluminación.	100%	No aplica

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

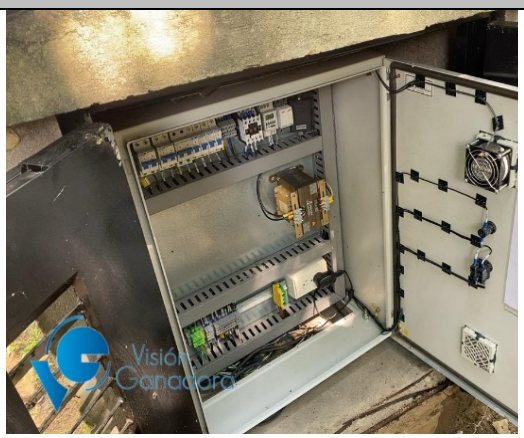
ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Inspección general y verificación del tablero principal.
IMAGEN No.2	**DESCRIPCIÓN**
	Ajuste de borneras y conexiones eléctricas del circuito.
IMAGEN No.3	**DESCRIPCIÓN**
	Toma de medidas (corriente, voltaje, tierra, termografía y humedad)

IMAGEN No.4	DESCRIPCIÓN
	Toma de medidas (corriente, voltaje, tierra, termografía y humedad)
IMAGEN No.5	**DESCRIPCIÓN**
	Limpieza y retiro de vegetación sobre iluminarias
IMAGEN No.6	**DESCRIPCIÓN**
	Verificación final de mantenimiento preventivo al hito.

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

No aplica.

Firma,

Victor L. Silva Mora

VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo Técnico profesional
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría ***VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***
