REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	**Fecha de finalización del Contrato**	**Fecha de elaboración del Informe de Avance**
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	11 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	**Fecha de Inicio**	**Fecha de término**	**Descripción de avance**	**Grado de Avance %**	**Observaciones**
Mantenimiento preventivo a los componentes eléctricos del hito monument	11/12/ 2024	11/12/ 2024	Se realiza revisión y limpieza general de todos los elementos que componen el sistema como luminarias, tablero eléctrico de protección y control, cajas de	100 %	No aplica.

o parque del perro.			inspección, cableados, canalizaciones y sistemas antivandálicos. Para la limpieza se utilizaron cepillos de cerdas suaves, paños de microfibras, limpiadores con soluciones neutras no abrasivos, antioxidantes y limpiador de contactos eléctricos.		
Mantenimiento preventivo a los componentes eléctricos del hito monumento o parque del perro.	11/12/2024	11/12/2024	En el tablero de protección y control se realiza revisión y medición de variables eléctricas como tensión, corriente, resistencia de puesta a tierra, humedad relativa y toma de termografía.	100%	No aplica

Mantenimiento preventivo a los componentes eléctricos del hito monumento parque del perro.	11/12/2024	11/12/2024	Se realiza prueba general de funcionamiento de todo el sistema de iluminación.	100%	No aplica

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

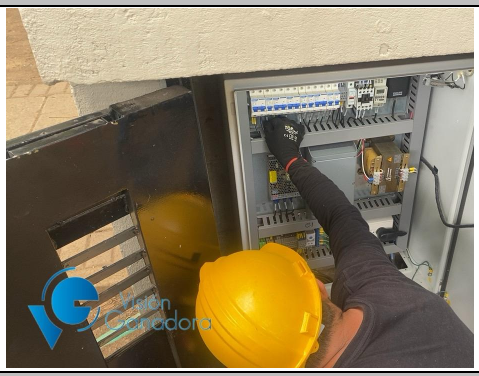
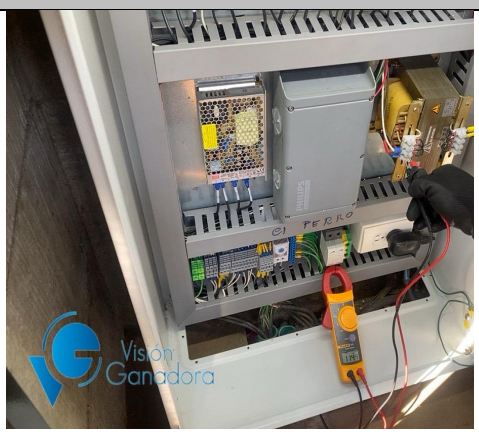
IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Inspección general y verificación del tablero principal.
IMAGEN No.2	**DESCRIPCIÓN**
	Ajuste de borneras y conexiones eléctricas del circuito.
IMAGEN No.3	**DESCRIPCIÓN**
	Toma de medidas (corriente, voltaje, tierra, termografía y humedad)

IMAGEN No.4	DESCRIPCIÓN
	Toma de medidas (corriente, voltaje, tierra, termografía y humedad)
IMAGEN No.5	**DESCRIPCIÓN**
	Limpieza y retiro de elementos sobre iluminarias
IMAGEN No.6	**DESCRIPCIÓN**
	Verificación final de mantenimiento preventivo al hito.

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

No aplica.

Firma,

VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo profesional Componente Técnico Construcción
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría ***VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***
