REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	13 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Grado de Avance %	Observaciones
Inventario de dispositivos y apertura de tableros	13/12/ 2024	13/12/ 2024	La red de iluminación ornamental tiene 3 tableros, 32 luminarias lineales de 4 pies y 31 luminarias tipo dona (10 en fuente inferior y 20 en fuente superior+1 faltante)	100%	Chapa de las 3 puertas en perfecto estado.
Verificación del estado de luminarias	13/12/ 2024	13/12/ 2024	9 de 32 luminarias lineales no	100 %	1 mojón de la fuente superior no tiene luminaria. Al

			encienden. (total 23 en buen estado) 8 de 31 luminarias tipo dona no encienden+1 faltante + 1 no recibe control (queda encendida en blanco) total 22 en buen estado.		colocarla serian en total 31 tipo dona
Medición de parámetros eléctricos en tableros	13/12/ 2024	13/12/ 2024	La medición de voltaje y corriente de los 3 tableros se encuentran dentro de los rangos esperados.	100 %	Se consigna la información en el formato "Mantenimiento preventivo" interno de Contratista.
Medición de resistividad línea a tierra	13/12/ 2024	13/12/ 2024	Tablero 1: 326 Ω Tablero 2: 20.4 Ω Tablero 3: 20,1 Ω	100 %	Valores de resistencia fuera del rango recomendable de 10 ohmios RETIE (RESOLUCIÓN NÚMERO 40117 DE 02 ABR 2024 libro 3 Tabla 3.12.3
Inspección de antivandálicos de luminarias lineales de 4 pies	13/12/ 2024	13/12/ 2024	Se observan todos antivandálicos oxidados y empolvados.	100 %	
Mejoramiento de antivandálicos de luminarias lineales de 4pies	13/12/ 2024	13/12/ 2024	Se limpian, lijan y pintan los 8 antivandálicos más visibles de la fuente inferior	100 %	

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

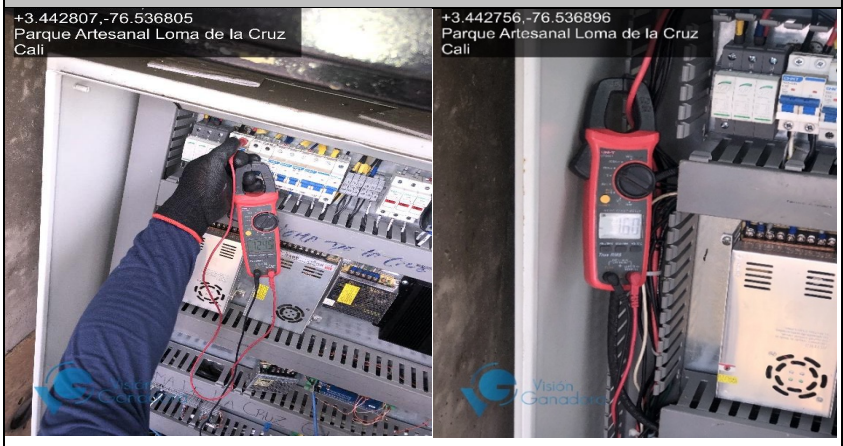
IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Medición de parámetros eléctricos en tableros Voltaje y corriente.

IMAGEN No. 2	DESCRIPCIÓN
	Termografía y medición de humedad.
IMAGEN No. 3	**DESCRIPCIÓN**
	Medición línea a tierra en tablero 1 Fuera del rango menor a 10 ohmios para equipos electrónicos
IMAGEN No. 4	**DESCRIPCIÓN**
	Medición línea a tierra en tablero 2 Fuera del rango menor a 10 ohmios para equipos electrónicos

IMAGEN No.5	DESCRIPCIÓN
	Medición línea a tierra en tablero 3 Fuera del rango menor a 10 ohmios para equipos electrónicos
IMAGEN No. 6	**DESCRIPCIÓN**
	Inspección de Antivandálicos, encontrando que se encuentran empolvados y oxidados.
IMAGEN No. 7	**DESCRIPCIÓN**
	Pintura usada en 8 de los Antivandálicos oxidados

IMAGEN No.8	DESCRIPCIÓN
	Presentación de 8 antivandálicos de luminarias de 4 pies en la fuente de la parte inferior, posterior al proceso de limpieza, lijado y pintura.

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

No aplica.

Firma,

Victor L. Silva Mora

VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo Técnico profesional
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

*Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría **VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***
