BALANCE DEL DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL MES DE JULIO DE 2024
JAC VILLA FÁTIMA

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA PROYECTADO (A)				%				VALOR PROGRAMA EJECUTADO (B)	%
	Descripcción de Items	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (Según Propuesta Económica Aprobada)	Valor Total		Unidad	Cantidad Ejecutada	Valor Unitario (Según Propuesta Ecomica Aprobada)		
1	**EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**				**$ 14,686,362.00**					**$ 3,709,555.00**	
1.1	Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo	Und	1	$ 513,159.00	$ 513,159.00		Und	1	$ 13,159.00	$ 13,159.00	
1.2	Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3	Und	1	$ 2,534,203.00	$ 2,534,203.00		Und	1	$ 34,203.00	$ 34,203.00	
1.3	Carrotanque de agua(1000 Galones)	Und	2	$ 1,430,183.18	$ 1,336,179.56		Und	2	$ 373,204.00	$ 746,408.00	
1.4	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton	Und	1	$ 2,918,126.00	$ 2,918,126.00		Und	1	$ 894,207.00	$ 894,207.00	
1.5	Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton	Und	1	$ 2,128,654.00	$ 2,128,654.00	7.48%	Und	1	$ 628,654.00	$ 628,654.00	**1.89%**
1.6	Aspersor manual de 20 litros	Und	1	$ 267,921.39	$ 267,921.39		Und	1	$ 267,921.00	$ 267,921.00	
1.7	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros	Und	1	$ 1,045,071.00	$ 1,045,071.00		Und	1	$ 545,071.00	$ 545,071.00	
1.9	Mezcladora de concreto tipo trompo	Und	1	$ 3,638,391.00	$ 3,638,391.00		Und	1	$ 275,275.00	$ 275,275.00	
1.10	Cizalla manual de 90 cm	Und	1	$ 304,657.05	$ 304,657.05		Und	1	$ 304,657.00	$ 304,657.00	
2	**MATERIALES**				**$ 114,495,846.80**					**$ 97,321,469.78**	
2.1	**Excavaciones Varias sin Clasificar**	M3	10.0	$ 21,819.00	$ 218,190.00		M3	8.5	$ 21,819.00	$ 185,461.50	
2.2	**Subbase Granular Clase C**	M3	96.7	$ 120,357.70	$ 11,639,972.40		M3	82.2	$ 120,357.70	$ 9,893,976.54	
2.3	**Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ**	M3	80.8	$ 786,450.90	$ 63,545,232.72		M3	68.7	$ 786,450.90	$ 54,013,447.81	
2.3.1	Cemento Uso Estructural	Und	196.0	$ 36,000.00	$ 7,056,000.00		Und	166.6	$ 36,000.00	$ 5,997,600.00	
2.3.2	Arena Fina	M3	39.0	$ 87,954.00	$ 3,425,808.30		M3	33.1	$ 87,954.00	$ 2,911,937.06	
2.3.3	Grava	M3	58.5	$ 117,000.00	$ 6,846,840.00	**58.31%**	M3	49.7	$ 117,000.00	$ 5,819,814.00	**49.56%**
2.4	**Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)**	M3	35.5	$ 341,917.60	$ 12,138,074.80		M3	30.2	$ 341,917.60	$ 10,317,363.58	
2.4.1	Piedra Rajón	M3	7.0	$ 68,000.00	$ 476,000.00		M3	6.0	$ 68,000.00	$ 404,600.00	
2.4.2	Cemento Uso Estructural	Und	117.0	$ 36,000.00	$ 4,212,000.00		Und	99.5	$ 36,000.00	$ 3,580,200.00	
2.4.3	Arena Fina	M3	32.0	$ 87,954.00	$ 2,814,528.00		M3	27.2	$ 87,954.00	$ 2,392,348.80	
2.4.4	Grava	M3	42.0	$ 117,000.00	$ 4,914,000.00		M3	35.7	$ 117,000.00	$ 4,176,900.00	
2.5	**Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)**	KG	3601.1	$ 7,485.00	$ 26,954,376.88		KG	3061.0	$ 7,485.00	$ 22,911,220.35	
4	**MANO DE OBRA**				**$ 13,992,091.20**					**$ 13,558,845.52**	
4.1	Primera Quincena (Del 15 al 30 de mayo 2024)				$ 2,098,813.68					$ 1,665,568.00	
4.2	Segunda Quincena (Del 01 al 15 de junio 2024)				$ 3,498,022.80	**7.13%**				$ 3,498,022.80	**6.91%**
4.3	Tercera Quincena (Del 15 al 30 de junio 2024)				$ 4,197,627.36					$ 4,197,627.36	
4.4	Cuarta Quincena (Del 01 al 15 de julio 2024)				$ 4,197,627.36					$ 4,197,627.36	
5	**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL**				**$ 4,306,812.00**					$ -	0.00%
6	**GASTOS ADMINSTRATIVOS**				**$ 47,873,437.00**					**$ 28,540,409.50**	
6.1	**PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**				**$ 26,213,295.00**					**$ 14,856,647.50**	
6.1.1	Residente de Obra (CPS)				$ 10,500,000.00					$ 7,000,000.00	
6.1.2	Contador Público (CPS)				$ 4,200,000.00					$ 2,100,000.00	
6.1.3	Maestro de obra (Nómina) + Carga Prestacional				$ 11,513,295.00					$ 5,756,647.50	
6.2	**SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN**				**$ 2,343,110.00**					**$ 2,293,885.00**	
6.3	**MEDIDAS AMBIENTALES**				**$ 953,000.00**					**$ 953,000.00**	
6.4	**GASTOS BANCARIOS**				**$ 1,274,032.00**					$ -	
6.5	**OTROS COSTOS**				**$ 17,090,000.00**	**24.38%**				**$ 10,436,877.00**	**14.54%**
6.5.1	Ensayos de Laboratorio				$ 700,000.00					$ -	
6.5.2	Valla (1x2)				$ 350,000.00					$ 340,000.00	
6.5.3	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños				$ 6,500,000.00					$ 6,500,000.00	
6.5.4	Topografía				$ 4,500,000.00					$ -	
6.5.5	Bodega				$ 600,000.00					$ 600,000.00	
6.5.6	Exámenes de ingreso personal nómina				$ 540,000.00					$ 518,400.00	
6.5.7	Pólizas				$ 1,800,000.00					$ 1,914,477.00	
6.5.8	Subsidio al dignatario para transporte				$ 1,200,000.00					$ 264,000.00	
6.5.9	Caja menor-Papelería				$ 900,000.00					$ 300,000.00	
7	**APORTE OAC**				**$ 1,000,000.00**	**0.51%**				$ -	0.00%
TOTALES					**$ 196,354,549.00**	**100.00%**				**$ 143,130,279.80**	**72.89%**

BITACORA DE OBRA

Fecha : 28-06-2024.
Estado del tiempo : Lluvioso.

Desarrollo de Actividades.
- No se labora por el mal estado del tiempo

Supervisor de obra : Ramiro Lugo.

Fecha : 29-06-2024.
Estado del tiempo : Lluvioso.

Desarrollo de Actividades.
- No se labora por mal estado del tiempo.

Supervisor de obra : Ramiro Lugo.

Fecha : 1/7/2024.
Estado del tiempo : Soleado

Desarrollo de Actividades.
- Suministro y colocación de concreto 3000 PSI espesor 15 cm para placa huella Km0+045- Km0+060.

Maquinaria y Equipo: Mezcladora, herramientas menores.
Personal en obra : Maestro, Ayudantes.

Supervisor de obra : Ramiro Lugo.

Powered by CamScanner

Fecha ¥ 2/7/2024
Estado del tiempo ¥ Soleado.
Desarrollo de Actividades
¥ Adecuación de terreno para Fundida

Maquinaria ¥ Equipo ¥ Herramientas menores.
Personal en obra ¥ oficial, Ayudantes.

Supervisor de obra ¥ Ramiro lugo

Fecha ¥ 3/7/2024
Estado del tiempo ¥ Soleado.
Desarrollo de Actividades.
¥ Instacion piedra pegada proporcion 60% concreto
40% piedra Ko+045 - Ko+060.

Maquinaria ¥ Equipo ¥ MEzcladora, Herramientas menores
Personal en obra ¥ maestro, Ayudante de obra.

Supervisor de obra ¥ Ramiro lugo.

Fecha ¥ 4/7/2024.
Estado del tiempo ¥ Soleado
Desarrollo de Actividad
¥ Suministro y colocacion de concreto 3000 (PSI)
espesor 15 cm para Placha huella Ko+060 - Ko+075

Maquinaria ¥ Equipo ¥ Mezcladora, Herramientas menores
personal en obra ¥ maestro, Ayudantes

Supervisor de obra ¥ Ramiro lugo.

Powered by CamScanner

Fecha ¥ 5/7/2024
Estado del tiempo ¥ soleado
Desarrollo de Actividad.
¥ Adecuación de terreno para fundida.

Maquinaria y Equipo ¥ Herramientas menores.
Personal en obra ¥ Maestro, Ayudantes de obra.
Supervisor de obra ¥ Ramiro Lugo

Fecha ¥ 6/7/2024
Estado del tiempo ¥ lluvioso.
Desarrollo de Actividades
¥ No se Laboró

Supervisor de obra ¥ Ramiro Lugo.

Fecha ¥ 8/7/2024
Estado del tiempo ¥ Soleado

Desarrollo de Actividades.
¥ Instalación piedra pegada proporción 60% concreto
40% piedra Acotado - Acotado

Maquinaria y Equipo. ¥ Mezcladora, Herramientas menores.
personal en obra ¥ maestro, Ayudantes.

Supervisor de obra ¥ Ramiro Lugo

Fecha ¥ 9/7/2024
Estado del tiempo ¥ lluvioso
Desarrollo de Actividades
¥ No se laboro

Supervisor de obra ¥ Ramiro Lugo

Powered by CamScanner

Fecha ¥ 10/7/2024
Estado del tiempo ¥ Soleado

Desarrollo de Actividades.
¥ Suministro y colocación de concreto 3000 (psi) espesor 15 cm para placa huella Ko+075 - Ko+090

Maquinaria y Equipo. ¥ Mezcladora, Herramientas menores.
personal en obra ¥ Maestro, Herramientas menores

Supervisor de obra ¥ Ramiro Lugo.

Fecha ¥ 11/7/2024.
Estado del tiempo ¥ Soleado
Desarrollo de Actividades.
¥ Instalación piedra pegada proporción concreto 3000 psi 60%, piedra 40%. para placa huella Ko+075- Ko+090

Maquinaria y Equipo¥ Mezcladora, Herramientas menores.
personal en obra ¥ Maestro, Ayudante de obra

Supervisor de obra ¥ Ramiro Lugo

Powered by CamScanner

Fecha ¥ 12/7/2024
Estado del tiempo ¥ Soleado

Desarrollo de Actividades
¥ Suministro y colocación de concreto 3000 PSI
espesor placa 15 cm, K0+090 - K0+105

Maquinaria y Equipo ¥ Mezcladora, Herramientas menores
Personal en obra ¥ maestro, oficiales, Ayudantes.

Supervisor de obra ¥ Ramiro Lugo

Fecha ¥ 13/7/2024
Estado del tiempo ¥ Nublado

Desarrollo de Actividades
¥ Suministro y colocación de concreto 3000 PSI
espesor 15 cm para placa huella K0+105 - K0+120

Maquinaria y Equipo ¥ Herramientas menores
mezcladora.
Supervisor de obra ¥ Ramiro Lugo

Fecha ¥ 15/7/2024
Estado del tiempo ¥ Soleado.
Desarrollo de Actividades.
¥ Instalación Piedra pegada Proporción 60%
concreto 3000 PSI, Piedra 40%
K0+040 - K0+105

Maquinaria y Equipo ¥ mezcladora, Herramientas
menores

Supervisor de obra ¥ Ramiro Lugo

Powered by CamScanner

Fecha : 16/7/2024
Estado del tiempo : Soleado

Desarrollo de Actividades
- Instalación piedra pegada proporción 60%. Concreto 3000 PSI, Piedra 40% Km0+105 - Km0+120

Maquinaria y Equipo : mezcladora, Herramientas menores.
Personal en obra : maestro, Ayudantes

Supervisor de obra : Ramiro Lugo

Fecha : 17/7/2024
Estado del tiempo : Soleado.
Desarrollo de Actividades.
- Suministro y colocación Concreto 3000 PSI espesor 15 cm para Placa huella Km0+120 - km0+130
- Suministro y colocación concreto 3000 PSI para bordillos Km0+000 - Km0+040

Maquinaria y equipo : mezcladora, Herramientas menores.
Personal en obra : maestro, Ayudantes.

Supervisor de obra : Ramiro Lugo

Powered by CamScanner

Fecha ¥ 18/7/2024
Estado del tiempo ¥ Soleado
Desarrollo de Actividades
¥ Instalación piedra pegada Proporcion concreto 60%, Piedra 40% Ko+120 - Ko+130
¥ Suministro y colocación concreto 3000 PSI para bordillos ko+040 - ko+085

Maquinaria y Equipos. ¥ Mezcladora, Herramientas menores.
Personal en obra ¥ maestro, Ayudante de obra

Supervisor de obra ¥ Ramiro Lugo.

Fecha ¥ 22/7/2024.
Estado del tiempo ¥ Soleado
Desarrollo de Actividades.
¥ Suministro y colocación de concreto para bordillo de 3000 PSI. ko+085 - ko+130.

Maquinaria y Equipo ¥ mezcladora, Herramientas menores.
personal en obra ¥ maestro, Ayudantes de obra

Supervisor de obra ¥ Ramiro Lugo.

Powered by CamScanner

4. CONVENIO SOLIDARIO N°3756 DE 2023 JAC VEREDA BAJO DE PIEDRA

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

4.1.1. Localización.

El municipio de Chinú se encuentra ubicado en el nororiente del departamento de Córdoba. Tiene una superficie total de 624 kilómetros cuadrados, de los cuales solo 597 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Vereda Bajo de Piedra, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en el Km 1+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia la Vereda Bajo de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Córdoba INVIAS.

El Municipio de Chinu se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 9° 06' 00" Norte
Longitud: 75° 24' 00" Oeste:

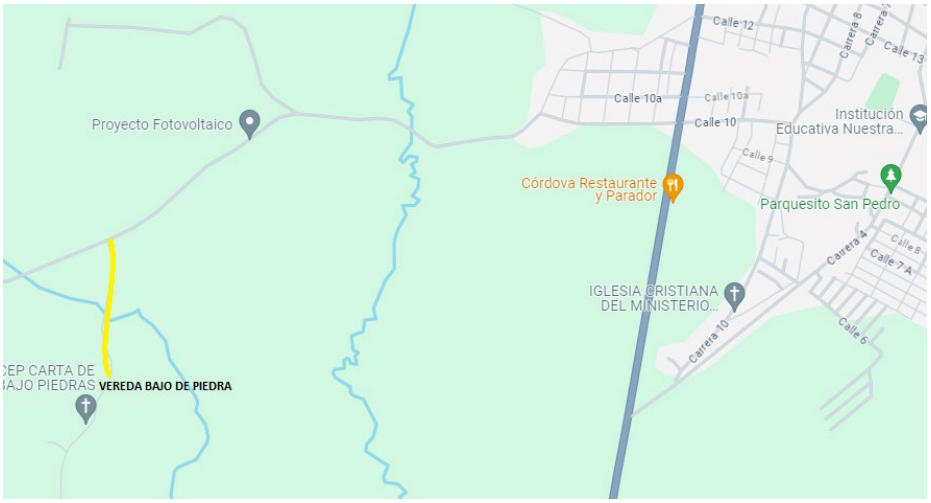


Ilustración 3. Localización de la obra del convenio 3756 de 2023 - JAC Bajo de Piedra

4.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Con la ejecución del proyecto, la población de las veredas ubicadas sobre la vía en Vereda BAJO DE PIEDRA; allí se encuentran principalmente actividades economías primaria representados cultivos transitorios como lo son: Yuca, Ñame, Maíz, entre otros. Lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al municipio de Chinu.

4.1.3. Inventario y Estado Inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 140 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material, adicionalmente se presenta obras de arte que requieren una intervención.

	
PR: 0+000 hasta el PR 0+ 203: Foto inicia (Visita técnica inicial INVIAS 31/05/2023)	PR: 0+000 hasta el PR 0+ 203: Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS 31/05/2023)

4.1.4. Características técnicas del proyecto.

Según el Acta definitiva de Estudios y Diseños, suscrita el 30 de abril de 2024, para presente Convenio Solidario, se tiene que:

- **Diseño geométrico:**

Según el Diseño Geométrico aprobado, las características de la Placa Huella serían las siguientes:

Según el Diseño Geométrico aprobado, las características de la Placa Huella serían las siguientes:

- Ancho de calzada: 5m
- Número de carriles: 2
- Ancho de carril: 1.8m
- Sobreancho: 0m
- Sentido del tráfico: Doble sentido
- Cuneta y Bordillo: 0.7m
- Huella: 0.90m Ciclópeo 0.90m
- Sobreancho Placa Huella 0.45m

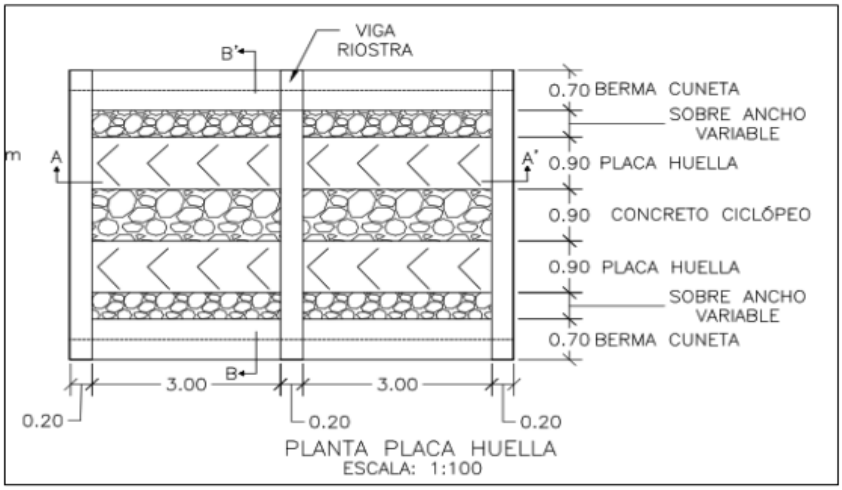



Imagen 5. Planta Placa Huella

Fuente: Vol I. Diseño Geométrico

- **Diseño Geotécnico:**

- Tipo de Suelo (SM), (CM) y (GM)
- CBR del terreno 2.27

Según el informe geotécnico se evidenció una capacidad portante del terreno menor al 3%, la cual es la mínima permitida para realizar la carpeta de mejoramiento con placa huella. Por tal motivo, el especialista geotécnico consideró que es necesario realizar un reemplazo de material seleccionado a lo largo del tramo, con un espesor al 10 cm. La estructura propuesta fue la siguiente:

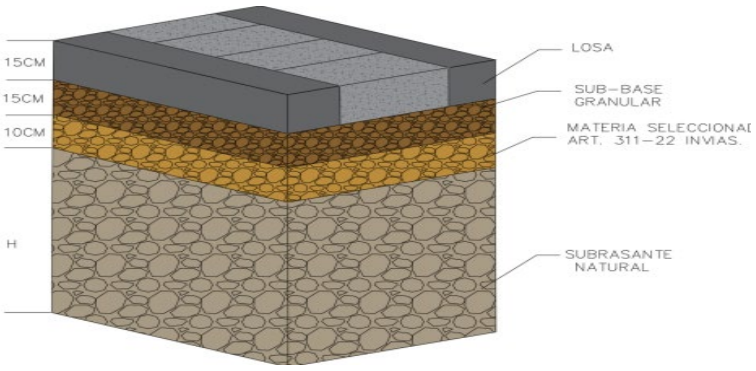

Fuente: Vol I. Diseño Geotécnico

- **Informe Hidrológico e Hidráulico:**

El Informe Hidráulico / Hidrológico, no arrojó la necesidad de construirse obras de arte en la zona, se tuvo una consideración de descargue de las escorrentías en caso de que los tramos viales fuesen mayor a 300 mts de longitud.

- **Diseño de transito**

Según el estudio de tránsito arrojo que, en el tiempo aforado, se evidenció circulación de vehículos de categoría C3, por lo tanto, la estructura se evaluó teniendo en cuenta los criterios con este vehículo de diseño.

En ese orden, se propuso que, basados en las memorias de cálculo del presupuesto inicial, la separación de las barras #3 (3/8”), era @0.20 m, esto se da en condiciones donde el tránsito de vehículos de categoría es menor que C3. Por tal motivo, se hizo un reajuste a estas separaciones, realizándolas a @0.15m, lo cual implicaría una mayor utilización de acero.

- **Alcance real.**

En ese orden de ideas, el alcance definitivo según los Estudios y Diseños realizados, y el balance de obra, se tiene lo siguiente:

MEJORAMIENTO VIAL	
PLACA HUELLA (m)	Box Coulvert 1X1 (UND)
130	N.A

4.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

4.2.1. Información General de Convenio

CONVENIO SOLIDARIO	3756 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	05/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CHINU - CÓRDOBA
NIT:	901.374.481-2
VALOR INICIAL	$ 196.855.717
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 196.855.717
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-027533 de fecha 12/12/2023
FECHA DE INICIO	12/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	N.A
REANUDACIÓN No. 1	N.A
PRÓRROGA No. 1	29/12/2023
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
PRÓRROGA No. 3	13/06/2024
PRÓRROGA No. 3	31/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 31/08/2024

4.2.2. Descripción de actividades.

- El 18 de julio de 2024, se realizó el comité operativo N°4 del convenio solidario, donde se realizó la revisión, socialización y aprobación de:

- Autorización de pago de nómina de trabajadores $7.984.000 por un valor de $11.821.067, pago seguridad social por $ 3.207.400 y devolución en la Retención por valor de $1.377.000.

- Pago del 30% de materiales restante a la empresa AURORA NOVA S.A.S, por un valor de: $32.869.864.

- Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades en obra, en donde a fecha del presente informe, el avance en obra fue del 100,00%:

- Mejoramiento de subrasante y conformación de calzada.

- Figuración de acero para vigas riostras y acero longitudinal y transversal en parrilla para huellas de concreto.

- Vaciado de placa de concreto de 3000 psi y concreto ciclópeo desde el PR0+000 al PR0+0130 en ambos carriles.

- Vaciado de cunetas y bordillos desde el PR0+000 al PR0+0130 en ambos carriles.

➢ En ese orden de ideas, el Convenio Solidario, finalizó su etapa de ejecución de obra, lo cual represente un avance físico del 100,0%. Dado lo anterior, para próximo periodo se inicia con la liquidación.

4.2.3. Seguimiento Items No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

4.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Dado a la terminación de las actividades de obra, la Interventoría acompañara a la liquidación y cierre del Convenio Solidario, desde las áreas Social, Ambiental y Administrativa.

Así mismo, se efectuarán los comités operativos dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentarán comparativos acompañados de cotizaciones y se realizará la evaluación correspondiente costo/beneficio para todo lo correspondiente a la liquidación del Convenio Solidario.

4.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

4.3.1. Informes Semanales.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento de los informes semanales, así:

- Informe Semanal 23: desde el 28 de junio al 04 de julio de 2024.
- Informe Semanal 24: desde el 05 al 11 de julio de 2024.
- Informe Semanal 25: desde el 12 al 18 de julio de 2024.

- Informe Semanal 26: desde el 19 al 25 de julio de 2024.
- Informe Semanal 27: desde el 26 de julio al 01 de agosto de 2024.

Se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

4.3.2. Maquinaria y Equipo.

Se adjunta MEPI “MAQUINARIA Y EQUIPO”, con la relación de Maquinaria y Equipo utilizado durante el presente periodo.

4.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Durante el presente periodo, la JAC presentó cuentas de cobros de profesionales y de mano de obra no calificada.

Por lo anterior, se anexa el formato de “PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL”, con la relación de personal.

4.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3756 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: “EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023”, por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 156623 de fecha 2023-08-30. Se hizo el registro presupuestal por valor $ 195.855.717.00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02.
Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato “PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS”.

Se anexa el formato “INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS”.

Se anexa el formato “ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS”.

4.3.5. Estado general del tiempo

Se anexa formato “ESTADO GENERAL DEL TIEMPO”, con la relación diaria de lluvias, desde el inicio de actividades del proyecto.

4.3.6. Resumen ensayos de laboratorios

Durante el mes de julio de 2024, la JAC no presentó los resultados de los ensayos de laboratorio. Se espera que para el próximo periodo se entregue la documentación por parte de la JAC.

No se anexa el formato “RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO”

4.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes:

Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 3018776 certificado No. 0 de fecha 23/10/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1012635 certificado No. 0 de fecha 23/10/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 39.371.143,40	05/10/2023	31/10/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 59.056.715,10	31/12/2023	31/12/2028
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.842.786,00	05/10/2023	31/12/2026
TOTAL		**$ 108.270.644,50**		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	25/09/2023	31/12/2023

En relación a las pólizas correspondientes a la prórroga N°1: Póliza de cumplimiento No. 3018776, certificado No. 3 de fecha 12/04/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1012635 certificado No. 2 de fecha 12/04/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 39.371.143,40	12/12/2023	28/02/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 59.056.715,10	31/12/2023	31/12/2028
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.842.786,00	12/12/2023	30/04/2027
TOTAL		**$ 108.270.644,50**		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	25/09/2023	31/12/2023

Se anexa el formato “SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS”

4.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

4.3.9. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta que, a la fecha del presente informe el Convenio Solidario, alcanzo con su meta física, no se cuenta con una programación de obra para la prórroga N°4, dado que todas las actividades van a ir enfocadas a la liquidación y cierre del convenio, desde el área administrativa, financiera, social, ambiental y contable.

ALCANCE FISICO P.H	EJECUTADO P.H	**AVANCE %**
130 M	130 M	**100,00%**

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: “El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC”.

- Actas comités de obra y reuniones: durante el presente periodo se realizó EL comité de obra N°4.

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
18/07/2024	Comité Operativo N°4	Se revisaron y aprobaron rubros para los pagos del 30% de materiales restante, pago de mano de obra no calificada y honorarios residente de obra.

CONVENIO SOLIDARIO N°3756 DE 2023

JAC VEREDA BAJO DE PIEDRA

INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 23 del 28 al 4 — Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO CASTRO GARZON

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 130 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Vereda Bajo de Piedra, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en el Km 1+200 de la vía Chinú --Sahagún, la entrada hacia la Vereda Bajo de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Córdoba INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA		
CONVENIO No.	3756-2023	VALOR INICIAL:	$ 196,855,717.00
FECHA DE INICIO:	12-dic-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 196,855,717.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-jul-24		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.		
INTEGRANTES:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.		
CONTRATO No.	5081 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 205,455,880.00
FECHA DE INICIO:	5-oct-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 205,455,880.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-jul-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,855,717			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,855,717			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 205,455,880			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 205,455,880			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 195,855,717.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 127,306,216.05	65.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 80,071,655.00	40.88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (47,234,561.05)	-24.12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 25,664,670.00	13.10%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 127,306,216.05	65.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 105,736,325.00	53.99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (21,569,891.05)	-11.0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12,000,000.00	6.1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5,000,000.00	2.6%

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario, compra de materiales y alquiler de maquinaria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184,910,292.00	90.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179,878,782.00	87.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,109,117.60	2.22%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,878,782.00	2.71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: JUNIO

VALOR FACTURA: $ 54,112,870.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En trámite Acta N°6 junio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 53% — Avance o Atraso Físico %: 14.0%
Meta Física Ejecutada %: 39%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELA	M	130
*	BOX CULVERT	Unidad	N/A
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	53%				53.0%
Ejec	39%				39.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Minicargador	1	1
Vibrador de Concreto	1	1
Mezlcadora de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Bajo de Piedra — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Emiro de Jesus Perez Zapata 2.9 Km de la via que conduce e Corozal a Sincelejo, a 560 metros del Peaje Las Flores, a la margen izquiera, Departamento de Sucre	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Ninguna

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

En el convenio se realizò la reutilizaciòn del material en el mejoramiento de tramos para el paso de volquetas, no se cuenta con permisos ambientales debido a que es un contrato de baja complejidad, en cuanto al consumo de agua, se hace por medio de reservorios artificiales que no

P.G.A. (PLAN DE GESTION AMBIENTAL)

ESTADO: Este se encuentra aprobado por la Interventoria

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades de fundida de placas en concreto y concreto ciclopeo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades en concreto.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	PR0 +000	Box 1x1		Box 1x1	PR0+130
Programado					
Ejecutado					

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 24 del 5 al 11 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO CASTRO GARZON

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 130 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Vereda Bajo de Piedra, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en el Km 1+200 de la vía Chinú --Sahagún, la entrada hacia la Vereda Bajo de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Córdoba INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA		
CONVENIO No.	3756-2023	VALOR INICIAL:	$ 196,855,717.00
FECHA DE INICIO:	12-dic-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 196,855,717.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-jul-24		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.		
INTEGRANTES:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.		
CONTRATO No.	5081 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 205,455,880.00
FECHA DE INICIO:	5-oct-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 205,455,880.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-jul-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,855,717			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,855,717			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 205,455,880			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 205,455,880			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 195,855,717.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 137,099,001.90	70.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 91,571,655.00	46.75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (45,527,346.90)	-23.25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 25,664,670.00	13.1%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 137,099,001.90	70.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111,508,849.00	56.9%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (25,590,152.90)	-13.1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,166,600.03	6.7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11,500,000.00	5.9%

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario, compra de materiales y alquiler de maquinaria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 191,073,968.40	93.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 185,378,782.00	90.23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,163,676.40	3.0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5,500,000.00	3.0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: JUNIO

VALOR FACTURA: $ 54,112,870.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En trámite Acta N°6 junio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 64% — Avance o Atraso Físico %: 14.0%

Meta Física Ejecutada %: 50%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELA	M	130
*	BOX CULVERT	Unidad	N/A
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	64%				64.0%
Ejec	50%				50.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Minicargador	1	1
Vibrador de Concreto	1	1
Mezlcadora de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Bajo de Piedra

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Emiro de Jesus Perez Zapata 2.9 Km de la via que conduce e Corozal a Sincelejo, a 560 metros del Peaje Las Flores, a la margen izquiera, Departamento de Sucre	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Ninguna

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

En el convenio se realizò la reutilizaciòn del material en el mejoramiento de tramos para el paso de volquetas, no se cuenta con permisos ambientales debido a que es un contrato de baja complejidad, en cuanto al consumo de agua, se hace por medio de reservorios artificiales que no se encuentran conectados a fuentes hidricas y el personal utiliza las USF de las viviendas aledañas al proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Este se encuentra aprobado por la Interventoria

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Vaciado de placas de concreto, vigas y riostras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Vaciado de placas de concreto.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	PR0 +000	Box 1x1		Box 1x1	PR0+130
Programado					
Ejecutado					

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 25 del 12 al 18 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO CASTRO GARZON

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 130 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Vereda Bajo de Piedra, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en el Km 1+200 de la vía Chinú --Sahagún, la entrada hacia la Vereda Bajo de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Córdoba INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA		
CONVENIO No.	3756-2023	VALOR INICIAL:	$ 196,855,717.00
FECHA DE INICIO:	12-dic-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 196,855,717.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-jul-24		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.		
INTEGRANTES:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.		
CONTRATO No.	5081 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 205,455,880.00
FECHA DE INICIO:	5-oct-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 205,455,880.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-jul-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,855,717			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,855,717			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 205,455,880			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 205,455,880			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 195,855,717.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 156,684,573.60	80.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 140,063,249.00	71.51%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (16,621,324.60)	-8.49%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 25,664,670.00	13.1%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 156,684,573.60	80.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111,508,849.00	56.93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (45,175,724.60)	-23.1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ (28,399,078.97)	-14.5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 48,491,594.00	24.8%

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario, compra de materiales y alquiler de maquinaria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 195,183,086.00	95.0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 191,878,782.00	93.4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,272,794.00	5.0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,500,000.00	3.4%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: JUNIO

VALOR FACTURA: $ 54,112,870.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En trámite Acta N°6 junio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 75% — Avance o Atraso Físico %: 15%
Meta Física Ejecutada %: 60%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELA	M	130
*	BOX CULVERT	Unidad	N/A
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	75%				75.0%
Ejec	60%				60.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Minicargador	1	1
Vibrador de Concreto	1	1
Mezlcadora de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Bajo de Piedra — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Emiro de Jesus Perez Zapata 2.9 Km de la via que conduce e Corozal a Sincelejo, a 560 metros del Peaje Las Flores, a la margen izquiera, Departamento de Sucre	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Compra de materiales Aurora NOVA S.A.S.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

En el convenio se realizó la reutilización del material en el mejoramiento de tramos para el paso de volquetas, no se cuenta con permisos ambientales debido a que es un contrato de baja complejidad, en cuanto al consumo de agua, se hace por medio de reservorios artificiales que no se encuentran conectados a fuentes hidricas y el personal utiliza las USF de las viviendas aledañas al proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Este se encuentra aprobado por la Interventoria

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se han fundido 65m de calzada.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de vaceado de placas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	PR0 +000	Box 1x1		Box 1x1	PR0+130
Programado					
Ejecutado					

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA | SEMANA No.: 26 del 19 al 25 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO CASTRO GARZON

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 130 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Vereda Bajo de Piedra, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en el Km 1+200 de la vía Chinú --Sahagún, la entrada hacia la Vereda Bajo de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Córdoba INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA		
CONVENIO No.	3756-2023	VALOR INICIAL:	$ 196,855,717.00
FECHA DE INICIO:	12-dic-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 196,855,717.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-jul-24		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.		
INTEGRANTES:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.		
CONTRATO No.	5081 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 205,455,880.00
FECHA DE INICIO:	5-oct-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 205,455,880.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-jul-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,855,717			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,855,717			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 205,455,880			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 205,455,880			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 195,855,717.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 166,477,359.45	85.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 154,563,249.00	78.92%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11,914,110.45)	-6.08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 25,664,670.00	13.1%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 166,477,359.45	85.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111,508,849.00	56.9%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (54,968,510.45)	-28.1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ (24,305,694.48)	-12.4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14,500,000.00	7.4%

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario, compra de materiales y alquiler de maquinaria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199,292,203.60	97.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199,078,782.00	96.90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8,218,235.20	4.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,200,000.00	3.62%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: JUNIO

VALOR FACTURA: $ 54,112,870.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En trámite Acta N°6 junio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 75.00% | Avance o Atraso Físico %: 5.00%
Meta Física Ejecutada %: 70.00%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELA	M	130
*	BOX CULVERT	Unidad	N/A
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	75%				75.0%
Ejec	70%				70.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Minicargador	1	1
Vibrador de Concreto	1	1
Mezlcadora de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Bajo de Piedra | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Emiro de Jesus Perez Zapata 2.9 Km de la via que conduce e Corozal a Sincelejo, a 560 metros del Peaje Las Flores, a la margen izquiera, Departamento de Sucre	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Ninguna

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

En el convenio se realizò la reutilizaciòn del material en el mejoramiento de tramos para el paso de volquetas, no se cuenta con permisos ambientales debido a que es un contrato de baja complejidad, en cuanto al consumo de agua, se hace por medio de reservorios artificiales que no se encuentran conectados a fuentes hidricas y el personal utiliza las USF de las viviendas aledañas al proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Este se encuentra aprobado por la Interventoria

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Bajo de Piedra - SAU

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se han fundido 73m de calzada.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de vaceado de placas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	PR0 +000	Box 1x1		Box 1x1	PR0+130
Programado					
Ejecutado					

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA | SEMANA No.: 27 del 26 al 1 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO CASTRO GARZON

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 130 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinú del departamento de Córdoba, en la Vereda Bajo de Piedra, tomando como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de Chinú, en dirección a Las Tablitas, en el Km 1+200 de la vía Chinú –Sahagún, la entrada hacia la Vereda Bajo de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Córdoba INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella, dos (2) obras de drenaje tipo Box Coulvert con medidas de 1 m x 1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA		
CONVENIO No.	3756-2023	VALOR INICIAL:	$ 196,855,717.00
FECHA DE INICIO:	12-dic-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 196,855,717.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ago-24		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.		
INTEGRANTES:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.		
CONTRATO No.	5081 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 205,455,880.00
FECHA DE INICIO:	5-oct-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 205,455,880.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ago-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,855,717			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,855,717			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 205,455,880			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 205,455,880			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	195,855,717.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	186,062,931.15	95.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	146,571,655.00	74.84%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(39,491,276.15)	-20.16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	25,664,670.00	13.1%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	186,062,931.15	95.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	111,508,849.00	56.9%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(74,554,082.15)	-38.1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	(5,483,960.08)	-2.8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	16,500,000.00	8.4%

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario, compra de materiales y alquiler de maquinaria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	203,401,321.20	99.0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	197,078,782.00	95.9%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,109,117.60	2.0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	5,200,000.00	2.64%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: JUNIO

VALOR FACTURA: $ 54,112,870.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En trámite Acta N°6 junio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 75% | Avance o Atraso Físico %: 5.0%

Meta Física Ejecutada %: 70%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELA	M	130
*	BOX CULVERT	Unidad	N/A
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	75%				75.0%
Ejec	70%				70.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Minicargador	1	1
Vibrador de Concreto	1	1
Mezlcadora de concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Bajo de Piedra | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Emiro de Jesus Perez Zapata 2.9 Km de la via que conduce e Corozal a Sincelejo, a 560 metros del Peaje Las Flores, a la margen izquiera, Departamento de Sucre	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Compra de materiales Aurora NOVA S.A.S.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

En el convenio se realizó la reutilizaciòn del material en el mejoramiento de tramos para el paso de volquetas, no se cuenta con permisos ambientales debido a que es un contrato de baja complejidad, en cuanto al consumo de agua, se hace por medio de reservorios artificiales que no se encuentran conectados a fuentes hidricas y el personal utiliza las USF de las viviendas aledañas al proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Este se encuentra aprobado por la Interventoria

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Bajo de Piedra - SAU

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se solicito prorroga N°4 hasta el 31 de agosto de 2024. Actividades en concreto. Se han fundido 75m de calzada.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades en concreto.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	PR0 +000	Box 1x1		Box 1x1	PR0+130
Programado					
Ejecutado					

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MAQUINARIA Y EQUIPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3521-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA FE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081-2022

INTERVENTORÍA: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Mini cargador	CAT 236D3		Corregimiento Santa Fe	X		X	X	X	X		X		X		X		X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Mezcladora de concreto		1000 L	Corregimiento Santa Fe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Volqueta		15 M3	Corregimiento Santa Fe	X		X	X		X		X		X	X			X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	
Vibrador de concreto			Corregimiento Santa Fe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	4	2	4	4	3	4	2	4	2	4	3	3	2	4	4	2	4	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	3	4	2
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100	100,0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	18	100,0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

DESDE EL 22 DE MAYO INICIARON LAS ACTIVIDADES MOVIMIENO DE TIERRAS.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: OSCAR ALBERTO BULA ESPINOSA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-36827 COR

Firma

Nombre: SAIR SAMIR MENDOZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0615477 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

- ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO
- INFORME INVERSIÓN MANEJO DESEMBOLSO
- PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** jul-24

ACTA FINAL ☐

CONVENIO No : 3756-2023 (Indique número y año)

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DEBAJO DE PIEDRA. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5081-2023 INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LIMITADA

PLAZO INICIAL: 0.33 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 8,77 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 12/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 196.855.717,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 196.855.717,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1			Desmonte y lipieza de zonas no boscosas	Ha	0,4	131.137,50	$ 52.455,00						
2	600.1.1	600-13	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,59	$ 21.819,00	$ 100.149,00						
3	320.3	320-13	Subbase Granular Clase C	M3	117,81	$ 105.422,80	$ 12.419.860,00						
4	630.1.4.1	630-13	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	82,52	$ 770.780,70	$ 63.604.823,00						
5	630.1.7	630-13	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	36,35	$ 327.442,20	$ 11.502.924,00						
6	640.1	640-13	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3815,5	$ 7.474,00	$ 28.517.047,00						
7	600.1.1	600-13	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	70,20	$ 21.819,00	$ 1.531.694,00						
8	610.1	630-13	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	14,04	$ 94.760,50	$ 1.330.437,00						
9	630.1.4.1	640-13	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	18,04	$ 770.780,70	$ 13.904.884,00						
10	630.1.6	600-13	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	1,62	$ 459.091,80	$ 743.729,00						
11	640.1	600-13	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	1279,62	$ 7.474,00	$ 9.563.880,00						
ÍTEM NO PREVISTOS													
			SUB-TOTAL BASICO DE OBRA				$ 143.671.482,00						
*			**PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)**				$ 4.310.144,00						
*			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**				$ 47.874.091,00						
*			**APORTE OAC**				$ 1.000.000,00						
*			**VALOR TOTAL**				$ 196.855.717,00						

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUB-TOTAL BASICO DE OBRA	$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

VALOR PRESENTE ACTA: $ - **VALOR EN LETRAS:** CERO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ.
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: JESUS ANTONIO BARBOZA BRACAMONTE.
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No: 081037-0563783 COR

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No: 2520262095 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1

FECHA 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3756-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5081-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

JUSTIFICACIÓN:
N.A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 FEBRERO	VR. MES 2 MARZO	VR. MES 3 ABRIL	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ -	$ 5.992.102,44	$ 11.984.204,87		$ 17.976.307,31	9,13%
2	MATERIALES	$ -	$ 28.079.546,05	$ 56.159.092,09		$ 84.238.638,14	42,79%
3	TRANSPORTE	$ -	$ 7.677.372,96	$ 15.354.745,93		$ 23.032.118,89	11,70%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ 6.009.244,34	$ 12.018.488,68		$ 18.027.733,02	9,21%
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ 1.436.714,67	$ 2.873.429,33		$ 4.310.144,00	2,19%
6	GASTOS ADMINSTRATIVOS	$ -	$ 15.958.030,33	$ 31.916.060,67		$ 47.874.091,00	24,32%
7	APORTE OAC			$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	0,51%
	TOTAL					**$ 196.855.717,00**	**100,00%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Firma:
Nombre: JESÚS ANTONIO BARBOZA BRACAMONTE
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 081037-0563783 COR

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3756-2023
(Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 550082804 **BANCO** AV VILLAS SUCURSAL: MONTERIA

DESEMBOLSO OTORGADO: 55,71%

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 109.107.536,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA BAJO DE PIEDRA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5081-2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Cuenta de cobro		1-mar-24	KATIA MILENA RAMOS DORIA	$ 6.500.000,00	6	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños
Cuenta de cobro		1-mar-24	AURA SUSANA MEZQUIDA DÍAZ	$ 1.591.084,00	6	Póliza Incial
Cuenta de cobro		18-mar-24	RUTH BELEN JAIME GARCÍA	$ 953.000,00	6	Medidas Ambientales
Cuenta de cobro		18-mar-24	RUTH BELEN JAIME GARCÍA	$ 2.293.885,00	6	Seguridad Industrial y Dotación
Cuenta de cobro		18-mar-24	AMPARO LUCIA ALCALA	$ 518.400,00	6	Exámenes de ingreso personal nómina
Cuenta de cobro		18-mar-24	LUZ ELENA SERPA MARTINEZ	$ 340.000,00	6	Valla 1x2
Cuenta de cobro		8-abr-24	SALOMON ISAAC ALMANZA	$ 280.000,00	6	Transporte dignatario
Cuenta de cobro		8-abr-24	LIANNETTE DEL CARMEN CORRALES ARIZA	$ 2.100.000,00	6	Honorario Contadora
Cuenta de cobro		8-abr-24	JESUS BARBOSA BRACAMONTE	$ 3.250.000,00	6	Prirmer pago Residente de obra
Cuenta de cobro		8-abr-24	JAC BAJO DE PIEDRA	$ 309.804,00	6	Actualización Póliza
Cuenta de cobro		10-may-24	AURORA NOVA SAS	$ 75.525.451,00	2	Compra 70% de materiales
Cuenta de cobro		10-may-24	AURORA NOVA SAS	$ 14.546.204,00	1	Alqulier de Maquinaria
Cuenta de cobro		10-may-24	MIRLETH MILENA OLIVERO SALCEDO	$ 600.000,00	6	Alquier de bodega
Cuenta de cobro		10-may-24	JESUS BARBOSA BRACAMONTE	$ 300.000,00	6	Caja menor
Cuenta de cobro		17-jul-24	LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ	$ 12.568.800,00	4	Pago mano de obra
Cuenta de cobro		17-jul-24	JESUS BARBOSA BRACAMONTE	$ 3.750.000,00	6	Segundo pago Residente de obra
Cuenta de cobro		17-jul-24	AURORA NOVA SAS	$ 32.172.794,00	2	Compra 30% de materiales

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 47.874.091,00	$ 19.036.173,00	$ 3.750.000,00	$ 22.786.173,00	$ 25.087.918,00
1_2_4	EQUIPOS_MATERIALES_ MANO DE OBRA	$ 143.671.482,00	$ 90.071.655,00	$ 44.741.594,00	$ 134.813.249,00	$ 8.858.233,00
	TOTALES	$ 191.545.573,00	$ 109.107.828,00	$ 48.491.594,00	$ 157.599.422,00	$ 33.946.151,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (6) : JULIO 2024 $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

SE SOLICITO A LA JAC, CONTACTARSE CON LA ENTIDAD BANCARIA, PARA HACER LA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DIRECCION DEL TESORO PUBLICO. A LA FECHA DEL INFORME SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DICHA GESTIÓN.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre: LUIS ENRRIQUE POLO RODRIGUEZ.
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO A GARANTÍAS Y SEGURO CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONVENIO No. 3756-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 12/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 196.855.717,00

VALOR ACUMULADO: $ 196.855.717,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LIMITADA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 39.371.143	5 / 10 / 2023	31 / 10 / 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.842.786	5 / 10 / 2023	31 / 10 / 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.056.715	31 / 12 / 2023	31 / 10 / 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3018776

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	171.79 SMLV	$ 232.000.000,00	25 / 9 / 2023	31 / 9 / 2023
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1012633 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.371.143,40	12	12	2023	28	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.842.785,85	31	12	2023	30	12	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.056.715,10	31	12	2023	30	4	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 318776

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVIOSRA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	171.79 SMLV	$ 232.000.000,00	1	1	2024	30	4	2024
Otros	N/A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1012629 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/04/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGI **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONVENIO No: 3756-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LIMITADA.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	X			X	X	X	X				X			X	X			X	X		X		X		X	X	X	X		X	X	18
Lluvias moderadas		X	X							X		X	X				X			X				X					X			9
Lluvias intensas								X	X							X						X										4
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se han presentado lluvias en dias continuos a lo largo del mes en la zona de ejecucion de la obra y sus alrrededores.

Firma
Nombre: JESUS BARBOSA BRACAMONTE.
Residente de Obra
Matrícula Profesional No: 081037-0563783 COR

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS.
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CÓMITE OPERATIVO N°4
18 DE JULIO DE 2024

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 004	Dirección Territorial INVIAS:	Fecha: julio 18 de 2024

Vereda Bajo de Piedra – Municipio Chinú- Departamento: Córdoba
No. Convenio(s) Solidario(s): 3756-2023 INVIAS – JAC Vereda Bajo de Piedra
Ejecutor(es): Junta Acción Comunal Vereda Bajo de Piedra

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Luis Enrique Polo Rodríguez	J. A. C. Vereda Bajo de Piedra	Presidente y Representante Legal
Miguel Simón Madera	J. A. C. Vereda Bajo de Piedra	Tesorero
Javier Barrero Mossos	Sociedad Técnica SOTA LTDA	Interventor
Oscar Bula Espinosa	Sociedad Técnica SOTA LTDA	Interventor
José Manuel Madera Díaz	Comité de Participación ciudadana Vereda Bajo de Piedra	Representante

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Pago de mano del personal en obra: un (1) mes de mano de obra no calificada (Incluye SS) e Ingeniero Residente, y Maestro de Obra.
2. Pago del 30% de materiales restante a la empresa AURORA NOVA S.A.S
3. probación para la devolución del valor de las retenciones generadas.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Aprobación para pagar mano de obra no calcificada, seguridad social e Ingeniero Residente
2- Aprobación para pagar el 30% de materiales restante.
3- Aprobación para la devolución del valor de las retenciones generadas.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron el presidente de la JAC Bajo de Piedra, Tesorero JAC Bajo de Piedra, Contador de la JAC, Ingeniero Residente, Representante del Comité de Participación Ciudadana Bajo de Piedra e Interventor.
2.	• Autorización de pago de nómina de trabajadores por un valor de $7.984.400, pago seguridad social por $ 3.207.400 y devolución en la Retención por valor de $1.377.000
3.	• Autorización de pago para el 30% de materiales restante del proyecto, las cotizaciones de los siguientes proveedores son: - M CONSTRUCCIONES SAS por un valor de $34.686.760 Incluye IVA,. - **AURORA NOVA SAS por un valor de $32.869.864 Incluye IVA.** - IBIZA CONSTRUCCIONES por un valor de $34.417.820 Incluye IVA,.
4.	• Autorización de pago para un mes de Ingeniero Residente por un valor de $3.750.000

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
	En el Comité Operativo, se determina escoger la propuesta de la empresa AURORA NOVA SAS por un valor de $32.869.864 Incluye IVA., dado que fue el primer proveedor que suministro el 70% de los materiales en obra y es la más económica. Este valor no incluye descuento de retención.
	En el Comité Operativo, se autoriza el pago de nómina de trabajadores por un valor de $7.984.400, pago seguridad social por $ 3.207.400 y devolución en la Retención por valor de $1.377.000
	En el Comité Operativo, se autoriza el segundo pago al Ingeniero Residente por un valor de $3.750.000, esta cuenta viene acompañada por su planilla soportes de seguridad social y parafiscales.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ___X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(Se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
Entrega del soporte de pago de los rendimientos financieros del Convenio Solidario	Contador y JAC	Digital


FIRMAS DE ASISTENTES:




Nombre: Luis Enrique Polo Rodríguez
Cargo: Presidente y Representante Legal de la Junta de JAC de la Vereda Bajo de Piedra



Nombre: José Manuel Madera Díaz
Cargo: Representante Comité Participación Ciudadana
JAC Vereda Bajo de Piedra



Nombre: Oscar Bula Espinosa
Cargo: Interventor Convenio N°3756-2023



Nombre: Miguel Simón Madera
Cargo: Tesorero JAC Vereda Bajo de Piedra



Nombre: Javier Barrero Mossos
Cargo: Directo de Interventoría Convenio N°3756-2023

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

Neiva, julio 17 de 2024

Señores:
Banco Av Villas
Of Montería

Ref: Solicitud de Transferencias vía ACH

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

Nombre	Junta de Acción Comunal Vereda de Bajo de Piedra Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS
Nit	901.374.481-2
Cuenta Corriente	550082804

Transferir a:

BANCO	TIPO DE CUENTA	NUEMERO DE CUENTA	NOMBRE TITULAR	NIT/CC	VALOR
BANCO AGRARIO	AHORRO	427700099192	LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ	3.996.814	$ 12.568.800
BBVA	AHORRO	0716168018	JESUS BARBOSA BRACAMONTE	1.067.097.285	$ 3.750.000
BANCOLOMBIA	AHORRO	16600005206	AURORA NOVA SAS	901.388.391	$ 32.172.794

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.
Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,

Firmas autorizadas

Nombre: Luis Enrique Polo Rodriguez
Identificación: 3.996.814
Representante Legal.

Nombre: Javier Barrero Mossos.
Identificación: 7.685.694
Interventor.

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA DE

PERÍODO	2024/07/01	**A**	2024/07/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	550-08280-4		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	MONTERIA		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$86,144,581.79
+ Movimiento crédito:	$163,847.58
- Movimiento débito:	$48,726,372.98
Saldo final período:	$37,582,056.39

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$70,505,408.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/03/05	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240305	$13,550.00	$86,158,131.79
2024/03/05	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240305	$13,550.00	$86,171,681.79
2024/03/26	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240326	$13,550.00	$86,185,231.79
2024/03/26	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240326	$13,550.00	$86,198,781.79
2024/03/26	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240326	$13,550.00	$86,212,331.79
2024/03/26	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240326	$13,550.00	$86,225,881.79
2024/04/19	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240419	$13,550.00	$86,239,431.79
2024/04/19	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240419	$13,550.00	$86,252,981.79
2024/04/19	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240419	$13,550.00	$86,266,531.79
2024/05/20	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240520	$13,550.00	$86,280,081.79
2024/05/20	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240520	$13,550.00	$86,293,631.79
2024/05/20	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240520	$13,550.00	$86,307,181.79
2024/07/17	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$650.40	$86,307,832.19
2024/07/22	DEB TRANSF OFICINA 000003996814 AGRARIO	$12,568,800.00	$73,739,032.19
2024/07/22	DEB TRANSF OFICINA 001067097285 BANCO BBVA	$3,750,000.00	$69,989,032.19
2024/07/22	DEB TRANSF OFICINA 000901388391 BANCOLOMBIA	$32,172,794.00	$37,816,238.19
2024/07/22	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240722	$13,550.00	$37,802,688.19
2024/07/22	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240722	$13,550.00	$37,789,138.19
2024/07/22	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240722	$13,550.00	$37,775,588.19
2024/07/22	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$194,128.98	$37,581,459.21
2024/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$597.18	$37,582,056.39

Fogafín Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Defensor del Consumidor Financiero: Banco AV Villas S.A. NIT 860.035.827-5. Calle 98 No. 19 C 73 A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si deseas dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas Jose Federico Ustáriz Gonzalez o Juan Manuel Calderon Cuervo, principales. Firma abogada. En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6105161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de nuestro Portal Transaccional a continuación en la Defensoría del Consumidor Financiero en un horario 24/7 a través de los siguientes medios. Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: www.defensoravvillas.com.co. APC Defensoría: https://bogota.gov.co/apc-pdf.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA

RELACION DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO INFORME FINANCIERO DEL CONVENIO N° 3756 DE 2023, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CHINÚ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL; ESTE BUSCA MEJORAR LA VÍA TERCIARIA UBICADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE CHINÚ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

DATOS DEL CLIENTE:

Razón social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL LA VEREDA BAJO DE PIEDRA
Nit: 901.374.481-2
Representante legal: LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ
Correo: lepr2022@gmail.com
Dirección: Calle 2c n° 9-75 vereda Bajo de piedra, municipio de Chinú, departamento de Córdoba.
Fecha: 16 de julio de 2024

SOLICITANTE:	CARGO:
LIANNETTE CORRALES ARIZA	CONTADOR PUBLICO

SOLICITUD NOMINA DEL 01 DE MAYO AL 06 DE JULIO DE 2024						
NOMINA	C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	VALOR BRUTO	MAS: IVA	MENOS: RETENCION	VALOR TOTAL
1	3.996.814	LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ	$ 7.984.400	$ -	$ -	$ 7.984.400

HONORARIOS INGENIERO RESIDENTE						
CUENTA N	C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	VALOR BRUTO	MAS: IVA	MENOS: RETENCION	VALOR TOTAL
2	1.067.097.285	JESUS BARBOSA BRACAMONTE	$ 3.750.000	$ -	$ -	$ 3.750.000

SOLICITUD PARA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MAYO Y JUNIO						
PERIODO	C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	VALOR BRUTO	MAS: IVA	MENOS: RETENCION	VALOR TOTAL
05-06-	3.996.814	LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ	$ 3.207.400	$ -	$ -	$ 3.207.400

RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR DIAN						
PERIODO	C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	VALOR BRUTO	MAS: IVA	MENOS: RETENCION	VALOR TOTAL
06-	3.996.814	LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ	$ 1.377.000	$ -	$ -	$ 1.377.000

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA

COMPRA DE 30% MATERIALES					
NIT	PROVEEDOR	VALOR BRUTO	MAS: IVA	MENOS: RETENCION	VALOR TOTAL
901.388.391	AURORA NOVA SAS	$ 27.883.303	$ 4.986.574	$ 697.083	$ 32.172.794

SOLICITANTE

Liannette CA.

LIANNETTE CORRALES ARIZA
T.P # 295364-T
Contador público.

LUIS POLO RODRIGUEZ
C.C N° 3.996.814
Representante legal.

Correo: lepr2022@gmail.com
Dirección: Calle 2c n° 9-75 vereda Bajo de piedra
Chinú - Córdoba

INFORME FINANCIERO No.4, PAGO NOMINA TRABAJADORES DEL 10 DE MAYO AL 06 DE JULIO, INGENIERO RESIDENTE, SEGURIDAD SOCIAL, RETENCION EN LA FUENTE Y COTIZACION DE MATERIALES, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO N° 3756 DE 2023, CELEBRADO ENTRE INVIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INTRODUCCION

El gobierno nacional de la república de Colombia cada día busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes tanto en la zona rural como urbana, para que estos encuentren comodidades habitacionales, sociales y de desarrollo educativo, económico, agrario entre otros, por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo para que las comunidades a través de las Juntas de acción comunal y demás asociaciones campesinas puedan ejecutar proyectos de infraestructura vial en los territorios. El estado ha aunado esfuerzos a través del instituto nacional de vías INVIAS y las Juntas de acción comunal para fortalecer las vías rurales y terciarias con el fin de beneficiar a la población, es así que, con la Junta de acción comunal de la vereda Bajo de piedra del municipio de Chinú, departamento de Córdoba se ha logrado firmar un convenio solidario N° 3756 de 2023, el cual tiene por objeto aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías INVIAS y la Junta de Acción Comunal de la vereda Bajo de Piedra del municipio de Chinú, departamento de Córdoba para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total; este busca mejorar la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la vereda Bajo de Piedra, municipio de Chinú, departamento de Córdoba.

En el presente documento, se detalla el cuarto informe de contabilidad de la Junta de acción comunal de la vereda bajo de piedra del municipio de Chinú departamento de Córdoba; que tiene que ver específicamente con la continuidad de las actividades a desarrollar y se detallan a continuación.

1. Presentación de planilla de pago de trabajadores, cuenta de cobro de ingeniero residente, seguridad social y pago de retención en la fuente "DIAN".
2. Presentación de cotizaciones para compra de materiales.

DESARROLLO

1. **Presentación de planilla de pago de trabajadores, cuenta de cobro de ingeniero residente, seguridad social y retención en la fuente en Renta.**

1.1. NOMINA DE TRABAJADORES DEL 10 DE MAYO AL 06 DE JULIO DE 2024.

SOLICITUD NOMINA DEL 01 DE MAYO AL 06 DE JULIO DE 2024						
NOMINA	C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	VALOR BRUTO	MAS: IVA	MENOS: RETENCION	VALOR TOTAL
1	3.996.814	LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ	$ 7.984.400	$ -	$ -	$ 7.984.400

1.2. COBRO No. 2 INGENIERO RESIDENTE.

HONORARIOS INGENIERO RESIDENTE						
CUENTA N	C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	VALOR BRUTO	MAS: IVA	MENOS: RETENCION	VALOR TOTAL
2	1.067.097.285	JESUS BARBOSA BRACAMONTE	$ 3.750.000	$ -	$ -	$ 3.750.000

1.3. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO Y JUNIO.

Pago Liquidación - 2024-05

Estimar su fecha de pago

Fecha estimada de pago 2024/07/12 Días de Mora: 21

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Valor Liquidado	Interes Mora	Saldos e Incapacidades	Total a Pagar
Totales por administradoras de EPS	3	6	$100.900	$1.700	$0	$102.600
Totales por administradoras de ARL	1	6	$175.200	$2.900	$0	$178.100
Totales por administradoras de AFP	2	6	$402.500	$6.600		$409.100
Totales por administradoras de SENA	0	0	$0	$0		$0
Totales por administradoras de ICBF	0	0	$0	$0		$0
Totales por administradoras de CCF	1	6	$100.900	$1.700		$102.600
Totales por administradoras de ESAP	0	0	$0	$0		$0
Totales por administradoras de MEN	0	0	$0	$0		$0
TOTAL A PAGAR	7	6	$779.500	$12.900	$0	$792.400

Pago Liquidación - 2024-06

Estimar su fecha de pago

Fecha estimada de pago 2024/07/18 Días de Mora: 0

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Valor Liquidado	Interes Mora	Saldos e Incapacidades	Total a Pagar
Totales por administradoras de EPS	3	6	$312.000	$0	$0	$312.000
Totales por administradoras de ARL	1	6	$543.000	$0	$0	$543.000
Totales por administradoras de AFP	2	6	$1.248.000	$0		$1.248.000
Totales por administradoras de SENA	0	0	$0	$0		$0
Totales por administradoras de ICBF	0	0	$0	$0		$0
Totales por administradoras de CCF	1	6	$312.000	$0		$312.000
Totales por administradoras de ESAP	0	0	$0	$0		$0
Totales por administradoras de MEN	0	0	$0	$0		$0
TOTAL A PAGAR	7	6	$2.415.000	$0	$0	$2.415.000

SOLICITUD PARA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MAYO Y JUNIO						
PERIODO	C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	VALOR BRUTO	MAS: IVA	MENOS: RETENCION	VALOR TOTAL
05-06-	3.996.814	LUIS ENRIQUE POLO RODRIGUEZ	$ 3.207.400	$ -	$ -	$ 3.207.400

El valor total de la seguridad social del mes de mayo y junio ascienden a Tres millones doscientos siete mil cuatrocientos pesos M/cte. **($3.207.400)**

1.4. RETENCION EN LA FUENTE EN RENTA.

RELACION RETENCIONES EN LA FUENTE POR PRESENTAR							
DESEMBOLSO	FECHA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR BASE	RETENCION	REDONDEO
2	10/04/2024	FEV10	AURORA NOVA SAS	COMPRA	$ 1.969.000	$ 49.225	$ 49.000
2			SERVISALUD Y ALIMENTOS IPS Y/O AMPARO ALCALA HIGGNIS	SERVICIO	$ 660.000	$ 26.400	$ 26.000
3	17/06/2023	FEV29	AURORA NOVA SAS	SERVICIO	$ 43.006.304	$ 430.063	$ 430.000
3	17/06/2023	FEV29	AURORA NOVA SAS	COMPRA	$ 29.007.897	$ 725.197	$ 725.000
3	17/06/2023	FEV28	AURORA NOVA SAS	SERVICIO	$ 14.693.135	$ 146.931	$ 147.000
TOTAL RETENCIONES POR PAGAR							$ 1.377.000

2. Presentación de cotizaciones para compra de materiales.

Dentro del convenio firmado entre INVIAS y la Junta de acción comunal de la vereda Bajo de Piedra del municipio de Chinú departamento de Córdoba, se estipuló que debe haber un comité operativo el cual estará conformado por el presidente, tesorero, ingeniero residente, contador, interventor y un veedor, los cuales estarán encargados de hacer seguimiento y vigilancia a todo el proceso, por lo cual, se hace necesario cumplir con las disposiciones generales para que se ejecute adecuadamente dicha obra. Para este proceso, se estipuló que, para gastos e inversiones como compras de materiales, alquiler de materiales, estudios y diseños y exámenes médicos se deben tener en cuenta como mínimo tres (3) cotizaciones o propuestas de entidades, empresas o persona natural diferentes con el fin de evaluar la que se ajuste al presupuesto estipulado y así, escoger en el comité operativo la que sea de mejor factibilidad.

Entre las propuestas a estudiar se encuentran:

COTIZACION DE MATERIALES					
NIT	PROVEEDOR	VALOR BRUTO	MAS: IVA	MENOS: RETENCION	VALOR TOTAL
901.519.103	M CONSTRUCCIONES SAS	$ 29.420.247	$ 5.266.514	$ 735.506	$ 33.951.255
901.388.391	AURORA NOVA SAS	$ 27.883.303	$ 4.986.574	$ 697.083	$ 32.172.794
900.657.200	IBIZA CONSTRUCCIONES	$ 29.193.126	$ 5.224.694	$ 729.828	$ 33.687.992

CONCLUSIÓN

Según los datos relacionados y la información plasmada en el presente documento, se busca dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por interventoría para dar inicio a las obras establecidas en el convenio interadministrativo firmado entre INVIAS y la junta de acción comunal de la vereda Bajo de Piedra del municipio de Chinú, en el departamento de Córdoba.

El presente informe se firma en la vereda Bajo de Piedra, municipio de Chinú, departamento de Córdoba, a los 08 días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

Liannette CA

LIANNETTE DEL CARMEN CORRALLES ARIZA
T.P # 295364-T
Contador público.

RELACION RETENCIONES EN LA FUENTE POR PRESENTAR							
DESEMBOLSO	**FECHA FACTURA**	**FACTURA**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR BASE**	**RETENCION**	**REDONDEO**
2	10/04/2024	FEV10	AURORA NOVA SAS	COMPRA	$ 1.969.000	$ 49.225	$ 49.000
2			SERVISALUD Y ALIMENTOS IPS Y/O AMPARO ALCALA HIGGNIS	SERVICIO	$ 660.000	$ 26.400	$ 26.000
3	17/06/2023	FEV29	AURORA NOVA SAS	SERVICIO	$ 43.006.304	$ 430.063	$ 430.000
3	17/06/2023	FEV29	AURORA NOVA SAS	COMPRA	$ 29.007.897	$ 725.197	$ 725.000
3	17/06/2023	FEV28	AURORA NOVA SAS	SERVICIO	$ 14.693.135	$ 146.931	$ 147.000
TOTAL RETENCIONES POR PAGAR							**$ 1.377.000**

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2024

3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510604537905

(415)7707212489984(8020) 000351060453790 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9013744812 | 6. DV: 2

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA

12. Cód. Dirección seccional: 12

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas				A personas naturales			
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	0	93	0
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0		79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	58,359,000	44	603,000		81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	30,977,000	49	774,000		86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								**130**	1,377,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	1,377,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	1,377,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN

2024-09-10 / 07:56:59 PM

2 0 2 ... :5 9

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900195004731

2 0 2 4 2 1 9 3 2 6 3 9 8 8

NO VALIDO

COMPROBANTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Numero Formulario:	4910847798664
Valor:	$ 1.377.000
Fecha:	10/09/2024 19:59:44
Identificacion:	901374481
Numero Dian:	12867908658925
Cus:	905657444
Estado:	Aprobada

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA

NIT 901.374.481-2

NOMINA

NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MAYO AL 06 DE JULIO DE 2024

	APELLIDOS Y NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	DEVENGADO				DEDUCCIONES				FIRMA
			SUELDO BASICO	SUBS. TRANSP.	DIAS	TOTAL DEVENGADO	SALUD 4%	PENS. 4%	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	
1	JUAN CARLOS TIRADO HOYOS	78.735.442	2.320.000		30	2.320.000	92.800	92.800	185.600	2.134.400	Juan Tirado H
2	MIGUEL SIMON MADERA BARON	78.734.094	1.300.000		48	2.080.000			-	2.080.000	Miguel
3	ALDAIR ALFONSO ALVAREZ PATERNINA	1.066.185.231	1.300.000		18	780.000			-	780.000	Aldair Alvarez
4	DANIEL ANDRES MADERA MADERA	1.066.173.812	1.300.000		13	563.333			-	563.333	Daniel madera
5	JUAN DAVID ALVAREZ CASTILLO	1.066.173.565	1.300.000		12	520.000			-	520.000	Juan Alvarez
6	LUIS ALBERTO POLO RUIZ	1.066.187.248	1.300.000		31	1.343.333			-	1.343.333	Luis Polo Ruiz
7	JESUS DAVID ALVAREZ PATERNINA	1.066.182.366	1.300.000		13	563.333				563.333	Jesús Alvarez
	TOTAL		10.120.000	-		8.170.000	92.800	92.800	185.600	7.984.400	

Liannette CA.

ELABORO: Liannette Corrales Ariza
Contador Público

Scanned with CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA
NIT: 901.374.481-2

A

JESUS ANTONIO BARBOZA BRACAMONTE
C.C 1.067.097.285

DEBE

POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR INGENIERO RESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 2 DE LA OBRA SEGÚN CONVENIO 3756 DE 2023 CELEBRADO ENTRE INVIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA.

LA SUMA DE..... $ 3.750.000

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,

Jesus Barboza

JESUS BARBOZA BRACAMONTE
C.C # 1.067.097.285

Pertenezco a la categoría de Rentas de Trabajo de acuerdo con la clasificación asignada en la ley 2277 de 2022, esta norma indica que las primeras 95 UVT no están sujetas a retención en la fuente para esta categoría, en concordancia con el artículo 383 parágrafo 2 del estatuto tributario (Tabla de retención en la fuente para ingresos laborales gravados). De acuerdo a lo anterior certifico que no solicitare costos y deducciones en la declaración de renta del respectivo año.

Montería, junio 29 de 2024.

HONORARIO RESIDENTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14977108995

(415)7707212489984(8020) 000001497710899 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1067097285	3	Impuestos y Aduanas de Montería 12	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1067097285	2016/03/09

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Córdoba 23	Buenavista 079

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BARBOZA	BRACAMONTE	JESUS	ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Córdoba 23	Montería 001

41. Dirección principal: BRR tambo manzana 06 lote 14

42. Correo electrónico: barboza98jesus@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
230001	3126752799	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4111	2024/02/01	4210	2024/02/01					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49 50

49 - No responsable de IVA

50 - No responsable de Consumo restauran

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 02 - 01 / 17 : 23: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BARBOZA BRACAMONTE JESUS ANTONIO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-02-2024 05:25:10PM

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2024 | 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505739130135

(415)7707212489984(8020) 000350573913013 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 7 4 4 8 1	2				

11. Razón social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA

12. Cód. Dirección seccional: 1 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	58,359,000	56	603,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	30,977,000	61	774,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones — Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones — Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones — Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones — Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	1,377,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79		0
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80		0
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81		0
A título de IVA — **Total retenciones IVA**	82		0
Retenciones impuesto timbre nacional	83		0
Retenciones contribución de laudos arbitrales	84		0
Total — **Total retenciones**	85		1,377,000
Total — Sanciones	86		0
Total — **Total retenciones más sanciones**	87		1,377,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

BORRADOR

2024032575923 2

CONSTRUCTORES S.A.S

Montería, julio 04 de 2024

Apreciados señores

JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA – CHINU

Cotizamos a continuación los siguientes elementos

MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
CEMENTO GRIS X BULTO 50KG	350,00	$ 37.250	$ 13.037.500
EMULSION ACUOSA DE PARAFINA	78,87	$ 7.628	$ 601.620
FORMALETAS DE MADERA	100,00	$ 24.250	$ 2.425.000
ACERO DE REFUERZO	2.668,00	$ 6.980	$ 18.622.640
TOTAL			$ 34.686.760

PAGO DE CONTADO – VALIDEZ 15 DIAS

JORGE IVAN MACHADO HUMANEZ

Cédula de ciudadanía: 1.064.998.010

3138511478

Montería, Córdoba CL 28 5 05

M CONSTRUCTORES S.A.S
Nit. 901519103-8
Correo: mconstructores@gmail.com
3227504199 - 3246350728

AURORA NOVA
S.A.S.

Montería, 05 julio de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO DE PIEDRA
MUNICIPIO DE CHINU

COTIZACION MATERIALES

Adjunto enviamos cotización solicitada por ustedes

MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
CEMENTO GRIS DE USO EXTRUCTURAL	350,00	BULTO	$ 36.000,0	$ 12.600.000
EMULSION ACUOSA DE PARAFINA	78,87	KG	$ 7.524,8	$ 593.477
FORMALETAS DE MADERA	100,00	M2	$ 23.344,0	$ 2.334.400
ACERO	2.668,00	KG	$ 6.500,0	$ 17.342.000
TOTAL MATERIALES				$ 32.869.864

SON: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/L

NOTA: EL VALOR DE LOS MATERIALES ACA COTIZADOS SE MANTENDRAN HASTA LA FINALIZACION DE LA OBRA DE PLACA HUELLA REALIZADA EN LA VEREDA BAJO DE PIEDRA.

Representante legal
Jorge Iván Meza Hoyos
Cc. 70.529.955

- COTIZACIÓN ESCOGIDA

AURORA NOVA SAS
NIT: 901388391-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 14 A 28 35, Montería, Córdoba, Colombia
Tel. 3138511478
Email. proyectos@auroranova.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764068217824 válida desde 2024-04-10 hasta 2025-04-10 rango desde FEV1 hasta FEV50.

Cliente: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA
NIT : 901374481
Dirección: CL 2 C975 VDA BAJO PIEDRA, Chinú, Córdoba, Colombia
Teléfono: 3105177034
Email: Lepr2022@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEV47**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **11:28:57-05:00**
FECHA FIRMADO: **22/08/2024 11:29:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	08	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	300	CEMENTO ULTRACEM GRIS DE USO ESTRUCTURAL X50KG	C62	350,00	$30.252,10	IVA	19%	$2,011,764.65	0,00	$10.588.235,00
2	320	ACERO REFORZADO	KGM	2.668,00	$5.462,18	IVA	19%	$2,768,888.29	0,00	$14.573.096,24
3	314	FORMALETA DE MADERA PARA CONCRETO	2J	100,00	$22.232,38	IVA	5%	$111,161.90	0,00	$2.223.238,00
4	313	EMULSION ACUOSA DE PARAFINA	KGM	78,87	$6.323,36	IVA	19%	$94,757.45	0,00	$498.723,40

Notas:

SON: (treinta y dos millones ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro pesos noventa y tres centavos)
CUFE: b132c12f2b6e27b4fb4758ceec996d0856fd20d2474bb419b6e9acc8725591e6bae6396ae50ac3deeb4ab4441152347d

Subtotal:	$27.883.292,64
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.986.572,29
Total:	$32.869.864,93

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.223.238,00	5,00%	$111.161,90
01 IVA	$25.660.054,64	19,00%	$4.875.410,39

- **FACTURA 30% MATERIALES**

Firma Digital: Jpnm/0mqfCIKX6YZeLOwOCpkR+99YbiykwxsW+fAVS9kejr58N93SJxircCwUZgy
x3wndOFBJj+zq73WmG+Lx6uFHjVDObBz1O2oIr1lpf4SEHaAGa
xaLN3W/1olJpMj iSxkrTduqvcna35YVVFXNSe+/rHt9KDXTMrMrcQ2ptr0H13loblKxPphdf2KOkfm DXiJ8Vmgef7GJJ/vYTy0Q8uNiKB30FW1F7h
7gQbeZa9c4Atm9vnAwTgQpnpsKjQn nQGXH6rFVs3r0dxXwvQxKW3dpl4u/KplfLksBXKUZ1RTpFyRbKZ0VqmXEIXWB3Nd Pua2CUp/pERlX8zkpLp8
Ew==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

IBIZA
CONSTRUCCIONES S.A.S.

Montería, julio 05 de 2024.

Señores
JAC VEREDA BAJO DE PIEDRA
CHINU- CORDOBA

Relacionamos a continuación el precio de los materiales que ustedes están cotizando

MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
CEMENTO GRIS DE USO EXTRUCTURAL	350	$ 37.120,0	$ 12.992.000,0
EMULSION ACUOSA DE PARAFINA	78,87	$ 7.628,0	$ 601.620,4
FORMALETAS DE MADERA	100	$ 24.150,0	$ 2.415.000,0
ACERO	2.668,00	$ 6.900,0	$ 18.409.200,0
TOTAL MATERIALES			$ 34.417.820,4

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS

MARÍA AUXILIADORA CAMPO FONTALVO

REPRESENTANTE LEGAL
Cédula de ciudadanía: 57308195
Nit. 900657200-1

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901374481	2	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BAJO DE PIEDRA	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA BAJO DE PIEDRA	CLL 3 BAJO DE PIEDRA	CHINU-CORDOBA	3167454512	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	860057786	9471597023	E	2024/06/21	2024/08/22	NEQUI	62	$816,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1066185231	ALVAREZ ALDAIR	X																	230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF16	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
2	CC	1066182368	ALVAREZ JESUS	X																	230301	16	$693,334	$111,000	ESSC07	16	$693,334	$27,800	CCF16	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0	Si	$214,900
3	CC	1066173565	ALVAREZ JUAN	X																	230301	4	$173,334	$27,800	ESSC07	4	$173,334	$7,000	CCF16	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
4	CC	1066173812	MADERA DANIEL	X																	230301	2	$86,667	$13,900	ESSC07	2	$86,667	$3,500	CCF16	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
5	CC	78734094	MADERA MIGUEL	X																	230201	10	$433,334	$69,400	ESSC07	10	$433,334	$17,400	CCF16	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
6	CC	1066187248	POLO LUIS	X																	230301	16	$693,334	$111,000	EPS041	16	$693,334	$27,800	CCF16	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0	Si	$214,900
Total	**Afiliados(6)**																						$2,513,337	$402,500			$2,513,337	$100,900			$2,513,337	$100,900			$2,513,337	$175,200		$0	$0		$779,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901374481	2	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BAJO DE PIEDRA	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA BAJO DE PIEDRA	CLL 3 BAJO DE PIEDRA	CHINU-CORDOBA	3167454512	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	860057786	9471597023	E	2024/06/21	2024/08/22	NEQUI	62	$816,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$402,500	$18,900	$0	$421,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$333,100	$15,600	$0	$348,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$69,400	$3,300	$0	$72,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$175,200	$8,200	$0	$183,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$175,200	$8,200	$0	$183,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$100,900	$4,800	$0	$105,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$100,900	$4,800	$0	$105,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$100,900	$4,900	$0	$105,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$55,700	$2,700	$0	$58,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$17,400	$900	$0	$18,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$27,800	$1,300	$0	$29,100
TOTAL				6	$779,500	$36,800	$0	$816,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901374481	2	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BAJO DE PIEDRA	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA BAJO DE PIEDRA	CLL 3 BAJO DE PIEDRA	CHINU-CORDOBA	3167454512	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	860346686	9471597063	E	2024/07/18	2024/08/22	NEQUI	35	$2,478,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1066185231	ALVAREZ ALDAIR																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1066182368	ALVAREZ JESUS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	1066173565	ALVAREZ JUAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1066173812	MADERA DANIEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	78734094	MADERA MIGUEL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	1066187248	POLO LUIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(6)**																						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$543,000		$0	$0		$2,415,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901374481	2	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BAJO DE PIEDRA	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA BAJO DE PIEDRA	CLL 3 BAJO DE PIEDRA	CHINU-CORDOBA	3167454512	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	860346686	9471597063	E	2024/07/18	2024/08/22	NEQUI	35	$2,478,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,248,000	$32,700	$0	$1,280,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,040,000	$27,200	$0	$1,067,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$5,500	$0	$213,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$543,000	$14,200	$0	$557,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$543,000	$14,200	$0	$557,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$312,000	$8,200	$0	$320,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$312,000	$8,200	$0	$320,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$312,000	$8,300	$0	$320,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$208,000	$5,500	$0	$213,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$1,400	$0	$53,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$1,400	$0	$53,400
TOTAL				6	$2,415,000	$63,400	$0	$2,478,400

ARL | sura

Medellín, 04 de Julio de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DE PIEDRA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1066185231	ALVAREZ PATERNINA ALDAIR ALFONSO	03/07/2024		312896Aa	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1066182368	ALVAREZ PATERNINA JESUS DAVID	03/07/2024		8203242I	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1066173565	ALVAREZ VASTILLO JUAN DAVID	03/07/2024		189Nt239	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C78734094	MADERA BARON MIGUEL SIMON	22/05/2024		47181214	DEPENDIENTE	MORA
C1066173812	MADERA MADERA DANIEL ANDRES	03/07/2024		14A16621	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1066187248	POLO RUIZ LUIS ALBERTO	14/06/2024		23615796	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C7838168224186446 99

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/07/2024 12:24:59 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.144.168.97, 192.230.86.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Servisaludyalimentosips@gmail.com
TEL: 3126434430 - 3008995124

JACVEREDEDABAJOPIEDRA20240904H

CERTIFICADO MÉDICO PRE-OCUPACIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS: ALDAIR ALFONSO ALVAREZ PATERNINA		**F.N: 16/01/1995**	**SEXO: Masculino**
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 1066185231**	**CODIGO: JACBAJODEPIEDRA2026899M**	EDAD: 29 Años
EMPRESA CONTRATANTE: JUNTA ACCION COMUNALVEREDA BAJO DE PIEDRA			**TIPO EXAMEN:** INGRESO
CARGO DESEMPEÑA: CONTRATISTA. OBRERO		**JORNADA TRABAJO:** Diurno	**FECHA: 09/04/2024**

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

	1. RECOMENDACIONES GENERALES						Ninguna
	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo		1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico		1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras
	2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES						Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas				
	3. RESTRICCIONES					X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: X Ingreso ____Periódico____Retiro___Post Incapacidad_____Cambio Cargo____Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS

	Examen Físico	Rx Tórax	Perfil Lipídico	TSH	Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular	Rx Columna Lumbo Sacra	Perfil Hepático	Serología	KOH Uñas
X	Audiometría	Cuadro Hemático	Perfil Renal	Ácido Úrico	Coprológico
X	Optometría	Glicemia	Frotis Sangre Periférica	Tamizaje Drogas	Baciloscopia
	Espirometría	Electrocardiograma	Hemoclasificación	Alcohol	Evaluación Neuropsicológica
X	Visiometría	Parcial de Orina	Espermograma	Colinesterasa	Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA Seguimiento por. (Medicina general, Optometría) . **SALUD OCUPACIONAL:** Control de Salud ocupacional periódico, Higiene Postural, Utilización EPP. Incluir en **PROGRAMAS DE PYP:** SVE Riesgo Visual, **Cardiovascular.** CONTROL POR EPS PYP.

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Fanny Sánchez Chávez
Médico Ocupacional
Lic. 1606 - Sep 2018

FANNY SANCHEZ CHAVEZ
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 1606 SEP/2018

JACVEREDEDABAJOPIEDRA20240904H

PACIENTE:

CLINICA FUTURO IPS S.A.S
Servisaludyalimentosips@gmail.com
TEL: 3126434430 - 3008995124
MEDICORDOBA IPS S.A.S

JACVEREDEDABAJOPIEDRA20240904H

CERTIFICADO MÉDICO PRE-OCUPACIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS: DANIEL ANDRES MADERA MADERA		**F.N: 23/12/2004**	**SEXO: Masculino**
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 1066173812**	**CODIGO: JACBAJODEPIEDRA2026899M**	EDAD: 19 Años
EMPRESA CONTRATANTE: JUNTA ACCION COMUNALVEREDA BAJO DE PIEDRA			**TIPO EXAMEN:** INGRESO
CARGO DESEMPEÑA: CONTRATISTA. OBRERO		**JORNADA TRABAJO:** Diurno	**FECHA: 09/04/2024**

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

	1. RECOMENDACIONES GENERALES							Ninguna
	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo		1.7. Control de peso y nutrición	
	1.2. Continuar manejo médico		1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras	

	2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES							Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar	
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros	
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas					

	3. RESTRICCIONES						X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados			3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos			3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos			3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: X _ Ingreso _____Periódico_____Retiro___Post Incapacidad_____Cambio Cargo_____Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo	Sin Restricciones para trabajo eléctrico	Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)	Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas	Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado	Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados	Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos	Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria	Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas				

5. EXÁMENES REALIZADOS

	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo	
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas	
X	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico	
X	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia	
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Evaluación Neuropsicológica	
X	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro	

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA Seguimiento por. (Medicina general, Optometría) . **SALUD OCUPACIONAL:** Control de Salud ocupacional periódico, Higiene Postural, Utilización EPP. Incluir en **PROGRAMAS DE PYP:** SVE Riesgo Visual, **Cardiovascular**. CONTROL POR EPS PYP.

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Fanny Sánchez Chávez
Médico Ocupacional
LIC. 1606 - Sep 2018

FANNY SANCHEZ CHAVEZ
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 1606 SEP/2018

JACVEREDEDABAJOPIEDRA20240904H

PACIENTE:

CLINICA FUTURO IPS S.A.S
Servisaludyalimentosips@gmail.com
TEL: 3126434430 - 3008995124
MEDICORDOBA IPS S.A.S

JACVEREDEDABAJOPIEDRA202409O4H

CERTIFICADO MÉDICO PRE-OCUPACIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS: JESUS DAVID ALVAREZ PATERNINA		**F.N: 10/07/1992**	**SEXO: Masculino**
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 1066182368**	**CODIGO: JACBAJODEPIEDRA2026899M**	EDAD: 32 Años
EMPRESA CONTRATANTE: JUNTA ACCION COMUNALVEREDA BAJO DE PIEDRA			**TIPO EXAMEN:** INGRESO
CARGO DESEMPEÑA: CONTRATISTA. OBRERO		**JORNADA TRABAJO:** Diurno	**FECHA: 09/04/2024**

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

	1. RECOMENDACIONES GENERALES						Ninguna
	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo		1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico		1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

	2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES						Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas				

	3. RESTRICCIONES					X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: X Ingreso ____Periódico____Retiro___Post Incapacidad_____Cambio Cargo____Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS

	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo	
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas	
X	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico	
X	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia	
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Evaluación Neuropsicológica	
X	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro	

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA Seguimiento por. (Medicina general, Optometría) . **SALUD OCUPACIONAL:** Control de Salud ocupacional periódico, Higiene Postural, Utilización EPP. Incluir en **PROGRAMAS DE PYP:** SVE Riesgo Visual, **Cardiovascular.** CONTROL POR EPS PYP.

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Fanny Sanchez Chavez
Médico Ocupacional
LIC. 1606 - Sep 2018

FANNY SANCHEZ CHAVEZ
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 1606 SEP/2018

JACVEREDEDABAJOPIEDRA202409O4H

PACIENTE:

Servisaludyalimentosips@gmail.com
TEL: 3126434430 - 3008995124

JACVEREDEDABAJOPIEDRA20240904H

CERTIFICADO MÉDICO PRE-OCUPACIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN CARLOS TIRADO HOYOS		**F.N: 24/02/1980**	**SEXO: Masculino**
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 78735442**	**CODIGO: JACBAJODEPIEDRA2026899M**	EDAD: 44 Años
EMPRESA CONTRATANTE: JUNTA ACCION COMUNALVEREDA BAJO DE PIEDRA			**TIPO EXAMEN:** INGRESO
CARGO DESEMPEÑA: CONTRATISTA. OBRERO		**JORNADA TRABAJO:** Diurno	**FECHA: 09/04/2024**

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES							
							Ninguna
	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo		1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico		1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES							
							Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas				

3. RESTRICCIONES							
						X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO					
Tipo Examen: X_ Ingreso ____Periódico____Retiro___Post Incapacidad_____Cambio Cargo_____Trabajos Especiales					
X	Concepto Sin Restricciones para el cargo	Sin Restricciones para trabajo eléctrico	Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)	Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas	Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado	Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados	Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos	Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria	Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas				

5. EXÁMENES REALIZADOS										
	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo	
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas	
X	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico	
X	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia	
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Evaluación Neuropsicológica	
X	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro	

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA Seguimiento por. (Medicina general, Optometría) . **SALUD OCUPACIONAL:** Control de Salud ocupacional periódico, Higiene Postural, Utilización EPP. Incluir en **PROGRAMAS DE PYP:** SVE Riesgo Visual, **Cardiovascular**. CONTROL POR EPS PYP.

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Fanny Sánchez Chávez
Médico Ocupacional
LIC. 1606 - Sep 2018

FANNY SANCHEZ CHAVEZ
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 1606 SEP/2018

PACIENTE:

JACVEREDEDABAJOPIEDRA20240904H

CLINICA FUTURO IPS S.A.S
Servisaludyalimentosips@gmail.com
TEL: 3126434430 - 3008995124
MEDICORDOBA IPS S.A.S

JACVEREDEDABAJOPIEDRA02406904H

CERTIFICADO MÉDICO PRE-OCUPACIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN DAVID ALVAREZ CASTILLO		**F.N: 02/11/2004**	**SEXO: Masculino**
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 1066173565**	**CODIGO: JACBAJODEPIEDRA2026899M**	EDAD: 19 Años
EMPRESA CONTRATANTE: JUNTA ACCION COMUNALVEREDA BAJO DE PIEDRA			**TIPO EXAMEN:** INGRESO
CARGO DESEMPEÑA: CONTRATISTA. OBRERO		**JORNADA TRABAJO:** Diurno	**FECHA: 09/04/2024**

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

	1. RECOMENDACIONES GENERALES						Ninguna
	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo		1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico		1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

	2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES						Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas				

	3. RESTRICCIONES					X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: X Ingreso ____Periódico____Retiro___Post Incapacidad_____Cambio Cargo____Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS

	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
X	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
X	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Evaluación Neuropsicológica
X	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA Seguimiento por. (Medicina general, Optometría) . **SALUD OCUPACIONAL:** Control de Salud ocupacional periódico, Higiene Postural, Utilización EPP. Incluir en **PROGRAMAS DE PYP:** SVE Riesgo Visual, **Cardiovascular.** CONTROL POR EPS PYP.

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Fanny Sánchez Chávez
Médico Ocupacional
LIC. 1606 - Sep 2018

FANNY SANCHEZ CHAVEZ
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 1606 SEP/2018

JACVEREDEDABAJOPIEDRA02406904H

PACIENTE:

CLÍNICA FUTURO IPS S.A.S
Servisaludyalimentosips@gmail.com
TEL: 3126434430 - 3008995124
MEDICORDOBA IPS S.A.S

JACVEREDEDABAJOPIEDRA2024090 4H

CERTIFICADO MÉDICO PRE-OCUPACIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS ALBERTOPOLO RUIZ		**F.N: 02/11/1997**	**SEXO: Masculino**
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 1066187248**	**CODIGO: JACBAJODEPIEDRA2026899M**	EDAD: 27 Años
EMPRESA CONTRATANTE: JUNTA ACCION COMUNALVEREDA BAJO DE PIEDRA			**TIPO EXAMEN:** INGRESO
CARGO DESEMPEÑA: CONTRATISTA. OBRERO		**JORNADA TRABAJO:** Diurno	**FECHA: 09/04/2024**

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES							
							Ninguna
	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo		1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico		1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES							
							Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas				

3. RESTRICCIONES							
						X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: X _ Ingreso ____Periódico____Retiro___Post Incapacidad_____Cambio Cargo____Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS

	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
X	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
X	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Evaluación Neuropsicológica
X	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA Seguimiento por. (Medicina general, Optometría) . **SALUD OCUPACIONAL:** Control de Salud ocupacional periódico, Higiene Postural, Utilización EPP. Incluir en **PROGRAMAS DE PYP:** SVE Riesgo Visual, **Cardiovascular.** CONTROL POR EPS PYP.

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Fanny Sanchez Chavez
Médico Ocupacional
LIC. 1606 - Sep 2018

FANNY SANCHEZ CHAVEZ
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 1606 SEP/2018

JACVEREDEDABAJOPIEDRA2024090 4H

PACIENTE:

Servisaludyalimentosips@gmail.com
TEL: 3126434430 - 3008995124

JACVEREDEDABAJOPIEDRA202409O4H

CERTIFICADO MÉDICO PRE-OCUPACIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS: MIGUEL MADERA BARON		**F.N: 15/09/1976**	**SEXO: Masculino**
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 78734094**	**CODIGO: JACBAJODEPIEDRA2026899M**	EDAD:47 Años
EMPRESA CONTRATANTE: JUNTA ACCION COMUNALVEREDA BAJO DE PIEDRA			**TIPO EXAMEN:** INGRESO
CARGO DESEMPEÑA: CONTRATISTA. OBRERO		**JORNADA TRABAJO:** Diurno	**FECHA: 09/04/2024**

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

	1. RECOMENDACIONES GENERALES						Ninguna
	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo		1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico		1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

	2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES						Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas	X	2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas				

	3. RESTRICCIONES					X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehículos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

	4. CONCEPTO MÉDICO						
Tipo Examen: X Ingreso ____Periódico____Retiro___Post Incapacidad_____Cambio Cargo____Trabajos Especiales							
X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS					
	Examen Físico	Rx Tórax	Perfil Lipídico	TSH	Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular	Rx Columna Lumbo Sacra	Perfil Hepático	Serología	KOH Uñas
X	Audiometría	Cuadro Hemático	Perfil Renal	Ácido Úrico	Coprológico
X	Optometría	Glicemia	Frotis Sangre Periférica	Tamizaje Drogas	Baciloscopia
	Espirometría	Electrocardiograma	Hemoclasificación	Alcohol	Evaluación Neuropsicológica
X	Visiometría	Parcial de Orina	Espermograma	Colinesterasa	Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA Seguimiento por. (Medicina general, Optometría) . **SALUD OCUPACIONAL**: Control de Salud ocupacional periódico, Higiene Postural, Utilización EPP. Incluir en **PROGRAMAS DE PYP:** SVE Riesgo Visual, **Cardiovascular**. CONTROL POR EPS PYP.

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Fanny Sánchez Chávez
Médico Ocupacional
LIC. 1606 - Sep 2018

FANNY SANCHEZ CHAVEZ
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 1606 SEP/2018

JACVEREDEDABAJOPIEDRA202409O4H

PACIENTE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **78.735.442**

TIRADO HOYOS

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

JUAN CARLOS TIRADO H

FIRMA



Powered by CamScann



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1980**

CHINU
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O-** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO


16-MAR-1998 CHINU

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1301900-01113654-M-0078735442-20191120 0069014168A 1 54464807


Powered by CamScann

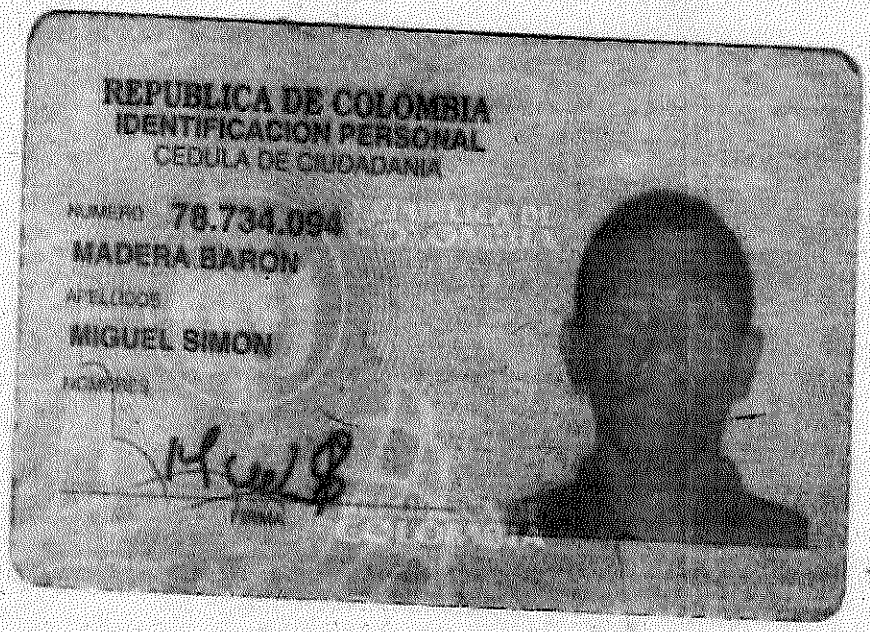

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 78.734.094
MADERA BARON
APELLIDOS
MIGUEL SIMON
NOMBRES

FIRMA

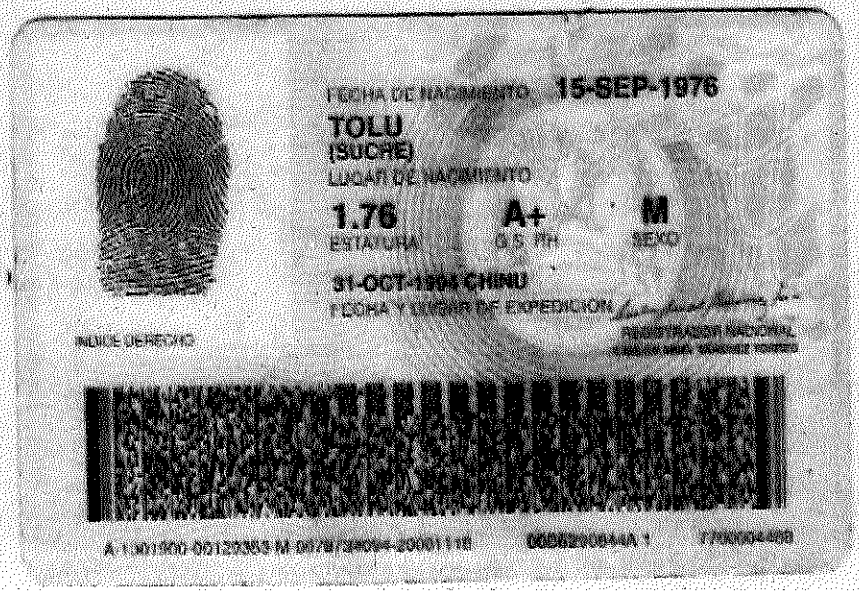

FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1976
TOLU
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
31-OCT-1994 CHINU
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.066.185.231

ALVAREZ PATERNINA

APELLIDOS

ALDAIR ALFONSO

NOMBRES

Aldair Alvarez

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **16-ENE-1995**

CHINU
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-JUN-2013 CHINU
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1301900-00455797 M 1066185231-20130815 **0034**374583A 1 39960220

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.066.173.81



Apellidos
MADERA MADERA

Nombres
DANIEL ANDRES

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.73	M

Fecha de nacimiento
23 DIC 2004

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
CHINU (CORDOBA)

Fecha y lugar de expedición
04 ENE 2023, CHINU


Fecha de expiración
04 ENE 2033

Daniel madera

.CO

0123975518

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

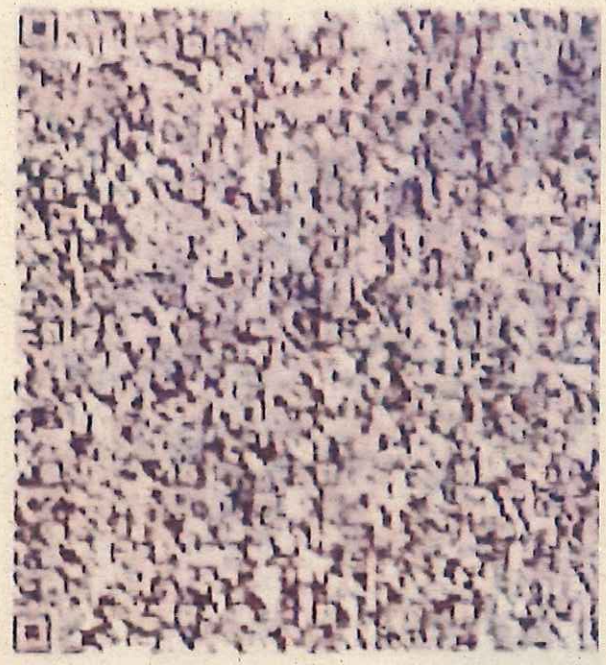

ICCOL0123975186130 19<<<<<<<<<<<<
0412236M3301041COL10661738 12<7
MADERA<MADERA<<DANIEL<ANDRES<<

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBI

NUIP 1.066.173.56



Apellidos
ALVAREZ CASTILLO

Nombres
JUAN DAVID

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.67	M

Fecha de nacimiento	G.S.
02 NOV 2004	O+

Lugar de nacimiento
CHINU (CORDOBA)

Fecha y lugar de expedición
04 ENE 2023, CHINU

Fecha de expiración
06 ENE 2033

Juan Alvarez

.CO

0123974 79

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0123974798130 19<<<<<<<<<<<<
0411022M3301063COL1066173565<4
ALVAREZ<CASTILLO<<JUAN<DAVID<<

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.066.187.248

POLO RUIZ

APELLIDOS

LUIS ALBERTO

NOMBRES

Luis Alberto Polo Ruiz

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1997

SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

25-MAY-2015 CHINU

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1700100-01220430-M-1066187248-20011202 0077042636A 2 8500925600

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL


CEDULA DE CIUDADANIA

1.006.182.368

ALVAREZ PATERNINA

JESUS DAVID

Jesús Alvarez P.

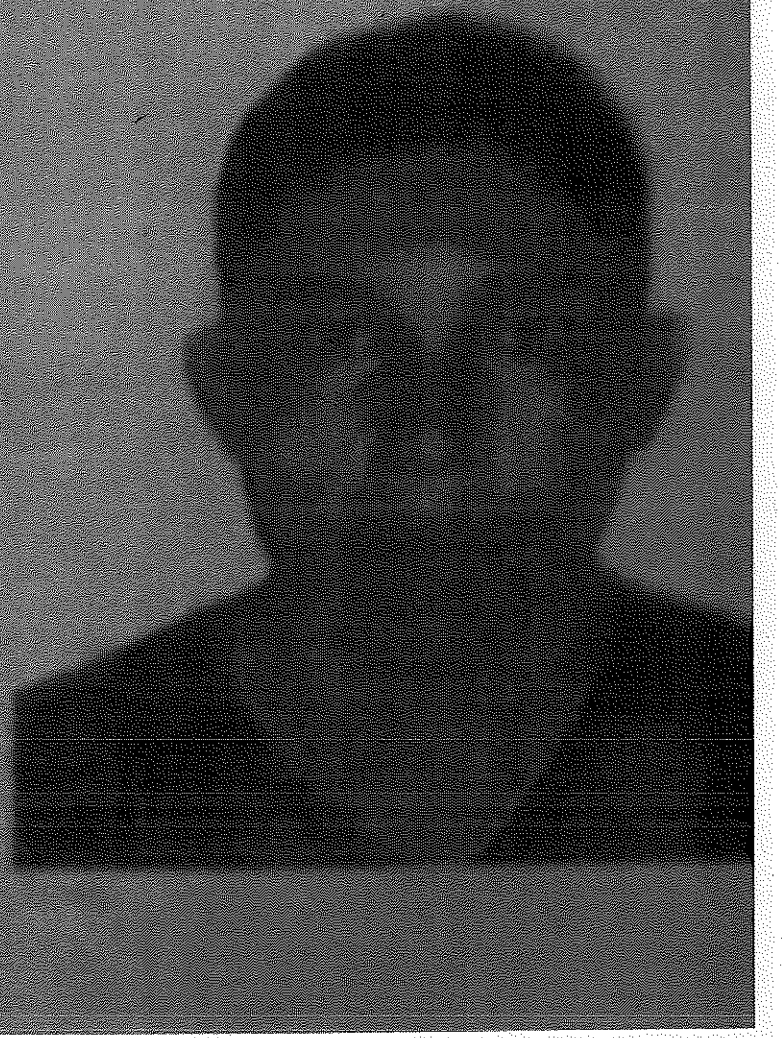



FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1992

CHINU
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ M
ESTATURA G.S RH SEXO

07-DIC-2010 CHINU
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

P<130CHINU<<ANA<MARIA<<<<<<<<<<<<<<

BALANCE DEL DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL MES DE JULIO DE 2024
JAC BAJO DE PIEDRA

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA PROYECTADO (A)				%				VALOR PROGRAMA EJECUTADO (B)	%
	Descripcción de Items	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (Según Propuesta Económica Aprobada)	Valor Total		Unidad	Cantidad Ejecutada	Valor Unitario (Según Propuesta Ecomica Aprobada)		
1	**EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**				**$ 14,693,135.00**					**$ 3,709,555.00**	
1.1	Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo	Und	1	$ 513,159.00	$ 513,159.00		Und	1	$ 13,159.00	$ 13,159.00	
1.2	Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3	Und	1	$ 2,534,203.00	$ 2,534,203.00		Und	1	$ 34,203.00	$ 34,203.00	
1.3	Carrotanque de agua(1000 Galones)	Und	2	$ 1,336,179.56	$ 1,336,179.56		Und	2	$ 373,204.00	$ 746,408.00	
1.4	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton	Und	1	$ 2,924,899.00	$ 2,924,899.00		Und	1	$ 894,207.00	$ 894,207.00	
1.5	Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton	Und	1	$ 2,128,654.00	$ 2,128,654.00	7.44%	Und	1	$ 628,654.00	$ 628,654.00	**1.88%**
1.6	Aspersor manual de 20 litros	Und	1	$ 267,921.39	$ 267,921.39		Und	1	$ 267,921.00	$ 267,921.00	
1.7	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros	Und	1	$ 1,045,071.00	$ 1,045,071.00		Und	1	$ 545,071.00	$ 545,071.00	
1.9	Mezcladora de concreto tipo trompo	Und	1	$ 3,638,391.00	$ 3,638,391.00		Und	1	$ 275,275.00	$ 275,275.00	
1.10	Cizalla manual de 90 cm	Und	1	$ 304,657.05	$ 304,657.05		Und	1	$ 304,657.00	$ 304,657.00	
2	**MATERIALES**				**$ 115,529,896.40**					**$ 91,877,008.84**	
2.1	**Excavaciones Varias sin Clasificar**	M3	10.0	$ 21,819.00	$ 218,190.00		M3	8.0	$ 21,819.00	$ 174,552.00	
2.2	**Subbase Granular Clase C**	M3	93.9	$ 94,760.50	$ 8,901,918.77		M3	75.2	$ 120,357.70	$ 9,045,241.16	
2.3	**Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ**	M3	80.8	$ 770,780.70	$ 62,279,080.56		M3	64.6	$ 786,450.90	$ 50,836,186.18	
2.3.1	Cemento Uso Estructural	Und	194.0	$ 36,000.00	$ 6,984,000.00		Und	155.2	$ 36,000.00	$ 5,587,200.00	
2.3.2	Arena Fina	M3	37.0	$ 87,954.00	$ 3,249,900.30		M3	29.6	$ 87,954.00	$ 2,599,920.24	
2.3.3	Grava	M3	57.5	$ 117,000.00	$ 6,729,840.00	**58.53%**	M3	46.0	$ 117,000.00	$ 5,383,872.00	**46.54%**
2.4	**Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)**	M3	37.5	$ 459,091.80	$ 17,215,942.50		M3	30.0	$ 341,917.60	$ 10,257,528.00	
2.4.1	Piedra Rajón	M3	7.0	$ 68,000.00	$ 476,000.00		M3	5.6	$ 68,000.00	$ 380,800.00	
2.4.2	Cemento Uso Estructural	Und	120.0	$ 36,000.00	$ 4,320,000.00		Und	96.0	$ 36,000.00	$ 3,456,000.00	
2.4.3	Arena Fina	M3	34.3	$ 87,954.00	$ 3,016,822.20		M3	27.4	$ 87,954.00	$ 2,413,457.76	
2.4.4	Grava	M3	44.1	$ 117,000.00	$ 5,159,700.00		M3	35.3	$ 117,000.00	$ 4,127,760.00	
2.5	**Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)**	KG	3601.1	$ 7,474.00	$ 26,914,764.57		KG	2880.9	$ 7,485.00	$ 21,563,501.50	
4	**MANO DE OBRA**				**$ 13,992,091.20**		**MANO DE OBRA**			**$ 9,794,463.84**	
4.1	Primera Quincena (Del 01 al 15 de junio 2024)				$ 2,098,813.68		Primera Quincena (Del 01 al 15 de junio 2024)			$ 2,098,813.68	
4.2	Segunda Quincena (Del 15 al 30 de junio 2024)				$ 3,498,022.80	7.09%	Segunda Quincena (Del 15 al 30 de junio 2024)			$ 3,498,022.80	**4.96%**
4.3	Tercera Quincena (Del 01 al 15 de julio 2024)				$ 4,197,627.36		Tercera Quincena (Del 01 al 15 de julio 2024)			$ 2,098,813.68	
4.4	Cuarta Quincena (Del 01 al 30 de julio 2024)				$ 4,197,627.36		Cuarta Quincena (Del 01 al 30 de julio 2024)			$ 2,098,813.68	
5	**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL**				**$ 4,310,144.00**		**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL**			$ -	0.00%
6	**GASTOS ADMINSTRATIVOS**				**$ 47,873,437.00**		**GASTOS ADMINSTRATIVOS**			**$ 30,845,479.50**	
6.1	**PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**				**$ 26,213,295.00**		**PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**			**$ 17,159,306.50**	
6.1.1	Residente de Obra (CPS)				$ 10,500,000.00		Residente de Obra (CPS)			$ 7,000,000.00	
6.1.2	Contador Público (CPS)				$ 4,200,000.00		Contador Público (CPS)			$ 2,100,000.00	
6.1.3	Maestro de obra (Nómina) + Carga Prestacional				$ 11,513,295.00		Maestro de obra (Nómina) + Carga Prestacional			$ 8,059,306.50	
6.2	**SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN**				**$ 2,343,110.00**		**SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN**			**$ 2,293,885.00**	
6.3	**MEDIDAS AMBIENTALES**				**$ 953,000.00**		**MEDIDAS AMBIENTALES**			**$ 953,000.00**	
6.4	**GASTOS BANCARIOS**				**$ 1,274,032.00**		**GASTOS BANCARIOS**			$ -	
6.5	**OTROS COSTOS**				**$ 17,090,000.00**	**24.25%**	**OTROS COSTOS**			**$ 10,439,288.00**	**15.63%**
6.5.1	Ensayos de Laboratorio				$ 700,000.00		Ensayos de Laboratorio			$ -	
6.5.2	Valla (1x2)				$ 350,000.00		Valla (1x2)			$ 340,000.00	
6.5.3	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños				$ 6,500,000.00		Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños			$ 6,500,000.00	
6.5.4	Topografía				$ 4,500,000.00		Topografía			$ -	
6.5.5	Bodega				$ 600,000.00		Bodega			$ 600,000.00	
6.5.6	Exámenes de ingreso personal nómina				$ 540,000.00		Exámenes de ingreso personal nómina			$ 518,400.00	
6.5.7	Pólizas				$ 1,800,000.00		Pólizas			$ 1,900,888.00	
6.5.8	Subsidio al dignatario para transporte				$ 1,200,000.00		Subsidio al dignatario para transporte			$ 280,000.00	
6.5.9	Caja menor-Papelería				$ 900,000.00		Caja menor-Papelería			$ 300,000.00	
7	**APORTE OAC**				**$ 1,000,000.00**	**0.51%**	**APORTE OAC**			$ -	0.00%
TOTALES					**$ 197,398,703.60**	**100.00%**	**TOTALES**			**$ 136,226,507.18**	**69.01%**

BITACORA DE OBRA

Fecha ¥ 29-06-2024
Estado del tiempo ¥ lluvioso.

Desarrollo de Actividades
• No se labo por mal estado del tiempo

Supervisor de obra ¥ Ramiro lugo.

Fecha ¥ 1/7/2024
Estado del tiempo ¥ Soleado
Desarrollo de Actividad
¥ Instalacion piedra pegada proporcion 60% concreto 3000 PSI, piedra 40% *Kotoi5-Kotoso

Maquinaria y Equipo ¥ mezcladora, Herramientas menores.
Personal en obra ¥ maestro., Ayudante de obra
Supervisor de obra ¥ Ramiro lugo.

Fecha ¥ 2/7/2024.
Estado del tiempo ¥ Soleado
Desarrollo de Actividad
¥ Desencofrado de formaleta, figuracion y Armado de Refuerzo

Maquinaria y Equipo ¥ Herramientas menores
personal en obra ¥ maestro, Ayudante de obra.

Supervisor de obra ¥ Ramiro lugo

Powered by CamScanner

Fecha : 3/7/2024
Estado del tiempo : Soleado
Desarrollo de Actividad
: Suministro y colocación de concreto 3000 PSI espesor 15 cm para placa huella Km 0+45 - Km 0+60

Maquinaria y Equipo : mezcladora; Herramiental menores
personal en obra : maestro, Ayudantes de obra

Supervisor de obra : Ramiro Lugo

Fecha : 4/7/2024.
Estado del tiempo : Soleado
Desarrollo de Actividad
: Instalación Piedra Pegada proporción 60% Concreto 3000 PSI, Piedra 40% Km 0+030 - Km 0+045

Maquinaria y Equipo : mezcladora y Herramientas menores
personal en obra : maestro, Ayudante de obra

Supervisor de obra : Ramiro Lugo

Fecha : 5/7/2024.
Estado del tiempo : lluvioso.
Desarrollo de Actividades.
: No se laboro.

Supervisor de obra : Ramiro Lugo

Fecha : 6/7/2024.
Estado del tiempo : lluvioso
Desarrollo de Actividad
: No se laboro por el mal estado del clima

Supervisor de obra : Ramiro Lugo

Powered by CamScanner

Fecha ¥ 8/7/2024
Estado del tiempo ¥ Soleado
Desarrollo de Actividad
¥ El dia de hoy se suspende Actividad de obra por parte de la mano de obra no calificada por falta de pago de sueldo.
Supervisor de obra : Ramiro lugo.

Fecha ¥ 16/7/2024.
Estado del tiempo ¥ Soleado
Desarrollo de Actividades
¥ Se retoman Actividades, Desencofrado de formaleta

Maquinaria y Equipo ¥ Herramientas menores.
personal de obra ¥ Maestro, Ayudante de obra

Supervisor de obra ¥ Ramiro lugo.

Fecha ¥ 17/7/2024.
Estado del Tiempo ¥ Soleado.
Desarrollo de Actividad.
¥ Figuración y Armado de refuerzos

maquinaria y Equipo ¥ Herramientas menores
personal en obra ¥ maestro, Ayudantes.

Supervisor de obra ¥ Ramiro lugo

Fecha ¥ 18/7/2024
Estado del tiempo ¥ lluvioso.
Desarrollo de Actividad
¥ No se trabajo por mal estado del clima.

Maquinaria y Equipo ¥ ninguna

Supervisor de obra ¥ Ramiro lugo.

Powered by CamScanner

Fecha : 19/7/2024
Estado del tiempo: Soleado
Desarrollo de Actividad
: Suministro y colocación de concreto de 3000 PSI espesor 15 cm para placa huella Ko+060 - Ko+075

Maquinaria y Equipo : mezcladora, Herramientas menores
personal en obra : maestro, Ayudante de obra.

Supervisor de obra : Ramiro Iugo

Fecha : 20/7/2024.
Estado del tiempo : lluvioso.
Desarrollo de Actividad
: NO se labora.
Supervisor de obra : Ramiro Iugo.

Fecha : 22/7/2024
Estado del tiempo. : Soleado
Desarrollo de Actividad
: Instalación piedra pegada, preparación 60% concreto 3000 PSI, piedra 40% Ko+045 - Ko+060.

Maquinaria y Equip. : mezcladora, Herramientas menores
personal en obra : maestro, Ayudante de obra.

Supervisor de obra : Ramiro Iugo.

Powered by CamScanner

Fecha : 23/7/2024
Estado del tiempo : Nublado
Desarrollo de Actividad
: Desencofrado, figurado y Armado de Acero para Refuerzo de losas.

Maquinaria y Equipo : Herramientas menores
personal en obra : maestro, Ayudantes.

Supervisor de obra : Ramiro Lugo

Fecha : 24/7/2024
Estado del tiempo : Soleado
Desarrollo de Actividad
: Instalación piedra pegada, proporción 60%.
Concreto 3000 PSI, piedra 40% Ko to Go - Ko to 75

Maquinaria y Equipo : mezcladora, Herramientas menores
personal de obra : Oficiales, Ayudante de obra.

Supervisor de obra : Ramiro Lugo

Fecha : 25/7/2024.
Estado del tiempo : Nublado.
Desarrollo de Actividades
: No se labora, no cuentan con material para la obra.

Supervisor de obra : Ramiro Lugo.

Fecha : 26/7/2024
Estado del tiempo : Soleado.
Desarrollo de Actividades.
: No se labora, no cuentan con material de obra

Supervisor de obra : Ramiro Lugo

Powered by CamScanner

Fecha 29/7/2024
Estado del tiempo y lluvioso.
Desarrollo de Actividades
y No se laboro por mal estado del Clima.

Supervisor de obra y Ramiro Lugo.

Fecha: 29/7/2024.
Estado del Clima y Nublado
Desarrollo de Actividades.
y Suministro y colocación de concreto 3000 PSI para losa espesor 15 cm, Ko+075- Ko+090.

Maquinaria y Equipo y mezcladora, Herramientas menores

Personal en obra y maestro. Ayudante de obra.
Supervisor de obra y Ramiro Lugo.

Fecha y 30/7/2024.
Estado del clima y lluvioso
Desarrollo de Actividades.
y Instalación piedra pegada, proporcion 60% concreto 3000 PSI, 40% piedra Ko+075- Ko+090.

Maquinaria y Equipo. y mezcladora, Herramientas menores.

Personal en obra y maestro, Ayudante de obra.
Supervisor de obra y Ramiro Lugo

Fecha y 31/7/2024.
Estado del Clima y lluvioso
Desarrollo de Actividades.
y No se laboro por el mal estado del Clima

Supervisor de obra y Ramiro Lugo

Powered by CamScanner

5. CONVENIO SOLIDARIO N°3924 DE 2023 JAC CORREGIMIENTO LOS LIMONES.

5.2. ESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

5.2.1. Localización

El municipio de Pueblo Nuevo, se encuentra en Colombia, específicamente en el Departamento de Córdoba. Está ubicado en la parte centro oriental del departamento, en la denominada subregión del San Jorge, en el Caribe Colombiano. Su extensión es de 819 Km2 y su cabecera municipal se encuentra a unos 63 Kilómetros de la ciudad de Montería, capital del Departamento. El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamento de Córdoba, corregimiento los limones. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Nuevo desde la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de Villa Clara 21 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°30’6"N y Longitud: 75°22'10,1"W; con punto de referencia final en el PR0+401 con coordenadas geográficas Latitud: 8°29'56,3"N y Longitud: 75°22'6,1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS

El Municipio de Pueblo Nuevo se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 8°30’18’’N
Longitud: 75°30’27’’O



Ilustración 4. Localización de la obra del convenio 3924 de 2023 - JAC Los Limones

5.2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Con la ejecución del proyecto, la población de las veredas ubicadas sobre la vía en Corregimiento de Los Limones; Es una zona predominantemente agropecuaria, ya que el sector agrícola se basa principalmente en la siembra de cultivos tradicionales y transitorios como el ajonjolí, arroz, maíz, frijol, y melón y en menor escala los cultivos anuales de ñame, plátano y yuca. Lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al municipio de Pueblo Nuevo.

5.2.3. Inventario y Estado Inicial de la vía.

El tramo por intervenir corresponde a 180 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material, adicionalmente se presenta obras de arte que requieren una intervención.

	
PR: 0+000 hasta el PR 0+ 401: Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS 06/07/2023)	PR: 0+000 hasta el PR 0+ 401: Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS 06/07/2023)

5.2.4. Inventario y Estado Inicial de la vía.

Según el Acta definitiva de Estudios y Diseños, suscrita el 30 de mayo de 2024, para presente Convenio Solidario, se tiene que:

- **Diseño geométrico:**

Según el Diseño Geométrico aprobado, las características de la Placa Huella serían las siguientes:

- Ancho de calzada: 5m
- Número de carriles: 2
- Ancho de carril: 1.8m
- Sobreancho: 0m
- Sentido del tráfico: Doble sentido
- Cuneta y Bordillo: 0.7m
- Huella: 0.90m Ciclópeo 0.90m
- Sobreancho Placa Huella 0.45m

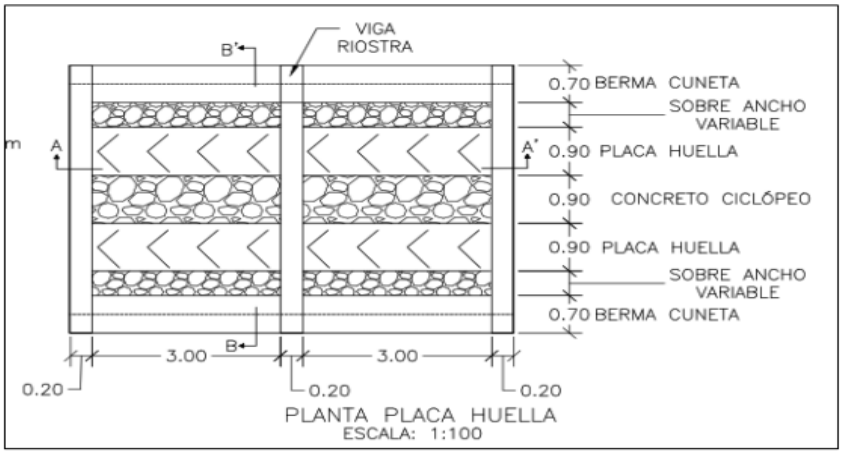



Imagen 5. Planta Placa Huella

Fuente: Vol I. Diseño Geométrico

- **Diseño Geotécnico:**

- Tipo de Suelo (SM), (CM) y (GM)
- CBR del terreno 2.27

Según el informe geotécnico se evidenció una capacidad portante del terreno menor al 3%, la cual es la mínima permitida para realizar la carpeta de mejoramiento con placa huella. Por tal motivo, el especialista geotécnico consideró que es necesario realizar un reemplazo de material seleccionado a lo largo del tramo, con un espesor al 10 cm. La estructura propuesta fue la siguiente:

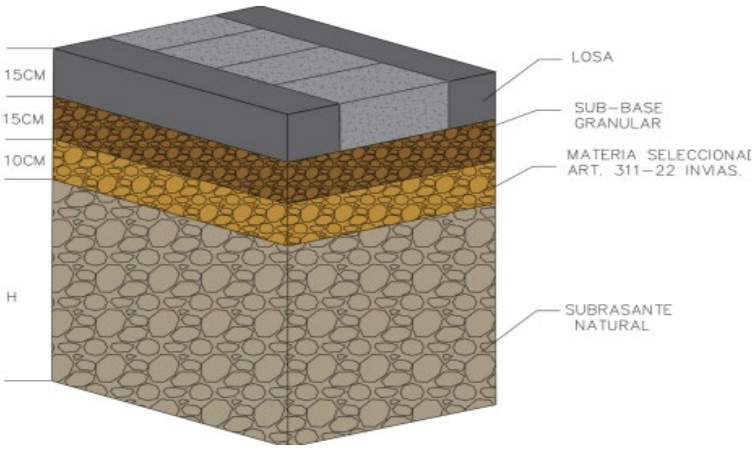

Fuente: Vol I. Diseño Geotécnico

- **Informe Hidrológico e Hidráulico:**

El Informe Hidráulico / Hidrológico, no arrojó la necesidad de construirse obras de arte en la zona, se tuvo una consideración de descargue de las escorrentías en caso de que los tramos viales fuesen mayor a 300 mts de longitud.

- **Diseño de transito**

Según el estudio de tránsito arrojo que, en el tiempo aforado, se evidenció circulación de vehículos de categoría C3, por lo tanto, la estructura se evaluó teniendo en cuenta los criterios con este vehículo de diseño.

En ese orden, se propuso que, basados en las memorias de cálculo del presupuesto inicial, la separación de las barras #3 (3/8”), era @0.20 m, esto se da en condiciones donde el tránsito de vehículos de categoría es menor que C3. Por tal motivo, se hizo un reajuste a estas separaciones, realizándolas a @0.15m, lo cual implicaría una mayor utilización de acero.

- **Alcance real.**

En ese orden de ideas, el alcance definitivo según los Estudios y Diseños realizados, y el balance de obra, se tiene lo siguiente:

MEJORAMIENTO VIAL	
PLACA HUELLA (m)	Box Coulvert 1X1 (UND)
126	N.A

5.3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

5.3.1. Información General de Convenio

CONVENIO SOLIDARIO	3924 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	13/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA
NIT:	901.702.020-9
VALOR INICIAL	$ 199.273.371
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-030173 del 19/12/2023
VALOR TOTAL	$ 199.273.371
FECHA DE INCIO	19/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	27/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	15/01/2024
SUSPENSIÓN No. 2	15/01/2024
REANUDACIÓN No. 2	23/01/2024
PRÓRROGA No. 1	26/01/2024
PRÓRROGA No. 2	30/04/2024
PRÓRROGA No. 3	13/06/2024
PRÓRROGA No. 4	30/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 31/08/2024

5.3.2. Descripción de actividades.

- Durante el presente periodo, no se realizó comité operativo de compras, dado que las actividades se enfocaron en la ejecución de la obra, las cuales fueron:

- Mejoramiento de subrasante y conformación de calzada.

- Figuración de acero para vigas riostras y acero longitudinal y transversal en parrilla para huellas de concreto.

- Acopio de material triturado y arena para dosificación de concreto.

5.3.3. Seguimiento Items No Previstos.

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

5.3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Se efectuarán los comités operativos dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentarán comparativos acompañados de cotizaciones y se realizará la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

Se solicitará un plan de contingencia, para superar los atrasos presentados durante la etapa de pre construcción, dado que, ya iniciadas las actividades de obra, el Convenio Solidario alce un avance físico del 100,00% antes de finalizar la fecha contractual.
La interventoría garantiza que la Junta realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en garantizar la participación de la comunidad mediante una contratación directa con la Junta y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.
Por lo anterior, con el inicio de las actividades de obra, se realizará seguimiento y control , técnico, administrativo, ambiental y social a todas las actividades realizadas.
En ese orden de ideas, la interventoría velará para que la Junta de Acción Comunal, garantice el cumplimiento de los requisitos establecidas en las especificaciones técnica del Convenio Solidario.

5.4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

5.4.1. Informes Semanales.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento de los informes semanales, así:

- Informe Semanal 23: desde el 28 de junio al 04 de julio de 2024.
- Informe Semanal 24: desde el 05 al 11 de julio de 2024.
- Informe Semanal 25: desde el 12 al 18 de julio de 2024.
- Informe Semanal 26: desde el 19 al 25 de julio de 2024.
- Informe Semanal 27: desde el 26 de julio al 01 de agosto de 2024.

Se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

5.4.2. Maquinaria y Equipo.

Se adjunta MEPI “MAQUINARIA Y EQUIPO”, con la relación de Maquinaria y Equipo utilizado durante el presente periodo.

5.4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Durante el presente periodo, la JAC NO presentó cuentas de cobros de profesionales y de mano de obra no calificada.

Por lo anterior, se anexa el formato de “PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL”, sin la relación de personal.

5.4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el convenio solidario No. 3924 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: “EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023”, por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 156623 de fecha 2023-08-30. Se hizo el registro presupuestal por valor $ 198.273.371 para el contrato principal; discriminado en C-

2402-0600-14-0-2402041-02.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa el formato “PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS”.

Se anexa el formato “INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS”.

Se anexa el formato “ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS”.

5.4.5. Estado general del tiempo

Se anexa formato “ESTADO GENERAL DEL TIEMPO”, con la relación pluviométrica del presente periodo.

5.4.6. Resumen ensayos de laboratorios

Durante el mes de julio de 2024, la JAC no presentó los resultados de los ensayos de laboratorio. Se espera que para el próximo periodo se entregue la documentación por parte de la JAC.

No se anexa el formato “RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO”

5.4.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes:
Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 3018839 certificado No. 0 de fecha 15/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1012678 certificado No. 0 de fecha 15/11/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 39.854.674,00	13/10/2023	31/10/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 59.782.011,00	31/12/2023	31/12/2028

PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.963.669,00	13/10/2023	31/12/2026
TOTAL		**$ 109.600.354,00**		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	13/10/2023	31/12/2023

En relación a las pólizas correspondientes a la prórroga N°1: Póliza de cumplimiento No. 3018839, certificado No. 5 de fecha 10/04/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1012678 certificado No. 2 de fecha 10/04/2024

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 39.854.674,00	19/12/2023	27/11/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 59.782.011,00	27/01/2024	27/01/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.963.669,00	19/12/2023	27/01/2027
TOTAL		**$ 109.600.354,00**		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	01/01/2024	30/04/2024

Se anexa el formato “SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS”

5.4.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

5.4.9. Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta la programación No. 4 presentada por el ingeniero residente de obra y basada en la nueva fecha de terminación de la prórroga N°4, se tiene a la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución del 10%

con respecto a un porcentaje programado del 25,33% del proyecto.

Lo anterior, se debe a que las fuertes precipitaciones presentadas en la zona del proyecto, han generado dificultades para avanzar significativamente con las actividades en obra, lo que se traduce a se presenten atrasos en el Convenio Solidario.

Así mismo, se presentaron inconvenientes y demoras en los tramites de cotizaciones por parte de la JAC, en la etapa de pre construcción, debido a que no se presentaba la documentación completa a la interventoría para poder sustentar los desembolsos.

- De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: “El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC”.

  Con el fin de realizar un seguimiento y control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizó un balance de obra de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante un acta de modificación de cantidades para convenios.

- Actas comités de obra y reuniones: durante el periodo reportado NO se realizaron reuniones ni comités de obra.

ANEXOS

CONVENIO SOLIDARIO N°3924 DE 2023

JAC CORREGIMIENTO LOS LIMONES

INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO LOS LIMONES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA | SEMANA No.: 23 del 28 al 4 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO CASTRO GARZON

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 126 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamento del Cordoba, corregimiento los limones. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Nuevo desde la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de Villa Clara 21 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°30'6"N y Longitud: 75°22'10,1"W; con punto de referencia final en el PR0+401 con coordenadas geográficas Latitud: 8°29'56,3"N y Longitud: 75°22'6,1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos obras de drenaje boxcoulver de 1x1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

CONVENIO No.: 3924-2023 | VALOR INICIAL: $ 199,273,371.00

FECHA DE INICIO: 19-dic-23 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: $ 199,273,371.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

INTEGRANTES: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

CONTRATO No.: 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 205,455,880.00

FECHA DE INICIO: 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: $ 205,455,880.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-24 | VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,273,371			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,273,371			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 205,455,880			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 205,455,880			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198,273,371.00	100.0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 119,043,331.95	60.04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 57,431,635.00	28.97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (79,230,039.05)	-39.96%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 19,704,847.00	9.94%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 119,043,331.95	60.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 77,136,482.00	38.90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (41,906,849.95)	-21.14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ (11,896,159.69)	-6.0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,431,635.00	4%

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario, compra de materiales y alquiler de maquinaria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184,910,292.00	90.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179,878,782.00	87.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,109,117.60	2.22%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,878,782.00	2.71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: JUNIO

VALOR FACTURA: $ 54,112,870.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En trámite Acta N°6 junio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 53% | Avance o Atraso Físico %: 44%

Meta Física Ejecutada %: 9.0%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELA	M	126
*	BOX CULVERT	Unidad	N/A
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	53%				53.0%
Ejec	9%				9.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Vereda Los Limones | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Emiro de Jesus Perez Zapata 2.9 Km de la via que conduce e Corozal a Sincelejo, a 560 metros del Peaje Las Flores, a la margen izquiera, Departamento de Sucre	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: En relación a la cantera Los Mimbres, esta corresponde a una Licencia Ambiental Temporal , por el término de duración de la vigencia del trámite de formalización minera No. OCD-16591, y dos (2) meses adicionales, después de otorgado el contrato de concesión minera o la anotación del subcontrato en el Registro Minero Nacional, término en el cual deberá presentarse por el interesado la solicitud de licencia ambiental global o definitiva.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: En el convenio se realizò la reutilizaciòn del material en el mejoramiento de tramos para el paso de volquetas, no se cuenta con permisos ambientales debido a que es un contrato de baja complejidad, en cuanto al consumo de agua, se hace por medio de reservorios artificiales que no se encuentran conectados a fuentes hidricas y el personal utiliza las USF de las viviendas aledañas al proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 4

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se cuenta con 1ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Inicio de actividades de excavacion y movimiento de tierras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de excavacion.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	PR0 +000	Box 1x1		Box 1x1	PR0+126
Programado					
Ejecutado					

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO LOS LIMONES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA | SEMANA No.: 24 del 5 al 11 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO CASTRO GARZON

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 126 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamento del Cordoba, corregimiento los limones. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Nuevo desde la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de Villa Clara 21 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°30'6"N y Longitud: 75°22'10,1"W; con punto de referencia final en el PR0+401 con coordenadas geográficas Latitud: 8°29'56,3"N y Longitud: 75°22'6,1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos obras de drenaje boxcoulver de 1x1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

CONVENIO No.: 3924-2023 | VALOR INICIAL: $ 199,273,371.00

FECHA DE INICIO: 19-dic-23 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: $ 199,273,371.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

INTEGRANTES: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

CONTRATO No.: 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 205,455,880.00

FECHA DE INICIO: 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: $ 205,455,880.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-24 | VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,273,371			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,273,371			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 205,455,880			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 205,455,880			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198,273,371.00	100.0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 119,043,331.95	60.04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 77,431,635.00	39.05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (79,230,039.05)	-39.96%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 19,704,847.00	9.94%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 119,043,331.95	60.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 97,136,482.00	48.99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (21,906,849.95)	-11.05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ (63,447,478.72)	-32.0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20,000,000.00	10%

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario, compra de materiales y alquiler de maquinaria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 191,073,968.40	93.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 185,378,782.00	90.23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,163,676.40	3.0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5,500,000.00	3.0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: JUNIO

VALOR FACTURA: $ 54,112,870.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En trámite Acta N°6 junio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 64% | Avance o Atraso Físico %: 50%

Meta Física Ejecutada %: 14%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELA	M	126
*	BOX CULVERT	Unidad	N/A
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	64%				64.0%
Ejec	14%				14.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Minicargador	1	1
Vibrdor de Concreto	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Vereda Los Limones

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Emiro de Jesus Perez Zapata 2.9 Km de la via que conduce e Corozal a Sincelejo, a 560 metros del Peaje Las Flores, a la margen izquiera, Departamento de Sucre	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: En relación a la cantera Los Mimbres, esta corresponde a una Licencia Ambiental Temporal , por el término de duración de la vigencia del trámite de formalización minera No. OCD-16591, y dos (2) meses adicionales, después de otorgado el contrato de concesión minera o la anotación del subcontrato en el Registro Minero Nacional, término en el cual deberá presentarse por el interesado la solicitud de licencia ambiental global o definitiva.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: En el convenio se realizò la reutilizaciòn del material en el mejoramiento de tramos para el paso de volquetas, no se cuenta con permisos ambientales debido a que es un contrato de baja complejidad, en cuanto al consumo de agua, se hace por medio de reservorios artificiales que no se encuentran conectados a fuentes hidricas y el personal utiliza las USF de las viviendas aledañas al proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin presentar a la fecha por parte del contratista

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 4

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Corregimiento Los Limones

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades de excavacion y nivelacion del terreno.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de excavacion.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	PR0 +000	Box 1x1		Box 1x1	PR0+126
Programado					
Ejecutado					

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO LOS LIMONES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 25 del 12 al 18 — Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO CASTRO GARZON

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 126 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamento del Cordoba, corregimiento los limones. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Nuevo desde la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de Villa Clara 21 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°30'6"N y Longitud: 75°22'10,1"W; con punto de referencia final en el PR0+401 con coordenadas geográficas Latitud: 8°29'56,3"N y Longitud: 75°22'6,1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos obras de drenaje boxcoulver de 1x1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

CONVENIO No.: 3924-2023 — VALOR INICIAL: $ 199,273,371.00

FECHA DE INICIO: 19-dic-23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 — VALOR ACUMULADO: $ 199,273,371.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

INTEGRANTES: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

CONTRATO No.: 5081 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 205,455,880.00

FECHA DE INICIO: 30-dic-23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 — VALOR ACUMULADO: $ 205,455,880.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-24 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,273,371			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,273,371			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 205,455,880			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 205,455,880			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198,273,371.00	100.0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 119,043,331.95	60.04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 85,431,635.00	43.09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (79,230,039.05)	-39.96%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 19,704,847.00	9.94%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 119,043,331.95	60.04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 105,136,482.00	53.03%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (13,906,849.95)	-7.01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38,500,000.00	19.4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8,000,000.00	4.0%

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario, compra de materiales y alquiler de maquinaria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 195,183,086.00	95.0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 191,878,782.00	93.4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,272,794.00	5.0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,500,000.00	3.4%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: JUNIO

VALOR FACTURA: $ 54,112,870.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En trámite Acta N°6 junio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 75% — Avance o Atraso Físico %: 58%

Meta Física Ejecutada %: 17%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* PLACA HUELA	M	126
* BOX CULVERT	Unidad	N/A
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	75%				75.0%
Ejec	17%				17.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Minicargador	1	1
Vibrdor de Concreto	1	1
Total	2	2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Vereda Los Limones

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Emiro de Jesus Perez Zapata 2.9 Km de la via que conduce e Corozal a Sincelejo, a 560 metros del Peaje Las Flores, a la margen izquiera, Departamento de Sucre	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO X	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: En relación a la cantera Los Mimbres, esta corresponde a una Licencia Ambiental Temporal , por el término de duración de la vigencia del trámite de formalización minera No. OCD-16591, y dos (2) meses adicionales, después de otorgado el contrato de concesión minera o la anotación del subcontrato en el Registro Minero Nacional, término en el cual deberá presentarse por el interesado la solicitud de licencia ambiental global o definitiva.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES: En el convenio se realizò la reutilizaciòn del material en el mejoramiento de tramos para el paso de volquetas, no se cuenta con permisos ambientales debido a que es un contrato de baja complejidad, en cuanto al consumo de agua, se hace por medio de reservorios artificiales que no se encuentran conectados a fuentes hidricas y el personal utiliza las USF de las viviendas aledañas al proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin presentar a la fecha por parte del contratista

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Corregimiento Los Limones

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se tiene a la fecha excavacion al 100% y relleno al 100%.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de cereo manual y colocacion de rieles para iniciar fundida de placas de concreto.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	PR0 +000	Box 1x1		Box 1x1	PR0+126
Programado					
Ejecutado					

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO LOS LIMONES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA | SEMANA No.: 26 del 19 al 25 | Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO CASTRO GARZON

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 126 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamento del Cordoba, corregimiento los limones. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Nuevo desde la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de Villa Clara 21 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°30'6"N y Longitud: 75°22'10,1"W; con punto de referencia final en el PR0+401 con coordenadas geográficas Latitud: 8°29'56,3"N y Longitud: 75°22'6,1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos obras de drenaje boxcoulver de 1x1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

CONVENIO No.: 3924-2023 | VALOR INICIAL: $ 199,273,371.00

FECHA DE INICIO: 19-dic-23 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: $ 199,273,371.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

INTEGRANTES: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

CONTRATO No.: 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 205,455,880.00

FECHA DE INICIO: 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: $ 205,455,880.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-24 | VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,273,371			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,273,371			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 205,455,880			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 205,455,880			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198,273,371.00	100.0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 148,705,028.25	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 97,431,635.00	49.14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (49,568,342.75)	-25.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 19,704,847.00	9.94%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 148,705,028.25	75.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 117,136,482.00	59.08%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (31,568,546.25)	-15.92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,433,062.44	12.3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,000,000.00	6%

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario, compra de materiales y alquiler de maquinaria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199,292,203.60	97.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199,078,782.00	96.90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8,218,235.20	4.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,200,000.00	3.62%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: JUNIO

VALOR FACTURA: $ 54,112,870.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En trámite Acta N°6 junio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 75% | Avance o Atraso Físico %: -58%

Meta Física Ejecutada %: 17%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELA	M	126
*	BOX CULVERT	Unidad	N/A
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	75%				75.0%
Ejec	17%				17.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Minicargador	1	1
Vibrdor de Concreto	1	1
Mezcladora de Concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Vereda Los Limones | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Emiro de Jesus Perez Zapata 2.9 Km de la via que conduce e Corozal a Sincelejo, a 560 metros del Peaje Las Flores, a la margen izquiera, Departamento de Sucre	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO X	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: En relación a la cantera Los Mimbres, esta corresponde a una Licencia Ambiental Temporal , por el término de duración de la vigencia del trámite de formalización minera No. OCD-16591, y dos (2) meses adicionales, después de otorgado el contrato de concesión minera o la anotación del subcontrato en el Registro Minero Nacional, término en el cual deberá presentarse por el interesado la solicitud de licencia ambiental global o definitiva.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES: En el convenio se realizò la reutilizaciòn del material en el mejoramiento de tramos para el paso de volquetas, no se cuenta con permisos ambientales debido a que es un contrato de baja complejidad, en cuanto al consumo de agua, se hace por medio de reservorios artificiales que no se encuentran conectados a fuentes hidricas y el personal utiliza las USF de las viviendas aledañas al proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Corregimiento Los Limones

OBSERVACIONES: Se cuenta con 1ingeniero residente, 1 maestro de obra y 1 contador.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Mejoramiento de la subrasante.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se iniciaran olas activiades de concreto del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	PR0 +000	Box 1x1		Box 1x1	PR0+126
Programado					
Ejecutado					

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL JAC CORREGIMIENTO LOS LIMONES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA | SEMANA No.: 27 del 26 al 1 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN PABLO CASTRO GARZON

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOS LIMONES DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en la construcción de 126 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pueblo Nuevo del departamento del Cordoba, corregimiento los limones. Para acceder al tramo de vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Pueblo Nuevo desde la tienda Nápoles ubicada en la calle 16 con cra 6 y partimos por la vía terciaria hacia la vereda de Villa Clara 21 km donde se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°30'6"N y Longitud: 75°22'10,1"W; con punto de referencia final en el PR0+401 con coordenadas geográficas Latitud: 8°29'56,3"N y Longitud: 75°22'6,1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante la construcción de 140 metros de Placa Huella y dos obras de drenaje boxcoulver de 1x1m, todas estas obras se realizarán dentro del tramo levando en campo parte del equipo técnico del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES

CONVENIO No.: 3924-2023 | VALOR INICIAL: $ 199,273,371.00

FECHA DE INICIO: 19-dic-23 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: $ 199,273,371.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ago-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

INTEGRANTES: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

CONTRATO No.: 5081 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 205,455,880.00

FECHA DE INICIO: 30-dic-23 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 | VALOR ACUMULADO: $ 205,455,880.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ago-24 | VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,273,371			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,273,371			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 205,455,880			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 205,455,880			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198,273,371.00	100.0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 49,568,342.75	25.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 108,931,635.00	54.94%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (148,705,028.25)	-75.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 19,704,847.00	9.94%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 49,568,342.75	25.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 128,636,482.00	64.88%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 79,068,139.25	39.88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,343,014.09	12.3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11,500,000.00	5.80%

Observaciones: El avance financiero corresponde al pago de los profesionales,: Ingeniero residente de obra y contador de la OAC, pago parcial de tranporte al dignatario, compra de materiales y alquiler de maquinaria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 203,401,321.20	99.0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 197,078,782.00	95.9%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,109,117.60	2.0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5,200,000.00	2.64%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: JUNIO

VALOR FACTURA: $ 54,112,870.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En trámite Acta N°6 junio

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 75% | Avance o Atraso Físico %: -58%

Meta Física Ejecutada %: 17%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELA	M	126
*	BOX CULVERT	Unidad	N/A
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	75%				75.0%
Ejec	17%				17.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Minicargador	1	1
Vibrdor de Concreto	1	1
Mezcladora de Concreto	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Centro Poblado Vereda Los Limones

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Emiro de Jesus Perez Zapata 2.9 Km de la via que conduce e Corozal a Sincelejo, a 560 metros del Peaje Las Flores, a la margen izquiera, Departamento de Sucre	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: En relación a la cantera Los Mimbres, esta corresponde a una Licencia Ambiental Temporal , por el término de duración de la vigencia del trámite de formalización minera No. OCD-16591, y dos (2) meses adicionales, después de otorgado el contrato de concesión minera o la anotación del subcontrato en el Registro Minero Nacional, término en el cual deberá presentarse por el interesado la solicitud de licencia ambiental global o definitiva.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: En el convenio se realizò la reutilizaciòn del material en el mejoramiento de tramos para el paso de volquetas, no se cuenta con permisos ambientales debido a que es un contrato de baja complejidad, en cuanto al consumo de agua, se hace por medio de reservorios artificiales que no se encuentran conectados a fuentes hidricas y el personal utiliza las USF de las viviendas aledañas al proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En tramite

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Excavacion, mejoramiento de la sbrasante y conformacion de la calzada.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades en concreto.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	PR0 +000	Box 1x1		Box 1x1	PR0+126
Programado					
Ejecutado					

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Realizar seguimiento y control a las actividades que se encuentran en ruta crítica para dar inicio al convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER BARRERO MOSSOS

Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MAQUINARIA Y EQUIPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3924-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081-2022

INTERVENTORÍA: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Mini cargador	Bobcar linea S530		LOS LIMONES	X	X		X		X		X			X	X			X	X		X		X		X	X		X		X		X	X
Carrotanque de agua		100L	LOS LIMONES	X		X		X	X		X		X		X	X		X	X			X	X			X		X		X		X	X
Volqueta		15M3	LOS LIMONES	X		X		X			X		X		X			X	X	X		X			X	X			X			X	X
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				3	1	2	1	2	2	0	3	0	2	1	3	1	0	3	3	1	1	2	2	0	2	3	0	2	1	2	0	3	3
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	49	100,0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	18	100,0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

DESDE EL 11 DE JUNIO INICIARON LAS ACTIVIDADES MOVIMIENO DE TIERRAS.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: OSCAR ALBERTO BULA ESPINOSA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-36827 COR

Firma

Nombre: YEISON DE JESUS QUINTERO MANTINEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No: 22202-434974 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONVENIO No: 3756-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMNAL COREGIMIENTO LOS LIMONES.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5081-2022 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LIMITADA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																									
2																																									
3																																									
4																																									
5																																									
6																																									
7																																									
8																																									
9																																									
10																																									
N																																									

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

Durante este periodo no se realizó comité de compras.

El contratista adjunta la certificación de fecha 31/07/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RAFAEL ENRIQUE DE LA HOZ RODRIGUEZ.
Representante Legal Organismo de Accion Comunal.

Firma
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

- ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO
- INFORME INVERSIÓN MANEJO DESEMBOLSO
- PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3924-2023
(Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 3-2767-0002051 **BANCO** BANCO AGRARIO SUCURSAL: PUEBLO NUEVO

DESEMBOLSO OTORGADO: 58,63%

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 116.243.283,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC CORREGIMIENTO LOS LIMONES.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5081-2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CHEQUE	1	10-abr-23	LUZ ELENA SERPA MARTINEZ	$ 340.000,00	6	Valla 1x2
CHEQUE	2	10-abr-23	KATIA MILENA RAMOS DORIA	$ 3.186.537,00	6	Pago 50% elaboracion de estudios y diseños
CHEQUE	3	12-abr-24	KATIA MILENA RAMOS DORIA	$ 3.186.537,00	6	Pago 50% elaboracion de estudios y diseños
CHEQUE	4	12-abr-24	EFRAIR JOSE ARIZA QUINTANA	$ 2.100.000,00	6	Pago honorarios contador
CHEQUE	5	12-abr-24	AURORA NOVA SAS	$ 2.293.885,00	6	Seguridad industrial y dotacion
CHEQUE	6	12-abr-24	AURORA NOVA SAS	$ 953.000,00	6	Medidas ambientales
CHEQUE	7	12-abr-24	YEISON QUINTERO MARTINEZ	$ 3.500.000,00	6	Pago honorarios residente de obra
Cuenta de cobro	8	12-abr-24	RAFAEL DE LA HOZ HERNANDEZ	$ 240.000,00	6	Caja menor
Cuenta de cobro	9	12-abr-24	AURORA NOVA SAS	$ 17.483.999,00	1	Alqulier de Maquinaria
Cuenta de cobro	10	12-abr-24	ANA RICARDO ALTAMIRANDA	$ 300.000,00	6	Alquier de bodega
Cuenta de cobro	11	6-may-24	RAFAEL DE LA HOZ HERNANDEZ	$ 1.884.453,00	6	Devolucion pago de polizas
Cuenta de cobro	12	6-may-24	AURORA NOVA SAS	$ 79.947.636,00	2	MATERIALES (70%)
Cuenta de cobro	13	6-may-24	SERVISALUD Y ALIMENTOS IPS SAS	$ 660.000,00	6	EXAMENES MEDICOS
Cuenta de cobro	13	6-may-24	RAFAEL DE LA HOZ HERNANDEZ	$ 167.236,00	6	Devolucion pago de polizas

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 48.002.979,00	$ 18.811.648,00	$ -	$ 18.811.648,00	$ 29.191.331,00
1_2	MATERIALES Y MAQUINARIA	$ 145.893.584,00	$ 97.431.635,00		$ 97.431.635,00	$ 48.461.949,00
	TOTALES	$ 193.896.563,00	$ 116.243.283,00	$ -	$ 116.243.283,00	$ 77.653.280,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (6) : JULIO 2024 $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

SE SOLICITO A LA JAC, CONTACTARSE CON LA ENTIDAD BANCARIA, PARA HACER LA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DIRECCION DEL TESORO PUBLICO. A LA FECHA DEL INFORME SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DICHA GESTIÓN.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal**.

Firma:
Nombre: RAFAEL ENRIQUE DE LA HOZ RODRIGUEZ.
Representante Legal Organismo de Acción Comunal
Contratista

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** jul-24

ACTA FINAL ☐

CONVENIO No : 3924-2023 (Indique número y año)

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5081-2023 INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LIMITADA

PLAZO INICIAL: 0.33 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 8,50 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 20/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 199.273.371,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 199.273.371,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	600.1.1	600-13	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,8	$ 21.819,00	$ 104.731,20						
2	320.3	320-13	Subbase Granular Clase C	M3	126,7	$ 184.935,70	$ 23.431.353,19						
3	630.1.4.1	630-13	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	102,4	$ 838.876,00	$ 85.900.902,40						
4	630.1.7	630-13	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	23,1	$ 384.706,40	$ 8.886.717,84						
5	640.1	640-13	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4680	$ 5.891,00	$ 27.569.880,00						
ÍTEM NO PREVISTOS													
			SUB-TOTAL BASICO DE OBRA				$ 145.893.584,63						
*			**PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)**				$ 4.376.808,00						
*			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**				$ 48.002.979,00						
*			**APORTE OAC**				$ 1.000.000,00						
*			**VALOR TOTAL**				$ 199.273.371,63						

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUB-TOTAL BASICO DE OBRA	$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

VALOR PRESENTE ACTA: $ - **VALOR EN LETRAS:** CERO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: RAFAEL ENRIQUE DE LA HOZ RODRIGUEZ.
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: YEISON DE JESUS QUINTERO MARTINEZ.
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No: 22202-434974 COR

Firma:
Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No: 25202-62095 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

BALANCE DEL DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL MES DE JULIO DE 2024
JAC LIMONES

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA PROYECTADO (A)				%				VALOR PROGRAMA EJECUTADO (B)	%
	Descripcción de Items	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (Según Propuesta Económica Aprobada)	Valor Total		Unidad	Cantidad Ejecutada	Valor Unitario (Según Propuesta Ecomica Aprobada)		
1	**EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**				**$ 17,660,604.44**					**$ 3,336,351.00**	
1.1	Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo	Und	1	$ 513,159.00	$ 513,159.00		Und	1	$ 13,159.00	$ 13,159.00	
1.2	Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3	Und	1	$ 2,534,203.00	$ 2,534,203.00		Und	1	$ 34,203.00	$ 34,203.00	
1.3	Carrotanque de agua(1000 Galones)	Und	1	$ 1,383,181.00	$ 1,383,181.00		Und	1	$ 373,204.00	$ 373,204.00	
1.4	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton	Und	1	$ 5,876,243.00	$ 5,876,243.00		Und	1	$ 894,207.00	$ 894,207.00	
1.5	Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton	Und	1	$ 2,097,778.00	$ 2,097,778.00	**8.84%**	Und	1	$ 628,654.00	$ 628,654.00	**1.67%**
1.6	Aspersor manual de 20 litros	Und	1	$ 267,921.39	$ 267,921.39		Und	1	$ 267,921.00	$ 267,921.00	
1.7	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros	Und	1	$ 1,045,071.00	$ 1,045,071.00		Und	1	$ 545,071.00	$ 545,071.00	
1.9	Mezcladora de concreto tipo trompo	Und	1	$ 3,638,391.00	$ 3,638,391.00		Und	1	$ 275,275.00	$ 275,275.00	
1.10	Cizalla manual de 90 cm	Und	1	$ 304,657.05	$ 304,657.05		Und	1	$ 304,657.00	$ 304,657.00	
2	**MATERIALES**				**$ 114,853,198.56**					**$ 22,993,909.28**	
2.1	**Excavaciones Varias sin Clasificar**	M3	687.1	$ 21,819.00	$ 14,992,532.38		M3	137.4	$ 21,819.00	$ 2,998,506.48	
2.2	**Subbase Granular Clase C**	M3	117.0	$ 94,760.50	$ 11,086,978.50		M3	23.4	$ 120,357.70	$ 2,816,370.18	
2.3	**Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ**	M3	80.8	$ 770,780.70	$ 62,279,080.56		M3	16.2	$ 786,450.90	$ 12,709,046.54	
2.3.1	Cemento Uso Estructural	Und	180.0	$ 36,000.00	$ 6,480,000.00		Und	36.0	$ 36,000.00	$ 1,296,000.00	
2.3.2	Arena Fina	M3	35.0	$ 87,954.00	$ 3,078,390.00		M3	7.0	$ 87,954.00	$ 615,678.00	
2.3.3	Grava	M3	52.0	$ 117,000.00	$ 6,084,000.00	**57.46%**	M3	10.4	$ 117,000.00	$ 1,216,800.00	**11.50%**
2.4	**Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)**	M3	35.5	$ 459,091.80	$ 16,297,758.90		M3	7.1	$ 341,917.60	$ 2,427,614.96	
2.4.1	Piedra Rajón	M3	7.0	$ 68,000.00	$ 476,000.00		M3	1.4	$ 68,000.00	$ 95,200.00	
2.4.2	Cemento Uso Estructural	Und	100.0	$ 36,000.00	$ 3,600,000.00		Und	20.0	$ 36,000.00	$ 720,000.00	
2.4.3	Arena Fina	M3	27.0	$ 87,954.00	$ 2,374,758.00		M3	5.4	$ 87,954.00	$ 474,951.60	
2.4.4	Grava	M3	38.0	$ 117,000.00	$ 4,446,000.00		M3	7.6	$ 117,000.00	$ 889,200.00	
2.5	**Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)**	KG	1364.3	$ 7,474.00	$ 10,196,848.22		KG	272.9	$ 7,485.00	$ 2,042,371.12	
4	**MANO DE OBRA**				**$ 13,992,091.20**		**MANO DE OBRA**			**$ 5,596,836.48**	
4.1	Primera Quincena (Del 01 al 15 de junio 2024)				$ 2,098,813.68		Primera Quincena (Del 01 al 15 de junio 2024)			$ 2,098,813.68	
4.2	Segunda Quincena (Del 15 al 30 de junio 2024)				$ 3,498,022.80	**7.00%**	Segunda Quincena (Del 15 al 30 de junio 2024)			$ 3,498,022.80	**2.80%**
4.3	Tercera Quincena (Del 01 al 15 de julio 2024)				$ 4,197,627.36		Tercera Quincena (Del 01 al 15 de julio 2024)			$ -	
4.4	Cuarta Quincena (Del 01 al 30 de julio 2024)				$ 4,197,627.36		Cuarta Quincena (Del 01 al 30 de julio 2024)			$ -	
5	**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL**				**$ 4,376,808.00**		**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL**			$ -	**0.00%**
6	**GASTOS ADMINSTRATIVOS**				**$ 48,002,979.00**		**GASTOS ADMINSTRATIVOS**			**$ 18,430,048.00**	
6.1	**PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**				**$ 26,213,295.00**		**PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**			**$ 5,600,000.00**	
6.1.1	Residente de Obra (CPS)				$ 10,500,000.00		Residente de Obra (CPS)			$ 3,500,000.00	
6.1.2	Contador Público (CPS)				$ 4,200,000.00		Contador Público (CPS)			$ 2,100,000.00	
6.1.3	Maestro de obra (Nómina) + Carga Prestacional				$ 11,513,295.00		Maestro de obra (Nómina) + Carga Prestacional			$ -	
6.2	**SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN**				**$ 2,343,110.00**		**SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN**			**$ 2,293,885.00**	
6.3	**MEDIDAS AMBIENTALES**				**$ 953,000.00**		**MEDIDAS AMBIENTALES**			**$ 953,000.00**	
6.4	**GASTOS BANCARIOS**				**$ 1,283,574.00**		**GASTOS BANCARIOS**			$ -	
6.5	**OTROS COSTOS**				**$ 17,210,000.00**	**24.02%**	**OTROS COSTOS**			**$ 9,583,163.00**	**9.22%**
6.5.1	Ensayos de Laboratorio				$ 700,000.00		Ensayos de Laboratorio			$ -	
6.5.2	Valla (1x2)				$ 350,000.00		Valla (1x2)			$ 340,000.00	
6.5.3	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños				$ 6,500,000.00		Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños			$ 6,373,074.00	
6.5.4	Topografía				$ 4,500,000.00		Topografía			$ -	
6.5.5	Bodega				$ 600,000.00		Bodega			$ 300,000.00	
6.5.6	Exámenes de ingreso personal nómina				$ 660,000.00		Exámenes de ingreso personal nómina			$ 518,400.00	
6.5.7	Pólizas				$ 1,800,000.00		Pólizas			$ 2,051,689.00	
6.5.8	Subsidio al dignatario para transporte				$ 1,200,000.00		Subsidio al dignatario para transporte			$ -	
6.5.9	Caja menor-Papelería				$ 900,000.00		Caja menor-Papelería			$ -	
7	**APORTE OAC**				**$ 1,000,000.00**	**0.50%**	**APORTE OAC**			$ -	0.00%
TOTALES					**$ 199,885,681.20**	**100.00%**	**TOTALES**			**$ 50,357,144.76**	**25.19%**

SEGUIMIENTO A GARANTÍAS Y SEGURO CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONVENIO No. 3924-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES.

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.273.371,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.273.371,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5081-2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TECNICA SOTA LIMITADA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 39.854.674	13 10 2023	31 10 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.963.669	13 10 2023	31 10 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.782.011	31 12 2023	31 10 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3018839

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	171.79 SMLV	$ 232.000.000,00	13 10 2023	31 12 2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 10126678 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.854.674,20	19	12	2023	28	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.963.668,55	30	4	2024	30	4	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.782.011,30	19	12	2023	30	4	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3018839

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVIOSRA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	171.79 SMLV	$ 260.000.000,00	1	1	2024	30	4	2024
Otros	N/A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 10126678 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/04/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-62095 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DURANTE EL PRESENTE PERIDO NO SE REALIZÓ COMITE OPERATIVO

BITACORA DE OBRA

03/04/24 Se realiza excavación y desalote, con el equipo minicargador, inicio de actividades 2:00 Pm. Solo se laboró 1,4 horas.

Luis Contreras

Residente de Obra.

Y.B

Inspector.

Powered by CamScanner

04/07/24 Se inpgan labores a las 11:00 Am Por motivos de lluvia.

Luis Contreras
Residente de Obra

Y.B
Inspector.

Powered by CamScanner

05/07/24 Se inician labores de cortes segun niveles de topografia, a las 3:00 pm se parte cuchilla del minicargador.

Luis Contreras — Residente de obra

Y.B — Inspector.

Powered by CamScanner

06/07/24 No se labora Por Cochilla Partida del minicargador.

Luis Contreras
Residente de Obra

Y.B
Inspector.

Powered by CamScanner

08/07/24 Se realiza acarreo de material sobrante 96 m^3

Luis Contreras

Residente de Obra

Y. B

Inspector.

Powered by CamScanner

09/07/24 No se laboro Por lluvia.

Luis cantrems

Residente de Obra

V.B

Inspector.

Powered by CamScanner

10/07/24 Se inician labores a las 10:00 Am
Se suspenden por motivos de lluvia.

Residente de Obra

Inspector.

Powered by CamScanner

11/07/24 No se labora por motivos de lluvia.

Luis contreras

Residente de Obra

Y. B

Inspector.

Powered by CamScanner

12/07/24 Se inician labores en Perfilación de talud, minicargador parte cubo de agua. Por tal razon se suspenden actividades.

Residente de Obra

Y.B.

Inspector

13/07/24 Se inician labores realizando extendimiento de afirmado, humectación y compactación.

Luis cantneros
Residente de Obra

X. B
Inspector.

Powered by CamScanner

15/07/24 Se inician labores con arreglos de tubería de agua Potable, Se continua con el esfendimiento de afirmado.

Luis Contreras
Residente de Obra

X.B
Inspector.

Powered by CamScanner
