INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA / CONTRATISTA OBRA

PROCESO

EJECUCIÓN DE OBRAS

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

SEMANA N. 51 **DEL** 27-ene-25 **AL** 2-feb-25

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 122-00-A-COFAC-DRIFRA-2023
(Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 121-00-A-COFAC-DRIFRA-2023

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO FAC 2309, INTEGRADO POR: -CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTVS.A.S (50%)-CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EFRS.A.S (50%) **NIT** 901.768.374-4

(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS **NIT** 900.457.115-5

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	26 (Día)	**DE**	12 (Mes)	**DE**	2023 (Año)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	30 (Día)	**DE**	9 (Mes)	**DE**	2024 (Año)
FECHA DE SUSPENSION 01 DEL CONTRATO	17 (Día)	**DE**	5 (Mes)	**DE**	2024 (Año)
FECHA DE REINICIACIÓN 01 DEL CONTRATO	5 (Día)	**DE**	6 (Mes)	**DE**	2024 (Año)
FECHA PRORROGA 1	15 (Día)	**DE**	10 (Mes)	**DE**	2024 (Año)
FECHA DE TERMINACION 2 DEL CONTRATO	18 (Día)	**DE**	11 (Mes)	**DE**	2024 (Año)
FECHA PRORROGA 2	15 (Día)	**DE**	11 (Mes)	**DE**	2024 (Año)
FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO	20 (Día)	**DE**	12 (Mes)	**DE**	2024 (Año)
FECHA PRORROGA 3	31 (Día)	**DE**	1 (Mes)	**DE**	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO	31 (Día)	**DE**	1 (Mes)	**DE**	2025 (Año)
FECHA PRORROGA 4	20 (Día)	**DE**	2 (Mes)	**DE**	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO	20 (Día)	**DE**	2 (Mes)	**DE**	2025 (Año)

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoría**	
Valor Inicial	$ 4,461,124,236.00	Valor Inicial	$ 369,974,570
Valor Actualizado	$ 4,461,124,236.00	Valor Actualizado	$ 369,974,570
No. de empleos generados	20	No. De empleos	11

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	prorroga	83.71%	Trabajo Ejecutado	0.08%	86.00%
Valor del Trabajo Programado	prorroga	$ 3,734,407,097.96	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 3,568,899.39	$ 3,836,566,842.96

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA / CONTRATISTA OBRA

PROCESO

EJECUCIÓN DE OBRAS

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

SEMANA N. 51 **DEL** 27-ene-25 **AL** 2-feb-25

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 122-00-A-COFAC-DRIFRA-2023
(Número de Contrato)

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO TOTAL ACTIVIDAD)	% EJECUTADO (FÍSICO TOTAL ACTIVIDAD)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
1. PRELIMINARES	100%	99.18%	-0.82%	**1.** Se realizó la actividad de localización y replanteo **2**. Se realizó cerramiento con polisoma para ingreso a la obra
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	100%	100%	0.00%	**1** Excavación mecánica , no incluye cargue, retiro y disposición final de excavación **2** Excavación manual en terreno consistente, no incluye cargue, retiro y disposición final de excavación. **3.** Excavación manual para cárcamo **3.** Se realiza excavación mecánica para instalación de tubería 4" pvcp-p
3. CIMENTACION	100%	98%	-2.00%	**1**Solado de limpieza en concreto según planos. Incluye materiales mano de obra, equipos y herramientas necesarias**.2** Concreto ciclópeo de 2500 psi (60% concreto Y 40% piedra pequeña)según planos.**3 z**apata en concreto de 4.000 psi impermeabilizado según planos. incluye, mano de obra, formaletas, equipos y herramientas necesarias, no incluye acero de refuerzo. **4** vigas de cimentación en concreto de 4.000 psi impermeabilizado según planos. incluye mano de obra, formaletas, equipos y herramientas necesarias, no incluye acero de refuerzo. **5** nivelación, conformación y compactación de la subrasante hasta obtener un CBR urbano del 95%. **6** geotextil NT 2500 o similar. **7** Relleno compactado al 95% del Proctor modificado tipo subbase b-200 según planos. incluye suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación.**8** Placa de contrapiso en concreto de 3.000 psi impermeabilizado, según planos. incluye mano de obra, formaletas, equipos y herramientas necesarias, e=0.15 m, no incluye acero de refuerzo **9.** Se realizo fundida de anden para todo el perímetro de la construcción tipo herradura de la fase III. **10.** Se realizó fundida de pedestal para instalación de hidroflo para bombas eyectoras.
4.ESTRUCTURA	100%	90%	-10.00%	**1** Columnas en concreto 4.000psi según planos. Incluye mano de obra, formaletas equipos y herramientas necesarias, .No incluye acero de refuerzo **2** Se continua con la instalación de formaleta en madera, parales metálicos y acero figurado para vigas aéreas, y fundir mediante el vaciado de concreto de acuerdo a los diseños. **3** Se instalo Malla electrosoldada fy 485 mpa -ntc 5806, incluye alambre negro trasiego, manejo. **4** Se continuo con la instalación de acero figurado y fundida de vigas aéreas para confinamiento de muros.
5.MAMPOSTERIA	100%	95.00%	-5.00%	**1.** Se continua con la construcción de muro con bloque estructural abujardado sobre vigas aéreas. y muros divisorios **2.** Se continua con la construcción de dintel sobre vanos de puertas y ventanas con acero de refuerzo. **3.** se realiza construcción de caseta para tablero eléctrico lugar de manhole. 4. Se realiza buitrón en mampostería para tubería de conexión en caseta eléctrica.
6.INSTAL. HIDROSANITARIAS	100%	70%	-30.00%	**1** Preliminares hidrosanitarios **2** Continuación con la red de desagües de aguas residuales , ventilaciones y reventilaciones **3** inicio de instalación de red de desagües de aguas lluvias **4** inicio de instalación de red de incendio **5.** Se inicia con la construcción de cajas (0.60x0.60)m sanitarias y aguas lluvias **6.** Se continua con la instalación de tubería 1/2" , 3/4", pvcp para puntos hidráulicos con sus respectivos accesorios **7.** Se realiza instalación de tubería 4" pvcp-p. **8.** Se realiza instalación de bombas hidráulicas para eyectores de agua potable. **8.** Se instaló equipo hidroflo para presión de bombas eyectoras.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA / CONTRATISTA OBRA

PROCESO

EJECUCIÓN DE OBRAS

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

SEMANA N. 51 **DEL** 27-ene-25 **AL** 2-feb-25

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 122-00-A-COFAC-DRIFRA-2023
(Numero de Contrato)

7.INST. ELECTRICAS	80%	70.0%	-10.00%	1. Inicio de preliminares eléctricos con la excavación en zona verde e incluye relleno con material de la misma excavación **2** Continuar con instalaciones banco de ducteria subterránea PVC 2x4" y 4x6" con sus respectivas uniones y terminales eléctrica para el sistema eyector . **3** Se inicia con la instalación de sistema puesta a tierra mediante varilla copperweld y cable debidamente soldado. **4** Se termina la construcción de cajas CS275 y CS276 eléctricas. **5**. Se continua con la instalación de tubería 3/4" EMT para puntos eléctricos en la parte interna de la construcción.**6** Se realiza instalación de cable cu 1/0 XLPE entre cajas CS276. **7** Se instala cable cu 2/0 entre cajas CS275. **8.** Se continua con la instalación de puntos eléctricos y llegada de celda a obra. **9.** Se continua con la instalación de las electrobarras de 400A. 10. se instala cableado 6 X No. 250 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 2 X No. 250 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 2 X No. 2/0
8.PAÑETES	100%	100%	0.00%	**1** Se termino con la instalación de pañete para muro externo de la viga área y viga canal. **2.** Se continua con la instalación de pañete en muros internos en las diferentes áreas de la construcción. **3** Se realiza instalación de pañete para caseta eléctrica y murete de tubería
11.CIELO RASO	21%	60%	39.00%	**1** Se continua con la instalación de estructura y drywall para cielo raso de techo
12. ACABADOS E IMPERM.	**91%**	90.00%	-1.00%	**1.** Se realizó alistado de piso en concreto impermeabilizado de 3000 PSI E=0.05 m (preparación de superficie) 2. Se realizo alistado de piso en mortero 1:5 e=0,04 m (preparación de superficie) 3. Se termino la construcción de mediacaña para cuartos eléctricos. 4. Se inicia con la instalación de piso cerámico umbría 45x90.1 atmosfera o similar. **5** Se realiza instalación de poliuretano en alta resistencia para pisos de cuartos eléctricos. **6**.se realiza revestimiento de media caña con material poliuretano de alta resistencia
13. ACABADOS MUROS PINTURAS/ENCHAPES	100%	80%	-20.00%	**1** Se continua con la instalación de estuco plástico y pintura para muros internos
14. CARPINTERIA EN MADERA	100%	95%	-5.00%	**1.** Se continua la instalación de puertas en madera para baños y alcobas
15. CARPINTERIA METALICA	100%	95%	-5.00%	**1**. Se continua con la instación de puertas y ventanas
16. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	100%	80%	-20.00%	**1**. Se continua con la instación de ventanearía tipo persiana aluminio serie 7038. **2.** Se continua con la instalación de ventanearía corrediza en aluminio serie 7038 de tres cuerpos y vidrio de 5mm en fachada.
17. CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE	100%	100%	0.00%	Se realiza instalación de accesorios en acero inoxidable(dispensador de papel, jabón, secador, papelera, modulo de cabina sanitaria)
18.CUBIERTAS	100%	100%	0.00%	**1** Se instaló estructura metálica para cubierta. . **2** Se instalo teja Steel standing para cubierta. . **3** Se instalo flanche con accesorios para cubierta. Se inicia con la instalación de cubierta para zona de bombeo de agua portable para fase III y la torre de control.
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	100%	100%	0.00%	**1.** Se instaló lavamanos de sobre poner, orinal, sanitario, ducha para baños
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	100%	100%	0.00%	**1.** Se continua con la instalación de vidrios para ventanas en aluminio de la parte externa. **2.** Se realizo instalación de espejo Biselado para baños. **3.** Se instaló divisiones de baño para ducha en vidrio templado biselado.
21. CERRADURAS	100%	95%	-5.00%	**1.** Se instalo brazo mecánico para puerta
21. OBRAS GENERALES	100%	100%	0.00%	NA
23. URBANISMO	100%	100%	0.00%	**1.** Se termino de fundir losa en concreto MR-41 texturizado para el área urbanística.
24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	53%	30%	-23.00%	**1.** Se continua con la recogida de material sobrante de obra y resanes en cabados de filos en muros y piso
EQUIPOS	91%	55%	-36.00%	1.Se suministra transformador y electrobrarras según programacion
NP-01 TAPONAMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE DE 36" INCLUYE MANEJO DE AGUAS COMBINADAS CON MOTOBOMBA DE 4" Y ELECTROBOMBA DE 2"	100%	100%	0.00%	**1.** Se realiza corte y taponamiento de tubería 36" gres, con sacos de material y concreto.

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

SEMANA N. 51 **DEL** 27-ene-25 **AL** 2-feb-25

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 122-00-A-COFAC-DRIFRA-2023
(Número de Contrato)

NP-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO PREFABICADO INCLUYE CARGUE D= 1.70 e= 0.18, CILINDRO D=1.2 H=1, CONO DE D=1.2X60, TAPA 0.70, CUELLO D= 1. ALTURA POZO 3mts - 3.30 mts	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizó instalación de pozo prefabricado en el lugar donde se intervino la tubería 36" gres,
NP-03 CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI IMPERMEABILIZADO (H= 0.55 m A=0.58 m) INCLUYE ANGULO RECIBIDOR Y TAPA EN LAMINA ALFAJOR	100%	95%	-5.00%	**1.** Se realizo fundida de muros laterales y piso de cárcamo en concreto premezclado. **2.** Se realizó instalación de marcos acerado para soporte de tapas **3**. se realizo fundida de tapas en concreto con refuerzo
NP-04 CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI IMPERMEABILIZADO (H= 0.82 m A=0.74 m) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO Y TAPA CON ANGULO REMOVIBLE	100%	90%	-10.00%	**1.** Se realizo fundida de muros laterales y piso de cárcamo en concreto premezclado. **2.** Se realizó instalación de marcos acerado para soporte de tapas
NP-05 VIGA CANAL EN CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizo la construcción de viga canal en concreto impermeabilizada
NP-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA PARA RCI	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizo instalación de siamesa para la red contra de incendios
NP-07 SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE 4" PARA RCI	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizo instalación de hidrante 4" para la red contra incendios
NP-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE CORTINA DE 4"	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizo instalación de cortina 4" para la red contra incendios
NP-014 ANCLAJES DE 1/2" CON EPOXICO H=15 CM	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizo instalación de anclajes para estructura de cubierta
NP-15 BORDILLO DE CONFINAMIENTO PARA ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,12 X0,30, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizó fundida de bordillo en concreto para confinamiento de anden en todo el perímetro. 2. se realizo fundida de bordillo para confinamiento de losa de concreto MR-41 del área urbanística
NP-16 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION VERTICAL Y HORIZONTAL ENTRE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 10 MM DE ANCHO X 10 MM DE PROFUNDIDAD CON SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS.	100%	100%	0.00%	**1.** Se continua con la instalación de sello de juntas para estructura
NP-17 BOCAPUERTA EN GRAVILLA LAVADA. INCLUYE DILATACIONES	100%	100%	0.00%	**1.** Se termino la instalación de grava lavada para boca puertas.
NP-18 TUBERIA PVC - TDP DE 4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	100%	80%	-20.00%	**1.** Se instaló tubería para proyección desde la torre hasta cárcamo
NP-19 TUBERIA PVC - TDP DE 4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	100%	80%	-20.00%	**1.** Se instaló tubería para conectar acometida desde la torre a caja CS275 eléctrica
NP-20 HIDROFUGADO PARA BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO CON SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS	100%	100%	0.00%	**1.** Se termina la actividad del hidrofugado para la estructura.
NP-21 TAPADO DE COLUMNAS EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM 1,22 X 2,44 M 26,61 KG APROX	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizo la actividad para cubrir tubería de bajantes aguas lluvias

CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA / CONTRATISTA OBRA **PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

SEMANA N. 51 **DEL** 27-ene-25 **AL** 2-feb-25

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 122-00-A-COFAC-DRIFRA-2023
(Número de Contrato)

NP-23 LAVADO Y DESINFECCION DE CUARTO DE EQUIPOS EN TANQUE EXISTENTE	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizo la actividad para construcción de dado
NP-30 REJILLA PLASTICA DE VENTILACION 20X20 CM.	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizo la actividad para ventilación de tubería en muros
NP-31 REJILLA CÚPULA EN ALUMINIO DE 4 A 3 PULGADAS	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizo la actividad para desagüe de viga canal aérea
NP-32 REJILLA DE PISO METALICA CON SOSCO CUADRADA DE 4 A 3 PULGADAS	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizo la actividad para desagüe de aguas lluvia en zona urbanística del MR-41
NP-33 ELEVACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN ELECTRICA Y SANITARIA	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizo la actividad para nivelar altura de piso
NP-34 SANITARIO MONTECARLO ALONGADO BLANCO CORONA	100%	100%	0.00%	**1.** Se realizo la actividad para baños de habitaciones y área social
NP-35 IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL CON SIKAFILL-100 SUPER Y TELA DE REFUERZO SIKA FELT FPP-30	100%	100%	0.00%	**1.** Se terminó la actividad de impermeabilización para viga canal área
NP-36 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 4" RANURADO A.C. PARA SIAMESA	100%	100%	0.00%	**1.** Se instalo este elemento para la RCI
NP-37 SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 4" A.C. PARA SIAMESA	100%	100%	0.00%	**1.** Se instalo este elemento para la RCI
NP-38 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA 6" X 4" A.C. PARA GABINETE	100%	100%	0.00%	**1.** Se instalo este elemento para la RCI
NP-39 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CON CUELLO INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLOS A.C. PARA GABINETE	100%	100%	0.00%	**1.** Se instalo este elemento para la RCI
NP-41 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 6" HD PARA C900 HIDRANTE - SIAMESA	100%	100%	0.00%	**1.** Se instalo este elemento para la RCI
NP-42 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 6" HD PARA SIAMESA - HIDRANTE - CHEQUE	100%	100%	0.00%	**1.** Se instalo este elemento para la RCI
NP-43 PUERTA TIPO PERSIANA EN ALUMINIO	100%	100%	0.00%	**1.** Se instalo este elemento para área de los agentes limpios

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

SEMANA N. 51 **DEL** 27-ene-25 **AL** 2-feb-25

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 122-00-A-COFAC-DRIFRA-2023
(Numero de Contrato)

NP-44 SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 6" A.C. PARA GABINETE Y SIAMESA	100%	100%	0.00%	**1.** Se instalo este elemento para la RCI
NP-46 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA 4" X 2 1/2" A.C. PARA GABINETE	100%	100%	0.00%	**1.** Se instalo este elemento para la RCI
NP-47 VALVULA ELASTICA 6" C-900 PARA CONTROLADOR DE FLUJO PARA EL HIDRANTE	100%	100%	0.00%	**1.** Se instalo este elemento para la RCI
NP-48 RUBATEX	100%	100%	0.00%	**1.** Se instalo este elemento para cubrir tubería del desagüe de los mini Split
NP-48 RUBATEX	100%	100%	0.00%	**1.** Se instalo este elemento para cubrir tubería del desagüe de los mini Split

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N:51 Se realizaron pruebas de tubería RCI, continua la instalación de thermolon, drywall, fibra mineral y black theter para cielo raso de las diferentes áreas de la construcción, aplicación de pintura para muros y cielo raso, se realiza pintura para viga aérea parte externa, instalación de lamina alfajor para cárcamo eléctrico, se realiza instalación, adecuación, conexión de aparatos y equipos eléctricos se continua con resanes para acabados de muros y pisos, entre otras actividades de terminación de la construcción de fase III.

En la semana informada se realizó comité técnico de forma virtual el día 27 de enero de 2025, con la asistencia de la supervisión por parte de la entidad contratante, contratista de obra y la presente interventoría, se inicio con la presentación por parte del supervisor del proyecto de la FAC, siendo la finalidad de realizar ajuste y modificaciones en temas tratados sobre la prorroga en tiempo de 20 días y posible adicion al contrato en presupuesto y tiempo con la finalidad de avanzar en obras que serian importantes para culminar la construcción de la presente Fase III, en determinaciones se concluye el avance en una prorroga de 20 días calentadrio, para culminar actividades hasta el día 20 de febrero del 2025, como se va ha establecer el la adicion de tiempo.

La presente interventoría continua con el seguimiento oportuno a cada una de las gestiones que se vienen desarrollado durante el periodo informado, realizando su respectivo acompañamiento y estarán al tanto de las determinaciones por parte de la entidad contratante, dando los respectivos alcances que son importante para la terminación final de todas las actividades contempladas en el proyecto.

Durante la semana el estado general del clima fue seco (soleado), por este motivo NO se considera que hayan dificultado el avance de las actividades programadas.



Descripción foto 1: Pruebas de tubería RCI



Descripción foto 2: I Pruebas de tubería RCI


FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

SEMANA N. 51 **DEL** 27-ene-25 **AL** 2-feb-25

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **122-00-A-COFAC-DRIFRA-2023**
(Número de Contrato)



Descripción foto 3: Instalación de drywall y laminas en fibromineral

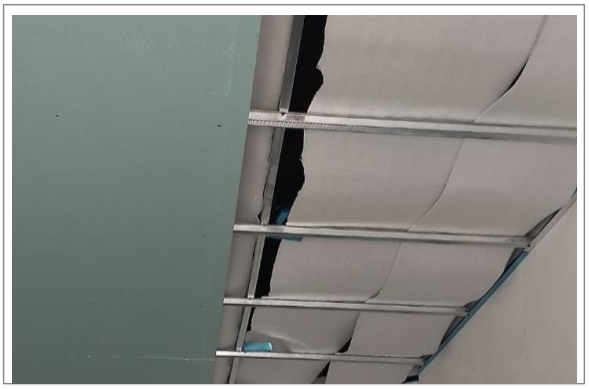


Descripción foto 4: Instalación de drywall y thermolon



Descripción foto 5: Instalación de drywall y laminas en fibromineral



Descripción foto 6 Aplicación de pintura para muros

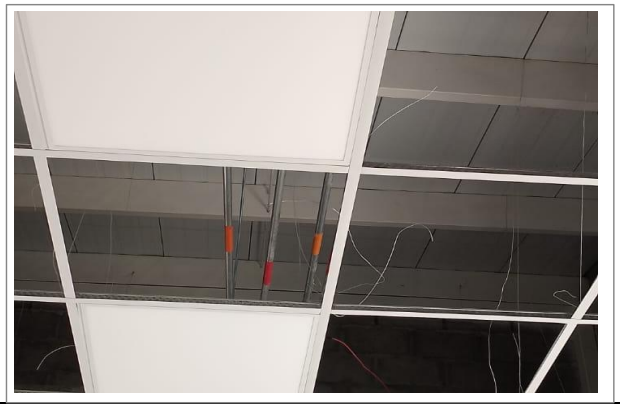

Descripción foto 7: Instalación de drywall y laminas en fibra mineral



Descripción foto 8: Instalación de drywall y laminas en fibra mineral

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

SEMANA N. 51 **DEL** 27-ene-25 **AL** 2-feb-25

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **122-00-A-COFAC-DRIFRA-2023**
(Número de Contrato)



Descripción foto 7: Instalación de Black theater



Descripción foto 8: Instalación de Black theater




Descripción foto 7: Adecuación para conexión eléctrica de Media Tensión



Descripción foto 8: Adecuación para conexión eléctrica de Media Tensión



Descripción foto 7: Adecuación para conexión eléctrica de Media Tensión

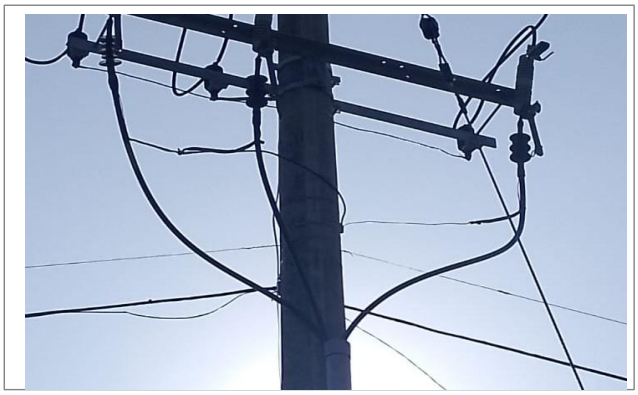

Descripción foto 8: Adecuación para conexión eléctrica de Media Tensión

CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA / CONTRATISTA OBRA **PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

SEMANA N. 51 **DEL** 27-ene-25 **AL** 2-feb-25

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **122-00-A-COFAC-DRIFRA-2023**
(Numero de Contrato)



Descripción foto 7: Aplicación de pintura para viga aérea parte externa



Descripción foto 8: Instalación de lamina en alfajor para tapas de cárcamo eléctrico



Descripción foto 7: Instalación de lamina en alfajor para tapas de cárcamo eléctrico



Descripción foto 8: Acondicionamiento y ajuste de equipos eléctricos

tres (Día en letras) (3) (Día en números) días del mes de febrero (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

German Adolfo Perdomo Pachón
Representante Legal- Consultores Del Occidente SAS

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
DOCUMENTO CONTROLADO
