**INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL #7 NOVIEMBRE**

CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-038-2023 LOTE 4 CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: " EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV." – LOTE 4

**01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024**

**ELABORADO POR:** OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S

CARTAGENA – BOLÍVAR

## Contenido

INTRODUCCIÓN ..... 3

1. DATOS GENERALES ..... 3

2. DATOS DEL CONTRATO ..... 3

3.1. Plan de compras ..... 4

3.2. Verificación y/o modificación de diseños durante el periodo del presente informe ..... 5

4. PLAN DE TRABAJO ..... 5

4.1. Plan de Calidad ..... 5

4.1.1. Ensayos: ..... 5

4.1.2. Maquinaria y Equipo: ..... 5

4.1.3. Materiales ..... 6

4.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo: ..... 6

4.3. Plan de Gestión Social ..... 9

5. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES ..... 9

6. CONTROL DE PERSONAL ..... 10

7. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ..... 10

8. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. ..... 10

9. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO. ..... 11

10. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. ..... 14

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... 15

12. COMPLEMENTARIOS ..... 20

15. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ..... 21

## INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como objetivo detallar las actividades y especificaciones técnicas involucradas en la ejecución del proyecto de Rehabilitación de la Malla Vial Urbana del Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. - Fase IV (Lote 4). El proyecto se desarrollará bajo el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable, y abarca la construcción de pavimento rígido, obras de urbanismo, obras de drenaje y la señalización correspondiente, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los diseños y especificaciones técnicas del contrato.

En términos generales, las obras incluirán actividades como la localización, trazado y replanteo de la vía, corte y retiro de material sobrante, la conformación de la subrasante, y la instalación de concreto premezclado, así como el suministro y colocación de estructuras de drenaje. Además, se llevarán a cabo tareas de señalización vial, tanto vertical como horizontal, para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Cada actividad será ejecutada siguiendo los estándares técnicos de calidad y seguridad aplicables, asegurando la correcta implementación de las especificaciones y el uso de los materiales adecuados, tales como concreto reforzado y estructuras de acero de alta resistencia.

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 18/11/24 | **INFORME NO.** | **07** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO NO.** | 2 | **DEL**: | **01/11/24** | **AL**: | **18/11/24** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. – LOTE 4 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BARRIO CRESPO, CARTAGENA – BOLÍVAR. |

### 2. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE:** | OBRA |
| **CONTRATO NO.:** | LP-SID-UAC-038-2023 LOTE 4 |
| **CONTRATISTA:** | OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S<br>NIT: 829.000.075-1 |
| **PLAZO INICIAL:** | 15 DÍAS |
| **FECHA DE INICIO:** | 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE:** | OBRA |
| **PLAZO ACTUALIZADO (***INCLUIDO PRORROGAS***):** | 6 MESES Y 13 DÍAS |
| **VALOR INICIAL:** | OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($8.541.666.630.00) |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 8.541.666.630.00 |

## 3. ACTIVIDADES DEL MES

A continuación, se da la relación de las actividades constructivas realizadas por el Contratista de Obra OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S, comprendido desde el 01 al 18 de Noviembre del 2024:

Durante este mes se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Se inicia demolición de placa de pavimento asfaltico en Cra. 3 entre calles 70 y 71
- ✓ Se realiza demolición de cunetas en Cra. 3 entre calles 70 y 71
- ✓ Se realiza retiro de escombros de las placas y cunetas demolidas
- ✓ Se realiza nivelación con grava y se compacta en el tramo Cra. 3 entre calles 70 y 71
- ✓ Se realiza limpieza y orden general en obra
- ✓ Se realiza evacuación de aguas lluvias con motobomba en las excavaciones abiertas

### 3.1. Plan de compras

Se llevo a cabo el plan de compras de acuerdo con lo programado, se anexa plan de compras de materiales representativos en obra.

**PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES PRODUCTOS REPRESENTATIVOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | LP-SID-UAC-038-2023 LOTE 4 | | | |
| **OBJETO** | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. – LOTE 4. | | | |
| **FECHA INICIACION** | 15/12/2023 | | | |
| **PLAZO DE EJCUCION** | 382 | | DIAS | |
| **FECHA DETERMINACION** | 31/12/2024 | | | |
| | | | | |
| Occidental de Colombia SAS, propone el siguiente plan de compras y adquisiciones del mes de Noviembre, de acuerdo al cronograma de ejecución en obra | | | | |
| **PLAN DE COMPRAS** | | | | |
| **INSUMO** | **CANTIDAD** | **UND** | **FECHA PUESTA EN OBRA** | **DESCRIPCIÓN** |
| TRITURADO 1" | 39.02 | TON | 5-nov-24 | RELLENO PARA SUBBASE PARA CAPA DE PAVIMENTO |
| CONCRETO MR-42 AC= 3 DÍAS | 84.25 | M3 | 24-oct-24 | CONCRETO PARA PLACAS DE PAVIMENTO |



**JAVIER ANDRES TORRES MORE**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S**

### 3.2. Verificación y/o modificación de diseños durante el periodo del presente informe

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 18 de Noviembre del 2024, se envía la versión 5 del balance, a interventoría para su revisión.

## 4. PLAN DE TRABAJO

### 4.1. Plan de Calidad

#### 4.1.1. Ensayos:

En la obra de pavimentación en el barrio Crespo, se realizó un ensayo de resistencia a la flexión del concreto para asegurar que el material utilizado cumple con los requisitos de resistencia. El procedimiento consistió en moldear vigas de concreto, que luego fueron sometidas a una carga en su tercio medio hasta que fallaron.

Este ensayo permitió evaluar la capacidad del concreto para resistir las tensiones que se generan durante el uso del pavimento, asegurando que la estructura sea adecuada para soportar el tránsito y las condiciones locales. Los resultados obtenidos fueron comparados con los valores establecidos en las especificaciones del proyecto para garantizar la calidad de la obra.

#### 4.1.2. Maquinaria y Equipo:

Durante este período de trabajo se hizo uso de la siguiente maquinaria y equipos:

| MAQUINA / EQUIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Pulidora 7” | Utilizada para corte de tuberías, acero. |
| Taladro | Utilizada para demoliciones de registros. |
| Vibrocompactador | Utilizado para compactar y estabilizar las capas suelo que conforman las capas de pavimento. |
| Minicargador | Utilizado para cargar o transportar materiales en áreas difícil acceso. |
| Retrocargador | Utilizado para realizar excavación en el terreno natural. |
| Cortadora de pavimento | Utilizada para realizar cortes de juntas de pavimento |
| Flota canal | Utilizado para darle acabado al concreto en la capa de rodadura |
| Cepillo texturizador | Utilizado para darle acabado al concreto en la capa de rodadura |
| Vibrador de Concreto | Utilizado para eliminar burbujas de aire en el concreto |
| Planta eléctrica | Utilizado para generar energía en los equipos |
| Fumigadora | Utilizado para aplicar antisol al concreto |
| Vibrocompactador tipo rana | Utilizado para compactar el relleno en los andenes |
| Tronzadora | Utilizada para realizar cortes de acero |
| Bomba sumergible | Utilizado para evacuar aguas |
| Taladro percutor | Utilizado para realizar anclajes y demoliciones |
| Sierra para madera | Utilizado para corte de listones y tablas |

### 4.1.3. Materiales

Durante este período de trabajo se hizo uso de los siguientes materiales:

| MATERIALES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Geotextil | Utilizado para separar, filtrar, reforzar y drenar las capas del pavimento, evitando la mezcla de materiales como base y subbase granular. |
| Triturado 1” | Utilizado para relleno de subbase de placa de pavimento |
| Zahorra | Utilizada para relleno en zonas de andenes |
| Acero | Utilizado para reforzar las placas especiales y armar las canastillas entre placas de pavimento. |
| Concreto MR 42 | Utilizado para conformar la capa de rodadura del pavimento. |
| Concreto 3500 PSI | Utilizado para conformar las estructuras de concreto de andenes y bordillos. |

## 4.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo:

OCCIDENTAL DE COLOMBIA, reconoce la importancia del mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos sus colaboradores en los diferentes niveles

de la organización, centros de trabajo y modalidades de contratación; es por ello, que se compromete con la protección y promoción de la salud, así como de la prevención de accidentes y enfermedades causadas por estas condiciones y medio ambiente de trabajo.

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), está orientado al desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua; que incluye la política, la planeación, la organización, la implementación, la evaluación, la auditora y las acciones de mejora, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos laborales que pueden existir en todos los procesos de la organización.

El responsable asignado por la empresa para liderar el diseño, implementación y seguimiento del SG-SST, cuenta con el apoyo de Occidental de Colombia, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y/o VIGIA y trabajadores en general; los cuales tendrán participación en las diferentes actividades y programas ejecutados.

Todo este proceso se desarrolla cumpliendo firmemente con la Legislación Colombiana en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo establecida por el Ministerio de Trabajo y otra índole que suscriba OCCIDENTAL DE COLOMBIA. Para el cumplimiento de esta política y el logro de los objetivos propuestos, OCCIDENTAAL DE COLOMBIA permanentemente orientará sus esfuerzos y destinará los recursos físicos, económicos y personal idóneo requerido para la oportuna identificación, valoración e intervención de los peligros que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y situaciones de emergencia.

Para cumplimiento de esta política, la gerencia agradece el apoyo y colaboración de todos los grupos de interés. Además, para su efectivo cumplimiento se divulgará a todos los niveles de la organización y estará accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas.

OCCIDENTAL DE COLOMBIA se compromete a revisarla mínimo una vez al año y de requerirse, será actualizada acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como de la organización.

Se realiza periódicamente charlas de seguridad antes de iniciar actividades, se dan recomendaciones antes de iniciar actividades como identificación de los peligros/aspectos, para así tener una valoración y control de riesgos al que están expuestos. Se destaca siempre el compromiso de los trabajadores con el orden y aseo, así como el buen uso de los elementos de protección personal. Con el fin de divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.

Acciones implementadas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo.

- **Inspecciones y preoperacionales**

| ITEM | INSPECCION | FRECUENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Herramientas Manuales<br>EQUIPOS MECANICOS O ELECTRICOS. | Semanal | CUMPLE |
| 2 | Elementos De Protección Personal y dotación de trabajo | Semanal | CUMPLE |
| 3 | Inspecciones externas/locativas | Semanal | CUMPLE |
| 4 | Inspección Equipo Emergencia | Quincenal | CUMPLE |
| 5 | Inspección Botiquín | Quincenal | CUMPLE |
| 7 | Preoperacionales de equipos y maquinaria (kit de derrame) | Semanal | CUMPLE |
| 8 | Fichas técnicas de maquinaria y cronograma de mantenimiento. | Mensual | CUMPLE |

- **Entrega de EPP**

Se realiza entrega primera, reposición y cambios de los EPP. Además, se realiza el mismo procedimiento para la dotación de trabajo al personal en obra.


- **Charlas, socializaciones y pausas activas.**

Durante el mes de Noviembre las charlas fueron enfocadas a la necesidad de obras, con la importancia de concientizar a los colaboradores con la orden y aseo y mantener la señalización en obra. En cuanto a las pausas activas, se realizaron con el fin de concientizar al personal la importancia de tomar pausas en la jornada laboral.

- **Jornadas de Orden y aseo**

Durante el presente mes se realizaron jornadas de orden y aseo en el campamento y frentes de obra como recogidas de material de volqueta.

- **Índice de severidad**

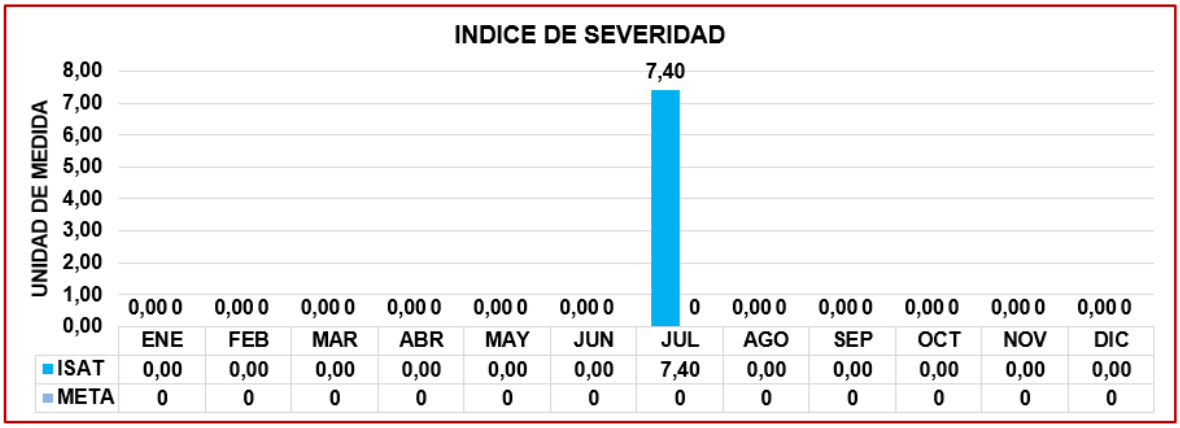


### 4.3. Plan de Gestión Social

Por medio del siguiente plan se da apertura al seguimiento mensual del plan de Gestión Social y Reputacional comprendido en el periodo del 01 al 18 de noviembre del 2024 dándole cumplimiento a lo socializado por el contratista OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS, en el contrato de obra No. LP-SID-UAC-038-2023 LOTE 4 que tiene como objetivo principal "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV." – LOTE 4" supervisado por la interventoría de INGEOCIM SAS.

- **Actas de reunión**

Durante el mes de Noviembre se llevó a cabo el acta de reunión No. 6 y No. 7.
El acta de reunión No. 6 se llevó a cabo el día 05 de Noviembre de 2024, de 4:00 pm a 6:00 pm en la iglesia Cristo Rey del barrio Crespo. El objetivo del acta de reunión en mención fue socializar con la comunidad de la carrera 3 el trabajo de obra de rehabilitación de la malla vial fase IV y el proceso de sustitución de tuberías por parte Aguas de Cartagena que se estará ejecutando en su sector.

El acta de reunión No. 7 se llevó a cabo el día 06 de Noviembre de 2024, de 8:00 am a 8:30 am en la Cra. 2 del barrio Crespo. El objetivo del acta de reunión en mención fue socializar con los trabajadores el tema de COMUNICACIÓN PARA LA VIDA.

## 5. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Durante este período se continuó y se definió la versión 5 del balance para llevar a cabo el cobro del acta Parcial de obra No. 2.

## 6. CONTROL DE PERSONAL

Se presentó el siguiente personal para la ejecución del proyecto, personal que fue aprobado por Interventoría.

| CARGO POR DESEMPEÑAR | NOMBRE | PROFESIÓN | CONDICIÓN | DEDICACIÓN SEGÚN TDR % |
|---|---|---|---|---|
| Director de Obra | Nicolás Eljadue Arrieta | Ingeniero Civil | Mano de obra calificada/activo | **25** |
| Residente de Obra | Charlie Romero Villalobos | Ingeniero Civil | Mano de obra calificada/activo | **100** |
| Especialista en Vías | Ramon de Jesús Torres Ortega | Ingeniero | Mano de obra calificada/activo | **30** |
| Especialista Estructural | Javier David Alarcón Gonzales | Ingeniero | Mano de obra calificada/activo | **30** |
| Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacionaly medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnicoen Aseguramiento de Calidad | Harold Alonso Badillo Amad | Ingeniero | Mano de obra calificada/activo | **100** |
| Profesional Social | Valentina Gaviria Beltrán | Psicóloga | Mano de obra calificada/activo | **100** |

## 7. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

El plazo para pagar la planilla de seguridad social del mes vence el 15 de Diciembre.

## 8. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

El contrato de Obra No. LP-SID-UAC-038-2023 - LOTE 4, a la fecha, se tiene consolidado el valor total del contrato y se empiezan a identificar cantidades de las actividades contractuales a ejecutar.

## 9. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

| Póliza No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Valor Aseg. | Expedición |
|---|---|---|---|---|---|
| **465-47-994000008279** | Aseguradora solidaria de Colombia | Cumplimiento | 12/09/23 – 30/04/24 | $1.708.333.326,00 | 14/09/23 |
| **465-47-994000008279** | Aseguradora solidaria de Colombia | Salarios y prestaciones | 12/09/23 – 31/12/26 | $427.083.331.,50 | 14/09/23 |
| **465-47-994000008279** | Aseguradora solidaria de Colombia | Estabilidad y Calidad de laObra | N/A | $1.708.333.326,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Predios, labores y operaciones | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contratistas y Subcontratistas | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Productos trabajados y operaciones terminadas | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Bienes bajo cuidado, tenencia y control | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | RCE patronal | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Vehículos propios y no propios | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contaminación | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Gastos médicos | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Responsabilidad civil cruzada | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-47-994000008279 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Cumplimiento | 12/09/23 – 21/10/24 | $1.708.333.326,00 | 03/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 12/09/23 – 21/06/27 | $427.083.331.,50 | 03/07/24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **465-47-994000008279 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Estabilidad y calidad de la obra | N/A | $1.708.333.326,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Predios, labores y operaciones | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contratistas y Subcontratistas | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Productos trabajados y operaciones terminadas | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Bienes bajo cuidado, tenencia y control | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | RCE patronal | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Vehículos propios y no propios | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contaminación | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Gastos médicos | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Responsabilidad civil cruzada | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Cumplimiento | 12/09/23 – 19/11/24 | $1.708.333.326,00 | 03/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 12/09/23 – 19/07/27 | $427.083.331.,50 | 03/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Estabilidad y calidad de la obra | N/A | $1.708.333.326,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Predios, labores y operaciones | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contratistas y Subcontratistas | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Productos trabajados y operaciones terminadas | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Bienes bajo cuidado, tenencia y control | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | RCE patronal | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Vehículos propios y no propios | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contaminación | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Gastos médicos | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Responsabilidad civil cruzada | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Cumplimiento | 12/09/23 – 30/12/24 | $1.708.333.326,00 | 25/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 12/09/23 – 30/08/27 | $427.083.331.,50 | 25/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Estabilidad y calidad de la obra | N/A | $1.708.333.326,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Predios, labores y operaciones | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contratistas y Subcontratistas | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Productos trabajados y operaciones terminadas | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Bienes bajo cuidado, tenencia y control | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | RCE patronal | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Vehículos propios y no propios | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contaminación | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Gastos médicos | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Responsabilidad civil cruzada | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **465-47-994000008279 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Cumplimiento | 12/09/23 – 30/04/25 | $1.708.333.326,00 | 25/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 12/09/23 – 31/12/27 | $427.083.331.,50 | 25/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Estabilidad y calidad de la obra | N/A | $1.708.333.326,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Predios, labores y operaciones | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contratistas y Subcontratistas | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Productos trabajados y operaciones terminadas | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Bienes bajo cuidado, tenencia y control | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | RCE patronal | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Vehículos propios y no propios | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contaminación | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Gastos médicos | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Responsabilidad civil cruzada | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |

## 10. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

Enviado.

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | OCC-CTO038-048-2024 | DOCUMENTACION DE EQUIPO EXCAVADORA | Javier Andrés Torres More<br>Representante Legal<br>Occidental de Colombia S.A.S | Carlos Mojica Contreras<br>Director de Interventoría<br>INGEOCIM SAS |
| 05/11/2024 | OCC-CTO038-049-2024 | REMISION DE DISEÑOS ESTRUCTURALES | Javier Andrés Torres More<br>Representante Legal | Carlos Mojica Contreras<br>Director de Interventoría |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Occidental de Colombia S.A.S | INGEOCIM SAS |
| 12/11/2024 | OCC-CTO038-050-2024 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ENTREGA DE DOTACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA. | Javier Andrés Torres More<br>Representante Legal<br>Occidental de Colombia S.A.S | Carolin Gomez De la Rosa<br>Interventoría de Proyectos<br>INGEOCIM SAS |

No se relaciona documentación recibida en el periodo comprendido entre el 01 de nov de 2024 al 18 de nov de 2024.

## 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO









**Ilustración 1. Inspección de equipos y botiquin**






**Ilustración 2. Entrega de EPP**













**Ilustración 3. Charlas y socializaciones y pausas activas**




**Ilustración 4. Seguimiento PMT**




**Ilustración 5. Orden y aseo en obra**



**Ilustración 6. Demolición de placa de pavimento asfaltico**




**Ilustración 7. Demolición de placa de anden**




**Ilustración 8. Cargue y transporte de material**



**Ilustración 9. Corte mecánico para área de calzada**



**Ilustración 10. Compactación del terreno**



**Ilustración 11. Instalación de geotextil y capa de relleno para subbase**

## 12. COMPLEMENTARIOS

Durante el mes de Noviembre no se tuvo información complementaria.

## 13. ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

La interventoría realizó inspección y revisión de las siguientes actividades: Excavaciones, rellenos e Instalación para tuberías de red de alcantarillado. Colocación de geotextil, rellenos con triturados y vaciados de concreto para placas de pavimentos.

## 14. PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE OBRA

No se presentaron problemáticas de obra durante este periodo de tiempo.

## 15. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Las actividades del proyecto han continuado de manera satisfactoria, siguiendo los estándares de calidad establecidos. Durante este periodo se continúan actividades en la Cra. 2 entre las Cl. 63 y 73 realizando todas las obras de urbanismos como andenes y bordillos contemplados en el proyecto, con el objetivo de finiquitar dicho tramo. Asimismo, se continúan actividades en la Calle 71 entre Cra. 1 y 3, y se inician actividades en la Cra. 3, Tramo 1 entre calle 70 y 71.

Se recomienda:

- Mantener el ritmo de trabajo constante que ha permitido avanzar de manera sostenida, a pesar de los imprevistos.
- Continuar con la supervisión constante para detectar cualquier posible obstáculo o necesidad de ajuste en el proceso, y aplicar soluciones de manera proactiva.
- Revisar periódicamente los cronogramas y recursos disponibles para asegurar que no haya desfasajes significativos que puedan impactar en la fecha de finalización del proyecto.
- Incentivar la comunicación efectiva entre los equipos para garantizar que todos los problemas o requerimientos se atiendan de manera rápida y eficaz.

El proyecto ha demostrado un buen desempeño con una capacidad de respuesta eficiente ante los imprevistos surgidos. A pesar de las dificultades presentadas, se ha logrado mantener el avance sin mayores contratiempos, lo cual habla positivamente de la gestión del equipo a cargo. Si se mantiene el ritmo de trabajo y la búsqueda activa de soluciones, el proyecto tiene altas probabilidades de culminar dentro de los plazos y con los resultados esperados.

# ANEXO 1: INSPECCIÓN DE EQUIPOS

| OCCIDENTAL DE COLOMBIA | OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS<br>FORMATO PARA INSPECCION DE EXTINTORES | DOCUMENTO No. PAS-FO-21<br>VERSIÓN 1<br>20/10/2015 |
|---|---|---|

Contrato No. u Obra: Lote 4 | Fecha de Revisión: DIA 1 MES 11 AÑO 24 | Empleado que aplica la lista de Chequeo: Harold Ruiz

CLASE DE EXTINTOR: Multiproposito | CODIGO: 01 | Encargado de Impacto Comunitario y de Salud Ocupacional: Harold Ruiz

CALIFICACIÓN: T = Cumplimiento Total P = Cumplimiento Parcial I = Insuficiente NA = No Aplica

| ITEM | DESCRIPCION DE FACTORES CLAVES EXITOSOS Y DE SUS RESPECTIVOS ITEMS | T | P | I | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Los elementos de los extintores se encuentran en perfecto estado de funcionamiento:** | | | | | |
| 1.1 | El soporte no presenta desgastes, esta firme y permite la sugecion correcta del extintor sin deteriorar el cilindro ni los demas elementos del equipo? | ✓ | | | | |
| 1.2. | La válvula se encuentra en perfecto estado de funcionamiento (para realizar esta revisión no es necesario retirar el pin de seguridad ni accionar la válvula) | ✓ | | | | |
| 1.3 | La manguera o boquilla se encuentra perfectamente instalada al equipo, se encuentra en buen estado, sin desgastes, ni roturas? | ✓ | | | | |
| 1.4 | El sujetador se encuentra firme y permite el agarre perfecto del equipo para ser utilizado? | ✓ | | | | |
| 2 | **Carga del equipo.** | | | | | |
| 2,1 | El manómetro indica señal intermedia, se encuentra ubicado por fuera de los campos de "RECARGA" y "SOBRECARGA" | ✓ | | | | |
| 2,2 | El cilindro se encuentra en buen estado de pintura y limpieza, libre de polvo? | ✓ | | | | |
| 2,3 | El cilindro se encuentra en perfecto estado no presenta deterioro por corrosión o por golpes? | ✓ | | | | |
| 2,4 | La señalizacion del equipo extintor se encuentra ubicada en la pared detrás del equipo y corresponde al tipo de extintor? | ✓ | | | | |
| 2,5 | El equipo se encuentra codificado y corresponde a la ubicación definida en el listado? | ✓ | | | | |
| 2,6 | Fecha última recarga | ✓ | | | | Enero 2024 |
| 2,7 | Fecha próxima recarga | ✓ | | | | Enero 2025 |
| 2,8 | La clase del extintor aplica para el riesgo del área donde esta ubicado? | ✓ | | | | Punto original |

| 3 | Acciones necarias para corregir las condiciones encontradas | Fecha de Ejecucion | fecha de Revision | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Nota: Los extintores que tienen manguera son de carga liquida, los que no tienen son de carga polvo quimico.

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONO

| | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA | Código: SIG-F-66<br>Versión: 1<br>Fecha de Emisión: 1 noviembre de 2018 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO | Occidente de Colombia | FECHA | 4-11-21 |
| TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO | Buldozer [ ] Retroexcavadora [X] Cargador [ ] Minicargador [ ] Piloteadora [ ] Paladraga [ ]<br>Excavadora [ ] Autohormigonera [ ] Motoniveladora [ ] Vibrocompactador [ ] Otra [ ] | | |
| PROPIETARIO | | OPERADOR | |

Marque en la casilla con la letra según corresponda
**C** (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

| | 1. ASPECTO A INSPECCIONAR | DÍAS LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Verificar nivel de aceite motor | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.2 | Verificar nivel de refrigerante | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.3 | Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.4 | Verificar estado de las correas | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.5 | Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.6 | Drenar filtro separador de agua | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.7 | Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.8 | Verificar nivel de aceite hidraulico | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.9 | Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.1 | Verificar funcionamiento de los mandos | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.11 | Verificar estado de los cilindros hidraulicos | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.12 | Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.13 | Verificar funcionamiento del tablero | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.14 | Verificar funcionamiento de pitos y alarmas | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.15 | Verificar estado de baterias y luces | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.16 | Verificar presión de aire y estado general de las llantas | N/A | N/A | N/A | | | | | |
| 1.17 | Verificar estado y funcionamiento de frenos | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.18 | Verificar el estado de la barra antivuelco | N/A | N/A | N/A | | | | | |
| 1.19 | Realizar engrase del equipo | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.20 | Verificar estado de vidrios y espejos | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.21 | Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.22 | Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.23 | Verificar estado del rodillo y acoples | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.24 | Verificar estado tubo de escape | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.25 | Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |

| | 2. AUTOHORMIGONERA | DÍAS LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Canal | | | | | | | | |
| 2.2 | Hidrolavadora | | | | | | | | |
| 2.3 | Bomba sube-baja canal | | | | | | | | |
| 2.4 | Tanque de agua | | | | | | | | |
| 2.5 | Pala de carga | | | | | | | | |
| 2.6 | Tambor | | | | | | | | |
| 2.7 | Tablero de mezcla | | | | | | | | |

**El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo**
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

| | 3. FACTORES HUMANOS | CUMPLE SI | NO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina? | ✓ | | | |
| 3.2 | El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina? | ✓ | | | |
| 3.3 | El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras? | ✓ | | | |
| 3.4 | Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina? | ✓ | | | |

| | INSPECCIONÓ | Vo.Bo Jefe Inmediato / SST |
|---|---|---|
| FIRMA | Pedro Antonio Gomez M. | |
| NOMBRE | Pedro Antonio Gomez | |
| C.C | 73.539.396 | 10.019.643 |

| | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA | Código: SIG-F-68<br>Versión: 1<br>Fecha de Emisión: 1 noviembre de 2018 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO | Lote 4 Occidental de Cota | FECHA | 4-11/2021 |
| TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO | Buldozer [ ] Retroexcavadora [ ] Cargador [ ] Minicargador [X] Pisoteadora [ ] Patrolinga [ ]<br>Excavadora [ ] Autohormigonera [ ] Motoniveladora [ ] Vibrocompactador [ ] Otra [ ] | | |
| PROPIETARIO | Occidental de Cota SAS | OPERADOR | Boiler Mora |

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

| 1. ASPECTO A INSPECCIONAR | | DÍAS LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Verificar nivel de aceite motor | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.2 | Verificar nivel de refrigerante | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.3 | Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.4 | Verificar estado de las correas | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.5 | Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.6 | Drenar filtro separador de agua | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.7 | Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.8 | Verificar nivel de aceite hidraulico | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.9 | Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.1 | Verificar funcionamiento de los mandos | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.11 | Verificar estado de los cilindros hidraulicos | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.12 | Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.13 | Verificar funcionamiento del tablero | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.14 | Verificar funcionamiento de pitos y alarmas | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.15 | Verificar estado de baterias y luces | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.16 | Verificar presión de aire y estado general de las llantas | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.17 | Verificar estado y funcionamiento de frenos | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.18 | Verificar el estado de la barra antivuelco | NA | NA | NA | | | | | |
| 1.19 | Realizar engrase del equipo | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.20 | Verificar estado de vidrios y espejos | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.21 | Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas) | NA | NA | NA | | | | | |
| 1.22 | Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.23 | Verificar estado del rodillo y acoples | NA | NA | NA | | | | | |
| 1.24 | Verificar estado tubo de escape | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.25 | Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |

| 2. AUTOHORMIGONERA | | DÍAS LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Canal | ✓ | | | | | | | |
| 2.2 | Hidrolavadora | ✓ | | | | | | | |
| 2.3 | Bomba sube-baja canal | | | | | | | | |
| 2.4 | Tanque de agua | | | | | | | | |
| 2.5 | Pala de carga | | | | | | | | |
| 2.6 | Tambor | | | | | | | | |
| 2.7 | Tablero de mezcla | | | | | | | | |

**El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo**
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

| 3. FACTORES HUMANOS | | CUMPLE SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina? | ✓ | | |
| 3.2 | El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina? | ✓ | | |
| 3.3 | El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras? | ✓ | | |
| 3.4 | Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina? | ✓ | | |

| | INSPECCIONÓ | Vo.Bo Jefe Inmediato / SST |
|---|---|---|
| FIRMA | | |
| NOMBRE | Boiler Mauricio Mora | |
| C.C | 1193537045 | 1094404... |

| | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA | Código: SIG-F-56<br>Versión: 1<br>Fecha de Emisión: 1 noviembre de 2018 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | Occidental de Colombia | | | | | **FECHA** | 11-11-24 | | | | |
| **TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO** | Buldozer ☐ | Retroexcavadora ☒ | Cargador ☐ | Minicargador ☐ | Piloteadora ☐ | Paladraga ☐ | Excavadora ☐ | Autohormigonera ☐ | Motoniveladora ☐ | Vibrocompactador ☐ | Otra ☐ _____ |
| **PROPIETARIO** | | | | | | **OPERADOR** | | | | | |

Marque en la casilla con la letra según corresponda
**C** (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

| | 1. ASPECTO A INSPECCIONAR | DÍAS | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |
| 1.1 | Verificar nivel de aceite motor | | C | C | C | C | C | | |
| 1.2 | Verificar nivel de refrigerante | | C | C | C | C | C | | |
| 1.3 | Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor | | C | C | C | C | C | | |
| 1.4 | Verificar estado de las correas | | C | C | C | C | C | | |
| 1.5 | Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire | | C | C | C | C | C | | |
| 1.6 | Drenar filtro separador de agua | | C | C | C | C | C | | |
| 1.7 | Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite | | C | C | C | C | C | | |
| 1.8 | Verificar nivel de aceite hidraulico | | C | C | C | C | C | | |
| 1.9 | Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico | | C | C | C | C | C | | |
| 1.1 | Verificar funcionamiento de los mandos | | C | C | C | C | C | | |
| 1.11 | Verificar estado de los cilindros hidraulicos | | C | C | C | C | C | | |
| 1.12 | Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tomamesa, etc) | | C | C | C | C | C | | |
| 1.13 | Verificar funcionamiento del tablero | | C | C | C | C | C | | |
| 1.14 | Verificar funcionamiento de pitos y alarmas | | C | C | C | C | C | | |
| 1.15 | Verificar estado de baterias y luces | | C | C | C | C | C | | |
| 1.16 | Verificar presión de aire y estado general de las llantas | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 1.17 | Verificar estado y funcionamiento de frenos | | C | C | C | C | C | | |
| 1.18 | Verificar el estado de la barra antivuelco | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 1.19 | Realizar engrase del equipo | | C | C | C | C | C | | |
| 1.20 | Verificar estado de vidrios y espejos | | C | C | C | C | C | | |
| 1.21 | Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas) | | C | C | C | C | C | | |
| 1.22 | Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc) | | C | C | C | C | C | | |
| 1.23 | Verificar estado del rodillo y acoples | | C | C | C | C | C | | |
| 1.24 | Verificar estado tubo de escape | | C | C | C | C | C | | |
| 1.25 | Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura) | | C | C | C | C | C | | |

| | 2. AUTOHORMIGONERA | DÍAS | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |
| 2.1 | Canal | | | | | | | | |
| 2.2 | Hidrolavadora | | | | | | | | |
| 2.3 | Bomba sube-baja canal | | | | | | | | |
| 2.4 | Tanque de agua | | | | | | | | |
| 2.5 | Pala de carga | | | | | | | | |
| 2.6 | Tambor | | | | | | | | |
| 2.7 | Tablero de mezcla | | | | | | | | |

**El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo**
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

| | 3. FACTORES HUMANOS | CUMPLE | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | | NO | | |
| 3.1 | Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina? | C | | | | |
| 3.2 | El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina? | C | | | | |
| 3.3 | El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras? | C | | | | |
| 3.4 | Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina? | C | | | | |

| | INSPECCIONÓ | Vo.Bo Jefe inmediato / SST |
|---|---|---|
| FIRMA | Pedro E. Sanmiguel M. | |
| NOMBRE | Pedro Antonio Sanmiguel | |
| C.C | 93.539.396 | 1.065.196.474 |

# ANEXO 2: INSPECCIÓN BOTIQUIN

| OCCIDENTAL DE COLOMBIA | OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS | DOCUMENTO No. PAS-FO-54 VERSIÓN 1 20/10/2015 |
|---|---|---|
| | FORMATO PARA REVISIÓN DE BOTIQUINES | |

CONTRATO O LUGAR: Lote 4

FECHA DE REVISIÓN: DD 5 MM 11 AA 2024

REVISIÓN REALIZADA POR: Harold Bello

TIPO DE BOTIQUÍN

| ELEMENTOS | CANT | ESTADO C | ESTADO NC | ESTADO N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasas estériles | 4 | ✓ | | | |
| Aplicadores | 5 | ✓ | | | |
| Curitas | 20 | ✓ | | | |
| Juego inmovilizadores (aplica solo para botiquín de bodega) | 1 | ✓ | | | |
| Vendaje en rollo de gasa | 2 | ✓ | | | |
| Micropore de 2 cm de ancho | 1 | ✓ | | | |
| Agua esteril o Solución salina | 1 | ✓ | | | |
| Prepodine solución | 1 | ✓ | | | |
| Toallas higiénicas | 2 | ✓ | | | |
| Alcohol | 1 | ✓ | | | |
| Tijeras para materiales | 1 | ✓ | | | |
| Linterna | 1 | ✓ | | | |
| Baja lenguas | 5 | ✓ | | | |
| Guantes quirurjicos | 4 | ✓ | | | |
| Jeringa desechable | 1 | ✓ | | | |
| Gafas de bioseguridad | 1 | ✓ | | | |
| Tapabocas | 1 | ✓ | | | |
| Sulfaplata Crema | 1 | ✓ | | | |
| Directorio de llamadas de urgencias | 1 | ✓ | | | |
| Manual de primeros auxilios | 1 | ✓ | | | |
| Libreta y esfero | 1 | ✓ | | | |
| Bolsa roja para desechos de atención | 3 | ✓ | | | |

| | | DOCUMENTO No. PAS-FO-28 VERSIÓN 1 20/10/2015 |
|---|---|---|
| | | |

DD MM AA

# ANEXO 3: CAPACITACIONES

| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA** | **Código:** FT-TEC-01<br>**Versión:** 1<br>**Fecha de aprobación:** 9-feb-2021 |
|---|---|---|

**REGISTRO DE CAPACITACIÓN**

Fecha: 1/11/21 Hora Inicio: 8:00 Hora Término: 8:10 Duración: 10 m.

Temas tratados:

Uso adecuado del baño.

Profesional: [illegible] Firma: [illegible] Lugar de Reunión: Lodi

Cargo: SST

| TIPO DE COMUNICACIÓN | |
|---|---|
| Marque una X | |
| CHARLA DIARIA (5 MINUTOS) | X |
| CHARLA SEMANAL | |
| CHARLA OPERACIONAL | |
| CHARLA INTEGRAL | |
| CHARLA VIDA SALUDABLE | |
| CHARLA RIESGO ESPECIFICO | |
| CAPACITACIÓN | |

| Nº | NOMBRE | DNI | FIRMA | ÁREA/PUESTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonson Morelo Agüero | 104409013 | [signature] | Centro Ladera Oficial |
| 2 | Juan Carlos Pablo | 72176750 | [signature] | oficial |
| 3 | Carolina Pérez Ramos | 104841668 | [signature] | Contadora mant. |
| 4 | Raul Guzman | 72173415 | [signature] | oficial |
| 5 | Edwin Rubas Rodriguez | 104603714 | [signature] | Oficial |
| 6 | Jorge Rodrigo C | 38009824 | JORGE RC | Ayudante |
| 7 | Hildaldo J. Mora | 92188111 | [signature] | Topografo |
| 8 | Pedro Ramos Machaco | 73539796 | [signature] | Op. Retro |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |

OBSERVACIONES:

NOTA: REMITIR EL FORMULARIO A SEGURIDAD E HIGIENE / PREVENCIÓN DE RIESGOS / RECURSOS HUMANOS (según corresponda)

| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA** | **Código:** FT-TEC-01<br>**Versión:** 1<br>**Fecha de aprobación:** 9-feb-2021 |
|---|---|---|

## REGISTRO DE CAPACITACIÓN

Fecha: 5/11/24 Hora Inicio: 8:00 Hora Término: 8:04 Duración: 4 min

Temas tratados:

Uso adecuado de la dotación

Profesional: Hadi Vilo Firma: Lugar de Reunión: Lote 11

Cargo: SST

| TIPO DE COMUNICACIÓN | |
|---|---|
| Marque una X | |
| CHARLA DIARIA (5 MINUTOS) | X |
| CHARLA SEMANAL | |
| CHARLA OPERACIONAL | |
| CHARLA INTEGRAL | |
| CHARLA VIDA SALUDABLE | |
| CHARLA RIESGO ESPECIFICO | |
| CAPACITACIÓN | |

| Nº | NOMBRE | DNI | FIRMA | ÁREA/PUESTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Gaviria Beltran | 1007660621 | Valentina G. | Trabajadora social |
| 2 | Jorge Rodelo G | 3800984 | Jorge RG | Ayudante |
| 3 | Daissa Manelo Garcia | 1047409045 | Daissa | Controladora Vial |
| 4 | Pedro Ramon Maldonado | 73.539.396 | Pedro Ramon | Pedro Retro |
| 5 | LUIS CORREDOR | 3200980 | LUIS CORREDOR | |
| 6 | Raul Guzman | 72173445 | Raul Guzman | Civil |
| 7 | Juan Cortes Ruiz | 72176750 | | Seguridad |
| | Belkis Daniris Vega | 1123320445 | | Operacion Sudor |
| 9 | Hidaldo J. Mozo | 42168111 | | Topografia |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |

OBSERVACIONES:

NOTA: REMITIR EL FORMULARIO A SEGURIDAD E HIGIENE / PREVENCIÓN DE RIESGOS / RECURSOS HUMANOS (según corresponda)

| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA** | **Código:** FT-TEC-01<br>**Versión:** 1<br>**Fecha de aprobación:** 9-feb-2021 |
|---|---|---|

**REGISTRO DE CAPACITACIÓN**

Fecha: 6/11/21 Hora Inicio: 7:00 Hora Término: 7:08 Duración: 8 m

Temas tratados:

Señalizacion en Obra

Profesional: Hector Ramos Firma: Lugar de Reunión: Obra

Cargo: SST

| TIPO DE COMUNICACIÓN | |
|---|---|
| Marque una X | |
| CHARLA DIARIA (5 MINUTOS) | X |
| CHARLA SEMANAL | |
| CHARLA OPERACIONAL | |
| CHARLA INTEGRAL | |
| CHARLA VIDA SALUDABLE | |
| CHARLA RIESGO ESPECIFICO | |
| CAPACITACIÓN | |

| Nº | NOMBRE | DNI | FIRMA | ÁREA/PUESTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Ramiro Machado | 73.539.396 | | Operador Rodillo |
| 2 | Eberto Agnes Bastos | 1047409015 | | Controladora Vial |
| 3 | Raul Guzman | 72173415 | | Obrero |
| 4 | Belkys Maria Mora | 11431325 | | Comunicadora Social |
| 5 | Hidalgo Mozo | 92166111 | | Topografia |
| 6 | Jorge Rodillo 6 | 38009841 | | Auxiliar |
| 7 | Jose Cotes | 5430711 | | Vigia |
| 8 | Luis Carlos | 38009880 | | Luis Carlos |
| 9 | [illegible] | 8731.658 | | [illegible] |
| 10 | Valentina Gaviria Beltran | 1007660621 | | T.S. |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |

OBSERVACIONES:

NOTA: REMITIR EL FORMULARIO A SEGURIDAD E HIGIENE / PREVENCIÓN DE RIESGOS / RECURSOS HUMANOS (según corresponda)

# ANEXO 4: PÓLIZAS APROBADAS

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS** 4650541354

**PÓLIZA No: 465 - 47 - 994000008279** **ANEXO: 0**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN DIA | MES | AÑO | FECHA DE IMPRESIÓN DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 09 | 2023 | 14 | 09 | 2023 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE:: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

BENEFICIARIO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 12/09/2023 | 30/04/2024 | 1,706,333,326.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 12/09/2023 | 31/12/2026 | 427,083,331.50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | VER NOTA ACLARATORIA | | 1,708,333,326.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *3,843,749,983.50 | $ *******24,295,308 | $****15,000.00 | $ ****4,618,959 | $ *******28,929,267 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 | | | |

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUÉLLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000465054135

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá.

CLIENTE

CADE25780A0EFD7D5A

**Defensor del Consumidor Financiero:** Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 458 7174 **Fax:** (601) 458 7174 * **Celular:** 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
**Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:** https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000008279** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

**TEXTO ITEM 1**

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**4650541388**

**PÓLIZA No: 465 -74 - 994000002359** **ANEXO:0**

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO** COD. AGE: 465 RAMO: 74 PAP:

| DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 09 | 2023 | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | 12 | 09 | 2023 | 23:59 | | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | 110 | 14 | 09 | 2023 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN | | |

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

| | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA DEL ANEXO | 12 | 09 | 2023 | 23:59 | | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | 110 |
| | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | |

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

DIRECCIÓN: Centro diagonal 30 # 30 - 78 Plaza de la aduana. CIUDAD: **CARTAGENA, BOLIVAR** TELÉFONO: 6056501092

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGE NIT : 890480184

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOLIVAR CIUDAD: CARTAGENA

DIRECCION: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 580,000,000.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 580,000,000.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 580,000,000.00 | | |
| | PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS | 580,000,000.00 | | |
| | BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL | 580,000,000.00 | | |
| | RCE PATRONAL | 580,000,000.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 580,000,000.00 | | |
| | CONTAMINACION | 580,000,000.00 | | |
| | GASTOS MEDICOS | 580,000,000.00 | | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 580,000,000.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. REFERENTE A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***580,000,000.00 | $ **********384,548 | $*********0.00 | $ *******73,064 | $ **********457,612 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 |

**COASEGURO CEDIDO**

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

**FIRMA ASEGURADOR** (415)7701861000019(8020)000000000070004650541 38 **FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780A0BFD7D57 CLIENTE KORTIZ 0

**Defensor del Consumidor Financiero:** Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 458 7174
**Fax:** (601) 458 7174 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensora-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS** 4650541354

**PÓLIZA No: 465 - 47 - 994000008279** **ANEXO: 1**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN DIA | MES | AÑO | FECHA DE IMPRESIÓN DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 2024 | 03 | 07 | 2024 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

BENEFICIARIO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 12/09/2023 | 21/10/2024 | 1,708,333,326.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 12/09/2023 | 21/06/2027 | 427,083,331.50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | VER NOTA ACLARATORIA | 1,708,333,326.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSION NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *3,843,749,983.50 | $ **********0 | $*********0.00 | $ **********0 | $ **********0 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 | | | |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA, PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MERCADEO PUBLICITARIO A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES PUSH, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO EL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO O GESTION DECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO. PARA FINES CONCRETOS, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONDEINDEMNIZACION@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wps_4_0/sas_institucional/politicas-de-tratamiento-de-datos-personales.aspx

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INEQUÍVOCA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRA RELACIONADA CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL O EL REGISTRO DE SOCIEDAD, LO QUE INCLUYE EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE INVOLUCREN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/RELACES-DE-INTERES/POLITICAS-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

(415)7701861000019(8020)000000000007000465054135

**FIRMA ASEGURADOR** **FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780907FD7D5E CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 0229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2500 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601; ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000008279** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

**TEXTO ITEM 1**

- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2014.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS** 4650541388

**PÓLIZA No: 465 -74 - 994000002359 ANEXO:1**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD AGE: 465 RAMO: 74 PAP:

| DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 2024 | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | | 21 | 06 | 2024 | 23:59 | 173 | 03 | 07 | 2024 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN | | |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

| | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA DEL ANEXO | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | | 21 | 06 | 2024 | 23:59 | 173 |
| | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | |

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

DIRECCIÓN: CENTRO PLAZA DE LA ADUANA CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR TELÉFONO: 3156560284

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

### DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGE NIT : 890480184

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOLÍVAR CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCION: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 580,000,000.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 580,000,000.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 580,000,000.00 | | |
| | PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS | 580,000,000.00 | | |
| | BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL | 580,000,000.00 | | |
| | RCE PATRONAL | 580,000,000.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 580,000,000.00 | | |
| | CONTAMINACION | 580,000,000.00 | | |
| | GASTOS MEDICOS | 580,000,000.00 | | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 580,000,000.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. REFERENTE A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***580,000,000.00 | $ **********0 | $*********0.00 | $ **********0 | $ **********0 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 |

**COASEGURO CEDIDO**

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004650541 38

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780907FD7D5D CLIENTE AGUIZA 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000002359** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

**TEXTO ITEM 1**

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023
- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024.

CLIENTE

## LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000002359 ANEXO: 1 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACION: 829.000.075-1

ASEGURADOS

| ITEM | ASEGURADO | C.C. ó NIT | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD | VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURA | 8904801844 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIA | CARTAGENA DE INDIAS | 580,000,000.00 | 0 | 0 |

| PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |
|---|---|
| 0 | 0 |

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
4650541354

**PÓLIZA No: 465 - 47 - 994000008279** **ANEXO: 2**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 03 | 07 | 2024 | 03 | 07 | 2024 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

BENEFICIARIO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 12/09/2023 | 19/11/2024 | 1,708,333,326.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 12/09/2023 | 19/07/2027 | 427,083,331.50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | VER NOTA ACLARATORIA | | 1,708,333,326.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSION NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *3,843,749,983.50 | $ **********360,388 | $*****5,000.00 | $ *******69,424 | $ **********434,812 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 | | | |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FEDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA, PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MERCANCÍA PUBLICITARIA A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES PUSH, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO EL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO. PARA TALES CONSECUALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wps_4_gestion_installing.html MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INEQUÍVOCA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRA RELACIONADA CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL O EL REPERTORIO SOCIAL, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LOS ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/RELACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000465054135

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780907FD7D58

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 0229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2500 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601; ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000008279** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

**TEXTO ITEM 1**

- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2014.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 1.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS** 4650541388

**PÓLIZA No: 465 -74 - 994000002359** **ANEXO:2**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD AGE: 465 RAMO: 74 PAP:

| FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO) | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 / 07 / 2024 | | 21 / 06 / 2024 | 23:59 | 19 / 07 / 2024 | 23:59 | 28 | 03 / 07 / 2024 |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

| VIGENCIA DEL ANEXO | VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 / 06 / 2024 | 23:59 | 19 / 07 / 2024 | 23:59 | 28 |

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

DIRECCIÓN: CENTRO PLAZA DE LA ADUANA CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR TELÉFONO: 3156560284

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

### DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGE NIT : 890480184

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOLÍVAR CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCION: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 650,000,000.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 650,000,000.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 650,000,000.00 | | |
| | PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS | 650,000,000.00 | | |
| | BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL | 650,000,000.00 | | |
| | RCE PATRONAL | 650,000,000.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 650,000,000.00 | | |
| | CONTAMINACION | 650,000,000.00 | | |
| | GASTOS MEDICOS | 650,000,000.00 | | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 650,000,000.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. REFERENTE A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***650,000,000.00 | $ **********109,699 | $*********0.00 | $ *******20,843 | $ **********130,541 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 |

**COASEGURO CEDIDO**

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004650541 38

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780907FD7A5E CLIENTE AGUIZA 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000002359** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

**TEXTO ITEM 1**

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023
- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 1.

NOTA: SE ACTUALIZAN VALOR ASEGURADO SEGÚN LOS SMMLV 2024.

CLIENTE

## LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000002359 ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACION: 829.000.075-1

ASEGURADOS

| ITEM | ASEGURADO | C.C. ó NIT | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD | VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURA | 890480184-4 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIA | CARTAGENA DE INDIAS | 650,000,000.00 | 109,699 | 130,541 |

| PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |
|---|---|
| 109,699 | 130,541 |

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
4650541354

**PÓLIZA No: 465 - 47 - 994000008279** **ANEXO: 3**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN DIA | MES | AÑO | FECHA DE IMPRESIÓN DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 07 | 2024 | 29 | 07 | 2024 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE:: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

BENEFICIARIO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION CONTRATO | AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|
| | CUMPLIMIENTO | 12/09/2023 | 30/12/2024 | 1,708,333,326.00 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 12/09/2023 | 30/08/2027 | 427,083,331.50 |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | VER NOTA ACLARATORIA | 1,708,333,326.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

OTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *3,843,749,983.50 | $ **********540,582 | $*****5,000.00 | $ ******103,661 | $ **********649,243 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 | | | |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA, PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), WHATSAPP, POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO EL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS CESIONARIOS COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO. PARA FINES COMERCIALES, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONDEMERCADEO@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/es_419/tratamiento-de-datos-personales.aspx

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, LISTO SIN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INEQUÍVOCA, AUTORIZO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y, EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LOS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000465054135

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780906ff7f5A

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 0229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000008279** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

**TEXTO ITEM 1**

- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2014.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 1.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 2 AL CONTRATO.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS** 4650541388

**PÓLIZA No: 465 -74 - 994000002359** **ANEXO:3**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD AGE: 465 RAMO: 74 PAP:

| DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 07 | 2024 | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | 19 | 07 | 2024 | 23:59 | | 30 | 08 | 2024 | 23:59 | 42 | 29 | 07 | 2024 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN | | |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

| | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA DEL ANEXO | 19 | 07 | 2024 | 23:59 | | 30 | 08 | 2024 | 23:59 | 42 |
| | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | |

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE:: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

DIRECCIÓN: CENTRO PLAZA DE LA ADUANA CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR TELÉFONO: 3156560284

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGE NIT : 890480184

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOLÍVAR CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCION: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 650,000,000.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 650,000,000.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 650,000,000.00 | | |
| | PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS | 650,000,000.00 | | |
| | BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL | 650,000,000.00 | | |
| | RCE PATRONAL | 650,000,000.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 650,000,000.00 | | |
| | CONTAMINACION | 650,000,000.00 | | |
| | GASTOS MEDICOS | 650,000,000.00 | | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 650,000,000.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. REFERENTE A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***650,000,000.00 | $ **********164,548 | $*********0.00 | $ *******31,264 | $ **********195,812 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 |

**COASEGURO CEDIDO**

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000465054138

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780906FF7F58 CLIENTE AGUIZA 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000002359** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

**TEXTO ITEM 1**

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023
- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 1.

NOTA: SE ACTUALIZAN VALOR ASEGURADO SEGÚN LOS SMMLV 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIPICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 2 AL CONTRATO.

CLIENTE

## LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000002359 ANEXO: 3 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACION: 829.000.075-1

ASEGURADOS

| ITEM | ASEGURADO | C.C. ó NIT | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD | VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURA | 8904801844 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIA | CARTAGENA DE INDIAS | 650,000,000.00 | 164,548 | 195,812 |

| PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |
|---|---|
| 164,548 | 195,812 |

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**4650541354**

**PÓLIZA No: 465 - 47 - 994000008279** **ANEXO: 4**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN DIA | MES | AÑO | FECHA DE IMPRESIÓN DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09 | 2024 | 19 | 09 | 2024 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE:: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

BENEFICIARIO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION CONTRATO | AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|
| | CUMPLIMIENTO | 12/09/2023 | 30/04/2025 | 1,706,333,326.00 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 12/09/2023 | 31/12/2027 | 427,083,331.50 |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | VER NOTA ACLARATORIA | 1,708,333,326.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

OTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *3,843,749,983.50 | $ ********1,583,134 | $*****5,000.00 | $ ******301,745 | $ ********1,889,879 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 | | | |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA, PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), WHATSAPP, APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS CESIONARIOS COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO. PARA FINES COMERCIALES, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONDEMERCADEO@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wps_4/gtlaw_tratamiento_de_datos_personales.aspx

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, LISTO SIN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INEQUÍVOCA, AUTORIZO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y, EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LOS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA OBLIGACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000465054135

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE257B080EF4765A

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 0229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000008279** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

**TEXTO ITEM 1**

- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2014.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 1.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 2 AL CONTRATO.

NOTA; CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGUN OTROSI NRO. 3 AL CONTRATO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
4650541388

**PÓLIZA No: 465 -74 - 994000002359** **ANEXO:4**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGE: 465 RAMO: 74 PAP:

| FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO) | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 09 / 2024 | | 30 / 08 / 2024 | 23:59 | 31 / 12 / 2024 | 23:59 | 123 | 19 / 09 / 2024 |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

| VIGENCIA DEL ANEXO | VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 / 08 / 2024 / 23:59 | | 31 / 12 / 2024 / 23:59 | | 123 |

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE:: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

DIRECCIÓN: CENTRO PLAZA DE LA ADUANA CIUDAD: **CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR** TELÉFONO: 3156560284

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGE NIT : 890480184

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOLÍVAR CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCION: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 650,000,000.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 650,000,000.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 650,000,000.00 | | |
| | PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS | 650,000,000.00 | | |
| | BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL | 650,000,000.00 | | |
| | RCE PATRONAL | 650,000,000.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 650,000,000.00 | | |
| | CONTAMINACION | 650,000,000.00 | | |
| | GASTOS MEDICOS | 650,000,000.00 | | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 650,000,000.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***650,000,000.00 | $ **********481,890 | $*********0.00 | $ *******91,559 | $ **********573,450 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 |

**COASEGURO CEDIDO**

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004650541 38

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE2578080BF57B5A CLIENTE IGARCIA 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2609 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Defensor del Consumidor Financiero:** Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180 **Fax:** (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
**Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:** https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000002359** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

**TEXTO ITEM 1**

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. REFERENTE A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023
- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 1.

NOTA: SE ACTUALIZAN VALOR ASEGURADO SEGÚN LOS SMMLV 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 2 AL CONTRATO.

NOTA; CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGUN OTROSI NRO. 3 AL CONTRATO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CLIENTE

## LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000002359 ANEXO: 4 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACION: 829.000.075-1


ASEGURADOS

| ITEM | ASEGURADO | C.C. ó NIT | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD | VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURA | 8904801844 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIA | CARTAGENA DE INDIAS | 650,000,000.00 | 481,890 | 573,450 |

| PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |
|---|---|
| 481,890 | 573,450 |

# ANEXO 4: BITACORA

| | | |
|---|---|---|
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA** | **Código:** FT-TEC-01<br>**Versión:** 1<br>**Fecha de aprobación:** 9-feb-2021 |

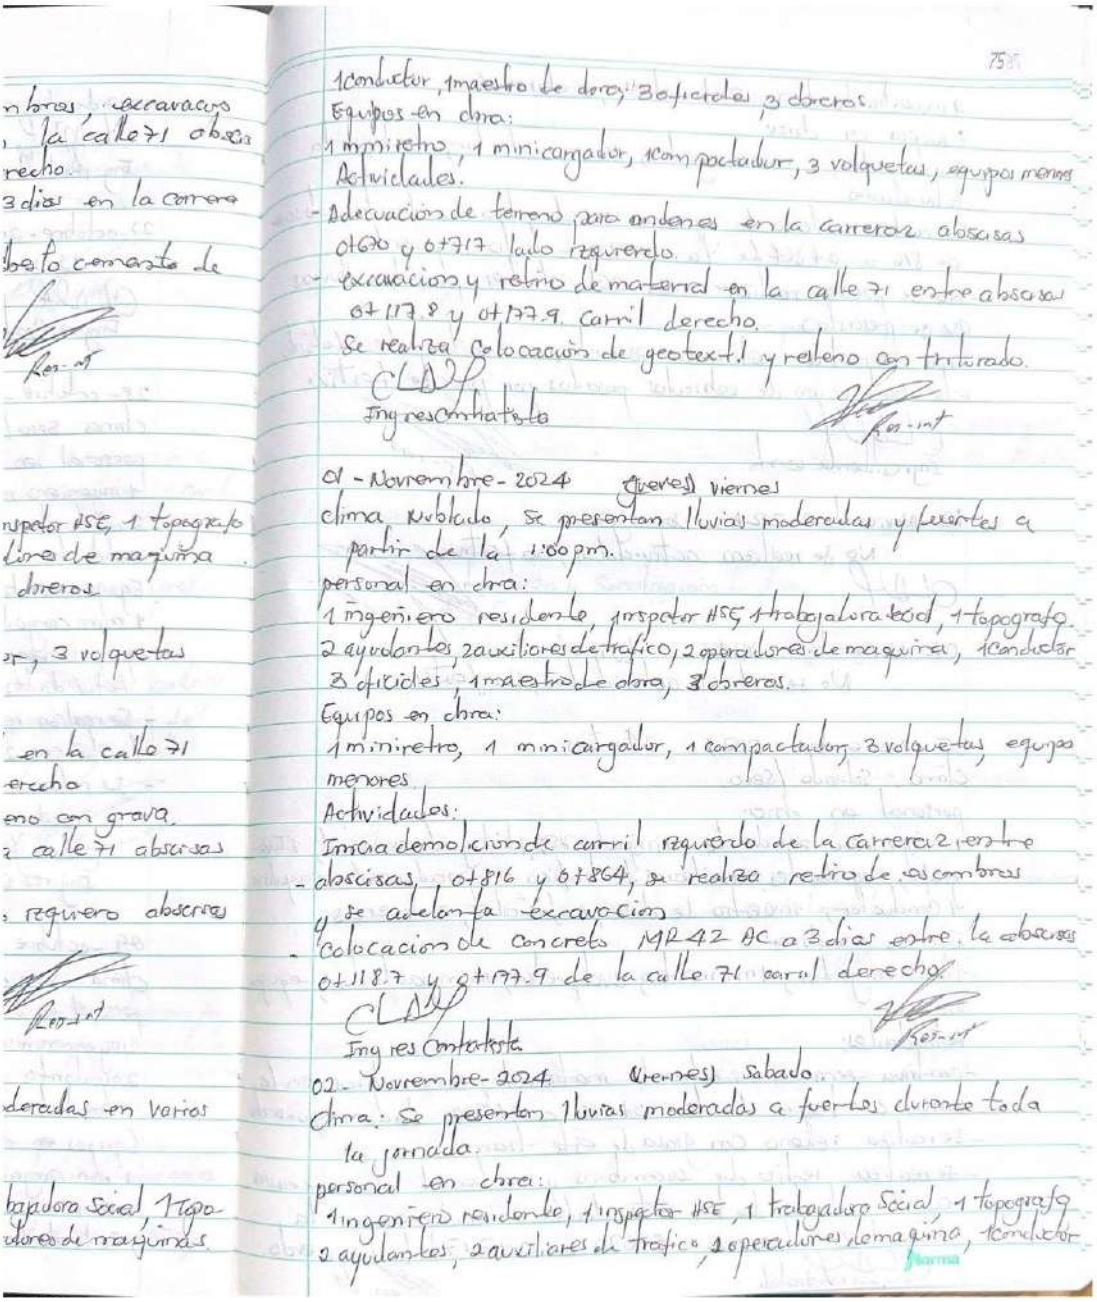


nbras, excavacion
la calle 71 abscis
recho.
3 dias en la carrera
beto comanto de
Res-int
spector HSE, 1 topografo
bores de maquina
obreros.
or, 3 volquetas
en la calle 71
erecha
eno con grava.
calle 71 abscisas
requiero abscisas
Res-int
deradas en varios
bajadora Social, 1 Topo
adores de maquinas

75

1 conductor, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 3 obreros.
Equipos en obra:
1 minitetro, 1 minicargador, 1 compactador, 3 volquetas, equipos menores
Actividades.
- Adecuación de terreno para andenes en la carrera 2 abscisas K1+630 y K1+717 lado izquierdo.
- excavacion y retiro de material en la calle 71 entre abscisas K1+117.8 y K1+177.9 carril derecho.
Se realiza colocación de geotextil y relleno con triturado.
CLAP
Ingeniero Contratista
Res-int

01-Noviembre-2024 (Jueves) Viernes
clima Nublado, se presentan lluvias moderadas y fuertes a partir de la 1:00 pm.
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector HSE, 1 trabajadora social, 1 topografo.
2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 2 operadores de maquina, 1 conductor
3 oficiales, 1 maestro de obra, 3 obreros.
Equipos en obra:
1 minitetro, 1 minicargador, 1 compactador, 3 volquetas, equipos menores.
Actividades:
Inicia demolicion de carril izquierdo de la carrera 2 entre abscisas K1+816 y K1+864, se realiza retiro de escombros y se adelanta excavacion.
- colocacion de concreto MR42 AC a 3 dias entre las abscisas K1+118.7 y K1+177.9 de la calle 71 carril derecho.
CLAP
Ingeniero Contratista
Res-int

02-Noviembre-2024 (Viernes) Sabado.
Clima: Se presentan lluvias moderadas a fuertes durante toda la jornada.
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector HSE, 1 trabajadora Social, 1 topografo
2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 2 operadores de maquina, 1 conductor

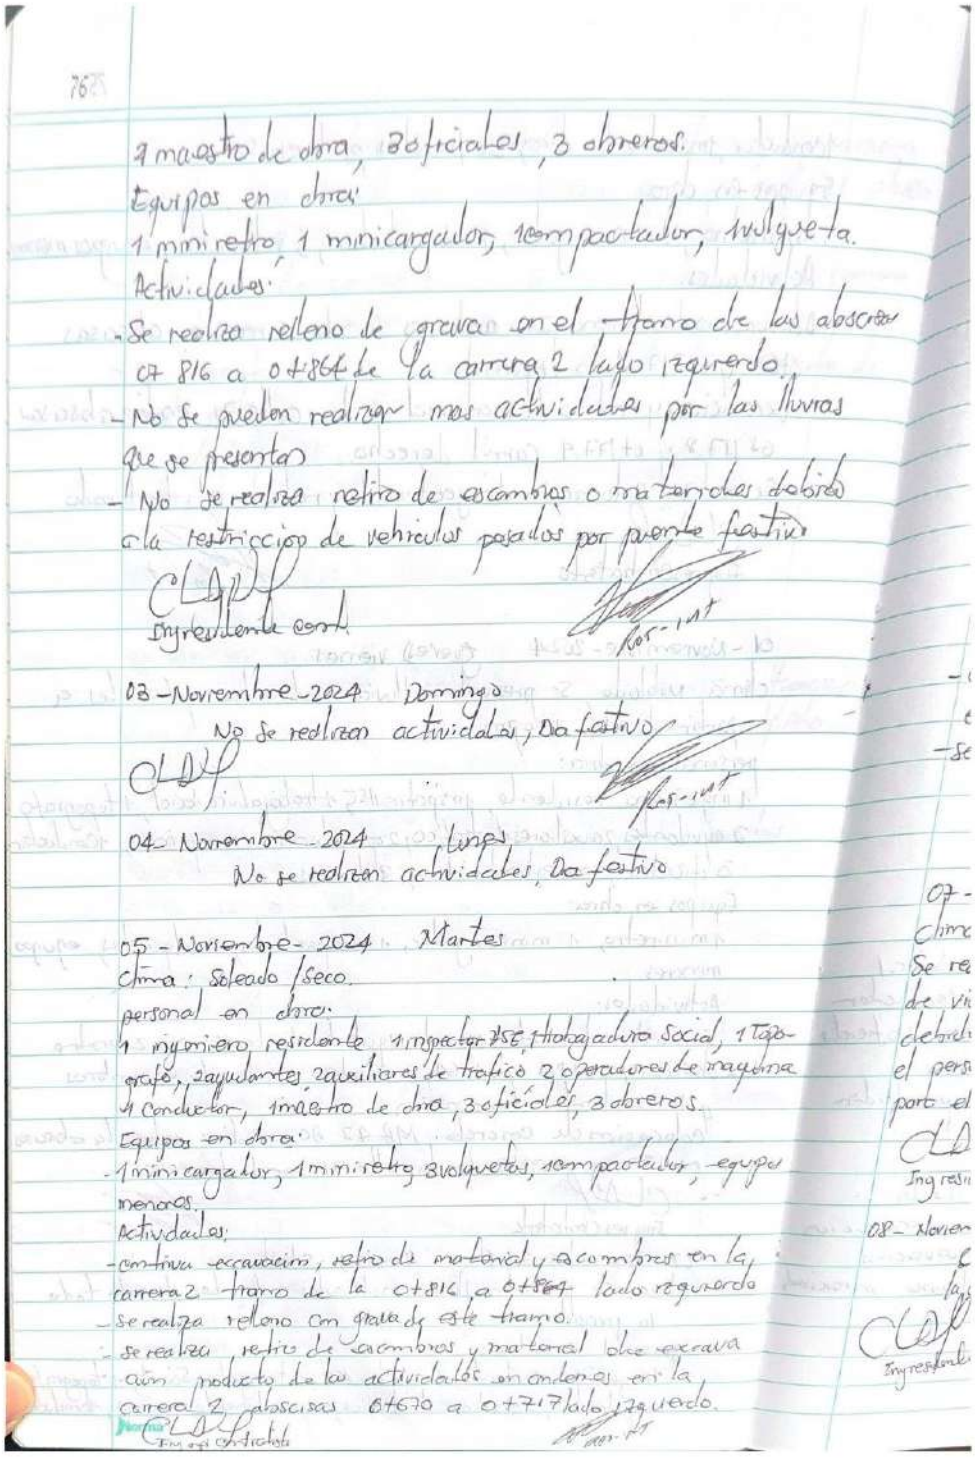

1 maestro de obra, 2 oficiales, 3 obreros.
Equipos en obra:
1 mini retro, 1 minicargador, 1 compactador, 1 volqueta.
Actividades:
- Se realiza relleno de grava en el tramo de las abscisas 0+816 a 0+864 de la carrera 2 lado izquierdo.
- No se pueden realizar mas actividades por las lluvias que se presentan
- No se realiza retiro de escombros o materiales debido a la restricción de vehículos pesados por puente festivo

Ingeniero cont. Res-Int

03-Noviembre-2024 Domingo
No se realizan actividades, Dia festivo

Res-Int


04-Noviembre-2024 Lunes
No se realizan actividades, Dia festivo

05-Noviembre-2024 Martes
clima: Soleado/seco.
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector HSE, 1 topógrafo, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 2 operadores de maquina, 1 Conductor, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 3 obreros.
Equipos en obra:
- 1 minicargador, 1 mini retro, 3 volquetas, 1 compactador, equipos menores.

Actividades:
- continua excavacion, retiro de material y escombros en la carrera 2 tramo de la 0+816 a 0+864 lado izquierdo
- se realiza relleno con grava de este tramo.
- se realiza retiro de escombros y material de excavación producto de las actividades en andenes en la carrera 2 abscisas 0+670 a 0+717 lado izquierdo.

Ingeniero residente

| | | |
|---|---|---|
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA** | **Código:** FT-TEC-01<br>**Versión:** 1<br>**Fecha de aprobación:** 9-feb-2021 |

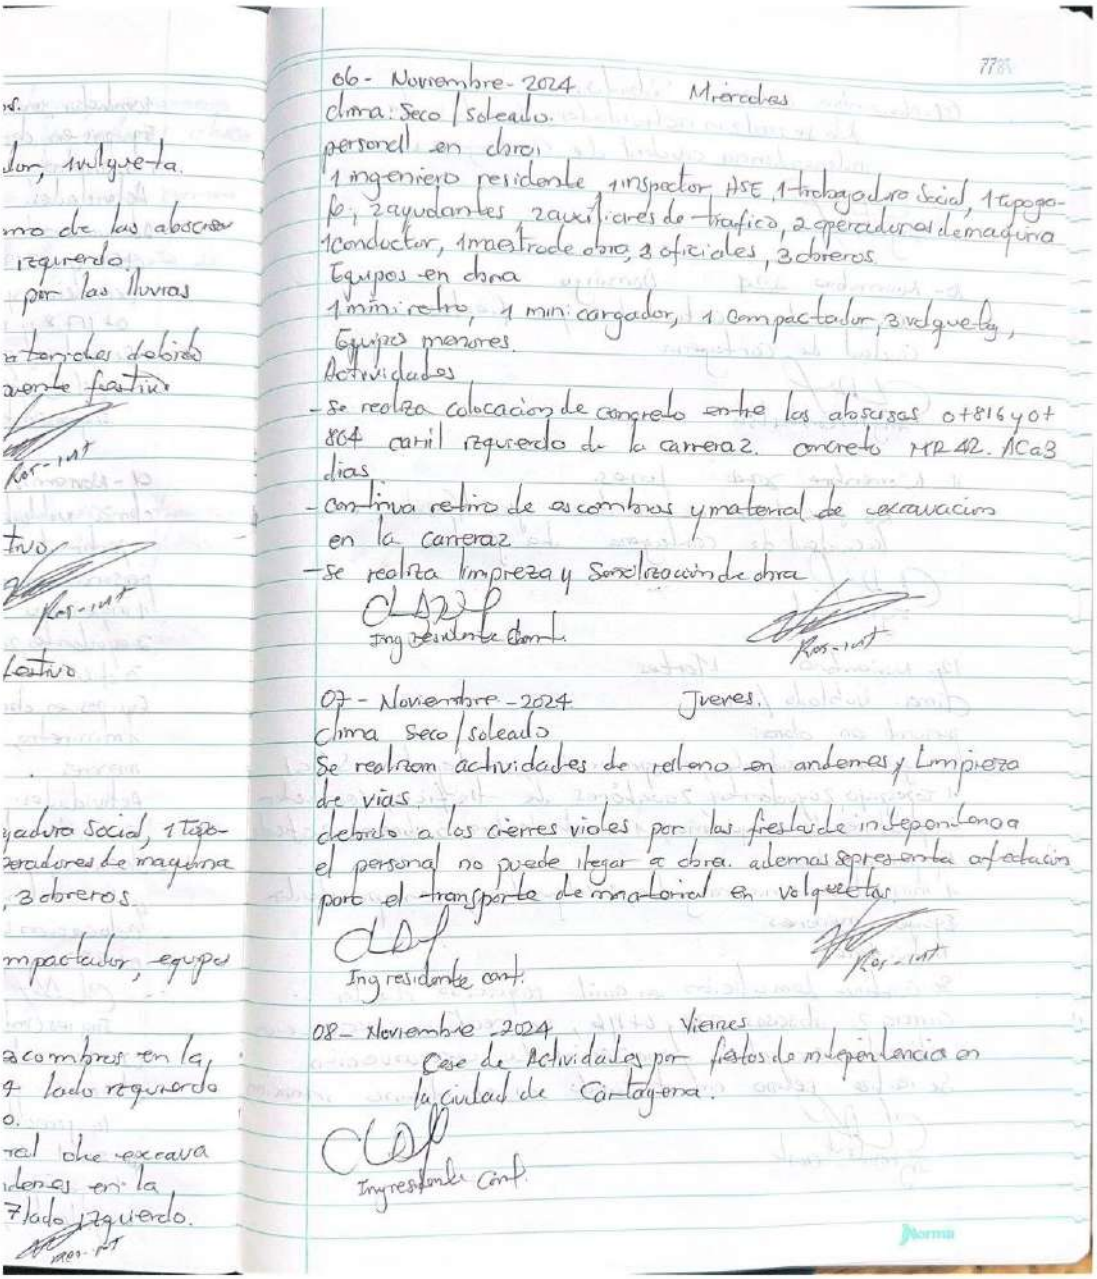

06- Noviembre- 2024 Miércoles
clima: Seco / soleado.
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector HSE, 1 trabajadora social, 1 topogafe, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 2 operadores de maquina 1 conductor, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 3 obreros.
Equipos en obra
1 mini retro, 1 mini cargador, 1 compactador, 3 volquetas,
Equipos menores.
Actividades
- Se realiza colocacion de concreto entre las abscisas 0+816 y 0+864 costil izquierdo de la carrera 2. concreto MR 42. IC a 3 dias
- continua retiro de escombros y material de excavacion en la carrera 2
- se realiza limpieza y Señalizacion de obra


Ing residente cont. Res-int

07- Noviembre- 2024 Jueves.
clima Seco / soleado
Se realizan actividades de relleno en andenes y Limpieza de vias.
debido a los cierres viales por las fiestas de independencia el personal no puede llegar a obra. ademas se presenta afectacion por el transporte de material en volquetas.

Ing residente cont. Res-int

08- Noviembre -2024 Viernes
Cese de Actividades por fiestas de independencia en la ciudad de Cartagena.

Ingresidente Cont.

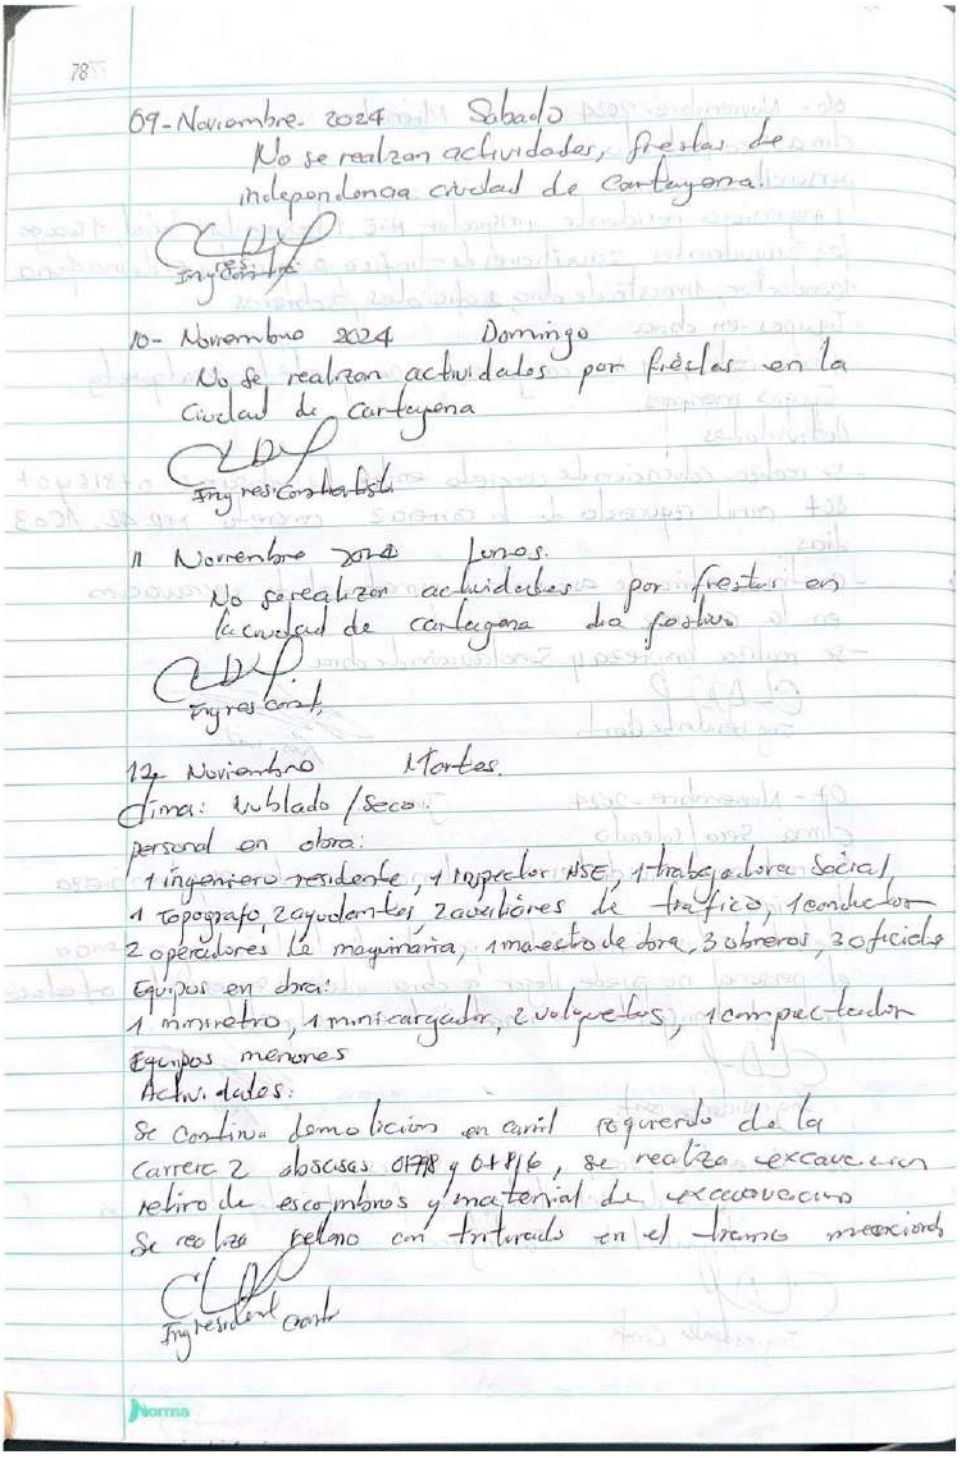

78

09-Noviembre 2024 Sabado
No se realizan actividades, fiestas de independencia ciudad de Cartagena.
Ingeniero Residente

10- Noviembre 2024 Domingo
No se realizan actividades por fiestas en la Ciudad de Cartagena
Ingeniero Residente

11 Noviembre 2024 Lunes.
No se realizan actividades por fiestas en la ciudad de cartagena dia festivo
Ingeniero Residente

12 Noviembre Martes.
Clima: Nublado / Seco.
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector HSE, 1 trabajadora Social, 1 Topografo, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 conductor 2 operadores de maquinaria, 1 maestro de obra, 3 obreros, 3 oficiales
Equipos en obra:
1 minirretro, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 compactador
Equipos menores
Actividades:
Se continua demolicion en canal reguero de la carrera 2 abscisas 0+778 y 0+816, se realiza excavacion retiro de escombros y material de excavacion
Se realiza relleno con triturado en el tramo mencionado
Ingeniero Residente

Norma

**INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL #8 NOVIEMBRE**

CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-038-2023 LOTE 4 CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: " EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV." – LOTE 4

**19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

**ELABORADO POR:** OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S

CARTAGENA – BOLÍVAR

## Contenido

INTRODUCCIÓN ..... 3

1. DATOS GENERALES ..... 3

2. DATOS DEL CONTRATO ..... 3

3.1. Plan de compras ..... 4

3.2. Verificación y/o modificación de diseños durante el periodo del presente informe ..... 5

4. PLAN DE TRABAJO ..... 5

4.1. Plan de Calidad ..... 5

4.1.1. Ensayos: ..... 5

4.1.2. Maquinaria y Equipo: ..... 5

4.1.3. Materiales ..... 6

4.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo: ..... 6

4.3. Plan Ambiental ..... 9

4.4. Plan de Gestión Social ..... 15

5. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES ..... 17

6. CONTROL DE PERSONAL ..... 17

7. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ..... 18

8. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. ..... 18

9. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO. ..... 18

10. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. ..... 22

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... 23

12. COMPLEMENTARIOS ..... 26

15. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ..... 27

## INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como objetivo detallar las actividades y especificaciones técnicas involucradas en la ejecución del proyecto de Rehabilitación de la Malla Vial Urbana del Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. - Fase IV (Lote 4). El proyecto se desarrollará bajo el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable, y abarca la construcción de pavimento rígido, obras de urbanismo, obras de drenaje y la señalización correspondiente, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los diseños y especificaciones técnicas del contrato.

En términos generales, las obras incluirán actividades como la localización, trazado y replanteo de la vía, corte y retiro de material sobrante, la conformación de la subrasante, y la instalación de concreto premezclado, así como el suministro y colocación de estructuras de drenaje. Además, se llevarán a cabo tareas de señalización vial, tanto vertical como horizontal, para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Cada actividad será ejecutada siguiendo los estándares técnicos de calidad y seguridad aplicables, asegurando la correcta implementación de las especificaciones y el uso de los materiales adecuados, tales como concreto reforzado y estructuras de acero de alta resistencia.

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 30/11/24 | **INFORME NO.** | **08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO NO.** | 2 | **DEL**: | **19/11/24** | **AL**: | **30/11/24** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. – LOTE 4 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BARRIO CRESPO, CARTAGENA – BOLÍVAR. |

### 2. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE:** | OBRA |
| **CONTRATO NO.:** | LP-SID-UAC-038-2023 LOTE 4 |
| **CONTRATISTA:** | OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S<br>NIT: 829.000.075-1 |
| **PLAZO INICIAL:** | 15 DÍAS |
| **FECHA DE INICIO:** | 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE:** | OBRA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **PLAZO ACTUALIZADO (***INCLUIDO PRORROGAS***):** | 6 MESES Y 13 DÍAS |
| **VALOR INICIAL:** | OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($8.541.666.630.00) |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 8.541.666.630.00 |

## 3. ACTIVIDADES DEL MES

A continuación, se da la relación de las actividades constructivas realizadas por el Contratista de Obra OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S, comprendido desde el 19 al 30 de Noviembre del 2024:

Durante este mes se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Vaciado de concreto de andenes en la cra 2
- ✓ Se realiza fundida en placa en cra 2 entre calle 70 y 71
- ✓ Se realizo demolición de placa de la calle 71
- ✓ Se realizó instalación de geotextil
- ✓ Se instalaron dovelas en las placas de la cra 2 y cra 3
- ✓ Se extendió material seleccionado estabilizado con cemento
- ✓ Se realiza retiro de escombros de las placas y cunetas demolidas
- ✓ Se realiza nivelación con grava y se compacta en el tramo Cra. 3 entre calles 70 y 71
- ✓ Se realiza limpieza y orden general en obra
- ✓ Se realiza evacuación de aguas lluvias con motobomba en las excavaciones abiertas

### 3.1. Plan de compras

Se llevo a cabo el plan de compras de acuerdo con lo programado, se anexa plan de compras de materiales representativos en obra.

**PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES PRODUCTOS REPRESENTATIVOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | LP-SID-UAC-038-2023 LOTE 4 | | | |
| **OBJETO** | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. – LOTE 4. | | | |
| **FECHA INICIACION** | 15/12/2023 | | | |
| **PLAZO DE EJCUCION** | 382 | | DIAS | |
| **FECHA DETERMINACION** | 31/12/2024 | | | |
| | | | | |
| Occidental de Colombia SAS, propone el siguiente plan de compras y adquisiciones del mes de Noviembre, de acuerdo al cronograma de ejecución en obra | | | | |
| **PLAN DE COMPRAS** | | | | |
| **INSUMO** | **CANTIDAD** | **UND** | **FECHA PUESTA EN OBRA** | **DESCRIPCIÓN** |
| TRITURADO 1" | 39.02 | TON | 5-nov-24 | RELLENO PARA SUBBASE PARA CAPA DE PAVIMENTO |
| CONCRETO MR-42 AC= 3 DÍAS | 84.25 | M3 | 24-oct-24 | CONCRETO PARA PLACAS DE PAVIMENTO |



**JAVIER ANDRES TORRES MORE**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S**

### 3.2. Verificación y/o modificación de diseños durante el periodo del presente informe

Durante el periodo comprendido entre el 19 al 30 de Noviembre del 2024, se envía la versión 6 del balance, a interventoría para su revisión.

## 4. PLAN DE TRABAJO

### 4.1. Plan de Calidad

#### 4.1.1. Ensayos:

En la obra de pavimentación en el barrio Crespo, se realizó un ensayo de resistencia a la flexión del concreto para asegurar que el material utilizado cumple con los requisitos de resistencia. El procedimiento consistió en moldear vigas de concreto, que luego fueron sometidas a una carga en su tercio medio hasta que fallaron.

Este ensayo permitió evaluar la capacidad del concreto para resistir las tensiones que se generan durante el uso del pavimento, asegurando que la estructura sea adecuada para soportar el tránsito y las condiciones locales. Los resultados obtenidos fueron comparados con los valores establecidos en las especificaciones del proyecto para garantizar la calidad de la obra.

#### 4.1.2. Maquinaria y Equipo:

Durante este período de trabajo se hizo uso de la siguiente maquinaria y equipos:

| MAQUINA / EQUIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Pulidora 7” | Utilizada para corte de tuberías, acero. |
| Taladro | Utilizada para demoliciones de registros. |
| Vibrocompactador | Utilizado para compactar y estabilizar las capas suelo que conforman las capas de pavimento. |
| Minicargador | Utilizado para cargar o transportar materiales en áreas difícil acceso. |
| Retrocargador | Utilizado para realizar excavación en el terreno natural. |
| Cortadora de pavimento | Utilizada para realizar cortes de juntas de pavimento |
| Flota canal | Utilizado para darle acabado al concreto en la capa de rodadura |
| Cepillo texturizador | Utilizado para darle acabado al concreto en la capa de rodadura |
| Vibrador de Concreto | Utilizado para eliminar burbujas de aire en el concreto |
| Planta eléctrica | Utilizado para generar energía en los equipos |
| Fumigadora | Utilizado para aplicar antisol al concreto |
| Vibrocompactador tipo rana | Utilizado para compactar el relleno en los andenes |
| Tronzadora | Utilizada para realizar cortes de acero |
| Bomba sumergible | Utilizado para evacuar aguas |
| Taladro percutor | Utilizado para realizar anclajes y demoliciones |
| Sierra para madera | Utilizado para corte de listones y tablas |

### 4.1.3. Materiales

Durante este período de trabajo se hizo uso de los siguientes materiales:

| MATERIALES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Geotextil | Utilizado para separar, filtrar, reforzar y drenar las capas del pavimento, evitando la mezcla de materiales como base y subbase granular. |
| Triturado 1” | Utilizado para relleno de subbase de placa de pavimento |
| Zahorra | Utilizada para relleno en zonas de andenes |
| Acero | Utilizado para reforzar las placas especiales y armar las canastillas entre placas de pavimento. |
| Concreto MR 42 | Utilizado para conformar la capa de rodadura del pavimento. |
| Concreto 3500 PSI | Utilizado para conformar las estructuras de concreto de andenes y bordillos. |

### 4.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo:

OCCIDENTAL DE COLOMBIA, reconoce la importancia del mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos sus colaboradores en los diferentes niveles de la organización, centros de trabajo y modalidades de contratación; es por ello, que se

compromete con la protección y promoción de la salud, así como de la prevención de accidentes y enfermedades causadas por estas condiciones y medio ambiente de trabajo.

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), está orientado al desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua; que incluye la política, la planeación, la organización, la implementación, la evaluación, la auditora y las acciones de mejora, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos laborales que pueden existir en todos los procesos de la organización.

El responsable asignado por la empresa para liderar el diseño, implementación y seguimiento del SG-SST, cuenta con el apoyo de Occidental de Colombia, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y/o VIGIA y trabajadores en general; los cuales tendrán participación en las diferentes actividades y programas ejecutados.

Todo este proceso se desarrolla cumpliendo firmemente con la Legislación Colombiana en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo establecida por el Ministerio de Trabajo y otra índole que suscriba OCCIDENTAL DE COLOMBIA. Para el cumplimiento de esta política y el logro de los objetivos propuestos, OCCIDENTAAL DE COLOMBIA permanentemente orientará sus esfuerzos y destinará los recursos físicos, económicos y personal idóneo requerido para la oportuna identificación, valoración e intervención de los peligros que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y situaciones de emergencia.

Para cumplimiento de esta política, la gerencia agradece el apoyo y colaboración de todos los grupos de interés. Además, para su efectivo cumplimiento se divulgará a todos los niveles de la organización y estará accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas.

OCCIDENTAL DE COLOMBIA se compromete a revisarla mínimo una vez al año y de requerirse, será actualizada acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como de la organización.

Se realiza periódicamente charlas de seguridad antes de iniciar actividades, se dan recomendaciones antes de iniciar actividades como identificación de los peligros/aspectos, para así tener una valoración y control de riesgos al que están expuestos. Se destaca siempre el compromiso de los trabajadores con el orden y aseo, así como el buen uso de los elementos de protección personal. Con el fin de divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.

Acciones implementadas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo.

- **Inspecciones y preoperacionales**

| ITEM | INSPECCION | FRECUENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Herramientas Manuales<br>EQUIPOS MECANICOS O ELECTRICOS. | Semanal | CUMPLE |
| 2 | Elementos De Protección Personal y dotación de trabajo | Semanal | CUMPLE |
| 3 | Inspecciones externas/locativas | Semanal | CUMPLE |
| 4 | Inspección Equipo Emergencia | Quincenal | CUMPLE |
| 5 | Inspección Botiquín | Quincenal | CUMPLE |
| 7 | Preoperacionales de equipos y maquinaria (kit de derrame) | Semanal | CUMPLE |
| 8 | Fichas técnicas de maquinaria y cronograma de mantenimiento. | Mensual | CUMPLE |

- **Entrega de EPP**

Se realiza entrega primera, reposición y cambios de los EPP. Además, se realiza el mismo procedimiento para la dotación de trabajo al personal en obra.


- **Charlas, socializaciones y pausas activas.**

Durante el mes de noviembre las charlas fueron enfocadas a la necesidad de obras, con la importancia de concientizar a los colaboradores con la orden y aseo y mantener la señalización en obra. En cuanto a las pausas activas, se realizaron con el fin de concientizar al personal la importancia de tomar pausas en la jornada laboral.

- **Jornadas de Orden y aseo**

Durante el presente mes se realizaron jornadas de orden y aseo en el campamento y frentes de obra como recogidas de material de volqueta.

- **Índice de severidad**

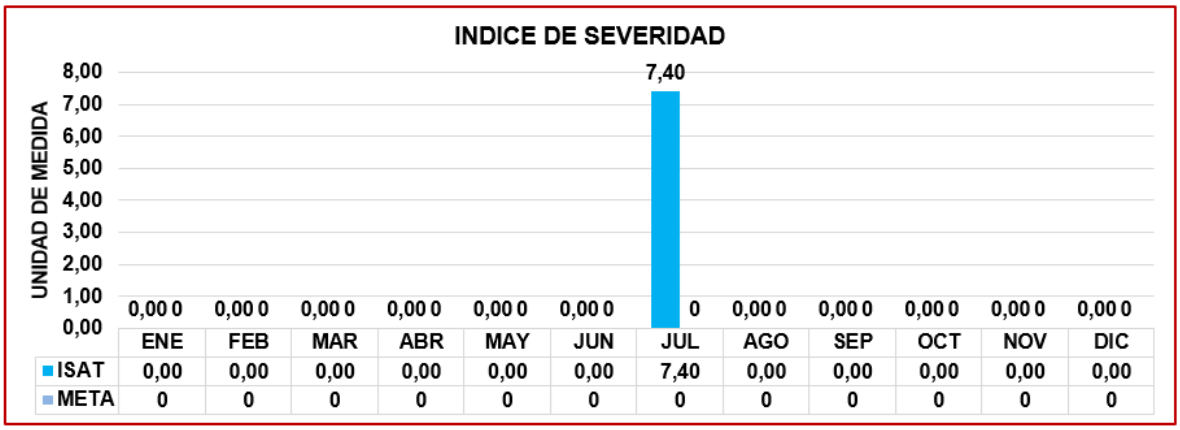


## 4.3. Plan Ambiental

OCCIDENTAL DE COLOMBIA, conforme al compromiso hacia el Medio Ambiente, parte de la premisa de absoluto RESPETO AL MEDIO AMBIENTE en el desarrollo de todas sus actividades. Para llevar a cabo su Política Medioambiental, atiende no sólo a las necesidades del presente, sino que prevé, en la medida de lo posible, las que en el futuro el Medio Ambiente y la Sociedad en su conjunto van a requerir. Los principios básicos que rigen dicha Política Medioambiental son los siguientes:

- Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas.
- Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes.
- Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la población y los ecosistemas.
- Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la gestión ambiental.
- Minimizar y aprovechar los residuos.
- Cumplir con la legislación y reglamentación ambiental vigente, así como de satisfacer otros requisitos adquiridos voluntariamente.

A continuación, se presentan los programas con las medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos y significativos del proyecto, correspondientes al periodo 19 de noviembre al 30 de noviembre de 2024, así como para potenciar los impactos ambientales positivos y dar cumplimiento a los requerimientos de la normatividad ambiental colombiana vigente.

- **Manejo integral de residuos solidos**

Durante el periodo correspondiente al 19 de noviembre hasta el 30 de noviembre el Contratista informa que se realizó disposición final de 10 kilos de residuos sólidos ordinarios no

aprovechables. Los cuales, se almacenan temporalmente en un contenedor plástico de propiedad de la empresa de Aseo PROMOAMBIENTAL S.A, que presta sus servicios de recolección y disposición final en el barrio Crespo Localidad N° 1 Histórica y del Caribe Norte. Se lleva registro de las cantidades de residuos sólidos generados por el personal dentro de la obra, los cuales se describen como; botellas de agua plásticas, servilletas, icopor, restos vegetales (hojas) de árboles presentes en el frente de obra que son recogidos en las jornadas de limpieza. En las 3 campañas de aseo y limpieza en frentes de obras, el personal usa sus elementos de protección y materiales de recolección de residuos donde se depositan los restos vegetales como hojas que caen de la cobertura vegetal presentes en las diferentes aceras de las vías intervenidas. Así mismo, se realizó una capacitación el día 29 de noviembre de 2024, sobre manejo adecuado de residuos sólidos.

| **REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA OBRA** | |
|---|---|
| SEMANA 1 | SEMANA 2 |
| 4 KILOS | 6 KILOS |
| **TOTAL** | **10 KILOS** |

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 19 de noviembre de 2024 a 30 de noviembre de 2024 | (Cantidad de residuos generados mes/ cantidad de residuos dispuestos correctamente mes) x 100<br><br>10Kg/10Kg*100=100%<br><br>(N° de jornadas de aseo proyectadas mes/ N° de jornadas de aseo realizadas mes) x 100<br><br>3/3* 100=100% |

- **Manejo residuos líquidos**

Durante el periodo correspondiente al 19 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2024, la empresa OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S informa que la obra cuenta con el uso de dos (2) baños portátiles para la disposición de residuos líquidos generados por el personal de trabajo. Los baños para el manejo de los residuos líquidos se encuentran ubicados entre la carrea 2 y la calle 71 del barrio Crespo donde se vienen desarrollando actividades constructivas de excavaciones, demoliciones y pavimentación de la vía, andenes y bordillos.
La empresa VEOLIA ha realizado una (1) jornada de mantenimiento de dos (2) baños portátiles para retirar y disponer correctamente los residuos líquidos generados en la etapa constructiva en el periodo correspondiente al corte 19 al 30 de noviembre de 2024. Como resultado de los mantenimientos en los baños portátiles la empresa VEOLIA retiro he hizo disposición fenal de 1 M3 de residuos líquidos. La empresa OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS se encuentra a la espera de la entrega de la certificación y disposición de las aguas residuales. A continuación, se

detallan los baños portátiles utilizados en el frente de obra para el uso exclusivo del personal que trabaja en las actividades constructivas del proyecto OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4

- **Manejo productos químicos**

El programa de manejo para productos químicos usados en la obra requiere de la adopción de prácticas adecuadas de manejo de disolventes químicos en las áreas de trabajo. Actualmente la obra en la construcción de la vía pavimentada del frente carrera 2, calle 71 y carrera 3, ha utilizado medio tanque de 20 litros de producto químico denominado Antisol Rojo, el cual es una solución de parafina en solventes orgánicos, que forma al aplicarse sobre concreto o mortero fresco, una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. A la fecha del periodo comprendido entre el 19 de noviembre y 30 de noviembre de 2024, no se ha presentado ningún tipo de derrame del producto indicado. En el escenario que se presente una eventualidad de derrame el equipo ambiental encargado implementará el uso de elementos de limpieza y remoción de áreas contaminadas mediante la utilización de arena o tierra.

- **Grasas y Aceites:**

La obra para el periodo comprendido entre el 19 de noviembre y 30 de noviembre de 2024, no ha generado aceites de combustión. Los vehículos y equipos que requieren cambio de aceites y mantenimientos, los realizan en centros y talleres especializados. Razón por la cual, en el frente de obra la carrera 2, calle 71 y carrera 3, no se generan este tipo de residuos. No obstante, la obra para hidratar las plataformas metálicas que sirven de estructura para fundir los andenes hace uso de aceite quemado. Este se aplica con una brocha sobre la estructura para que no se adhiera al momento de desinstalarla una vez fragua o toma consistencia el concreto.
De acuerdo a las recomendaciones dadas por el señor GUSTAVO AMOR GELIZ en Calidad de interventor ambiental se viene cumpliendo con el manejo adecuado de este insumo de vital importancia para fundir las vías indicadas. Por lo que se hace uso de material plástico para proteger el tanque que contiene aceite quemado, para prevenir o evitar cualquier eventualidad o derrame al suelo. En cuanto a las grasas se puede indicar que al periodo de manejo ambiental entre el 19 de noviembre y el 30 de noviembre de 2024, la obra ha utilizado un (2) tanque de grasas para aplicar en las mallas y estructuras de hierro que se instalan en las placas antes de fundir. Estos residuos de recipientes impregnados con grasas poseen un peso de 2 Kilogramos en 17 días.

| REGISTRO DE RESIDUOS DE PRODUCTOS QUIMICOS, SÓLIDOS, GRASAS Y ACEITES | | |
|---|---|---|
| **ACEITES** | | |
| **NOVIEMBRE** | | |
| 0 M3 | 0 M3 | |
| TOTAL | | 0 M3 |
| **PRODUCTOS QUÍMICOS** | | |
| **NOVIEMBRE** | | |
| TOTAL 1 UNIDAD DE TANQUE: 12 Kg (el tanque está en uso) | | |
| **GRASAS** | | |
| **SEMANA 1** | **SEMANA 2** | |
| 1 UNIDAD DE TANQUE de 1 Kg | 1 UNIDAD DE TANQUE de 1 Kg | |
| TOTAL | | 2 KILOGRAMO o 2 UNIDAD |

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 19 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 | 1) Cantidad de residuos líquidos generados semanalmente en baños portátiles/ cantidad de residuos líquidos generados mensualmente) x 100.<br>0 m3/0 m3*100=0%<br>2) Cantidad de residuos de productos químicos generados mes / cantidad de residuos de productos químicos dispuestos correctamente mes) x 100.<br>1 UNIDAD/1 UNIDAD*100=100% el recipiente está en uso sin disposición final<br>3) Cantidad de residuos de grasas generados mes / cantidad de residuos de grasas dispuestos correctamente mes) x 100.<br>2 Kg /2 Kg*100=100% |

- **Manejo a la generación de ruido y material particulado**

Las maquinarias que operaron en la ejecución del proyecto realizaron las actividades en los horarios adecuados con el fin de no generar ruido que perturbe la tranquilidad del sector, el horario de actividad está distribuido entre las 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y de 7: 00 a.m. a 12:00 pm los días sábados. Durante este corte no se realizaron actividades en horarios restringidos. Las volquetas utilizadas en el transporte de los materiales fueron cubiertas completamente con el fin de evitar el derrame de materiales. El material acumulado, arena y agregados, se mantuvo tapado temporalmente con una lona de plástico y humedecidos para evitar el arrastre con el viento. Es importante resaltar que, gracias al buen ritmo de avance de obras, los materiales de construcción de relleno y adecuación de terreno como zahorra y triturado permanecen muy poco tapados ya que se utilizan y se extienden de manera inmediata una vez llegan a la obra. En el periodo comprendido entre el 19 de noviembre al 30 de noviembre de 2024, la obra ha realizado cerramiento con polisombra verde a los tramos intervenidos, con el fin, de disminuir el material particulado proveniente de las actividades de la obra. El personal de la obra ha sido capacitado el día 29 de noviembre de 2024, sobre el manejo de la generación de ruido y emisión de material particulado.

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 19 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024 | 1) Cumplimiento de horario de trabajo semanal: 100% de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y de 7: 00 a.m. a 12:00 pm los días sábados<br>2) Metros lineales de cerramiento de obra con polisombra: 100%<br>200 m/200 m*100=100%<br>3) Numero de capacitación manejo generación de ruido y material particulado realizada/Numero de capacitación manejo generación de ruido y material particulado programada x 100.<br>1/1*100=100% |

- **Manejo a la Generación de Gases y Vapores**

El presente programa busca mitigar la alteración de la calidad del aire con la generación de gases y vapores emitidos por cada uno de los vehículos, equipos y maquinarias que hacen parte del proyecto para el desarrollo de sus actividades constructivas. La emisión de gases y vapores en el proyecto LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4, se realiza básicamente por movilización de maquinarias, equipos y materiales de construcción dentro del frente de obra. La obra cuenta con un registro de la maquinaria que se utilizó en la obra en el periodo correspondiente entre el 19 de noviembre al 30 de noviembre de 2024, con la respectiva documentación necesaria para laborar y la cual es exigida por las autoridades de tránsito en el perímetro donde se van a desarrollar las actividades.

- **Manejo de residuos de construcción y demolición RCD**

Durante el periodo de 19 de noviembre hasta 30 de noviembre de 2024, el Contratista informa que se realizaron retiros de 23,25 m3 de residuos de demolición de ANDENES LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO Y BORDILLO en la calle 71, 6,2 m3 de demolición de BORDILLOS en la calle 71, 28,8 m3 Demolición de ANDENES LADO IZQUIERDO en la carrera 2, 282 m3 de DEMOLICIÓN PLACA CARRERA 2, 28,5 DEMOLICIÓN BORDILLO CARRERA 3, del barrio Crespo, 34 m3 DEMOLICIÓN PLACA CALLE 71 y 7,1 m3 DEMOLICION BORDILLO CALLE 71, para un total de 409,8 m3 de residuos de RCD de ANDENES, PLACA y BORDILLOS, el cual se dispuso en Parque Loma de los Cocos, lugar donde funciona el Relleno Sanitario y la Escombrera Distrital de Cartagena de indias. La disposición final de estos residuos pétreos se realizó sin ninguna novedad, los vehículos pudieron llegar sin contratiempos al relleno sanitario. Las volquetas cuentan con identificación en las puertas laterales, también las volquetas tienen el Pin transportador requerimiento establecidos en la resolución 130 de 2015, por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos ambientales para el manejo, aprovechamiento, transporte y disposición final de los residuos de construcción y demolición, y se dictan otras disposiciones. El contratista lleva los registros diarios de las cantidades de material retirado por día, y las volquetas que están laborando. Se presentará a la interventoría un anexo con cada uno de los recibos de 31 disposición final de los RCD generados en las etapas de excavación y demolición de la carrera 2 y calle 71 del barrio Crespo.

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 19 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 | 1) Cantidad de m3 de material de excavación-demolición proyectado/ Cantidad de m3 de material excavación-demolición con disposición final x 100<br>= (980,9 m3/980,9 m3) x 100<br>=100%<br><br>2) Numero de capacitación manejo de RCD realizada/Numero de capacitación manejo de RCD programada x 100.<br>1/1*100=100% |

- **Educación ambiental**

La base de una buena gestión ambiental es la educación ambiental, ya que facilita la planeación y ejecución del manejo ambiental y posibilita la disminución de los efectos negativos que puede generar el presente proyecto vial.
En el periodo correspondiente entre el 19 de noviembre y el 30 de noviembre de 2024, fue posible capacitar al personal en temas de;
✓ Manejo Integral de Residuos Sólidos

✓ Manejo de Productos Químicos (disolventes), Grasas y Aceites
✓ Manejo a la Generación de Ruido y Material Particulado
✓ Manejo a la Generación de Gases y Vapores
✓ Manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD
✓ Normatividad ambiental vigente a proyectos constructivos

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 19 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre 2024 | 1) Numero de capacitaciones ambientales dictadas /Numero de capacitación manejo programadas x 100.<br>6/6*100=100% |

### 4.4. Plan de Gestión Social

Por medio del siguiente plan se da apertura al seguimiento mensual del plan de Gestión Social y Reputacional comprendido en el periodo del 19 al 30 de noviembre del 2024 dándole cumplimiento a lo socializado por el contratista OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS, en el contrato de obra No. LP-SID-UAC-038-2023 LOTE 4 que tiene como objetivo principal "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV." – LOTE 4" supervisado por la interventoría de INGEOCIM SAS.

- **Actas de vecindad**

Durante el mes de noviembre se continuó con el levante de actas de vecindad en la Cra. 3 entra calle 70 y 73.

- **Actores**

| **INSTITUCIONALES** | **TELEFONO** | **CORREO ELECTRONICO** |
|---|---|---|
| Surtigas | 3014793336<br>3014793290 | atencionalusuario@corvivienda.gov.co |
| Aguas de Cartagena | 6056943337 | correspondencia@acuacar.com |

| | | |
|---|---|---|
| Afinia | 115 | correspondencia@afinia.com.co |
| Autoridades públicas (policía nacional) CAI de crespo | 3007093662<br>3106005008 | Mecar.oac@policia.gov.co |
| Alcaldia distrital | 6056411370<br>018000415393 | alcalde@cartagena.gov.co |
| Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena (EPA) | 6056421316 | atencionalciudadano@epacartagena.gov.co |

| NO INSTITUCIONALES | ROLES | TELEFONO | SECTOR |
|---|---|---|---|
| Alvaro mendez siloa | Presidente de la junta de acción comunal | 3147076012 | Calle 70A Barrio Crespo |
| Jorge correa | administrador del conjunto la PROA | 3017956868 | Calle 70 A Barrio crespo |
| suarez | Administrador del conjunto el gloria | 3128105685 | Calle 70 A Barrio crespo |
| Javier | Administrador conjunto alba Sofía del mar y miembro de la veeduría | 3113193087 | Barrio crespo |
| Rafael morales | Vicepreciente de la junta de acción comunal de crespo | 3008156979 | Barrios crespo |
| Luis Antonio Gonzáles | Edil barrio crespo | 3114013205 | Carrera 71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oscar Gaviria | Miembro de Veeduria de crespo | 3163714697 | Carrera 2 barrio crespo |

- **Atención y acompañamiento social**

Se realizaron reuniones para atender las inquietudes y aportes que tienen los vecinos residentes de la obra frente a la ejecución de
esta.

- **Seguimiento y evaluación**

En el proceso de la ejecución de la obra se presentan imprevistos los cuales pueden afectar un poco las viviendas de las casas como manchar una pared, escombros y suciedad. Pero en nuestra empresa prima el bienestar de los ciudadanos a medida que vamos avanzando de este mismo modo vamos haciendo seguimiento y subsanación de todo tipo de molestias que pudo causar a las viviendas y espacio público.

## 5. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Durante este período se continuó y se definió la versión 6 del balance para llevar a cabo el cobro del acta Parcial de obra No. 3.

## 6. CONTROL DE PERSONAL

Se presentó el siguiente personal para la ejecución del proyecto, personal que fue aprobado por Interventoría.

| CARGO POR DESEMPEÑAR | NOMBRE | PROFESIÓN | CONDICIÓN | DEDICACIÓN SEGÚN TDR % |
|---|---|---|---|---|
| Director de Obra | Nicolás Eljadue Arrieta | Ingeniero Civil | Mano de obra calificada/activo | **25** |
| Residente de Obra | Charlie Romero Villalobos | Ingeniero Civil | Mano de obra calificada/activo | **100** |
| Especialista en Vías | Ramon de Jesús Torres Ortega | Ingeniero | Mano de obra calificada/activo | **30** |
| Especialista Estructural | Javier David Alarcón Gonzales | Ingeniero | Mano de obra calificada/activo | **30** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacionaly medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnicoen Aseguramiento de Calidad | Harold Alonso Badillo Amad | Ingeniero | Mano de obra calificada/activo | **100** |
| Profesional Social | Valentina Gaviria Beltrán | Psicóloga | Mano de obra calificada/activo | **100** |

## 7. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

El plazo para pagar la planilla de seguridad social del mes vence el 15 de Diciembre.

## 8. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

El contrato de Obra No. LP-SID-UAC-038-2023 - LOTE 4, a la fecha, se tiene consolidado el valor total del contrato y se empiezan a identificar cantidades de las actividades contractuales a ejecutar.

## 9. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

| Póliza No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Valor Aseg. | Expedición |
|---|---|---|---|---|---|
| **465-47-994000008279** | Aseguradora solidaria de Colombia | Cumplimiento | 12/09/23 – 30/04/24 | $1.708.333.326,00 | 14/09/23 |
| **465-47-994000008279** | Aseguradora solidaria de Colombia | Salarios y prestaciones | 12/09/23 – 31/12/26 | $427.083.331.,50 | 14/09/23 |
| **465-47-994000008279** | Aseguradora solidaria de Colombia | Estabilidad y Calidad de laObra | N/A | $1.708.333.326,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Predios, labores y operaciones | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contratistas y Subcontratistas | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Productos trabajados y operaciones terminadas | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Bienes bajo cuidado, tenencia y control | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | RCE patronal | 12/09/2023 – | $580.000.000,00 | 14/09/23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2023 | | |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Vehículos propios y no propios | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contaminación | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Gastos médicos | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-74-994000002359** | Aseguradora solidaria de Colombia | Responsabilidad civil cruzada | 12/09/2023 – 31/12/2023 | $580.000.000,00 | 14/09/23 |
| **465-47-994000008279 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Cumplimiento | 12/09/23 – 21/10/24 | $1.708.333.326,00 | 03/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 12/09/23 – 21/06/27 | $427.083.331.,50 | 03/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Estabilidad y calidad de la obra | N/A | $1.708.333.326,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Predios, labores y operaciones | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contratistas y Subcontratistas | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Productos trabajados y operaciones terminadas | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Bienes bajo cuidado, tenencia y control | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | RCE patronal | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Vehículos propios y no propios | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contaminación | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Gastos médicos | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 1** | Aseguradora solidaria de Colombia | Responsabilidad civil cruzada | 31/12/2023 – 21/06/2024 | $580.000.000,00 | 03/07/24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **465-47-994000008279 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Cumplimiento | 12/09/23 – 19/11/24 | $1.708.333.326,00 | 03/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 12/09/23 – 19/07/27 | $427.083.331.,50 | 03/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Estabilidad y calidad de la obra | N/A | $1.708.333.326,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Predios, labores y operaciones | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contratistas y Subcontratistas | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Productos trabajados y operaciones terminadas | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Bienes bajo cuidado, tenencia y control | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | RCE patronal | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Vehículos propios y no propios | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contaminación | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Gastos médicos | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 2** | Aseguradora solidaria de Colombia | Responsabilidad civil cruzada | 21/06/2024 – 19/07/2024 | $650.000.000,00 | 03/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Cumplimiento | 12/09/23 – 30/12/24 | $1.708.333.326,00 | 25/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 12/09/23 – 30/08/27 | $427.083.331.,50 | 25/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Estabilidad y calidad de la obra | N/A | $1.708.333.326,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Predios, labores y operaciones | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contratistas y Subcontratistas | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Productos trabajados y operaciones terminadas | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Bienes bajo cuidado, tenencia y control | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | RCE patronal | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Vehículos propios y no propios | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contaminación | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Gastos médicos | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 3** | Aseguradora solidaria de Colombia | Responsabilidad civil cruzada | 19/07/2024 – 30/08/2024 | $650.000.000,00 | 25/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Cumplimiento | 12/09/23 – 30/04/25 | $1.708.333.326,00 | 25/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 12/09/23 – 31/12/27 | $427.083.331.,50 | 25/07/24 |
| **465-47-994000008279 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Estabilidad y calidad de la obra | N/A | $1.708.333.326,00 | 25/07/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Predios, labores y operaciones | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contratistas y Subcontratistas | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Productos trabajados y operaciones terminadas | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Bienes bajo cuidado, tenencia y control | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | RCE patronal | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Vehículos propios y no propios | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Contaminación | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Gastos médicos | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |
| **465-74-994000002359 Anexo 4** | Aseguradora solidaria de Colombia | Responsabilidad civil cruzada | 30/08/2024 – 31/12/2024 | $650.000.000,00 | 10/09/24 |

## 10. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

Enviado.

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2024 | OCC-CTO038-052-2024 | DOCUMENTACION RETROEXCAVADORA CATERPILAR CAT0416EKSHA01220 | Javier Andrés Torres More<br>Representante Legal<br>Occidental de Colombia S.A.S | Carlos Mojica Contreras<br>Director de Interventoría<br>INGEOCIM SAS |
| 20/11/2024 | OCC-CTO038-055-2024 | BALANCE V6 MALLA VIAL CRESPO LOTE 4 | Javier Andrés Torres More<br>Representante Legal<br>Occidental de Colombia S.A.S | Carlos Mojica Contreras<br>Director de Interventoría<br>INGEOCIM SAS |

Recibido.

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2024 | T-005-2023-035-LT4 | Solicitud actualización y ajuste Cronograma, pólizas y demás documentos según otro sí N°3 – Reiteración de oficio T-005-2023-027-LT4. | Carlos Mojica Contreras<br>Director de Interventoría<br>INGEOCIM SAS | Javier Andrés Torres More<br>Representante Legal<br>Occidental de Colombia S.A.S |
| 22/11/2024 | T-005-2023-036-LT4 | Incumplimiento en los envíos oportunos de los pagos de seguridad social integral del personal. | Carlos Mojica Contreras<br>Director de Interventoría<br>INGEOCIM SAS | Javier Andrés Torres More<br>Representante Legal<br>Occidental de Colombia S.A.S |
| 25/11/2024 | T-005-2023-037-LT4 | Apremio No.1 – presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por parte de OCCIDENTAL DE COLOMBIA bajo el contrato de obra No. LP-SID UAC-038-2023 – Abandono frente de obra | Carlos Mojica Contreras<br>Director de Interventoría<br>INGEOCIM SAS | Javier Andrés Torres More<br>Representante Legal<br>Occidental de Colombia S.A.S |

## 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Ilustración 1. Inspección de equipos y botiquín




**Ilustración 2. Entrega de EPP**




**Ilustración 3. Charlas y socializaciones y pausas activas**




**Ilustración 4. Seguimiento PMT**




**Ilustración 5. Orden y aseo en obra**




**Ilustración 6. Demolición de placa de pavimento asfaltico**







**Ilustración 7. Demolición de placa de pavimento**







**Ilustración 8. Cargue y transporte de material**






**Ilustración 9. Vaciado de concreto**




**Ilustración 10. Compactación del terreno**




**Ilustración 11. Instalación de geotextil y capa de relleno para subbase**

## 12. COMPLEMENTARIOS

Durante el mes de Noviembre no se tuvo información complementaria.

## 13. ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

La interventoría realizó inspección y revisión de las siguientes actividades: Excavaciones, colocación de geotextil, rellenos con triturados y vaciados de concreto para placas de pavimentos, y demás actividades contempladas en el alcance del proyecto.

## 14. PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE OBRA

No se presentaron problemáticas de obra durante este periodo de tiempo.

## 15. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES


Las actividades del proyecto han continuado de manera satisfactoria, siguiendo los estándares de calidad establecidos. Durante este periodo se continúan actividades en la Cra. 2 entre las Cl. 63 y 73 realizando todas las obras de urbanismos como andenes y bordillos contemplados en el proyecto, con el objetivo de finiquitar dicho tramo. Asimismo, se continúan actividades en la Calle 71 entre Cra. 1 y 3, y en la Cra. 3, Tramo 1 entre calle 70 y 71, y se inician actividades en tramo 2 de la Cra. 3 entre calle 71 y 72.

Se recomienda:

- Mantener el ritmo de trabajo constante que ha permitido avanzar de manera sostenida, a pesar de los imprevistos.
- Continuar con la supervisión constante para detectar cualquier posible obstáculo o necesidad de ajuste en el proceso, y aplicar soluciones de manera proactiva.
- Revisar periódicamente los cronogramas y recursos disponibles para asegurar que no haya desfasajes significativos que puedan impactar en la fecha de finalización del proyecto.
- Incentivar la comunicación efectiva entre los equipos para garantizar que todos los problemas o requerimientos se atiendan de manera rápida y eficaz.

El proyecto ha demostrado un buen desempeño con una capacidad de respuesta eficiente ante los imprevistos surgidos. A pesar de las dificultades presentadas, se ha logrado mantener el avance sin mayores contratiempos, lo cual habla positivamente de la gestión del equipo a cargo. Si se mantiene el ritmo de trabajo y la búsqueda activa de soluciones, el proyecto tiene altas probabilidades de culminar dentro de los plazos y con los resultados esperados.

# ANEXO 1: INSPECCIÓN DE EQUIPOS

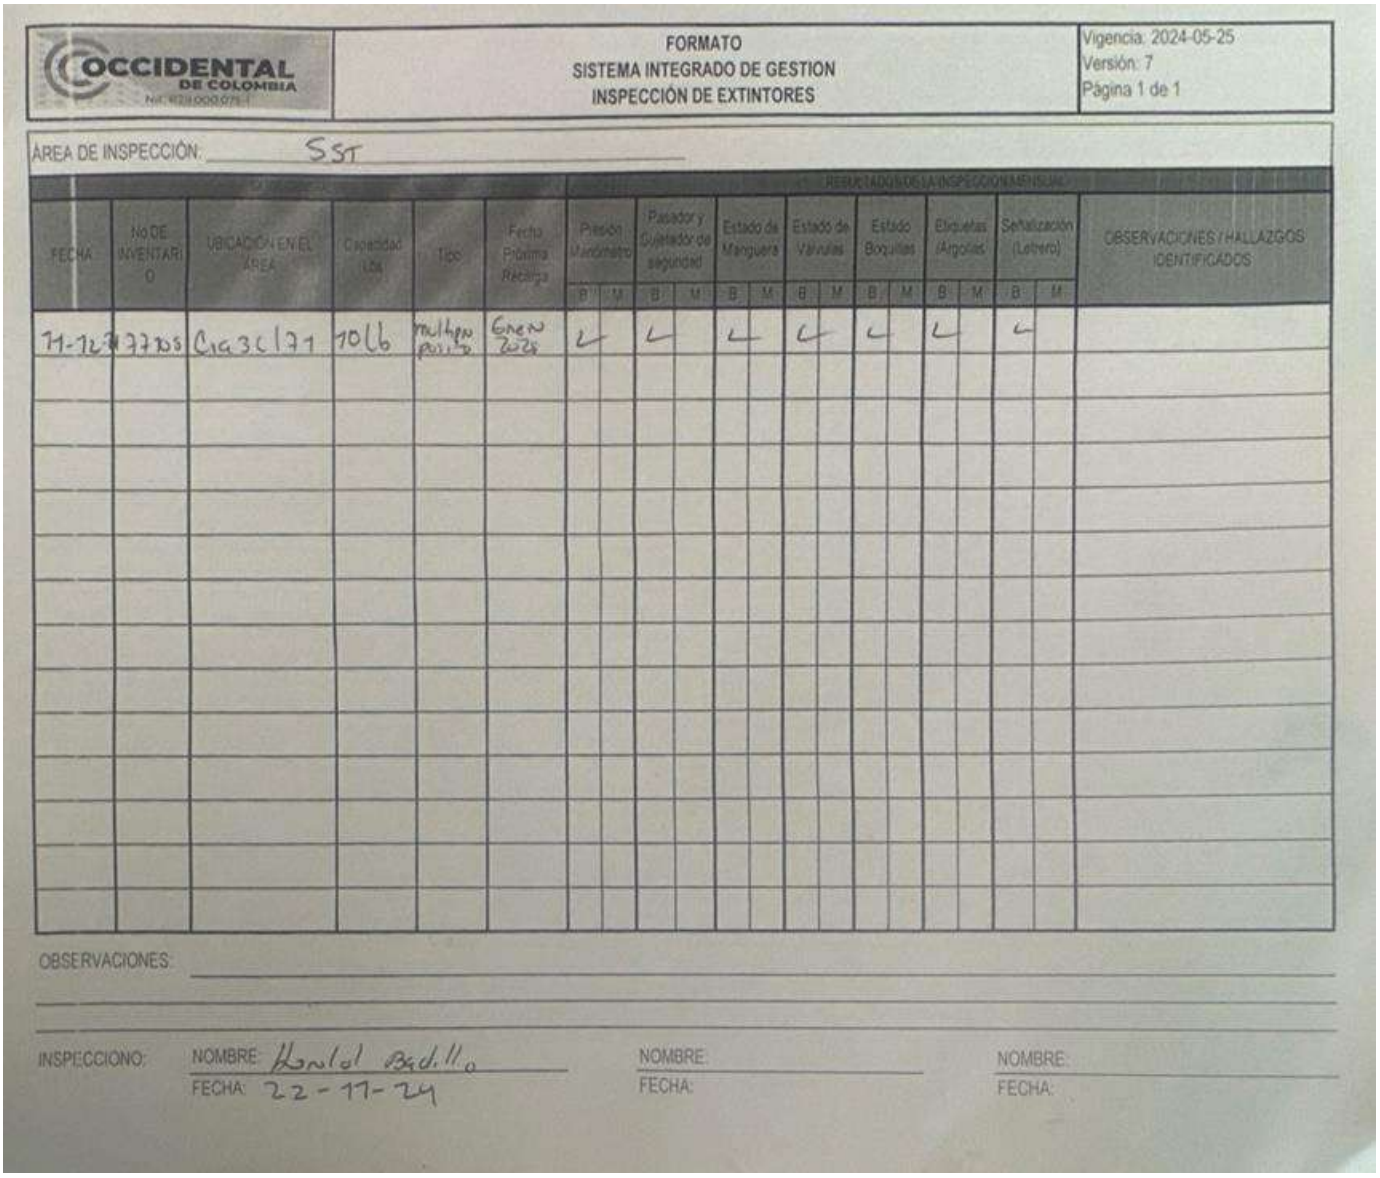

OCCIDENTAL DE COLOMBIA

FORMATO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Vigencia: 2024-05-25
Versión: 7
Página 1 de 1

ÁREA DE INSPECCIÓN: SST


| FECHA | No DE INVENTARIO | UBICACIÓN EN EL ÁREA | Capacidad (Lbs) | Tipo | Fecha Próxima Recarga | RESULTADOS DE LA INSPECCION MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES / HALLAZGOS IDENTIFICADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Presión Manómetro | | Pasador y Guietador de seguridad | | Estado de Manguera | | Estado de Válvulas | | Estado Boquillas | | Etiquetas (Argolas) | | Señalización (Letrero) | | | | |
| | | | | | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | | |
| 11-12 | 77205 | Cra 3 C 171 | 10Lb | multipropósito | Enero 2025 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |

OBSERVACIONES:

INSPECCIONO: NOMBRE: Harold Badillo
FECHA: 22-11-24

NOMBRE:
FECHA:

NOMBRE:
FECHA:

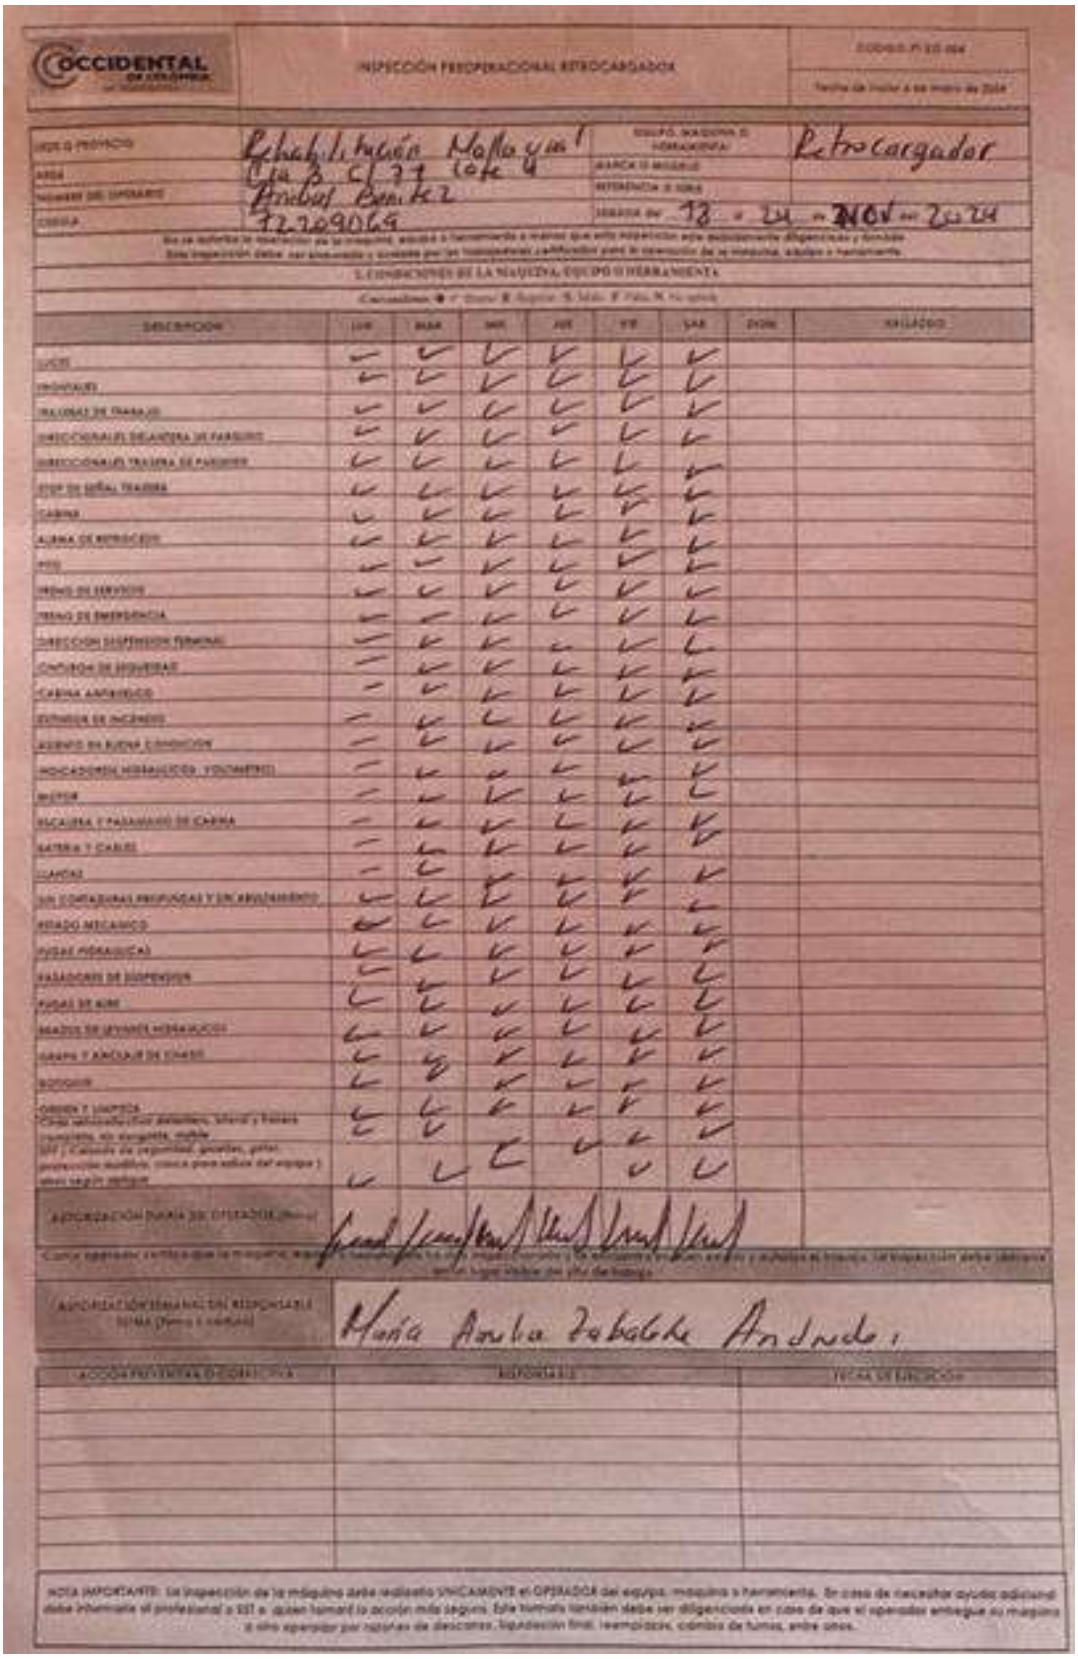

OCCIDENTAL DE COLOMBIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROCARGADOR

Rehabilitación Malla vial Cra 8 C 27 Calle 4

Anibal Benitez

1220906

Retrocargador

13 - 14 - NOV - 2024

I. CONDICIONES DE LA MAQUINA, EQUIPO O HERRAMIENTA


| DESCRIPCION | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | HALLAZGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ORNAMENTACION | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| PALANCAS DE TRABAJO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| DIRECCIONALES DELANTERA DE PARQUEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| DIRECCIONALES TRASERA DE PARQUEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| STOP DE SEÑAL TRASERA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CABINA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ALARMA DE RETROCESO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| PITO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| FRENO DE SERVICIO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| FRENO DE EMERGENCIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| DIRECCION SUSPENSION TERMINAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CUCHARA DE IZQUIERDA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CABINA ANTIRUIDO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| EXTINTOR DE INCENDIO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ASIENTO EN BUENA CONDICION | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| INDICADORES HIDRAULICOS (VOLUMETRO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| MOTOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ESCALERA Y PASAMANOS DE CABINA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BATERIA Y CABLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| LLANTAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ARADO MECANICO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| FUGAS HIDRAULICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| PASADORES DE SUSPENSION | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| FUGAS DE AIRE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| MANDOS DE SEGURO HIDRAULICOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| GRAPA Y ANCLAJE DE CABLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BOCINA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ORDEN Y LIMPIEZA<br>Cinta reflectiva (Tres alrededor, lateral y frontal completa, sin interrupción, visible<br>EPP ( Casco de seguridad, gafas, gafas protección auditiva, botas para subir del equipo ) otro según el riesgo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| APROBACIÓN PARA EL OPERADOR (Firma) | | | | | | | | |

Como operador certifico que la maquina, equipo o herramienta se encuentra en buen estado y apta para el trabajo. La inspección debe realizarse antes de iniciar labores del día de trabajo

APROBACIÓN PARA EL RESPONSABLE SST/SA (Firma y nombre): María Paula Zabaleta Andrade.

| ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo, maquina o herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al profesional a SST a quien llamará la acción más segura. Esta formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su maquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambios de turnos, entre otros.

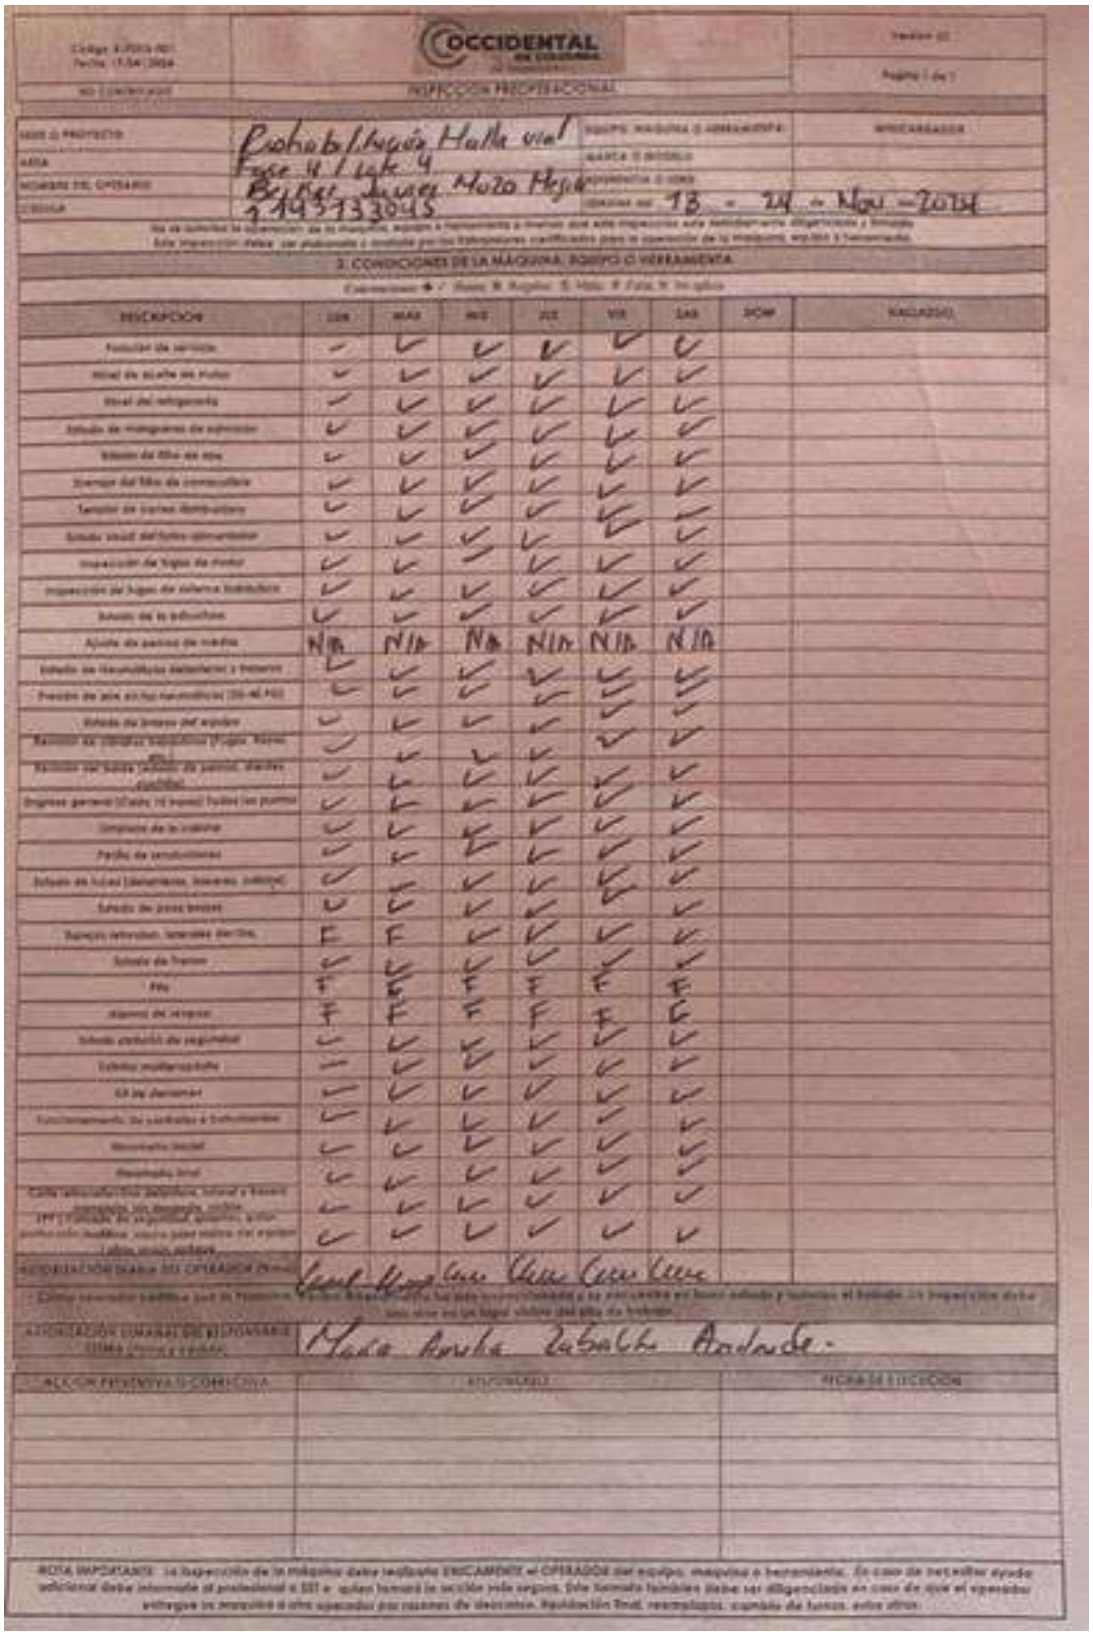

OCCIDENTAL

INSPECCIÓN PRECOPERACIONAL

Probable Hoja Vial
Fase II / Lote 4
Belkis Juvel Muzo Hoyos
1143933045

13 - 24 - Nov - 2024

3. CONDICIONES DE LA MÁQUINA, EQUIPO O HERRAMIENTA

| DESCRIPCIÓN | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | HALLAZGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de aceite de motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Nivel del refrigerante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado de mangueras de aspiración | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado de filtro de aire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado del filtro de combustible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Tensión de correa distribución | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado visual del tubo silenciador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Inspección de fugas de motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Inspección de fugas de sistema hidráulico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado de la estructura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Ajuste de pernos de rueda | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| Estado de neumáticos delanteros y traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Presión de aire en los neumáticos (20-40 PSI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado de brazos del ripper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado de cilindros hidráulicos (Fugas, daños, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Revisión del buen estado de pernos, dientes y cuchillas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Engrase general (Cada 10 horas) Todos los puntos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Limpieza de la cabina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Perfil de neumáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado de luces (delanteras, traseras, cabina) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado de pines bronce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Ruidos extraños, temperatura de los | F | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado de frenos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Pito | F | F | F | F | F | F | | |
| Alarma de reversa | F | F | F | F | F | F | | |
| Estado protector de seguridad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado multipropósito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Kit de derrames | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Funcionamiento de controles e instrumentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Botiquín social | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Botiquín vial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cinta señalización peatonal, vehicular y barrera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| EPP (Casco de seguridad, guantes, gafas de protección auditiva, visual para realizar este equipo, maquina o herramienta) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

ACEPTACIÓN DIARIA DEL OPERADOR (Firma)

ACEPTACIÓN DIARIA DEL RESPONSABLE (Firma y cargo)

| ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, maquina o herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al profesional o SST o quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue la maquina a otro operador por razones de descanso, finalización final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.



OCCIDENTAL

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

Rehabilitacion malla vial
Fase 4 / Lote 4 Ct 3
Pedro Daniel
73539396
13 - 24 - NOV - 2024

| DESCRIPCIÓN | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | HALLAZGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCES DE TRABAJO DELANTERA | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | | |
| PARQUEADEROS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| LUCES DE STOP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| LUCES DE TRABAJO TRASERAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CABINA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| PROTECCIÓN ANTIFUGOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CINTURÓN DE SEGURIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| EXTINTOR DE INCENDIOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ESPEJOS Y SEÑALES DE RETROPROYECCIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| PANEL INSTRUMENTOS ANALÓGICOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| INTERRUPTOR HORNITO, CORNETA, ALARMA DE RETROCESO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SISTEMA DE ESCAPE EXCESO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ALARMA DE REVERSA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ESCALERA Y APOYO DE ACCESO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ESPEJO LATERALES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| ESPEJO CENTRAL CONVEXO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PALANCA DE MANDO | ✓ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PEDALES | N/A | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SISTEMA HIDRAULICO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| NIVEL DE COMBUSTIBLE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ESPARRAGOS DE RUEDA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| FILTRO DE ACEITE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| FILTRO DE AIRE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| FRENOS DE PEDAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SISTEMA ELECTRICO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CHASIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SISTEMA DE SUSPENSIONES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| LUCES DE CHASIS Y DIRECCIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUSPENSIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| AIR PRINCIPAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cinta retroreflectiva delantera, lateral y trasera completa, en cualquier estado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| EPP ( Casco, de seguridad, guantes, gafas, protección auditiva, ropa para cielos del equipo y otros según aplique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| AUTORIZACIÓN (NAME DEL OPERADOR) | Pedro Daniel | Pedro Daniel | Pedro Daniel | Pedro Daniel | Pedro Daniel | Pedro Daniel | | |


Una inspección satisfactoria, debe ser realizada, equipo o herramienta, no sea usado ni entregado y se encuentre en buen estado y apto para el trabajo. La inspección debe diligenciarse en un lugar visible del sitio de trabajo.

RETROALIMENTACIÓN SEMANAL DEL RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y CARGO): Maria Amelia Rebolledo Andrade.

| ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, maquina o herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarlo al profesional a SST a quien tomara la acción más segura. Este formato también deberá ser diligenciado en caso de que el operador entregue su maquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, vacaciones, comisión de turnos, entre otros.

# ANEXO 2: INSPECCIÓN BOTIQUIN

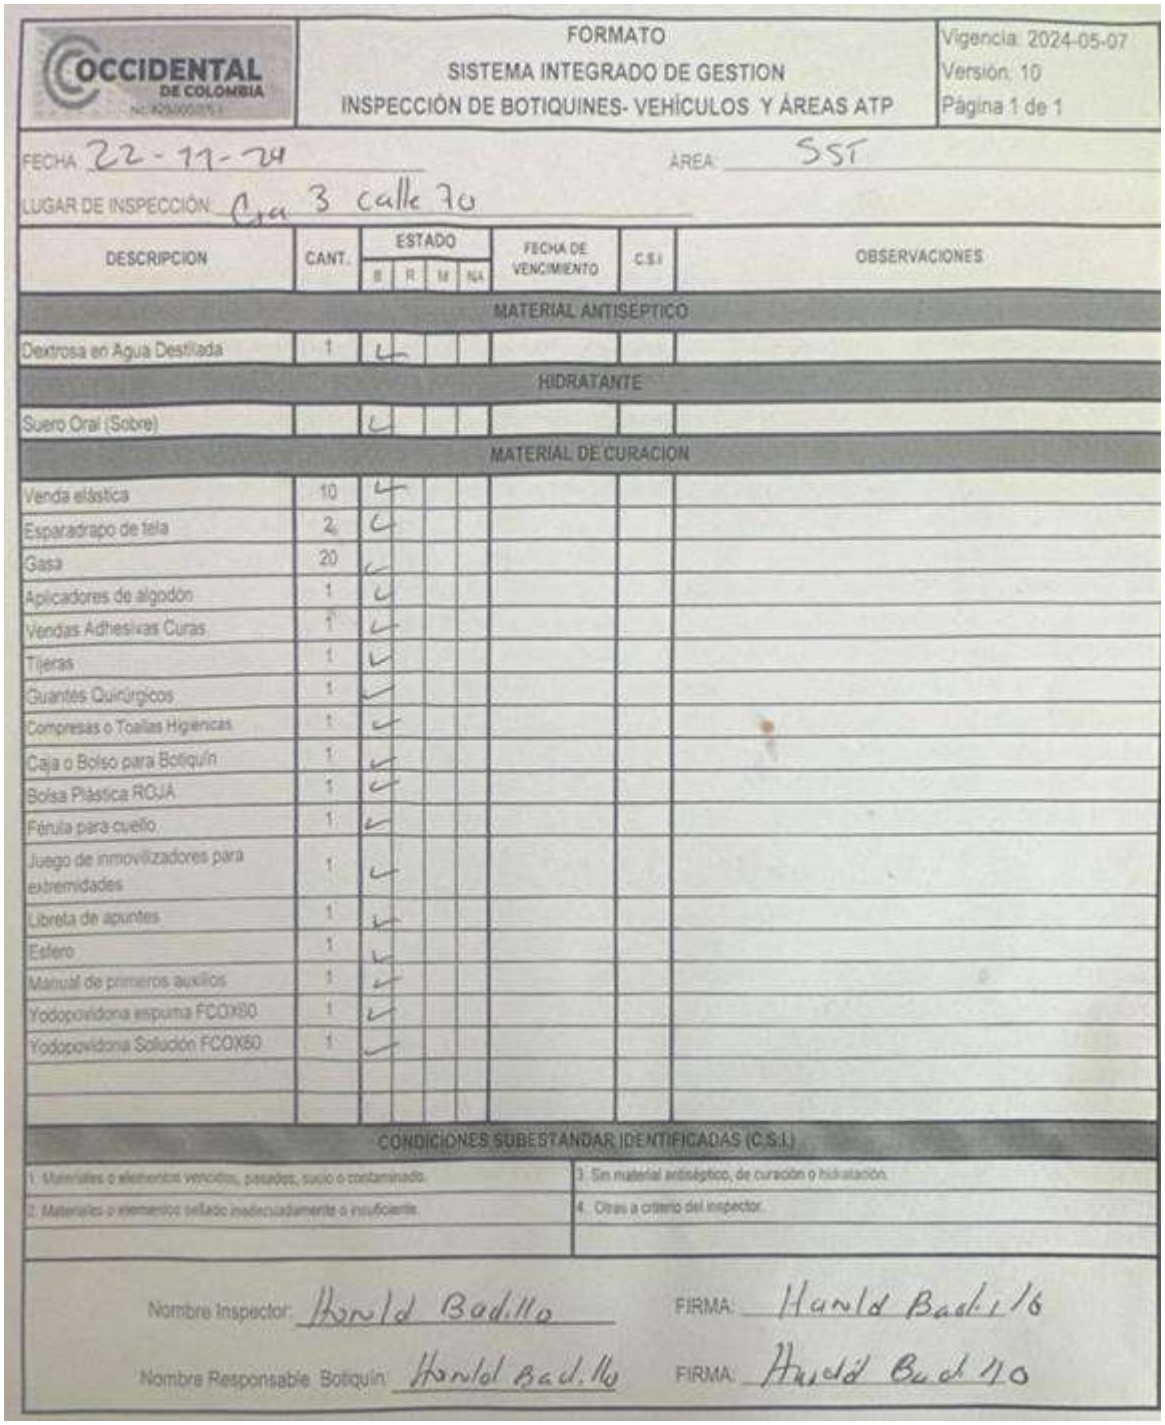

OCCIDENTAL DE COLOMBIA

FORMATO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
INSPECCIÓN DE BOTIQUINES- VEHÍCULOS Y ÁREAS ATP

Vigencia: 2024-05-07
Versión: 10
Página 1 de 1

FECHA 22-11-24 ÁREA SST

LUGAR DE INSPECCIÓN Cra 3 calle 70

| DESCRIPCION | CANT. | ESTADO B | R | M | NA | FECHA DE VENCIMIENTO | C.S.I | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MATERIAL ANTISEPTICO** | | | | | | | | |
| Dextrosa en Agua Destilada | 1 | ✓ | | | | | | |
| **HIDRATANTE** | | | | | | | | |
| Suero Oral (Sobre) | | ✓ | | | | | | |
| **MATERIAL DE CURACION** | | | | | | | | |
| Venda elástica | 10 | ✓ | | | | | | |
| Esparadrapo de tela | 2 | ✓ | | | | | | |
| Gasa | 20 | ✓ | | | | | | |
| Aplicadores de algodón | 1 | ✓ | | | | | | |
| Vendas Adhesivas Curas | 1 | ✓ | | | | | | |
| Tijeras | 1 | ✓ | | | | | | |
| Guantes Quirúrgicos | 1 | ✓ | | | | | | |
| Compresas o Toallas Higienicas | 1 | ✓ | | | | | | |
| Caja o Bolso para Botiquín | 1 | ✓ | | | | | | |
| Bolsa Plástica ROJA | 1 | ✓ | | | | | | |
| Férula para cuello | 1 | ✓ | | | | | | |
| Juego de inmovilizadores para extremidades | 1 | ✓ | | | | | | |
| Libreta de apuntes | 1 | ✓ | | | | | | |
| Esfero | 1 | ✓ | | | | | | |
| Manual de primeros auxilios | 1 | ✓ | | | | | | |
| Yodopovidona espuma FCOX60 | 1 | ✓ | | | | | | |
| Yodopovidona Solución FCOX60 | 1 | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |


CONDICIONES SUBESTANDAR IDENTIFICADAS (C.S.I.)

| | |
|---|---|
| 1. Materiales o elementos vencidos, pasados, sucio o contaminado. | 3. Sin material antiséptico, de curación o hidratación. |
| 2. Materiales o elementos sellado inadecuadamente o insuficiente. | 4. Otras a criterio del inspector. |

Nombre Inspector: Harold Badillo FIRMA: Harold Badillo

Nombre Responsable Botiquín: Harold Badillo FIRMA: Harold Badillo

# ANEXO 3: CAPACITACIONES

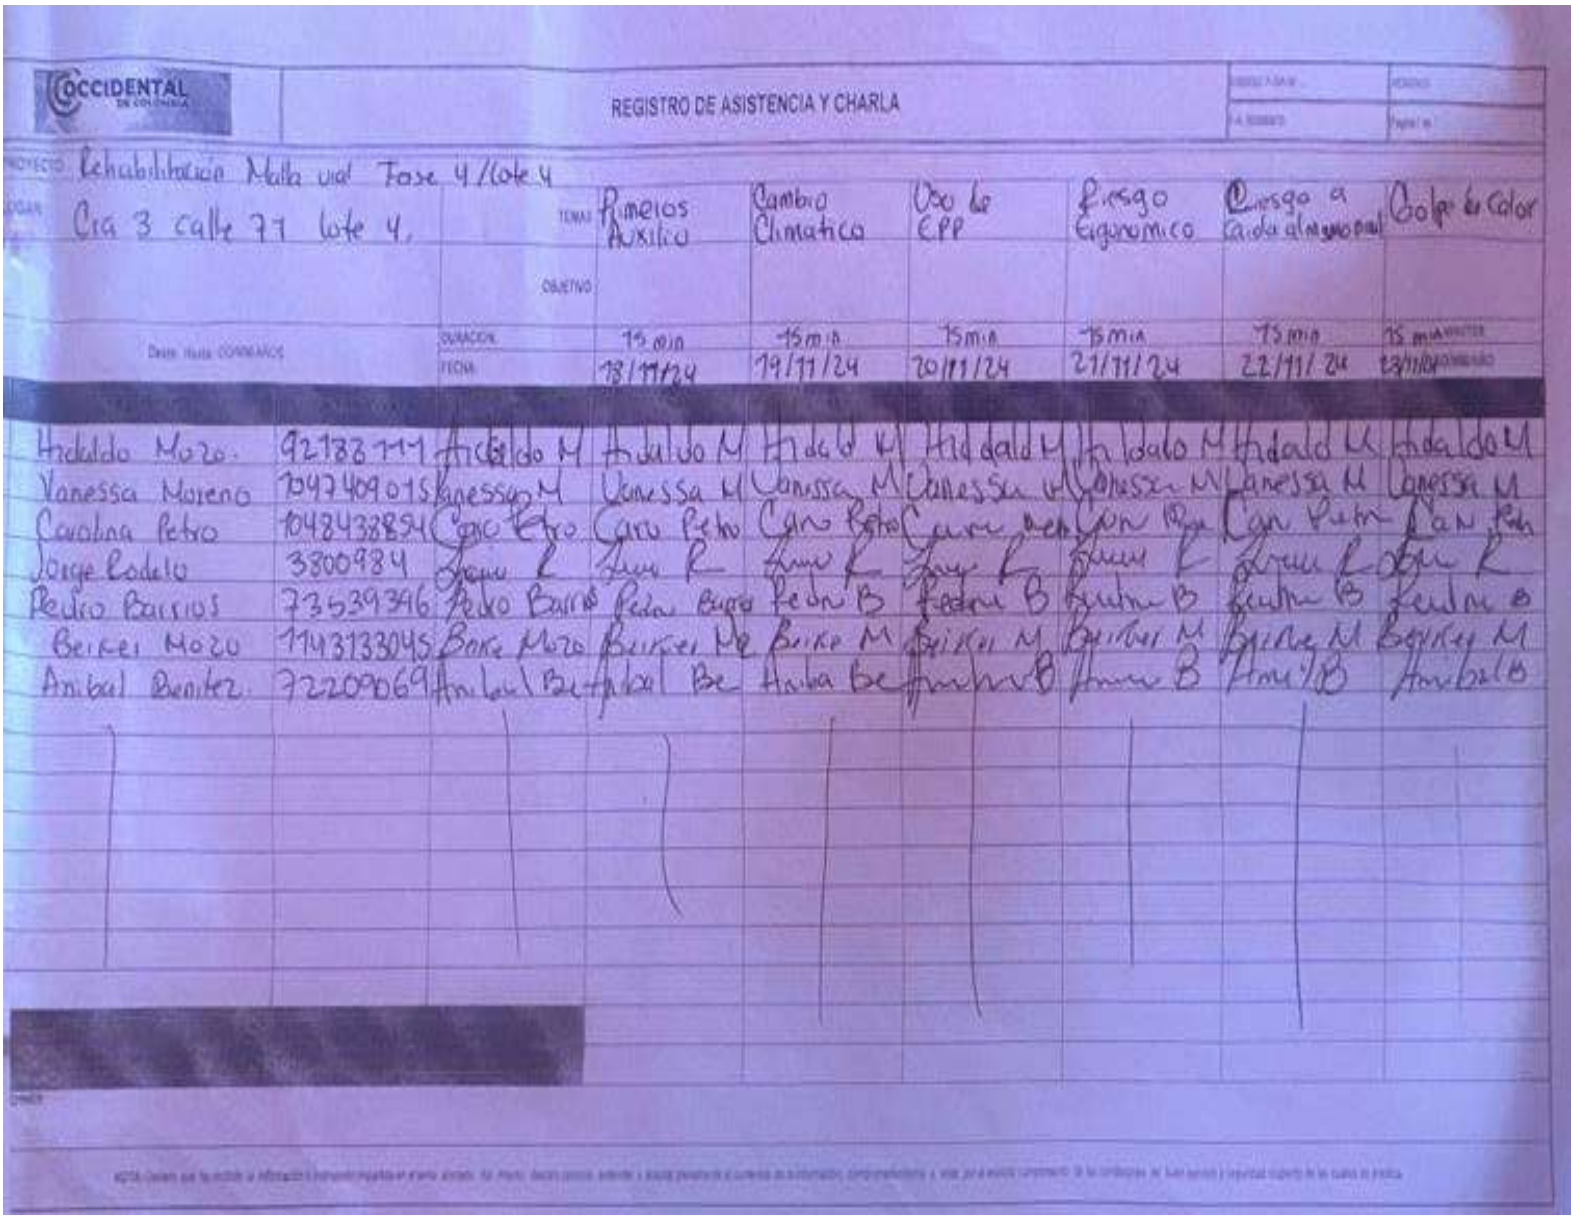

OCCIDENTAL DE COLOMBIA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y CHARLA

PROYECTO: Rehabilitación Malla vial Fase 4 / Lote 4

LUGAR: Cra 3 calle 71 lote 4.

TEMA: Primeros Auxilio | Cambio Climatico | Uso de EPP | Riesgo Ergonomico | Riesgo a caida al mismo nivel | Golpe de Calor

OBJETIVO:

DURACIÓN: 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min

FECHA: 18/11/24 | 19/11/24 | 20/11/24 | 21/11/24 | 22/11/24 | 23/11/24

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidalgo Mozo | 92183711 | Hidalgo M | Hidalgo M | Hidalgo M | Hidalgo M | Hidalgo M | Hidalgo M | Hidalgo M |
| Vanessa Moreno | 1047409015 | Vanessa M | Vanessa M | Vanessa M | Vanessa M | Vanessa M | Vanessa M | Vanessa M |
| Carolina Petro | 1048438854 | Caro Petro | Caro Petro | Caro Petro | Caro Petro | Caro Petro | Caro Petro | Caro Petro |
| Jorge Padilla | 3800984 | Jorge P | Jorge P | Jorge P | Jorge P | Jorge P | Jorge P | Jorge P |
| Pedro Barrios | 73539316 | Pedro Barrios | Pedro Barrios | Pedro B | Pedro B | Pedro B | Pedro B | Pedro B |
| Beiker Mozo | 1143133045 | Beiker Mozo | Beiker Mozo | Beiker M | Beiker M | Beiker M | Beiker M | Beiker M |
| Anibal Benitez | 72209069 | Anibal Benitez | Anibal Benitez | Anibal B | Anibal B | Anibal B | Anibal B | Anibal B |

# ANEXO 4: PÓLIZAS APROBADAS

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**4650541354**

**PÓLIZA No: 465 - 47 - 994000008279** **ANEXO: 0**

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO** COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 14 | 09 | 2023 |
| FECHA DE IMPRESIÓN | 14 | 09 | 2023 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 12/09/2023 | 30/04/2024 | 1,708,333,326.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 12/09/2023 | 31/12/2026 | 427,083,331.50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | VER NOTA ACLARATORIA | | 1,708,333,326.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *3,843,749,983.50 | $ *******24,295,308 | $****15,000.00 | $ ****4,618,959 | $ *******28,929,267 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 | | | |

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000465054135

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780A0EFD7D5A

CLIENTE

**Defensor del Consumidor Financiero:** Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 458 7174 **Fax:** (601) 458 7174 * **Celular:** 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
**Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:** https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000008279** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

**TEXTO ITEM 1**

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**NÚMERO ELECTRONICO**
PARA PAGOS
**4650541388**

**PÓLIZA No: 465 -74 - 994000002359 ANEXO:0**

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO** COD AGE: 465 RAMO: 74 PAP:

| | DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | 09 | 2023 | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | 12 | 09 | 2023 | 23:59 | | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | 110 | 14 | 09 | 2023 |
| | FECHA DE EXPEDICIÓN | | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN | | |

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

| | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA DEL ANEXO | 12 | 09 | 2023 | 23:59 | | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | 110 |
| | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | |

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

DIRECCIÓN: Centro diagonal 30 # 30 - 78 Plaza de la aduana. CIUDAD: **CARTAGENA, BOLIVAR** TELÉFONO: 6056501092

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGE NIT : 890480184

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOLIVAR CIUDAD: CARTAGENA

DIRECCION: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 580,000,000.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 580,000,000.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 580,000,000.00 | | |
| | PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS | 580,000,000.00 | | |
| | BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL | 580,000,000.00 | | |
| | RCE PATRONAL | 580,000,000.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 580,000,000.00 | | |
| | CONTAMINACION | 580,000,000.00 | | |
| | GASTOS MEDICOS | 580,000,000.00 | | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 580,000,000.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4- REFERENTE A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***580,000,000.00 | $ **********384,548 | $*********0.00 | $ *******73,064 | $ **********457,612 |

INTERMEDIARIO

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 |

COASEGURO CEDIDO

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004650541 38

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

KORTIZ 0

CADE25780A0BFD7D57 CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
4650541354

**PÓLIZA No: 465 - 47 - 994000008279** **ANEXO: 1**

Compañía de Seguros

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN DIA | MES | AÑO | FECHA DE IMPRESIÓN DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 2024 | 03 | 07 | 2024 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

BENEFICIARIO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 12/09/2023 | 21/10/2024 | 1,708,333,326.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 12/09/2023 | 21/06/2027 | 427,083,331.50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | VER NOTA ACLARATORIA | | 1,708,333,326.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *3,843,749,983.50 | $ **********0 | $*********0.00 | $ **********0 | $ **********0 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 | | | |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO EL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMO BOLSA DE COBRANZA E INTERMEDIARIO, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO. PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/es_ES/actualizacion-de-datos/

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INEQUÍVOCA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y, EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRA RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REPRESENTADA SOCIEDAD, LO QUE INCLUYE EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA, EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000465054135

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADE25780907FD7D5E

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 0229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000008279** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

**TEXTO ITEM 1**

- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2014.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS** 4650541388

**PÓLIZA No: 465 -74 - 994000002359 ANEXO:1**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD AGE: 465 RAMO: 74 PAP:

| FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO) | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 / 07 / 2024 | | 31 / 12 / 2023 | 23:59 | 21 / 06 / 2024 | 23:59 | 173 | 03 / 07 / 2024 |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

| VIGENCIA DEL ANEXO | VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 / 12 / 2023 / 23:59 | | 21 / 06 / 2024 / 23:59 | | 173 |

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 — CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER — TELÉFONO: 3202776109

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

DIRECCIÓN: CENTRO PLAZA DE LA ADUANA — CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR — TELÉFONO: 3156560284

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

### DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGE NIT : 890480184

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOLÍVAR CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCION: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 580,000,000.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 580,000,000.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 580,000,000.00 | | |
| | PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS | 580,000,000.00 | | |
| | BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL | 580,000,000.00 | | |
| | RCE PATRONAL | 580,000,000.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 580,000,000.00 | | |
| | CONTAMINACION | 580,000,000.00 | | |
| | GASTOS MEDICOS | 580,000,000.00 | | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 580,000,000.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. REFERENTE A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***580,000,000.00 | $ **********0 | $*********0.00 | $ **********0 | $ **********0 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 |

**COASEGURO CEDIDO**

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004650541 38

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780907FD7D5D

CLIENTE

AGUIZA 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000002359** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

**TEXTO ITEM 1**

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023
- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024.

CLIENTE

## LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000002359 ANEXO: 1 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACION: 829.000.075-1

ASEGURADOS

| ITEM | ASEGURADO | C.C. ó NIT | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD | VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURA | 8804801844 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIA | CARTAGENA DE INDIAS | 580,000,000.00 | 0 | 0 |

| PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |
|---|---|
| 0 | 0 |

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS** 4650541354

**PÓLIZA No: 465 - 47 - 994000008279** **ANEXO: 2**

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO** COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN DIA | MES | AÑO | FECHA DE IMPRESIÓN DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 2024 | 03 | 07 | 2024 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 12/09/2023 | 19/11/2024 | 1,708,333,326.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 12/09/2023 | 19/07/2027 | 427,083,331.50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | VER NOTA ACLARATORIA | | 1,708,333,326.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSION NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *3,843,749,983.50 | $ **********360,388 | $*****5,000.00 | $ *******69,424 | $ **********434,812 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 | | | |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FEHACIENTES HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA, PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MERCANCÍA PUBLICITARIA A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES PUSH, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO EL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO O GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO. PARA TALES CONSECUALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wps_4_gestion_installing.html

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INEQUÍVOCA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRA RELACIONADA CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL O EL REPRESENTADO SOCIEDAD, LO QUE INCLUYE EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE INVOLUCREN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. ACORDE CON LA LOS OBLIGACIÓN APLICABLE, ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE. CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/RELACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000465054135

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780907FD7D58

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 0229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2500 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601; ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000008279** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

**TEXTO ITEM 1**

- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2014.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 1.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS** 4650541388

**PÓLIZA No: 465 -74 - 994000002359** **ANEXO:2**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD AGE: 465 RAMO: 74 PAP:

| FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO) | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 / 07 / 2024 | | 21 / 06 / 2024 | 23:59 | 19 / 07 / 2024 | 23:59 | 28 | 03 / 07 / 2024 |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

| VIGENCIA DEL ANEXO | VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 / 06 / 2024 | 23:59 | 19 / 07 / 2024 | 23:59 | 28 |

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

DIRECCIÓN: CENTRO PLAZA DE LA ADUANA CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR TELÉFONO: 3156560284

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

### DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGE NIT : 890480184

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOLÍVAR CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCION: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 650,000,000.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 650,000,000.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 650,000,000.00 | | |
| | PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS | 650,000,000.00 | | |
| | BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL | 650,000,000.00 | | |
| | RCE PATRONAL | 650,000,000.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 650,000,000.00 | | |
| | CONTAMINACION | 650,000,000.00 | | |
| | GASTOS MEDICOS | 650,000,000.00 | | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 650,000,000.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. REFERENTE A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***650,000,000.00 | $ **********109,699 | $*********0.00 | $ *******20,843 | $ **********130,541 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 |

**COASEGURO CEDIDO**

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004650541 38

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780907FD7A5E CLIENTE AGUIZA 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000002359** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

**TEXTO ITEM 1**

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023
- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 1.

NOTA: SE ACTUALIZAN VALOR ASEGURADO SEGÚN LOS SMMLV 2024.

CLIENTE

## LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000002359 ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACION: 829.000.075-1

ASEGURADOS

| ITEM | ASEGURADO | C.C. ó NIT | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD | VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURA | 8904801844 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIA | CARTAGENA DE INDIAS | 650,000,000.00 | 109,699 | 130,541 |

| PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |
|---|---|
| 109,699 | 130,541 |

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS** 4650541354

**PÓLIZA No: 465 - 47 - 994000008279** **ANEXO: 3**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN DIA | MES | AÑO | FECHA DE IMPRESIÓN DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 07 | 2024 | 29 | 07 | 2024 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE:: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

BENEFICIARIO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION CONTRATO | AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|
| | CUMPLIMIENTO | 12/09/2023 | 30/12/2024 | 1,708,333,326.00 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 12/09/2023 | 30/08/2027 | 427,083,331.50 |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | VER NOTA ACLARATORIA | 1,708,333,326.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

OTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *3,843,749,983.50 | $ **********540,582 | $*****5,000.00 | $ ******103,661 | $ **********649,243 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 | | | |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA, PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), WEB PAGER, APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS CESIONARIOS COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO. PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONDEMERCADEO@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/es_419/tratamiento-de-datos-personales.aspx

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, LISTO SIN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INEQUÍVOCA, AUTORIZO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y, EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LOS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRA RELACIONADA CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIONALES Y DE RED EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE. CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COMCO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000465054135

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780906ff7f5A

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 0229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000008279** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

**TEXTO ITEM 1**

- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2014.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 1.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 2 AL CONTRATO.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS** 4650541388

**PÓLIZA No: 465 -74 - 994000002359** **ANEXO:3**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD AGE: 465 RAMO: 74 PAP:

| DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 07 | 2024 | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | 19 | 07 | 2024 | 23:59 | | 30 | 08 | 2024 | 23:59 | 42 | 29 | 07 | 2024 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN | | |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

| | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA DEL ANEXO | 19 | 07 | 2024 | 23:59 | | 30 | 08 | 2024 | 23:59 | 42 |
| | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | |

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE:: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

DIRECCIÓN: CENTRO PLAZA DE LA ADUANA CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR TELÉFONO: 3156560284

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGE NIT : 890480184

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOLÍVAR CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCION: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 650,000,000.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 650,000,000.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 650,000,000.00 | | |
| | PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS | 650,000,000.00 | | |
| | BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL | 650,000,000.00 | | |
| | RCE PATRONAL | 650,000,000.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 650,000,000.00 | | |
| | CONTAMINACION | 650,000,000.00 | | |
| | GASTOS MEDICOS | 650,000,000.00 | | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 650,000,000.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. REFERENTE A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***650,000,000.00 | $ **********164,548 | $*********0.00 | $ *******31,264 | $ **********195,812 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 |

**COASEGURO CEDIDO**

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004650541 38

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780906FF7F58 CLIENTE AGUIZA 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000002359** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

**TEXTO ITEM 1**

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023
- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 1.

NOTA: SE ACTUALIZAN VALOR ASEGURADO SEGÚN LOS SMMLV 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIPICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 2 AL CONTRATO.

CLIENTE

## LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000002359 ANEXO: 3 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACION: 829.000.075-1

ASEGURADOS

| ITEM | ASEGURADO | C.C. ó NIT | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD | VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURA | 8904801844 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIA | CARTAGENA DE INDIAS | 650,000,000.00 | 164,548 | 195,812 |

| PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |
|---|---|
| 164,548 | 195,812 |

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
4650541354

**PÓLIZA No: 465 - 47 - 994000008279** **ANEXO: 4**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN DIA | MES | AÑO | FECHA DE IMPRESIÓN DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09 | 2024 | 19 | 09 | 2024 |

Compañía de Seguros

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE:: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

BENEFICIARIO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 12/09/2023 | 30/04/2025 | 1,706,333,326.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 12/09/2023 | 31/12/2027 | 427,083,331.50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | VER NOTA ACLARATORIA | 1,708,333,326.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

OTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *3,843,749,983.50 | $ ********1,583,134 | $*****5,000.00 | $ ******301,745 | $ ********1,889,879 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 | | | |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA, PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), WEB PLAYER, POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS CESIONARIOS COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO. PARA FINES COMERCIALES: POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONDEMERCADEO@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/es_419/tratamiento-de-datos-personales.aspx

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, LISTO SIN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INEQUÍVOCA, AUTORIZO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y, EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LOS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA PRESENTE SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE. CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000465054135

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE257B080EF4765A

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 0229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000008279** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

**TEXTO ITEM 1**

- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 1.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 2 AL CONTRATO.

NOTA; CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGUN OTROSI NRO. 3 AL CONTRATO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS** 4650541388

**PÓLIZA No: 465 -74 - 994000002359** **ANEXO:4**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD AGE: 465 RAMO: 74 PAP:

| FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO) | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 09 / 2024 | | 30 / 08 / 2024 | 23:59 | 31 / 12 / 2024 | 23:59 | 123 | 19 / 09 / 2024 |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

| VIGENCIA DEL ANEXO | VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS) | A LAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 / 08 / 2024 | 23:59 | 31 / 12 / 2024 | 23:59 | 123 |

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 829.000.075-1

DIRECCIÓN: KR 25 47 60 CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3202776109

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 890.480.184-4

DIRECCIÓN: CENTRO PLAZA DE LA ADUANA CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR TELÉFONO: 3156560284

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

### DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGE NIT : 890480184

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOLÍVAR CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCION: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 650,000,000.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 650,000,000.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 650,000,000.00 | | |
| | PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS | 650,000,000.00 | | |
| | BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL | 650,000,000.00 | | |
| | RCE PATRONAL | 650,000,000.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 650,000,000.00 | | |
| | CONTAMINACION | 650,000,000.00 | | |
| | GASTOS MEDICOS | 650,000,000.00 | | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 650,000,000.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***650,000,000.00 | $ **********481,890 | $*********0.00 | $ *******91,559 | $ **********573,450 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON | 6771 | 100.00 |

**COASEGURO CEDIDO**

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y PARA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000465054138

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE2578080BF57B5A CLIENTE IGARCIA 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000002359** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.075-1**

ASEGURADO: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.480.184-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

**TEXTO ITEM 1**

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. LP-SID-UAC-038-2023 -LOTE 4. REFERENTE A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECION UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA MIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.- FASE IV (LOTE 4).

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023: FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE2023.
- ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023
- ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 1.

NOTA: SE ACTUALIZAN VALOR ASEGURADO SEGÚN LOS SMMLV 2024.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN OTROSÍ 2 AL CONTRATO.

NOTA; CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGUN OTROSI NRO. 3 AL CONTRATO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CLIENTE

## LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000002359 ANEXO: 4 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3


TOMADOR: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S IDENTIFICACION: 829.000.075-1

ASEGURADOS

| ITEM | ASEGURADO | C.C. ó NIT | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD | VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURA | 8904801844 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIA | CARTAGENA DE INDIAS | 650,000,000.00 | 481,890 | 573,450 |

| PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |
|---|---|
| 481,890 | 573,450 |

# ANEXO 5: BITACORA

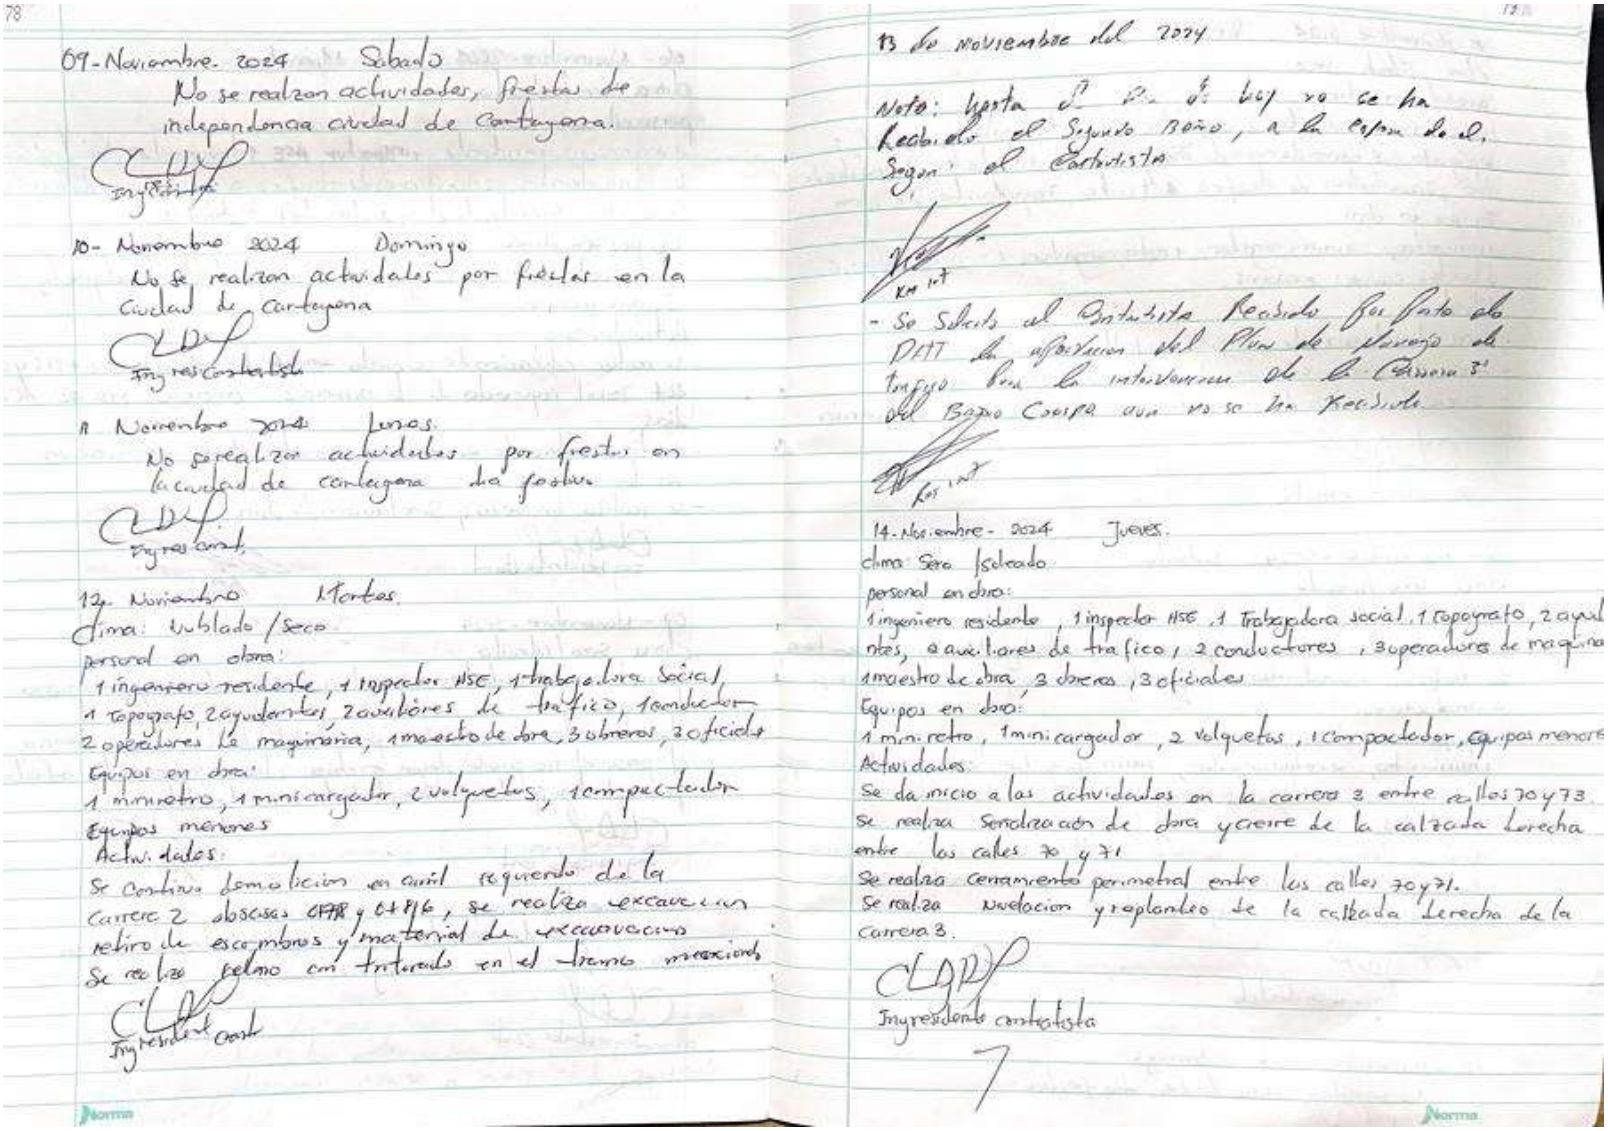

78

09-Noviembre. 2024 Sabado
No se realizan actividades, fiestas de independencia ciudad de Cartagena.
Ingeniero

10- Noviembre 2024 Domingo
No se realizan actividades por fiestas en la Ciudad de Cartagena
Ingeniero Contratista

11 Noviembre 2024 Lunes
No se realizan actividades por fiestas en la ciudad de cartagena de indias
Ingeniero cont.

12. Noviembre Martes.
Clima: Nublado / Seco
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector HSE, 1 trabajadora Social, 1 topografo, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 conductor 2 operadores de maquinaria, 1 maestro de obra, 3 obreros, 2 oficiales
Equipos en obra:
1 mini retro, 1 mini cargador, 2 volquetas, 1 compactador
Equipos menores
Actividades:
Se Continua demolicion en asfalto requerido de la Carrera 2 abscisas CF7R y CF8/6, se realiza excavacion retiro de escombros y material de excavacion
Se realiza pelmo en triturado en el tramo mencionado
Ingeniero cont

13 de Noviembre del 2024

Nota: Hasta el dia de hoy no se ha Recibido el Segundo Pago, a la espera de el, Segun el Contratista

Km 1+7


- Se Solicita al Contratista Realizar Por Parte del PAIT la aplicacion del Plan de Manejo de Trafico para la intervencion de la Carrera 3 del Barrio Crespo que no se ha Realizado

Km 1+7

14. Noviembre - 2024 Jueves.
clima: Seco Soleado
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector HSE, 1 Trabajadora social, 1 topografo, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 2 conductores, 3 operadores de maquina 1 maestro de obra, 3 obreros, 3 oficiales
Equipos en obra:
1 mini retro, 1 mini cargador, 2 volquetas, 1 compactador, Equipos menores
Actividades:
Se da inicio a las actividades en la carrera 3 entre calles 70 y 73
Se realiza Senalizacion de obra y cierre de la calzada derecha entre las calles 70 y 71
Se realiza cerramiento perimetral entre las calles 70 y 71.
Se realiza Nivelacion y replanteo de la calzada derecha de la carrera 3.
Ingeniero contratista

7

| | | |
|---|---|---|
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA** | **Código:** FT-TEC-01<br>**Versión:** 1<br>**Fecha de aprobación:** 9-feb-2021 |

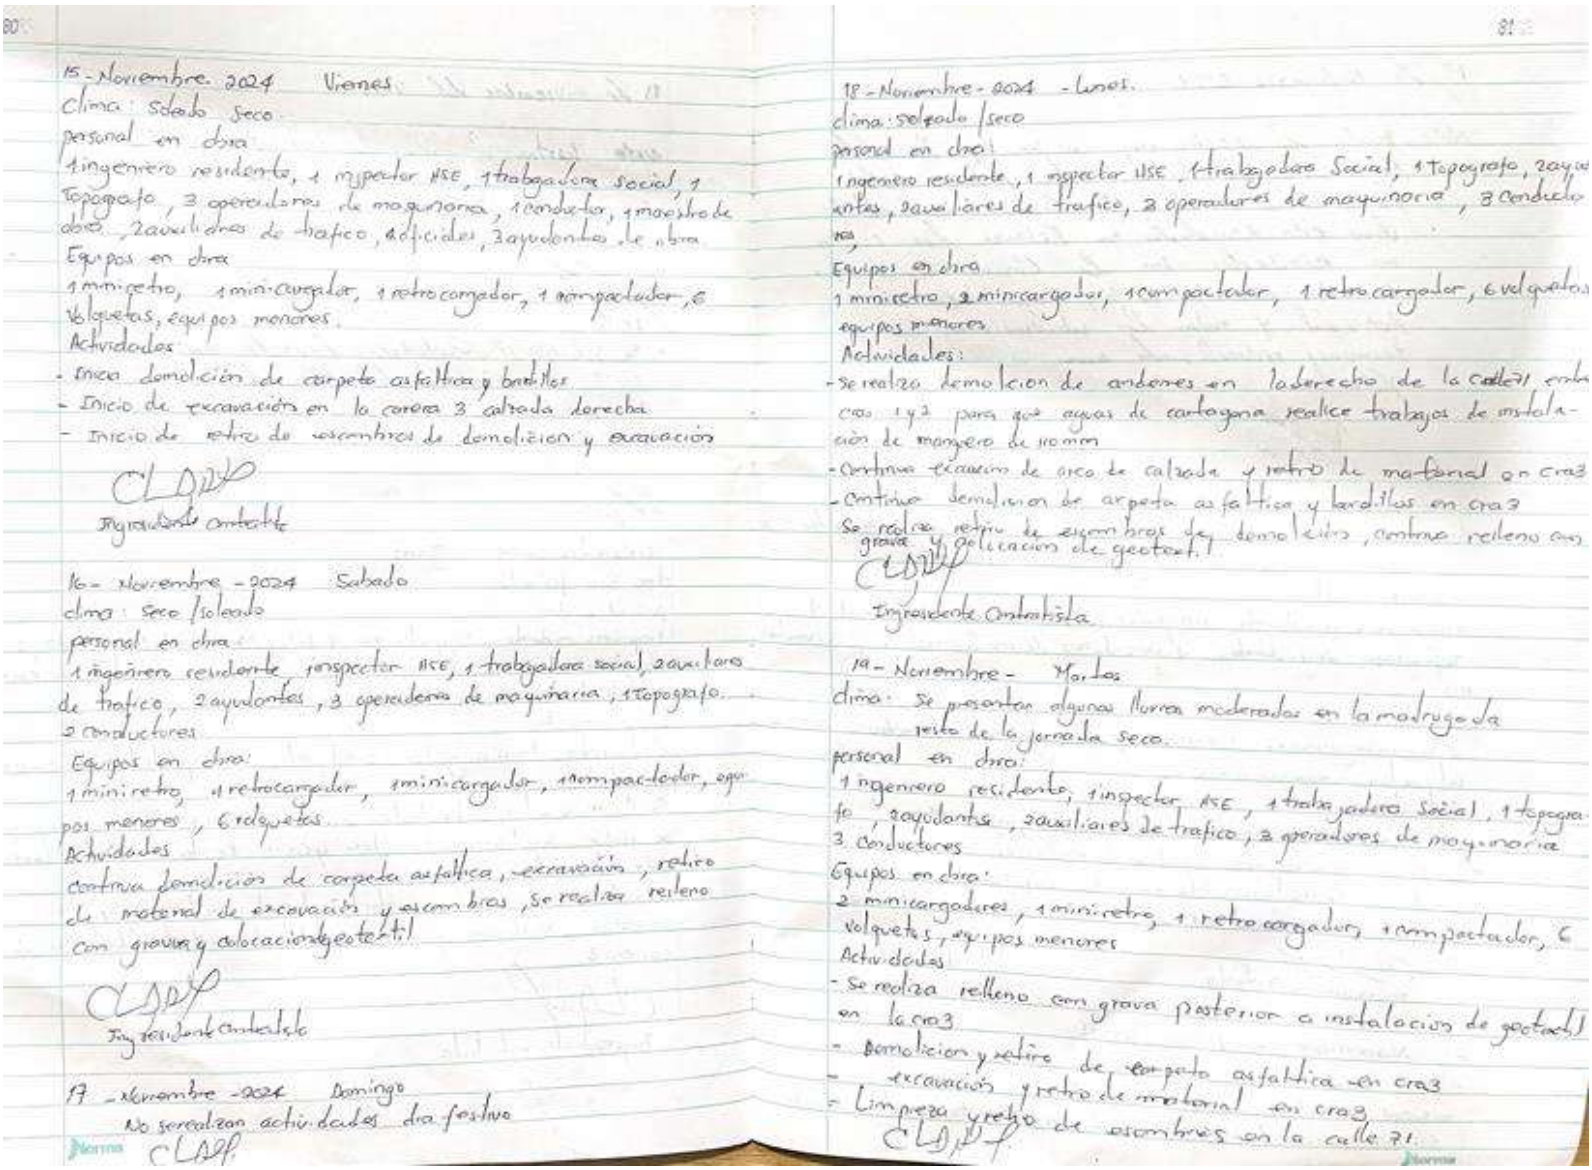

80

15-Noviembre. 2024 Viernes
Clima: Sábado Seco
personal en obra
1 ingeniero residente, 1 inspector IISE, 1 trabajadora social, 1 Topografo, 3 operadores de maquinaria, 1 conductor, 1 maestro de obra, 2 auxiliares de trafico, 4 oficiales, 3 ayudantes de obra
Equipos en obra
1 minicetro, 1 mini cargador, 1 retro cargador, 1 compactador, 6 Volquetas, equipos menores.
Actividades
- Inicio demolición de carpeta asfaltica y bordillos
- Inicio de excavación en la carrera 3 calzada derecha
- Inicio de retiro de escombros de demolición y excavación

Ingeniero residente Contratista

16- Noviembre - 2024 Sabado
clima: Seco / soleado
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector IISE, 1 trabajadora social, 2 auxiliares de trafico, 2 ayudantes, 3 operadores de maquinaria, 1 topografo. 2 conductores
Equipos en obra:
1 minirretro, 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 compactador, equipos menores, 6 volquetas
Actividades
continua demolición de carpeta asfaltica, excavación, retiro de material de excavación y escombros, se realiza relleno con grava y colocación geotextil

Ing residente contratista

17 - Noviembre - 2024 Domingo
No se realizan actividades dia festivo

81

18 - Noviembre - 2024 - Lunes
clima: soleado / seco
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector IISE, 1 trabajadora Social, 1 Topografo, 2 auxiliares, 2 auxiliares de trafico, 2 operadores de maquinaria, 3 conductores,
Equipos en obra
1 minirretro, 2 minicargadores, 1 compactador, 1 retro cargador, 6 volquetas equipos menores
Actividades:
- Se realizo demolicion de andenes en la derecho de la calle 71 entre cras 1 y 2 para que aguas de cartagena realice trabajos de instalación de manera de prueba
- Continua excavacion de oficio de calzada y retiro de material en cra3
- Continua demolicion de carpeta asfaltica y bordillos en cra3
Se realice retiro de escombros de demolicion, continua relleno con grava y colocacion de geotextil

Ingeniero residente Contratista

19 - Noviembre - Martes
clima: Se presentan algunas lluvias moderadas en la madrugada resto de la jornada seco.
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector IISE, 1 trabajadora Social, 1 topografo, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 2 operadores de maquinaria 3 conductores
Equipos en obra:
2 minicargadores, 1 minirretro, 1 retro cargador, 1 compactador, 6 volquetes, equipos menores
Actividades
- Se realiza relleno con grava posterior a instalacion de geotextil en la cra3
- Demolicion y retiro de carpeta asfaltica en cra3
- excavación y retiro de material en cra3
- Limpieza y retiro de escombros en la calle 71.

| | | |
|---|---|---|
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA** | **Código:** FT-TEC-01<br>**Versión:** 1<br>**Fecha de aprobación:** 9-feb-2021 |

82

19 de Noviembre 2024

Nota: hasta la fecha aun no se han Reanudado Actividades de Fundido de Placas de Pavimento en el Tramo, debido que de 4 días esta Actividades en Peligro. Los puntos mas afectados son la Carrera 2 y Via 3 en estos momento no hay ningun tipo de Actividad y estan las intervenciones SIN terminar aprovechando acceso Vehiculares a Viviendas.

20 - Noviembre - 2024 (Jueves) Miercoles

clima: se presentan lluvias fuertes en la madrugada hasta los 8:30 am, el resto de la jornada Seco/nublado

personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector HSE, 1 trabajadora social, 1 topografo, 2 ayudantes, 4 operadores de maquinaria, 3 conductores

Equipos en obra:
2 minicargadores, 1 minirretro, 1 compactador, 1 retrocargador, 6 Volquetas, equipos menores

Actividades:
- Colocación de geotextil y relleno con grava 1" en cra 3
- continua excavación y retiro de material en cra 3
- continua demolición de carpeta asfaltica en cra 3.
- demolición de bordillos en cra 3, retiro de escombros

Ingresidente contratista

21 - Noviembre - 2024 Jueves

clima: seco

personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector HSE, 1 trabajadora social

87

1 topografo, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 4 operadores de maquinaria, 2 conductores

Equipos en obra:
1 minirretro, 1 compactador, 1 retrocargador, 2 minicargadores, 6 Volquetas, equipos menores.

Actividades:
Se realiza demolicion de andenes en todo derecho de la calle 71 entre Cras 2 y 3 para intervencion de aguas de cartagena con instalacion de fibera
Continua demolición de carpeta asfaltica y bordillos en cra 3
Continua excavacion para via en cra 3
Se realiza retiro de escombros de demolición y material de excavación
Se realiza colocacion de geotextil T2400 y relleno con grava 1" en cra 3

Ing residente cont

22 - Noviembre - 2024 Viernes

clima: Seco/ soleado


personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 ingeniero HSE, 1 trabajadora social, 1 topografo, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 4 operadores de maquinaria, 2 conductores

Equipos en obra:
2 minicargador, 1 minirretro, 1 retro cargador, 1 compactador, 6 volquetas, equipos menores

Actividades:
Continua excavación, colocacion de geotextil, relleno con grava en area de calzada en la cra 3
Se realiza demolicion en calle 71 todo derecho en andenes
Se realiza retiro de escombros, material de excavacion en cra 3 y calle 71

Ingresidente cont

| | | |
|---|---|---|
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA** | **Código:** FT-TEC-01<br>**Versión:** 1<br>**Fecha de aprobación:** 9-feb-2021 |

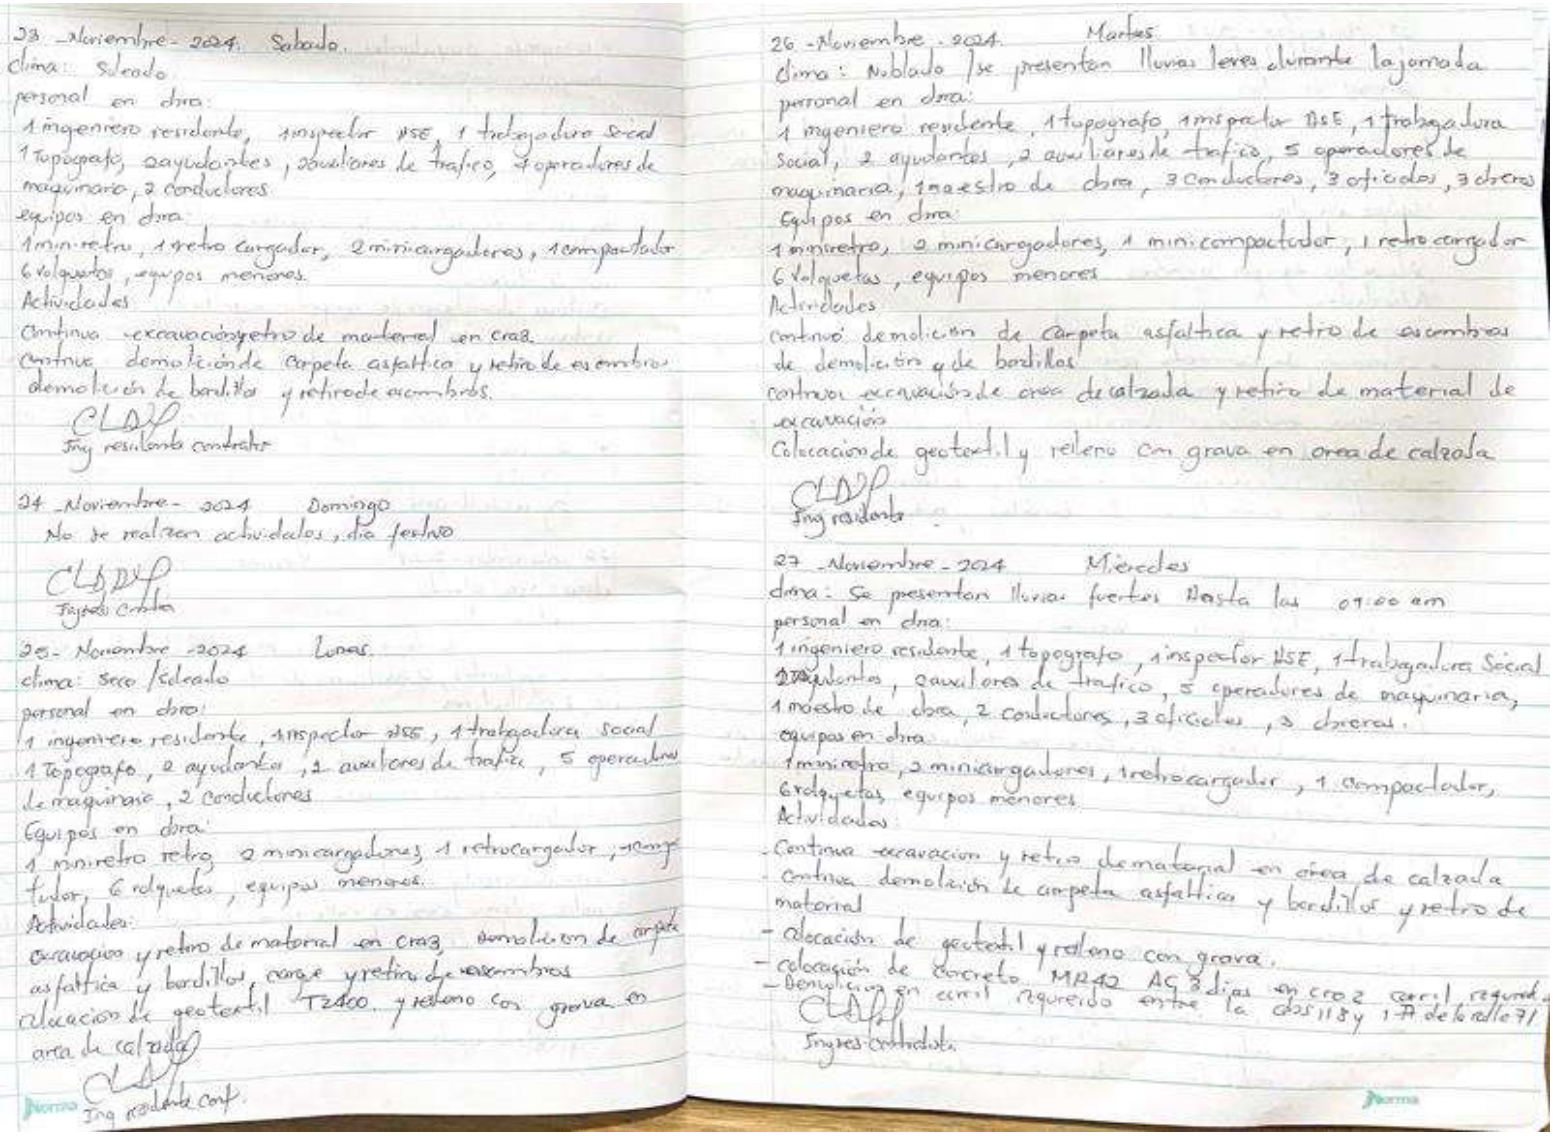

23 -Noviembre- 2024. Sabado.
clima: Soleado
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector HSE, 1 trabajadora Social
1 Topografo, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 4 operadores de maquinaria, 2 conductores
equipos en obra
1 mini retro, 1 retro cargador, 2 minicargadores, 1 compactador
6 Volquetas, equipos menores
Actividades
Continua excavación y retiro de material en area.
Continua demolición de carpeta asfaltica y retiro de escombros
demolición de bordillo y retiro de escombros.
CLDP
Ing residente contratista


24 -Noviembre- 2024 Domingo
No se realizan actividades, dia festivo
CLDP
Ingeniero Contratista

25- Noviembre -2024 Lunes.
clima: Seco / Soleado
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 inspector HSE, 1 trabajadora Social
1 Topografo, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 5 operadores de maquinaria, 2 conductores
Equipos en obra:
1 mini retro retro, 2 minicargadores, 1 retrocargador, 1 compactador, 6 volquetas, equipos menores.
Actividades:
excavacion y retiro de material en area, demolicion de carpeta asfaltica y bordillos, cargue y retiro de escombros
colocacion de geotextil T2400, y relleno con grava en area de calzada
CLDP
Ing residente cont.

26 -Noviembre- 2024. Martes
clima: Nublado / se presentan lluvias leves durante la jornada
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 topografo, 1 inspector HSE, 1 trabajadora Social, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 5 operadores de maquinaria, 1 maestro de obra, 3 conductores, 3 oficiales, 3 obreros
Equipos en obra:
1 mini retro, 2 minicargadores, 1 mini compactador, 1 retrocargador
6 Volquetas, equipos menores
Actividades
Continua demolicion de carpeta asfaltica y retiro de escombros de demolicion y de bordillos
continua excavacion de area de calzada y retiro de material de excavacion
Colocacion de geotextil y relleno con grava en area de calzada
CLDP
Ing residente

27 -Noviembre- 2024 Miercoles
clima: Se presentan lluvias fuertes hasta las 09:00 am
personal en obra:
1 ingeniero residente, 1 topografo, 1 inspector HSE, 1 trabajadora Social
2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 5 operadores de maquinaria,
1 maestro de obra, 2 conductores, 3 oficiales, 3 obreros.
equipos en obra
1 mini retro, 2 minicargadores, 1 retrocargador, 1 compactador,
6 volquetas, equipos menores
Actividades
- Continua excavacion y retiro de material en area de calzada
- Continua demolicion de carpeta asfaltica y bordillos y retiro de material
- Colocacion de geotextil y relleno con grava.
- Colocación de concreto MR42 AG 8 dias en area 2 carril, regund. - Demolicion en carril requerido entre la cra 113 y 114 de la calle 91
CLDP
Ingeniero contratista

| | | |
|---|---|---|
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA** | **Código:** FT-TEC-01<br>**Versión:** 1<br>**Fecha de aprobación:** 9-feb-2021 |

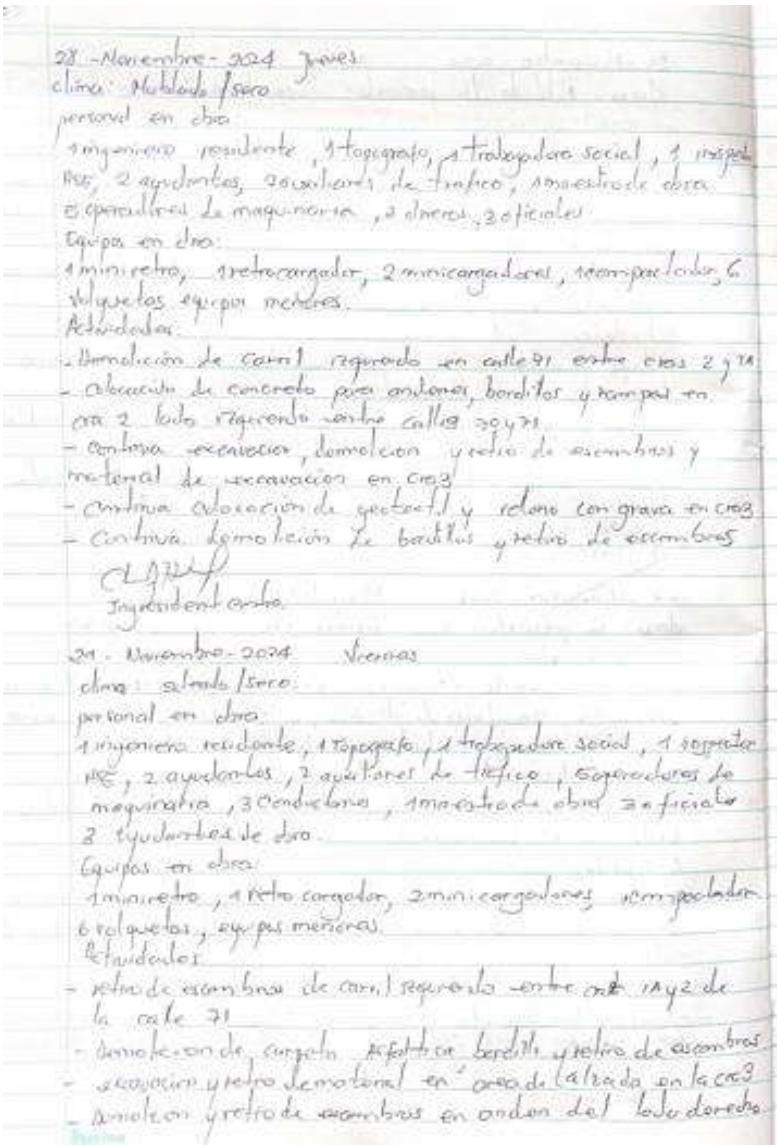

28 - Noviembre - 2024 Jueves
clima: Nublado / seco
personal en obra
1 ingeniero residente, 1 topografo, 1 trabajadora social, 1 inspector HSE, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 maestro de obra, 5 operadores de maquinaria, 2 choferes, 3 oficiales
Equipo en obra:
1 mini retro, 1 retrocargador, 2 minicargadores, 1 compactador, 6 volquetas equipos menores.
Actividades:
- Demolición de carril izquierdo en calle 71 entre cras 2 y 1A
- Colocación de concreto para andenes, bordillos y rampas en cra 2 lado izquierdo entre calles 70 y 71
- Continua excavación, demolición y retiro de escombros y material de excavación en cra 3
- Continua colocación de geotextil y relleno con grava en cra 3
- Continua demolición de bordillos y retiro de escombros

CLDP
Ingresidente cons.

29 - Noviembre - 2024 Viernes
clima: soleado / seco
personal en obra
1 ingeniero residente, 1 Topografo, 1 trabajadora social, 1 inspector HSE, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 5 operadores de maquinaria, 3 conductores, 1 maestro de obra 3 oficiales 2 ayudantes de obra.
Equipos en obra:
1 mini retro, 1 retro cargador, 2 minicargadores, 1 compactador 6 volquetas, equipos menores.
Actividades:
- retiro de escombros de carril izquierdo entre cras 1A y 2 de la calle 71
- Demolicion de carpeta asfaltica bordillo y retiro de escombros
- excavacion y retiro de material en area de alzada en la cra 3
- Andenes y retiro de escombros en andenes del lado derecho de la carrera 2 entre calles 70 y 71
- Realizo conformacion, rellenos y compactacion en andenes cra 2 lado izquierdo

CLDP
Ing residente Cons

30 - Noviembre - 2024 Sabado
clima: seco / soleado
personal en obra
1 ingeniero residente, 1 inspector HSE, 1 trabajadora social, 1 Topografo 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 5 operadores de maquinaria 2 conductores, 1 maestro de obra, 4 oficiales, 1 choferes.
Equipos en obra:
1 mini retro, 1 retro cargador, 2 minicargadores, 1 compactador 6 volquetas, equipos menores
Actividades:
- Demolicion de Andenes en cra 2 andenes lado izquierdo entre calle 70 y 71 retiro de escombros y material de excavacion
- Demolicion de carpeta asfaltica y bordillos y retiro de escombros en cra 3
- excavacion y retiro de material en area de alzado de la cra 3
- Colocacion de geotextil y relleno con grava en cra 3
- reconstruccion de registro sanitario en abs 0+170 de la cra 3 lado derecho
- Limpieza de via en cra 2 y cargue escombro y sobrantes

CLDP
Ingresidente Cons.

**INFORME MENSUAL SST**

ALCALDIA DE CARTAGENA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

**Entidad Contratante**

Occidental de Colombia S.A.S.

**Contratista de obra**

“EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES NECESARIASNPARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DI STRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y C FASE IV”

*LOTE 04*

**Objeto Contrato de obra**

**LP-SID-UAC-038-2023**

**No de Contrato de Obra**

INGEOCIM SAS

**Interventoría**

CARTAGENA

**2024**

# 1. INTRODUCCIÓN

La revisión mensual que se le realiza al Sistema Integrado de Gestión se concibe como referencia de seguimiento y diagnóstico general del mismo; así mismo se ha convertido en herramienta que contribuye a la toma de decisiones de la Alta dirección la cual permite promover la mejora continua del sistema y de la Organización en sí. A través de este análisis de igual manera se verifica el sostenimiento, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las normas implementadas y certificadas por la empresa Occidental de Colombia S.A.S.

Para evaluar el objetivo de dicha Revisión, se cuenta con información previa que incluye los elementos del sistema integrado; para esta mensualidad de 1 – 18 de noviembre de 2024 se presentan los siguientes resultados:

ALCANCE DEL INFORME

1. Revisión de la Política y objetivos del SIG
2. Resultados del seguimiento al SIG
3. Retroalimentación con el cliente y grupos de interés
4. Desempeño de los procesos
5. Cumplimiento de objetivos metas y programas
6. Estado de acciones preventivas y correctivas
7. Estado de investigaciones de incidentes
8. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la Entidad
9. Acciones de seguimiento previas efectuadas por la Dirección
10. Cambios que podrían afectar el SIG
11. Recomendaciones para la mejora

## 2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SST

En el presente informe se plasmará el trabajo realizado por el contratista Occidental de Colombia S.A.S. en el periodo del 1 AL 18 de noviembre del 2024 adicionalmente se demuestra la implementación del PLAN SST proyectado.

## 3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la ejecución de las actividades se implementaron acciones relacionadas al cumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta la normatividad del decreto 1072 de 2015 y 1443 de 2014 en cuanto a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Teniendo en cuenta el ciclo PHVA en el SG-SST, como el procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

**3.1 Planificar:** Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.

**3.2 Hacer:** Implementación de las medidas planificadas.

**3.3 Verificar:** Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.

**3.4 Actuar:** Realizar acciones de mejora para obtener los. mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.

**El contratista en este mes relacionado debe hacer entrega de:**

## 4.OBJETIVOS

**Describir objetivos de acuerdo con su plan de trabajo SST.**

### **4.1** Generales (1)

Diseñar estrategias que permitan el cumplimiento de los estándares mínimos, que permitan garantizar un ambiente de trabajo seguro, a través de la prevención de accidentes y enfermedades laborales en los colaboradores, mediante el control de los peligros, el desarrollo de actividades de promoción y prevención, y el cumplimiento de la normativa vigente.

### **4.2** Específicos (2)

**1.** Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para mitigar la accidentalidad.

**2.** Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

**3.** Proteger la seguridad y salud de todos los servidores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, generando y gestionando acciones preventivas, correctivas y de mejora para el control de la incidentalidad, accidentalidad y emergencias que se pueda presentar.

## 5.ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

| **ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO** | **IMPACTOS PARA MITIGAR** |
|---|---|
| • **Demolición en losa de concreto**<br>• **Tránsito de vehículos aledaños a la obra.**<br>• **Malas Posturas en las actividades diarias.** | Proyección de partículas de concreto.<br>Contacto con material particulado (polvo).<br>Choque con vehículos.<br>Riesgo público.<br>Estrés, fatiga, dolores en las coyunturas. |

**6.INDUCCION DEL PERSONAL:**

**6.1Programa de Inducción y reinducción:**) Realización de inducción al personal que va a ingresar al proyecto, Inducciones en SG-SST**.** Se cumple con el ítem en el anexo 6. Se evidencian las inducciones y reinducciones el personal en el mes de noviembre. (no ha ingresado personal nuevo en el mes de noviembre).

**6.2 Listado de personal de obra Actualizado y Cargos**

El listado de personal de acuerdo con los requerimientos exigidos contempla, nombres, cargos, entidades de afiliación, fechas de ingreso. Se cumple con el ítem y se anexa en la carpeta directorio de personal.

**7.CONTROL Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS**

El contratista durante el periodo del presente informe se ha encargado de la divulgación y/o socialización de documentos del sistema de Gestión SST, para el conocimiento del personal de obra. Se realiza capacitación riesgo químico con su evaluación como anexo en conjunto con las charlas realizadas este mes.

**8. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS**.

El contratista presento Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de acuerdo con las actividades a ejecutar en el objeto del contrato, con la metodología de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012**. Se anexa matriz actualizada**

**9.MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO**

**Artículo 84 de la Ley 9 de 1979 y Resolución 2400 de 1979 artículo 2**: conjunto de actividades implementadas por el empleador con el objetivo de promocionar, prevenir y controlar la salud de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgos en seguridad y salud en el trabajo a los que pueden estar expuestos, ubicándolos en sitios de trabajo acordes a sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolos en aptitud de producción de trabajo.

**9.1Vigilancia Epidemiológica**

**9.1.1 Exámenes de Ingreso:**

**Redacte si cumplió o no cumplió con este ítem** (enviar soportes de exámenes de ingreso de todo el personal nuevo que ingreso durante el mes de noviembre) no hubo ingresos

**9.2 Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social:**

Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad Social Integra.

**(Enviar PLANILLAS pagadas de** aportes legales de seguridad social integral o bien sea el caso enviar novedades de afiliación del personal recién ingresado, es indispensable que siempre se envié la arl del personal al mismo momento de su ingreso a obra)

**9.2.1 Certificación del revisor fiscal/ contador público representante legal del contratista. (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y subcontratistas,** donde se **exprese paz y salvo** por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social integral y salarios que contengan como mínimo el numero de los trabajadores que laboran en el periodo.

NOTA: (solicitar la certificación requerida con sus superiores y anexarla junto a sus planillas pagadas de todo el personal a cargo, contratista y subcontratista).

**10. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA**

**10.1 Ejecución de ATS – Permisos de Trabajo**

En el presente mes el contratista debe dar cumplimiento de todas sus actividades operativas expuestas en los **ATS.**

**(Soportar FORMATOS DILIGENCIADOS** DE todos los ATS Y permisos de trabajo realizados durante el mes, sujetos a estos todas las inspecciones requeridas).

**10.2 INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES SST**

A continuación, se describen el cumplimiento del contratista con las siguientes

ejecuciones:

| ITEM | INSPECCION | FRECUENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Herramientas Manuales EQUIPOS MECANICOS O ELECTRICOS. | Semanal | CUMPLE |
| 2 | Elementos De Protección Personal y dotacion de trabajo | Semanal | CUMPLE |
| 3 | Inspecciones externas/locativas | Semanal | CUMPLE |
| 4 | Inspección Equipo Emergencia | Quincenal | CUMPLE |
| 5 | Inspección Botiquín | Quincenal | CUMPLE |
| 7 | Preoperacionales de equipos y maquinaria (kit de derrame) | Semanal | CUMPLE |
| 8 | Fichas técnicas de maquinaria y cronograma de mantenimiento. | Mensual | CUMPLE |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Fotografía No 1: inspección de elementos de protección personal en campo




Fotografía No 2: calistenia.

**10.3 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad, no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave.

**OBJETIVO: Durante la jornada de trabajo con el fin de proteger la salud del colaborador de los agentes nocivos que se desprenden de la actividad que se desarrolla.**

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 3: entrega de dotación y epps | Fotografía No 4: Uso adecuado de los epp actividad instalación de base. |

**10.4 CHARLAS Y SOCIALIZACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**Durante el mes de agosto las charlas fueron enfocadas a la necesidad de obras, con la importancia de concientizar a los colaboradores con la orden y aseo y mantener la señalización en obra.**

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 5: Charlas SST: Importancia de la hidratación. | Fotografía No 6: Charlas SST: Señalización en obra. |

**10.5 CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO.**

Las capacitaciones que realizo según su PLAN DE TRABAJO SST y las recomendadas por la interventoría. Estas van sujetas a evaluaciones que deben ser soportadas en PDF junto con la asistencia.

| | |
|---|---|
| | |
| Fotografía No 7: | Fotografía No 8: |

**10.6 PAUSAS ACTIVAS**

**Concientizar al personal la importancia de tomar pautas en la jornada laboral.**

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 9: Pausas activas / Calistenia. | Fotografía No 10 Pausas activas / Calistenia.<br>: |

## 11.MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Redacte o describa su maquinaria operativa en obra y el cumplimiento con los siguientes puntos:

-certificación de importación

-tarjeta de propiedad

-Fichas técnicas

- Hoja de vida de maquinaria o equipo y mtto

En obra se cuenta con una Retroexcabadora de oruga, un Minicargador Cat, y un vibrocompactador.

.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 11: inspección de maquina | Fotografía No 12: inspección de herramientas |

## 12.ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Los elementos de primeros auxilios son un conjunto de herramientas y suministros diseñados para tratar lesiones menores o enfermedades repentinas antes de que llegue la atención médica profesional. (Relata o describe el tipo de botiquín que se encuentra en obra y los elementos que lo conforman)

-Enviar formatos de inspecciones de extintores, botiquín y camilla de p. Aux.

NOTA.: **favor no enviar las mismas fotos que enviaron el mes** pasado.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| Fotografía No 13: elementos de emergencia. | Fotografía No 14: Inspección en campo elementos de primeros auxilios. |

## 13. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)

El PMT está conformado por señalización vertical temporal de obra: informativas, preventivas, reglamentarias y señalización horizontal.

El objetivo de esta implementación queda descrito en el anexo técnico: Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de trafico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la secretaria de transito y/o ante la dependencia de la administración municipal según corresponda, esto, en cumplimiento con lo establecido en el Art 101 de la ley 769 de 2002.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 15: demarcación vaciada de losa de concreto. | Fotografía No 16: Uso de maletines para señalización. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 17: señalización vertical hombres trabajando | Fotografía No 18: control vial en obra |

## 14. ORDEN Y ASEO – CAMPAMENTO E HIDRATACION

-Jornadas de orden y aseo en el campamento, y frente de obra, como recogidas de material con volquetas.

- Termo para hidratación

Cuando no hay en él elementos innecesarios y todo aquello necesario está en su lugar. Procedemos a retirar la suciedad de un objeto o lugar en forma periódica para referirnos tanto a que un objeto, lugar o persona esté limpio, como al hecho de no ensuciar.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 19: mantenimiento de baños | Fotografía No 20: jornada orden y aseo |

## 15. REPORTE DE ACCIDENTES O INCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERIODO

**15.1 Índice de Frecuencia de Accidentalidad:** Este indicador te permite calcular la cantidad de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes. Anteriormente se alineó su cálculo a estándares internacionales como OHSAS y NTC 3701. En resolución 0312 de 2019 se adapta a Colombia.

**NOTA:** remplazar los valores que se expondrán a continuación, por los valores reales que correspondan, según su número de trabajadores, número de accidentes, incidentes presentados y días laborados.

A continuación, se relaciona el indicador de accidentalidad:

**F= N° AT * 100%**

**N° de trabajadores**

A continuación, se relaciona el índice de frecuencia de accidentalidad en la obra.

**Ejemplo**

**0*100= 0%**

**21 (# de trabajadores) Remplazar valores.**

**F** =13X1X100 % **F** =13%

**15.1.1Indice de Severidad:** En este indicador, la severidad está dada por la cantidad de días perdidos por concepto de accidentes laborales.

**S= N°. de días por incapacidad por AT* No. cargados* 100**
**No trabajadores**


A continuación, se relaciona el indicador de severidad en la obra:

**S= 0* 100 = 0%**

**21**

| SEGUIMIENTO AL INDICADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Efectividad del Indicador** | | **Deficiente** | **Bueno** | **Excelente** |
| | | | | |
| MES | **ISAT** | **N° DE A.T INCAP** | **N° HHT MES** | **META** |
| **ENE** | **#¡DIV/0!** | **0** | 0 | **0** |
| **FEB** | **#¡DIV/0!** | **0** | 0 | **0** |
| **MAR** | **#¡DIV/0!** | **0** | 0 | **0** |
| **ABR** | **#¡DIV/0!** | **0** | 0 | **0** |
| **MAY** | **#¡DIV/0!** | **0** | 0 | **0** |
| **JUN** | **#¡DIV/0!** | **0** | 0 | **0** |
| **JUL** | **7.40** | **1** | 2704 | **0** |
| **AGO** | **0.00** | **0** | 3000 | **0** |
| **SEP** | **0.00** | **0** | 3000 | **0** |
| **OCT** | **#¡DIV/0!** | **0** | 0 | **0** |
| **NOV** | **#¡DIV/0!** | **0** | 0 | **0** |
| **DIC** | **#¡DIV/0!** | **0** | 0 | **0** |
| **CONSO. 1** | **#¡REF!** | | #¡REF! | |
| **CONSO. 2** | **#¡REF!** | | #¡REF! | |
| **META** | **0%** | | #¡REF! | |

| VARIABLES | |
|---|---|
| **I.S.AT** | Indice de Severidad accidentes de trabajo. |
| **Numerador** | Numero de Accidentes de Trabajo con dias perdidos por Mes |
| **Denominador** | Numero de Horas Hombres Trabajadas por mes |

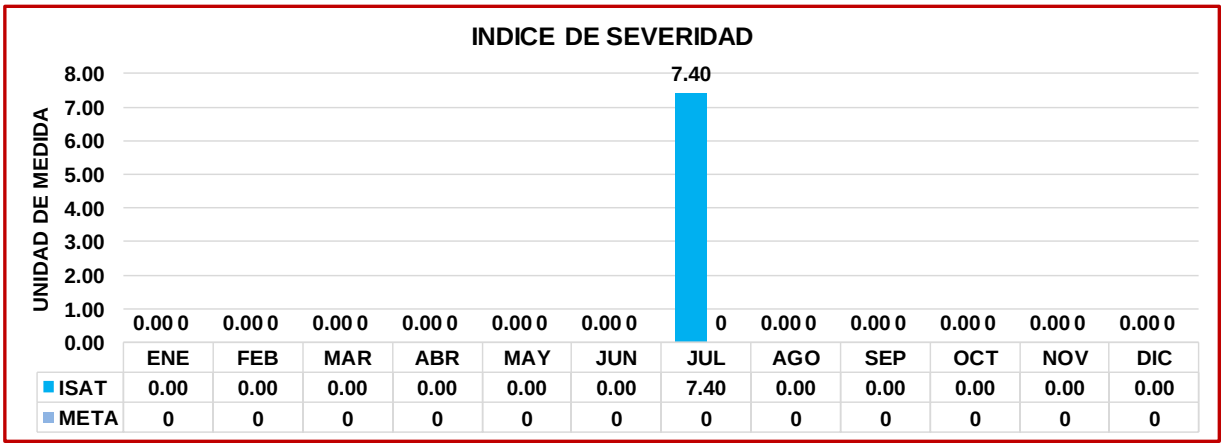


En caso de tener un positivo**, anexar los requerimientos descritos en la RESOLUCION *1401 DE 2007*. (mayo 14) "***Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo".***

- **FURAT: formato único de reporte de accidentes de trabajo.**
- Acta de reunión con anexos de investigación de accidente de trabajo, recuerde que: Esta investigación debe realizarse a través del equipo investigador, el cual debe estar conformado como mínimo: *El jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente. Un responsable del comité paritario o el vigía de seguridad y salud en el trabajo y un testigo*.

En esta se deben implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia.

- Acta de capacitación y lecciones aprendidas donde se encuentra el afectado y todo el personal de trabajo. Con anexos.
- Reporte oficial (OFICIO) del contratista a la intervententoria.
- Matriz de accidentalidad y ausentismo laboral, actualizada.

## 16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

**1. Se han identificado riesgos asociados a la exposición a materiales peligrosos, como el CONCRETO y los productos químicos utilizados en la construcción de vías.**

**2. La falta de señalización adecuada en las zonas de trabajo puede generar riesgos de accidentes y incidentes.**

**3. Se han detectado deficiencias en el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores.**

**4. La formación y capacitación en SST es esencial para garantizar la seguridad de los trabajadores.**

**5. Se recomienda implementar un programa de mantenimiento preventivo para los equipos y maquinaria utilizados en la construcción de vías.**

**6. La coordinación y comunicación entre los diferentes equipos de trabajo es fundamental para prevenir accidentes y incidentes.**

**7. Se deben establecer protocolos de emergencia claros y efectivos en caso de accidentes o incidentes.**

## 17. CIERRE DE HALLAZGOS.

**Espacio asignado para interventoria**

**INFORME MENSUAL SST**

ALCALDIA DE CARTAGENA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

**Entidad Contratante**

Occidental de Colombia S.A.S.

**Contratista de obra**

“EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES NECESARIASNPARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DI STRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y C FASE IV”

*LOTE 04*

**Objeto Contrato de obra**

**LP-SID-UAC-038-2023**

**No de Contrato de Obra**

INGEOCIM SAS

**Interventoría**

CARTAGENA

**2024**

# 1. INTRODUCCIÓN

La revisión mensual que se le realiza al Sistema Integrado de Gestión se concibe como referencia de seguimiento y diagnóstico general del mismo; así mismo se ha convertido en herramienta que contribuye a la toma de decisiones de la Alta dirección la cual permite promover la mejora continua del sistema y de la Organización en sí. A través de este análisis de igual manera se verifica el sostenimiento, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las normas implementadas y certificadas por la empresa Occidental de Colombia S.A.S.

Para evaluar el objetivo de dicha Revisión, se cuenta con información previa que incluye los elementos del sistema integrado; para esta mensualidad de 19 – 30 de noviembre de 2024 se presentan los siguientes resultados:

ALCANCE DEL INFORME

1. Revisión de la Política y objetivos del SIG
2. Resultados del seguimiento al SIG
3. Retroalimentación con el cliente y grupos de interés
4. Desempeño de los procesos
5. Cumplimiento de objetivos metas y programas
6. Estado de acciones preventivas y correctivas
7. Estado de investigaciones de incidentes
8. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la Entidad
9. Acciones de seguimiento previas efectuadas por la Dirección
10. Cambios que podrían afectar el SIG
11. Recomendaciones para la mejora

## 2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SST

En el presente informe se plasmará el trabajo realizado por el contratista Occidental de Colombia S.A.S. en el periodo del 19 AL 30 de noviembre del 2024 adicionalmente se demuestra la implementación del PLAN SST proyectado.

## 3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la ejecución de las actividades se implementaron acciones relacionadas al cumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta la normatividad del decreto 1072 de 2015 y 1443 de 2014 en cuanto a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Teniendo en cuenta el ciclo PHVA en el SG-SST, como el procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

**3.1 Planificar:** Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.

**3.2 Hacer:** Implementación de las medidas planificadas.

**3.3 Verificar:** Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.

**3.4 Actuar:** Realizar acciones de mejora para obtener los. mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.

**El contratista en este mes relacionado debe hacer entrega de:**

## 4.OBJETIVOS

**Describir objetivos de acuerdo con su plan de trabajo SST.**

### **4.1** Generales (1)

Diseñar estrategias que permitan el cumplimiento de los estándares mínimos, que permitan garantizar un ambiente de trabajo seguro, a través de la prevención de accidentes y enfermedades laborales en los colaboradores, mediante el control de los peligros, el desarrollo de actividades de promoción y prevención, y el cumplimiento de la normativa vigente.

### **4.2** Específicos (2)

**1.** Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para mitigar la accidentalidad.

**2.** Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

**3.** Proteger la seguridad y salud de todos los servidores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, generando y gestionando acciones preventivas, correctivas y de mejora para el control de la incidentalidad, accidentalidad y emergencias que se pueda presentar.

## 5.ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

| **ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO** | **IMPACTOS PARA MITIGAR** |
|---|---|
| • **Demolición en losa de concreto**<br>• **Tránsito de vehículos aledaños a la obra.**<br>• **Malas Posturas en las actividades diarias.** | Proyección de partículas de concreto.<br>Contacto con material particulado (polvo).<br>Choque con vehículos.<br>Riesgo público.<br>Estrés, fatiga, dolores en las coyunturas. |

**6.INDUCCION DEL PERSONAL:**

**6.1Programa de Inducción y reinducción:**) Realización de inducción al personal que va a ingresar al proyecto, Inducciones en SG-SST**.** Se cumple con el ítem en el anexo 6. Se evidencian las inducciones y reinducciones el personal en el mes de noviembre. (no ha ingresado personal nuevo en el mes de noviembre).

**6.2 Listado de personal de obra Actualizado y Cargos**

El listado de personal de acuerdo con los requerimientos exigidos contempla, nombres, cargos, entidades de afiliación, fechas de ingreso. Se cumple con el ítem y se anexa en la carpeta directorio de personal.

**7.CONTROL Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS**

El contratista durante el periodo del presente informe se ha encargado de la divulgación y/o socialización de documentos del sistema de Gestión SST, para el conocimiento del personal de obra. Se realiza capacitación riesgo químico con su evaluación como anexo en conjunto con las charlas realizadas este mes.

**8. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS**.

El contratista presento Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de acuerdo con las actividades a ejecutar en el objeto del contrato, con la metodología de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012**. Se anexa matriz actualizada**

**9.MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO**

**Artículo 84 de la Ley 9 de 1979 y Resolución 2400 de 1979 artículo 2**: conjunto de actividades implementadas por el empleador con el objetivo de promocionar, prevenir y controlar la salud de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgos en seguridad y salud en el trabajo a los que pueden estar expuestos, ubicándolos en sitios de trabajo acordes a sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolos en aptitud de producción de trabajo.

**9.1Vigilancia Epidemiológica**

**9.1.1 Exámenes de Ingreso:**

**Redacte si cumplió o no cumplió con este ítem** (enviar soportes de exámenes de ingreso de todo el personal nuevo que ingreso durante el mes de noviembre**) No se cumple con el item**

**9.2 Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social:**

Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad Social Integra.

**(Enviar PLANILLAS pagadas de** aportes legales de seguridad social integral o bien sea el caso enviar novedades de afiliación del personal recién ingresado, es indispensable que siempre se envié la arl del personal al mismo momento de su ingreso a obra)

**9.2.1 Certificación del revisor fiscal/ contador público representante legal del contratista. (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y subcontratistas,** donde se **exprese paz y salvo** por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social integral y salarios que contengan como mínimo el numero de los trabajadores que laboran en el periodo.

NOTA: (solicitar la certificación requerida con sus superiores y anexarla junto a sus planillas pagadas de todo el personal a cargo, contratista y subcontratista).

**10. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA**

**10.1 Ejecución de ATS – Permisos de Trabajo**

En el presente mes el contratista debe dar cumplimiento de todas sus actividades operativas expuestas en los **ATS.**

**(Soportar FORMATOS DILIGENCIADOS** DE todos los ATS Y permisos de trabajo realizados durante el mes, sujetos a estos todas las inspecciones requeridas).

**10.2 INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES SST**

A continuación, se describen el cumplimiento del contratista con las siguientes

ejecuciones:

| ITEM | INSPECCION | FRECUENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Herramientas Manuales EQUIPOS MECANICOS O ELECTRICOS. | Semanal | CUMPLE |
| 2 | Elementos De Protección Personal y dotacion de trabajo | Semanal | CUMPLE |
| 3 | Inspecciones externas/locativas | Semanal | CUMPLE |
| 4 | Inspección Equipo Emergencia | Quincenal | CUMPLE |
| 5 | Inspección Botiquín | Quincenal | CUMPLE |
| 7 | Preoperacionales de equipos y maquinaria (kit de derrame) | Semanal | CUMPLE |
| 8 | Fichas técnicas de maquinaria y cronograma de mantenimiento. | Mensual | CUMPLE |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotografía No 1: inspección de elementos de protección personal en campo</td>
<td>Fotografía No 2: calistenia.</td>
</tr>
</table>

**10.3 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad, no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave.

**OBJETIVO: Durante la jornada de trabajo con el fin de proteger la salud del colaborador de los agentes nocivos que se desprenden de la actividad que se desarrolla.**

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
|   |  |
| Fotografía No 3: entrega de dotación y epps | Fotografía No 4: Uso adecuado de los epp actividad instalación de base. |

**10.4 CHARLAS Y SOCIALIZACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**Durante el mes de agosto las charlas fueron enfocadas a la necesidad de obras, con la importancia de concientizar a los colaboradores con la orden y aseo y mantener la señalización en obra.**

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 5: Charlas SST: Importancia de la hidratación. | Fotografía No 6: Charlas SST: Señalización en obra. |

**10.5 CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE.**

Las capacitaciones que realizo según su PLAN DE TRABAJO SST y las recomendadas por la interventoría. Estas van sujetas a evaluaciones que deben ser soportadas en PDF junto con la asistencia.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 7: Evaluación Capacitación. | Fotografía No 8: Evaluación Capacitación. |

## 10.6 PAUSAS ACTIVAS

**Concientizar al personal la importancia de tomar pautas en la jornada laboral.**

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
|   |   |
| Fotografía No 9: Pausas activas / Calistenia. | Fotografía No 10 Pausas activas / Calistenia.<br>: |

## 11.MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Redacte o describa su maquinaria operativa en obra y el cumplimiento con los siguientes puntos:

-certificación de importación

-tarjeta de propiedad

-Fichas técnicas

- Hoja de vida de maquinaria o equipo y mtto

**Nuestra flota de maquinaria pesada incluye:**

- Vibrocompactador K416F2: ideal para compactar suelos y asfaltos.
- Minicargador Cat: un equipo versátil para carga y descarga de materiales.
- Minicargador Bobcat S300: un equipo compacto y potente para trabajos en espacios

reducidos.

- Mini retroexcavadora Lovol FR60E: un equipo ideal para trabajos de excavación y carga en espacios reducidos.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
|   |   |
| Fotografía No 11: inspección de maquina | Fotografía No 12: inspección de herramientas |

## 12.ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Los elementos de primeros auxilios son un conjunto de herramientas y suministros diseñados para tratar lesiones menores o enfermedades repentinas antes de que llegue la atención médica profesional. (Relata o describe el tipo de botiquín que se encuentra en obra y los elementos que lo conforman)

-Enviar formatos de inspecciones de extintores, botiquín y camilla de p. Aux.

NOTA.: **favor no enviar las mismas fotos que enviaron el mes** pasado.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 13: kit antiderrame. | Fotografía No 14: Inspección en campo elementos de primeros auxilios. |

## 13. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)

El PMT está conformado por señalización vertical temporal de obra: informativas, preventivas, reglamentarias y señalización horizontal.

El objetivo de esta implementación queda descrito en el anexo técnico: Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de trafico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la secretaria de transito y/o ante la dependencia de la administración municipal según corresponda, esto, en cumplimiento con lo establecido en el Art 101 de la ley 769 de 2002.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 15: demarcación vaciada de losa de concreto. | Fotografía No 16: Uso de maletines para señalización. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía No 17: señalización vertical hombres trabajando | Fotografía No 18: control vial en obra |

## 14. ORDEN Y ASEO – CAMPAMENTO E HIDRATACION

-Jornadas de orden y aseo en el campamento, y frente de obra, como recogidas de material con volquetas.

- Termo para hidratación

Cuando no hay en él elementos innecesarios y todo aquello necesario está en su lugar. Procedemos a retirar la suciedad de un objeto o lugar en forma periódica para referirnos tanto a que un objeto, lugar o persona esté limpio, como al hecho de no ensuciar.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| | |
|---|---|
|   |   |
| Fotografía No 19: mantenimiento de baños | Fotografía No 20: jornada orden y aseo |

## 15. REPORTE DE ACCIDENTES O INCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERIODO

**15.1 Índice de Frecuencia de Accidentalidad:** Este indicador te permite calcular la cantidad de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes. Anteriormente se alineó su cálculo a estándares internacionales como OHSAS y NTC 3701. En resolución 0312 de 2019 se adapta a Colombia.

**NOTA:** remplazar los valores que se expondrán a continuación, por los valores reales que correspondan, según su número de trabajadores, número de accidentes, incidentes presentados y días laborados.

A continuación, se relaciona el indicador de accidentalidad:

**F= N° AT * 100%**

_____

**N° de trabajadores**

A continuación, se relaciona el índice de frecuencia de accidentalidad en la obra.

**Ejemplo**

**0*100= 0%**

**21 (# de trabajadores) Remplazar valores.**

**F** =13X1X100 %  **F** =13%

**15.1.1Indice de Severidad:** En este indicador, la severidad está dada por la cantidad de días perdidos por concepto de accidentes laborales.


**S= N°. de días por incapacidad por AT* No. cargados* 100**
**No trabajadores**

A continuación, se relaciona el indicador de severidad en la obra:

**S= 0* 100 = 0%**

**21**

| SEGUIMIENTO AL INDICADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Efectividad del Indicador | | Deficiente | Bueno | Excelente |
| | | | | |
| MES | ISAT | N° DE A.T INCAP | N° HHT MES | META |
| ENE | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| FEB | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| MAR | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| ABR | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| MAY | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| JUN | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| JUL | 7.40 | 1 | 2704 | 0 |
| AGO | 0.00 | 0 | 3000 | 0 |
| SEP | 0.00 | 0 | 3000 | 0 |
| OCT | 0.00 | 0 | 3000 | 0 |
| NOV | 0.00 | 0 | 2300 | 0 |
| DIC | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| CONSO. 1 | #¡REF! | | #¡REF! | |
| CONSO. 2 | #¡REF! | | #¡REF! | |
| META | 0% | | #¡REF! | |

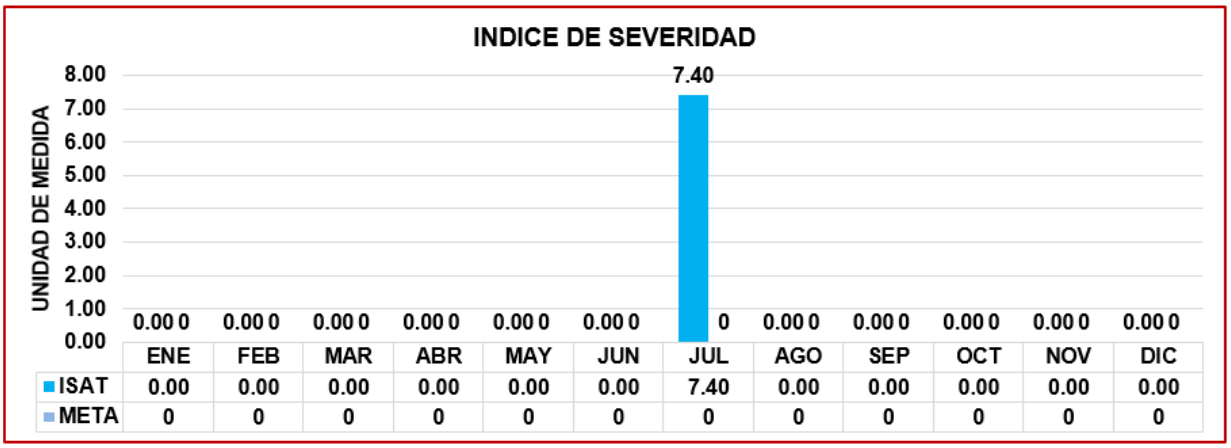


En caso de tener un positivo**, anexar los requerimientos descritos en la RESOLUCION *1401 DE 2007*. (mayo 14) "***Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo".*

- **FURAT: formato único de reporte de accidentes de trabajo.**
- Acta de reunión con anexos de investigación de accidente de trabajo, recuerde que: Esta investigación debe realizarse a través del equipo investigador, el cual debe estar conformado como mínimo: *El jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente. Un responsable del comité paritario o el vigía de seguridad y salud en el trabajo y un testigo*.

En esta se deben implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia.

- Acta de capacitación y lecciones aprendidas donde se encuentra el afectado y todo el personal de trabajo. Con anexos.
- Reporte oficial (OFICIO) del contratista a la intervententoria.
- Matriz de accidentalidad y ausentismo laboral, actualizada.

## 16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

**1. Se han identificado riesgos asociados a la exposición a materiales peligrosos, como el CONCRETO y los productos químicos utilizados en la construcción de vías.**

**2. La falta de señalización adecuada en las zonas de trabajo puede generar riesgos de accidentes y incidentes.**

**3. Se han detectado deficiencias en el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores.**

**4. La formación y capacitación en SST es esencial para garantizar la seguridad de los trabajadores.**

**5. Se recomienda implementar un programa de mantenimiento preventivo para los equipos y maquinaria utilizados en la construcción de vías.**

**6. La coordinación y comunicación entre los diferentes equipos de trabajo es fundamental para prevenir accidentes y incidentes.**

**7. No se cuenta con COPASST, ni comité de convivencia.**

**8. Se deben establecer protocolos de emergencia claros y efectivos en caso de accidentes o incidentes. Aun no contamos con una salida de emergencia o punto de encuentro en obra ya por los movimientos en las diferentes calles, tampoco contamos con una brigada de emergencia.**

2024

# Informe de Manejo Ambiental Corte 01-18 de noviembre de 2024, Obras de Rehabilitación De La Malla Vial Urbana Del Distrito De Cartagena De Indias D.T. Y C. –FASE IV. LOTE 4



OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-038-2023 - LOTE 4 del 25-08-2023 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 2024

## CONTENIDO

**CONTENIDO** ..... **2**

**1. INTRODUCCIÓN** ..... **3**

**2. GENERALIDADES** ..... **3**

**3. LOCALIZACIÓN** ..... **5**

**4. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL** ..... **6**

**5. CONCLUSIONES** ..... **40**

**6. RECOMENDACIONES** ..... **41**

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento elaborado por la empresa OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. contiene el Informe de Manejo Ambiental Mensual #5 Rehabilitación De La Malla Vial Urbana Del Distrito De Cartagena De Indias D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4, correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **01 de noviembre al 18 de noviembre de 2024**. En el cual, el CONTRATISTA presenta seguimiento y cumplimiento a los programas ambientales establecidos en el capítulo 10, ítem 10.1 Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición RCD PMA- RCD del proyecto y los requerimientos contractuales atribuidos al CONTRATO DE OBRA No. LP- SID-UAC-038-2023 - LOTE 4 del 25-08-2023 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 2024, cuyo objeto es EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4.

Para el cumplimiento ambiental se realizan los informes mensuales con el objeto de contar con un registro de las actividades que se ejecutaron y los avances realizados, así como las dificultades e inconvenientes, que retrasaron el desarrollo de actividades orientadas a cumplir con los compromisos adquiridos. Sumado a esto se relacionan en los informes las medidas de manejo ambiental implementadas durante la ejecución de las actividades constructivas para el correspondiente periodo.

El proyecto asociado a las obras constructivas busca intervenir los tramos de vía del barrio Crespo del norte del distrito de Cartagena que actualmente presentan deterioro en su capa de rodadura y en algunos casos el colapso (parcial o total) de la estructura del pavimento, dificultando con ello la movilidad tanto vehicular como peatonal, lo cual, se agrava en época de lluvia, debido a que, algunos tramos tienen drenaje superficial deficiente, la capa de rodadura empeora y se vuelve aún más insegura para el tránsito de vehículos pesado y livianos, así como para transeúntes.

Los tramos de vías a intervenir en el objeto del presente contrato pertenecen a la malla vial de la ciudad; Crepo (Calle 70 entre carrera 1 y 9, Calle 70 entre carreras 8 y 9,
Carrera 8 entre calles 70 y 70A, Calle 71 entre carreras 1 y 3, Carrera 3 entre calles 70 y 73 y Carrera 2 entre calles 63 y 73).

## 2. GENERALIDADES

Se presentan a continuación, la descripción de los responsables y alcance de la ejecución de proyecto OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4, en el barrio Crespo del distrito de Cartagena;

| | |
|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE | ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |
| OBJETO DEL PROYECTO | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 |
| CONTRATISTA | OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S |
| CONTRATO No. | LP-SID-UAC-038-2023 - LOTE 4 del 25-08-2023 |
| VALOR TOTAL | OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($ 8.541.666.630,00) |
| OBJETO DEL PROYECTO | “EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL FASE IV – LOTE X” |
| INTERVENTORIA | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S |
| FECHCA DE INICIO | 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| FECHA DE SUSPENSION No.1 | 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| FECHA DE REINICIO | 17 DE JUNIO DE 2024 |
| PLAZO | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| NOBRE DOCUMENTO | INFORME DE MANEJO AMBIENTAL MENSUAL #5 REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024. |

## 3. LOCALIZACIÓN

El proyecto asociado a las actividades de OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4'', se
encuentra localizado en el barrio Crespo en la zona norte del distrito de Cartagena en la localidad N° 1 Histórica y del Caribe Norte, en las coordenadas geográficas 10°26'48.20" N- 75°31'0 2.99"O.

**Figura 1. Localización calles a intervenir**




**Fuente: Google Earth. 2024. Fuente: Autores, 2024.**

# 4. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación, se presentan los programas con las medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos y significativos del proyecto, correspondientes al periodo **01 de noviembre al 18 de noviembre de 2024**, así como para potenciar los impactos ambientales positivos y dar cumplimiento a los requerimientos de la normatividad ambiental colombiana vigente.

Cada una de las fichas tiene una codificación que indica el tipo de programa al que pertenece la ficha Programa de Manejo Ambiental de RCD(PMA-RCD), el consecutivo que identifica el número del programa y Código: Tipo de programa - Proyecto, obra o actividad. Las fichas presentan de manera esquemática los acciones y/o medidas de manejo, los indicadores de cumplimiento y los respectivos registros fotográficos de cada programa.

# PROGRAMAS FICHA 1: Manejo Integral de Residuos Sólidos

### 3.1 PROGRAMA FICHA 1: Manejo Integral de Residuos Sólidos

#### 3.1.1 Actividades implementadas

Durante el periodo correspondiente al 01 de noviembre hasta el 18 de noviembre el Contratista informa que se realizó disposición final de 8 kilos de residuos sólidos ordinarios no aprovechables. Los cuales, se almacenan temporalmente en un contenedor plástico de propiedad de la empresa de Aseo PROMOAMBIENTAL S.A, que presta sus servicios de recolección y disposición final en el barrio Crespo Localidad N° 1 Histórica y del Caribe Norte.

Se lleva registro de las cantidades de residuos sólidos generados por el personal dentro de la obra, los cuales se describen como; botellas de agua plásticas, servilletas, icopor, restos vegetales (hojas) de árboles presentes en el frente de obra que son recogidos en las jornadas de limpieza.

En las 3 campañas de aseo y limpieza en frentes de obras, el personal usa sus elementos de protección y materiales de recolección de residuos donde se depositan los restos vegetales como hojas que caen de la cobertura vegetal presentes en las diferentes aceras de las vías intervenidas.

Así mismo, se realizó una capacitación el día 12 de noviembre de 2024, sobre manejo adecuado de residuos sólidos.

**Tabla 1. Registro de residuos sólidos generados en el frente de obra carrera 2 y calle 71.**

| **REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA OBRA** | |
|---|---|
| SEMANA 1 | SEMANA 2 |
| 3 KILOS | 5 KILOS |
| **TOTAL** | **8 KILOS** |

#### 3.1.2 Indicadores de seguimiento

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 01 de noviembre de 2024 a 18 de noviembre<br>de 2024 | (Cantidad de residuos generados mes/ cantidad de residuos dispuestos correctamente mes) x 100<br><br>8Kg/8Kg*100=100%<br><br>(N° de jornadas de aseo proyectadas mes/ N° de jornadas de aseo realizadas mes) x 100<br><br>3/3* 100=100% |

# PROGRAMAS FICHA 2: Manejo de Productos Químicos (disolventes), Grasas y Aceites

## 3.2 PROGRAMA FICHA 2: Manejo de Productos Químicos (disolventes), Residuos Líquidos, Grasas y Aceites

### 3.2.1 Actividades implementadas

- **Residuos líquidos:**

Durante el periodo correspondiente al 01 de noviembre hasta el 18 de noviembre de 2024, la empresa OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S informa que la obra cuenta con el uso de baños portátiles para la disposición de residuos líquidos generados por el personal de trabajo.

Los baños para el manejo de los residuos líquidos se encuentran ubicados entre la carrea 2 y la calle 71 del barrio Crespo donde se vienen desarrollando actividades constructivas de excavaciones, demoliciones y pavimentación de la vía, andenes y bordillos.

El servicio de instalación de baños sanitarios, mantenimiento y disposición final de los residuos líquidos generados por el personal de la obra en los baños portátiles son prestados por la empresa VEOLIA. Para el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y del Plan de Manejo Ambiental de la Obra se contrataron los siguientes servicios;

Cartagena, JUNIO-25-2024

**CTZ-SSP-1203**

Sres.

**GINSA CONSTRUCCIONES**
**Valentina Gaviria**

**Asunto:** Propuesta comercial

Cordial saludo

Nos complace hacer parte de su compromiso con la transformación ecológica, agradecemos que nos tenga en cuenta para la adecuada gestión de su ciclo del agua, para esto nos permitimos presentarle la propuesta técnico-económica para la prestación del servicio público de aseo en las actividades complementarias de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales generadas en Unidades Sanitarias Portátiles - en adelante las USP- y/o almacenamiento ubicadas en CRESPO.

| PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Concepto** | **Cantidad USP** | **N° Servicios** | **Valor unitario** | **Total** |
| 1 | Frecuencias de aseo al mes | 1 | 8 | $49.050 | $392.400 |
| 2 | Base gravada alquiler cabina | | | $5.000 | $40.000 |
| 3 | IVA (19%) base $5.000 | | | | $7.600 |
| | | | | **TOTAL** | $440.000 |

La empresa VEOLIA ha realizado una (1) jornada de manteniendo de baños portátiles para retirar y disponer correctamente los residuos líquidos generados en la etapa constructiva en el periodo correspondiente al corte 01 al 18 de noviembre de 2024.

Como resultado de los mantenimientos en los baños portátiles la empresa VEOLIA retiro he hizo disposición fenal de **0,40 M3** de residuos líquidos. La empresa OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS se encuentra a la espera de la entrega de la certificación y disposición de las aguas residuales.

A continuación, se detallan los baños portátiles utilizados en el frente de obra para el uso exclusivo del personal que trabaja en las actividades constructivas del proyecto OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4;

Ver registro;



**Imagen: Baño Portátil para la disposición de residuos líquidos.**

- **Productos Químicos:**

El programa de manejo para productos químicos usados en la obra requiere de la adopción de prácticas adecuadas de manejo de disolventes químicos en las áreas de trabajo.

Actualmente la obra en la construcción de la vía pavimentada del frente carrera 2 y calle 71, ha utilizado medio tanque de 12 litros de producto químico denominado Antisol Rojo, el cual es una solución de parafina en solventes orgánicos, que forma al aplicarse sobre concreto o mortero fresco, una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material.

A la fecha del periodo comprendido entre el 01 de noviembre y 18 de noviembre de 2024, no se ha presentado ningún tipo de derrame del producto indicado. En el escenario que se presente una eventualidad de derrame el equipo ambiental encargado implementará el uso de elementos de limpieza y remoción de áreas contaminadas mediante la utilización de arena o tierra.

- **Grasas y Aceites:**

La obra para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y 18 de noviembre de 2024, no ha generado aceites de combustión. Los vehículos y equipos que requieren cambio de aceites y mantenimientos, los realizan en centros y talleres especializados. Razón por la cual, en el frente de obra la carrera 2 y la calle 71, no se generan este tipo de residuos. No obstante, la obra para hidratar las plataformas metálicas que sirven de estructura para fundir los andenes hace uso de aceite quemado. Este se aplica con una brocha sobre la estructura para que no se adhiera al momento de desinstalarla una vez fragua o toma consistencia el concreto.

De acuerdo a las recomendaciones dadas por el señor GUSTAVO AMOR GELIZ en Calidad de interventor ambiental se viene cumpliendo con el manejo adecuado de este insumo de vital importancia para fundir las vías indicadas. Por lo que se hace uso de material plástico para proteger el tanque que contiene aceite quemado, para prevenir o evitar cualquier eventualidad o derrame al suelo.

En cuanto a las grasas se puede indicar que al periodo de manejo ambiental entre el 01 de noviembre y el 18 de noviembre de 2024, la obra ha utilizado un (1) tanque de grasas para aplicar en las mallas y estructuras de hierro que se instalan en las placas antes de fundir. Estos residuos de recipientes impregnados con grasas poseen un peso de 1 Kilogramos en 12 días.

**Tabla 2. Registro de Manejo de Productos Químicos (disolventes), Residuos Líquidos, Grasas y Aceites en el frente de obra Carrera 2 y calle 71.**

| **REGISTRO DE RESIDUOS DE PRODUCTOS QUIMICOS, SÓLIDOS, GRASAS Y ACEITES** | | |
|---|---|---|
| **ACEITES** | | |
| **OCTUBRE** | | |
| 0 M3 | 0 M3 | |
| TOTAL | | 0 M3 |
| **PRODUCTOS QUÍMICOS** | | |
| **OCTUBRE** | | |
| TOTAL 1/2 UNIDAD DE TANQUE: 6 Kg (el tanque está en uso) | | |
| **GRASAS** | | |
| **SEMANA 1** | **SEMANA 2** | |
| 1/2 UNIDAD DE TANQUE de 1 Kg | 1/2 UNIDAD DE TANQUE de 1 Kg | |
| TOTAL | | 1 KILOGRAMO o 1 UNIDAD |

Para el presente periodo fue posible realizar el día 18 de noviembre de 2024, una capacitación al personal sobre lo referente a buenas prácticas operacionales para el manejo de disolventes químicos, combustibles, aceites, grasas y residuos líquidos, indicando la importancia de la implementación de las mismas. También se sensibilizó en lo correspondiente a las medidas para el control rápido y eficiente de situaciones de emergencia.

### 3.2.2 Indicadores de seguimiento

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 01 de noviembre al 18 de noviembre de 2024 | 1) Cantidad de residuos líquidos generados semanalmente en baños portátiles/ cantidad de residuos líquidos generados mensualmente) x 100.<br>0 m3/0 m3*100=0%<br>2) Cantidad de residuos de productos químicos generados mes / cantidad de residuos de productos químicos dispuestos correctamente mes) x 100.<br>1/2 UNIDAD/1/2 UNIDAD*100=100% el recipiente está en uso sin disposición final<br>3) Cantidad de residuos de grasas generados mes / cantidad de residuos de grasas dispuestos correctamente mes) x 100.<br>1 Kg /1 Kg*100=100% |

### 3.2.3 Registro Fotográfico

| REGISTRO FOTOGRAFICO NO. 3 - DE RESIDUOS DE PRODUCTOS QUIMICOS, SÓLIDOS, GRASAS Y ACEITES | |
|---|---|
|  |  |
| | |

# PROGRAMAS FICHA 3 Y 4: Manejo a la Generación de Ruido y Material Particulado

### 3.3 PROGRAMA FICHA 3 y 4: Manejo Generación de Ruido y Material Particulado

#### 3.3.1 Actividades implementadas

Las maquinarias que operaron en la ejecución del proyecto realizaron las actividades en los horarios adecuados con el fin de no generar ruido que perturbe la tranquilidad del sector, el horario de actividad está distribuido entre las 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y de 7: 00 a.m. a 12:00 pm los días sábados. Durante este corte no se realizaron actividades en horarios restringidos. Las volquetas utilizadas en el transporte de los materiales fueron cubiertas completamente con el fin de evitar el derrame de materiales.

El material acumulado, arena y agregados, se mantuvo tapado temporalmente con una lona de plástico y humedecidos para evitar el arrastre con el viento. Es importante resaltar que, gracias al buen ritmo de avance de obras, los materiales de construcción de relleno y adecuación de terreno como zahorra y triturado permanecen muy poco tapados ya que se utilizan y se extienden de manera inmediata una vez llegan a la obra.

En el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 18 de noviembre de 2024, la obra ha realizado cerramiento con polisombra verde a los tramos intervenidos, con el fin, de disminuir el material particulado proveniente de las actividades de la obra. El personal de la obra ha sido capacitado el día 12 de noviembre de 2024, sobre el manejo de la generación de ruido y emisión de material particulado.

#### 3.3.2 Indicadores de seguimiento

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 01 de noviembre de 2024 al 18 de noviembre de 2024 | 1) Cumplimiento de horario de trabajo semanal: 100% de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y de 7: 00 a.m. a 12:00 pm los días sábados<br>2) Metros lineales de cerramiento de obra con polisombra: 100%<br>80 m/80 m*100=100%<br>3) Numero de capacitación manejo generación de ruido y material particulado realizada/Numero de capacitación manejo generación de ruido y material particulado programada x 100.<br>1/1*100=100% |

### 3.3.3 Registro Fotográfico

**REGISTRO FOTOGRAFICO NO. 4 y 5 – MANEJO DE GENERACIÓN DE RUIDO Y MATERIAL PARTICULADO**

**USO DE MAQUINARIA EN HORARIO PERMITIDO**







**CERRAMIENTO CON POLISOMBRA EN FRENTES DE OBRA**












**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TRANSPORTADO Y CUBIERTOS EN VEHICULOS DE CARGA**







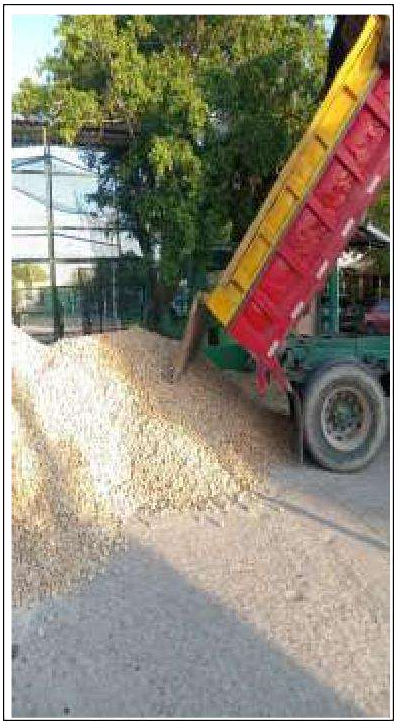

# PROGRAMAS FICHA 5: Manejo a la Generación de Gases y Vapores

### 3.4 PROGRAMA FICHA 5: Manejo Generación de Gases y Vapores

#### 3.4.1 Actividades implementadas

El presente programa busca mitigar la alteración de la calidad del aire con la generación de gases y vapores emitidos por cada uno de los vehículos, equipos y maquinarias que hacen parte del proyecto para el desarrollo de sus actividades constructivas.

La emisión de gases y vapores en el proyecto LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV.
LOTE 4, se realiza básicamente por movilización de maquinarias, equipos y materiales de construcción dentro del frente de obra.

La obra cuenta con un registro de la maquinaria que se utilizó en la obra en el periodo correspondiente entre el 01 de noviembre al 18 de noviembre de 2024, con la respectiva documentación necesaria para laborar y la cual es exigida por las autoridades de tránsito en el perímetro donde se van a desarrollar las actividades.

Ver listado de equipos y maquinarias de la obra:

| **MAQUINA** | MARCA |
|---|---|
| **EXCAVADORA INTERMEDIA** | FR60E2-H - LOVOL |
| **MOTONIVELADORA** | VOLVO DD29 |
| **MINICARGADOR** | BOBCAT3530 |
| **MINICARGADOR** | 23603 CAT |
| **RETROEXCAVADORA** | CATERPILLA R 416F |

Listado de vehículos (volquetas);

| **Vehículos-volquetas utilizadas en la obra** | |
|---|---|
| Volquetas | TAG O14 |
| | HLA 644 |
| | CSA 857 |
| | SMV 307 |
| | SOQ 204 |
| | SZN 553 |
| | SZN 562 |

| | |
|---|---|
| | SZN 587 |
| | SZP 043 |
| | THY 011 |

En la obra esta estrictamente prohibido las quemas de todo tipo de materiales (basura, residuos, material vegetal, entre otros).

Fue posible verificar en el periodo indicado que todos los vehículos vinculados a la obra dispongan del certificado de emisiones de gases vigente. Así mismo, se constató que las maquinarias y equipos que no se encontraban prestando servicios constructivos en los frentes de obra permanecieran apagados, con el fin de ahorrar combustible y evitar la descarga de emisiones a la atmósfera.

El mantenimiento de los vehículos fuera de la obra deberá considerar la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de llantas, así como el reemplazo de partes y aditivos, en caso de ser necesario.

Se promovió métodos de control de velocidad consistentes en señalización, instrucciones y campañas educativas para las personas vinculadas, así como la reglamentación de la velocidad. Los equipos y maquinarias realizan sus chequeos y mantenimientos preventivos en talleres especializados antes de ejecutar sus actividades en la obra. Con estas acciones se busca garantizar la sincronización y carburación de los motores.

### 3.4.2 Registro Fotográfico

**REGISTRO FOTOGRAFICO NO. 6– MANEJO DE GENERACIÓN DE GASES Y VAPORES**

**EQUIPOS Y MAQUINARIA**






CAT


LOVOL

# PROGRAMAS FICHA 6: Manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD

### 3.5 PROGRAMA FICHA 6: Manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD

#### 3.5.1 Actividades implementadas

- **Residuos de Excavación:**

Durante el corte de este informe el contratista señalizó el frente de obra de la carrera 2 y calle 71, que se está ejecutando, utilizando señales preventivas, cintas de seguridad y polisombra verde. Se acondicionó el almacenamiento temporal de los materiales de excavación, utilizando plástico resistente.

Los materiales que se utilizaron para bases y sub- bases se obtuvieron de la cantera Colón. Las volquetas salen de la obra carpadas y no sobre pasando su volumen de diseño.

Las excavaciones se realizan en jornada diurna generando una cantidad total de **50,4 m3** de residuos de sobrantes de excavación. Estos residuos de excavación son provenientes de la intervención de las losas de pavimento intervenidas en la carrera 2 del barrio Crespo.

En la siguiente tabla se muestra los registros de los materiales de excavación que van a la escombrera Parque Loma de los Cocos.

Ver registro de Residuos Pétreos de la excavación de la carrera 2;

**Tabla 3. Registro de Material de Excavación de la Carrera 2.**

| OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Etapa Constructiva** | | **Excavación Realizada** | | | | |
| **Fuente de Generación de RCD** | **Tipo de Pavimento** | **Longitud lozas (m)** | **Ancho lozas(m)** | **Área (m2)** | **Espesor excavación (m)** | **Total Volumen Excavación (m3)** |
| Carrera 2 | PR1 | 48 | 3,50 | 168 | 0,30 | 50,4 |
| **TOTAL, EXCAVACIÓN CARRERA 2** | | | | | | **50,4 M3** |

- **Residuos de Demolición:**

Durante el periodo de 01 de noviembre hasta 18 de noviembre de 2024, el Contratista informa que se realizaron retiros de **22,3 m3** de residuos de demolición de ANDENES en la calle 71, **4,1 m3** de demolición de BORDILLOS en la calle 71, **33,6 m3** de residuos de escombros de PLACA en la carrera 2 y **1,4 m3** de BORDILLOS en la carrera 2 del barrio Crespo, para un total de **61,4 m3** de residuos de RCD de ANDENES, PLACA y BORDILLOS, el cual se dispuso en Parque Loma de los Cocos, lugar donde funciona el Relleno Sanitario y la Escombrera Distrital de Cartagena de indias. La disposición final de estos residuos pétreos se realizó sin ninguna novedad, los vehículos pudieron llegar sin contratiempos al relleno sanitario.

Las volquetas cuentan con identificación en las puertas laterales, también las volquetas tienen el Pin transportador requerimiento establecidos en la resolución 130 de 2015, por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos ambientales para el manejo, aprovechamiento, transporte y disposición final de los residuos de construcción y demolición, y se dictan otras disposiciones. El contratista lleva los registros diarios de las cantidades de material retirado por día, y las volquetas que están laborando.

Se presentará a la interventoría un anexo con cada uno de los recibos de disposición final de los RCD generados en las etapas de excavación y demolición de la carrera 2 y calle 71 del barrio Crespo.

En la siguiente tabla se muestra los registros de los materiales de demolición que van a la escombrera Parque Loma de los Cocos;

**Tabla 5. Registro de Material de Demolición de Andenes y bordillos en la calle 71**

| OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Etapa Constructiva** | | **Demolición de ANDENES Proyectado** | | | | |
| **Fuente de Generación de RCD** | **Tipo de Pavimento** | **Longitud (m)** | **Ancho (m)** | **Área (m2)** | **Espesor Demolición (m)** | **Total Volumen Demolición (m3)** |
| Calle 71 | PR1 | 139,8 | 1,60 | 223,6 | 0,10 | 22,3 |
| **TOTAL, DEMOLICIÓN ANDENES CALLE 71** | | | | | | **22,3 M3** |
| **Etapa Constructiva** | **Demolición de Bordillo Realizado** | | | | | |
| Calle 71 | PR1 | 139,8 | 0,15 | 20,9 | 0,20 | 4,1 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL, DEMOLICION BORDILLOS CALLE 71** | **4,1 M3** |

**Tabla 6. Registro de Material de Demolición Placas y Bordillos de la Carrera 2**

| **OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Etapa Constructiva** | | **Demolición de Placas Realizada** | | | | |
| **Fuente de Generación de RCD** | **Tipo de Pavimento** | **Longitud lozas (m)** | **Ancho lozas(m)** | **Área (m2)** | **Espesor demolición (m)** | **Total, Volumen Excavación (m3)** |
| Carrera 2 | PR1 | 48 | 3,50 | 168 | 0,20 | 33,6 |
| **TOTAL, DEMOLICIÓN PLACA CARRERA 2** | | | | | | **33,6 M3** |
| **Etapa Constructiva** | | **Demolición de Bordillo Realizado** | | | | |
| Carrera 2 | PR1 | 48 | 0,15 | 7,2 | 0,20 | 1,4 |
| **TOTAL, DEMOLICIÓN BORDILLO CARRERA 2** | | | | | | **1,4 M3** |

### 3.5.2 Indicadores de seguimiento

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 01 de noviembre al 18 de noviembre de 2024 | 1) Cantidad de m3 de material de excavación-demolición proyectado/ Cantidad de m3 de material excavación-demolición con disposición final x 100<br>= (111,8 m3/111,8 m3) x 100<br>=100%<br><br>2) Numero de capacitación manejo de RCD realizada/Numero de capacitación manejo de RCD programada x 100.<br>1/1*100=100% |

### 3.5.3 Registro Fotográfico

**RESIDUOS DE EXCAVACIÓN**







**RESIDUOS DE DEMOLICIÓN**







**RELACIÓN DE RESIDUOS RCD CON CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO LOS COCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE PARCIAL DE 2024**

## REGISTRO E INVENTARIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD (RETIRO)

Se detalla el formato modelo de registro de cantidades de generación y disposición final de residuos de RCD en los frentes de obra carrera 2 y calle 71, correspondiente a los meses JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARCIAL de 2024, el cual obedece a los lineamientos establecidos en el manejo y gestión integral de residuos RCD en el marco de la Resolución 1257 de 2021.

### JUNIO

| Fecha y Hora | Naturaleza RCD | Tipo RCD | Metros Cúbicos de RCD generado (M3) | Transportador | Placa de Vehículo | Receptor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 - 14:42 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 20/06/2024 - 8:38 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 20/06/2024 - 9:12 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 20/06/2024 - 11:30 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 20/06/2024 - 11:36 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 20/06/2024 - 13:36 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 21/06/2024 - 8:17 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 22/06/2024 - 8:39 | PETREOS | PETREOS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 22/06/2024 - 8:41 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 22/06/2024 - 10:45 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 24/06/2024 -12:16 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 24/06/2024 - 12:19 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 25/06/2024 - 15:01 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 25/06/2024 - 15:02 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SOQ204 | CARIBE VERDE |
| 25/06/2024 - 15:06 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 26/06/2024 - 9:09 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 26/06/2024 - 13:06 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 26/06/2024 - 13:03 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 26/06/2024 - 9:06 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 28/06/2024 - 9:52 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| **TOTAL, RCD** | | | **340** | **JUNIO** | | |

### JULIO

| Fecha y Hora | Naturaleza RCD | Tipo RCD | Metros Cúbicos de RCD generado (M3) | Tipo Transportador | Placa de Vehículo | Receptor |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/07/2024 -16:53 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SOQ204 | CARIBE VERDE |
| 3/07/2024 - 10:21 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 3/07/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN 553 | CARIBE VERDE |
| 3/07/2024 - 11:17 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SOQ204 | CARIBE VERDE |
| 3/07/2024 - 16:59 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN 587 | CARIBE VERDE |
| 6/07/2024 - 9:45 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 8/07/2024 - 15:46 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 8/07/2024 - 11:23 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN587 | CARIBE VERDE |
| 8/07/2024 - 17:19 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN587 | CARIBE VERDE |
| 09/07/2024 -07:51 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 09/07/2024 -14:38 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 09/07/2024 - 13:26 | PETREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN587 | CARIBE VERDE |
| 11/07/2024 -09:43 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 22/07/2024 -07:18 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 22/07/2024 - 07:57 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 22/07/2024 - 09:43 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 22/07/2024 - 15:48 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 23/07/2024 - 14:18 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 23/07/2024 - 08:28 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 23/07/2024 - 12:52 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 23/07/2024 - 09:31 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 23/07/2024 - 07:04 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 23/07/2024 - 18:41 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 11:55 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 07:11 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 08:30 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 18:25 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 10:45 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 09:41 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 14:51 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 15:08 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 09:28 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | KCC423 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 15:14 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 07:52 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 07:04 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 09:25 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TAG014 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 11:47 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 16:58 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 08:04 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| | | | | | | |
| **TOTAL, RCD** | | | **431** | **JULIO** | | |

| AGOSTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha y Hora** | **Naturaleza RCD** | **Tipo RCD** | **Metros Cúbicos de RCD generado (M3)** | **Transportador** | **Placa de Vehículo** | **Receptor** |
| 21/08/2024 - 4:02 PM | PÉTREOS | ESCOMBROS | 14 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 21/08/2024 – 2:26 PM | PETREOS | ESCOBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 22/08/2024 – 8:16 AM | PETREOS | ESCOBROS | 12 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 23/08/2024 – 5:13 PM | PETREOS | ESCOBROS | 14 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 24/08/2024 – 5:20 PM | PETREOS | ESCOBROS | 13 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| **TOTAL, RCD** | | | **69** | **AGOSTO** | | |

| SEPTIEMBRE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha y Hora** | **Naturaleza RCD** | **Tipo RCD** | **Metros Cúbicos de RCD generado (M3)** | **Tipo Transportador** | **Placa de Vehículo** | **Receptor** |
| 02/09/2024 -3:26 PM | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 03/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 03/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 03/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 03/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 03/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | KCC423 | CARIBE VERDE |
| 03/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | KCC423 | CARIBE VERDE |
| 04/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | KCC423 | CARIBE VERDE |
| 09/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 10/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 10/09/2024 – 20:24 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 11/09/2024 – 8:26 AM | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 11/09/2024 – 14:18 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 11/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | KCC423 | CARIBE VERDE |
| 12/09/2024 – 8:30 AM | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 12/09/2024 11:14 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 12/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 12/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 13/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 13/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 13/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 14/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 12 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 14/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 16/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 16/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA057 | CARIBE VERDE |
| 16/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA854 | CARIBE VERDE |
| 17/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 20/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 20/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA854 | CARIBE VERDE |
| 20/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 20/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 20/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 20/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 21/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 24/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 24/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 24/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 25/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 25/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 25/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 25/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 25/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 27/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 27/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HIA644 | CARIBE VERDE |
| 27/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 27/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 28/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 28/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 30/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| **TOTAL, RCD** | | | **705** | **SEPTIEMBRE** | | |

## OCTUBRE

| Fecha y Hora | Naturaleza RCD | Tipo RCD | Metros Cúbicos de RCD generado (M3) | Tipo Transportador | Placa de Vehículo | Receptor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 01/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 01/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SSK878 | CARIBE VERDE |
| 01/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 02/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 02/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 03/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 04/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 04/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 04/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 04/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 04/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 07/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 07/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 07/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 07/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 09/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 10/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 10/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 17/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 17/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 17/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 19/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 19/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 19/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 22/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 22/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 22/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 23/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 23/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 24/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 24/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 24/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 25/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 25/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 26/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 28/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 28/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 28/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 28/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| **TOTAL** | | | **664** | **OCTUBRE** | | |
| | | | | | | |

| NOVIEMBRE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha y Hora** | **Naturaleza RCD** | **Tipo RCD** | **Metros Cúbicos de RCD generado (M3)** | **Tipo Transportador** | **Placa de Vehículo** | **Receptor** |
| 01/11/2024 8:58 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 01/11/2024 11:24 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 01/11/2024 13:40 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 01/11/2024 3:58 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 05/11/2024 16:58 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 05/11/2024 18:40 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 05/11/2024 20:29 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 06/11/2024 9:54 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 06/11/2024 12:38 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 06/11/2024 148:40 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 06/11/2024 17:01 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 06/11/2024 22:12 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| **TOTAL, RCD** | | | **221 M3** | **NOVIEMBRE** | | |

# PROGRAMAS FICHA 7: Educación Ambiental

### 3.6 PROGRAMA FICHA 7: Educación Ambiental

#### 3.6.1 Actividades implementadas

- **Capacitaciones:**

La base de una buena gestión ambiental es la educación ambiental, ya que facilita la planeación y ejecución del manejo ambiental y posibilita la disminución de los efectos negativos que puede generar el presente proyecto vial.

En el periodo correspondiente entre el 01 de noviembre y el 18 de noviembre de 2024, fue posible capacitar al personal en temas de;

- ✓ Manejo Integral de Residuos Sólidos
- ✓ Manejo de Productos Químicos (disolventes), Grasas y Aceites
- ✓ Manejo a la Generación de Ruido y Material Particulado
- ✓ Manejo a la Generación de Gases y Vapores
- ✓ Manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD
- ✓ Normatividad ambiental vigente a proyectos constructivos

#### 3.6.2 Indicadores de seguimiento

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 01 de noviembre de 2024 al 18 de noviembre 2024 | 1) Numero de capacitaciones ambientales dictadas /Numero de capacitación manejo programadas x 100.<br>6/6*100=100% |

#### 3.6.3 Registro Fotográfico

## REGISTRO FOTOGRAFICO NO. 8– EDUCACIÓN AMBIENTAL

**CAPACITACIONES AMBIENTALES**








# 5. CONCLUSIONES

El proyecto Obras de Rehabilitación De La Malla Vial Urbana Del Distrito De Cartagena De Indias D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4, en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre hasta el 18 de noviembre de 2024, ha cumplido a cabalidad la implementación de los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de RCD, para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los posibles impactos generados por las actividades constructivas (EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN y CONSTRUCCIÓN) del proyecto.

Para el cumplimiento del programa Manejo de Residuos Líquidos, el contratista ha instalado baños portátiles de propiedad de la empresa VEOLIA. La cual realizó 1 mantenimiento durante el corte 01-18 de noviembre de 2024.

La empresa OCCIDENTAL DEL COLOMBIA S.A.S ha elaborado un Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición RCD para ser sometido a evaluación, seguimiento y control por parte de la interventoría (GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S) del proyecto y de la Autoridad Ambiental Competente. Esto con el fin de que el Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, emita un PIN DE GENERADOR DE RCD. El EPA Cartagena envío a la empresa OCCIDENTAL COLOMBIA SAS un código de solicitud de PIN GENERADOR DE RCD correspondiente al número radicado EXT-AMC-24-0098876.

Los equipos, maquinarias y vehículos, utilizados para el cargue y transporte de materiales de construcción, movimientos, excavaciones, demoliciones cuentan con sus correspondientes certificados tecno mecánicos que demuestran su perfecto estado para su funcionamiento y operación.

Las volquetas utilizadas para el transporte y disposición final de RCD (excavación y demolición) generados en la obra específicamente en el frente de la carrera 2 y calle 71, cuentan con PIN TRANSPORTADOR DE RCD emitido por el EPA-Cartagena.

En el informe de junio de 2024, se proyecta la generación de 324,32 M3 de residuos de excavación y demolición. En la relación de certificaciones de Disposición Final de residuos de excavación y demolición para el mes de junio de 2024 es de 340 M3. Es decir, se certificó un adicional o excedente de 15. 68 M3 de RCD.

En el informe de julio de 2024, se proyecta la generación de 325.46 M3 de residuos de excavación y demolición. En la relación de certificaciones de Disposición Final de residuos de excavación y demolición para el mes de julio de 2024 es de 431 M3. Es decir, se certificó un adicional o excedente de 105, 54 M3 de RCD.

En el mes de agosto de 2024, se estima la generación de 24 M3 de RCD.

Generando una cantidad real certificada de RCD de 69 M3, ES DECIR, 45 m3 por encima de lo proyectado para el mes de agosto. De igual manera, se proyecta la generación de 626,7 M3 de residuos de RCD en el mes de septiembre, obteniendo una cantidad real dispuesta en el relleno de 663 M3, es decir, 36.6 M3 adicionales a los proyectados.

Así mismo, se estima la generación de 306 M3 para el mes de octubre de 2024. A la fecha no cuenta el proyecto con los certificados o recibos soportes de los RCD para el mes de octubre de 2024.

# 6. RECOMENDACIONES

La empresa OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS debe hacer seguimiento al código radicado de solicitud del PIN GENERADOR RCD N° EXT-AMC-24-0098876.

El contratista debe hacer seguimiento al Plan de Manejo de Trafico PMT radicado en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT, con el fin de contar con un documento de medidas de tráfico y movilidad para el uso y desplazamiento de vehículos dentro y fuera de la obra.

El proyecto debe instalar toda la señalización pertinente para indicar a la ciudadanía circundante o que se desplaza cerca de la obra que existen unos senderos peatonales para no dificultar su acceso a los bienes inmuebles. Así mismo, para indicar a los conductores de las actividades constructivas en los frentes de obras.

Se recomienda al contratista que, si existe la necesidad de trabajar en los frentes de obra en horarios extemporáneos a los definidos en el programa de manejo de ruido, se debe gestionar ante la alcaldía local 1 (Histórica y del Caribe Norte), los respectivos permisos, como lo estipula la ley ambiental vigente Resolución 0627 DE 2006.

2024

# Informe de Manejo Ambiental Corte 19-30 de noviembre de 2024, Obras de Rehabilitación De La Malla Vial Urbana Del Distrito De Cartagena De Indias D.T. Y C. –FASE IV. LOTE 4



OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-UAC-038-2023 - LOTE 4 del 25-08-2023 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 2024

04-12-2024

## CONTENIDO

**CONTENIDO** ..... **2**

**1. INTRODUCCIÓN** ..... **3**

**2. GENERALIDADES** ..... **3**

**3. LOCALIZACIÓN** ..... **5**

**4. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL** ..... **6**

**5. CONCLUSIONES** ..... **40**

**6. RECOMENDACIONES** ..... **41**

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento elaborado por la empresa OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. contiene el Informe de Manejo Ambiental, Rehabilitación De La Malla Vial Urbana Del Distrito De Cartagena De Indias D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4, correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **19 de noviembre al 30 de noviembre de 2024**. En el cual, el CONTRATISTA presenta seguimiento y cumplimiento a los programas ambientales establecidos en el capítulo 10, ítem 10.1 Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición RCD PMA- RCD del proyecto y los requerimientos contractuales atribuidos al CONTRATO DE OBRA No. LP- SID-UAC-038-2023 - LOTE 4 del 25-08-2023 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 2024, cuyo objeto es EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4.

Para el cumplimiento ambiental se realizan los informes mensuales con el objeto de contar con un registro de las actividades que se ejecutaron y los avances realizados, así como las dificultades e inconvenientes, que retrasaron el desarrollo de actividades orientadas a cumplir con los compromisos adquiridos. Sumado a esto se relacionan en los informes las medidas de manejo ambiental implementadas durante la ejecución de las actividades constructivas para el correspondiente periodo.

El proyecto asociado a las obras constructivas busca intervenir los tramos de vía del barrio Crespo del norte del distrito de Cartagena que actualmente presentan deterioro en su capa de rodadura y en algunos casos el colapso (parcial o total) de la estructura del pavimento, dificultando con ello la movilidad tanto vehicular como peatonal, lo cual, se agrava en época de lluvia, debido a que, algunos tramos tienen drenaje superficial deficiente, la capa de rodadura empeora y se vuelve aún más insegura para el tránsito de vehículos pesado y livianos, así como para transeúntes.

Los tramos de vías a intervenir en el objeto del presente contrato pertenecen a la malla vial de la ciudad; Crepo (Calle 70 entre carrera 1 y 9, Calle 70 entre carreras 8 y 9,
Carrera 8 entre calles 70 y 70A, Calle 71 entre carreras 1 y 3, Carrera 3 entre calles 70 y 73 y Carrera 2 entre calles 63 y 73).

## 2. GENERALIDADES

Se presentan a continuación, la descripción de los responsables y alcance de la ejecución de proyecto OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4, en el barrio Crespo del distrito de Cartagena;

| | |
|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE | ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |
| OBJET DEL PROYECTO | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 |
| CONTRATISTA | OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S |
| CONTRATO No. | LP-SID-UAC-038-2023 - LOTE 4 del 25-08-2023 |
| VALOR TOTAL | OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($ 8.541.666.630,00) |
| OBJETO DEL PROYECTO | "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL FASE IV – LOTE X" |
| INTERVENTORIA | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S |
| FECHCA DE INICIO | 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| FECHA DE SUSPENSION No.1 | 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| FECHA DE REINICIO | 17 DE JUNIO DE 2024 |
| PLAZO | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| NOBRE DOCUMENTO | INFORME DE MANEJO AMBIENTAL MENSUAL, REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. |

## 3. LOCALIZACIÓN

El proyecto asociado a las actividades de OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4'', se
encuentra localizado en el barrio Crespo en la zona norte del distrito de Cartagena en la localidad N° 1 Histórica y del Caribe Norte, en las coordenadas geográficas 10°26'48.20" N- 75°31'0 2.99"O.

**Figura 1. Localización calles a intervenir**




**Fuente: Google Earth. 2024. Fuente: Autores, 2024.**

# 4. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación, se presentan los programas con las medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos y significativos del proyecto, correspondientes al periodo **19 de noviembre al 30 de noviembre de 2024**, así como para potenciar los impactos ambientales positivos y dar cumplimiento a los requerimientos de la normatividad ambiental colombiana vigente.

Cada una de las fichas tiene una codificación que indica el tipo de programa al que pertenece la ficha Programa de Manejo Ambiental de RCD(PMA-RCD), el consecutivo que identifica el número del programa y Código: Tipo de programa - Proyecto, obra o actividad. Las fichas presentan de manera esquemática los acciones y/o medidas de manejo, los indicadores de cumplimiento y los respectivos registros fotográficos de cada programa.

# PROGRAMAS FICHA 1: Manejo Integral de Residuos Sólidos

### 3.1 PROGRAMA FICHA 1: Manejo Integral de Residuos Sólidos

#### 3.1.1 Actividades implementadas

Durante el periodo correspondiente al 19 de noviembre hasta el 30 de noviembre el Contratista informa que se realizó disposición final de 10 kilos de residuos sólidos ordinarios no aprovechables. Los cuales, se almacenan temporalmente en un contenedor plástico de propiedad de la empresa de Aseo PROMOAMBIENTAL S.A, que presta sus servicios de recolección y disposición final en el barrio Crespo Localidad N° 1 Histórica y del Caribe Norte.

Se lleva registro de las cantidades de residuos sólidos generados por el personal dentro de la obra, los cuales se describen como; botellas de agua plásticas, servilletas, icopor, restos vegetales (hojas) de árboles presentes en el frente de obra que son recogidos en las jornadas de limpieza.

En las 3 campañas de aseo y limpieza en frentes de obras, el personal usa sus elementos de protección y materiales de recolección de residuos donde se depositan los restos vegetales como hojas que caen de la cobertura vegetal presentes en las diferentes aceras de las vías intervenidas.

Así mismo, se realizó una capacitación el día 29 de noviembre de 2024, sobre manejo adecuado de residuos sólidos.

**Tabla 1. Registro de residuos sólidos generados en el frente de obra carrera 2, calle 71 y carrera 3.**

| **REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA OBRA** | |
|---|---|
| SEMANA 1 | SEMANA 2 |
| 4 KILOS | 6 KILOS |
| **TOTAL** | **10 KILOS** |

#### 3.1.2 Indicadores de seguimiento

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 19 de noviembre de 2024 a 30 de noviembre de 2024 | (Cantidad de residuos generados mes/ cantidad de residuos dispuestos correctamente mes) x 100<br><br>10Kg/10Kg*100=100%<br><br>(N° de jornadas de aseo proyectadas mes/ N° de jornadas de aseo realizadas mes) x 100<br><br>3/3* 100=100% |

# PROGRAMAS FICHA 2: Manejo de Productos Químicos (disolventes), Grasas y Aceites

## 3.2 PROGRAMA FICHA 2: Manejo de Productos Químicos (disolventes), Residuos Líquidos, Grasas y Aceites

### 3.2.1 Actividades implementadas

- **Residuos líquidos:**

Durante el periodo correspondiente al 19 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2024, la empresa OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S informa que la obra cuenta con el uso de dos (2) baños portátiles para la disposición de residuos líquidos generados por el personal de trabajo.

Los baños para el manejo de los residuos líquidos se encuentran ubicados entre la carrea 2 y la calle 71 del barrio Crespo donde se vienen desarrollando actividades constructivas de excavaciones, demoliciones y pavimentación de la vía, andenes y bordillos.

El servicio de instalación de baños sanitarios, mantenimiento y disposición final de los residuos líquidos generados por el personal de la obra en los baños portátiles son prestados por la empresa VEOLIA. Para el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y del Plan de Manejo Ambiental de la Obra se contrataron los siguientes servicios;

Cartagena, JUNIO-25-2024

**CTZ-SSP-1203**

Sres.

**GINSA CONSTRUCCIONES**
**Valentina Gaviria**

**Asunto:** Propuesta comercial

Cordial saludo

Nos complace hacer parte de su compromiso con la transformación ecológica, agradecemos que nos tenga en cuenta para la adecuada gestión de su ciclo del agua, para esto nos permitimos presentarle la propuesta técnico-económica para la prestación del servicio público de aseo en las actividades complementarias de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales generadas en Unidades Sanitarias Portátiles - en adelante las USP- y/o almacenamiento ubicadas en CRESPO.

| PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Concepto** | **Cantidad USP** | **N° Servicios** | **Valor unitario** | **Total** |
| 1 | Frecuencias de aseo al mes | 1 | 8 | $49.050 | $392.400 |
| 2 | Base gravada alquiler cabina | | | $5.000 | $40.000 |
| 3 | IVA (19%) base $5.000 | | | | $7.600 |
| | | | | **TOTAL** | $440.000 |

La empresa VEOLIA ha realizado una (1) jornada de mantenimiento de dos (2) baños portátiles para retirar y disponer correctamente los residuos líquidos generados en la etapa constructiva en el periodo correspondiente al corte 19 al 30 de noviembre de 2024.

Como resultado de los mantenimientos en los baños portátiles la empresa VEOLIA retiro he hizo disposición fenal de **1 M3** de residuos líquidos. La empresa OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS se encuentra a la espera de la entrega de la certificación y disposición de las aguas residuales.

A continuación, se detallan los baños portátiles utilizados en el frente de obra para el uso exclusivo del personal que trabaja en las actividades constructivas del proyecto OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4;

Ver registro;








**Imagen: Baño Portátil para la disposición de residuos líquidos.**

- **Productos Químicos:**

El programa de manejo para productos químicos usados en la obra requiere de la adopción de prácticas adecuadas de manejo de disolventes químicos en las áreas de trabajo.

Actualmente la obra en la construcción de la vía pavimentada del frente carrera 2, calle 71 y carrera 3, ha utilizado medio tanque de 20 litros de producto químico denominado Antisol Rojo, el cual es una solución de parafina en solventes orgánicos, que forma al aplicarse sobre concreto o mortero fresco, una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material.

A la fecha del periodo comprendido entre el 19 de noviembre y 30 de noviembre de 2024, no se ha presentado ningún tipo de derrame del producto indicado. En el escenario que se presente una eventualidad de derrame el equipo ambiental encargado implementará el uso de elementos de limpieza y remoción de áreas contaminadas mediante la utilización de arena o tierra.

- **Grasas y Aceites:**

La obra para el periodo comprendido entre el 19 de noviembre y 30 de noviembre de 2024, no ha generado aceites de combustión. Los vehículos y equipos que requieren cambio de aceites y mantenimientos, los realizan en centros y talleres especializados. Razón por la cual, en el frente de obra la carrera 2, calle 71 y carrera 3, no se generan este tipo de residuos. No obstante, la obra para hidratar las plataformas metálicas que sirven de estructura para fundir los andenes hace uso de aceite quemado. Este se aplica con una brocha sobre la estructura para que no se adhiera al momento de desinstalarla una vez fragua o toma consistencia el concreto.

De acuerdo a las recomendaciones dadas por el señor GUSTAVO AMOR GELIZ en Calidad de interventor ambiental se viene cumpliendo con el manejo adecuado de este insumo de vital importancia para fundir las vías indicadas. Por lo que se hace uso de material plástico para proteger el tanque que contiene aceite quemado, para prevenir o evitar cualquier eventualidad o derrame al suelo.

En cuanto a las grasas se puede indicar que al periodo de manejo ambiental entre el 19 de noviembre y el 30 de noviembre de 2024, la obra ha utilizado un (2) tanque de grasas para aplicar en las mallas y estructuras de hierro que se instalan en las placas antes de fundir. Estos residuos de recipientes impregnados con grasas poseen un peso de 2 Kilogramos en 17 días.

**Tabla 2. Registro de Manejo de Productos Químicos (disolventes), Residuos Líquidos, Grasas y Aceites en el frente de obra Carrera 2, Carrera 3 y calle 71.**

| **REGISTRO DE RESIDUOS DE PRODUCTOS QUIMICOS, SÓLIDOS, GRASAS Y ACEITES** | |
|---|---|
| **ACEITES** | |
| **NOVIEMBRE** | |
| 0 M3 | 0 M3 |
| TOTAL | 0 M3 |
| **PRODUCTOS QUÍMICOS** | |
| **NOVIEMBRE** | |
| TOTAL 1 UNIDAD DE TANQUE: 12 Kg (el tanque está en uso) | |
| **GRASAS** | |
| **SEMANA 1** | **SEMANA 2** |
| 1 UNIDAD DE TANQUE de 1 Kg | 1 UNIDAD DE TANQUE de 1 Kg |
| TOTAL | 2 KILOGRAMO o 2 UNIDAD |

Para el presente periodo fue posible realizar el día 29 de noviembre de 2024, una capacitación al personal sobre lo referente a buenas prácticas operacionales para el manejo de disolventes químicos, combustibles, aceites, grasas y residuos líquidos, indicando la importancia de la implementación de las mismas. También se sensibilizó en lo correspondiente a las medidas para el control rápido y eficiente de situaciones de emergencia.

### 3.2.2 Indicadores de seguimiento

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 19 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 | 1) Cantidad de residuos líquidos generados semanalmente en baños portátiles/ cantidad de residuos líquidos generados mensualmente) x 100.<br>0 m3/0 m3*100=0%<br>2) Cantidad de residuos de productos químicos generados mes / cantidad de residuos de productos químicos dispuestos correctamente mes) x 100.<br>1 UNIDAD/1 UNIDAD*100=100% el recipiente está en uso sin disposición final<br>3) Cantidad de residuos de grasas generados mes / cantidad de residuos de grasas dispuestos correctamente mes) x 100.<br>2 Kg /2 Kg*100=100% |

### 3.2.3 Registro Fotográfico

| REGISTRO FOTOGRAFICO NO. 3 - DE RESIDUOS DE PRODUCTOS QUIMICOS, SÓLIDOS, GRASAS Y ACEITES | |
|---|---|
|  |  |

# PROGRAMAS FICHA 3 Y 4: Manejo a la Generación de Ruido y Material Particulado

### 3.3 PROGRAMA FICHA 3 y 4: Manejo Generación de Ruido y Material Particulado

#### 3.3.1 Actividades implementadas

Las maquinarias que operaron en la ejecución del proyecto realizaron las actividades en los horarios adecuados con el fin de no generar ruido que perturbe la tranquilidad del sector, el horario de actividad está distribuido entre las 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y de 7: 00 a.m. a 12:00 pm los días sábados. Durante este corte no se realizaron actividades en horarios restringidos. Las volquetas utilizadas en el transporte de los materiales fueron cubiertas completamente con el fin de evitar el derrame de materiales.

El material acumulado, arena y agregados, se mantuvo tapado temporalmente con una lona de plástico y humedecidos para evitar el arrastre con el viento. Es importante resaltar que, gracias al buen ritmo de avance de obras, los materiales de construcción de relleno y adecuación de terreno como zahorra y triturado permanecen muy poco tapados ya que se utilizan y se extienden de manera inmediata una vez llegan a la obra.

En el periodo comprendido entre el 19 de noviembre al 30 de noviembre de 2024, la obra ha realizado cerramiento con polisombra verde a los tramos intervenidos, con el fin, de disminuir el material particulado proveniente de las actividades de la obra. El personal de la obra ha sido capacitado el día 29 de noviembre de 2024, sobre el manejo de la generación de ruido y emisión de material particulado.

#### 3.3.2 Indicadores de seguimiento

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 19 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024 | 1) Cumplimiento de horario de trabajo semanal: 100% de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y de 7: 00 a.m. a 12:00 pm los días sábados<br>2) Metros lineales de cerramiento de obra con polisombra: 100%<br>200 m/200 m*100=100%<br>3) Numero de capacitación manejo generación de ruido y material particulado realizada/Numero de capacitación manejo generación de ruido y material particulado programada x 100.<br>1/1*100=100% |

### 3.3.3 Registro Fotográfico

**REGISTRO FOTOGRAFICO NO. 4 y 5 – MANEJO DE GENERACIÓN DE RUIDO Y MATERIAL PARTICULADO**

**USO DE MAQUINARIA EN HORARIO PERMITIDO**






**CERRAMIENTO CON POLISOMBRA EN FRENTES DE OBRA**













kokoriko
20 nov 2024 10:39:23 a. m.
10°26'40.153"N 75°31'2.43"W ±2.50m
176° S
Número de índice: 375


20 nov 2024 10:38:49 a. m.
10°26'40.165"N 75°31'2.889"W ±2.00m
123° SE
Número de índice: 372

**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TRANSPORTADO Y CUBIERTOS EN VEHICULOS DE CARGA**





# PROGRAMAS FICHA 5: Manejo a la Generación de Gases y Vapores

### 3.4 PROGRAMA FICHA 5: Manejo Generación de Gases y Vapores

#### 3.4.1 Actividades implementadas

El presente programa busca mitigar la alteración de la calidad del aire con la generación de gases y vapores emitidos por cada uno de los vehículos, equipos y maquinarias que hacen parte del proyecto para el desarrollo de sus actividades constructivas.

La emisión de gases y vapores en el proyecto LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV.
LOTE 4, se realiza básicamente por movilización de maquinarias, equipos y materiales de construcción dentro del frente de obra.

La obra cuenta con un registro de la maquinaria que se utilizó en la obra en el periodo correspondiente entre el 19 de noviembre al 30 de noviembre de 2024, con la respectiva documentación necesaria para laborar y la cual es exigida por las autoridades de tránsito en el perímetro donde se van a desarrollar las actividades.

Ver listado de equipos y maquinarias de la obra:

| **MAQUINA** | MARCA |
|---|---|
| **EXCAVADORA INTERMEDIA** | FR60E2-H - LOVOL |
| **MOTONIVELADORA** | VOLVO DD29 |
| **MINICARGADOR** | BOBCAT3530 |
| **MINICARGADOR** | 23603 CAT |
| **RETROEXCAVADORA** | CATERPILLA R 416F |

Listado de vehículos (volquetas);

| **Vehículos-volquetas utilizadas en la obra** | |
|---|---|
| | TAG O14 |
| | HLA 644 |
| | CSA 857 |

| | |
|---|---|
| Volquetas | SMV 307 |
| | SOQ 204 |
| | SZN 553 |
| | SZN 562 |
| | SZN 587 |
| | SZP 043 |
| | THY 011 |

En la obra esta estrictamente prohibido las quemas de todo tipo de materiales (basura, residuos, material vegetal, entre otros).

Fue posible verificar en el periodo indicado que todos los vehículos vinculados a la obra dispongan del certificado de emisiones de gases vigente. Así mismo, se constató que las maquinarias y equipos que no se encontraban prestando servicios constructivos en los frentes de obra permanecieran apagados, con el fin de ahorrar combustible y evitar la descarga de emisiones a la atmósfera.

El mantenimiento de los vehículos fuera de la obra deberá considerar la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de llantas, así como el reemplazo de partes y aditivos, en caso de ser necesario.

Se promovió métodos de control de velocidad consistentes en señalización, instrucciones y campañas educativas para las personas vinculadas, así como la reglamentación de la velocidad. Los equipos y maquinarias realizan sus chequeos y mantenimientos preventivos en talleres especializados antes de ejecutar sus actividades en la obra. Con estas acciones se busca garantizar la sincronización y carburación de los motores.

### 3.4.2 Registro Fotográfico

## REGISTRO FOTOGRAFICO NO. 6– MANEJO DE GENERACIÓN DE GASES Y VAPORES

**EQUIPOS Y MAQUINARIA**









236D3
CAT


236D3
CAT

# PROGRAMAS FICHA 6: Manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD

### 3.5 PROGRAMA FICHA 6: Manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD

#### 3.5.1 Actividades implementadas

- **Residuos de Excavación:**

Durante el corte de este informe el contratista señalizó el frente de obra de la carrera 2, calle 71 y carrera 3, que se está ejecutando, utilizando señales preventivas, cintas de seguridad y polisombra verde. Se acondicionó el almacenamiento temporal de los materiales de excavación, utilizando plástico resistente. Los materiales que se utilizaron para bases y sub- bases se obtuvieron de la cantera Colón. Las volquetas salen de la obra carpadas y no sobre pasando su volumen de diseño.

Las excavaciones se realizan en jornada diurna generando una cantidad total de **571,1 m3** de residuos de sobrantes de excavación. Estos residuos de excavación son provenientes de la intervención de las losas de pavimento intervenidas en la carrera 2 del barrio Crespo.

En la siguiente tabla se muestra los registros de los materiales de excavación que van a la escombrera Parque Loma de los Cocos.

Ver registro de Residuos Pétreos de la excavación de la carrera 2;

**Tabla 3. Registro de Material de Excavación ANDEN de la Carrera 2.**

| OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Etapa Constructiva** | | **Excavación en andenes** | | | | |
| **Fuente de Generación de RCD** | **Tipo de Pavimento** | **Longitud** | **Ancho (m)** | **Área (m2)** | **Espesor excavación (m)** | **Total Volumen Excavación (m3)** |
| Carrera 2 | PR1 | 96 | 3 | 288 | 0,20 | 57,6 |
| **TOTAL, EXCAVACIÓN ANDEN CARRERA 2** | | | | | | **57,6 M3** |

**Tabla 4. Registro de Material de Excavación PLACA carrera 3.**

| OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Etapa Constructiva** | | **Excavación en andenes** | | | | |
| **Fuente de Generación de RCD** | **Tipo de Pavimento** | **Longitud** | **Ancho (m)** | **Área (m2)** | **Espesor excavación (m)** | **Total Volumen Excavación (m3)** |
| Carrera 3 | PR1 | 200 | 7,30 | 1440 | 0,30 | 432 |
| **TOTAL, EXCAVACIÓN PLACA CARRERA 3** | | | | | | **432 M3** |

**Tabla 5. Registro de Material de Excavación ANDEN LADEO DERECHO E IZQUIERDO calle 71.**

| OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Etapa Constructiva** | | **Excavación en andenes** | | | | |
| **Fuente de Generación de RCD** | **Tipo de Pavimento** | **Longitud** | **Ancho (m)** | **Área (m2)** | **Espesor excavación (m)** | **Total Volumen Excavación (m3)** |
| Calle 71 | PR1 | 105 | 1,5 | 157,5 | 0,20 | 31,5 |
| Calle 71 | PR1 | 50 | 1,5 | 75 | 0,20 | 15 |
| **TOTAL, EXCAVACIÓN ANDEN CALLE 71.** | | | | | | **46,5 M3** |

**Tabla 6. Registro de Material de Excavación PLACA Calle 71.**

| OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Etapa Constructiva** | | **Excavación en andenes** | | | | |
| **Fuente de Generación de RCD** | **Tipo de Pavimento** | **Longitud** | **Ancho (m)** | **Área (m2)** | **Espesor excavación (m)** | **Total Volumen Excavación (m3)** |
| Calle 71 | PR1 | 50 | 3,50 | 175 | 0,20 | 35 |
| **TOTAL, EXCAVACIÓN CALLE 71.** | | | | | | **35 M3** |

- **Residuos de Demolición:**

Durante el periodo de 19 de noviembre hasta 30 de noviembre de 2024, el Contratista informa que se realizaron retiros de **23,25 m3** de residuos de demolición de ANDENES LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO Y BORDILLO en la calle 71, **6,2 m3** de demolición de BORDILLOS en la calle 71, **28,8 m3** Demolición de ANDENES LADO IZQUIERDO en la carrera 2, **282 m3** de DEMOLICIÓN PLACA CARRERA 2, **28,5** DEMOLICIÓN BORDILLO CARRERA 3, del barrio Crespo, **34 m3** DEMOLICIÓN PLACA CALLE 71 y **7,1 m3** DEMOLICION BORDILLO CALLE 71, para un total de **409,8 m3** de residuos de RCD de ANDENES, PLACA y BORDILLOS, el cual se dispuso en Parque Loma de los Cocos, lugar donde funciona el Relleno Sanitario y la Escombrera Distrital de Cartagena de indias. La disposición final de estos residuos pétreos se realizó sin ninguna novedad, los vehículos pudieron llegar sin contratiempos al relleno sanitario.

Las volquetas cuentan con identificación en las puertas laterales, también las volquetas tienen el Pin transportador requerimiento establecidos en la resolución 130 de 2015, por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos ambientales para el manejo, aprovechamiento, transporte y disposición final de los residuos de construcción y demolición, y se dictan otras disposiciones. El contratista lleva los registros diarios de las cantidades de material retirado por día, y las volquetas que están laborando.

Se presentará a la interventoría un anexo con cada uno de los recibos de

disposición final de los RCD generados en las etapas de excavación y demolición de la carrera 2 y calle 71 del barrio Crespo.

En la siguiente tabla se muestra los registros de los materiales de demolición que van a la escombrera Parque Loma de los Cocos;

**Tabla 7. Registro de Material de Demolición de ANDENES LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO Y BORDILLO en la calle 71**

| OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Etapa Constructiva** | | **Demolición de ANDENES Proyectado** | | | | |
| **Fuente de Generación de RCD** | **Tipo de Pavimento** | **Longitud (m)** | **Ancho (m)** | **Área (m2)** | **Espesor Demolición (m)** | **Total Volumen Demolición (m3)** |
| Calle 71 | PR1 | 105 | 1,5 | 157 | 0,10 | 15,75 |
| Calle 71 | PR1 | 50 | 1.5 | 75 | 0,10 | 7,5 |
| **TOTAL, DEMOLICION ANDENES CALLE 71** | | | | | | **23,25 M3** |
| **Etapa Constructiva** | **Demolición de Bordillo Realizado** | | | | | |
| Calle 71 | PR1 | 50 | 0,25 | 12,5 | 0,50 | 6,2 |
| **TOTAL, DEMOLICION BORDILLOS CALLE 71** | | | | | | **6,2 M3** |

**Tabla 8. Registro de Material de Demolición de ANDENES LADO IZQUIERDO en la carrera 2.**

| OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Etapa Constructiva** | | **Demolición de ANDENES Proyectado** | | | | |
| **Fuente de Generación de RCD** | **Tipo de Pavimento** | **Longitud (m)** | **Ancho (m)** | **Área (m2)** | **Espesor Demolición (m)** | **Total Volumen Demolición (m3)** |
| Carrera 2 | PR1 | 96 | 3 | 288 | 0,10 | 28,8 |
| **TOTAL, DEMOLICION ANDENES CARRERA 2** | | | | | | **28,8 M3** |

**Tabla 9. Registro de Material de Demolición PLACAS Y BORDILLOS de la Carrera 3**

| OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Etapa Constructiva** | | **Demolición de Placas Realizada** | | | | |
| **Fuente de Generación de RCD** | **Tipo de Pavimento** | **Longitud lozas (m)** | **Ancho lozas(m)** | **Área (m2)** | **Espesor demolición (m)** | **Total, Volumen Excavación (m3)** |
| Carrera 3 | PR1 | 200 | 7,05 | 1410 | 0,20 | 282 |
| **TOTAL, DEMOLICIÓN PLACA CARRERA 2** | | | | | | **282 M3** |
| | | **Demolición de Bordillo Realizado** | | | | |

| Etapa Constructiva | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3 | PR1 | 200 | 0,25 | 50 | 0,57 | 28,5 |
| **TOTAL, DEMOLICIÓN BORDILLO CARRERA 3** | | | | | | **28,5 M3** |

**Tabla10. Registro de Material de Demolición PLACAS Y BORDILLOS de la Calle 71**

| OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Etapa Constructiva** | | **Demolición de Placas Realizada** | | | | |
| **Fuente de Generación de RCD** | **Tipo de Pavimento** | **Longitud lozas (m)** | **Ancho lozas(m)** | **Área (m2)** | **Espesor demolición (m)** | **Total, Volumen Excavación (m3)** |
| Calle 71 | PR1 | 50 | 3,4 | 170 | 0,20 | 34 |
| **TOTAL, DEMOLICIÓN PLACA CALLE 71** | | | | | | **34 M3** |
| **Etapa Constructiva** | | **Demolición de Bordillo Realizado** | | | | |
| Calle 71 | PR1 | 50 | 0,25 | 12,5 | 0,57 | 7,1 |
| **TOTAL, DEMOLICION BORDILLO CALLE 71** | | | | | | **7,1** |

### 3.5.2 Indicadores de seguimiento

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 19 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 | 1) Cantidad de m3 de material de excavación-demolición proyectado/ Cantidad de m3 de material excavación-demolición con disposición final x 100<br>= (980,9 m3/980,9 m3) x 100<br>=100%<br><br>2) Numero de capacitación manejo de RCD realizada/Numero de capacitación manejo de RCD programada x 100.<br>1/1*100=100% |

### 3.5.3 Registro Fotográfico

**RESIDUOS DE EXCAVACIÓN**







HOTEL
Auchi







**RESIDUOS DE DEMOLICIÓN**









**RELACIÓN DE RESIDUOS RCD CON CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO LOS COCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE DE 2024**

## REGISTRO E INVENTARIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD (RETIRO)

Se detalla el formato modelo de registro de cantidades de generación y disposición final de residuos de RCD en los frentes de obra carrera 2, calle 71 y carrera 3 del barrio Crespo, correspondiente a los meses JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE de 2024, el cual obedece a los lineamientos establecidos en el manejo y gestión integral de residuos RCD en el marco de la Resolución 1257 de 2021.

### JUNIO

| Fecha y Hora | Naturaleza RCD | Tipo RCD | Metros Cúbicos de RCD generado (M3) | Transportador | Placa de Vehículo | Receptor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 - 14:42 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 20/06/2024 - 8:38 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 20/06/2024 - 9:12 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 20/06/2024 - 11:30 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 20/06/2024 - 11:36 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 20/06/2024 - 13:36 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 21/06/2024 - 8:17 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 22/06/2024 - 8:39 | PETREOS | PETREOS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 22/06/2024 - 8:41 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 22/06/2024 - 10:45 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 24/06/2024 -12:16 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 24/06/2024 - 12:19 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 25/06/2024 - 15:01 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 25/06/2024 - 15:02 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SOQ204 | CARIBE VERDE |
| 25/06/2024 - 15:06 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 26/06/2024 - 9:09 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 26/06/2024 - 13:06 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 - 13:03 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 26/06/2024 - 9:06 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 28/06/2024 - 9:52 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| **TOTAL, RCD** | | | **340** | **JUNIO** | | |
| **JULIO** | | | | | | |
| **Fecha y Hora** | **Naturaleza RCD** | **Tipo RCD** | **Metros Cúbicos de RCD generado (M3)** | **Tipo Transportador** | **Placa de Vehículo** | **Receptor** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/07/2024 -16:53 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SOQ204 | CARIBE VERDE |
| 3/07/2024 - 10:21 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 3/07/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN553 | CARIBE VERDE |
| 3/07/2024 - 11:17 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SOQ204 | CARIBE VERDE |
| 3/07/2024 - 16:59 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN587 | CARIBE VERDE |
| 6/07/2024 - 9:45 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 8/07/2024 - 15:46 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZP043 | CARIBE VERDE |
| 8/07/2024 - 11:23 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN587 | CARIBE VERDE |
| 8/07/2024 - 17:19 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN587 | CARIBE VERDE |
| 09/07/2024 -07:51 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 09/07/2024 -14:38 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 09/07/2024 - 13:26 | PETREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SZN587 | CARIBE VERDE |
| 11/07/2024 -09:43 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 22/07/2024 -07:18 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 22/07/2024 - 07:57 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 22/07/2024 - 09:43 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 22/07/2024 - 15:48 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 23/07/2024 - 14:18 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 23/07/2024 - 08:28 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 23/07/2024 - 12:52 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 23/07/2024 - 09:31 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 23/07/2024 - 07:04 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 23/07/2024 - 18:41 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 11:55 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 07:11 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 08:30 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 18:25 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 - 10:45 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 09:41 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 14:51 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 24/07/2024 - 15:08 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 09:28 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | KCC423 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 15:14 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 07:52 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 07:04 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 09:25 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TAG014 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 11:47 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 16:58 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 25/07/2024 - 08:04 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| | | | | | | |
| **TOTAL, RCD** | | | **431** | **JULIO** | | |

| AGOSTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha y Hora** | **Naturaleza RCD** | **Tipo RCD** | **Metros Cúbicos de RCD generado (M3)** | **Transportador** | **Placa de Vehículo** | **Receptor** |
| 21/08/2024 - 4:02 PM | PÉTREOS | ESCOMBROS | 14 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 21/08/2024 – 2:26 PM | PETREOS | ESCOBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 22/08/2024 – 8:16 AM | PETREOS | ESCOBROS | 12 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 23/08/2024 – 5:13 PM | PETREOS | ESCOBROS | 14 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 24/08/2024 – 5:20 PM | PETREOS | ESCOBROS | 13 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| **TOTAL, RCD** | | | **69** | **AGOSTO** | | |
| **SEPTIEMBRE** | | | | | | |
| **Fecha y Hora** | **Naturaleza RCD** | **Tipo RCD** | **Metros Cúbicos de RCD generado (M3)** | **Tipo Transportador** | **Placa de Vehículo** | **Receptor** |
| 02/09/2024 -3:26 PM | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 03/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 03/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 03/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 03/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 03/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | KCC423 | CARIBE VERDE |
| 03/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | KCC423 | CARIBE VERDE |
| 04/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | KCC423 | CARIBE VERDE |
| 09/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 10/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 10/09/2024 – 20:24 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 11/09/2024 – 8:26 AM | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 11/09/2024 – 14:18 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 11/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 9 | VOLQUETA | KCC423 | CARIBE VERDE |
| 12/09/2024 – 8:30 AM | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 12/09/2024 11:14 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 12/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 12/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 13/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 13/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 14/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 12 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 14/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 16/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 16/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA057 | CARIBE VERDE |
| 16/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA854 | CARIBE VERDE |
| 17/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 17/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 20/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 20/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA854 | CARIBE VERDE |
| 20/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 20/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 20/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 20/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 21/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 24/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 24/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 24/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 25/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 25/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 25/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 25/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 25/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 26/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 27/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 27/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HIA644 | CARIBE VERDE |
| 27/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 27/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 28/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 28/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 30/09/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| **TOTAL, RCD** | | | **705** | **SEPTIEMBRE** | | |
| **OCTUBRE** | | | | | | |
| **Fecha y Hora** | **Naturaleza RCD** | **Tipo RCD** | **Metros Cúbicos de RCD generado (M3)** | **Tipo Transportador** | **Placa de Vehículo** | **Receptor** |

| 01/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 01/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SSK878 | CARIBE VERDE |
| 01/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 02/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 02/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 03/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 03/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 04/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 04/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 04/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 04/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 04/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 07/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 07/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 07/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 07/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 09/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 10/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 10/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 17/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 17/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SKK878 | CARIBE VERDE |
| 17/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | TTG687 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 18/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 19/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 19/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 19/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| 22/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 22/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 22/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | HLA644 | CARIBE VERDE |
| 23/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 23/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 24/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 24/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 24/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 25/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 25/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 26/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 28/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 28/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 16 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 28/10/2024 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 8 | VOLQUETA | CSA857 | CARIBE VERDE |
| **TOTAL** | | | **664** | **OCTUBRE** | | |
| | | | | | | |
| **NOVIEMBRE** | | | | | | |
| **Fecha y Hora** | **Naturaleza RCD** | **Tipo RCD** | **Metros Cúbicos de RCD generado (M3)** | **Tipo Transportador** | **Placa de Vehículo** | **Receptor** |
| 01/11/2024 8:58 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 01/11/2024 11:24 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 01/11/2024 13:40 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 01/11/2024 3:58 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 05/11/2024 16:58 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 05/11/2024 18:40 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 05/11/2024 20:29 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 06/11/2024 9:54 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 06/11/2024 12:38 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 06/11/2024 148:40 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 06/11/2024 17:01 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 06/11/2024 22:12 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 12/11/2024 22:10 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 15/11/2024 11:08 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 15/11/2024 16:50 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 15/11/2024 19:05 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 16/11/2024 16:21 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 16/11/2024 20:58 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 18/11/2024 17:07 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 18/11/2024 17:07 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 16:19 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 19/11/2024 18:01 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 19/11/2024 20:23 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 20/11/2024 14:41 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 20/11/2024 17:11 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 20/11/2024 10:45 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 21/11/2024 08:28 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 21/11/2024 18:48 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 22/11/2024 15:59 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 26/11/2024 09:32 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 26/11/2024 07:13 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 26/11/2024 15:53 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 26/11/2024 17:58 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 27/11/2024 09:45 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 27/11/2024 20:20 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 27/11/2024 16:55 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| 27/11/2024 13:18 | PÉTREOS | ESCOMBROS | 17 | VOLQUETA | SVM307 | CARIBE VERDE |
| | | | | | | |
| **TOTAL, RCD** | | | **646 M3** | **NOVIEMBRE** | | |

# PROGRAMAS FICHA 7: Educación Ambiental

### 3.6 PROGRAMA FICHA 7: Educación Ambiental

#### 3.6.1 Actividades implementadas

- **Capacitaciones:**

La base de una buena gestión ambiental es la educación ambiental, ya que facilita la planeación y ejecución del manejo ambiental y posibilita la disminución de los efectos negativos que puede generar el presente proyecto vial.

En el periodo correspondiente entre el 19 de noviembre y el 30 de noviembre de 2024, fue posible capacitar al personal en temas de;

- ✓ Manejo Integral de Residuos Sólidos
- ✓ Manejo de Productos Químicos (disolventes), Grasas y Aceites
- ✓ Manejo a la Generación de Ruido y Material Particulado
- ✓ Manejo a la Generación de Gases y Vapores
- ✓ Manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD
- ✓ Normatividad ambiental vigente a proyectos constructivos

#### 3.6.2 Indicadores de seguimiento

| PERIODO | INDICADOR |
|---|---|
| 19 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre 2024 | 1) Numero de capacitaciones ambientales dictadas /Numero de capacitación manejo programadas x 100.<br>6/6*100=100% |

#### 3.6.3 Registro Fotográfico

**REGISTRO FOTOGRAFICO NO. 8– EDUCACIÓN AMBIENTAL**

**CAPACITACIONES AMBIENTALES y SST**





# 5. CONCLUSIONES

El proyecto Obras de Rehabilitación De La Malla Vial Urbana Del Distrito De Cartagena De Indias D.T. Y C. – FASE IV. LOTE 4, en el periodo comprendido entre el 19 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2024, ha cumplido a cabalidad la implementación de los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de RCD, para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los posibles impactos generados por las actividades constructivas (EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN y CONSTRUCCIÓN) del proyecto.

Para el cumplimiento del programa Manejo de Residuos Líquidos, el contratista ha instalado baños portátiles de propiedad de la empresa VEOLIA. La cual realizó 1 mantenimiento durante el corte 19-30 de noviembre de 2024.

La empresa OCCIDENTAL DEL COLOMBIA S.A.S ha elaborado un Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición RCD para ser sometido a evaluación, seguimiento y control por parte de la interventoría (GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S) del proyecto y de la Autoridad Ambiental Competente. Esto con el fin de que el Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, emita un PIN DE GENERADOR DE RCD. El EPA Cartagena envío a la empresa OCCIDENTAL COLOMBIA SAS un código de solicitud de PIN GENERADOR DE RCD correspondiente al número radicado EXT-AMC-24-0098876.

Los equipos, maquinarias y vehículos, utilizados para el cargue y transporte de materiales de construcción, movimientos, excavaciones, demoliciones cuentan con sus correspondientes certificados tecno mecánicos que demuestran su perfecto estado para su funcionamiento y operación.

Las volquetas utilizadas para el transporte y disposición final de RCD (excavación y demolición) generados en la obra específicamente en el frente de la carrera 2, calle 71 Y carrera 3, cuentan con PIN TRANSPORTADOR DE RCD emitido por el EPA-Cartagena.

En el informe de junio de 2024, se proyecta la generación de 324,32 M3 de residuos de excavación y demolición. En la relación de certificaciones de Disposición Final de residuos de excavación y demolición para el mes de junio de 2024 es de 340 M3. Es decir, se certificó un adicional o excedente de 15. 68 M3 de RCD.

En el informe de julio de 2024, se proyecta la generación de 325.46 M3 de residuos de excavación y demolición. En la relación de certificaciones de Disposición Final de residuos de excavación y demolición para el mes de julio de 2024 es de 431 M3. Es decir, se certificó un adicional o excedente de 105, 54 M3 de RCD.

En el mes de agosto de 2024, se estima la generación de 24 M3 de RCD. Generando una cantidad real certificada de RCD de 69 M3, ES DECIR, 45 m3 por encima de lo proyectado para el mes de agosto. De igual manera, se proyecta la generación de 626,7 M3 de residuos de RCD en el mes de septiembre, obteniendo una cantidad real dispuesta en el relleno de 663 M3, es decir, 36.6 M3 adicionales a los proyectados.

Así mismo, se estima la generación de 306 M3 para el mes de octubre de 2024 y 646 m3 de disposición final de RCD para el mes de noviembre de 2024.

# 6. RECOMENDACIONES

La empresa OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS debe hacer seguimiento al código radicado de solicitud del PIN GENERADOR RCD N° EXT-AMC-24-0098876.

El contratista debe hacer seguimiento al Plan de Manejo de Trafico PMT radicado en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT, con el fin de contar con un documento de medidas de tráfico y movilidad para el uso y desplazamiento de vehículos dentro y fuera de la obra.

El proyecto debe instalar toda la señalización pertinente para indicar a la ciudadanía circundante o que se desplaza cerca de la obra que existen unos senderos peatonales para no dificultar su acceso a los bienes inmuebles. Así mismo, para indicar a los conductores de las actividades constructivas en los frentes de obras.

Se recomienda al contratista que, si existe la necesidad de trabajar en los frentes de obra en horarios extemporáneos a los definidos en el programa de manejo de ruido, se debe gestionar ante la alcaldía local 1 (Histórica y del Caribe Norte), los respectivos permisos, como lo estipula la ley ambiental vigente Resolución 0627 DE 2006.

**INFORME**

**N° del Contrato LP-SID-UAC-038-2023**

Objeto del Contrato: “EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C FASE IV – LOTE 4” CRESPO

01 al 18 de Noviembre del 2024

INFORME

## 1. INTRODUCCION

Las obras civiles constituyen hechos sociales, pues se ejecutan con y para los(as) ciudadanos(as) y comunidades en general, a partir de la transformación de los espacios.

El plan de gestión busca mitigar los impactos generados en el momento de ejecución de las obras, como cambios abruptos tanto en el trabajador como en las Rutinas diarias de los habitantes del sector o nuevos intereses y expectativas de la comunidad frente a la ejecución de las obras. En las comunidades el concepto “intervención social en obra” adquiere múltiples sentidos ya que toda obra que realiza el Estado tiene un sentido social, porque busca mejorar la calidad de vida de quienes habitan y laboran en ella e impactar positivamente en las comunidades.

Así como brindarles capacitación tanto a la comunidad como a los Trabajadores para que participen en la vigilancia y control ciudadano para garantizar la calidad de los servicios.

De igual forma los planes de gestión social pretenden cooperativismo y empoderamiento de las comunidades, esto implica como primera medida hacer a la población participe directa en los procesos que se llevarán a cabo por las empresas contratistas haciendo uso del recurso legal de participación ciudadana y el proceso de comunicación entre diversos actores sociales que buscan transformar mediante acciones concretas.

**Acta de reunión**

**ACTA No.6**

**DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / CORREGIMIENTO:** Bolívar / Cartagena

**FECHA:** 05/11/2024 **HORA:** De 4:00pm a 6:00pm

**LUGAR:** Iglesia Cristo Rey barrió Crespo

**A CARGO:** Occidental De Colombia

**OBJETIVO:**

| |
|---|
| Socializar con la comunidad de la carrera 3 el trabajo de obra de rehabilitación de la malla vial fase IV y el proceso de sustitución de tuberías por parte Aguas de Cartagena que se estará ejecutando en su sector. |

**ORDEN DEL DÍA:**

| | TEMA |
|---|---|
| 1 | Saludos |
| 2 | Objetivo de la reunión |
| 3 | Intervención trabajadora social de Occidental de Colombia |
| 4 | Intervención Ingeniero residente de Occidental de Colombia |
| 5 | Intervención representante de Aguas de Cartagena |
| 6 | Intervención promotora social contratistas construcciones JS |
| 7 | Intervención por parte de los asistentes |
| 8 | cierre |

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

**1 Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes de la reunión.**

**2. desarrollo de la reunión:**

El motivo de esta reunión es para informar el proceso de obra que se estará ejecutando en la carrera 3 del barrio crespo rehabilitación de la malla vial fase IV, lote 4

El trabajo en la carrera se realizara paulatinamente para no afectar de manera completa la movilidad y acceso al sector. No se va a cerrar todo el tramo que va desde la calle 70 hasta la calle 73 sino que se va cerrando por tramos y habilitando a medida se vaya finalizando el pavimento. Se estaría trabajando en ambas calzadas, la idea es terminar una calzada primero que sería la derecha mirando de la 70 a la 73 donde está la mayoría de viviendas.

Este proceso va acompañado de la realización de las actas de vecindad que tienen como finalidad dejar un registro tanto escrito como fotográfico de las condiciones de la propiedad a la hora de nosotros empezar en las demoliciones de las placas de pavimento. Ya que si se reporta un cambio en la estructuras del inmueble nosotros contar con las evidencias del estado de la propiedad.

De igual forma se pueden presentar los casos donde no se permite el acceso a las viviendas contamos con un acta de no responsabilidad que se aplica a la propiedad donde se ratifica que nos libramos de cualquier responsabilidad si llega a presentarse alguna anomalía en la propiedad.

Hay un trabajo previo donde se va hacer la reposición de la tubería de acueducto y trabajaremos en conjunto ya que nosotros tenemos que hacer la demolición del pavimento, quitar piedra y hacer excavación para que ellos puedan realizar todo su proceso del cambio de tuberías sin embargo ellos ya empezaron a localizar la tubería para tener la menor afectación posible. pero no estamos exentos en que algún momento se presente alguna afectación a la cual se le dará manejo inmediato y son cosas que pasan diariamente pero sin embargo no queremos afectarlos en sus actividades diarias por lo que trabajaremos con mucho cuidado.

Primero se realizara la demolición del pavimento, segundo la instalación de la tubería y posteriormente se intervienen los andenes respetando las medidas actuales que tienen y las cotas que están actualmente en la vía como drenaje. La rehabilitación de la vía estará compuesta por 35 Cms de grave y 22 Cms de concreto.

Tiene como fecha de inicio la obra el martes 12 de noviembre del 2024 y fecha final el 28 de diciembre del 2024.

Hace la intervención la ingeniera Roxana Alcalá por parte de la interventoría de aguas de Cartagena Quien explica las actividades a realizar es la sustitución de tubería de hace 100 AC mm por tubería de PAD de 110 mm. Se realizara excavación de 1 metro de profundidad.

Esta instalación se realizará desde la calle 71 hasta la Cr 3.

En representación de Construcciones JS S.A.S Oniza Fonseca Pájaro Promotora Social del contratista a cargo de realizar los trabajos, hace su intervención informa que entre las actividades está el traslado y normalización de los medidores a la zona de andén.

Previo a esto se estará realizando un recorrido para identificar los medidores que se encuentran en la zona para eso solicitara los números de pólizas, las actividades iniciaran el martes 12 de noviembre del 2024. En la actualidad se encuentran realizando apiques para descubrir la tubería existente.

Para explicar mejor a los asistentes a la reunión sacan mapa para explicar por dónde va la tubería y como se dará el manejo para el cambio de esta. Se les avisara a las casas con anticipación si necesitan hacer corte del agua por el tiempo que lleve el proceso de cambio de la misma.

**Solicitudes de los asistentes por parte de la comunidad:**


- Que se les informe si se realizaran cortes de algunos de los servicios para ellos contar con soluciones que mitiguen un poco estas afectaciones y tener conocimiento con anterioridad ya que sus actividades diarias se verán afectadas.
- Que se cree un buen plan de movilidad sugieren que sea el mismo DAT que tome el control de la circulación vehicular del sector. Teniendo en cuenta que ya hay varias

vías mejoradas y es un punto a favor para que pueda ejecutar de manera satisfactoria la intervención de la obra en la carrera 3.

- Si van a realizar cambios en los andenes o en la estructura de la vía se informe a los vecinos antes.
- Hay que contemplar que en esta carrera 3 hay mucho comercio y preocupa la accesibilidad a estos y preocupa donde van a guardar los carros los vecinos
- Existe un grupo económico informal que tienen como trabajo lavar vehículos y venta de almuerzos como medio de sustento. se verán afectados por la ejecución de la obra, son importante para nosotros y solicitamos apoyo laborar o una alternativa de solución para su situación. Por lo tanto es muy importante el PMT porque ahí se deben contemplar las afectaciones de los diferentes ámbitos, social, ambiental, accesibilidad del civil y vehicular.
- En la carrera 2 en la calle 73 la señora luz Mery está afectada se empoza el agua al frente de su casa
- Articular las obras con aguas de Cartagena es de suma importancia para una adecuada intervención
- El PMT socializarlo con la comunidad y articularlo con la parte social.
- No puede existir una casa sin realizar acta de vecindad, por parte de la veeduría los podemos ayudar en el acompañamiento si se presenta un caso de que no les permitan el acceso a una propiedad.
- El aeropuerto no quiere reconocer a La empresa de taxis como parte de su operación y presentan una condición difícil de movilidad ya que para salir del parqueadero tienen que hacer un tramo en contravía o tienen que retroceder. Colocan a consideración y estudio la posibilidad de recortar o mover el separador para solucionar el problema de salir en contravía.

**SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO:** SI _X_____NO_____PARCIALMENTE__


Listado de asistencia:

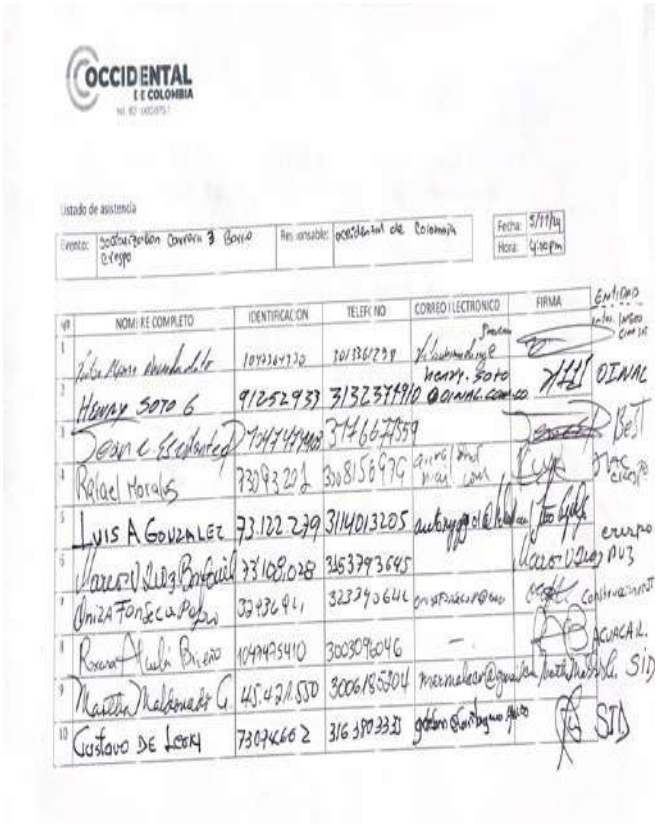

Listado de asistencia

| Evento: | Sostenibilidad Corredor 3 Bosco Orejo | Responsable: | occidental de Colombia | Fecha: | 5/11/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Hora: | 4:00 Pm |

| Nº | NOMBRE COMPLETO | IDENTIFICACION | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | Henry Soto G | 91252937 | 3132374910 | @ainal.com.co | |
| 3 | [illegible] | [illegible] | 3176677559 | | |
| 4 | Rafael Morales | 73093202 | 3085569[illegible] | | |
| 5 | Luis A Gonzalez | 73.122.279 | 3114013205 | | |
| 6 | [illegible] | 73108028 | 3153793645 | | |
| 7 | [illegible] | 3393641 | 3233906[illegible] | | |
| 8 | [illegible] | 1047975410 | 3003096046 | — | |
| 9 | [illegible] | 45.471.550 | 3006185504 | | |
| 10 | Gustavo De Leon | 73074662 | 3163993331 | | |

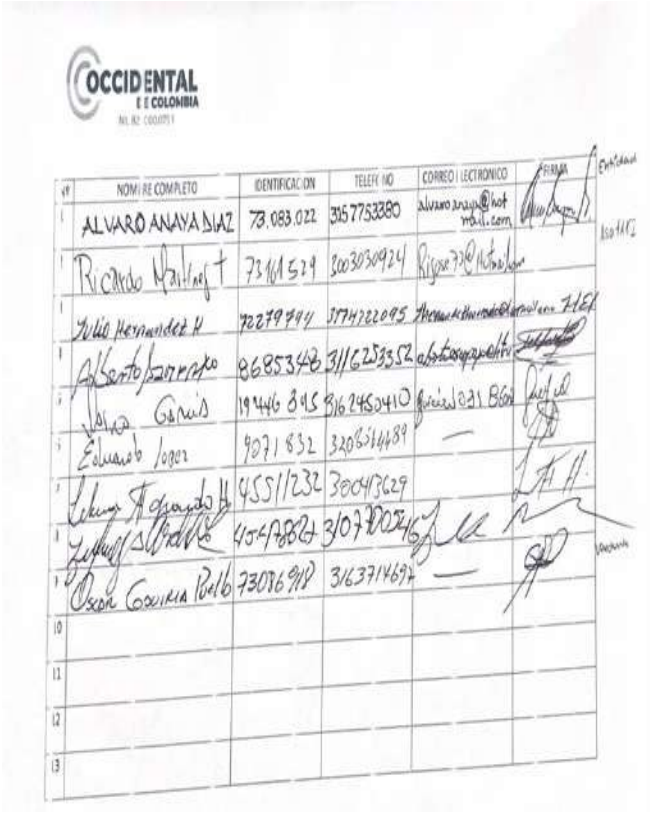

| Nº | NOMBRE COMPLETO | IDENTIFICACION | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO ANAYA DIAZ | 73.083.022 | 3157753380 | | |
| 2 | [illegible] | 73161529 | 3003030924 | | |
| 3 | [illegible] | 72279994 | 3174222095 | | |
| 4 | [illegible] | 86853428 | 3116253352 | | |
| 5 | [illegible] | 19446 895 | 3162450410 | | |
| 6 | [illegible] | 9071832 | 3208314489 | — | |
| 7 | [illegible] | 45511232 | 3004137629 | | |
| 8 | [illegible] | 45478824 | 3107[illegible] | | |
| 9 | [illegible] | 73086918 | 3163714697 | — | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |

Evidencia fotográfica


















**Acta de reunión con los trabajadores de obra lote 4**

**ACTA No.7**

**DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / CORREGIMIENTO:** Bolívar / Cartagena

**FECHA:** 06/11/2024 **HORA:** De 8:00am a 8:30am

**LUGAR:** Carrera 2 barrio

crespo

**A CARGO:** Occidental de Colombia

**OBJETIVO:**

| |
|---|
| Socializar con los trabajadores el tema de COMUNICACIÓN PARA LA VIDA |

**ORDEN DEL DÍA:**

| | TEMA |
|---|---|
| 1 | Saludos |
| 2 | Objetivo de la reunión |
| 3 | Comunicación para la vida |
| 4 | El conocimiento de sí mismo facilita |
| 5 | La empatía fomenta |
| 6 | Comunicación efectiva |
| 7 | las destrezas para solucionar problemas y conflictos facilitan |
| 8 | cierre |

**SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** (Si los hay):

| | COMPROMISO | ESTADO Y OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1 | No aplica | |
| | | |

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:
**1 Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes de la reunión.**
**2. desarrollo de las temáticas:**

**COMUNICACION PARA LA VIDA - INTERVENCIÓN CON COMUNIDADES**

Las destrezas psicosociales necesarias para enfrentar con éxito los desafíos de la intervención comunitaria son muchas y muy diversas, y su naturaleza depende en gran medida del contexto social y cultural. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso que existe un grupo esencial de habilidades psicosociales, que probablemente son relevantes para realizar procesos de intervención en cualquier contexto sociocultural, y que pueden agruparse por parejas en cinco grandes áreas, ya que existen relaciones naturales entre ellas: Conocimiento de sí mismo Comunicación efectiva Toma de decisiones Pensamiento creativo Empatía Relaciones interpersonales Solución de problemas y conflictos Pensamiento crítico Manejo de sentimientos y emociones Conocimiento de sí mismo Manejo de tensiones o estrés Implica reconocer nuestro ser, carácter, fortalezas, debilidades, gustos y disgustos. Desarrollar un mayor conocimiento personal nos facilita reconocer los momentos de preocupación o tensión. A menudo, este conocimiento es un requisito de la comunicación efectiva, las relaciones interpersonales y la capacidad para desarrollar empatía hacia los demás.

**EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO FACILITA:**

• El reconocimiento de las propias fortalezas, lo que estimula la autoestima y confianza en sí mismo.
• El reconocimiento de las propias debilidades, lo que contribuye a una autoimagen y decisiones más realistas.
• Una mayor conciencia sobre deberes, derechos y responsabilidades.
• La clarificación de valores.
• Una mayor motivación para cuidarse a sí mismo.

Empatía: Es la capacidad de “ponerse en los zapatos del otro” e imaginar cómo es la vida para esa persona, incluso en situaciones con las que no estamos familiarizados. La empatía nos ayuda a aceptar a las personas diferentes a nosotros y mejora nuestras interacciones sociales. También nos ayuda a fomentar comportamientos solidarios y de apoyo hacia las personas que necesitan cuidados, asistencia o aceptación, como los enfermos de Sida, las personas con

trastornos mentales o los desplazados por el conflicto interno, quienes con frecuencia son víctimas del estigma y ostracismo social. Comprender las emociones de los demás implican "meternos en su pellejo" y entender sus motivos. Es escuchar sus sentimientos y hacerle saber que "nos hacemos cargo", intentar entender lo que siente esa persona.

No se trata de mostrar alegría, si siquiera de ser simpáticos. Simplemente, que somos capaces de ponernos en su lugar. Sin embargo, no significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro. Para demostrar esa actitud, usaremos frases como: “entiendo lo que sientes”, “noto que...”.

**LA EMPATÍA FOMENTA:**

• El respeto por todas las formas de vida y el medio ambiente.
• La solidaridad como valor individual y social.
• La aceptación de la diferencia como un factor de crecimiento personal y social, y de convivencia pacífica.
• La tolerancia.
• Un comportamiento menos agresivo en las relaciones interpersonales.
• Una mayor capacidad para establecer amistades.
• Comprender a los demás en sus sentimientos y puntos de vista.
• Anticipar las formas de comportarse de las personas significativas de nuestro entorno comunitario.
• Generar un clima positivo de flexibilidad y cohesión de beneficio para la comunidad. Saber crear y unir
• Experimentar los sentimientos, objetivos de los demás e interesarnos activamente por sus preocupaciones
• Conocer las necesidades de desarrollo de los miembros de la comunidad y contribuir seriamente a su satisfacción.

**COMUNICACIÓN EFECTIVA**

La Comunicación efectiva tiene que ver con la capacidad de expresarse, en forma apropiada a la cultura y las situaciones. Un comportamiento asertivo implica un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones que ayudan a alcanzar sus objetivos personales y profesionales de forma socialmente aceptable. La comunicación efectiva también s se relaciona con nuestra capacidad de pedir consejo o ayuda en momentos de necesidad. Algunos de los principios básicos para lograr una correcta comunicación son:

1. La escucha activa: Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo es el saber escuchar. Se está más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta necesidad propia de comunicar se pierde la esencia de la comunicación, es decir, poner en común, compartir con los demás.

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla, es entender, comprender o dar sentido a lo que la persona está expresando directamente, así como a los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo.

Elementos a evitar en la escucha activa:
- No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos.
- No interrumpir al que habla.
- No juzgar. “Te lo dije” -No burlarse de sus modismos (palabras populares, dichos, historias etc)
- No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. “No prometer”
- No validar lo que el otro esté sintiendo, "no te preocupes, eso no es nada".
- No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte. - No alardees de tus habilidades y conocimientos.
- No contra argumentar: el otro dice "me siento mal" y tú respondes "y yo también".
- Evitar el "síndrome del experto": ya tienes las respuestas al problema de la otra persona, antes incluso de que te haya contado la mitad.

2. Respetar la comunicación El mejor estilo de comunicación se basa en que la persona respete a los demás y también se respete a sí misma, dicho estilo es el estilo asertivo, en el que la persona asume la responsabilidad de su vida y de sus mensajes. La comunicación asertiva y respetuosa propicia la motivación y la responsabilidad en la interacción comunitaria, reduce situaciones conflictivas. Sea el estilo pasivo y/o agresivo en ambos se presenta la carencia de respeto y la falta de interacción social Para ejercer el respeto hacia el otro es importante mantener una mente abierta; exponer nuestros puntos de vista, pero sin pelear, es posible no estar de acuerdo con alguien sin ser desagradable; evitar siempre las manifestaciones de una comunicación agresiva. Expresiones de rechazo, negativas o descalificantes

3. El poder de la palabra La comunicación eficaz se logra cuando sabemos escuchar y expresamos acertadamente, pero como afirma Fischman (2000) es una herramienta tanto útil como peligrosa:

Bien utilizada puede generar un clima de confianza y unión en los integrantes de la comunidad; mal usada puede generar sentimientos negativos como dolor, rabia y un clima destructivo en la organización comunitaria. No comunicarnos con franqueza y claridad puede propiciar desconfianza, miedo y una competencia “desleal”, entre los integrantes de la comunidad. Conviene, pues, redefinir la crítica. Y, al hablar de crítica constructiva, nos referimos al hecho de comunicar información a otros de tal modo que puedan usarla en beneficio propio... Y de los demás. La crítica constructiva es un instrumento verbal para favorecer el desarrollo de las relaciones personales, no un instrumento de venganza para herir y molestar al prójimo. (J.V. Bonet, 1995) Para que nuestros mensajes influyan sobre los demás es importante:

• Ser abierto y oportuno
• Hacer que la persona no esté a la defensiva
• Dar ejemplo, es vital
• Usar las palabras para construir no para destruir.
• Ser específico, concreto y preciso, es una de las normas principales de la comunicación.
• Evitar las generalizaciones. Los términos "siempre" y "nunca" raras veces son ciertos. Para valorar al interlocutor, son más efectivas expresiones como: “La mayoría de veces”, “En ocasiones”, “Algunas veces”, “Frecuentemente”.
• Cuidar la comunicación no verbal. El contacto visual, el tono emocional, la expresión facial y el volumen de voz deben ser adecuados para la situación en la que se está interactuando.

Elegir el lugar y el momento adecuado:

El ambiente, el ruido, el nivel de intimidad y las personas que nos rodean juegan un papel fundamental en toda comunicación En la interacción con comunidades vulnerables es vital no olvidar que la comunicación es el medio a través del cual sus miembros dan a conocer sus necesidades físicas, psicológicas y sociales. La comunicación debe entonces orientarse a ofrecer, enriquecer y ayudar al colectivo, para así lograr el éxito de los procesos de intervención. Gracias a la Comunicación asertiva podemos brindar mensajes de aceptación de las peculiaridades y derechos de uno mismo y de las demás personas con quienes interactuamos. Si la practicamos.

Los miembros de la comunidad acceden a derechos como:
• Actuar con autonomía
• Expresar sin temores necesidades, sentimientos, ideas, opiniones y sugerencias
• Aceptar equivocarse alguna vez
• Pensar de manera propia y creativa
• Cambiar las propias opiniones

• Aceptar y rechazar críticas y quejas
• Aceptar no saber algo
• Hacer peticiones
• Expresar sentimientos
• Elogiar y recibir elogios

**LAS DESTREZAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS Y CONFLICTOS FACILITAN:**

• La identificación de problemas, sus causas y alternativas de solución.
• La negociación como estrategia para resolver relaciones y situaciones de conflicto.
• La identificación de soluciones colectivas a los problemas sociales y de la comunidad.
• El solicitar ayuda en los momentos de necesidad.
• Proporcionar a los integrantes de la comunidad herramientas específicas para la satisfacción de sus necesidades.

Pensamiento creativo Consiste en la utilización de los procesos básicos de pensamiento para desarrollar o inventar ideas o soluciones novedosas, estéticas, o constructivas, relacionadas con preceptos y conceptos, con énfasis en los aspectos del pensamiento que tienen que ver con la iniciativa y la razón. Contribuye en la toma de decisiones y en la solución de problemas, lo cual nos permite explorar las alternativas disponibles y las diferentes consecuencias de nuestras acciones u omisiones. Nos ayuda a ver más allá de nuestra experiencia directa, y aún cuando no exista un problema, o no se haya tomado una decisión, el pensamiento creativo nos ayuda a responder de manera adaptativa y flexible a las situaciones que se presentan en la intervención comunitaria. Pensamiento crítico Es la habilidad de analizar información y experiencias de manera objetiva.

**COMPROMISOS** (Si los hay):


| | COMPROMISO | RESPONSABLE | INICIA | TERMINA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |

**FECHA DE PRÓXIMA REUNION:**_____ <Si aplica>

**SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO:** SI _X_____ NO_____ PARCIALMENTE__

OCCIDENTAL DE COLOMBIA
Nit. 829.000.075-1

Listado de asistencia:

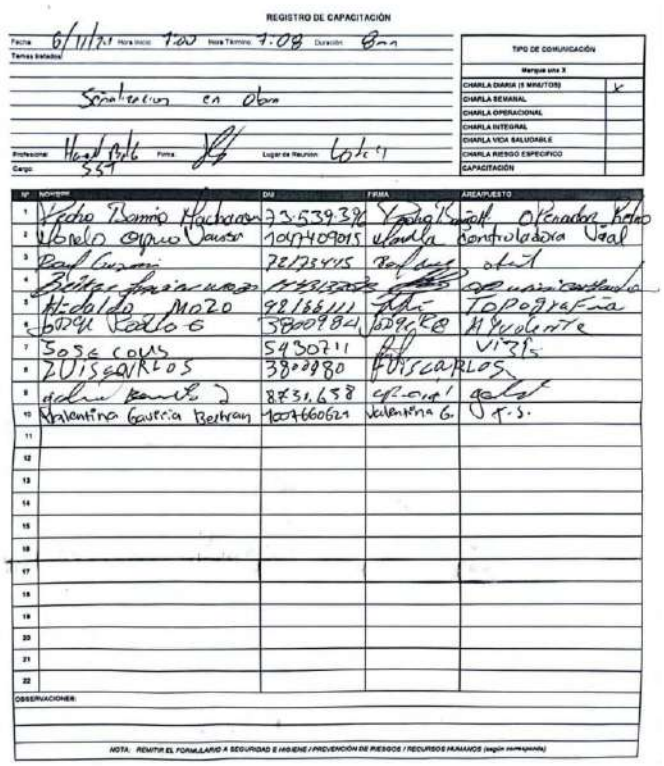

REGISTRO DE CAPACITACIÓN

Fecha: 6/11/21 Hora Inicio: 7:00 Hora Término: 7:08 Duración: 8mn
Temas tratados: Señalizacion en Obra
Profesional: Head SST Firma: Lugar de Reunión: Lote 1
Cargo:

| TIPO DE COMUNICACIÓN | Marque una X |
|---|---|
| CHARLA DIARIA (5 MINUTOS) | X |
| CHARLA SEMANAL | |
| CHARLA OPERACIONAL | |
| CHARLA INTEGRAL | |
| CHARLA VIDA SALUDABLE | |
| CHARLA RIESGO ESPECIFICO | |
| CAPACITACIÓN | |

| Nº | NOMBRE | DNI | FIRMA | AREA/PUESTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Damian Machacuay | 73539396 | | Operador Rodillo |
| 2 | Udelo Oliver Davila | 10474099015 | | Controladora Vial |
| 3 | Raul Cusi | 72173415 | | obrero |
| 4 | Britney Jimenez | 74913205 | | Supervisora |
| 5 | Heldo MOZO | 98166111 | | TOPOGRAFIA |
| 6 | Jorge Pablo G | 38009824 | | Mayordomo |
| 7 | Jose Luis | 5430711 | | Vigia |
| 8 | LUIS CARLOS | 38002980 | | LUIS CARLOS |
| 9 | [illegible] | 8731.658 | | [illegible] |
| 10 | Valentina Gaviria Bertran | 1007660621 | | T.S. |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |

OBSERVACIONES:

NOTA: REMITIR EL FORMULARIO A SEGURIDAD E HIGIENE / PREVENCIÓN DE RIESGOS / RECURSOS HUMANOS (según corresponda)

Evidencia fotográfica



Elaboro:

**VALENTINA GAVIRIA BELTRAN**
**Trabajadora Social**
**CC Nº 1007660621**

**INFORME MENSUAL**

**N° del Contrato LP-SID-UAC-038-2023**

Objeto del Contrato: “EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C FASE IV – LOTE 4” CRESPO

19 al 30 de Noviembre del 2024

**Contenido**


**1. INTRODUCCION……2**
**2. LECTURATERRITORIAL……..…3**
**2.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA……3,4**
**3. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A IMPLEMENTAR……5**
**3.1ACTAS DE VECINDAD……5,6**
**3.2 BASE DE DATOS DE ACTORES……..……6,8**
**4 PROGRAMADE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL……8**
**5. Reporte de contratación mano de obra local……..8**
**7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN……9**
**8. Atención a las solicitudes del ciudadano……10,12**
**9. Relación de recursos físicos de gestión social……..……12**

**ANEXOS……..13,24**

## 1. INTRODUCCION

Las obras civiles constituyen hechos sociales, pues se ejecutan con y para los(as) ciudadanos(as) y comunidades en general, a partir de la transformación de los espacios.

El plan de gestión busca mitigar los impactos generados en el momento de ejecución de las obras, como cambios abruptos tanto en el trabajador como en las Rutinas diarias de los habitantes del sector o nuevos intereses y expectativas de la comunidad frente a la ejecución de las obras. En las comunidades el concepto “intervención social en obra” adquiere múltiples sentidos ya que toda obra que realiza el Estado tiene un sentido social, porque busca mejorar la calidad de vida de quienes habitan y laboran en ella e impactar positivamente en las comunidades.

Así como brindarles capacitación tanto a la comunidad como a los Trabajadores para que participen en la vigilancia y control ciudadano para garantizar la calidad de los servicios.

De igual forma los planes de gestión social pretenden cooperativismo y empoderamiento de las comunidades, esto implica como primera medida hacer a la población participe directa en los procesos que se llevarán a cabo por las empresas contratistas haciendo uso del recurso legal de participación ciudadana y el proceso de comunicación entre diversos actores sociales que buscan transformar mediante acciones concretas.

## 2. LECTURA TERRITORIAL

### 2.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA:

- Hasta la fecha se ha intervenido en la calle 70A entre carreras 8 y 9







- carrera 8






- actualmente Carrera 2








- carrera 71






Carrera 3






## 3. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A IMPLEMENTAR

### 3.1 Actas de vecindad:

Se evidencia a continuación las jornadas de visitas casa en casa para realizar actas de vecindad

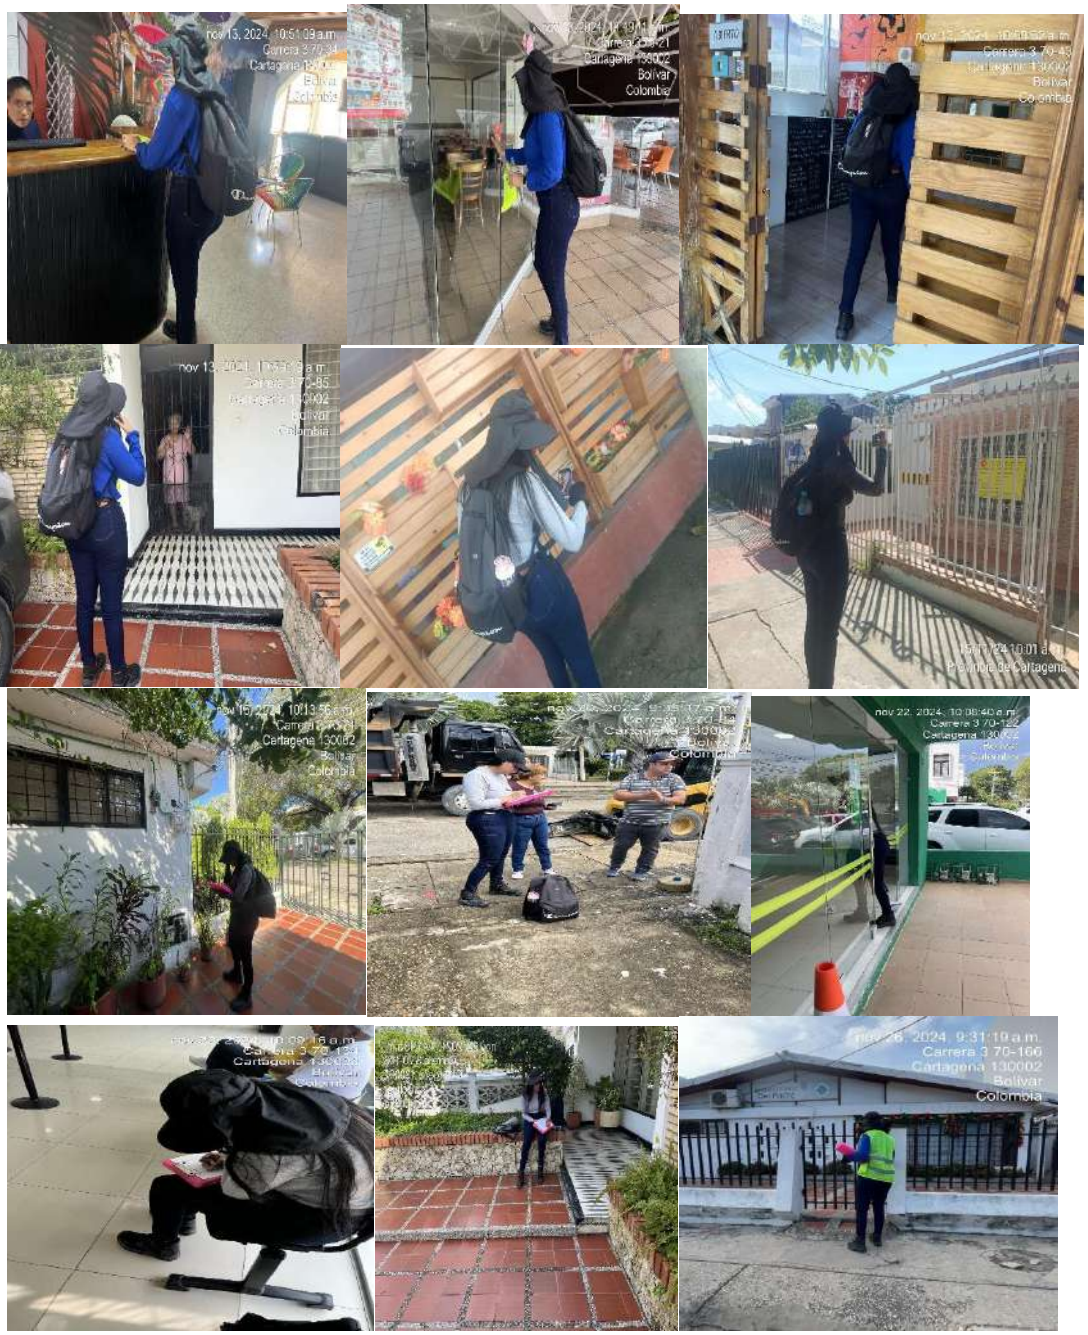

### 3.2 Base de datos de actores

Incluye la información de contacto (institucionales y no institucionales) involucrados en el proyecto y posibles aliados.

| INSTITUCIONALES | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO |
|---|---|---|
| surtigas | **3014793336 3014793290** | **atencionalusuario@corvivienda.gov.co** |
| Aguas de Cartagena | **6056943337** | **correspondencia**@acuacar.com |
| Afinia | **115** | **correspondencia**@afinia.com.co |
| Autoridades públicas (policía nacional) CAI de crespo | **3007093662 3106005008** | **Mecar.oac@policia.gov.co** |
| Alcaldia distrital | **6056411370 0180004153 93** | **alcalde@cartagena.gov.co** |
| Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena (EPA) | **6056421316** | **atencionalciudadano@epacartagena.gov.co** |

| NO INSTITUCIONALES | ROLES | TELEFONO | SECTOR |
|---|---|---|---|
| Alvaro mendez siloa | Presidente de la junta de acción comunal | 3147076012 | Calle 70A Barrio Crespo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jorge correa | administrador del conjunto la PROA | 3017956868 | Calle 70 A Barrio crespo |
| suarez | Administrador del conjunto el gloria | 3128105685 | Calle 70 A Barrio crespo |
| Javier | Administrador conjunto alba Sofía del mar y miembro de la veeduría | 3113193087 | Barrio crespo |
| Rafael morales | Vicepreciente de la junta de acción comunal de crespo | 3008156979 | Barrios crespo |
| Luis Antonio Gonzáles | Edil barrio crespo | 3114013205 | Carrera 71 |
| Oscar Gaviria | Miembro de Veeduria de crespo | 3163714697 | Carrera 2 barrio crespo |

## 4. PROGRAMA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL



Se realizan reuniones para atender las inquietudes y aportes que tienen los vecinos residentes de la obra frente a la ejecución de la misma

## 5. Reporte de contratación mano de obra local

| Procedencia | trabajadores | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mano de obra foránea | 9 | 43% |
| Mano de obra local | 12 | 57% |
| **Total** | **21** | **100%** |

En cuanto a la distribución por sexo, prima la población masculina. Se cuenta con vinculación del 14% de población femenina; se resalta que las políticas de contratación de personal del proyecto, se prioriza mano de obra femenina que cumpla con el perfil de los cargos estipulados.

## 7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En el proceso de la ejecución de la obra se presentan imprevistos los cuales pueden afectar un poco las viviendas de las casas como manchar una pared, escombros y suciedad. Pero en nuestra empresa prima el bienestar de los ciudadanos a medida que vamos avanzando de este mismo modo vamos haciendo seguimiento y subsanación de todo tipo de molestias que pudo causar a las viviendas y espacio público.






## 8. Atención a las solicitudes del ciudadano


Desde la fecha de inicio del proyecto, se han recibido 4 PQRS:





A continuación, se detalla el énfasis de estas PQRS:



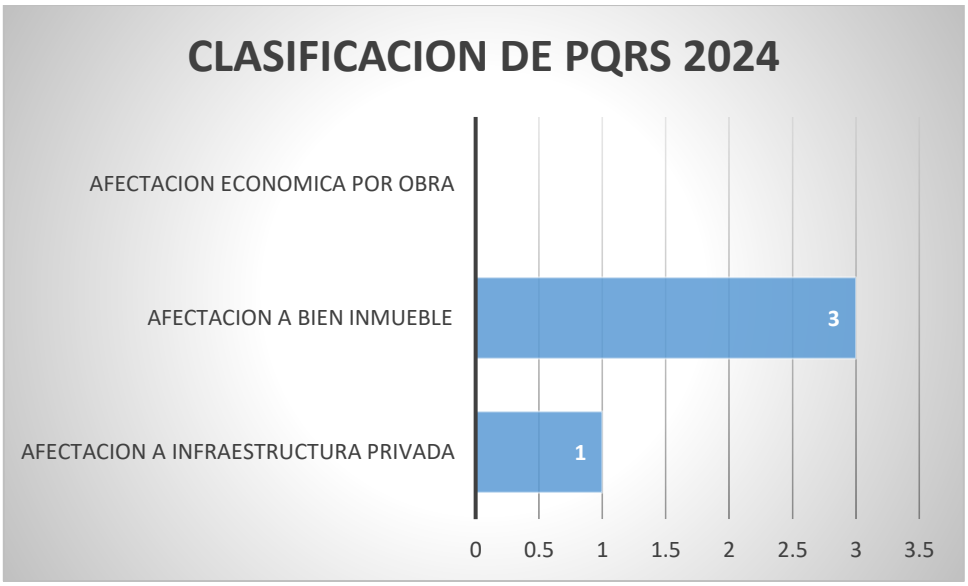


De las 4 PQRS recibidas, 1 de ellas manifiestan afectación a infraestructura de sus viviendas y 3 afectaciones a bien mueble (vehículo)

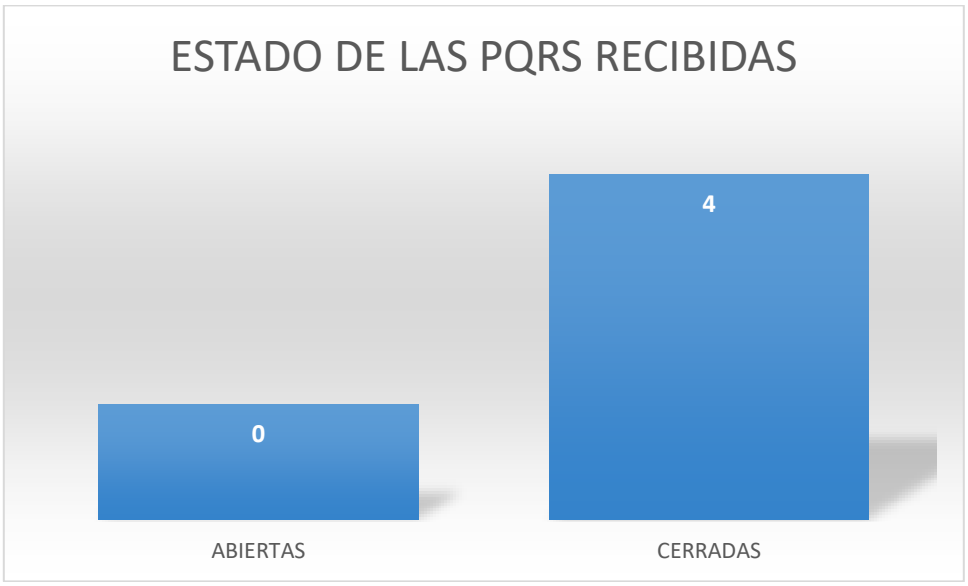


En la actualidad se encuentra cerradas las 4 PQRS

## 9. Relación de recursos físicos de gestión social

| RELACION DE RECURSOS FISICOS PLAN DE GESTION SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| | DESCRIPCION | Und | CANTIDAD |
| 1 | Equipo de computo | Und | 1 |
| 2 | fotocopias | Und | 60 |
| 3 | Diseño plan de gestión social | Und | 1 |
| 4 | Zona de hidratacion | Und | 1 |
| 5 | Dotacion (botas, camisa, pantalón y casco | Und | 4 |
| 6 | baños | Und | 1 |

Anexos

Actividad: Por la parte social se realiza acompañamiento en obra en carrera 2 y carrera 71 barrio crespo



Elaboro:

**VALENTINA GAVIRIA BELTRAN**
**Trabajadora Social**
**CC Nº 1007660621**
