RECIBIDO 14 MAR 2025

GESTION TRANSPARENTE
MUNICIPIO 14 MAR 2025
NIT. 890.890.998-8 CHIGORODO

ALCALDIA DE CHIGORODO NIT: 890.890.998-8	FORMATO	Código:	FO-SP-00-00	Municipio de Chigorodó
	ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO	Versión:	1	

ACTA PARCIAL [X] (marque X) No. Acta [13] ACTA FINAL [ ] (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 01 febrero 2025 hasta 28 febrero 2025

	RETILAP reglamento tecnico de iluminacion y alumbrado publico de obras proyectadas.	UND	1.00	$	8 800 000	$	8 800 000.00			$	-			$ -	
	Equipo de medida semidirecta ITRON ACE6000, caja de policarbonato tipo 4 y tcs 500/5A	UND		$	4 200 000	$	-			$	-			$ -	
	REAJUSTE PRECIO Acero para Cercha Metalica de cubierta, correas, perfiles y soporte de losa, según diseño estructural.	KG	65 954.03	$	1 328	$	87 586 953.57		$ -	63 680.08	$ 84 567 146.24	63 680.08	$ 84 567 146.24	96.55 %
COSTO DE LEGALIZACION						$	108 186 953.57				$ 84 567 146.24		$ 84 567 146.24	78.2%
VALOR TOTAL OBRA INCLUYE AIU Y COSTOS DE LEGALIZACION						$	7 654 239 360.57		$ 662 612 554.85		$ 5 232 232 378.22		$ 5 894 844 933.08	77.01%
VALOR AJUSTE AL PESO						-$	0.85		-$ 0.85		-$ 2.23		-$ 3.08	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO						$	-							
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA						$	662 612 554.00		$ 662 612 554.00		$ 5 232 232 376.00		$ 5 894 844 930.00	77.01%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA									8.66 %		68.36 %		77.01 %	77.01%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO									$ 662 612 554.00		$ 5 232 232 376.00		$ 5 894 844 930.00	

JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
C.C. No.71.948.267 de Apartadó
R/L UNION TEMPORAL VETA
CONTRATISTA

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
C.C. No. 73.124.700 de Cartagena
DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO VELNEC BRAIN
INTERVENTORIA


C.C. No. 43573702 de MEDELLÍN
SUPERVISOR
ALCALDIA DE CHIGORODO

RECIBIDO 14 MAR. 2025
MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT. 890980998-8
...ION TRANSPARENTE

ALCALDIA DE CHIGORODÓ NIT: 890.890.998-8	ALCALDIA DE CHIGORODO MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Municipio de Chigorodó

CONTRATO: 149 DE 2022	**OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA"				
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VETA	**NIT:** 901.562.237-8	**UBICACIÓN**	**PERIODO**		**ACTA PARCIAL DE OBRA** No 13
INTERVENTORIA: CONSORCIO VELNEC BRAIN	**NIT:** 901.575.163-8	CHIGORODO - ANTIOQUIA	1/2/2025	28/02/2025	

Item	Descripción	Unidad
3.3	Dinteles en concreto 10x10 cm	ML

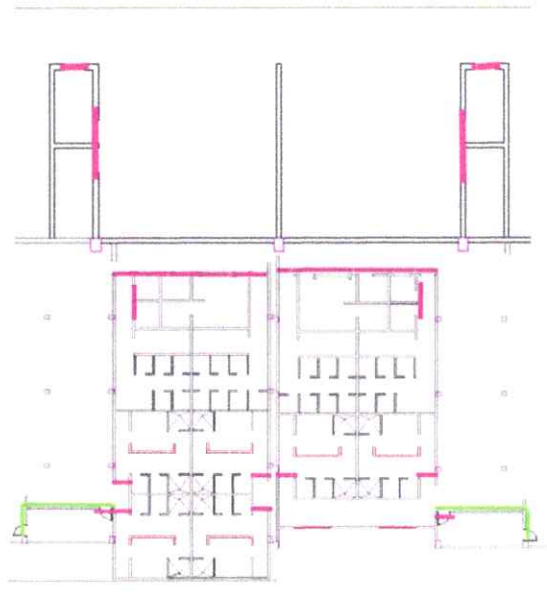

	Localización	Dimensiones					Medida Parcial	No de elementos	Medida Total
		Ancho	Longitud	Alto	Area	kls			
	OFICINAS NORTE Y SUR								
1	Ventana de baño		1.10				1.10	4.00	4.40
2	Puerta de baño y bodega		2.10				2.10	4.00	8.40
	BAÑOS NORTE								
3	EJE 14y 12 ENTE G-H		2.40				2.40	4.00	9.60
4	DEPORTISTAS MUJERES Y HOMBRE ESC NORTE		1.25				1.25	2.00	2.50
5	DEPORTISTAS MUJERES Y HOMBRE ESC CENTRAL		1.25				1.25	2.00	2.50
6	DEPOSITO		1.30				1.30	1.00	1.30
7	TAQUILLA		1.30				1.30	1.00	1.30
	EJE C1		11.00				11.00	1.00	11.00
8	**BAÑOS SUR**								
9	EJE F1		2.90				2.90	2.00	5.80
10	DEPORTITAS MUJERES ESC SUR		1.25				1.25	1.00	1.25
11	DEPORTITAS HOMBRE ESC SUR		1.25				1.25	1.00	1.25
12	DEPOSITO		1.30				1.30	1.00	1.30
13	TAQUILLA		1.30				1.30	1.00	1.30
14	EJE C1		10.90				10.90	1.00	10.90
	BODEGA2								
15	EJE F3 PUERTA BODEGA		1.15				1.15	2.00	2.30
16	AMARRE BODEGA		7.84				7.84	2.00	15.68
17	GRADERIA CENTRAL ENTRADA CAMERINO		3.80				3.80	1.00	
	CUARTO DE MAQUINAS								
18	EJE 1		3.34				3.34	1.00	3.34
19	EJE F Y G		5.35				5.35	2.00	10.70
								Subtotal ejecutado	94.82
								Subtotal actas anteriores	-61.53
	Total							ML	33.29

OBSERVACIONES:
El dintel fabricado tiene las medidas de 0,10mx0,15m x longitud requerida, debido a que el bloque con el que se esta trabajando su espesor es de 0.15m

Contratista
Nombre: JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
Mat. Profesional: 05202123388 ANT

Interventoría
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Mat. Profesional: 2570052679 CND

Alcaldía Municipal de Chigorodó
Nombre: Monica Alexandra Salazar
Mat. Profesional: 05202-391581
