GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
ACTA DE COBRO PARCIAL 2

CODIGO	MINFRA-MN-N-7-FR-1
VERSION	2
PAGINA	DE
FECHA	10/09/2024 (Da / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA
ACTA No: 2.00 (Numerar de manera consecutiva)
POR CANTIDADES DE OBRA [x]
POR CONTRATO ADICIONAL No (Indicar No. 1, 2, etc)

CONTRATO No. 1.310-12.13-0326

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5

CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRUJILLO VALLE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 13100259.1-0331
INTERVENTOR: EDUARDO CARDENAS

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses segun contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 24/08/2023 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 26/12/2023 (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 4.992.976.581,00
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 4.992.976.581,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 13 MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 16/01/2024 (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
Porcentaje Presupuestal Acumulado: 90%

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 15/06/24		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 15/05/24		PRESENTE DE OBRA ACTA No. 2 CON FECHA 10/09/2024		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		GRUPO 5 (TRUJILLO)				**$ 3.400.218.602,00**		**$ 3.400.218.603,00**			**$ -**		**$ 1.528.664.248,00**		**$ 1.784.209.722,00**		**$ 87.344.635,00**
		GRUPO 5 PUNTO CRITICO 1				**$ 1.068.532.027,00**		**$ 486.461.779,00**			**$ -**		**$ 229.006.643,00**		**$ 234.528.093,00**		**$ 22.927.040,00**
	1	**CAPITULO 1 - PRELIMINARES**				**$ 80.767.318,00**		**$ 153.011.997,00**			**$ -**		**$ 27.853.631,00**		**$ 125.158.365,00**		**$ -**
	1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	600	$ 4.294,78	$ 2.576.866,00	238,6	$ 1.024.734,00			$ -	238,60	$ 1.024.734,00	-	$ -	0,00	$ -
	1,2	ROCERIA	M2	150	$ 10.000,00	$ 1.500.000,00	270	$ 2.700.000,00			$ -	270,00	$ 2.700.000,00	-	$ -	0,00	$ -
	1,3	DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS	ML	100	$ 2.191,04	$ 219.104,00	100	$ 219.104,00			$ -	100,00	$ 219.104,00	-	$ -	0,00	$ -
	1,4	LIMPIENZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG	UND	4	$ 135.446,27	$ 541.785,00	1	$ 135.446,00			$ -	1,00	$ 135.446,00	-	$ -	0,00	$ -
	1,5	DEMOLI CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9	$ 60.655,22	$ 545.897,00	7,8	$ 473.111,00			$ -		$ -	7,80	$ 473.111,00	0,00	$ -
	1,6	DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14	$ 11.514,18	$ 161.199,00	7	$ 80.600,00			$ -		$ -	7,00	$ 80.599,00	0,00	$ -
	1,7	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	1468	$ 8.425,37	$ 12.368.448,00	7,56	$ 63.696,00			$ -		$ -	7,56	$ 63.696,00	0,00	$ -
	1,8	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	343,85	$ 8.425,37	$ 2.897.065,00	15,13	$ 127.476,00			$ -		$ -	15,13	$ 127.476,00	0,00	$ -
	1,9	EXCAVACION MATERIAL COMUN EN SECO	M3	100	$ 8.425,37	$ 842.537,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	1,10	EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	50	$ 11.350,00	$ 567.500,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	1,11	EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	50	$ 48.558,96	$ 2.427.948,00	917,29	$ 44.542.544,00			$ -	145,80	$ 7.079.896,00	771,49	$ 37.462.748,00	0,00	$ -
	1,12	TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	30237	$ 1.855,97	$ 56.118.969,00	55844,21	$ 103.645.186,00			$ -	8995,00	$ 16.694.451,00	46.849,21	$ 86.950.735,00	0,00	$ -
	2	**CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS**				**$ 228.123.283,00**		**$ 58.920.692,00**			**$ -**		**$ 13.582.796,00**		**$ 22.599.869,00**		**$ 22.738.025,00**
	2,1	CONFORM COMPACT SUBRASANTE	M2	600	$ 3.679,85	$ 2.207.910,00	106,25	$ 390.984,00			$ -	30,60	$ 112.603,00	75,65	$ 278.381,00	0,00	$ -
	2,2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	550	$ 73.181,34	$ 40.249.739,00	244,44	$ 17.888.448,00			$ -	138,87	$ 10.162.693,00	105,57	$ 7.725.754,00	0,00	$ -
	2,3	RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	55	$ 75.000,00	$ 4.125.000,00	80,1	$ 6.007.500,00			$ -	44,10	$ 3.307.500,00	36,00	$ 2.700.000,00	0,00	$ -
	2,4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR 0,20 mts	M3	180	$ 169.102,24	$ 30.438.403,00	36,9	$ 6.239.873,00			$ -		$ -	36,90	$ 6.239.873,00	0,00	$ -
	2,5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR 0,30 mts	M3	135	$ 153.275,37	$ 20.692.175,00	36,9	$ 5.655.861,00			$ -		$ -	36,90	$ 5.655.861,00	0,00	$ -
	2,6	IMPRIMACION	M2	600	$ 3.776,87	$ 2.266.119,00	123	$ 464.554,00			$ -		$ -	-	$ -	123,00	$ 464.554,00
	2,7	RIEGO DE LIGA	M2	600	$ 1.597,01	$ 958.209,00	123	$ 196.433,00			$ -		$ -	-	$ -	123,00	$ 196.433,00
	2,8	SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0,10 mts	M3	125	$ 950.670,90	$ 118.833.862,00	18,45	$ 17.539.878,00			$ -		$ -	-	$ -	18,45	$ 17.539.878,00
	2,9	ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	4500	$ 1.855,97	$ 8.351.866,00	2444,63	$ 4.537.161,00			$ -		$ -	-	$ -	2444,63	$ 4.537.160,00
	3	**CAPITULO 3 - OBRAS DE DRENAJE**				**$ 56.230.218,00**		**$ 11.430.049,00**			**$ -**		**$ 1.418.357,00**		**$ 10.011.693,00**		**$ -**
	3,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	15,4	$ 922.611,94	$ 14.208.224,00	4,96	$ 4.576.155,00			$ -		$ -	4,96	$ 4.576.155,00	0,00	$ -
	3,2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	540	$ 8.417,16	$ 4.545.269,00	83,3	$ 701.150,00			$ -		$ -	83,30	$ 701.150,00	0,00	$ -
	3,3	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	149,5	$ 4.909,70	$ 734.000,00	61	$ 299.492,00			$ -	36,00	$ 176.749,00	25,00	$ 122.743,00	0,00	$ -
	3,4	TUB PVC 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	150	$ 84.620,90	$ 12.693.134,00	19	$ 1.607.797,00			$ -	9,50	$ 803.899,00	9,50	$ 803.899,00	0,00	$ -
	3,5	FILTRO GEODREN(INCLUYE EXCAV Y RELLENO)	ML	200	$ 48.634,33	$ 9.726.866,00	19	$ 924.052,00			$ -	9,00	$ 437.709,00	10,00	$ 486.343,00	0,00	$ -
	3,6	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0,15	M3	15,45	$ 922.611,94	$ 14.254.354,00	3,6	$ 3.321.403,00			$ -		$ -	3,60	$ 3.321.403,00	0,00	$ -
	3,7	CUNETA EN TIERRA (MANUAL)	ML	32,5	$ 2.103,73	$ 68.371,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	4	**CAPÍTULO 4 CONCRETOS MURO**				**$ 668.143.247,00**		**$ 81.435.470,00**			**$ -**		**$ 66.473.163,00**		**$ 14.962.306,00**		**$ -**
	4,1	SOLADO ESPESOR E=0,07M 2500 PSI	M3	13,8	$ 561.120,90	$ 7.743.468,00	3,06	$ 1.717.030,00			$ -	3,06	$ 1.717.030,00	-	$ -	0,00	$ -
	4,2	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI	M3	90	$ 1.057.497,01	$ 95.174.731,00	15,3	$ 16.179.704,00			$ -	15,30	$ 16.179.704,00	-	$ -	0,00	$ -
	4,3	PILOTE D 1,2 m INCLUYE EXCAVACION	M3	85	$ 1.057.497,01	$ 89.887.246,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	4,4	MURO CONTENCION 4000 PSI	M3	114,5	$ 1.266.838,06	$ 145.052.958,00	17,01	$ 21.548.916,00			$ -	17,01	$ 21.548.915,00	-	$ -	0,00	$ -
	4,5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	39239,44419	$ 8.417,16	$ 330.284.844,00	4988,59	$ 41.989.820,00			$ -	3.211,00	$ 27.027.514,00	1.777,59	$ 14.962.306,00	0,00	$ -
	5	**CAPÍTULO 5 OBRAS DE SEÑALIZACION**				**$ 2.205.224,00**		**$ 189.015,00**			**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 189.015,00**
	5,1	LINEA DE DEMARCACION	ML	350	$ 2.362,69	$ 826.940,00	80	$ 189.015,00			$ -		$ -	-	$ -	80,00	$ 189.015,00
	5,2	SEÑAL DE TRANSITO	UN	4	$ 344.570,90	$ 1.378.284,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	6	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				**$ 33.062.737,00**		**$ 33.062.737,00**			**$ -**		**$ 33.062.737,00**		**$ -**		**$ -**
	6,1	AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1	$ 33.062.737,31	$ 33.062.737,00	1	$ 33.062.737,00			$ -	1	$ 33.062.737,00		$ -	0,00	$ -
	NP	**ITEM´S NO PREVISTOS**				**$ -**		**$ 148.411.819,00**			**$ -**		**$ 86.615.959,00**		**$ 61.795.860,00**		**$ -**
	NP1,01	PIEDRA PARA FILTRO	M3	0	$ 100.842,27	$ -	9,25	$ 932.791,00			$ -	6,75	$ 680.685,00	2,50	$ 252.106,00	0,00	$ -
	NP1,04	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0,15	ML	0	$ 961.074,49	$ -	10	$ 9.610.745,00			$ -		$ -	10,00	$ 9.610.745,00	0,00	$ -
	NP1,05	GEOTEXTIL TEJIDO TR-5000	M2	0	$ 55.368,38	$ -	75,65	$ 4.188.618,00			$ -		$ -	75,65	$ 4.188.618,00	0,00	$ -
	NP1,07	GEODREN PLANAR	M2	0	$ 126.375,21	$ -	29,03	$ 3.668.672,00			$ -	29,03	$ 3.668.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	NP1,08	LLENO CON ARENA	M3	0	$ 85.470,80	$ -	8,91	$ 761.545,00			$ -	8,91	$ 761.545,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	PC3(4,4)	TRANSPORTE DE CEMENTO > 10KM	KLK	0	$ 5,22	$ -	796716,4686	$ 4.161.952,00			$ -	407.102,00	$ 2.126.652,00	389.614,47	$ 2.035.299,00	0,00	$ -
	PC3(4,5)	TRANSPORTE HIERRO > 10 KM KG/KM	KLK	0	$ 3,73	$ -	94882,31	$ 354.038,00			$ -	93.182,99	$ 347.698,00	1.699,32	$ 6.341,00	0,00	$ -
	NP1,12	CONCRETO PARA POCETA, CABEZAL, ALETAS Y DESCOLE F'c 21 mpa	M3	0	$ 1.523.270,71	$ -	7,8	$ 11.881.512,00			$ -	7,80	$ 11.881.512,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,13	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL TIPO NOVAFORT DN 36"	ML	0	$ 2.062.737,77	$ -	7	$ 14.439.164,00			$ -	7,00	$ 14.439.164,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,16	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	0	$ 4.069.958,84	$ -	2	$ 8.139.918,00			$ -	2,00	$ 8.139.918,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,17	MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA	ML	0	$ 11.638,80	$ -	14	$ 162.943,00			$ -	14,00	$ 162.943,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,18	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	0	$ 12.051,80	$ -	180	$ 2.169.323,00			$ -	180,00	$ 2.169.323,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,19	CARGUE MAT. EXCV. A MAQUINA (SIN TRANSPORTE)	M3	0	$ 9.190,35	$ -	1202,98	$ 11.055.802,00			$ -	197,00	$ 1.810.498,00	1.005,98	$ 9.245.304,00	0,00	$ -
	PC2(1,12)	ACARREO DE MATERIAL GRANULAR	M3K	0	$ 2.078,69	$ -	36987,2	$ 76.884.796,00			$ -	19448,51	$ 40.427.349,00	17.538,69	$ 36.457.447,00	0,00	$ -
		GRUPO 5 PUNTO CRITICO 2				**$ 1.068.532.027,00**		**$ 492.661.174,00**			**$ -**		**$ 246.654.501,00**		**$ 234.347.656,00**		**$ 12.659.014,00**

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA ACTA DE COBRO PARCIAL 2	CÓDIGO	MINFRA-MN-N-7-FR-1
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	OE
		FECHA	10/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

ACTA No: 5 2.00 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar No.) ☐

CONTRATO No : 1.310-12.13-0326

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5

CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRUJILLO VALLE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 13100259.1-0331

INTERVENTOR: EDUARDO CARDENAS

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 24/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 25/12/2023 (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.992.976.561,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.992.976.561,00

PLAZO ACUMULADO: 13 MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 16/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

Porcentaje Presupuestal Acumulado: 90%

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 15/06/24		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 15/05/24		PRESENTE DE OBRA ACTA No. 2 CON FECHA 10/09/2024		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	1	**CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES**				$ 80.767.318,00		$ 56.290.482,00			$ -		$ 15.433.890,00		$ 40.856.588,00		$ -
	1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	600	$ 4.294,78	$ 2.576.866,00	149,43	$ 641.769,00			$ -	149,43	$ 641.768,00	-	$ -	0,00	$ -
	1,2	ROCERIA	M2	150	$ 10.000,00	$ 1.500.000,00	540	$ 5.400.000,00			$ -	540,00	$ 5.400.000,00	-	$ -	0,00	$ -
	1,3	DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS	ML	100	$ 2.191,04	$ 219.104,00	150	$ 328.656,00			$ -	100,00	$ 219.104,00	50,00	$ 109.552,00	0,00	$ -
	1,4	LIMPIENZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG.	UND	4	$ 135.446,27	$ 541.785,00	4	$ 541.785,00			$ -	1,00	$ 135.446,00	3,00	$ 406.339,00	0,00	$ -
	1,5	DEMOLI CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9	$ 60.655,22	$ 545.897,00	9	$ 545.897,00			$ -		$ -	9,00	$ 545.897,00	0,00	$ -
	1,6	DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14	$ 11.514,18	$ 161.199,00	6	$ 69.085,00			$ -		$ -	6,00	$ 69.085,00	0,00	$ -
	1,7	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	1468	$ 8.425,37	$ 12.368.448,00	25,2	$ 212.320,00			$ -		$ -	25,20	$ 212.319,00	0,00	$ -
	1,8	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	343,85	$ 8.425,37	$ 2.897.065,00	16,8	$ 141.547,00			$ -		$ -	16,80	$ 141.546,00	0,00	$ -
	1,9	Excavacion material comun en seco	M3	100	$ 8.425,37	$ 842.537,00	100	$ 842.537,00			$ -		$ -	100,00	$ 842.537,00	0,00	$ -
	1,10	EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	50	$ 11.350,00	$ 567.500,00	50	$ 567.500,00			$ -		$ -	50,00	$ 567.500,00	0,00	$ -
	1,11	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	50	$ 48.558,96	$ 2.427.948,00	197,87	$ 9.608.361,00			$ -	54,75	$ 2.658.603,00	143,12	$ 6.949.758,00	0,00	$ -
	1,12	TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	30237	$ 1.865,97	$ 56.118.969,00	20146,35	$ 37.391.024,00			$ -	3437,00	$ 6.378.969,00	16.709,35	$ 31.012.055,00	0,00	$ -
	2	**CAPÍTULO 2 - BASES Y RELLENOS**				$ 228.123.283,00		$ 32.170.430,00			$ -		$ 4.769.911,00		$ 16.308.805,00		$ 11.091.715,00
	2,1	CONFORM COMPACT SUBRASANTE	M2	600	$ 3.679,85	$ 2.207.910,00	68,4	$ 251.702,00			$ -	8,40	$ 30.911,00	60,00	$ 220.791,00	0,00	$ -
	2,2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPO	M3	550	$ 73.181,34	$ 40.249.739,00	119,55	$ 8.748.630,00			$ -	47,11	$ 3.447.500,00	72,44	$ 5.301.330,00	0,00	$ -
	2,3	RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TI	M3	55	$ 75.000,00	$ 4.125.000,00	97,2	$ 7.290.000,00			$ -	17,22	$ 1.291.500,00	79,98	$ 5.998.500,00	0,00	$ -
	2,4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR 0.20 mts	M3	180	$ 169.102,24	$ 30.438.403,00	12	$ 2.029.227,00			$ -		$ -	12,00	$ 2.029.227,00	0,00	$ -
	2,5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR 0.30 mts	M3	135	$ 153.275,37	$ 20.692.175,00	18	$ 2.758.956,00			$ -		$ -	18,00	$ 2.758.957,00	0,00	$ -
	2,6	IMPRIMACION	M2	600	$ 3.776,87	$ 2.266.119,00	60	$ 226.612,00			$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 226.612,00
	2,7	RIEGO DE LIGA	M2	600	$ 1.597,01	$ 958.209,00	60	$ 95.821,00			$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 95.821,00
	2,8	SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	125	$ 950.670,90	$ 118.833.862,00	9	$ 8.556.038,00			$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 8.556.038,00
	2,9	ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	4500	$ 1.865,97	$ 8.351.866,00	1192,5	$ 2.213.244,00			$ -		$ -	-	$ -	1192,50	$ 2.213.244,00
	3	**CAPÍTULO 3 - OBRAS DE DRENAJE**				$ 56.230.218,00		$ 34.180.048,00			$ -		$ 1.874.557,00		$ 32.305.489,00		$ -
	3,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	15,4	$ 922.611,94	$ 14.208.224,00	7,29	$ 6.725.841,00			$ -		$ -	7,29	$ 6.725.841,00	0,00	$ -
	3,2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	540	$ 8.417,16	$ 4.545.269,00	1345,5	$ 11.325.295,00			$ -		$ -	1.345,50	$ 11.325.294,00	0,00	$ -
	3,3	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	149,5	$ 4.909,70	$ 734.000,00	47,97	$ 235.518,00			$ -	47,97	$ 235.518,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	3,4	TUB PVC 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	150	$ 84.620,90	$ 12.693.134,00	12,3	$ 1.040.837,00			$ -	12,30	$ 1.040.837,00	-	$ -	0,00	$ -
	3,5	FILTRO GEOCREN(INCLUYE EXCAV Y RELLENO)	ML	200	$ 48.634,33	$ 9.726.866,00	12,3	$ 598.203,00			$ -	12,30	$ 598.202,00	-	$ -	0,00	$ -
	3,6	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	15,45	$ 922.611,94	$ 14.254.354,00	15,45	$ 14.254.354,00			$ -		$ -	15,45	$ 14.254.354,00	0,00	$ -
	3,7	CUNETA EN TIERRA (MANUAL)	ML	32,5	$ 2.103,73	$ 68.371,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	4	**CAPÍTULO 4 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				$ 668.143.247,00		$ 69.038.681,00			$ -		$ 43.093.231,00		$ 25.945.451,00		$ -
	4,1	SOLADO ESPESOR E=0.07M 2500 PSI	M3	13,8	$ 561.120,90	$ 7.743.468,00	0,86	$ 482.564,00			$ -	0,86	$ 482.564,00	-	$ -	0,00	$ -
	4,2	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI	M3	90	$ 1.057.497,01	$ 95.174.731,00	3,44	$ 3.637.789,00			$ -	3,44	$ 3.637.790,00	-	$ -	0,00	$ -
	4,3	PILOTE D 1,2 m INCLUYE EXCAVACION	M3	85	$ 1.057.497,01	$ 89.887.246,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	4,4	MURO CONTENCION 4000 PSI	M3	114,5	$ 1.266.838,06	$ 145.052.958,00	21,9	$ 27.743.754,00			$ -	17,96	$ 22.752.412,00	3,94	$ 4.991.342,00	0,00	$ -
	4,5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	39239,44419	$ 8.417,16	$ 330.284.844,00	4416,52	$ 37.174.574,00			$ -	1.927,07	$ 16.220.465,00	2.489,45	$ 20.954.109,00	0,00	$ -
	5	**CAPÍTULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION**				$ 2.205.224,00		$ 1.567.299,00			$ -		$ -		$ -		$ 1.567.299,00
	5,1	LINEA DE DEMARCACION	ML	350	$ 2.362,89	$ 826.940,00	80	$ 189.015,00			$ -		$ -	-	$ -	80,00	$ 189.015,00
	5,2	SEÑAL DE TRANSITO	UN	4	$ 344.570,90	$ 1.378.284,00	4	$ 1.378.284,00			$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 1.378.284,00
	6	**CAPÍTULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				$ 33.062.737,00		$ 33.062.737,00			$ -		$ 33.062.737,00		$ -		$ -
	6,1	AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1	$ 33.062.737,31	$ 33.062.737,00	1	$ 33.062.737,00			$ -	1	$ 33.062.737,00		$ -	0,00	$ -
	NP	**ITEM´S NO PREVISTOS**				$ -		$ 256.351.497,00			$ -		$ 147.420.175,00		$ 118.931.323,00		$ -
	NP1,02	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	0	$ 961.074,49	$ -	20	$ 19.221.490,00			$ -		$ -	20,00	$ 19.221.490,00	0,00	$ -
	NP1,03	GEOTEXTIL TEJIDO TR-5000	M2	0	$ 55.368,38	$ -	60	$ 3.322.103,00			$ -		$ -	60,00	$ 3.322.103,00	0,00	$ -
	PC2(1,12)	ACARREO DE MATERIAL GRANULAR	M3K	0	$ 2.078,69	$ -	29781,03	$ 61.905.427,00			$ -	10487,00	$ 21.799.186,00	19.294,03	$ 40.106.241,00	0,00	$ -
	NP1,06	PIEDRA PARA FILTRO	M3	0	$ 100.842,27	$ -	9,84	$ 992.288,00			$ -	9,84	$ 992.288,00	-	$ -	0,00	$ -
	PC3(4,4)	TRANSPORTE DE CEMENTO > 10KM	KLK	0	$ 5,22	$ -	4750656,15	$ 24.816.860,00			$ -	268.239,58	$ 1.401.252,00	4.482.416,57	$ 23.415.609,00	0,00	$ -
	PC3(4,5)	TRANSPORTE HIERRO > 10 KM KG/KM	KLK	0	$ 3,73	$ -	122711,39	$ 457.878,00			$ -	41.046,59	$ 153.159,00	81.564,80	$ 304.719,00	0,00	$ -
	NP1,09	CONCRETO PARA POCETA, CABEZAL, ALETAS Y DESCOLE F'c 21 mpa	M3	0	$ 1.523.270,71	$ -	7,8	$ 11.881.512,00			$ -		$ -	7,80	$ 11.881.512,00	0,00	$ -
	NP1,10	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL TIPO NOVAFORT ON 36"	ML	0	$ 2.062.737,77	$ -	8	$ 16.501.902,00			$ -		$ -	8,00	$ 16.501.902,00	0,00	$ -
	NP1,11	ANCLAJE PASIVO 4" INCLUYE CENTRALIZADORES, EXCAVACIÓN EN ROCA, PERFORACIÓN MECANICA CON MARTILLO DE FONDO Y COMPRESOR. NO INCLUYE ACERO NI DADO EN CONCRETO	ML	0	$ 450.379,00	$ -	144	$ 64.854.576,00			$ -	144,00	$ 64.854.576,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,12	INSTALACIÓN REVESTIMIENTO RECUPERABLE 4 1/2" PARA ANCLAJE PASIVO	ML	0	$ 232.689,50	$ -	144	$ 33.507.288,00			$ -	144,00	$ 33.507.288,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,13	INYECCION Y REINYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO PARA ANCLAJE PASIVO, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO	ML	0	$ 95.299,30	$ -	144	$ 13.723.099,00			$ -	144,00	$ 13.723.099,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,16	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	0	$ 4.069.958,84	$ -	2	$ 8.139.918,00			$ -	2,00	$ 8.139.918,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,17	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	0	$ 12.051,80	$ -	180	$ 2.169.323,00			$ -	180,00	$ 2.169.323,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,18	CARGUE MAT. EXCV. A MAQUINA (SIN TRANSPORTE)	M3	0	$ 9.190,35	$ -	528,58	$ 4.857.833,00			$ -	74,00	$ 680.086,00	454,58	$ 4.177.747,00	0,00	$ -

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
ACTA DE COBRO PARCIAL 2

CODIGO	MINFRA-MNIN-7-FR-1			
VERSION	2			
PAGINA				DE
FECHA	10/09/2024 (Dia / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA
ACTA No: 2.00 (Numerar de manera consecutiva)
POR CANTIDADES DE OBRA [x]
POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar No. Y fecha)

CONTRATO No. 1.310-12.13-0326

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5

CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRUJILLO VALLE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 13100259.1-0331
INTERVENTOR: EDUARDO CARDENAS

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses segun contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 24/08/2023 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 25/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo de acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.992.976.561,00 (Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.992.976.561,00

PLAZO ACUMULADO: 13 MESES (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 16/01/2024 (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
Porcentaje Presupuestal Acumulado: 99%

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 15/06/24		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 15/05/24		PRESENTE DE OBRA ACTA No. 2 CON FECHA 10/09/2024		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		GRUPO 5 PUNTO CRITICO 3				**$ 398.147.339,00**		**$ 1.036.174.240,00**			**$ -**		**$ 416.844.584,00**		**$ 608.237.943,00**		**$ 11.091.715,00**
	1	**CAPITULO 1 - PRELIMINARES**				**$ 20.167.456,00**		**$ 61.198.741,00**			**$ -**		**$ 35.897.303,00**		**$ 25.301.439,00**		**$ -**
	1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	ML	500	$ 4.294,78	$ 2.147.388,00	89,1	$ 382.664,00			$ -	89,10	$ 382.665,00	-	$ -	0,00	$ -
	1,2	EXCAVACION DE EXPLANACION CANALES Y PRESTAMOS	M3	558	$ 13.734,33	$ 7.663.755,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	1,3	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	5580	$ 1.855,97	$ 10.356.313,00	32767,61	$ 60.816.077,00			$ -	19135,35	$ 35.514.638,00	13.632,46	$ 25.301.439,00	0,00	$ -
	2	**CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS**				**$ 46.018.235,00**		**$ 386.977.687,00**			**$ -**		**$ 16.495.829,00**		**$ 370.481.856,00**		**$ -**
	2,1	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	45	$ 73.181,34	$ 3.293.160,00	205,38	$ 15.029.984,00			$ -	205,38	$ 15.029.984,00	-	$ -	0,00	$ -
	2,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR	M3	65	$ 169.102,24	$ 10.991.646,00	9	$ 1.521.921,00			$ -		$ -	9,00	$ 1.521.920,00	0,00	$ -
	2,3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR	M3	65	$ 153.275,37	$ 9.962.899,00	12	$ 1.839.304,00			$ -		$ -	12,00	$ 1.839.304,00	0,00	$ -
	2,4	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	11730	$ 1.855,97	$ 21.770.530,00	198595,0462	$ 368.596.478,00			$ -	789,80	$ 1.465.845,00	197.805,25	$ 367.130.632,00	0,00	$ -
	3	**CAPITULO 3 - CORRECCIÓN CAUSE**				**$ 22.776.079,00**		**$ 6.327.437,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 6.327.437,00**		**$ -**
	3,1	RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HRS	98	$ 167.843,28	$ 16.448.642,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	3,2	DESVIACION TEMPORAL CAUCE ANCHO 5.1 A 3 M	ML	45	$ 140.609,70	$ 6.327.437,00	45	$ 6.327.437,00			$ -		$ -	45,00	$ 6.327.437,00	0,00	$ -
	4	**CAPITULO 4 - BOX CULVERT**				**$ 290.529.353,00**		**$ 67.178.146,00**			**$ -**		**$ 32.699.121,00**		**$ 34.479.027,00**		**$ -**
	4,1	SOLADO ESPESOR E=0.01M 3000 PSI 210 MPA	M3	65	$ 561.120,90	$ 36.472.858,00	2,52	$ 1.414.024,00			$ -	2,52	$ 1.414.025,00	-	$ -	0,00	$ -
	4,2	CONCRETO PARA BOXCULVERT 4000 PSI	M3	107,61	$ 1.057.497,01	$ 113.797.254,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	4,3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	15563,57416	$ 8.417,16	$ 131.001.159,00	4484,93	$ 37.750.392,00			$ -	3.615,70	$ 30.433.951,00	869,23	$ 7.316.442,00	0,00	$ -
	4,4	TRANSPORTE DE CEMENTO > 10KM	KLK	1472260	$ 5,22	$ 7.690.910,00	5273922,6	$ 27.550.341,00			$ -	107.923,15	$ 563.778,00	5.165.999,45	$ 26.986.564,00	0,00	$ -
	4,5	TRANSPORTE HIERRO > 10 KM KG/KM	KLK	420002	$ 3,73	$ 1.567.172,00	124188,16	$ 463.389,00			$ -	77.014,44	$ 287.367,00	47.173,72	$ 176.021,00	0,00	$ -
	5	**CAPITULO 5 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				**$ 18.656.716,00**		**$ 18.656.716,00**			**$ -**		**$ 18.656.716,00**		**$ -**		**$ -**
	5,1	AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1	$ 18.656.716,42	$ 18.656.716,00	1	$ 18.656.716,00			$ -	1	$ 18.656.716,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP	**ITEM´S NO PREVISTOS**				**$ -**		**$ 495.835.513,00**			**$ -**		**$ 313.095.615,00**		**$ 171.648.184,00**		**$ 11.091.715,00**
	PC2(1,2)	ROCERIA	M2	0	$ 10.000,00	$ -	300	$ 3.000.000,00			$ -	300,00	$ 3.000.000,00	-	$ -	0,00	$ -
	PC2(1,3)	DESCOLMATACION CUNETAS ZANJAS	ML	0	$ 2.191,04	$ -	150	$ 328.657,00			$ -	150,00	$ 328.657,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,04	DEMOL. ESTRUCTURA EXISTENTE	M3	0	$ 510.878,60	$ -	15	$ 7.663.179,00			$ -		$ -	15,00	$ 7.663.179,00	0,00	$ -
	PC2(1,11)	EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	0	$ 48.558,96	$ -	479,02	$ 23.260.711,00			$ -	243,00	$ 11.799.826,00	236,02	$ 11.460.885,00	0,00	$ -
	PC2(2,1)	CONFORM COMPACT SUBRASANTE	M2	0	$ 3.679,85	$ -	72,6	$ 267.157,00			$ -	25,20	$ 92.732,00	47,40	$ 174.425,00	0,00	$ -
	PC2(2,6)	IMPRIMACION	M2	0	$ 3.776,87	$ -	60	$ 226.612,00			$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 226.612,00
	PC2(2,7)	RIEGO DE LIGA	M2	0	$ 1.597,01	$ -	60	$ 95.821,00			$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 95.821,00
	PC2(2,8)	SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	0	$ 950.670,90	$ -	9	$ 8.556.038,00			$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 8.556.038,00
	PC2(2,9)	ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	0	$ 1.855,97	$ -	1192,5	$ 2.213.244,00			$ -		$ -	-	$ -	1192,50	$ 2.213.244,00
	NP1,08	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	ML	0	$ 961.074,49	$ -	40	$ 38.442.980,00			$ -		$ -	40,00	$ 38.442.980,00	0,00	$ -
	NP1,09	GEOTEXTIL TEJIDO TR-5000	M2	0	$ 55.368,38	$ -	90	$ 4.983.154,00			$ -		$ -	90,00	$ 4.983.154,00	0,00	$ -
	NP1,12	GEOTEXTIL NO TEJIDO TR-3000	M2	0	$ 18.939,80	$ -	70,2	$ 1.329.574,00			$ -		$ -	70,20	$ 1.329.574,00	0,00	$ -
	PC2(3,4)	TUB PVC 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	0	$ 84.620,90	$ -	36	$ 3.046.352,00			$ -	36,00	$ 3.046.352,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,14	PIEDRA PARA FILTRO	M3	0	$ 100.842,27	$ -	28,8	$ 2.904.257,00			$ -	28,80	$ 2.904.257,00	-	$ -	0,00	$ -
	PC2(4,2)	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI	M3	0	$ 1.057.497,01	$ -	10,08	$ 10.659.570,00			$ -	10,08	$ 10.659.570,00	-	$ -	0,00	$ -
	PC2(4,4)	MURO CONTENCION 4000 PSI	M3	0	$ 1.266.838,06	$ -	70,56	$ 89.388.093,00			$ -	34,64	$ 43.881.823,00	35,92	$ 45.506.271,00	0,00	$ -
	NP1,18	CONCRETO PARA POCETA, CABEZAL, ALETAS Y DESCOLE F'c 21 mpa	M3	0	$ 1.523.270,71	$ -	7,8	$ 11.881.512,00			$ -		$ -	7,80	$ 11.881.512,00	0,00	$ -
	NP1,19	TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL TIPO NOVAFORT DN 36"	ML	0	$ 2.062.737,77	$ -	9	$ 18.564.640,00			$ -		$ -	9,00	$ 18.564.640,00	0,00	$ -
	NP1,20	CONCRETO CANAL DE RAPIDAS CON TAPA F'c 21 mpa	ML	0	$ 1.430.745,34	$ -	20	$ 28.614.907,00			$ -		$ -	20,00	$ 28.614.907,00	0,00	$ -
	NP1,21	ANCLAJE ACTIVO 4 INCLUYE CENTRALIZADORES. EXCAVACIÓN EN ROCA, PERFORACIÓN MECANICA CON MARTILLO DE FONDO Y COMPRESOR. NO INCLUYE ACERO NI DADO EN CONCRETO	ML	0	$ 450.379,00	$ -	288	$ 129.709.152,00			$ -	288,00	$ 129.709.152,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,22	INSTALACION REVESTIMIENTO RECUPERABLE 4 1/2" PARA ANCLAJE PASIVO	ML	0	$ 232.689,50	$ -	288	$ 67.014.576,00			$ -	288,00	$ 67.014.576,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,23	INYECCION Y REINYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO PARA ANCLAJE PASIVO. NO INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO	ML	0	$ 95.299,30	$ -	288	$ 27.446.199,00			$ -	288,00	$ 27.446.199,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,24	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	0	$ 4.069.958,84	$ -	2	$ 8.139.918,00			$ -	2,00	$ 8.139.918,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,25	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	0	$ 12.051,80	$ -	180	$ 2.169.323,00			$ -	180,00	$ 2.169.323,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,26	CARGUE MAT. EXCV. A MAQUINA (SIN TRANSPORTE)	M3	0	$ 9.190,35	$ -	645,23	$ 5.929.887,00			$ -	315,90	$ 2.903.230,00	329,33	$ 3.026.657,00	0,00	$ -
		GRUPO 6 PUNTO CRITICO 4				**$ 408.734.101,00**		**$ 874.284.890,00**			**$ -**		**$ 278.336.999,00**		**$ 375.246.935,00**		**$ 20.703.187,00**
	1	**CAPITULO 1 - PRELIMINARES**				**$ 47.859.046,00**		**$ 224.859.756,00**			**$ -**		**$ 13.829.648,00**		**$ 211.030.108,00**		**$ -**
	1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	120	$ 4.294,78	$ 515.373,00	52,2	$ 224.187,00			$ -	52,20	$ 224.187,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1,2	ROCERIA	M2	120	$ 10.000,00	$ 1.200.000,00	60	$ 600.000,00			$ -	60,00	$ 600.000,00	-	$ -	0,00	$ -
	1,3	DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS	ML	90	$ 2.191,04	$ 197.194,00	60	$ 131.463,00			$ -	60,00	$ 131.463,00	-	$ -	0,00	$ -
	1,4	LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG	UND	4	$ 135.446,27	$ 541.785,00	4	$ 541.785,00			$ -		$ -	4,00	$ 541.785,00	0,00	$ -
	1,5	DEMOLI CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9	$ 60.655,22	$ 545.897,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	1,6	DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14	$ 11.514,18	$ 161.199,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	1,7	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	20,7	$ 8.425,37	$ 174.405,00	15,6	$ 131.436,00			$ -		$ -	15,60	$ 131.436,00	0,00	$ -
	1,8	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	27	$ 8.425,37	$ 227.485,00	15,6	$ 131.436,00			$ -		$ -	15,60	$ 131.436,00	0,00	$ -
	1,9	EXCAVACION MATERIAL COMUN EN SECO	M3	864,6978261	$ 8.425,37	$ 7.285.402,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	1,10	EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	383,0869565	$ 11.350,00	$ 4.348.037,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
ACTA DE COBRO PARCIAL 2

CÓDIGO	MINFRA-MN-N-7-FR-1
VERSION	2
PAGINA	DE
FECHA	10/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA
ACTA No $ 2.00 (Numerar de manera consecutiva)
POR CANTIDADES DE OBRA [x]
POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar NO "0")

CONTRATO No 1.310-12 13-0326
OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5
CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRUJILLO VALLE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según codigo vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 13100259.1-0331
INTERVENTOR: EDUARDO CARDENAS

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses segun contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 24/06/2023 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.992.676.561,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.992.676.561,00

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 16/01/2024 (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
Porcentaje Presupuestal Acumulado: 90%

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 15/06/24		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 15/05/24		PRESENTE DE OBRA ACTA No. 2 CON FECHA 10/09/2024		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	1,11	EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	164,7	$ 48.558,96	$ 7.997.660,00	834,8	$ 40.537.016,00			$ -	50,00	$ 2.427.948,00	784,80	$ 38.109.068,00	0,00	$ -
	1,12	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	13289,33478	$ 1.855,97	$ 24.664.609,00	98364,96158	$ 182.562.433,00			$ -	5828,35	$ 10.446.058,00	92.736,61	$ 172.116.383,00	0,00	$ -
	2	**CAPÍTULO 2 - BASES Y RELLENOS**				**$ 64.818.599,00**		**$ 60.293.081,00**			**$ -**		**$ 4.844.254,00**		**$ 36.223.187,00**		**$ 19.225.640,00**
	2,1	CONFORM COMPACT SUBRASANTE	M2	90	$ 3.679,85	$ 331.187,00	86,4	$ 317.939,00			$ -	8,00	$ 29.439,00	78,40	$ 288.500,00	0,00	$ -
	2,2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	390,7826087	$ 73.181,34	$ 28.597.996,00	207,12	$ 15.157.320,00			$ -	44,64	$ 3.266.815,00	162,48	$ 11.890.505,00	0,00	$ -
	2,3	RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	45	$ 75.000,00	$ 3.375.000,00	207,12	$ 15.534.000,00			$ -	20,64	$ 1.548.000,00	186,48	$ 13.986.000,00	0,00	$ -
	2,4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR 0,20 mts	M3	39	$ 169.102,24	$ 6.594.987,00	31,2	$ 5.275.990,00			$ -		$ -	31,20	$ 5.275.990,00	0,00	$ -
	2,5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR 0,30 mts	M3	39	$ 153.275,37	$ 5.977.740,00	31,2	$ 4.782.192,00			$ -		$ -	31,20	$ 4.782.192,00	0,00	$ -
	2,6	IMPRIMACION	M2	150	$ 3.776,87	$ 566.530,00	104	$ 392.794,00			$ -		$ -	-	$ -	104,00	$ 392.794,00
	2,7	RIEGO DE LIGA	M2	360	$ 1.597,01	$ 574.925,00	104	$ 166.089,00			$ -		$ -	-	$ -	104,00	$ 166.089,00
	2,8	SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0,10 mts	M3	17,25	$ 950.670,90	$ 16.399.073,00	15,6	$ 14.830.467,00			$ -		$ -	-	$ -	15,60	$ 14.830.466,00
	2,9	ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	1293,75	$ 1.855,97	$ 2.401.161,00	2067	$ 3.836.290,00			$ -		$ -	-	$ -	2067,00	$ 3.836.290,00
	3	**CAPÍTULO 3 - CORRECCION CAUSE**				**$ 81.136.066,00**		**$ 5.070.652,00**			**$ -**		**$ 1.599.063,00**		**$ 3.471.591,00**		**$ -**
	3,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	80	$ 922.611,94	$ 73.808.955,00	2,75	$ 2.537.183,00			$ -		$ -	2,75	$ 2.537.183,00	0,00	$ -
	3,2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	210	$ 8.417,16	$ 1.767.604,00	36,79	$ 309.667,00			$ -		$ -	36,79	$ 309.667,00	0,00	$ -
	3,3	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	120	$ 4.909,70	$ 589.164,00	48	$ 235.665,00			$ -		$ -	48,00	$ 235.666,00	0,00	$ -
	3,4	TUB PVC 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	30	$ 84.620,90	$ 2.538.627,00	12	$ 1.015.451,00			$ -	12,00	$ 1.015.451,00	-	$ -	0,00	$ -
	3,5	FILTRO GEOCREN(INCLUYE EXCAV Y RELLENO)	ML	50	$ 48.634,33	$ 2.431.716,00	20	$ 972.686,00			$ -	12,00	$ 583.612,00	8,00	$ 389.075,00	0,00	$ -
	4	**CAPÍTULO 4 - CONCRETOS MURO**				**$ 194.786.157,00**		**$ 57.763.775,00**			**$ -**		**$ 57.376.602,00**		**$ 387.173,00**		**$ -**
	4,1	CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17,50 mpa (2500 psi) a 28 dias SOLADO	M3	8,96	$ 561.120,90	$ 5.027.643,00	1,53	$ 858.515,00			$ -	0,84	$ 471.342,00	0,69	$ 387.173,00	0,00	$ -
	4,2	CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	58,2198878	$ 1.057.497,01	$ 61.567.358,00	3,78	$ 3.997.339,00			$ -	3,78	$ 3.997.339,00	-	$ -	0,00	$ -
	4,3	CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	41,19	$ 1.266.838,06	$ 52.181.060,00	23,49	$ 29.758.026,00			$ -	23,49	$ 29.758.026,00	-	$ -	0,00	$ -
	4,4	ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	M3	9030,368696	$ 8.417,16	$ 76.010.096,00	2750,32	$ 23.149.895,00			$ -	2.750,32	$ 23.149.895,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**CAPÍTULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION**				**$ 1.477.517,00**		**$ 1.477.517,00**			**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.477.517,00**
	5,1	LINEA DE DEMARCACION	ML	42	$ 2.362,69	$ 99.233,00	42	$ 99.233,00			$ -		$ -	-	$ -	42,00	$ 99.233,00
	5,2	SEÑAL DE TRANSITO	UN	4	$ 344.570,90	$ 1.378.284,00	4	$ 1.378.284,00			$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 1.378.284,00
	6	**CAPÍTULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				**$ 18.656.716,00**		**$ 18.656.716,00**			**$ -**		**$ 18.656.716,00**		**$ -**		**$ -**
	6,1	AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1	$ 18.656.716,42	$ 18.656.716,00	1	$ 18.656.716,00			$ -	1	$ 18.656.716,00	$ -	$ -	0,00	$ -
	NP	**ITEM´S NO PREVISTOS**				**$ -**		**$ 306.163.393,00**			**$ -**		**$ 182.029.616,00**		**$ 124.133.776,00**		**$ -**
	NP1,02	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0,15	ML	0	$ 662.715,17	$ -	20	$ 13.254.303,00			$ -		$ -	20,00	$ 13.254.303,00	0,00	$ -
	NP1,03	GEOTEXTIL TEJIDO TR-5000	M2	0	$ 55.368,38	$ -	78	$ 4.318.734,00			$ -		$ -	78,00	$ 4.318.734,00	0,00	$ -
	NP1,05	PIEDRA PARA FILTRO	M3	0	$ 100.842,27	$ -	9	$ 907.580,00			$ -	9,00	$ 907.580,00	-	$ -	0,00	$ -
	PC3(4,4)	TRANSPORTE DE CEMENTO > 10KM	KLK	0	$ 5,22	$ -	4607744,15	$ 24.070.305,00			$ -	364.524,25	$ 1.904.231,00	4.243.219,90	$ 22.166.074,00	0,00	$ -
	PC3(4,5)	TRANSPORTE HIERRO > 10 KM KG/KM	KLK	0	$ 3,73	$ -	58808,02	$ 219.433,00			$ -	58.581,82	$ 218.589,00	226,20	$ 844,00	0,00	$ -
	NP1,08	ANCLAJE PASIVO 4" INCLUYE CENTRALIZADORES EXCAVACIÓN EN ROCA, PERFORACIÓN MECANICA CON MARTILLO DE FONDO Y COMPRESOR. NO INCLUYE ACERO NI DADO EN CONCRETO	ML	0	$ 450.379,00	$ -	192	$ 86.472.768,00			$ -	192,00	$ 86.472.768,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,09	INSTALACIÓN REVESTIMIENTO RECUPERABLE 4 1/2" PARA ANCLAJE PASIVO	ML	0	$ 232.689,50	$ -	192	$ 44.676.384,00			$ -	192,00	$ 44.676.384,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,10	INYECCIÓN Y REINYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO PARA ANCLAJE PASIVO. NO INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO	ML	0	$ 95.299,30	$ -	192	$ 18.297.466,00			$ -	192,00	$ 18.297.466,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,11	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	0	$ 4.069.958,84	$ -	2	$ 8.139.918,00			$ -	2,00	$ 8.139.918,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,12	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	0	$ 12.051,80	$ -	180	$ 2.169.323,00			$ -	180,00	$ 2.169.323,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,13	CARGUE MAT. EXCV. A MAQUINA (SIN TRANSPORTE)	M3	0	$ 9.190,35	$ -	1105,52	$ 10.160.111,00			$ -	65,00	$ 597.372,00	1.040,52	$ 9.562.738,00	0,00	$ -
	NP1,16	GEOTEXTIL NO TEJIDO TR-3000	M2	0	$ 18.939,80	$ -	80	$ 1.515.184,00			$ -		$ -	80,00	$ 1.515.184,00	0,00	$ -
	PC2(1,12)	ACARREO DE MATERIAL GRANULAR	M3K	0	$ 2.078,69	$ -	44240,38	$ 91.961.884,00			$ -	8970,08	$ 18.645.985,00	35.270,30	$ 73.315.899,00	0,00	$ -
		GRUPO 5 PUNTO CRITICO 5				**$ 456.272.698,00**		**$ 710.636.523,00**			**$ -**		**$ 358.822.621,00**		**$ 331.850.195,00**		**$ 19.963.709,00**
	1	**CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES**				**$ 33.919.331,00**		**$ 149.595.147,00**			**$ -**		**$ 30.813.788,00**		**$ 118.881.358,00**		**$ -**
	1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	60	$ 4.294,78	$ 343.582,00	150,63	$ 646.922,00			$ -	150,63	$ 646.922,00	-	$ -	0,00	$ -
	1,2	ROCERIA	M2	90	$ 10.000,00	$ 800.000,00	375	$ 3.750.000,00			$ -	300,00	$ 3.000.000,00	75,00	$ 750.000,00	0,00	$ -
	1,3	DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS	ML	60	$ 2.191,04	$ 131.463,00	150	$ 328.657,00			$ -	60,00	$ 131.463,00	90,00	$ 197.194,00	0,00	$ -
	1,4	LIMPIENZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG	UND	4	$ 135.446,27	$ 541.785,00	4	$ 541.785,00			$ -		$ -	4,00	$ 541.785,00	0,00	$ -
	1,5	DEMOLI CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9	$ 60.655,22	$ 545.897,00	9	$ 545.897,00			$ -		$ -	9,00	$ 545.897,00	0,00	$ -
	1,6	DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14	$ 11.514,18	$ 161.199,00	14	$ 161.199,00			$ -		$ -	14,00	$ 161.199,00	0,00	$ -
	1,7	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	13,8	$ 8.425,37	$ 116.270,00	30	$ 252.761,00			$ -		$ -	30,00	$ 252.761,00	0,00	$ -
	1,8	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	18	$ 8.425,37	$ 151.657,00	30	$ 252.761,00			$ -		$ -	30,00	$ 252.761,00	0,00	$ -
	1,9	EXCAVACION MATERIAL COMUN EN SECO	M3	617,6413043	$ 8.425,37	$ 5.203.858,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	1,10	EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	255,3913043	$ 11.350,00	$ 2.898.691,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	1,11	EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	110,7	$ 48.558,96	$ 5.375.476,00	849,03	$ 41.228.009,00			$ -	105,00	$ 5.098.690,00	744,03	$ 36.129.319,00	0,00	$ -
	1,12	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	9509,556522	$ 1.855,97	$ 17.649.453,00	54950,86	$ 101.987.156,00			$ -	11819,54	$ 21.936.713,00	43.131,32	$ 80.050.442,00	0,00	$ -
	2	**CAPÍTULO 2 - BASES Y RELLENOS**				**$ 62.853.885,00**		**$ 69.821.408,00**			**$ -**		**$ 8.076.210,00**		**$ 43.259.006,00**		**$ 18.486.192,00**
	2,1	CONFORM COMPACT SUBRASANTE	M2	60	$ 3.679,85	$ 220.791,00	117	$ 430.543,00			$ -	14,00	$ 51.518,00	103,00	$ 379.025,00	0,00	$ -

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
ACTA DE COBRO PARCIAL 2

CODIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1
VERSION	2
PAGINA	DE
FECHA	10/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

ACTA No: $ 2.00 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar "NO" y "RAZÓN")

CONTRATO No. 1.310-12 13-0326

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5

CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRUJILLO VALLE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 13100259.1-0331

INTERVENTOR: EDUARDO CARDENAS

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses segun contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 24/08/2023 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.992.976.561,00 (Segun contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.992.976.561,00

PLAZO ACUMULADO: 13 MESES (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 16/01/2024 (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

Porcentaje Presupuestal Acumulado: 99%

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 15/06/24		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 15/05/24		PRESENTE DE OBRA ACTA No. 2 CON FECHA 10/09/2024		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	- / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	2,2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	260.5217391	$ 73.181,34	$ 19.065.331,00	326,7	$ 23.908.345,00			$ -	74,40	$ 5.444.692,00	252,30	$ 18.463.653,00	0,00	$ -
	2,3	RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	30	$ 75.000,00	$ 2.250.000,00	231	$ 17.325.000,00			$ -	34,40	$ 2.580.000,00	196,60	$ 14.745.000,00	0,00	$ -
	2,4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR 0,20 mts	M3	31,2	$ 169.102,24	$ 5.275.990,00	30	$ 5.073.067,00			$ -		$ -	30,00	$ 5.073.067,00	0,00	$ -
	2,5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR 0,30 mts	M3	46,8	$ 153.275,37	$ 7.173.287,00	30	$ 4.598.261,00			$ -		$ -	30,00	$ 4.598.261,00	0,00	$ -
	2,6	IMPRIMACION	M2	120	$ 3.776,87	$ 453.224,00	100	$ 377.687,00			$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 377.687,00
	2,7	RIEGO DE LIGA	M2	240	$ 1.597,01	$ 383.284,00	100	$ 159.701,00			$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 159.701,00
	2,8	SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0,10 mts	M3	13,8	$ 950.670,99	$ 13.119.258,00	15	$ 14.260.063,00			$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 14.260.063,00
	2,9	ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	8035	$ 1.865,97	$ 14.912.720,00	1987,5	$ 3.688.741,00			$ -		$ -	-	$ -	1987,50	$ 3.688.741,00
	3	**CAPÍTULO 3 - OBRAS DE DRENAJE**				$ 108.097.988,00		$ 12.109.605,00			$ -		$ 2.665.105,00		$ 9.444.502,00		$ -
	3,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	110	$ 922.611,94	$ 101.487.313,00	8,6	$ 7.934.462,00			$ -		$ -	8,60	$ 7.934.463,00	0,00	$ -
	3,2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	240	$ 8.417,16	$ 2.020.119,00	179,4	$ 1.510.039,00			$ -		$ -	179,40	$ 1.510.039,00	0,00	$ -
	3,3	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	95	$ 4.909,70	$ 466.422,00	0	$ -			$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
	3,4	TUB PVC 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	20	$ 84.620,90	$ 1.692.418,00	20	$ 1.692.418,00			$ -	20,00	$ 1.692.418,00	-	$ -	0,00	$ -
	3,5	FILTRO GEODREN(INCLUYE EXCAV Y RELLENO)	ML	50	$ 48.634,33	$ 2.431.716,00	20	$ 972.686,00			$ -	20,00	$ 972.687,00	-	$ -	0,00	$ -
	4	**CAPÍTULO 4 - CONCRETOS MURO**				$ 231.267.171,00		$ 85.674.557,00			$ -		$ 57.045.012,00		$ 28.629.546,00		$ -
	4,1	CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17,50 mpa (2500 psi) a 28 dias SOLADO	M3	5,7	$ 561.120,90	$ 3.198.389,00	3,32	$ 1.862.921,00			$ -	1,80	$ 1.010.018,00	1,52	$ 852.904,00	0,00	$ -
	4,2	CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	59	$ 1.057.497,01	$ 62.392.324,00	6,8	$ 7.190.980,00			$ -	6,80	$ 7.190.980,00	-	$ -	0,00	$ -
	4,3	CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	28	$ 1.266.838,06	$ 35.471.466,00	17,05	$ 21.599.589,00			$ -	17,05	$ 21.599.589,00	-	$ -	0,00	$ -
	4,4	ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60 000 psi)	M3	15468,98583	$ 8.417,16	$ 130.204.992,00	6536,77	$ 55.021.067,00			$ -	3.236,77	$ 27.244.425,00	3.300,00	$ 27.776.642,00	0,00	$ -
	5	**CAPÍTULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN**				$ 1.477.517,00		$ 1.477.517,00			$ -		$ -		$ -		$ 1.477.517,00
	5,1	LINEA DE DEMARCACION	ML	42	$ 2.362,69	$ 99.233,00	42	$ 99.233,00			$ -		$ -	-	$ -	42,00	$ 99.233,00
	5,2	SEÑAL DE TRANSITO	UN	4	$ 344.570,90	$ 1.378.284,00	4	$ 1.378.284,00			$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 1.378.284,00
	6	**CAPÍTULO 6 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN**				$ 18.656.716,00		$ 18.656.716,00			$ -		$ 18.656.716,00		$ -		$ -
	6,1	AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1	$ 18.656.716,42	$ 18.656.716,00	1	$ 18.656.716,00			$ -	1	$ 18.656.716,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP	**ITEM´S NO PREVISTOS**				$ -		$ 373.201.573,00			$ -		$ 241.565.790,00		$ 131.635.783,00		$ -
	NP1,02	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0,15	M3		$ 662.715,17	$ -	20	$ 13.254.303,00			$ -		$ -	20,00	$ 13.254.303,00	0,00	$ -
	NP1,03	GEOTEXTIL TEJIDO TR-5000	M2		$ 55.368,38	$ -	100	$ 5.536.838,00			$ -		$ -	100,00	$ 5.536.838,00	0,00	$ -
	NP1,05	PIEDRA PARA FILTRO	M3		$ 100.818,27	$ -	16	$ 1.613.092,00			$ -	16,00	$ 1.613.092,00	-	$ -	0,00	$ -
	PC3(4,4)	TRANSPORTE DE CEMENTO > 10KM	KLK		$ 5,22	$ -	4614112,5	$ 24.103.573,00			$ -	335.258,05	$ 1.751.348,00	4.278.854,45	$ 22.352.225,00	0,00	$ -
	PC3(4,5)	TRANSPORTE HIERRO > 10 KM KG/KM	KLK		$ 3,73	$ -	143054,42	$ 533.785,00			$ -	68.943,20	$ 257.251,00	74.111,22	$ 276.534,00	0,00	$ -
	NP1,08	ANCLAJE PASIVO 4" INCLUYE CENTRALIZADORES, EXCAVACIÓN EN ROCA, PERFORACIÓN MECANICA CON MARTILLO DE FONDO Y COMPRESOR. NO INCLUYE ACERO NI DADO EN CONCRETO	ML		$ 450.379,00	$ -	252	$ 113.495.508,00			$ -	252,00	$ 113.495.508,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,09	INSTALACIÓN REVESTIMIENTO RECUPERABLE 4 1/2" PARA ANCLAJE PASIVO	ML		$ 232.689,50	$ -	252	$ 58.637.754,00			$ -	252,00	$ 58.637.754,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,10	INYECCIÓN Y REINYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO PARA ANCLAJE PASIVO. NO INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO	ML		$ 95.299,30	$ -	252	$ 24.015.424,00			$ -	252,00	$ 24.015.424,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,14	GEOTEXTIL NO TEJIDO TR-3000	M2		$ 18.939,80	$ -	78	$ 1.477.305,00			$ -		$ -	78,00	$ 1.477.305,00	0,00	$ -
	NP1,15	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND		$ 4.069.958,84	$ -	2	$ 8.139.918,00			$ -	2,00	$ 8.139.918,00	-	$ -	0,00	$ -

	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA ACTA DE COBRO PARCIAL 2	CODIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	2
		PAGINA	DE
		FECHA	10/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

ACTA No: $ 2.00 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [✓]

POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1.310-12.13-0326

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5

CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRUJILLO VALLE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 13100259.1-0331

INTERVENTOR: EDUARDO CARDENAS

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses segun contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 24/08/2023 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.992.976.561,00 (Segun contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.992.976.561,00

PLAZO ACUMULADO: 13 MESES (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 16/01/2024 (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

Porcentaje Presupuestal Acumulado: 90%

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 15/06/24		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 15/05/24		PRESENTE DE OBRA ACTA No. 2 CON FECHA 10/09/2024		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP1,16	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2		$ 12.051,80	$ -	180	$ 2.169.323,00			$ -	180,00	$ 2.169.323,00	-	$ -	0,00	$ -
	NP1,17	CARGUE MAT. EXCV. A MAQUINA (SIN TRANSPORTE)	M3		$ 9.190,35	$ -	1220,89	$ 11.220.401,00			$ -	136,50	$ 1.254.482,00	1.084,39	$ 9.965.919,00	0,00	$ -
	PC2(1,12)	ACARREO DE MATERIAL GRANULAR	M3K		$ 2.078,69	$ -	52439,05	$ 109.004.349,00			$ -	14543,65	$ 30.231.690,00	37.895,40	$ 78.772.659,00	0,00	$ -
Ajuste al peso																	
-		COSTOS DIRECTOS				$ 3.400.218.602,00		$ 3.400.218.602,00			$ -		$ 1.528.664.248,00		$ 1.784.209.719,00		$ 87.344.635,00
-		COSTOS ADMINISTRACION (28%)				$ 952.061.209,00		$ 952.061.209,00			$ -		$ 428.025.989,00		$ 499.578.721,00		$ 24.456.498,00
-		COSTOS IMPREVISTOS (1%)				$ 34.002.186,00		$ 34.002.186,00			$ -		$ 15.286.642,00		$ 17.842.097,00		$ 873.446,00
-		UTILIDAD (5%)				$ 170.010.930,00		$ 170.010.930,00			$ -		$ 76.403.212,00		$ 89.210.486,00		$ 4.367.232,00
-		COSTO SUBTOTAL DEL PROYECTO				$ 4.556.292.927,00		$ 4.556.292.927,00			$ -		$ 2.048.410.092,00		$ 2.390.841.023,00		$ 117.041.811,00
-		COMPONENTE AMBIENTAL -PMA- PAGA - (SI APLICA)				$ 179.916.400,68		$ 179.916.400,68									$ 179.916.400,68
-		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT - (SI APLICA)				$ 179.916.400,68		$ 179.916.400,68									$ 179.916.400,68
-		IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%*28%)				$ 76.850.833,00		$ 76.850.833,00					$ 76.850.833,00				$ -
-		VALOR TOTAL				$ 4.992.976.561,00		$ 4.992.976.561,00			$ -		$ 2.125.260.925,00		$ 2.390.841.023,00		$ 476.874.612,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

RESUMEN DE ANTICIPO		
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	50%	$ 2.496.488.280,50
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR A AMORTIZAR EN LA PRESENTE ACTA	50%	$ 1.195.420.511,50
VALOR AMORTIZADO ACTA N1		$ 1.062.630.462,50
SALDO POR AMORTIZAR EN SIGUIENTES ACTAS		$ 238.437.306,50
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 1.195.420.511,50

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: VALERIA ALEXANDRA ZAPATA
Representante Legal Vida Nueva Arquitectura e Ingenieria
Contratista

Firma:
Nombre: EDUARDO CARDENAS
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

Firma:
Nombre: ALFREDO ALMEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	**2**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 1				
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. - GRUPO 5				
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA				
ITEM 1,5	DEMOLI.CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)			**UNIDAD**	M3

	OBSERVACION	UNIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL	ESQUEMA
			Largo	Ancho	Alto				
	Alcantarilla existe	M3	1,90	1,80	2,28		1	7,80	
							1	0,00	
							TOTAL	7,80	

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 1		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM 1,6	DEMOL.ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	UNIDAD	ML

	OBSERVACION	UNIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL	ESQUEMA
			Largos	Anchos	Alto				
	DEMOL.ALCANTARILLAS (INCLUYE	M2	1,8	1,8	2,16		1	7,00	
							1	0,00	
							1	0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	7,00	

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 1		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM 1,7	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	UNIDAD	M3

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES Largos	Anchos	Alto	PROFUNDIDAD	VOLUMEN	SUBTOTAL	ESQUEMA
	BASE EXISTENTE	1	12,3	6.15	0,1		7,5645	7,56	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	7,56	

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 1		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM 1,8	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	UNIDAD	M3

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES Largos	Anchos	Alto	PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL	ESQUEMA
	Subbase existente	1	12,3	6,15	0,2		1	15,13	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	15,13	

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 1		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM 1,11	EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	UNIDAD	M3

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	Factor expansion	DIMENSIONES			VOLUMEN	# DE VECES	SUBTOTAL
			Largos	Anchos	Alto			
	EXCAVACION	1,3	6,00	2,80	4,60		1	100,46
	EXCAVACION DE LIMPIEZA	1,3	82,00	0,80	0,80			68,22
	EXCAVCION PARA MANEJO DE AGUA (AGUAS ARRIBA)	1,3	205	0,6	0,4			63,96
	EXCAVCION PARA MANEJO DE AGUA (AGUAS ABAJO)	1,3	180	0,6	0,4			56,16
	EXCAVACION PARA ZAPATA	1,3	8,00	4,00	0,60			24,96
	EXCAVACION ZONA LLENO	1,3	6,00	3,00	3,80			88,92
	EXCAVACION ADICIONAL POR DESLIZAMIENTO DE TALUD	1,3				283,69		368,80
							TOTAL	771,49

ESQUEMA



Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 1			
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5			
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA			
ITEM 1,12	TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS		UNIDAD	M3-KM

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL
			FM	VOLUMEN	Alto			
	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	45,7	1,3	771,49			45834,22	45834,22
	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	45,7	1,3	7.56			449,14	449,14
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	45,7	1,3	2,707			160,81	565,85
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
							TOTAL	46849,21

ESQUEMA

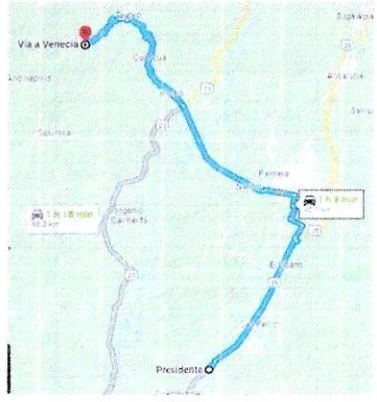

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:


EDUARDO CARDENAS

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 1				
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5				
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA				
ITEM 2,1	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE		UNIDAD	M3-KM	

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO			
	SUBRASANTE	1	12,3	6.15			75,65	75,65
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
							TOTAL	75,65

ESQUEMA

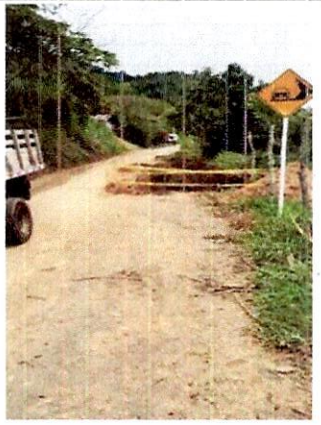

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 1			
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5			
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA			
ITEM 2,2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	UNIDAD	M3	

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO			
	SUBRASANTE	1	12,3	6.15			75,65	75,65
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
							TOTAL	75,65

ESQUEMA

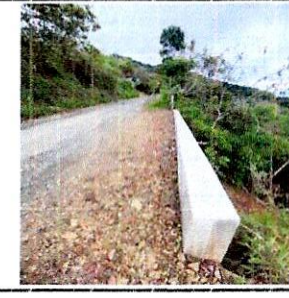

Elaboró:
R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:
EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 1		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM 2,3	RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	UNIDAD	M3

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			AREA	# DE VECES	SUBTOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO			
	SUBRASANTE	1	4,74	2,00	3,8	36,00	1	36,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
							TOTAL	36,00

ESQUEMA



Elaboró:

Elaboró:

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 1		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM 2,4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR 0.20 mts	UNIDAD	M3

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL
			Largos	Anchos	Alto			
	Subbase existente	1	20	6.15	0,3		1	36,90
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
							TOTAL	36,90

ESQUEMA

Elaboró:
R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:
EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 2		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM 1,3	DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS.	UNIDAD	ML

	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL
			Largo	Ancho	Alto			
	DESCOLMATACION CUNETAS,	1	50,00				1,00	50,00
							TOTAL	50,00

ESQUEMA



Elaboró:
R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:
EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 2		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM 1,4	LIMPIENZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG	UNIDAD	ML

	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	UND	SUBTOTAL	ESQUEMA
			Largo	Ancho	Alto				
	LIMPIENZA ALCANTARILLAS	1					3,00	3,00	
							TOTAL	3,00	

Elaboró:
R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:
EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 2			
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5			
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA			
ITEM 1,5	DEMOLICAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	UNIDAD	M3	

	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL	ESQUEMA
			Largo	Ancho	Alto				
	DEMOLICION DE ENCOLE	1	1,70	1,47	2,00		5,00	5,00	
	DEMOLICION DE DESCOLE	1	1,36	1,47	2,00		4,00	4,00	
							TOTAL	9,00	

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO		PUNTO CRITICO No. 2	
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM 1,6	DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	UNIDAD	ML

	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL	ESQUEMA
			Largos	Anchos	Alto				
	DEMOLICION TUBERIA	M2	6,00				1	6,00	
							1	0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	6,00	

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 2		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM 1,7	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	UNIDAD	M3
	ML		

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL	ESQUEMA
			Largos	Anchos	Alto				
	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	1	20,0	3,0	0,3		1	25,20	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	25,20	

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 2		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM 1.8	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	UNIDAD	M3

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL	ESQUEMA
			Largos	Anchos	Alto				
	EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	1,4	20,00	3,00	0,20		16,8	16,80	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	16,80	

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 2				
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5				
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA				
ITEM 1,9	Excavacion material comun en seco			UNIDAD	M3

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			VOLUMEN	# DE VECES	SUBTOTAL	ESQUEMA
			LARGO	ANCHO	ALTO				
	EXCAVACION MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	1,3	32,1	3,0	0,8		1	100,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	100,00	

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 3			
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5			
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA			
ITEM 2,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR		UNIDAD	M3

	OBSERVACION	UNIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL	ESQUEMA
			Largo	Ancho	Alto				
	BASSE GRANULAR	M3	20,0	3,0	0,15		1	9,00	
							TOTAL	9,00	

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 3		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM 2,3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR	UNIDAD	M3

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	UNIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL	ESQUEMA
			DISTANCIA	FM	Volumen				
	SUBBASE	DEL 30 DE JUNIO AL 10	20	3.00	0,20			12,00	
							TOTAL	12,00	

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 3		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERÍA		
ITEM 3,2	DESVIACIÓN TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3 M	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	UNIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL	ESQUEMA
			Largos	Anchos	Área				
	DESVIACIÓN TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3 M	ML	45				1	45,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	45,00	

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 3		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM NP1,04	DEMOL. ESTRUCTURA EXISTENTE	UNIDAD	M3

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			VOLUMEN	# DE VECES	SUBTOTAL	ESQUEMA
			LARGO	Anchos	Alto				
	DEMOLCION TUBERIA	1				6,00	1	6,00	
	DEMOLICION DE ENCOLE	1				5,00	1	5,00	
	DEMOLICION DE DESCOLE	1				4,00	1	4,00	
							TOTAL	15,00	

Elaboró:

R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:

EDUARDO CARDENAS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROYECTO	PUNTO CRITICO No. 3		
OBJETO	OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 5		
CONTRATISTA	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
ITEM NP1,08	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	UNIDAD	ML

FECHA aaaa-mm-dd	OBSERVACION	UNIDAD	DIMENSIONES			PROFUNDIDAD	# DE VECES	SUBTOTAL	ESQUEMA
			Largos	Anchos	Alto				
	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	ML	20				1	20,00	
	0	ML	20				1	20,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	40,00	

Elaboró:
R.L VALERIA ALEXABDRA ZAPATA

Revisó y aprobó:
EDUARDO CARDENAS
