

Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
0	0	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE PALACIOS DE JUSTICIA**	**$ 332.565.173,00**		**97 días**	**19/06/24**	**2/11/24**	
1	1	**INICIO OBRA**	**$ 0,00**		**0 días**	**19/06/24**	**19/06/24**	**315CC+21 días**
2	2	**INICIO CHALAN**	**$ 0,00**	**164CC+7 días**	**0 días**	**13/08/24**	**13/08/24**	**5CC;49CC+4 días**
3	3	**PALACIO DE JUSTICIA DE CHALÁN**	**$ 42.709.367,00**		**25 días**	**13/08/24**	**14/09/24**	
4	3.1	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**	**$ 6.423.263,00**		**6 días**	**13/08/24**	**22/08/24**	
5	3.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO INCLUYE PEPENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA, RETIRO Y DISPOSICION DE MANTO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COR	$ 6.423.263,00	2CC	6 días	13/08/24	22/08/24	19CC+2 días;47;35CC;21C
6	3.2	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 0,00**		**0 días**	**13/08/24**	**13/08/24**	
7	3.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE F	$ 0,00	2CC	0 días	13/08/24	13/08/24	
8	3.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 24.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO B O C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COB	$ 0,00	2CC	0 días	13/08/24	13/08/24	
9	3.3	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 659.811,00**		**2 días**	**5/09/24**	**9/09/24**	

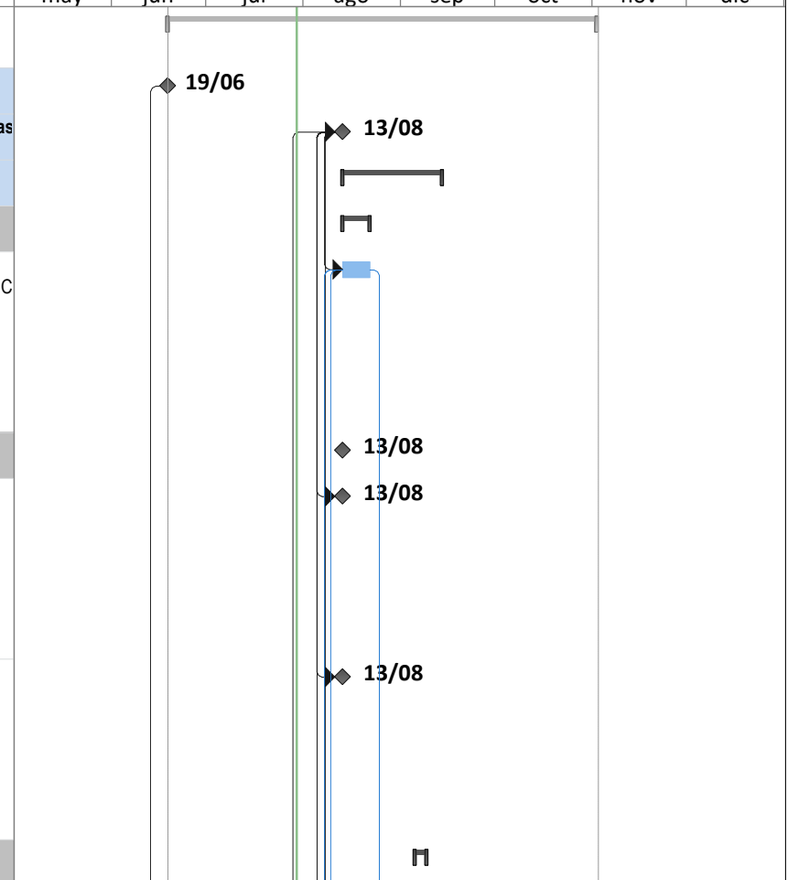

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
10	3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	$ 659.811,00	17	2 días	5/09/24	9/09/24	42
11	**3.4**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 871.243,00**		**2 días**	**15/08/24**	**20/08/24**	
12	3.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCES(	$ 871.243,00	19CC	2 días	15/08/24	20/08/24	14CC+2 días
13	**3.5**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 671.750,00**		**4 días**	**20/08/24**	**24/08/24**	
14	3.5.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFE(	$ 671.750,00	12CC+2 días	4 días	20/08/24	24/08/24	18
15	**3.6**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 20.671.805,00**		**16 días**	**15/08/24**	**5/09/24**	
16	3.6.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 3.802.815,00	19;30	5 días	24/08/24	30/08/24	17
17	3.6.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 8.752.469,00	16	5 días	30/08/24	5/09/24	10
18	3.6.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MAN(	$ 3.683.827,00	14	5 días	24/08/24	30/08/24	39
19	3.6.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 4.432.694,00	5CC+2 días	5 días	15/08/24	23/08/24	16;29CC;41CC;12
20	**3.7**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**$ 61.360,00**		**2 días**	**13/08/24**	**15/08/24**	
21	3.7.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	$ 61.360,00	5CC	2 días	13/08/24	15/08/24	48

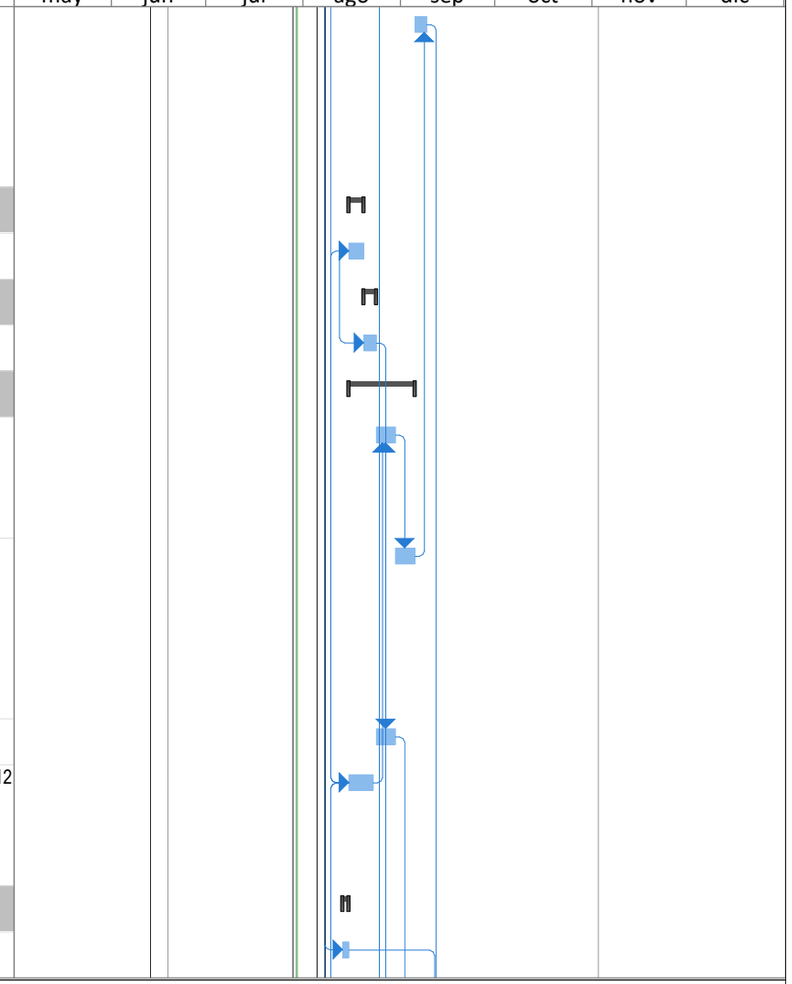

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
22	**3.8**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**$ 286.194,00**		**9 días**	**13/08/24**	**26/08/24**	
23	3.8.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION	$ 138.465,00	37	2 días	22/08/24	24/08/24	27CC
24	3.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALI	$ 0,00	2CC	0 días	13/08/24	13/08/24	
25	3.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JAB	$ 0,00	2CC	0 días	13/08/24	13/08/24	
26	3.8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALI	$ 0,00	2CC	0 días	13/08/24	13/08/24	
27	3.8.5	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFE	$ 147.729,00	23CC	3 días	22/08/24	26/08/24	48
28	**3.9**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 406.922,00**		**6 días**	**15/08/24**	**24/08/24**	
29	3.9.1	SUMISNISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DO	$ 78.762,00	19CC	4 días	15/08/24	22/08/24	48
30	3.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200 W IP65 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE REFLECTOR EXISTENTE EN EL DEPOSITO QUE AUTORICE LA SUPERVISION".	$ 328.160,00	41CC+2 días	4 días	20/08/24	24/08/24	16
31	**3.10**	**CARPINTERIA METALICA**	**$ 0,00**		**0 días**	**13/08/24**	**13/08/24**	
32	3.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLA	$ 0,00	2CC	0 días	13/08/24	13/08/24	
33	3.10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLA	$ 0,00	2CC	0 días	13/08/24	13/08/24	
34	**3.11**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 1.104.520,00**		**6 días**	**13/08/24**	**22/08/24**	
35	3.11.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTA	$ 431.879,00	5CC	4 días	13/08/24	20/08/24	36CC
36	3.11.2	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTA	$ 431.879,00	35CC	4 días	13/08/24	20/08/24	37
37	3.11.3	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE	$ 240.762,00	36	2 días	20/08/24	22/08/24	23
38	**3.12**	**SEGURIDAD**	**$ 403.721,00**		**2 días**	**30/08/24**	**2/09/24**	
39	3.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURI	$ 403.721,00	18	2 días	30/08/24	2/09/24	48
40	**3.13**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 10.362.483,00**		**23 días**	**15/08/24**	**14/09/24**	

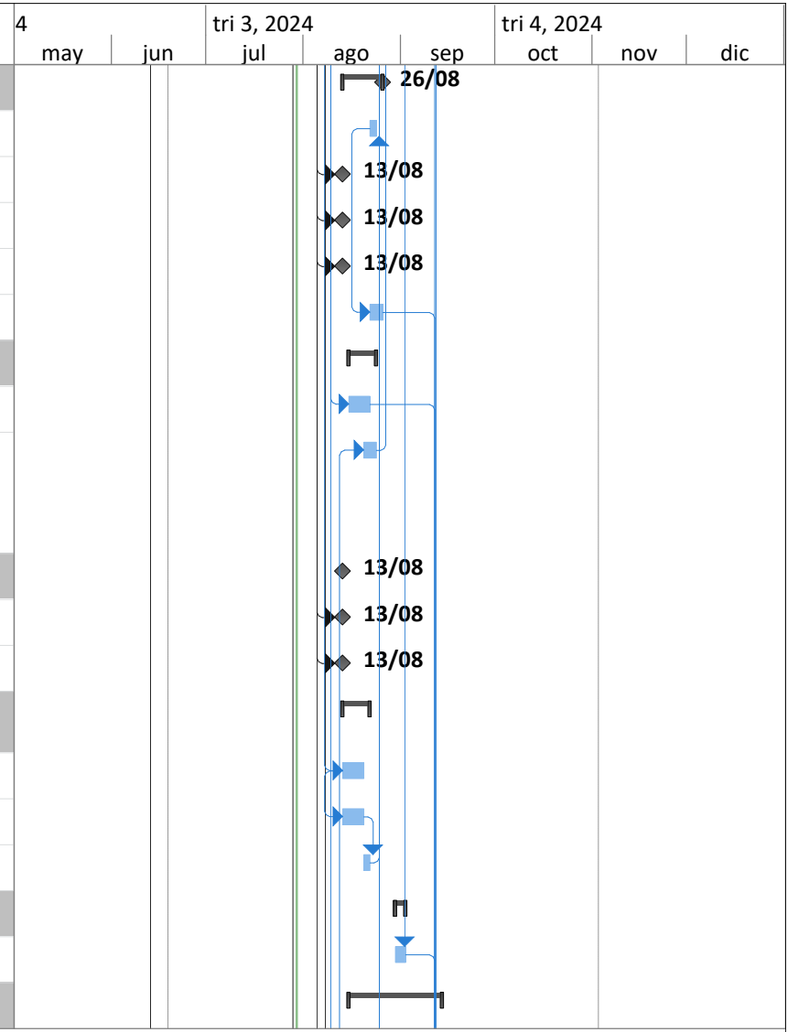

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Progress
Progreso manual


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
41	3.13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE RACK 18 RU	$ 838.249,00	19CC	4 días	15/08/24	22/08/24	30CC+2 días
42	3.13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALIC	$ 9.126.800,00	10	2 días	9/09/24	11/09/24	43;44
43	3.13.3	SUMINISTRO E INSTALACION ESTANTERÍA METÁLICA 2	$ 328.468,00	42	2 días	11/09/24	13/09/24	48
44	3.13.4	APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA PARA SELLADO DE	$ 68.966,00	42	3 días	11/09/24	14/09/24	48
45	**3.14**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 786.295,00**		**12 días**	**13/08/24**	**29/08/24**	
46	3.14.1	PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PA	$ 0,00	2CC	0 días	13/08/24	13/08/24	
47	3.14.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 786.295,00	5	6 días	22/08/24	29/08/24	48
48	**4**	**FIN CHALAN**	**$ 0,00**	**27;29;47;43;44;21;**	**0 días**	**14/09/24**	**14/09/24**	**357;118**
49	**5**	**INICIO PALMITO**	**$ 0,00**	**2CC+4 días**	**0 días**	**20/08/24**	**20/08/24**	**53CC;93CC;70CC**
50	**6**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN ANTONIO DE PALMITO**	**$ 46.423.442,00**		**31 días**	**20/08/24**	**26/09/24**	
51	**6.1**	**CUBIERTA**	**$ 4.852.204,00**		**16 días**	**20/08/24**	**9/09/24**	
52	6.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
53	6.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA	$ 1.410.027,00	49CC	8 días	20/08/24	29/08/24	54;56CC;72CC
54	6.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 3.442.177,00	53	8 días	29/08/24	9/09/24	116
55	**6.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 1.353.514,00**		**4 días**	**20/08/24**	**24/08/24**	
56	6.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONA	$ 864.585,00	53CC	4 días	20/08/24	24/08/24	57CC
57	6.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICION	$ 488.929,00	56CC	4 días	20/08/24	24/08/24	86CC
58	**6.3**	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 384.890,00**		**2 días**	**16/09/24**	**18/09/24**	
59	6.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITU	$ 384.890,00	68	2 días	16/09/24	18/09/24	117
60	**6.4**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 880.917,00**		**6 días**	**27/08/24**	**3/09/24**	
61	6.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO	$ 461.246,00	70	3 días	27/08/24	30/08/24	62CC

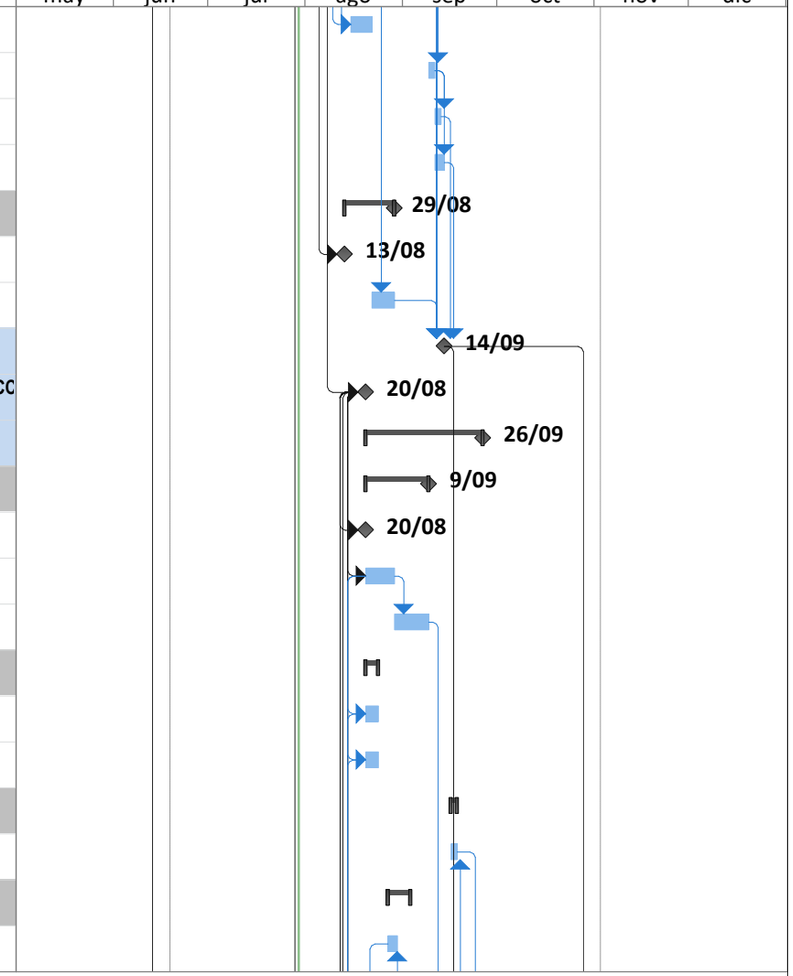

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
62	6.4.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDEN	$ 220.309,00	61CC	3 días	27/08/24	30/08/24	63
63	6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ESMERILADO P	$ 199.362,00	62	3 días	30/08/24	3/09/24	117
64	**6.5**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 354.571,00**		**2 días**	**20/08/24**	**22/08/24**	
65	6.5.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFEC	$ 354.571,00	115CC	2 días	20/08/24	22/08/24	69
66	**6.6**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 7.609.770,00**		**22 días**	**20/08/24**	**16/09/24**	
67	6.6.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MAN(	$ 1.787.214,00	70	8 días	27/08/24	5/09/24	68
68	6.6.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PA	$ 5.133.684,00	67	8 días	5/09/24	16/09/24	59
69	6.6.3	PINTURA ESMALTE EXTERIOR COLOR IGUAL O SIMILAR	$ 293.954,00	65	8 días	22/08/24	31/08/24	117
70	6.6.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR,	$ 394.918,00	49CC	6 días	20/08/24	27/08/24	115CC;67;61
71	**6.7**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**$ 1.047.551,00**		**4 días**	**20/08/24**	**24/08/24**	
72	6.7.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	$ 80.245,00	53CC	4 días	20/08/24	24/08/24	73CC
73	6.7.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA	$ 967.306,00	72CC	4 días	20/08/24	24/08/24	117
74	**6.8**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**$ 55.386,00**		**12 días**	**20/08/24**	**3/09/24**	
75	6.8.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION	$ 55.386,00	87	4 días	29/08/24	3/09/24	117
76	6.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALI	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
77	6.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JAB	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
78	6.8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALI	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
79	**6.9**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 378.989,00**		**10 días**	**20/08/24**	**31/08/24**	
80	6.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUA	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
81	6.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REI	$ 51.952,00	115	5 días	26/08/24	31/08/24	82CC
82	6.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200 V	$ 327.037,00	81CC	5 días	26/08/24	31/08/24	117

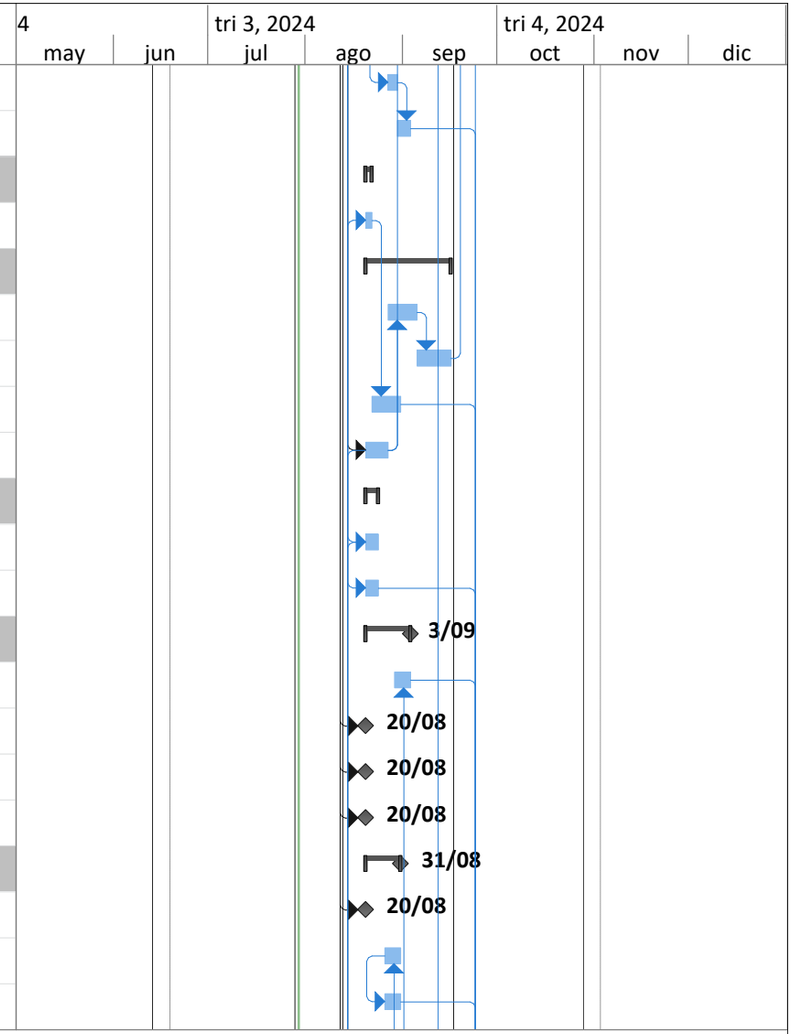

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
83	**6.10**	**JARDINERIA VERTICAL EN FACHADA**	**$ 0,00**		**0 días**	**20/08/24**	**20/08/24**	
84	6.10.1	PLANTAS ARTIFICALES PARA JARDIN VERTICAL	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
85	**6.11**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 672.640,00**		**8 días**	**20/08/24**	**29/08/24**	
86	6.11.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTA	$ 431.878,00	57CC	4 días	20/08/24	24/08/24	87
87	6.11.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA , INCLUYE TOI	$ 240.762,00	86	4 días	24/08/24	29/08/24	75
88	**6.12**	**SEGURIDAD**	**$ 0,00**		**0 días**	**20/08/24**	**20/08/24**	
89	6.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURII	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
90	**6.13**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 27.812.591,00**		**31 días**	**20/08/24**	**26/09/24**	
91	6.13.1	PODA ARBOL VECINO	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
92	6.13.2	LIMPIEZA CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE CERI	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
93	6.13.3	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO INCLUYE CORTE	$ 654.134,00	49CC	3 días	20/08/24	23/08/24	94
94	6.13.4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	$ 1.138.197,00	93	4 días	23/08/24	28/08/24	95
95	6.13.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO EN MATERIA	$ 151.991,00	94	2 días	28/08/24	30/08/24	96
96	6.13.6	SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN DE AC	$ 9.562.015,00	95	9 días	30/08/24	11/09/24	97CC+2 días
97	6.13.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLADO EN CONCRET	$ 1.093.813,00	96CC+2 días	3 días	2/09/24	5/09/24	98
98	6.13.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPa	$ 6.665.665,00	97	4 días	5/09/24	11/09/24	99
99	6.13.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPa	$ 4.847.756,00	98	4 días	11/09/24	16/09/24	100
100	6.13.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPa	$ 1.136.193,00	99	4 días	16/09/24	20/09/24	101
101	6.13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO D	$ 804.522,00	100	3 días	20/09/24	24/09/24	102
102	6.13.12	PAÑETE IMPERMEABILIZADO DOSIFICACIÓN 1:4	$ 1.758.305,00	101	2 días	24/09/24	26/09/24	117

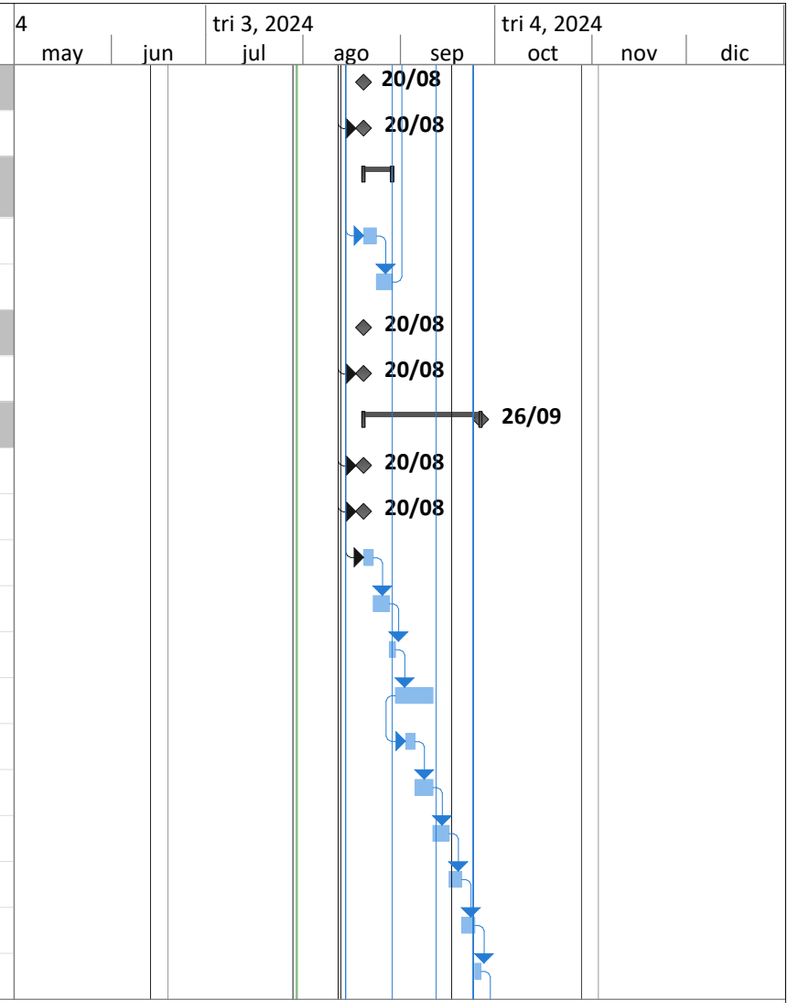

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
103	**6.14**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 1.020.419,00**		**20 días**	**20/08/24**	**13/09/24**	
104	6.14.1	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRE	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
105	6.14.2	DEMOLICION DE VIGAS Y/O COLUMNETAS DE CONFINAI	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
106	6.14.3	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIO	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
107	6.14.4	CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
108	6.14.5	CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
109	6.14.6	TRASIEGO (MATERIAL SOBRANTE Y MATERIAL DE CONS	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
110	6.14.7	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISP	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
111	6.14.8	CASETA PARA ELECTROBOMBA DE 0,6 X 0,6 X 0,6 DIMEI	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
112	6.14.9	SUMINISTRO E INSTALACIONDE ELECTROBOMBA DE 1/	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
113	6.14.10	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 CM	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
114	6.14.11	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	$ 0,00	49CC	0 días	20/08/24	20/08/24	
115	6.14.12	CIELO RASO PLANO EN PVC E=7MM. INCLUYE ARMADU	$ 234.124,00	70CC	5 días	20/08/24	26/08/24	65CC;81
116	6.14.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 786.295,00	54	4 días	9/09/24	13/09/24	117
117	**7**	**FIN PALMITO**	**$ 0,00**	**116;82;102;69;63;5**	**0 días**	**26/09/24**	**26/09/24**	**357**
118	**8**	**INICIO SAMPUES**	**$ 0,00**	**48**	**0 días**	**14/09/24**	**14/09/24**	**122CC;121CC;12**
119	**9**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUÉS**	**$ 33.160.592,00**		**17 días**	**14/09/24**	**5/10/24**	
120	**9.1**	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**	**$ 6.500.112,00**		**9 días**	**14/09/24**	**25/09/24**	
121	9.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 0,00	118CC	0 días	14/09/24	14/09/24	
122	9.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 6.500.112,00	118CC	9 días	14/09/24	25/09/24	139CC;162FC+2 d
123	**9.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 1.152.780,00**		**3 días**	**14/09/24**	**18/09/24**	

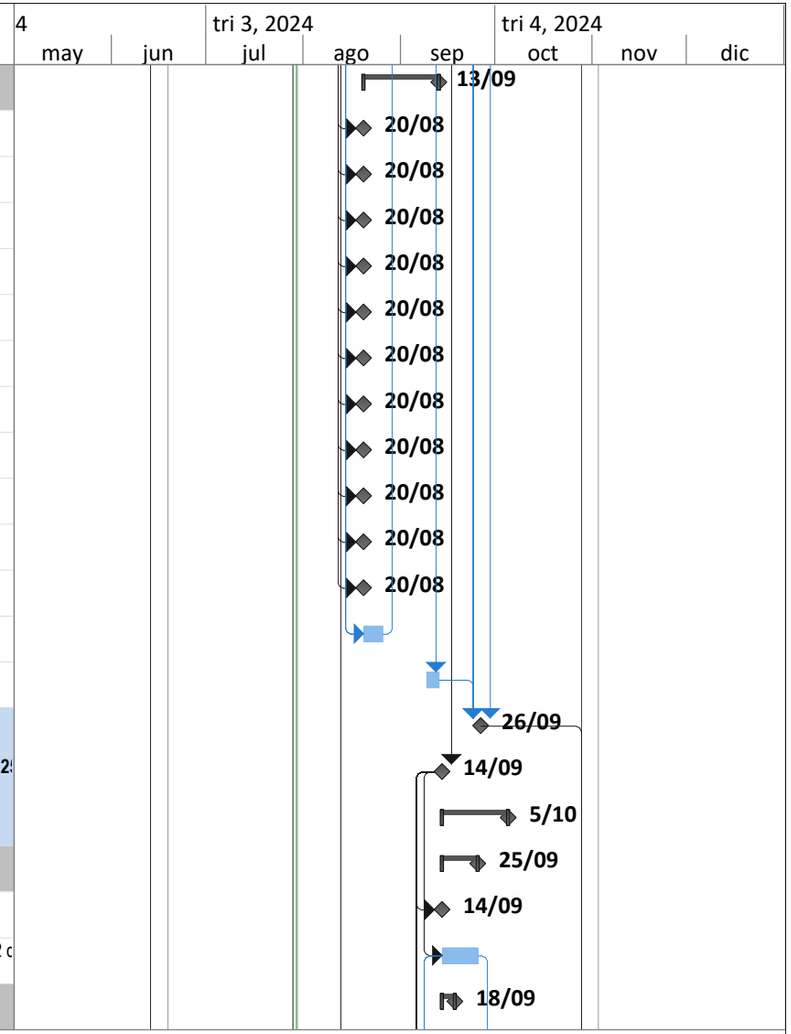

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
124	9.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONA	$ 1.152.780,00	122CC	3 días	14/09/24	18/09/24	137CC+2 días;161
125	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAM	$ 0,00	118CC	0 días	14/09/24	14/09/24	
126	**9.3**	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 384.890,00**		**2 días**	**24/09/24**	**26/09/24**	
127	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITU	$ 384.890,00	135	2 días	24/09/24	26/09/24	163
128	**9.4**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 2.713.200,00**		**4 días**	**14/09/24**	**19/09/24**	
129	9.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO	$ 0,00	118CC	0 días	14/09/24	14/09/24	
130	9.4.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORA	$ 0,00	118CC	0 días	14/09/24	14/09/24	
131	9.4.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLA	$ 2.713.200,00	137CC	2 días	17/09/24	19/09/24	134
132	9.4.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE CERRADUF	$ 0,00	118CC	0 días	14/09/24	14/09/24	
133	**9.5**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 16.677.919,00**		**11 días**	**17/09/24**	**1/10/24**	
134	9.5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MAN	$ 3.972.783,00	131	4 días	19/09/24	24/09/24	135CC
135	9.5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PA	$ 7.205.158,00	134CC	4 días	19/09/24	24/09/24	127;158;149CC
136	9.5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MAN	$ 2.932.053,00	153	4 días	25/09/24	1/10/24	163
137	9.5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR,	$ 2.567.925,00	124CC+2 días	4 días	17/09/24	21/09/24	131CC
138	**9.6**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**$ 95.415,00**		**3 días**	**14/09/24**	**18/09/24**	
139	9.6.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	$ 95.415,00	122CC	3 días	14/09/24	18/09/24	155CC+2 días
140	**9.7**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**$ 1.254.210,00**		**10 días**	**14/09/24**	**26/09/24**	
141	9.7.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION	$ 0,00	118CC	0 días	14/09/24	14/09/24	
142	9.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALI	$ 0,00	118CC	0 días	14/09/24	14/09/24	
143	9.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JAB	$ 0,00	118CC	0 días	14/09/24	14/09/24	
144	9.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALI	$ 0,00	118CC	0 días	14/09/24	14/09/24	

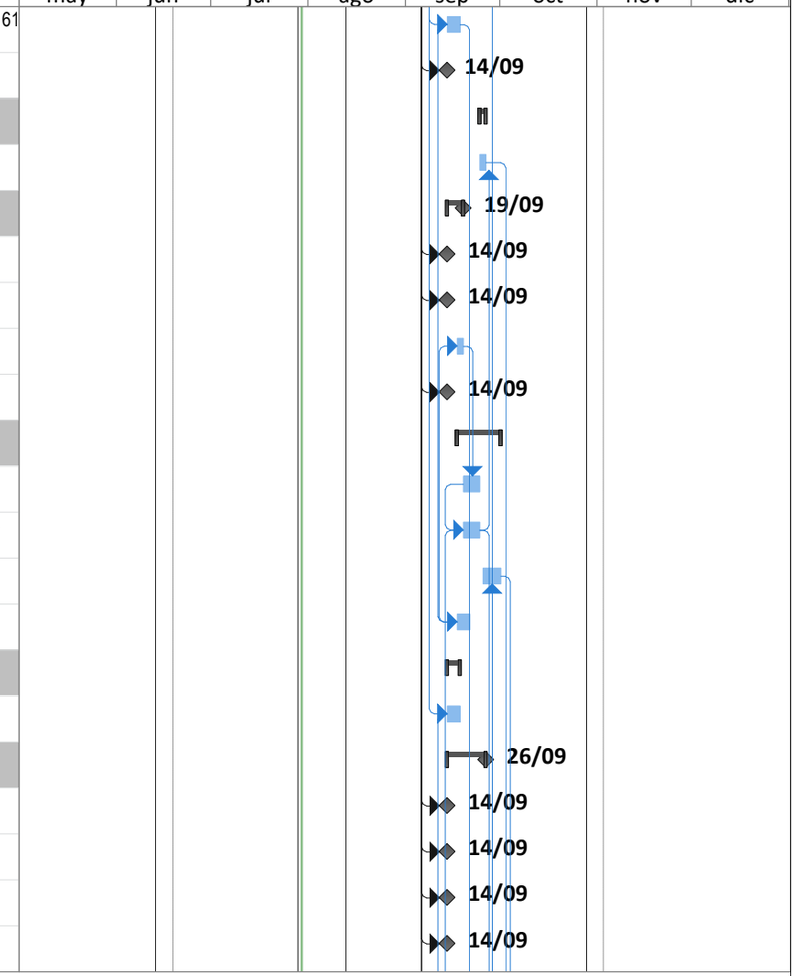

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Progress
Progreso manual


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
145	9.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO BISELADO 2.0X1.5	$ 411.849,00	147	2 días	24/09/24	26/09/24	163
146	9.7.6	MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE LA REVISIC	$ 103.718,00	155	2 días	21/09/24	24/09/24	147CC
147	9.7.7	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFE	$ 738.643,00	146CC	2 días	21/09/24	24/09/24	145
148	**9.8**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 1.762.209,00**		**5 días**	**19/09/24**	**25/09/24**	
149	9.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CU/	$ 165.391,00	135CC	5 días	19/09/24	25/09/24	150CC
150	9.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CU/	$ 772.246,00	149CC	5 días	19/09/24	25/09/24	151CC
151	9.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REI	$ 92.277,00	150CC	5 días	19/09/24	25/09/24	152CC
152	9.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE EM	$ 463.656,00	151CC	5 días	19/09/24	25/09/24	153CC
153	9.8.5	MANTENIMIENTO DE SALIDAS ELECTRICA PARA LUMIN/	$ 268.639,00	152CC	5 días	19/09/24	25/09/24	136
154	**9.9**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 431.879,00**		**6 días**	**14/09/24**	**21/09/24**	
155	9.9.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTA	$ 431.879,00	139CC+2 días	4 días	17/09/24	21/09/24	146
156	9.9.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE	$ 0,00	118CC	0 días	14/09/24	14/09/24	
157	**9.10**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 161.789,00**		**2 días**	**24/09/24**	**26/09/24**	
158	9.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALIC	$ 161.789,00	135	2 días	24/09/24	26/09/24	163
159	**9.11**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 2.026.189,00**		**17 días**	**14/09/24**	**5/10/24**	
160	9.11.1	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	$ 0,00	118CC	0 días	14/09/24	14/09/24	
161	9.11.2	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE	$ 1.239.894,00	124	5 días	18/09/24	24/09/24	163
162	9.11.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	$ 786.295,00	122FC+2 días	6 días	27/09/24	5/10/24	163

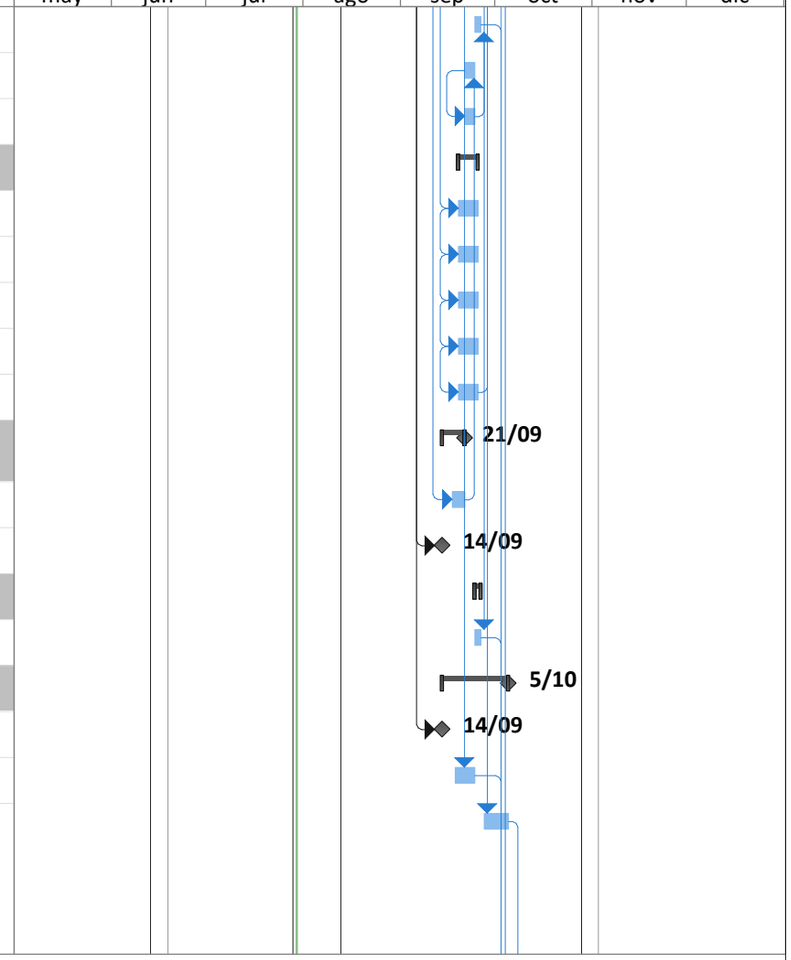

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
163	**10**	**FIN SAMPUES**	**$ 0,00**	**162;161;145;127;15**	**0 días**	**5/10/24**	**5/10/24**	**357**
164	**11**	**INICIO SAN BENITO ABAD**	**$ 0,00**	**217CC+3 días**	**0 días**	**3/08/24**	**3/08/24**	**169CC;198CC;2C**
165	**12**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN BENITO ABAD**	**$ 23.106.228,00**		**66 días**	**3/08/24**	**28/10/24**	
166	**12.1**	**CUBIERTA**	**$ 4.854.593,00**		**16 días**	**3/08/24**	**26/08/24**	
167	12.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 4.408.254,00	169CC+2 días	13 días	6/08/24	24/08/24	168CC+5 días;215
168	12.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 177.964,00	167CC+5 días	9 días	13/08/24	26/08/24	182
169	12.1.3	MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INC	$ 268.375,00	164CC	9 días	3/08/24	15/08/24	167CC+2 días;184
170	**12.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 0,00**		**0 días**	**3/08/24**	**3/08/24**	
171	12.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONA	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
172	12.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONAI	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
173	**12.3**	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 494.858,00**		**5 días**	**7/10/24**	**12/10/24**	
174	12.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITU	$ 494.858,00	180	5 días	7/10/24	12/10/24	216
175	**12.4**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 0,00**		**0 días**	**3/08/24**	**3/08/24**	
176	12.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
177	12.4.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLA	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
178	**12.5**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 12.018.985,00**		**46 días**	**26/08/24**	**23/10/24**	
179	12.5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MAN	$ 2.475.236,00	182	12 días	6/09/24	21/09/24	180
180	12.5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PA	$ 5.598.421,00	179	12 días	21/09/24	7/10/24	181;174
181	12.5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MAN	$ 2.109.969,00	180	12 días	7/10/24	23/10/24	203
182	12.5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR	$ 1.835.359,00	168	10 días	26/08/24	6/09/24	179;194CC;201
183	**12.6**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**$ 128.873,00**		**6 días**	**15/08/24**	**24/08/24**	

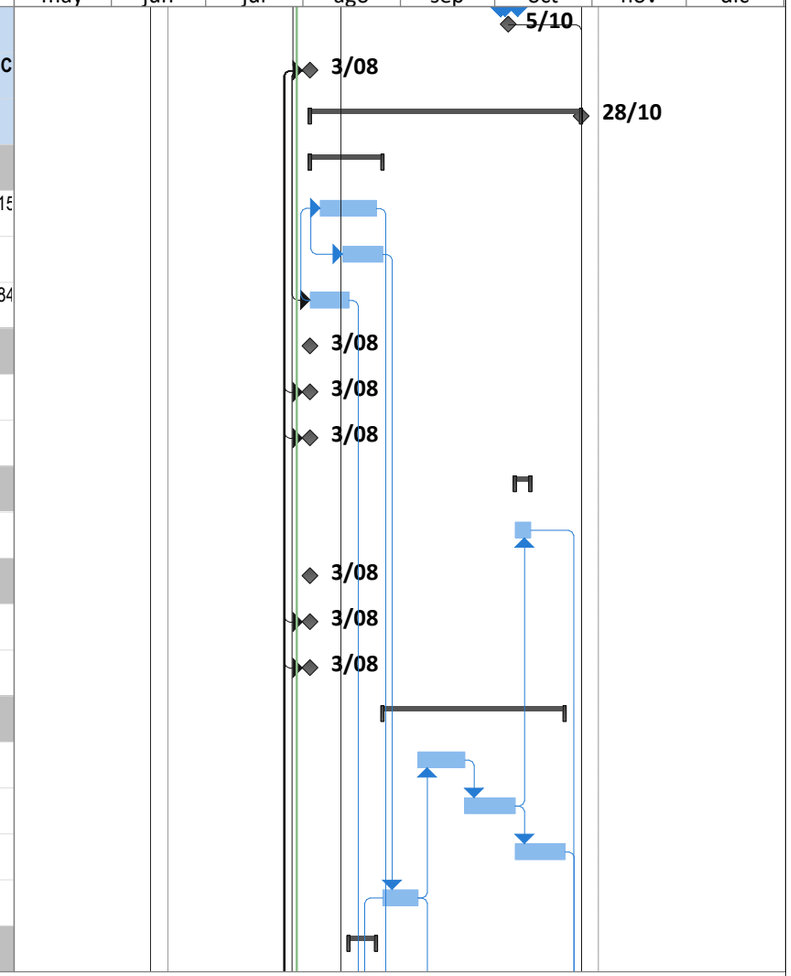

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
184	12.6.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	$ 128.873,00	169	6 días	15/08/24	24/08/24	216
185	**12.7**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**$ 311.153,00**		**10 días**	**3/08/24**	**16/08/24**	
186	12.7.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
187	12.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METAL	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
188	12.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JAB	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
189	12.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METAL	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
190	12.7.5	MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE LA REVISIO	$ 207.435,00	199	4 días	12/08/24	16/08/24	192CC
191	12.7.6	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFE	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
192	12.7.7	MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE LA REVISIC	$ 103.718,00	190CC	4 días	12/08/24	16/08/24	216
193	**12.8**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 1.484.435,00**		**3 días**	**26/08/24**	**29/08/24**	
194	12.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CU	$ 82.696,00	182CC	3 días	26/08/24	29/08/24	195CC
195	12.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CU	$ 1.235.593,00	194CC	3 días	26/08/24	29/08/24	196CC
196	12.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LEC	$ 166.146,00	195CC	3 días	26/08/24	29/08/24	216
197	**12.9**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 672.641,00**		**6 días**	**3/08/24**	**12/08/24**	
198	12.9.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTA	$ 431.879,00	164CC	5 días	3/08/24	10/08/24	199CC+1 día
199	12.9.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE	$ 240.762,00	198CC+1 día	5 días	5/08/24	12/08/24	190
200	**12.10**	**IMPERMEABILIZACION DE JARDINERA**	**$ 798.545,00**		**4 días**	**6/09/24**	**12/09/24**	
201	12.10.1	IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERA CON MANTO ASF	$ 798.545,00	182	4 días	6/09/24	12/09/24	216
202	**12.11**	**CARPINTERIA METALICA**	**$ 1.555.850,00**		**4 días**	**23/10/24**	**28/10/24**	
203	12.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLL	$ 1.555.850,00	181	4 días	23/10/24	28/10/24	216

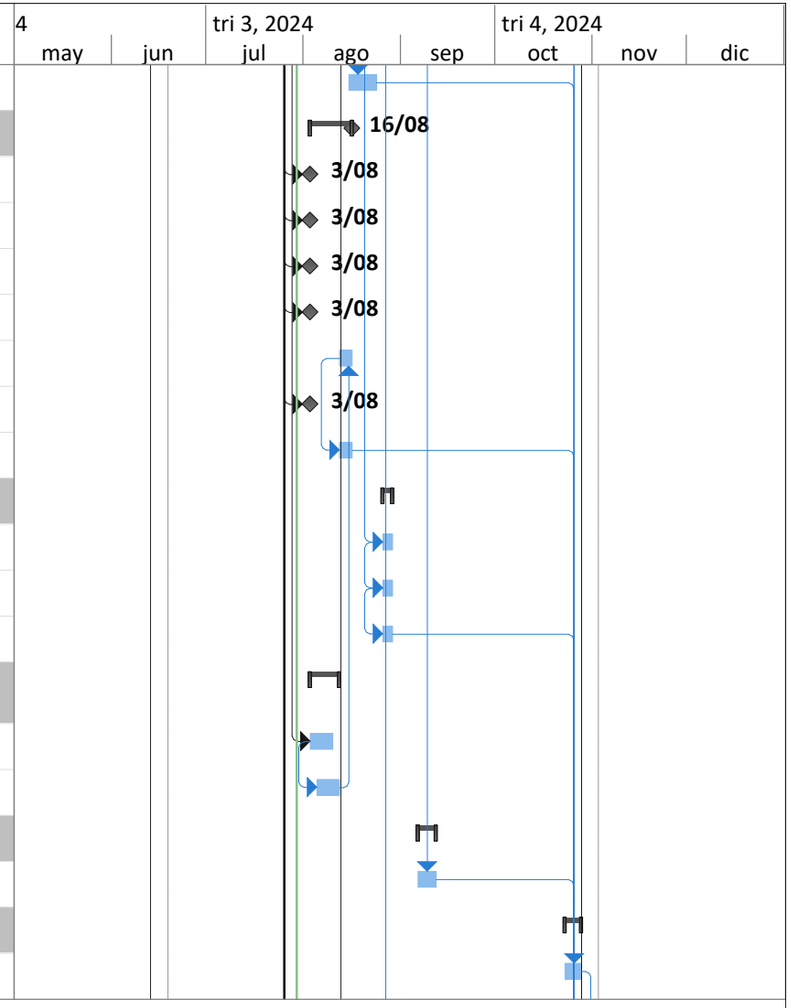

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
204	**12.12**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 0,00**		**0 días**	**3/08/24**	**3/08/24**	
205	12.12.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
206	12.12.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO EN MATERIA	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
207	**12.13**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 786.295,00**		**21 días**	**3/08/24**	**31/08/24**	
208	12.13.1	PISA TECHO EN CONCRETO 2500 PSI	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
209	12.13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA TRAFIC	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
210	12.13.3	PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PA	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
211	12.13.4	TABLETA GRES LISO DE 30 X 30 - MORTERO 1:4, JUNTA	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
212	12.13.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
213	12.13.6	ENCHAPE PARED 20 X 30 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO)	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
214	12.13.7	CUNETA EN CONCRETO DE 3,000 PSI DESARROLLO 60 (	$ 0,00	164CC	0 días	3/08/24	3/08/24	
215	12.13.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 786.295,00	167	6 días	24/08/24	31/08/24	216
216	**13**	**FIN SAN BENITO ABAD**	**$ 0,00**	**215;203;201;196;19**	**0 días**	**28/10/24**	**28/10/24**	**357**
217	**14**	**INICIO CAIMITO**	**$ 0,00**	**315CC+2 días**	**0 días**	**31/07/24**	**31/07/24**	**222CC;235CC;25**
218	**15**	**PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO**	**$ 33.480.315,00**		**19 días**	**31/07/24**	**26/08/24**	
219	**15.1**	**CUBIERTA**	**$ 4.668.147,00**		**17 días**	**31/07/24**	**23/08/24**	
220	15.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 2.721.848,00	222	9 días	10/08/24	23/08/24	267CC+3 días
221	15.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
222	15.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIER	$ 1.946.299,00	217CC	8 días	31/07/24	10/08/24	220
223	**15.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 0,00**		**0 días**	**31/07/24**	**31/07/24**	
224	15.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONA	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	

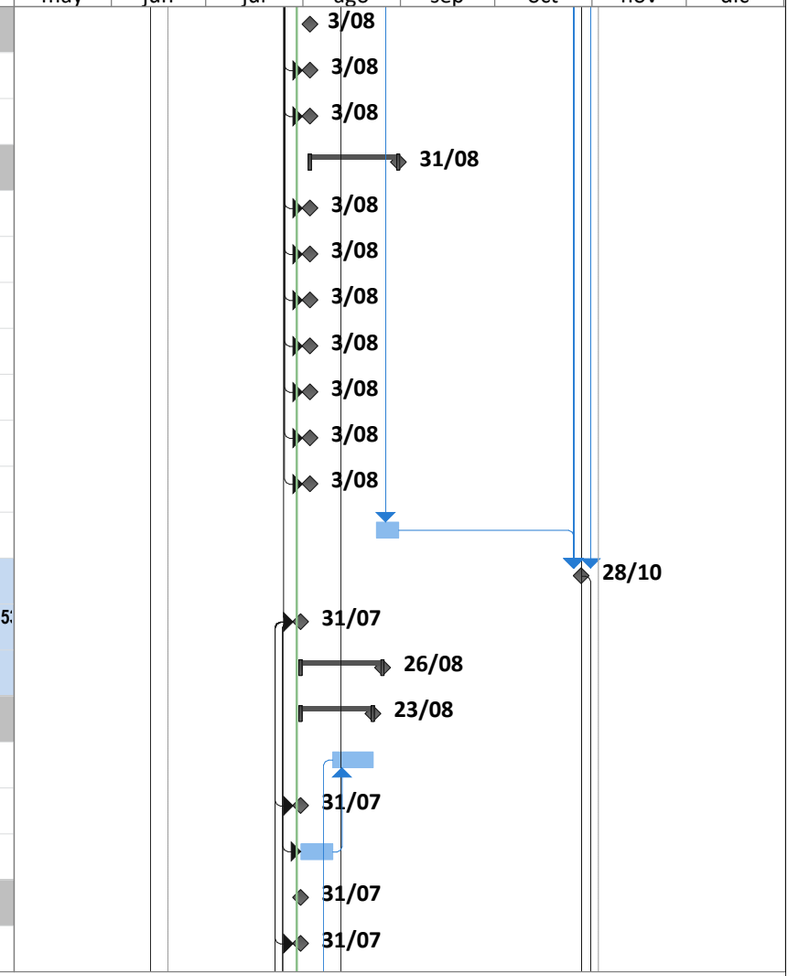

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
225	**15.3**	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 549.842,00**		**2 días**	**23/08/24**	**26/08/24**	
226	15.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITU	$ 549.842,00	233	2 días	23/08/24	26/08/24	268
227	**15.4**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 2.713.200,00**		**11 días**	**31/07/24**	**14/08/24**	
228	15.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDEN	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
229	15.4.2	MANTENIMIENTO DE PUERTADE ACCESO A DEPENDEN	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
230	15.4.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLA	$ 2.713.200,00	235	3 días	10/08/24	14/08/24	232;237
231	**15.5**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 13.754.399,00**		**18 días**	**31/07/24**	**24/08/24**	
232	15.5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MAN	$ 2.721.299,00	230	5 días	14/08/24	22/08/24	233CC
233	15.5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PA	$ 6.314.741,00	232CC	6 días	14/08/24	23/08/24	226
234	15.5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MAN	$ 1.897.965,00	250	4 días	20/08/24	24/08/24	268
235	15.5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR	$ 2.820.394,00	217CC	8 días	31/07/24	10/08/24	230;255;251CC
236	**15.6**	**CARPINTERIA METALICA**	**$ 4.148.934,00**		**4 días**	**14/08/24**	**21/08/24**	
237	15.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLL	$ 4.148.934,00	230	4 días	14/08/24	21/08/24	268
238	**15.7**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**$ 361.190,00**		**8 días**	**31/07/24**	**10/08/24**	
239	15.7.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION	$ 109.743,00	253CC+2 días	2 días	2/08/24	5/08/24	240
240	15.7.2	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFE	$ 147.729,00	239	2 días	5/08/24	8/08/24	241
241	15.7.3	MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE LA REVISIO	$ 103.718,00	240	2 días	8/08/24	10/08/24	268
242	15.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METAL	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
243	15.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JAB	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
244	15.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METAL	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
245	**15.8**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 5.680.196,00**		**14 días**	**31/07/24**	**20/08/24**	

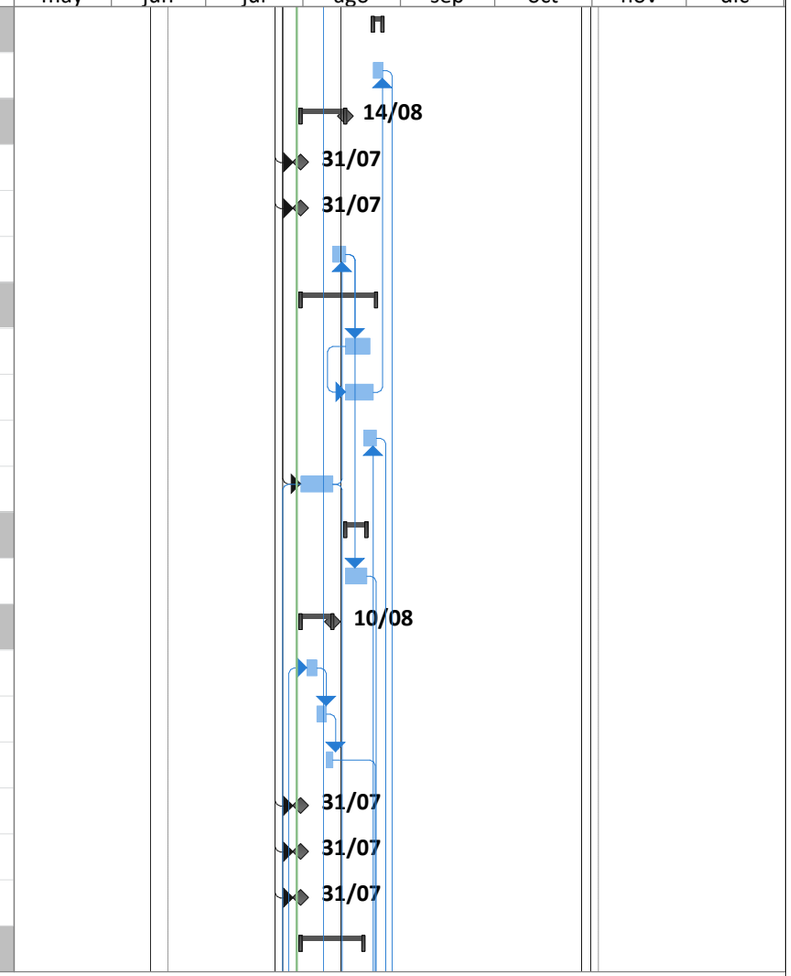

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
246	15.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REC	$ 2.165.778,00	255CC+2 días	4 días	13/08/24	20/08/24	247CC
247	15.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUA	$ 1.544.491,00	246CC	4 días	13/08/24	20/08/24	248CC
248	15.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LEC	$ 110.764,00	247CC	4 días	13/08/24	20/08/24	249CC
249	15.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LEC	$ 839.360,00	248CC	4 días	13/08/24	20/08/24	250CC
250	15.8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE EM	$ 927.312,00	249CC	4 días	13/08/24	20/08/24	234
251	15.8.6	SUMISNISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GF	$ 92.491,00	235CC	4 días	31/07/24	5/08/24	268
252	**15.9**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 309.875,00**		**5 días**	**31/07/24**	**6/08/24**	
253	15.9.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTA	$ 309.875,00	217CC	5 días	31/07/24	6/08/24	239CC+2 días
254	**15.10**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 508.237,00**		**9 días**	**10/08/24**	**23/08/24**	
255	15.10.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFEC	$ 508.237,00	235	9 días	10/08/24	23/08/24	246CC+2 días
256	**15.11**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 786.295,00**		**16 días**	**31/07/24**	**22/08/24**	
257	15.11.1	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
258	15.11.2	PISA TECHO EN CONCRETO 2500 PSI	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
259	15.11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC DE 3" (AM/	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
260	15.11.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC DE 3" (A	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
261	15.11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA TRAFIC	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
262	15.11.6	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO - COLOR M	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
263	15.11.7	VENTANAS SERIE 744 ALUMINIO (SUMINISTRO E INSTAL	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
264	15.11.8	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTUF	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
265	15.11.9	TABLETA GRES LISO DE 30 X 30 - MORTERO 1:4, JUNTA	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	

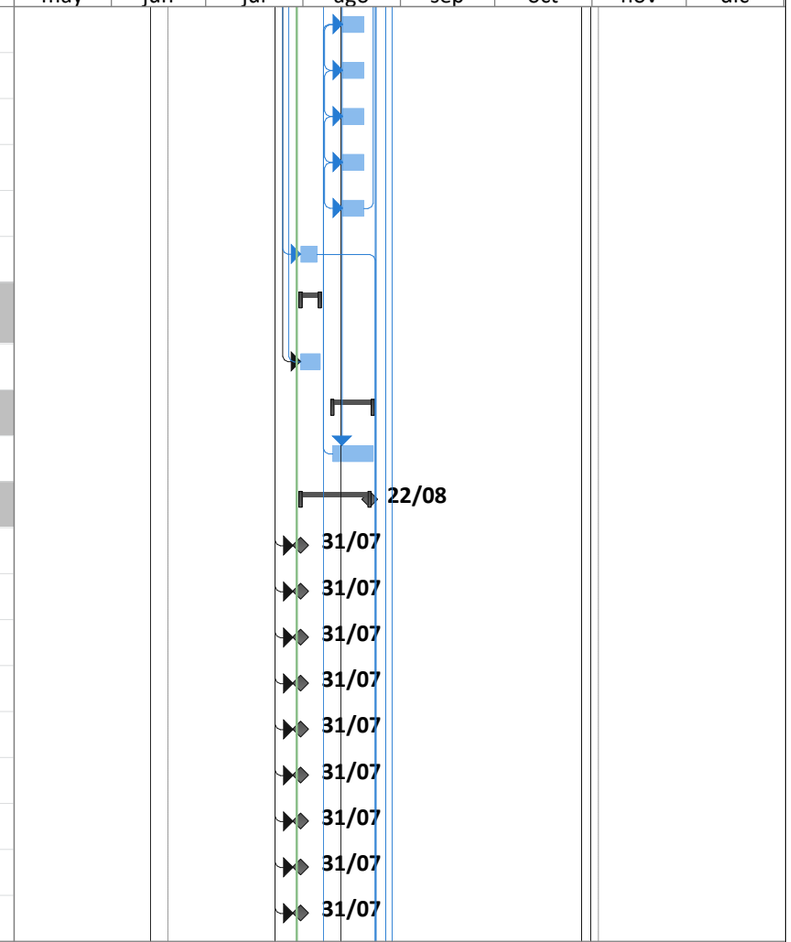

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
266	15.11.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E	$ 0,00	217CC	0 días	31/07/24	31/07/24	
267	15.11.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 786.295,00	220CC+3 días	5 días	14/08/24	22/08/24	268
268	**16**	**FIN CAIMITO**	**$ 0,00**	**234;237;241;251;26**	**0 días**	**26/08/24**	**26/08/24**	**357**
269	**17**	**INICIO SUCRE**	**$ 0,00**	**49CC+1 día**	**0 días**	**21/08/24**	**21/08/24**	**272CC;290CC+2**
270	**18**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE**	**$ 64.185.865,00**		**30 días**	**21/08/24**	**26/09/24**	
271	**18.1**	**CUBIERTA**	**$ 10.447.828,00**		**18 días**	**21/08/24**	**12/09/24**	
272	18.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIER	$ 1.499.474,00	269CC	11 días	21/08/24	3/09/24	273CC;276CC
273	18.1.2	MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INC	$ 3.757.254,00	272CC	9 días	21/08/24	31/08/24	274
274	18.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 5.191.100,00	273	9 días	31/08/24	12/09/24	307CC
275	**18.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 1.136.027,00**		**4 días**	**21/08/24**	**26/08/24**	
276	18.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONA	$ 1.136.027,00	272CC	4 días	21/08/24	26/08/24	313
277	18.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAM	$ 0,00	269CC	0 días	21/08/24	21/08/24	
278	**18.3**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 4.143.096,00**		**12 días**	**23/08/24**	**6/09/24**	
279	18.3.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO	$ 783.880,00	289CC	6 días	23/08/24	30/08/24	280
280	18.3.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDEN	$ 207.347,00	279	6 días	30/08/24	6/09/24	281CC
281	18.3.3	MANTENIMIENTO PUERTA METALICA, INCLUYE SUMINIS	$ 438.669,00	280CC	6 días	30/08/24	6/09/24	282CC
282	18.3.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLA	$ 2.713.200,00	281CC	6 días	30/08/24	6/09/24	286;284CC;306
283	**18.4**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 3.388.248,00**		**7 días**	**30/08/24**	**9/09/24**	
284	18.4.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFEC	$ 3.388.248,00	282CC	7 días	30/08/24	9/09/24	288;299CC
285	**18.5**	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 37.088.537,00**		**28 días**	**23/08/24**	**26/09/24**	
286	18.5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MAN	$ 2.993.640,00	282	8 días	6/09/24	17/09/24	287

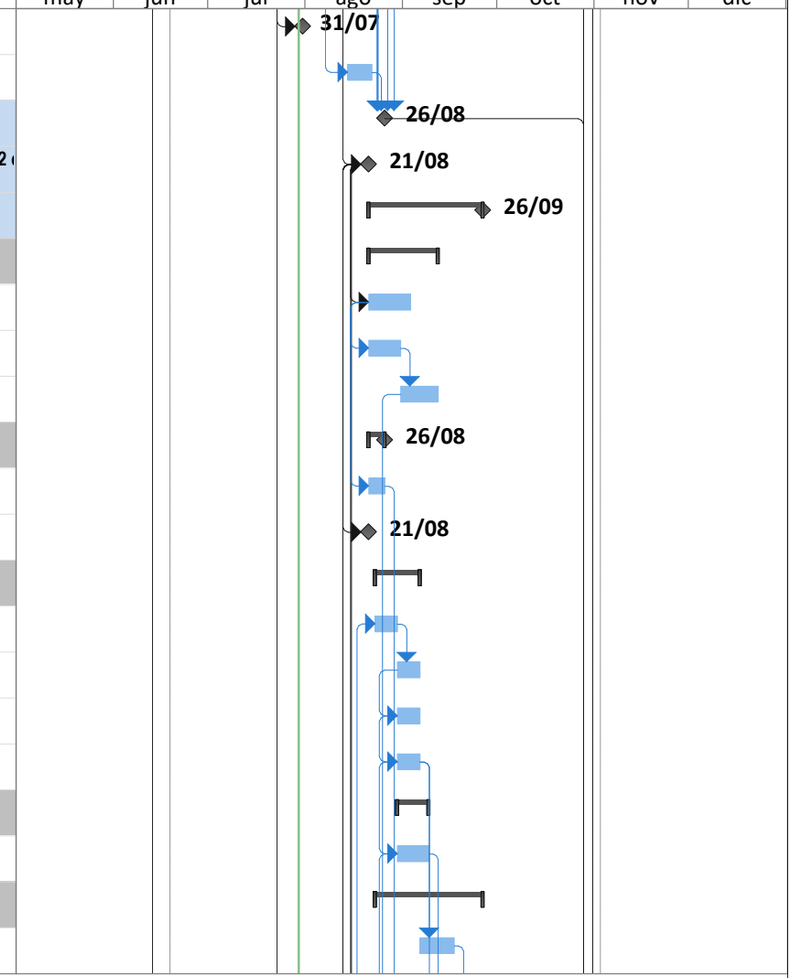

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
287	18.5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PA	$ 14.513.215,00	286	8 días	17/09/24	26/09/24	314
288	18.5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MAN	$ 4.668.805,00	284	8 días	9/09/24	18/09/24	314
289	18.5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR,	$ 8.524.959,00	290CC	8 días	23/08/24	2/09/24	279CC
290	18.5.5	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR	$ 6.387.918,00	269CC+2 días	8 días	23/08/24	2/09/24	289CC
291	**18.6**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**$ 389.912,00**		**11 días**	**21/08/24**	**3/09/24**	
292	18.6.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION	$ 138.465,00	304	3 días	30/08/24	3/09/24	296CC
293	18.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALI	$ 0,00	269CC	0 días	21/08/24	21/08/24	
294	18.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JAB	$ 0,00	269CC	0 días	21/08/24	21/08/24	
295	18.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALI	$ 0,00	269CC	0 días	21/08/24	21/08/24	
296	18.6.5	MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE LA REVISIC	$ 103.718,00	292CC	3 días	30/08/24	3/09/24	297CC
297	18.6.6	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFE	$ 147.729,00	296CC	3 días	30/08/24	3/09/24	314
298	**18.7**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 3.426.460,00**		**10 días**	**30/08/24**	**12/09/24**	
299	18.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LEC	$ 698.267,00	284CC	5 días	30/08/24	5/09/24	300
300	18.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REC	$ 2.728.193,00	299	5 días	5/09/24	12/09/24	314
301	**18.8**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 1.029.459,00**		**8 días**	**21/08/24**	**30/08/24**	
302	18.8.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTA	$ 426.373,00	269CC	4 días	21/08/24	26/08/24	303CC
303	18.8.2	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTA	$ 409.774,00	302CC	4 días	21/08/24	26/08/24	304
304	18.8.3	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE	$ 193.312,00	303	4 días	26/08/24	30/08/24	292
305	**18.9**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 1.896.404,00**		**8 días**	**31/08/24**	**11/09/24**	
306	18.9.1	APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA PARA SELLADO DE	$ 97.597,00	282	3 días	6/09/24	11/09/24	308CC

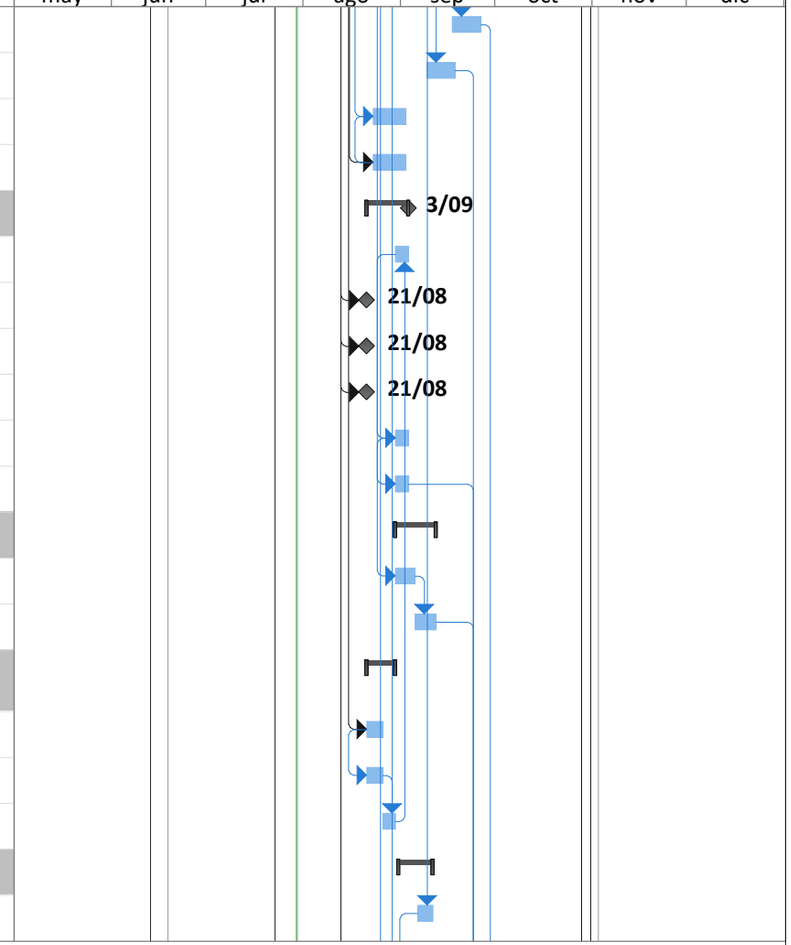

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
307	18.9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 1.403.064,00	274CC	7 días	31/08/24	10/09/24	314
308	18.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALIC	$ 395.743,00	306CC	3 días	6/09/24	11/09/24	314
309	**18.10**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 1.239.894,00**		**9 días**	**21/08/24**	**31/08/24**	
310	18.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA TRAFIC	$ 0,00	269CC	0 días	21/08/24	21/08/24	
311	18.10.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA VENTANA EN ALUMINIO IN	$ 0,00	269CC	0 días	21/08/24	21/08/24	
312	18.10.3	EMBOQUILLADO ENCHAPE PARED Y PISO CERAMICO	$ 0,00	269CC	0 días	21/08/24	21/08/24	
313	18.10.4	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE	$ 1.239.894,00	276	5 días	26/08/24	31/08/24	314
314	**19**	**FIN SUCRE**	**$ 0,00**	**313;307;308;300;25**	**0 días**	**26/09/24**	**26/09/24**	**357**
315	**20**	**INICIO SAN MARCOS**	**$ 0,00**	**1CC+21 días**	**0 días**	**29/07/24**	**29/07/24**	**323CC;341CC;31**
316	**21**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN MARCOS**	**$ 89.499.364,00**		**41 días**	**29/07/24**	**19/09/24**	
317	**21.1**	**CUBIERTA**	**$ 20.975.129,00**		**20 días**	**29/07/24**	**24/08/24**	
318	21.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 20.975.129,00	315CC	20 días	29/07/24	24/08/24	355
319	**21.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 0,00**		**0 días**	**29/07/24**	**29/07/24**	
320	21.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONA	$ 0,00	315CC	0 días	29/07/24	29/07/24	
321	21.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONA	$ 0,00	315CC	0 días	29/07/24	29/07/24	
322	**21.3**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 1.711.617,00**		**12 días**	**29/07/24**	**13/08/24**	
323	21.3.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO	$ 152.016,00	315CC	6 días	29/07/24	5/08/24	330;324
324	21.3.2	MANTENIMIENTO PUERTA METALICA, INCLUYE SUMINIS	$ 1.559.601,00	323	6 días	5/08/24	13/08/24	344
325	21.3.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLA	$ 0,00	315CC	0 días	29/07/24	29/07/24	
326	**21.4**	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 50.802.509,00**		**35 días**	**5/08/24**	**19/09/24**	
327	21.4.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANO	$ 13.756.405,00	330	10 días	14/08/24	28/08/24	356

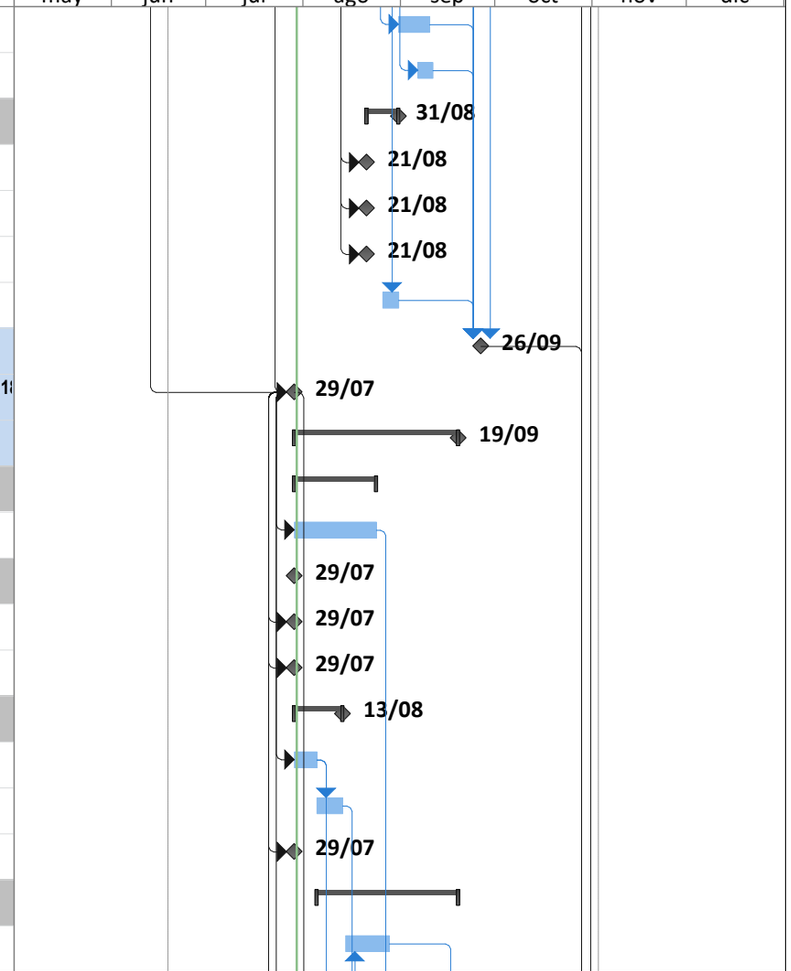

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
328	21.4.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PA	$ 21.167.147,00	331	10 días	12/08/24	26/08/24	346
329	21.4.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MAN	$ 11.594.704,00	346	8 días	10/09/24	19/09/24	356
330	21.4.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR,	$ 2.939.668,00	323	7 días	5/08/24	14/08/24	331CC;327
331	21.4.5	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR	$ 1.344.585,00	330CC	5 días	5/08/24	12/08/24	328
332	**21.5**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**$ 701.587,00**		**17 días**	**29/07/24**	**21/08/24**	
333	21.5.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION	$ 553.858,00	342	7 días	10/08/24	21/08/24	337CC
334	21.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METAL	$ 0,00	315CC	0 días	29/07/24	29/07/24	
335	21.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JAB	$ 0,00	315CC	0 días	29/07/24	29/07/24	
336	21.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METAL	$ 0,00	315CC	0 días	29/07/24	29/07/24	
337	21.5.5	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFE	$ 147.729,00	333CC	5 días	10/08/24	16/08/24	356
338	**21.6**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 4.633.474,00**		**8 días**	**10/09/24**	**19/09/24**	
339	21.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED	$ 4.633.474,00	346	8 días	10/09/24	19/09/24	356
340	**21.7**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 672.640,00**		**10 días**	**29/07/24**	**10/08/24**	
341	21.7.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTA	$ 431.878,00	315CC	5 días	29/07/24	3/08/24	342CC+5 días
342	21.7.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE	$ 240.762,00	341CC+5 días	5 días	3/08/24	10/08/24	356;333
343	**21.8**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 7.574.408,00**		**5 días**	**13/08/24**	**21/08/24**	
344	21.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURI	$ 7.574.408,00	324	5 días	13/08/24	21/08/24	356
345	**21.9**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 1.694.124,00**		**12 días**	**26/08/24**	**10/09/24**	
346	21.9.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFEC	$ 1.694.124,00	328	12 días	26/08/24	10/09/24	329;339
347	**21.10**	**CARPINTERIA METALICA**	**$ 0,00**		**0 días**	**29/07/24**	**29/07/24**	

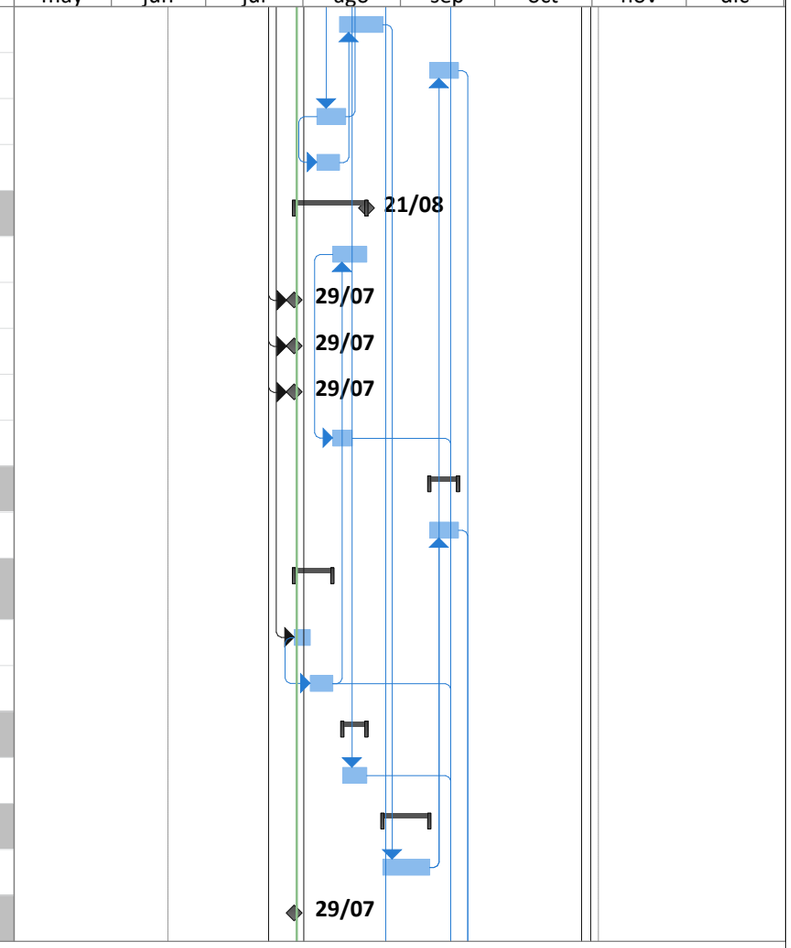

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	

Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
348	21.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLL/	$ 0,00	315	0 días	29/07/24	29/07/24	
349	**21.11**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 733.876,00**		**34 días**	**29/07/24**	**11/09/24**	
350	21.11.1	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	$ 0,00	315CC	0 días	29/07/24	29/07/24	
351	21.11.2	DESMONTE Y REINSTALACION DE PROTECTOR METALI	$ 0,00	315CC	0 días	29/07/24	29/07/24	
352	21.11.3	PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PA	$ 0,00	315CC	0 días	29/07/24	29/07/24	
353	21.11.4	TABLETA GRES LISO DE 30 X 30 - MORTERO 1:4, JUNTA	$ 0,00	315CC	0 días	29/07/24	29/07/24	
354	21.11.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E	$ 0,00	315CC	0 días	29/07/24	29/07/24	
355	21.11.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE	$ 733.876,00	318	14 días	24/08/24	11/09/24	356
356	**22**	**FIN SAN MARCOS**	**$ 0,00**	**355;342;339;344;32**	**0 días**	**19/09/24**	**19/09/24**	**357**
357	**23**	**CIERRE DEL PROYECTO**	**$ 0,00**	**268;356;216;48;117**	**5 días**	**28/10/24**	**2/11/24**	**358**
358	**24**	**FIN DEL PROYECTO**	**$ 0,00**	**357**	**0 días**	**2/11/24**	**2/11/24**	

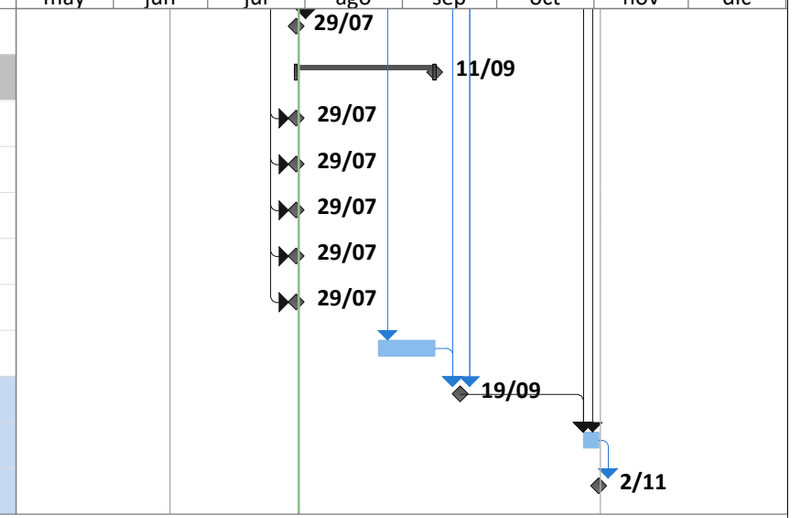

Project: ADECUACIONES Y REPARA
Date: 30/07/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	
