CONTRATO No.1561 DE 2024
CONSTANCIA DE ACTIVIDADES DEL 06 AL 31 DE MAYO DE 2024

En la fecha dejamos constancia que el contratista durante el periodo del 06 al 31 de mayo de 2024, realizo las siguientes actividades:

Obligaciones Específicas:

1. **Obligaciones:**
    a. Participar en el desarrollo de las visitas generales y especiales a los curadores urbanos, efectuando la revisión del componente estructural verificando la adecuada prestación de la función pública delegada en los curadores urbanos, y que la misma se cumpla en las condiciones estructurales dispuestas por la normatividad que rige a estos particulares para el estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas y las actuaciones administrativas asociadas a las mismas, analizando y procesando la información solicitada al curador y dejando en cada caso constancia de su conformidad. NO SE HIZO EN ESTE PERIODO
    b. Preparar con antelación la práctica de la visita, principalmente la revisión de la normatividad urbanística aplicable a los predios licenciados que serán objeto de auditoría, así como, acopiar y analizar la información disponible del curador urbano, con el fin de determinar los temas que por su relevancia y vigencia ameriten ser considerados en el proceso de verificación. SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL.
    c. Participar en las reuniones de apertura y cierre de las visitas generales y especiales a los curadores urbanos, con el fin de señalar los objetivos y conclusiones principales, siguiendo de las directrices establecidas por la dependencia. SE ASISTIÓ A LAS REUNIONES DE INDUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE GRUPO.
    d. Presentar y socializar los hallazgos del componente financiero y de liquidación de expensas que evidencie durante el desarrollo de la visita con el líder del equipo, el curador urbano y el profesional del equipo interdisciplinario que éste delegue. NO APLICABLE PARA ESTE COMPONENTE ESTRUCTURAL.
    e. Recopilar, organizar y entregar la información producida y recibida durante el desarrollo de la visita, que se asocie a la revisión del componente estructural, así mismo, adelantar las gestiones que sean necesarias posteriores al cierre de las visitas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la dependencia. SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL.
    f. Efectuar los aportes que permitan la formulación de los planes de mejoramiento y los traslados al equipo disciplinario, otras dependencias o entidades, con base en los hallazgos del componente estructural que evidencie durante el desarrollo de la visita. SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE UN INSTRUCTIVO DE REVISIÓN,

g. Identificar y poner en conocimiento las causas generadoras de hallazgos evidenciados en desarrollo de las visitas. SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL.
h. Emitir conceptos técnicos a solicitud de los profesionales que conocen de los asuntos disciplinarios, para efectos de apoyar la instrucción de los procesos a su cargo, así como, proyectar desde el punto de vista técnico la respuesta de las peticiones, quejas y reclamos cuando así se requiera. SE HIZO ACOMPAÑAMIENTO A LAS CONSULTAS ASIGNADAS PARA ASESORAMIENTO AL ÁREA DE DISCIPLINARIOS.
i. Recomendar las acciones de mejora a los procesos y procedimientos para la práctica de las visitas a los curadores urbanos. SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL.
j. Participar en la construcción de los lineamientos y la metodología para la implementación del modelo enfocado en riesgos en las actividades de inspección, vigilancia y control a los Curadores Urbanos. SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL.
k. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad requeridas. SE ADELANTARON LOS DILIGENCIAMIENTOS DE LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO.
l. Las demás actividades asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño. SE ASISTIÓ A REUNIÓN VIRTUAL CON EL ÁREA DE DISCIPLINARIOS.

2. Actividades de este periodo:

a. Asistencia a reuniones de inducción con las directivas de la sección.
b. Revisión completa del proyecto estructural con software especializado, para los expedientes EST-66001-2-232084 Galicia y 05266-1-22-0374 CEC ESCOBERO.
c. Asistencia a la reunión de asesoría al área de disciplinarios.
d. Asistencia a la reunión de seguimiento en la sede de la SNR.

Evidencias

Escobero, Expediente 05266-1-22-0374

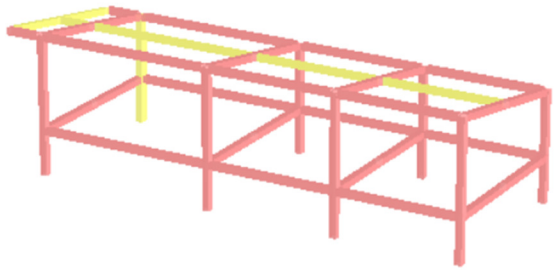


Ilustración 1 - Modelo Escobero Salón Comunal

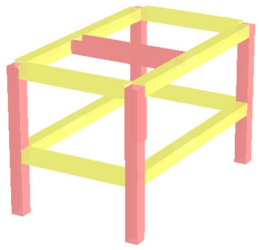


Ilustración 2 - Modelo Escobero - Cocina

Company: JLChF Ingeniería de Estructuras **Engineer: José Luis Chacón F.**
Project: Escobero Cocina **10:39:11 12/3/2025**

Column	Story	L	Lu	Sec	bxh	TIES	XTIES	Sec	LdCmb	Pu	Mu2	Mu3	RHO	As
A-2	2	2.55	2.15	1	40x40	5 #3 @ 12 cm (end)	1 (b)	Top	10	10.58	1.09	8.88	0.0100	16.00
				1		5 #3 @ 24 cm (ctr)	1 (h)	Bot	7	10.98	2.68	4.96	0.0100	16.00
A-2	1	2.00	1.68	1	40x40	5 #3 @ 12 cm (end)	1 (b)	Top	6	7.55	4.89	2.49	0.0100	16.00
				1		3 #3 @ 24 cm (ctr)	1 (h)	Bot	7	17.49	5.17	5.21	0.0100	16.00
B-1	2	2.55	2.15	1	40x40	5 #3 @ 12 cm (end)	1 (b)	Top	11	10.72	1.23	8.91	0.0100	16.00
				1		5 #3 @ 24 cm (ctr)	1 (h)	Bot	6	11.13	2.76	5.10	0.0100	16.00
B-1	1	2.00	1.68	1	40x40	5 #3 @ 12 cm (end)	1 (b)	Top	7	7.70	4.95	2.48	0.0100	16.00
				1		3 #3 @ 24 cm (ctr)	1 (h)	Bot	6	17.70	5.23	5.27	0.0100	16.00
A-1	2	2.55	2.15	1	40x40	5 #3 @ 12 cm (end)	1 (b)	Top	8	10.69	1.08	9.00	0.0100	16.00
				1		5 #3 @ 24 cm (ctr)	1 (h)	Bot	8	10.69	1.88	5.54	0.0100	16.00
A-1	1	2.00	1.68	1	40x40	5 #3 @ 12 cm (end)	1 (b)	Top	5	7.67	4.84	2.52	0.0100	16.00
				1		3 #3 @ 24 cm (ctr)	1 (h)	Bot	4	17.61	5.21	5.24	0.0100	16.00

Design Results - Beams (DMO)

BEAM: A(1-2) FLOOR: 2

Length: L = 3.86 m a = 0.20 m Section: b = 40.0 cm Sec: V40x40
Lu = 3.46 m c = 0.20 m h = 40.0 cm Mat: C21


X, m:	0.20	0.55	0.89	1.24	1.58	1.93	2.28	2.62	2.97	3.31	3.66
Mu(-), ton-m:	-5.07	-3.86	-2.73	-1.63	-1.01	-1.01	-1.01	-1.62	-2.71	-3.84	-5.04
Mu(+), ton-m:	4.90	4.13	3.34	2.50	1.60	1.01	1.61	2.51	3.36	4.15	4.92
As(-), cm2:	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55
As(+), cm2:	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55
Vu, ton:	3.79	3.79	3.64	3.50	3.36	3.22	3.34	3.49	3.63	3.77	3.77
Tu, ton-m:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	8.00	8.00	8.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	8.00	8.00	8.00

DESIGN

A-1 11 #3 @ 8 10 #3 @ 17 11 #3 @ 8 A-2

						TRANSVERSE REINFORCEMENT		LONGITUDINAL REINFORCEMENT						
Column	Story	L (m)	Lu (m)	Sec Mat	bxh (cm)	TIES	XTIES	Sec	LdCmb critc	Pu (ton)	Mu2 (ton-m)	Mu3 (ton-m)	RHO -	As (cm2)
C-5	2	2.78	2.48	1	30x30	6 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	25	2.62	1.41	2.88	0.0100	9.00
				1		7 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	25	2.62	0.97	3.14	0.0100	9.00
C-5	1	2.00	1.78	1	30x30	6 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	25	5.88	0.90	1.85	0.0100	9.00
				1		3 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	23	7.26	0.45	2.51	0.0100	9.00
A-5	2	4.00	3.70	1	30x30	7 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	26	2.83	1.43	1.88	0.0100	9.00
				1		12 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	23	4.14	1.69	1.34	0.0100	9.00
A-5	1	2.00	1.78	1	30x30	6 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	24	5.43	0.14	3.55	0.0100	9.00
				1		3 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	21	7.47	0.38	2.59	0.0100	9.00
C-4	2	2.78	2.48	1	30x30	6 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	33	3.36	0.90	2.88	0.0100	9.00
				1		7 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	25	5.14	0.84	3.32	0.0100	9.00
C-4	1	2.00	1.78	1	30x30	6 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	29	6.50	2.56	0.65	0.0100	9.00
				1		3 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	10.66	0.26	3.59	0.0100	9.00
A-4	2	4.00	3.70	1	30x30	7 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	20	6.32	1.78	1.41	0.0100	9.00
				1		12 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	20	6.32	1.73	1.72	0.0100	9.00
A-4	1	2.00	1.78	1	30x30	6 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	34	6.57	1.14	3.08	0.0100	9.00
				1		3 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	10.97	0.27	3.66	0.0100	9.00
C-3	2	2.78	2.48	1	30x30	6 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	25	6.12	1.49	3.18	0.0100	9.00
				1		7 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	25	6.12	1.19	3.49	0.0100	9.00
C-3	1	2.00	1.78	1	30x30	6 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	29	7.33	2.30	0.49	0.0100	9.00
				1		3 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	12.19	0.30	4.10	0.0100	9.00
A-3	2	4.00	3.70	1	30x30	7 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	26	6.33	1.59	2.38	0.0100	9.00
				1		12 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	23	7.20	2.23	1.82	0.0100	9.00
A-3	1	2.00	1.78	1	30x30	6 #3 @ 10 cm (end)	1 (b)	Top	34	7.49	1.06	3.25	0.0100	9.00
				1		3 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	13	12.93	0.31	4.33	0.0100	9.00
C-2	2	2.78	2.48	2	30x40	6 #3 @ 10 cm (end)	2 (b)	Top	27	5.99	4.66	1.45	0.0100	12.00
				1		7 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	25	5.88	3.54	0.95	0.0100	12.00
C-2	1	2.00	1.78	2	30x40	6 #3 @ 10 cm (end)	2 (b)	Top	1	11.64	0.32	0.42	0.0100	12.00
				1		3 #3 @ 20 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	11.64	3.45	0.28	0.0100	12.00

Expediente 66001-2-232084 Galicia

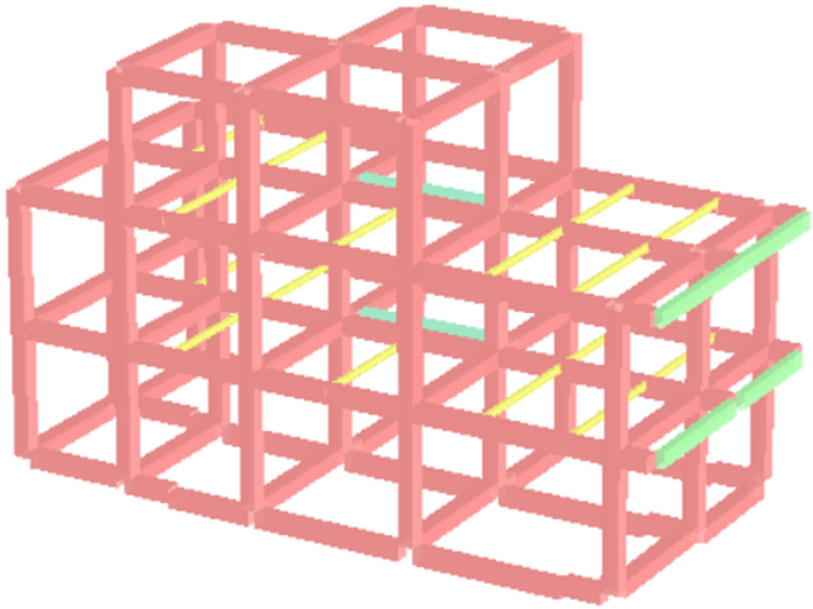

Company: JLChF Ingeniería de Estructuras
Project: GaliciaPereira

Engineer: José Luis Chacón F.
13:00:54 17/3/2025

Column	Story	L	Lu	Sec	bxh	TIES	XTIES	Sec	LdCmb	Pu	Mu2	Mu3	RHO	As
A-3	3	2.50	2.20	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	1	3.74	0.12	0.09	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	3.74	0.09	0.09	0.0100	9.00
A-3	2	2.50	2.20	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	1	7.82	0.19	0.19	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	7.82	0.19	0.32	0.0100	9.00
A-3	1	2.50	2.23	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	5	10.94	2.07	1.13	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	5	10.94	2.33	2.91	0.0100	9.00
B-2	3	2.50	2.20	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	1	2.10	0.22	0.23	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	2.10	0.21	0.08	0.0100	9.00
B-2	2	2.50	2.20	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	1	7.45	0.18	0.28	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	7.45	0.18	0.38	0.0100	9.00
B-2	1	2.50	2.20	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	13	9.02	2.22	0.52	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	15	7.81	2.57	0.45	0.0100	9.00
A-2	3	2.50	2.20	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	1	2.17	0.28	0.18	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	2.17	0.25	0.11	0.0100	9.00
A-2	2	2.50	2.20	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	1	4.97	0.15	0.12	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	4.97	0.15	0.31	0.0100	9.00
A-2	1	2.50	2.15	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	13	3.61	1.97	0.65	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	5	5.69	2.25	1.98	0.0100	9.00
C-1	2	2.50	2.20	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	4	3.16	1.88	0.32	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	11	3.70	2.08	0.82	0.0100	9.00
C-1	1	2.50	2.20	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	1	6.08	0.15	0.62	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	5	5.65	2.78	1.19	0.0100	9.00
B-1	2	2.50	2.20	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	1	2.62	0.07	0.09	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	2.62	0.22	0.10	0.0100	9.00
B-1	1	2.50	2.18	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	7	2.03	1.60	0.56	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	9	3.88	1.48	1.89	0.0100	9.00
A-1	2	2.50	2.20	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	1	1.35	0.13	0.07	0.0100	9.00
				1		9 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	1	1.35	0.22	0.11	0.0100	9.00
A-1	1	2.50	2.13	1	30x30	7 #3 @ 7 cm (end)	1 (b)	Top	5	-0.31	1.17	0.08	0.0100	9.00
				1		8 #3 @ 14 cm (ctr)	1 (h)	Bot	7	0.54	1.44	0.40	0.0100	9.00

Design Results - Beams (DES)

BEAM: A(1-2) FLOOR: 1

Length: L = 2.16 m, Lu = 1.86 m, a = 0.15 m, c = 0.15 m
Section: b = 30.0 cm, h = 30.0 cm
Sec: V30x30
Mat: RConcrete1

X, m:	0.15	0.34	0.52	0.71	0.89	1.08	1.27	1.45	1.64	1.82	2.01
Mu(-), ton-m:	-2.06	-1.79	-1.50	-1.21	-0.90	-0.60	-0.35	-0.32	-0.47	-0.71	-0.96
Mu(+), ton-m:	1.29	1.11	0.92	0.71	0.50	0.27	0.11	0.16	0.39	0.70	1.06
As(-), cm2:	2.53	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
As(+), cm2:	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
Vu, ton:	1.54	1.54	1.59	1.62	1.63	1.68	1.70	1.74	1.77	1.79	1.79
Tu, ton-m:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stirrup:	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
Spacing, cm:	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00	11.00	11.00	5.00	5.00	5.00	5.00
DESIGN											

Firma:

JOSÉ LUIS CHACÓN FIGUEROA

DIANA PAOLA TORRES SAAVEDRA

Profesional Especializado Grado19

Supervisora

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** **PROCESO: SISTEMA DE OPERACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL** **FORMATO: CONTROL DE ASISTENCIA Y ACTA DE REUNION**	SIG

FECHA:	28 de Febrero 2025	**LUGAR DE REALIZACIÓN**	Nivel Central
DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA:	Grupo Curadores Urbanos		
TEMA (S) A TRATAR:	Mesa de trabajo- componente estructural		
HORA INICIO:	11:00 AM	**HORA FINAL**	12:00 PM
NOMBRE DEL MODERADOR	Paola Torres		

ASISTENTES

No.	NOMBRE FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	José Luis Chacón F.	GCURB	jose.chacon@supernotariado.gov.co	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PUNTOS DE DISCUSION
Se socializa frente a la proyección del formato de verificación del componente estructural y se llegan a los siguientes compromisos

CONCLUSIONES

No	TAREA	RESPONSABLE	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Entregar el avance del formato (estructura) a implementar para el diagnóstico a realizar, y la matriz de hallazgos con lo correspondiente.	José Luis Chacón	14/03/2025	
2		José Luis Chacón	28/03/2025	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** **PROCESO: SISTEMA DE OPERACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL** **FORMATO: CONTROL DE ASISTENCIA Y ACTA DE REUNION**	SIG

FECHA:	24 de Febrero 2025	**LUGAR DE REALIZACIÓN**	Nivel Central
DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA:	Grupo Curadores Urbanos		
TEMA (S) A TRATAR:	Mesa de trabajo- componente estructural		
HORA INICIO:	10:30 AM	**HORA FINAL**	12:00 PM
NOMBRE DEL MODERADOR	Paola Torres		

ASISTENTES

No.	NOMBRE FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	José Luis Chacón F.	GCURB	jose.chacon@supernotariado.gov.co	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PUNTOS DE DISCUSION
Se socializa frente a la proyección del formato de verificación del componente estructural

CONCLUSIONES

No	TAREA	RESPONSABLE	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Entregar el formato (estructura) a implementar para el diagnóstico a realizar.	José Luis Chacón	28/02/2025	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
	PROCESO: SISTEMA DE OPERACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
	FORMATO: CONTROL DE ASISTENCIA Y ACTA DE REUNION

FECHA:	25-02-2025	**LUGAR DE REALIZACIÓN**	San Martin Piso 33
DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA:	Grupo Curadores Urbanos		
TEMA (S) A TRATAR:	Socializar la linea de tiempo de las Vista, sus generalidades IGAC,		
HORA INICIO:	8:00 AM	**HORA FINAL**	1:00 PM
NOMBRE DEL MODERADOR	Paola Torres y Sara Velandia		

ASISTENTES

No.	NOMBRE FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Paola Torres S	GCURB	diana.torres@supernotariado.gov.co	
2	Julio C. Amy-	CURB	julio.amy-@supernotariado.gov.co	
3	Ana Patricia lopez	Grup	plch4355@gmail.com	
4	Daniela Camacho	GCURB	angie.camacho@supernotariado.gov.co	Daniela Camach
5	Ana Albán Achinte	GCURB	ana.alban@supernotariado.gov.co	
6	Olga Grajales G	GCURB	olga.grajales@supernotariado.gov.co	
7	Mónica Ramírez Satoque	GCURB	monica.ramirez@supernotariado.gov.co	
8	MARIO ECHEVERRI P.	GCURB	mario.echeverri@supernotariado.gov.co.	
9	JOSÉ LUIS CHACÓN F.	GCURB	jose.chacon@supernotariado.gov.co	
10	Nhora Penuela C	GCURB	nhora.penuela@supernotariado.gov.co	
11.	Sara I. Velandia M.	GCURB	sara.velandia@supernotariado.gov.co	Sara I. Velandia M.

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO PROCESO: SISTEMA DE OPERACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL FORMATO: CONTROL DE ASISTENCIA Y ACTA DE REUNION	SIG

FECHA:	25-02-2025	**LUGAR DE REALIZACIÓN**	San Martín -Piso 33,
DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA:	Grupo Curadores Urbanos		
TEMA (S) A TRATAR:	Socializar la línea de tiempo, sus generalidades, Presentación IGAC.		
HORA INICIO:	8:00 AM	**HORA FINAL**	1:00 PM
NOMBRE DEL MODERADOR	Paola Tará y Sara Velandia		

ASISTENTES

No.	NOMBRE FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Mayerly Alexandra Sastoque Lara	GCURB	mayerly.sastoque@supernotariado.gov.co	
2	Monica Peinado	GCURB	monica.peinado@supernotariado.gov.c	MP
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PUNTOS DE DISCUSION

1. Generalidades Grupo de Visitas
2. Procedimiento de etapas y fases de las visitas
3. Socialización IGAC.

CONCLUSIONES

No	TAREA	RESPONSABLE	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Validar la grabación de las socializaciones	Paola Torres	25-2-2025	
2	Validar la antelación de comunicación del Acto	Paola Torres	25-2-2025	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
