INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO No. 1967 DE 2021, SAN ANTERO-CORDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2022

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO.

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUETIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – CÓRDOBA"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de San Antero		
BENEFICIARIO:	SAN ANTERO – CÓRDOBA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.250.000.000 M/L.
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.250.000.000 M/L.
FECHA SUSCRIPCIÓN	11/11/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30-10-2022		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	17/11/2021	15/01/2022
	LUIS FERNANDO PINZON GALINDO	15/01/2022	31/01/2022
	JUAN CARLOS MONTAÑA	01/02/2022	05/02/2022
	REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	06/02/2022	31/03/2022
	JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA/LIDER DE GRUPO JUAN JOSE BLANCO OVIEDO	1/04/2022	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	HARRY MANRIQUE	06/12/2021	15/12/2021
	CAMILA PUENTES	15/12/2021	31/03/2022
	MARIA ALEXANDRA MIZGER PACHECO	1/04/2022	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 112221	11/11/2021	
	No. 139721	14/12/2021	
	No. 23322	19/01/2022	
	No. 26322	19/01/2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3016215	06/12/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	06/12/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		FECHA: 26/05/2022
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	CUARTA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillassi es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO.		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	N° POLIZA: 3016215 FECHA DE APROBACION: Fecha de entrega de garantías: 18/07/2022 5:42:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		

	EL MUNICIPIO FIRMO MINUTA EL 26 DE MAYO DE 2022 SUBIO LA POLIZA EL 18 DE JULIO DE 2022 EN LA PLATAFORMA SECOP II. A LA FECHA NO HA SIDO ACEPTADA Y APROBADA POR SGC. FECHA:
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.667.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$1.041.667.000
VALOR INTERVENTORÍA	$83.333.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1) UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente a la suma de $225.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	N/A	15/12/2021	$225.000.000 PESOS M/L
SEGUNDO DESEMBOLSO	2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $820.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B.El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40 %	DD/MM/AAAA	$820.000.000 PESOS M/L
ULTIMO DESEMBOLSO	3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $205.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$205.000.000 PESOS M/L
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$225.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3016215	Cumplimiento	$ 250.000.000	11/11/2021	30/04/2023
	Calidad del Servicio	$ 250.000.000	11/11/2021	30/04/2023

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: SELECCION ABREVIADA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE, TIPOLOGÍA 1, OPCIÓN 1, EN EL BARRIO SAN JOSE DE PETARE ZONA URBANA DEL	$1,124,998,840.00 Peso Colombiano

MENOR CUANTIA Nº 002 DE 2022	MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-12979239&g-recaptcha-response=03AGdBq27fima-wkweYEpSeg8_IES0_84akbFMnWMvzvhwiEcB2TX4fXW9Oyh9bvxyLN7zYBdmFw1jS8-QWgwIcH5oL3tCtdKIeCB8oaKqD1apN6q8xhPIWNr7iJSlSVKfD0LpfhjSUPNv7aE4R_dg-YvyXU8vDlshB818tJC_zYEzXR1e1ALoDASXICbdewGCUlmAGO-nQgvX-GqBb0S8HXls_ene-fbMov-DHjSUcGI06Uc36BCfC-uTDa-3U6SVcpCaFnXOfAB-x26_fwkAHoohvJlhywa12U5C-E_LJ4dmSg_ebW3g9-PRWASbC0leg35s2RWlhO38tpCJpCpPJNQvfdYHvaRDq5YMJOHVjdMAlvxoz5o9ux4LQWFXb23WHqtTTmeHSme8YjzbWI7us12iW9UD8HHjVG0s6tlf8GCn9o3ZCQmTTrSnx0_oPZzmx6J3-3_wehvmYXAAFbFcpTteOOQWpgwk0Gt3rrBJKdSeGDRJ9yV-TvA		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE SAN ANTERO 2022- Nit de Persona Jurídica No. 901595098/ RAFAFEL GILLERMO NUÑEZ EMILIANI		
Fecha de Acta de inicio del contrato	a la fecha no se ha suscrito el contrato de obra, toda vez que el CONSORCIO SACUDETE SAN ANTERO 2022, representado legalmente por RAFAEL GUILLERMO NUÑEZ EMILIANI, a quien le fue adjudicado, se encuentra tramitando ante la DIAN, el respectivo Registro Único Tributario – RUT del consorcio.		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato		**Fecha Actual de terminación del contrato**	30/10/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1,124,998,840.00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	No. 53-44-101021088		
FECHA DE LA PÓLIZA	**Aprobada:** 25/05/2022		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: CONCURSO DE MERITO 001 DE 2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE, TIPOLOGÍA 1, OPCIÓN 1, EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE PETARE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	$ 125,000,000

Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12823983&g-recaptcha-response=03AGdBq27LjsqOxhSQX-3gFTl6nPBxhSsAzEopmDu1tV8YdBl2wHywrhhDqcsDZVsH0iHERkMyPEafu1xV_O0mt5hNrpZue6hq4eO6ElCBUimCIFr81IoRAQW4wyCNWy4RbQy0NATAVI8KX1jN3FZPNSQQBGp-ydlmJN0u6OLQkUcCJQZfTDosHtv7VRiye5TxzlwmohF1a2aXjZPrb2CGV2c5Pyq07haHStBxA11JE8xvCNy86K-8lSElQ6urBT5od7efv-lOdxVhvgpa6SWNwoXtoDeNUtKpAZ4bdlEkjGJWUmsIS8WSd_tY1DRGVD4W-7B0zqP7f0Sf9ddXYobWRi9gmxNWl1yL_pB6eLe7AOPzm654l8hDMwOl-yKUvh4fDonhKJqjSMUJC1ggecCjuq_kIYo9pjvhe1NFyfHkL0TH9lURISLraBT33GN4wkOPecvSeewJDO-arTVA3Uq7c0h5YLfBCPbRFq		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	BUSERCO SAS Representado legalmente por ANDRES FELIPE BUELVAS identificado con la C.C. N° 1.067.892.139		
Fecha de Acta de inicio del contrato	01/06/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	**30/05/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	30/10/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$124.999.980
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	No. CG-1035165		
FECHA DE LA PÓLIZA	Aprobada: 11/04/2022		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MAYO 2022	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%

CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS

- *Lun 11/07/2022 15:45- En cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio No. 1967-2021, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – CÓRDOBA", solicitamos de manera inmediata lo siguiente:*

1. Informe de Supervisión No.8 (junio 2022).
2. Informe Financiero a 30 de junio de 2022.
3. Extracto Bancario junio 2022.
4. actas de inicio contratos derivados.
5.pólizas de contratos derivados.
6.Poliza de la última actuación del convenio.
6. pantallazo de informe de junio subido a secop II.

- *El día **13/07/2022, - 7:00 am** en las instalaciones del Ministerio se recibieron los Estudios y Diseños , donde asistieron las siguientes personas:*

SAMIR JOSÉ TAMAYO ALVAREZ
Secretario de Obras Públicas Municipal
CC. No. 15.621.685

MAICOL JAVIER MARTINEZ LADEUTH
Apoyo Supervisión Secretaría de Obras
CC. No. 1.072.526.943

RAFAEL GUILLERMO NUÑEZ EMILIANI
Rep. Legal Contratista
CC. No. 73.095.692

RICHARD JOSE LADEUTH CASTRO
Arquitecto Contratista
CC. No. 1.003.655.521

Oscar David Moreno Cogollo
CC. No. 1.073.819.714
Director de Interventoría

NOTA: se adjunta la correspondencia explicada anteriormente.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- *A la fecha no se ha iniciado la ejecución de las obras porque el proyecto continúa en la etapa de estudios y diseño.*

- *El 05 de Julio de 2022, se realizó el último comité técnico virtual, con la participación del supervisor del Ministerio del Interior, funcionarios del municipio, equipo del contratista y la interventoría, para continuar revisando los avances en los estudios y diseños y los ajustes de acuerdo con las observaciones indicadas en el comité técnico virtual del día 23 de junio de 2022, en este comité se dio la viabilidad por parte del ministerio para hacer la entrega formal de todos los estudios ante el ministerio del interior y se formalizo la fecha de entrega pactada por todas las partes involucradas en el proyecto.*

- *El 21 de julios se realizó la socialización del proyecto ante la comunidad sananterana en general donde se dio a conocer en que conocer los alcances del proyecto, las fuentes de financiación, contratistas e interventoras y los beneficios que le traerá a la comunidad de San Antero y donde se le dio la participación a la comunidad de que conformara una veeduría para garantizar que los trabajos de hagan conforme a los plasmado en los diseños y en las especificaciones técnica tratando de que todo se cumpla.*

Nota: se adjunta.
- Acta de socialización.
- Actas de inicios de contratos derivados.
- Pólizas y resoluciones por la entidad contratantes de los contratos derivados.

Se adjunta copia de correos electrónicos.

OBSERVACIONES

- La supervisión por parte del ministerio en aras del seguimiento y cumplimiento a la ejecución del convenio en mención realizo todas las gestiones pertinentes a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y reuniones virtuales, por tal razón se mantuvo contacto frecuente por medio de llamadas para solicitar informes técnicos al municipio, además de solicitar fotografías, videos y documentos soportes para corroborar las actividades programadas en la etapa de componente 1 y de las últimas actuaciones correspondiente a la primera prorroga.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. SUPERVISOR



JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
Supervisor Convenio No. 1967-2021 Subdirección de Infraestructura Ministerio -FONSECON



ARQ.JUAN JOSE BLANCO OVIEDO.
Líder de grupo de Supervisión del Convenio 1967-2021 Subdirección de Infraestructura Ministerio - FONSECON.



MARIA ALEXANDRA MIZGER PACHECO.
Apoyo a la supervisión convenio 1967-2021 Subdirección de Infraestructura Ministerio -FONSECON

Cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio No. 1967-2021

Maria Alexandra Mizger <maria.mizger@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Lun 11/07/2022 15:45

Para: SAMIR _sobraspublicas <sobraspublicas@sanantero-cordoba.gov.co>

CC: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Cordial saludo.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio No. 1967-2021, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – CÓRDOBA", solicitamos de manera inmediata lo siguiente:

1. Informe de Supervisión No.8 (junio 2022).
2. Informe Financiero a 30 de junio de 2022.
3. Extracto Bancario junio 2022.
4. actas de inicio contratos derivados.
5.pólizas de contratos derivados .
6.Poliza de la última actuación del convenio.
6. pantallazo de informe de junio subido a secop II.

Cordialmente,

--

El futuro es de todos Mininterior

image.png

ING.MARIA ALEXANDRA MIZGER
Profesional - Apoyo a la supervisión
Contratista
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mai: maria.ministeriodelinterior@gmail.com
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

anexo 22 entrega de estudios y diseños

Maria Alexandra Mizger <maria.mizger@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Vie 15/07/2022 14:25

Para: SAMIR _sobraspublicas <sobraspublicas@sanantero-cordoba.gov.co>

1 archivos adjuntos (120 KB)

33_anexo_22._acta_de_recibo_de_estudios_y_disenos san antero..docx;

psi,

--

ING.MARIA ALEXANDRA MIZGER
Profesional - Apoyo a la supervisión
Contratista
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mai: maria.ministeriodelinterior@gmail.com
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

RV: ingreso municipio SAN ANTERO-CORDOBA.

Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Mar 12/07/2022 14:36

Para: Manuel Guillermo Segura Sierra <manuel.segura@mininterior.gov.co>

CC: Maria Alexandra Mizger <maria.mizger@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

buenas tardes,

Doc. Manuel, por medio del presente remito y teniendo en cuenta lo del asunto agradezco su colaboración para ingreso el día 13/07/2022, - 7:00 am a las instalaciones del Ministerio y además permiso para la utilización durante todo el día del salón # 1 o 2 - piso 11 para poder recibir los Estudios y Diseños del mencionado municipio.

SAMIR JOSÉ TAMAYO ALVAREZ
Secretario de Obras Públicas Municipal
CC. No. 15.621.685

MAICOL JAVIER MARTINEZ LADEUTH
Apoyo Supervisión Secretaría de Obras
CC. No. 1.072.526.943

RAFAEL GUILLERMO NUÑEZ EMILIANI
Rep. Legal Contratista
CC. No. 73.095.692

RICHARD JOSE LADEUTH CASTRO
Arquitecto Contratista
CC. No. 1.003.655.521

Oscar David Moreno Cogollo
CC. No. 1.073.819.714
Director de Interventoría

Juan José Blanco Oviedo
Subdirección de infraestructura
Ministerio del interior

E-mail **juan.blanco@mininterior.gov.co**

PBX : 571- 2427400 EXT- 2826

CRA. 8 N° 12B - 31 PISO 10

Bogota - Colombia- www.mininterior .gov.co

MUNICIPIO DE SAN ANTERO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

ACTA DE SOCIALIZACION

Teniendo en cuenta que el plan de desarrollo "**CONFIANZA Y DESARROLLO 2020 – 2023**" se encuentra la **LINEA PROGRAMATICA DEL SECTOR PLAN ESTRATEGICO DE VIAS Y URBANISMOS,** dentro del cual se encuentra: Priorizar y establecer una línea de inversión en materia de vías en el Municipio de San Antero:

ASUNTO: PROYECTO "SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA #002 – 2022 ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE, TIPOLOGÍA 1, OPCIÓN 1, EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE PETARE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Fecha: 21 de Julio de 2022

Hora: 4:30 P.M.

Lugar: **Barrio San José de Petare (Lote donde se ejecutará el proyecto).**

SOCIALIZACIÓN: #002 – 2022 "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE, TIPOLOGÍA 1, OPCIÓN 1, EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE PETARE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Fecha: 21 **de** Julio **de 2022**

ORDEN DEL DIA

1. INSTALACION DEL EVENTO POR PARTE DEL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DR. SAMIR JOSE TAMAYO ALVAREZ.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DR. SAMIR JOSE TAMAYO ALVAREZ
3. INTERVENCION, (PREGUNTAS POR LA COMUNIDAD PRESENTE.
4. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS.

SOCIALIZACION: PROYECTO #002 – 2022 ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE, TIPOLOGÍA 1, OPCIÓN 1, EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE PETARE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Fecha: _____ de _____ de 2022

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

FIRMAS DE ASISTENTES REUNION PROYECTO: #002 – 2022 ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE, TIPOLOGÍA 1, OPCIÓN 1, EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE PETARE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Fecha: 21 de JULIO de 2022

Hora: 4.30 P.M

Lugar: Lugar: **Barrio San José de Petare (Lote donde se ejecutará el proyecto).**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DIRECCIÒN	VICTIMA SI - NO
01	Alfredo Z. F.	73.621430	S. martin	NO
02	Jhon Deivi Mendoza		S. martin	NO
03	Manuel Posso Caballero	1072525598	San de petare	NO
04	Manuel Andres Posso	15617687	Petare	NO
05	Jorge Mateo	15620746	San marten	NO
06	Nerlys Diaz Cortez	1072526731	Cevera	NO
07	Katerine Gonzalez Castro	1072525574	petare	NO
08	Jesus Suárez	15619253	Jesus	NO
09	Martha C López Hernandez	37548748	S/martin #2	NO
10	Alex Avila Martinez	78.711.537	parque.	NO


11	Carmelo fuentes f	15.622.021	Loma.	UD
12	Arnol Barros Benitez	1.063.153.173	[illegible]	UD
13	Oscar puerta madera	1063.779.136	petare	UU
14	Jose de los santos	1063720058	Petare	UU
15	Juan Carlos Diaz pacheco	1063 708 811	calle abajo	UU
16	Jovanni Isaac Aguilar.	1063 165 010	Petare	UU
17	Breiner jose vega.	1104868332	Coveñas	UU
18	Romer Camilo Burgos Romero	1.010.806.568	Petare	UU
19	Manuel Luis Gonzalez Castillo	1.063.150.650	petare	UU
20	Julio Javier Patrón Gómez	1.062.437.200	Petare	UU
21	Larry Jayser Gómez posso	1.201.213.511	nuevo Agsur	UU
22	Kelly Antero Murillo	15.617701	Cll Nel Mar	UU
23	Luis carlos diz bonoli	15616691.	Petare.	UD
24	Luis A. Monterroza Zuñiga	1072525864	Bejiga	UD
25	Cristobal C	15615418	Petare	UU
26	Pedro puz P.	15615173	cevera	UU
27	Eder Luis Perez Padilla	1072528679	Cavina	UD
28	Luis Carlos Diaz H.	26176439	Callearriba	UU
29	Claudia Milena Madrigal	1105057497	obrero	UU
30	Marilu Cabeza Fuentes	50484028	Petare	UD

31	EVER Luis Gonzalez	1072523792	Petare	NO
32	Santander mozo	1131026269	Petare	NO
33	Antonio Mario Benitez Oquendo	15023862	Petare	NO
34	Wadys A Luna Cabrales	70.522.213	B. Deportes	NO
35	Juan Camilo Escalante M.	1072530486.	Petare	NO.
36	Damaris Olea Suigado	1072530498	L. Esperanza	No.
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

ANEXOS






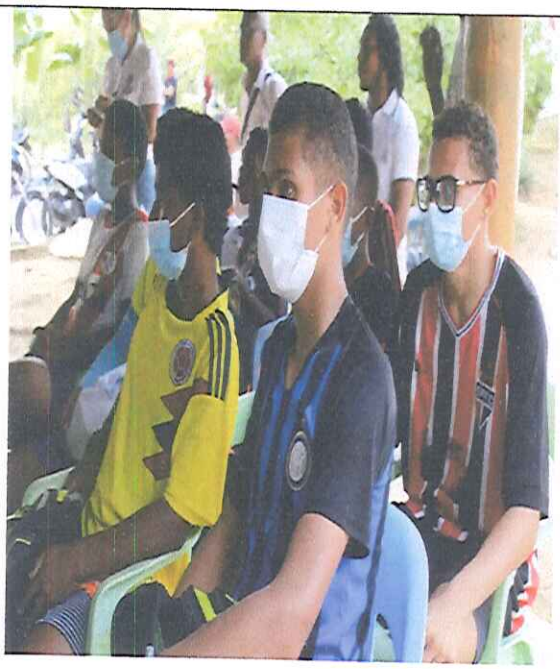






GRACIAS

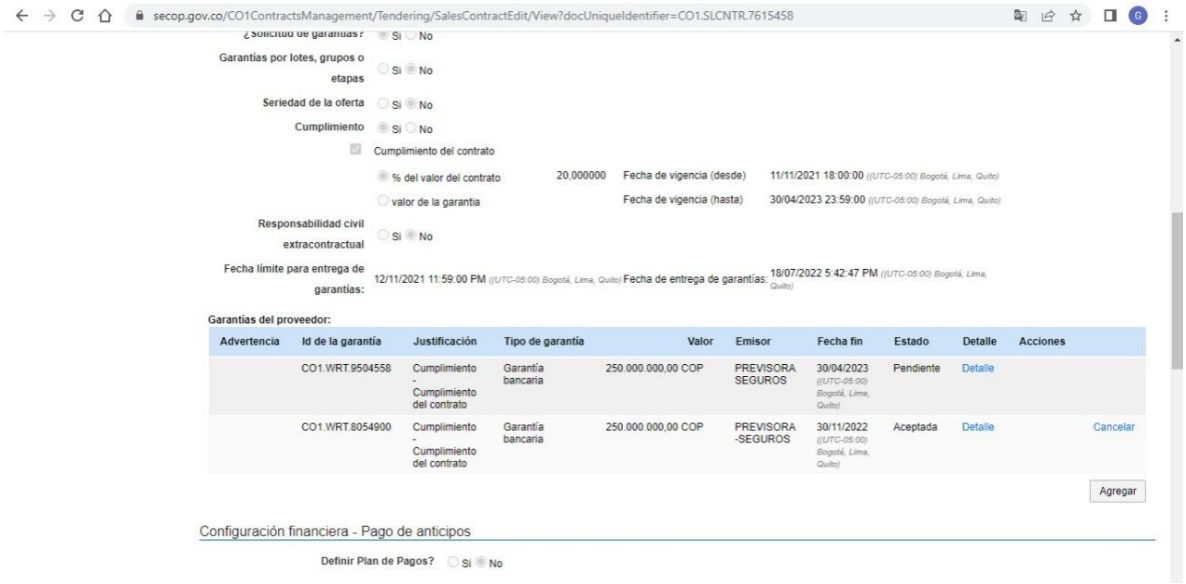
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.7615458
¿Solicitud de garantías?
Si
No
Garantías por lotes, grupos o etapas
Si
No
Seriedad de la oferta
Si
No
Cumplimiento
Si
No
Cumplimiento del contrato
% del valor del contrato
20,000000
valor de la garantía
Fecha de vigencia (desde)
11/11/2021 18:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vigencia (hasta)
30/04/2023 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extracontractual
Si
No
Fecha límite para entrega de garantías:
12/11/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de garantías:
18/07/2022 5:42:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Garantías del proveedor:
Advertencia
Id de la garantía
Justificación
Tipo de garantía
Valor
Emisor
Fecha fin
Estado
Detalle
Acciones
CO1.WRT.9504558
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Garantía bancaria
250.000.000,00 COP
PREVISORA SEGUROS
30/04/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Pendiente
Detalle
CO1.WRT.8054900
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Garantía bancaria
250.000.000,00 COP
PREVISORA -SEGUROS
30/11/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aceptada
Detalle
Cancelar
Agregar
Configuración financiera - Pago de anticipos
Definir Plan de Pagos?
Si
No
