INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 1967 DE 2021, SAN ANTERO-CORDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA,A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUETIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – CÓRDOBA"	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CALLE NO.13 Y CRA 11D – BARRIO SAN JOSÉ DE PETARE.	
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$1.250.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$0
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$1.250.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	11/11/2019	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/03/2023	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR	

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)

NOMBRE	**DESDE**	**HASTA**
NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVRA	16/01/2023	3/02/2023
REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ	18/09/2022	15/01/2023
LUZ YOLIMA HERRERA MARTINEZ	29/09/2022	17/10/2022
REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	1/08/2022	28/09/2022
JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA	1/04/2022	31/07/2022
REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	06/02/2022	31/03/2022
JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA	01/02/2022	05/02/2022
LUIS FERNANDO PINZON GALINDO	15/01/2022	31/01/2'22

	REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	17/11/2021	15/01/2022
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	HARRY MANRIQUE	06/12/2021	14/12/2021
	CAMILA PUENTES	15/12/2021	31/04/2022
	MARIA ALEXANDRA MIZGER	27/07/2022	31/01/2022
	MARIA ALEXANDRA MIZGER	25/01/2022	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.112221	11/11/21	
	No.23322	19/01/22	
	No.10723	19/01/23	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	N/A	N/A
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3016215	06/12/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	06/12/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA AL CONVENIO		FECHA: **26/05/22**
	SEGUNDA PRORROGA AL CONVENIO		FECHA: **27/10/22**
	TERCERA PRORROGA AL CONVENIO		FECHA: **9/12/22**
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSION		FECHA: **29/03/22**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 15/12/2022		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0		
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.000		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.000		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR

PRIMER DESEMBOLSO	1) UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente a la suma de $225.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	15/12/2021	$ 225.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $820.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B.El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	22/12/2022	$820.000.000
ULTIMO DESEMBOLSO	3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $205.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	-	-
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.045.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 222.224.996,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3016215	Cumplimiento	$ 250.000.000	11/11/2021	30/09/2023

PÓLIZA INICIAL DEL CONVENIO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3016215	Cumplimiento	$ 250.000.000,00	11-11-2021	30-11-2022
	Calidad del servicio	No Aplica	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN PRÓRROGA No.1

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3016215	Cumplimiento	$ 250.000.000,00	11-11-2021	30-04-2023
	Calidad del servicio	No Aplica	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN PRÓRROGA No. 2

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3016215	Cumplimiento	$ 250.000.000,00	11-11-2021	30-06-2023
	Calidad del servicio	No Aplica	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN PRÓRROGA No. 3

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3016215	Cumplimiento	$ 250.000.000,00	11-11-2021	30-09-2023
	Calidad del servicio	No Aplica	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños Y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE, TIPOLOGÍA 1, OPCIÓN 1, EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE PETARE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	**$ 1.124.998.840,00**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-12979239&g	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE SAN ANTERP 2022-R/LEGAL RAFAEL GUILLERMO NUÑEZ EMILIANIS.	NIT.9015950982 C.C. 73.095.692

Fecha de Acta de inicio del contrato	01/06/2022		**CINCO (05) MESES**
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA No. 1	31/10/2022	**PRORROGA No.1 DOS (02) MESES**
	PRÓRROGA No. 2	30/12/2022	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	**PRORROGA No.2 TRES (03) MESES**
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	30/10/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato según prorroga No. 2**	30/03/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.124.998.840,00**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
PÓLIZA No.	No. 53-44-101021088 **Aprobada:** 25/05/2022
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 24/05/2022
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 53-40-101007234 **Aprobada:** 25/05/2022
FECHA DE LA POLIZA	24/05/2022

AMPAROS	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
		FECHA DE INICIO	**FECHA FINAL**
Cumplimiento del Contrato	$ 112.499.884,00	19-05-2022	19-02-2023
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 112.499.884,00	19-05-2022	10-10-2025
Prestaciones Sociales	$ 112.499.884,00	19-10-2022	19-10-2027
Responsabilidad Civil	$200.000.000,000	19- 05- 2022	19- 05- 2023

ACTUALIZACION DE POLIZA CON RESPECTO A ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
PÓLIZA No.	No. 53-44-101021088 **Aprobada:** 13/07/2022
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 13/07/2022
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 53-40-101007234 **Aprobada:** 13/07/2022
FECHA DE LA POLIZA	13/07/2022

AMPAROS	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
		FECHA DE INICIO	**FECHA FINAL**
Cumplimiento del Contrato	$ 112.499.884,00	01-06-2022	04-03-2023
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 112.499.884,00	01-06-2022	01-11-2027
Prestaciones Sociales	$ 112.499.884,00	01-06-2022	01-11-2025
Responsabilidad Civil	$200.000.000,000	01-06- 2022	04-03- 2023

ACTUALIZACION DE POLIZA CON RESPECTO A OTRO SI No.1

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
PÓLIZA No.	No. 53-44-101021088 **Aprobada:** 09/11/2022
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 09/11/2022
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 53-40-101007234 **Aprobada:** 09/11/2022

FECHA DE LA POLIZA	09/11/2022		
AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Cumplimiento del Contrato	$ 112.499.884,00	01-06-2022	04-05-2023
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 112.499.884,00	01-06-2022	01-11-2027
Prestaciones Sociales	$ 112.499.884,00	01-06-2022	01-01-2026
Responsabilidad Civil	$200.000.000,000	01-06- 2022	04-05- 2023
ACTUALIZACION DE POLIZA CON RESPECTO A OTRO SI No.2			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	No. 53-44-101021088 **Aprobada:** 06/01/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 06/01/2023		
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 53-40-101007234 **Aprobada:** 06/01/2023		
FECHA DE LA POLIZA	06/01/2023		
AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Cumplimiento del Contrato	$ 112.499.884,00	06-01-202	04-08-2023
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 112.499.884,00	01-11-2022	01-11-2027
Prestaciones Sociales	$ 112.499.884,00	01-06-2022	01-01-2026
Responsabilidad Civil	$200.000.000,000	01-06- 2022	04-08- 2023

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obras***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. 001 DE 23 DE MARZO DE 2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE, TIPOLOGÍA 1, OPCIÓN 1, EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE PETARE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		$124.999.980
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12823983&g		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	31/10/2022		$ 41.665.000
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	BUSERCO SAS – R/LEGAL ANDRES FELIPE BUELVAS		NIT. 900.805.380-4 C.C. 1.067.892.139 de Montería
Fecha de Acta de inicio del contrato	01/06/2022		CINCO (05) MESES
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA No.1	31/10/2022	**PRORROGA No.1 DOS (02) MESES**
	PRÓRROGA No. 2	30/12/2022	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	**PRORROGA No.2 TRES (03) MESES**
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y Contrato de Ejecución de Interventoría de obra.***

Fecha Inicial de terminación del contrato	30/10/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato según prorroga No.2**	30/03/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$124.999.980
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN ADICIONAL No. 1			$ 166.664.980

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**
PÓLIZA No.	No. CG-1035165 – Aprobada: 11/04/2022
FECHA DE LA PÓLIZA	08/04/2022

AMPAROS	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
		FECHA DE INICIO	**FECHA FINAL**
Cumplimiento	$ 12.499.998,00	23-03-2022	23-02-2023
Prestaciones Sociales	$12.499.998,00	23-03-2022	23-08-2025
Calidad del servicio	$12.499.998,00	23-03-2022	23-08-2027

ACTUALIZACION DE POLIZA CON RESPECTO A ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**
PÓLIZA No.	No. CG-1035165 – Aprobada: 16/07/2022
FECHA DE LA PÓLIZA	16/06/2022

AMPAROS	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
		FECHA DE INICIO	**FECHA FINAL**
Cumplimiento	$ 12.499.998,00	01-06-2022	04-05-2023
Prestaciones Sociales	$12.499.998,00	01-06-2022	01-11-2025
Calidad del servicio	$12.499.998,00	01-11-2022	01-11-2027

ACTUALIZACION DE POLIZA CON RESPECTO A OTRO SI No.1

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**
PÓLIZA No.	No. CG-1035165 – Aprobada: 15/11/2022
FECHA DE LA PÓLIZA	11/113/2022

AMPAROS	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
		FECHA DE INICIO	**FECHA FINAL**
Cumplimiento	$ 12.499.998,00	31-10-2022	30-06-2023
Prestaciones Sociales	$12.499.998,00	31-10-2022	31-12-2025
Calidad del servicio	$12.499.998,00	01-11-2022	01-11-2027

ACTUALIZACION DE POLIZA CON RESPECTO A OTRO SI No.2

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**
PÓLIZA No.	No. CG-1035165 – Aprobada: 30/12/2022
FECHA DE LA PÓLIZA	30/12/2022

AMPAROS	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
		FECHA DE INICIO	**FECHA FINAL**
Cumplimiento	$ 12.499.998,00	27-12-2022	30-09-2023
Prestaciones Sociales	$12.499.998,00	27-12-2022	30-03-2026
Calidad del servicio	$12.499.998,00	30-03-2023	30-03-2028

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MARZO 2023	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**47.95%**
% EJECUTADO DE OBRA	**42.57%**

SEGUMIENTO REALIZADO:

PERIODO: ENERO 2023

FECHA DE ACTA DE INICIO: *6 de diciembre de 2021*

AVANCE DE OBRA: *42.57%*

VIGENCIA: *30 de marzo de 2023*

El grupo a la supervisión durante este mes ejerció el control y vigilancia, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al conveniado y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado.

A. SUPERVISIÓN GENERAL:

- *Apoyar el logro de los objetivos contractuales.*
- *Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.*
- *Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.*
- *Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato.*
- *Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.*

B.VIGILANCIA ADMINISTRATIVA:

- *Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.*
- *Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos para la celebración del contrato, etc.*

- *Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. • Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.*

C. VIGILANCIA TECNICA:

- *Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes.*

D. VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE:

- *Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.*
- *Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo.*

PARA LO QUE SE REALIZO LA SIGUIENTE GESTION:

1. **Se remitió correo el día 21 de Enero de 2023 al destinatario sobraspublicas@sanantero-cordoba.gov.co para realizar seguimiento a los informes de interventoría semanales y evaluar el cumplimiento de las cláusulas del convenio 1967-21,con el siguiente asunto:**

"solicitud de informes financieros con extractospara auditoria de la contraloria general de la republica de carácter urgente"

La Subdirección de Proyectos del Ministerio del Interior, en calidad de supervisor del convenio en mención solicita a usted, darles cabal y estricto cumplimiento a las obligaciones del municipio establecidas por mutuo acuerdo entre las partes dentro del articulado del convenIo.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siquientes obligaciones:

1. *ESPECIFICAS: 33) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP Il y presentar al MINISTERIO- FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de studios, diseño y obra como el de interventoria. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiacion, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificacion en la que conste el cumplimento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados.*
2.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio y a la auditoria que adelanta la contraloría general de la republica, solicitamos de manera urgente antes de 10 am del dia 30 d e enero d e 2022 lo siguiente:

1. enviar e n este medio y cargar en secop I los informes financieros con los extractos bancarios y los informs semanales de interventora hasta el mes de diciembre de 2022..

Se adjunta correo (anexo 1)

2. **Se remitió correo el día 29 de Enero de 2023 al destinatario sobraspublicas@sanantero-cordoba.gov.co para realizar seguimiento a los informes de interventoría semanales y evaluar el cumplimiento de las cláusulas del convenio 1967-21,con el siguiente asunto:**

"Lineamientofrente a el cumplimiento de la entrega de la información"

En vista que no se viene llevando la entrega de la información a tiempo como lo establece la minuta se adjuntan pantallazos de lo que se hará conforme lo establece el manual de supervisión del ministerio del interior.

POR FAVOR PONERSE AL DIA CON LA INFORMACION SOLICITADA DE MANERA IMEDIATA A CORTE DE DICIEMBRE DE 2022.

LOS INFORMES MENSUALES DE EJECUCION POR FAVOR VERIFIVARLOS YREDACTARLOS BIEN CON TODA LA INFORMACION DEL MES REALIZADA ASUS CONTRATOS DERIVADOS YLOS INFORMES FINANCIEROS POR FAVOR ANEXARLOS EGRESOS YEXTRACTOS ADJUNTOS DENTRO DEL PDF DEL INFORME.

EL INCUMPLIENTO SE DARA CONFORME A LA CLAUSULA DESANCION DE LA MINUTA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES. En caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podrá declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Las partes aceptan que en el caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudirá al procedimiento previsto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. PARAGRAFO ÚNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el evento que así se requiera.
REMITIR LO SOLICITADO E LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR FAVOR

Se adjunta correo (anexo 2)

COMPONENTE FINANCIERO

A la fecha se han desembolsado $1.045.000.000

COMPONENTEN JURIDICO

El convenio se encuentra vigente hasta el 30 de marzo de 2023.


ANEXOS

- Correos enero
- Informes semanales de interventoria

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Según reporte de interventoría enviada a el Municipio San Antero-Cordoba se presenta la siguiente información:

ACTIVIDADES:

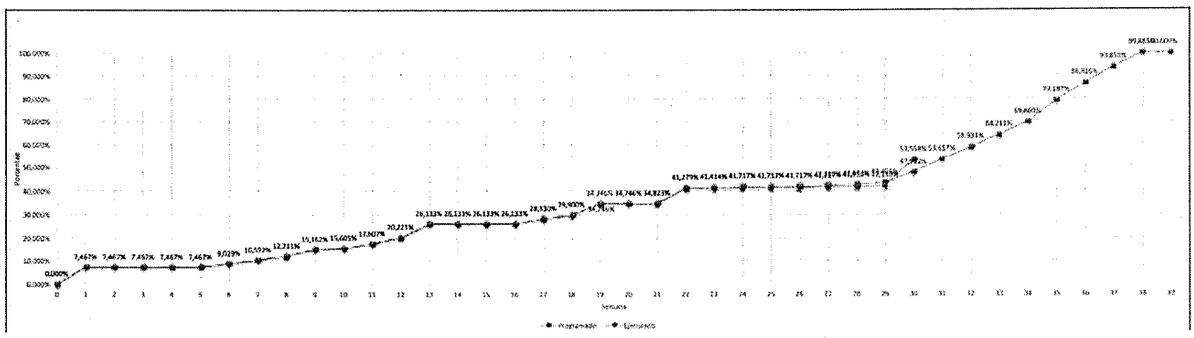

El contratista de obra tenía programado ejecutar en la presente semana 4,55% de avance y acumulado de 47,31% y ejecutó un avance físico semanal del 11,53% y un acumulado físico ejecutado de 53,65% , por lo que se presenta un avance por encima de lo programado de 6,34% por valor de $ 71.357.766. En la presente semana el contratista ejecutó las siguientes actividades:

4,1 Concreto estampado e=0,08 de Fc= 3000 psi o 210 Kg/cm2 M2 68,17
5,1 Guía Pododàctil de 0.20 x 0.20 M2 34,64
5,2 Loseta Podotáctil de Prevención de 0.20 x 0.20 M2 2,74
7,1 Excavación manual de Pilote Y Retiro del mismo M3 (0,00)
9,1 Muros en Bloque liso 15X19x39 M2 7,56
10,2 Modulo de Cerramiento en malla eslabonada galvanizada calibre 10 con hueco de 2 1/4" recubierta en pvc M2 8,26
16,8 Concreto a a la vista impermeabilizado 3.000 PSI para vigas de amarre o de confinamiento 0.2x0.15,incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución (no incluye acero) M3 0,23 16,9 Acero para viga de confinamiento KG 8,02
20,1 Muros en Bloque liso 15X19x39 M2 19,73
20,2 levante superior M2 (0,01)
28,3 Gotero en malla venada. y mortero 1:4 disponer barras # 2 en placa para desarrollar gotero. ML 6,82
30,6 Plantilla en hormigón de 3000 psi, con aditivo impermeabilizante, con espesor de 0.08 M2 (0,00)
30,7 Concreto 3.000 PSI para vigas de confinamiento 0.2x0.15,incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución M3 0,31
31,2 Gotero en malla venada. y mortero 1:4 disponer barras # 2 en placa para desarrollar gotero. ml 11,30
37,1 Levante de Muros de 0.10 MTS De Espesor (No.4) M2 19,76
41,1 Concreto Estampado e=0.07m 3.000 PSI, incluye malla electrosoldada 15x 15,5mm M2 4,20
42,3 Guia Pododactil de 0.20 X 0.20 M2 2,80

43,8 Concreto 3.000 PSI para vigas de confinamiento 0.15x0.1,incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución M3 0,83
47,2,3 SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO TUBERIA SCH4 CABLE #12 LSFH UN 17,00
47,4,1 CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 X 0,60 X 0,65 M, EN CONCRETO. UN 7,00
47,4,2 CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M, EN CONCRETO. COMUNICACIONES UN 10,00
47,5,1 TABLERO MONOFASICO 8 CIRCUITOS CON PUERTA, 220/127V, 150 AMP. UN 2,00
47,6,4 CAJA 30x30 CM DE INSPECCION SUBTERRANEA UN 1,00
47,7,6 POSTE METALICO ROLADO DE 5 MTS CON BASE PERNADA CON BRAZO DE 0,5 MTS. UN 10,00
47,7,7 POSTE METALICO ROLADO DE 5 MTS CON BASE PERNADA CON BRAZO DE 1,0 MTS. UN 2,00
47,7,8 POSTE METALICO ROLADO DE 6 MTS CON BASE PERNADA CON BRAZO DE 1,0 MTS. UN 1,00
47,7,9 POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS INCLUYE; HERRAJES DE SUJECIÓN PROYECTORES UN 4,00
50,1 Concreto Pulido con Acabado Rústico 0,07 m2 10,13
51,1,1 Plantilla e=0.07m 3.000 PSI M2 30,32
Se realizó ensayo de esclerometría en la placa de entrepisos del área de cafeteria.

OBSERVACIONES :

- La supervisión por parte del ministerio en aras del seguimiento y cumplimiento a la ejecución del convenio en mención a realizado todas las gestiones pertinentes y se genero compromiso por parte del Municipio el aporte del recurso para obtener cierre financiero.

- Se realizo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados. En los términos de "***la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, las Entidades Estatales, los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.***"

- Durante este periodo se ejercicio el apoyo a la supervisión en base a todos los lineamientos para la suscripción, perfeccionamiento, supervisión y legalización de convenios y contratos interadministrativos en Función Pública.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

14/09/2022	19/11/2022	06/12/2022	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO Supervisor Convenio No. 1967 de 2021 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**DAVID DARIO NEGRETE** Reviso-contratista desde el 25 de enero de 2023 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON
NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR Subdirector de proyectos desde el 6/01/2023-15/01/2023 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**MARIA ALEXANDRA MIZGER** Elaboró -Contratista de apoyo a la supervisión Desde el 25/01/2023 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

solicitud de informes financieros para auditoria de la contraloría general de la republica de carácter urgente

Maria Alexandra Mizger <maria.mizger@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Dom 29/01/2023 0:41

Para: SAMIR _sobraspublicas <sobraspublicas@sanantero-cordoba.gov.co>

Cordial saludo.

La Subdirección de Proyectos del Ministerio del Interior, en calidad de supervisor del convenio en mención solicita a usted, darles cabal y estricto cumplimiento a las obligaciones del municipio establecidas por mutuo acuerdo entre las partes dentro del articulado del convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones:

I. ESPECÍFICAS: 33) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio y a la auditoria que adelanta la contraloría general de la republica , solicitamos de manera urgente antes de **10 am del dia 30 de enero de 2022** lo siguiente:

1. enviar en este medio y cargar en secop II los informes financieros con los extractos bancarios y los informes semanales de interventora hasta el mes de diciembre de 2022.

Cordialmente,

image.png

Profesional - Apoyo a la supervisión
Contratista
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mai: maria.ministeriodelinterior@gmail.com
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Lineamiento frente a el cumplimiento de la entrega de la información

Maria Alexandra Mizger <maria.mizger@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Dom 29/01/2023 13:16

Para: SAMIR _sobraspublicas <sobraspublicas@sanantero-cordoba.gov.co>

2 archivos adjuntos (378 KB)

Captura de pantalla 2023-01-29 a la(s) 1.03.10 p.m..png; Captura de pantalla 2023-01-29 a la(s) 1.03.21 p.m..png;

Buenas tardes,

En vista que no se viene llevando la entrega de la información a tiempo como lo establece la minuta se adjuntan pantallazos de lo que se hará conforme lo establece el manual de supervisión del ministerio del interior.

POR FAVOR PONERSE AL DIA CON LA INFORMACION SOLICITADA DE MANERA INMEDIATA A CORTE DE DICIEMBRE DE 2022.

LOS INFORMES MENSUALES DE EJECUCION POR FAVOR VERIFIVARLOS Y REDACTARLOS BIEN CON TODA LA INFORMACION DEL MES REALIZADA A SUS CONTRATOS DERIVADOS Y LOS INFORMES FINANCIEROS POR FAVOR ANEXAR LOS EGRESOS Y EXTRACTOS ADJUNTOS DENTRO DEL PDF DEL INFORME.

EL INCUMPLIENTO SE DARA CONFORME A LA CLAUSULA DE SANCION DE LA MINUTA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES. En caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podrá declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudirá al procedimiento previsto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. **PARÁGRAFO ÚNICO.** El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el evento que así se requiera.

REMITIR LO SOLICITADO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR FAVOR

REGISTRO DE CALIDAD
INFORME SEMANAL DEL PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE, TIPOLOGÍA 1, OPCIÓN 1, EN EL BARRIO SAN JOSE DE PETARE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA


PLAZO TOTAL EN MESES: 10	TOTAL SEMANAS:	39	SEMANA No. 30	DEL 23/1/2023	AL 29/01/2023

OBRA		INTERVENTORÍA
CONTRATO DE OBRA N°:	002-2022	BUSERCO S.A.S.
VALOR INICIAL:	$ 1.124.998.840,00	
VALOR DE ESTUDIOS:	$ 83.333.000,00	
VALOR DE LA OBRA:	$ 1.041.665.840,00	
VALOR FINAL (Inicial + Adicional):	NA	
PLAZO INICIAL (meses) :	Cinco (5) Meses	
PLAZO TOTAL (meses) :	Diez(10) Meses	
FECHA DE INICIO :	1/06/2022	
CONTRATISTA :	CONSORCIO SACUDETE SAN ANTERO 2022	

2. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	COMPONENTE / DESCRIPCIÓN	VALOR COSTO DIRECTO	% DEL COMPONENTE SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE PROGRAMADO EN LA SEMANA	PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE O ATRASO	VALOR DE AVANCE O ATRASO
0,0	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000	7,41%	0,00%	7,41%	0,00%	7,41%	[illegible]	$ [illegible]
1,0	CANCHA GENERAL DE OBRAS EXTERIORES PROYECTO 30mX40m	$98.283.104	8,74%	0,43%	7,66%	1,19%	8,59%	[illegible]	$ [illegible]
2,0	CANCHA SINTETICA CERRAMIENTO	$135.077.668	12,01%	0,00%	12,01%	-0,38%	11,68%	[illegible]	$ [illegible]
3,0	CANCHA SINTETICA DE MICROFUTBOL	$114.671.630	10,19%	0,00%	2,68%	0,00%	2,68%	[illegible]	$ [illegible]
4,0	GRADERIAS EN CONCRETO	$22.078.964	1,96%	0,00%	1,96%	0,00%	1,96%	[illegible]	$ [illegible]
5,0	BLOQUES BAÑOS Y SALA COMUNITARIA	$107.822.285	9,58%	0,56%	6,92%	0,24%	5,15%	[illegible]	$ [illegible]
6,0	CAFETERIA	$39.206.147	3,48%	0,19%	2,60%	0,17%	2,58%	[illegible]	$ [illegible]
7,0	AUDITORIO ABIERTO	$129.857.440	11,54%	1,33%	3,46%	0,18%	2,50%	[illegible]	$ [illegible]
8,0	ILUMINACION EXTERIOR E INTERIOR	$201.842.094	17,94%	2,23%	2,23%	9,84%	9,84%	[illegible]	$ [illegible]
9,0	GYM VITAL	$25.610.764	2,28%	0,00%	0,38%	0,00%	0,38%	[illegible]	$ [illegible]
10,0	CICLO PARQUEO	$2.587.257	0,23%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	[illegible]	$ [illegible]
11,0	JUEGOS PARA NIÑOS	$152.166.135	13,53%	0,00%	0,00%	0,22%	0,81%	[illegible]	$ [illegible]
12	CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP	$12.461.800	1,11%						
	TOTAL DEL PROYECTO	$ 1.124.998.288,54	100,0%	4,5458%	47,310%	11,5335%	53,65%	[illegible]	$ [illegible]

Valor Avance Acumulado Programado a la Fecha =	$ 532.234.398,2	47,31%
Valor Avance Fisico Ejecutado a la Fecha =	$ 603.592.164,2	53,65%

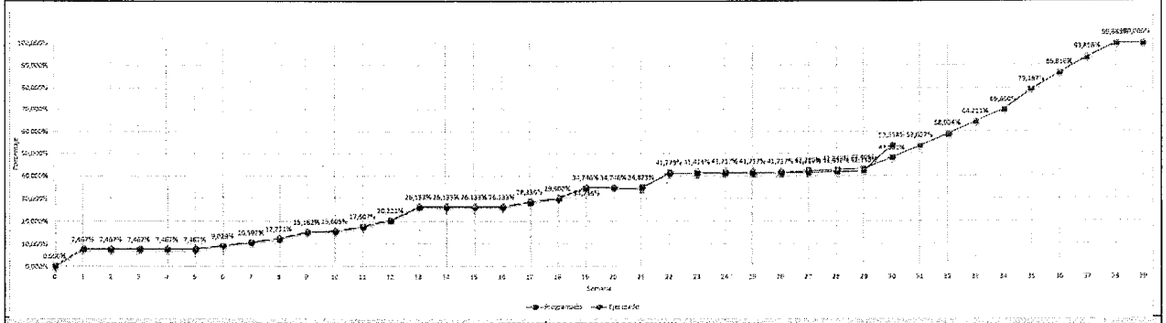

3. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

3.1 ASPECTOS TECNICOS

El contratista de obra tenía programado ejecutar en la presente semana 4,55% de avance y acumulado de 47,31% y ejecutó un avance físico semanal del 11,53% y un acumulado físico ejecutado de 53,65% , por lo que se presenta un avance por encima de lo programado de 6,34% por valor de $ 71.357.786.


En la presente semana el contratista ejecutó las siguientes actividades:


4,1 Concreto estampado e=0,08 de Fc= 3000 psi o 210 Kg/cm2 M2 68,17
5,1 Guia Pododáctil de 0.20 x 0.20 M2 34,64
5,2 Loseta Pododáctil de Prevención de 0.20 x 0.20 M2 2,74
7,1 Excavación manual de Pilote Y Retiro del mismo M3 (0,00)
9,1 Muros en Bloque liso 15X19x39 M2 7,56
10,2 Modulo de Cerramiento en malla esfabonada galvanizada calibre 10 con hueco de 2 1/4" recubierta en pvc M2 8,26
16,8 Concreto a -a la vista impermeabilizado 3.000 PSI para vigas de amarre o de confinamiento 0.2x0.15,incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución (no incluye acero) M3 0,23
16,9 Acero para viga de confinamiento KG 8,02
20,1 Muros en Bloque liso 15X19x39 M2 19,73
20,2 levante superior M2 (0,01)
28,3 Gotero en malla venada. y mortero 1:4 disponer barras # 2 en placa para desarrollar gotero. ML 6,82
30,6 Plantilla en hormigón de 3000 psi, con aditivo impermeabilizante, con espesor de 0.08 M2 (0,00)
30,7 Concreto 3.000 PSI para vigas de confinamiento 0.2x0.15,incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución M3 0,31
31,2 Gotero en malla venada. y mortero 1:4 disponer barras # 2 en placa para desarrollar gotero. ml 11,30
37,1 Levante de Muros de 0.10 MTS De Espesor (No,4) M2 19,76
41,1 Concreto Estampado e=0,07m 3.000 PSI, Incluye malla electrosoldada 15x 15,5mm M2 4,20
42,3 Guia Pododactil de 0.20 X 0.20 M2 2,80
43,8 Concreto 3.000 PSI para vigas de confinamiento 0.15x0.1,incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución M3 0,83
47,2,3 SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO TUBERIA SCH4 CABLE #12 LSFH UN 17,00
47,4,1 CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 X 0,60 X 0,65 M, EN CONCRETO. UN 7,00
47,4,2 CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M, EN CONCRETO. COMUNICACIONES UN 10,00
47,5,1 TABLERO MONOFASICO 8 CIRCUITOS CON PUERTA, 220/127V, 150 AMP. UN 2,00
47,6,4 CAJA 30x30 CM DE INSPECCION SUBTERRANEA UN 1,00
47,7,6 POSTE METALICO ROLADO DE 5 MTS CON BASE PERNADA CON BRAZO DE 0,5 MTS. UN 10,00
47,7,7 POSTE METALICO ROLADO DE 5 MTS CON BASE PERNADA CON BRAZO DE 1,0 MTS. UN 2,00
47,7,8 POSTE METALICO ROLADO DE 6 MTS CON BASE PERNADA CON BRAZO DE 1,0 MTS. UN 1,00
47,7,9 POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS INCLUYE; HERRAJES DE SUJECIÓN PROYECTORES UN 4,00
50,1 Concreto Pulido con Acabado Rústico 0,07 m2 10,13
51,1,1 Plantilla e=0.07m 3.000 PSI M2 30,32

Se realizó ensayo de esclerometría en la placa de entrepisos del área de cafetería.

3.2 ASPECTOS SOCIALES, SISO Y AMBIENTALES

4. RECORD FOTOGRAFICO

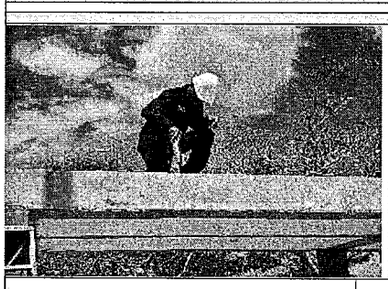

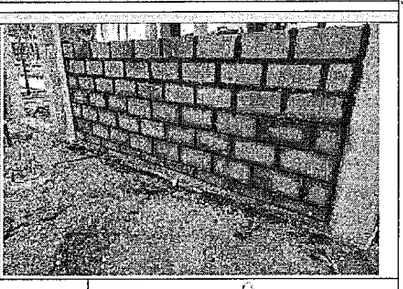

lunes 30 de enero de 2023			Firma:
			Nombre: Andrés Felipe Buelvas Serpa
			RESIDENTE DE INTERVENTORIA
