Informe: Desarrollo actividades de construcción parqueadero del Centro de la Construcción.

Ficha en etapa practica: 2927396 Técnico en construcción de vías.

Instructor: Elkin Bernel Perez Daza

Fecha: 14 de marzo 2025

Mediante el presente informe me permito notificar las actividades que se han venido desarrollando en el **Parqueadero del Centro de la Construcción**, las cuales se están ejecutando con aprendices en etapa pertenecientes a la Ficha **2927396 Técnico en construcción de vías**.

Este informe recoge el desarrollo de las actividades desde el 17 de febrero hasta el 14 de marzo de 2025.

Lunes, 17 de febrero 2025


Se realiza el corte de formaleta para las fundiciones en concreto de los pedestales para los pilares de la cubierta.






Miércoles, 19 de febrero 2025


Fundición de pedestales en concreto de 4000 PSI, toma de cilindros para control de calidad del concreto.

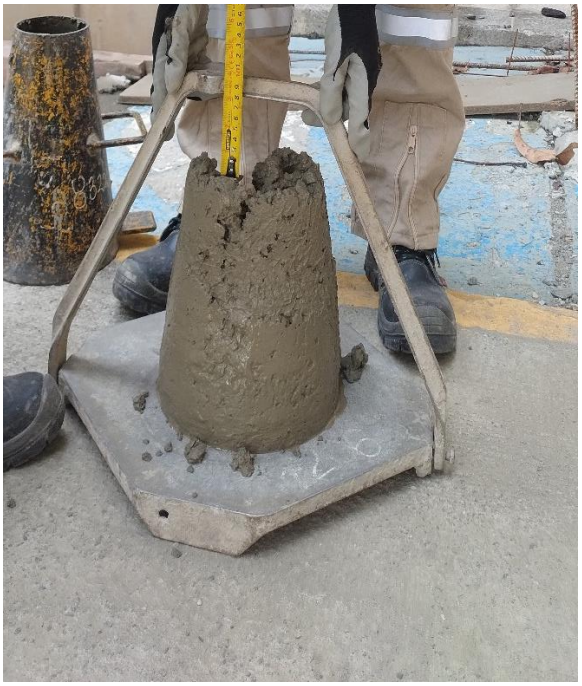

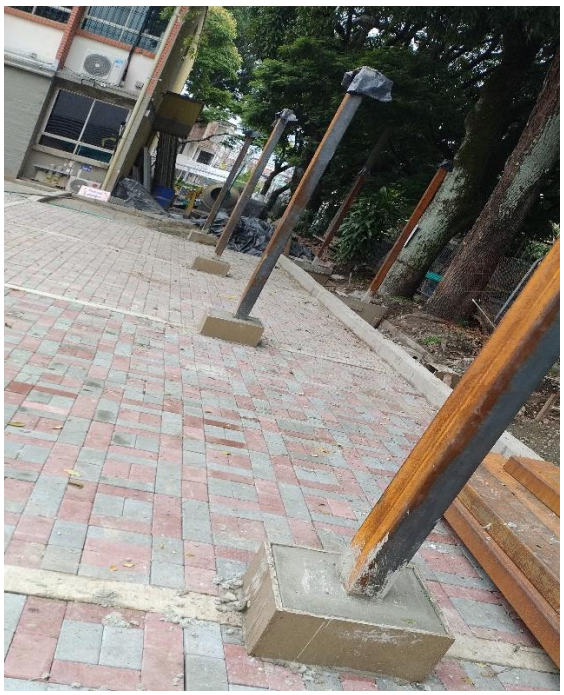

Lunes, 24 de febrero 2025

Se retira la formaleta del bordillo del eje No.1, la cual se había deformado debido a que lleva más de 2 meses expuesta, y se procede a realizar un nuevo replanteo e instalar nueva formaleta.

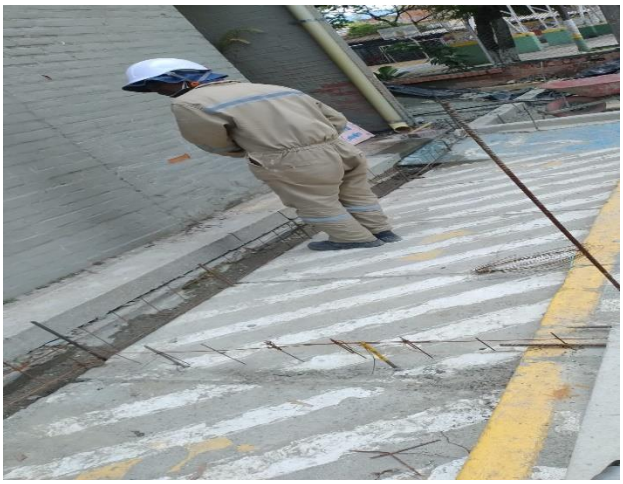




Miércoles, 26 de febrero 2025

Fundición de bordillo del eje No.1, con concreto de 4000 PSI, toma de cilindros para control de calidad del concreto.



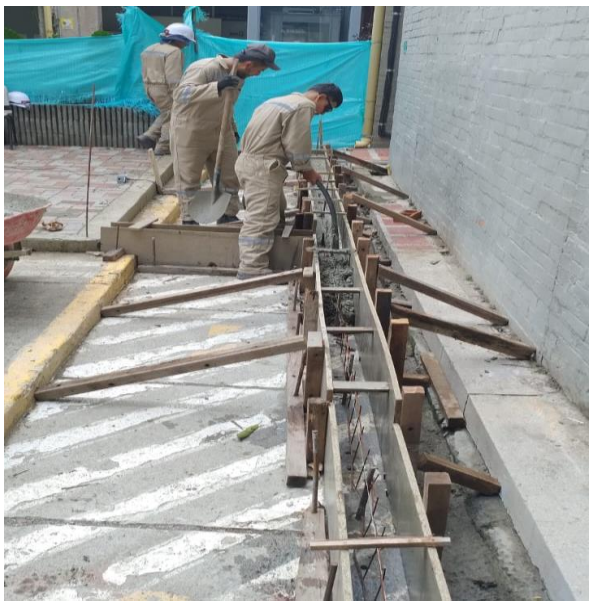

Lunes, 03 de marzo 2025

Se procede a realizar el replanteo e instalación de formaleta para los bordillos perimetrales de confinamiento en la franja de zona verde.





Miércoles, 05 de marzo 2025


Se inicia intervención de muro de lindero con colegio Sante fe, debido a que se encuentra en mal estado, iniciando la demolición y el retiro de escombros.





Lunes, 10 de marzo 2025

Se rellena y compacta con material de subbase (roca-muerta), para nivelación de áreas a ser pavimentadas con adoquín.

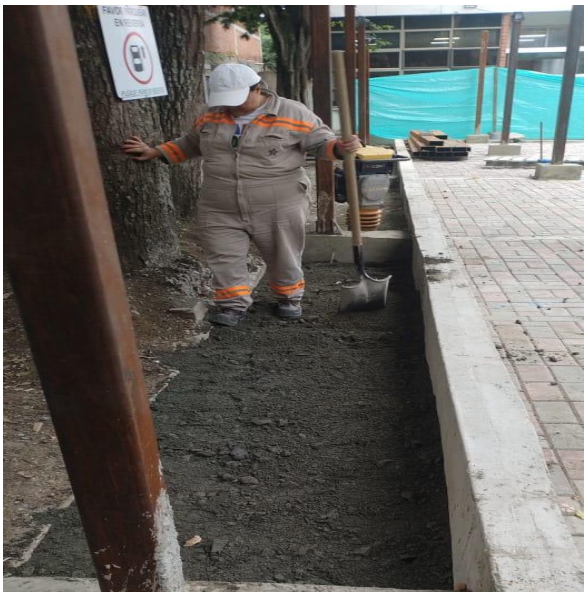



Anexo 1. Plan de trabajo que se ha propuesto, teniendo en cuenta algunas novedades.

El plan de trabajo se ha venido cumpliendo, aunque se han venido incorporando intervenciones que no estas previstas, como es el muero de lindero con el colegio Santa fe.

Cabe recordar que mi asignación a la ejecución de las obras del parqueadero es solo los lunes y miércoles durante el presente trimestre.

Muchas gracias.

Cordialmente,



Elkin Bernel Perez Daza
Contratista
C.C. No. 1085690035

Anexo 1

Plan de trabajo propuesto para el I trimestre de 2025

	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
1	Cerramiento, limpieza y organización del area de trabajo		25-feb	Las fechas de terminacion establecidas se cumpliran, teniendo en cuenta que se pueden presentar novedades en el desarrollo de las actividades, tales como: Factores climaticos Cierre de las instalaciones del Centro de la construccion Incumplimiento y actitud de disponibilidad de los aprendices Semana santa (13 al 20 abril) Otros motivos de fuerza mayor.
2	Formaleteada y fundicion en concreto de 4000 psi, de pedestales	Corresponde a los Perfiles metalicos, de los elementos verticales de la zona verde y del area de parqueo		
3	Formaleteada y fundicion en concreto de 4000 psi, de bordillos de confinamiento	Ubicados en el acceso peatonal al parqueadero, para conformar la canal de aguas lluvias	6-mar	
4	Formaleteada y fundicion en concreto de 4000 psi, de bordillos de confinamiento	Para confinar los paños de adoquin faltantes en el area del parqueadero		
5	Acarreo de material de sub base granular	Vaciado del material en los espacios a adoquinar en la zona verde	18-mar	
6	Adecuacion de la superficie y fundicion de rampa en concreto reforzado de 4000 psi	Es la rampa de acceso peatonal al parqueadero	25-mar	
7	Adecuacion de la superficie y fundicion de rampa en concreto reforzado de 4000 psi	Es la rampa de acceso vehicular al parqueadero	27-mar	
8	Instalacion de adoquin vehicular	Corresponde al area de parqueadero y acceso peatonal	10-abr	
9	Limpieza y aseo del area de trabajo		24-abr	
