CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO 100-12-03-007



OBJETO: "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERROVERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ".

INFORME DE OBRA ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No. 001

SIMITÍ - BOLIVAR

FEBRERO DE 2024

CALLE 62 No 28-28 LOCAL 1 EDIFICIO PORTOBELLO II TELÉFONO: 6431470 – 317 4337686
E – MAIL: byb.soluciones@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER

1. INTRODUCION

El presente informe presenta las Actividades Ejecutadas durante el periodo de tiempo comprendido desde el veintiocho (28) de octubre al doce (12) de diciembre del 2024, del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO 100-12-03-007,** cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERROVERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ". Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, mediante evidencia fotográfica se presentan los procesos constructivos llevados a cabo hasta la fecha.

El alcalde Municipal **WILMAN ELI QUINTANA GONZALEZ,** pretende ofrecer a la comunidad del Corregimiento del CERRO DE VERACRUZ (BURGOS), el mejoramiento de un tramo del muro de contención así como a la comunidad del corregimiento CAMPO PAYARES, se piensa adecuar un muro en piedra y hexápodos para prevenir y adecuar la orilla del rio en los márgenes deteriorados por el rio Magdalena cumpliendo con las normas exigidas.

Este proyecto de impacto nace debido al deterioro del muro existente, afectado estructuralmente debido a la socavación generada por el rio, perjudicando directamente a la comunidad de los corregimientos, tanto del Cerro de Veracruz como de Campo Payares, creando la necesidad de construir un muro para mitigar el problema

2. LOCALIZACIÓN.

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

Simití es un municipio de Colombia del departamento de Bolívar situado a 584 kilómetros de Cartagena. Queda localizado en el Magdalena Medio. Simití o Chimití, que significa "Mucha tierra", está rodeado por la ciénaga homónima.



MUNICIPIO DE SIMITI - BOLIVAR

2.2 LOCALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO

La zona donde se está desarrollando el proyecto **"CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERROVERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ",** una ubicación será en la Zona Rural Cerro de Veracruz (Burgos), está ubicado a unos 12 km del casco urbano del Municipio de Simiti bolívar, a este Corregimiento se puede acceder por vía terrestre, aquí se realizará la construcción del muro de contención y la otra ubicación en el Corregimiento de Campo Payares, el cual se accede por vía fluvial desde le Cerro de Burgos con tiempo de 45 minutos, o por vía terrestre por el Municipio de Morales





Foto de Corregimiento Campo Payares

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO 100-12-03-007

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	CTO 2024-110-12-03-007
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE SIMITÍ** cuyo Representante legal es Wilman Eli Quintana González, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.851.161 de Barrancabermeja.
NIT:	890.480.006 – 1
CONTRATISTA:	**B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S** cuyo Representante legal es Jorge Leonardo Basto Anaya, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.022 de Bucaramanga.
NIT:	900.295.156 - 0
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ.
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ
VALOR:	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTE Y TRES PESOS MCTE ($345.912.133,00) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
PLAZO:	DOS (02) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.005.45.4503.02
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	No. 0822 - 4
REGISTRO PRESUPUESTAL RP	No. 1017 - 7
ACTA DE INICIACION	OCTUBRE 28 DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 27 DE 2024
ACTA DE SUSPENSION DE OBRA No. 001	DICIEMBRE 13 DE 2024
ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 001	FEBRERO 25 DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE REINICIO No. 001	MARZO 11 DE 2025
REGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA

3.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
ACTA DE INICIO DE OBRA	28/10/2024	NINGUNA
ACTA DE SUSPENSION DE OBRA No. 001	13/1272024	NINGUNA
ACTA DE REINCIODE OBRA No. 001	25/02/2025	NINGUNA
ACTA DE RECIBO Y PAGO DE AVANCE DE OBRA No. 001	28/02/2025	NINGUNA

3.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Por medio del Contrato de Obra Pública No. CTO 100-12-03-007, del diez (10) de octubre de 2024, el Municipio de Simití-Bolívar, se ejecuta la obra en los corregimientos de Cerro de Vera Cruz y corregimiento Campo Payares, obra para la "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ". Donde se han ejecutado las siguientes actividades relevantes:

- LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO.
- EXCAVACION EN MATERIAL COMUN.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE HEXAPODOS EN CONCRETO PARA MUROS CLASE D (F´c = 210 kg/cm2) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO).
- RELLENO FLUIDO LANZADO.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE EN ROCADO.

Por medio de la Supervisión, se realizó el control, revisión y verificación de la ejecución y cumplimiento de los trabajos concernientes al contrato de obra respectivo

3.4. DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

A la fecha de corte del informe parcial de avance de obra No. 001, durante el periodo de tiempo comprendido desde el veintiocho (28) de octubre al doce (12) de diciembre del 2025, se ejecutó un porcentaje de obra del **60.32%** de la CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ, acumulando un porcentaje de total de la ejecución de 60.32%, faltando para su terminación un porcentaje de 39.68**%** para una ejecución del 100 % de del Contrato de Obra en mención.

Se relaciona a continuación en la **Tabla 2** Presupuesto con cantidades originalmente contratadas y Acta de Recibo y Pago Final y Avance Obra, **Tabla 3**. En el Anexo A se mostrarán las evidencias fotográficas del desarrollo de la obra.

Tabla 2: cantidades originalmente contratadas.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		FASE I				
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
1.01		LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	MES	2.00	$ 4,799,796.00	$ 9,599,592.00
Subtotal						**$ 9,599,592.00**
2	**ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES**					
2.01		EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	15.00	$ 94,178.00	$ 1,412,670.00
Subtotal						**$ 1,412,670.00**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					
3.01		SUMINISTRO Y COLOCACION DE HEXAPODOS EN CONCRETO PARA MUROS CLASE D (F'c = 210 kg/cm2) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	U	372.00	$ 606,082.00	$ 225,462,504.00
3.02		RELLENO FLUIDO LANZADO	M3	3.00	$ 652,722.00	$ 1,958,166.00
Subtotal						**$ 227,420,670.00**
4	**ESTRUCTURAS DE ENROCADOS**					

4.01		SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES	M3	30.00	$ 788,020.00	$ 23,640,600.00
4.02		SUMINISTRO E INSTALACION DE EN ROCADO	M3	311.58	$ 269,080.00	$ 83,838,601.00
Subtotal						**$ 107,479,201.00**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 345,912,133.00**

3.5. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Tabla 3: Actividades ejecutadas por el contratista

De acuerdo con el objeto del contrato durante el periodo de tiempo comprendido desde el veintiocho (28) de octubre al doce (12) de diciembre del 2024, se desarrollaron las siguientes Actividades del Acta de Recibo y Pago de Avance de Obra No. 001, con un avance del 60.32%.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONCICIONES CONTRATUALES INICIALES				ACTA No. 001	
			UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.01		LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	MES	2.00	4,799,796.00	9,599,592.00	1.50	7,199,694.00
Subtotal						**9,599,592.00**		**7,199,694.00**
2.01		EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	15.00	94,178.00	1,412,670.00	15.00	1,412,670.00
Subtotal						**1,412,670.00**		**1,412,670.00**
3.01		SUMINISTRO Y COLOCACION DE HEXAPODOS EN CONCRETO PARA MUROS CLASE D (F´c = 210 kg/cm2) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	U	372.00	606,082.00	225,462,504.00	220.00	133,338,040.00
3.02		RELLENO FLUIDO LANZADO	M3	3.00	652,722.00	1,958,166.00	0.00	0.00
Subtotal						**227,420,670.00**		**133,338,040.00**
4.01		SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES	M3	30.00	788,020.00	23,640,600.00	30.00	23,640,600.00
4.02		SUMINISTRO E INSTALACION DE EN ROCADO	M3	311.58	269,080.00	83,838,601.00	160.00	43,052,800.00
Subtotal						**107,479,201.00**		**66,693,400.00**
		ADMINISTRACIÓN			29.00%	74,307,050.79		44,819,780.12
		IMPREVISTOS			1.00%	2,562,312.10		1,545,509.66
		UTILIDAD			5.00%	12,811,560.48		7,727,548.30
		VALOR TOTAL				[redacted]		[redacted]
						[redacted]		[redacted]

3.5.1. ACTIVIDADES TECNICAS:

De acuerdo con el objeto del contrato durante el periodo de tiempo comprendido desde el veintiocho (28) de octubre de al doce (12) de diciembre del 2024, se desarrollaron las siguientes Actividades.

- PRELIMINARES
  - ✓ LOCALIZACION Y REPLATEO TOPOGRAFICO
- ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES
  - ✓ EXCAVACION EN MATERIAL COMUN.
- ESTRUCTURAS EN CONCRETO
  - ✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE HEXAPODOS EN CONCRETO PARA MUROS CLASE D (F´c = 210 kg/cm2) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
- ESTRUCTURAS EN CONCRETO
  - ✓ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES
  - ✓ SUMINISTRO E INSTALACION DE ENROCADO

3.5.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

De acuerdo con el objeto contractual se realizaron las siguientes actividades:


- La gestión del personal de obra, Contratación del personal de obra con sus respectivas afiliaciones, así como sus liquidaciones, y paz y salvos.
- Compras: revisión de comparativos, elaboración de contratos de suministros y servicios.
- Gestión de subcontratistas: revisar contratos con subcontratistas, solicitar y revisar la documentación laboral de los subcontratistas, liquidación de subcontratistas.
- Control de tesorería: registro y control de los movimientos de la caja de obra y las cuentas bancarias asociadas a la obra, realizar estimaciones de flujos de caja de la obra.
- Facturación y pagos: revisión, conformidad, contabilización y pago de las facturas de proveedores y subcontratistas
- Contabilidad: realizar la contabilidad analítica de la obra, y realizar o supervisar la contabilidad financiera de la obra.

- Gestionar el archivo documental de la obra
- Controlar las comunicaciones oficiales de la obra (entrada y salida de documentación)
- Supervisar el almacén de la obra, realizar inventario final.
- Recopilar las actas de las reuniones internas de la obra, y realizar actas finales.
- Realizar todas las gestiones necesarias con las Administraciones Públicas relacionadas con la obra
- Llevar el control de inmovilizado e inventario de obra.

3.5.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS:

Durante el periodo comprendido se ejecutaron las actividades descritas en el acta de recibo y pago final de avance de obra, por un valor de CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE ($120.168.526,00) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, En el siguiente diagrama se muestra el balance financiero del proyecto

VALOR CONTRATADO	$ 345.912.133,00	100,00%
VALOR ACTA ANTICIPO CONTRATO INICIAL	$ 0.00	0,00%
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No. 001	$ 208.643.804,00	60,32%
DESCUENTO POR ANTICIPO AL ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No. 001	$ 0,00	
NETO A PAGAR ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No. 001	$ 208.643.804,00	
PORCENTAJE (%) ACUMULADO TOTAL	$ 208.643.804,00	60,32%
VALOR POR EJECUTAR CONTRATO INICIAL	$ 137.268.329.00	39,68%

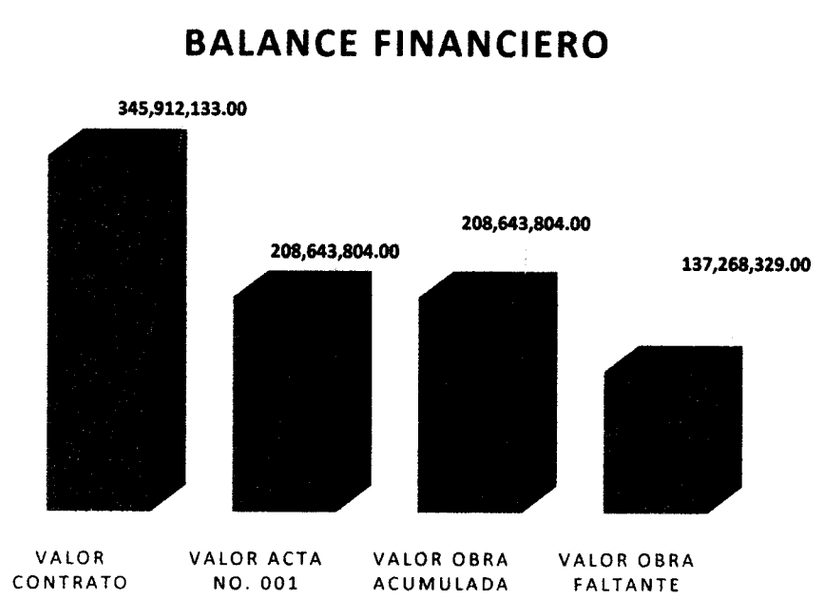

3.5.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES:

Se dio cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental dentro del proceso de Selección Abreviada Pública, se recolectaron todos los escombros y sobrantes de obra, se procedió a llevarlos a el sitio dispuesto por la supervisión.

3.5.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

Se dio cumplimiento al Plan de Control y Aseguramiento de la Calidad dentro del proceso de Selección Abreviada Pública, Se entregaron certificaciones de todos los materiales utilizados en la obra.

3.5.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDA EN EL TRABAJO

Se dio cumplimiento al programa de seguridad en el trabajo que tiene la empresa dentro del proceso de Selección Abreviada Pública, Se entregaron certificaciones de todos los materiales utilizados en la obra.

3.6. RELACION DEL PERSONAL POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro y es acorde con el proceso contractual, así:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Ingeniero Residente de Obra	1	SI
Ingeniero Auxiliar HSI	1	SI
Almacenista	1	SI
Secretaria-auxiliar contable	1	SI
Maestro de Obra	1	SI
Oficiales de Obra	1	SI
Operador de maquinaria Pesada	1	SI
Ayudantes de Obra	4	SI
PERSONAL TOTAL	**11**	

3.7. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
VEHICULO	1	CAMIONETA
MINICARGADOR	1	BOCAT
VOLQUETA SENCILLA	1	8 M3 DODGE
VOLQUETA DOBLETROQUE	4	16 M3
RETROCARGADOR TIPO ORUGA	2	220 CAT
FERRI-CARGADOR	1	300 TON
RETRO CARGADOR TIPO PAGARITA	1	420 D
COMPUTADOR PORTÁTIL	1	3G
IMPRESORA	1	EPSON 210
SCANNER	1	EPSON L55
FORMALETA PARA HEXAPODOS	20	UNIDADES
MEZCLADORA	2	2 BTOS
VIBRADOR DE CONCRETO	2	ELECTRICOS
HERRAMIENTA MENOR	1	

3.8. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el desarrollo del contrato de obra se presentaron lluvias fuertes y moderadas en más de 10 días así como inundación del corregimiento el Cerro de Veracruz lo que han obligado a suspender las labores en esos días, provocando el incremento en los imprevistos de obra.

3.9. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	No. PÓLIZA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/10/2024	10/07/2025	96-44-101192407	SEGUROS DEL ESTADO S.A
CALIDAD DEL SERVISIO	28/10/2024	10/07/2025	96-44-101192407	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/10/2024	10/03/2028	96-44-101192407	SEGUROS DEL ESTADO S.A
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS	5 AÑOS	96-44-101192407	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	28/10/2024	10/03/2025	96-40-101068107	SEGUROS DEL ESTADO S.A
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	28/10/2024	10/03/2025	96-40-101068107	SEGUROS DEL ESTADO S.A

4. ANEXOS

- **MEMORIAS DE CALCULO CON REGISTRO FOTOGRÁFICO.**
- **SEGURIDAD SOCIAL.**
- **COPIAS POLIZAS.**

JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
C.C No. 91.497.022 de Bucaramanga
R.L. B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S

5. IMPREVISTOS.

Los imprevistos en el Contrato de Obra inicial son de 1% que ascienden a un valor de $2,562,312.10; Para esta acta de recibo y pago final de avance de obra, se tiene un imprevisto que equivale a $ 1.545.509,66; correspondientes a las situaciones mencionadas a continuación.


La justificación del imprevisto obedece a que se ha tenido que realizar una protección en tapia para el corregimiento de Campo Payares, este trabajo se realiza para la protección de la ribera en la zona de trabajo e impedir la inundación al sitio de trabajo, estas actividades fueron aprobadas por la supervisión del contrato.

CERRAMIENTO EN LONA VERDE				
Descripción	UND	CANTIDAD	VR	SUBTOTAL
INSTALACIÓN DE TAPIA EN EL CORREGIMIENTO CERRO Y PAYARES	M	40	$ 50.000	$ 2.000,000.00
TOTAL IMPREVISTOS			$ 2.000,000.00	

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS IMPREVISTOS


IMP – 1	INSTALACIÓN DE TAPIA EN EL CORREGIMIENTO CERRO Y PAYARES	M	50



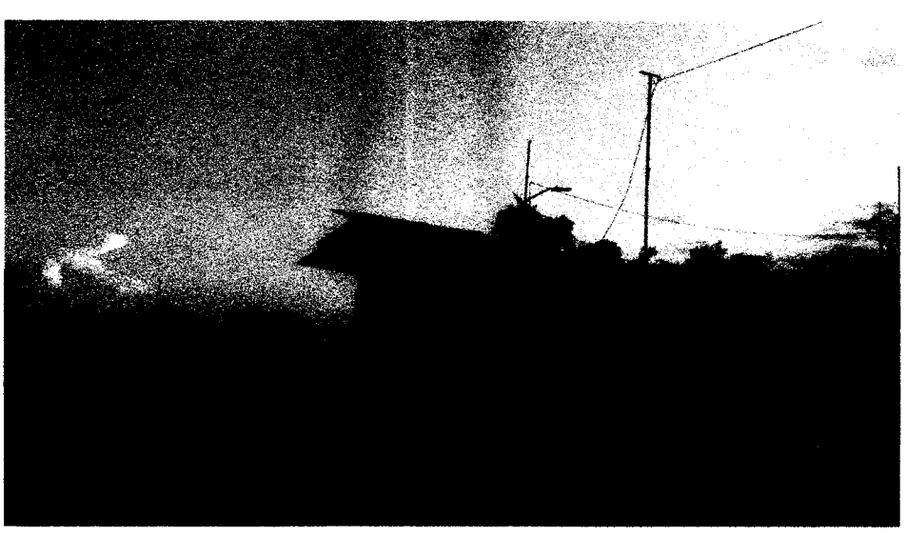

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	MES

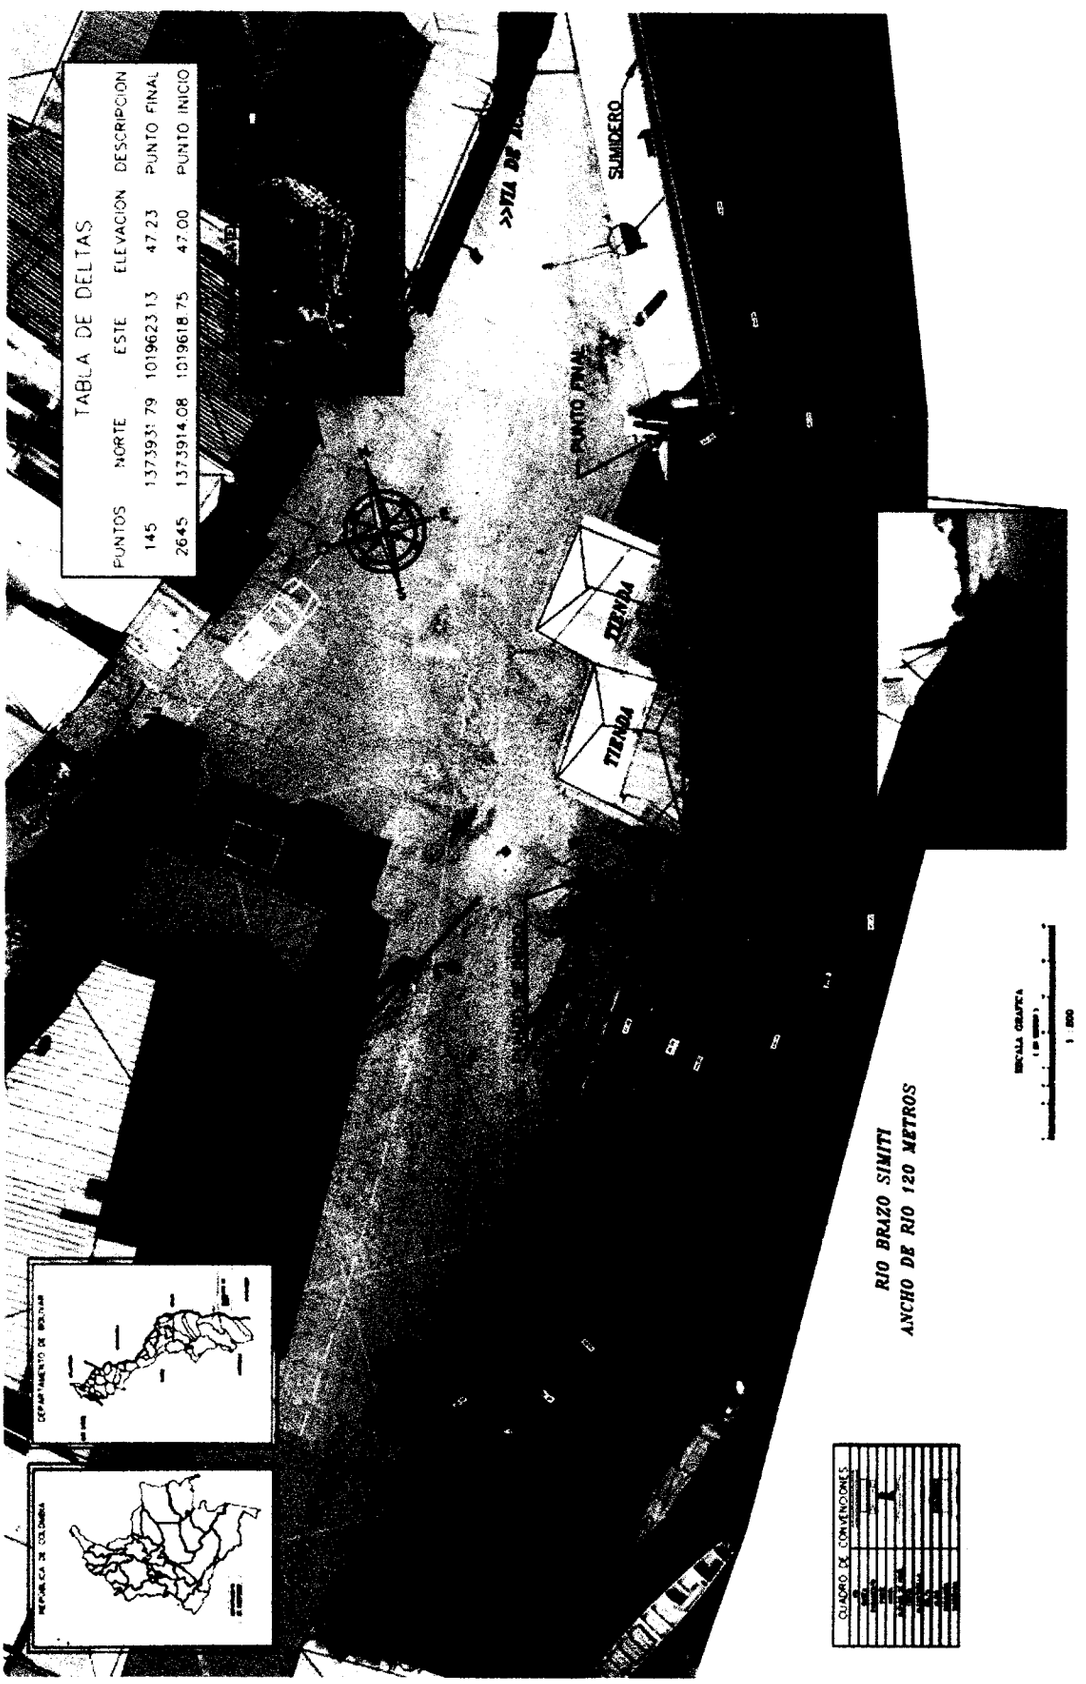



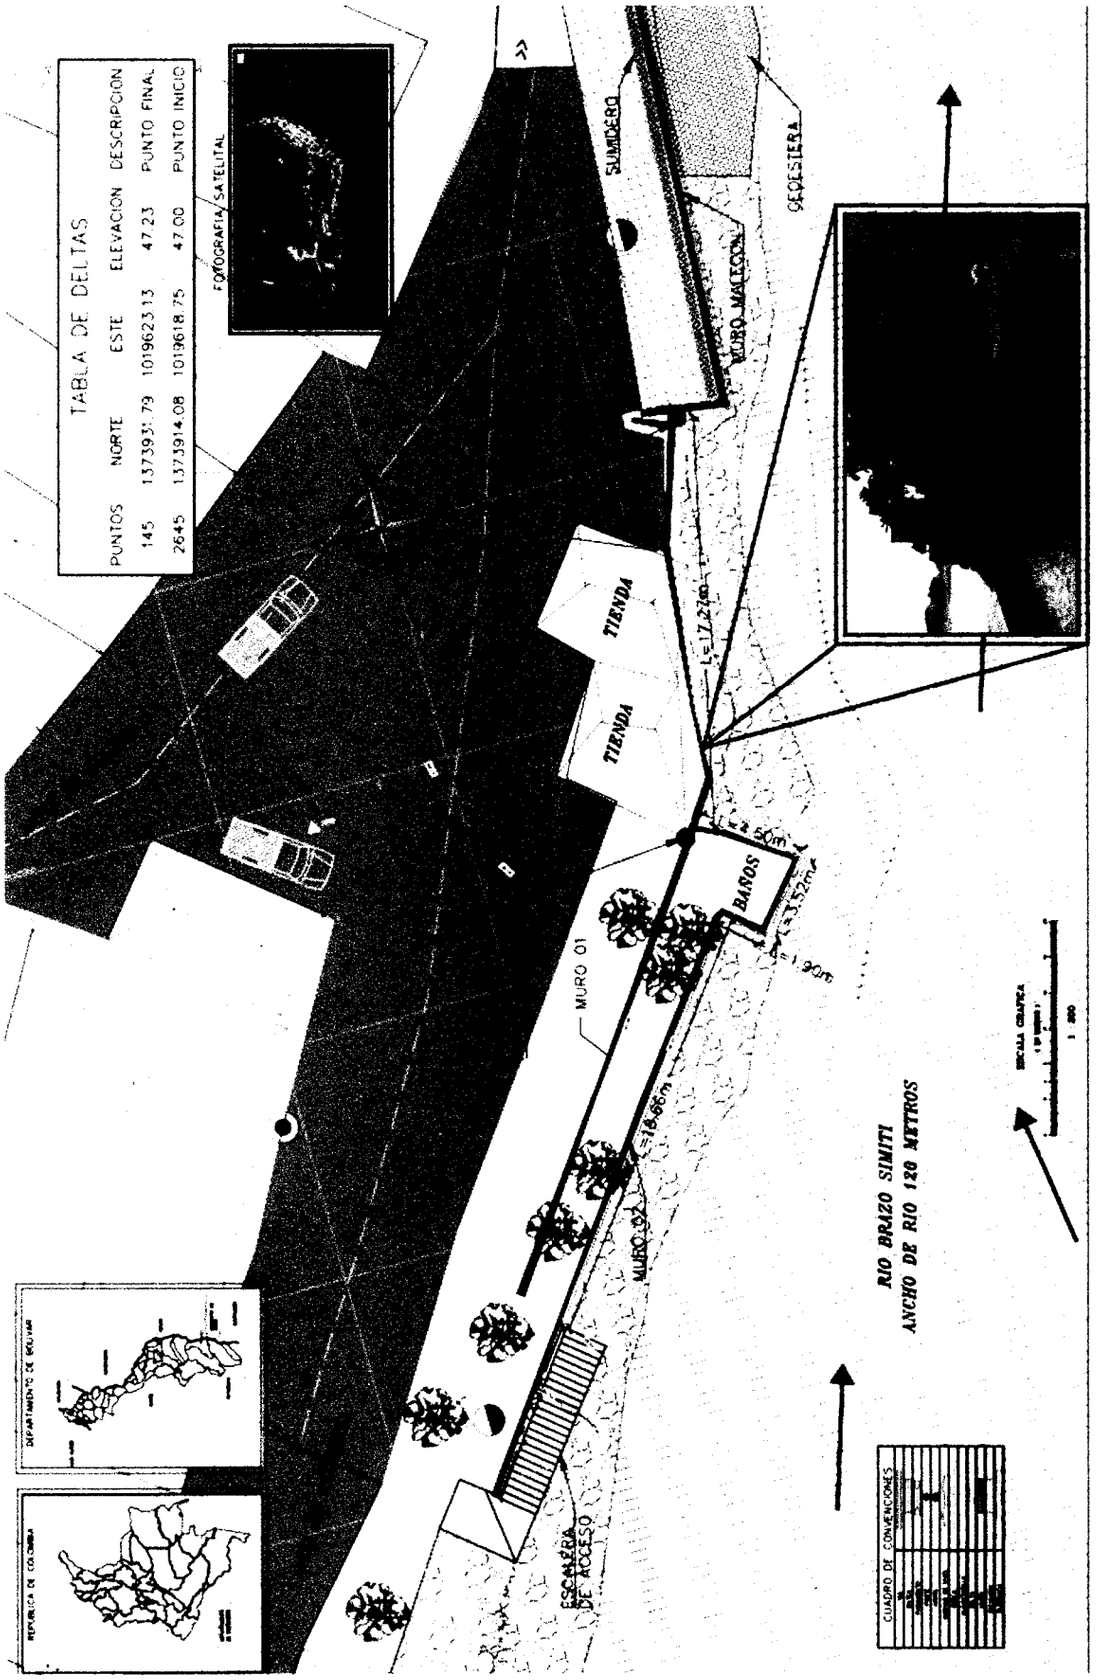

TABLA DE DELTAS
PUNTOS NORTE ESTE ELEVACION DESCRIPCION
145 1373935.79 1019623.13 47.23 PUNTO FINAL
2645 1373914.08 1019618.75 47.00 PUNTO INICIO
FOTOGRAFIA SATELITAL
SUMIDERO
GEOESTERA
MURO MALECON
TIENDA
TIENDA
BAÑOS
MURO 01
MURO 02
ESCALERA DE ACCESO
RIO BRAZO SINITI
ANCHO DE RIO 120 METROS
CUADRO DE CONVENCIONES
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
REPUBLICA DE COLOMBIA

TABLA DE DELTAS
PUNTOS NORTE ESTE ELEVACION DESCRIPCION
145 1373931.79 1019623.13 47.23 PUNTO FINAL
2645 1373914.08 1019618.75 47.00 PUNTO INICIO
SUMIDERO
PUNTO FINAL
TIENDA
TIENDA
RIO BRAZO SIMITI
ANCHO DE RIO 120 METROS
CUADRO DE CONVENCIONES
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR


2.01	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3

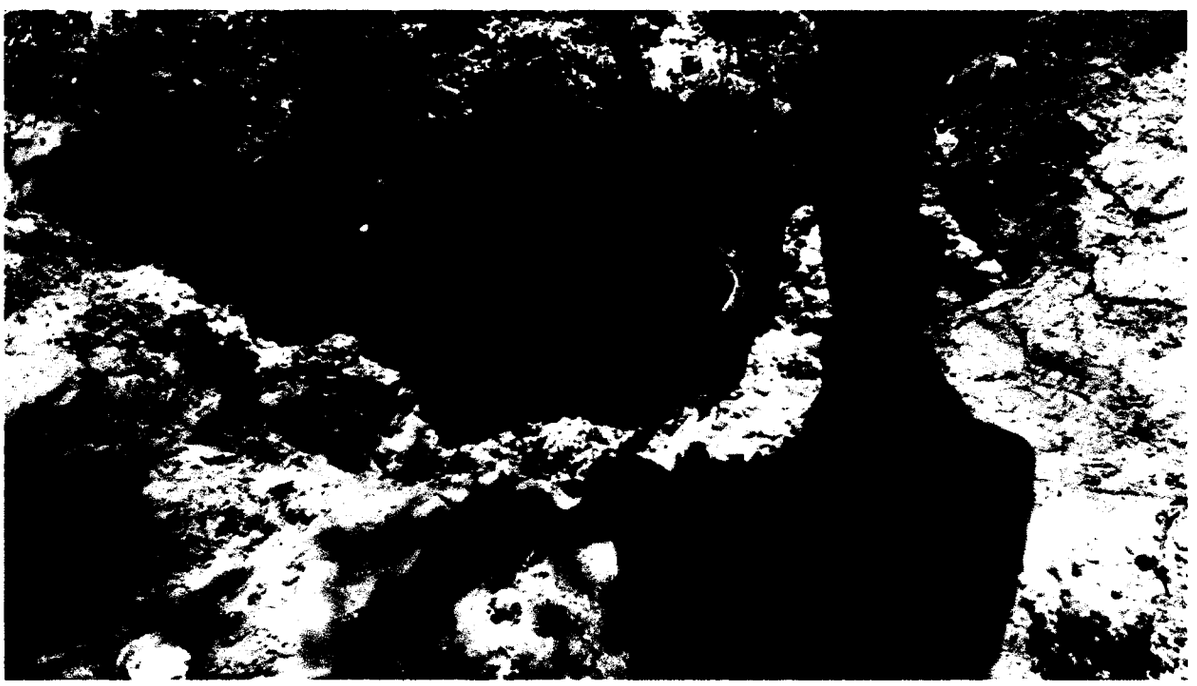

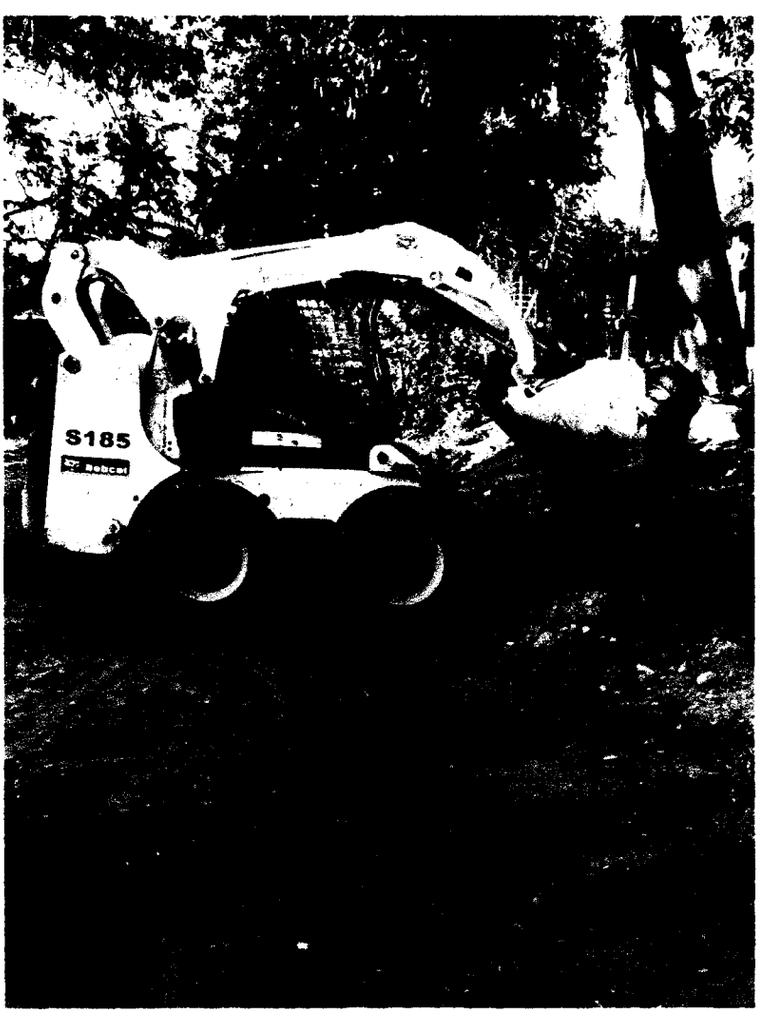

3.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HEXAPODOS EN CONCRETO PARA MUROS CLASE D (F´c = 210 kg/cm2) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	U



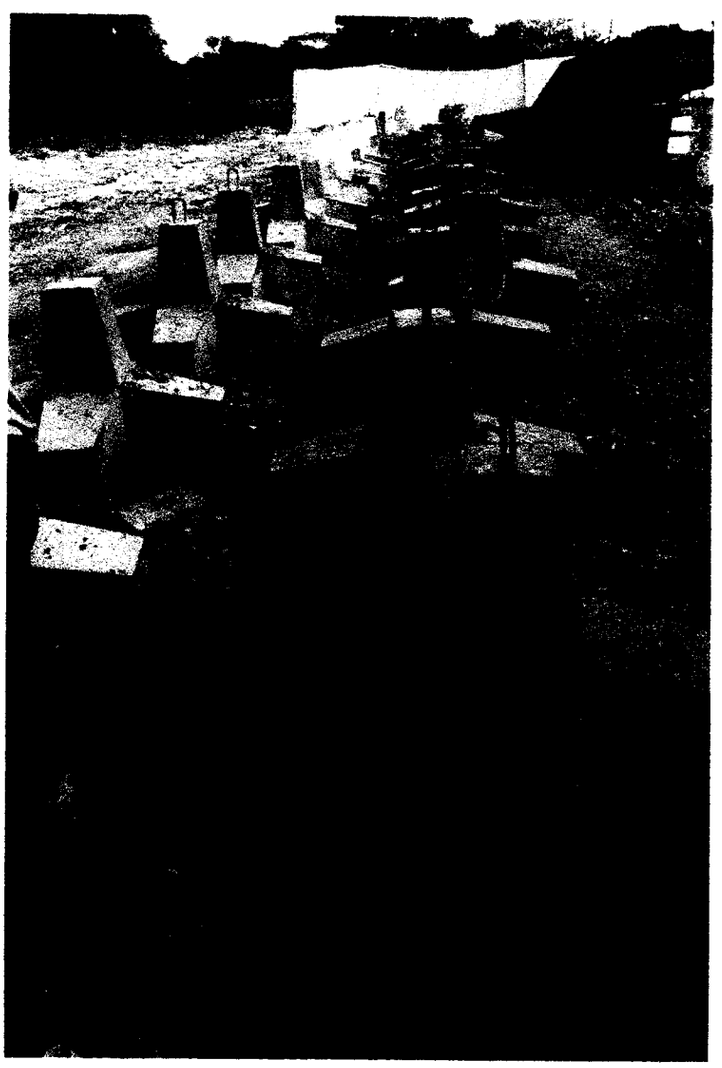








4.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES	M3







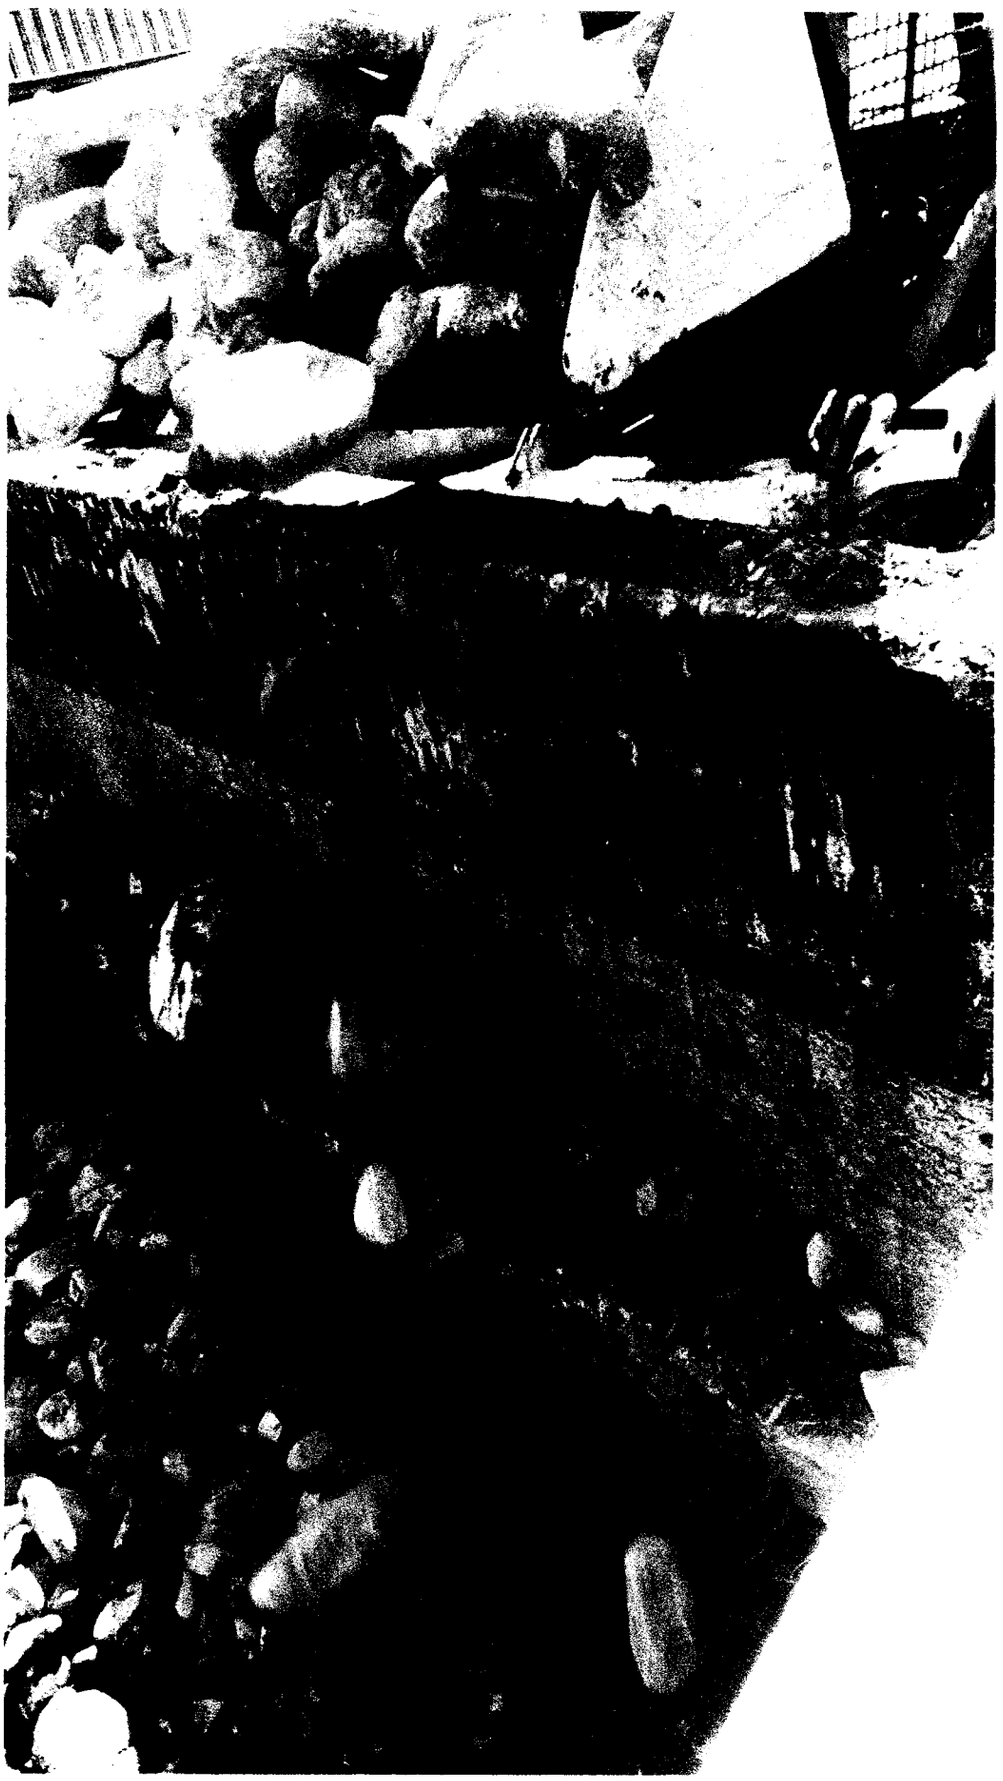

CALLE 62 No 28-28 LOCAL 1 EDIFICIO PORTOBELLO II TELÉFONO: 6431470 – 317 4337686
E – MAIL: byb.soluciones@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER






CALLE 62 No 28-28 LOCAL 1 EDIFICIO PORTOBELLO II TELÉFONO: 6431470 – 317 4337686
E – MAIL: byb.soluciones@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER

4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EN ROCADO	M3



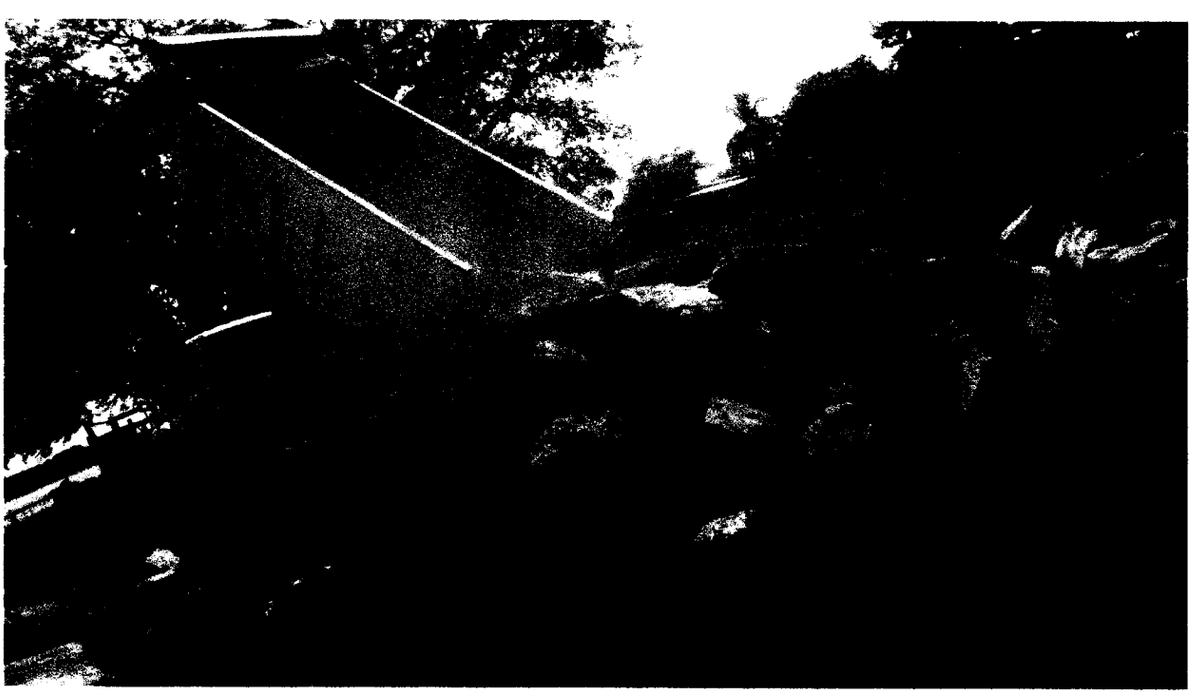








CALLE 62 No 28-28 LOCAL 1 EDIFICIO PORTOBELLO II TELÉFONO: 6431470 – 317 4337686
E – MAIL: byb.soluciones@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER

b&b
soluciones de ingeniería

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE SIMITI - BOLIVAR

CONTRATO	No. CTO 2024-110-12-03-007	**ACTA**	**MEMORIA ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 001**
OBJETO	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ		
CONTRATISTA	B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S		
INTERVENTOR			
SUPERVISOR	ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ		
ITEM	1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	**UNIDAD**	MES

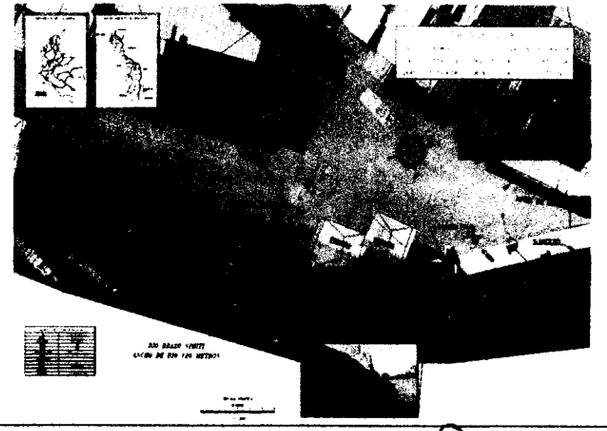Descripcion	DESCRIPCCION		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	FOTOS Y/O ESQUEMA
			Largo	Ancho	Alto				
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO					1.5	MES	1.50	
					TOTAL PRESENTE ACTA			1.50	

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
ING. JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S

Aprobó
EL SUPERVISOR

Firma:
Vo.Bo. **ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ**
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

b&b
soluciones de ingeniería


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE SIMITI - BOLIVAR

CONTRATO	No. CTO 2024-110-12-03-007	**ACTA**	MEMORIA ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 001
OBJETO	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ		
CONTRATISTA	B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S		
INTERVENTOR			
SUPERVISOR	ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ		
ITEM	2.01 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	**UNIDAD**	M3

Descripcion	DESCRIPCCIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	EXCAVACIONES EN EL CERRO DE VERACRUZ	10	2	0.75	1	M3	15.00
				TOTAL PRESENTE ACTA			15.00

FOTOS Y/O ESQUEMA

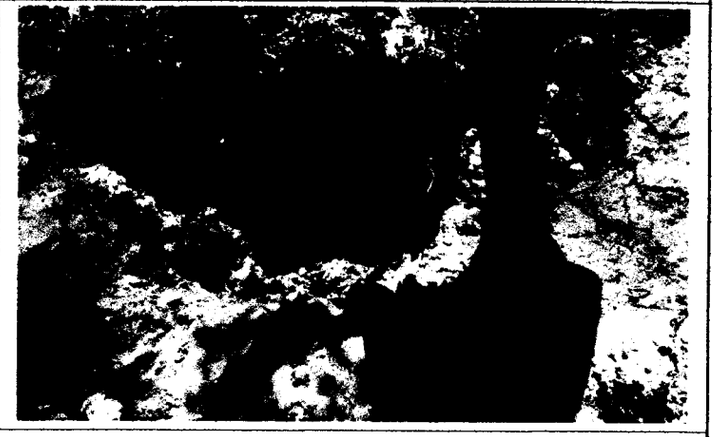

Elaboró
EL CONTRATISTA
Firma:
ING. JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S

Aprobó
EL SUPERVISOR
Firma:
Vo.Bo. ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

b&b
soluciones de ingeniería

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE SIMITI - BOLIVAR

CONTRATO	No. CTO 2024-110-12-03-007	**ACTA**	**MEMORIA ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 001**
OBJETO	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ		
CONTRATISTA	B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S		
INTERVENTOR			
SUPERVISOR	ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ		
ITEM	3.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HEXAPODOS EN CONCRETO PARA MUROS CLASE D (F´c = 210 kg/cm2) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	**UNIDAD**	U

Descripcion	LOCALIZACION		DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	HEXAPODOS PARA EL CERRO DE VERACRUZ					60	U	60.00
	HEXAPODOS PARA CAMPO PAYARES					160	U	160.00
					TOTAL PRESENTE ACTA			220.00

FOTOS Y/O ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
ING. JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S

Aprobó
EL SUPERVISOR

Firma:
Vo.Bo. **ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ**
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

b&b
soluciones de ingeniería

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE SIMITI - BOLIVAR

CONTRATO	No. CTO 2024-110-12-03-007	**ACTA**	**MEMORIA ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 001**
OBJETO	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ		
CONTRATISTA	B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S		
INTERVENTOR			
SUPERVISOR	ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ		
ITEM	4.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES	**UNIDAD**	M3

Descripcion	LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
			Largo	Ancho	Alto			
	SITIO CERRO DE VERACRUZ		2	1	1.00	15	M3	30.00
					TOTAL PRESENTE ACTA			30.00

FOTOS Y/O ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
ING. JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S

Aprobó
EL SUPERVISOR

Firma:

Vo.Bo. **ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ**
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

b&b
soluciones de ingeniería


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE SIMITI - BOLIVAR

CONTRATO	No. CTO 2024-110-12-03-007	**ACTA**	**MEMORIA ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 001**
OBJETO	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ		
CONTRATISTA	B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S		
INTERVENTOR			
SUPERVISOR	ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ		
ITEM	4.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE EN ROCADO	**UNIDAD**	M3

Descripcion	LOCALIZACION		DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	INSTALACION DE ENROCADO EN CERRO		16			5	M3	60.00
	INSTALACION DE ENROCADO EN CAMPO PAYARES		16			7.75	M3	100.00
						TOTAL PRESENTE ACTA		160.00

FOTOS Y/O ESQUEMA

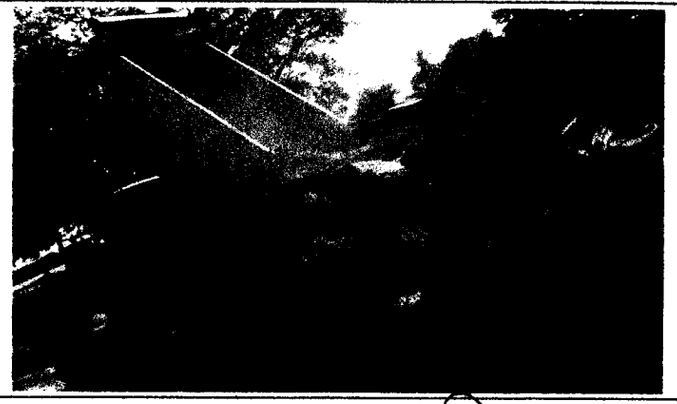

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
ING. JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S

Aprobó
EL SUPERVISOR

Firma:
Vo.Bo. **ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ**
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900295156	0	B Y B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	B	14	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CARRERA 36 35 10 OFC 102		6431470			BYB.SOLUCIONES@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31464804	E	2024-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.614.300	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	31464804	2024-11-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 91497022	BASTO ANAYA JORGE LEONARDO	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
2	CC 63453434	CASTELLANOS MENDIVELSO MARIA ANGELICA	2.000.000	P															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	CAJASAN-CCF39	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	1841401
3	CC 91425160	SALAZAR MANRIQUE RAUL	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1620101
4	CC 91151804	SANDOVAL SUAREZ HERIBERTO	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900295156	0	B Y B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	B	14	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CARRERA 36 35 10 OFC 102		6431470			BYB.SOLUCIONES@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31464804	E	2024-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.614.300	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	31464804	2024-11-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				4	944.000	0	0	0	944.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	944.000	0	0	0	944.000
EPS(Administradoras: 2)				4	236.000	0	0	0	236.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	104.000	0	0	0	104.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	132.000	0	0	0	132.000
ARP(Administradoras: 1)				4	198.300	0	0	0	198.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	198.300	0	0	0	198.300
CCF(Administradoras: 1)				4	236.000	0	0	0	236.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	4	236.000	0	0	0	236.000
Gran Total					1.614.300	0	0	0	1.614.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900295156	0	B Y B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	B	14	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CARRERA 36 35 10 OFC 102		6431470			BYB.SOLUCIONES@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31759922	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.614.300	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	31759922	2024-12-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 91497022	BASTO ANAYA JORGE LEONARDO	1.300.000	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
2	CC 63453434	CASTELLANOS MENDIVELSO MARIA ANGELICA	2.000.000	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	CAJASAN-CCF39	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	1841401
3	CC 91425160	SALAZAR MANRIQUE RAUL	1.300.000	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1620101
4	CC 91151804	SANDOVAL SUAREZ HERIBERTO	1.300.000	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900295156	0	B Y B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	B	14	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CARRERA 36 35 10 OFC 102		6431470			BYB.SOLUCIONES@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31759922	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.614.300	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	31759922	2024-12-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				4	944.000	0	0	0	944.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	944.000	0	0	0	944.000
EPS(Administradoras: 2)				4	236.000	0	0	0	236.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	132.000	0	0	0	132.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras: 1)				4	198.300	0	0	0	198.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	198.300	0	0	0	198.300
CCF(Administradoras: 1)				4	236.000	0	0	0	236.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	4	236.000	0	0	0	236.000
Gran Total					1.614.300	0	0	0	1.614.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900295156	0	B Y B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	B	14	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CARRERA 36 35 10 OFC 102		6431470			BYB.SOLUCIONES@HOTMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32131300	E	2025-01-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.614.300	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	32131300	2025-01-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 91497022	BASTO ANAYA JORGE LEONARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
2	CC 63453434	CASTELLANOS MENDIVELSO MARIA ANGELICA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	CAJASAN-CCF39	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	1841401
3	CC 91425160	SALAZAR MANRIQUE RAUL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1620101
4	CC 91151804	SANDOVAL SUAREZ HERIBERTO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900295156	0	B Y B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	B	14	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CARRERA 36 35 10 OFC 102		6431470			BYB.SOLUCIONES@HOTMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32131300	E	2025-01-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.614.300	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	32131300	2025-01-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				4	944.000	0	0	0	944.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	944.000	0	0	0	944.000
EPS(Administradoras: 2)				4	236.000	0	0	0	236.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	104.000	0	0	0	104.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	132.000	0	0	0	132.000
ARP(Administradoras: 1)				4	198.300	0	0	0	198.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	198.300	0	0	0	198.300
CCF(Administradoras: 1)				4	236.000	0	0	0	236.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	4	236.000	0	0	0	236.000
Gran Total					1.614.300	0	0	0	1.614.300

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101068107	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	02	2025	28	10	2024	00:00	10	03	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.	NIT: 900.295.156-0	CL 62 NRO. 28 - 28	BUCARAMANGA, SANTANDER	6175008

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE SIMITI	NIT: 890.480.006-1	CALLE 12 # 5-31 PALACIO MUNICIPAL	SIMITI, BOLIVAR	5699076

BENEFICIARIO: 890480006 - MUNICIPIO DE SIMITI

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CTO 110-12-03-007 FIRMADO EL DIA 10/10/2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION E INSTALACION DE HEXAPODOS DE CONTENCION PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITI.
SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE SIMITI NIT 890.480.006-1
ASEGURADOS: MUNICIPIO DE SIMITI NIT 890.480.006-1 Y B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S, NIT 900295156-0

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/10/2024	10/03/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/10/2024	10/03/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/10/2024	10/03/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION DE OBRA No. 001 Y ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 001 SE AJUSTA LA VIGENCIA SEGUN TIEMPO SUSPENDIDO

ACTA DE SUSPENSION DE OBRA No. 001 SUSCRITA EL 13/12/2024
ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 001 SUSCRITA EL 25/02/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****205,150.00	$ *******3,000.00	$ ******39,548.00	$ **********247,699.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
DEVIS RAFAEL DELACRUZ VILLAMIL	230633	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101068107

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101068107	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	02	2025	28	10	2024	00:00	10	03	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.295.156-0
DIRECCIÓN: CL 62 NRO. 28 - 28	**CIUDAD:** BUCARAMANGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6175008

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SIMITI		NIT: 890.480.006-1
DIRECCIÓN: CALLE 12 # 5-31 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** SIMITI, BOLIVAR	**TELÉFONO:**	5699076

BENEFICIARIO: 890480006 - MUNICIPIO DE SIMITI

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/10/2024	10/03/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/10/2024	10/03/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/10/2024	10/03/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101068107

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101068107	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	02	2025	28	10	2024	00:00	10	03	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.295.156-0	
DIRECCIÓN: CL 62 NRO. 28 - 28	**CIUDAD:** BUCARAMANGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6175008

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE SIMITI		NIT: 890.480.006-1	
DIRECCIÓN: CALLE 12 # 5-31 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** SIMITI, BOLIVAR	**TELÉFONO:**	5699076

BENEFICIARIO: 890480006 - MUNICIPIO DE SIMITI

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101068107

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Olaya - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101192407	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	02	2025	28	10	2024	00:00	28	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.	NIT: 900.295.156-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 62 NRO. 28 - 28	BUCARAMANGA, SANTANDER	6175008

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SIMITI	NIT: 890.480.006-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 12 # 5-31 PALACIO MUNICIPAL	SIMITI, BOLIVAR	5699076

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO Y LA ESTABILIDAD DE LA OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CTO 110-12-03-007 FIRMADO POR EL 10/10/2024 Y CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION E INSTALACION DE HEXAPODOS DE CONTENCION PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITI.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/10/2024	10/07/2025	$69,182,426.60	$69,182,426.60
CALIDAD DEL SERVICIO	28/10/2024	10/07/2025	$69,182,426.60	$69,182,426.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/10/2024	10/03/2028	$34,591,213.30	$34,591,213.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$69,182,426.60	$69,182,426.60

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION DE OBRA No. 001 Y ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 001 SE AJUSTA LA VIGENCIA SEGUN TIEMPO SUSPENDIDO

ACTA DE SUSPENSION DE OBRA No. 001 SUSCRITA EL 13/12/2024
ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 001 SUSCRITA EL 25/02/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******17,295.00	$ *******4,000.00	$ *******4,046.00	$ **********25,341.00	$ ******242,138,493.10	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART
DEVIS RAFAEL DELACRUZ VILLAMIL	230633	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

96-44-101192407

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101192407	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	02	2025	28	10	2024	00:00	28	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
B & B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.		NIT: 900.295.156-0	
DIRECCIÓN: CL 62 NRO. 28 - 28	**CIUDAD:** BUCARAMANGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6175008

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE SIMITI		NIT: 890.480.006-1	
DIRECCIÓN: CALLE 12 # 5-31 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** SIMITI, BOLIVAR	**TELÉFONO:**	5699076

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101192407

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas


FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ISAACSOLAYA

Ficha Técnica. Versión 4. Enero 2017.

CEMENTO
USO ESTRUCTURAL

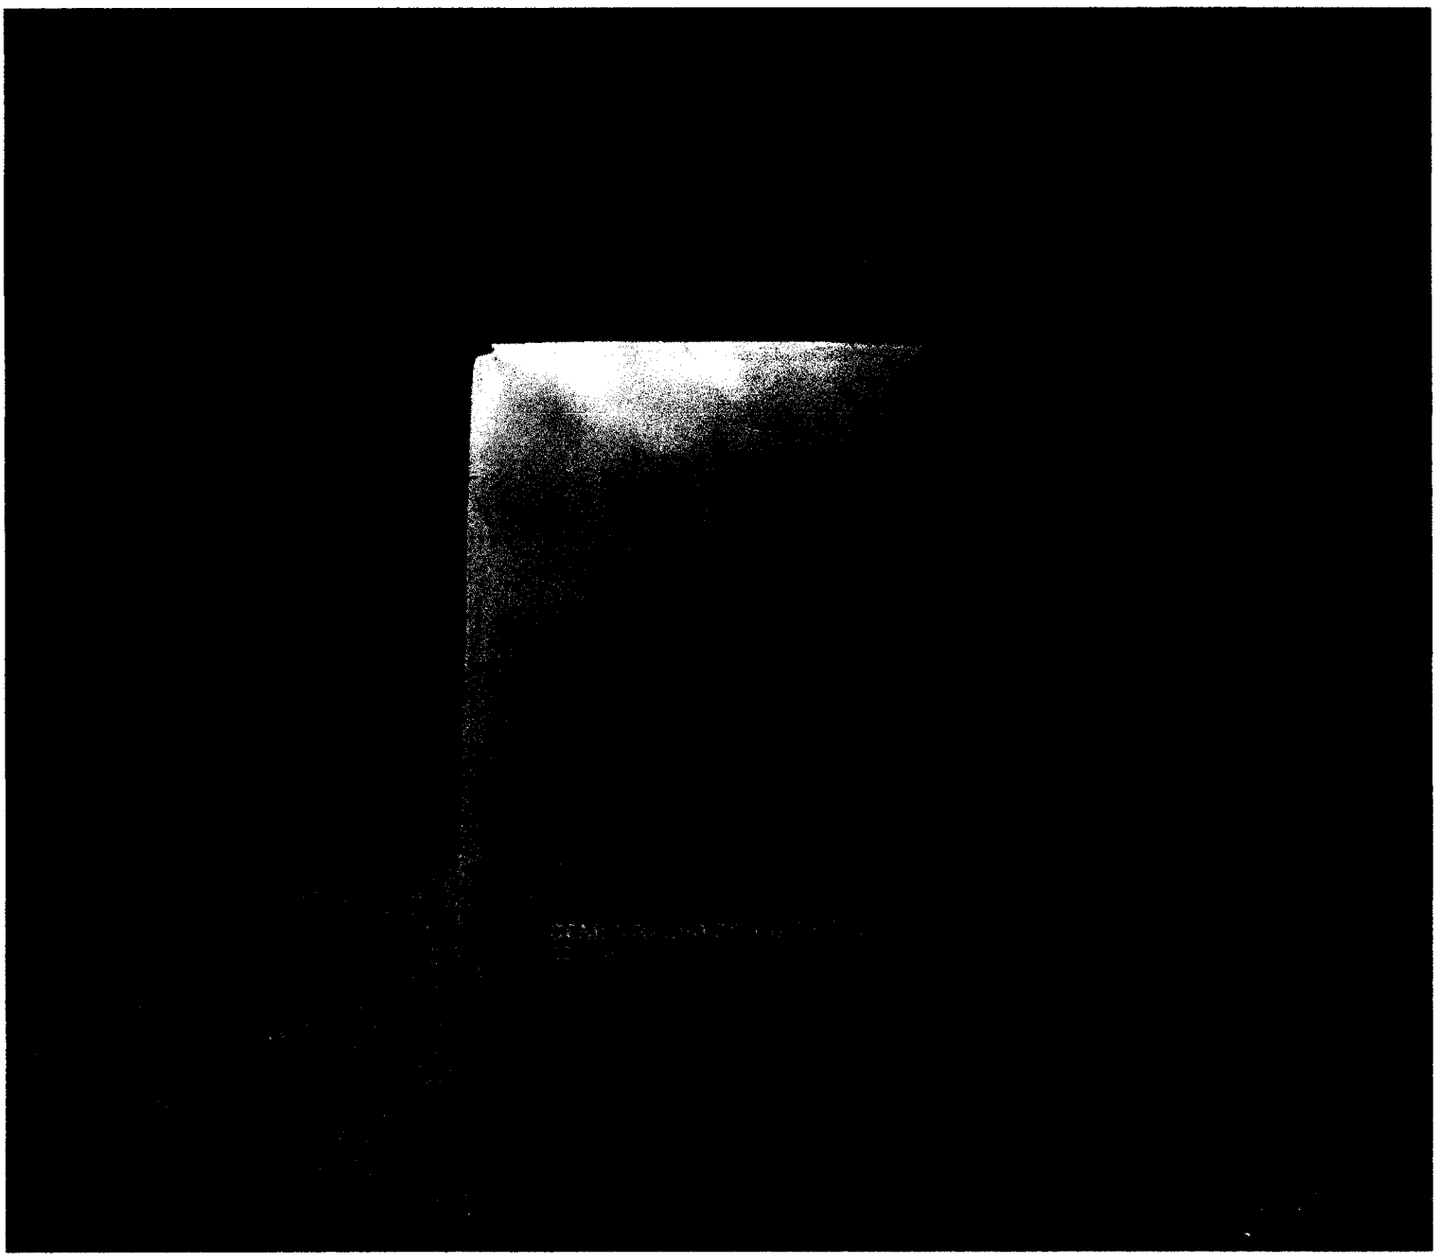

Argos. Luz Verde.

ARGOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS FÍSICOS		NORMA DE ENSAYO	NTC 121 TIPO UG	ASTM C-1157 TIPO GU	ESPECIFICACIÓN ARGOS
Finura	Blaine, mín. (cm^2/gr)	NTC 33	A	A	A
	Retenido Tamiz 45 µm (%)	NTC 294	A	A	A
Cambio de longitud por autoclave expansión, máx. (%)		NTC 107	0.8	0.8	0.8
Tiempo de fraguado, Ensayo de Vicat[B]	No menos de, minutos	NTC 118	45	45	70
	No más de, minutos	NTC 118	420	420	330
Expansión de barras de mortero a 14 días, máx. (%)		NTC 4927	0.020	0.020	0.020
RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN, (MPa)					
3 días		NTC 220	8.0	13.0	21.0
7 días		NTC 220	15.0	20.0	28.0
28 días		NTC 220	24.0	28.0	36.6

A : Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los certificados que sean solicitados.
B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fragaudo inicial en la **NTC 118.**

RECOMENDACIONES:

- El uso y aplicación de nuestros cementos se debe hacer bajo los lineamientos de las normas técnicas de construcción.
- Adicionalmente, en la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la **NTC 3318** y la Norma Sismo Resistente Colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
- Almacene el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.
- Conserve el cemento sobre estibas y no sobre el suelo.
- Una vez abierto el empaque consúmalo de manera inmediata.

CONTÁCTANOS:

- Si deseas más información acerca de este producto contáctate con nuestros asesores en la **Línea de Servicio 01 8000 527 467** o marcando desde tu celular **#250.**
- En caso de requerir asesoría técnica sobre el producto, puedes escribir al correo **asesorvirtual@argos.com.co**
- Si quieres aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a **www.360gradosenconcreto.com**

ARGOS

Planta: ZONA FRANCA ARGOS S.A.
Dirección: VÍA MAMONAL, Km 7. CARTAGENA, BOLIVAR. COLOMBIA
Teléfono: (5) 668 9200
Fecha: FEBRERO DE 2019
Material: CEMENTO ESTRUCTURAL ARGOS - CEMENTO PORTLAND TIPO UG NTC 121
Presentación: EMPACADO 42,5 KG

Fecha	Finura	Tiempo de fraguado (Minutos)		Resistencias a la Compresión (Mpa)				Especificaciones Quimicas	
Dia	Blaine (cm2/g)	PF	FF	R1 dia	R3 dias	R7 dias	R28 dias	MgO %	SO3 %
Especificacion NTC 121	—	Mín. 45	Máx. 480	—	Mín. 1160 (8,0)	Mín. 2176 (15,0)	Mín. 3480 (24,0)	—	—
Especificacion ARGOS	—	Mín. 70	Máx. 330	—	Mín. 3045 (21,0)	Mín. 4060 (28,0)	Mín. 5307 (36,6)	Max 6.0%	Max 3.5%
1/02/2018									
2/02/2018									
3/02/2018	4643	155	212	15	30,07	38,91	48,30	1,35	2,85
4/02/2018									
5/02/2018	3808	152	211	11,25	25,01	33,27	42,63	1,41	3,25
6/02/2018									
7/02/2018	4033	136	212	10,98	25,64	33,80	44,75	1,37	3,07
8/02/2018									
9/02/2018	4024	151	211	13,24	25,39	35,00	40,67	1,40	3,50
10/02/2018									
11/02/2018	4029	126	181	13,98	26,97	37,29	44,79	1,34	3,07
12/02/2018									
13/02/2018	3772	124	181	14,37	27,83	31,05		1,36	3,20
14/02/2018									
15/02/2018									
16/02/2018	4234	127	197	12,22	26,15	36,34		1,44	3,20
17/02/2018									
18/02/2018									
19/02/2018									
20/02/2018									
21/02/2018	4127	124	181	12,71	25,37	34,23		1,39	2,97
22/02/2018									
23/02/2018	3791	139	180	14,55	27,98	32,74		1,35	3,17
24/02/2018									
25/02/2018									
26/02/2018									
27/02/2018	3780	154	211	8,00	26,85	40,01		1,28	3,06
28/02/2018									

Promedio	4024	139	198	12,63	26,72	35,26	44,23	1,37	3,13
Desv. Estd	271	13,19	15,24	2,13	1,57	2,84	2,85	0,04	0,18
% CV	6,74%	9,50%	7,71%	16,85%	5,87%	8,05%	6,44%	3,24%	5,64%
º DATOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00
MAXIMO	4.643,00	155,00	212,00	14,99	30,07	40,01	48,30	1,44	3,50
MINIMO	3.772,00	124,00	180,00	8,00	25,01	31,05	40,67	1,28	2,85
RANGO	871,00	31,00	32,00	6,99	5,06	8,96	7,64	0,16	0,66

Certificamos que este cemento cumple con las Normas Técnicas Colombianas 121 para CEMENTO PORTLAND TIPO UG
Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana.

Los resultados en este informe se refieren a la muestra relacionada y al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.

CARLOS FERNANDEZ

PazdelRío

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 06.02.2019
HORA: 11:06:31
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6098498 - ROLLO CORRU N.2 SR NTC 2289 **REPORTE:** *99995
CLIENTE: 7820 - APDR PLANTA ACABADOS ENDEREZ **PLACA:** **ORDEN DE ENTREGA:** 8070970960
CENTRO DEST: 7820 PLANTA APDR ACABADOS ENDEREZAD **ALMACEN DEST:** 1000 ENDEREZADO MP

Análisis Químico y Propiedades Físicas Garantizadas

Propiedad:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq	Rs(MPa)	Fl (MPa)	AL(%)	DOBLADO	P/metro	Espa.Res.	
												%	MPa	MPa	%		g	mm	
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								550,00	420,00	14,00		234		
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50							0,550		540,00				4,45	

Lote	Peso KG	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	% V	%Ceq %	Rs(MPa) MPa	Fl (MPa) MPa	AL(%) %	DOBLADO	P/metro g	Espa.Res. mm	
B41793-19	36.680,00	0,28	0,95	0,013	0,015	0,15	0,040	0,015	0,018	0,005	0,014	0,000	0,437	619,93	441,29	17,27	B	252	4,20	

Características: Rs(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO
Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.

Km 6 Vía Nobsa - Belencito
Planta Industrial.
Nobsa - Boyacá
Tel: +57 (8) 7730200
Ext: 6848

Firma Autorizada: ING.OMAR EDUARDO WIEST SUAREZ
Coordinador Calidad Productos

Firma Autorizada vigente a partir de: 08.11.2018

Resolución N° 216
(Junio 18 de 2015)

Por medio de la cual se concede Licencia Ambiental para explotación de Cantera y se toman otras determinaciones

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar-CSB en uso de sus facultades otorgadas por la Ley 99/93 y demás normas concordantes y

CONSIDERANDO

Que el señor **SANTIAGO RIVERA MORA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 79.314.220 de Bogotá, presentó ante la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, el Estudio de impacto ambiental para la explotación de materiales de construcción de arrastre de río para su posterior transformación a triturado, ubicado en la vereda las lajas, municipio de Simití, departamento de Bolívar, con el objeto de solicitar Autorización y/o Permisos Ambientales.

Que es función de las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer evaluación, vigilancia y control de las actividades de explotación, exploración, beneficio, transporte, uso y depósitos de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.

Que mediante auto se remitió por parte de Secretaría General a la Subdirección de Gestión Ambiental de la CSB, la solicitud presentada por el señor SANTIAGO RIVERA MORA, para que se procediera a designar funcionario idóneo para practicar la diligencia de visita ocular y emitir el respectivo concepto técnico.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental hizo lo pertinente y luego de visita de inspección ocular y evaluar documentos presentados por el usuario, emitió el respectivo concepto técnico.

Que de la visita practicada por el funcionario antes mencionado, se emitió el Concepto Técnico de fecha Mayo 25 de 2015, el cual reza así:

"**ANTECEDENTES**: El señor SANTIAGO RIVERA MORA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.314.220, representante legal de la empresa "SERVI RETROS DEL SUR", con NIT. 79314220-1, presenta ante la CSB el Estudio de impacto ambiental para la explotación de materiales de construcción de arrastre de río para su posterior transformación a triturado, ubicado en la vereda las Lajas, municipio de Simití, departamento de Bolívar, con el objeto de solicitar Autorización y/o Permisos Ambientales, el proyecto se encuentra localizado en un terreno ondulado y suave. En el área de interés ha sido intervenida entrópicamente, presentándose de esta manera pérdida de la cobertura vegetal y potencial agrológico del suelo por parte de actividades de ganadería intensiva.

El proyecto en mención se encuentra delimitado por las siguientes coordenadas:

PUNTO INICIAL	COORDENADA ESTE	COORDENADA NORTE
1	1009850	1364346
2	1009699	1364428
3	1010068	1364695
4	1010194	1364486

INFORME DE EVALUACIÓN

La evaluación del estudio se realiza por medio de un análisis detallado del documento presentado por el solicitante y por la realización de una visita ocular de campo, en la cual se recorrió toda el área de influencia del proyecto.

El contenido que presenta el estudio de impacto ambiental se resume en lo siguiente:

INTRODUCCIÓN: El documento presenta una introducción clara del contenido del Estudio de Impacto Ambiental.

RESUMEN EJECUTIVO: En forma resumida presenta cada uno de los capítulos que contiene el documento.

ASPECTOS GENERALES: En los aspectos generales presenta los siguientes temas:

Objetivos: Realiza un objetivo general y 6 objetivos específicos.

Alcance: Muestra en forma detallada los alcance del estudio.

Metodología: Especifica la metodología que utilizó para desarrollar el estudio y además aclara las limitaciones que tuvo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: en la descripción del proyecto muestra la ubicación donde se va a desarrollar la explotación.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO: Este es uno de los capítulos más importantes del estudio en él hace especial énfasis en los siguientes temas:

Área de Influencia: Para delimitar las áreas de influencia directas e indirectas del proyecto se tuvo en cuenta los siguientes criterios: alcance del impacto sobre cada componente ambiental influido por la actividad como son:

Componente atmosférico:
Componente geosférico:
Componente hidrosférico:
Componente biótico:
Componente paisajístico:
Componente socioeconómico y cultural:

Además de estos temas se describen los siguientes:

Componente Físico, Geomorfología, Suelos, Paisaje, Hidrología, Atmósfera (Clima), Componente Biótico; Vegetación (Bosques y Rastrojos, Corredores

- ✓ Alteración del paisaje y en proceso de migración.

- ➢ **Componente Atmosférico.** Las emanaciones gaseosas producto de la combustión de motores a gasolina y A.C.P.M, el polvo, y el ruido originado por los equipos. Son entre otros los mayores impactos causados al componente atmosférico. En el plan de manejo ambiental se describe cuáles van a ser las medidas implementadas para corregir estos impactos.

- ➢ **Componente Socio- Cultural y Económico.**

Generación de Expectativas. La promoción de este proyecto, ha generado grandes expectativas, interés y muchas esperanzas en el mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores y vecinos, y en general los beneficios que se derivarán al poner en marcha este proyecto.

Conflictos. Ante las condiciones que se presentan, son inevitables los conflictos de tipo social, cultural y político, teniendo como consecuencia un impacto en la comunidad, cuando esta desconoce por su mismo modus vivendus ciertas pautas de comportamiento, basadas en la prudencia, respeto y la tolerancia y por falta de espacios democráticos en la participación de las comunidades.

Generación de Empleo. Es un impacto positivo, ya que en la explotación de la cantera se requieren de mano de obra y esto disminuye el índice de desempleo, también generaría una demanda de insumos, víveres y la movilización de personal flotante.

CONCLUSIONES

- ➢ El área que se solicita, ha sido una zona que ya ha sido intervenida por otros explotadores ilegales, que han dejado el área en malas condiciones morfológicas, de lo cual el solicitante se compromete a restituir morfológicamente el área.

- ➢ El componente biótico del área del proyecto, presenta una notable intervención antrópica de sus recursos naturales, especialmente el recurso vegetal que en los últimos años ha sido intervenido notablemente, las altas tasas de deforestación, y los cultivos lícitos y uso del suelo para la ganadería en suelos pobres han ocasionado un progresivo deterioro a las condiciones naturales.

- ➢ La calificación de impactos nos da como resultado que estas son de características adversas y directas en el medio ambiente, muy próximos a la zona de la cantera, la mayoría son recuperables y reversibles, tienen una intensidad notable, salvo aquellos sobre la atmósfera y el agua superficial que tiene intensidad mínima. La ocurrencia de estos impactos es a corto o mediano plazo, son generalmente discontinuos dada la fluctuación irregular de la demanda del material de la cantera, sin embargo, son compatibles y moderados con el medio ambiente, exceptuándose los efectos sobre el paisaje que puede llegar a ser de magnitud severa.

- ➢ Con base en la caracterización ambiental, evaluación y análisis de los impactos se diseñó el plan de manejo ambiental, en el cual se define en forma precisa las medidas genéricas y específicas del proyecto, tendientes a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos juzgados en las

PRIMERO: Otorgar Licencia ambiental a *SERVI RETROS DEL SUR, con NIT. 79314220-1,* representada legalmente por el señor SANTIAGO RIVERA MORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.314.220 expedida en Bogotá, para desarrollar por el término de tres (03) años, el proyecto de explotación que se *localiza en el Departamento de Bolívar, zona rural del Municipio de Simití, Vereda Las Lajas.*

Esta área es jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar.

El proyecto en mención se encuentra delimitado por las siguientes coordenadas:

PUNTO INICIAL	***COORDENADA ESTE***	***COORDENADA NORTE***
1	*1009850*	*1364346*
2	*1009699*	*1364428*
3	*1010068*	*1364695*
4	*1010194*	*1364486*

PUNTO INICIAL	***COORDENADA ESTE***	***COORDENADA NORTE***
1	*1012148*	*1366417*
2	*1012705*	*1366217*
3	*1013548*	*1366398*
4	*1013787*	*1366654*
5	*1013951*	*1366513*
6	*1014330*	*1365765*
7	*1014858*	*1365507*
8	*1014891*	*1365187*
9	*1014594*	*1365209*
10	*1013141*	*1365915*
11	*1012022*	*1365918*

SEGUNDO: El permiso de explotación de material en la Cantera, sólo deberá emplearse en los términos contemplados en el respectivo concepto técnico.

TERCERO: Se acoge en todas sus partes la Evaluación de Impacto Ambiental y todos sus anexos, presentado por el señor SANTIAGO RIVERA MORA, para todas las actividades de preparación, explotación y abandono de la Cantera en mención. Ya que el proyecto reúne los requisitos establecidos por la autoridad ambiental y que con base en las características del sector, las condiciones y efectos ambientales analizados son mitigables y serán compensados con la ejecución de las obras descritas y que por lo tanto representa un compromiso por parte del propietario, en garantizar la puesta en marcha de cada una de ellas, para que el proyecto sea viable.

CUARTO: De acuerdo a la Ley 99 de 1993 y demás normas complementarias, se ordena realizar seguimiento y control ambiental, al proyecto de extracción de material de construcción de la Cantera de propiedad de *SERVI RETROS DEL SUR, con NIT. 79314220-1,* representada legalmente por el señor SANTIAGO RIVERA MORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.314.220 expedida en Bogotá , con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos para este tipo de actividades y/o explotaciones.

Santiago Rivera Mora
Nit. 79.314.220

CERTIFICACION

Yo **SANTIAGO RIVERA MORA**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 79.314.220 Expedida en Bogotá, con actividad económica actividades de explotación de minas y canteras y en calidad proveedor del **CONSTRUCTORA SMAQ S.A.S** Con Nit. 804.009.556-0; me permito certificar que el material de playa será suministrado en el marco de la licencia concedida por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR, CSB- según Resolución No. 216 de junio 18 de 2015.

El material entregado a la Constructora se encuentra acopiado según existencias de inventario, el cual fue extraído en el periodo de vigencia de la resolución proveniente del rio inanea del Municipio de Simiti – Bolívar.

La presente certificación se expide a los dos nueve días (09) del mes de marzo de 2019.

Se adjunta Certificación de licencia ambiental.

SANTIAGO RIVERA MORA.
C.C. 79.314.220 Bogotá,
Proveedor.

Calle 14 No. 3 B – 64 Barrio San Isidro – Teléfono: 3133494187
Email: distribucionessantiagorivera@hotmail.com
Santa Rosa Del Sur Bolívar

Scanned by CamScanner

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa B Y B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S identificado(a) con NITPJ 9002951560 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 600485536 desde el 01 de julio de 2009, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 20 de diciembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota
