INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA**	CÓDIGO:	PM-FO-600-013
		VERSIÓN:	3
		APROBACIÓN:	18/OCT/23

ACTA No.	4	FECHA DEL ACTA	10 DE DICIEMBRE DE 2024	PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No.	IND-23-5027				
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"				
CONTRATISTA	CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC	NIT - CC	901526894-4	CDP: N°. 1023 del 25/07/23 CDP DEL 31 de octubre de 2024 y CDP 6246 DEL 31 de octubre 2024	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	CONSORCIO GRUPO G3 JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	NIT - CC	901769200-8	RPC: No. 1223 del 26/12/23 RP 424 del 03 de diciembre 2024 y RP 19008 del 03 de diciembre de 2024	

PERÍODO A PAGAR: DEL 03 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNID	CONTRATO. CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD INICIAL CONTRATADA	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 2	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR $	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL $	CANT	VALOR $
1	PRELIMINARES													
1.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	666,81	666,76	4.390	2.927.076,00	666,76		666,76	2.927.076	-	2.927.076	-	-
1.1.2	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	35,55	30,06	21.850	656.811,00	30,06		30,06	656.811	-	656.811	-	-
1.1.3	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	M3	0,88	1,44	177.170	255.125,00	1,44		1,44	255.125	-	255.125	-	-
1.1.4	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	37,93	40,95	19.780	809.991,00	40,95		40,95	809.991	-	809.991	-	-
1.1.5	PODA DE ARBOLES	UND	1,00	1,00	126.280	126.280,00	-		-	-	-	-	1,00	126.280,00
1.1.6	DESMONTE JUEGO	UND	2,00	2,00	53.270	106.540,00	2,00		2,00	106.540	-	106.540	-	-
	SUBTOTAL CAP. 1,1 PRELIMINARES:					4.881.823,00				4.755.543	-	4.755.543		126.280
1,2	CIMENTACION													
1.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	25,91	50,84	21.850	1.110.864,00	50,84		50,84	1.110.864	-	1.110.864	-	-
1.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	64,56	66,09	19.780	1.307.293,00	66,09		66,09	1.307.296	-	1.307.296	-	-
1.2.3	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	38,00	37,00	27.600	1.021.200,00	37,00		37,00	1.021.200	-	1.021.200	-	-
1.2.4	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	23,75	23,75	630.870	14.983.440,00	23,75		23,75	14.983.440	-	14.983.440	-	-
1.2.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	4.141,87	3.932,45	6.200	24.381.207,00	3.932,45		3.932,45	24.381.207	-	24.381.207	-	-
1.2.6	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	6,00	6,00	491.180	2.947.080,00	6,00		6,00	2.947.080	-	2.947.080	-	-
1.2.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	402,28	401,76	6.200	2.490.912,00	401,76		401,76	2.490.912	-	2.490.912	-	-
1.2.8	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	13,00	13,00	865.180	11.247.340,00	13,00		13,00	11.247.340	-	11.247.340	-	-
1.2.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.802,64	1.795,60	6.200	11.132.720,00	1.795,60		1.795,60	11.132.720	-	11.132.720	-	-
1.2.10	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	6,29	6,14	551.830	3.390.444,00	6,14		6,14	3.390.444	-	3.390.444	-	-
1.2.11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.211,28	2.853,02	6.200	17.688.749,00	2.853,02		2.853,02	17.688.749	-	17.688.749	-	-
1.2.12	SIKAGROUT PARA ANCLAJES	KG	731,86	614,40	29.540	18.149.376,00	-		-	-	-	-	614,40	18.149.376,00
	SUBTOTAL CAP. 1,2 CIMENTACION:					109.850.625,00				91.701.252	-	91.701.252		18.149.376
1,3	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA													

1.3.1	ACERO ESTRUCTURAL	KLS	30.550,40	30.423,53	17.260	525.110.054,00	15.512,66	3.482,36	18.995,01	267.748.449	60.105.493,49	327.853.942	11.428,51	197.256.111,67
				SUBTOTAL CAP. 1,3 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA:		525.110.054,00				267.748.449	60.105.493	327.853.942		197.256.112
1,4	CUBIERTA													
1.4.1	TEJA TERMOACUSTICA UPVC	KLS	607,21	607,52	79.540	48.322.340,00			-	-	-	-	607,52	48.322.339,65
				SUBTOTAL CAP. 1,3 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA:		48.322.340,00				-	-	-		48.322.340
2	CANCHA MULTIPLE													
2,1	GEOTEXTIL REPAV 450	M2	544,14	-	5.340	-			-	-	-	-	-	-
2,2	CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	27,64	-	673.200	-			-	-	-	-	-	-
2,3	IMPRIMACION	M2	544,14	-	3.190	-			-	-	-	-	-	-
2,4	ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPCTADO	M3K	3.317,08	-	1.920	-			-	-	-	-	-	-
2,5	TRANSPORTE DE EQUIPO 31KM A 50 KM	T/K	6.000,00	-	1.090	-			-	-	-	-	-	-
2,6	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML	345,39	345,02	2.530	872.888,00			-	-	-	-	345,02	872.888,48
2,7	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC TIPO 2 SIN CONCRI	JGO	1,00	1,00	5.915.850	5.915.850,00			-	-	-	-	1,00	5.915.850,00
2,8	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES + TUBO AUX	JGO	1,00	1,00	1.212.600	1.212.600,00			-	-	-	-	1,00	1.212.600,00
	ITEMS ADICIONALES					-			-	-	-	-	-	-
2.9 (1.1.3)	DEMOL. CONCRETO REFORZADO	M3		63,60	177.170	11.268.012,00	7,01	56,59	63,60	1.241.962	10.026.050,30	11.268.012	-	-
2.10 (1.2.1)	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3		362,52	21.850	7.921.062,00		362,52	362,52	-	7.921.062,00	7.921.062	-	-
2.11 (1,2,2)	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3		547,33	19.780	10.826.108,00	5,62	541,71	547,33	111.172	10.714.935,92	10.826.108	-	-
2.12 (5.2.5)	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3		267,12	31.670	8.459.690,00		267,12	267,12	-	8.459.690,40	8.459.690	-	-
2.13 (1.2.11)	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS		461,44	6.200	2.860.928,00		461,44	461,44	-	2.860.928,00	2.860.928	-	-
2.14 (4,5)	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS		1.590,00	7.910	12.576.900,00		1.590,00	1.590,00	-	12.576.900,00	12.576.900	-	-
2.15 (INP 001)	LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI	M2		636,00	120.998	76.954.728,00		636,00	636,00	-	76.954.728,00	76.954.728	-	-
2.16 (INP 002)	REVESTIMIENTO ACRILICO SOBRE PISO EN CONCRETO	M2		636,00	125.640	79.907.040,00			-	-	-	-	636,00	79.907.040,00
2.17 (INP 003)	TIERRA PARA SIEMBRA Y NIVELACION	M3		44,52	71.848	3.198.673,00			-	-	-	-	44,52	3.198.672,96
2.18 (INP 004)	S.E.I. PRADO TRENZA. INCLUYE RIEGO DE PRENDIMIENTO	M2		445,20	43.238	19.249.558,00			-	-	-	-	445,20	19.249.557,60
2.19 (2,14)	ACARREO MATERIAL PETREO VOL.COMPACT	M3K		14.882,40	1.990	29.615.976,00		14.882,40	14.882,40	-	29.615.976,00	29.615.976	-	-
2.20 (INP 005)	GAVION DE CONTENCION DE ESTRUCTURA CANCHA MUL	M3		8,00	327.890	2.623.120,00		8,00	8,00	-	2.623.120,00	2.623.120	-	-
2.21 (INP 006)	SUB-BASE COMP.MAT.SELECC.	M3		95,40	83.743,00	7.989.082,00		95,40	95,40	-	7.989.082,20	7.989.082	-	-
2.22 (INP 007)	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCELDA PARA MEJOR	M2		636,00	52.583,00	33.442.788,00		636,00	636,00	-	33.442.788,00	33.442.788	-	-
					SUBTOTAL CAP. 2 CANCHA MULTIPLE:	314.895.003,00				1.353.134	161.753.391	163.106.525		110.358.809
3,00	PANTALLAS DE PROTECCIÓN													
3,1	PRELIMINARES													
3.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	25,90	25,91	2.210	57.266,00	25,91		25,91	57.266	-	57.266	-	-
					SUBTOTAL CAP. 3,1 PRELIMINARES:	57.266,00				57.266	-	57.266		-
3,2	MOVIMIENTOS DE TIERRRA													
3.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,99	6,42	21.850	140.336,00	6,42		6,42	140.336	-	140.336	-	-
3.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	5,95	7,60	19.780	150.240,00	7,60		7,60	150.240	-	150.240	-	-
					SUBTOTAL CAP. 3,2 MOVIMIENTOS DE TIERRRA:	290.576,00				290.576	-	290.576		-
3,3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA													

3.3.1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	9,26	9,77	27.600	269.751,00	9,77		9,77	269.751	-	269.751	-	-
3.3.2	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	3,71	2,20	865.180	1.904.227,00	2,20		2,20	1.904.227	-	1.904.227	-	-
3.3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	207,40	206,94	6.200	1.283.028,00	206,94		206,94	1.283.028	-	1.283.028	-	-
3.3.4	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	3,96	2,51	630.870	1.585.549,00	2,51		2,51	1.585.549	-	1.585.549	-	-
3.3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	615,96	364,59	6.200	2.260.451,00	364,59		364,59	2.260.451	-	2.260.451	-	-
3.3.6	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	0,50	0,26	551.830	141.268,00	-		-	-	-	-	0,26	141.268,48
3.3.7	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	0,60	0,80	491.180	392.944,00	0,80		0,80	392.944	-	392.944	-	-
3.3.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	104,40	49,22	6.200	305.139,00	49,22		49,22	305.139	-	305.139	-	-
					SUBTOTAL CAP. 3,3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA:	8.142.357,00				8.001.089	-	8.001.089		141.268
3,4	MAMPOSTERIA													
3.4.1	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	9,26	9,60	61.280	588.288,00			-	-	-	-	9,60	588.288,00
3.4.2	CINTA CONFINAMIENTO MURO	ML	23,16	25,50	28.330	722.415,00			-	-	-	-	25,50	722.415,00
3.4.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	31,82	40.70	6.200	252.328,00			-	-	-	-	40,70	252.327,60
					SUBTOTAL CAP. 3,4 MAMPOSTERIA:	1.563.031,00				-	-	-		1.563.031
3,5	MALLA													
3.5.1	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	102,32	102,40	29.450	3.015.680,00			-	-	-	-	102,40	3.015.680,00
3.5.2	POSTE TUBO GALV 2" x2.3MM C.13	ML	119,44	143,70	30.950	4.447.515,00			-	-	-	-	143,70	4.447.515,00
3.5.3	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2"	ML	112,64	34,08	16.640	567.091,00			-	-	-	-	34,08	567.091,20
3.5.4	ANGULO HIERRO 1 1/2"X3/16"	ML	25,58	25,50	19.980	509.490,00			-	-	-	-	25,50	509.490,00
					SUBTOTAL CAP. 3,5 MALLA:	8.539.776,00				-	-	-		8.539.778
4	ANDENES													
4,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7,91	8,06	21.850	176.029,00			-	-	-	-	8,06	176.029,06
4,2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	7,91	10,47	19.780	207.158,00			-	-	-	-	10,47	207.158,41
4,3	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	6,32	6,45	29.990	193.286,00			-	-	-	-	6,45	193.285,55
4,4	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	26,16	30,94	68.220	2.110.454,00			-	-	-	-	30,94	2.110.453,92
4,5	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	50,70	61,87	7.910	489.408,00			-	-	-	-	61,87	489.407,52
4,6	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	5,46	30,94	27.600	853.834,00			-	-	-	-	30,94	853.833,60
4,7	CORDON CONCRETO 3100 PSI	M3	1,09	1,55	1.039.620	1.608.084,00			-	-	-	-	1,55	1.608.084,22
4,8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	135,23	135,13	6.200	837.829,00			-	-	-	-	135,13	837.828,94
4,9	ACARREO MATERIAL PETREO VOL.COMPACT	M3K	78,42	216,55	1.990	430.938,00			-	-	-	-	216,55	430.938,48
					SUBTOTAL CAP. 4 ANDENES:	6.907.020,00				-	-	-		6.907.020
5,00	DRENAJE PLUVIAL													
5,1	PRELIMINARES													
5.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	133,65	127,50	2.070	263.925,00	133,65		133,65	276.656	-	276.656	- 6,15	- 12.730,50
					SUBTOTAL CAP. 5,1 PRELIMINARES:	263.925,00				276.656	-	276.656		-12.731
5,2	MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS													
5.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	76,26	120,46	21.850	2.631.993,00	120,46		120,46	2.631.993	-	2.631.993	-	-
5.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	76,26	156,59	19.780	3.097.441,00	156,59		156,59	3.097.441	-	3.097.441	-	-
5.2.3	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	2,40	3,99	75.050	299.450,00	4,01		4,01	300.608	-	300.608	- 0,02	- 1.158,02
5.2.4	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTAD	M3	4,16	12,02	98.470	1.183.117,00	12,02		12,02	1.183.117	-	1.183.117	-	-

5.2.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	33,52	34,04	31.670	1.078.125,00	34,04		34,04	1.078.125	-	1.078.125	-	-
5.2.6	RELLENO TIERRA-NIVELACION	M3	3,09	8,01	26.370	211.224,00	8,01		8,01	211.224	-	211.224	-	-
5.2.7	ACARREO MATERIAL PETREO VOL COMPACT	M3K	535,46	688,27	1.990	1.369.667,00	688,27		688,27	1.369.666	-	1.369.666	-	-
	SUBTOTAL CAP. 5,2 MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS:					**9.871.018,00**				**9.872.173**	-	**9.872.173**		**-1.158**
5,3	**FILTRO**														
5.3.1	GRAVA TRITURAD DE 1/2"	M3	1,73	1,84	87.010	160.142,00	1,84		1,84	160.142	-	160.142	-	-
5.3.2	GRAVA TRITURAD DE 1"	M3	1,73	1,84	69.340	127.620,00	1,84		1,84	127.620	-	127.620	-	-
5.3.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	28,35	32,72	5.340	174.725,00	32,72		32,72	174.725	-	174.725	-	-
5.3.4	TUB PVC 6 DREN SF NOVAFOR	ML	20,45	20,45	51.680	1.056.856,00	20,45		20,45	1.056.856	-	1.056.856	-	-
	SUBTOTAL CAP. 5,3 FILTRO:					**1.519.343,00**				**1.519.343**	-	**1.519.343**		**-**
5,4	**DRENAJE PLUVIAL**														
5.4.1	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	1,00	1,00	340.150	340.150,00	1,00		1,00	340.150	-	340.150	-	-
5.4.2	CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO]	UND	1,00	1,00	504.070	504.070,00	1,00		1,00	504.070	-	504.070	-	-
5.4.3	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	1,00	1,00	406.850	406.850,00	1,00		1,00	406.850	-	406.850	-	-
5.4.4	CAJA INSPECCION 120x120 CM [CONCRETO]	UND	1,00	1,00	794.450	794.450,00	1,00		1,00	794.450	-	794.450	-	-
5.4.5	CAJA INSPECCION 175x 80 CM DOM[CONCRETO]	UND	1,00	1,00	997.970	997.970,00	-		-	-	-	-	1,00	997.970,00
5.4.6	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS	UND	1,00	1,00	1.930.280	1.930.280,00	1,00		1,00	1.930.280	-	1.930.280	-	-
5.4.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	30,65	30,65	27.600	845.940,00	30,65		30,65	845.940	-	845.940	-	-
5.4.8	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	ML	61,30	61,30	93.150	5.710.095,00	-		-	-	-	-	61,30	5.710.095,00
5.4.9	TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF ESP:8CM	UND	103,00	103,00	52.800	5.438.400,00	-		-	-	-	-	103,00	5.438.400,00
5.4.10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	273,56	518,40	6.200	3.214.082,00	-		-	-	-	-	518,40	3.214.082,48
5.4.11	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUA	ML	6,04	32,00	2.440	78.080,00	32,00		32,00	78.080	-	78.080	-	-
5.4.12	TUBERIA PVC 4 RDE 21 - 200 PSI	ML	111,24	111,24	92.360	10.274.126,00	-		-	-	-	-	111,24	10.274.126,40
5.4.13	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	1,14	1,14	77.250	88.065,00	1,14		1,14	88.065	-	88.065	-	-
5.4.14	TUB PVC NOVAFORT 10"	ML	20,58	20,58	83.890	1.726.456,00	20,58		20,58	1.726.456	-	1.726.456	-	-
5.4.15	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	24,31	24,31	164.460	3.998.023,00	24,31		24,31	3.998.023	-	3.998.023	-	-
5.4.16	CODO PVC-UM 4 x 90	UND	36,00	36,00	113.210	4.075.560,00	-		-	-	-	-	36,00	4.075.560,00
5.4.17	TRAGANTE LOSA TCI 4 ATRAPA MANTO-ALUM	UND	12,00	12,00	376.500	4.518.000,00	-		-	-	-	-	12,00	4.518.000,00
5.4.18	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	48,00	48,00	20.750	996.000,00	-		-	-	-	-	48,00	996.000,00
5.4.19	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	60,60	61,00	98.660	6.018.260,00	-		-	-	-	-	61,00	6.018.260,00
5.4.20	VÁLVULA ANTIRRETORNO PVC DE 300 MM, CLAPETA DE POLIPROPILENO, JUNTA LABIADA Y REGISTRO SUPERIOR	UND	1,00	1,00	2.595.090	2.595.090,00	-		-	-	-	-	1,00	2.595.090,00
5.4.21	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	27,00	13,00	120.250	1.563.250,00	27,00		27,00	3.246.750	-	3.246.750	- 14,00	- 1.683.500,00
5.4.22	BATEA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	2,11	2,14	523.130	1.116.883,00	2,14		2,14	1.116.883	-	1.116.883	-	-
	SUBTOTAL CAP. 5,4 DRENAJE PLUVIAL:					**57.230.080,00**				**15.075.996**	-	**15.075.996**		**42.154.084**
6	**SISTEMA DE ILUMINACION**														
6,1	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	7,20	7,20	21.850	157.320,00			-	-	-	-	7,20	157.320,00
6,2	ACOM.E.3F(3# 6+1# 8) 2"	ML	36,00	36,00	80.610	2.901.960,00			-	-	-	-	36,00	2.901.960,00
6,3	CAPACETE GALV 2	UND	1,00	1,00	14.280	14.280,00			-	-	-	-	1,00	14.280,00
6,4	CURVA PVC 2	ML	1,00	1,00	23.690	23.690,00			-	-	-	-	1,00	23.690,00
6,5	TUBO GALV 2 X3 MTS	UND	2,00	2,00	109.510	219.020,00			-	-	-	-	2,00	219.020,00
6,6	CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA	UND	1,00	1,00	633.630	633.630,00			-	-	-	-	1,00	633.630,00

6,7	CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER	UND	1,00	1,00	154.770	154.770,00			-	-	-	-	1,00	154.770,00
6,8	CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT	UND	2,00	2,00	438.928	877.856,00			-	-	-	-	2,00	877.856,00
6,9	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1,00	1,00	1.154.310	1.154.310,00			-	-	-	-	1,00	1.154.310,00
6,10	TABLERO DE BAJA TENSION ILUMINACIÓN 220 V	UND	1,00	1,00	1.889.190	1.889.190,00			-	-	-	-	1,00	1.889.190,00
6,11	ACOM.E.3F(3# 10+1#10) 1" EMT"	ML	70,00	70,00	38.510	2.695.700,00			-	-	-	-	70,00	2.695.700,00
6,12	SAL LAMP EMT	UND	12,00	12,00	97.970	1.175.640,00			-	-	-	-	12,00	1.175.640,00
6,13	LUMINARIA LED 150 W 13074 LUMENS INDUSTRIAL	UND	12,00	12,00	1.697.530	20.370.360,00			-	-	-	-	12,00	20.370.360,00
6,14	PUNTA CAPTORA ACERO GAL	UND	12,00	12,00	87.300	1.047.600,00			-	-	-	-	12,00	1.047.600,00
6,15	CONECTOR PARALELO BIMETALICO	UND	6,00	6,00	39.970	239.820,00			-	-	-	-	6,00	239.820,00
6,16	CAJA RAWELT 3/4"	UND	6,00	6,00	22.540	135.240,00			-	-	-	-	6,00	135.240,00
6,17	GRAPA SUJECION PUNTA CAPTORA	UND	12,00	12,00	40.930	491.160,00			-	-	-	-	12,00	491.160,00
6,18	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	UND	12,00	12,00	53.360	640.320,00			-	-	-	-	12,00	640.320,00
6,19	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	40,00	40,00	35.870	1.434.800,00			-	-	-	-	40,00	1.434.800,00
6,20	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	1,00	1,00	271.690	271.690,00			-	-	-	-	1,00	271.690,00
6,21	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	1,00	1,00	271.690	271.690,00			-	-	-	-	1,00	271.690,00
6,22	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	16,00	16,00	29.160	466.560,00			-	-	-	-	16,00	466.560,00
6,23	ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM	ML	242,00	242,00	16.670	4.034.140,00			-	-	-	-	242,00	4.034.140,00
6,24	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	6,00	6,00	190.140	1.140.840,00			-	-	-	-	6,00	1.140.840,00
6,25	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT + TAPA	UND	6,00	6,00	162.530	975.180,00			-	-	-	-	6,00	975.180,00
					SUBTOTAL CAP. 6 SISTEMA DE ILUMINACION:	43.416.766,00				-	-	-		43.416.766
											242.574.819,16	242.574.819	-	476.918.772,71
7	ASEO Y LIMPIEZA													
7,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	544,14	585,00	2.070	1.210.950,00			-	-	-	-	585,00	1.210.950,00
8	INCREMENTO POR TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD (6% PARA L		0,06	0,06		68.524.317,00				24.039.089	14.554.489,15	38.593.578		29.930.739,23
9	ICOCIV (Construcción de obras civiles) - estimada por el DANE, s	%	0,14	0,14		162.859.460,00				57.132.901	34.591.169,21	91.724.070		71.135.390,18
					SUBTOTAL CAP. 7 ASEO Y LIMPIEZA:	232.594.728,00				81.171.989	49.145.658	130.317.648		102.277.079
	SUBTOTAL CAP. P2 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:					1.373.455.731				481.823.353	291.720.478	773.543.831		599.911.900

	COSTOS INDIRECTOS										
	VALOR COSTOS DIRECTOS		1.373.455.731				481.823.353	291.720.478	773.543.831	-	599.911.900,00
	ADMINISTRACION	29%	398.302.162				139.728.772	84.598.938	224.327.710	-	173.974.451,00
	IMPREVISTOS	1%	13.734.557				4.818.234	2.917.205	7.735.439	-	5.999.119,00
	UTILIDAD	6%	82.407.344				28.909.401	17.503.229	46.412.630	-	35.994.714,00
	TOTAL AIU	36%	494.444.064				173.456.407	105.019.372	278.475.779	-	215.968.285,00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	0%					-	-	-	-	-
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		1.867.899.795				655.279.760	396.739.850	1.052.019.610	-	815.880.185

AMORTIZACION ANITICIPO											
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA											

BALANCE PRESUPUESTAL								
V/R INICIAL CONTRATO:	1.426.801.042,00				V/R ANTICIPO:		-	
V/R ADICIONES:	441.098.753				% ANTICIPO :		-	
V/R ACTUAL CONTRATO:	1.867.899.795				% RETEGARANTIA :		-	
NO.	DESCRIPCIÓN ACTAS PARCIALES	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓ	RETENCIÓN GARANTÍA	ACUMULADO AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR ACUMULADO ACTAS
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	11/03/24	172.520.031	0	0	0	0	172.520.031
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No 2	11/05/24	300.060.416	0	0	0	0	472.580.447
3	ACTA PARCIAL DE OBRA No 3	02/12/24	182.699.313	0	0	0	0	655.279.760
4	ACTA PARCIAL DE OBRA No 4	10/12/24	396.739.850	0	0	0	0	1.052.019.610
TOTALES			1.052.019.610	0	0	0	0	1.052.019.610

El interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales por parte del contratista

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoría y/o supervisión y el contratista realizan las mediciones en campo y de las revisiones efectuadas por la interventoría.

La presente acta no exime al contratista de reparar, y/o enmendar las obras aquí contempladas o resarcir los daños por causas que le sean imputadas al contratista y queda sujeta en un todo a la liquidación del contrato.

EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: BRENDA LIZETH MURILLO BARCO
REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

EL INTERVENTOR:
Firma:
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

VB. INDERVALLE
Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RUEDA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Espacio para
Logo Corporativo

CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC
NIT 901.526.894-4
MZ H14A BARRIO HUASIPANGA
Tel: (undefined) 3218005123 - Ext. undefined
Mocoa - Colombia
construpacificosaszomac@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 14

Señores	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	805.012.896-4	**Teléfono**	(602) 5560112 - Ext. 000
Dirección	CR 36 5B 3 65 BRR SAN FERNANDO	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 17:48
Expedición	18/12/2024, 17:56
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Descripción	Valor Impto.Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	396,739,850.00	396,739,850.00

Total items: 1

Total Bruto	396,739,850.00
Total a Pagar	396,739,850.00

Valor en Letras:
Trescientos noventa y seis millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por $ 396,739,850.00

Observaciones:
RETENCIONES EN LA FUENTE:
CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC NIT 901.526.894-4 TIENE BENEFICIO DE ACUERDO AL DECRETO 1650 DE 2017 ARTÍCULO 1.2.1.23.1.10. la tarifa de retención en la fuente se calculará en forma proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementario de la sociedad beneficiaria, así: MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA: AÑO 2024 25%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068699036 aprobado en 20240409 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**

ORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 32087

CON AFECTACIÓN **FECHA: 24/12/2024**

A FAVOR DE: CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC **CEDULA O NIT: 901526894**

DESCRIPCION: RP-19008-2024 PAGO FACT FV14 ACTA NO. 4 POR VALOR 396.739.850 OTROSI No. 02 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA IND-23-5027 (CJ-7141)

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
31612	1159309	396,739,850.00	58,320,756.00	1,983,699.00	0.00	336,435,395.00
	TOTAL	396,739,850.00	58,320,756.00	1,983,699.00	0.00	336,435,395.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
246784	Traslado	105	16500330-2 AV VILLAS	901526894	CONSTRUPACICOL S.A.S ZOMAC	336,435,395.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244023001	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD 5%	19,836,992.00
244024004	TASA PRODEPORTE 2,5% DEC. 1405-2020	9,918,496.00
244035001	EST. PROUNIVALLE: 2%	7,934,797.00
244035002	EST, PRODESARROLLO: 2%	7,934,797.00
244035003	EST. PROHOSPITALES: 1%	3,967,398.00
244035004	EST. PROCULTURA: 1%	3,967,398.00
244035006	EST. PROUCEVA: 0,5%	1,983,699.00
244035007	EST. PROUPACIFICO: 0,5%	1,983,699.00
244035022	EST. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	793,480.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243626001	RETEFUENTE 2% CONSTRUC OBRA PUBLICA	1,983,699.00

TESORERÍA

ELABORADO POR:CLAUDIA MILENA ORTEGA DORADO

CONSTRUPACICOL S.A.S
ZOMAC

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

Yo, **CARLOS ALBERTO ANACONA ORTEGA**, identificado con C.C. No. 5.348.778 de Colón Putumayo, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la Empresa **CONSTRUPACICOL SAS ZOMAC** con Nit 901526894-4 de la cual soy el Revisor Fiscal ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de seguridad social (Salud y Pensiones), ARL señalados en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por sus conceptos.

La empresa se encuentra exonerado del pago de parafiscales y salud de conformidad a lo preceptuado por la Ley 1429 y Ley 607.

La presente certificación, se firma a los nueve (9) días mes de diciembre de 2024.

CARLOS ALBERTO ANACONA ORTEGA
C.C. No.5.348.778 de Colón
T.P.- No. 109371-T
Revisor Fiscal

321 449 8859
PROYECTOS.CONSTRUPACICOL@GMAIL.COM
construpacificosaszomac@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4E2999D0FE5565CF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

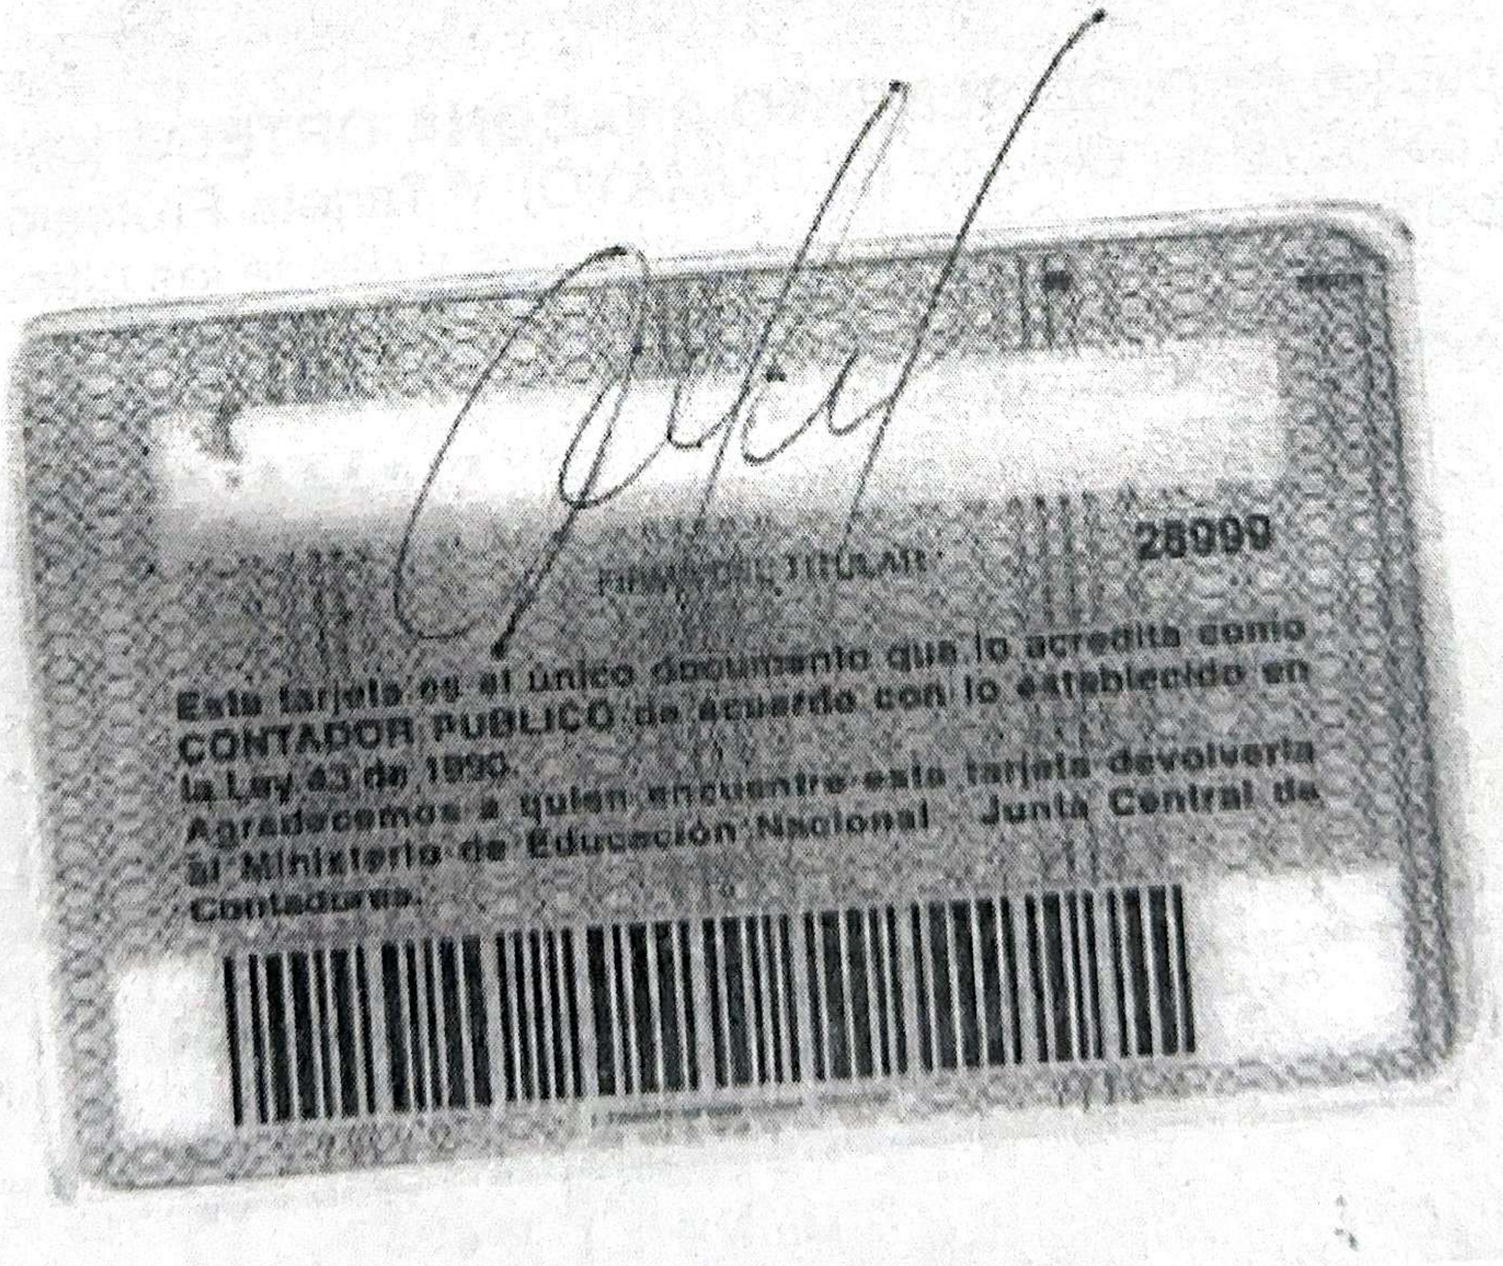
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO ANACONA ORTEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5348778 de COLON (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 109371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
109371-T
CARLOS ALBERTO
ANACONA ORTEGA
C.C.5346776
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA
PRESIDENTE
28999


28999
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

5.348.778
NUMERO

ANACONA ORTEGA
APELLIDOS

CARLOS ALBERTO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-OCT-1970

COLON
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-ENE-1989 COLON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-6400700-00168911-M-0005348778-20090813 0014871721A 1 26647128
