Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-009352 Id: 503358
Folios: 1 Fecha: 06-03-2025 09:55:58
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL.**

DE: **SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.**

ASUNTO: Remisión informe de ejecución del Ministerio del Interior – Convenio No. 2057 de 2021 periodo de Enero de 2025

Cordial saludo;

Por medio de la presente remito para su información y fines pertinentes información relacionada con el convenio No. 2057 de 2021 suscrito con el Municipio de López de Micay - Cauca, así:

Mes y Año del Informe	Municipio	Departamento	No de Convenio	No de Folios
Enero de 2025	López de Micay	Cauca	2057 de 2021	20

Atentamente,

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del convenio.

Anexos: Informe mensual de Supervisión Enero 2025 (20 Folios)
Elaboró: Ing. Carlos Andrés Montaña G / Apoyo técnico a la supervisión SPSCC

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo No. **2057 de 2021**, MUNICIPIO DE **LÓPEZ DE MICAY - CAUCA**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES **ENERO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA COORDENADAS: 2°50'47"N 77°14'50"O		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 4.813.963.309
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 849.522.937
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 5.663.486.246
FECHA SUSCRIPCIÓN	19/11/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	31/07/2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	31/08/2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO / CONTRATO	Arq. Manuel Antonio Linares Donato	**DESDE:** 29/01/2024	
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. Yenier Henao Mejía	19/11/2021	31/03/2022
	Ing. Remberto Alejandro Martínez Polo	01/04/2022	03/08/2022
	Arq. Héctor Iván Ayala Dueñas	04/08/2022	30/06/2023
	Ing. Edgar Ricardo González Patiño	01/07/2023	20/07/2023
	Ing. Hernando de Jesús Pérez Pérez	21/07/2023	28/01/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. Jhonatan Camilo García Medina	19/11/2021	31/03/2022
	Arq. María Camila Puentes Díaz	01/04/2022	30/06/2022
	Arq. Harry Fernhey Manrique Delgado	01/07/2022	12/07/2022
	Ing. Lisset Nathalia Moreno Jiménez	13/07/2022	31/12/2022
	Ing. Darío Fernando Córdoba Jurado	01/02/2023	31/12/2023
	Ing. Darío Fernando Córdoba Jurado	11/01/2024	28/01/2024
	Ing. Keyber Jhancarlos Socha Vargas	29/01/2024	31/12/2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 43521	19/08/2021	
	No. 14822	16/01/2022	
	No. 16023	19/01/2023	
	No. 16424	16/01/2024	
	No. 16524	16/01/2024	
	No. 21294	16/01/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 129221	29/11/2021	
	No. 6322	16/01/2022	
	No. 10423	19/01/2023	
	No. 8424	16/01/2024	
	No. 8524	16/01/2024	
	No. 14024	16/01/2024	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	Radicado: **2-2023-042664**	Fecha: **14/08/2023**	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	N/A	

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 435-47-994000047251	24/11/2021
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	29/11/2021	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	**PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN:** • Se extiende la fecha de terminación del convenio hasta: **31 de diciembre 2022.**	**FECHA:** 29/07/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA Y SEGUNDA MODIFICACIÓN: • Se extiende la fecha de terminación convenio hasta: **31 de diciembre de 2023.**	**FECHA:** 12/09/2022
	TERCERA PRÓRROGA Y TERCERA MODIFICACIÓN: • Se extiende la fecha de terminación convenio hasta: **31 de agosto de 2024.** • Sustitución presupuestal vigencia 2024.	**FECHA:** 09/04/2023
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	**PRIMERA SUSPENSIÓN** • Se suspende el convenio por un periodo de 2 meses, modificando la fecha de terminación hasta: 31 de octubre de 2024.	**FECHA:** 21/08/2024
	REINICIO 01 • Se reinició el convenio en la fecha estipulada.	**FECHA:** 21/10/2024
	SEGUNDA SUSPENSIÓN • Se suspende el convenio por un periodo de 45 días, modificando la fecha de terminación hasta: 16 de diciembre de 2024.	**FECHA:** 31/10/2024
	REINICIO 02 Se reinició el convenio en la fecha estipulada.	**FECHA:** 16/12/2024
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	**PÓLIZA INICIAL:** (No. 435-47-994000047251)	**FECHA DE APROBACIÓN:** 24/11/2021
	VIGENCIA DEL AMPARO: 31/01/2023	
	PÓLIZA 1RA PRÓRROGA, 1RA MODIFICACIÓN:	**FECHA DE APROBACIÓN:** 30/11/2022
	VIGENCIA DEL AMPARO:30/06/2023	
	PÓLIZA 2DA PRÓRROGA, 2DA MODIFICACIÓN:	**FECHA DE APROBACIÓN:** 23/03/2023
	VIGENCIA DEL AMPARO: 30/06/2024	
	PÓLIZA 3RA PRÓRROGA, 3RA MODIFICACIÓN:	**FECHA DE APROBACIÓN:** 23/05/2024
	VIGENCIA DEL AMPARO: 28/02/2025	
	Reinicio 01	**FECHA DE APROBACIÓN:** 16/12/2024
	VIGENCIA DEL AMPARO: 30/04/25	
	Reinicio 02	**FECHA DE APROBACIÓN:** 16/12/2024
	VIGENCIA DEL AMPARO: 16/06/2025	
	PÓLIZA 4TA PRÓRROGA, 4TA MODIFICACIÓN:	**FECHA DE APROBACIÓN:** Pendiente

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 181.764.470
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 64.490.034
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR DE OBRA	$ 5.225.106.621
VALOR INTERVENTORÍA	$ 192.125.121
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 5.663.486.246

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo / Contrato***

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. E. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría.	N/A	09/12/2021	$2.888.377.985
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. D. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40 %	-	$962. 792.662
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	-	$962.792.662
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$2.888.377.985
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME				$0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
No. 435-47-994000047251	Cumplimiento	$ 1.132.697.249,20	23/11/2021	30/06/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
Licitación Obra Pública PS 004- LP – LMICAY – CAU-2022 **No. Contrato:** F2-F14-243-2022	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA.		$ 5.406.693,215
Link de Consulta:	SECOP I		
Adicional en valor	19/07/2022		$108.000.000
Nombre contratista	CONSORCIO MICAY 2022		NIT. 901594340
	RL. HERNÁN ALFREDO VALLEJO MARTÍNEZ		C.C. 4.779.927
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/06/2022		6.5 MESES
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	OTRO Sí No.1	19/07/2022	ADICIÓN ($108.000.000)
	SUSPENSIÓN 01	21/11/2022	5.5 MESES
	REINICIO	02/05/2023	N/A
	SUSPENSIÓN 02	08/05/2023	2.5 MESES
	REINICIO 02	20/07/2023	N/A
	OTRO SÍ No.2	23/08/2023	PRÓRROGA
	SUSPENSIÓN 03	07/12/2023	3 MESES
	REINICIO 01	01/03/2024	-
	OTRO SÍ No.03	01/04/2024	PRÓRROGA
	SUSPENSIÓN 04	12/07/2024	1 MES
Fecha de terminación inicial del contrato	30/12/2022	**Fecha actual de terminación del contrato**	-
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 5.514.693.215**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	No. 45-44-101138910 – Cumplimiento No. 4540-101076269 – Responsabilidad Civil Extracontractual		
FECHA DE LA PÓLIZA	08/06/2022		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
Concurso de Méritos Abiertos CM-002-LMICAY-CAU-2022 **No. Contrato:** 257	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMIISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY- CAUCA.		$ 256.615.155
Link de Consulta:	SECOP I		
Adicional en valor	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO VALLECA		NIT. 901602320
	RL. TATIANA JANETH CERON DIAZ		C.C. 1.143.832.729
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/06/2022		12 MESES
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	SUSPENSIÓN 01	21/11/2022	5.5 MESES
	REINICIO	02/05/2023	N/A
	SUSPENSIÓN 02	08/05/2023	2.5 MESES
	REINICIO 02	20/07/2023	N/A
	SUSPENSIÓN 03	07/12/2023	3 MESES
	REINICIO 03	01/03/2024	-
	OTRO SÍ No.01	01/04/2024	PRÓRROGA
	SUSPENSIÓN 04	12/07/2024	1 MES
Fecha de terminación inicial del contrato	16/06/2023	**Fecha actual de terminación del contrato**	-
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 256.615.155

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA No.	No. 45-44-101139110 – Cumplimiento No. 45-40-101076438 – Responsabilidad Civil Extracontractual
FECHA DE LA PÓLIZA	14/06/2022

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: **NOVIEMBRE-24**	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X Último Informe Presentado Periodo Noviembre de 2024
INFORME FINANCIERO		X No se ha presentado
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 1.417.775.549,13	Corte: Noviembre 2024
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Cierre Financiero	
OTROS	N/A	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%

COMPONENTE CONTRACTUAL:

- Minuta Inicial: Suscrita el **2911/2021**
- Prórroga 01 – Modificación 01: Suscrita el **29/07/2022**
- Prórroga 02 – Modificación 02: Suscrita el **12/09/2022**
- Prórroga 03 – Modificación 03: Suscrita el **09/04/2023**
- Primera Suspensión: Suscrita el **21/08/2024**
- Reinicio 01: Suscrito el **21/10/2024**
- Suspensión 02: Suscrita el **31/10/2024**
- Reinicio 02: Suscrito el **16/12/2024**
- Prórroga 04 – Modificación 04: Suscrita el **16/12/2024**

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante el mes de enero de 2025 no se contó con personal de apoyo a la supervisión para continuar con el seguimiento al convenio, se espera continuar con esta actividad de manera activa en el mes de febrero de 2025.

COMPONENTE TÉCNICO:

En el transcurso de la vigencia 2024, se realizaron audiencias con el municipio López de Micay – Cauca, por el presunto incumplimiento a las obligaciones; tales como: cronograma del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, allegar los expedientes contractuales pendientes y la consecución de los recursos para lograr el cierre financiero del proyecto CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Dichas diligencias fueron adelantadas en las siguientes fechas:

• 16 de agosto de 2024.
• 07 de octubre de 2024.

• 28 de octubre de 2024.
• 31 de octubre de 2024.
• 13 de noviembre de 2024.
• 21 de noviembre de 2024.

De igual forma es preciso indicar que, de acuerdo con la última audiencia que se llevó a cabo con el municipio López de Micay – Cauca, y después de haber escuchado a cada una de las partes del Convenio en mención, el asesor jurídico de la Entidad Territorial, interpusoel recurso con el fin de resolver la resolución No. 2030 del 31 DE OCTUBRE DE 2024, en el cual se multó al municipio por un valor de$ 566.348.624,6 M/L. Dicha diligencia fue suspendida hasta el próximo 17 de febrero de 2025, fecha en la cual se espera dar el fallo a
favor o en contra por el presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales en el marco del Convenio suscrito con el Ministerio del
Interior.

COMPONENTE FINANCIERO:

DESEMBOLSO	FECHA	VALOR
Primer Desembolso	12/09/2021	$ 2.888.377.985

COMPONENTE JURÍDICO:

De acuerdo con la última actuación realizada, la cual corresponde a la cuarta prórroga, cuarta modificación y reprogramación presupuestal para la vigencia 2025, el convenio se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por otra parte, como resultado de la cuarta audiencia se declaró incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales al municipio López de Micay - Cauca, mediante RESOLUCIÓN 2030 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024, multando a la Entidad Territorial por un valor de $ 566.348.624,6 M/L.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Teniendo en cuenta las audiencias que se adelantaron desde el mes de agosto de 2024 hasta la fecha con el municipio López de Micay – Cauca, se declaró incumplimiento parcial por parte del Ministerio del Interior mediante RESOLUCIÓN 2030 DEL 31 DE OCTUBREDE 2024 de las siguientes obligaciones contractuales consagradas en el ANEXO DE CONDICIONES del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO – I. ESPECIFICAS

"4) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR".

"21) Incluir como riesgo previsible en su contratación los mayores valores que puedan arrojar los estudios y diseños. En caso de materializarse este riesgo, deberá aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado del presupuesto entregado con los estudios y diseños. Lo anterior, deberá ser revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO, ¡para lo cual deberá presentar el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuesta!, previo al inicio de la ejecución de la obra, a fin de garantizar el cierre financiero del proyecto. Los recursos adicionales a los que se refiere este numeral serán adicionados por el MUNICIPIO a los contratos derivados según se requiera, previa modificación del convenio".

"22) Aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuesta l. Estos recursos se adicionarán directamente por el MUNICIPIO a los contratos. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de que se inicie la ejecución las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos".

"32) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soporte, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos".

"36) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a} Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto".

"49) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio".

"50) Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO -FONSECON".

"52) Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento".

Desde la Supervisión del Ministerio del Interior, no se registra avance de la obra; toda vez que, se le indicó al municipio López de Micay - Cauca no avanzar en la ejecución hasta que se determinara y lograra el cierre financiero del proyecto CAM.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

Arq. MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor Convenio
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON

CONSORCIO VALLECA NIT. 901602320-4	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: CV-CTO-275-IS
		Versión: 1
		Fecha: 01/07/2024
		Página: 1 de 2

	D	M	A						
1. FECHA ELABORACIÓN:	13	7	2024	2. No. INFORME	39		3. SEMANA No.	39	
4. PERIODO COMPRENDIDO DESDE:	8	7	2024	HASTA:	12	7	2024		
5. NOMBRE PROYECTO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA			6. DIRECCION PROYECTO:	CRA 2 # 5 - 07 CALLE LAS FLORES.				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

7. CONTRATO OBRA No:	F2-F14-243-2022			8. FECHA CONTRATO:	23	5	2022	9. VALOR CONTRATO FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 181.764.470
								9.1 VALOR CONTRATO FASE II DE CONSTRUCCIÓN :	$ 5.224.928.745
								9.2 ADICIONES FASE I EyD.	$ 108.000.000,00
								9.3. TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.514.693.215,00
10. FECHA INICIO DEL CONTRATO:	17	6	2022	11. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	8	2024	9.4 VALOR OBRA RESULTADO EyD	$ 8.484.814.463,00
13. FECHA INICIO FASE DE CONSTRUCCIÓN	20	7	2023	14. PLAZO FASE DE OBRA:	7 MESES Y 11 DIAS		Meses/días	12. PLAZO DEL CONTRATO:	12 MESES Y 21 DIAS

GARANTIAS DEL CONTRATO

TIPO DE GARANTÍA	No. DE POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENCIA HASTA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	45-44-101138910	jueves, 9 de junio de 2022	miércoles, 1 de agosto de 2029	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	45-40-101-076269	jueves, 9 de junio de 2022	jueves, 1 de agosto de 2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO F2-F14-243-2022

ACTUACIONES Y MODIFICACIONES	DURACIÓN	DESDE	HASTA
ACTA DE INICIO	6.5 Meses	viernes, 17 de junio de 2022	domingo, 1 de enero de 2023
OTRO SI No. 01 (adición presupuestal)	N/A	martes, 19 de julio de 2022	N/A
SUSPENSIÓN No. 01	5 Meses + 11 días	lunes, 21 de noviembre de 2022	martes, 2 de mayo de 2023
REINICIO No.01	N/A	martes, 2 de mayo de 2023	N/A
SUSPENSIÓN No. 02	2 Meses + 12 días	lunes, 8 de mayo de 2023	jueves, 20 de julio de 2023
REINICIO No.02	N/A	jueves, 20 de julio de 2023	N/A
OTRO SI No. 02 (adición en tiempo)	126 Días	miércoles, 23 de agosto de 2023	N/A
SUSPENSION No. 03	2 Meses + 23 días	jueves, 7 de diciembre de 2023	viernes, 1 de marzo de 2024
REINICIO No.03	N/A	viernes, 1 de marzo de 2024	N/A
OTRO SI No.03 (adición en tiempo)	60 días	lunes, 1 de abril de 2024	N/A
SUSPENSION No. 04	1 Mes	viernes, 12 de julio de 2024	lunes, 12 de agosto de 2024

19. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA.
20. CONTRATISTA:	CONSORCIO MICAY 2022

A.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

21. CONTRATO INTEVENTORIA No:	257-2022			22. FECHA CONTRATO:	9	6	2022	21. VALOR INTERVENTORIA FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS :	$ 64.490.034
24. FECHA ACTA INICIO:	17	6	2022	25. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	8	2024	21.2 VALOR INTERVENTORIA FASE II DE CONSTRUCCION	$ 191.954.096
PLAZO DEL CONTRATO	14 MESES			PLAZO FASE INTV. DE OBRA	9 MESES + 26 DÍAS			21.3 VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 256.444.130

GARANTIAS DEL CONTRATO

TIPO DE GARANTÍA	No. DE POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENCIA HASTA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	45-44-101139110	jueves, 9 de junio de 2022	domingo, 9 de julio de 2028	SEGUROS DEL ESTADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	45-40-101076438	jueves, 9 de junio de 2022	martes, 4 de junio de 2024	SEGUROS DEL ESTADO

CRONOLOGIA DEL CONTRATO F4-F36-257-2022

ACTUACIONES Y MODIFICACIONES	DURACIÓN	DESDE	HASTA
ACTA DE INICIO	6.5 Meses	viernes, 17 de junio de 2022	domingo, 1 de enero de 2023
OTRO SI No. 01 (adición presupuestal)	N/A	martes, 19 de julio de 2022	N/A
SUSPENSIÓN No. 01	5 Meses + 11 días	lunes, 21 de noviembre de 2022	martes, 2 de mayo de 2023
REINICIO No.01	N/A	martes, 2 de mayo de 2023	N/A
SUSPENSIÓN No. 02	2 Meses + 12 días	lunes, 8 de mayo de 2023	jueves, 20 de julio de 2023
REINICIO No.02	N/A	jueves, 20 de julio de 2023	N/A
OTRO SI No. 02 (adición en tiempo)	126 Días	miércoles, 23 de agosto de 2023	N/A
SUSPENSIÓN No. 03	2 Meses + 23 días	jueves, 7 de diciembre de 2023	viernes, 1 de marzo de 2024
REINICIO No.03	N/A	viernes, 1 de marzo de 2024	N/A
OTRO SI No.03 (adición en tiempo)	60 días	lunes, 1 de abril de 2024	N/A
SUSPENSION No. 04	1 Mes	viernes, 12 de julio de 2024	lunes, 12 de agosto de 2024

30. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO VALLECA	31. ADICIONES:	$ -
32. SUPERVISOR:	ING. IVAN DARIO CASTILLO VALENCIA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN		

CONSORCIO VALLECA NIT. 901602330-4	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: CV-CTO-275-IS Versión: 1 Fecha: 01/07/2024 Página: 1 de 2

	D	M	A					
1. FECHA ELABORACIÓN:	13	7	2024	2. No. INFORME	39	3. SEMANA No.	39	
4. PERIODO COMPRENDIDO DESDE:	8	7	2024	HASTA:	13	7	2024	
5. NOMBRE PROYECTO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA			6. DIRECCION PROYECTO:	CRA 2 # 5 - 07 CALLE LAS FLORES.			

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

33. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	34. % PROGRAMADO	35. % EJECUTADO	36. UNIDAD	37. CANTIDAD PROGRAMADA	38. CANTIDAD EJECUTADA	39. EVALUACIÓN AVANCE
CIMENTACIÓN						
ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI	100,0%	99,1%	M3	103,66	102,75	se funden concretos de toda la cimentacion
ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	100,0%	5,9%	M3	89,86	5,28	se funden pedestales y arannques de columnas
PANTALLA EN CONCRETO 4000 PSI	100,0%	7,3%	M3	44,48	3,26	Se funden los arranques de la estructura
ACEROS-MALLAS						
ACERO DE REFUERZO FIGURADO	100,0%	42,9%	KG	123944,57	53202,49	se instala el acero de refuerzo de pilotes, cimentacion y arranques de columnas y pantallas

40. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	42,48%	100,00%	-57,52%
Durante el periodo	2,42%	0,00%	2,42%
Acumulado Actual	44,90%	100,00%	-55,10%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,00%	100,00%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ 5.224.928.745,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,42%	44,90%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 126.443.275,63	$ 2.345.813.776,00

41. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

43. PERSONAL OPERATIVO OBRA		44. EQUIPOS EN OBRA		45. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**DIA**	**ESTADO**
OFICIAL	2	Vibrador de concreto	1	LUNES	F
RESIDENTE DE OBRA	1	Mezcladoras	2	MARTES	L
AYUDANTE DE OBRA	11	Motobomba	1	MIERCOLES	L
PROFESIONAL SISO	1	Motocarguero	1	JUEVES	F
MAESTRO DE OBRA	1			VIERNES	L
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1			SABADO	F

NOTA: *Se verifica afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo y certificados de calibracion de equipos. Se verifica la condición de maquinaria pesada. Soportes adjuntos en informe mensual.*

LLUVIOSO (L)
FAVORABLE (F)
SOLEADO (S)

CONSORCIO VALLECA NIT. 901602320-4	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: CV-CTO-275-IS Versión: 1 Fecha: 01/07/2024 Página: 1 de 2

	D	M	A						
1. FECHA ELABORACIÓN:	13	7	2024	2. No. INFORME	39	3. SEMANA No.	39		
4. PERIODO COMPRENDIDO DESDE:	8	7	2024	HASTA:	13	7	2024		
5. NOMBRE PROYECTO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA			6. DIRECCION PROYECTO:	CRA 2 # 5 - 07 CALLE LAS FLORES.				

D. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA SIGUIENTE SEMANA (SEGÚN CRONOGRAMA)

E. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS.

Se hace claridad, que el avance de obra del presente informe semanal de interventoría se reporta con base en el valor actualmente contratado para la fase II (Obra) el cual corresponde a $5.224.928.745, celebrado entre el Municipio López de Micay y el Consorcio Micay 2022.
El valor contratado actualmente entre el Municipio de López de Micay, Cauca y el Consorcio Micay 2022 no es suficiente para lograr la ejecución total de la obra diseñada durante la fase I (Estudios y Diseños).
Si bien es cierto que el valor del contrato F2-F14-243-2022 de fecha 23 de mayo de 2022, cuyo objeto es " REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA" suscrito entre el municpio de López de Micay - Cauca y el Consorcio Micay 2022 tiene un presupuesto para la construcción de $5.224.928.745, el resultado de la fase I (Estudios y Diseños) en su presupuesto arrojó que la obra tiene un costo total de $8.484.814.463,00, razón por la cual, el proyecto aún requiere la consecución de $3.259.885.718. En otras palabras, es fundamental lograr el cierre financiero para culminar y entregar el proyecto CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL con cada una de las especificaciones y componentes diseñados. A continuación se relacionan los cáptiulos cuya ejecución se encuentra sujeta a la consecución de los recursos adicionales; Muros en Board, Instalaciones Hidrosanitarias, Pañetes, Pinturas, Bases-pisos-enchape y cermaica, Cielo raso, Carpintería metálica, Carpintería en madera, baños y grifería, asecensor, R.C.I. Cuarto de bombas, Instalaciones eléctricas e iluminación e instalaciones de la red de voz y datos.
Se suspende el contrato de obra e interventoría el día 12 de julio de 2024. justificación: "*Las lluvias persistentes en la zona han ocasionada la crecida de los ríos e inundando la zona intervenida por el proyecto, lo que ha afectadoconsiderablemente la ejecución de la obra no permitiendo el avance en el desarrollo de las diferentes actividades preliminares del proyecto. Además, aunado a ello no ha sido posible la extracción del material pétreo y su debido transporte, materia prima indispensable en la fabricación de concretos*".
No se conocen las activiadades a ejecutar. Contratista no aporta cronograma actualizado. Por lo tanto se solicitó al contratista actualizar dicho insumo para el correcto control y seguimiento a la obra.
Se inicia y avanza con la fundición de zapatas aisladas. Se reporta un total de 102,75m3.
Se inicia y avanza con la fundición de columnas. Se reportan 5.28 m3 fundidos.
Se inicia y avanza con la fundición de pantalla estructural. Se reportan 3,26 m3 fundidos.
Se verifica por parte de la interventoría la localización de los ejes de la cimentación superficial para instalar el acero de refuerzo.
Se realiza el retiro y disposición final de material de excavación en los sitios autorizados por el Municipio de López de Micay
Se avanza con la demolición de cabezales
Adecuación de cabezales de los pilotes. Se realiza corte de los excesos de acero y se enderezan las varillas que garantizan el anclaje a la cimentación.
Retiro de aguas freáticas, mediante el uso de motobombas.
Instalación de acero de refuerzo para cimentación aislada, columnas y pantalla estructural.
La alcaldía dispuso de un sitio para hacer uso de las disposiciones finales de los residuos correspondientes a las demoliciones y a las excavaciones, se está utilizando como relleno de un muro de contención construido en el municipio.
Se denota un buen uso de la seguridad industrial del personal en obra.

F. FIRMAS

INTERVENTORIA	***CONTRATISTA DE OBRA***	***SUPERVISOR DEL CONTRATO***
R.L.S. CONSORCIO VALLECA	*R.L. CONSORCIO MICAY 2022*	*MUNICIPIO LÓPEZ DE MICAY - CAUCA*

Original: Secretaria de infraestructura - Municipio Lopez de Micay
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13	7	2024	No. INFORME	39	SEMANA No.	39	
PERIODO COMPRENDIDO DESDE:	8	7	2024	HASTA:	13	7	2024	

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA

CONTRATO OBRA No:	F2-F14-243-2022	CONTRATISTA	CONSORCIO MICAY 2022
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	257-2022	INTEVENTORÍA	CONSORCIO VALLECA

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Armadura de refuerzo. Vigas de cimentacion y pedestales de la estructura



DESCRIPCIÓN: Armadura de refuerzo, Zapatas Aisladadas.



DESCRIPCION:Armadura de refuerzo. Cimentación.



DESCRIPCIÓN: Armadura de refuerzo Pantalla Estructural y Cimentacion

FECHA ELABORACIÓN:	13	7	2024	No. INFORME	39	SEMANA No.	39	
PERIODO COMPRENDIDO DESDE:	8	7	2024	HASTA:	13	7	2024	

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA

CONTRATO OBRA No:	F2-F14-243-2022	CONTRATISTA	CONSORCIO MICAY 2022
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	257-2022	INTEVENTORÍA	CONSORCIO VALLECA

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Fundicion de zapatas de cimentacion.



DESCRIPCIÓN: Fundicion de zapatas aisaldas y vigas de cimentacion.





DESCRIPCIÓN: Instalacion de formaleta y puentes de referencia en guadua.



DESCRIPCIÓN: Cimentacion Edificio de servicios. Instalaicon de formaleta.

CONSORCIO VALLECA NIT. 901602320-4	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:CV-CTO-275-IS
		Versión: 1
		Fecha: 01/07/2024
		Página: 2 de 2

FECHA ELABORACIÓN:	13	7	2024	No. INFORME	39	SEMANA No.	39	
PERIODO COMPRENDIDO DESDE:	8	7	2024	HASTA:	13	7	2024	

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA

CONTRATO OBRA No:	F2-F14-243-2022	CONTRATISTA	CONSORCIO MICAY 2022
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	257-2022	INTEVENTORÍA	CONSORCIO VALLECA

G. REGISTRO FOTOGRAFICO




DESCRIPCIÓN: Fundicion Cimentacion



DESCRIPCIÓN: Tioma de muestras de concreto.



DESCRIPCIÓN: Vibrado de concreto

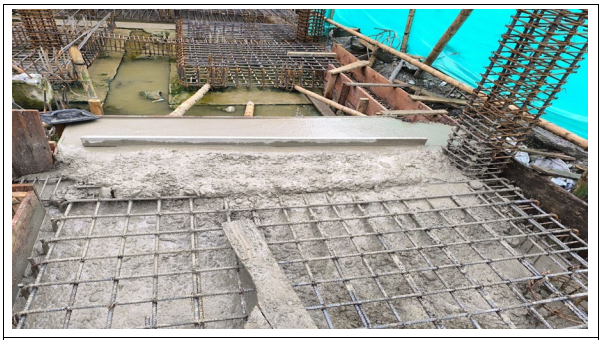

DESCRIPCIÓN: Tallado y acabado de la superficie del elemento fundido.

FECHA ELABORACIÓN:	13	7	2024	No. INFORME	39	SEMANA No.	39	
PERIODO COMPRENDIDO DESDE:	8	7	2024	HASTA:	13	7	2024	

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA

CONTRATO OBRA No:	F2-F14-243-2022	CONTRATISTA	CONSORCIO MICAY 2022
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	257-2022	INTEVENTORÍA	CONSORCIO VALLECA

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



02/11/2024
DESCRIPCIÓN: Fundición de cimentacion



DESCRIPCIÓN: Cimentación fundida.

FLUJO DE CAJA
CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY - EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO MICAY 2022
CONTRATO DE OBRA No FSP-14-24-34202-DEL 23 DE MAYO DE 2022

| Costo | 2023 | | |

FLUJO DE CAJA
CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY- EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO MICAY 2022
CONTRATO DE OBRA No PSP-140-342022 DEL 23 DE MAYO DE 2022


Costo	T3							T4												T1														2023												T2												T3								Total general
	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 1	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	
Construccion Obra																																																																
Preliminares																																																															
Localizacion y Replanteo Obra Arquitectonica																																																															
Localizacion y Replanteo Planos																																																														
Cerramiento Sector Construccion																																																														
Acopio																																																														
Obras Provisionales																																																														
Movimiento de Tierra																																																														
Excavacion Tierra a Mano Sepo Agua No 3.4mx Incluye Cargue																																																														
Relleno Importado Sitio Obra																																																														
Mv. Mamposteria de Piedra																																																														
Concretos																																																														
Concreto De Pisitos Tipo Trombe Manual, Slump de 7cm, Concreto De 4000 Psi, Incluye Formaleta Manual, Retiro De Sobrantes, % Esperdicio 25% (No Incluye Acero)																																																														
Dental, Cabezal De Pilotes Incluye Retiro y Disposicion De Sitio Autorizado De Sobrantes y En Este Mismo																																																														
Losas Concreto Ciclopeo 3000 Psi Sitio																																																														
Losas Concreto 3000 Psi Incl. Formaleta																																																													
Concreto Ciclopeo 3000 Psi Incl. Sitio Obra																																																												
Viga Cimentacion Concreto 3000 Psi Para 40MPA (De 3000 Psi																																																											
Mv. Cimentacion																																																												
Estructuras en Concreto																																																											
Columnas Concreto Reforzado Concreto 4000 Psi Incluye Placa, Vigas, Losa																																																											
Losa Cajonera Nervio Angosto 35 cm (40 x 40)																																																											
Losa Concreto Macizo 3.000 Psi Concreto 3000 Psi																																																											
Columnas Concreto 3000 Psi																																																										
Riostra Concreto 3000 Psi, Incluye 0.03 De Polvo																																																										
Escalera Concreto 3000 Psi Incl. Formaleta																																																										
Mv. Mamposteria																																																										
Mamposteria En Bloque Tipo Corriente 600 Psi Incluye Pega																																																										
Muro Divisorio Ladrillo Tolete Liso Panelado																																																										
Muro Divisorio Ladrillo Tolete Liso Panelado Incl. Sitio																																																										
Muro Divisorio Ladrillo Tolete Liso Panelado Incl. Sitio																																																										
Mv. Pañetes																																																										
Pañete Liso Interior Sin Dilatacion																																																									
Pañete Liso Interior Sin Dilatacion Incl. Sitio																																																									
Pañete Liso Exterior Sin Dilatacion																																																								
Pañete Liso Exterior Sin Dilatacion Incl. Sitio																																																								
Mv. Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias y Agua Lluvias																																																								
Caja Sifon 200 Con Dimension 4000psi																																																								
Cisterna Para Bombeo Incl Sitio																																																							
Tuberia Para Sanitaria																																																							
Tuberia Para Sanitaria Incl Sitio																																																						
Caja Registro 60x60 Tipo Convencional																																																						
Caja Registro 120x60 Tipo Convencional																																																					
Mv. Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias y Agua Lluvias																																																					
Aseo General																																																					
Limpieza - Barrido - Aseo																																																					
Personal General																																																				
Mv. Construccion																																																				
Total general	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31.622.129,84	$ 112.133.362,24	$ 112.133.362,24	$ 112.133.362,24	$ 352.448.032,97	$ 151.241.203,97	$ 151.133.203,81	$ 265.133.203,81	$ 333.544.312,81	$ 325.444.312,81	$ 314.041.203,81	$ 315.193.028,13	$ 185.133.576,13	$ 47.102.235,81	$ 9.333.546,02	$ 3.729.883,81	$ 3.729.883,81	$ 3.729.883,81	$ 3.729.883,81	$ 3.729.883,81	$ 3.729.883,81	$ 59.168.927,81	$ 11.941.203,51	$ 1.722.598,58	$ 933.916,52	$ 2.224.152.798,16

CRONOGRAMA DE OBRA

CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY"- EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA CONTRATISTA:
CONSORCIO MICAY 2022

CONTRATO DE OBRA No F2-F14-243-2022 DEL 23 DE MAYO DE 2022

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	% completado
1		**Construccion Obra**	**347 días**	**$ 5.224.928.748,00**	**jue 20/07/23**	**mié 17/09/25**	**42%**
2	**1**	**Preliminares**	**164 días**	**$ 49.685.984,00**	**jue 20/07/23**	**jue 9/05/24**	**36%**
3	1,1	Localizacion y Replanteo Obra Arquitectonica	20 días	$ 12.287.265,00	jue 20/07/23	lun 14/08/23	100%
4	1,2	Localizacion y Replanteo Pilotes	15 días	$ 5.301.598,00	sáb 2/09/23	jue 21/09/23	100%
5	1,3	Cerramiento Lamina Galvanizada	15 días	$ 15.177.923,00	mar 15/08/2	vie 1/09/23	100%
6	1.4	Bombeo	90 días	$ 16.919.198,00	lun 23/10/23	jue 9/05/24	0%
7		Fin Preliminares	0 días	$ 0,00	jue 21/09/23	jue 21/09/23	100%
8	**2**	**Movimiento de Tierra**	**148 días**	**$ 25.480.430,00**	**jue 21/09/23**	**vie 21/06/24**	**100%**
9	2,1	Excavacion Tierra a Mano Bajo Agua H= 2.0m. Incluye Retiro	14 días	$ 20.978.143,00	jue 21/09/23	lun 9/10/23	100%
10	2,2	Relleno Importado Balastro (ST)	14 días	$ 4.502.287,00	mié 5/06/24	vie 21/06/24	100%
11		Fin Movimiento de Tierras	0 días	$ 0,00	vie 21/06/24	vie 21/06/24	100%
12	**3**	**Cimentacion**	**160 días**	**$ 1.569.793.510,00**	**lun 23/10/23**	**sáb 26/04/25**	**95%**
13	3,1	Fabricación De Pilotes Tipo Tornillo Manual, Diámetro 40 Cm, Concreto De 4000 Psi, Incluye Perforación Manual, Retiro De Sobrantes, % Expansión 20% (No	90 días	$ 1.269.172.897,00	lun 23/10/23	jue 9/05/24	100%
14	3,2	Demol. Cabezal De Pilotes Incluye Retiro y Disposición En Sitio Autorizado De Sobrantes a D= 5km Máximo)	70 días	$ 15.159.097,00	jue 23/11/23	jue 16/05/24	100%
15	3,3	Solado Espesor E=0.07m 2000 Psi 14.5 Mpa	58 días	$ 21.416.989,00	lun 4/03/24	jue 16/05/24	100%
16	3,4	Zapata Concreto 3000 Psi Inc. Formaleta	65 días	$ 194.489.214,00	jue 14/03/24	mar 4/06/24	100%
17	3,5	Concreto Ciclópeo 3000 Psi Relac.60c/40p	20 días	$ 4.663.265,00	mié 2/04/25	sáb 26/04/25	0%
18	3,6	Viga Cimiento Enlace (30x30 Hasta 60x40) Cm 3000 Psi	65 días	$ 64.892.048,00	jue 14/03/24	mar 4/06/24	100%
19		Fin Cimentacion	0 días	$ 0,00	sáb 26/04/25	sáb 26/04/25	0%
20	**4**	**Estructuras en Concreto**	**88 días**	**$ 1.342.382.751,00**	**sáb 22/06/24**	**mié 2/07/25**	**11%**
21	4,1	Tanque Enterrado Concreto 4000 Psi Incluye Placa, Muros, y Tapa	30 días	$ 62.854.986,00	lun 28/04/25	mié 4/06/25	0%
22	4,2	Tapa Caja Marco Angulo 91x91-100x100	10 días	$ 985.566,00	mié 4/06/25	mar 17/06/25	0%
23	4,3	Losa Concreto-Maciza E=20 Cm Concreto 3000 Psi	35 días	$ 224.399.111,00	lun 28/04/25	mar 10/06/25	0%
24	4,4	Escalera En Concreto 3000 Psi-	15 días	$ 34.107.542,00	mié 11/06/25	lun 30/06/25	0%
25	4,5	Rampa Concreto 3000 Psi, Maciza E=10 Cm Para Acceso Movilidad Reducida	7 días	$ 6.865.490,00	mar 24/06/25	mié 2/07/25	0%
26	4,6	Columna Concreto 3000 Psi	70 días	$ 195.079.284,00	sáb 22/06/24	lun 9/06/25	22%
27	4,7	Columna Ccto 3000 Psi Amarre Muro De 12cmcx20cm	70 días	$ 19.182.281,00	sáb 22/06/24	lun 9/06/25	22%
28	4,8	Pantalla En Concreto 4000 Psi E=20cms	70 días	$ 93.758.725,00	sáb 22/06/24	lun 9/06/25	22%
29	4,9	Viga Concreto Aérea 3000 Psi	35 días	$ 417.155.569,00	lun 28/04/25	mar 10/06/25	0%
30	4,10	Viga Concr 3000 Psi .Amarre Muro 12x25cm	35 días	$ 6.149.174,00	lun 28/04/25	mar 10/06/25	0%
31	4,11	Losa Concreto Tipo Joist (H= 0,3 -0,40 M) E=10cm. Ccto 3000 Psi	30 días	$ 281.845.023,00	vie 16/05/25	lun 23/06/25	0%
32		Fin Estructuras en Concreto	0 días	$ 0,00	mié 2/07/25	mié 2/07/25	0%
33	**5**	**Aceros - Mallas**	**120 días**	**$ 1.990.013.598,00**	**vie 10/05/24**	**lun 30/06/25**	**28%**
34	5,1	Acero De Refuerzo Figurado Fy= 420 Mpa-60000 Psi, Suministro, Transporte e Instalación.	110 días	$ 1.740.987.403,00	vie 10/05/24	mar 17/06/25	45%
35	5,2	Vigueta Tipo Steel Joist En Acero Estructural A.S.T,M,A-36 O A-572.Suministro, Transporte e	35 días	$ 135.193.757,00	vie 16/05/25	lun 30/06/25	0%
36	5,3	Malla Electrosoldada 6 Mm De 15x15 Para Losa. Suministro, Transporte e Instalación.	35 días	$ 113.832.438,00	lun 28/04/25	mar 10/06/25	0%
37		Fin Aceros - Mayas	0 días	$ 0,00	lun 30/06/25	lun 30/06/25	0%
38	**6**	**Muros**	**50 días**	**$ 195.656.655,00**	**lun 30/06/25**	**lun 1/09/25**	**0%**
39	6,1	Muro Bloque Concreto 12x19x39cm	40 días	$ 27.125.830,00	lun 30/06/25	mar 19/08/25	0%
40	6,2	Muro Lad.Farol Limpio De 29x12x19	15 días	$ 168.530.825,00	mié 13/08/25	lun 1/09/25	0%
41		Fin Muros	0 días	$ 0,00	lun 1/09/25	lun 1/09/25	0%
42	**7**	**Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Aguas Lluvias**	**30 días**	**$ 47.843.306,00**	**lun 28/04/25**	**mié 4/06/25**	**0%**
43	7,1	Caja 100x100 Cm Concreto 3000psi	8 días	$ 2.473.515,00	lun 28/04/25	mié 7/05/25	0%
44	7,2	Tubería Pvc 4 Sanitaria (Losa)	15 días	$ 11.467.955,00	vie 16/05/25	mié 4/06/25	0%
45	7,3	Tubería Pvc 6 Sanitaria	15 días	$ 16.578.840,00	vie 16/05/25	mié 4/06/25	0%
46	7,4	Tub Pvc Novafort 8"	2 días	$ 3.802.773,00	mié 7/05/25	vie 9/05/25	0%
47	7,5	Caja Inspección 80x 80 CM [Concreto]	8 días	$ 2.147.683,00	lun 28/04/25	mié 7/05/25	0%
48	7,6	Caja inspección 100X100 CM [Concreto]	8 días	$ 11.372.540,00	lun 28/04/25	mié 7/05/25	0%
49		Fin Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias y Aguas Lluvias	0 días	$ 0,00	mié 4/06/25	mié 4/06/25	0%
50	**8**	**Aseo General**	**13 días**	**$ 4.072.514,00**	**mar 2/09/25**	**mié 17/09/25**	**0%**
51	8,1	Limpieza - Barrido - Aseo	13 días	$ 4.072.514,00	mar 2/09/25	mié 17/09/25	0%
52		Fin Aseo General	0 días	$ 0,00	mié 17/09/25	mié 17/09/25	0%
53		Fin Construccion	0 días	$ 0,00	mié 17/09/25	mié 17/09/25	0%
54		Interventoria Obra	1 día	$ 0,00	jue 18/09/25	jue 18/09/25	0%

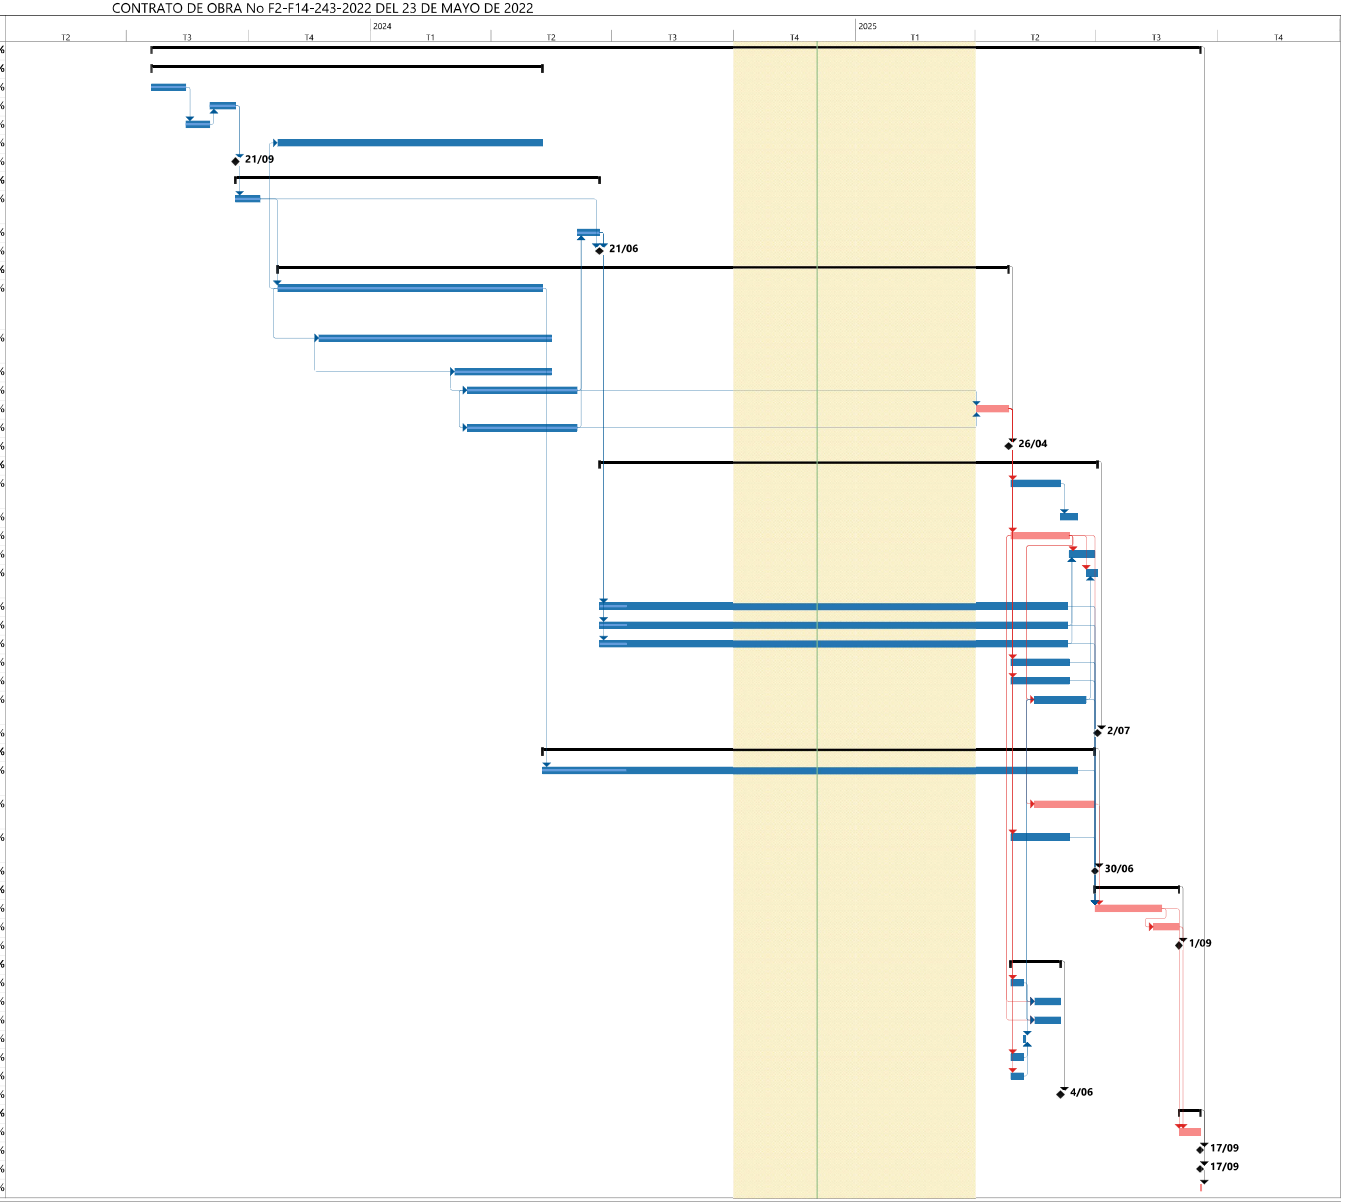

Proyecto: CONSTRUCCION SED
Fecha: mar 3/12/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

HERNAN A VALLEJO
R.L. Cosorcio Micay 2022

IVAN DARIO CASTILLO
Supervisor del Contrato

CAMILO A MARTINEZ
R.L.S. Consorcio VALLECA

Alcaldía López de Micay

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO LÓPEZ DE MICAY

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO No. 2057 DE 2021 - DE ACUERDO CON LA CUARTA PRÓRROGA

"Aunar esfueros técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover los estudios, diseños y construcción (obra) de la sede administrativa de la alcaldía municipal de López de Micay - Cauca".

| AÑO | 2024 | 2025 | | |

MUNICIPIO LÓPEZ DE MICAY
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
NIT 800.051.168-9
SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 2024 - CONVENIO No. 2057 DE 2021

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

CUENTA (AHORROS) No.: **42139300266-8** DEL BANCO: **AGRARIO DE COLOMBIA**

VALOR INICIAL DEL CONVENIO		**$ 5.663.486.246,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 4.813.963.309,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO		**$ 849.522.937,00**
	FECHA DE GIRO	
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	9/12/2021 GIRO 1	**$ 2.888.377.985,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 2	**$ 0,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 3	**$ 0,00**
	GIRO 4	**$ 0,00**
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 2.888.377.985,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)		**$ 2.888.377.985,00**

BALANCE CONTRATOS CELEBRADOS MUNICIPIO
VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICIÓN MUNICIPIO	TOTAL CONTRATADO
F2-F14-243-2022 DEL 23-05-2022	CONSORCIO MICAY 2022 - **(ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA)**	$ 5.406.693.215,00	$ 108.000.000,00	$ 5.514.693.215,00
257 DEL 06-06-2022	CONSORCIO VALLECA - **(INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA)**	$ 256.444.130,00	$ 0,00	$ 256.444.130,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 5.771.137.345,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACIÓN RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO F2-F14-243-2022 COMPONENTE 1 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-12651	ECP-14125	25/08/2022	$ 115.905.787,00	$ 0,00	$ 115.905.787,00
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO F2-F14-243-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-129	ECP-16565	29/03/2023	$ 65.662.898,00	$ 0,00	$ 46.936.160,00
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-143	ECP-18906	17/10/2023	$ 99.107.560,00	$ 0,00	$ 75.568.411,00
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-18986	ECP-18904	17/10/2023	$ 98.911.776,00	$ 0,00	$ 98.911.776,00
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-144	ECP-18905	19/10/2023	$ 1.991.059.722,00	$ 0,00	$ 1.991.059.722,00
257 DEL 06-06-2022	PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO 257 DE 2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-148	ECP-20008	29/12/2023	$ 13.463.316,00	$ 0,00	$ 13.463.316,00
257 DEL 06-06-2022	PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO F4-F36-257-2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA (VIGENCIA FUTURA)	COP-17986	ECP-20007	29/12/2023	$ 50.881.306,00	$ 0,00	$ 42.569.490,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 2.434.992.365,00**	**$ 0,00**	**$ 2.384.414.662,00**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
dic-21	$ 1.380.349,00
ene-22	$ 1.802.032,00
feb-22	$ 1.853.861,00
mar-22	$ 2.111.717,00
abr-22	$ 2.447.705,00
may-22	$ 2.370.716,00
jun-22	$ 2.581.109,00
jul-22	$ 3.172.191,00
ago-22	$ 3.152.752,00
sep-22	$ 3.435.922,00
oct-22	$ 5.031.570,00
nov-22	$ 5.847.152,00
dic-22	$ 6.354.306,00
ene-23	$ 5.967.190,00
feb-23	$ 6.807.649,00
mar-23	$ 8.200.152,00
abr-23	$ 7.143.105,00
may-23	$ 7.401.179,00
jun-23	$ 8.161.973,00
jul-23	$ 8.621.870,00
ago-23	$ 7.859.140,00
sep-23	$ 7.875.219,00
oct-23	$ 5.581.088,00
nov-23	$ 3.051.758,00
dic-23	$ 3.229.372,00
ene-24	$ 2.905.838,00
feb-24	$ 2.814.560,00
mar-24	$ 3.070.361,00
abr-24	$ 3.076.859,00
may-24	$ 3.123.152,00
jun-24	$ 2.855.421,00
jul-24	$ 2.850.677,00
ago-24	$ 3.047.109,00
sep-24	$ 2.767.148,00
oct-24	$ 2.963.952,00
nov-24	$ 2.970.215,00
TOTAL (3)	**$ 151.392.414,00**

DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ————————

FECHA DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACIÓN DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS
17/04/2024	$ 32.000.000,00	65916
19/04/2024	$ 32.000.000,00	66123
30/04/2024	$ 32.000.000,00	67034
2/05/2024	$ 6.231.180,00	EN TRAMITE EL SOPORTE
TOTAL (7)	**$ 102.231.180,00**	

DEVOLUCIÓN VALOR NO EJECUTADO A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ————————

FECHA DEVOLUCIÓN VALOR NO EJECUTADO	VALOR DEVOLUCIÓN VALOR NO EJECUTADO	No. DE RECIBO DE CONSIGNACIÓN DEVOLUCION VALOR NO EJECUTADO
TOTAL (7)	**$ 0,00**	

CONSIGNACIONES A LA CUENTA BANCARÍA DEL CONVENIO

DESCRIPCIÓN SEGÚN EXTRACTO	ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG
FECHA	18 DE MARZO DE 2024
VALOR (11)	**$ 65.747.187,13**

ACTIVACIÓN DE CUENTA (0)	**$ 20.000,00**
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 3.737.900.922,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 2.384.414.662,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	**$ 151.392.414,00**
TOTAL DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	**$ 102.231.180,00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 49.161.234,00**
RECURSOS FONSECON NO EJECUTADOS (1-2)=6	**$ 1.353.486.260,00**
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS (7)	**$ 0,00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES MUNICIPIO (8)	**$ 50.577.703,00**
RETIRO RETENCIONES Y DEDUCCIONES MUNICIPIO (9)	**$ 50.577.703,00**
SALDO EN LA CUENTA RETENCIONES Y DEDUCCIONES MUNICIPIO (8-9)=(10)	**$ 0,00**
CONSIGNACIÓN A LA CUENTA BANCARÍA (11)	**$ 65.747.187,13**
TOTAL DESCUENTOS BANCARIOS POR DEVOLVER AL MINISTERIO (12)	**$ 61.384,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO A CORTE DEL MES DEL INFORME (0) + (1) - (2) + (5) - (9) + (11) - (12) = (13)	**$ 1.417.775.594,13**

OBSERVACIONES:

JOSE ADEMIR VALENCIA MOSQUERA
Secretario de Hacienda Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

NOMBRE	MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY ,
DIRECCIÓN	CALLE LAS FLORES PALACIOS MUNICIPAL LOPEZ DE MICAY
CIUDAD	CAUCA, LOPEZ DE MICAY

MES	NOVIEMBRE	AÑO	2024

NÚMERO DE CUENTA:
421393002668


OFICINA: 2139 LOPEZ DE MICAY

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		1.414.805.379,13	SALDO ACTUAL	1.417.775.594,13
TOTAL ABONOS	19	2.970.215,00	PROMEDIO MES	1.416.357.012,13
TOTAL CARGOS	0	0,00	INTERESES	2.970.215,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
01/11	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		382.904,00	1.415.188.283,13
05/11	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.742,00	1.415.284.025,13
06/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.749,00	1.415.379.774,13
07/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.755,00	1.415.475.529,13
08/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		383.085,00	1.415.858.614,13
12/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.787,00	1.415.954.401,13
13/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.794,00	1.416.050.195,13
14/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.800,00	1.416.145.995,13
15/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		287.440,00	1.416.433.435,13
18/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.826,00	1.416.529.261,13
19/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.833,00	1.416.625.094,13
20/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.839,00	1.416.720.933,13
21/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.846,00	1.416.816.779,13
22/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		287.576,00	1.417.104.355,13
25/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.872,00	1.417.200.227,13
26/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.878,00	1.417.296.105,13
27/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.885,00	1.417.391.990,13
28/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		95.891,00	1.417.487.881,13
29/11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		287.713,00	1.417.775.594,13

NIT. 800.037.800-8
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud, por favor comunicarla por escrito, a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS. | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495 - Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá
