Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-010326 Id: 511007
Folios: 1 Fecha: 21-03-2025 09:14:05
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual.

DE: Subdirección de Proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana.

ASUNTO: REMISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2025.

Ref.: CONVENIO 1620-23 COLOSÓ - SUCRE

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar a su dependencia el siguiente informe de supervisión correspondiente al mes de febrero de 2025 del convenio 1620-23 Colosó - Sucre.

FEBRERO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD DE FOLIOS**
1	Anexo 3 informe mensual de supervisión del periodo del mes de febrero de 2025 1620-23 Colosó - Sucre. (anexos)	Treinta y uno (31) folios

Atentamente

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisor del Convenio

Elaboró: Andrés del Río / Apoyo a la Supervisión

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **NO. 1620 DE 2023**, MUNICIPIO DE **COLOSO - SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **FEBRERO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	BARRIO 6 DE ENERO UBICADO EN LA CARRERA 8ª NO. 10-46 LOTE # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0.00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		**$ 2.383.023.552**
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-JUNIO-2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	18-JUNIO-2024	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	18-MARZO-2025
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. JENNY PAOLA LAVAO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ANDRES FELIPE GIRALDO	28/06/2023	05/05/2024
	EDGAR RICARDO GONZALEZ	06/05/2024	09/05/2024
	JENNY PAOLA LAVAO	10/05/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Arq. DANIEL SUAREZ	28/06/2023	31/12/2023
	Arq. DANIEL SUAREZ	11/01/2024	31/12/2025
	ING. JENNY PAOLA LAVAO	1/01/2025	6/02/2025
	ING. ANDRÉS DEL RÍO	7/02/2025	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	53723	27/06/2023	
	13824	16/01/2024	
	3625	9/01/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	75723	28/06/2023	
	5824	16/01/2024	
	3625	16/01/2024	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540 47 994000026544	14/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19-JULIO-2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		**FECHA:** 18/06/2023
	SEGUNDA PRÓRROGA		**FECHA:** 18/10/2024
	TERCERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACION		**FECHA:** 18/12/2024
	SUSPENSIÓN 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA
	REINICIO	**FECHA:** DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL No. 540-47-9940000026544 ANEXO:1 ASEGURADORA SOLIDARIA	
	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $476.604.710,40 DESDE 14-07-2023 HASTA 18/05/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 164.561.480	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 79.434.000	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0	
VALOR DE OBRA	$ 1.980.160.072,04	
VALOR INTERVENTORÍA	$ 158.868.000	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 2.383’023.552	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/203	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS** certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	$436.887.651
CUARTO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652

	avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.072.360.598,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 1.509.248.249,00

3. PÓLIZAS CONVENIO / CONTRATO

Nombre Aseguradora: POLIZA INICIAL / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 0	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	20/02/2025

Nombre Aseguradora: PRIMERA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 1	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	18/05/2025

Nombre Aseguradora: SEGUNDA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 2	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	18/06/2025

Nombre Aseguradora: SEGUNDA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 2	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	16/11/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE	$2.144.708.697

26-10-2023	INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA JUAN JAVIER ALANDETE PIÑERES		NIT: 901.766.870-7 C.C N° 19.752.494	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	03/07/2024	**Fecha de terminación actual del contrato**	15/12/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.144.708.697	

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 08/11/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028951	-Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	26/10/2023	28/10/2024
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	26/10/2023	28/10/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$107.235.434,85		
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	26/10/2023	26/06/2027
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	26/10/2023	26/12/2024

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Primera Prórroga				
Fecha de Expedición: 03/09/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028951 Anexo 3	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	03/11/2023	05/01/2025
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	03/11/2023	05/01/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 107.235.434,85	03/11/2023	04/09/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	03/11/2023	04/10/2024
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	03/11/2023	04/03/2025

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Segunda Prórroga				
Fecha de Expedición: 05/09/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	03/11/2023	06/10/2024
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	03/11/2023	06/10/2024

53-44-101028951 Anexo 4	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 107.235.434,85	03/11/2023	06/10/2024
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	03/11/2023	06/10/2024
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	03/11/2023	06/10/2024

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR	
No. del contrato CM 004 2023 09-10-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		$238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista	INTERVINCO S.A.S JORGE LUS PUCHE ORTEGA		NIT N° 90.013.868-0 C.C N° 11.001.627	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	31/10/2024		
	PRORROGA N°3	09/11/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/07/2024	**Fecha de terminación actual del contrato**	15/12/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$238.238.000	

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 19/09/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	09/10/2023	11/12/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$107.235.434,85	09/10/2023	09/06/2027
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	09/10/2023	09/10/2028

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Primera Prórroga				
Fecha de Expedición: 03/09/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315 Anexo 4	-Cumplimiento del contrato	$ 23.823.800,00	03/11/2023	06/03/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 47.647.600,00	03/11/2023	04/09/2027
	-Calidad del Servicio	$ 71.471.400,00	03/11/2023	03/11/2028
	-Buena manejo del anticipo	$ 95.295.200,00	03/11/2023	06/03/2025

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Segunda Prórroga				
Fecha de Expedición: 05/09/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315 Anexo 5	-Cumplimiento del contrato	$ 23.823.800,00	03/11/2023	06/04/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 47.647.600,00	03/11/2023	04/10/2027
	-Calidad del Servicio	$ 71.471.400,00	03/11/2023	03/11/2028
	-Buena manejo del anticipo	$ 95.295.200,00	03/11/2023	06/04/2025

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	NOVIEMBRE - 2024	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	N/A
INFORME FINANCIERO	NOVIEMBRE - 2024	**Corte:** 30 - NOV - 2024
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$233.994.316,36	**Corte:** 30 - NOV - 2024
	SI	**NO**
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**90,13%**
% EJECUTADO DE OBRA	**95,12%**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MINISTERIO:

- Que el 13 de febrero de 2025, se adelantó reunión de seguimiento y control con el municipio, en el cual, se manifiesta que el proyecto está a la espera de certificación RETIE y conexión eléctrica definitiva.
- Que el 21 de febrero de 2025, se remitió al municipio oficio de presunto incumplimiento, con radicado 2025-2-003122-004476 Id: 496679, en el que se solicitó aclarar las modificaciones contractuales que adelanto el municipio con los contratos derivados.
- Que el 26 de febrero de 2025, el municipio remitió respuesta al oficio de presunto incumplimiento, con radicado 2025-2-003122-004476 Id: 496679.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

De acuerdo con lo manifestado por el municipio, los contratos derivados se encuentran suspendidos desde el 2 de diciembre de 2024, razón por la cual, a la fecha, no hay ejecución física de obra. Sin embargo, el municipio indicó que las actividades pendientes se resumen en los acabados, la certificación RETIE y la conexión eléctrica definitiva.

Por último, es importante aclarar que los acabados aún no se han ejecutado debido a que dependen de actividades predecesoras, como las instalaciones eléctricas. Estas ya se encuentran finalizadas, pero no podrán avanzar hasta que se obtenga la certificación RETIE, tienen en cuenta las observaciones que puedan surtir en visita programada.

A la fecha el municipio no suministrado informe mensual de diciembre 2024, enero 2025 y febrero 2025; sin embargo, ha remitido únicamente informe semanal 37 y 38 de interventoria.

Anexos

1. Correos
2. Acta de reunión
3. Oficios
4. Informe de interventoria

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

01/08/2023	18/04/2024	29/05/2024	19/06/2024	31/10/2024	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA Supervisor del Convenio 1620-23 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	**ING. ANDRES FELIPE DEL RIO CERVANTES** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión

Outlook

ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL SEGUIMIENTO CONV 1620-2023 (13-02-2025)

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Jue 13/02/2025 11:56
Para planeacion@coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
CC Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>; Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (142 KB)
250213-COLOSO-1620-23.pdf;

Cordial saludo,

Remito acta de reunión virtual realizada el 13 de febrero de 2025.

Sin más que agregar, agradezco la atención prestada.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la Supervisión
Andrés Felipe del Río Cervantes
andres.delrio@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Posible incumplimieto a sus obligaciones contractuales.

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 21/02/2025 17:11
Para Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (173 KB)
2025-2-003122-004476.pdf;

Cordial saludo.

Adjunto remitimos la comunicación oficial con **radicado 2025-2-003122-004476**, en la cual se requiere al **Municipio de Colosó, Sucre**, atender los compromisos contractuales en el marco del **Convenio Interadministrativo No. 1620 de 2023**.

Agradecemos remitir la respuesta y realizar las gestiones correspondientes a más tardar el **25 de febrero de 2025**, enviando la información a **andres.delrio@mininterior.gov.co**, con copia a **jenny.lavao@mininterior.gov.co** y **servicioalciudadano@mininterior.gov.co**.

Quedamos atentos.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la Supervisión
Andrés Felipe del Río Cervantes
andres.delrio@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

ACTA No.	20251302
FECHA	13/02/2025
CIUDAD	Bogotá D.C – Reunión Virtual
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1620-23
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	95% a corte de febrero de 2025
MOTIVO:	Reunión de seguimiento a la ejecución contractual del convenio 1621-23

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Jenny Paola Lavao Pastrana Cargo: Supervisora del Convenio 1621-23	Nombre: Shirley Quiñonez C.C./ NIT: Cargo: Supervisora del convenio
Nombre: Andrés Felipe del Río Cervantes Cargo: Apoyo a la Supervisión del Convenio 1621-23	Nombre: C.C./ NIT: Cargo:
Nombre: Angie Vannessa Venegas Serrano Cargo: Apoyo a la Supervisión del Convenio 1621-23	Nombre: C.C./ NIT: Cargo:

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 10:30 AM del 13 de febrero de 2025, se inició el comité técnico de seguimiento y control de forma Virtual del convenio No. 1620 de 2023, que tiene como objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE". Se establece el siguiente orden del día.

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento
   2.1 Cumplimiento obligaciones contractuales
3. Compromisos
4. Lectura, aprobación y firma del acta.

1. Presentación de los asistentes

Se procedió a la presentación de los representantes del Municipio y Ministerio del Interior, se registra en la parte superior de esta acta.

2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento

Toma la palabra la supervisora del municipio, mencionando que los Contratos derivados se encuentran suspendidos desde el 2 de diciembre de 2024 con avance de ejecución física del 95%. El motivo de la suspensión se centra en la obtención de certificaciones RETIE/RETILAP, del cual, solo se obtendrá RETIE ya que el proyecto no requiere RETILAP de acuerdo

a lo expresado por la supervisora del municipio. Dicho lo anterior, se requiere que el municipio justifique con la norma vigente correspondiente el hecho de no requerirse la certificación RETILAP.

El municipio continúa con la palabra y menciona que en obra ya se encuentra adelantada con acabados y se encuentra pendiente únicamente actividades de instalación de parte cableada, pruebas eléctricas e instalación de ventanearía. Seguidamente, la ing Shirley manifiesta que se adelanta una evaluación de cantidades de mayores y menores en compañía de la interventoría. Adicionalmente, la supervisora del municipio expresa que bebedero no se encuentra en el mercado con las especificaciones establecidas en diseño, el APU corresponde al ítem "*5.3.1Suministro e instalación de bebedero de agua con pedestal en concreto a la vista, poceta en acero inoxidable y frigería con sistema pushTipo P M103. Med0,97X0,35X0,35m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento*", motivo por el cual, el municipio solicita evaluación de modificación. En virtud de lo anterior, el municipio deberá presentar estudio de mercado y modificatoria a través de correo electrónico andres.delrio@miniterior.gov.co.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo manifestado por el municipio, se hace necesario que se realice la solicitud de suspensión al convenio, toda vez que se encuentra en desarrollo actividades obtención de certificación RETIE y de conexión eléctrica definitiva, considerando que el convenio cuenta con vigencia hasta el 18 de marzo de 2025.

3. COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio	**Enviar solicitud de suspensión con su respectiva justificación.**	**14/02/2025**
Municipio	**Enviar certificado y/o aclaración del por qué no se requiere certificado RETILAP en el proyecto.**	**14/02/2025**
Municipio	**Balance financiero con corte a febrero 2025**	**14/02/2025**
Municipio	**Presentación de modificatoria de actividades.**	**17/02/2025**

5. Lectura, aprobación y firma del acta.

Una vez leída la presente acta, esta es aprobada por todos los asistentes y se procede a diligenciar el formulario corrobora la aprobación del acta leída en esta reunión virtual.

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=pjIK3NK6KqEdZ1PgbFomC2TohBlHrPg2&id=DIf3xAjrAU2wl6cd2U6IO27BznsJkIxJhUttXSS6vThUN1RDSFhQWlcwV0NOMklNQjlNMUU1WjY5SC4u

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-004476 Id: 496679
Folios: 3 Fecha: 21-02-2025 12:00:56
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS

Bogotá D.C. 19 de febrero de 2025

Señor:

DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE
Alcalde Municipal
Municipio Colosó - Sucre.

Asunto: Posible incumplimieto a sus obligaciones contractuales.

Referencia: Convenio Interadministrativo No. 1620 de 2023

Cordial saludo,

En atención al convenio interadministrativo No. 2040 de 2021, suscrito entre el Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Circasia – Quindío, cuyo objeto es: "**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE**." Con fecha de terminación el 18 de marzo de 2025.

En ejercicio de las facultades de supervisión atribuidas, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en especial en lo relativo a la adecuada gestión contractual, se requiere al ente territorial para que garantice el estricto cumplimiento de sus obligaciones contractuales, con énfasis en el deber de notificación de cualquier modificación realizada a los contratos derivados.

En este sentido, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece el principio de responsabilidad de las entidades estatales en la gestión contractual, lo que implica la obligación de actuar con diligencia en la administración de los contratos. Asimismo, el artículo 14 de la misma norma señala que las modificaciones a los contratos deben constar por escrito y cumplir con los procedimientos previstos en la ley.

De igual manera, el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 dispone que toda modificación contractual debe ser debidamente formalizada y notificada dentro de los términos legales.

Lo anterior cobra especial relevancia en el presente caso, dado que, en el marco del comité realizado el jueves 13 de febrero de 2025, el Municipio manifestó que los contratos derivados se encuentran suspendidos desde agosto de 2024, sin que, a la fecha, se haya efectuado la notificación formal de dichas modificaciones a este Ministerio.

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-004476 Id: 496679
Folios: 3 Fecha: 21-02-2025 12:00:56
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS

En consecuencia, se insta al ente territorial a que adopte las medidas necesarias para cumplir con el deber de notificación dentro de los términos legales, garantizando así el adecuado ejercicio de las funciones de supervisión y control a cargo de este Ministerio.

Asimismo, se advierte que, conforme a lo evidenciado en la plataforma SECOP I de Colombia Compra Eficiente, los documentos de suspensión fueron publicados el 7 de febrero de 2025 e indican una suspensión desde el 29 de noviembre de 2024, lo que constituye una publicación extemporánea respecto de la modificación de los contratos derivados. Adicionalmente, solo se evidencia la suspensión del contrato de interventoría y no la del contrato de obra.

Cabe señalar que el marco normativo aplicable en esta materia se encuentra regulado, entre otras disposiciones, por el Decreto 1082 de 2015, el cual establece los lineamientos para la gestión contractual en Colombia, la Ley 1150 de 2007, que regula los principios de transparencia, eficiencia y publicidad en la contratación pública. La Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación Pública, Artículo 3: Señala el principio de transparencia, indicando que todas las actuaciones contractuales deben ser públicas y accesibles en tiempo real a través de los medios oficiales establecidos. Adicionalmente, de conformidad con el Decreto 4170 de 2011, Colombia Compra Eficiente es la entidad encargada de administrar el SECOP II, garantizando la correcta publicación de las actuaciones contractuales en los términos de la normatividad vigente.

En virtud de lo anterior, la publicación tardía en SECOP I vulnera los principios de publicidad, transparencia y eficiencia en la contratación pública, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas, disciplinarias e incluso fiscales si se evidencia perjuicio económico derivado de la falta de información oportuna.

Por lo expuesto, esta supervisión requiere al Municipio de Colosó - Sucre:

1. Justificación por escrito de la razón de la publicación tardía de la suspensión de los contratos derivados, explicando las circunstancias que llevaron a este incumplimiento y adjuntando los soportes correspondientes.
2. Actualizar y corregir la información en SECOP I, garantizando que refleje la realidad contractual conforme a los lineamientos normativos.

La respuesta requerida debe ser enviada a más tardar el 25 de febrero de 2025, a los correos andres.delrio@mininterior.gov.co con copia a jenny.lavao@mininterior.gov.co y servicioalciudadano@mininterior.gov.co

Atentamente,

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-004476 Id: 496679
Folios: 3 Fecha: 21-02-2025 12:00:56
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del convenio No. 1620 de 2023
Subdirección de Proyectos Para la Seguridad
Y Convivencia Ciudadana

Elaboró: Andrés del Río/ Profesional de apoyo a la supervisión/SPSCC
Revisó: Angie Venegas Serrano – Abogada contratista SPS

Sincelejo, Marzo de 2024.

Señores
Alcaldía de Colosó.
Colosó.
Departamento de sucre

REFERENCIA: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"


Asunto: Concepto No Aplicabilidad de Certificación Retilap

Yo, Juan Fernando Vergara Montes, identificado con cedula de ciudadanía 91.492.766 de Bucaramanga, me permito conceptuar el Dise¶o El®ctrico del Proyecto òESTUDIO, DISE¤O Y CONSTRUCCIĎN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCREó, no requiere certificacion Retilap, de acuerdo a lo establecido en la sección 610.2 del reglamento, en donde se establece Categorización de los Proyectos de Alumbrado Público para parques en el regimen de bajo impacto en el cual se encuentra el proyecto, se muestra que NO es necesario el dictamen pleno, ya que el proyecto incorpora menos de 25 luminarias y menos de 1000 metros de excavaciones subterraneas de las tuberias electricas.

Juan Fernando Vergara Montes
Ingeniero electricista
CC 91.492.766
M.P. AN 205-56065



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 91.492.766
VERGARA MONTES
APELLIDOS
JUAN FERNANDO
NOMBRES
FIRMA

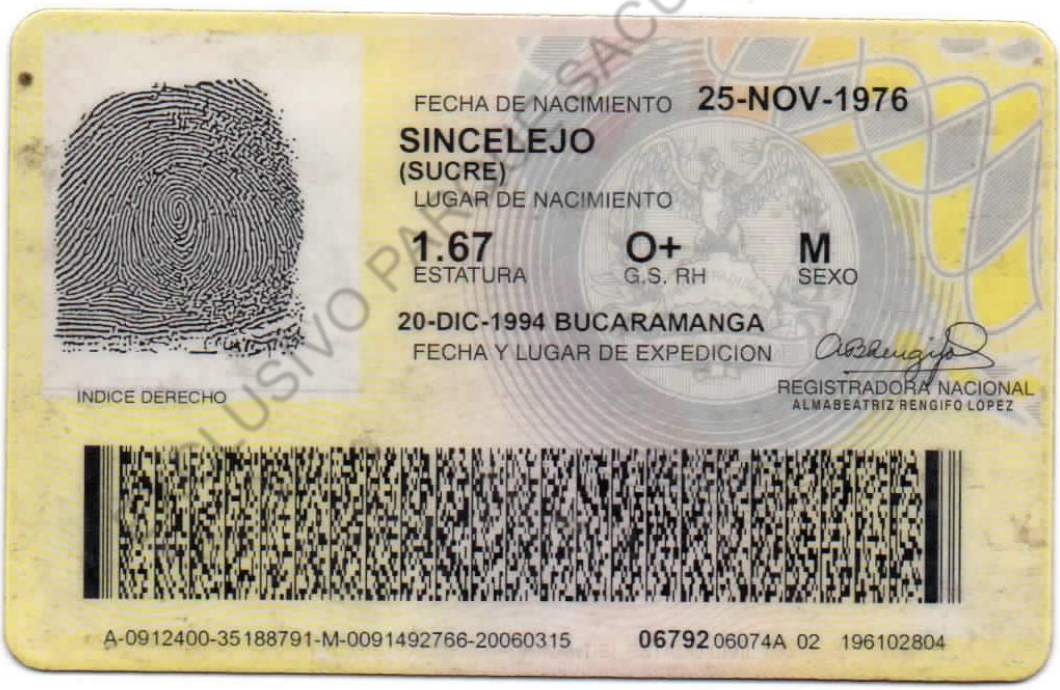

FECHA DE NACIMIENTO 25-NOV-1976
SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
20-DIC-1994 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-0912400-35188791-M-0091492766-20060315 06792 06074A 02 196102804

USO EXCLUSIVO PARA SACUDETE CONSO



Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Titular JUAN FERNANDO
VERGARA MONTES

D.I. 91.492.766

Ingeniero ELECTRICISTA

Matricula AN205-56065

Resol. C.P.N. 10/2008

EXCLUSIVO PARQUE SACUDETE COLOSO

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Juan Fernando VERGARA MONTES**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **91492766** de **Bucaramanga (Santander)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **AN205-56065** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **ANTIOQUIA** mediante resolución No. **AN-1 de 2008** el día **08** de **Febrero** de **2008** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-10 de 2008**.

2. La matrícula profesional No. **AN205-56065**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Once (11) días del mes de Enero de Dos Mil Veinticuatro (2024)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901808530. Vence el 11-Julio-2024**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo

Colosó, 25 de febrero 2025

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del convenio No. 1620 de 2023
Subdirección de Proyectos Para la Seguridad Y Convivencia Ciudadana

Asunto: Respuesta al Oficio del 19 de febrero de Posible incumplimiento a sus obligaciones contractuales.

Ref. Convenio Interadministrativo No. 1620 de 2023

Cordial saludo.

En atención al número de convenio relacionado aclaro que el numero del convenio celebrado con el municipio de Coloso, Sucre corresponde al No 1620 de 2023 con objeto "**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE.**"

Que el día 13 de febrero de 2025 se efectuó el comité de seguimiento de manera virtual entre el municipio y los supervisores por parte del Ministerio del Interior de dicho convenio donde se manifestó que los contratos de obra e interventoría suscritos por el municipio se encuentran suspendidos desde el 02 de diciembre tal como se dejo en el acta del comité del 13 de febrero de 2025 y no desde agosto de 2024 como lo manifiesta el oficio, dichas actuaciones administrativas fueron informadas al anterior supervisor al profesional Daniel Suarez, y también se informa en el informe de Supervisión del mes de Diciembre de 2024 remitidos al Ministerio del interior, junto con el informe financiero y los informes semanales de la interventoria.

2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento

Toma la palabra la supervisora del municipio, mencionando que los Contratos derivados se encuentran suspendidos desde el 2 de diciembre de 2024 con avance de ejecución física del 95%. El motivo de la suspensión se centra en la obtención de certificaciones RETIE/RETILAP, del cual, solo se obtendrá RETIE ya que el proyecto no requiere RETILAP de acuerdo

Revisando la plataforma de Secop I efectivamente se procede a realizar el cargue en su totalidad para su verificación se relaciona los links:

CONTRATO DE OBRA LP-007-OP-2023

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40655&g-recaptcha-response=03AFcWeA6Eyb6HCvgUm3D19SsIJcn_x6g70O2vKarGY9OpbXjEnxJTilQDKwKbNH0LHa0VlpKctDz0Kn2ZaXiEk9FgWdhLuEDqHZ8LTHeB0l7WSecwxxkIdty0k_nFVCsJa7gsl3CPfPzYWg-MPVYml3Z287SFuvPiq6v9paeap_UMdOAqSDyWGo4YoVpQ5WO9k5efOX2D0vkm9JEHgMgUjmXbvrXuMfRrbhIOKn3XG0BiiuR3xEcW0Ss_3iqjwN7MAuJWGFl7LsYD3VCt1uGCRdoqo2RIsxlhuBwn4H4VGHpG8dUQYGtxDu9lb2cNrUBfbmRM38Jfpkk73K5J9st1DlgXOWGnsl8Aq_4uPmK1JsiRUG5m2yNRy0YsUhPyKWFKQ2z2LfDJlvdI0VfLidMog2IzywaqAwpWuj1M8fGTg30jF_wKHSjRG6157laOHs3h0GCv5XBj4m85nkRD4jWF9PcYLuD0uLbuysUk4SS7zDxqcWpfB75pV5xoqxiKmJ8kewkHVgMSRHbWJHqhlRXECAoYmn3exfVVmAGTWbk-q_yYN74AT8y8G6AB-3o27sZG3Q80UOQ-gha5uzqZvzcjoZFbTOHeZI8YXseSDHilPGsqL8CJTo0glvRAS-qyWttFznueFCB_y7k5t93rKFvTCNsULb8slN28AN_AX_rV1Bc2jNkkXyqe8Gnb5qyByr-7MY9gv12ieuHy0Ah62Sr0JjYNol5rUPGm5nxFrj_bbW5Vj12L1BHt4iflouYr-tJf9EukPfycIEQY7zu1rjHsVABjshR8fM59naSe6dMAqgMVUMA1xQrdhG_nua55PXndGyIhtjsHLyXTK7F9F6Y_ieMgSvmIZJD7lLFJP33VlXKRioaTEQHaFV_3KhZtovk4_3HPZH-Xl0FHReLvqTGlZAuZ9d2LMzJjH68Cc76uoFzm5L8IGd69vepGmV7V2RHSTUvIB1l46vDJ

CONTRATO DE INTERVENTORIA CM- 004-2023

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13777098&g-recaptcha-response=03AFcWeA4ZnAt0zqzyr5f5lsOfOks5hwnGnW6xtV9OUBFJlKjGGYQFNr0uHh3MEcvU2zCa7n6G-8VARm-i2tAY8foT1e45xTEsvhsDBUOQLrtbhjT0yYNHocKSUz0P53I9WvOFrDiUHB8U928oQU-KsLokvjO0-A7GHTNmYt5g5QufCAiazfx3AqdjSxw3TXnlelt6IZkWI5jSIUKKSokZr2w9L5qpe6gneV35_3iKx3ZbXlOlCSf-t7rjwXOWH_BenXcyyMuQGBPKNfyg9dNYWVJC6zH4Za9A4JzzwLxYAiHRPFuthyKMABM0AqWLLiiVmwe59iprw31hbEBeQrXcI3dIEIO4_gg505PDK6n2dtoesJRQ9eU-mG2vacGMnj9iOPmr2UhBx4JfDIhjLBYwg7RftNa7LQljTwriSjKAp8ZaGxldrer1wAB5ypJvqADxejqKyTN1ES6DdbyhjmrKJOJAF3IzmPpktEhGjbQtGVbJ553KZBl_icu6MFcmLZhCQowgm6G9rgfHLoJIeAvHX3v7lPDDuDa4fkLnE1TtEAFZP5lXwyEAEpA8_uIUcOkf2yEvLmvaHrjj4hLStjtItchlQTD0zEoHL38ZM6Yi4F5-litbzeICZWF_OeD2b_kMxy2E7cZ_moJJkEIVUU3F136K_pSM4zPYKCOeJfY9JQpECnW3S6wywmY1iCVx5UBPqtHvGOLDngYsT_NNAJFWaqZiag08QywDsiTn4XTO4WJkeCx_3ziOUl4HUeqvfXKHgBunON05JWWup4PW0IePlpH04DSQiHlikRDDCNZZmV_Ang3tj7HoOwrOisAOw1xMA1JjAIBqgiDxUt-

6CxuTbRBw4CXcbLwkG8Lgdpwe4_OF8JXsU_nT7NZl_j6LGrUg-elLewpdNF52Qqa_Maa1W-ZGCQ_IQLUNOQvciUDEXN5RIb__AQkCQilJaAWLCBYemcbbuBiLSBLw

Lo relacionado al respecto a este tipo de cargues la administración se compromete a tener al dia toda modificaciones que sufran estos contratos a la plataforma dentro los términos de ley.

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria Municipal de planeación
Municipio de Colosó, Departamento de Sucre

Coloso, Sucre, 14 de febrero de 2025

Señores:
MIN -FONSECON

REF. ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE"***

ASUNTO: Solicitud de Suspensión N°1 Convenio No 1620 - 2023 Coloso – Sucre.

Por medio de la presente, me permito solicitar formalmente la **suspensión temporal del Convenio No 1620 -2023**, cuyo objeto es el " ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE***, conforme a las circunstancias que se detallan a continuación. Los retrasos derivados de la suspensión temporal de los trabajos

El convenio mencionado, se encuentra actualmente con un avance con más del 95%, sin embargo, la obra requiere completar aspectos técnicos esenciales, tales como las instalaciones eléctricas y la obra blanca, además de obtener las certificaciones necesarias para la ejecución final del proyecto, como la certificación RETIE y la conexión definitiva a los servicios públicos (agua, energía y gas).

Se han presentado demoras en los trámites administrativos necesarios para la obtención de las certificaciones requeridas para la ejecución final del proyecto, lo cual ha afectado directamente el cronograma de ejecución de la obra. Cabe aclarar que estos retrasos obedecen a los plazos establecidos por las entidades encargadas de los procesos administrativos, las cuales estipulan ciertos días hábiles para la entrega de las certificaciones necesarias. En este sentido, las demoras en dichos trámites no están bajo el control de las partes involucradas en la ejecución del contrato, como la administración municipal.

Para optimizar los recursos y continuar con la ejecución conforme a los requerimientos establecidos, solicitamos formalmente la suspensión temporal de los trabajos por dos (02) meses aproximadamente. Esta medida es necesaria para abordar de manera adecuada las dificultades derivadas de los trámites administrativos pendientes y reorientar las acciones necesarias para completar las tareas pendientes de acuerdo con

los nuevos plazos establecidos.

Las principales razones que sustentan la solicitud de suspensión son las siguientes:

- La finalización del proyecto depende de la obtención de ciertos permisos y certificaciones que están siendo gestionados ante las entidades correspondientes, como AFINIA, quien es la empresa prestadora del servicio de energía en el Municipio de Coloso, cuyas respuestas están sujetas a plazos administrativos fuera de nuestro control. Esto impide la continuación de las actividades conforme al cronograma original.

- La certificación RETIE es indispensable para la culminación del proyecto, y su obtención se encuentra sujeta a los tiempos establecidos por las entidades certificadoras.

- La obtención de las conexiones definitivas a los servicios públicos (agua, energía y gas), también se encuentra afectada por demoras en los trámites administrativos necesarios para su habilitación

- Tener en cuenta que el contrato suscrito de obra LP – OP – 007 – 2023 e interventoría **CM-004-2023** por parte del municipio se encuentra en suspensión desde el dia 02 de diciembre por estos mismos motivos los cuales fueron aprobados por la interventoría.

Por lo anterior, y dado que el retraso en la ejecución de la obra no ha sido producto de negligencia o incumplimiento por parte del municipio, solicitamos formalmente la autorización para la suspensión temporal de los trabajos por dos (02) meses aproximadamente, así como la modificación del cronograma de ejecución del proyecto, a fin de garantizar la culminación satisfactoria de la obra en el plazo solicitado. Por consiguiente, se solicita de manera respetuosa que el convenio 1620- 2023 de igual manerasurta con una prórroga con la finalidad de llevar a cabalidad el 100%., hasta la obtención de la certificación RETIE y el proceso de conexión definitiva de los servicios públicos, los cuales tienen tiempos administrativos prolongados es fundamental para garantizar el cumplimiento a cabalidad.

Agradezco su atención a la presente solicitud y quedo a la espera de su respuesta.

SHIRLEYS ESTHER QUIÑONES PATERNINA
Secretaria Municipal de Planeación
Municipio de Colosó, Departamento de Sucre

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		1/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 37 Del: 25/11/2024 Al: 1/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 258 días


Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA	
	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	5,00%	84,93%	8,50%	85,62%
Valor de la Obra	$ 99.007.365,85	$ 1.681.739.116,33	$ 168.312.521,95	$ 1.695.489.059,16

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	79,93%	77,12%	0,69%
Durante el periodo	5,00%	8,50%	
Acumulado actual	84,93%	85,62%	

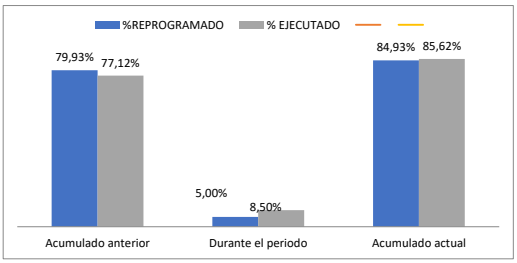

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO

PALMA SINTÉTICA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



PALMA SINTÉTICA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



PALMA SINTÉTICA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		1/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 37 Del: 25/11/2024 Al: 1/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 258 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

EDIFICIO DE SERVICIO

MESÓN EN CONCRETO, CON ACABADO SUPERIOR Y FALDÓN EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MARSELLA.



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MARSELLA E INSTITUCIONALES



EDIFICIO COMPLEMENTARIO

PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL



PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

POSTES METÁLICOS DE 4 METROS



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		1/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 37 Del: 25/11/2024 Al: 1/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 258 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA



POSTES METÁLICOS DE 4 MTS Y LUMINARIA TIPO EPSILON LED 40W, INCLUYE FOTOCELDA.



POSTES METÁLICOS DE 4 MTS Y LUMINARIA TIPO EPSILON LED 40W, INCLUYE FOTOCELDA.



INSTALACIONES ELECTRICAS



ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	23	23	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		308
Lluvias moderadas		1	1																													2
Lluvias intensas				2																												2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Página 1

NOTA:

Se han presentado retrasos significativos debido a precipitaciones extraordinariamente altas. Según los datos proporcionados en el estado general del tiempo, y soportados con el Boletín Climatológico, el volumen de precipitaciones durante las últimas semanas representan un porcentaje por encima de lo normal o muy por encima de lo normal, manejando un intervalo entre 45% y 60% . Adjunto a esta nota, se encuentran los reportes meteorológicos detallados, así como evidencias de actividades afectadas por las lluvias.

OBSERVACIONES:

EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024, EN DÓNDE SE HAN PRESENTADO CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, EN EL PRESENTE MES LAS CONDICIONES DE LLUVIAS HAN SIDO MODERADAS E INTENSAS, COMO SE DETALLA EN LA TABLA ANTERIOR.

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		1/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 37 Del: 25/11/2024 Al: 1/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 258 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 37 se sigue ejecutando las siguientes actividades: Palma sintética e=7 mm de 1.0 x 0.6 m. Incluye elementos de fijación.

COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 37 se proyectan las siguientes actividades: SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA CaudalTOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general; Suministro, transporte e instalación de medidor electromagnetico de 16mm (1/2") incluye caja de andén, tee partida o collar de derivación según como se requiera, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro,válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación. Todos los accesorios serán en 1/2"; Suministro e instalación de Barra de Seguridad Sanitaria Tipo H en acero inoxidable para personas en condición de discapacidad. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; Lavatrapero en concreto y acabado en ceramica, 50cmx70cmx30cm, incluye rejilla de desague.

COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE 7: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE: Para el componente 8 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 37 se proyectan las siguientes actividades: Señal Prohibido Fumar (SUM + INST); Señal conmemorativa de entrega (SUM + INST); Señal Extintor (SUM + INST).

COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 37, se encuentra en ejecución lo siguiente: Breaker Bipolar Enchufable 2*20 A; Luminaria Tipo Epsilon led 40W. Incluye : Cable encauchetado, cable de cobre desnudo 8,fotocelda, conector tipo gel, terminal y tuberia pvc para llegar desde registro hasta lampara.

En el informe de la semana anterior, se reportó un avance del 79,93%, mientras que el avance real ejecutado fue del 77,12%. Durante esta semana, se continuaron llevando a cabo las actividades planificadas, con especial atención a los componentes y tareas pendientes, con el fin de cerrar la brecha entre el avance programado y el avance real. Este seguimiento continuo tiene como objetivo garantizar que los trabajos se alineen con las expectativas de tiempo y calidad definidas en el proyecto.

Nota: Es fundamental que el contratista continúe trabajando conforme al plan de contingencia. Al revisar todas las circunstancias y tomar las decisiones pertinentes, se podrá optimizar la preparación ante imprevistos y garantizar la continuidad y pronta finalización del proyecto.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre **JORGE LUIS PUCHE ORTEGA** CC 1001627
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre **SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA** CC

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		2/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 38 Del: 2/12/2024 Al: 2/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 259 días


Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	6,00%	90,93%	9,50%	95,12%
Valor de la Obra	$ 118.808.839,02	$ 1.800.547.955,35	$ 188.113.995,12	$ 1.883.603.054,27

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	84,93%	85,62%	4,19%
Durante el periodo	6,00%	9,50%	
Acumulado actual	90,93%	95,12%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO

PALMA SINTÉTICA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



PALMA SINTÉTICA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



LUMINARIA HIGH BAY LED 100W/6000 K



PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE TARIMA Y GRADERÍAS



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		2/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 38 Del: 2/12/2024 Al: 2/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 259 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

EDIFICIO DE SERVICIO

PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL



PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL



PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS Y ORINALES



EDIFICIO DE SERVICIO Y COMPLEMENTARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO NEGRO MATE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO NEGRO MATE.



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		2/12/2024

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 38 Del: 2/12/2024 Al: 2/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 259 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

EDIFICIO DE SERVICIO Y COMPLEMENTARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA REJILLA CON MARCOS Y PERSIANAS EN PERFILERIA EN ALUMINIO NEGRO MATE.

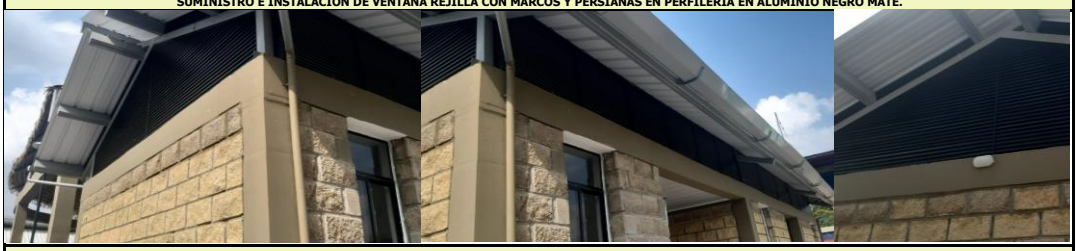

EDIFICIO DE SERVICIO Y COMPLEMENTARIO

CANOA METÁLICA PARA AGUA LLUVIA CON BAJANTE.



TOMACORRIENTES GFCI EN TUBERIA PVC Y SUICHE SENCILLO CON CAJA Y TAPA METALICA



ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239
Lluvias moderadas	1																															1
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pagina 1

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Se han presentado retrasos significativos debido a precipitaciones extraordinariamente altas. Según los datos proporcionados en el estado general del tiempo, y soportados con el Boletín Climatológico, el volumen de precipitaciones durante las últimas semanas representan un porcentaje por encima de lo normal o muy por encima de lo normal, manejando un intervalo entre 45% y 60% . Adjunto a esta nota, se encuentran los reportes meteorológicos detallados, así como evidencias de actividades afectadas por las lluvias.

OBSERVACIONES:

EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024, EN DÓNDE SE HAN PRESENTADO CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, EN EL PRESENTE MES LAS CONDICIONES DE LLUVIAS HAN SIDO MODERADAS E INTENSAS, COMO SE DETALLA EN LA TABLA ANTERIOR.

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		2/12/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 38 Del: 2/12/2024 Al: 2/12/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 259 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 38 se dio finalización a la ejecución de las siguientes actividades: Palma sintética e=7 mm de 1.0 x 0.6 m. Incluye elementos de fijación.

COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 38 se proyectan las siguientes actividades: SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA CaudalTOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general; Tanque hidroneumatico alta presion 150 litros. Vertical, membrana; Suministro, transporte e instalación de medidor electromagnetico de 16mm (1/2") incluye caja de andén, tee partida o collar de derivación según como se requiera, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro,válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación. Todos los accesorios serán en 1/2"; SISTEMA RESPALDO CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA CaudalTOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general.

COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 no se tiene programado ninguna actividad.

COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, para la semana 38 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE 7: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE: Para el componente 8 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 38 se proyectan las sigueintes actividades: Señal plano ubicacion parque (SUM + INST).

COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 38, no le corresponde ejecutar ninguna actividad.

En el informe de la semana anterior, se reportó un avance del 84,93%, mientras que el avance real ejecutado fue del 85,62%. Durante esta semana, se continuaron llevando a cabo las actividades planificadas, en el informe anterior se logró nivelar el porcentaje entre el avance programado y el avance real. Se sigue haciendo seguimiento continuo para garantizar que los trabajos cumplan con las expectativas de tiempo y calidad definidas en el proyecto.

Nota: En este informe se comunica la suspensión temporal de la obra a partir de la fecha indicada, destacando que el avance de la misma se encuentra en una fase avanzada, muy cercana a la finalización. Esta suspensión permitirá contar con el tiempo necesario para realizar los trámites correspondientes y la obtención de la certificación RETIE, asegurando así el cumplimiento de los requisitos legales y normativos necesarios para la entrega final del proyecto.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre **JORGE LUIS PUCHE ORTEGA** CC 11001627
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre **SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA** CC
