BITACORA DOVIO

CONTRATO ESTATAL DE OBRA No 082-2024

CONTRATANTE: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA.

CONTRATISTA: JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ

RESIDENTE DE OBRA: EDDIE ALEXANDRO CALDERON

OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN EL INMUEBLE TIPO JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EL DOVIO.

FECHA DE INICIO: 17 DE ENERO 2025

FECHA DE TERMINACION:

17-ENERO-2025

DIA NUBLADO, LLUVIOSO

PERSONAL EN OBRA 2 oficiales, 1 ayudante, 1 SISO, 1 Residente, 1 coordinador de obra.

SE INICIAN ACTIVIDADES REALIZANDO, CERRAMIENTO EN LOTE VALDIO, TAMBIEN SE COMIENZA CON EL APLICACIÓN de ESTUCO, aplicación de PINTURA, APLICACION DE ESMALTE en rejas, instalación de puerta, tambien se inicia la actividad de fabricación e instalación de cubierta, esta actividad se pauso DIAS 2:30 PM a 3:00 PM con el oficial y el ayudante. Se retoma la actividad a las 3 PM. SE REALIZA RESANE y tambien INSTALACIÓN de panel yeso en cielo raso que se encontraba desprendido, se realiza el desmonte de la hoja de puerta que va a ser reemplazada, esta actividad no estaba incluida en el presupuesto, se realiza el Montaje de la puerta nueva, finalizando el dia a las 6 PM quedando ejecutado el 100% de las actividades contempladas en este frente de trabajo.

Residente

Powered by CamScanner

BITACORA PALMIRA

* Llenado de filos y pulimiento en estuco Filos muros terraza palacio de justicia



02- DIC - 2024

* Acometida electrica palacio de justicia en los 3 pisos. Puntos electricos nuevos por medio de bandeja existente. palacio de justicia



* Se tubo huecos de jardin internamente con long por resanes con estuco en parte de muros de la terraza y pulimiento de muros con estuco filos Palacio de justicia

-

* Pintura y lyocio oficina 303 dzgado 3 penal municipal palacio de justicia

-


* Se para actividades por motivo de lluvia desde las 2:00 PM en la fachada de la familiar hasta las 5:00 PM

-

* No se reativa labores de fachada por motivos de. lluvia.

03-DIC-2024

* Aplicacion de Sementoso Fachada Sede familiar



* instalacion de estructura liviana para cartera. Fachada Familiar.



* Armado Andamios estuco fachada

-

* Se para actividades en el palacio de justicia a las 3:00 PM por novena de navidad no hay paso por entrada principal hasta las 4:30 PM



Powered by CamScanner

03-DIC-2024

* instalacion de Angulos Plasticos muros internos de los techos palacio de Justicia
-
* llenado de Angulos plasticos con estuco pulimiento en todos los 4 muros de los techos terraza palacio de justicia
-

04-DIC-2024

* Retiro de cable en pasillo para Acometida bandeja existente datos
-
* Meter cable en pasillos para Acometida electrica bandeja existente
-
* Acometida por button cableado electrico y cableado datos palacio de Justicia bandeja existente
-
* Acometida en rack segundo piso cable datos
-
* se realizan actividades despes de las 5 pm hasta las 10 pm por motivos que en el dia no se podia trabajar en la zona se quedan horas extras
1 encargado 3 oficiales, 1 sst, 1 residente

* Aplicacion de Cementoso sede familiar fachada parte lateral calle 23. con 29.
-
* instalacion de estructura liviana para cartera en Fachada sede familiar
-
* se pausan Actividades en palacio de justicia por motivos de novena a las 3:00 pm hasta las 4:30 pm.

05 - DIC - 2024

* Resaqueteo zona interna Muros de los techos por los patios palacio de justicia.

* Aplicacion de Cementoso muros internos techos. palacio de justicia

* Momo pulimiento en fibs Muros internos y esternos de los techos palacio de justicia

* Se paran actividades en el Palacio de justicia por Motivos de novena navideña no hay entrado por Rerta principal a las 3:00 pm hasta las 4:30 pm.

* Acometida cable electrico 3 piso en bandeja existente

* Acometida de datos bandeja existente. he instalacion de tuberia Gris para Seguir Secuencia en zonas donde no llegaba bandeja existente.

* estuco Fachada Sede familiar Frente del palacio de justicia cra 23.

06 - DIC - 2024

- estuco fachada Sede familiar.

* instalacion de carteras Fachada Sede familiar

* Lijado y Pintado baño hombres Sede Familiar

* se paran actividades en instalacion de carteras por audiencias en Sede familiar 3:00 pm hasta las 5:00 pm.

Powered by CamScanner

07 · DIC - 2024

* Desmonte de laminas super board Fachada familiar
- SST
* cableado electrico Sede familiar
- SST
* instalacion canaleta para puntos electricos y de datos. Sede familiar
- SST.
* estuco de fachada sede familiar.
- SST.

8 - DIC - 2024

* Pintura de muro color Veis palacio de Justicia Archivo
- SST
* Demolicion de solado en techos Sede familiar por Filtracion de agua, humedad en sala audiencias.
- SST
* Aplicacion de estuco fachada familiar.
- SST
* instalacion de carteras fachada Sede familiar

09 - DIC - 2024

* se para actividad en fachada instalacion de carteras por Audicia 9:30 AM Sede familiar hasta la 1 PM
- SST.
* se Retoman actividades despues de las 2PM en Fachada Sede familiar por audiencia
- SST
* se para actividad en Fachada a las 4:00 PM por Motivos de lluvia no se reativa actividad.
* Armado Andamio. para actvidades Sede familiar.
* Senalizacion de la zona
* Anclaje Lineas de vida y utilizacion de Arnes
* Lijado de paredes con ultima mano de estuco.
* orden y Aseo en las zonas de parqueadero
* charla de seguridad.

09 - OIC - 2024

*Fundicion de solado techos sede Familiar
-
*instalacion de Carteras Fachada sede Familiar
-
*Aplicacion de estuco Fachada sede Familiar
-
*Metida de cable palacio de justicia se hace Jornada de trabajo extendida despues de las 5 PM hasta las 10 PM Por que en la zona donde se debia trabajar no dieron Autorizacion en Horario laboral.
1 encargado, 3 oficiales, 1 siso, 1 residente
-
*Metida de cable en sede familiar se hace Jornada de trabajo extendida despues de las 5PM hasta las 10 PM en el Juzgado 4 promiscuo no se podia trabajar en Horario laboral
1 encargado, 3 oficiales, 1 siso, 1 residente
-

10 - OIC - 2024

*Se realiza Carteras en la zona de terraza ductos de ventilacion en Super board palacio de Justicia -
*se Aplica estuco fachada sede familiar
-
*instalacion de carteras fachada sede Familiar
-
*instalacion De breckes en tablero electrico Regulado Cuarto Electrico palacio de Justicia
*Metida de Cableado y peinado de cable en Canaleta existente cuarto electrico
*Se hace peinada extendida despues de las 5 de la tarde hasta las 10 PM en la Zona donde se debia laborar no dieron Autorizacion

Powered by CamScanner

en horario laboral Palacio de Justicia Juzgado 8 3 piso
1 encargado, 3 oficiales, 1 siso, 1 residente.
sst

* instalacion de canaletas para puntos electricos y datos Sede familiar. Se hace jornada extendida despues de las 5 pm ya que no nos dieron Autorizacion en horario laboral se labora hasta las 10 pm
Juzgado 4. promiscuo de familia
1 encargado, 3 oficiales, 1 siso, 1 Residente.
sst
11-DIC-2024

* instalacion de guardaescobas en muro del Archivo
sst

* Aplicacion de estuco en fachada. Sede familiar.
sst

* instalacion de carteras fachada sede familiar.
sst

* Fundicion de solado en sede familiar
zona de terraza.
sst

* bajada de escombros demolicion de solado de la terraza Sede familiar.
sst

* retiro de escombro en Camioneta a escombrera de coronado.
sst

* Metida de cable en Juzgado 4 Promiscuo de. Familia, Se. hace jornada estendido depues de. las 5 pm. ya que en lazona no nos permiten laboral en horario Normal. Se trabajo hasta las 9 pm.
1 encargado, 3 oficiales, 1 sst, 1 Residente.
sst

* instalacion de lamina de bosar en parte superior techo #4 con estructura liviana Sellar Abertura del telho evitar que Cuando llueva Se meta el Agua y
Mojar Archivo

* Aplicacion Cementoso en punto fijo
- SST

* instalacion de Carteras en board en ductos de Ventilacion terraza palacio de justicia

* instalacion de cajon para bandejas puntos de datos Palacio de justicia
- SST

* instalacion de gabinete para bandejas puntos de datos. sede familiar
- SST

* instalacion de ficha Normd en fachada palacio de Justicia
- SST

* se para actividades por motivos de lluvia a las. 3 PM. No se Retoman Actividades por lluvia actividad de fachada tanto Carteras como estuco
SST

12- Oct-2024

* Aplicacion de estuco en fachada Sede familiar
- SST


* instalacion de carpetas fachada sede familiar
- SST

* instalacion da cable de datos en canaleta nueva. sede familiar se hace jornada extendida ya que solo se puede trabajar en la zona despues de las 5 PM. se labora hasta las 9 PM.
1 encargado 3. Oficiales, 1 SST, 1 Residente
- SST

* instalacion de cable de datos en canaleta nueva Juzgado 9. tercer piso Palacio de justicia se hace. Jornada extendida ya que solo se puede trabajar en este Zona despues de las 5 PM se labora hasta las 9: PM
1 encargado, 3 oficiales, 1 SST, 1 Residente
- SST

Powered by CamScanner

* instalacion de pach panel de 24 Puertos. en gabinete. palacio de Justicia



SST
13 - DIC - 2024

* instalacion de carteras fachada sede familiar.

SST


* Aplicacion de estuco fachada sede familiar

SST

* Estuco punto fijo palacio de justicia

SST

* instalacion de tapa canaleta y cajas puntos electricos y Punto de datos. Se requiere jornada extendida porque en el juzgado 8-3 piso del palacio de justicia no nos permiten laboral Antes de las 5 pm se extinde. hasta las 10 pm quedando listo los Puntos. electricos, canaletas, tapas, cajas.
1 encargado, 3 oficiales, 1 sst, 1 residente.



SST
14 - DIC - 2024

* Aplicacion de estuco fachada principal sede familiar.

SST.

* instalacion de carteras fachada Sede familiar.

SST

* Lijado Punto Fijo para Pintura.

SST

* Estuco de Resanes palacio de Justicia

SST

* Retiro y Aseo Zona fachada, sede familiar.

SST

* poda de Arbol para poder Colocar carteras y estucar,

* Se para actividad de instalacion de estructura liviana por motivo de Audiencia desde las 9:30 AM se reinicia en horas de la tarde 1 pm

16-Dic-2024

* instalacion de carteras Fachada Sede familiar
* Aplicacio de estuco fachada sede familiar
*
* Lijada de punto Fijo para pintura
* Estucada y Rasqueteada Cuarto Ascensor
* Aplicacion de Serrenteso en cuarto Ascensor
* instalacion de tapas y tapas completas Juzgados noveno 3 piso se hace horario extendido ya que en el sitio no podemos laborar antes de las 5 pm se extiende hasta las 10 pm dejando terminado la instalacion
1 encargado, 3 oficiales, 1 sst. 1 residente
* estuco de pasillos palacio de justicia, Resanes y puesta de cinta maya.

17-Dic-2024

* instalacion de carteras Fachada sede familiar
* Armado de Andamios estuco fachada sede familiar
* instalacion de dilataciones en carteras, cinta maya y estuco.
* Aplicacion de estuco en pasillos y resanes palacio de justicia
* Pintado de punto fijo y Cuarto del Ascensor Palacio de Justicia
* Se para actividad de personal electricos y datos por falta de accesorios escasos en los proveedores para finquitar Juzgados 9 y 4 del palacio de Jeticia
* Se para actividades de fachada por motivos de lluvia desde las 3:00 pm hasta las 5 pm no se pudieron retomar actividades de nuevo

18-DIC-2024

* instalacion de carteras fachada sede familiar.
* Aplicacion de estuco fachada Sede familiar
* Se para actividad fachada Sede familiar por la Funcionaria omaira ducke refiere que con la bulla del taladro no la dejan concentrarse en la redaccion de los documentos para actividad a las 8:54 AM y no se podra retomar hasta en horas de la tarde. 1 PM

SST

* Se realiza Metida de cable por medio de buitron 3 piso en bandeja existente tanto electrica como datos para cuarto de rad. Segundo piso palacio de justicia

SST

* mano de pintura terminacion final punto fijo y cuarto Ascensor.
* instalacion de cajas y tapas de canaletas juzgado 4. ejecucion de penas palacio de Justicia se hace. jornada Extendida ya que en horario normal no se puede trabajar en el sitio se labora de 5. PM hasta las 10:00 PM.
1 encargada 3 oficiales, 1 SST, 1 residente

SST

19-DIC-2024

* se instala Gabinete para bandeja de datos Pach. Panel de 24 puertos. PALACIO DE JUSTICIA
* instalacion de pach. cord 14 de 1 metro
* INSTALACION DE CARTERAS FACHADA EN SEDE FAMILIAR EN SUPER BOARD

SST

* ARMADO DE ANDAMIO, INSTALACION DE LINEA DE VIDA PARA ESTUCO FACHADA DE SEDE FAMILIAR
* ENTREGA DE ANDAMIOS A LA EMPRESA ALQUILER DE ANDAMIOS PALMERA

SST

* SE PARAN ACTIVIDADES DE FACHADA SEDE FAMILIAR Y ACTIVIDADES DE PALACIO DE JUSTICIA

HASTA NUEVA ORDEN

-

23-DIC-2024

* SE HACE ENTREGA DE ANDAMIOS RESTANTES QUE QUEDARON EN OBRA

-

26-DIC-2024

*INSTALACIÓN DE CAJAS Y TAPAS EN CANALETA NUEVA TERMINACIÓN DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ENERGÍA Y DATOS EN JUZGADO 4TO PROMISCUO DE FAMILIA

* SE RETIRA CANALETA Y TABLERO EXISTENTE EN JUZGADO 4TO PROMISCUO DE FAMILIA DEJANDO UBICADOS COMO VAN DEFINITIVAMENTE LOS ESCRITORIOS SEGÚN EL PLANO, DANDO POR TERMINADO EL TRABAJO DE PUNTOS DE ENERGÍA Y DATOS

* SE HACE VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE INTERNET TODOS FUNCIONANDO AL 100%

-

09-ENERO-2025

* SE INICIAN NUEVAMENTE LABORES EN SEDE FONTIBÓN Y PALACIO DE JUSTICIA

* VERIFICACIÓN DE CONEXIONES EN EL PACH PANEL Y TODOS SUS DEBIDOS PACH CORD

* SE REALIZA ORDEN Y ASEO EN ZONA DE ARCHIVO

* SE HACEN RESANES EN LOS CORREDORES DEL TERCER PISO PALACIO DE JUSTICIA

* SE HACEN RETOQUES FINALES EN EL CUARTO DEL ASCENSOR, DANDOLE NUEVAMENTE OTRAS MANOS DE PINTURA PARA HACER TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN LA ZONA

-

10-ENERO-2025

* SE APLICA IMPERMEABILIZANTE EN ZONA DE LA TERRAZA PALACIO DE JUSTICIA

* SE REALIZA ORDEN Y ASEO EN ZONA DE PUESTO FIJO Y TODA LA TERRAZA

Powered by CamScanner

HASTA NUEVA ORDEN 8AM hasta 5:00 PM
-
23-DIC-2024

* SE HACE ENTREGA DE ANDAMIOS RESTANTES QUE QUEDARON EN OBRA
-
26-DIC-2024

*INSTALACIÓN DE CAJAS Y TAPAS EN CANALETA Y TERMINACIÓN DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ENERGIA Y DATOS EN JUZGADO 4TO PROMISCUO DE FAMILIA
* SE RETIRA CANALETA Y CABLEADO EXISTENTE EN JUZGADO 4TO PROMISCUO DE FAMILIA DE JANO UBICADOS COMO VAN DEFINITIVAMENTE LOS SALIDAS SEGUN EL PLANO, DANDO POR TERMINADO EL TRABAJO DE PUNTOS DE ENERGIA Y DATOS
* SE HACE VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE INTERNET TODOS FUNCIONANDO AL 100%
-
09-ENERO-2025

* SE INICIAN NUEVAMENTE LABORES EN SEDE COMISARIA Y POLICIA DE JUSTICIA
* VERIFICACIÓN DE CONEXIONES EN EL PACH PANEL Y TODOS SUS DEBIDOS PACH CORD
* SE REALIZA ORDEN Y ASEO EN ZONA DE ARCHIVO
* SE HACEN RESANES EN LOS CORREDORES DEL TERCER PISO POLICIA DE JUSTICIA
* SE HACEN RETOQUES FINALES EN EL CUARTO DEL ASCENSOR, DANDOLE NUEVAMENTE OTRAS MANOS DE PINTURA PARA HACER TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN LA ZONA
-
10-ENERO-2025

* SE APLICA IMPERMEABILIZANTE EN ZONA DE LA TERRAZA POLICIA DE JUSTICIA
* SE REALIZA ORDEN Y ASEO EN ZONA DE PUNTO FIJO Y TODA LA TERRAZA

* Se Reciben Andamios y se Verifica Estado de Cada una de las piezas
* se Retoman Actividades en la fachada de Aplicación de estuco Instalación de Carteras
* Instalación de Dilataciones en Cartera que va encima de la # p en lamina super board
- SST
11 - ENERO - 2025

* Instalación de Carteras en fachada de la sede familiar
* Armado de Andamio para Aplicación de estuco en la fachada de la Familiar
* Rezone en pasillos del palacio de Justicia piso 2
- SST
13 - ENERO - 2025

* Armado de Andamios para Instalación de Carteras en la fachada de la sede familiar
* Aplicación de estuco en la fachada de la sede familiar - SST
* Desmonte de Modulo en el Juzgado 9 Tercer piso para Construir Muro en Estructura Liviana
* Desmonte de puerta en el Juzgado 9 penal Municipal - SST
* Instalación de Estructura Liviana para Division en Juzgado 9 penal Municipal SST
* Instalación de frescaso y Topado Completo de Muro por ambos lados
* Aplicación de estuco Instalación de Cinta Malla en Muro Nuevo palacio de Justicia Juzgado 9 penal Municipal
* Resanteada del Techo de la entrada principal del palacio de Justicia
* Instalacion de Dilatacion en U para Cartera que va Encima de una IP
- SST

14-ENERO-2025

* MASILLADO DEL MURO NUEVO EN PALACIO DE JUSTICIA JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL
* INSTALACION DE CARTERAS EN SEDE FAMILIAR
* INSTALACION DE DILATACION EN CARTERAS DE LA FACHADA DE LA SEDE FAMILIAR
* RESANES CON ESTUCO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO DE JUSTICIA
* Se para actividad de fachada carteras por Audiencia 8:30 AM hasta la 1 PM Sede familiar.

SST

15-ENERO-2025

* Masillado del muro nuevo en palacio de justicia, juzgado 9 penal Municipal alimiento.
* Masillado entrada principal palacio de justicia
* Masillado en los patios zona terraza muros internos
* Masillado en corredores piso 2 palacio de justicia
* instalacion de dilatacion en U en cartera de la IPE fachada Sede familiar
* Masillado de cartera y dilatacion Sede familiar. Cartera sobresaliente.
* Masillado de muros fachada sede familiar

SST

16-ENERO-2025

* Armado Andamios para labores fachada Sede familiar
* Armado de carteras fachada Sede familiar
* Aplicacion de estuco sede familiar.
* instalacion de dilatacion en carteras salientes. Sede familiar
* Se para actividad de fachada por Motivos de Audiencia de 9:30 AM hasta la 1 PM Sede Familia Se reanudan Actividades, 3 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Residente, 1 SST

SST

* Se Aplica pulimiento masilla en entrada principal del palacio para Lijar y pintar.
* Se da pulimiento A los patios Muros internos de la terraza palacio de Justicia
* Se para actividad en el centro de servicios Judiciales por que no nos dieron Autorizacion de entrar. en espera A poder realizar las actividades programadas en esta zona.

sst.

17- ENERO - 2025

* Armado de Andamios en la calle Actividades en la sede familiar.
* Señalizacion de la zona
* Aplicacion de estuco muros fachada sede familiar.
* instalacion de fijos en carteras sede familiar.
* Lijado de muros ya con todas sus manos de estuco y Pulimiento sede familiar
* Se informa que no ha sido posible laboral y Avanzar en las Actividades del cuarto de audiencia 3 en la sede familiar ya que la funcionaria de esta zona no nos a dado la autorizacion de ingresar por motivos de salud. Refiere que viene de una incapacidad y no debe de recibir ninguna clase de polvo ni olor fuerte. estamos a la espera de poder retomar labores en esta Zona ya que por este motivo estamos atrazados
* casqueteo centro de servicios Judiciales. en dos paredes diferentes de la zona Palacio de Justicia
* Aplicacion de Lijado y pintura entrada principal palacio de Justicia

sst.

18- enero 2025

* Armado de Andamios y señalizacion de la zona Actividades sede familiar
* Aplicacion de estuco en muros fachada sede familiar
* instalacion de dilataciones sede familiar
* Lijado en muros sede familiar

* Relleno de hueco y Perfilada del mismo para Ventana Atencion Al Publico Con Cemento 30. sede familia
* Aplicacion mural estuco en muro Juzgado 4. Promiscuo de familia
* Pulimiento de los patios muros internos de la terraza Palacio de justicia.

20-ENERO-2024

* se informa que se habia programado labores en la. Sala de audiencia 3 Sede Familiar pero no dejaron las llaves de la zona. la Juez del lugar no nos quiso dar la autorizacion, A pesar de que ya se habia llegado a un Acuerdo con los funcionarios del lugar de trabajar el Dia sabado 18 enero pero la juez a pesar de que le dejaron mensajes y le hicieron llamadas nunca les respondio y sin la Autorizacion del juez no nos es posible laboral en ese espacio Quedamos Atentas en la Semana a poder continuar Con las labores ya que estos inconvenientes nos generan retraso. Hora 7:30 AM. 1:00 PM. SST.

20-ENERO-2024

* Armado de Andamio en zona Publica para realizar trabajos en fachada, se hace Señalizacion de la zona
* Aplicacion de estuco en fachada Sede familiar
* instalacion de dilatacion en fachada sede familiar
* se suspenden Actividades de Fachada por motivos de Audiencia 9:30 AM hasta las 1 PM se. reanuda nueva mente. Sede Familiar
* se aplica pulimiento en los patios Muros internos de la terraza para lijar y pintar. Palacio de Justicia
* se hace certificacion de puntos de datos en. las Zonas de, Palacio de Justicia, Juzgado 4 ejecucion de, Penas, Juzgado 8 Penal del Circuito, Juzgado 9 Penal municipal y cuarto del segundo Piso quedando al 100% hcaha la certificacion

Con la empresa LINKWARE™ PC.

* se hace jornada extendida despues de las 5 pm. para hacer certificacion puntos de datos sede familiar ya que no nos dieron Autorizacion de entrar a la zona en horario laboral la certificacion queda programada para las 05:00 pm. se informa siendo las 3:00 pm
* se hace certificacion en el juzgado 4 promiscuo de familia de todos los puntos de datos. quedando al 100% la certificacion. 5:00 pm hasta las 9:00 pm
* se hace certificacion en el rack verificando que el pach panel y todos los pach cord que se instalaron. Quedaron Conectados correctamente y funcionando al 100% certificacion terminada en sede de familia 1 encargado 2 oficiales, 1 tecnico, 1 sst, 1 residente.

SST

21-enero-2024

* estuco patios muros internos de techos palacio de Juzticua
* instalacion de Angulos para techo en ventanillas externos punto fijo filtracion de agua cuando llueve. palacio de justicia
* instalacion de teja en soportes Angulo Metalico techos ventanilla puntos fijos. palacio de justicia
* instalacion de Dilatacion en carteras fachada sede familiar
* Aplicacion de estuco fachada sede familiar.
* Ayudo paredes fachada sede familiar
* Ayudo -

SST

22-Enero-2024

* Armado de Andamios y señalizacion de la zona en Actividades zona publica de la sede familiar
* Aplicacion de estuco en fachada sede familiar
* instalacion de carteras fachada sede familiar en super board y con estructura liviana

SST

* Lijado de Paredes Fachada principal sede familiar
* Instalación de Dilatación En Cortero Sede familiar
* Se para actividad de la fachada de la Sede familiar por motivos que se encontraban en Audiencia y el ruido los estaba Afectando 9:30 AM hasta las 2:00 PM.
* Rezones de topos en pisos de los Juzgados 4to piso de familia
* Rasqueteado en pared de baño segundo piso Sede familiar y Aplicación De ESTUCO
* Rasqueteado segundo piso
Instalación de Cinta malla, Aplicación de estuco para sellar fisuras en la pared, en la sede familiar
* Rezone de Topos en pisos de Juzgados 9 penal municipal
* Rezone de Topos en pisos de Juzgados 4to Estucado de penos
* Rezone de topos que se encuentran en el piso del Juzgado 8 penal del Circuito

23-ENERO-2025

* Armado de andamio, señalización de la zona en una publica, fachada de la sede familiar
* Armado de Estructura liviana en Estructura de hierro existente, para fachada de la sede familiar
* pintado y lijado de la pared del segundo piso de la sede familiar
* Lijado y pintado de la pared externa del baño del segundo piso de la sede familiar
* Lijado en la zona de patios, Muros interiores de Techos en Terraza del palacio de justicia

24-Enero-2025

* Armado de Andamio, señalización de la zona en vía publica en la sede familiar
* instalacion de laminas de super board para la fachada de la sede familiar

* impermeabilización de MOTIVO externo con sika fill en palacio de justicia
* Rasqueteado en paredes y techos en sala de audiencia 3 de la sede familiar
* Aplicación de Acronal, sellamiento de humedad en paredes de la sede familiar
* instalación de panel yeso en cielo razo de sala de Audiencia 3 de la sede familiar
* Aplicación de la cinta malla para juntas y aplicación de estuco para cielo razo de la sala de audiencia 3 de la sede familiar
* Rasqueteado de la pared interna que da hacia la fachada de Centros de servicios Judiciales
* Rasqueteado del pared interno que da hacia el baño que presenta humedad en Centro de servicios Judiciales
* Aplicación de Acronal en pared por presencia de humedad en pared interna que da hacia del baño, en Centro de servicios Judiciales
* Aplicación de estuco en pared interna que da hacia la fachada del Centro de servicios Judiciales
* lijado de fachada de las paredes que se encuentran terminados con polimento de estuco listos para pintar
* Marquillas de pach panel del cuarto de RAC para cada Juzgado

25-ENERO-2025

* Armado de Andamio y señalización de la zona en espacio publico de la fachada de la sede familiar
* Instalación de lamina de super board para fachada en la sede familiar
* Lijado en zonas terminadas con polimento de estuco en fachada Listos para pintura en la sede familiar
* instalacion de ornatos en U para fachada sede Familiar
* estuco y perfilado de Ventana Atencion al client Juzgado 4 promiscuo de familia.

* Desmonte de puerta cortina del sotano zona parqueo doro
* Desmonte de rieles y soportes existentes.
* Desmonte sistema de motor para instalacion de todo nuevo.
* Soldadura de rieles nuevos, Armado de modulos para puerta cortina nueva, instalacion de bisagras he: estructura Completa
* Se hace jornada extra instalacion de puerta cortina con Modulos para zona de parqueadero. Palacio de J despues de las 12:00 AM hasta las 8:00 PM. 1 soldador, un encargado, 1 sst, 1 oficial. Sst

26-ENERO-2025

* Se realiza Actividades para Modificacion y Correcion de instalacion de puerta cortina con modulos en zona de parqueadero.
* instalacion de soportes y Guayas para Manejo manual mientras instalan el Motor.
* se realiza jornada Continua de 6:30 AM Hasta las 7:00 PM, 1 soldador, 1 oficial, 1 sst, 1 Residente
* Se deja provisional abriendo Manualmente pero funcional Completamente. Palacio de Justicia
* Se Aplica Mano de estuco final muros y Ventana de Atencion al Cliente en juzgado de familia numero 4 de familia

27-ENERO-2025

* Armado de Andamios, Señalizacion de la zona sitio Publico Fachada sede familiar
* Estuco fachada sede familiar en zona donde se hizo parte en Super boar.
* Lijado de paredes de la fachada ya con muros firmados de estuco listas para pintar.

* aplicacion estuco pulimiento en cuarto de sala audiencia 3. paredes y techos sede familiar.
* Aplicacion estuco pulimiento en cuarto de. Centro. Servicios Judiciales para lijar y pintar. palacio de justicia
* Rasqueteo en cuarto. Grieta pared Principal entrada de la oficina Palacio de justiccia.
* se suspenden Actividades en cuarto. Centro de servicios. solo se pudo rasquetiar ya que la Juez del lugar no nos permitio continuar con las labores en el sitio se suspenden Actividades a las 11:30 AM hasta nueva orden. Tatiana Sst
* Se hizo reubicacion de escritorios en juzgados. 9 penal municipal, 8 penal del circuito y 4 ejecucion de penas, instalando los equipos en Coneccion a las canaletas nuevas y Puntos electricos y de datos. instalados por la empresa Julio Ricardo Rojas. Quedando todos en funcionamiento al 100%.
* Aplicacion de repello en zona terraza parte. de respiradero detras de techo 4. remate en resane fino Listo para estucar. y pintar. Tatiana Sst.
* Se paran labores a las 3:30 PM por motivo de fumigacion en la sede y en el palacio de justicia hasta las 5:00 PM.

28-ENERO-2024

* Armado de Andamio y señalizacion de la zona en via publica fachada sede familiar.
* estuco en fachada lateral frente de palacio de Justicia sede familiar.
* Lijado de las paredes y cortinas hechas en boor dejando Listas Para pintura sede familiar.
* estuco y Lijado de sala de audiencia 3. pintura y entrega al 100% terminacion del stio sede familiar.
* Visita de la Arquitecta lorena. se. suspenden labores de pintura en fachada por. decision de color final de la fachada sede

Familiar 9:30 AM. hasta las 5:00 PM
* Se realiza jornada extendida en juzgado 4. promiscuo de familia ya que en horario laboral no nos permitieron realizar ninguna labor.
Jornada extendida de 5:00 PM a 7:00 PM
1 oficial, 1 encargado 1 sst. sst
29-enero-2025
* instalacion de laminas Superboar en fachada sede Familiar
* estuco en fachada paredes sede familiar
* Cambio de lumpara juzgado 8. penal del circuito palacio de justicia
* Separacion de la palmera de la cartera con ayuda de las garruchas. y el poste. para terminar cartera y Aplicación de anta maya y aplicacion de estuco.
* instalacion de lamina de eterboard. sst
30 enero-2025
* Armado de Andamios, senalizacion de la zona. Armado en espacio publico.
* Aplicacion de estuco en fachada sede familiar
* instalacion de carteras con estructura luliana y
* instalacion de laminar eterboar.
* instalacion de dilatacion en esquinas de carteras
* Aplicacion de tratamiento de juntas en carteras sst.

31-enero-2025

* Aplicacion de estuco relleno en fachada Sede Familiar
* Aplicacion de tratamiento de juntas en carteras Sede familiar.
* Aplicacion de estuco fino terminacion en fachada, Sede familiar
* Armado Andamio zona publica sede familiar
* Demarcacion de la zona — sst

01-febrero-2025

* Armado de andamios en la fachada lateral izquierda de la sede de familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST y 1 residente, 1 encargado
* Aplicación de estuco en fachada lateral izquierda de la sede de familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST y 1 residente, 1 encargado
* Lijada y Pintada de centro de servicios primer piso en el Palacio de Justicia, y se deja terminado en su totalidad
4 oficial, 1 auxiliar, 1 SST y 1 residente, 1 encargado
-

03-Febrero-2025

* Sacada y armado de andamios en la fachada lateral izquierda de la sede de familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST y 1 residente, 1 encargado
* Aplicación de estuco en fachada lateral izquierda de la sede de familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Suministro e instalación de cinta malla para carteras y sellador de juntas para las mismas en la fachada lateral izquierda de la sede de familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y un encargado
-

04-Febrero-2025

* Sacada y armado de andamios en la fachada lateral izquierda de la sede de familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Aplicación de estuco en fachada lateral izquierda de la sede de familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y 1 encargado

* Desmonte de Cartera existente y se hace el montaje de la estructura para las nuevas carteras, y se dejan instaladas con sus respectivas dilataciones en la sede de familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y un encargado
* Desmonte de cristal en el primer piso del Palacio de Justicia y se instala el nuevo, a espera de accesorios para su correcto funcionamiento y queda fuera de servicio.
1 oficial, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Desmonte de cristal en el segundo piso del Palacio de Justicia y se instala el nuevo, a espera de accesorios para su correcto funcionamiento y queda fuera de servicio
1 oficial, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Rasqueteo de piso de maderas en el primer piso en la parte posterior del palacio de Justicia y se hace retiro del material sobrante y se lleva al sitio de recogida
1 oficial, 1 ayudante, 1 SST, 1 residente y 1 encargado

05-Febrero-2025

* Sacada y armada de andamios en la Fachada lateral izquierda de la sede de familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Aplicación de estuco en Fachada lateral izquierda de la sede de Familia
* Aseo y limpieza en la Fachada lateral derecha de la sede de Familia
1 ayudante, 1 SST y 1 residente
* traslado de escombro hasta el punto de recolección
1 oficial, 1 ayudante, 1 SST y 1 residente
* Aplicación de hidrofugo sobre muro en ladrillo al lado de la cubierta
1 oficial, 1 ayudante, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Pintura de muros internos de la terraza
1 oficial, 1 ayudante, 1 SST y 1 residente

06-Febrero-2025

* Sacada y armado de andamios en la fachada lateral izquierda de la sede de Familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Aplicación de estuco en fachada lateral izquierda de la sede de familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Marquilla en los tableros electricos de la sede de familia
1 oficial electrico, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente
* Marquilla de los puntos electricos y de datos, de los puestos de trabajo en el Juzgado 4 Promiscuo de Familia, en la sede de Familia
1 oficial electrico, 1 auxiliar, 1 SST y 1 residente.
* Se organizan los Patchcord en el PatchPanel y se deja totalmente funcional y se procede a entregar cuarto del Rack al Personal de mantenimiento en la sede de Familia
1 oficial, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente
* Se realiza lavado de materas con hidrolavadora y se deja lista para pintar. En Palacio de Justicia
1 oficial, 1 ayudante, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Pintura a una mano para las materas en el Palacio de Justicia
1 oficial, 1 ayudante, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Desmonte de orinal en el tercer Piso del Palacio de Justicia y se instala el nuevo, a espera de accesorios para su correcto funcionamiento y queda fuera de servicio.
1 oficial, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* sellado de orinales de los tres pisos del Palacio de Justicia, esto se realiza con silicona
1 oficial, 1 SST, 1 residente y 1 encargado

SST

* se realiza jornada extendida desde las 5:00 pm hasta las 8:00 pm en fachada Familia
3 oficiales, 1 ayudante, 1 sst, 1 residente, 1 encargado.

SST

07-Febrero-2023

* Sacada y armado de andamios en la Fachada lateral izquierda de la sede de Familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Aplicacion de estuco en la Fachada lateral izquierda de la sede de Familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Armado y montaje de estructura para carteras restantes en la Fachada lateral izquierda de la sede de Familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Suministro e instalacion de cinta malla para carteras y sellador de Juntas para las mismas, en la Fachada lateral izquierda de la sede de Familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Se paran actividades a las 3 Pm por motivos de lluvia y no se reanudan actividades.

08-Febrero-2025

* Sacada y armado de andamios en la Fachada lateral izquierda de la sede de Familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Aplicacion de estuco en la Fachada lateral izquierda de la sede de Familia
3 oficiales, 1 auxiliar, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Retiro de escombros en vehiculo
* Resane y Pintura de muros en el Juzgado 4 Promiscuo de Familia en la sede de Familia
1 oficial, 1 ayudante, 1 SST, 1 residente y 1 encargado
* Instalacion de Vidrio en ventanilla del Juzgado 4 Promiscuo de Familia en la sede de Familia jornada extendida de 18:00 pm a 7:00 pm
1 oficial, 1 ayudante, 1 SST, 1 residente, 1 encargado

10-Febrero-2025

* Sacada y Armada de Andamios Sede familiar lado izquierdo.
3 oficiales, 1 ayudante, 1 encargado, 1 sst, 1 Resident
* Aplicacion de estuco en muros y carteras de fachada Sede familiar
3 oficiales, 1 ayudante, 1 encargado, 1 sst, 1 Residente
* Lijado y pulimento muros Fachada Sede familiar
3 oficiales, 1 ayudante, 1 sst, 1 Residente, 1 encargado
* se hace jornada extendida de 5:00 PM hasta las 7:00 PM labores de pintura en el juzgado 4 promiscuo de familia
2 oficiales, 1 ayudante, 1 sst, 1 Residente, 1 encargado.

11- febrero-2025

* Desmonte completo de puerta corrediza del parqueadero Palacio de Justicia por luz en parte de arriba de una de las modulos.
De trabajo horario extendido desde las 7:00 M hasta las 6:00 PM (Domingo) 09-febrero-2025.
2 oficiales soldadores, 1 sst, 1 encargado.

11- Febrero-2025

* Armado de Andamios y sacada de los mismos en la zona izquierda de la Sede familiar.
3 oficiales, 1 ayudante, 1 sst, 1 Residente, 1 Encargado.
* estuco en paredes fachada sede familiar zona izquierda
3 Oficiales, 1 Ayudante, 1 sst, 1 Residente, 1 encargado.
* jornada extendida de 5:00 PM hasta las 7:00 PM en juzgado 4 Promiscuo de familia pintura de muros. terminación
2 oficiales, 1 ayudant, 1 sst, 1 encargado.

12-febrero-2025

* Sacada de Andamios, Armado de Andamios lado izquierdo de la sede familiar
3 oficiales, 1 ayudante, 1 SST, 1 Residente, 1 encargado.
* Aplicacion de estuco fachada y Carteras en las paredes externas de la sede familia.
3 Oficiales, 1 ayudante, 1 SST, 1 Residente, 1 encargado.
* Pintura en Muros de terraza palacio de Justicia Ultima Mano de pintura Muros internos. Fachada.
1 oficial, 1 Ayudante, 1 SST, 1 Residente, 1 Encargado.

* Se presenta inconveniente Con la guarda de seguridad Martha al dar orden directa a nuestro personal de Mover Moto de funcionario y el refiere que la Moto Aparecio rallada y exige se le pague por los daños presentados, esto quedo en bitacora donde la guarda de seguridad se hizo responsable de toda la situacion a la cual ella respondera por todos los daños y perjuicios ocasionados.
Zona parqueadero Sede familiar

SST

13-febrero-2025

* Se inician labores a las 10:00 AM en fachada por motivos de lluvia Sede familiar
* Armado y Sacado de Andamios para parte izquierda de la Sede familia, Senalizacion de la Zona
3 oficiales, 1 Ayudante, 1 SST, 1 Residente, 1 encargado.
* se paran actividades desde las 11:20 AM en fachada por Motivos de lluvia hasta las 3:00 PM
3 oficiales, 1 ayudante, 1 SST, 1 Residente, 1 encargado.
* en horas de la tarde solo se pudo laborar desde las 3:00 PM hasta las 5:00 PM por Motivos de lluvia
3 oficiales, 1 Ayudante, 1 SST, 1 Residente, 1 encargado

SST

14- febrero -2025

* Sacado y Armado Andamios parte izquierda Sede Familiar
* Aplicacion de estuco en fachada izquierda sede Familiar, Lijada y Pintada de la misma.
3 oficiales, 1 ayudante, 1 sst, 1 Residente 1 encargado
* Aplicacion ultima mano de Pintura Muros fachada interna palacio de justicia Terraza.
* impermeabilizacion de nuevos parches en la terraza palacio de Justicia
* Cumplido

15- febrero-2025

* trasladado de Andamios y Armado en la parte izquierda de la sede Familiar. para Lijado y Pintura de muros de fachada.
3. oficiales, 1 ayudante, 1 sst, 1 Residente, 1 encargado
* se para actividad 8:30 AM por Motivo de lluvia hasta la 1 PM no se retoma Actividades hasta las 2 PM Donde se realiza jornada extendida hasta las 10:00 PM. (sabado)
4 oficiales, 2 ayudantes, 1 sst, 1 Residente, 1 encargado.
Cumplido

16- febrero-2025

* Armado y Sacado Andamios parte posterior izquierda sede Familiar.
* Lijado y pintura blanca y Gris Fachada Carteras y Muros Sede Familiar.
* se realiza jornada continua de 7:00 AM hasta las 3:00 PM (Dia Domingo 16 febrero -2025)
4. oficiales, 2 ayudantes, 1 sst, 1 Residente, 1 encargado.
Cumplido

* se labora en la parte Gamle del parqueadero palacio de Justicia Quedando al 100% para entrega definitiva a la administradora Adriana Bejarano

1 oficial soldador, 1 oficial estructura metalica
2 sst, 1 Residente, 1 encargado.

17- Febrero-2025

* Sacado y Armado de Andamios en parte derecha principal de la sede familia fachada Lijado y pintura de la misma color blanco y gris
3 oficiales, 2 ayudantes, 1 sst, 1 Residente, 1 encargado
* retiracion de guarda escoba en muro 4 Juzgado promiscuo de familia se hizo jornada continua de 5:00 pm hasta las 7:00 pm
1 oficial, 1 Ayudante, 1 encargado, 1 sst, 1 residente.
* Sellado de huecos en pisos tapas ciegas en el Juzgado 4 ejecucion de penas, palacio de justicia
* 1 oficial, 1 ayudante, 1 sst, 1 residente
* Se llama a la encargada de la administracion la doctora Adriana bejarano para hacer la entrega formal de la puerta garaje del parqueadero que ya habia quedado al 100% funcional pero al estar haciendo las pruebas de el funcionamiento de la cortina la Juez Mariza de la sede de familia la cual iba llegando al parqueadero y no se percato de la prueba y choco el auto con la puerta causando daño y retrasando la entrega.

SST

18- Febrero-2025

* Armado y sacado de Andamios trabajos en muros de fachada y carteras en sede de familia
* Lijado y pintura de fachada color blanco.
Carteras color gris
3 Oficiales, 2 ayudantes, 1 sst, 1 Residente, 1 encargado.
* Aplicacion de ultima mano de pintura en sede familiar salida trasera lado Parqueadero

* terminacion ultima mano muros de la terraza palacio de Justicia
2 oficiales, 1 ayudante, 1 sst, 1 residente, 1 encargado
* se paran Actividades de fachada sede familia por motivos de lluvia siendo las 2:30 pm. hasta las 5:00 pm.
* se hace jornada continua desde las 5:00pm hasta las 10:00 pm.
3 oficiales, 2 ayudantes, 1 sst, 1 Residente, 1 encargado

sst

19-Febrero-2025

* Armado y translado de Andamios para actividades en la Fachada Sede de familia
* estuco detalles, Lyado y Antura de la fachada.
3 oficiales, 2 ayudantes, 1 sst, 1 residente, 1 encargado.
* se hace entrega formal de la puerta Garaje en optimas condiciones y funcionando al 100% a la Doctora Adriana Bejarano y al Señor Ismael Jefe de mantenimiento
* se hace jornada extendida de 5:00 pm hasta las 10 pm
3 oficiales, 2 ayudantes, 1 sst, 1 Residente, 1 encargado

sst 20-Febrero-2025

* Armado y translado de Andamios para actividades en la Fachada Sede de familia
* estuco detalles, Lyado y Antura de fachada y cartenas blanco y Gris
3 oficiales, 2 ayudantes, 1 sst, 1 Residente, 1 encargado.
* se hace jornada extendida desde las 5:00 pm hasta las 10:00 pm
3 oficiales, 2 ayudantes, 1 sst, 1 encargado, 1 Residente.

sst

21-Febrero-2025

* sacado y Armado de Andamios para actividades de fachada en Sede Familia
* 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 sst, 1 Resident, 1 encargado

* Estuco de fachada Lijado y pintura Dos colores blanco y gris terminacion para entrega de Actividades.
3. Oficiales, 2 ayudantes. 1 sst, 1 Residente 1 encargado

22-Febrero-2025

* translado de Andamios y Armado en fachada sede de Familia para actividades de lijado y pintura.
* se hace Jornada Continua desde las 12:00 AM hasta las 9:00 PM entrega de Actividades en fachada sede F
3. Oficiales 2 ayudantes, 1 sst, 1 Residente, 1 encargado.

23-Febrero-2025

* translado y Armado de Andamios. Actividades y en fachada sede de la familia Lijado y pintura horario extendido desde las 7:00 AM hasta las 8:00 PM Domingo
3 oficiales, 2 ayudantes, 1 sst, 1 Residente, 1 encargado.

24-febre-2025

* Recorrido de obra Revisando detalles en fachada pasillos, y demas zonas intervenidas para poder hacer entrega formal de todas las actividades Que se llevaban a cabo en la sede familiar y en el palacio de justicia
* se hizo orden y Aseo en el palacio de justicia Punto fijo y Archivo, sitios que utilizabamos como bodega dejando todo Limpio y ordenado para entrega
* Orden y Aseo en la Sede familiar con lavado del Parqueadero y zonas publicas Andenes con la Hidro lavadora para hacer entrega de las zonas
* retiro de escombros y demas residuos de obra
* entrega de equipos y Andamios Alquilados para

realizar labores.

* 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 sst, 1 residente, 1 encargado.
* se hace jornada continua desde las 5:00 pm hasta las 10:00 pm.

3 oficiales, 2 ayudantes, 1 sst, 1 residente, 1 encargado.

* ~~se~~ sst.

* Se culminan Actividades en sede de familia Quedando todo al 100% entregado a la doctora Adriana bejarano y al Señor ismael de mantenimiento. y tambien se hace entrega de el palacio de Justicia.

Dir. obra.

BITACORA TULUA

CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 092 DE 2024.

CONTRATANTE: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA.

OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN EL INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA DE TULUA "LIZANDRO MARTINEZ ZUÑIGA" Y OTROS.
UBICACION CLL 26 CRA 27 ESQUINA TULUA.

CONTRATISTA: JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
Director de Obra.

RESIDENTE DE OBRA: EDDIE ALEXANDRO CALDERON.

FECHA DE INICIO: 09 DE DICIEMBRE 2024.

FECHA DE TERMINACION:

Powered by CamScanner

9-DIC-2024
TIEMPO SOLEADO.
Personal, 1 residente, 1 SISO, 2 oficiales, 1 ayudante y el director de obra.
Se inician actividades llevando los equipos y herramientas necesarios para realizar la actividad de Mantenimiento de cubierta, se solicita un sitio para Guardar tanto Materiales como Herramientas el cual fue asignado por la doctora Judith ENDO, tambien se procedio a Comprar el Material de Madera caña brava con el Fin de tener reserva en Sitio para realizar los Cambios necesarios en el Momento de las respectivas Inspecciones en Cubierta. Se Ubica el Sitio de acceso a Cubierta que esta sobre el cielo falso del Baño en PISO 2°. Tambien Se procede a Comprar el plastico y la Madera para construir el provisional para cubrir en Caso de estar traspasado y llueva, se comienza con la armada de la cubierta de protección Movil.

Dir. obra.

10-DIC-2024
TIEMPO Soleado.
Personal, 1 residente de obra, 1 SISO, 2 oficiales 1 ayudante y el Director de obra.
Se continua con las actividades de construcción de la cubierta Movil, se realiza el acceso a la cubierta, con el Fin de Comenzar a desmontar y hacer los respectivos remplazos de la estructura en Caña brava, al realizar

los respectivos desMontes se observa que hay que realizar reemplazos en el Manto o tela asfaltica ya que esta en Mal estado en algunos tramos, por consiguiente se lleva a la obra tela asfaltica superteclo para realizar los respectivos reemplazos, se observa que hay que realizar cambios de tejas que se encuentran en Mal estado, portanto se procede a realizar la compra de estas unidades y asi tener reserva para realizar esta actividad, se continua con la labor de inspección por tramos y ya se tiene lista la cubierta Movil en caso de lluvia.

Dir. obra.

10-Dic-2024
tiempo lluvioso
Personal, 1 residente de obra, 1 SISO, 2 oficiales, 1 Ayudante.
Se continua con las actividades de Mantenimiento en cubierta pero hay la necesidad de parar por 3 horas por Motivos de lluvia, se paran actividades alas 8 AM y se continua alas 11 AM hora en que la lluvia Calmo, se realiza actividades de Reemplazo de Caña brava, cambios de tela asfaltica y Cambio de algunas unidades de teja, se realiza tambien la actividad de limpieza de Canales ya que se encuentran con bastantes residuos de hojarasca y elementos llevados por el viento.

Dir. obra.

Powered by CamScanner

11-Dic-2024
Tiempo Sombreado
Personal: 1 residente de obra, 1 SISO, 2 oficiales, 1 ayudante.
Se continua con las actividades en cubierta reemplazos de caña brava, cambio de tela o Manto asfaltico, reemplazo de unidades de teja, organización de tejas despredidas, limpieza de Canales. por Motivos de lluvia se paro actividades a las 3PM, se usa cubierta Movil.

Dir. obra.

12-Dic-2024
Tiempo Soleado
Personal: Director de obra, 1 residente de obra 1 SISOma, 2 oficiales, 1 ayudante.
Se continua con las actividades en cubierta, limpieza de canales, reemplazos caña brava, remplazo de unidades de tejas, reemplazos con tela asfaltica Supertecho, se evacuan las tejas y Material en mal estado

Dir. obra.

13-Dic-2024
tiempo Sombreado
Personal: 1 residente de obra, 1 SISO, 2 oficiales, 1 ayudante, Para las Actividades de Cubierta y para la construccion e instalacion de ductos en oficinas llegan 2 oficiales.
Se continua con las actividades de Mantenimiento en cubierta, realizando reemplazos de CañaBrava, reemplazos de Supertecho,

Powered by CamScanner

Cambios de unidades de teja, comienza a llover a las 9: hasta 10 y 30, se usa la cubierta Movil, se retoman actividades en cubierta. los 2 oficiales comienzan a realizar la actividad de construcción de ductos para cubrir tubería de aire acondicionado dentro de los Juzgados, en este caso se comienza por el Juzgado 1 civil Municipal.

Dir. obra.
14-Dic-2024
tiempo Sombreado
Personal: 1 Residente de obra, 1 SISO, 2 oficiales, 1 ayudante en actividades de Mantenimiento de cubierta y 2 oficiales en actividades de instalación de ducto tubería aire acondicionados en oficinas Juzgados.
Se continua con la actividad de Mantenimiento de Cubierta realizando reemplazos con cabrava, Manto asfaltico superficial, Cambio unidades de tejas en Mal estado, Reacomodación de tejas desplazadas, limpieza Canales, Tarjas se continua con la actividad de instalación ductería en Juzgado 1 civil Municipal y Juzgado 1 laboral del circuito.

Dir. obra
15-Dic-2024
tiempo Soleado
Personal: Residente obra, 1 SISO, 2 oficiales y 1 ayudante.
Se continua con la actividad de Mantenimiento de Cubierta, se realiza cambio de Caña-

Powered by CamScanner

brava, cambios de Manto asfáltico y cambios de unidades de tejas en mal estado, se culmina con la limpieza de las canales.

Dir. obra.

16-DIC-2024
Tiempo Soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 SISO, 2 oficiales y 1 ayudante para el Mantenimiento de cubierta y 2 oficiales para instalación ductos en etaboard oficinas y Juzgados.
se continua con la actividad de Mantenimiento de cubierta, se realizaron todos los reemplazos pertinentes de caña brava, Manto asfaltico y tejas, el dia de hoy se esta realizando la actividad de impermeabilizacion de la cumbrera en el remate de la limatesa con tela y aplicacion de impermeabilizante acrílico en frio con el fin de sellar todos los posibles existentes a través de todas las cumbreras, esta actividad queda finalizada al termino del dia, quedando así la actividad de Mantenimiento de cubierta realizada en su totalidad En cuanto a la instalación de ductería en etaboard se continua con las oficinas Juzgados civil del Circuito y Juzgado 2 laboral del circuito.

Dir. obra.

17-DIC-2024
DIA Soleado.
Personal: Dir. obra, 1 Residente, 1 SISO, 2 oficiales.

Powered by CamScanner

Se Continua con la instalación de ductos en oficinas Juzgados y Sala, Juzgado 3 civil del circuito y Sala 2.


Dir. obra.
18-Dic-2024
tiempo soleado.
personal: 1 residente de obra, 1 siso, 2 oficiales.
Se continua con la actividad de instalación de ductos en Juzgado 3 civil laboral y sala 1.

Dir. obra.
19-Dic-2024
tiempo soleado
Personal: 1 residente de obra, 1 siso, 2 oficiales.
Se Continua con la actividad de instalación de ductos en eterboard en Juzgado 3 civil Municipal y Juzgado 2 civil Municipal.

Dir. obra
20-Di-2024
tiempo Sombreado.
personal: 1 residente de obra, 1 siso, 2 oficiales.
Se Continua con la instalación de ductos en eterboard Juzgado 2 civil del circuito, quedando así finiquitado todas las instalaciones de acuerdo a Cantidades plasmados en el balance de obra, con esto queda realizado y culminado todas las actividades contemplados en este frente de trabajo, se

Powered by CamScanner

deja el sitio, limpio, se evacuan los basuras y elementos sobrantes durante la ejecución.



Dir. obra.

Powered by CamScanner

INFORME No. 5 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA

CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 082 de 2024
CONTRATISTA: JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ

01 al 30 de diciembre de 2024

Carrera 61 F No. 51 B 33 sur, Bogotá D.C. – Tel Móvil 3017558184 -3017804089
Email: arquitectosconstructoresbog@hotmail.com

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO	082 de 2024
CONTRATANTE	LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA	JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LOS INMUEBLES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CALI "PEDRO ELÍAS SERRANO ABADÍA", JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL DOVIO, PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO", SEDE FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA, EDIFICIO TRANSFERENCIAS, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE OBANDO, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL PALMAR Y PALACIO DE JUSTICIA DE TULUÁ “LIZANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA”
VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (1.887.698.818,00)
FIRMA DEL CONTATO	25 de julio de 2024
PLAZO DE EJECUCION	Ciento ochenta y un (181) días
FECHA DE INICIO	30 de julio de 2024

SUPERVISORES:		
	María Del Socorro Marín Cataño	Coordinador Área Administrativa
	Luis Eduardo Ducuara Celis	Jefe Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura
	Adriana Piedad Bejarano	Jefe Oficina de Servicios de Palmira
	Judith Henao Muñoz	Jefe Oficina de Servicios de Tuluá
	Diego Fernando Ordoñez Velásquez	Jefe Oficina de Servicios de Cartago
	Cesar Augusto Rendón Díaz	Apoyo a la supervisión
	Piedad Lorena Hernández Fernández	Apoyo a la supervisión
	Edwin Reinaldo Cante Cruz	Apoyo a la supervisión

Valle del Cauca

1. OBJETIVO

Describir el informe de actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado con el propósito de cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y técnicos, que permiten la protección de sus trabajadores.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Acto subestándar o inseguro:** Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.
- **Alerta:** acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.
- **Alta Dirección:** Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.
- **Amenaza:** factor de origen natural que afecta a una comunidad ocasionando lesiones a sus integrantes e instalaciones
- **Capacitación:** conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa
- **Contingencia:** evento que puede suceder o no suceder, para el cual se debe estar preparado.
- **Control:** acción encaminada a eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o minimizar sus consecuencias
- **COVID-19:** Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la OrganizaciónMundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII).
- **Emergencia:** estado de alteración parcial o total de las actividades de una empresa, ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente y cuyo control supera la capacidad de respuesta de las personasy organizaciones.
- **Exposición:** Acción de exponer a alguien o algo a los efectos de otros agentes lo cual depende de la cantidad de sustancia o dosis, tiempo de contacto y/o frecuencia.
- **Gestión:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
- **Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional:** Conjunto de acciones, programas y/o proyectos encaminados a controlar y mejorar la seguridad ysalud en el trabajo.
- **Identificación:** Es la acción que permite reconocer los registros y relacionarlos con la actividad involucrada o el proceso del sistema que evidencian.
- **Información:** datos que poseen significado.
- **Manual del Sistema de Gestión:** Documento que especifica el Sistema de Gestión de una organización.
- **Objetivos:** Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
- **Políticas:** Intenciones globales y orientación de una organización relativasa la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
- **Proceso:** Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en resultado.
- **SYSO:** Sistema de gestión para desarrollar la política y gestionar los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional.
- **SGSST:** Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- **SG:** Sigla que significa sistema de gestión

- **SST:** Sigla que significa seguridad y salud en el trabajo
- **Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de daño, en términos de enfermedad o lesión a las personas, o a una combinación de éstos.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
- **Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

3. ALCANCE Y RESPONSABLES

Este Informe aplica para todo el sistema de gestión y niveles de la organización con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la entidad contratante y normatividad legal vigente encabeza de la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 entre otras actualizaciones vigentes.

El Representante legal es responsable de:

- Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión.
- Asegurar que los recursos necesarios para las medidas de bioseguridad y elsistema de gestión estén disponibles.
- Asegurar que se establezcan la política y objetivos del sistema de gestión, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización.
- Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión con los procesos de negocio de la organización. Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y locales para la atención y prevención del COVID-19 en el período de aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno Nacional.
- Implementar las recomendaciones aquí previstas conforme a las condiciones y necesidades de cada uno de los proyectos; garantizando la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas, autoridades, personal de interventoría, supervisión y demás personas que estén presentes en los frentes de obra u operación de los proyectos.
- Promover el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
- importancia de una gestión eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión.
- Asegurar de que el sistema de gestión logre los resultados previstos.
- Liderar el desarrollo e implementación de los sistemas de gestióncomprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión.
- Promover a la mejora.
- Apoyar otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
- Informar al responsable e inspector del SG-SST todo cambio a nivel estructural, físico o actividades que se realicen en los diferentes procesos.

Los responsables del SG-SST, son los encargados de:

- Diseñar, administrar y ejecutar el sistema de gestión de la empresa.
- Identificar los peligros, evaluar los riesgos las actividades de trabajo
- Actualizar la matriz de peligros, establecer medidas de control en conjuntocon las áreas y procesos de la organización.

- Realizar seguimiento a los planes de acción.
- Asesorar a la Gerencia en la implementación del sistema de gestión, así como la intervención y prioridad para la prevención y control de los riesgos.
- Verificar que se cumplan las medidas preventivas y correctivas establecidas en los resultados de las inspecciones de seguridad
- Solicitar el acompañamiento de la ARL para verificar el cumplimiento de lasmedias y acciones adoptadas en su proyecto.
- Reportar cualquier evento de contagio que se presente dentro del desarrollo de las actividades de obra, operación y mantenimiento.

Los colaboradores son responsables de:

- Cumplir todos los procedimientos del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo establecidos por el contratista.
- Informar sobre cualquier condición de salud que le pueda generar restricciones, antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas
- Utilizar las medidas de prevención y protección sean implementadas.
- Reportar oportunamente peligros detectados en el área de trabajo por medio del reporte de actos y condiciones inseguras.
- Participar activamente en las actividades del sistema de gestión en las cuales se vean involucrados.

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El proyecto contempla el mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Departamento del Valle de Cauca, brindando protección de los bienes inmuebles, operatividad y garantizando la integridad de los servidores judiciales y sus visitantes.

4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Valle del Cauca está ubicado, es una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y exportación que por allí se registra.

Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio nacional, su población para el año de 1993 era de 3.474.695 habitantes, para una densidad de 156.9 habitantes por KM2.

El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura promedio, para una altura de 1000m sobre el nivel del mar. La región del litoral pacífico presenta precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año.

El departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de Cali. El 81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las áreas rurales.

Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 22

Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye una de las zonas agrícolas más importantes del país.
Por último, la región de la costa pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. (https://www.cali.gov.co/publico2/laciudad/datoscalivalle.htm)

4.2 SEDES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA A INTERVENIR

SEDE	MUNICIPIO	DIRECCION
Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"	Cali	Carrera 10 No. 12 - 15
Juzgado Promiscuo Municipal del Dovio	El Dovio	Carrera 10 No. 11 - 57
Palacio de Justicia de Palmira "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO"	Palmira	Carrera 23 No. 29 - 09
Edificio Sede de Familia	Palmira	Calle 22 No. 28 A 10
Palacio Nacional	Buenaventura	Calle 3 No. 2 A 35
Edificio de Transferencia	Buenaventura	Calle 9 No. 2 - 21
Juzgado Promiscuo Municipal	Obando	Carrera 2 No. 3 - 25
Juzgado Promiscuo Municipal	San José Del Palmar	Carrera 4 No. 12 - 13
Palacio de Justicia “Lizandro Martínez”	Tuluá	Calle 26 con carrera 27 esquina

4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El contrato de obra contempla varias actividades que conllevan al mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Departamento del Valle de Cauca, con los más altos estándares de calidad tanto eléctrico como obra civil.

4.4 GENERALIDADES DEL SG-SST

Consciente de la importancia de la seguridad y salud en el Trabajo SST y consecuente con la reglamentación legal existente en el país, el contratista. En cabeza de su representante legal, asume la responsabilidad de la planeación y ejecución de las actividades del presente Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SGSST; en todos los campos; condiciones de salud y condiciones de trabajo.

El presente documento corresponde al informe mensual de las actividades desarrolladas y aplicadas a los colaboradores del contratista en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en elTrabajo (SG-SST), como lo son la ley 9 de 1979, resolución 1016 de 1983, resolución 2413 de 1979, la resolución 2400 de 1979, decreto No. 1295 de 1994, ley 1262 de 2012, decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019 entre otros.

5. PERSONAL EN OBRA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

Para el periodo reportado en el informe, se ejecutaron actividades en el Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA", en el Palacio de Justicia de Palmira "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO", Palacio Nacional de Buenaventura, Edificio de Transferencia en Buenaventura y Palacio de Justicia "Lizandro Martínez" de Tuluá. El personal que ejercieron actividades para este periodo es:

NOMBRE	CARGO	SEDE O FRENTE
Julio Ricardo Rojas Hernández	Director de Obra	Todas
Juan José Monsalve Ospina	Residente de Obra Cali	Cali
Carlos Eduardo Guendica	Residente de Obra Palmira	Palmira
Erika Tatiana Cano Leal	Residente SISO Cali	Cali
Paula Andrea Derazo Arango	Residente SISO Palmira	Palmira
Jair Micolta Córdoba	Residente de Obra Buenaventura	Buenaventura
Katherine Mina Vente	Residente SISO Buenaventura	Buenaventura
Eddie Alexandro Calderón Vallejo	Residente de Obra Obando	Cali/Tuluá
Angie Viviana Hurtado López	Residente SISO	Tuluá
José Julián Sepúlveda Guerra	Técnico Electricista	Palmira
José Luis Mesa Rodríguez	Técnico Electricista	Cali
Cesar William Esguerra López	Tecnólogo en Telecomunicaciones	Cali
José Luis Angulo Ramos	Carpintero	Cali/Palmira / Buenaventura
Jhon Jairo Telpud Diaz	Carpintero	Cali/Palmira / Buenaventura
Jaime Arnulfo Rodríguez	Oficial	Cali
Leider Elia Raad Pedrozo	Ayudante	Cali
Giovanny Caro Estrada	Ayudante	Cali
Elkin Darío Caro Estrada	Oficial – Soldador	Palmira
German Alonso Tenorio Navarro	Oficial	Palmira
Rodrigo Toro	Ayudante	Palmira
Carlos Silva Rojas	Ayudante	Palmira
José Zoilo Cáceres Ibarguen	Ayudante	Palmira/Tulua
Uriel Antonio Cáceres Ibarguen	Ayudante	Palmira/Tulua
Juan David Murillo Torres	Ayudante	Palmira/Tulua
Carlos Andrés Ruiz Zapata	Ayudante	Palmira
Alvaro León Barraza	Oficial	Buenaventura
Marlon Stiven Torres Arroyo	Ayudante	Buenaventura
William Palacios Caicedo	Ayudante	Buenaventura
Manuel Tovar Torres	Ayudante	Buenaventura
Dedier Sinisterra Angulo	Ayudante	Buenaventura
Owar Torres Valencia	Ayudante	Buenaventura
Stiven Cuero Cuero	Ayudante	Buenaventura
Orlanto Ortegon	Ayudante	Buenaventura
NO CONTRACTUAL		
Raul Alfonso Rojas Hernández	Director de Proyectos	Todas

David Fernando Correa Moncayo	Red voz y datos	Cali
José Miguel Ossa Ossa	Red voz y datos	Cali
Erminson Ortiz Castrillón	Red voz y datos	Cali
Cristian Gerardo Rivera Jaramillo	Red voz y datos	Cali
Andrés Fernando Barona Fernández	Red voz y datos	Cali
Linner Domínguez Carvajal	Red voz y datos	Palmira

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL SGSST

Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo como medidas de control el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el mes de diciembre de 2024 se han realizado las siguientes actividades:

a) Inducción de Personal

Una vez vinculado el trabajador, se inicia la etapa de inducción a la empresa y puesto de trabajo, para ello se realizan charlas personalizadas con el personal antes de su ingreso e inicio de labores, dejando constancia de esta. Para el mes de diciembre de 2024 se realizó la inducción y reinducción a los trabajadores y subcontratistas quienes recibieron información.

b) Charlas Preoperacionales y Pausas Activas

Enfatizadas en mitigar, controlar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo; previo al desarrollo e inicio de labores mediante charlas de seguridad diarias con una duración de 5 minutos se dan conocer diferentes temas en materia de seguridad y salud en el trabajo, se llevan a cabo una vez se inicien las actividades contempladas en el contrato estatal de obra.

CHARLAS 5 MINUTOS		
Cali	**Palmira**	**Buenaventura**
• Higiene postural. • Riesgo ergonómico. • Trabajo en alturas. • Riesgo químico. Exposiciones, consecuencias. • Trabajo en caliente. • Uso de EPP. • Trabajo en espacios confinados.	• Que son los tableros eléctricos • Prevención de lesiones osteomusculares • Higiene personal • Prevención de enfermedades laborales • Incidentes y accidentes de trabajo	• Buen uso de EPP • Verificación de área laborada • Compañerismo • Movimientos repetitivos • Lesiones osteomusculares

De igual manera se desarrollan pausas activas con base en ejercicios de calistenia a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteo musculares a fin de generar cultura y prevenir el estrés, que permita a los colaboradores recuperar energías garantizando un desempeño eficiente en su trabajo.

Es de resaltar que para dichas actividades deberá asistir todo el personal - oficiales de obra, ayudantes de obra, electricistas, soldador, residentes de obra, director de obra y todo aquel colaborador que intervenga en la misma.

INDUCCION DE PERSONAL Y CHARLAS PREOPERACIONALES	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" – CALI	 
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA	


PAUSAS ACTIVAS	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA	

c) Entrega y cambio de dotación o elementos de protección individual

Conforme al CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Artículo 2.2.1.4.2. Favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido y Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, Literal 5 del DECRETO 1072/2015, se debe suministrar vestido y el calzado necesario para el normal desarrollo de las labores de trabajo, por lo tanto, se realiza la entrega de la dotación y elementos de protección individual necesarios para el desarrollo de las labores, a los diferentes colaboradores que participan en las actividades quedando como registro el acta de entrega de dotación y Epp's

d) Inspección de dotación Elementos de protección personal

Se realiza la correspondiente inspección a los elementos de protección individual entregado al personal de la obra, a través de observación directa verifica las condiciones.

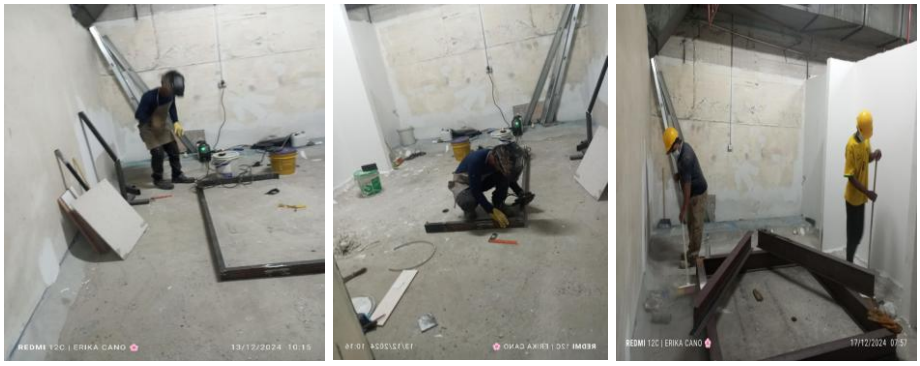USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BJARANO" – PALMIRA	

PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TANSFERENCIA	    

e) Inspección de equipos de emergencia

Garantizando las actividades tendientes a prestar la primera atención o primero auxilios a los trabajadores en caso de accidentes e incidentes de trabajo o eventualidades de emergencias, se realizó inspección a los elementos de emergencias los cuales son inspeccionados mensualmente, dicha inspección será plasmada en el formato “inspección de equipos de emergencia” por la profesional SST


EQUIPOS DE EMERGENCIA	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	  


PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	  
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA	 


f) Inspección de Herramientas y elementos de trabajo


Se realizan las correspondientes inspecciones semanales a las herramientas y elementos de trabajo a cargo del personal de la obra, dicha inspección se plasmada en el formato "inspección de herramientas" por la profesional SST quien a través de observación directa verificaron condiciones.


INSPECCION DE HERRAMIENTAS	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	 

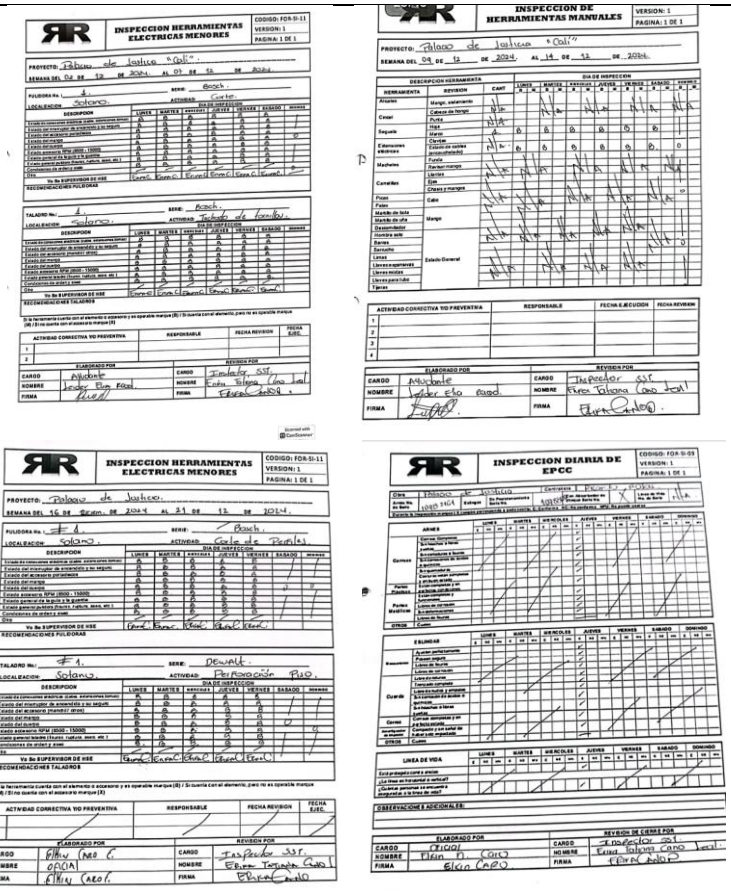
	
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	

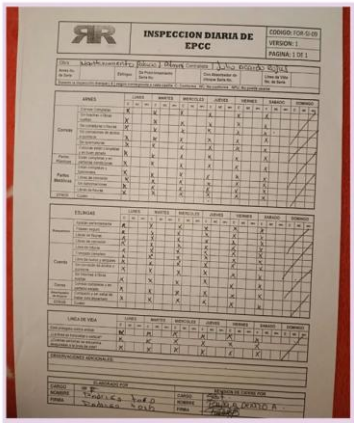



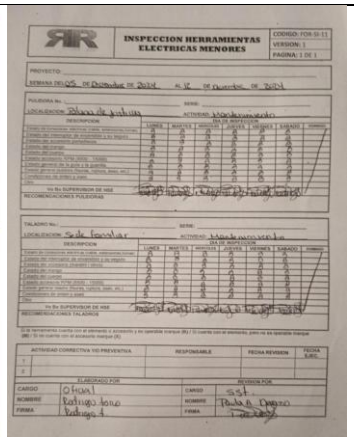

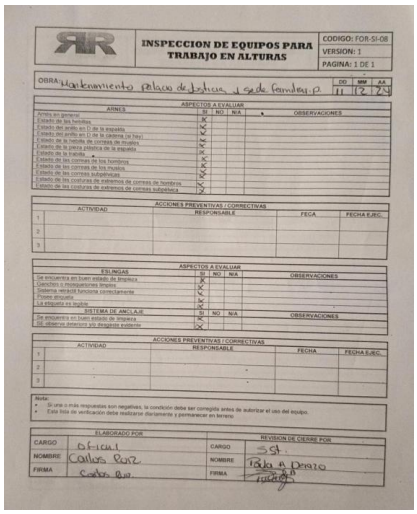

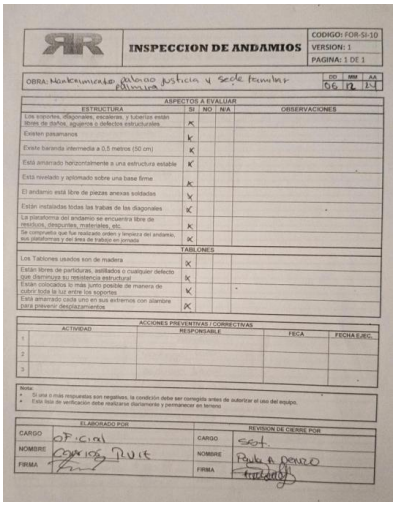


g) Inspección a puestos de trabajo

Se realizan inspecciones a los diferentes puestos de trabajo, con la finalidad de identificar los Peligros y Riesgos a los cuales pueden llegar a estar expuestos los trabajadores y así mismo implementar medidas de control para minimizar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo.

h) Señalización y demarcación de áreas de trabajo

Como medida preventiva y teniendo en cuenta las condiciones locativas de la obra se realiza la ubicación de señalización a fin de prevenir a los usuarios sobre la existencia de riesgos o situaciones especiales, de igual manera se restringe el paso de personal, se realiza la señalización de zonas de intervención a fin de evitar accidentes y eventualidades con la comunidad educativa.

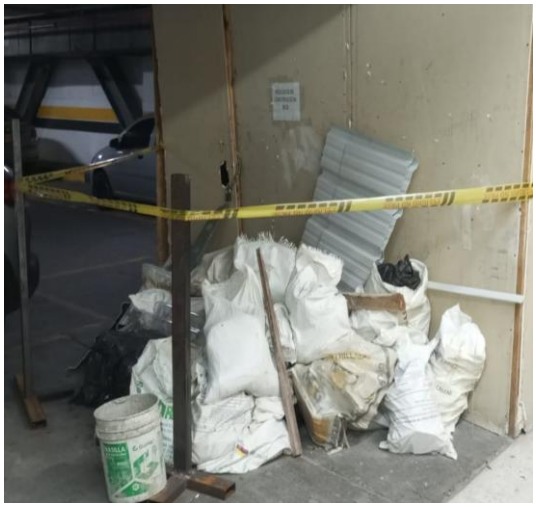SEÑALIZACION Y DEMARCACION	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	 
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA	

i) Inducción de Bioseguridad al Personal

Se realizará inducción a todo el personal antes de iniciar labores, basado en el Protocolo de Bioseguridad el cual fue diseñado para el trabajo en zonas de construcción, antes, durante y después de la labor, garantizando las acciones y medidas de seguridad en las actividades de construcción con el fin de contribuir con la disminución de propagación y contagio del COVID-19.

j) Disposición de residuos de bioseguridad.

La clasificación y disposición de residuos se realizan de acuerdo a los materiales usados, al inicio y final de las labores por todo el personal de obra en las zonas o centros de acopio y punto ecológico.

7. NOVEDADES DE PERSONAL (INGRESO, AUSENCIAS E INCAPACIDADES)

7.1 Ausencias

7.2.1. Enfermedad General: No se presentaron

7.2.2. Accidente trabajo: No se presentaron

7.2 Afiliaciones de ley y Seguridad social

El Residente SST y la Dirección Administrativa consultan en el FOSYGA y RUAF las entidades donde han estado afiliados los trabajadores y con base en dicha información realizar las respectivas afiliaciones de ley, si hay lugar a ello:

- ARL (Administradora de riesgos laborales)
- EPS (Entidad Promotora de Salud)
- AFP (Administradora de Fondos de Pensión)
- CF (Caja de Compensación Familiar)

De igual manera y de acuerdo con los reportes mensuales de novedades de personal, en las fechas establecidas se realizarán los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal del personal vinculado con el contratista en pro de garantizar el acceso de los trabajadores a los beneficios y cobertura de dicho sistema.

Relación de seguridad social personal de obra diciembre 2024


PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO	SEDE
Julio Ricardo Rojas Hernández	$ 208.000	$ 162.500	$ 90.500	$ 26.000	9479446581	30/12/2024	Todas
Juan José Monsalve Ospina	$ 208.000	$ 162.500	$ 90.500	$ 0,00	9479448507	23/01/2025	Cali
Carlos Eduardo Guendica	$ 384.000	$ 300.000	$ 90.500	$ 0,00	1068690999	16/12/2024	Palmira
Erika Tatiana Cano Leal	$ 326.400	$ 81.600	$ 142.000	$ 81.600	9480657824	23/01/2025	Cali
Paula Andrea Derazo Arango	$ 326.400	$ 81.600	$ 142.000	$ 81.600	9480657824	23/01/2025	Palmira
Jair Micolta Córdoba	$ 208.000	$ 162.500	$ 90.500	$ 0,00	9479508670	23/01/2025	Buenaventura
Katherine Mina Vente	$ 208.000	$ 162.500	$ 90.500	$ 0,00	1069306937	04/01/2025	Buenaventura
Eddie Alexandro Calderón Vallejo	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52,000	9480657824	23/01/2025	Cali/Tuluá


Angie Viviana Hurtado López	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52,000	9479878391	03/01/2025	Tuluá
José Julián Sepúlveda Guerra	$ 208.000	$ 162.500	$ 90.500	$ 0,00	1068079171	08/01/2025	Palmira
José Luis Mesa Rodríguez	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480378195	17/01/2025	Cali
Cesar William Esguerra López	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480378195	17/01/2025	Cali
José Luis Angulo Ramos	$ 208.000	$ 162.500	$ 90.500	$ 0,00	1069789615	16/01/2025	Buenaventura
Jaime Arnulfo Rodríguez	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480657824	23/01/2025	Cali
Jhon Jairo Diaz Telpud	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480657824	23/01/2025	Buenaventura
Leider Elia Raad Pedrozo	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480657824	23/01/2025	Cali
Giovanny Caro Estrada	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480657824	23/01/2025	Cali
Elkin Darío Caro Estrada	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480657824	23/01/2025	Palmira
German Alonso Tenorio Navarro	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480657824	23/01/2025	Palmira
Rodrigo Toro	$ 138.700	$ 34.700	$ 60.400	$ 42.700	9480657824	23/01/2025	Palmira
Carlos Silva Rojas	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480657824	23/01/2025	Palmira
José Zoilo Cáceres Ibarguen	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480657824	23/01/2025	Palmira/Tuluá
Uriel Antonio Cáceres Ibarguen	$ 138.700	$ 34.700	$ 60.400	$ 42.700	9480657824	23/01/2025	Palmira/Tuluá
Juan David Murillo Torres	$ 145.600	$ 36.400	$ 63.400	$ 44.800	9480657824	23/01/2025	Palmira/Tuluá
Carlos Andres Ruiz Zapata	$ 124.800	$ 31.200	$ 54.300	$ 34.400	9480657824	23/01/2025	Palmira
Alvaro León Barraza	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480657824	23/01/2025	Buenaventura
Marlon Stiven Torres Arroyo	$ 166.400	$ 41.600	$ 72.400	$ 43.400	9480657824	23/01/2025	Buenaventura
Dedier Sinisterra Angulo	$ 76.300	$ 19.100	$ 33.200	$ 19.900	9480657824	23/01/2025	Buenaventura
Owar Torres Valencia	$ 138.700	$ 34.700	$ 60.400	$ 42.700	9480657824	23/01/2025	Buenaventura
Stiven Cuero Cuero	$ 83.200	$ 20.800	$ 36.200	$ 21.700	9480657824	23/01/2025	Buenaventura
Orlanto Ortegon	$ 20.800	$ 5.200	$ 9.100	$ 5.500	9480657824	23/01/2025	Buenaventura
NO CONTRACTUAL							
Raul Alfonso Rojas Hernández	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9479755561	30/12/2024	Todas
David Fernando Correa Moncayo	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480378195	17/01/2025	Cali
José Miguel Ossa Ossa	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480378195	17/01/2025	Cali
Erminson Ortiz Castrillón	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480378195	17/01/2025	Cali
Cristian Gerardo Rivera Jaramillo	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480378195	17/01/2025	Cali
Andrés Fernando Barona Fernández	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	9480378195	17/01/2025	Cali
Linner Domínguez Carvajal	$ 208.000	$ 162.500	$ 90.500	$ 0,00	1068883805	16/01/2025	Palmira

8. GESTIÓN AMBIENTAL

8.1 Jornada de Aseo y disposición de residuos de obra


Se realizarán jornadas de aseo y clasificación de materiales, las cuales se desarrollan al inicio y final de las labores, limpieza y adecuación de bodega de almacenamiento de materiales a fin de garantizar y mantener en buenas condiciones las diferentes locaciones de la obra.

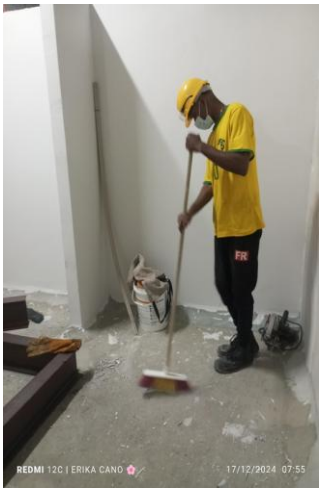ORDEN Y ASEO	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	 
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA	 

7.1 Punto ecológico

Se cuenta con puntos Ecológicos en cada frente de obra, con la finalidad de mantener un buen manejo de residuos y así promover el orden y aseo en obra, dando a conocer a los trabajadores la ubicación del punto y brindándoles la información sobre el buen manejo y separación de residuos de obra.

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	***PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA***	***PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA***
		
	 Se realiza retiro total de los desperdicios (no escombro)	Escombro reutilizado como relleno para colaborante de nivelación de parqueadero 

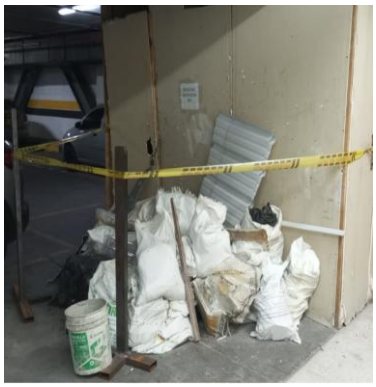
9. ANALISIS SEGURO DE TRABAJO – AST

Los permisos de trabajo son obligatorios en los procesos en los cuales se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea, para ello se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. El Análisis de Seguridad en la Tarea (AST) tiene como finalidad realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de la empresa.

AST SEDE PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" – CALI





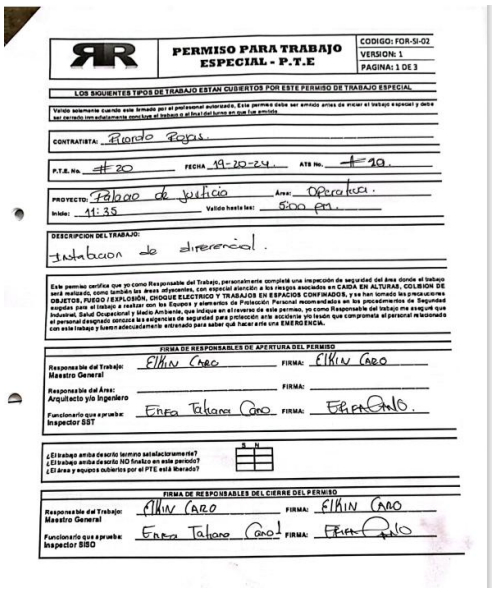

PERMISO PARA TRABAJO ESPECIAL - P.T.E

CODIGO: FOR-SI-02
VERSION: 1
PAGINA: 1 DE 3

LOS SIGUIENTES TIPOS DE TRABAJO ESTAN CUBIERTOS POR ESTE PERMISO DE TRABAJO ESPECIAL

Valido solamente cuando este firmado por el personal autorizado. Este permiso debe ser emitido antes de iniciar el trabajo especial y debe ser cerrado inmediatamente cuando el trabajo o el final del turno en que fue emitido

CONTRATISTA: Ricardo Rojas.

P.T.E. No. # 20 FECHA 19-20-24. ATS No. # 19.

PROYECTO: Palacio de justicia Area: Operativa.

Inicio: 11:35 Valido hasta las: 6:00 pm.

DESCRIPCION DEL TRABAJO:
Instalacion de diferencial.

Este permiso certifica que yo como Responsable del Trabajo, personalmente completé una inspección de seguridad del área donde el trabajo será realizado, como también las áreas adyacentes, con especial atención a los riesgos asociados en CAIDA EN ALTURAS, COLISION DE OBJETOS, FUEGO / EXPLOSIÓN, CHOQUE ELECTRICO Y TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS, y se han tomado las precauciones exigidas para el trabajo a realizar con los Equipos y elementos de Protección Personal recomendados en los procedimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, que indique en el reverso de este permiso, yo como Responsable del trabajo me aseguré que el personal designado conozca las exigencias de seguridad para protección ante accidente y/o lesión que comprometa el personal relacionado con este trabajo y bueno adecuadamente entrenado para saber qué hacer ante una EMERGENCIA.

FIRMA DE RESPONSABLES DE APERTURA DEL PERMISO

Responsable del Trabajo: Maestro General: ELKIN CARO FIRMA: ELKIN CARO

Responsable del Área: Arquitecto y/o Ingeniero FIRMA:


Funcionario que aprueba: Inspector SST: Erika Tatiana Cano FIRMA:



¿El trabajo arriba descrito termino satisfactoriamente? S N
¿El trabajo arriba descrito NO finalizo en este periodo?
¿El área y equipos quedaron por el PTE está liberado?

FIRMA DE RESPONSABLES DEL CIERRE DEL PERMISO

Responsable del Trabajo: Maestro General: ELKIN CARO FIRMA: ELKIN CARO

Funcionario que aprueba: Inspector SISO: Erika Tatiana Cano FIRMA:

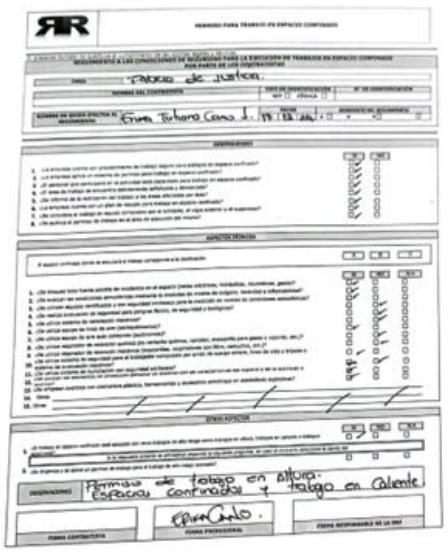


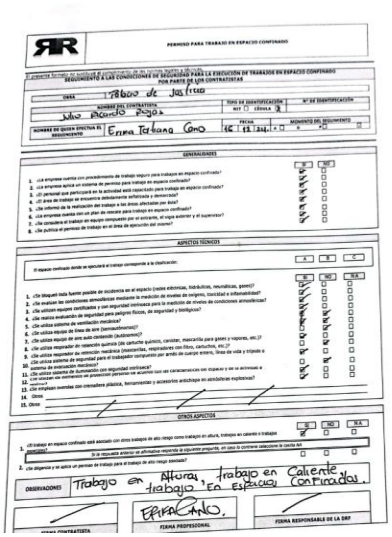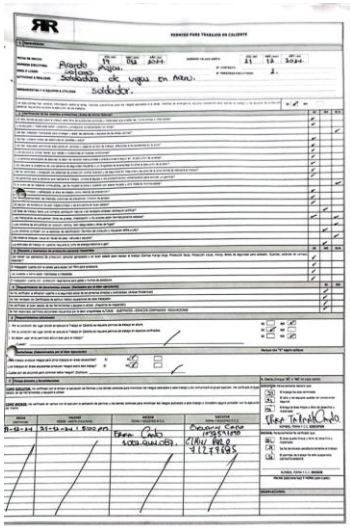



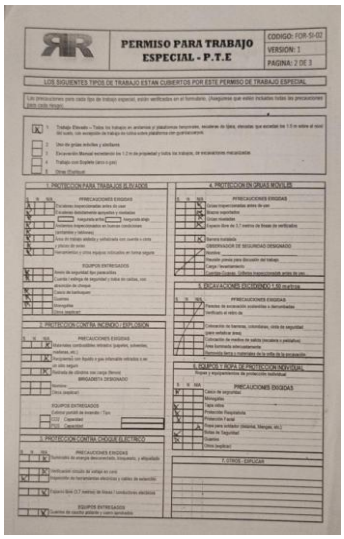

AST PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA






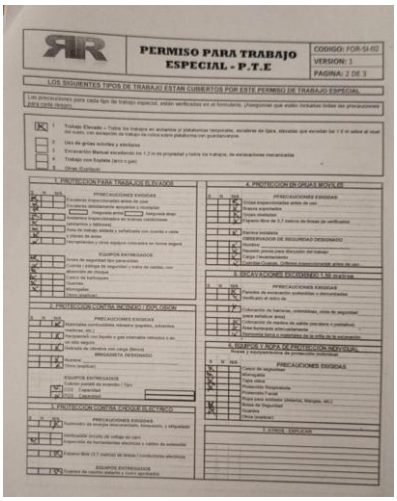

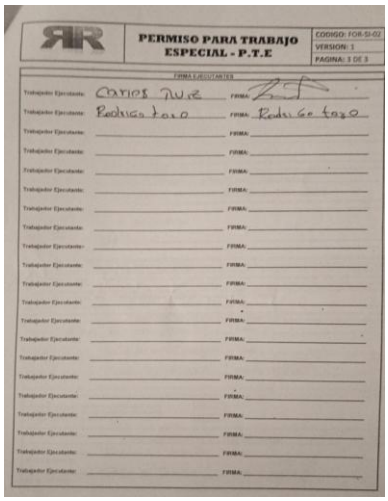


PERMISO PARA TRABAJO ESPECIAL - P.T.E
CODIGO: FOR-SI-02
VERSION: 1
PAGINA: 2 DE 3


PERMISO PARA TRABAJO ESPECIAL - P.T.E
CODIGO: FOR-SI-02
VERSION: 1
PAGINA: 3 DE 3


SAOS ALTURAS SAS
NIT 901.725.447-9
JOSE ZOILO CACERES BARGUEN
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

SAOS ALTURAS SAS
NIT 901.725.447-9
URIEL ANTONIO CACERES BARGUEN
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO


AST PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA









PERMISO PARA TRABAJO ESPECIAL - P.T.E
CODIGO: FOR-SI-02
VERSION: 1
PAGINA: 1 DE 3

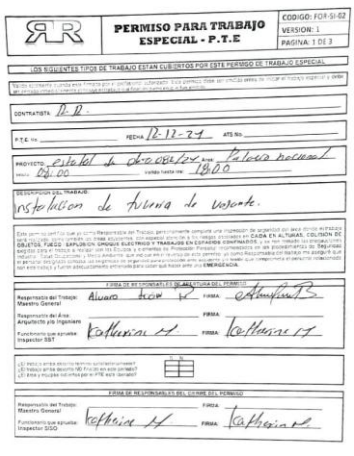
PERMISO PARA TRABAJO ESPECIAL - P.T.E
CODIGO: FOR-SI-02
VERSION: 1
PAGINA: 1 DE 3

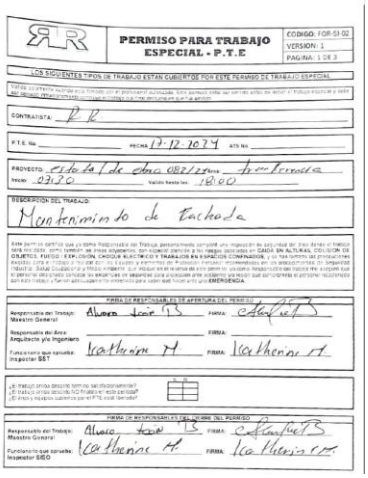
PERMISO PARA TRABAJO ESPECIAL - P.T.E
CODIGO: FOR-SI-02
VERSION: 1
PAGINA: 1 DE 3


SAOS ALTURAS SAS
NIT 901.725.447-9
CONSECUTIVO
TSA - 3700
CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS
OTORGADO A:
ALVARO LEON BARRAZA
IDENTIFICADO CON C.C. N° 1002422428
CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO
CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (32) HORAS


SAOS ALTURAS SAS
NIT 901.725.447-9
CONSECUTIVO
TSA - 3702
CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS
OTORGADO A:
MARLON STIVEN TORRES ARROYO
IDENTIFICADO CON C.C. N° 1006195369
CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO
CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (32) HORAS


SAOS ALTURAS SAS
NIT 901.725.447-9
CONSECUTIVO
TSA - 3708
CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS
OTORGADO A:
RODOLFO CACERES IBARGUEN
IDENTIFICADO CON C.C. N° 1192273
CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO
CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

10. CONCLUSIONES

Se logró identificar que los empleados comienzan a datar una cultura más amena en el área sistema de salud y seguridad, puesto que se ha suministrado capacitaciones para que estos puedan tener una concientización de los peligros o riesgos a los que están expuestos día tras día en sus labores. En este mismo orden de ideas, se continuará suministrando charlas periódicas que contribuyan en el mejoramiento y mitigación de riesgos asociados a las actividades

Cordialmente,

Residente Siso Palmira
PAULA ANDREA DERAZO ARANGO
C.C. No. 29.679.146 de Palmira
Tecnóloga en Higiene y Seguridad Industrial
Resolución No. 6120 del 28/10/2019, de la Secretaria de Salud del Atlántico

Residente Siso Cali
ERIKA TATIANA CANO LEAL
C.C. No. 1.002.944.087 de Viterbo (Caldas)
Tecnóloga en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Resolución No. 1036 del 03/05/2021, de la Secretaria de Salud del Tolima

Residente Siso Buenaventura
KATHERINE MINA VENTO
C.C. No. 1.111.785.465 de Buenaventura
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución No.0026 del 27/04/2021, de la Secretaria de Salud Distrital de Buenaventura

Director de Obra
JULIO RICARD ROJAS HERNANDEZ
C.C. No. 79.356.655 de Bogotá
Arquitecto MP No. 25700-57909CND
Especialista en Medio Ambiente y Desarrollo Local

INFORME No. 6 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA

CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 082 de 2024
CONTRATISTA: JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ

01 al 31 de enero de 2025

Carrera 61 F No. 51 B 33 sur, Bogotá D.C. – Tel Móvil 3017558184 -3017804089
Email: arquitectosconstructoresbog@hotmail.com

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO	082 de 2024
CONTRATANTE	LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA	JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LOS INMUEBLES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CALI "PEDRO ELÍAS SERRANO ABADÍA", JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL DOVIO, PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO", SEDE FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA, EDIFICIO TRANSFERENCIAS, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE OBANDO, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL PALMAR Y PALACIO DE JUSTICIA DE TULUÁ “LIZANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA”
VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (1.887.698.818,00)
FIRMA DEL CONTATO	25 de julio de 2024
PLAZO DE EJECUCION	Doscientos seis días (206) días
FECHA DE INICIO	30 de julio de 2024

SUPERVISORES:		
	María Del Socorro Marín Cataño	Coordinador Área Administrativa
	Luis Eduardo Ducuara Celis	Jefe Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura
	Adriana Piedad Bejarano	Jefe Oficina de Servicios de Palmira
	Judith Henao Muñoz	Jefe Oficina de Servicios de Tuluá
	Diego Fernando Ordoñez Velásquez	Jefe Oficina de Servicios de Cartago
	Cesar Augusto Rendón Díaz	Apoyo a la supervisión
	Piedad Lorena Hernández Fernández	Apoyo a la supervisión
	Edwin Reinaldo Cante Cruz	Apoyo a la supervisión

Valle del Cauca

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL

1. OBJETIVO

Describir el informe de actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado con el propósito de cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y técnicos, que permiten la protección de sus trabajadores.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Acto subestándar o inseguro:** Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.
- **Alerta:** acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.
- **Alta Dirección:** Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.
- **Amenaza:** factor de origen natural que afecta a una comunidad ocasionando lesiones a sus integrantes e instalaciones
- **Capacitación:** conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa
- **Contingencia:** evento que puede suceder o no suceder, para el cual se debe estar preparado.
- **Control:** acción encaminada a eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o minimizar sus consecuencias
- **COVID-19:** Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la OrganizaciónMundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII).
- **Emergencia:** estado de alteración parcial o total de las actividades de una empresa, ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente y cuyo control supera la capacidad de respuesta de las personasy organizaciones.
- **Exposición:** Acción de exponer a alguien o algo a los efectos de otros agentes lo cual depende de la cantidad de sustancia o dosis, tiempo de contacto y/o frecuencia.
- **Gestión:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
- **Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional:** Conjunto de acciones, programas y/o proyectos encaminados a controlar y mejorar la seguridad ysalud en el trabajo.
- **Identificación:** Es la acción que permite reconocer los registros y relacionarlos con la actividad involucrada o el proceso del sistema que evidencian.
- **Información:** datos que poseen significado.
- **Manual del Sistema de Gestión:** Documento que especifica el Sistema de Gestión de una organización.
- **Objetivos:** Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
- **Políticas:** Intenciones globales y orientación de una organización relativasa la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
- **Proceso:** Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en resultado.
- **SYSO:** Sistema de gestión para desarrollar la política y gestionar los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional.
- **SGSST:** Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- **SG:** Sigla que significa sistema de gestión

- **SST:** Sigla que significa seguridad y salud en el trabajo
- **Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de daño, en términos de enfermedad o lesión a las personas, o a una combinación de éstos.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
- **Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

3. ALCANCE Y RESPONSABLES

Este Informe aplica para todo el sistema de gestión y niveles de la organización con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la entidad contratante y normatividad legal vigente encabeza de la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 entre otras actualizaciones vigentes.

El Representante legal es responsable de:

- Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión.
- Asegurar que los recursos necesarios para las medidas de bioseguridad y elsistema de gestión estén disponibles.
- Asegurar que se establezcan la política y objetivos del sistema de gestión, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización.
- Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión con los procesos de negocio de la organización. Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y locales para la atención y prevención del COVID-19 en el período de aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno Nacional.
- Implementar las recomendaciones aquí previstas conforme a las condiciones y necesidades de cada uno de los proyectos; garantizando la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas, autoridades, personal de interventoría, supervisión y demás personas que estén presentes en los frentes de obra u operación de los proyectos.
- Promover el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
- importancia de una gestión eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión.
- Asegurar de que el sistema de gestión logre los resultados previstos.
- Liderar el desarrollo e implementación de los sistemas de gestióncomprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión.
- Promover a la mejora.
- Apoyar otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
- Informar al responsable e inspector del SG-SST todo cambio a nivel estructural, físico o actividades que se realicen en los diferentes procesos.

Los responsables del SG-SST, son los encargados de:

- Diseñar, administrar y ejecutar el sistema de gestión de la empresa.
- Identificar los peligros, evaluar los riesgos las actividades de trabajo
- Actualizar la matriz de peligros, establecer medidas de control en conjuntocon las áreas y procesos de la organización.

- Realizar seguimiento a los planes de acción.
- Asesorar a la Gerencia en la implementación del sistema de gestión, así como la intervención y prioridad para la prevención y control de los riesgos.
- Verificar que se cumplan las medidas preventivas y correctivas establecidas en los resultados de las inspecciones de seguridad
- Solicitar el acompañamiento de la ARL para verificar el cumplimiento de lasmedias y acciones adoptadas en su proyecto.
- Reportar cualquier evento de contagio que se presente dentro del desarrollo de las actividades de obra, operación y mantenimiento.

Los colaboradores son responsables de:

- Cumplir todos los procedimientos del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo establecidos por el contratista.
- Informar sobre cualquier condición de salud que le pueda generar restricciones, antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas
- Utilizar las medidas de prevención y protección sean implementadas.
- Reportar oportunamente peligros detectados en el área de trabajo por medio del reporte de actos y condiciones inseguras.
- Participar activamente en las actividades del sistema de gestión en las cuales se vean involucrados.

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El proyecto contempla el mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Departamento del Valle de Cauca, brindando protección de los bienes inmuebles, operatividad y garantizando la integridad de los servidores judiciales y sus visitantes.

4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Valle del Cauca está ubicado, es una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y exportación que por allí se registra.

Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio nacional, su población para el año de 1993 era de 3.474.695 habitantes, para una densidad de 156.9 habitantes por KM2.

El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura promedio, para una altura de 1000m sobre el nivel del mar. La región del litoral pacífico presenta precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año.

El departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de Cali. El 81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las áreas rurales.

Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 22

Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye una de las zonas agrícolas más importantes del país.

Por último, la región de la costa pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. (https://www.cali.gov.co/publico2/laciudad/datoscalivalle.htm)

4.2 SEDES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA A INTERVENIR

SEDE	MUNICIPIO	DIRECCION
Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"	Cali	Carrera 10 No. 12 - 15
Juzgado Promiscuo Municipal del Dovio	El Dovio	Carrera 10 No. 11 - 57
Palacio de Justicia de Palmira "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO"	Palmira	Carrera 23 No. 29 - 09
Edificio Sede de Familia	Palmira	Calle 22 No. 28 A 10
Palacio Nacional	Buenaventura	Calle 3 No. 2 A 35
Edificio de Transferencia	Buenaventura	Calle 9 No. 2 - 21
Juzgado Promiscuo Municipal	Obando	Carrera 2 No. 3 - 25
Juzgado Promiscuo Municipal	San José Del Palmar	Carrera 4 No. 12 - 13
Palacio de Justicia “Lizandro Martínez”	Tuluá	Calle 26 con carrera 27 esquina

4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El contrato de obra contempla varias actividades que conllevan al mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Departamento del Valle de Cauca, con los más altos estándares de calidad tanto eléctrico como obra civil.

4.4 GENERALIDADES DEL SG-SST

Consciente de la importancia de la seguridad y salud en el Trabajo SST y consecuente con la reglamentación legal existente en el país, el contratista. En cabeza de su representante legal, asume la responsabilidad de la planeación y ejecución de las actividades del presente Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SGSST; en todos los campos; condiciones de salud y condiciones de trabajo.

El presente documento corresponde al informe mensual de las actividades desarrolladas y aplicadas a los colaboradores del contratista en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en elTrabajo (SG-SST), como lo son la ley 9 de 1979, resolución 1016 de 1983, resolución 2413 de 1979, la resolución 2400 de 1979, decreto No. 1295 de 1994, ley 1262 de 2012, decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019 entre otros.

5. PERSONAL EN OBRA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

Para el periodo reportado en el informe, se ejecutaron actividades en el Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA", en el Palacio de Justicia de Palmira "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO", Palacio Nacional de Buenaventura, Edificio de Transferencia en Buenaventura y Juzgado Promiscuo Municipal del Dovio. El personal que ejercieron actividades para este periodo es:

NOMBRE	CARGO	SEDE O FRENTE
Julio Ricardo Rojas Hernández	Director de Obra	Todas
Juan José Monsalve Ospina	Residente de Obra Cali	Cali
Erika Tatiana Cano Leal	Residente SISO Cali	Cali
Paula Andrea Derazo Arango	Residente SISO Palmira	Palmira
Jair Micolta Córdoba	Residente de Obra Buenaventura	Buenaventura
Katherine Mina Vente	Residente SISO Buenaventura	Buenaventura
Eddie Alexandro Calderón Vallejo	Residente de Obra Obando	Cali/Tuluá
Angie Viviana Hurtado López	Residente SISO	Tuluá
José Julián Sepúlveda Guerra	Técnico Electricista	Palmira
José Luis Mesa Rodríguez	Técnico Electricista	Cali
Cesar William Esguerra López	Tecnólogo en Telecomunicaciones	Cali
José Luis Angulo Ramos	Carpintero	Cali/Palmira / Buenaventura
Jhon Jairo Diaz Telpud	Carpintero	Cali/Palmira / Buenaventura
Jaime Arnulfo Rodríguez	Oficial	Cali
Alvaro León Barraza	Oficial	Buenaventura
German Alonso Tenorio Navarro	Oficial	Palmira/Dovio
Elkin Darío Caro Estrada	Oficial	Palmira/Dovio
Giovanny Caro Estrada	Ayudante	Cali
Leider Elia Raad Pedrozo	Ayudante	Cali
Carlos Silva Rojas	Ayudante	Palmira
José Zoilo Cáceres Ibarguen	Ayudante	Palmira
Luis Felipe Perez Gamba	Ayudante	Palmira
Jairo Hernández Osorio	Ayudante	Palmira
Marlon Stiven Torres Arroyo	Ayudante	Buenaventura
William Palacios Caicedo	Ayudante	Buenaventura
Manuel Tovar Torres	Ayudante	Buenaventura
Jhon Edison Tepu	Ayudante	Buenaventura
NO CONTRACTUAL		
Raul Alfonso Rojas Hernández	Director de Proyectos	Todas
David Fernando Correa Moncayo	Red voz y datos	Cali
Erminson Ortiz Castrillón	Red voz y datos	Cali
Linner Domínguez Carvajal	Red voz y datos	Palmira

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL SGSST

Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo como medidas de control el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el mes de enero de 2025 se han realizado las siguientes actividades:

a) Inducción de Personal

Una vez vinculado el trabajador, se inicia la etapa de inducción a la empresa y puesto de trabajo, para ello se realizan charlas personalizadas con el personal antes de su ingreso e inicio de labores, dejando constancia de esta. Para el mes de enero de 2025 se realizó la inducción y reinducción a los trabajadores y subcontratistas quienes recibieron información.

b) Charlas Preoperacionales y Pausas Activas


Enfatizadas en mitigar, controlar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo; previo al desarrollo e inicio de labores mediante charlas de seguridad diarias con una duración de 5 minutos se dan conocer diferentes temas en materia de seguridad y salud en el trabajo, se llevan a cabo una vez se inicien las actividades contempladas en el contrato estatal de obra.

CHARLAS 5 MINUTOS		
Cali	**Palmira**	**Buenaventura**
• Reinducción al cargo • Socialización de ATS • Uso adecuado de EPP • Exposición a trabajo con sustancias químicas • Manejo adecuado de las herramientas • Trabajo sobre escaleras	• Cumplimiento en el lugar de trabajo • Armado correcto de andamios • Uso de líneas de vida • Orden y aseo • Señalización de las zonas • Riesgo publico	• Buen uso de EEP • Autocuidado

De igual manera se desarrollan pausas activas con base en ejercicios de calistenia a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteo musculares a fin de generar cultura y prevenir el estrés, que permita a los colaboradores recuperar energías garantizando un desempeño eficiente en su trabajo.

Es de resaltar que para dichas actividades deberá asistir todo el personal - oficiales de obra, ayudantes de obra, electricistas, soldador, residentes de obra, director de obra y todo aquel colaborador que intervenga en la misma.

INDUCCION DE PERSONAL Y CHARLAS PREOPERACIONALES	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" – CALI	

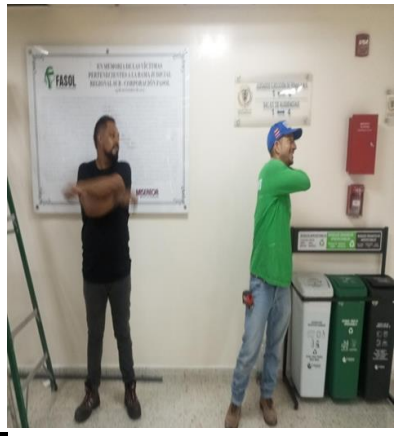PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA	
PAUSAS ACTIVAS	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	 

	
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA	


c) Entrega y cambio de dotación o elementos de protección individual

Conforme al CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Artículo 2.2.1.4.2. Favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido y Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, Literal 5 del DECRETO 1072/2015, se debe suministrar vestido y el calzado necesario para el normal desarrollo de las labores de trabajo, por lo tanto, se realiza la entrega de la dotación y elementos de protección individual necesarios para el desarrollo de las labores, a los diferentes colaboradores que participan en las actividades quedando como registro el acta de entrega de dotación y Epp's

d) Inspección de dotación Elementos de protección personal

Se realiza la correspondiente inspección a los elementos de protección individual entregado al personal de la obra, a través de observación directa verifica las condiciones.

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	 
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BJARANO" – PALMIRA	

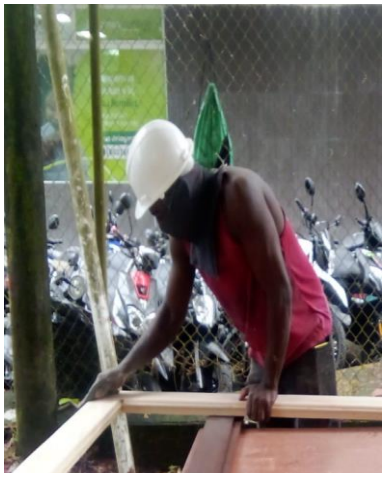PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TANSFERENCIA	  

e) Inspección de equipos de emergencia

Garantizando las actividades tendientes a prestar la primera atención o primero auxilios a los trabajadores en caso de accidentes e incidentes de trabajo o eventualidades de emergencias, se realizó inspección a los elementos de emergencias los cuales son inspeccionados mensualmente, dicha inspección será plasmada en el formato "inspección de equipos de emergencia" por la profesional SST

EQUIPOS DE EMERGENCIA	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	  
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	  

PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA	 

f) Inspección de Herramientas y elementos de trabajo

Se realizan las correspondientes inspecciones semanales a las herramientas y elementos de trabajo a cargo del personal de la obra, dicha inspección se plasmada en el formato “inspección de herramientas” por la profesional SST quien a través de observación directa verificaron condiciones.

INSPECCION DE HERRAMIENTAS	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	 
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	

g) Inspección a puestos de trabajo

Se realizan inspecciones a los diferentes puestos de trabajo, con la finalidad de identificar los Peligros y Riesgos a los cuales pueden llegar a estar expuestos los trabajadores y así mismo implementar medidas de control para minimizar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo.

h) Señalización y demarcación de áreas de trabajo

Como medida preventiva y teniendo en cuenta las condiciones locativas de la obra se realiza la ubicación de señalización a fin de prevenir a los usuarios sobre la existencia de riesgos o situaciones especiales, de igual manera se restringe el paso de personal, se realiza la señalización de zonas de intervención a fin de evitar accidentes y eventualidades con la comunidad educativa.

SEÑALIZACION Y DEMARCACION	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	

PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TANSFERENCIA	

i) Inducción de Bioseguridad al Personal

Se realizará inducción a todo el personal antes de iniciar labores, basado en el Protocolo de Bioseguridad el cual fue diseñado para el trabajo en zonas de construcción, antes, durante y después de la labor, garantizando las acciones y medidas de seguridad en las actividades de construcción con el fin de contribuir con la disminución de propagación y contagio del COVID-19.

j) Disposición de residuos de bioseguridad.

La clasificación y disposición de residuos se realizan de acuerdo a los materiales usados, al inicio y final de las labores por todo el personal de obra en las zonas o centros de acopio y punto ecológico.

7. NOVEDADES DE PERSONAL (INGRESO, AUSENCIAS E INCAPACIDADES)

7.1 Ausencias

7.2.1. Enfermedad General: No se presentaron

7.2.2. Accidente trabajo: No se presentaron

7.2 Afiliaciones de ley y Seguridad social

El Residente SST y la Dirección Administrativa consultan en el FOSYGA y RUAF las entidades donde han estado afiliados los trabajadores y con base en dicha información realizar las respectivas afiliaciones de ley, si hay lugar a ello:

- ARL (Administradora de riesgos laborales)
- EPS (Entidad Promotora de Salud)
- AFP (Administradora de Fondos de Pensión)
- CF (Caja de Compensación Familiar)

De igual manera y de acuerdo con los reportes mensuales de novedades de personal, en las fechas establecidas se realizarán los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal del personal vinculado con el contratista en pro de garantizar el acceso de los trabajadores a los beneficios y cobertura de dicho sistema.



Relación de seguridad social personal de obra enero 2025

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO	SEDE
Julio Ricardo Rojas Hernández	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 28.500	9480841003	17/02/2025	Todas
Juan José Monsalve Ospina	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0,00	9480840408	17/02/2025	Cali
Erika Tatiana Cano Leal	$ 326.400	$ 81.600	$ 142.000	$ 81.600	9481738318	17/02/2025	Cali
Paula Andrea Derazo Arango	$ 326.400	$ 81.600	$ 142.000	$ 81.600	9481738318	17/02/2025	Palmira
Jair Micolta Córdoba	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0,00	9480974023	17/02/2025	Buenaventura
Katherine Mina Vente	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0,00	1070136254	05/02/2025	Buenaventura
Eddie Alexandro Calderón Vallejo	$ 227.800	$ 80.000	$ 139.500	$ 80,000	9481738318	17/02/2025	Palmira/Dovio
Angie Viviana Hurtado López	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481410164	06/02/2025	Dovio
José Julián Sepúlveda Guerra	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0,00	1069455207	11/02/2025	Palmira
José Luis Mesa Rodríguez	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481707722	14/02/2025	Cali
Cesar William Esguerra López	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	9481707722	14/02/2025	Cali
José Luis Angulo Ramos	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0,00	1070642893	17/02/2025	Buenaventura
Jaime Arnulfo Rodríguez	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481738318	17/02/2025	Cali
Jhon Jairo Diaz Telpud	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481738318	17/02/2025	Buenaventura
Leider Elia Raad Pedrozo	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481738318	17/02/2025	Cali
Giovanny Caro Estrada	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481738318	17/02/2025	Cali
Elkin Darío Caro Estrada	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481738318	17/02/2025	Palmira
German Alonso Tenorio Navarro	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481738318	17/02/2025	Palmira/Dovio
Carlos Silva Rojas	$ 121.500	$ 30.400	$ 52.900	$ 36.300	9481738318	17/02/2025	Palmira
José Zoilo Cáceres Ibarguen	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481738318	17/02/2025	Palmira/Dovio
Luis Felipe Pérez Gamba	$ 159.500	$ 39.900	$ 69.400	$ 39.900	9481738318	17/02/2025	Palmira
Jairo Hernández Osorio	$ 159.500	$ 39.900	$ 69.400	$ 39.900	9481738318	17/02/2025	Palmira
Alvaro León Barraza	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481738318	17/02/2025	Buenaventura
Marlon Stiven Torres Arroyo	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481738318	17/02/2025	Buenaventura
William Palacios Caicedo	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481738318	17/02/2025	Buenaventura
Manuel Tovar Torres	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481738318	17/02/2025	Buenaventura
Jhon Edison Tepu	$ 76.000	$ 19.000	$ 33.100	$ 19.000	9481738318	17/02/2025	Buenaventura
NO CONTRACTUAL							
Raul Alfonso Rojas Hernández	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481738318	17/02/2025	Todas
David Fernando Correa Moncayo	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481707722	14/02/2025	Cali
Erminson Ortiz Castrillón	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9481707722	14/02/2025	Cali
Linner Domínguez Carvajal	$ 208.000	$ 178.000	$ 99.100	$ 0,00	1069136110	16/02/2025	Palmira

8. GESTIÓN AMBIENTAL

8.1 Jornada de Aseo y disposición de residuos de obra

Se realizarán jornadas de aseo y clasificación de materiales, las cuales se desarrollan al inicio y final de las labores, limpieza y adecuación de bodega de almacenamiento de materiales a fin de garantizar y mantener en buenas condiciones las diferentes locaciones de la obra.

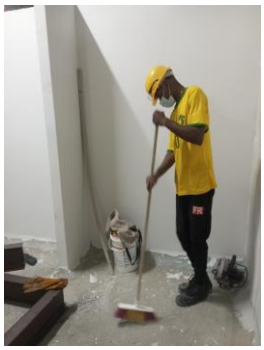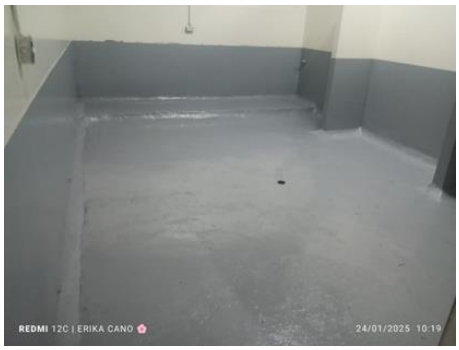ORDEN Y ASEO	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	 
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA	   

7.1 Punto ecológico

Se cuenta con puntos Ecológicos en cada frente de obra, con la finalidad de mantener un buen manejo de residuos y así promover el orden y aseo en obra, dando a conocer a los trabajadores la ubicación del punto y brindándoles la información sobre el buen manejo y separación de residuos de obra.


DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	*PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA*	*PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA*
		

9. ANALISIS SEGURO DE TRABAJO – AST

Los permisos de trabajo son obligatorios en los procesos en los cuales se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea, para ello se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. El Análisis de Seguridad en la Tarea (AST) tiene como finalidad realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de la empresa.

AST SEDE PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" – CALI



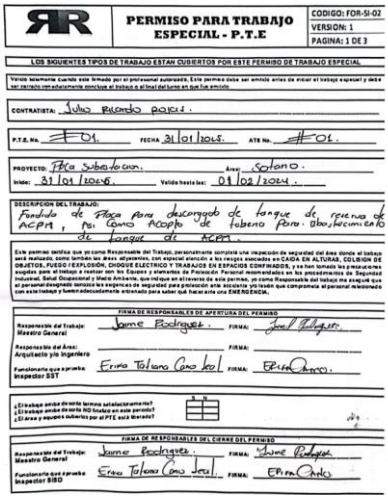

PERMISO PARA TRABAJO ESPECIAL - P.T.E

CODIGO: FOR-SI-02
VERSION: 1
PAGINA: 1 DE 3

LOS SIGUIENTES TIPOS DE TRABAJO ESTAN CUBIERTOS POR ESTE PERMISO DE TRABAJO ESPECIAL

Valido solamente cuando este firmado por el personal autorizado. Este permiso debe ser emitido antes de iniciar el trabajo especial y debe ser cerrado con exactamente concluye el trabajo o al final del turno en que fue emitido

CONTRATISTA: JULIO RICARDO ROJAS

P.T.E. No. 001 FECHA 31/01/2024 ATS No. 001

PROYECTO: Plaza Sabaticon Area: Sotano

Inicio: 31/01/2024 Valido hasta las: 01/02/2024

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Fundido de Placa para descargado de tanque de reserva de ACPM, asi como Acopio de tuberia para abastecimiento de tanque de ACPM.

Este permiso certifica que yo como Responsable del Trabajo, personalmente completé una inspección de seguridad del área donde el trabajo será realizado, como también las áreas adyacentes, con especial atención a los riesgos asociados en CAIDA EN ALTURAS, COLISION DE OBJETOS, FUEGO / EXPLOSIÓN, CHOQUE ELECTRICO Y TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS, y se han tomado las precauciones exigidas para el trabajo a realizar con los Equipos y elementos de Protección Personal recomendados en los procedimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, que indique en el reverso de este permiso, yo como Responsable del trabajo me exijo que el personal designado conozca las exigencias de seguridad para prevención este asociado y/o trabajo que comprometa al personal relacionado con este trabajo y hemos adecuadamente entrenado para saber que hacer ante una EMERGENCIA.

FIRMA DE RESPONSABLES DE APERTURA DEL PERMISO

Responsable del Trabajo: Maestro General: Jaime Rodriguez FIRMA:

Responsable del Area: Arquitecto y/o Ingeniero FIRMA:

Funcionario que aprueba: Inspector SST: Erika Tolosa Cano Ing. FIRMA:

¿El trabajo ambas diferido tiempo satisfactoriamente?
¿El trabajo ambas diferido NO finalizo en este periodo?
¿El área y equipos quedaron por el PTE esta Mañana?

FIRMA DE RESPONSABLES DEL CIERRE DEL PERMISO

Responsable del Trabajo: Maestro General: Jaime Rodriguez FIRMA:


Funcionario que aprueba: Inspector SISO: Erika Tolosa Cano Ing. FIRMA:


AST PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA








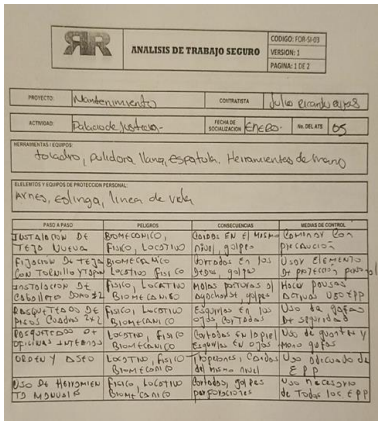


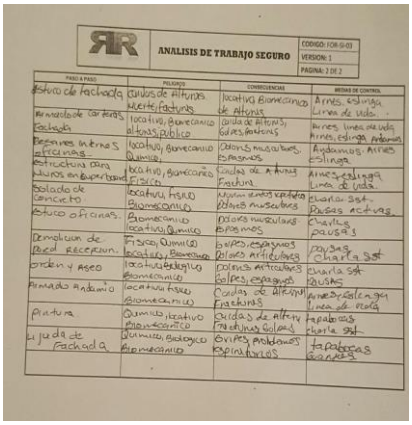

AST PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA



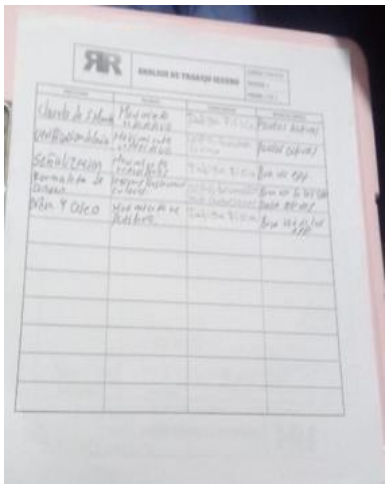

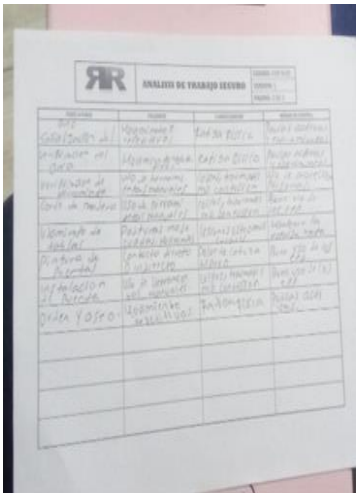


SAOS ALTURAS SAS
NIT 901.725.447-9
CONSECUTIVO
TSA - 3700
CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS
OTORGADO A:
ALVARO LEON BARRAZA
IDENTIFICADO CON C.C. N° 1002422428
CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO
CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (32) HORAS


SAOS ALTURAS SAS
NIT 901.725.447-9
CONSECUTIVO
TSA - 3702
CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS
OTORGADO A:
MARLON STIVEN TORRES ARROYO
IDENTIFICADO CON C.C. N° 1006195369
CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO
CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (32) HORAS

10. CONCLUSIONES

Las actividades realizadas han contribuido de manera importante, para identificar y resaltar los puntos que hay que abrigar, para la ejecución de un correcto análisis de riesgos en las diferentes arias de trabajo.

Se continuará promoviendo una cultura de prevención de riesgo, basada en el habito de prácticas de trabajo seguro, con actitudes preventivas y no ser reactivos logrando que las buenas prácticas de trabajo seguro sean parte importante de cada día

Cordialmente,

Residente Siso Palmira
PAULA ANDREA DERAZO ARANGO
C.C. No. 29.679.146 de Palmira
Tecnóloga en Higiene y Seguridad Industrial
Resolución No. 6120 del 28/10/2019, de la Secretaria de Salud del Atlántico

Residente Siso Cali
ERIKA TATIANA CANO LEAL
C.C. No. 1.002.944.087 de Viterbo (Caldas)
Tecnóloga en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Resolución No. 1036 del 03/05/2021, de la Secretaria de Salud del Tolima

Residente Siso Buenaventura
KATHERINE MINA VENTO
C.C. No. 1.111.785.465 de Buenaventura
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución No.0026 del 27/04/2021, de la Secretaria de Salud Distrital de Buenaventura

Director de Obra
JULIO RICARD ROJAS HERNANDEZ
C.C. No. 79.356.655 de Bogotá
Arquitecto MP No. 25700-57909CND
Especialista en Medio Ambiente y Desarrollo Local

INFORME No. 7 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA

CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 082 de 2024
CONTRATISTA: JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ

01 al 24 de febrero de 2025

Carrera 61 F No. 51 B 33 sur, Bogotá D.C. – Tel Móvil 3017558184 -3017804089
Email: arquitectosconstructoresbog@hotmail.com

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO	082 de 2024
CONTRATANTE	LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA	JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LOS INMUEBLES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CALI "PEDRO ELÍAS SERRANO ABADÍA", JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL DOVIO, PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO", SEDE FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA, EDIFICIO TRANSFERENCIAS, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE OBANDO, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL PALMAR Y PALACIO DE JUSTICIA DE TULUÁ “LIZANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA”
VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (1.887.698.818,00)
FIRMA DEL CONTATO	25 de julio de 2024
PLAZO DE EJECUCION	Doscientos seis días (206) días
FECHA DE INICIO	30 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACION	24 de febrero de 2025

SUPERVISORES:	María Del Socorro Marín Cataño	Coordinador Área Administrativa
	Luis Eduardo Ducuara Celis	Jefe Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura
	Adriana Piedad Bejarano	Jefe Oficina de Servicios de Palmira
	Judith Henao Muñoz	Jefe Oficina de Servicios de Tuluá
	Diego Fernando Ordoñez Velásquez	Jefe Oficina de Servicios de Cartago
	Piedad Lorena Hernández Fernández	Apoyo a la supervisión
	Edwin Reinaldo Cante Cruz	Apoyo a la supervisión

Valle del Cauca

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL

1. OBJETIVO

Describir el informe de actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado con el propósito de cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y técnicos, que permiten la protección de sus trabajadores.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Acto subestándar o inseguro:** Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.
- **Alerta:** acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.
- **Alta Dirección:** Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.
- **Amenaza:** factor de origen natural que afecta a una comunidad ocasionando lesiones a sus integrantes e instalaciones
- **Capacitación:** conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa
- **Contingencia:** evento que puede suceder o no suceder, para el cual se debe estar preparado.
- **Control:** acción encaminada a eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o minimizar sus consecuencias
- **COVID-19:** Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la OrganizaciónMundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII).
- **Emergencia:** estado de alteración parcial o total de las actividades de una empresa, ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente y cuyo control supera la capacidad de respuesta de las personasy organizaciones.
- **Exposición:** Acción de exponer a alguien o algo a los efectos de otros agentes lo cual depende de la cantidad de sustancia o dosis, tiempo de contacto y/o frecuencia.
- **Gestión:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
- **Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional:** Conjunto de acciones, programas y/o proyectos encaminados a controlar y mejorar la seguridad ysalud en el trabajo.
- **Identificación:** Es la acción que permite reconocer los registros y relacionarlos con la actividad involucrada o el proceso del sistema que evidencian.
- **Información:** datos que poseen significado.
- **Manual del Sistema de Gestión:** Documento que especifica el Sistema de Gestión de una organización.
- **Objetivos:** Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
- **Políticas:** Intenciones globales y orientación de una organización relativasa la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
- **Proceso:** Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en resultado.
- **SYSO:** Sistema de gestión para desarrollar la política y gestionar los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional.
- **SGSST:** Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- **SG:** Sigla que significa sistema de gestión

- **SST:** Sigla que significa seguridad y salud en el trabajo
- **Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de daño, en términos de enfermedad o lesión a las personas, o a una combinación de éstos.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
- **Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

3. ALCANCE Y RESPONSABLES

Este Informe aplica para todo el sistema de gestión y niveles de la organización con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la entidad contratante y normatividad legal vigente encabeza de la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 entre otras actualizaciones vigentes.

El Representante legal es responsable de:

- Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión.
- Asegurar que los recursos necesarios para las medidas de bioseguridad y elsistema de gestión estén disponibles.
- Asegurar que se establezcan la política y objetivos del sistema de gestión, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización.
- Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión con los procesos de negocio de la organización. Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y locales para la atención y prevención del COVID-19 en el período de aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno Nacional.
- Implementar las recomendaciones aquí previstas conforme a las condiciones y necesidades de cada uno de los proyectos; garantizando la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas, autoridades, personal de interventoría, supervisión y demás personas que estén presentes en los frentes de obra u operación de los proyectos.
- Promover el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
- importancia de una gestión eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión.
- Asegurar de que el sistema de gestión logre los resultados previstos.
- Liderar el desarrollo e implementación de los sistemas de gestióncomprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión.
- Promover a la mejora.
- Apoyar otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
- Informar al responsable e inspector del SG-SST todo cambio a nivel estructural, físico o actividades que se realicen en los diferentes procesos.

Los responsables del SG-SST, son los encargados de:

- Diseñar, administrar y ejecutar el sistema de gestión de la empresa.
- Identificar los peligros, evaluar los riesgos las actividades de trabajo
- Actualizar la matriz de peligros, establecer medidas de control en conjuntocon las áreas y procesos de la organización.

- Realizar seguimiento a los planes de acción.
- Asesorar a la Gerencia en la implementación del sistema de gestión, así como la intervención y prioridad para la prevención y control de los riesgos.
- Verificar que se cumplan las medidas preventivas y correctivas establecidas en los resultados de las inspecciones de seguridad
- Solicitar el acompañamiento de la ARL para verificar el cumplimiento de lasmedias y acciones adoptadas en su proyecto.
- Reportar cualquier evento de contagio que se presente dentro del desarrollo de las actividades de obra, operación y mantenimiento.

Los colaboradores son responsables de:

- Cumplir todos los procedimientos del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo establecidos por el contratista.
- Informar sobre cualquier condición de salud que le pueda generar restricciones, antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas
- Utilizar las medidas de prevención y protección sean implementadas.
- Reportar oportunamente peligros detectados en el área de trabajo por medio del reporte de actos y condiciones inseguras.
- Participar activamente en las actividades del sistema de gestión en las cuales se vean involucrados.

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El proyecto contempla el mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Departamento del Valle de Cauca, brindando protección de los bienes inmuebles, operatividad y garantizando la integridad de los servidores judiciales y sus visitantes.

4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Valle del Cauca está ubicado, es una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y exportación que por allí se registra.

Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio nacional, su población para el año de 1993 era de 3.474.695 habitantes, para una densidad de 156.9 habitantes por KM2.

El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura promedio, para una altura de 1000m sobre el nivel del mar. La región del litoral pacífico presenta precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año.

El departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de Cali. El 81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las áreas rurales.

Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 22

Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye una de las zonas agrícolas más importantes del país.

Por último, la región de la costa pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. (https://www.cali.gov.co/publico2/laciudad/datoscalivalle.htm)

4.2 SEDES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA A INTERVENIR

SEDE	MUNICIPIO	DIRECCION
Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"	Cali	Carrera 10 No. 12 - 15
Juzgado Promiscuo Municipal del Dovio	El Dovio	Carrera 10 No. 11 - 57
Palacio de Justicia de Palmira "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO"	Palmira	Carrera 23 No. 29 - 09
Edificio Sede de Familia	Palmira	Calle 22 No. 28 A 10
Palacio Nacional	Buenaventura	Calle 3 No. 2 A 35
Edificio de Transferencia	Buenaventura	Calle 9 No. 2 - 21
Juzgado Promiscuo Municipal	Obando	Carrera 2 No. 3 - 25
Juzgado Promiscuo Municipal	San José Del Palmar	Carrera 4 No. 12 - 13
Palacio de Justicia “Lizandro Martínez”	Tuluá	Calle 26 con carrera 27 esquina

4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El contrato de obra contempla varias actividades que conllevan al mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Departamento del Valle de Cauca, con los más altos estándares de calidad tanto eléctrico como obra civil.

4.4 GENERALIDADES DEL SG-SST

Consciente de la importancia de la seguridad y salud en el Trabajo SST y consecuente con la reglamentación legal existente en el país, el contratista. En cabeza de su representante legal, asume la responsabilidad de la planeación y ejecución de las actividades del presente Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SGSST; en todos los campos; condiciones de salud y condiciones de trabajo.

El presente documento corresponde al informe mensual de las actividades desarrolladas y aplicadas a los colaboradores del contratista en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en elTrabajo (SG-SST), como lo son la ley 9 de 1979, resolución 1016 de 1983, resolución 2413 de 1979, la resolución 2400 de 1979, decreto No. 1295 de 1994, ley 1262 de 2012, decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019 entre otros.

5. PERSONAL EN OBRA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE FEBRERO DE 2025

Para el periodo reportado en el informe, se ejecutaron actividades en el Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA", en el Palacio de Justicia de Palmira "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO", Palacio Nacional de Buenaventura, Edificio de Transferencia en Buenaventura y Juzgado Promiscuo Municipal del Dovio. El personal que ejercieron actividades para este periodo es:

NOMBRE	CARGO	SEDE O FRENTE
Julio Ricardo Rojas Hernández	Director de Obra	Todas
Juan José Monsalve Ospina	Residente de Obra Cali	Cali
Erika Tatiana Cano Leal	Residente SISO Cali	Cali
Eddie Alexandro Calderón Vallejo	Residente de Obra Palmira	Palmira
Paula Andrea Derazo Arango	Residente SISO Palmira	Palmira
Jair Micolta Córdoba	Residente de Obra Buenaventura	Buenaventura
Katherine Mina Vente	Residente SISO Buenaventura	Buenaventura
Jhon Jairo Diaz Telpud	Carpintero	Cali/Palmira / Buenaventura
Alvaro León Barraza	Oficial	Buenaventura
German Alonso Tenorio Navarro	Oficial	Palmira/Dovio
Elkin Darío Caro Estrada	Oficial	Palmira/Dovio/Cali
Giovanny Caro Estrada	Ayudante	Cali
José Zoilo Cáceres Ibarguen	Ayudante	Palmira
Luis Felipe Pérez Gamba	Ayudante	Palmira
Jairo Hernández Osorio	Ayudante	Palmira
Marlon Stiven Torres Arroyo	Ayudante	Buenaventura
William Palacios Caicedo	Ayudante	Buenaventura
Manuel Tovar Torres	Ayudante	Buenaventura
Jhon Edison Tepu	Ayudante	Buenaventura
NO CONTRACTUAL		
Raul Alfonso Rojas Hernández	Director de Proyectos	Todas

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL SGSST

Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo como medidas de control el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el mes de febrero de 2025 se han realizado las siguientes actividades:

a) Inducción de Personal

Una vez vinculado el trabajador, se inicia la etapa de inducción a la empresa y puesto de trabajo, para ello se realizan charlas personalizadas con el personal antes de su ingreso e inicio de labores, dejando constancia de esta. Para el mes de febrero de 2025 se realizó la inducción y reinducción a los trabajadores y subcontratistas quienes recibieron información.

b) Charlas Preoperacionales y Pausas Activas

Enfatizadas en mitigar, controlar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo; previo al desarrollo e inicio de labores mediante charlas de seguridad diarias con una duración de 5 minutos se dan conocer diferentes temas en materia de seguridad y salud en el trabajo, se llevan a cabo una vez se inicien las actividades contempladas en el contrato estatal de obra.

CHARLAS 5 MINUTOS		
Cali	**Palmira**	**Buenaventura**
• Trabajo en equipo • Socialización de ATS • Uso adecuado de EPP • Riesgo de trabajo en caliente • Riesgo físico • Riesgos en el área de trabajo	• La importancia de las líneas de vida • Manejo ambiental en zonas de verdes	• Inspección de cascos de seguridad • Buen uso de los epp's • Riesgo físico • Autocuidado

De igual manera se desarrollan pausas activas con base en ejercicios de calistenia a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteo musculares a fin de generar cultura y prevenir el estrés, que permita a los colaboradores recuperar energías garantizando un desempeño eficiente en su trabajo.

Es de resaltar que para dichas actividades deberá asistir todo el personal - oficiales de obra, ayudantes de obra, electricistas, soldador, residentes de obra, director de obra y todo aquel colaborador que intervenga en la misma.

INDUCCION DE PERSONAL Y CHARLAS PREOPERACIONALES	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" – CALI	

PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA	
PAUSAS ACTIVAS	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	  



PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA	

c) Entrega y cambio de dotación o elementos de protección individual

Conforme al CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Artículo 2.2.1.4.2. Favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido y Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, Literal 5 del DECRETO 1072/2015, se debe suministrar vestido y el calzado necesario para el normal desarrollo de las labores de trabajo, por lo tanto, se realiza la entrega de la dotación y elementos de protección individual necesarios para el desarrollo de las labores, a los diferentes colaboradores que participan en las actividades quedando como registro el acta de entrega de dotación y Epp's

d) Inspección de dotación Elementos de protección personal

Se realiza la correspondiente inspección a los elementos de protección individual entregado al personal de la obra, a través de observación directa verifica las condiciones.

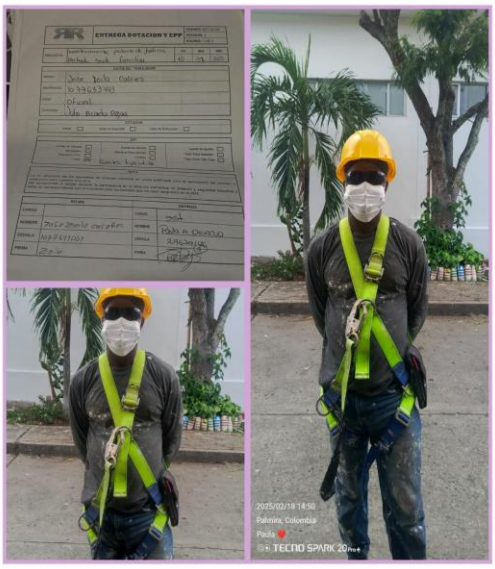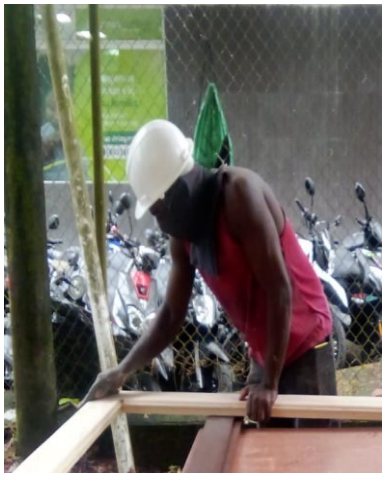USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	 
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BJARANO" – PALMIRA	
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TANSFERENCIA	  

e) Inspección de equipos de emergencia

Garantizando las actividades tendientes a prestar la primera atención o primero auxilios a los trabajadores en caso de accidentes e incidentes de trabajo o eventualidades de emergencias, se realizó inspección a los elementos de emergencias los cuales son inspeccionados mensualmente, dicha inspección será plasmada en el formato "inspección de equipos de emergencia" por la profesional SST

EQUIPOS DE EMERGENCIA	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	  
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	  
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA	 

f) Inspección de Herramientas y elementos de trabajo

Se realizan las correspondientes inspecciones semanales a las herramientas y elementos de trabajo a cargo del personal de la obra, dicha inspección se plasmada en el formato "inspección de herramientas" por la profesional SST quien a través de observación directa verificaron condiciones.

INSPECCION DE HERRAMIENTAS	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	  
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	

g) Inspección a puestos de trabajo

Se realizan inspecciones a los diferentes puestos de trabajo, con la finalidad de identificar los Peligros y Riesgos a los cuales pueden llegar a estar expuestos los trabajadores y así mismo implementar medidas de control para minimizar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo.

h) Señalización y demarcación de áreas de trabajo

Como medida preventiva y teniendo en cuenta las condiciones locativas de la obra se realiza la ubicación de señalización a fin de prevenir a los usuarios sobre la existencia de riesgos o situaciones especiales, de igual manera se restringe el paso de personal, se realiza la señalización de zonas de intervención a fin de evitar accidentes y eventualidades con la comunidad educativa.

SEÑALIZACION Y DEMARCACION	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	  
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	

PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TANSFERENCIA	

i) Inducción de Bioseguridad al Personal

Se realizará inducción a todo el personal antes de iniciar labores, basado en el Protocolo de Bioseguridad el cual fue diseñado para el trabajo en zonas de construcción, antes, durante y después de la labor, garantizando las acciones y medidas de seguridad en las actividades de construcción con el fin de contribuir con la disminución de propagación y contagio del COVID-19.

j) Disposición de residuos de bioseguridad.

La clasificación y disposición de residuos se realizan de acuerdo a los materiales usados, al inicio y final de las labores por todo el personal de obra en las zonas o centros de acopio y punto ecológico.

7. NOVEDADES DE PERSONAL (INGRESO, AUSENCIAS E INCAPACIDADES)

7.1 Ausencias

7.2.1. Enfermedad General: No se presentaron

7.2.2. Accidente trabajo: No se presentaron

7.2 Afiliaciones de ley y Seguridad social

El Residente SST y la Dirección Administrativa consultan en el FOSYGA y RUAF las entidades donde han estado afiliados los trabajadores y con base en dicha información realizar las respectivas afiliaciones de ley, si hay lugar a ello:

- ARL (Administradora de riesgos laborales)
- EPS (Entidad Promotora de Salud)
- AFP (Administradora de Fondos de Pensión)
- CF (Caja de Compensación Familiar)

De igual manera y de acuerdo con los reportes mensuales de novedades de personal, en las fechas establecidas se realizarán los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal del personal vinculado con el contratista en pro de garantizar el acceso de los trabajadores a los beneficios y cobertura de dicho sistema.


Relación de seguridad social personal de obra febrero 2025


PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO	SEDE
Julio Ricardo Rojas Hernández	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 28.500	9482320161	05/03/2025	Todas
Juan José Monsalve Ospina	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0,00	9482319772	05/03/2025	Cali
Erika Tatiana Cano Leal	$ 326.400	$ 81.600	$ 142.000	$ 81.600	9482754983	05/03/2025	Cali
Paula Andrea Derazo Arango	$ 326.400	$ 81.600	$ 142.000	$ 81.600	9482754983	05/03/2025	Palmira
Jair Micolta Córdoba	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0,00	9482381537	05/03/2025	Buenaventura
Katherine Mina Vente	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0,00	1070644481	25/02/2025	Buenaventura
Eddie Alexandro Calderón Vallejo	$ 227.800	$ 80.000	$ 139.500	$ 80,000	9482754983	05/03/2025	Palmira
Jhon Jairo Diaz Telpud	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9482754983	05/03/2025	Buenaventura
Giovanny Caro Estrada	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9482754983	05/03/2025	Cali
Elkin Darío Caro Estrada	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9482754983	05/03/2025	Cali/Palmira
German Alonso Tenorio Navarro	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9482754983	05/03/2025	Palmira
José Zoilo Cáceres Ibarguen	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9482754983	05/03/2025	Palmira
Luis Felipe Pérez Gamba	$ 159.500	$ 39.900	$ 69.400	$ 39.900	9482754983	05/03/2025	Palmira
Jairo Hernández Osorio	$ 159.500	$ 39.900	$ 69.400	$ 39.900	9482754983	05/03/2025	Palmira
Alvaro León Barraza	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9482754983	05/03/2025	Buenaventura
Marlon Stiven Torres Arroyo	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9482754983	05/03/2025	Buenaventura
William Palacios Caicedo	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9482754983	05/03/2025	Buenaventura
Manuel Tovar Torres	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9482754983	05/03/2025	Buenaventura
Jhon Edison Tepu	$ 76.000	$ 19.000	$ 33.100	$ 19.000	9482754983	05/03/2025	Buenaventura
NO CONTRACTUAL							
Raul Alfonso Rojas Hernández	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	9482754983	05/03/2025	Todas

8. GESTIÓN AMBIENTAL

8.1 Jornada de Aseo y disposición de residuos de obra

Se realizarán jornadas de aseo y clasificación de materiales, las cuales se desarrollan al inicio y final de las labores, limpieza y adecuación de bodega de almacenamiento de materiales a fin de garantizar y mantener en buenas condiciones las diferentes locaciones de la obra.

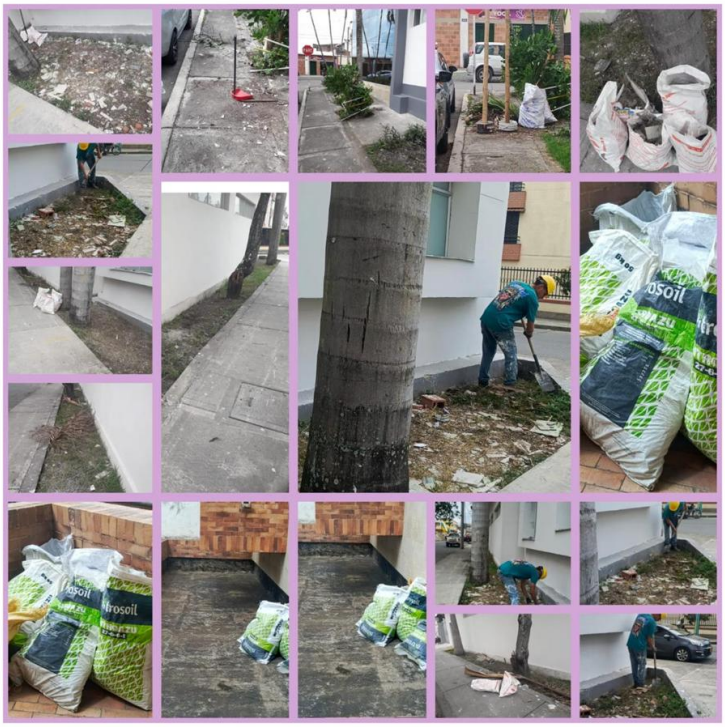ORDEN Y ASEO	
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	   
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA	

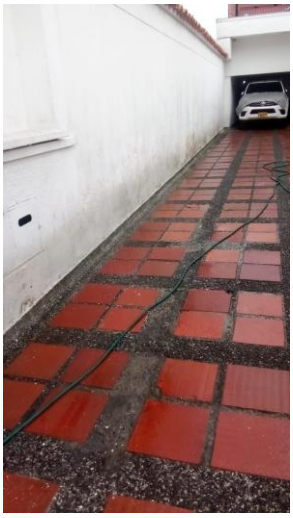PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA	  

7.1 Punto ecológico

Se cuenta con puntos Ecológicos en cada frente de obra, con la finalidad de mantener un buen manejo de residuos y así promover el orden y aseo en obra, dando a conocer a los trabajadores la ubicación del punto y brindándoles la información sobre el buen manejo y separación de residuos de obra.

PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI	***PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA***	***PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA***
		

7.2 Disposición Final de residuos de obra

PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" – CALI





Constancia de disposición final de residuos

ASOCIACION MUTUAL ECO AMBIENTAL DE CALI
Nit 900641714-5. - Agosto 23 de 2013

CONSTANCIA DE GESTORES DE RESIDUOS DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DATOS BASICOS DEL GESTOR

Nº 4683

Nombre o Razón Social	Asociación Mutual Eco ambiental de Cali		No PIN	3503519411	
Número de Identificación o NIT	900641714-5	Representante Legal		Uriel Fernando Ariza	
Número telefónico de Contacto	3503521158	Dirección		Calle 42 No 39B-99	
Municipio	Santiago de Cali	Departamento		Valle del Cauca	
Gestor	Punto limpio X	aprovechamiento		Disposición final	
Tipo de RCD recibidos	Concreto - Mortero	Peso RCD recibidos -ton		2 mts.^{3} - 1 Viaje	
Tipo de aprovechamiento (si aplica)	Entrega RCD aprovechables			Compra Ecomateriales	
Tipo de Ecomaterial y % de RCD contenido					
No PIN Gestor de Transporte					

DATOS BASICOS DEL GENERADOR

Nombre o razón social del Generador	Julio Ricardo Rojas Hernandez.		
Número de Identificación o NIT	79356655.		
Nombre del proyecto constructivo	Palacio de Justicia Cal.	No. Registro App WEB (PIN)	wmx 523
Dirección del proyecto	Calle 13 Carrera 10		
Número de teléfono de contacto			
Fecha de recepción de los RCD	11 de Febrero 2025		
Firma y sello del gestor de RCD			
Nit	900641714-5	Fecha	


Asociación Mutual Eco Ambiental de Cali Nit. 900641714-5

Calle 42 No 39B-99 Barrio Antonio Nariño (Cali -Valle) Teléfono 4037410-3163661404

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL

PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA



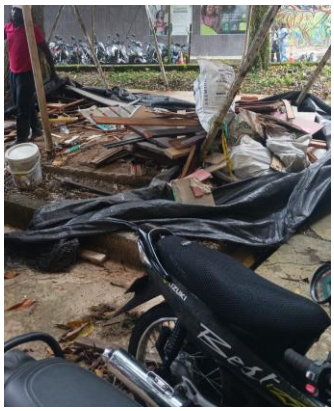



Constancia de disposición final de residuos



REEGAM SAS
RENTA EQUIPOS Y EXCAVACIÓN GAMEZ
NIT: 901.106.333-2.
RÉGIMEN SIMPLE.

Buenaventura, 21 de febrero 2025

CERTIFICACIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).


La presente es para certificar el recibo de residuos de material de construcción y demolición (RCD) propiamente madera, producto de los arreglos locativos del palacio nacional de Buenaventura, realizados por el señor Julio Ricardo Rojas Hernández, identificado con CC. 79.356.655-1.

Esta disposición final se recibió en el predio "las Palmas". El cual cuenta con resolución EPA número RESOLUCIÓN No 2023-426 (16 DE NOVIEMBRE DE 2023), donde se autoriza la disposición final de residuos de construcción y demolición.

En total se recibió 1 viaje y el volumen dispuesto fue 6 m^3.

Walter Gámez Gutiérrez.

Diagonal 4ª # 6-44 Calle las Flores. Pueblo Nuevo Tel: (2) 2426243 – Cel: 3187082712 – 3017542050 Buenaventura – Colombia
Email: reegam-wgg@hotmail.com – www.reegam.webs.com

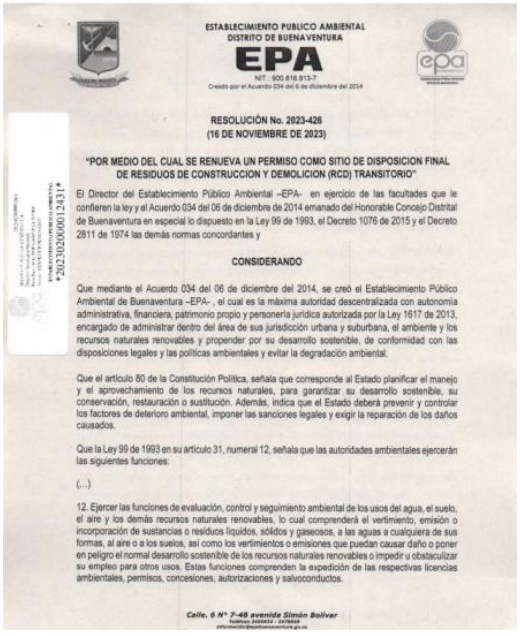

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA
NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

RESOLUCIÓN No. 2023-426
(16 DE NOVIEMBRE DE 2023)

"POR MEDIO DEL CUAL SE RENUEVA UN PERMISO COMO SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD) TRANSITORIO"

El Director del Establecimiento Público Ambiental –EPA- en ejercicio de las facultades que le confieren la ley y el Acuerdo 034 del 06 de diciembre de 2014 emanado del Honorable Concejo Distrital de Buenaventura en especial lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 2811 de 1974 las demás normas concordantes y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo 034 del 06 de diciembre del 2014, se creó el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura –EPA- , el cual es la máxima autoridad descentralizada con autonomía administrativa, financiera, patrimonio propio y personería jurídica autorizada por la Ley 1617 de 2013, encargado de administrar dentro del área de sus jurisdicción urbana y suburbana, el ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas ambientales y evitar la degradación ambiental.

Que el artículo 80 de la Constitución Política, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, indica que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 31, numeral 12, señala que las autoridades ambientales ejercerán las siguientes funciones:

(...)

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.


Calle. 6 Nº 7-48 avenida Simón Bolívar

9. ANALISIS SEGURO DE TRABAJO – AST

Los permisos de trabajo son obligatorios en los procesos en los cuales se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea, para ello se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. El Análisis de Seguridad en la Tarea (AST) tiene como finalidad realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de la empresa.

AST SEDE PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" – CALI



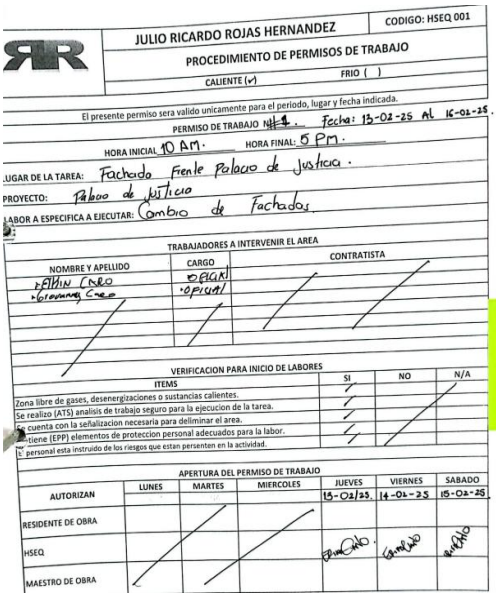

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ — CODIGO: HSEQ 001

PROCEDIMIENTO DE PERMISOS DE TRABAJO

CALIENTE (✓) FRIO ( )

El presente permiso sera valido unicamente para el periodo, lugar y fecha indicada.

PERMISO DE TRABAJO Nº 1. Fecha: 13-02-25 Al 15-02-25.

HORA INICIAL 10 AM. HORA FINAL: 5 PM.

LUGAR DE LA TAREA: Fachada Frente Palacio de Justicia.

PROYECTO: Palacio de Justicia

LABOR A ESPECIFICA A EJECUTAR: Cambio de Fachadas.

TRABAJADORES A INTERVENIR EL AREA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CONTRATISTA
JAIRO CANO	OFICIAL	
Gobernay Cano	OFICIAL	

VERIFICACION PARA INICIO DE LABORES

ITEMS	SI	NO	N/A
Zona libre de gases, desenergizaciones o sustancias calientes.	✓		
Se realizo (ATS) analisis de trabajo seguro para la ejecucion de la tarea.	✓		
Se cuenta con la señalizacion necesaria para delliminar el area.	✓		
Tiene (EPP) elementos de proteccion personal adecuados para la labor.	✓		
El personal esta instruido de los riesgos que estan presentes en la actividad.	✓		

APERTURA DEL PERMISO DE TRABAJO

AUTORIZAN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
				13-02-25.	14-02-25	15-02-25
RESIDENTE DE OBRA						
HSEQ						
MAESTRO DE OBRA						

AST PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA






JOSE ZOILO CACERES BARQUEN

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

URIEL ANTONIO CACERES BARQUEN

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

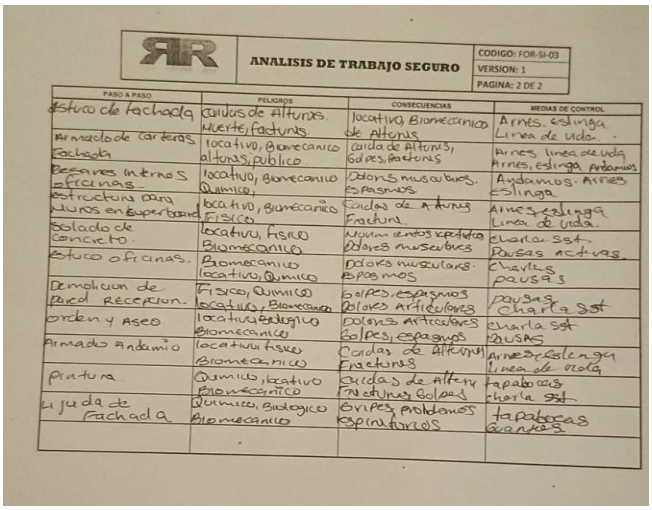


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO


CODIGO: FOR-SI-03
VERSION: 1
PAGINA: 2 DE 2

PASO A PASO	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIAS DE CONTROL
Estuco de fachada	caidas de Alturas.	locativo, Biomecanico	Arnes, eslinga.
Armado de carteras	Muerte, fracturas	de Alturas	Linea de vida.
Fachada	locativo, Biomecanico	caida de Alturas,	Arnes, linea de vida
Resanes internos	alturas, publico	golpes, fracturas	Arnes, eslinga, Andamios
oficinas	locativo, Biomecanico	Dolores musculares.	Aydamios. Arnes
estructura cany	Quimico,	espasmos	eslinga
Muros en superboard	locativo, Biomecanico	caidas de Alturas	Arnes, eslinga
Soldado de	Fisico	Fracturs	Linea de vida.
concreto	locativo, Fisico	Movimientos repetitivo	charla SST.
Estuco oficinas.	Biomecanico	Dolores musculares.	Pausas activas.
	locativo, Quimico	espasmos	charlas
Demolicion de	Fisico, Quimico	golpes, espasmos	pausas
pared recepcion.	locativo, Biomecanico	Dolores Articulares	pausas, Charla SST
orden y Aseo	locativo, Ergonomico	Dolores articulares	charla SST
	Biomecanico	Golpes, espasmos	PAUSAS
Armado andamio	locativo, fisico	Caidas de Alturas,	Arnes, eslinga
	Biomecanico	Fracturas	Linea de vida
pintura	Quimico, locativo	caidas de altura	tapabocas
	Biomecanico	Fracturas, Golpes	charla SST
Lijada de	Quimico, Biologico	Gripes, problemas	tapabocas
Fachada	Biomecanico	respiratorios	guantes

AST PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA Y EDIFICIO DE TRANSFERENCIA



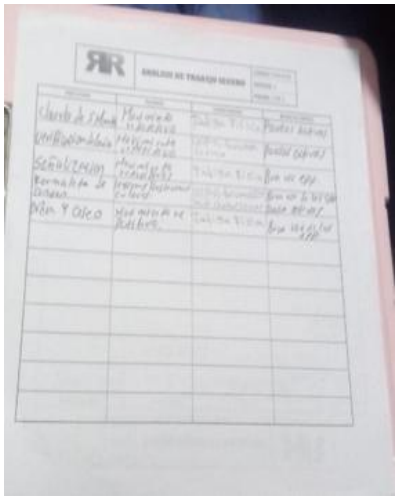

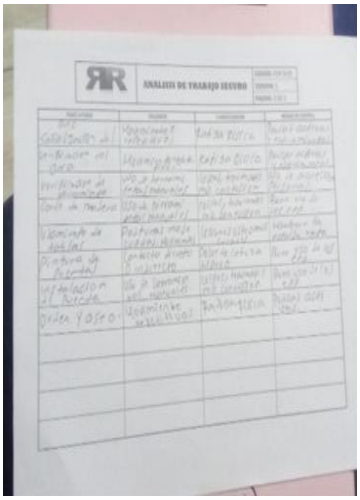





10. CONCLUSIONES

Se cumplió con el objetivo toda que la obra finalizó la obra sin incidente y/o accidente en el trabajo según las evidencias y el análisis estadístico de seguridad y salud por lo que las medidas de control de seguridad aplicadas sobre el trabajo realizadas fueron satisfactorias.

Cordialmente,

Residente Siso Palmira
PAULA ANDREA DERAZO ARANGO
C.C. No. 29.679.146 de Palmira
Tecnóloga en Higiene y Seguridad Industrial
Resolución No. 6120 del 28/10/2019, de la Secretaria de Salud del Atlántico

Residente Siso Cali
ERIKA TATIANA CANO LEAL
C.C. No. 1.002.944.087 de Viterbo (Caldas)
Tecnóloga en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Resolución No. 1036 del 03/05/2021, de la Secretaria de Salud del Tolima

Residente Siso Buenaventura
KATHERINE MINA VENTO
C.C. No. 1.111.785.465 de Buenaventura
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución No.0026 del 27/04/2021, de la Secretaria de Salud Distrital de Buenaventura

Director de Obra
JULIO RICARD ROJAS HERNANDEZ
C.C. No. 79.356.655 de Bogotá
Arquitecto MP No. 25700-57909CND
Especialista en Medio Ambiente y Desarrollo Local



REEGAM SAS

RENTA EQUIPOS Y EXCAVACIÓN GAMEZ

NIT: 901.106.333-2.
RÉGIMEN SIMPLE.

Buenaventura, 21 de febrero 2025

CERTIFICACIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).

La presente es para certificar el recibo de residuos de material de construcción y demolición (RCD) propiamente madera, producto de los arreglos locativos del palacio nacional de Buenaventura, realizados por el señor Julio Ricardo Rojas Hernández, identificado con CC. 79.356.655-1.

Esta disposición final se recibió en el predio “las Palmas”. El cual cuenta con resolución EPA número RESOLUCIÓN No 2023-426 (16 DE NOVIEMBRE DE 2023), donde se autoriza la disposición final de residuos de construcción y demolición.

En total se recibió 1 viaje y el volumen dispuesto fue 6 m^3.

Walter Gámez Gutiérrez.

Diagonal 4ª # 6-44 Calle las Flores. Pueblo Nuevo Tel: (2) 2426243 – Cel: 3187082712 – 3017542050 Buenaventura – Colombia
Email: reegam-wgg@hotmail.com – www.reegam.webs.com

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA

EPA

NIT.: 900.816.913-7

Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

RESOLUCIÓN No. 2023-426
(16 DE NOVIEMBRE DE 2023)

"POR MEDIO DEL CUAL SE RENUEVA UN PERMISO COMO SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD) TRANSITORIO"

20230200001243 1

El Director del Establecimiento Público Ambiental –EPA- en ejercicio de las facultades que le confieren la ley y el Acuerdo 034 del 06 de diciembre de 2014 emanado del Honorable Concejo Distrital de Buenaventura en especial lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 2811 de 1974 las demás normas concordantes y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo 034 del 06 de diciembre del 2014, se creó el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura –EPA- , el cual es la máxima autoridad descentralizada con autonomía administrativa, financiera, patrimonio propio y personería jurídica autorizada por la Ley 1617 de 2013, encargado de administrar dentro del área de sus jurisdicción urbana y suburbana, el ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas ambientales y evitar la degradación ambiental.

Que el artículo 80 de la Constitución Política, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, indica que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 31, numeral 12, señala que las autoridades ambientales ejercerán las siguientes funciones:

(...)

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

ASOCIACION MUTUAL ECO AMBIENTAL DE CALI

Nit 900641714-5. - Agosto 23 de 2013

CONSTANCIA DE GESTORES DE RESIDUOS DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Nº 4683

DATOS BASICOS DEL GESTOR

Nombre o Razón Social	Asociación Mutual Eco ambiental de Cali		No PIN	3503519411	
Número de Identificación o NIT	900641714-5	Representante Legal		Uriel Fernando Ariza	
Número telefónico de Contacto	3503521158	Dirección		Calle 42 No 39B-99	
Municipio	Santiago de Cali	Departamento		Valle del Cauca	
Gestor	Punto limpio X	aprovechamiento		Disposición final	
Tipo de RCD recibidos Concreto - Mortero		Peso RCD recibidos -ton		2 mts.^{3} - 1 Viaje	
Tipo de aprovechamiento (si aplica)	Entrega RCD aprovechables			Compra Ecomateriales	
Tipo de Ecomaterial y % de RCD contenido					
No PIN Gestor de Transporte					

DATOS BASICOS DEL GENERADOR

Nombre o razón social del Generador	Julio Ricardo Rojas Hernandez.		
Número de Identificación o NIT	79356655.		
Nombre del proyecto constructivo	Palacio de Justicia Cali.	No. Registro App WEB (PIN)	wmx 523
Dirección del proyecto	Calle 13 Carrera 10		
Número de teléfono de contacto			
Fecha de recepción de los RCD	11 de febrero 2025		
Firma y sello del gestor de RCD			
Nit	900641714-5	Fecha	

Asociación Mutual Eco Ambiental de Cali Nit. 900641714-5

CUMPLIDO

Después de haber efectuado una revisión del Contrato Estatal de Obra No. 082 de 2024 - SAMC-2024-09, se puede dar el pago al corte final, conforme lo estipula la forma de pago del presente contrato, al señor JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No.79.356.655 de Bogotá D.C.; cuyo objeto es " ***CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LOS INMUEBLES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CALI "PEDRO ELÍAS SERRANO ABADÍA", JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL DOVIO, PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO", SEDE FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA, EDIFICIO TRANSFERENCIAS, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE OBANDO, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL PALMAR Y PALACIO DE JUSTICIA DE TULUÁ "LIZANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA", INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO"*** el corte es por valor de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS ($ 633.148.010) M/CTE, incluido AIU e IVA, de acuerdo al acta de actividades eejcutadas, presentado y verificado por las partes.

Para tales efectos se aprueba la factura electrónica de Venta RR61 de fecha 21 de marzo de 2025 por un valor de $633.148.011,39 y una nota crédito 1 12 por un valor de $ 1.39, siendo el valor a pagar $633.148.010.

Firmado en Santiago de Cali, a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2025.

Concepto	Und	No. Registro Pptal- Rec 16 CSF	Fecha	Valor	DATOS FACTURA		Afectación	Nuevo saldo del Registro Pptal
					No. Factura	Valor		
Valor Inicial Contrato	02	29124	26/07/2024	$1.260.568.325	RR-56 Dic-02-2024	$544.938.749	$544.938.749	$715.629.576
					RR-59 Febre-24-2025	$709.612.053,88	$709.612.053,88	$6.017.522,12
					Nota Debito No.2	0.12	0.12	$6.017.522
					RR-61 marz-21-2025	$633.148.011,39	$6.017.522	$0

MODIFICACIÓN No.1

Concepto	Und	No. Registro Pptal- Rec 16 CSF	Fecha	Valor	DATOS FACTURA		Afectación	Nuevo saldo del Registro Pptal
					No. Factura	Valor		
Valor Adición Contrato	02	48824	13/11/2024	$627.130.493	RR-61 marz-20-2025	$633.148.011,39	$627.130.488	$5
					Nota crédito 1 12	$1.39	0	0

MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa
Supervisión Contrato

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

CONTRATISTA:	CONTRATANTE:		OBJETO:			
JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA		CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LOS INMUEBLES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CALI "PEDRO ELÍAS SERRANO ABADÍA", JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL DOVIO, PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO", SEDE FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA, EDIFICIO TRANSFERENCIAS, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE OBANDO, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL PALMAR Y PALACIO DE JUSTICIA DE TULUÁ "LIZANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA", INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO.			
FECHA PRESENTE:	CONTRATO No.	082-2024– SAMC-2024-09				
24/02/25	VALOR CONTRATO:	$1.260.568.325,00				
FECHA ACTA DE INICIO:	VALOR ADICIÓN AL CONTRATO:	$627.130.493,00	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1:	10	VR PAGADO CORTE No. 1	$544.938.749,00
30/07/24			TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2:	13	VR CORTE No. 2	$709.612.054,00
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	**VALOR TOTAL CONTRATO:**	**$1.887.698.818,00**	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 3:	38	VR CORTE No. 3	$633.148.010,00
			TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 4:	25	TOTAL CORTES	$1.887.698.813,00
24/02/25	ACTA No.	**3**	**TOTAL TIEMPO ADICIONES**	**86**	**SALDO ACTUAL CONTRATO**	**$5,00**

INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONTRATO INTERVENTORIA	0	TIEMPO (DIAS) ADICION 1:	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2:
Ing. / Arq			10	13

PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI		CANTIDADES CONTRACTUALES				Corte 1 8/09/24		CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR CONFORME ADICION Y REPLANTEO		Corte 2 18/10/24		Corte 3 30/11/24		ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO ANTES DE AIU E IVA	VALOR	CANT.	VALOR	MAYORES Y MENORES	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
A.	**Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"**																		
A. 2	**Actividades para cubierta de la terraza torre A - Fase C**																		
A. 2,1	Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza	UND	52,00	$ 63.587,00	$ 3.306.524,00	48,00	$ 3.052.176,00	48,00	$ 3.052.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -	48,00	$ 3.052.176,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,2	Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto.	UND	52,00	$ 63.516,00	$ 3.302.832,00	48,00	$ 3.048.768,00	48,00	$ 3.048.768,00	0,00	$ -	0,00	$ -	48,00	$ 3.048.768,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,3	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 100 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 2	ML	97,00	$ 106.132,00	$ 10.294.804,00	54,00	$ 5.731.128,00	54,00	$ 5.731.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -	54,00	$ 5.731.128,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,4	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1	ML	212,00	$ 106.132,00	$ 22.499.984,00	189,00	$ 20.058.948,00	470,00	$ 49.882.040,00	281,00	$ 29.823.092,00	0,00	$ -	470,00	$ 49.882.040,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,5	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1	ML	255,00	$ 97.837,00	$ 24.948.435,00	255,00	$ 24.948.435,00	412,00	$ 40.308.844,00	157,00	$ 15.360.409,00	0,00	$ -	412,00	$ 40.308.844,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,6	Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica	M2	330,00	$ 72.682,00	$ 23.985.060,00	0,00	$ -	550,00	$ 39.975.100,00	550,00	$ 39.975.100,00	0,00	$ -	550,00	$ 39.975.100,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,7	Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación	ML	28,00	$ 82.513,00	$ 2.310.364,00	0,00	$ -	28,00	$ 2.310.364,00	28,00	$ 2.310.364,00	0,00	$ -	28,00	$ 2.310.364,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,8	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal	ML	40,00	$ 90.166,00	$ 3.606.640,00	0,00	$ -	61,50	$ 5.545.209,00	61,50	$ 5.545.209,00	0,00	$ -	61,50	$ 5.545.209,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,9	Corte de muro con pulidora	ML	40,00	$ 15.009,00	$ 600.360,00	0,00	$ -	70,00	$ 1.050.630,00	70,00	$ 1.050.630,00	0,00	$ -	70,00	$ 1.050.630,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,10	Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	ML	70,00	$ 50.569,00	$ 3.539.830,00	0,00	$ -	70,00	$ 3.539.830,00	70,00	$ 3.539.830,00	0,00	$ -	70,00	$ 3.539.830,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,11	Suministro e instalación de soscos para canal en 3"	UND	10,00	$ 25.829,00	$ 258.290,00	0,00	$ -	8,00	$ 206.632,00	8,00	$ 206.632,00	0,00	$ -	8,00	$ 206.632,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,12	Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios.	ML	80,00	$ 41.046,00	$ 3.283.680,00	0,00	$ -	84,00	$ 3.447.864,00	84,00	$ 3.447.864,00	0,00	$ -	84,00	$ 3.447.864,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,13	Suministro e instalación tubo de pasamanos de 2"	ML	7,00	$ 122.476,00	$ 857.332,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
A. 2,14	Suministro e instalación pasarela o plataforma metálica en rejilla de acero con 2 pasos en cada extremo cuyas medidas son 80 cm ancho, 160cm de largo y 40 cm de latura, incluye pasamanos	UND	1,00	$ 852.250,00	$ 852.250,00	0,00	$ -	1,00	$ 852.250,00	1,00	$ 852.250,00	0,00	$ -	1,00	$ 852.250,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 3	**Impermeabilización cubierta de cuartos técnicos terraza torre A**																		
A. 3,1	Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros	M2	191,00	$ 17.584,00	$ 3.358.544,00	160,96	$ 2.830.321,00	160,96	$ 2.830.321,00	0,00	$ -	0,00	$ -	160,96	$ 2.830.321,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 3,2	Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso, incluye retiro)	M2	191,00	$ 31.241,00	$ 5.967.031,00	160,96	$ 5.028.551,00	160,96	$ 5.028.551,00	0,00	$ -	0,00	$ -	160,96	$ 5.028.551,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 3,3	Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación)	M2	51,00	$ 206.656,00	$ 10.539.456,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
A. 3,4	Suministro e instalación de enchape antideslizante	M2	140,00	$ 80.833,00	$ 11.316.620,00	140,00	$ 11.316.426,00	161,00	$ 13.014.113,00	21,00	$ 1.697.687,00	0,00	$ -	161,00	$ 13.014.113,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 3,5	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero.	M2	140,00	$ 37.743,00	$ 5.284.020,00	140,00	$ 5.283.929,00	161,00	$ 6.076.623,00	21,00	$ 792.694,00	0,00	$ -	161,00	$ 6.076.623,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 4	**Tratamiento de humedades en muros y cielos, incluye resane, estuco y pintura (gimnasio, despachos, cuartos técnicos terraza Torre A)**																		
A. 4,1	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	247,00	$ 6.458,00	$ 1.595.126,00	171,90	$ 1.110.130,00	246,94	$ 1.594.739,00	75,04	$ 484.608,00	0,00	$ -	246,94	$ 1.594.739,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 4,2	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	247,00	$ 43.882,00	$ 10.838.854,00	171,90	$ 7.543.316,00	246,99	$ 10.838.415,00	75,09	$ 3.295.099,00	0,00	$ -	246,99	$ 10.838.415,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 4,3	Suministro y aplicación de estuco plástico	M2	247,00	$ 25.621,00	$ 6.328.387,00	170,00	$ 4.355.570,00	318,28	$ 8.154.652,00	76,99	$ 1.972.561,00	71,29	$ 1.826.521,00	318,28	$ 8.154.652,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 4,4	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)	M2	353,00	$ 18.506,00	$ 6.532.618,00	353,01	$ 6.532.711,00	838,69	$ 15.520.705,00	285,55	$ 5.284.388,00	200,13	$ 3.703.606,00	838,69	$ 15.520.705,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 4,5	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	M2	67,16	$ 17.048,00	$ 1.144.978,00	66,90	$ 1.140.511,00	141,78	$ 2.416.980,00	8,40	$ 143.118,00	66,48	$ 1.133.351,00	141,78	$ 2.416.980,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 4,6	Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1	M2	66,00	$ 16.558,00	$ 1.092.828,00	0,00	$ -	66,00	$ 1.092.828,00	66,00	$ 1.092.828,00	0,00	$ -	66,00	$ 1.092.828,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 4,7	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	ML	73,00	$ 4.578,00	$ 334.194,00	48,80	$ 223.406,00	65,80	$ 301.232,00	17,00	$ 77.826,00	0,00	$ -	65,80	$ 301.232,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 4,8	Suministro y aplicación de estuco plástico	ML	121,00	$ 20.167,00	$ 2.440.207,00	121,00	$ 2.440.207,00	121,00	$ 2.440.207,00	0,00	$ -	0,00	$ -	121,00	$ 2.440.207,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 4,9	Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)	ML	121,00	$ 5.961,00	$ 721.281,00	121,00	$ 721.281,00	121,00	$ 721.281,00	0,00	$ -	0,00	$ -	121,00	$ 721.281,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 4,10	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	ML	73,00	$ 7.792,00	$ 568.816,00	64,90	$ 505.701,00	73,00	$ 568.816,00	8,10	$ 63.115,00	0,00	$ -	73,00	$ 568.816,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 5	**Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos**																		
A. 5,1	Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo	M2	256,00	$ 118.956,00	$ 30.452.736,00	255,72	$ 30.418.952,00	270,82	$ 32.215.188,00	15,10	$ 1.796.236,00	0,00	$ -	270,816	$ 32.215.188,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 5,2	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	60,00	$ 44.391,00	$ 2.663.460,00	45,00	$ 1.997.595,00	55,00	$ 2.441.505,00	10,00	$ 443.910,00	0,00	$ -	55,00	$ 2.441.505,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 5,3	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	60,00	$ 45.141,00	$ 2.708.460,00	45,00	$ 2.031.345,00	91,85	$ 4.146.201,00	5,00	$ 225.705,00	41,85	$ 1.889.151,00	91,85	$ 4.146.201,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 5,4	Suministro e instalación de guarda escoba en pvc	ML	72,00	$ 36.136,00	$ 2.601.792,00	71,80	$ 2.594.565,00	84,20	$ 3.042.651,00	3,40	$ 122.862,00	9,00	$ 325.224,00	84,20	$ 3.042.651,00	100%	0,00	$ -	0%

A. 5,5	Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz	UND	12,00	$	598.760,00	$	7.185.120,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-		0,00	$	-	
A. 5,6	Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica	ML	1,00	$	16.951,00	$	16.951,00	1,00	$	16.951,00	1,00	$	16.951,00	0,00	$	-	0,00	$	-	1,00	$	16.951,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,7	Suministro e instalación de panel yeso de 1/2 , una cara, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	M2	16,00	$	62.106,00	$	993.696,00	15,60	$	968.854,00	15,60	$	968.854,00	0,00	$	-	0,00	$	-	15,60	$	968.854,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,8	Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado RETIE	ML	241,00	$	70.776,00	$	17.057.016,00	161,50	$	11.430.324,00	320,00	$	22.648.320,00	110,50	$	7.820.748,00	48,00	$	3.397.248,00	320,00	$	22.648.320,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,9	Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación	UND	189,00	$	33.945,00	$	6.415.605,00	49,00	$	1.663.305,00	281,00	$	9.538.545,00	190,00	$	6.449.550,00	42,00	$	1.425.690,00	281,00	$	9.538.545,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,10	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH	ML	1970,00	$	10.147,00	$	19.989.590,00	1518,00	$	15.403.146,00	4.833,70	$	49.047.554,00	2271,00	$	23.043.837,00	1.044,70	$	10.600.571,00	4833,70	$	49.047.554,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,11	Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)	UND	75,00	$	69.514,00	$	5.213.550,00	48,00	$	3.336.672,00	169,00	$	11.747.866,00	87,00	$	6.047.718,00	34,00	$	2.363.476,00	169,00	$	11.747.866,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,12	Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)	UND	63,00	$	19.587,00	$	1.233.981,00	48,00	$	940.176,00	101,00	$	1.978.287,00	36,00	$	705.132,00	17,00	$	332.979,00	101,00	$	1.978.287,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,13	Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado	UND	35,00	$	116.367,00	$	4.072.845,00	35,00	$	4.072.845,00	88,00	$	10.240.296,00	39,00	$	4.538.313,00	14,00	$	1.629.138,00	88,00	$	10.240.296,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,14	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	63,00	$	116.367,00	$	7.331.121,00	45,00	$	5.236.515,00	101,00	$	11.753.067,00	39,00	$	4.538.313,00	17,00	$	1.978.239,00	101,00	$	11.753.067,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,15	Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación	UND	9,00	$	93.387,00	$	840.483,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-		0,00	$	-	
A. 5,16	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 - 240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	UND	20,00	$	100.492,00	$	2.009.840,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-		0,00	$	-	
A. 5,17	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	ML	20,00	$	16.332,00	$	326.640,00	20,00	$	326.640,00	732,00	$	11.955.024,00	624,00	$	10.191.168,00	88,00	$	1.437.216,00	732,00	$	11.955.024,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,18	Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A	UND	63,00	$	35.183,00	$	2.216.529,00	17,00	$	598.111,00	84,00	$	2.955.372,00	33,00	$	1.161.039,00	34,00	$	1.196.222,00	84,00	$	2.955.372,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,19	Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A	UND	5,00	$	45.811,00	$	229.055,00	3,00	$	137.433,00	86,00	$	3.939.746,00	2,00	$	91.622,00	81,00	$	3.710.691,00	86,00	$	3.939.746,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,20	Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T	UND	1,00	$	2.956.090,00	$	2.956.090,00	1,00	$	2.956.090,00	4,00	$	11.824.360,00	2,00	$	5.912.180,00	1,00	$	2.956.090,00	4,00	$	11.824.360,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,21	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos cat. 6a (incluye elementos de fijación)	UND	1,00	$	328.968,00	$	328.968,00	1,00	$	328.968,00	5,00	$	1.644.840,00	1,00	$	328.968,00	3,00	$	986.904,00	5,00	$	1.644.840,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,22	Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material	M2	5,00	$	18.069,00	$	90.345,00	3,20	$	57.821,00	3,20	$	57.821,00	0,00	$	-	0,00	$	-	3,20	$	57.821,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,23	Suministro e instalación de tubería SCH 40 1"	ML	15,00	$	19.960,00	$	299.400,00	15,00	$	299.400,00	252,67	$	5.043.224,00	4,00	$	79.840,00	233,67	$	4.663.984,00	252,67	$	5.043.224,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,24	Suministro e instalación de tubería SCH 40 1 1/2"	ML	15,00	$	36.458,00	$	546.870,00	15,00	$	546.870,00	15,00	$	546.870,00	0,00	$	-	0,00	$	-	15,00	$	546.870,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 5,25	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, (ver imagen1)	UND	7,00	$	135.055,00	$	945.385,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-		0,00	$	-	
A. 5,26	Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar)	ML	17,00	$	236.946,00	$	4.028.082,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-		0,00	$	-	
A. 6	**Muro de Contención antiderrame**																										
A. 6,1	Demolición muro existente incluye retiro	M3	3,00	$	175.320,00	$	525.960,00	0,00	$	-	1,51	$	265.084,00	1,51	$	265.084,00	0,00	$	-	1,51	$	265.084,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 6,2	Fabricación muro en ladrillo estructural - altura 70 cm incluye viga, dovelas, grouting, ladrillo estructural 14x19x39 cm, mortero	M2	17,00	$	311.680,00	$	5.298.560,00	0,00	$	-	5,60	$	1.745.408,00	0,00	$	-	5,60	$	1.745.408,00	5,60	$	1.745.408,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 6,3	Suministro y fabricación guardaescoba en concreto en media caña 10 cm	ML	33,00	$	36.103,00	$	1.191.399,00	0,00	$	-	48,30	$	1.743.775,00	31,00	$	1.119.193,00	17,30	$	624.582,00	48,30	$	1.743.775,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 6,4	Suministro y aplicación de mortero 1:3 esmaltado	M2	24,00	$	36.282,00	$	870.768,00	0,00	$	-	42,92	$	1.557.223,00	21,83	$	792.036,00	21,09	$	765.187,00	42,92	$	1.557.223,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 6,5	Corte de concreto con pulidora y/o cortadora	ML	3,00	$	14.447,00	$	43.341,00	0,00	$	-	14,50	$	209.482,00	0,00	$	-	14,50	$	209.482,00	14,50	$	209.482,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 6,6	excavación tierra a mano 30 cm	M3	1,00	$	40.671,00	$	40.671,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-		0,00	$	-	
A. 6,7	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4" con sus respectivos accesorios	ML	3,00	$	47.426,00	$	142.278,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-		0,00	$	-	
A. 6,8	Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en placa de RF espesor 12,7 mm , una cara, incluye estructura	M2	20,00	$	150.970,00	$	3.019.400,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-		0,00	$	-	
A. 6,9	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	2,00	$	77.341,00	$	154.682,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-		0,00	$	-	
A. 7	**Sellamiento de fisuras piso y muros**																										
A. 7,1	Corte de concreto con pulidora y/o cortadora	ML	220,00	$	14.447,00	$	3.178.340,00	0,00	$	-	126,20	$	1.823.211,00	35,00	$	505.645,00	91,20	$	1.317.566,00	126,20	$	1.823.211,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 7,2	suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elástico para interior y exterior	ML	120,00	$	35.982,00	$	4.317.840,00	34,60	$	1.244.977,00	69,60	$	2.504.347,00	35,00	$	1.259.370,00	0,00	$	-	69,60	$	2.504.347,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 7,3	Suministro e instalación de perfil o dilatación aluminio para piso	ML	100,00	$	25.040,00	$	2.504.000,00	0,00	$	-	17,50	$	438.200,00	0,00	$	-	17,50	$	438.200,00	17,50	$	438.200,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 7,4	Suministro e instalación de dilatación Z plástica (junta de expansión drywall)	ML	100,00	$	8.264,00	$	826.400,00	26,00	$	214.864,00	61,00	$	504.104,00	14,00	$	115.696,00	21,00	$	173.544,00	61,00	$	504.104,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 8	**Reparación de fachada flotante calle 10**																										
A. 8,1	Desmonte de láminas metálicas en mal estado	ML	170,00	$	5.369,00	$	912.730,00	0,00	$	-	234,00	$	1.256.346,00	0,00	$	-	234,00	$	1.256.346,00	234,00	$	1.256.346,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 8,2	Desmonte de estructura metálica en mal estado	ML	97,00	$	5.357,00	$	519.629,00	0,00	$	-	35,00	$	187.495,00	0,00	$	-	35,00	$	187.495,00	35,00	$	187.495,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 8,3	Suministro e instalación de lámina metálica perforada redonda 5mm calibre 3mm	M2	50,00	$	477.260,00	$	23.863.000,00	0,00	$	-	52,00	$	24.817.520,00	0,00	$	-	52,00	$	24.817.520,00	52,00	$	24.817.520,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 8,4	Suministro e instalación de estructura o perfiles metálicos 50mm x 50mm x 3mm	ML	112,00	$	78.894,00	$	8.836.128,00	0,00	$	-	66,00	$	5.207.004,00	0,00	$	-	66,00	$	5.207.004,00	66,00	$	5.207.004,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 9	**Impermeabilización piso de cuarto de residuos sólidos**																										
A. 9,1	Retiro de pintura epoxica existente con cloruro de metileno	M2	41,00	$	24.350,00	$	998.350,00	0,00	$	-	43,00	$	1.047.050,00	43,00	$	1.047.050,00	0,00	$	-	43,00	$	1.047.050,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 9,2	lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie)	M2	41,00	$	31.241,00	$	1.280.881,00	0,00	$	-	43,00	$	1.343.363,00	43,00	$	1.343.363,00	0,00	$	-	43,00	$	1.343.363,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 9,3	Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso con acabado en barniz (2 capas de pintura epoxica)	M2	41,00	$	41.395,00	$	1.697.195,00	0,00	$	-	90,00	$	3.725.550,00	0,00	$	-	90,00	$	3.725.550,00	90,00	$	3.725.550,00	100%	0,00	$	-	0%
A. 9,4	Aseo general.	M2	41,00	$	5.357,00	$	219.637,00	18,00	$	96.426,00	43,00	$	230.351,00	9,00	$	48.213,00	16,00	$	85.712,00	43,00	$	230.351,00	100%	0,00	$	-	0%
	ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																										
E. 2,7	Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente.	UND	0,00	$	1.071.400,00	$	-	0,00	$	-	7,00	$	7.499.800,00	7,00	$	7.499.800,00	0,00	$	-	7,00	$	7.499.800,00	100%	0,00	$	-	0%
D. 1,5	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior	M2	0,00	$	72.368,00	$	-	0,00	$	-	63,32	$	4.582.342,00	8,00	$	578.944,00	55,32	$	4.003.398,00	63,32	$	4.582.342,00	100%	0,00	$	-	0%
	OBRAS NO PREVISTAS																										
NP 1	Losa en concreto de 3000 PSI espesor de 0,15 con lámina colaborante, incluye acero de refuerzo en lamina electrosoldada	M2	0,00	$	270.285,00	$	-	0,00	$	-	4,00	$	1.081.140,00	0,00	$	-	4,00	$	1.081.140,00	4,00	$	1.081.140,00	100%	0,00	$	-	0%
NP 2	Suministro e instalación de perfil HEA 190x200x6.5 mm, incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento	ML	0,00	$	599.592,00	$	-	0,00	$	-	12,00	$	7.195.104,00	0,00	$	-	12,00	$	7.195.104,00	12,00	$	7.195.104,00	100%	0,00	$	-	0%
NP 3	Suministro e instalación de IPE 220X110X5.9 MM, incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento	ML	0,00	$	457.100,00	$	-	0,00	$	-	12,00	$	5.485.200,00	0,00	$	-	12,00	$	5.485.200,00	12,00	$	5.485.200,00	100%	0,00	$	-	0%
NP 4	Suministro e instalación de perlín estructural tipo C entre 200 y 190x160x60	ML	0,00	$	159.000,00	$	-	0,00	$	-	8,00	$	1.272.000,00	0,00	$	-	8,00	$	1.272.000,00	8,00	$	1.272.000,00	100%	0,00	$	-	0%
NP 5	Suministro e instalación de bases en concreto de 3000 PSI de 40cmx40cm undidos sobre losa sotano	UND	0,00	$	127.174,00	$	-	0,00	$	-	4,00	$	508.696,00	0,00	$	-	4,00	$	508.696,00	4,00	$	508.696,00	100%	0,00	$	-	0%
NP 6	Suministro e instalación de platina 1/2 30 cm x 30 cm x 50 aprox. incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto.	UND	0,00	$	191.000,00	$	-	0,00	$	-	8,00	$	1.528.000,00	0,00	$	-	8,00	$	1.528.000,00	8,00	$	1.528.000,00	100%	0,00	$	-	0%
NP 7	Desmonte y montaje del tanque de combustible	GL	0,00	$	1.800.000,00	$	-	0,00	$	-	1,00	$	1.800.000,00	0,00	$	-	1,00	$	1.800.000,00	1,00	$	1.800.000,00	100%	0,00	$	-	0%

COSTO DIRECTO					**$ 354.904.144,00**		**$ 192.790.360,00**		**$ 506.860.635,00**		**$ 205.086.839,00**		**$ 108.983.435,00**		**$ 506.860.635,00**			**$ -**								
ADMINISTRACION				18,50%	$ 65.657.267,00	18,50%	$ 35.666.217,00	18,50%	$ 93.769.217,00	18,50%	$ 37.941.065,00	18,50%	$ 20.161.935,00	18,50%	$ 93.769.217,00		18,50%	$ -								
IMPREVISTO				2,00%	$ 7.098.083,00	2,00%	$ 3.855.807,00	2,00%	$ 10.137.213,00	2,00%	$ 4.101.737,00	2,00%	$ 2.179.669,00	2,00%	$ 10.137.213,00		2,00%	$ -								
UTILIDAD				4,50%	$ 15.970.686,00	4,50%	$ 8.675.566,00	4,50%	$ 22.808.729,00	4,50%	$ 9.228.908,00	4,50%	$ 4.904.255,00	4,50%	$ 22.808.729,00		4,50%	$ -								
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 3.034.430,00	19,00%	$ 1.648.358,00	19,00%	$ 4.333.659,00	19,00%	$ 1.753.493,00	19,00%	$ 931.808,00	19,00%	$ 4.333.659,00		19,00%	$ -								
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA					**$ 446.664.610,00**		**$ 242.636.308,00**		**$ 637.909.453,00**		**$ 258.112.042,00**		**$ 137.161.102,00**		**$ 637.909.453,00**			**$ -**								
B	**Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio**																									
B. 1,1	Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros	M2	6,00	$ 16.636,00	$ 99.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -								
B. 1,2	Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente)	M2	6,00	$ 31.241,00	$ 187.446,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -								
B. 1,3	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente)	M2	6,00	$ 34.334,00	$ 206.004,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -								
B. 1,4	Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación)	M2	6,00	$ 206.656,00	$ 1.239.936,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -								
B. 1,5	Rasqueteada de Pintura	M2	20,00	$ 6.458,00	$ 129.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -								
B. 1,6	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	3,00	$ 43.882,00	$ 131.646,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -								
B. 1,7	Suministro y aplicación de estuco plástico	M2	20,00	$ 25.621,00	$ 512.420,00	0,00	$ -	2,00	$ 51.242,00	0,00	$ -	2,00	$ 51.242,00	2,00	$ 51.242,00	100%	0,00	$ -	0%							
B. 1,8	Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)	M2	20,00	$ 18.506,00	$ 370.120,00	0,00	$ -	29,00	$ 536.674,00	0,00	$ -	29,00	$ 536.674,00	29,00	$ 536.674,00	100%	0,00	$ -	0%							
B. 1,9	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	M2	4,00	$ 17.048,00	$ 68.192,00	0,00	$ -	4,00	$ 68.192,00	0,00	$ -	4,00	$ 68.192,00	4,00	$ 68.192,00	100%	0,00	$ -	0%							
B. 1,10	Aseo general.	M2	21,00	$ 5.357,00	$ 112.497,00	0,00	$ -	24,00	$ 128.568,00	0,00	$ -	24,00	$ 128.568,00	24,00	$ 128.568,00	100%	0,00	$ -	0%							
B. 1,11	Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts.	ML	24,00	$ 26.426,00	$ 634.224,00	0,00	$ -	24,00	$ 634.224,00	0,00	$ -	24,00	$ 634.224,00	24,00	$ 634.224,00	100%	0,00	$ -	0%							
	ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																									
A. 5,7	Suministro e instalación de panel yeso de 1/2 , una cara, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	M2	0,00	$ 62.106,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 62.106,00	0,00	$ -	1,00	$ 62.106,00	1,00	$ 62.106,00	100%	0,00	$ -	0%							
A. 2,5	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1	ML	0,00	$ 97.837,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 1.467.555,00	0,00	$ -	15,00	$ 1.467.555,00	15,00	$ 1.467.555,00	100%	0,00	$ -	0%							
A. 2,6	Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica	M2	0,00	$ 72.682,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 654.138,00	0,00	$ -	9,00	$ 654.138,00	9,00	$ 654.138,00	100%	0,00	$ -	0%							
E. 2,7	Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente.	UND	0,00	$ 1.071.400,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.071.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.071.400,00	1,00	$ 1.071.400,00	100%	0,00	$ -	0%							
COSTO DIRECTO					**$ 3.691.461,00**		**$ -**		**$ 4.674.099,00**		**$ -**		**$ 4.674.099,00**		**$ 4.674.099,00**			**$ -**								
ADMINISTRACION				18,50%	$ 682.920,00	18,50%	$ -	18,50%	$ 864.708,00	18,50%	$ -	18,50%	$ 864.708,00	18,50%	$ 864.708,00		18,50%	$ -								
IMPREVISTO				2,00%	$ 73.829,00	2,00%	$ -	2,00%	$ 93.482,00	2,00%	$ -	2,00%	$ 93.482,00	2,00%	$ 93.482,00		2,00%	$ -								
UTILIDAD				4,50%	$ 166.116,00	4,50%	$ -	4,50%	$ 210.334,00	4,50%	$ -	4,50%	$ 210.334,00	4,50%	$ 210.334,00		4,50%	$ -								
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 31.562,00	19,00%	$ -	19,00%	$ 39.963,00	19,00%	$ -	19,00%	$ 39.963,00	19,00%	$ 39.963,00		19,00%	$ -								
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA					**$ 4.645.888,00**		**$ -**		**$ 5.882.586,00**		**$ -**		**$ 5.882.586,00**		**$ 5.882.586,00**			**$ -**								
C	**Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira**																									
C. 1	**Reparaciones y Tratamiento de humedades externas**																									
C. 1,1	Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros)	ML	47,00	$ 221.046,00	$ 10.389.162,00	47,00	$ 10.389.162,00	47,00	$ 10.389.162,00	0,00	$ -	0,00	$ -	47,00	$ 10.389.162,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 1,2	Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales.	M2	47,00	$ 16.247,00	$ 763.609,00	47,00	$ 763.609,00	94,00	$ 1.527.218,00	47,00	$ 763.609,00	0,00	$ -	94,00	$ 1.527.218,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 1,3	Lijada con maquina pulidora (piedra esmeril)	M2	1037,00	$ 9.444,00	$ 9.793.428,00	1.034,41	$ 9.769.002,00	1.034,41	$ 9.769.002,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1034,41	$ 9.769.002,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 1,4	Lavado de la fachada con hidrolavadora, incluye ventaneria y piedra.	M2	1234,00	$ 8.724,00	$ 10.765.416,00	1.234,00	$ 10.765.416,00	1.575,25	$ 13.742.481,00	341,25	$ 2.977.065,00	0,00	$ -	1575,25	$ 13.742.481,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 1,5	Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra, 2 manos)	M2	1037,00	$ 43.830,00	$ 45.451.710,00	981,78	$ 43.031.251,00	1.323,37	$ 58.003.377,00	341,60	$ 14.972.126,00	0,00	$ -	1323,37	$ 58.003.377,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 1,6	Suministro e instalación de ángulo en aluminio anoloc de 1/2, (gotero en ventana)	ML	117,00	$ 23.502,00	$ 2.749.734,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -								
C. 2	**Reparaciones y Tratamiento de humedades internas**																									
C. 2,1	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	179,0	$ 6.458,00	$ 1.155.982,00	177,59	$ 1.146.874,00	189,70	$ 1.225.083,00	12,11	$ 78.209,00	0,00	$ -	189,70	$ 1.225.083,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 2,2	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	90,00	$ 43.882,00	$ 3.949.380,00	90,00	$ 3.949.380,00	149,53	$ 6.561.877,00	59,53	$ 2.612.497,00	0,00	$ -	149,53	$ 6.561.877,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 2,3	Suministro y aplicación de estuco plástico	M2	149,00	$ 25.621,00	$ 3.817.529,00	149,00	$ 3.817.529,00	301,15	$ 7.715.744,00	152,15	$ 3.898.215,00	0,00	$ -	301,15	$ 7.715.744,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 2,4	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)	M2	298,00	$ 18.506,00	$ 5.514.788,00	0,00	$ -	239,35	$ 4.429.411,00	226,39	$ 4.189.559,00	12,96	$ 239.853,00	239,35	$ 4.429.411,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 2,5	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	M2	60,00	$ 17.048,00	$ 1.022.880,00	0,00	$ -	56,80	$ 968.326,00	0,00	$ -	56,80	$ 968.326,00	56,80	$ 968.326,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 2,6	Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1	M2	56,00	$ 16.558,00	$ 927.248,00	0,00	$ -	129,00	$ 2.135.982,00	0,00	$ -	129,00	$ 2.135.982,00	129,00	$ 2.135.982,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 2,7	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	ML	149,00	$ 4.578,00	$ 682.122,00	139,40	$ 638.173,00	139,40	$ 638.173,00	0,00	$ -	0,00	$ -	139,40	$ 638.173,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 2,8	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	ML	74,00	$ 17.191,00	$ 1.272.134,00	74,00	$ 1.272.134,00	89,80	$ 1.543.752,00	15,80	$ 271.618,00	0,00	$ -	89,80	$ 1.543.752,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 2,9	Suministro y aplicación de estuco plástico	ML	124,00	$ 20.167,00	$ 2.500.708,00	26,00	$ 524.342,00	26,00	$ 524.342,00	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 524.342,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 2,10	Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)	ML	248,00	$ 5.961,00	$ 1.478.328,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -								
C. 2,11	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	ML	50,00	$ 7.792,00	$ 389.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -								
C. 2,12	Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a dos manos (muro terraza)	ML	384,00	$ 13.344,00	$ 5.124.096,00	137,61	$ 1.836.268,00	193,77	$ 2.585.667,00	56,16	$ 749.399,00	0,00	$ -	193,77	$ 2.585.667,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 2,13	Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a 3 manos (muro terraza)	M2	230,00	$ 18.019,00	$ 4.144.370,00	210,57	$ 3.794.261,00	255,79	$ 4.609.080,00	15,22	$ 274.321,00	30,00	$ 540.498,00	255,79	$ 4.609.080,00	100%	0,00	$ -	0%							
C.3	**Puerta garaje**																									
C. 3,1	Desmonte puerta eléctrica existente 320 cm x 270 cm(incluye motor)	UND	1,00	$ 389.600,00	$ 389.600,00	0,00	$ -	1,00	$ 389.600,00	0,00	$ -	1,00	$ 389.600,00	1,00	$ 389.600,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 3,2	suministro e instalación de puerta eléctrica de 320 cm de ancho x 270 cm de alto (Incluye motor)	UND	1	$ 5.844.000,00	$ 5.844.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.844.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.844.000,00	1,00	$ 5.844.000,00	100%	0,00	$ -	0%							
C.4	**Impermeabilización Terraza- materas**																									
C. 4,1	Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros	M2	86,00	$ 17.584,00	$ 1.512.224,00	26,00	$ 457.184,00	59,66	$ 1.049.061,00	0,00	$ -	33,66	$ 591.877,00	59,66	$ 1.049.061,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 4,2	Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie)	M2	86,00	$ 31.241,00	$ 2.686.726,00	0,00	$ -	203,39	$ 6.354.087,00	135,74	$ 4.240.716,00	67,65	$ 2.113.371,00	203,39	$ 6.354.087,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 4,3	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente)	M2	86,00	$ 34.334,00	$ 2.952.724,00	0,00	$ -	20,00	$ 686.680,00	0,00	$ -	20,00	$ 686.680,00	20,00	$ 686.680,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 4,4	Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.	M2	86,00	$ 218.517,00	$ 18.792.462,00	0,00	$ -	206,00	$ 45.014.502,00	146,93	$ 32.105.829,00	59,07	$ 12.908.673,00	206,00	$ 45.014.502,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 5	**Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos**																									
C. 5,1	Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo	M2	24,00	$ 118.956,00	$ 2.854.944,00	0,00	$ -	58,67	$ 6.979.149,00	52,19	$ 6.208.671,00	6,4770	$ 770.478,00	58,6700	$ 6.979.149,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 5,2	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	15,00	$ 44.391,00	$ 665.865,00	0,00	$ -	20,00	$ 887.820,00	20,00	$ 887.820,00	0,00	$ -	20,00	$ 887.820,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 5,3	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	15,00	$ 45.141,00	$ 677.115,00	0,00	$ -	26,00	$ 1.173.666,00	26,00	$ 1.173.666,00	0,00	$ -	26,00	$ 1.173.666,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 5,4	Suministro e instalación de guarda escoba en pvc	ML	9,39	$ 36.136,00	$ 339.317,00	0,00	$ -	37,60	$ 1.358.714,00	13,40	$ 484.222,00	24,20	$ 874.491,00	37,60	$ 1.358.714,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 5,5	Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, imunización y pintura en Barniz	UND	3,00	$ 598.760,00	$ 1.796.280,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.395.040,00	4,00	$ 2.395.040,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.395.040,00	100%	0,00	$ -	0%							
C. 5,6	Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado RETIE	ML	54,00	$ 70.776,00	$ 3.821.904,00	0,00	$ -	30,00	$ 2.123.280,00	0,00	$ -	30,00	$ 2.123.280,00	30,00	$ 2.123.280,00	100%	0,00	$ -	0%							

C. 5,7	Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación	UND	48,00	$ 33.945,00	$ 1.629.360,00	0,00	$ -	39,00	$ 1.323.855,00	0,00	$ -	39,00	$ 1.323.855,00	39,00	$ 1.323.855,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 5,8	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH	ML	375,00	$ 10.147,00	$ 3.805.125,00	0,00	$ -	730,00	$ 7.407.310,00	0,00	$ -	730,00	$ 7.407.310,00	730,00	$ 7.407.310,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 5,9	Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)	UND	18,00	$ 69.514,00	$ 1.251.252,00	0,00	$ -	14,00	$ 973.196,00	0,00	$ -	14,00	$ 973.196,00	14,00	$ 973.196,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 5,10	Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)	UND	18,00	$ 19.587,00	$ 352.566,00	0,00	$ -	14,00	$ 274.218,00	0,00	$ -	14,00	$ 274.218,00	14,00	$ 274.218,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 5,11	Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado	UND	18,00	$ 116.367,00	$ 2.094.606,00	0,00	$ -	11,00	$ 1.280.037,00	0,00	$ -	11,00	$ 1.280.037,00	11,00	$ 1.280.037,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 5,12	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	18,00	$ 116.367,00	$ 2.094.606,00	0,00	$ -	14,00	$ 1.629.138,00	0,00	$ -	14,00	$ 1.629.138,00	14,00	$ 1.629.138,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 5,13	Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida	UND	3,00	$ 93.387,00	$ 280.161,00	0,00	$ -	3,00	$ 280.161,00	0,00	$ -	3,00	$ 280.161,00	3,00	$ 280.161,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 5,14	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 - 240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	UND	12,00	$ 100.492,00	$ 1.205.904,00	0,00	$ -	2,00	$ 200.984,00	0,00	$ -	2,00	$ 200.984,00	2,00	$ 200.984,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 5,15	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	ML	20,00	$ 16.332,00	$ 326.640,00	0,00	$ -	410,00	$ 6.696.120,00	0,00	$ -	410,00	$ 6.696.120,00	410,00	$ 6.696.120,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 5,16	Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A	UND	18,00	$ 35.183,00	$ 633.294,00	0,00	$ -	14,00	$ 492.562,00	0,00	$ -	14,00	$ 492.562,00	14,00	$ 492.562,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 5,17	Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A	UND	3,00	$ 45.811,00	$ 137.433,00	0,00	$ -	14,00	$ 641.354,00	0,00	$ -	14,00	$ 641.354,00	14,00	$ 641.354,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 5,18	Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T	UND	1,00	$ 2.956.314,00	$ 2.956.314,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.956.314,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.956.314,00	1,00	$ 2.956.314,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 5,19	Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación)	UND	1,00	$ 328.968,00	$ 328.968,00	0,00	$ -	1,00	$ 328.968,00	0,00	$ -	1,00	$ 328.968,00	1,00	$ 328.968,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 7	**Otros**																			
C. 7,1	Suministro e instalación de puerta en madera con marco metálico cuyas medidas son 96 cm x 197 cm, incluye marco, pintura y cerradura	UND	1,00	$ 900.950,00	$ 900.950,00	0,00	$ -	1,00	$ 900.950,00	0,00	$ -	1,00	$ 900.950,00	1,00	$ 900.950,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 7,2	Suministro e instalación de sellador para uso exterior (para ventanas)	ML	486,00	$ 27.376,00	$ 13.304.736,00	374,00	$ 10.238.624,00	408,80	$ 11.191.309,00	34,80	$ 952.685,00	0,00	$ -	408,80	$ 11.191.309,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 7,6	Aseo general.	M2	748,00	$ 5.357,00	$ 4.007.036,00	744,26	$ 3.986.990,00	1.200,00	$ 6.428.389,00	455,74	$ 2.441.399,00	0,00	$ -	1200,00	$ 6.428.389,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 8	**Teja upvc**																			
C. 8,1	Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado	M2	175,00	$ 9.275,00	$ 1.623.125,00	175,00	$ 1.623.125,00	185,95	$ 1.724.686,00	10,95	$ 101.561,00	0,00	$ -	185,95	$ 1.724.686,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 8,2	Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza	UND	16,00	$ 63.587,00	$ 1.017.392,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
C. 8,3	Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto.	UND	16,00	$ 63.516,00	$ 1.016.256,00	16,00	$ 1.016.256,00	36,00	$ 2.286.576,00	20,00	$ 1.270.320,00	0,00	$ -	36,00	$ 2.286.576,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 8,4	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1	ML	116,00	$ 106.132,00	$ 12.311.312,00	116,00	$ 12.311.737,00	243,73	$ 25.867.977,00	127,73	$ 13.556.240,00	0,00	$ -	243,73	$ 25.867.977,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 8,5	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1	ML	195,00	$ 97.837,00	$ 19.078.215,00	195,00	$ 19.078.215,00	300,86	$ 29.435.631,00	105,86	$ 10.357.416,00	0,00	$ -	300,86	$ 29.435.631,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 8,6	Suministro e instalación de cubierta en teja upvc blanca con tramos translucidos intercalados	M2	201,00	$ 76.906,00	$ 15.458.106,00	201,00	$ 15.458.244,00	267,47	$ 20.570.379,00	66,47	$ 5.112.134,00	0,00	$ -	267,47	$ 20.570.379,00	100%	0,00	$ -	0%
	ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																			
A. 3,5	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero.	M2	0,00	$ 37.743,00	$ -	0,00	$ -	11,08	$ 418.343,00	11,08	$ 418.343,00	0,00	$ -	11,08	$ 418.343,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 1,5	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior	M2	0,00	$ 72.368,00	$ -	0,00	$ -	13,70	$ 991.442,00	13,70	$ 991.442,00	0,00	$ -	13,70	$ 991.442,00	100%	0,00	$ -	0%
NP	**OBRAS NO PREVISTAS**																			
NP 8	Suministro e instalación de orinal mediano entrada superior similar al existente	UND	0,00	$ 421.450,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.264.350,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.264.350,00	3,00	$ 1.264.350,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 9	Desmonte de orinal existente	UND	0,00	$ 34.772,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 104.316,00	0,00	$ -	3,00	$ 104.316,00	3,00	$ 104.316,00	100%	0,00	$ -	0%
COSTO DIRECTO					**$ 240.038.742,00**		**$ 155.867.776,00**		**$ 326.292.841,00**		**$ 113.484.122,00**		**$ 56.940.942,00**		**$ 326.292.841,00**			**$ -**	
ADMINISTRACION				18,50%	$ 44.407.167,00	18,50%	$ 28.835.539,00	18,50%	$ 60.364.176,00	18,50%	$ 20.994.563,00	18,50%	$ 10.534.074,00	18,50%	$ 60.364.176,00		18,50%	$ -	
IMPREVISTO				2,00%	$ 4.800.775,00	2,00%	$ 3.117.356,00	2,00%	$ 6.525.857,00	2,00%	$ 2.269.682,00	2,00%	$ 1.138.819,00	2,00%	$ 6.525.857,00		2,00%	$ -	
UTILIDAD				4,50%	$ 10.801.743,00	4,50%	$ 7.014.050,00	4,50%	$ 14.683.178,00	4,50%	$ 5.106.785,00	4,50%	$ 2.562.342,00	4,50%	$ 14.683.178,00		4,50%	$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 2.052.331,00	19,00%	$ 1.332.670,00	19,00%	$ 2.789.804,00	19,00%	$ 970.289,00	19,00%	$ 486.845,00	19,00%	$ 2.789.804,00		19,00%	$ -	
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA					**$ 302.100.758,00**		**$ 196.167.391,00**		**$ 410.655.856,00**		**$ 142.825.441,00**		**$ 71.663.022,00**		**$ 410.655.856,00**			**$ -**	
D	**Sede de Familia de Palmira**																			
D. 1	**Arreglo humedades fachada**																			
D. 1,1	Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros)	ML	29,00	$ 221.046,00	$ 6.410.334,00	0,00	$ -	29,00	$ 6.410.334,00	0,0	$ -	29,00	$ 6.410.334,00	29,00	$ 6.410.334,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 1,2	Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales.	M2	73,00	$ 16.247,00	$ 1.186.031,00	0,00	$ -	58,00	$ 942.326,00	0,0	$ -	58,00	$ 942.326,00	58,00	$ 942.326,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 1,3	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	M2	7	$ 8.036,00	$ 56.252,00	0,00	$ -	60,00	$ 482.160,00	0,0	$ -	60,00	$ 482.160,00	60,00	$ 482.160,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 1,4	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	ML	91	$ 8.036,00	$ 731.276,00	0,00	$ -	313,80	$ 2.521.697,00	0,0	$ -	313,80	$ 2.521.697,00	313,80	$ 2.521.697,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 1,5	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior	M2	7	$ 72.368,00	$ 506.576,00	0,00	$ -	60,00	$ 4.342.080,00	0,0	$ -	60,00	$ 4.342.080,00	60,00	$ 4.342.080,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 1,6	Suministro y aplicación de estuco plástico	M2	189	$ 25.621,00	$ 4.842.369,00	0,00	$ -	594,27	$ 15.225.792,00	0,0	$ -	594,27	$ 15.225.792,00	594,27	$ 15.225.792,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 1,7	Suministro y aplicación de pintura para superboard para exterior a dos manos color similar al existente	M2	377	$ 20.454,00	$ 7.711.158,00	0,00	$ -	596,60	$ 12.202.856,00	0,0	$ -	596,60	$ 12.202.856,00	596,60	$ 12.202.856,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 1,8	Mantenimiento alfajía metálica existente incluye desmonte y nivelación (pendiente)	ML	28	$ 11.228,00	$ 314.384,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 1,9	Suministro e instalación de alfajía metálica cuyas medidas oscilan entre 70 a 200 cm de largo	ML	16	$ 57.416,00	$ 918.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 1,10	suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica	ML	90	$ 35.982,00	$ 3.238.380,00	0,00	$ -	31,06	$ 1.117.601,00	0,0	$ -	31,06	$ 1.117.601,00	31,06	$ 1.117.601,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 1,11	Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U	ML	29,00	$ 12.662,00	$ 367.198,00	0,00	$ -	157,84	$ 1.998.570,00	0,0	$ -	157,84	$ 1.998.570,00	157,84	$ 1.998.570,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 1,12	suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, estructura, filos y pintura para exterior	M2	9,00	$ 72.368,00	$ 651.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 2	**Arreglo humedades en losa de cubierta**																			
D. 2,1	Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros	M2	14	$ 17.584,00	$ 246.176,00	0,00	$ -	14,00	$ 246.176,00	0,0	$ -	14,00	$ 246.176,00	14,00	$ 246.176,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 2,2	Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros)	M2	14	$ 10.336,00	$ 144.704,00	0,00	$ -	14,00	$ 144.704,00	0,0	$ -	14,00	$ 144.704,00	14,00	$ 144.704,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 2,3	Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente)	M2	14	$ 31.241,00	$ 437.374,00	0,00	$ -	14,00	$ 437.374,00	0,0	$ -	14,00	$ 437.374,00	14,00	$ 437.374,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 2,4	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente)	M2	15	$ 34.334,00	$ 515.010,00	0,00	$ -	14,00	$ 480.676,00	0,0	$ -	14,00	$ 480.676,00	14,00	$ 480.676,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 2,5	Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación)	M2	16	$ 206.656,00	$ 3.306.496,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 2,6	Perforación de muro en concreto 3"	UND	4	$ 72.076,00	$ 288.304,00	0,00	$ -	1,00	$ 72.076,00	0,0	$ -	1,00	$ 72.076,00	1,00	$ 72.076,00	100%	0,00	$ -	0%

D. 2,7	Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada cal 16, pintura con base epoxica con acabado en esmalte.	ML	27	$ 125.499,00	$ 3.388.473,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 2,8	Suministro e instalación de tubo cuadrado 50 mm x 50 mm x 2mm incluye ángulo conector para perfil estructural existente	ML	34	$ 71.796,00	$ 2.441.064,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 2,9	Suministro e instalación de soscos para canal en 3"	UND	4,00	$ 25.829,00	$ 103.316,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 2,10	Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " pintada color fachada, incluye accesorios	ML	24,00	$ 47.426,00	$ 1.138.224,00	0,00	$ -	18,00	$ 853.668,00	0,0	$ -	18,00	$ 853.668,00	18,00	$ 853.668,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 3	**Reparaciones y Tratamiento de humedades internas**																		
D. 3,1	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	7	$ 6.458,00	$ 45.206,00	0,00	$ -	4,00	$ 25.832,00	0,0	$ -	4,00	$ 25.832,00	4,00	$ 25.832,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 3,2	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	7	$ 43.882,00	$ 307.174,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 3,3	Suministro y aplicación de estuco plástico	M2	8	$ 25.621,00	$ 204.968,00	0,00	$ -	13,50	$ 345.884,00	0,0	$ -	13,50	$ 345.884,00	13,50	$ 345.884,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 3,4	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)	M2	9	$ 18.506,00	$ 166.554,00	0,00	$ -	64,54	$ 1.194.377,00	0,0	$ -	64,54	$ 1.194.377,00	64,54	$ 1.194.377,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 3,5	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	M2	2	$ 17.048,00	$ 34.096,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 3,6	Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1	M2	11	$ 16.558,00	$ 182.138,00	0,00	$ -	27,30	$ 452.033,00	0,0	$ -	27,30	$ 452.033,00	27,30	$ 452.033,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 3,7	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	ML	4	$ 4.578,00	$ 18.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 3,8	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	ML	3	$ 17.191,00	$ 51.573,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 3,9	Suministro y aplicación de estuco plástico	ML	4	$ 20.167,00	$ 80.668,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 3,10	Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)	ML	6	$ 5.961,00	$ 35.766,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 3,11	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	ML	1	$ 7.792,00	$ 7.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 3,12	Desmonte y retiro de cielo en panel yeso	M2	18	$ 15.584,00	$ 280.512,00	0,00	$ -	18,00	$ 280.512,00	0,0	$ -	18,00	$ 280.512,00	18,00	$ 280.512,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 3,13	Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material	M2	4	$ 18.069,00	$ 72.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 3,14	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso	M2	18	$ 46.989,00	$ 845.802,00	0,00	$ -	9,00	$ 422.901,00	0,0	$ -	9,00	$ 422.901,00	9,00	$ 422.901,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5	**Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos**																		
D. 5,1	Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo	M2	10	$ 118.956,00	$ 1.189.560,00	0,00	$ -	10,00	$ 1.189.560,00	0,0	$ -	10,00	$ 1.189.560,00	10,00	$ 1.189.560,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,2	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	5	$ 44.391,00	$ 221.955,00	0,00	$ -	5,00	$ 221.955,00	0,0	$ -	5,00	$ 221.955,00	5,00	$ 221.955,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,3	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	5	$ 45.141,00	$ 225.705,00	0,00	$ -	5,00	$ 225.705,00	0,0	$ -	5,00	$ 225.705,00	5,00	$ 225.705,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,4	Suministro e instalación de guarda escoba en pvc	ML	8	$ 36.136,00	$ 289.088,00	0,00	$ -	8,00	$ 289.088,00	0,0	$ -	8,00	$ 289.088,00	8,00	$ 289.088,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,5	Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz	UND	1	$ 598.760,00	$ 598.760,00	0,00	$ -	1,00	$ 598.760,00	0,0	$ -	1,00	$ 598.760,00	1,00	$ 598.760,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,6	Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado RETIE	ML	12	$ 70.776,00	$ 849.312,00	0,00	$ -	16,00	$ 1.132.416,00	0,0	$ -	16,00	$ 1.132.416,00	16,00	$ 1.132.416,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,7	Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación	UND	7	$ 33.945,00	$ 237.615,00	0,00	$ -	7,00	$ 237.615,00	0,0	$ -	7,00	$ 237.615,00	7,00	$ 237.615,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,8	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH	ML	110	$ 10.147,00	$ 1.116.170,00	0,00	$ -	190,00	$ 1.927.930,00	0,0	$ -	190,00	$ 1.927.930,00	190,00	$ 1.927.930,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,9	Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)	UND	7	$ 69.514,00	$ 486.598,00	0,00	$ -	7,00	$ 486.598,00	0,0	$ -	7,00	$ 486.598,00	7,00	$ 486.598,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,10	Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)	UND	7	$ 19.587,00	$ 137.109,00	0,00	$ -	7,00	$ 137.109,00	0,0	$ -	7,00	$ 137.109,00	7,00	$ 137.109,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,11	Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado	UND	7	$ 116.367,00	$ 814.569,00	0,00	$ -	7,00	$ 814.569,00	0,0	$ -	7,00	$ 814.569,00	7,00	$ 814.569,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,12	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	7	$ 116.367,00	$ 814.569,00	0,00	$ -	8,00	$ 930.936,00	0,0	$ -	8,00	$ 930.936,00	8,00	$ 930.936,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,13	Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida	UND	1	$ 93.387,00	$ 93.387,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 5,14	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 - 240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	UND	3	$ 100.492,00	$ 301.476,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 5,15	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	ML	5	$ 16.332,00	$ 81.660,00	0,00	$ -	82,00	$ 1.339.224,00	0,0	$ -	82,00	$ 1.339.224,00	82,00	$ 1.339.224,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,16	Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A	UND	7	$ 35.183,00	$ 246.281,00	0,00	$ -	7,00	$ 246.281,00	0,0	$ -	7,00	$ 246.281,00	7,00	$ 246.281,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,17	Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A	UND	1	$ 45.811,00	$ 45.811,00	0,00	$ -	9,00	$ 412.299,00	0,0	$ -	9,00	$ 412.299,00	9,00	$ 412.299,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,18	Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T	UND	1	$ 2.956.314,00	$ 2.956.314,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.956.314,00	0,0	$ -	1,00	$ 2.956.314,00	1,00	$ 2.956.314,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,19	Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación)	UND	1	$ 328.968,00	$ 328.968,00	0,00	$ -	1,00	$ 328.968,00	0,0	$ -	1,00	$ 328.968,00	1,00	$ 328.968,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,20	Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores medida 120 cm x 100 cm	UND	1	$ 1.508.942,00	$ 1.508.942,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.508.942,00	0,0	$ -	1,00	$ 1.508.942,00	1,00	$ 1.508.942,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 5,21	Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar)	ML	1	$ 236.946,00	$ 236.946,00	0,00	$ -	1,00	$ 236.946,00	0,0	$ -	1,00	$ 236.946,00	1,00	$ 236.946,00	100%	0,00	$ -	0%
D. 6	**otros**																		
D. 6,1	Suministro y aplicación de masilla fibra de vidrio	UND	6	$ 24.350,00	$ 146.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
D. 6,2	Aseo general.	M2	380	$ 5.162,00	$ 1.961.560,00	0,00	$ -	380,00	$ 1.961.560,00	0,0	$ -	380,00	$ 1.961.560,00	380,00	$ 1.961.560,00	100%	0,00	$ -	0%
	ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																		
C. 4,4	Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.	M2	0,00	$ 218.517,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 3.496.272,00	0,0	$ -	16,00	$ 3.496.272,00	16,00	$ 3.496.272,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,5	Corte de muro en concreto con pulidora	ML	0,00	$ 17.007,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 68.028,00	0,00	$ -	4,00	$ 68.028,00	4,00	$ 68.028,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,12	Demolición muro existente incluye retiro	M3	0,00	$ 175.320,00	$ -	0,00	$ -	0,02	$ 4.248,00	0,00	$ -	0,02	$ 4.248,00	0,02	$ 4.248,00	100%	0,00	$ -	0%
NP	**OBRAS NO PREVISTAS**																		
NP 10	Suministro e instalación de placa de fibrocemento de 8mm incluye estructura	ML	0,00	$ 46.600,00	$ -	0,00	$ -	358,00	$ 16.682.800,00	0,0	$ -	358,00	$ 16.682.800,00	358,00	$ 16.682.800,00	100%	0,00	$ -	0%
COSTO DIRECTO					**$ 56.164.359,00**		**$ -**		**$ 87.633.752,00**		**$ -**		**$ 87.633.752,00**		**$ 87.633.752,00**			**$ -**	
ADMINISTRACION				18,50%	$ 10.390.406,00	18,50%	$ -	18,50%	$ 16.212.244,00	18,50%	$ -	18,50%	$ 16.212.244,00	18,50%	$ 16.212.244,00		18,50%	$ -	
IMPREVISTO				2,00%	$ 1.123.287,00	2,00%	$ -	2,00%	$ 1.752.675,00	2,00%	$ -	2,00%	$ 1.752.675,00	2,00%	$ 1.752.675,00		2,00%	$ -	
UTILIDAD				4,50%	$ 2.527.396,00	4,50%	$ -	4,50%	$ 3.943.519,00	4,50%	$ -	4,50%	$ 3.943.519,00	4,50%	$ 3.943.519,00		4,50%	$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 480.205,00	19,00%	$ -	19,00%	$ 749.269,00	19,00%	$ -	19,00%	$ 749.269,00	19,00%	$ 749.269,00		19,00%	$ -	
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA					**$ 70.685.653,00**		**$ -**		**$ 110.291.459,00**		**$ -**		**$ 110.291.459,00**		**$ 110.291.459,00**			**$ -**	
E.	**Palacio Nacional de Buenaventura**																		
E. 1	**Mantenimiento de puertas y ventanas metálicas**																		
E. 1,1	Lavada de ventanas y rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado.	M2	20	$ 23.863,00	$ 477.260,00	0,00	$ -	106,73	$ 2.546.898,00	0,00	$ -	106,73	$ 2.546.898,00	106,73	$ 2.546.898,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 1,2	Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 120 cm 180cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios	UND	113	$ 279.528,00	$ 31.586.664,00	0,00	$ -	140,00	$ 39.133.920,00	76,00	$ 21.244.128,00	64,00	$ 17.889.792,00	140,00	$ 39.133.920,00	100%	0,00	$ -	0%

E. 1,3	Mantenimiento de ventanas en aluminio con diseño que incluye celosías cuyas medidas son entre 70 -100 cm de ancho x 120 - 200 cmalto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios	UND	16	$ 279.528,00	$ 4.472.448,00	0,00	$ -	15,00	$ 4.192.920,00	0,00	$ -	15,00	$ 4.192.920,00	15,00	$ 4.192.920,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 1,4	Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 200 - 400 cmde ancho x 200 cm 400 cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios	UND	6	$ 433.430,00	$ 2.600.580,00	0,00	$ -	16,00	$ 6.934.880,00	0,00	$ -	16,00	$ 6.934.880,00	16,00	$ 6.934.880,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 1,5	Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas son entre 80 -100 cm de ancho x 170 - 240 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano	UND	5	$ 272.720,00	$ 1.363.600,00	0,00	$ -	10,00	$ 2.727.200,00	2,00	$ 545.440,00	8,00	$ 2.181.760,00	10,00	$ 2.727.200,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 1,6	Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y aplicación de pintura en esmalte (2 capas) en rejas existentes	M2	4	$ 43.830,00	$ 175.320,00	0,00	$ -	1,64	$ 71.754,00	0,00	$ -	1,64	$ 71.754,00	1,64	$ 71.754,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 1,7	Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas es 300 cm de ancho x 600 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano	UND	1	$ 779.200,00	$ 779.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
E. 2	**Restauración puertas en madera**																			
E. 2,1	Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 200 cm 260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería	UND	37	$ 413.950,00	$ 15.316.150,00	0,00	$ -	27,00	$ 11.176.650,00	4,00	$ 1.655.800,00	23,00	$ 9.520.850,00	27,00	$ 11.176.650,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 2,2	Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, diseño con celosía cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -240 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería	UND	2	$ 487.000,00	$ 974.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 487.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 487.000,00	1,00	$ 487.000,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 2,3	Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, cuyas medidas son entre 100 a 140 cm de ancho x 200 -260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería	UND	1	$ 555.180,00	$ 555.180,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.110.360,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.110.360,00	2,00	$ 1.110.360,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 2,4	Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, con diseño que incluye vidrio cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería	UND	15	$ 487.000,00	$ 7.305.000,00	0,00	$ -	12,00	$ 5.844.000,00	0,00	$ -	12,00	$ 5.844.000,00	12,00	$ 5.844.000,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 2,5	Mantenimiento de ventanas en madera con diseño que incluye vidrio, cuyas medidas son entre 70 - 170 cm de ancho x 100 cm 180 cm alto, incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería	UND	7	$ 224.020,00	$ 1.568.140,00	0,00	$ -	12,00	$ 2.688.240,00	0,00	$ -	12,00	$ 2.688.240,00	12,00	$ 2.688.240,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 2,6	Desmonte de puertas en madera (se refiere a las que no se reinstalaran)	UND	5	$ 60.875,00	$ 304.375,00	0,00	$ -	28,00	$ 1.704.500,00	0,00	$ -	28,00	$ 1.704.500,00	28,00	$ 1.704.500,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 2,7	Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente.	UND	5	$ 1.071.400,00	$ 5.357.000,00	0,00	$ -	28,00	$ 29.999.200,00	0,00	$ -	28,00	$ 29.999.200,00	28,00	$ 29.999.200,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 3	**Reparaciones y Tratamiento de humedades internas**																			
E. 3,1	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	426	$ 6.458,00	$ 2.751.108,00	58,66	$ 378.836,00	110,00	$ 710.383,00	51,34	$ 331.547,00	0,00	$ -	110,00	$ 710.383,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 3,2	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	355	$ 43.882,00	$ 15.578.110,00	0,00	$ -	110,00	$ 4.827.020,00	79,28	$ 3.478.921,00	30,72	$ 1.348.099,00	110,00	$ 4.827.020,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 3,3	Suministro y aplicación de estuco plástico	M2	568	$ 25.621,00	$ 14.552.728,00	0,00	$ -	250,00	$ 6.405.250,00	79,54	$ 2.037.894,00	170,46	$ 4.367.356,00	250,00	$ 6.405.250,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 3,4	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)	M2	710	$ 18.506,00	$ 13.139.260,00	0,00	$ -	400,00	$ 7.402.400,00	229,64	$ 4.249.764,00	170,36	$ 3.152.636,00	400,00	$ 7.402.400,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 3,5	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	M2	497	$ 17.048,00	$ 8.472.856,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
E. 3,6	Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1	M2	474	$ 16.558,00	$ 7.848.492,00	0,00	$ -	13,70	$ 226.762,00	13,70	$ 226.762,00	0,00	$ -	13,70	$ 226.762,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 3,7	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	ML	281	$ 4.578,00	$ 1.286.418,00	0,00	$ -	100,00	$ 457.800,00	0,00	$ -	100,00	$ 457.800,00	100,00	$ 457.800,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 3,8	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	ML	281	$ 17.191,00	$ 4.830.671,00	0,00	$ -	100,00	$ 1.719.100,00	0,00	$ -	100,00	$ 1.719.100,00	100,00	$ 1.719.100,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 3,9	Suministro y aplicación de estuco plástico	ML	351	$ 20.167,00	$ 7.078.617,00	0,00	$ -	100,00	$ 2.016.700,00	0,00	$ -	100,00	$ 2.016.700,00	100,00	$ 2.016.700,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 3,10	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)	ML	351	$ 11.104,00	$ 3.897.504,00	0,00	$ -	100,00	$ 1.110.400,00	0,00	$ -	100,00	$ 1.110.400,00	100,00	$ 1.110.400,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 3,11	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	ML	351	$ 7.792,00	$ 2.734.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
E. 4	**Mantenimiento de las redes hidrosanitarias**																			
E. 4,1	Mantenimiento de cajas de inspección existentes, incluye limpieza, reparación de pañetes y tapa de concreto	UND	4	$ 93.707,00	$ 374.828,00	4,00	$ 374.828,00	4,00	$ 374.828,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 374.828,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,2	Suministro y fabricación de caja de aguas negras (100 cm x 100 cm) incluye tapa divida en 2	UND	1	$ 566.346,00	$ 566.346,00	1,00	$ 566.346,00	1,00	$ 566.346,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 566.346,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,3	Excavación de tierra a mano para tubería de 6"	M3	25	$ 23.609,00	$ 590.225,00	13,82	$ 326.229,00	34,77	$ 820.885,00	0,00	$ -	20,95	$ 494.656,00	34,77	$ 820.885,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,4	Suministro e instalación de ladrillo sucio	ML	16	$ 33.240,00	$ 531.840,00	16,00	$ 531.840,00	16,00	$ 531.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 531.840,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,5	Corte de muro en concreto con pulidora	ML	16	$ 17.007,00	$ 272.112,00	0,00	$ -	16,00	$ 272.112,00	0,00	$ -	16,00	$ 272.112,00	16,00	$ 272.112,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,6	Perforación de piso en concreto 6"	UND	4	$ 85.712,00	$ 342.848,00	4,00	$ 342.848,00	4,00	$ 342.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 342.848,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,7	Retiro de tubería PVC existente de 2" a 6"	ML	50	$ 10.897,00	$ 544.850,00	50,00	$ 544.850,00	50,00	$ 544.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 544.850,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,8	Retiro de tubería galvanizada	ML	25	$ 7.553,00	$ 188.825,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
E. 4,9	Suministro e instalación tubería PVC de 4" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento.	ML	30	$ 60.097,00	$ 1.802.910,00	7,00	$ 420.679,00	7,00	$ 420.679,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 420.679,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,10	Suministro e instalación tubería en PVC de 1 1/2" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento.	ML	25	$ 24.541,00	$ 613.525,00	1,00	$ 24.541,00	1,00	$ 24.541,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 24.541,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,11	Suministro e instalación tapa de inspección en aluminio de 60 cm x 120 cm, tipo celosía, incluye marco y pasador	UND	5	$ 173.319,00	$ 866.595,00	0,00	$ -	3,00	$ 519.957,00	0,00	$ -	3,00	$ 519.957,00	3,00	$ 519.957,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,12	Demolición muro existente incluye retiro	M3	2	$ 175.320,00	$ 350.640,00	1,28	$ 224.585,00	1,28	$ 224.585,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,28	$ 224.585,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,13	Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento.	ML	15	$ 46.509,00	$ 697.635,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
E. 4,14	Suministro e instalación tubería en PVC de 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento.	ML	15	$ 17.045,00	$ 255.675,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
E. 4,15	Suministro y fabricación de tapa en concreto para caja de aguas negras (100 cm x 50 cm) incluye marco metálico	UND	2	$ 194.800,00	$ 389.600,00	0,00	$ -	4,00	$ 779.200,00	0,00	$ -	4,00	$ 779.200,00	4,00	$ 779.200,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,16	Corte de losa en concreto con pulidora incluye retiro	ML	1	$ 15.696,00	$ 15.696,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
E. 4,17	Suministro e instalación de tubería novafort de 6"	ML	25	$ 76.273,00	$ 1.906.825,00	25,00	$ 1.906.825,00	37,00	$ 2.822.101,00	0,00	$ -	12,00	$ 915.276,00	37,00	$ 2.822.101,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 4,18	Suministro e instalación de yee de 4" con tapón de inspección	UND	1	$ 32.678,00	$ 32.678,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
E.5	**otros**																			
E. 5,2	Aseo general.	M2	816	$ 5.357,00	$ 4.371.312,00	287,42	$ 1.539.702,00	816,00	$ 4.371.312,00	277,78	$ 1.488.063,00	250,80	$ 1.343.547,00	816,00	$ 4.371.312,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 5,3	Suministro e instalación de tubería de PVC 1" pintada color fachada	ML	167	$ 23.447,00	$ 3.915.649,00	0,00	$ -	120,00	$ 2.813.640,00	0,00	$ -	120,00	$ 2.813.640,00	120,00	$ 2.813.640,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 5,4	Instalación de pasamanos en acero (existente) incluye elementos de fijación como varilla 1/4", abrazadera. (12 mt de largo)	UND	1	$ 2.922.000,00	$ 2.922.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 5.844.000,00	1,00	$ 2.922.000,00	1,00	$ 2.922.000,00	2,00	$ 5.844.000,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 6	**Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos**																			
E. 6,1	Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo	M2	10	$ 118.956,00	$ 1.189.560,00	0,00	$ -	10,16	$ 1.208.593,00	10,16	$ 1.208.593,00	0,00	$ -	10,16	$ 1.208.593,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 6,2	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	5	$ 44.391,00	$ 221.955,00	0,00	$ -	5,00	$ 221.955,00	5,00	$ 221.955,00	0,00	$ -	5,00	$ 221.955,00	100%	0,00	$ -	0%

E. 6,3	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	5	$ 45.141,00	$ 225.705,00	0,00	$ -	5,00	$ 225.705,00	5,00	$ 225.705,00	0,00	$ -	5,00	$ 225.705,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 6,4	Suministro e instalación de guarda escoba en pvc	ML	8	$ 36.136,00	$ 289.088,00	0,00	$ -	6,00	$ 216.816,00	0,00	$ -	6,00	$ 216.816,00	6,00	$ 216.816,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 6,5	Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz	UND	1	$ 598.760,00	$ 598.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
	ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																		
A. 2,8	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal	ML	0,00	$ 90.166,00	$ -	0,00	$ -	4,80	$ 432.797,00	4,80	$ 432.797,00	0,00	$ -	4,80	$ 432.797,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 1,2	Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas)	M2	0,00	$ 8.766,00	$ -	0,00	$ -	3.445,37	$ 30.202.101,00	3.003,07	$ 26.324.912,00	442,30	$ 3.877.189,00	3445,37	$ 30.202.101,00	100%	0,00	$ -	0%
NP	**OBRAS NO PREVISTAS**																		
NP 11	Demolicion con demoledor debloques en concreto para pase de tuberia de 6"	UND	0,00	$ 115.000,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 460.000,00	4,00	$ 460.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 460.000,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 12	Suministro e instalación de malla electrosoldada 6mm -15x15	M2	0,00	$ 34.362,00	$ -	0,00	$ -	117,90	$ 4.051.280,00	117,90	$ 4.051.280,00	0,00	$ -	117,90	$ 4.051.280,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 13	Placa maciza concreto espesor 0.20 de 3000 PSI	M3	0,00	$ 696.000,00	$ -	0,00	$ -	25,10	$ 17.466.468,00	25,10	$ 17.466.468,00	0,00	$ -	25,10	$ 17.466.468,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 14	Demolición placa parqueadero	M2	0,00	$ 33.000,00	$ -	0,00	$ -	127,90	$ 4.220.700,00	62,48	$ 2.061.758,00	65,42	$ 2.158.943,00	127,90	$ 4.220.700,00	100%	0,00	$ -	0%
COSTO DIRECTO					**$ 179.083.355,00**		**$ 7.182.109,00**		**$ 213.473.476,00**		**$ 90.633.787,00**		**$ 115.657.581,00**		**$ 213.473.476,00**			**$ -**	
ADMINISTRACION				18,50%	$ 33.130.421,00	18,50%	$ 1.328.690,00	18,50%	$ 39.492.593,00	18,50%	$ 16.767.251,00	18,50%	$ 21.396.652,00	18,50%	$ 39.492.593,00		18,50%	$ -	
IMPREVISTO				2,00%	$ 3.581.667,00	2,00%	$ 143.642,00	2,00%	$ 4.269.470,00	2,00%	$ 1.812.676,00	2,00%	$ 2.313.152,00	2,00%	$ 4.269.470,00		2,00%	$ -	
UTILIDAD				4,50%	$ 8.058.751,00	4,50%	$ 323.195,00	4,50%	$ 9.606.306,00	4,50%	$ 4.078.520,00	4,50%	$ 5.204.591,00	4,50%	$ 9.606.306,00		4,50%	$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 1.531.163,00	19,00%	$ 61.407,00	19,00%	$ 1.825.198,00	19,00%	$ 774.919,00	19,00%	$ 988.872,00	19,00%	$ 1.825.198,00		19,00%	$ -	
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA					**$ 225.385.357,00**		**$ 9.039.043,00**		**$ 268.667.043,00**		**$ 114.067.153,00**		**$ 145.560.848,00**		**$ 268.667.043,00**			**$ -**	
F	**Edificio de Transferencia de Buenaventura**																		
F. 1	**Tratamiento de humedades fachada**																		
F. 1,1	suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación.	M2	22	$ 12.175,00	$ 267.850,00	22,00	$ 267.850,00	22,00	$ 267.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 267.850,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 1,2	Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas)	M2	395,00	$ 8.766,00	$ 3.462.570,00	395,00	$ 3.462.570,00	487,36	$ 4.272.198,00	0,00	$ -	92,36	$ 809.628,00	487,36	$ 4.272.198,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 1,3	Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado	M2	245,00	$ 6.458,00	$ 1.582.210,00	245,00	$ 1.582.210,00	448,36	$ 2.895.509,00	0,00	$ -	203,36	$ 1.313.299,00	448,36	$ 2.895.509,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 1,4	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	245,00	$ 43.882,00	$ 10.751.090,00	218,47	$ 9.586.725,00	448,36	$ 19.674.934,00	0,00	$ -	229,8940	$ 10.088.209,00	448,3600	$ 19.674.934,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 1,5	Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina	M2	350,00	$ 14.263,00	$ 4.992.050,00	0,00	$ -	448,36	$ 6.394.959,00	0,00	$ -	448,36	$ 6.394.959,00	448,36	$ 6.394.959,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 1,6	Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos	M2	350,00	$ 20.941,00	$ 7.329.350,00	0,00	$ -	448,36	$ 9.389.107,00	137,92	$ 2.888.183,00	310,44	$ 6.500.924,00	448,36	$ 9.389.107,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 2	**Mantenimiento de puertas en madera**				$ -														
F. 2,1	Desmonte de puertas en madera incluye hoja y marco metálico	UND	3	$ 60.875,00	$ 182.625,00	0,00	$ -	5,00	$ 304.375,00	0,00	$ -	5,00	$ 304.375,00	5,00	$ 304.375,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 2,2	Mantenimiento de puertas de una nave en madera , cuyas medidas son entre 70 a 90 cm de ancho x 180 -220 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería	UND	22	$ 413.950,00	$ 9.106.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
F. 2,3	Suministro e instalación de puerta de una nave de madera, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras, herrajes y cerradura.	UND	3,00	$ 1.071.400,00	$ 3.214.200,00	0,00	$ -	6,00	$ 6.428.400,00	0,00	$ -	6,00	$ 6.428.400,00	6,00	$ 6.428.400,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 2,4	Suministro e instalación de marco metálico para puerta en madera de medidas entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto	UND	3,00	$ 199.670,00	$ 599.010,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
F. 2,5	Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera	UND	12,00	$ 82.790,00	$ 993.480,00	0,00	$ -	3,00	$ 248.370,00	0,00	$ -	3,00	$ 248.370,00	3,00	$ 248.370,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 3	**Reparaciones y Tratamiento de humedades internas**				$ -														
F. 3,1	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	191	$ 6.458,00	$ 1.233.478,00	147,48	$ 952.426,00	147,48	$ 952.426,00	0,00	$ -	0,00	$ -	147,48	$ 952.426,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 3,2	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	191	$ 43.882,00	$ 8.381.462,00	147,48	$ 6.471.717,00	147,48	$ 6.471.717,00	0,00	$ -	0,00	$ -	147,48	$ 6.471.717,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 3,3	Suministro y aplicación de estuco plástico	M2	239	$ 25.621,00	$ 6.123.419,00	147,48	$ 3.778.585,00	587,92	$ 15.063.037,00	401,34	$ 10.282.771,00	39,10	$ 1.001.681,00	587,92	$ 15.063.037,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 3,4	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)	M2	239	$ 18.506,00	$ 4.422.934,00	0,00	$ -	251,95	$ 4.662.587,00	216,01	$ 3.997.555,00	35,94	$ 665.032,00	251,95	$ 4.662.587,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 3,5	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	M2	167	$ 17.048,00	$ 2.847.016,00	0,00	$ -	68,55	$ 1.168.640,00	0,00	$ -	68,55	$ 1.168.640,00	68,55	$ 1.168.640,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 3,6	Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1	M2	3	$ 16.558,00	$ 49.674,00	0,00	$ -	13,92	$ 230.487,00	13,92	$ 230.487,00	0,00	$ -	13,92	$ 230.487,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 3,7	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	ML	10	$ 4.578,00	$ 45.780,00	0,00	$ -	66,50	$ 304.437,00	0,00	$ -	66,50	$ 304.437,00	66,50	$ 304.437,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 3,8	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	ML	10	$ 17.191,00	$ 171.910,00	0,00	$ -	66,50	$ 1.143.202,00	66,50	$ 1.143.202,00	0,00	$ -	66,50	$ 1.143.202,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 3,9	Suministro y aplicación de estuco plástico	ML	10	$ 20.167,00	$ 201.670,00	0,00	$ -	66,50	$ 1.341.106,00	66,50	$ 1.341.106,00	0,00	$ -	66,50	$ 1.341.106,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 3,10	Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)	ML	10	$ 5.961,00	$ 59.610,00	0,00	$ -	66,50	$ 396.407,00	66,50	$ 396.407,00	0,00	$ -	66,50	$ 396.407,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 3,11	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	ML	10	$ 7.792,00	$ 77.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
F. 4	**Mantenimiento de cubierta**				$ -														
F. 4,1	Lavada de cubierta con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y debe realizarse con belt manlift)	M2	245	$ 32.142,00	$ 7.874.790,00	245,00	$ 7.874.790,00	513,19	$ 16.494.953,00	268,19	$ 8.620.163,00	0,00	$ -	513,19	$ 16.494.953,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 4,2	Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo	ML	60	$ 56.372,00	$ 3.382.320,00	0,00	$ -	60,00	$ 3.382.320,00	0,00	$ -	60,00	$ 3.382.320,00	60,00	$ 3.382.320,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 4,5	Aseo general.	M2	570	$ 5.357,00	$ 3.053.490,00	199,97	$ 1.071.264,00	570,00	$ 3.053.490,00	43,50	$ 233.005,00	326,53	$ 1.749.220,00	570,00	$ 3.053.490,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 4,6	retiro de rejilla sifón (incluye demolición y retiro)	UND	6	$ 8.766,00	$ 52.596,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
F. 4,7	Suministro e instalación de sifón de 3"	UND	6	$ 55.031,00	$ 330.186,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
	ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																		
A. 3,4	Suministro e instalación de enchape antideslizante	M2	0,00	$ 80.833,00	$ -	0,00	$ -	7,80	$ 630.497,00	0,00	$ -	7,80	$ 630.497,00	7,80	$ 630.497,00	100%	0,00	$ -	0%
E. 5,3	Suministro e instalación de tubería de PVC 1" pintada color fachada	ML	0,00	$ 23.447,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 422.046,00	10,00	$ 234.470,00	8,00	$ 187.576,00	18,00	$ 422.046,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,4	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1	ML	0,00	$ 106.132,00	$ -	0,00	$ -	51,14	$ 5.427.590,00	51,14	$ 5.427.590,00	0,00	$ -	51,14	$ 5.427.590,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,5	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1	ML	0,00	$ 97.837,00	$ -	0,00	$ -	54,86	$ 5.367.338,00	54,86	$ 5.367.338,00	0,00	$ -	54,86	$ 5.367.338,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 2,6	Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica	M2	0,00	$ 72.682,00	$ -	0,00	$ -	62,64	$ 4.553.113,00	62,64	$ 4.553.113,00	0,00	$ -	62,64	$ 4.553.113,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 1,6	Suministro e instalación de ángulo en aluminio anoloc de 1/2, (gotero en ventana)	ML	0,00	$ 23.502,00	$ -	0,00	$ -	48,00	$ 1.128.096,00	0,00	$ -	48,00	$ 1.128.096,00	48,00	$ 1.128.096,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 4,4	Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.	M2	0,00	$ 218.517,00	$ -	0,00	$ -	62,18	$ 13.586.294,00	62,18	$ 13.586.294,00	0,00	$ -	62,18	$ 13.586.294,00	100%	0,00	$ -	0%
NP	**OBRAS NO PREVISTAS**																		
NP 12	Suministro e instalación de malla electrosoldada 6mm -15x15	M2	0,00	$ 34.362,00	$ -	0,00	$ -	16,70	$ 573.674,00	16,70	$ 573.674,00	0,00	$ -	16,70	$ 573.674,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 13	Placa maciza concreto espesor 0.20 de 3000 PSI	M3	0,00	$ 696.000,00	$ -	0,00	$ -	3,34	$ 2.323.944,00	3,34	$ 2.323.944,00	0,00	$ -	3,34	$ 2.323.944,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 15	Suministro e instalación de impermeabilizante para teja canaleta	M2	0,00	$ 58.400,00	$ -	0,00	$ -	487,07	$ 28.444.888,00	487,07	$ 28.444.888,00	0,00	$ -	487,07	$ 28.444.888,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 16	Arreglo de bajante de 4" dentro de muro, incluye demolición, suministro de tubería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	UND	0,00	$ 239.200,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 239.200,00	1,00	$ 239.200,00	0,00	$ -	1,00	$ 239.200,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 17	Limpieza de canal fachada principal y posterior	ML	0,00	$ 6.500,00	$ -	0,00	$ -	59,70	$ 388.050,00	59,70	$ 388.050,00	0,00	$ -	59,70	$ 388.050,00	100%	0,00	$ -	0%
COSTO DIRECTO					**$ 80.789.590,00**		**$ 35.048.137,00**		**$ 167.625.241,00**		**$ 90.271.440,00**		**$ 42.305.663,00**		**$ 167.625.241,00**			**$ -**	
ADMINISTRACION				18,50%	$ 14.946.074,00	18,50%	$ 6.483.905,00	18,50%	$ 31.010.670,00	18,50%	$ 16.700.216,00	18,50%	$ 7.826.548,00	18,50%	$ 31.010.670,00		18,50%	$ -	
IMPREVISTO				2,00%	$ 1.615.792,00	2,00%	$ 700.963,00	2,00%	$ 3.352.505,00	2,00%	$ 1.805.429,00	2,00%	$ 846.113,00	2,00%	$ 3.352.505,00		2,00%	$ -	

UTILIDAD				4,50%	$ 3.635.532,00	4,50%	$ 1.577.166,00	4,50%	$ 7.543.136,00		4,50%	$ 4.062.215,00		4,50%	$ 1.903.755,00		4,50%	$ 7.543.136,00			4,50%	$ -		
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 690.751,00	19,00%	$ 299.662,00	19,00%	$ 1.433.196,00		19,00%	$ 771.821,00		19,00%	$ 361.713,00		19,00%	$ 1.433.196,00			19,00%	$ -		
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA					**$ 101.677.739,00**		**$ 44.109.833,00**		**$ 210.964.748,00**			**$ 113.611.121,00**			**$ 53.243.792,00**			**$ 210.964.748,00**				**$ -**		
G	**Juzgado Promiscuo Municipal de Obando**																							
G.1	**Tratamiento de humedades fachada**																							
G. 1,1	suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación.	M2	33	$ 12.175,00	$ 401.775,00	30,00	$ 365.250,00	30,00	$ 365.250,00		0,00	$ -		0,00	$ -		30,00	$ 365.250,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 1,2	Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas)	M2	33	$ 8.766,00	$ 289.278,00	31,50	$ 276.129,00	31,50	$ 276.129,00		0,00	$ -		0,00	$ -		31,50	$ 276.129,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 1,3	Tratamiento de fisura el cual consiste en sellado con mortero especial para reparaciones.	ML	5	$ 82.790,00	$ 413.950,00	5,00	$ 413.950,00	6,00	$ 496.740,00		1,00	$ 82.790,00		0,00	$ -		6,00	$ 496.740,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 1,4	Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado	M2	20	$ 6.458,00	$ 129.160,00	14,02	$ 90.541,00	14,02	$ 90.541,00		0,00	$ -		0,00	$ -		14,02	$ 90.541,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 1,5	Suministro y aplicación de emulsión acrílica al 50% generador de adherencia, (o sellador acrílico)	M2	33	$ 21.915,00	$ 723.195,00	30,54	$ 669.284,00	30,54	$ 669.284,00		0,00	$ -		0,00	$ -		30,54	$ 669.284,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 1,6	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1	M2	33	$ 20.941,00	$ 691.053,00	30,03	$ 628.858,00	57,03	$ 1.194.265,00		27,00	$ 565.407,00		0,00	$ -		57,03	$ 1.194.265,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 1,7	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	20	$ 43.882,00	$ 877.640,00	14,02	$ 615.226,00	14,02	$ 615.226,00		0,00	$ -		0,00	$ -		14,02	$ 615.226,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 2	**Tratamiento de humedades muros internos y fachada**				$ -																			
G. 2,1	Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" (incluye retiro de tierra a mano)	ML	20	$ 71.589,00	$ 1.431.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -			0,00	$ -		
G. 2,2	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	50	$ 6.458,00	$ 322.900,00	49,31	$ 318.444,00	56,67	$ 365.975,00		7,36	$ 47.531,00		0,00	$ -		56,67	$ 365.975,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 2,3	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	50	$ 43.882,00	$ 2.194.100,00	49,31	$ 2.163.821,00	56,67	$ 2.486.793,00		7,36	$ 322.971,00		0,00	$ -		56,67	$ 2.486.793,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 2,4	Suministro y aplicación de estuco plástico	M2	80	$ 25.621,00	$ 2.049.680,00	80,00	$ 2.049.680,00	241,42	$ 6.185.488,00		161,42	$ 4.135.808,00		0,00	$ -		241,42	$ 6.185.488,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 2,5	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)	M2	114	$ 18.506,00	$ 2.109.684,00	114,00	$ 2.109.684,00	338,99	$ 6.273.256,00		224,99	$ 4.163.572,00		0,00	$ -		338,99	$ 6.273.256,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 2,6	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	M2	23	$ 17.048,00	$ 392.104,00	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -			0,00	$ -		
G. 2,7	Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1	M2	6	$ 16.558,00	$ 99.348,00	4,28	$ 70.934,00	97,81	$ 1.619.541,00		93,53	$ 1.548.607,00		0,00	$ -		97,81	$ 1.619.541,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 2,8	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	ML	3	$ 4.578,00	$ 13.734,00	2,40	$ 10.987,00	2,40	$ 10.987,00		0,00	$ -		0,00	$ -		2,40	$ 10.987,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 2,9	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	ML	3	$ 17.191,00	$ 51.573,00	2,21	$ 37.992,00	32,61	$ 560.581,00		30,40	$ 522.589,00		0,00	$ -		32,61	$ 560.581,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 2,10	Suministro y aplicación de estuco plástico	ML	3	$ 20.167,00	$ 60.501,00	3,00	$ 60.501,00	48,40	$ 976.083,00		45,40	$ 915.582,00		0,00	$ -		48,40	$ 976.083,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 2,11	Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)	ML	3	$ 5.961,00	$ 17.883,00	3,00	$ 17.883,00	48,40	$ 288.512,00		45,40	$ 270.629,00		0,00	$ -		48,40	$ 288.512,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 2,12	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	ML	3	$ 7.792,00	$ 23.376,00	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -			0,00	$ -		
G. 3	**Cubierta en teja plástica**				$ -												0,00	$ -			0,00	$ -		
G. 3,1	Desmonte de cubierta en teja plástica	M2	30	$ 8.327,00	$ 249.810,00	0,00	$ -	40,00	$ 333.080,00		40,00	$ 333.080,00		0,00	$ -		40,00	$ 333.080,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 3,2	Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado	M2	30	$ 60.133,00	$ 1.803.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -			0,00	$ -		
G. 3,3	Corte de muro con pulidora	ML	23,00	$ 15.009,00	$ 345.207,00	0,00	$ -	54,00	$ 810.486,00		54,00	$ 810.486,00		0,00	$ -		54,00	$ 810.486,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 3,4	Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	ML	23	$ 50.569,00	$ 1.163.087,00	0,00	$ -	54,00	$ 2.730.726,00		54,00	$ 2.730.726,00		0,00	$ -		54,00	$ 2.730.726,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 4	**otros**				$ -																			
G. 4,1	Suministro e instalación de película opalizada para ventanas	M2	30	$ 54.710,00	$ 1.641.300,00	0,00	$ -	2,28	$ 124.739,00		2,28	$ 124.739,00		0,00	$ -		2,28	$ 124.739,00	100%		0,00	$ -		0%
G. 4,2	Aseo general.	M2	30	$ 5.357,00	$ 160.710,00	30,00	$ 160.710,00	134,80	$ 722.123,00		104,80	$ 561.413,00		0,00	$ -		134,80	$ 722.123,00	100%		0,00	$ -		0%
	ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																							
D. 1,10	suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica	ML	0,00	$ 35.982,00	$ -	0,00	$ -	19,20	$ 690.854,00		19,20	$ 690.854,00		0,00	$ -		19,20	$ 690.854,00	100%		0,00	$ -		0%
D. 2,2	Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros)	M2	0,00	$ 10.336,00	$ -	0,00	$ -	27,00	$ 279.072,00		27,00	$ 279.072,00		0,00	$ -		27,00	$ 279.072,00	100%		0,00	$ -		0%
F. 2,5	Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera	UND	0,00	$ 82.790,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 165.580,00		2,00	$ 165.580,00		0,00	$ -		2,00	$ 165.580,00	100%		0,00	$ -		0%
F. 4,2	Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo	ML	0,00	$ 56.372,00	$ -	0,00	$ -	54,00	$ 3.044.088,00		54,00	$ 3.044.088,00		0,00	$ -		54,00	$ 3.044.088,00	100%		0,00	$ -		0%
A. 3,5	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero.	M2	0,00	$ 37.743,00	$ -	0,00	$ -	27,00	$ 1.019.061,00		27,00	$ 1.019.061,00		0,00	$ -		27,00	$ 1.019.061,00	100%		0,00	$ -		0%
C. 1,5	Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra, 2 manos)	M2	0,00	$ 43.830,00	$ -	0,00	$ -	27,00	$ 1.183.410,00		27,00	$ 1.183.410,00		0,00	$ -		27,00	$ 1.183.410,00	100%		0,00	$ -		0%
A.6,6	excavación tierra a mano 30 cm	M3	0,00	$ 40.671,00	$ -	0,00	$ -	2,40	$ 97.610,00		2,40	$ 97.610,00		0,00	$ -		2,40	$ 97.610,00	100%		0,00	$ -		0%
C. 8,6	Suministro e instalación de cubierta en teja upvc blanca con tramos translucidos intercalados	M2	0,00	$ 76.906,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 3.076.240,00		40,00	$ 3.076.240,00		0,00	$ -		40,00	$ 3.076.240,00	100%		0,00	$ -		0%
A. 2,10	Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	ML	0,00	$ 50.569,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -			0,00	$ -		
A. 5,16	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 - 240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	UND	0,00	$ 100.492,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 1.205.904,00		12,00	$ 1.205.904,00		0,00	$ -		12,00	$ 1.205.904,00	100%		0,00	$ -		0%
NP	**NO PREVISTAS**											$ -			$ -									
NP 10	Suministro e instalación de placa de fibrocemento de 8mm incluye estructura	ML	0,00	$ 46.600,00	$ -	0,00	$ -	8,60	$ 400.760,00		8,60	$ 400.760,00		0,00	$ -		8,60	$ 400.760,00	100%		0,00	$ -		0%
NP 18	Suministro y fabricación de bordillo / anden en concreto de 3000 PSI	M3	0,00	$ 730.500,00	$ -	0,00	$ -	1,65	$ 1.206.881,00		1,65	$ 1.206.881,00		0,00	$ -		1,65	$ 1.206.881,00	100%		0,00	$ -		0%
NP 19	Evacuación material excavación	M3	0,00	$ 84.850,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -			0,00	$ -		
NP 20	Retiro solapa existente, suministro e instalación de solapa en lamina galvanizada Cal 24 ancho de 0. 50 cm, incluye sellador sobre muro	ML	0,00	$ 9.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -			0,00	$ -		
COSTO DIRECTO					**$ 17.656.818,00**		**$ 10.059.874,00**		**$ 39.565.265,00**			**$ 29.505.390,00**			**$ -**			**$ 39.565.265,00**				**$ -**		
ADMINISTRACION				18,50%	$ 3.266.511,00	18,50%	$ 1.861.077,00	18,50%	$ 7.319.574,00		18,50%	$ 5.458.497,00		18,50%	$ -		18,50%	$ 7.319.574,00			18,50%	$ -		
IMPREVISTO				2,00%	$ 353.136,00	2,00%	$ 201.197,00	2,00%	$ 791.305,00		2,00%	$ 590.108,00		2,00%	$ -		2,00%	$ 791.305,00			2,00%	$ -		
UTILIDAD				4,50%	$ 794.557,00	4,50%	$ 452.694,00	4,50%	$ 1.780.437,00		4,50%	$ 1.327.743,00		4,50%	$ -		4,50%	$ 1.780.437,00			4,50%	$ -		
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 150.966,00	19,00%	$ 86.012,00	19,00%	$ 338.283,00		19,00%	$ 252.271,00		19,00%	$ -		19,00%	$ 338.283,00			19,00%	$ -		
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA					**$ 22.221.988,00**		**$ 12.660.854,00**		**$ 49.794.864,00**			**$ 37.134.009,00**			**$ -**			**$ 49.794.864,00**				**$ -**		
H	**Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar**																							
H. 1	**Tratamiento de humedades fachada**																							

H. 1,1	Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye ventaneria y retiro de material afectado por humedad)	M2	17	$ 8.766,00	$ 149.022,00	17,00	$ 149.022,00	106,08	$ 929.932,00	89,08	$ 780.910,00	0,00	$ -	106,08	$ 929.932,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 1,2	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	10	$ 43.882,00	$ 438.820,00	9,20	$ 403.714,00	61,47	$ 2.697.470,00	52,27	$ 2.293.756,00	0,00	$ -	61,47	$ 2.697.470,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 1,3	Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado	M2	10	$ 6.458,00	$ 64.580,00	9,20	$ 59.414,00	61,47	$ 396.980,00	52,27	$ 337.566,00	0,00	$ -	61,47	$ 396.980,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 1,4	Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina	M2	17	$ 14.263,00	$ 242.471,00	16,31	$ 232.651,00	99,62	$ 1.420.844,00	83,31	$ 1.188.193,00	0,00	$ -	99,62	$ 1.420.844,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 1,5	Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos	M2	17	$ 20.941,00	$ 355.997,00	16,31	$ 341.579,00	103,62	$ 2.169.854,00	87,31	$ 1.828.275,00	0,00	$ -	103,62	$ 2.169.854,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 2	**Tratamiento de humedades muros internos**																		
H. 2,1	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	192	$ 6.458,00	$ 1.239.936,00	192,00	$ 1.239.936,00	194,38	$ 1.255.306,00	2,38	$ 15.370,00	0,00	$ -	194,38	$ 1.255.306,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 2,2	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	192	$ 43.882,00	$ 8.425.344,00	192,00	$ 8.425.344,00	194,38	$ 8.529.783,00	2,38	$ 104.439,00	0,00	$ -	194,38	$ 8.529.783,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 2,3	Suministro y aplicación de estuco plástico	M2	274	$ 25.621,00	$ 7.020.154,00	251,90	$ 6.453.930,00	251,90	$ 6.453.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	251,90	$ 6.453.930,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 2,4	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)	M2	274	$ 18.506,00	$ 5.070.644,00	265,94	$ 4.921.486,00	265,94	$ 4.921.486,00	0,00	$ -	0,00	$ -	265,94	$ 4.921.486,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 2,5	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	M2	137	$ 17.048,00	$ 2.335.576,00	47,70	$ 813.190,00	77,50	$ 1.321.220,00	29,80	$ 508.030,00	0,00	$ -	77,50	$ 1.321.220,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 2,6	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	ML	46	$ 4.578,00	$ 210.588,00	46,00	$ 210.588,00	47,70	$ 218.371,00	1,70	$ 7.783,00	0,00	$ -	47,70	$ 218.371,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 2,7	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros	ML	46	$ 17.191,00	$ 790.786,00	46,00	$ 790.786,00	47,70	$ 820.011,00	1,70	$ 29.225,00	0,00	$ -	47,70	$ 820.011,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 2,8	Suministro y aplicación de estuco plástico	ML	46	$ 20.167,00	$ 927.682,00	46,00	$ 927.682,00	47,70	$ 961.966,00	1,70	$ 34.284,00	0,00	$ -	47,70	$ 961.966,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 2,9	Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos)	ML	65	$ 5.961,00	$ 387.465,00	47,70	$ 284.340,00	47,70	$ 284.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	47,70	$ 284.340,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 2,10	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	ML	20	$ 7.792,00	$ 155.840,00	7,20	$ 56.102,00	7,20	$ 56.102,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,20	$ 56.102,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3	**Otros**				$ -														
H. 3,1	Mantenimiento de reja exterior existente con puerta de 2 naves, consiste en soldar, lijar y pintar colo crema.	M2	10	$ 48.700,00	$ 487.000,00	10,00	$ 487.000,00	20,96	$ 1.020.752,00	10,96	$ 533.752,00	0,00	$ -	20,96	$ 1.020.752,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3,2	excavación tierra a mano (tipo terraceo), incluye retiro	M3	9	$ 40.671,00	$ 366.039,00	9,00	$ 366.234,00	30,77	$ 1.251.365,00	21,76	$ 885.131,00	0,00	$ -	30,77	$ 1.251.365,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3,3	Suministro y fabricación de Viga en concreto H=30-40 cm de 21 Mpa incluye acero y flejes de 3/8"	M3	1	$ 852.262,00	$ 852.262,00	1,00	$ 852.262,00	3,96	$ 3.374.958,00	2,96	$ 2.522.696,00	0,00	$ -	3,96	$ 3.374.958,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3,4	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre 12 hueco 2 1/2" altura 200 cm	M2	52	$ 43.830,00	$ 2.279.160,00	52,00	$ 2.279.160,00	56,42	$ 2.472.889,00	4,42	$ 193.729,00	0,00	$ -	56,42	$ 2.472.889,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3,5	Suministro e instalación de poste cilíndrico con brazo, diámetro 2 1/2" para cerramiento., incluye alambre de pues y concertina	ML	12,00	$ 67.361,00	$ 808.332,00	12,00	$ 808.332,00	54,00	$ 3.637.494,00	42,00	$ 2.829.162,00	0,00	$ -	54,00	$ 3.637.494,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3,6	Suministro e instalación de reja de seguridad en tubo cuadrado de 1" x 1" fabricada en fundición, separación entre barras de 10 cm, , incluye perforación, pernos y demás elementos para su correcta instalación.	M2	22	$ 244.812,00	$ 5.385.864,00	5,20	$ 1.273.022,00	5,20	$ 1.273.022,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,20	$ 1.273.022,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3,7	Desmonte ventana metálica existente	M2	17	$ 27.241,00	$ 463.097,00	4,12	$ 112.233,00	4,12	$ 112.233,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,12	$ 112.233,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3,8	Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza	M2	17	$ 340.241,00	$ 5.784.097,00	4,12	$ 1.400.092,00	4,12	$ 1.400.092,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,12	$ 1.400.092,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3,9	Aseo general.	M2	165	$ 5.357,00	$ 883.905,00	165,00	$ 883.905,00	165,00	$ 883.905,00	0,00	$ -	0,00	$ -	165,00	$ 883.905,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3,10	Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" (incluye retiro de tierra a mano)	ML	15	$ 71.589,00	$ 1.073.835,00	15,00	$ 1.073.835,00	15,00	$ 1.073.835,00	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 1.073.835,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3,11	Suministro y fabricación de protección a talud existente- consiste en suministrar e instalar un manto control de erosión, incluye manto geotextil, malla y varilla de acero 1/2"	M2	45	$ 73.050,00	$ 3.287.250,00	45,00	$ 3.287.250,00	45,00	$ 3.287.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 3.287.250,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3,12	Suministro e instalación de marco metálico cuyas medidas oscilan entre 100 cm de ancho x 247 cm de alto	UND	2	$ 197.614,00	$ 395.228,00	2,00	$ 395.228,00	2,00	$ 395.228,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 395.228,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3,13	Desmonte de puerta metálica existente 100 cm x 200 cm	UND	1	$ 60.875,00	$ 60.875,00	1,00	$ 60.875,00	1,00	$ 60.875,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 60.875,00	100%	0,00	$ -	0%
H. 3,14	Suministro e instalación de puerta metálica 100 cm x 200 cm	UND	1	$ 443.778,00	$ 443.778,00	1,00	$ 443.778,00	1,00	$ 443.778,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 443.778,00	100%	0,00	$ -	0%
	ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																		
E. 1,5	Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas son entre 80 -100 cm de ancho x 170 - 240 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano	UND	0,00	$ 272.720,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.090.880,00	4,00	$ 1.090.880,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.090.880,00	100%	0,00	$ -	0%
F. 2,5	Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera	UND	0,00	$ 82.790,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 165.580,00	2,00	$ 165.580,00	0,00	$ -	2,00	$ 165.580,00	100%	0,00	$ -	0%
A. 3,5	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero.	M2	0,00	$ 37.743,00	$ -	0,00	$ -	18,07	$ 682.091,00	18,07	$ 682.091,00	0,00	$ -	18,07	$ 682.091,00	100%	0,00	$ -	0%
NP	**OBRAS NO PREVISTAS**				$ -						$ -		$ -						
NP 17	Limpieza de canal fachada principal y posterior	ML	0,00	$ 6.500,00	$ -	0,00	$ -	20,90	$ 135.850,00	20,90	$ 135.850,00	0,00	$ -	20,90	$ 135.850,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 21	Sacada de filos	ML	0,00	$ 23.335,00	$ -	0,00	$ -	47,70	$ 1.113.080,00	47,70	$ 1.113.080,00	0,00	$ -	47,70	$ 1.113.080,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 22	Desmonte de cubierta fibrocemento	M2	0,00	$ 13.000,00	$ -	0,00	$ -	121,60	$ 1.580.800,00	121,60	$ 1.580.800,00	0,00	$ -	121,60	$ 1.580.800,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 23	Suministro e instalación de tejas en fibrocemento	M2	0,00	$ 49.257,00	$ -	0,00	$ -	121,36	$ 5.977.830,00	121,36	$ 5.977.830,00	0,00	$ -	121,36	$ 5.977.830,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 24	Suministro e instalación de caballete en fibrocemento	ML	0,00	$ 69.000,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 552.000,00	8,00	$ 552.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 552.000,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 25	Suministro e instalación de canaleta plástica entre 20mmx12mm	ML	0,00	$ 8.300,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 99.600,00	12,00	$ 99.600,00	0,00	$ -	12,00	$ 99.600,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 26	Suministro e instalación de ángulo 1 1/2 x 1/8 con varilla de 1/4, incluye anticorrosivo y pintura	ML	0,00	$ 39.100,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 2.346.000,00	60,00	$ 2.346.000,00	0,00	$ -	60,00	$ 2.346.000,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 27	Regata para meter tubería conduit 1/2, incluye resane con mortero, estuco y pintura	ML	0,00	$ 12.400,00	$ -	0,00	$ -	1,90	$ 23.560,00	1,90	$ 23.560,00	0,00	$ -	1,90	$ 23.560,00	100%	0,00	$ -	0%
COSTO DIRECTO					**$ 50.385.627,00**		**$ 39.032.970,00**		**$ 66.892.542,00**		**$ 27.859.572,00**		**$ -**		**$ 66.892.542,00**			**$ -**	
ADMINISTRACION				18,50%	$ 9.321.341,00	18,50%	$ 7.221.099,00	18,50%	$ 12.375.120,00	18,50%	$ 5.154.021,00	18,50%	$ -	18,50%	$ 12.375.120,00		18,50%	$ -	
IMPREVISTO				2,00%	$ 1.007.713,00	2,00%	$ 780.659,00	2,00%	$ 1.337.851,00	2,00%	$ 557.191,00	2,00%	$ -	2,00%	$ 1.337.851,00		2,00%	$ -	
UTILIDAD				4,50%	$ 2.267.353,00	4,50%	$ 1.756.484,00	4,50%	$ 3.010.164,00	4,50%	$ 1.253.681,00	4,50%	$ -	4,50%	$ 3.010.164,00		4,50%	$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 430.797,00	19,00%	$ 333.732,00	19,00%	$ 571.931,00	19,00%	$ 238.199,00	19,00%	$ -	19,00%	$ 571.931,00		19,00%	$ -	
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA					**$ 63.412.831,00**		**$ 49.124.944,00**		**$ 84.187.608,00**		**$ 35.062.664,00**		**$ -**		**$ 84.187.608,00**			**$ -**	
J	**Palacio de Justicia de Tuluá**																		
J. 1	**Reparación de cubierta en teja de barro**																		
J. 1,1	mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros.	M2	156	$ 101.856,00	$ 15.889.536,00	0,00	$ -	587,00	$ 59.789.472,00	0,00	$ -	587,00	$ 59.789.472,00	587,00	$ 59.789.472,00	100%	0,00	$ -	0%
J. 1,2	Suministro e instalación de teja de barro	M2	24	$ 39.613,00	$ 950.712,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
J. 1,3	Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	ML	24	$ 50.569,00	$ 1.213.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
J. 1,4	Aseo general.	M2	156	$ 5.357,00	$ 835.692,00	0,00	$ -	587,00	$ 3.144.559,00	0,00	$ -	587,00	$ 3.144.559,00	587,00	$ 3.144.559,00	100%	0,00	$ -	0%
	ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE																		
A. 8,4	Suministro e instalación de estructura o perfiles metálicos 50mm x 50mm x 3mm	ML	0,00	$ 78.894,00	$ -	0,00	$ -	119,00	$ 9.388.386,00	0,00	$ -	119,00	$ 9.388.386,00	119,00	$ 9.388.386,00	100%	0,00	$ -	0%
G. 2,11	Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)	ML	0,00	$ 5.961,00	$ -	0,00	$ -	204,00	$ 1.216.044,00	0,00	$ -	204,00	$ 1.216.044,00	204,00	$ 1.216.044,00	100%	0,00	$ -	0%
C. 4,4	Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.	M2	0,00	$ 218.517,00	$ -	0,00	$ -	12,22	$ 2.670.278,00	0,00	$ -	12,22	$ 2.670.278,00	12,22	$ 2.670.278,00	100%	0,00	$ -	0%
NP	**OBRAS NO PREVISTAS**				$ -								$ -						
NP 29	Cubierta de protección movible	M2	0,00	$ 23.335,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 1.166.750,00	0,00	$ -	50,00	$ 1.166.750,00	50,00	$ 1.166.750,00	100%	0,00	$ -	0%
NP 10	Suministro e instalación de placa de fibrocemento de 8mm incluye estructura	ML	0,00	$ 46.600,00	$ -	0,00	$ -	204,00	$ 9.506.400,00	0,00	$ -	204,00	$ 9.506.400,00	204,00	$ 9.506.400,00	100%	0,00	$ -	0%
COSTO DIRECTO					**$ 18.889.596,00**	**$0**	**$ -**		**$ 86.881.889,00**		**$ -**		**$ 86.881.889,00**		**$86.881.889**			**$ -**	
ADMINISTRACION				18,50%	$ 3.494.575,00	18,50%	$ -	18,50%	$ 16.073.149,00	18,50%	$ -	18,50%	$ 16.073.149,00	18,50%	$ 16.073.149,00		18,50%	$ -	
IMPREVISTO				2,00%	$ 377.792,00	2,00%	$ -	2,00%	$ 1.737.638,00	2,00%	$ -	2,00%	$ 1.737.638,00	2,00%	$ 1.737.638,00		2,00%	$ -	
UTILIDAD				4,50%	$ 850.032,00	4,50%	$ -	4,50%	$ 3.909.685,00	4,50%	$ -	4,50%	$ 3.909.685,00	4,50%	$ 3.909.685,00		4,50%	$ -	

IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$	161.506,00	19,00%	$	-	19,00%	$	742.840,00	19,00%	$	-	19,00%	$	742.840,00	19,00%	$	742.840,00		19,00%	$	-	
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA				**$**	**23.773.501,00**		**$**	**-**		**$**	**109.345.201,00**		**$**	**-**		**$**	**109.345.201,00**		**$**	**109.345.201,00**			**$**	**-**	

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$**	**1.001.603.692,00**	**$**	**439.981.226,00**	**$**	**1.499.899.740,00**	**$**	**556.841.150,00**	**$**	**503.077.361,00**	**$**	**1.499.899.737,00**	**$**	**-**
ADMINISTRACION	18,50%	$	185.296.682,00	$	81.396.527,00	$	277.481.451,00	$	103.015.613,00	$	93.069.310,00	$	277.481.450,00	$	-
IMPREVISTO	2,00%	$	20.032.074,00	$	-	$	29.997.996,00	$	11.136.823,00	$	10.061.548,00	$	29.997.995,00	$	-
UTILIDAD	4,50%	$	45.072.166,00	$	19.799.155,00	$	67.495.488,00	$	25.057.852,00	$	22.638.481,00	$	67.495.488,00	$	-
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$	8.563.711,00	$	3.761.841,00	$	12.824.143,00	$	4.760.992,00	$	4.301.310,00	$	12.824.143,00	$	-
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)		**$**	**1.260.568.325,00**	**$**	**544.938.749,00**	**$**	**1.887.698.818,00**	**$**	**700.812.430,00**	**$**	**633.148.010,00**	**$**	**1.887.698.813,00**	**$**	**-**
			100,00%		**28,87%**				**37,59%**		**33,54%**		**99,99999974%**		**0,00%**

VALOR CORTE No.2	$ 700.812.430,00
IMPREVISTOS RESPECTO AL PORCENTAJE DEL CORTE 1	$ 8.799.624,00
VALOR PAGADO	**$ 709.612.054,00**

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
Representante Legal

MARIA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinador Área Administrativa
Supervisión del contrato

PIEDAD LORENA HERNANDEZ FERNANDEZ
Supervisión de apoyo

EDWIN REINALDO CANTE CRUZ
Supervisión de apoyo

PALACIO JUSTICIA CALI

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,1	0	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | INMUEBLE | Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,2	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | INMUEBLE | Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 100 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 2

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,3	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,4	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,5	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,6	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,7	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,8	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Corte de muro con pulidora

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,9	0	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,10	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de soscos para canal en 3"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,11	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,12	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación tubo de pasamanos de 2"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,13	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación pasarela o plataforma metálica en rejilla de acero con 2 pasos en cada extremo cuyas medidas son 80 cm ancho, 160cm de largo y 40 cm de latura, incluye pasamanos

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,14	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN	Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 3,1	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN	Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso, incluye retiro)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 3,2	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 3,3	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de enchape antideslizante

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 3,4	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 3,5	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 4,1	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 4,2	0,0	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de estuco plástico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 4,3	71,29	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Estuco Plástico	Porteria Calle 12	1	4,7		1,1	5,17
Estuco Plástico	Archivo Juzgado 36	2	4,2		2,2	18,48
Estuco Plástico	Dilataciones	6	1,2		2,4	17,28
Estuco Plástico	Unidad de Residuos	1	8,6		2,6	22,36
Estuco Plástico	Cubierta Porteria	1	2,5		3,2	8

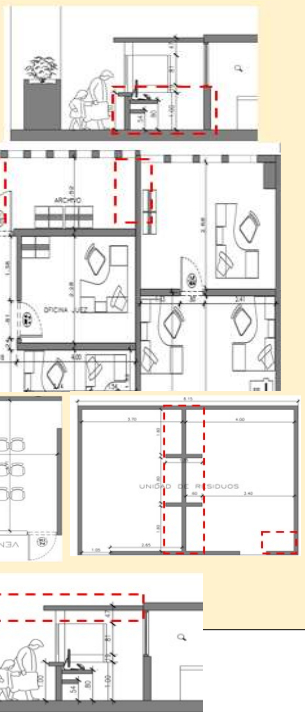







Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO

A. 4,4		200,13	M2			
DISCRIMINACIÓN						
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
VINILO TIPO 1	Porteria Calle 12	1	5,7		1,1	6,27
VINILO TIPO 1	Archivo Juzgado 36	2	14,5		2,2	63,8
VINILO TIPO 1	Dilataciones	6	1,2		2,4	17,28
VINILO TIPO 1	Cuarto Unidad de Residuos	2	20,15		2,6	104,78
VINILO TIPO 1	Cubierta Portería	1	2,5		3,2	8

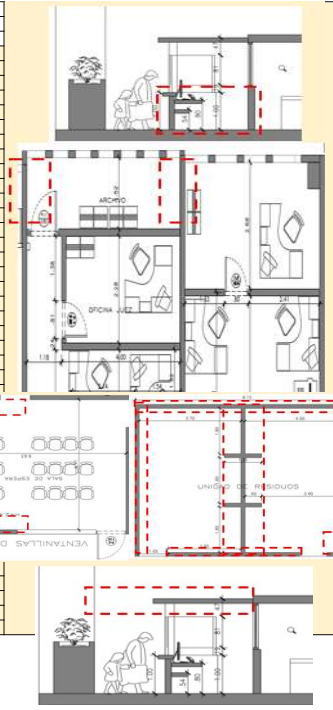







Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"
DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de pintura en esmalte	


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 4,5	66,48	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PINTURA ESMALTE	Unidad de Residuos		41,55		1,6	66,48







Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"
DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1	

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 4,6	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 4,7	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de estuco plástico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 4,8	0,0	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 4,9	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura en esmalte

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 4,10	0	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,1	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de alma en madera de 88mm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,2	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Alma de Madera						

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 5,3	41,85	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Cartera Panel Yeso	Dilataciones ADMON y Piso 5	19			2,2	41,85

PLANO DE CANTIDADES

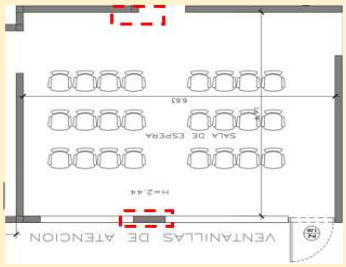

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de guarda escoba en pvc

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 5,4	9,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
GUARDA ESCOBA PVC	PORTERIA CALLE 10	1		9		9

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 5,5	0	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,6	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de panel yeso de 1/2 , una cara, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,7	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,8	48,00	ML	 	 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CANALETA 100x45	ASISTENTE SOCIALES CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4		4
CANALETA 100x45	JUZGADO 09			15		15
CANALETA 100x45	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS			14		14
CANALETA 100x46	JUZGADO 05 PISO 02			15		15

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 5,9	42,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
TROQUEL REGULADO	JUZGADO 09	11				17
TROQUEL REGULADO	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS	5				11
TROQUEL REGULADO	JUZGADO 05 PISO 02	5				14


PLANO DE CANTIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 5,10	1044,7	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Cable UTP CAT 6	ASISTENTE SOCIALES CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5		48		240
Cable UTP CAT 6	JUZGADO 09	7		25,7		179,9
Cable UTP CAT 6	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS	5		60		300
Cable UTP CAT 6	JUZGADO 05 PISO 02	7		46,4		324,8

PLANO DE CANTIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 5,11	34,00	UND

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Toma Hem.Jack RJ 45	JUZGADO 09	11				12
Toma Hem.Jack RJ 45	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS	5				12
Toma Hem.Jack RJ 45	JUZGADO 05 PISO 02					10

PLANO DE CANTIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 5,12	17,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
FACEPLATE 1 SALIDA	JUZGADO 09	6				6
FACEPLATE 1 SALIDA	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS	6				6
FACEPLATE 1 SALIDA	JUZGADO 05 PISO 02	5				5

PLANO DE CANTIDADES

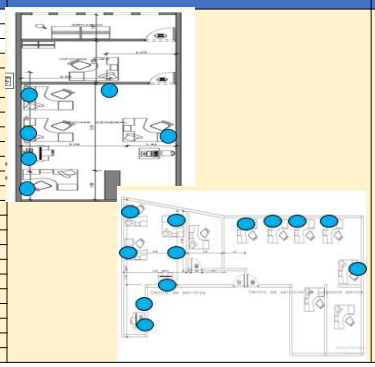

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 5,13	14,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Red Regulada	JUZGADO 09					5
Red Regulada	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS					5
Red Regulada	JUZGADO 05 PISO 02					4

PLANO DE CANTIDADES

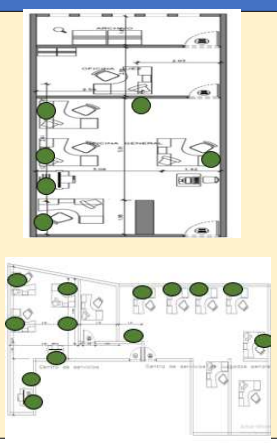

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 5,14	17,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Red Normal	JUZGADO 09					6
Red Normal	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS					6
Red Normal	JUZGADO 05 PISO 02					5

PLANO DE CANTIDADES

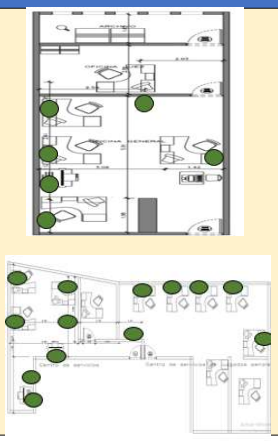

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,15	0	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,16	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total




Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado

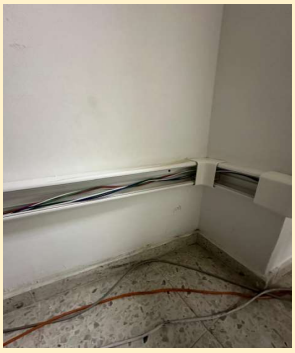ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,17	88,00	ML	 	

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Red Regulada	JUZGADO 09					30
Red Regulada	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS					28
Red Regulada	JUZGADO 05 PISO 02					30

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 5,19	81,00	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PATCH CORD CAT 6a	JUZGADO 03 PISO 06	5				5
PATCH CORD CAT 6a	JUZGADO 08 PISO 06	7				7
PATCH CORD CAT 6a	JUZGADO 36 PISO 06	4				4
PATCH CORD CAT 6a	JUZGADO 11 PISO 06	6				6
PATCH CORD CAT 6a	JUZGADO 05 PISO 02	6				6
PATCH CORD CAT 6a	JUZGADO 04 PISO 02	5				5
PATCH CORD CAT 6a	JUZGADO 02 PISO 02	5				5
PATCH CORD CAT 6a	ASISTENTES SOCIALES CENTRO ADMON PISO 02	5				5
PATCH CORD CAT 6a	JUZGADO 01 PISO 02	5				5
PATCH CORD CAT 6a	CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PISO 02	10				10
PATCH CORD CAT 6a	JUZGADO 09 PISO 06	6				6
PATCH CORD CAT 6a	CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	11				11
PATCH CORD CAT 6a	ENTREGADOS AL ING. EDWIN CANTE					6

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO

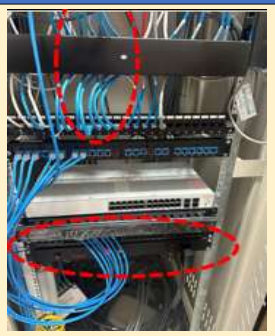

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 5,20	1	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Switch 24 puertos		1				1

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO

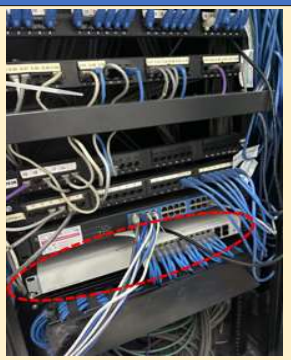

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos cat. 6a (incluye elementos de fijación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 5,21	3,00	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PATCHPANEL	Cuarto Telecomunicaciones Piso 02	3				3

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO

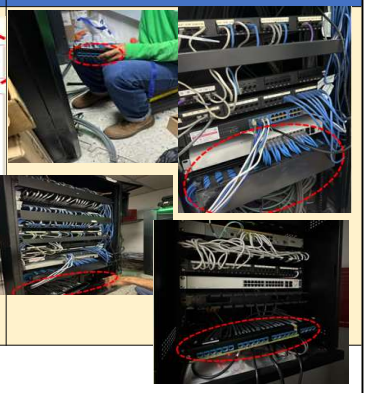

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,22	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de tubería SCH 40 1"

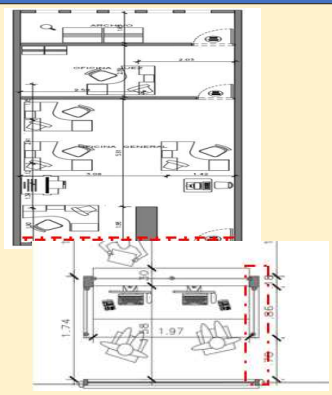ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,23	233,67	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Tubo SCH 40"	Juzgado 05			15		15
Tubo SCH 40"	Porteria Calle 10			50		50
Tubo SCH 40"	CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PISO 02			16		16
Tubo SCH 40"	Juzgado 3 piso 6			10		10
Tubo SCH 40"	Juzgado 6 penal piso 6			14		14
Tubo SCH 40"	Juzgado 12 de ejecucion piso 6			10		10
Tubo SCH 40"	Juzgado 10 piso 6			14		14
Tubo SCH 40"	Juzgado 11 piso 6			14		14
Tubo SCH 40"	Juzgado 8 piso 6			10		10
Tubo SCH 40"	Juzgado 36 piso 6			15		15
Tubo SCH 40"	Juzgado 4 piso 2			14		14
Tubo SCH 40"	Juzgado 2 piso 2			10		10
Tubo SCH 40"	Juzgado 1 piso 2			17		17
Tubo SCH 40"	Centro de servicios piso 2			14		14
Tubo SCH 40"	Asistentes sociales			10,7		10,7

192,74

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de tubería SCH 40 1 1/2"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,24	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, (ver imagen1)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,25	0	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,26	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Demolición muro existente incluye retiro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 6,1	0,00	M3		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Fabricación muro en ladrillo estructural - altura 70 cm incluye viga, dovelas, grouting, ladrillo estructural 14x19x39 cm, mortero


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 6,2	5,60	M2		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MURO ESTRUCTURAL	CUARTO COMBUSTIBLE	1	8		0,7	5,6









Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Suministro y fabricación guardaescoba en concreto en media caña 10 cm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 6,3	17,30	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MEDIACAÑA	Unidad de Residuos			9,3		9,3
MEDIACAÑA	Subestacion			8		8

PLANO DE CANTIDADES

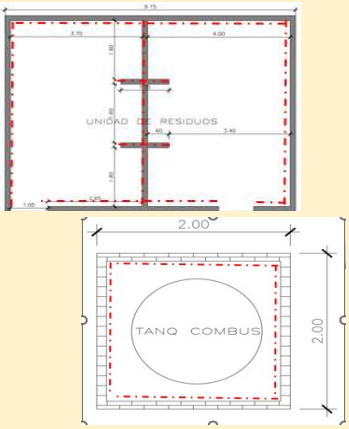

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de mortero 1:3 esmaltado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 6,4	21,09	M2


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MORTERO ESMALTADO	UNIDAD DE RESIDUOS	1	3,7	5,7		21,09

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Corte de concreto con pulidora y/o cortadora

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 6,5	14,50	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CORTE PULIDORA	CUARTO COMBUSTIBLE PISO 2	1		14,5		14,5

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN excavación tierra a mano 30 cm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 6,6	0,00	M3		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4" con sus respectivos accesorios

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 6,7	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en placa de RF espesor 12,7 mm , una cara, incluye estructura

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 6,8	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 6,9	0	M3		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Corte de concreto con pulidora y/o cortadora

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 7,1	91,20	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CORTE DE DILATACION	PISO 02 - ZONA ADMON	2		45,6		91,2

PLANO DE CANTIDADES

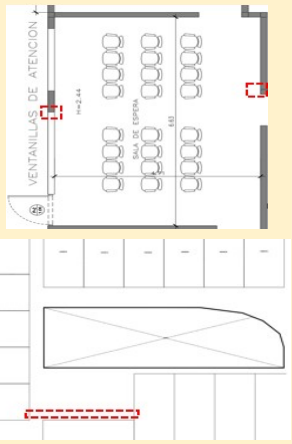

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elástico para interior y exterior

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 7,2	0,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de perfil o dilatación aluminio para piso

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 7,3	17,50	ML


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
DILATACION ALU	PISO 05	1		4,9		4,9
DILATACION ALU	Lobby Administracion	1		7,8		7,8
DILATACION ALU	Oficina Doc Socorro	1		4,8		4,8

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO

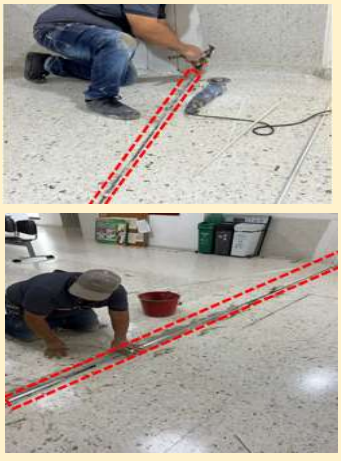

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de dilatación Z plástica (junta de expansión drywall)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 7,4	21,00	ML


DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
DILATACION EN Z	PISO 02 - ZONA ADMON			14		14
DILATACION EN Z	OFICINA DRA SOCORRO			7		7

PLANO DE CANTIDADES

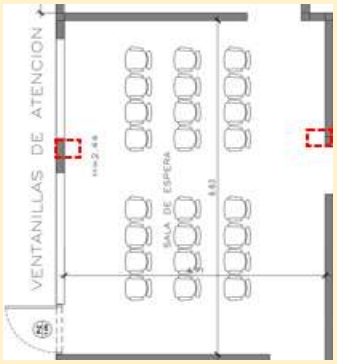

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Desmonte de láminas metálicas en mal estado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 8,1	234	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10	4	7,1		1,7	48,28
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10	4	7,3		1,4	40,88
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10	4	3,6		1,4	20,16
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10	5	2,607		0,9	11,73
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10	4	7,15		1,4	40,04
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10	4	3,5		1,5	21
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10	3	2,7		1,5	12,15
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10	4	7,1		1,4	39,76

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO




Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Desmonte de estructura metálica en mal estado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 8,2	35,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ESTRUCTURA FACHADA	FACHADA CALLE 10			7		7
ESTRUCTURA FACHADA	FACHADA CALLE 10			7,4		7,4
ESTRUCTURA FACHADA	FACHADA CALLE 10			1,5		1,5
ESTRUCTURA FACHADA	FACHADA CALLE 10			7,5		7,5
ESTRUCTURA FACHADA	FACHADA CALLE 10			4,4		4,4
ESTRUCTURA FACHADA	FACHADA CALLE 10			7,2		7,2

PLANO DE CANTIDADES




REGISTRO FOTOGRAFICO




Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de lámina metálica perforada redonda 5mm calibre 3mm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 8,3	52,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10		7,1		1,7	12,07
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10		5,7		1,4	7,98
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10		2,4		1,5	3,6
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10		2		0,9	1,8
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10		7,15		1,4	10,01
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10		2,2		1,5	3,3
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10		2,2		1,5	3,3
LAMINAS MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10		7,1		1,4	9,94



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de estructura o perfiles metálicos 50mm x 50mm x 3mm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 8,4	66,00	ML	 	 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ESTRUCTURA MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10	2		7,5		15
ESTRUCTURA MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10	4		5,25		21
ESTRUCTURA MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10	2		7,5		15
ESTRUCTURA MAL ESTADO	FACHADA CALLE 10	2		7,5		15

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Retiro de pintura epoxica existente con cloruro de metileno

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 9,1	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 9,2	0	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso con acabado en barniz (2 capas de pintura epoxica)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 9,3	90	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
APLICA PINTU EPOX	CUARTO DE RESIDUOS - PISO	1	6,7	7,2		48,24
APLICA PINTU EPOX	CUARTO DE RESIDUOS - MURO 1m	1	41,76	1		41,76

PLANO DE CANTIDADES

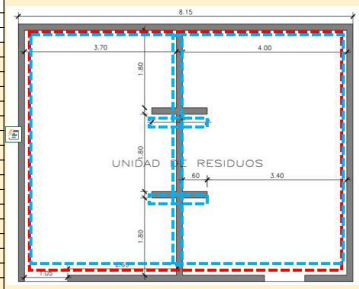

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"

DESCRIPCIÓN Aseo general.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
A. 9,4	16,00	M2

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ASEO DE OBRA	GENERAL		5,333	3		16

PLANO DE CANTIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 2,7	0,00	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
D. 1,5	55,32	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PLACA FIBROCEMENTO	Portería Calle 10	2	4,5	2,66		23,964
PLACA FIBROCEMENTO	Cuarto de residuos	2	1,8		2,01	7,24
PLACA FIBROCEMENTO	Cuarto de residuos	8	0,6		2,01	9,65
PLACA FIBROCEMENTO	Cuarto de residuos	2	1,8		2,01	7,24
PLACA FIBROCEMENTO	Cuarto de residuos	2	1,8		2,01	7,24

PLANO DE CANTIDADES

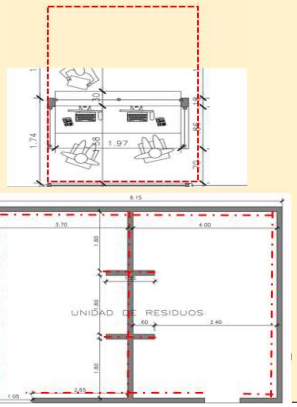

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Losa en concreto de 3000 PSI espesor de 0,15 con lámina colaborante, incluye acero de refuerzo en lamina electrosoldada

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
NP 1	4,00	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
LOSA CONCRETO	SUBESTACION	1	2	2		4

PLANO DE CANTIDADES

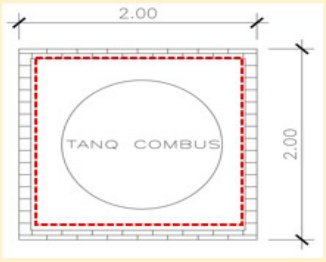

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de perfil HEA 190x200x6.5 mm, incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
NP 2	12,00	ML


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PERFIL	SUBESTACION	4		3		12


PLANO DE CANTIDADES







REGISTRO FOTOGRAFICO

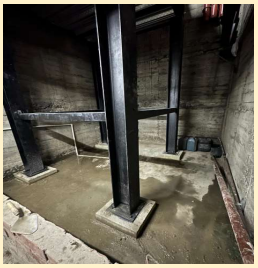

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de IPE 220X110X5.9 MM, incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
NP 3	12	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
IPE	SUBESTACION	4		3		12

PLANO DE CANTIDADES

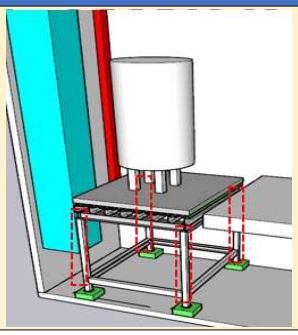

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de perlín estructural tipo C entre 200 y 190x160x60


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
NP 4	8,00	ML

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
TANQUE	SOTANO					8,00

PLANO DE CANTIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO

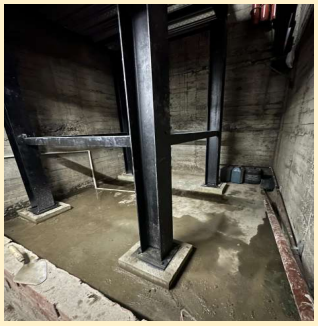

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de bases en concreto de 3000 PSI de 40cmx40cm undidos sobre losa sotano


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
NP 5	4,00	UND

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
BASES DE CONCRETO	SUBESTACION			4		4

PLANO DE CANTIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de platina 1/2 30 cm x 30 cm x 50 aprox. incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
NP 6	8,00	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PLATINA	SUBESTACION			8		8

PLANO DE CANTIDADES

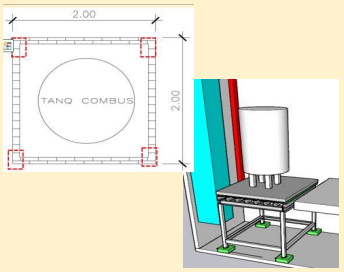

REGISTRO FOTOGRAFICO

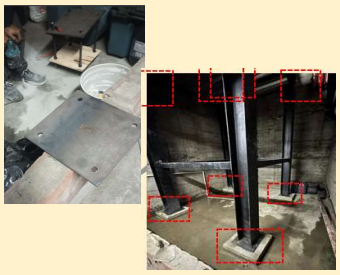

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"


DESCRIPCIÓN: Desmonte y montaje del tanque de combustible

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
NP 7	1,00	GL

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Desmonte instalación tanque combustible	Cuarto combustible	1				1

PLANO DE CANTIDADES

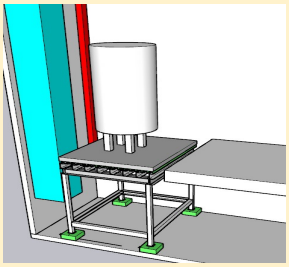

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

DOVIO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
B. 1,1	0	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
		0				0

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | INMUEBLE | Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
B. 1,2	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
		0				0

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
B. 1,3	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
		0				0

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
B. 1,4	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
		0				0

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN	Rasqueteada de Pintura

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
B. 1,5	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
B. 1,6	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de estuco plástico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
B. 1,7	2,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Estuco	Pasillo	1	1	2		2


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)

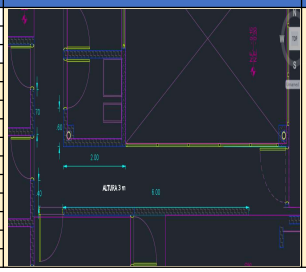ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
B. 1,8	29,00	M2		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Pintura	Pasillo	1	6,0		3	18,00
Pintura	Pasillo	1	2,0		3	6,00
Pintura	Pasillo	1	0,6		3	1,80
Pintura	Pasillo	1	0,7		3	2,10
Pintura	Pasillo	1	0,4		3	1,10


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura en esmalte

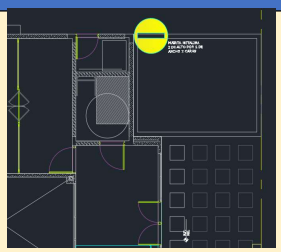ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
B. 1,9	4	M2		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ESMALTE	REJA PATIO	2	1	2		4



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN Aseo general.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
B. 1,10	24,00	M2	 	 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ASEO	PASILLO	1	1,9	2,9		5,51
ASEO	PASILLO	1	1,0	8,2		8,20
ASEO	TERRAZA	1	4,75	2,166		10,29


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts.

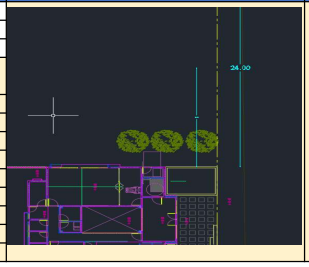ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
B. 1,11	24,00	ML		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Cerramiento	solar lado derecho	24				24,00



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de panel yeso de 1/2 , una cara, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 5,7	1,00	M2		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PANEL YESO	PASILLO	1	1	1		1,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1

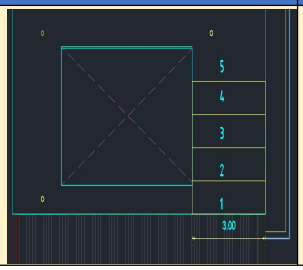ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,5	15,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Cubierta	Terraza	5		3		15,00



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica

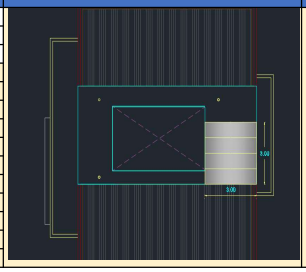ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,6	9,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Teja	Terraza	1	3	3		9,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente.

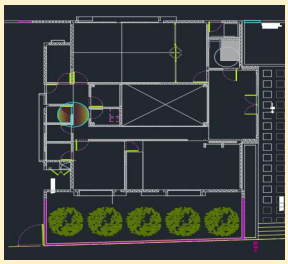ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 2,7	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PUERTA	BAÑO DAMAS	1				1

Vo Bo Director Obra

PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCION	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN	Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 1,1	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN	Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 1,2	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN	Lijada con maquina pulidora (piedra esmeril)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 1,3	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Lavado de la fachada con hidrolavadora, incluye ventaneria y piedra.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 1,4	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra, 2 manos)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 1,5	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de ángulo en aluminio anoloc de 1/2, (gotero en ventana)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 1,6	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 2,1	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 2,2	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de estuco plástico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 2,3	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)

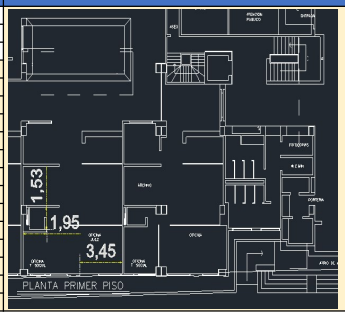ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 2,4	12,96	M2		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
VINILO	OF 102		1,95		2,33	4,54
VINILO	OF 102		1,53		2,33	3,56
VINILO	OF 102		3,45		2,33	8,04
DESCUENTO PUERTA	OF 102		- 0,68		2,10	- 1,43
DESCUENTO VENTANA	OF 102		- 1,32		1,33	- 1,76

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura en esmalte

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 2,5	56,80	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ESMALTE	PUERTA GARAJE SOTANO	2	3,2		2,81	18,00
ESMALTE	MURO ARCHIVO	2	6		3,5	42,00
DESCUENTO	PUERTA	2	-0,8		2	-3,20

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 2,6	129,00	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PINTURA CIELO PRIMER PIS	ENTRADA PALACIO	1	1,60	6,00		9,60
PINTURA CIELO TERCER PIS	PASILLOS PALACIO	1	1,60	10,50		16,80
PINTURA CIELO TERCER PIS	PASILLOS PALACIO	1	1,62	26,75		43,32
PINTURA CIELO SEGUNDO I	PASILLOS PALACIO	1	0,40	15,75		6,30
PINTURA CIELO SEGUNDO I	PASILLOS PALACIO	1	1,60	10,50		16,80
PINTURA CIELO SEGUNDO I	PASILLOS PALACIO	1	1,62	26,75		43,34
DESCUENTO	PASILLOS PALACIO	4	0,55	-1,30		-2,87
DESCUENTO	PASILLOS PALACIO	1	0,55	-1,30		-0,72
DESCUENTO	PASILLOS PALACIO	4	0,55	-1,30		-2,86
DESCUENTO	PASILLOS PALACIO	1	0,55	-1,30		-0,72

PLANO DE CANTIDADES

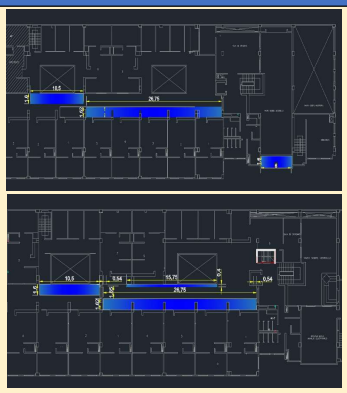

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 2,7	0,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 2,8	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de estuco plástico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 2,9	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 2,10	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de pintura en esmalte

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 2,11	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a dos manos (muro terraza)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 2,12	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a 3 manos (muro terraza)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 2,13	30,00	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PERIMETRO	TERRAZA	1		8,20	1	8,20
PERIMETRO	TERRAZA	1		20,40	1	20,40
PERIMETRO	TERRAZA	1		1,40	1	1,40
29,996						

PLANO DE CANTIDADES

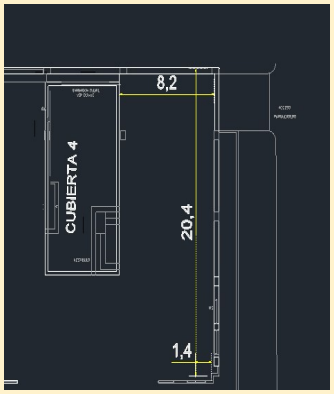

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN Desmonte puerta eléctrica existente 320 cm x 270 cm(incluye motor)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 3,1	1,00	UND


DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
DESMONTE PUERTA	GARAJE	1				1,00

PLANO DE CANTIDADES

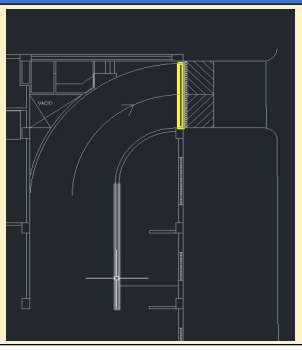

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN suministro e instalación de puerta eléctrica de 320 cm de ancho x 270 cm de alto (Incluye motor)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 3,2	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
SUMINISTRO PUERTA	SOTANO	1				1,00

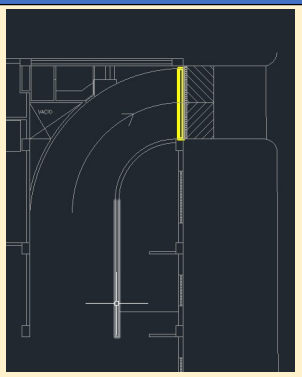



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 4,1	33,66	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
RETIRO DE MANTO	MATERA	1	3,30	10,20		33,66

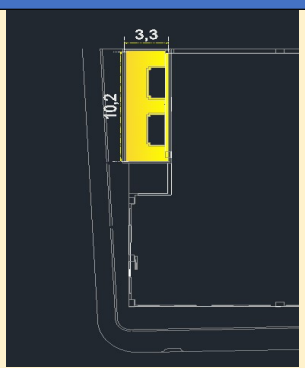



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 4,2	67,65	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
RETIRO DE MANTO	MATERA	1	3,16	10,00		31,59
RETIRO DE MANTO	TERRAZA	1	1,85	1,62		3,00
RETIRO DE MANTO	TERRAZA	1	1,00	11,22		11,22
RETIRO DE MANTO	TERRAZA	1	1,85	1,32		2,44
RETIRO DE MANTO	TERRAZA	1	1,20	0,80		0,96
RETIRO DE MANTO	TERRAZA	1	1,55	1,30		2,02
RETIRO DE MANTO	TERRAZA	1	2,25	2,10		4,73
RETIRO DE MANTO	TERRAZA	1	2,30	1,70		3,91
RETIRO DE MANTO	TERRAZA	1	3,00	2,60		7,79

PLANO DE CANTIDADES

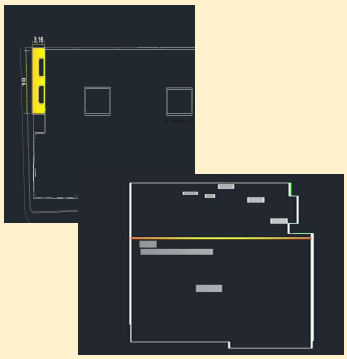

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 4,3	20	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MORTERO DE NIVELACION	JARDINERAS	20				20,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 4,4	59,07	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
IMPERMEABILIZANTE	MATERA	1	3,18	10,24		32,57
IMPERMEABILIZANTE	TERRAZA	1	1,80	1,50		2,70
IMPERMEABILIZANTE	TERRAZA	1	1,00	11,20		11,20
IMPERMEABILIZANTE	TERRAZA	1	1,30	1,80		2,34
IMPERMEABILIZANTE	TERRAZA	1	1,50	1,30		1,95
IMPERMEABILIZANTE	TERRAZA	1	2,30	1,70		3,91
IMPERMEABILIZANTE	TERRAZA	1	2,20	2,00		4,40

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 5,1	6,48	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PANEL YESO	JUZGADO 9	1		2,7	2,40	6,48

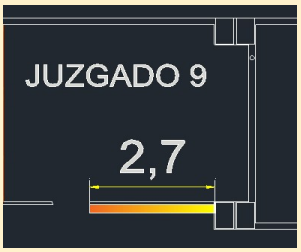



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de alma en madera de 88mm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 5,2	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 5,3	0	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de guarda escoba en pvc

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,4	24,20	ML


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PANEL YESO	JUZGADO 4 EJECUCION Y PENAS	2		3,87		7,74
PANEL YESO	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL	2		4,00		8,00
PANEL YESO	JUZGADO 9 EJECUCION Y PENAS	2		2,70		5,40
PANEL YESO	JUZGADO 8 PENAL DEL CIRCUITO	2		3,93		7,86
DESCUENTON PUERTA	JUZGADO 4 DE EJECUCION Y PENAS	2		-0,8		-1,60
DESCUENTON PUERTA	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL	2		-0,8		-1,60
DESCUENTON PUERTA	JUZGADO 8 PENAL DEL CIRCUITO	2		-0,8		-1,60

PLANO DE CANTIDADES

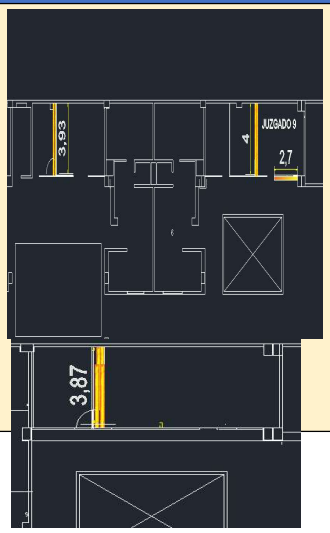

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,5	0	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PUERTAS						

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,6	30	ML


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CANALETA	DESPACHO 9 MUNICIPAL	10				10,00
CANALETA	DESPACHO 8 PENAL CIRCUITO	10				10,00
CANALETA	DESAPCHO 4 EJECUCION DE PENAS	10				10,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO

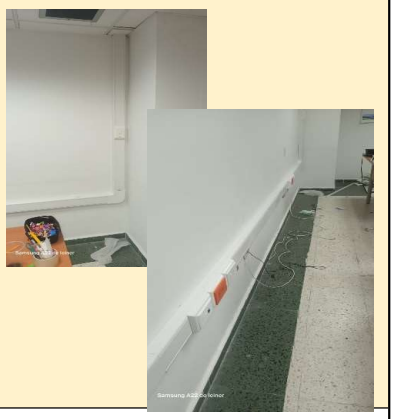

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,7	39	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
TROQUELES	DESPACHO 9 MUNICIPAL	11				11
TROQUELES	DESPACHO 8 PENAL CIRCUITO	14				14
TROQUELES	DESAPCHO 4 EJECUCION DE PENAS	14				14

PLANO DE CANTIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,8	730	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
UTP	DESPACHO 9 MUNICIPAL	1		350		350
UTP	DESPACHO 8 PENAL CIRCUITO	1		280		280
UTP	DESAPCHO 4 EJECUCION DE PENAS	1		100		100

PLANO DE CANTIDADES

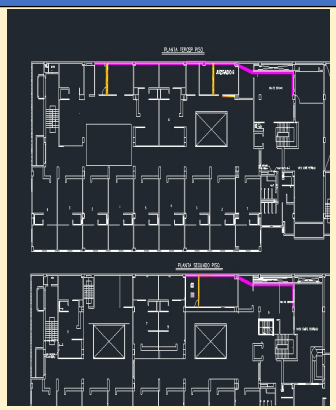

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,9	14	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
TOMA HEMBRA	DESPACHO 9 MUNICIPAL	4				4
TOMA HEMBRA	DESPACHO 8 PENAL CIRCUITO	5				5
TOMA HEMBRA	DESAPCHO 4 EJECUCION DE PENAS	5				5

PLANO DE CANTIDADES

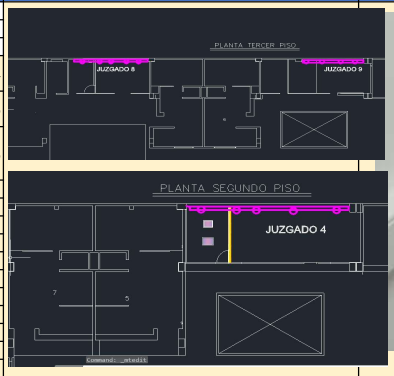

REGISTRO FOTOGRAFICO

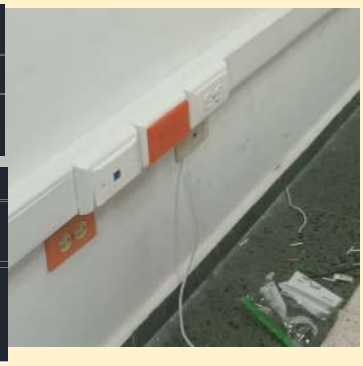

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,10	14	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
FACEPLATE	DESPACHO 9 MUNICIPAL	4				4
FACEPLATE	DESPACHO 8 PENAL CIRCUITO	5				5
FACEPLATE	DESAPCHO 4 EJECUCION DE PENAS	5				5

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,11	11	UND

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
REGULADA	DESPACHO 9 MUNICIPAL	3				3
REGULADA	DESPACHO 8 PENAL CIRCUITO	4				4
REGULADA	DESAPCHO 4 EJECUCION DE PENAS	4				4

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,12	14	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
SALIDA ELECTRICA	DESPACHO 9 MUNICIPAL	4				4
SALIDA ELECTRICA	DESPACHO 8 PENAL CIRCUITO	5				5
SALIDA ELECTRICA	DESAPCHO 4 EJECUCION DE PENAS	5				5

PLANO DE CANTIDADES

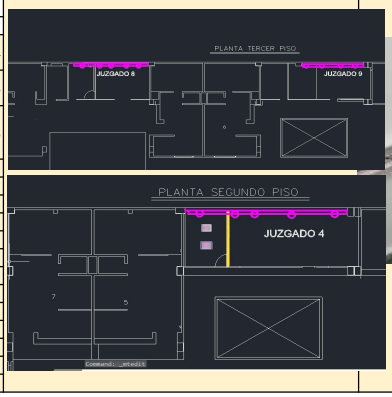

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,13	3	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
INTERRUPTOR SENCILLO	DESPACHO 9 MUNICIPAL	1				1
INTERRUPTOR SENCILLO	DESPACHO 8 PENAL CIRCUITO	1				1
INTERRUPTOR SENCILLO	DESAPCHO 4 EJECUCION DE PENAS	1				1

PLANO DE CANTIDADES

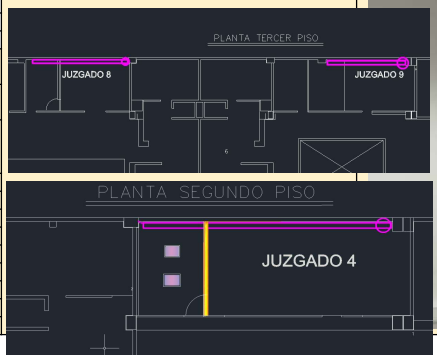

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,14	2	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
LAMPARA	JUZGADO 8	2				2,00

PLANO DE CANTIDADES

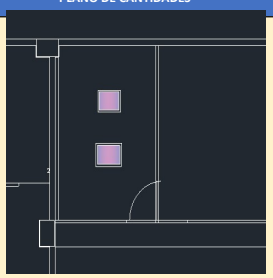

REGISTRO FOTOGRAFICO

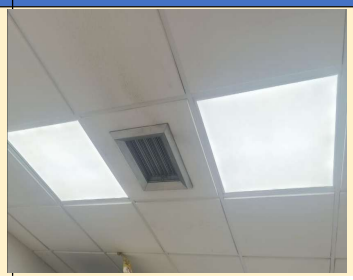

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,15	410	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CABLE TRENZADO	DESPACHO 9 MUNICIPAL	166				166
CABLE TRENZADO	DESPACHO 8 PENAL CIRCUITO	123				123
CABLE TRENZADO	DESAPCHO 4 EJECUCION DE PENAS	121				121

PLANO DE CANTIDADES

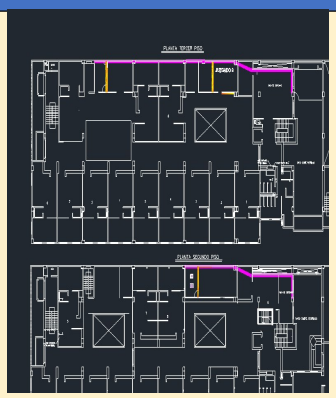

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,16	14	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PATCH CORD	RACK	14				14

PLANO DE CANTIDADES

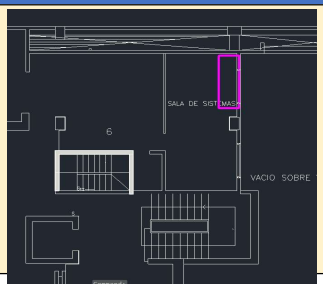

REGISTRO FOTOGRAFICO

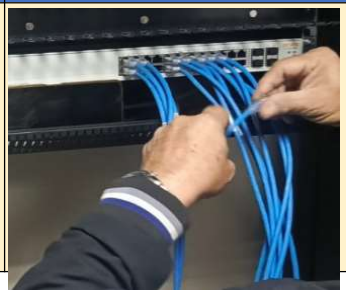

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,17	14	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PATCH CORD	DESPACHO 9 MUNICIPAL	4				4
PATCH CORD	DESPACHO 8 PENAL CIRCUITO	5				5
PATCH CORD	DESAPCHO 4 EJECUCION DE PENAS	5				5

PLANO DE CANTIDADES

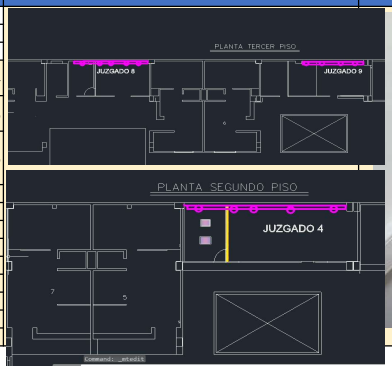

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,18	1	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
SWICTCH	RACK	1				1

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 5,19	1	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PATCH PANEL 24	RACK	1				1,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO




Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de puerta en madera con marco metálico cuyas medidas son 96 cm x 197 cm, incluye marco, pintura y cerradura

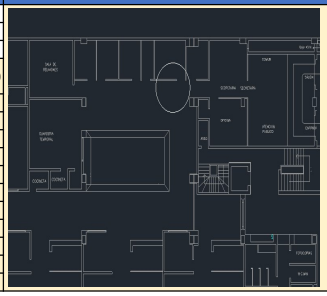ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 7,1	1	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PUERTA CON CON VIDRIO	JUZGADO 8 PENAL	1				1,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de sellador para uso exterior (para ventanas)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 7,2	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Aseo general.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 7,6	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 8,1	0	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 8,2	0	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 8,3	0	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 8,4	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 8,5	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cubierta en teja upvc blanca con tramos translucidos intercalados

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 8,6	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 3,5	0	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 1,5	0	M2		

DISCRIMINACIÓN


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de orinal mediano entrada superior similar al existente

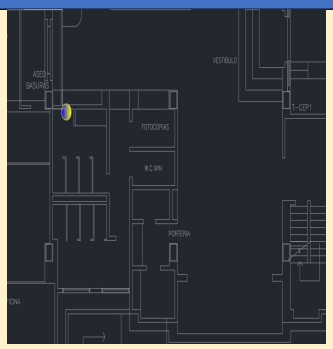ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
NP 8	3	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
INSTALACION ORINAL	BAÑO 1 PISO	1				1,00
INSTALACION ORINAL	BAÑO 2 PISO	1				1,00
INSTALACION ORINAL	BAÑO 3 PISO	1				1,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" de Palmira


DESCRIPCIÓN	Desmonte de orinal existente

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
NP 9	3	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
DESMONTE ORINAL	BAÑO 1 PISO	1				1,00
DESMONTE ORINAL	BAÑO 2 PISO	1				1,00
DESMONTE ORINAL	BAÑO 3 PISO	1				1,00

PLANO DE CANTIDADES

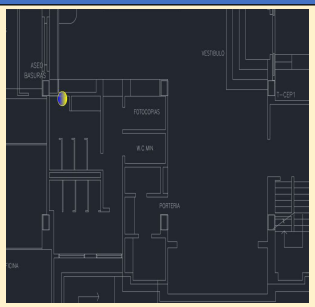

REGISTRO FOTOGRAFICO

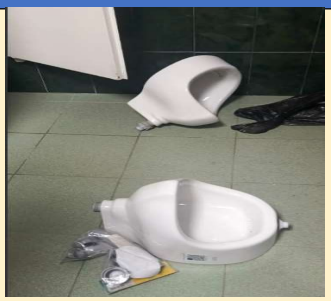

Vo.Bo Director Obra


SEDE DE FAMILIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCION	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 1,1	29	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PASARELA		29				29,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 1,2	58,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MALLA SOMBRA	SEDE FAMILIA	29			2	58,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 1,3	60,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
DESMONTE	FACHADA	1	6		7,6	45,50
DESMONTE	FACHADA	1	0,5		7,0	3,50
DESMONTE	FACHADA	1	0,5		6,0	3,00
DESMONTE	FACHADA VENT	8	0,5		1,0	4,00
DESMONTE	FACHADA VENT	8	0,5		1,0	4,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CALCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 1,4	313,80	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
FIBROCEMENTO PERIMETRO- CENTRO- 3 CARAS	FACHADA - NIVEL 3,5	3			52,3	156,90
FIBROCEMENTO PERIMETRO INF.	FACHADA NIVEL 7	3			52,3	156,90

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
D. 1,5	60,00	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
FIBROCEMENTO	FACHADA	1	6		7,6	45,50
FIBROCEMENTO	FACHADA LAT DERCH	1	0,5		7,0	3,50
FIBROCEMENTO	FACHADA LAT IZQ	1	0,5		6,0	3,00
FIBROCEMENTO	PERIMETRO VENT	8	0,5		1,0	4,00
FIBROCEMENTO	PERIMETRO VENT	8	0,5		1,0	4,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de estuco plástico


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
D. 1,6	594,27	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PISO UNO ESTUCO POSTERIOR	SEDE FAMILIA	1	19,37		4,25	82,32
PISO UNO ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	20,09		4,25	85,38
PISO UNO ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,95		4,25	4,04
PISO UNO ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,70		4,25	2,98
PISO UNO ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,25	1,28
PISO UNO ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	6,02		4,25	25,59
PISO UNO ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,25	1,28
PISO UNO ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,62		4,25	2,64
PISO UNO ESTUCO FRENTE	SEDE FAMILIA	1	0,50		4,25	2,13
PISO UNO ESTUCO DERECHA	SEDE FAMILIA	1	20,94		4,25	89,00
PISO DOS ESTUCO POSTERIOR	SEDE FAMILIA	1	20,22		4,60	93,01
PISO DOS ESTUCO POSTERIOR	SEDE FAMILIA	1	0,32		4,60	1,47
PISO DOS ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	20,42		4,60	93,93
PISO DOS ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	1,80		4,60	8,28
PISO DOS ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,70		4,60	3,22
PISO DOS ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,60	1,38
PISO DOS ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	6,02		4,60	27,69
PISO DOS ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,60	1,38
PISO DOS ESTUCO IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,62		4,60	2,85
PISO DOS ESTUCO FRENTE	SEDE FAMILIA	1	0,50		4,60	2,30
PISO DOS ESTUCO DERECHA	SEDE FAMILIA	1	0,20		4,60	0,92
PISO DOS ESTUCO DERECHA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,60	1,38
PISO DOS ESTUCO DERECHA	SEDE FAMILIA	1	1,65		4,60	7,59
PISO DOS ESTUCO DERECHA	SEDE FAMILIA	1	0,40		4,60	1,84
PISO DOS ESTUCO DERECHA	SEDE FAMILIA	1	5,90		4,60	27,14
PISO DOS ESTUCO DERECHA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,60	1,38
PISO DOS ESTUCO DERECHA	SEDE FAMILIA	1	4,01		4,60	18,45
PISO DOS ESTUCO DERECHA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,60	1,38
PISO DOS ESTUCO DERECHA	SEDE FAMILIA	1	4,81		4,60	22,13
PISO DOS ESTUCO DERECHA	SEDE FAMILIA	1	4,40		4,60	20,24
VENT-1 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	1	6,00		0,50	-3,00
VENT-1 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	1	2,40		0,50	-1,20
VENT-1 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	1	3,80		0,50	-1,90
VENT-1 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	1	0,70		1,80	-1,26
VENT-2 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	1	0,70		1,00	-0,70
VENT-2 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	6	0,30		2,00	-3,60
VENT-2 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	3	0,50		2,00	-3,00
VENT-2 PISO POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	2,50		0,50	-1,25
VENT-2 PISO POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	2,00		0,50	-1,00
VENT-2 PISO POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	4,00		0,50	-2,00
VENT-1 PISO POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	2,00		0,50	-1,00
VENT-1 PISO POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	2,50		0,50	-1,25
VENT-1 PISO POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	2,10		0,50	-1,05
PURTA POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	0,90		1,70	-1,53
VENTANA REJILLA POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	5,20		0,25	-1,30
VENT-1 PISO IZQUIERDA	SED.FAMILIA	1	0,80		1,80	-1,44
VENT-1 PISO IZQUIERDA	SED.FAMILIA	3	0,30		1,80	-1,62
VENT-1 PISO IZQUIERDA	SED.FAMILIA	7	0,50		1,80	-6,30
VENT-2 PISO IZQUIERDA	SED.FAMILIA	1	6,00		0,50	-3,00
VENT-2 PISO IZQUIERDA	SED.FAMILIA	1	2,20		0,50	-1,10
VENT-2 PISO IZQUIERDA	SED.FAMILIA	1	3,60		0,50	-1,80


PLANO DE CANTIDADES



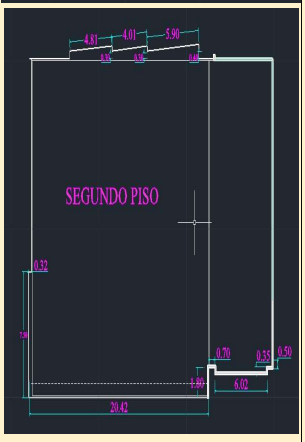

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura para superboard para exterior a dos manos color similar al existente

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 1,7	596,60	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PISO UNO PINTURA POSTERIOR	SEDE FAMILIA	1	19,37		4,25	82,32
PISO UNO PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	20,09		4,25	85,38
PISO UNO PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,95		4,25	4,04
PISO UNO PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,70		4,25	2,98
PISO UNO PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,25	1,28
PISO UNO PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	6,02		4,25	25,59
PISO UNO PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,25	1,28
PISO UNO PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,62		4,25	2,64
PISO UNO PINTURA FRENTE	SEDE FAMILIA	1	0,76		4,25	3,25
PISO UNO PINTURA DERECHA	SEDE FAMILIA	1	20,94		4,25	89,00
PISO DOS PINTURA POSTERIOR	SEDE FAMILIA	1	20,22		4,60	93,01
PISO DOS PINTURA POSTERIOR	SEDE FAMILIA	1	0,32		4,60	1,47
PISO DOS PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	20,42		4,60	93,93
PISO DOS PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	1,80		4,60	8,28
PISO DOS PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,70		4,60	3,22
PISO DOS PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,60	1,38
PISO DOS PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	6,02		4,60	27,69
PISO DOS PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,60	1,38
PISO DOS PINTURA IZQUIERDA	SEDE FAMILIA	1	0,62		4,60	2,85
PISO DOS PINTURA FRENTE	SEDE FAMILIA	1	0,76		4,60	3,51
PISO DOS PINTURA DERECHA	SEDE FAMILIA	1	0,20		4,60	0,92
PISO DOS PINTURA DERECHA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,60	1,38
PISO DOS PINTURA DERECHA	SEDE FAMILIA	1	1,65		4,60	7,59
PISO DOS PINTURA DERECHA	SEDE FAMILIA	1	0,40		4,60	1,84
PISO DOS PINTURA DERECHA	SEDE FAMILIA	1	5,90		4,60	27,14
PISO DOS PINTURA DERECHA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,60	1,38
PISO DOS PINTURA DERECHA	SEDE FAMILIA	1	4,01		4,60	18,45
PISO DOS PINTURA DERECHA	SEDE FAMILIA	1	0,30		4,60	1,38
PISO DOS PINTURA DERECHA	SEDE FAMILIA	1	4,81		4,60	22,13
PISO DOS PINTURA DERECHA	SEDE FAMILIA	1	4,40		4,60	20,24
VENT-1 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	1	6,00		0,50	-3,00
VENT-1 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	1	2,40		0,50	-1,20
VENT-1 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	1	3,80		0,50	-1,90
VENT-1 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	1	0,70		1,80	-1,26
VENT-2 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	1	0,70		1,00	-0,70
VENT-2 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	6	0,30		2,00	-3,60
VENT-2 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	3	0,50		2,00	-3,00
VENT-2 PISO POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	2,50		0,50	-1,25
VENT-2 PISO POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	2,00		0,50	-1,00
VENT-2 PISO POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	4,00		0,50	-2,00
VENT-1 PISO POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	2,00		0,50	-1,00
VENT-1 PISO POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	2,50		0,50	-1,25
VENT-1 PISO POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	2,10		0,50	-1,05
PURTA POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	0,90		1,70	-1,53
VENTANA REJILLA POSTERIOR	SED.FAMILIA	1	5,20		0,25	-1,30
VENT-1 PISO IZQUIERDA	SED.FAMILIA	1	0,80		1,80	-1,44
VENT-1 PISO IZQUIERDA	SED.FAMILIA	3	0,30		1,80	-1,62
VENT-1 PISO IZQUIERDA	SED.FAMILIA	7	0,50		1,80	-6,30
VENT-2 PISO IZQUIERDA	SED.FAMILIA	1	6,00		0,50	-3,00
VENT-2 PISO IZQUIERDA	SED.FAMILIA	1	2,20		0,50	-1,10
VENT-2 PISO IZQUIERDA	SED.FAMILIA	1	3,60		0,50	-1,80







Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento alfajía metálica existente incluye desmonte y nivelación (pendiente)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 1,8	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de alfajía metálica cuyas medidas oscilan entre 70 a 200 cm de largo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 1,9	0	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 1,10	31,06	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
VENT-1 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	1	0,70		1,80	2,50
VENT-2 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	2	0,70		1,00	3,40
VENT-2 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	7	0,30		1,87	15,16
VENT-2 PISO DERECHA	SED.FAMILIA	4	0,50		2,00	10,00



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U

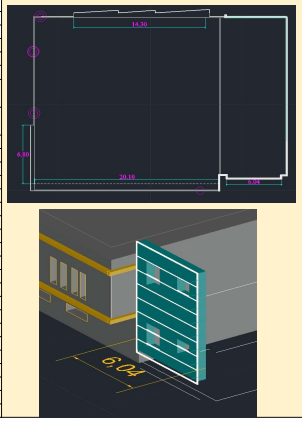ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 1,11	157,84	ML		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
FACHADA IZQ- DILATACION	SEDE FAMILIA	1		20,1		20,10
FACHADA DERECHA-DILATACION	SEDE FAMILIA	1		14,3		14,30
FACHADA DERECHA-DILATACION **HEA**	SEDE FAMILIA	6		3,9		23,40
FACHADA POSTERIOR-DILATACION **HEA**	SEDE FAMILIA	2		8,5		17,00
FACHADA POSTERIOR-DILATACION **HEA**	SEDE FAMILIA	2		4		8,00
FACHADA POSTERIOR SEGUNDO PISO	SEDE FAMILIA	1		6,8		6,80
FACHADA FLOTANTE IZQ.	SEDE FAMILIA	6		6,04		36,24
BAJANTE AGUAS LLUVIAS	SEDE FAMILIA	4		8		32,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, estructura, filos y pintura para exterior

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 1,12	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 2,1	14,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
RETIRO MANTO	TERRAZA		2	7		14,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 2,2	14,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
DEMOLICION	TERRAZA		2	7		14,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 2,3	14,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
DESTRONQUE			2	7		14,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 2,4	14,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MORTERO DE NIVELACION			2	7		14,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 2,5	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Perforación de muro en concreto 3"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 2,6	1	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PERFORACION		1				1,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada cal 16, pintura con base epoxica con acabado en esmalte.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 2,7	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de tubo cuadrado 50 mm x 50 mm x 2mm incluye ángulo conector para perfil estructural existente

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 2,8	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de soscos para canal en 3"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 2,9	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " pintada color fachada, incluye accesorios

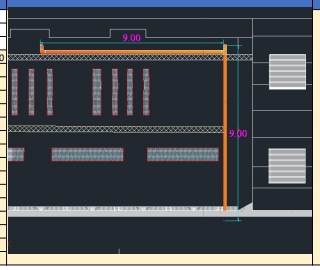ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 2,10	18,00	ML		

DISCRIMINACIÓN



elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
TUBO SANITARIO	FACHADA IZQ.	2		9		18,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado

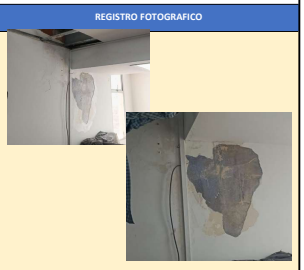ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,1	4,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
RASQUETEADA	SALA DE AUDIENCIA	1	2	2		4,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,2	0	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00




Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de estuco plástico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,3	13,50	M2		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ESTUCO PLASTICO	SALA DE AUDIENCIA		2,7	5		13,50


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)

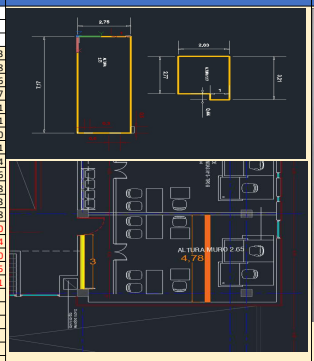ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,4	64,54	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MUROS BAÑOS	FAMILIA	1	2,76		1,17	3,23
MUROS BAÑOS	FAMILIA	1	2,63		1,17	3,08
MUROS BAÑOS	FAMILIA	1	3,21		1,17	3,76
MUROS BAÑOS	FAMILIA	1	1		1,17	1,17
MUROS BAÑOS	FAMILIA	1	0,44		1,17	0,51
MUROS BAÑOS	FAMILIA	1	1,63		1,17	1,91
MURO JUZGADO 4 PASILLO	FAMILIA	1	1,24		2,9	3,60
MURO JUZGADO 4 PASILLO	FAMILIA	1	0,66		2,9	1,91
MURO JUZGADO 4 INTERNO	FAMILIA	1	3		2,58	7,74
MUROS PASILLO	FAMILIA	1	3,45		3,67	12,66
SALA DE AUDIENCIA	FAMILIA	1	2,75		2,5	6,88
SALA DE AUDIENCIA	FAMILIA	1	7,17		2,5	17,93
SALA DE AUDIENCIA	FAMILIA	1	2,75		2,5	6,88
DESCUENTO	FAMILIA	1	-1		2,5	-2,50
DESCUENTO	FAMILIA	1	-0,5		1,28	-0,64
DESCUENTO	FAMILIA	1	-0,6		2,5	-1,50
DESCUENTO	FAMILIA	1	-0,3		2,5	-0,75
DESCUENTO JUZGA 4 VENTANA	FAMILIA	2	-0,73		0,9	-1,31

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura en esmalte

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,5	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1

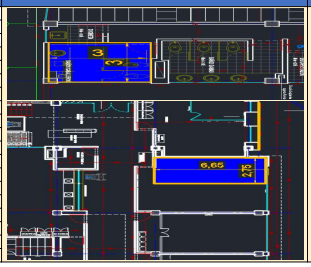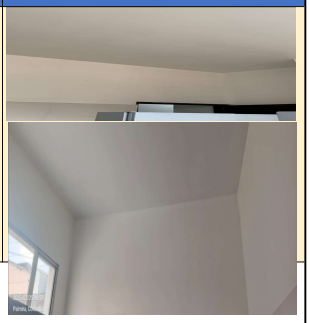ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,6	27,30	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
VINILO CIELO	BAÑO PRIMER PISO	1	3,00	3		9,00
VINILO CIELO	SEGUNDO PISO SALA AUD.	1	2,75	6,655		18,30

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,7	0	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,8	0	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de estuco plástico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,9	0	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,10	0	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura en esmalte

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,11	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00




Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Desmonte y retiro de cielo en panel yeso

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,12	18,00	M2	 	 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
RETIRO CIELO	BAÑO PISO 1	1	3	3		9,00
RETIRO CIELO	SALA DE AUDIENCIA	1	2	2		4,00
RETIRO CIELO	JUZGADO APERTURA DE VANO TECHO	2	1	2		5,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,13	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación cielo falso en panel yeso

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 3,14	9,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CIELO FALSO	BAÑO 1er PISO	1	3		3	9,00



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo

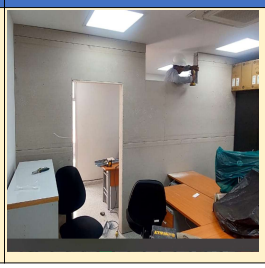ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,1	10,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MURO	JUZGADO 4		4		2,5	10,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de alma en madera de 88mm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,2	5,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MADERA VANO	JUZGADO 4	5				5,00



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,3	5,00	ML		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CARTERA	JUZGADO 4	5				5,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de guarda escoba en pvc

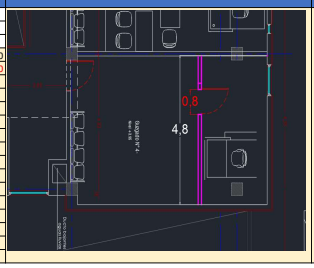ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,4	8,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
GUARDA ESCOBA	JUZGADO 4	2		4,8		9,60
DESCUENTO VANO PUERTA	SEDE FAMILIA	2		-0,8		-1,60

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
D. 5,5	1	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PUERTA	JUZGADO 4	1				1,00

PLANO DE CANTIDADES

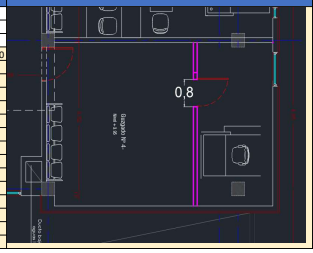

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
D. 5,6	16,00	ML


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CANALETA	JUZGADO 4					16,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
D. 5,7	7	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
TROQUEL	JUZGADO 4	7				7,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO




Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,8	190,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
UTP	JUZGADO 4					190,00



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,9	7	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
TOMA	JUZGADO 4	7				7,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,10	7	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
FACEPLATE	JUZGADO 4	7				7,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,11	7	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
SALIDA ELECTRICA	JUZGADO 4	7				7,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,12	8	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
SALIDA ELECTRICA	JUZGADO 4	8				8,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,13	0	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,14	0	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,15	82,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CABLE TRENZADO	JUZGADO 4					82,00



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,16	7	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PATCHCORD	RACK					7,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,17	9	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PATCHCORD 3M	JUZGADO 4 PUESTOS DE TRABAJO					7,00
PATCHCORD 3M	RACK					2,00


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,18	1	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
SWITCH	JUZGADO 4					1,00



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación)

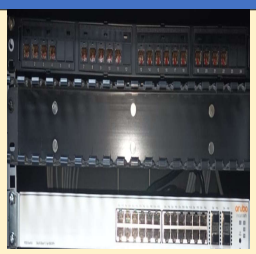ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 5,19	1	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PATCH PANEL						1,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores medida 120 cm x 100 cm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
D. 5,20	1	UND


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
VIDRIO Ttemplado	JUZGADO 4	1				1,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
D. 5,21	1,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MESON	JUZGADO 4	1				1

PLANO DE CANTIDADES

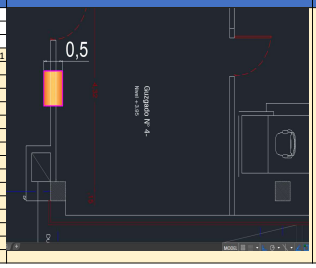

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de masilla fibra de vidrio

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 6,1	0	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Aseo general.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
D. 6,2	380,00	M2		 

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ASEO	JUZGADO 4		4,78	7,3		34,89
ASEO	PASILLO		3,65	1,51		5,51
ASEO	BAÑO PRIMER PISO		3	3		9,00
ASEO	PERIMETRO		3	105,5		316,59
ASEO	TERRAZA		7	2		14,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Sede de Familia de Palmira

DESCRIPCIÓN Corte de muro en concreto con pulidora

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 4,5	4,00	M2		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
APERTURA VANO	JUZGADO 4	2	2	1		4,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | Sede de Familia de Palmira


DESCRIPCIÓN | Demolición muro existente incluye retiro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 4,12	0,02	M3

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
APERTURA VANO	JUZGADO 4		1	1	0,02423	0,02

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | Sede de Familia de Palmira


DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
C. 4,4	16,00	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
POLIURETANO INCLUYE MEDIA CAÑA		1	2,286		7	16,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | Sede de Familia de Palmira


DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de placa de fibrocemento de 8mm incluye estructura

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
NP 10	358,00	ML


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO DOS	1		0,4		0,4
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO DOS	3		5,9		17,7
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO DOS	1		0,3		0,3
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO DOS	3		4,01		12,03
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO DOS	1		0,3		0,3
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO DOS	3		4,8		14,4
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO DOS	1		0,3		0,3
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO DOS	2		0,3		0,6
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO DOS	3		7,5		22,5
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO DOS	3		20,4		61,2
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO DOS	2		1,8		3,6
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO UNO	1		0,4		0,4
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO UNO	3		5,9		17,7
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO UNO	2		0,3		0,6
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO UNO	3		4,01		12,03
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO UNO	1		0,3		0,3
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO UNO	3		4,81		14,43
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO UNO	1		0,3		0,3
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO UNO	1		0,32		0,32
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO UNO	3		7,5		22,5
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO UNO	3		20,4		61,2
CARTERA FIBROCEMENTO	PISO UNO	3		1,8		5,4
CARTERA FIBROCEMENTO	HEA	3		3,9		11,7
CARTERA FIBROCEMENTO	HEA	1		8,5		8,5
CARTERA FIBROCEMENTO	HEA	1		4		4
CARTERA FIBROCEMENTO	FACHADA FLOTANTE	2		6		12
CARTERA FIBROCEMENTO	FACHADA FLOTANTE	2		8,29		16,59
CARTERA FIBROCEMENTO	CARTERAS VENTANAS	8		1,7		13,6
CARTERA FIBROCEMENTO	CARTERAS VENTANAS	8		1,2		9,6
CARTERA FIBROCEMENTO	CARTERAS TUBO SANITARIO	3		4,5		13,5

PLANO DE CANTIDADES

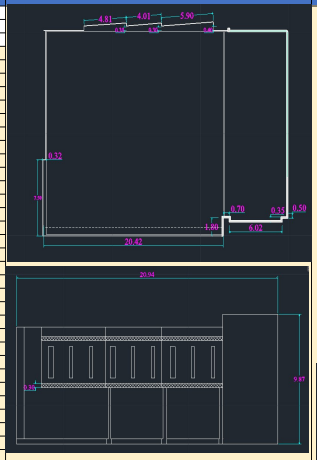

REGISTRO FOTOGRAFICO

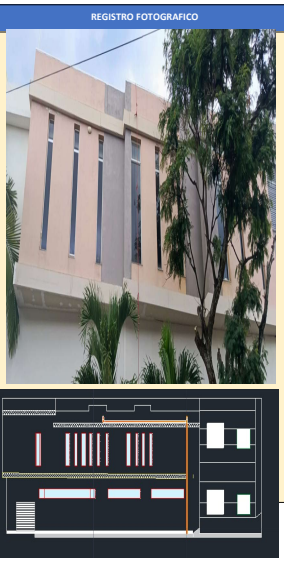

Vo Bo Director Obra

PALACIO NACIONAL BUENAVENTURA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN


Lavada de ventanas y rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado.


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 1,1	106,73	M2

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
REJA	PALACIO	16	1,6		2,38	60,1660
REJA	PALACIO	4	0,95		2,78	10,56
REJA	PALACIO	9	1,80		2,00	32,40
REJA	PALACIO	2	1,00		1,80	3,60

PLANO DE CANTIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | INMUEBLE | Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN


Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 120 cm 180cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 1,2	64	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Mantenimiento	VENTANAS 2 PISO	37				37
Mantenimiento	VENTANAS 3 PISO	19				19
Mantenimiento	VENTANAS 4 PISO	1				1
Mantenimiento	VENTANAS MEZANINE	7				7

PLANO DE CANTIDADES



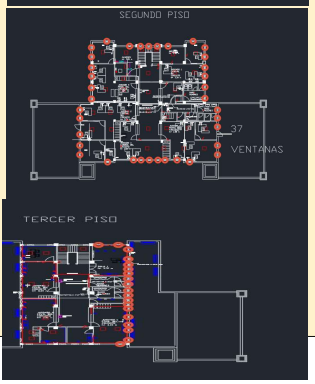

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | INMUEBLE | Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN


Mantenimiento de ventanas en aluminio con diseño que incluye celosías cuyas medidas son entre 70 -100 cm de ancho x 120 - 200 cmalto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 1,3	15	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Mantenimiento	VENTANAS 1er piso - Mezzanine	15				15

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 200 - 400 cmde ancho x 200 cm 400 cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 1,4	16	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Ventanas	Perimetro	16				16

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas son entre 80 -100 cm de ancho x 170 - 240 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 1,5	8	UND

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Puertas	balcones 2do piso lado izq	2				2
Puertas	balcones 2do piso lado der	2				2
Puertas	balcones 3er piso lado izq	2				2
Puertas	balcones 3er piso lado izq	2				2

PLANO DE CANTIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y aplicación de pintura en esmalte (2 capas) en rejas existentes

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 1,6	1,64	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ANTICORROSIVO	PERGOLA	1	0,5	3,27		1,64

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas es 300 cm de ancho x 600 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 1,7	0	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 200 cm 260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería

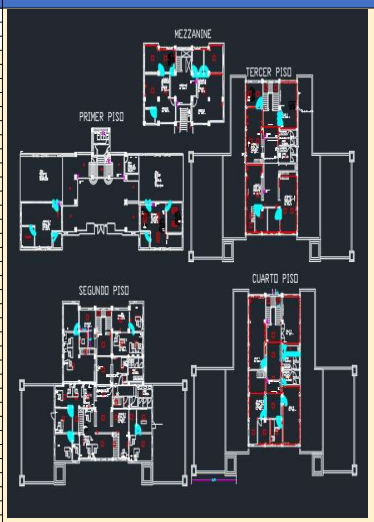ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 2,1	23	UND		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Mantenimiento puertas	PISO 4 SALA 1	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 4 BAÑO HOMBRES	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 4 BAÑO MUJERES	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 4 JUZGADO 2 PENAL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 4 JUEZ 2 PENAL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 3 JUZGADO 1 CIVIL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 3 JUEZ 1 CIVIL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 3 JUZGADO 2 CIVIL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 3 JUEZ 2 CIVIL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 3 JUZGADO 3 CIVIL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 3 BAÑO HOMBRES	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 3 BAÑO MUJERES	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 3 COCINA	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 2 BAÑO MUJERES	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 2 BAÑO HOMBRES	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 2 COCINA	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 2 JUZGADO 1 LABORAL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 2 JUZGADO 1 PENAL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 2 PATIO	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 2 JUZGADO 3 LABORAL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 2 JUZGADO 2 LABORAL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 2 JUZGADO 3 PENAL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	BAÑO MEZZANIN	1	1,0		2,00	1,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, diseño con celosía cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -240 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 2,2	1	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
SALA 2	SALA 2 PISO 4	1	1,00		2,40	1,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, cuyas medidas son entre 100 a 140 cm de ancho x 200 -260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 2,3	2	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MANTENIMIENTO	PISO 2	1	1,00		2,40	1,00
SALA 1	PISO 3	1	1,00		2,40	1,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, con diseño que incluye vidrio cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 2,4	12	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Mantenimiento puertas	PISO 4 JUEZ JUZGADO 2 PENAL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 4 CCTV	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 3 JUEZ JUZGADO 1 CIVIL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 3 JUEZ 2 CIRCUITO	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 3 JUEZ 1 CIVIL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 3 JUEZ 2 CIVIL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 3 JUEZ 3 CIVIL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 2 JUEZ 1 PENAL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 2 JUEZ 1 LABORAL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 2 JUEZ 2 LABORAL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	PISO 2 JUEZ 3 PENAL	1	1,00		2,00	1,00
Mantenimiento puertas	MEZZANINE JUEZ FAMILIA 2	1	1,00		2,00	1,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de ventanas en madera con diseño que incluye vidrio, cuyas medidas son entre 70 - 170 cm de ancho x 100 cm 180 cm alto, incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 2,5	12	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Mant ventanas en madera	PISO 4 JUEZJUZGADO 2 PENAL	1				1
Mant ventanas en madera	PISO 3 JUEZ JUZGADO 1 CIVIL	1				1
Mant ventanas en madera	PISO 3 JUZGADO 3 CIVIL	2				2
Mant ventanas en madera	PISO 3 JUEZ 2 CIRCUITO	1				1
Mant ventanas en madera	PISO 2 JUEZ 1 LABORAL	1				1
Mant ventanas en madera	PISO 2 JUZGADO 1 PENAL	1				1
Mant ventanas en madera	PISO 2 JUEZ 3 LABORAL	1				1
Mant ventanas en madera	PISO 2 JUEZ 2 LABORAL	1				1
Mant ventanas en madera	PISO 2 JUEZ 3 PENAL	1				1
Mant ventanas en madera	PISO 1 OF. DE APOYO	1				1
Mant ventanas en madera	PISO 2 OF DE APOYO	1				1

PLANO DE CANTIDADES

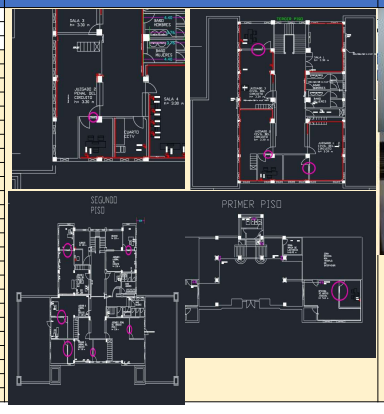

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Desmonte de puertas en madera (se refiere a las que no se reinstalaran)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 2,6	28,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Desmonte	PISO 4 SALA 1	1	1		2	1
Desmonte	PISO 4 BAÑO HOMBRES	1	1		2	1
Desmonte	PISO 4 BAÑO HOMBRES	1	1		2	1
Desmonte	PISO 4 JUZGADO 2 PENAL	1	1		2	1
Desmonte	PISO 4 JUEZ 2 PENAL	1	1		2	1
Desmonte	PISO 3 JUZGADO 1 CIVIL	1	1		2	1
Desmonte	PISO 3 JUEZ 1 CIVIL	1	1		2	1
Desmonte	PISO 3 JUZGADO 2 CIVIL	1	1		2	1
Desmonte	PISO 3 JUEZ 2 CIVIL	1	1		2	1
Desmonte	PISO 3 JUZGADO 3 CIVIL	1	1		2	1
Desmonte	PISO 3 BAÑO HOMBRES	1	1		2	1
Desmonte	PISO 3 BAÑO MUJERES	1	1		2	1
Desmonte	PISO 3 COCINA	1	1		2	1
Desmonte	PISO 2 BAÑO MUJERES	1	1		2	1
Desmonte	PISO 2 BAÑO HOMBRES	1	1		2	1
Desmonte	PISO 2 COCINA	1	1		2	1
Desmonte	PISO 2 JUZGADO 1 LABORAL	1	1		2	1
Desmonte	PISO 2 JUZGADO 1 PENAL	1	1		2	1
Desmonte	PISO 2 PATIO	1	1		2	1
Desmonte	PISO 2 JUZGADO 3 LABORAL	1	1		2	1
Desmonte	PISO 2 JUZGADO2 LABORAL	1	1		2	1
Desmonte	PISO 2 JUZGADO 3 PENAL	1	1		2	1
Desmonte	MEZZANIN BAÑO HOMBRES	1	1		2	1
Desmonte	MEZZANIN BAÑO MUJERES	1	1		2	1
Desmonte	MEZZANIN JUZGADO 1 FAMILIA	1	1		2	1
Desmonte	MEZZANIN JUZGADO 2 FAMILIA	1	1		2	1
Desmonte	PISO 1 OFICINA DE APOYO	1	1		2	1
Desmonte	PISO 1 BAÑO	1	1		2	1

PLANO DE CANTIDADES

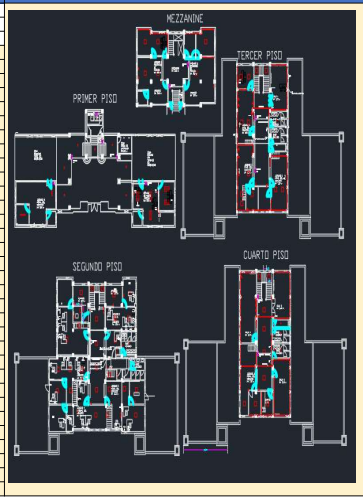

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo.Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 2,7	28,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Puertas	PISO 4 SALA 1	1	1		2	1
Puertas	PISO 4 BAÑO HOMBRES	1	1		2	1
Puertas	PISO 4 BAÑO HOMBRES	1	1		2	1
Puertas	PISO 4 JUZGADO 2 PENAL	1	1		2	1
Puertas	PISO 4 JUEZ 2 PENAL	1	1		2	1
Puertas	PISO 3 JUZGADO 1 CIVIL	1	1		2	1
Puertas	PISO 3 JUEZ 1 CIVIL	1	1		2	1
Puertas	PISO 3 JUZGADO 2 CIVIL	1	1		2	1
Puertas	PISO 3 JUEZ 2 CIVIL	1	1		2	1
Puertas	PISO 3 JUZGADO 3 CIVIL	1	1		2	1
Puertas	PISO 3 BAÑO HOMBRES	1	1		2	1
Puertas	PISO 3 BAÑO MUJERES	1	1		2	1
Puertas	PISO 3 COCINA	1	1		2	1
Puertas	PISO 2 BAÑO MUJERES	1	1		2	1
Puertas	PISO 2 BAÑO HOMBRES	1	1		2	1
Puertas	PISO 2 COCINA	1	1		2	1
Puertas	PISO 2 JUZGADO 1 LABORAL	1	1		2	1
Puertas	PISO 2 JUZGADO 1 PENAL	1	1		2	1
Puertas	PISO 2 PATIO	1	1		2	1
Puertas	PISO 2 JUZGADO 3 LABORAL	1	1		2	1
Puertas	PISO 2 JUZGADO2 LABORAL	1	1		2	1
Puertas	PISO 2 JUZGADO 3 PENAL	1	1		2	1
Puertas	MEZZANIN BAÑO HOMBRES	1	1		2	1
Puertas	MEZZANIN BAÑO MUJERES	1	1		2	1
Puertas	MEZZANIN JUZGADO 1 FAMILIA	1	1		2	1
Puertas	MEZZANIN JUZGADO 2 FAMILIA	1	1		2	1
Puertas	PISO 1 OFICINA DE APOYO	1	1		2	1
Puertas	PISO 1 BAÑO	1	1		2	1

PLANO DE CANTIDADES

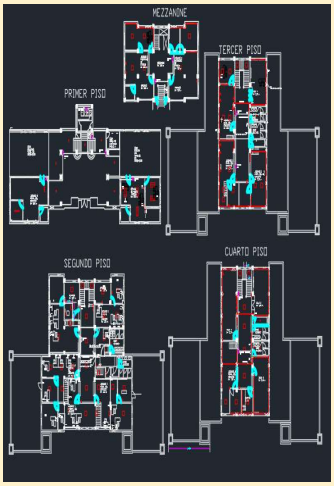

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo.Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 3,1	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 3,2	30,72	M2		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Cementoso	piso 2 pasillos			3,6	2,9	10,44
Cementoso	escaleras mezzanine a 2do piso			3,00	1,30	3,9
Cementoso	escaleras mezzanine a 2do piso			3,7	2,4	8,85
Cementoso	escaleras mezzanine a 2do piso			2,8	1,3	3,64
	escaleras mezzanine a 2do piso			2,50	2,90	7,25
	ventanas	3		-0,80	1,40	-3,36


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de estuco plástico

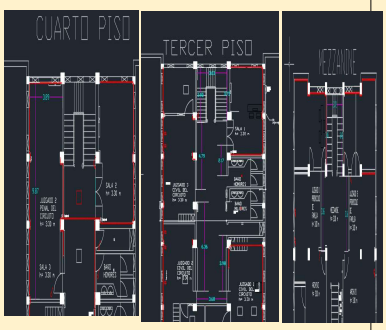ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 3,3	170,46	M2	 	

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
estuco	zonas comunes 2 piso	1		3,5	2,90	10,15
estuco	zonas comunes 2 piso	1		3,1	4,36	13,53
estuco	zonas comunes 2 piso	1		3,2	2,20	7,04
estuco	zonas comunes 2 piso	1		4,06	1,10	4,47
estuco	zonas comunes 2 piso	1		2,53	1,10	2,78
estuco	zonas comunes 2 piso	1		4,17	1,10	4,59
estuco	zonas comunes 2 piso	1		4,17	1,80	7,51
estuco	zonas comunes 2 piso	1		2,39	2,00	4,78
estuco	zonas comunes 3 piso	1		3,63	2,15	7,80
estuco	zonas comunes 3 piso	1		3,75	2,15	8,06
estuco	zonas comunes 3 piso	1		2,17	2,15	4,67
estuco	zonas comunes 3 piso	1		3,98	1,20	4,78
estuco	zonas comunes 3 piso	1		3,68	1,20	4,42
estuco	zonas comunes 3 piso	1		6,36	1,20	7,63
estuco	zonas comunes 3 piso	1		4,79	2,50	11,98
estuco	zonas comunes mezzanine	1		3,46	2,20	7,61
estuco	zonas comunes mezzanine	1		3,72	2,20	8,18
estuco	zonas comunes mezzanine	1		3,42	2,20	7,52
estuco	zonas comunes mezzanine	2		3,16	2,20	13,90
estuco	juzgado	1		9,87	2,62	25,83
estuco	juzgado	1		3,89	3,30	12,84
descuento	ventanas	10		-0,8	1,2	-9,6

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 3,4	170,36	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
estuco	zonas comunes 2 piso	1		3,5	2,90	10,15
estuco	zonas comunes 2 piso	1		3,1	4,36	13,53
estuco	zonas comunes 2 piso	1		3,2	2,20	7,04
estuco	zonas comunes 2 piso	1		4,06	1,10	4,47
estuco	zonas comunes 2 piso	1		2,53	1,10	2,78
estuco	zonas comunes 2 piso	1		4,17	1,10	4,59
estuco	zonas comunes 2 piso	1		4,17	1,80	7,51
estuco	zonas comunes 2 piso	1		2,39	2,00	4,78
estuco	zonas comunes 3 piso	1		3,63	2,15	7,80
estuco	zonas comunes 3 piso	1		3,75	2,15	8,06
estuco	zonas comunes 3 piso	1		2,17	2,15	4,67
estuco	zonas comunes 3 piso	1		3,98	1,20	4,78
estuco	zonas comunes 3 piso	1		3,68	1,20	4,42
estuco	zonas comunes 3 piso	1		6,36	1,20	7,63
estuco	zonas comunes 3 piso	1		4,79	2,50	11,98
estuco	zonas comunes mezzanine	1		3,46	2,20	7,61
estuco	zonas comunes mezzanine	1		3,72	2,20	8,18
estuco	zonas comunes mezzanine	1		3,42	2,20	7,52
estuco	zonas comunes mezzanine	2		3,16	2,20	13,90
estuco	juzgado	1		9,87	2,61	25,72
estuco	juzgado	1		3,89	3,30	12,84
descuento	ventanas	10		-0,8	1,2	-9,6

PLANO DE CANTIDADES

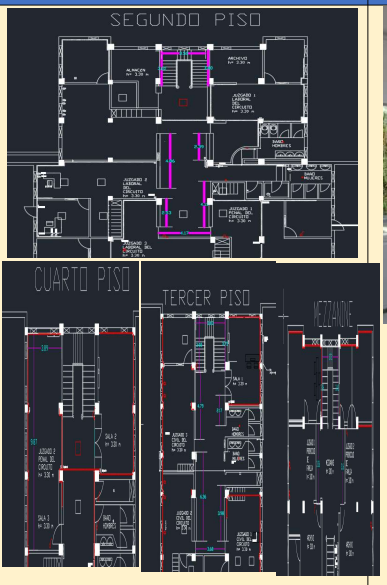

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura en esmalte

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 3,5	0,00	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 3,6	0,00	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 3,7	100,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
RASQUETEO	perimetro ventanas	5		5		25
RASQUETEO	perimetro ventanas	5		5		25
RASQUETEO	perimetro ventanas	5		5		25
RASQUETEO	perimetro ventanas	5		5		25

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 3,8	100,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CEMENTOSO	perimetro ventanas	5		5		25
CEMENTOSO	perimetro ventanas	5		5		25
CEMENTOSO	perimetro ventanas	5		5		25
CEMENTOSO	perimetro ventanas	5		5		25

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de estuco plástico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 3,9	100,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ESTUCO PUNTO FIJO	perimetro ventanas	5		5		25
ESTUCO PUNTO FIJO	perimetro ventanas	5		5		25
ESTUCO PUNTO FIJO	perimetro ventanas	5		5		25
ESTUCO PUNTO FIJO	perimetro ventanas	5		5		25

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 3,10	100,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
VINILO	perimetro ventanas	5		5		25
VINILO	perimetro ventanas	5		5		25
VINILO	perimetro ventanas	5		5		25
VINILO	perimetro ventanas	5		5		25

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura en esmalte

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 3,11	0,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Mantenimiento de cajas de inspección existentes, incluye limpieza, reparación de pañetes y tapa de concreto

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 4,1	0	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y fabricación de caja de aguas negras (100 cm x 100 cm) incluye tapa divida en 2

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 4,2	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Excavación de tierra a mano para tubería de 6"

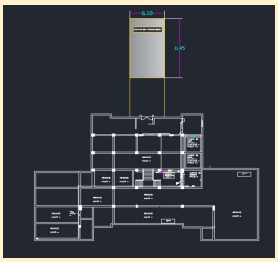ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 4,3	20,95	M3		  

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Excavacion para recebo	Parqueadero		6,1	11,4	0,3	20,95

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de ladrillo sucio

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 4,4	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Corte de muro en concreto con pulidora

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 4,5	16,00	ML


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Corte muro	baño piso 2	1		3,6		3,6
Corte muro	baño piso 3	1		3,6		3,6
Corte muro	baño piso 4	2		3,6		7,2
Corte muro	para pasar tubería sanitaria cuarto de bombas	1		1,6		1,6

PLANO DE CANTIDADES

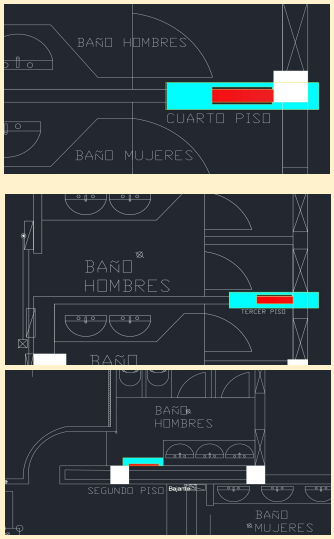

REGISTRO FOTOGRAFICO

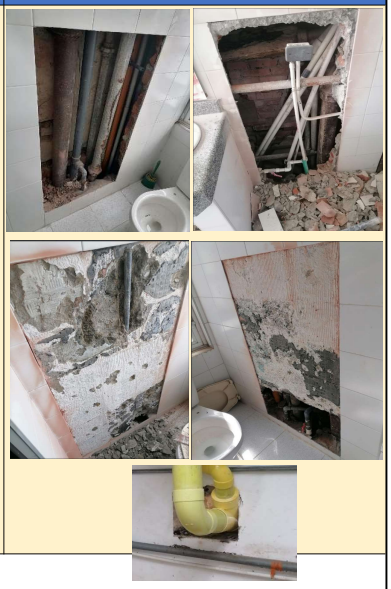

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Perforación de piso en concreto 6"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 4,6	0,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Retiro de tubería PVC existente de 2" a 6"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 4,7	0,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Retiro de tubería galvanizada

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 4,8	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación tubería PVC de 4" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 4,9	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación tubería en PVC de 1 1/2" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 4,10	0	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación tapa de inspección en aluminio de 60 cm x 120 cm, tipo celosía, incluye marco y pasador

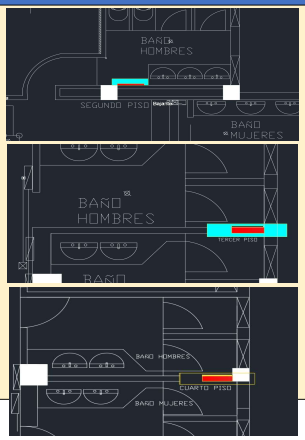ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 4,11	3,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Tapa	Baño 2do iso	1				1
Tapa	Baño 3er piso	1				1
Tapa	Baño 4to piso	1				1,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Demolición muro existente incluye retiro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 4,12	0,00	M3		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 4,13	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación tubería en PVC de 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 4,14	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y fabricación de tapa en concreto para caja de aguas negras (100 cm x 50 cm) incluye marco metálico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 4,15	4,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Tapa en concreto	Parqueadero posterior	4				4,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Corte de losa en concreto con pulidora incluye retiro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 4,16	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de tubería novafort de 6"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 4,17	12,00	ML


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Tuberia novafort	cañuela borden anden jardin posterior	12				12

PLANO DE CANTIDADES

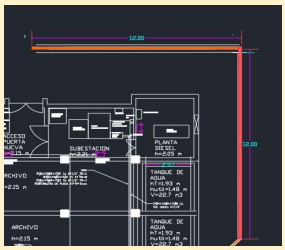

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de yee de 4" con tapón de inspección

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 4,18	0,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Aseo general.


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 5,2	250,80	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ASEO	PERIMETRO PALACIO		5,88	19,80		116,45
ASEO	PERIMETRO PALACIO		6,54	9,21		60,23
ASEO	BALCON		3,40	21,8		74,12

PLANO DE CANTIDADES

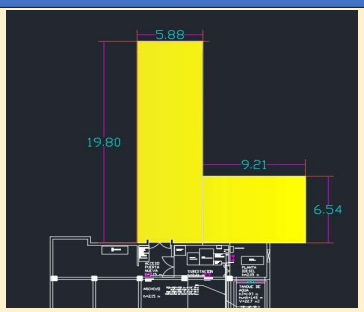

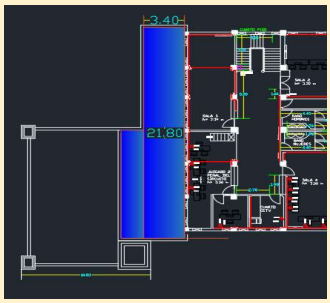

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de tubería de PVC 1" pintada color fachada


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 5,3	120,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Tubería	Perimetro	120		1		120,00


PLANO DE CANTIDADES



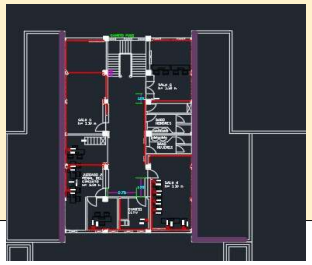


REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Instalación de pasamanos en acero (existente) incluye elementos de fijación como varilla 1/4", abrazadera. (12 mt de largo)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 5,4	1	UND


DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Pasamanos	Fachada principal palacio	1				1

PLANO DE CANTIDADES

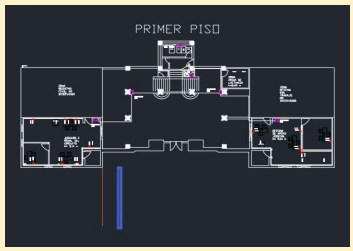

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
E. 6,1	0,0	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de alma en madera de 88mm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 6,2	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 6,3	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de guarda escoba en pvc

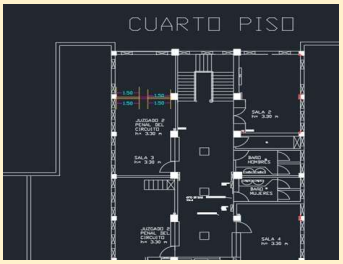ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 6,4	6,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Guardaescoba en pvc	juzgado 2 penal civil especializado	6				6,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 6,5	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,8	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas)

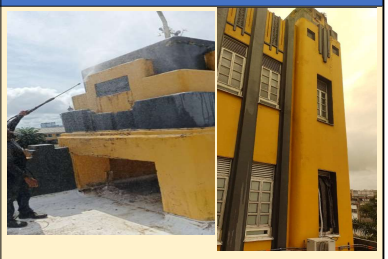ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 1,2	442,30	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Lavada	Cupula fachada posterior	8	2,95		2	47,20
	Cupula fachada frontal	8	2,95		2	47,20
	4 piso terraza	2	21		8,28	347,90

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Demolicion con demoledor debloques en concreto para pase de tuberia de 6"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
NP 11	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de malla electrosoldada 6mm -15x15

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
NP 12	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Placa maciza concreto espesor 0.20 de 3000 PSI

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
NP 13	0,00	M3		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio Nacional de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Demolición placa parqueadero

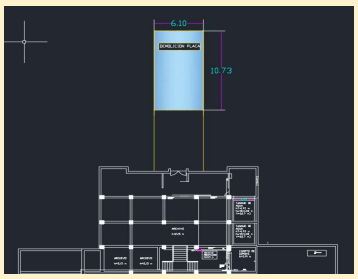ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
NP 14	65,42	M2		  

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Demolición	Parqueadero		6,1	10,7		65,42

Vo Bo Director Obra

TRANSFERENCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 1,1	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas)

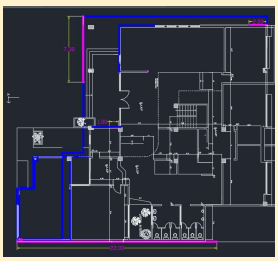ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 1,2	92,36	M2		   

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
LAVADA	lateral izquierda	1		2,00	6,40	12,80
LAVADA	Frente volado con canal (voladizo)	1		7,30	1,34	9,76
LAVADA	frente derecho 1	1		1,00	6,00	6,00
LAVADA	fachada lateral derecha	1		22,00	2,90	63,80


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado

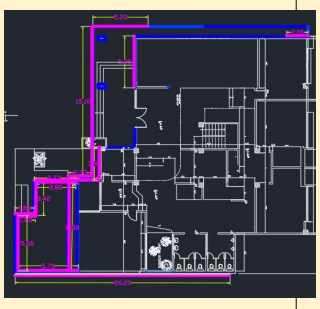ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 1,3	203,36	M2		 

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Rasqueteada	lateral izquierda	1		2,00	6,40	12,80
Rasqueteada	volado laterl izquierda	1		5,20	2,00	10,40
Rasqueteada	frente 1	1		5,25	2,00	10,50
Rasqueteada	frente volado con canal	1		15,10	1,70	25,68
Rasqueteada	frente volado con canal	1		2,33	1,70	3,96
Rasqueteada	frente 2	1		3,40	6,40	21,76
Rasqueteada	frente derecho 1	1		2,43	6,40	15,55
Rasqueteada	lateral dereca 1	1		3,73	4,40	16,41
Rasqueteada	lateral dereca 2	1		1,80	4,40	7,92
Rasqueteada	terraza piso 2 muro interior	1		8,80	0,33	2,89
Rasqueteada	terraza piso 2 muro interior	1		3,80	1,00	3,80
Rasqueteada	terraza piso 2 muro interior	1		3,42	1,00	3,42
Rasqueteada	terraza piso 2 muro interior	1		1,80	1,00	1,80
Rasqueteada	terraza piso 2 muro interior	1		5,60	1,00	5,60
Rasqueteada	terraza piso 2 muro interior	1		5,70	1,80	10,26
Rasqueteada	fachada lateral derecha	1		20,20	3,00	60,60
	ventana	5		1,6	1,0	-8
	puerta	1		2	1,0	-2

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 1,4	229,894	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Cementoso	columnas	2		2,00	2,00	8,00
Cementoso	frente	1		5,25	3,00	15,75
Cementoso	frente	1		3,40	6,40	21,76
Cementoso	frente	1		3,40	6,40	21,76
Cementoso	frente volado con canal	1		9,6	2	19,20
Cementoso	frente volado con canal	1		15,10	2,00	30,20
Cementoso	frente volado con canal	1		2,33	2,00	4,66
Cementoso	frente derecho 1	1		2,43	6,40	15,55
Cementoso	lateral dereca 1	1		3,73	4,40	16,41
Cementoso	frente derecho 2	1		3,42	4,40	15,05
Cementoso	frente derecho 3	1		5,97	4,40	26,27
Cementoso	lateral dereca 2	1		1,80	4,40	7,92
Cementoso	terraza piso 2 muro interior	1		8,80	1,42	12,48
Cementoso	terraza piso 2 muro interior	1		3,80	1,00	3,80
Cementoso	terraza piso 2 muro interior	1		3,42	1,00	3,42
Cementoso	terraza piso 2 muro interior	1		1,80	1,00	1,80
Cementoso	terraza piso 2 muro interior	1		5,60	1,00	5,60
Cementoso	terraza piso 2 muro interior	1		5,70	1,80	10,26
Cementoso	ventana	5		1,6	1,0	-8
	puerta	1		2	1,0	-2

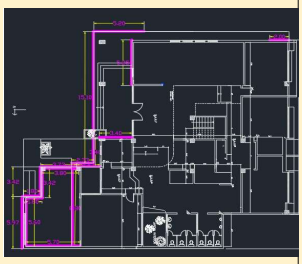





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 1,5	448,36	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Sellador	lateral izquierda	1		16,30	6,40	104,32
Sellador	volado laterl izquierda	1		20,00	1,50	30,00
Sellador	columnas	4		0,60	6,40	15,36
Sellador	columnas	4		0,40	6,40	10,24
Sellador	fachada principal	1		5,25	6,40	33,60
Sellador	frente volado con canal	1		15,10	1,95	29,45
Sellador	frente volado con canal	1		1,30	1,95	2,54
Sellador	frente volado con canal	1		9,60	1,95	18,72
Sellador	frente derecho 1	1		3,50	6,40	22,40
Sellador	frente derecho 1	1		3,40	6,40	21,76
Sellador	frente derecho 1	1		3,04	6,40	19,46
Sellador	lateral derecha 1	1		4,70	4,40	20,66
Sellador	frente 2	1		3,43	4,55	15,61
Sellador	frente 2	1		1,80	4,55	8,19
Sellador	frente 2	1		5,97	4,55	27,16
Sellador	fachada lateral derecha	1		22,00	2,90	63,80
Sellador	terraza piso 2	1		8,80	2,30	20,24
Sellador	terraza piso 2	1		3,80	1,00	3,80
Sellador	terraza piso 2	1		3,00	1,00	3,00
Sellador	terraza piso 2	1		1,80	1,00	1,80
Sellador	terraza piso 2	1		5,00	1,00	5,00
Sellador	tapa derecha	1		5,70	1,80	10,26
	vetanas	8		1,6	1,0	-12,80
	vetanas	4		1,6	1,0	-6,40
	ventana	4		1,6	1,0	-6,40
	ventana	4		1,6	1,0	-6,40
	ventana	1		2	2,5	-5,00
	puerta	1		2	1,0	-2,00

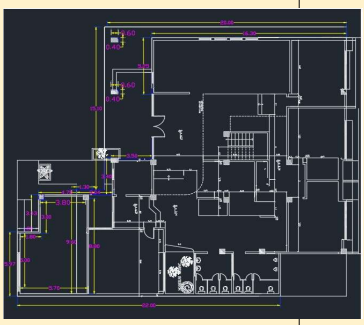



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura


DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
F. 1,6	310,44	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Pintura acrilica	volado lateral izquierda	1		20,00	1,50	30,00
Pintura acrilica	columnas	4		0,60	6,40	15,36
Pintura acrilica	columnas	4		0,40	6,40	10,24
Pintura acrilica	frente volado con canal	1		15,10	1,95	29,45
Pintura acrilica	frente volado con canal	1		1,30	1,95	2,54
Pintura acrilica	frente volado con canal	1		9,60	1,95	18,72
Pintura acrilica	frente derecho 1	1		3,50	6,40	22,40
Pintura acrilica	frente derecho 1	1		3,40	6,40	21,76
Pintura acrilica	frente derecho 1	1		3,04	6,40	19,46
Pintura acrilica	lateral derecha 1	1		4,70	4,40	20,66
Pintura acrilica	frente 2	1		3,43	4,55	15,61
Pintura acrilica	frente 2	1		1,80	4,55	8,19
Pintura acrilica	frente 2	1		5,97	4,55	27,16
Pintura acrilica	fachada lateral derecha	1		22,00	2,90	63,80
Pintura acrilica	terraza piso 2	1		8,80	2,30	20,24
Pintura acrilica	terraza piso 2	1		3,80	1,00	3,80
Pintura acrilica	terraza piso 2	1		3,00	1,00	3,00
Pintura acrilica	terraza piso 2	1		1,80	1,00	1,80
Pintura acrilica	terraza piso 2	1		5,00	1,00	5,00
Pintura acrilica	tapa derecha	1		5,70	1,80	10,26
	vetanas	8		1,6	1,0	-12,80
	vetanas	4		1,6	1,0	-6,40
	ventana	4		1,6	1,0	-6,40
	ventana	4		1,6	1,0	-6,40
	ventana	1		2	2,5	-5,00
	puerta	1		2	1,0	-2,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura


DESCRIPCIÓN: Desmonte de puertas en madera incluye hoja y marco metálico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
F. 2,1	5,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
DESMONTE PUERTA	TRANSFERENCIA	5				5

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de puertas de una nave en madera , cuyas medidas son entre 70 a 90 cm de ancho x 180 -220 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
F. 2,2	0,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de puerta de una nave de madera, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras, herrajes y cerradura.

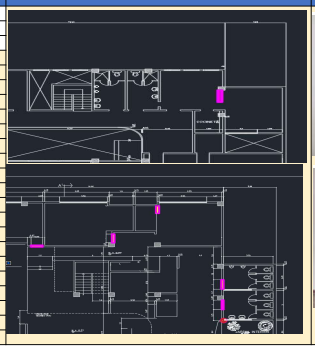ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 2,3	6	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Puerta	Transferencia	6				6

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de marco metálico para puerta en madera de medidas entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 2,4	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 2,5	3,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Chapa	Transferencia	3				3,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,1	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,2	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de estuco plástico


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,3	39,10	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ESTUCO	JUZGADO CON ARCHIVO	1		1,80	2,30	4,14
ESTUCO	JUZGADO CON ARCHIVO	1		3,59	1,20	4,31
ESTUCO	JUZGADO CON ARCHIVO	1		4,35	2,70	11,75
ESTUCO	JUZGADO CON ARCHIVO	1		4,61	2,70	12,45
ESTUCO	JUZGADO CON ARCHIVO	2		1,28	0,62	1,59
ESTUCO	MURO JUZGADO CON ARCHIVO	1		1,50	1,14	1,71
ESTUCO	ARCHIVO LUGAR BAJO CANAL	1		1,00	1,20	1,20
ESTUCO	MOCHETAS VENTANAS	2		1,00	0,98	1,96







Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
F. 3,4	35,94	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
VINILO	JUZGADO CON ARCHIVO	1		1,80	2,30	4,14
VINILO	JUZGADO CON ARCHIVO	1		3,59	1,20	4,31
VINILO	JUZGADO CON ARCHIVO	1		4,35	2,70	11,75
VINILO	JUZGADO CON ARCHIVO	1		4,61	2,70	12,45
VINILO	JUZGADO CON ARCHIVO	2		1,28	0,62	1,59
VINILO	JUZGADO CON ARCHIVO	1		1,50	1,14	1,71

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



35,94

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | INMUEBLE | Edificio de Transferencia de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura en esmalte

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
F. 3,5	68,55	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ESMALTE EN MUROS	PERIMETRO AREAS COMUNES	1		5,4	1,1	5,94
ESMALTE EN MUROS	PERIMETRO AREAS COMUNES	1		3,8	1,1	4,18
ESMALTE EN MUROS	PERIMETRO AREAS COMUNES	1		11,27	1,1	12,40
ESMALTE EN MUROS	PERIMETRO AREAS COMUNES	1		5,05	1,1	5,56
ESMALTE EN MUROS	PERIMETRO AREAS COMUNES	1		6,10	1,1	6,71
ESMALTE EN MUROS	PERIMETRO AREAS COMUNES	1		10,15	1,1	11,17
ESMALTE EN MUROS	PERIMETRO AREAS COMUNES	1		1,53	1,1	1,68
ESMALTE EN MUROS	PERIMETRO AREAS COMUNES	1		3,68	1,1	4,05
ESMALTE EN MUROS	PERIMETRO AREAS COMUNES	1		9,81	1,1	10,79
ESMALTE EN MUROS	PERIMETRO AREAS COMUNES	1		10,58	1,1	11,64
DESCUENTO PUERTAS	PERIMETRO AREAS COMUNES	7		-0,72	1,1	-5,55

PLANO DE CANTIDADES

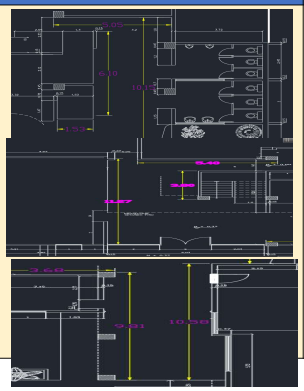

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | INMUEBLE | Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
F. 3,6	0,00	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado

ITEM	CANTIDAD TOTAL		PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,7	66,50	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
rasqueteada	Perimetro	1		20,20		20,20
rasqueteada	Perimetro	1		15,10		15,10
rasqueteada	Perimetro	1		2,32		2,32
rasqueteada	Perimetro	1		9,6		9,60
rasqueteada	Perimetro	5		3,86		19,28





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,8	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de estuco plástico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,9	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,10	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura en esmalte

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,11	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Lavada de cubierta con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y debe realizarse con belt manlift)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 4,1	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
F. 4,2	60,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
cinta foil	canaleta	1		60		60,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura


DESCRIPCIÓN: Aseo general.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
F. 4,5	326,53	M2


DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
aseo	canal 2do piso costado posterior	1	1,0	6,3		6,30
aseo	canal 1er piso costado posterior	1	1,0	18,2		18,20
aseo	canal fachada frontal	1	1,0	15,2		15,20
aseo	canal fachada frontal	1	1,0	9,3		9,30
aseo	cubierta	1	10,0	24,5		246,03
aseo	cubierta	1	6,3	5,0		31,50

PLANO DE CANTIDADES

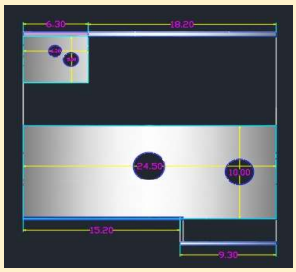

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: retiro de rejilla sifón (incluye demolición y retiro)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
F. 4,6	0,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de sifón de 3"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 4,7	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de enchape antideslizante

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 3,4	7,80	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
enchape	cuarto bomba	1	1,20	6,5		7,8


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de tubería de PVC 1" pintada color fachada

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
E. 5,3	8,00	M2		 

DISCRIMINACIÓN

TUBERIA 1"	fachada forntal	1		4		4,00
TUBERIA 1"	patio	1		4		4,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,4	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,5	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 2,6	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de ángulo en aluminio anoloc de 1/2, (gotero en ventana)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 1,6	48,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ANGULO	GOTERO PERIMETRO	20,2				20,2
ANGULO	GOTERO PERIMETRO	15,5				15,5
ANGULO	GOTERO PERIMETRO	2,7				2,7
ANGULO	GOTERO PERIMETRO	9,6				9,6

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 4,4	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de malla electrosoldada 6mm -15x15

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
NP 12	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura
DESCRIPCIÓN	Placa maciza concreto espesor 0.20 de 3000 PSI		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
NP 13	0,00	M3		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de impermeabilizante para teja canaleta		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
NP 15	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura
DESCRIPCIÓN	Arreglo de bajante de 4" dentro de muro, incluye demolición, suministro de tubería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
NP 16	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura
DESCRIPCIÓN	Limpieza de canal fachada principal y posterior		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
NP 17	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

PALACIO JUSTICIA TULUA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Tuluá


DESCRIPCIÓN: mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
J. 1,1	587,00	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CUBIERTA MANTENIMIENTO	CUBIERTA		13,5	30		405
CUBIERTA MANTENIMIENTO	CUBIERTA		13	14		182

PLANO DE CANTIDADES

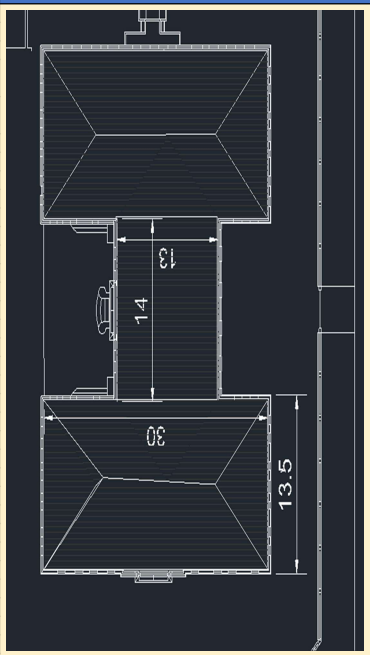

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Tuluá

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de teja de barro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
J. 1,2	0,00	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

PLANO DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Tuluá

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
J. 1,3	0,00	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Tuluá

DESCRIPCIÓN Aseo general.

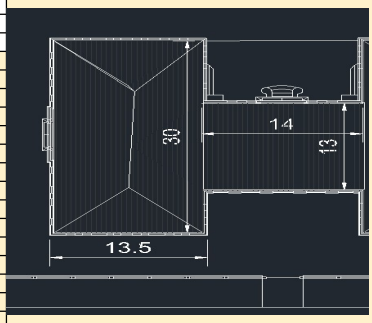ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
J. 1,4	587,00	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ASEO GENERAL	CUBIERTA		13,5	30		405
ASEO GENERAL	CUBIERTA		13	14		182

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Tuluá

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de estructura o perfiles metálicos 50mm x 50mm x 3mm

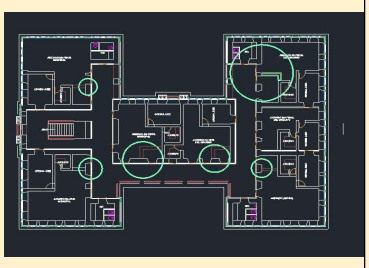ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
A. 8,4	119,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
angulo ductos	juzgados	119		1		119


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Tuluá

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)

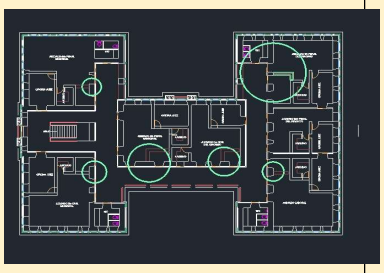ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
G. 2,11	204,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
pintura ductos	juzgados	2		102		204


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.

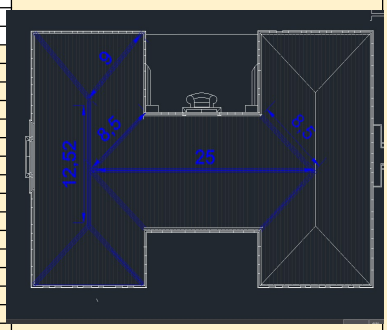ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
C. 4,4	12,22	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Limatesas	Cubierta	1	0,14	12,52		1,69
Limatesas	Cubierta	4	0,14	9		4,86
Limatesas	Cubierta	1	0,14	25		3,375
Limatesas	Cubierta	2	0,14	8,5		2,295

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Tuluá


DESCRIPCIÓN Cubierta de protección movible

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
NP 29	50,00	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CUBIERTA MOVIBLE	CUBIERTA		5	10		50

PLANO DE CANTIDADES

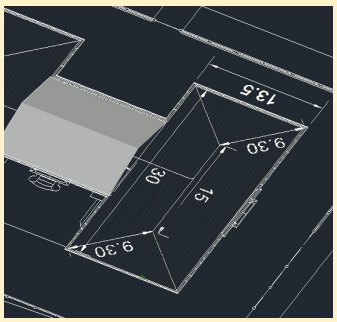

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Palacio de Justicia de Tuluá


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de placa de fibrocemento de 8mm incluye estructura

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
NP 10	204,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Ducto	juzgados	204		1		204

PLANO DE CANTIDADES

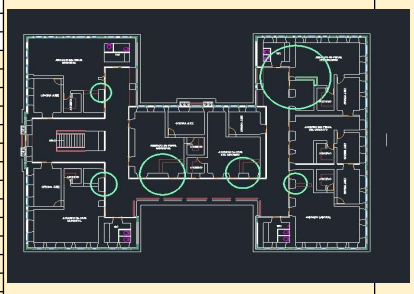

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra
