Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-008576 Id: 497413
Folios: 1 Fecha: 24-02-2025 11:40:29
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

ASUNTO: Informes de supervisión y documentos contractuales del convenio **No. 1909 de 2022 – ESTACIÓN DE POLICÍA – EL CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ)**; correspondiente al mes de **ENERO 2025.**

En mi condición supervisor del convenio **No. 1909 de 2022 – ESTACIÓN DE POLICÍA – EL CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ),** por medio de la presente remito para su información y fines pertinentes información.

SUPERVISIÓN DE CONVENIOS ESTACIÓN DE POLICÍA			
N.º DE CONVENIO	**MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO**	**CANTIDAD DE FOLIOS**
1909 de 2022	El Cantón de San Pablo	Chocó	INFORME ENERO – 2025 MINISTERIO + SOPORTES – FOLIOS (39)

Atentamente,

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado

Proyectó: Julián Camilo Hernández Cáceres – Contratista/Apoyo a la supervisión SPS

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No.**1909-2022** MUNICIPIO DE **CANTÓN DE SAN PABLO-CHOCO**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	BARRIO LAS BRISAS POBLACIÓN DE MANAGRU		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE CHOCÓ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.931.858.630,00
	ADICIÓN MIN – FONSECON		$ 1.103.560.995,48
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 693.857.405,00
	ADICIÓN ENTIDADES PUBLICAS		$ 205.304.425,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 5.934.581.455,48
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/03/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/08/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Manuel Antonio Linares	DESDE: 26/08/2024	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Manuel A. Linares D.	21/12/2022	28/01/2024
	Julian Felipe Valencia Marín	29/01/2024	17/07/2024
	Edgar Ricardo González Patiño	18/07/2024	29/07/2024
	Angela Jaramillo Gómez	30/07/2024	12/08/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	13/08/2024	25/08/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Oscar Javier Cuadros	21/12/2022	31/12/2022
	Gonzalo Flórez Peña	27/01/2023	14/02/2024
	Julian Camilo Hernández C.	15/02/2024	24/09/2024
	Julian Camilo Hernández C.	09/10/2024	31/12/2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	21324	16/01/2024	31/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	13424	16/01/2024	31/12/2024
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 128	23/03/2022	31/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3002240	16/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACIÓN		FECHA: 29/02/2024
	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 04/07/2024 (HASTA EL 31/12/2024)
	PRIMERA ADICIÓN		FECHA: 04/07/2024

	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 27/12/2024 (HASTA EL 30/08/2025)
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	FECHA: 29/02/2024
	PRIMERA REANUDACIÓN	FECHA: 17/06/2024
		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	PRIMERA REANUDACIÓN: 09/01/2025	
	PRIMERA PRÓRROGA Y ADICIÓN: 01/07/2025	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA	$ 4.160.457.625,00	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA	$ 465.033.732,00	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 1.165.289.991,34	
VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORÍA	$ 143.675.429,14	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	15/06/2023	$ 1.965.929.315
SEGUNDO DESEMBOLSO – PRIMERA ADICIÓN	A. Certificación del supervisor designado por el Departamento y/o Municipio que acredite el inicio de las actividades de obra, B. Ampliación de cobertura y vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de conformidad con la presente adición y prorroga y aprobación por parte del área de Gestión Contractual del Ministerio del Interior de la misma. C. Cronograma actualizado del convenio. D. Entrega de otrosí modificatorio de los contratos estudios diseños y obra e interventoría si aplica y sus correspondientes registros presupuestales	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 1.103.560.995,48
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.	70%	DD/MM/AAAA	$ 1.572.743.452,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.185.863,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.965.929.315,00

TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)	$ 1.950.413.437,35

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002240	Cumplimiento	$ 593.458.146,00	19/07/2024	01/07/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 001-LP-OP	*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.*		$ 4.160.457.625,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	15/07/2024		$ 1.165.289.991,34
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	08/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	07/11/2023	
	PRIMERA REANUDACIÓN	04/12/2023	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	06/12/2023	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	22/12/2023	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	08/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	15/07/2024	
	SEGUNDA PRÓRROGA	11/12/2024	
	TERCERA PRÓRROGA	31/12/2025	
Fecha de terminación del contrato	30/07/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 5.325.747.616,34
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTDO**		
PÓLIZA No.	17-40-101027222		
FECHA DE LA PÓLIZA	24/02/2023		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 001-I-CM	*INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO".*	$ 465.033.732,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	15/07/2024	$ 143.675.429,14
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	YORK STIVENSON PEREA AYALA	

Fecha de Acta de inicio del contrato	08/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	07/11/2023	
	PRIMERA REANUDACIÓN	04/12/2023	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	06/12/2023	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	22/12/2023	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	08/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	15/07/2024	
	SEGUNDA PRÓRROGA	11/12/2024	
	TERCERA PRÓRROGA	31/12/2025	
Fecha de terminación del contrato	30/07/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 608.833.839,14
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**17-44-101208799**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**21/02/2023**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: DICIEMBRE 2024	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	No. 24 del 16 de diciembre de 2024 hasta el 22 de diciembre de 2024.	
INFORME FINANCIERO	DICIEMBRE 2024	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 5.540.312,14 DICIEMBRE 2024	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	muro interno de espesor 15 cm bloque no 5 o similar, muro externo espesor 20 cm bloque estructural, punto sanitario pvc 4" hasta 3 m, muro de cerramiento de altura total de 2.40 m, con cimentación ciclópea y viga de amarre y columnetas. incluye todos los refuerzos en hierro necesarios.	
OTROS		**X**

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**46%**
% EJECUTADO DE OBRA	**37,49%**

PERIODO: ENERO 2025
PORCENTAJE EJECUCIÓN: 37,49%
VIGENCIA: 30/07/2025

COMPONENTE TÉCNICO.

En el mes de enero de 2025, se avanzó en la ejecución de la obra, presentando un avance en las siguientes actividades: muro interno de espesor 15 cm bloque no 5 o similar, muro externo espesor 20 cm bloque estructural, punto sanitario pvc 4" hasta 3 m, muro de cerramiento de altura total de 2.40 m, con cimentación ciclópea y viga de amarre y columnetas. incluye todos los refuerzos en hierro necesarios.

El Municipio de El Cantón de San Pablo, remitió los siguientes informes semanales:

- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No. 25 del 23 de diciembre de 2024 hasta el 29 de diciembre de 2024, se contó con un porcentaje de avance del 36,9% y programado del 73,63% ejecutando las siguientes actividades: punto sanitario pvc 4" hasta 3 m, muro de cerramiento de altura total de 2.40 m, con cimentación ciclópea y viga de amarre y columnetas. incluye todos los refuerzos en hierro necesarios.

- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No. 26 del 30 de diciembre de 2024 hasta el 5 de enero de 2025, se contó con un porcentaje de avance del 36,90% y programado del 37,59% el porcentaje programado disminuyo toda vez que se suscribió la prórroga del contrato.

- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No. 27 del 6 de enero de 2025 hasta el 12 de enero de 2025, se contó con un porcentaje de avance del 36,90% y programado del 38,46% no se evidencia porcentaje de avance toda vez que el contratista de obra presento dificultades en la aprobación de las pólizas del contrato.

- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No. 28 del 13 de enero de 2025 hasta el 19 de enero de 2025, se contó con un porcentaje de avance del 37,16% y programado del 39,67% ejecutando las siguientes actividades: muro interno de espesor 15 cm bloque no 5 o similar, muro externo espesor 20 cm bloque estructural.

- De acuerdo con el informe semanal de interventoría N. 29 del 20 de enero de 2025 hasta el 26 de enero de 2025, se contó con un porcentaje de avance del 37,49% y programado del 40,88% ejecutando las siguientes actividades: muro interno de espesor 15 cm bloque no 5 o similar, muro externo espesor 20 cm bloque estructural

A la fecha de acuerdo con el cronograma de obra se evidencia un atraso del 3,39% y frente al cronograma del convenio un atraso del 8,51%, se deben adelantar por parte del Municipio de El Cantón de San Pablo las acciones de carácter técnicas que permita dar cumplimiento al cronograma de obra y del convenio.

Por parte del Municipio de El Cantón de San Pablo, no se ha remitió informe de supervisión del mes de enero de 2025.

COMPONENTE FINANCIERO.

- La supervisión por parte del Ministerio del Interior no presenta informe financiero, dado que no hubo ejecución en el presente mes.

- Por parte del Municipio de El Cantón de San Pablo, no se ha remitido informe financiero y extracto del mes de enero de 2025.

- De igual manera se presenta el estado financiero del convenio y los contratos derivados con corte al mes de diciembre de 2024:

ESTADO FINANCIERO
CONVENIO No. 1909 DE 2022 - MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ Y MINISTERIO DEL INTERIOR
No. CUENTA: 979123817 / BANCO BOGOTA

RECURSOS APORTADOS

VALOR CONVENIO	$ 5.934.581.455,48	APORTES MINISTERIO	$	3.931.858.630,00
		APORTES MUNICIPIO	$	693.857.405,00
		ADICIÓN MINISTERIO	$	1.103.560.995,48
		ADICIÓN MUNICIPIO	$	205.304.425,00

DESEMBOLSOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	APORTANTE	VALOR	TOTAL
DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso	A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. D. Reunión de socialización del Proyecto con las especificaciones técnicas del proyecto	179700323	15/06/2023	Ministerio del Interior	$ 1.965.929.315,00	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					**$ 1.965.929.315,00**	39,04%
DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso	Cofinanciacion	N/A	30/06/2023	Municipio	$ 816.001.162,14	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					**$ 816.001.162,14**	90,75%
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO						**$ 2.781.930.477,14**

PAGOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO A CONTRATOS DERIVADOS
VALOR CONTRATADO

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL CONTRATADO
001-LP-OP	YEISON ALBORNOZ RIVAS	$ 4.160.557.625,00	$ 1.165.289.991,34	$ 5.325.847.616,34
001-I-CM	YORK STIVENSON PEREA AYALA	$ 465.003.732,00	$ 143.800.107,14	$ 608.803.839,14

PAGOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	No.COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN DE RECURSOS	VALOR	TOTAL
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							
Primer pago	Acta parcial No.1 (Anticipo)	162	165	23/03/2023	Municipio	$ 500.000.000,00	
Segundo pago	Acta parcial No.1 (Anticipo)	327	309	3/05/2023	Municipio	$ 192.857.405,00	
Tercer pago	Acta parcial No.1 (Anticipo)	464	466	29/06/2023	Ministerio del Interior	$ 970.325.645,00	
Cuarto pago	Acta parcial No.1	544	544	15/08/2024	Ministerio del Interior	$ 436.844.558,34	
Quito pago	Acta parcial No. 2	644	660	16/09/2024	Ministerio del Interior	$ 375.395.133,00	
Sexto pago	Acta parcial No.3 (abono)	1034	1020	23/12/2024	Municipio	$ 120.000.000,00	
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE OBRA						**$ 2.595.422.741,34**	48,73%
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							
Primer pago	Acta parcial No.1 (Estudios y diseños)	579	607	11/08/2023	Ministerio del Interior	$ 116.258.433,01	
Segundo pago	Acta parcial No.1	516	661	16/09/2024	Ministerio del Interior	$ 51.549.668,00	
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA						**$ 167.808.101,01**	27,56%
TOTAL RECURSOS PAGADOS A LOS CONTRATOS DERIVADOS							**$ 2.763.230.842,35**

TOTAL RECURSOS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE 2024	**$ 18.699.634,79**
SALDO EN LA CUENTA A DICIEMBRE 2024	**$ 5.540.312,14**

NOTA:
- El municipio de El Cantón de San Pablo, Chocó, tienen pendiente retirar la suma correspondiente por las retenciones de los pagos al contratista.
- La diferencia entre el total de recursos por pagar y el saldo en cuenta corresponde a los rendimientos financieros generados.
- Ultimo extracto a diciembre 2024.

COMPONENTE JURÍDICO.

- El convenio interadministrativo 1909 de 2022, se encuentra vigente con un plazo de ejecución hasta el treinta (30) de agosto de 2025.

ANEXOS

A continuación, se enlistan los correos electrónico y documentos que fueron remitidos y recibidos durante el mes de enero de 2025:

- Informe mensual técnico y financiero correspondiente al mes de diciembre de 2024.
- Informe semanal de interventoría No. 25, No. 26, No. 27, No. 28, No. 29 y No. 30.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

En el mes de enero de 2025, se avanzó en la ejecución de la obra, presentando un avance en las siguientes actividades muro interno de espesor 15 cm bloque no 5 o similar, muro externo espesor 20 cm bloque estructural, punto sanitario pvc 4" hasta 3 m, muro de cerramiento de altura total de 2.40 m, con cimentación ciclópea y viga de amarre y columnetas. incluye todos los refuerzos en hierro necesarios., presentando un porcentaje de avance acumulado del 37,49%

Durante el mes de enero de 2025, no se contó con profesional de apoyo y dado el número de convenios a cargo, no se logró adelantar un seguimiento adecuado al proyecto.

Todo lo anteriormente mencionado queda plasmado en los anexos del presente informe.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

08/03/2023	20/11/2024	21/11/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor Convenio No. 1909 de 2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1909 de 2022 No.16_, MUNICIPIO: CANTON DE PABLO- DEPARTAMENTO: CHOCÓ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MANAGRÚ- BARRIO LAS BRISAS		
BENEFICIARIO:	CANTON DE SAN PABLO-CHOCÓ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 5.035.419.625,48
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		899.161.830
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 5.934.581.455,48
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/08/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	NESTOR MOSQUERA ANDRADES		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	YIVIOLA RAMIREZ MORERNO	16/12/2022	01/01/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 128	23/03/2022	30/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	**No. 3002240**	09/08/2022 24/09/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRORROGA**		**FECHA: 04/07/2024**
	PRIMERA ADICIÓN		**FECHA: 04/07/2024**
	SEGUNDA PRORROGA		**FECHA: 27/12/2024**
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA SUSPENSIÓN**		**FECHA: 29/02/2024**
	PRIMERA REANUDACIÓN		**FECHA: 17/06/2024**
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA: 24/09/2024: suscripción del convenio**		
	FECHA: 24/09/2024: Acta de reanudación No 1		
	FECHA: 01/07/2025: Primera adición y prorroga		
	FECHA: 01/03/2026: Segunda prorroga		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216.526.237,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 156.524.576		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	$ 3.943.931.388,00		

VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 1.165.289.991,34
VALOR INTERVENTORÍA	$ 465.035.732,00
VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORIA	$ 143.800.107,14

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio B. Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del ministerio. D. Reunión de socialización del proyecto con las especificaciones técnicas del proyecto.	NO APLICA	15/06/2023	$ 1.965.929.315
SEGUNDO DESEMBOLSO	SEGUNDO DESEMBOLSO - PRIMERA ADICIÓN: Por la suma de MIL CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.103.560.995,48), previo cumplimiento de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor designado por el Departamento y/o Municipio que acredite el inicio de las actividades de obra, B. Ampliación de cobertura y vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de conformidad con la presente adición y prorroga y aprobación por parte del área de Gestión Contractual del Ministerio del Interior de la misma. C. Cronograma actualizado del convenio. D. Entrega de otrosí modificatorio de los contratos estudios diseños y obra e interventoría si aplica y sus correspondientes registros presupuestales.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$1.103.560.995,48
TERCER DESEMBOLSO	UN TERCER DESEMBOLSO en la vigencia 2024 equivalente a la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.572.743.452,00), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.	70 %	DD/MM/AAAA	$1.572.743.452,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO en la vigencia 2024 equivalente a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($393.185.863), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.185.863
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.965.929.315
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$ 1,950,413,437.35**

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002240	Cumplimiento	$593.458.146,00	02/01/2025	01/3/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños; obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. LP-001-2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO- DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		$ 4.160.457.625,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**15/07/2024**		$ 1.165.289.991,34
Nombre contratista	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	8/MARZO/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	07/11/2023	
	PRIMER REANUDACIÓN	04/12/2023	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	06/12/2023	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	22/12/2023	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	08/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	15/07/2024	
	PRIMERA ADICIÓN	15/07/2024	
	SEGUNDA PRORROGA	11/12/2024	
	TERCERA PRORROGA	31/12/2024	
Fecha de terminación del contrato	**30/07/2025**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 5.325.747.616,34		
COMPAÑÍA ASEGURADORA			**SEGUROS DEL ESTADO S. A**
PÓLIZA No.	17-44-101208889 - CUMPLIMIENTO		
FECHA DE LA PÓLIZA	15/12/2029		
PÓLIZA No.	17-40-101027222 - RC		
FECHA DE LA PÓLIZA	31/10/2025		

- ***Contrato de ejecución de Interventoría Estudios y Diseños, obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. CM-001-2023	INTERVENTORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"		$ 465.033.732,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	04/07/2024		$ 143.800.107,14
Nombre contratista	YORK STIVENSON PEREA AYALA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	8/MARZO/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	07/11/2023	
	PRIMER REANUDACIÓN	04/12/2023	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	06/12/2023	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	22/12/2023	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	08/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	15/07/2024	
	PRIMERA ADICIÓN	15/07/2024	
	SEGUNDA PRORROGA	11/12/2024	
	TERCERA PRORROGA	31/12/2024	
Fecha de terminación del contrato	**30/07/2025**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 5,934,551,455.48**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**17-44-101208799**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**31/07/2028**		

5. RESUMEN DE PAGOS REALIZADOS A LA FECHA

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	162	165	23/03/2023	$ 0.00	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	327	309	03/05/2023	$ 0.00	$ 192,857,405.00	$ 192,857,405.00
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	464	466	27/06/2023	$ 970,325,645.00	$ 0.00	$ 970,325,645.00
001-I-CM	PAGO ACTA INTERVENTORIA, ESTUDIOS Y DISEÑO	579	607	11/08/2023	$ 116,258,433.01	$ 0.00	$ 116,258,433.01
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 1	544	544	15/08/2024	$ 436,884,558.34	$ 0.00	$ 436,884,558.34
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 2	644	660	12/09/2024	$ 375,395,133.00	$ 0.00	$ 375,395,133.00
001-I-CM	PAGO ACTA DE COSTOS INTERVENTORIA N 1	516	661	12/09/2024	$ 51,549,668.00	$ 0.00	$ 51,549,668.00
001-LP-OP	PAGO ABONO1 ACTA PARCIAL DE OBRA N 3	1034	1020	23/12/2024		$ 120,000,000.00	$ 0.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 1,950,413,437.35	$ 812,857,405.00	$ 2,643,270,842.35

6. RESUMEN DE MANEJO DEL ANTICIPO DE OBRA

MANEJO ANTICIPO DE OBRA	
VALOR INICAL DEL CONTRATO	$4,160,457,625.00
VALOR ADICION	$1,165,289,991.34
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$5,325,747,616.34
VALOR ANTICPO OTORGADO	$1,664,183,050.00
VALOR AMORTIZADO ACTA No 1	$198,390,766.70
VALOR AMORTIZADO ACTA No 2	$170,468,209.17
VALOR POR AMORTIZAR	$1,295,324,074.13

7. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: NOVIEMBRE 2024	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: No 21	X	
INFORME FINANCIERO: DICIEMBRE **2024**	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA: $ 5,160,152.14	X	
➢ PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): se ejecutó durante este periodo un equivalente al 30% de esta actividad. ➢ CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO): se ejecutó durante este periodo 3 Un, equivalente al 11,11% para un total de 23 Un de esta actividad. ➢ MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.: se ejecutó durante este periodo 342,81Ml equivalentes al 46% para un total de 484,22 Ml esta actividad.		

8. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
SE REALIZARON LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**79.46%**
% EJECUTADO DE OBRA	**36.9%**

PERIODO: DICIEMBRE 2024
VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO 1909: 31/12/2024
AVANCE DE OBRA: 36.9%

Componente técnico:
Para el periodo reportado se continua con el desarrollo de las actividades en obra las cuales se listaron en el numeral anterior y se evidencian en el registro fotográfico anexo.

Componente administrativo: El contratista presenta el acta parcial de obra No 3, aprobada por la interventoría por un valor de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 567,824,578.87) MCTE, de los cuales después de amortizar el anticipo, queda un saldo a pagar al contratista por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHOMIL SETENTA Y TRES PESOS ($ 390.498.073) MCTE.
Componente financiero: Se realiza El abono No 1 al acta parcial No 3 presentada por el contratista por un valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 120, 000,000)
Componente Jurídico: Mediante resolución no. 0799 del 23 de diciembre de 2024 se ordena el pago del abono No 1 al acta parcial No 3 presentada por el contratista por un valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 120, 000,000)

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: Para el periodo de corte se registra un avance de del **36.9 %** el cual se justifica con las actividades relacionadas en el numeral anterior y se anexan los informes semanales de interventoría los informes mensuales de obra e interventoría correspondiente.

9. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

15/03/2023	17/03/2023	15/07/2024	25/07/2024	21/11/2024	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

10. SUPERVISOR



NESTOR MOSQUERA ANDRADES
Supervisor convenio 1909 de 2022 Municipio El Cantón Del San Pablo-Chocó

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1909 DE 2022

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO-DEPARTAMENTO DEL CHOCÒ.

INFORME FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2024
MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO

PROYECTO (S):	**AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO-DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.**

CUENTA (AHORROS) No.: 979123817		**DEL BANCO: DE BOGOTA**	
VALOR CONVENIO			**$ 5,934,581,455.48**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 5,035,419,625.48**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO			**$ 0.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 899,161,830.00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIROS MINISTERIO		
FECHA DE GIRO	**GIROS**	**VALOR DE GIROS**
15/06/2023	GIRO 1	$ 1,965,929,315.00
	GIRO 2	$ 0.00
	GIRO 3	$ 0.00
		$ 0.00
TOTAL GIRO MINISTERIO		**$ 1,965,929,315.00**
GIROS MUNICIPIO		
15/03/2023	GIRO 1	$ 505,000,000.00
16/04/2023	GIRO 2	$ 188,897,405.00
17/05/2023	GIRO 3	$ 2,000,000.00
31/07/2023	GIRO 4	$103,757.14
TOTAL GIRO MUNICIPIO		**$ 696,001,162.14**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 979123817 A LA FECHA	**$ 2,661,930,477.14**
VALOR CONTRATADO:	$

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
001-LP-OP	YEISON ALBORNOZ RIVAS	$ 4,160,457,625.00	$ 1,165,289,991.34	$5,325,747,616.34
001-I-CM	YORK STIVENSON PEREA AYALA	$ 465,003,732.00	$ 143,800,107.14	$608,803,839.14
TOTAL CONTRATADO				**$ 5,934,551,455.48**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	162	165	23/03/2023	$ 0.00	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	327	309	03/05/2023	$ 0.00	$ 192,857,405.00	$ 192,857,405.00
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	464	466	27/06/2023	$ 970,325,645.00	$ 0.00	$ 970,325,645.00
001-I-CM	PAGO ACTA INTERVENTORIA, ESTUDIOS Y DISEÑO	579	607	11/08/2023	$ 116,258,433.01	$ 0.00	$ 116,258,433.01
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 1	544	544	15/08/2024	$ 436,884,558.34	$ 0.00	$ 436,884,558.34
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 2	644	660	12/09/2024	$ 375,395,133.00	$ 0.00	$ 375,395,133.00
001-I-CM	PAGO ACTA DE COSTOS INTERVENTORIA N 1	516	661	12/09/2024	$ 51,549,668.00	$ 0.00	$ 51,549,668.00
001-LP-OP	PAGO ABONO1 ACTA PARCIAL DE OBRA N 3	1034	1020	23/12/2024		$ 120,000,000.00	$ 0.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 1,950,413,437.35**	**$ 812,857,405.00**	**$ 2,643,270,842.35**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/03/2023	$ 14,753.00
30/04/2023	$ 2,770.00
31/05/2023	$ 1,082.00
30/06/2023	$ 225,066.00
31/07/2023	$ 123,937.00
31/08/2023	$ 116,235.00
31/09/2023	$ 111,369.00
31/10/2024	$ 110,795.00
31/11/2023	$ 110,809.00
31/12/2023	$ 110,823.00
31/01/2024	$ 110,837.00
29/02/2024	$ 110,850.00
31/03/2024	$ 110,864.00
30/04/2024	$ 110,878.00
31/05/2024	$ 110,892.00
30/06/2024	$ 110,906.00
31/07/2024	$ 76,457.00
31/08/2024	$ 56,706.00
30/09/2024	$ 21,178.00
31/10/2024	$ 8,264.00
30/11/2024	$ 3,332.00
31/12/2024	$ 482.00
TOTAL (3)	**$ 1,759,285.00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	**$ 0.00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 2,661,930,477.14**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 2,643,270,842.35**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	**$ 1,759,285.00**
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	**$ 0.00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 1,759,285.00**

ESCUENTOS BANCARIO	**GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO**	**23/03/2023**	**$ 2,000,000.00**
	TOTAL IVA	**24/03/2023**	**$ 1,349.00**
	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**24/03/2023**	**$ 33.00**
	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**03/05/2023**	**$ 771,430.00**
	TOTAL IVA	**04/05/2023**	**$ 1,349.00**
	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**04/05/2023**	**$ 33.00**
	TOTAL IVA	**29/06/2023**	**$ 11,611.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**29/06/2023**	**$ 3,881,587.00**
	TOTAL IVA	**11/08/2023**	**$ 1,349.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**31/08/2023**	**$ 369,735.00**
	TOTAL IVA	**12/09/2023**	**$ 733.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**12/09/2023**	**$ 51,172.00**
	TOTAL IVA	**14/08/2024**	**$ 1,469.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**14/08/2024**	**$ 1,459,231.00**
	IVA	**12/09/2024**	**$ 2,267.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**12/09/2024**	**$ 1,288,828.00**
	IVA	**13/11/2024**	**$ 6,752.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**13/11/2024**	**$ 769,692.00**
	IVA	**24/12/2024**	**$ 3,104.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**24/12/2024**	**$ 400,878.00**
TOTAL DESCUENTOS			**$ 10,618,620.00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 20,418,919.79**
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 8,618,620.00**
SALDO EN CUENTA APLICANDO DESCUENTOS BANCARIOS	**$ 9,800,299.79**

OBSERVACIONES	**NOTA 1:** PARA OBTENER EL VALOR DEL SALDO REPORTADO EN LOS EXTRACTOS HAY QUE DESCONTAR LAS DEDUCCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD BANCARIA CORRESPONDIENTES A GRAVÁMENES FINANCIEROS (IVA, 4X1000), CABE MENCIONAR QUE EL MUNICIPIO ES CONSCIENTE QUE LA CUENTA DEBE ESTAR EXENTA DE ESTOS IMPUESTOS Y SE ADELANTAN LAS ACCIONES PARA SUBSANAR ESTO, MIENTRAS TANTO ASUME EL COMPROMISO DE REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE ESTOS DESCUENTOS A FAVOR DEL MINISTERIO.

FIRMA

Felipe Hinestroza Trellez

FELIPE HINESTROZA TRELLEZ
Tesorero General
Secretario de hacienda

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

RESOLUCIÓN No. 0799 DE 2024
(23 DE DICIEMBRE)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DEL ABONO No 1 DEL ACTA PARCIAL #3 DEL CONTRATO DE OBRA No. 001-LP-OP DE 2023

EL SUSCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCO, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto único reglamentario 1082 de 2015, y demás normas reglamentarias y

CONSIDERANDO:

Que, la Administración Municipal El Cantón de San Pablo - Chocó, con fecha 23 de febrero de 2023, suscribió con **YEISON ALBORNOZ RIVAS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 11708479 expedida en Istmina, el **CONTRATO DE OBRA No. 001-LP-OP DE 2023**, el cual tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"**

Que, la cuantía de dicho contrato estatal, asciende a la suma de **CUATRO MIL CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($4.160.457.625) MCTE.**

Que mediante anticipo del 40% se ordenó el pago al contratista por la suma de **MIL SIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS (1.663.183.050) MCTE.**

Que con fecha 15 de julio de 2024, se suscribió el otrosí #1 al contrato, mediante el cual se adiciono el valor en la suma de **MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.165.289.991,34) MTE,** para un valor total de **CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($5.325.747.616,34) M/CTE.**

Que, mediante resolución No. 0432 del 08 de agosto de 2024, se ordenó el pago de acta parcial #1 por valor de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($436.884.558,34) MCTE.**

Que, mediante resolución No. 0515 del 12 de septiembre de 2024, se ordenó el pago de acta parcial #2 por valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($ 375.395.133) MCTE.**

Que, con fecha 10 del mes de septiembre de 2024, se suscribió entre los señores **YEISON ALBORNOZ RIVAS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 11708479 expedida en Istmina, en calidad de **CONTRATISTA, YORK STIVENSON PEREA AYALA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 9.732.848 expedida en Armenia, en calidad de **INTERVENTOR** y **NESTOR MOSQUERA ANDRADES,** Secretario de Planeación, en calidad de **SUPERVISOR**, el acta de recibo parcial #2 del **CONTRATO DE OBRA No. 001-LP-OP DE 2023**, la cual asciende a la suma de **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 567,824,578.87) MCTE,** de los cuales después de amortizar el anticipo, queda un saldo a pagar al contratista por la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHOMIL SETENTA Y TRES PESOS ($ 390.498.073) MCTE.**

Que, mediante certificados de disponibilidad presupuestal **Nro. 01 del 12 de enero de 2023 y No. 317 de 09 de julio de 2024,** expedidos por el jefe de Presupuesto Municipal, se registra que, dentro del presupuesto de rentas y gastos, existe una partida presupuestal disponible libre de afectaciones para amparar los compromisos ocasionados por el precitado Contrato.

Qué, En mérito a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar pagar el abono No 1 al señor **YEISON ALBORNOZ RIVAS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 11708479 expedida en Istmina, por concepto de pago de acta parcial #3 correspondiente al **CONTRATO DE OBRA No. 001-LP-OP DE 2023**, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO –**

DEPARTAMENTO DE CHOCO” la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 120,000,000.00) MCTE,** de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada a los 23 días del mes de diciembre de 2024

HENRY RAMIREZ PALACIOS
Alcalde Municipal El Cantón de San Pablo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE EL CANTON DEL SAN PABLO
NIT 800239414-5
ORDEN DE PAGO

Nro. OP:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
1034	23 de Diciembre de 2024	2024	PRESUPUESTO ENTIDAD
Disponibilidad:	**Compromiso:**	**Estado:**	**Valor total:**
1	97	APROBADO	120.000.000,00
Tercero:		**Concepto de pago:**	
11708479 - YEISON ALBORNOZ RIVAS		Contratos de Obra	

Descripción:

RESOLUCION NUMERO 0799 DEWL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LA DE LA CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMNETO CHOCO

RUBROS DE EGRESO

Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
2.3.45.05.2.01.01.001.02.14.01	1180	Estudios, Diseños y Construcción de la Estación De Policía - convenio numero 1909 ministerio de interior -FONSECON **Fuente:** 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL. **MGA:** 0 - No aplica. **CPC:** 0 - No aplica. **Sector:** 0 - NO APLICA.	120.000.000,00

Total 120.000.000,00

DEDUCCIONES

Código	Deducción	Porc.	Valor
01	Estampilla Universidad Tecnológica del Chocó	1,50	1.800.000,00
02	Estampilla Proadulto Mayor	4,00	4.800.000,00
03	Tasa Deporte y Recreación	2,00	2.400.000,00
04	Estampilla Procultura	1,00	1.200.000,00
15	Retención en la Fuente por Contratos de Construcción	2,00	2.400.000,00
16	Contribución Especial de Obra Pública	5,00	6.000.000,00
17	Impuesto de Industria y Comercio (Contratos de Obra)	1,00	1.200.000,00
		Total	**19.800.000,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

Código	Cuenta contable	Débito	Crédito
511190	Otros gastos generales	120.000.000,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	100.200.000,00
240101	Bienes y servicios	0,00	10.200.000,00
243626	Contratos de construcción	0,00	2.400.000,00
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	1.200.000,00
244023	Contribuciones	0,00	6.000.000,00
	Total	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**

TOTAL OBLIGACIÓN	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL IVA	NETO A PAGAR
120.000.000,00	19.800.000,00	0,00	100.200.000,00

Son: CIENTO VEINTE MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS

Alcalde

Secretario de Hacienda

Elaboró: ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA.
Aprobó: ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA.
Imprimé: ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE EL CANTON DEL SAN PABLO
NIT 800239414-5
COMPROBANTE DE EGRESO

Consecutivo:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
1020	30 de Diciembre de 2024	2024	PRESUPUESTO ENTIDAD
Estado:	**Valor total:**	**Valor neto:**	
APROBADO	120.000.000,00	100.200.000,00	

Tercero:
11708479 - YEISON ALBORNOZ RIVAS

Descripción:
RESOLUCION NUMERO 0799 DEWL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LA DE LA CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMNETO CHOCO

RUBROS DE EGRESO

CDP	RP	OP	Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
1	97	1034	2.3.45.05.2.01.01.001.02.14.01	1180	Estudios, Diseños y Construcción de la Estación De Policía - convenio numero 1909 ministerio de interior -FONSECON **Fuente:** 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL. **MGA:** 0 - No aplica. **CPC:** 0 - No aplica. **Sector:** 0 - NO APLICA.	120.000.000,00
					Total	**120.000.000,00**

CUENTAS BANCARIAS

Código	Cuenta bancaria	Banco	Tipo cuenta	Nro. cuenta	Forma pago	Nro. transacción	Valor
52	CTA N° 979123817 CONTRUCCION COMANDO DE POLICIA	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA DE AHORROS	979123817	TRANSFERENCIA		100.200.000,00
						Total	**100.200.000,00**

Son: CIEN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Felpe Hinestroza
Secretario de Hacienda

Beneficiario

Elaboró: ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA.
Aprobó: ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA.
Imprimé: FELIPE HINESTROZA TRELLEZ.

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PAB**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8002394145**
Generado por: **FELIPE HINESTROZA**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	13372227	**Fecha de Emisión**	2024/12/26

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CONSTRUCCION COMANDO	**No. Producto**	*****3817
Fecha de Pago	2024/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11708479
Beneficiario	YEISON ARBONOZ RIVAS
Valor a Pagar	$100,200,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	05950995445
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos | www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024123112AH3178176790

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



13632 1-2

ESTUDIO DISENOS Y CONTRUCCION DE LA ESTA
CR 5 2-1
MANAGRU,CHOCO
Entrega: EM Oficina: 2037 Gerencia Oficial 2 - Quibdó
13632

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2024**
Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 979123817
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 2037
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**5,160,152.14**
Total 000002 Abonos:	201,200,000.00
Total 000004 Cargos:	-200,416,340.00
Total IVA:	-3,104.00
Total 4x1000 GMF:	-400,878.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	482.00
Saldo Final:	**5,540,312.14**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
23/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Municipio Canton Del San Pablo	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	101,000,000.00	106,160,152.14
24/12	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		400,800.00	106,560,952.14
24/12	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores -otros	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	100,200,000.00	206,760,952.14
24/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-100,200,000.00	106,560,952.14
24/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-8,170.00	106,552,782.14
24/12	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-1,552.00	106,551,230.14
24/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-400,839.00	106,150,391.14
26/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-100,200,000.00	5,950,391.14
26/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-8,170.00	5,942,221.14
26/12	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-1,552.00	5,940,669.14
26/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-400,839.00	5,539,830.14
31/12	GT01	Intereses ganados	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		482.00	5,540,312.14
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoria del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTON DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**25**	**MES: DICIEMBRE**			**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-CM-de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"		**DEL** 23-dic-24	**AL**	29-dic-24
INTERVENTOR: **YORK STIVENSON PEREA AYALA**		**DIRECTOR DE INTERVENTORA. ING. KATHERINE HINESTROZA**		**DIRECTOR DE OBRA: ARQ YEISON ALBORNOZ RIVAS**			


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

MANAGRO - MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	$ 1.165.289.991,34		
PLAZO	NUEVE (9) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGA N° 1:	Cuatro (4) meses y seis (6) días			**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	Lunes, 16 de diciembre de 2024		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 5.325.747.616,34			**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 1.664.183.050,00		
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	183 DIAS			**PLAZO RESTANTE:**	275 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,64%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	36,90%	**PROGRAM. SEMANA**	2,31%	**PROGRAM. ACUMULADO**	73,63%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 34.279.625,32	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 1.965.464.756,94	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 122.861.270,44	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 3.921.511.511

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DEL CONVENIO

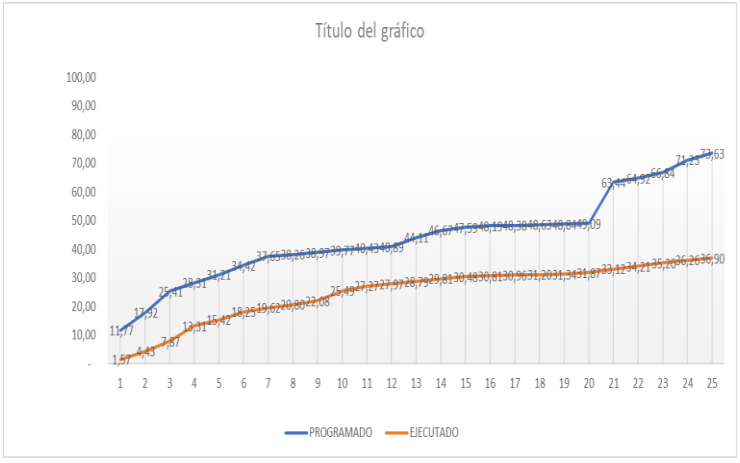

4. RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO INICIAL					
ITEM	DESCRIPCION		SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.				
1	REPLANTEO GENERAL		$ -	$ 8.749.820,88	$ 8.749.820,88
2	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)		$ -	$ 24.854.104,80	$ 24.854.104,80
3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)		$ -	$ 53.056.766,88	$ 53.056.766,88
4	RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)		$ -	$ 255.304.425,00	$ 255.304.425,00
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA		$ -	$ 100.842.473,28	$ 100.842.473,28
6	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.		$ -	$ 20.939.062,26	$ 20.939.062,26
7	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)		$ -	$ 31.779.266,76	$ 31.779.266,76
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI		$ -	$ 85.229.821,75	$ 85.229.821,75
9	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO. SUMIN. FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).		$ -	$ 50.868.480,00	$ 50.868.480,00
10	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.		$ -	$ 327.157.806,40	$ 327.157.806,40
11	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN. FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)		$ -	$ 30.943.133,34	$ 30.943.133,34
12	MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO		$ -	$ -	$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6		$ -	$ 4.400.917,92	$ 4.400.917,92
14	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.		$ -	$ 11.279.580,33	$ 11.279.580,33
15	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)		$ -	$ -	$ -
16	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)		$ -	$ -	$ -
17	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)		$ -	$ -	$ -
18	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.		$ -	$ -	$ -
19	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)		$ -	$ -	$ -
20	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.		$ -	$ -	$ -
21	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)		$ -	$ -	$ -
22	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.		$ -	$ -	$ -
26	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.		$ -	$ -	$ -
	COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)		$ -	$ -	$ -
40	RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		$ -	$ 13.828.536,90	$ 13.828.536,90
41	RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		$ -	$ 2.710.497,00	$ 2.710.497,00
42	PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		$ 197.008,00	$ -	$ 197.008,00
43	PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		$ -	$ -	$ -
44	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60-0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)		$ -	$ 6.128.626,00	$ 6.128.626,00
45	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6-0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)		$ -	$ 4.602.060,00	$ 4.602.060,00
46	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.4-0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)		$ -	$ 15.156.261,00	$ 15.156.261,00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"		$ -	$ 462.879,01	$ 462.879,01
48	MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.		$ 25.077.360,00	$ 180.231.474,38	$ 205.308.834,38
			$ -		
		SUBTOTAL	$ 25.274.368,00	$ 1.184.566.634,62	$ 1.209.841.002,62
	36,90%	A.I.U	$ 9.005.257,32	$ 422.061.091,92	$ 431.066.349,24
		VALOR TOTAL	$ 34.279.625,32	$ 1.606.627.726,54	$ 1.640.907.351,86
AVANCE PROGRAMADO	73,63%				
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	-36,73%				

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	VR_UNITARIO	VR/PARCIAL EJECUTADO	VR/PARCIAL ACUMULADO
REPLANTEO GENERAL	M2	0,00	0	753,94	$ 11.607,00	$ -	$ 8.749.820,88
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	753,94	$ 32.970,00	$ -	$ 24.854.104,80
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	19.599,64	$ 2.707,00	$ -	$ 53.056.766,88
RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,00	0	1.264,57	$ 159.834,00	$ -	$ 255.304.425,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	M3/KM	0,00	0	33.388,71	$ 3.198,00	$ -	$ 100.842.473,28
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	496,66	$ 42.181,00	$ -	$ 20.939.062,26
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	12.913,16	$ 2.461,00	$ -	$ 31.779.266,76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,00	0	164,91	$ 491.673,00	$ -	$ 85.229.821,75
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO. SUMIN. FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3	0,00	0	51,20	$ 993.525,00	$ -	$ 50.868.480,00
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN. FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	37,54	$ 824.271,00	$ -	$ 30.943.133,34
MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	M2	0,00	0	0,00	$ 97.698,00	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	M2	0,00	0	753,94	$ 5.838,00	$ -	$ 4.400.917,92
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	37.884,23	$ 8.654,00	$ -	$ 327.157.806,40
COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI, (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	75,64	$ 958.960,00	$ -	$ 72.538.238,53
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PANALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 935.553,00	$ -	$ -
ADOBOLLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 50CM X 25CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDO Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	0,00	0	0,00	$ 43.728,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	1.303,40	$ 8.654,00	$ -	$ 11.279.580,33
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	0	88,04	$ 207.241,00	$ -	$ 18.422.014,54
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	2.312,44	$ 17.653,00	$ -	$ 41.263.991,33
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	0,00	$ 6.746,00	$ -	$ -
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	0,00	$ 42.181,00	$ -	$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	0,00	$ 2.461,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 896.592,00	$ -	$ -
RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	266,02	$ 97.121,00	$ -	$ 13.828.536,90
RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	25,50	$ 106.294,00	$ -	$ 2.710.497,00
PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	10	4,00	$ 123.130,00	$ 197.008,00	$ 492.520,00
PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	0,00	$ 102.414,00	$ -	$ -
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60-0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	7,00	$ 875.518,00	$ -	$ 6.128.626,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6-0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	6,00	$ 767.010,00	$ -	$ 4.602.060,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.4-0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	23,00	$ 689.707,00	$ -	$ 15.165.884,49
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	UN	0,00	0	1,00	$ 79.638,00	$ -	$ 79.638,00
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M2	60,00	15	464,22	$ 417.906,00	$ 25.077.360,00	$ 202.384.398,84
SUB TOTAL SEMANA						$ 25.274.368,00	$ 1.339.082.681,13
					AIU	7.503.959,86	$ 397.573.648,03
					TOTAL SEMANA 25	$ 34.279.625,32	$ 1.736.656.329
						0,64%	36,90%

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% CANTIDAD PROGRAMADA	OBSERVACION
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	459,42	20	
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.4-0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	3,00	1	
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M2	240,68	1	

7. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	si	8-mar-23	15-ago-25	$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION	si	8-mar-23	7-mar-24	$ 1.064.183.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	si	8-mar-23	15-dic-27	$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	si	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	si	8-mar-23	15-mar-25	$ 232.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-45-101027222

ACTAS REALIZADAS

CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION
ACTA NO. 1	8/05/2024	
ACTA No 2	10/09/2024	

CONTRATOS ADICIONALES

Nº	VALOR	CAUSA
1	1.165.289.971,34	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

PRORROGAS

Nº	TIEMPO	CAUSAL
1	4 MESES 0 DIAS	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

8. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE OBRA	1	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1	INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1
TRABAJADORA SOCIAL	1	TRABAJADORA SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1		
ALMACENISTA	1		
JEFE DE PERSONAL	1		
MAESTRO DE OBRA	1		
OFICIALES	4		
AYUDANTES	10		

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

*Continuamos con el retrazo en las actividades que se estan ejecutando, cada semana se va reflejando mas retrazo, esto debido al fuerte invierno reinante en la zona lo cual dificulta tener mejor rendimiento, por esto se observa que el rendimiento sigue cayendo semana a semana, sigue aumentando la diferencia programado - ejecutado, se recomienda seguir con la implementacion del plan de contingencia y aprovechar mejor los momentos donde las lluvias dan el espacio de trabajar.

OBSERVACIONES

*Continuar con el Plan de contingencia, en espera de la prorroga solicitada en tiempo de las labores a ejecutar ya que el fuerte invierno en la zona no aminora, los trabajos aledanos al area que se esta interviniendo y el orden publico delicado en la zona, no ha permitido tener un mejor rendimiento en las labores que se estan ejecutando y poder cumplir a cabalidad con las programacion inicial.

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

*Después de iniciar las actividades en obra esta interventoria tiene por prioridad estar pendiente de los EPP como lo son el casco, las botas de seguridad industrial, las gafas que se utilizan para evitar accidentes en los ojos, guantes y los cuidados que debe manejar el trabajador para su seguridad integral, se le reitera al contratista renovar la dotacion de guantes, gafas y chalecos que se encuentran en mal estado y algunos obreros ya no los tienen.

Elaborado por:

YOMI STHANDON PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.848 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.



MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.



MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.



MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.



PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)



PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTON DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No: 26		**MES: ENERO**			**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-CM de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"		**DEL** 30-dic-24	**AL**	5-ene-25
INTERVENTOR: **YORK STIVENSON PEREA AYALA**		**DIRECTOR DE INTERVENTORA. ING. KATHERINE HINESTROZA**		**DIRECTOR DE OBRA: ARQ YEISON ALBORNOZ RIVAS**			


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

MANAGRO - MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	$ 1.165.289.991,34		
PLAZO	VEINTE (20) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGAS N° 1,2,3,4:	Cuatro (11) meses y seis (6) días			**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	Lunes/Miercoles, 30 de julio de 2025		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 5.325.747.616,34			**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 1.664.183.050,00		
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	168 DIAS			**PLAZO RESTANTE:**	275 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	36,90%	**PROGRAM. SEMANA**	1,70%	**PROGRAM. ACUMULADO**	37,59%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 1.965.464.796,94	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 90.767.348,93	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 2.001.879.980

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DEL CONVENIO

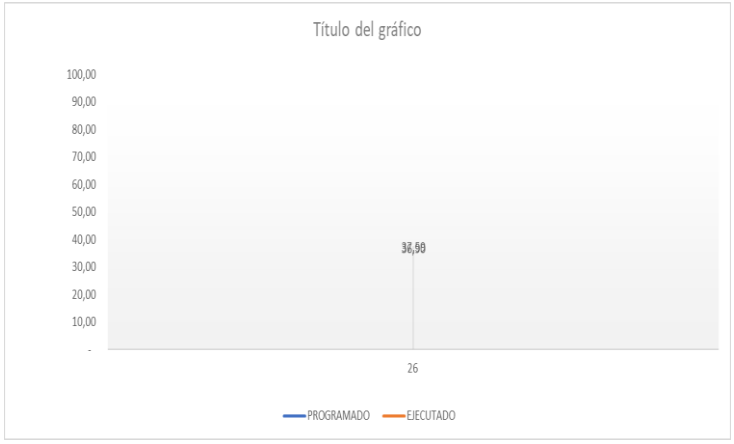

4. RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO INICIAL					
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.				
1	REPLANTEO GENERAL	$ -		$ 8.749.820,88	$ 8.749.820,88
2	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	$ -		$ 24.854.104,80	$ 24.854.104,80
3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -		$ 53.056.766,88	$ 53.056.766,88
4	RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	$ -		$ 255.304.425,00	$ 255.304.425,00
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	$ -		$ 100.842.473,28	$ 100.842.473,28
6	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -		$ 20.939.662,26	$ 20.939.662,26
7	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -		$ 31.779.266,76	$ 31.779.266,76
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	$ -		$ 85.229.821,75	$ 85.229.821,75
9	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO. SUMIN. FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	$ -		$ 50.868.480,00	$ 50.868.480,00
10	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -		$ 327.157.806,40	$ 327.157.806,40
11	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -		$ 30.943.133,34	$ 30.943.133,34
12	MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	$ -		$ -	$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	$ -		$ 4.400.917,92	$ 4.400.917,92
14	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -		$ 11.279.580,33	$ 11.279.580,33
15	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	$ -		$ -	$ -
16	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	$ -		$ -	$ -
17	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -		$ -	$ -
18	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -		$ -	$ -
19	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	$ -		$ -	$ -
20	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -		$ -	$ -
21	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -		$ -	$ -
22	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -		$ -	$ -
26	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -		$ -	$ -
	COLUMNETA Y VIGA-CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO).	$ -		$ -	$ -
40	RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -		$ 13.828.536,90	$ 13.828.536,90
41	RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -		$ 2.710.497,00	$ 2.710.497,00
42	PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -		$ 197.008,00	$ 197.008,00
43	PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -		$ -	$ -
44	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -		$ 6.128.626,00	$ 6.128.626,00
45	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.8M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -		$ 4.602.060,00	$ 4.602.060,00
46	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -		$ 15.190.261,00	$ 15.190.261,00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	$ -		$ 462.879,01	$ 462.879,01
48	MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	$ -		$ 205.339.834,38	$ 205.339.834,38
				$ -	
		SUBTOTAL	$ -	$ 1.209.843.002,62	$ 1.209.843.002,62
		A.I.U	$ -	$ 431.066.349,24	$ 431.066.349,24
		VALOR TOTAL	$ -	$ 1.640.907.351,86	$ 1.640.907.351,86

AVANCE EJECUTADO	36,90%
AVANCE PROGRAMADO	37,59%
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	-0,68%

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	VR_UNITARIO	VR/PARCIAL EJECUTADO	VR/PARCIAL ACUMULADO
REPLANTEO GENERAL	M2	0,00	0	753,94	$ 11.607,00	$ -	$ 8.749.820,88
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	753,94	$ 32.970,00	$ -	$ 24.854.104,80
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	19.599,64	$ 2.707,00	$ -	$ 53.056.766,88
RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,00	0	1.264,57	$ 159.834,00	$ -	$ 255.304.425,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	M3/KM	0,00	0	33.388,71	$ 3.198,00	$ -	$ 106.842.473,28
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	496,66	$ 42.181,00	$ -	$ 20.939.662,26
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	12.913,16	$ 2.461,00	$ -	$ 31.779.266,76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,00	0	164,91	$ 491.673,00	$ -	$ 85.229.821,75
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO. SUMIN. FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3	0,00	0	91,39	$ 960.525,00	$ -	$ 50.868.480,00
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	37,54	$ 824.271,00	$ -	$ 30.943.133,34
MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	M2	0,00	0	0,00	$ 97.698,00	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	M2	0,00	0	753,94	$ 5.838,00	$ -	$ 4.400.917,92
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	37.884,23	$ 8.654,00	$ -	$ 327.157.806,40
COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI, (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	75,64	$ 958.960,00	$ -	$ 72.538.238,52
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PANALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 935.553,00	$ -	$ -
ADOBOLLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 50CM X 25CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDO Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	0,00	0	0,00	$ 43.728,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	1.303,40	$ 8.654,00	$ -	$ 11.279.580,33
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	0	88,04	$ 207.241,00	$ -	$ 18.422.014,54
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	2.312,44	$ 17.853,00	$ -	$ 41.283.991,32
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	0,00	$ 6.746,00	$ -	$ -
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	0,00	$ 42.181,00	$ -	$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	0,00	$ 2.461,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
COLUMNETA Y VIGA-CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO).	M3	0,00	0	0,00	$ 896.592,00	$ -	$ -
RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	266,02	$ 97.121,00	$ -	$ 13.828.536,90
RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	25,50	$ 106.294,00	$ -	$ 2.710.497,00
PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	4,00	$ 123.138,00	$ -	$ 492.528,00
PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	0,00	$ 102.414,00	$ -	$ -
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	7,00	$ 875.518,00	$ -	$ 6.128.626,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.8M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	6,00	$ 767.010,00	$ -	$ 4.602.060,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	22,00	$ 690.767,00	$ -	$ 15.190.894,49
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	UN	0,00	0	1,00	$ 79.639,00	$ -	$ 79.639,00
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M2	0,00	0	494,22	$ 417.806,00	$ -	$ 260.384.398,84
					SUB TOTAL SEMANA	$ -	$ 1.339.092.681,13
					AIU	$ -	$ 397.573.648,03
					TOTAL SEMANA 26	$ -	$ 1.736.656.329
						0,00%	36,90%

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% CANTIDAD PROGRAMADA	OBSERVACION
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	4,00	2	
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M2	36,79	1	

7. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	=	8-mar-23	30-nov-25	$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION	=	8-mar-23	30-jul-25	$ 1.064.183.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	=	8-mar-23	30-jul-28	$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	=	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	=	8-mar-23	31-oct-25	$ 232.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-45-101027222

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA No. 1	8/05/2024		1	1.165.289.971,34	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	4 MESES 6 DIAS	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
ACTA No 2	10/09/2024							

8. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE OBRA	1	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1	INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1
TRABAJADORA SOCIAL	1	TRABAJADORA SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1		
ALMACENISTA	1		
JEFE DE PERSONAL	1		
MAESTRO DE OBRA	1		
OFICIALES	4		
AYUDANTES	10		

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

*Continuamos con el retrazo en las actividades que se estan ejecutando, cada semana se va reflejando mas retrazo, esto debido al fuerte invierno reinante en la zona lo cual dificulta tener mejor rendimiento, por esto se observa que el rendimiento sigue cayendo semana a semana, sigue aumentando la diferencia programado - ejecutado, se recomienda despues del sese de actividades por motivos de invierno y que el contratisñta le dio esta semana de descanso a su personal para pasar los ultimos dias del año con su familia, redoblar esfuerzos con la implementacion del plan de contingencia y aprovechar mejor los momentos donde las lluvias dan el espacio de trabajar.

OBSERVACIONES

Continuar con el Plan de contingencia, ya con la prorrogra aprovada aprovechar el tiempo lo mejor posible para poder mejorar el rendimiento de las labores a ejecutar ya que el fuerte invierno en la zona no aminora, se le exige al contratista una ves reinicie los trabajos trabajar jornadas extendidas para poder cumplir con la reprogramacion.

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

*Después de iniciar las actividades en obra esta interventoria tiene por prioridad estar pendiente de los EPP como lo son el casco, las botas de seguridafid industrial, las gafas que se utilizan para evitar accidentes en los ojos, guantes y los cuidados que debe manejar el trabajador para su seguridad integral, se le reitera al contratista renovar la dotacion de guantes, gafas y chalecos que se encuentran en mal estado y algunos obreros ya no los tienen.

Elaborado por:

YOMA STIVENSON PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.848 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESTA SEMANA NO HAY REGISTRO FOTOGRAFICO NO SE LABORO EN OBRA.

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTON DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No: 27		**MES: ENERO**			**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-CM de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"	**DEL**	**6-ene-25**	**AL**	**12-ene-25**
INTERVENTOR: **YORK STIVENSON PEREA AYALA**		**DIRECTOR DE INTERVENTORA. ING. KATHERINE HINESTROZA**			**DIRECTOR DE OBRA: ARQ YEISON ALBORNOZ RIVAS**		


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

MANAGRO - MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	$ 1.165.289.991,34		
PLAZO	VEINTE (20) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGAS N° 1,2,3,4:	Cuatro (11) meses y seis (6) dias			**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	Marcoles, 30 de julio de 2025		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 5.325.747.616,34			**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 1.664.183.050,00		
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	6%	DIAS		**PLAZO RESTANTE:**	275	DIAS	
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	36,90%	**PROGRAM. SEMANA**	0,87%	**PROGRAM. ACUMULADO**	38,46%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 1.965.464.796,94	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 46.115.822,28	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 2.048.232.258

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DEL CONVENIO

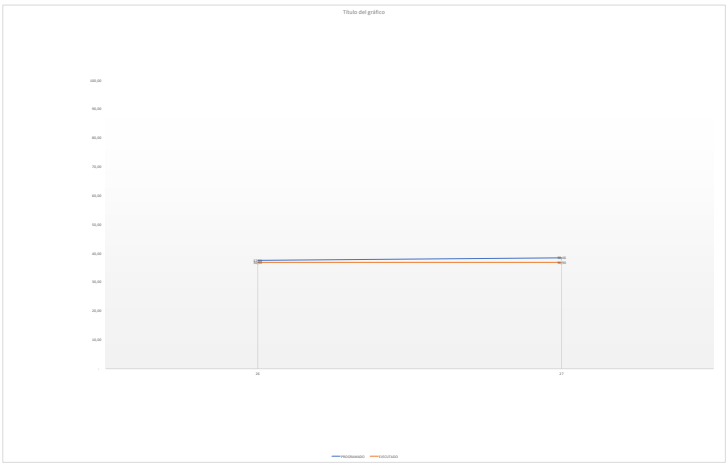

4. RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO INICIAL					
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.				
1	REPLANTEO GENERAL	$ -	$ 8.749.820,88	$ 8.749.820,88	
2	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ 24.854.104,80	$ 24.854.104,80	
3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 53.056.766,88	$ 53.056.766,88	
4	RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	$ -	$ 255.304.425,00	$ 255.304.425,00	
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	$ -	$ 100.842.473,28	$ 100.842.473,28	
6	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ 20.939.062,26	$ 20.939.062,26	
7	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 31.779.286,76	$ 31.779.286,76	
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	$ -	$ 85.229.821,75	$ 85.229.821,75	
9	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO. SUMIN. FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	$ -	$ 50.868.480,00	$ 50.868.480,00	
10	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ 327.157.806,42	$ 327.157.806,42	
11	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ 30.943.133,34	$ 30.943.133,34	
12	MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	$ -	$ -	$ -	
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	$ -	$ 4.400.917,92	$ 4.400.917,92	
14	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ 11.279.580,33	$ 11.279.580,33	
15	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -	
16	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -	
17	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -	
18	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -	
19	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -	
20	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ -	$ -	
21	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -	
22	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -	
26	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -	
	COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO).	$ -	$ -	$ -	
40	RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 13.828.536,90	$ 13.828.536,90	
41	RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 2.710.497,00	$ 2.710.497,00	
42	PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 197.008,00	$ 197.008,00	
43	PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	
44	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 6.128.626,00	$ 6.128.626,00	
45	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.8M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 4.602.060,00	$ 4.602.060,00	
46	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 15.166.261,00	$ 15.166.261,00	
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	$ -	$ 462.879,01	$ 462.879,01	
48	MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	$ -	$ 205.339.834,58	$ 205.339.834,58	
			$ -		
		SUBTOTAL	$ -	$ 1.209.841.002,62	$ 1.209.841.002,62
AVANCE EJECUTADO	36,90%	A.I.U	$ -	$ 431.066.349,24	$ 431.066.349,24
		VALOR TOTAL	$ -	$ 1.640.907.351,86	$ 1.640.907.351,86
AVANCE PROGRAMADO	38,46%				
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	-1,55%				

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	VR_UNITARIO	VR/PARCIAL EJECUTADO	VR/PARCIAL ACUMULADO
REPLANTEO GENERAL	M2	0,00	0	753,94	$ 11.607,00	$ -	$ 8.749.820,88
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	753,94	$ 32.970,00	$ -	$ 24.854.104,80
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	19.599,64	$ 2.707,00	$ -	$ 53.056.766,88
RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,00	0	1.264,57	$ 159.834,00	$ -	$ 255.304.425,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	M3/KM	0,00	0	33.388,71	$ 3.198,00	$ -	$ 106.842.473,28
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	496,66	$ 42.181,00	$ -	$ 20.939.062,26
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	12.913,16	$ 2.461,00	$ -	$ 31.779.286,76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,00	0	164,91	$ 491.673,00	$ -	$ 85.229.821,75
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO. SUMIN. FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3	0,00	0	91,39	$ 960.525,00	$ -	$ 50.868.480,00
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	37,54	$ 824.271,00	$ -	$ 30.943.133,34
MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	M2	0,00	0	0,00	$ 97.698,00	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	M2	0,00	0	753,94	$ 5.838,00	$ -	$ 4.400.917,92
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	37.884,23	$ 8.654,00	$ -	$ 327.157.806,42
COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI, (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	75,64	$ 958.960,00	$ -	$ 72.538.238,52
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PANALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 935.553,00	$ -	$ -
ADOBOLLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 50CM X 25CM. REFORZADO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDO Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	0,00	0	0,00	$ 43.728,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	1.303,40	$ 8.654,00	$ -	$ 11.279.580,33
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	0	88,04	$ 207.241,00	$ -	$ 18.422.014,54
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	2.312,44	$ 17.853,00	$ -	$ 41.283.991,32
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	0,00	$ 6.746,00	$ -	$ -
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	0,00	$ 42.181,00	$ -	$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	0,00	$ 2.461,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GID) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO).	M3	0,00	0	0,00	$ 896.502,00	$ -	$ -
RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	266,02	$ 87.121,00	$ -	$ 13.828.536,90
RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	25,50	$ 106.294,00	$ -	$ 2.710.497,00
PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	4,00	$ 123.139,00	$ -	$ 492.528,00
PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	0,00	$ 102.414,00	$ -	$ -
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	7,00	$ 875.518,00	$ -	$ 6.128.626,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.8M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	6,00	$ 767.010,00	$ -	$ 4.602.060,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	23,00	$ 659.707,00	$ -	$ 15.166.884,49
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	UN	0,00	0	1,00	$ 79.639,00	$ -	$ 79.639,00
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M2	0,00	0	494,22	$ 417.906,00	$ -	$ 202.384.368,84
					SUB TOTAL SEMANA	$ -	$ 1.339.092.681,13
					AIU	$ -	$ 397.573.648,03
					TOTAL SEMANA 27	$ -	$ 1.736.656.329
						0,00%	36,90%

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% CANTIDAD PROGRAMADA	OBSERVACION
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	4,00	2	
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M2	36,79	1	

7. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	=	8-mar-23	30-nov-25	$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION	=	8-mar-23	30-jul-25	$ 1.064.183.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	=	8-mar-23	30-jul-28	$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	=	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	=	8-mar-23	31-oct-25	$ 232.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-45-101027222

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA No. 1	8/05/2024		1	1.165.289.971,34	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	4 MESES 0 DIAS	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
ACTA No 2	10/09/2024							

8. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE OBRA	1	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1	INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1
TRABAJADORA SOCIAL	1	TRABAJADORA SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1		
ALMACENISTA	1		
JEFE DE PERSONAL	1		
MAESTRO DE OBRA	1		
OFICIALES	4		
AYUDANTES	10		

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

*Se continua con el retrazo en la la obra ya que esta semana no se retomaron las labores como estaba preestablecido los mitivos que aduce el contratista es la dificultad que se le presento para la legalizacion del otrosi No. 4, que tubo muchos inconvenientes para legalizar las polizasdel mismo. se recomienda despues de superado este impace se reanuden las actividades de la mejor manera, se sugiere trabajar a doble jornada para poder mejorar el rendimiento de la obra. cuyo retraso va nuevamente en aumento ya que no se laboraron dos semanas.

OBSERVACIONES

Continuar con el Plan de contingencia, ya con la prorrogra aprovada se debe aprovechar el tiempo lo mejor posible para poder mejorar el rendimiento de las labores a ejecutar ya que el fuerte invierno en la zona no aminora, se le exige al contratista una ves reinicie los trabajos trabajar jornadas extendidas para poder cumplir con la reprogramacion.

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

*Después de iniciar las actividades en obra esta interventoria tiene por prioridad estar pendiente de los EPP como lo son el casco, las botas de seguridafid industrial, las gafas que se utilizan para evitar accidentes en los ojos, guantes y los cuidados que debe manejar el trabajador para su seguridad integral, se le reitera al contratista renovar la dotacion de guantes, gafas y chalecos que se encuentran en mal estado y algunos obreros ya no los tienen.

Elaborado por:

YOMA STEVENSON PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.848 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESTA SEMANA NO HAY REGISTRO FOTOGRAFICO NO SE LABORO EN OBRA

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTON DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No: 28		**MES: ENERO**			**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-CM-de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"	**DEL**	**13-ene-25**	**AL**	**19-ene-25**
INTERVENTOR:**YORK STIVENSON PEREA AYALA**		**DIRECTOR DE INTERVENTORA. ING. KATHERINE HINESTROZA**		**DIRECTOR DE OBRA: ARQ YEISON ALBORNOZ RIVAS**			


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

MANAGRÚ - MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	$ 1.165.289.991,34		
PLAZO	VEINTE (20) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGAS N° 1,2,3,4:	Cuatro (1.1) meses y seis (6) días			**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	Marcoles, 30 de julio de 2025		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 5.325.747.616,34			**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 1.664.183.050,00		
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	183 DÍAS			**PLAZO RESTANTE:**	275 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,26%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	37,16%	**PROGRAM. SEMANA**	1,21%	**PROGRAM. ACUMULADO**	39,67%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 13.660.508,19	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 1.979.125.305,13	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 64.360.500,99	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 2.112.631.438

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DEL CONVENIO

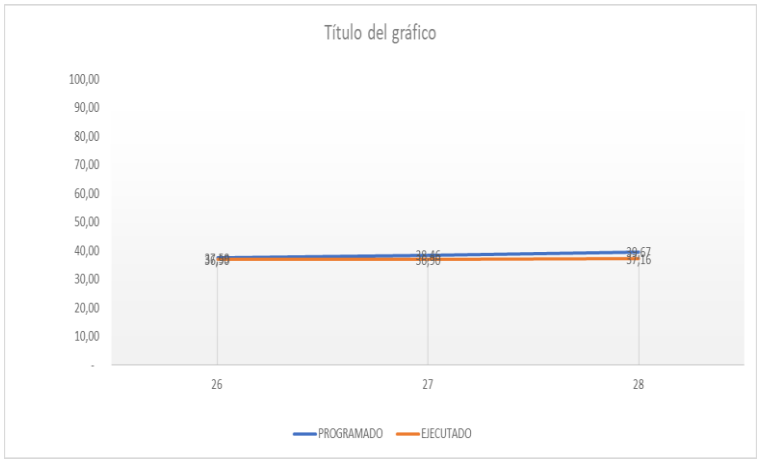

4. RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO INICIAL

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.			
1	REPLANTEO GENERAL	$ -	$ 8.749.820,88	$ 8.749.820,88
2	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (0-0.2M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ 24.854.104,80	$ 24.854.104,80
3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 53.056.766,88	$ 53.056.766,88
4	RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	$ -	$ 205.334.425,00	$ 205.334.425,00
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	$ -	$ 198.842.473,29	$ 198.842.473,29
6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ 20.939.682,26	$ 20.939.682,26
7	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 31.779.266,79	$ 31.779.266,79
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	$ -	$ 85.229.821,75	$ 85.229.821,75
9	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMUN (INCLUYE BOMBEO. SUMIN. FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	$ -	$ 50.868.480,00	$ 50.868.480,00
10	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ 327.157.606,42	$ 327.157.606,42
11	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ 30.943.133,34	$ 30.943.133,34
12	MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	$ -	$ -	$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	$ -	$ 4.400.917,92	$ 4.400.917,92
14	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ 11.279.580,33	$ 11.279.580,33
15	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -
16	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -
17	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -
18	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
19	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (0-0.2M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -
20	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ -	$ -
21	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -
22	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
26	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
	COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -
40	RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 13.828.536,90	$ 13.828.536,90
41	RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 2.710.497,00	$ 2.710.497,00
42	PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 197.008,00	$ 197.008,00
43	PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -
44	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 6.128.626,00	$ 6.128.626,00
45	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.90X0.9M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 4.602.060,00	$ 4.602.060,00
46	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.45X0.45M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 15.195.261,00	$ 15.195.261,00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	$ -	$ 462.879,01	$ 462.879,01
48	MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	$ -	$ 205.308.834,56	$ 205.308.834,56
49	MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO 5 O SIMILAR	$ 5.473.165,20	$ -	$ 5.473.165,20
50	MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	$ 4.308.957,37	$ -	$ 4.308.957,37
		$ -	$ -	$ -

AVANCE EJECUTADO	37,16%	SUBTOTAL	$ 10.073.,882,79	$ 1.209.843.692,62	$ 1.219.912.895,42
		A.I.U	$ 3.588.615,40	$ 431.064.349,24	$ 434.654.964,64
		VALOR TOTAL	$ 13.660.508,19	$ 1.640.907.353,86	$ 1.654.567.860,06
AVANCE PROGRAMADO	39,67%				
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	-2,51%				

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	VR_UNITARIO	VR/PARCIAL EJECUTADO	VR/PARCIAL ACUMULADO
REPLANTEO GENERAL	M2	0,00	0	753,94	$ 11.607,00	$ -	$ 8.749.820,88
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (0-0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	753,94	$ 32.970,00	$ -	$ 24.854.104,80
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	19.596,64	$ 2.707,00	$ -	$ 53.056.766,88
RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,00	0	1.264,27	$ 139.834,00	$ -	$ 205.334.425,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	M3/KM	0,00	0	33.398,71	$ 3.188,00	$ -	$ 198.842.473,29
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	496,66	$ 42.161,00	$ -	$ 20.939.682,26
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	12.912,10	$ 2.461,00	$ -	$ 31.779.266,79
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,00	0	164,91	$ 491.675,00	$ -	$ 85.229.821,75
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO. SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3	0,00	0	91,20	$ 865.535,00	$ -	$ 50.868.480,00
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	37,54	$ 824.271,00	$ -	$ 30.943.133,34
MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	M2	0,00	0	0,00	$ 95.696,00	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	M2	0,00	0	753,94	$ 5.838,00	$ -	$ 4.400.917,92
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	37.894,23	$ 8.454,00	$ -	$ 327.157.606,42
COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	75,44	$ 958.960,00	$ -	$ 72.338.230,52
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 935.533,00	$ -	$ -
BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 25CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	0,00	$ 43.728,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	1.303,40	$ 8.454,00	$ -	$ 11.276.598,33
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	0	88,94	$ 207.341,00	$ -	$ 18.432.014,54
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	2.312,44	$ 17.933,00	$ -	$ 41.283.991,32
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.454,00	$ -	$ -
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (0-0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	0,00	$ 6.746,00	$ -	$ -
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	0,00	$ 42.161,00	$ -	$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	0,00	$ 2.461,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.454,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.454,00	$ -	$ -
COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 896.592,00	$ -	$ -
RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	286,92	$ 67.121,00	$ -	$ 13.828.536,90
RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	25,50	$ 106.294,00	$ -	$ 2.710.497,00
PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	4,00	$ 123.138,00	$ -	$ 492.528,00
PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	0,00	$ 102.414,00	$ -	$ -
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	7,00	$ 875.518,00	$ -	$ 6.128.626,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.90X0.9M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	6,00	$ 767.010,00	$ -	$ 4.602.060,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.45X0.45M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	23,00	$ 660.707,00	$ -	$ 15.195.894,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	UN	0,00	0	1,00	$ 79.639,00	$ -	$ 79.639,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA PARA EL AGUA DE 3/4 HP. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y TUBERÍA PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN	UN	0,00	0	0,00	$ 1.316.688,00	$ -	$ -
MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO 5 O SIMILAR	M2	42,72	0	42,72	$ 98.780,00	$ 4.220.212,76	$ 4.220.212,76
MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	M2	33,54	0	33,54	$ 105.710,00	$ 3.545.915,30	$ 3.545.915,30
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M2	0,00	0	484,22	$ 417.950,00	$ -	$ 202.384.396,64
SUB TOTAL SEMANA						$ -	$ 1.340.848.816,21
					AIU	$ -	$ 399.879.411,75
					TOTAL SEMANA 28	$ 13.660.508,19	$ 1.740.728.222
						0,26%	37,16%

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% CANTIDAD PROGRAMADA	OBSERVACION
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	45,94	20	
CONCRETO DE FC=4000 PSI GRAVA COMÚN ADICIONANDO MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO Y MORTERO, PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CONCRETO PREMEZCLADO SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL DISEÑO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS.	M3	7,53	40	
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	3,00	10	
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M2	8,89	5	

7. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	si	8-mar-23	30-nov-25	$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208869
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION	si	8-mar-23	30-jul-25	$ 1.664.183.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208869
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	si	8-mar-23	30-jul-28	$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208869
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	si	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208869
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	si	8-mar-23	31-oct-25	$ 232.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101027222

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA No. 1	8/05/2024		1	1.165.289.891,34	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	4 MESES 6 DIAS	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
ACTA No 2	10/09/2024							

8. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE OBRA	1	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1	INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1
TRABAJADORA SOCIAL	1	TRABAJADORA SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1		
ALMACENISTA	1		
JEFE DE PERSONAL	1		
MAESTRO DE OBRA	1		
OFICIALES	4		
AYUDANTES	10		

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Se reiniciaron las labores esta semana se inicio con la llegada de la formaleta para hacer los bloques en concreto en la obra, continuamos con el retrazo en la obra el motivo principal es por la falta de personal en obra. El contratista se compromete a mejorar el rendimiento una vez le llegue el resto del hierro para iniciar con las vigas aereas. se recomienda continuar con otros frentes donde ya se tiene pista para trabajar.

OBSERVACIONES

Continuar con el Plan de contingencia, ya con la prorrogra aprovada se debe aprovechar el tiempo lo mejor posible para poder mejorar el rendimiento de las labores a ejecutar ya que el fuerte invierno en la zona no aminora, se le exige al contratista una ves reinicie los trabajos trabajar jornadas extendidas para poder cumplir con la reprogramacion.

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

*Después de iniciar las actividades en obra esta interventoria tiene por prioridad estar pendiente de los EPP como lo son el casco, las botas de seguridafd industrial, las gafas que se utilizan para evitar accidentes en los ojos, guantes y los cuidados que debe manejar el trabajador para su seguridad integral, se le reitera al contratista renovar la dotacion de guantes, gafas y chalecos que se encuentran en mal estado y algunos obreros ya no los tienen.

Elaborado por:

YOMA LYSANDRA PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.848 - 2

FIRMA /
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE RAMADA PARA ELABORACION DE BLOQUES EN LA OBRA



CONSTRUCCION DE RAMADA PARA ELABORACION DE BLOQUES EN LA OBRA



CONSTRUCCION DE RAMADA PARA ELABORACION DE BLOQUES EN LA OBRA



CONSTRUCCION DE RAMADA PARA ELABORACION DE BLOQUES EN LA OBRA

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTON DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No: 29		**MES: ENERO**			**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-CM de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"	**DEL**	**20-ene-25**	**AL**	**26-ene-25**
INTERVENTOR: **YORK STIVENSON PEREA AYALA**		**DIRECTOR DE INTERVENTORA. ING. KATHERINE HINESTROZA**		**DIRECTOR DE OBRA: ARQ YEISON ALBORNOZ RIVAS**			


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

MANAGRÚ - MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	$ 1.165.289.991,34		
PLAZO	VEINTE (20) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGAS N° 1,2,3,4:	Cuatro (11) meses y seis (6) días			**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	Miercoles, 30 de julio de 2025		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 5.325.747.616,34			**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 1.664.183.050,00		
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	168 DIAS			**PLAZO RESTANTE:**	275 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,33%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	37,49%	**PROGRAM. SEMANA**	1,21%	**PROGRAM. ACUMULADO**	40,88%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 17.556.403,03	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 1.996.720.708,16	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 64.473.886,36	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 2.177.088.470

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DEL CONVENIO

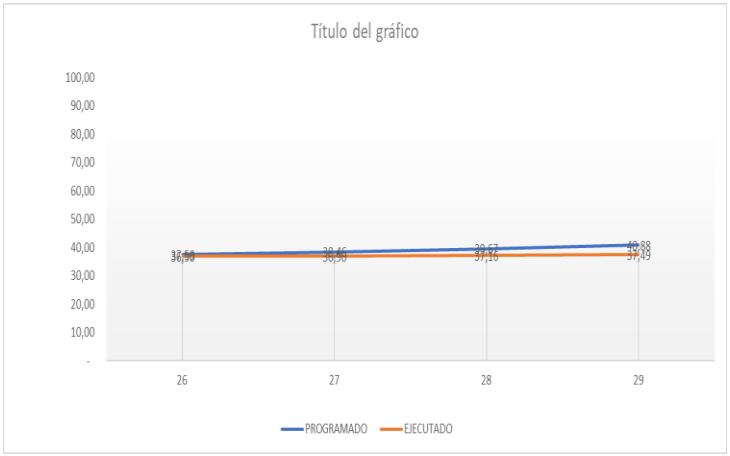

4. RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO INICIAL				
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.			
1	REPLANTEO GENERAL	$ -	$ 8.749.820,88	$ 8.749.820,88
2	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ 24.854.164,80	$ 24.854.164,80
3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 53.056.766,88	$ 53.056.766,88
4	RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	$ -	$ 205.304.425,00	$ 205.304.425,00
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	$ -	$ 190.842.473,28	$ 190.842.473,28
6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ 20.939.682,26	$ 20.939.682,26
7	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 31.779.286,76	$ 31.779.286,76
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3500 PSI	$ -	$ 85.229.821,75	$ 85.229.821,75
9	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO. SUMIN. FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	$ -	$ 50.868.480,00	$ 50.868.480,00
10	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ 327.157.806,42	$ 327.157.806,42
11	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ 30.943.133,34	$ 30.943.133,34
12	MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	$ -	$ -	$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	$ -	$ 4.400.917,92	$ 4.400.917,92
14	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ 11.279.580,33	$ 11.279.580,33
15	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -
16	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -
17	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -
18	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
19	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -
20	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ -	$ -
21	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -
22	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
26	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
	COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -
40	RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) [SUMINISTRO E INSTALACIÓN]	$ -	$ 13.828.536,90	$ 13.828.536,90
41	RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) [SUMINISTRO E INSTALACIÓN]	$ -	$ 2.710.497,00	$ 2.710.497,00
42	PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) [SUMINISTRO E INSTALACIÓN]	$ -	$ 197.008,00	$ 197.008,00
43	PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) [SUMINISTRO E INSTALACIÓN]	$ -	$ -	$ -
44	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 6.128.626,00	$ 6.128.626,00
45	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.8M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 4.602.060,00	$ 4.602.060,00
46	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 15.166.281,00	$ 15.166.281,00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	$ -	$ 462.879,01	$ 462.879,01
48	MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	$ -	$ 205.339.834,58	$ 205.339.834,58
49	MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO 5 O SIMILAR	$ 6.841.494,03	$ -	$ 6.841.494,03
50	MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	$ 6.131.596,75	$ -	$ 6.131.596,75
		$ -		
	SUBTOTAL	$ 12.973.090,78	$ 1.209.841.692,62	$ 1.222.814.693,41
	A.I.U	$ 4.622.312,25	$ 431.966.369,24	$ 436.588.681,49
	VALOR TOTAL	$ 17.595.403,03	$ 1.641.807.353,86	$ 1.659.403.754,89

AVANCE EJECUTADO	37,49%	
AVANCE PROGRAMADO	40,88%	
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	-3,39%	

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	VR_UNITARIO	VR/PARCIAL EJECUTADO	VR/PARCIAL ACUMULADO
REPLANTEO GENERAL	M2	0,00	0	753,94	$ 11.607,00	$ -	$ 8.749.820,88
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	753,94	$ 32.970,00	$ -	$ 24.854.164,80
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	19.598,64	$ 2.707,00	$ -	$ 53.056.766,88
RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,00	0	1.264,27	$ 159.824,00	$ -	$ 205.304.425,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	M3/KM	0,00	0	33.398,71	$ 3.199,00	$ -	$ 190.842.473,28
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	496,66	$ 42.161,00	$ -	$ 20.939.682,26
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	12.913,16	$ 2.461,00	$ -	$ 31.779.286,76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3500 PSI	M3	0,00	0	164,91	$ 491.675,00	$ -	$ 85.229.821,75
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO. SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3	0,00	0	91,10	$ 950.525,00	$ -	$ 50.868.480,00
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	37,54	$ 824.271,00	$ -	$ 30.943.133,34
MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	M2	0,00	0	0,00	$ 95.696,00	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	M2	0,00	0	753,94	$ 5.838,00	$ -	$ 4.400.917,92
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	37.894,23	$ 8.654,00	$ -	$ 327.157.806,42
COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	75,64	$ 958.960,00	$ -	$ 72.538.230,52
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 935.553,00	$ -	$ -
BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 30CM X 20CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	0,00	0	0,00	$ 43.738,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	1.303,49	$ 8.654,00	$ -	$ 11.279.580,33
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	0	88,54	$ 207.349,00	$ -	$ 18.432.914,54
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	2.312,44	$ 17.833,00	$ -	$ 41.243.691,32
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	0,00	$ 6.746,00	$ -	$ -
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	0,00	$ 42.161,00	$ -	$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	0,00	$ 2.461,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 896.592,00	$ -	$ -
RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) [SUMINISTRO E INSTALACIÓN]	ML	0,00	0	286,92	$ 67.121,00	$ -	$ 13.828.536,90
RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) [SUMINISTRO E INSTALACIÓN]	ML	0,00	0	25,50	$ 106.294,00	$ -	$ 2.710.497,00
PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) [SUMINISTRO E INSTALACIÓN]	UN	0,00	0	4,00	$ 123.130,00	$ -	$ 492.520,00
PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) [SUMINISTRO E INSTALACIÓN]	UN	0,00	0	0,00	$ 102.414,00	$ -	$ -
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	7,00	$ 875.518,00	$ -	$ 6.128.626,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.8M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	6,00	$ 767.010,00	$ -	$ 4.602.060,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	23,00	$ 659.707,00	$ -	$ 15.166.896,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	UN	0,00	0	1,00	$ 79.638,00	$ -	$ 79.638,00
MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO 5 O SIMILAR	M²	53,54	19	98,27	$ 98.700,00	$ 5.466.960,00	$ 9.787.191,94
MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	M²	42,72	10	76,36	$ 103.713,00	$ 4.516.166,22	$ 8.682.161,32
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M²	0,00	0	464,22	$ 417.956,00	$ -	$ 202.394.380,98
SUB TOTAL SEMANA						$ -	$ 1.356.851.994,51
					AIU	$ -	$ 402.849.348,26
					TOTAL SEMANA 29	$ 17.595.403,03	$ 1.759.701.313
						0,33%	37,49%

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% CANTIDAD PROGRAMADA	OBSERVACION
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	45,94	20	
CONCRETO DE FC=4000 PSI GRAVA COMÚN ADICIONANDO MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO Y MORTERO, PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CONCRETO PREMEZCLADO SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL DISEÑO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS.	M3	7,83	40	
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	m3	12,96	100	

7. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	si	8-mar-23	30-nov-25	$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208899
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION	si	8-mar-23	30-jul-25	$ 1.664.183.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208899
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	si	8-mar-23	30-jul-28	$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208899
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	si	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208899
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	si	8-mar-23	31-oct-25	$ 232.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-45-101027222

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA No. 1	8/05/2024		1	1.165.289.991,34	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	4 MESES 6 DIAS	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
ACTA No 2	10/09/2024							

8. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE OBRA	1	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1	INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1
TRABAJADORA SOCIAL	1	TRABAJADORA SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1		
ALMACENISTA	1		
JEFE DE PERSONAL	1		
MAESTRO DE OBRA	1		
OFICIALES	4		
AYUDANTES	10		

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Se sugiere al contratista continuar con las actividades ya iniciadas y abrir mas frenteside trabajo, seguir con la elaboracion y pega de los bloques en concreto, seguir con las instalaciones sanitarias y terminar las cajas de inspeccion. ya que el retrazo se hace cada dia mas grande, toca tener minimo otros dos frentes de trabojos activos. El contratista se compromete a mejorar el rendimiento una vez le llegue el resto del hierro y tuberia a la obra y una ves supere unos problemas de orden publico en la zona.

OBSERVACIONES

Continuar con el Plan de contingencia, Una vez el contratista supere los problemas de llegada de material y orden publico en la zona tener todos los frentes de trabajo activos para poder cumpir con lo programado ya que hay via libre para trabajar la mayoria de las actividades de la obra.

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

*Después de iniciar las actividades en obra esta interventoria tiene por prioridad estar pendiente de los EPP como lo son el casco, las botas de seguridafid industrial, las gafas que se utilizan para evitar accidentes en los ojos, guantes y los cuidados que debe manejar el trabajador para su seguridad integral, se le reitera al contratista renovar la dotacion de guantes, gafas y chalecos que se encuentran en mal estado y algunos obreros ya no los tienen.

Elaborado por:

YOMA STEVENSON PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.848 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



BASE PARA APOYO DE MAQUINA PARA APOYO DE BLOQUERA



INSTALACIÓN DE BLOQUERA EN OBRA



ELABORACION DE BLOQUES DE 20CM



PEGA DE MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE No. 5 O SIMILAR

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTON DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No: 30		**MES: ENERO**			**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-CM-de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"		**DEL** 27-ene-25	**AL**	2-feb-25
INTERVENTOR:**YORK STIVENSON PEREA AYALA**		**DIRECTOR DE INTERVENTORA. ING. KATHERINE HINESTROZA**		**DIRECTOR DE OBRA: ARQ YEISON ALBORNOZ RIVAS**			


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

MANAGRÚ - MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	$ 1.165.289.991,34		
PLAZO	VEINTE (20) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGAS N° 1,2,3,4:	Cuatro (11) meses y seis (6) dias			**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	Miercoles, 30 de julio de 2025		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 5.325.747.616,34			**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 1.664.183.050,00		
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	69 DIAS			**PLAZO RESTANTE:**	166 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,57%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	38,06%	**PROGRAM. SEMANA**	1,05%	**PROGRAM. ACUMULADO**	41,93%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 30.100.509,44	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 2.026.821.217,60	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 55.725.232,37	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 2.233.185.785

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DEL CONVENIO

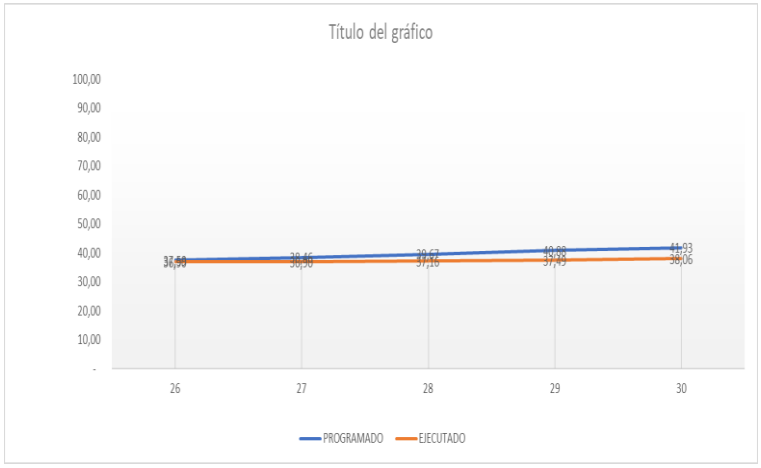

4. RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO INICIAL

ITEM	DESCRIPCION	SUMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.			
1	REPLANTEO GENERAL	$ -	$ 8.749.820,88	$ 8.749.820,88
2	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ 24.854.104,80	$ 24.854.104,80
3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 53.056.766,88	$ 53.056.766,88
4	RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	$ -	$ 255.334.425,00	$ 255.334.425,00
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	$ -	$ 100.842.473,29	$ 100.842.473,29
6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ 20.029.882,26	$ 20.029.882,26
7	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 31.779.286,79	$ 31.779.286,79
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	$ -	$ 85.229.821,75	$ 85.229.821,75
9	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO. SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	$ -	$ 50.868.480,00	$ 50.868.480,00
10	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ 327.157.606,42	$ 327.157.606,42
11	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ 30.943.133,34	$ 30.943.133,34
12	MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	$ -	$ -	$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	$ -	$ 4.400.917,92	$ 4.400.917,92
14	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ 11.279.580,33	$ 11.279.580,33
15	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -
16	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -
17	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -
18	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
19	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -
20	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ -	$ -
21	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -
22	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
26	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
	COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ -	$ -
40	RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 13.828.536,90	$ 13.828.536,90
41	RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 2.710.497,00	$ 2.710.497,00
42	PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 197.008,00	$ 197.008,00
43	PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -
44	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 6.128.626,00	$ 6.128.626,00
45	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.8M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 4.602.060,00	$ 4.602.060,00
46	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 15.196.261,00	$ 15.196.261,00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	$ -	$ 462.879,01	$ 462.879,01
48	MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	$ -	$ 205.308.834,58	$ 205.308.834,58
49	MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO 5 O SIMILAR	$ 10.940.360,40	$ -	$ 10.940.360,40
50	MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	$ 12.263.193,51	$ -	$ 12.263.193,51
		$ -		

AVANCE EJECUTADO	**38,06%**	SUBTOTAL	$ 22.209.583,91	$ 1.209.843.692,63	$ 1.233.053.596,58
		A.I.U	$ 6.660.525,44	$ 432.964.369,24	$ 439.335.904,68
		VALOR TOTAL	$ 30.100.509,44	$ 1.640.867.263,86	$ 1.672.389.510,26
AVANCE PROGRAMADO	**41,93%**				
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	**-3,87%**				

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	VR_UNITARIO	VR/PARCIAL EJECUTADO	VR/PARCIAL ACUMULADO
REPLANTEO GENERAL	M2	0,00	0	753,94	$ 11.607,00	$ -	$ 8.749.820,88
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	753,94	$ 32.970,00	$ -	$ 24.854.104,80
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	19.598,64	$ 2.707,00	$ -	$ 53.056.766,88
RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,00	0	1.264,27	$ 159.824,00	$ -	$ 255.334.425,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	M3/KM	0,00	0	33.398,71	$ 3.198,00	$ -	$ 106.842.473,29
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	496,00	$ 42.181,00	$ -	$ 20.929.882,26
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	12.913,16	$ 2.461,00	$ -	$ 31.779.286,79
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,00	0	164,91	$ 491.675,00	$ -	$ 85.229.821,75
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO. SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3	0,00	0	91,10	$ 995.525,00	$ -	$ 50.868.480,00
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	37,54	$ 824.271,00	$ -	$ 30.943.133,34
MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	M2	0,00	0	0,00	$ 95.696,00	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CALIBRE 6	M2	0,00	0	753,94	$ 5.838,00	$ -	$ 4.400.917,92
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	37.894,23	$ 8.454,00	$ -	$ 327.157.606,42
COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	75,64	$ 958.960,00	$ -	$ 72.536.238,52
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 935.553,00	$ -	$ -
BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 30CM X 20CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDO Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	0,00	0	0,00	$ 45.738,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	1.303,40	$ 8.454,00	$ -	$ 11.279.580,33
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	0	88,54	$ 207.349,00	$ -	$ 18.432.014,54
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	2.312,44	$ 17.833,00	$ -	$ 41.263.991,32
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.454,00	$ -	$ -
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	0,00	$ 6.746,00	$ -	$ -
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	0,00	$ 42.181,00	$ -	$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	0,00	$ 2.461,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.454,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (UAS) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.454,00	$ -	$ -
COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	0,00	$ 896.592,00	$ -	$ -
RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	286,92	$ 67.121,00	$ -	$ 13.828.536,90
RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	25,50	$ 106.294,00	$ -	$ 2.710.497,00
PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	19	2,40	$ 133.138,00	$ -	$ 295.512,00
PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	0,00	$ 102.414,00	$ -	$ -
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	7,00	$ 875.518,00	$ -	$ 6.128.626,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.8M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	6,00	$ 767.010,00	$ -	$ 4.602.060,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	23,00	$ 660.707,00	$ -	$ 15.196.261,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	UN	0,00	0	1,00	$ 79.638,00	$ -	$ 79.638,00
MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO 5 O SIMILAR	M2	89,73	12	167,38	$ 98.700,00	$ 8.853.839,25	$ 16.571.011,00
MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	M2	85,46	12	161,71	$ 105.715,00	$ 9.032.372,43	$ 17.094.473,95
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M. CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M2	0,00	0	404,20	$ 417.956,00	$ -	$ 177.307.606,64

SUB TOTAL SEMANA			$ 1.349.473.798,19
	AIU	$ -	$ 450.835.770,68
	TOTAL SEMANA 30	$ 30.100.509,44	**$ 1.750.112.568,87**
		0,57%	**38,06%**

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% CANTIDAD PROGRAMADA	OBSERVACION
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	22,07	10	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	7,20	100	

7. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	si	8-mar-23	30-nov-25	$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208669
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION	si	8-mar-23	30-jul-25	$ 1.064.183.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208669
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	si	8-mar-23	30-jul-26	$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208669
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	si	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 532.074.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208669
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	si	8-mar-23	31-oct-25	$ 232.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101027222

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA No. 1	8/05/2024		1	1.165.289.971,34	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	4 MESES 6 DIAS	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
ACTA No 2	10/09/2024							

8. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE OBRA	1	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1	INGENIERO AMBIENTAL - SISO	1
TRABAJADORA SOCIAL	1	TRABAJADORA SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1		
ALMACENISTA	1		
JEFE DE PERSONAL	1		
MAESTRO DE OBRA	1		
OFICIALES	4		
AYUDANTES	10		

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Se continua con la misma actividad de la semana anterior, se le exige al contratista abrir mas frentesde trabajo, seguir con la elaboracion y pega de los bloques en concreto, seguir con las instalaciones sanitarias y terminar las cajas de inspeccion. ya que el retrazo se hace cada dia mas grande, toca tener minimo otros dos frentes de trabojos activos. El contratista se compromete a mejorar el rendimiento una vez le llegue el resto del hierro y tuberia a la obra y una ves se superen los problemas de orden publico en la zona.

OBSERVACIONES

Poner a funcionar de la mejor manera el Plan de contingencia para que se puesda notar un mejor avance en las actividades a ejecutar. para poder cumpir con lo programado ya que hay via libre para trabajar la mayoria de las actividedes de la obra.

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

*Después de iniciar las actividades en obra esta interventoria tiene por prioridad estar pendiente de los EPP como lo son el casco, las botas de seguridahd industrial, las gafas que se utilizan para evitar accidentes en los ojos, guantes y los cuidados que debe manejar el trabajador para su seguridad integral, se le reitera al contratista renovar la dotacion de guantes, gafas y chalecos que se encuentran en mal estado y algunos obreros ya no los tienen.

Elaborado por:

YOMA STIVENSON PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.848 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORACION Y PEGA DE MURO EXTERNO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL



PEGA DE MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE No. 5 O SIMILAR
