AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL



INFORME INTERVENTORÍA

16 Diciembre - 16 Enero

2023

ELSA TORRES ARENALES

CONTRATO No. 22001197 H3 de 2022

BOGOTÁ D.C

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ


CONTROL DE IDENTIFICACIÓN, REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE DE DOCUMENTO: INFORME MENSUAL No. 04

PERIODO DE FACTURACION: 16 - DIC - 2022 / 16 - ENE - 2023

FECHA DE EVALUACION: 18 DE ENERO DEL 2023

No. Revisión			Rev. 0
APROBACIÓN	Responsables Elaboración Equipo Interventoría	Nombre / Cargo	Ing. Paula Orjuela López Ingeniera residente
		Nombre / Cargo	Ing. Marcela Díaz Ingeniera residente
		Nombre / Cargo	Ing. Felipe Vallejo Ingeniero residente
		Fecha	18 de Enero de 2023

No. Revisión			Rev. 0
APROBACIÓN	Vo. Bo. Director de Interventoría	Nombre	Ing. Luis Rodríguez
		Firma	
		Fecha	18 de Enero de 2023

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

No.	FECHA	SECCIÓN MODIFICADA	OBSERVACIONES
0	18-Ene-2023	Documento versión 0	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5

2 ANTECEDENTES DEL CONTRATO 6

3 DATOS GENERALES 8

3.1 Estado general del contrato de obra e interventoría 8

3.2 Información general del contrato de obra e interventoría 9

4 CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 11

4.5 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas 15

5 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 16

6 LABORATORIOS Y ENSAYOS 20

7 CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 21

8 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS 22

9 FORMATOS DE CONTROL 51

10 REGISTRO FOTOGRÁFICO 57

11 GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES 66

12 ANEXOS 69

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Programación 03 de octubre de 2022 11
Ilustración 2 Programación 06 de diciembre de 2022..... 12
Ilustración 3 Programación 06 de diciembre de 2022..... 13
Ilustración 4 Gráfico avance del contrato de obra 16
Ilustración 5 Gráfica presupuestal contrato de obra No. 22001132 H4 DE 2022..... 21
Ilustración 6 Suministro y aplicación de pintura para señalización horizontal en pista sur 57
Ilustración 7 Poda de zonas verdes dentro de zona de seguridad de las pistas..... 57
Ilustración 8 Poda de zonas verdes fuera de zona de seguridad de las pistas..... 58
Ilustración 9 Poda de árboles de altura variable y diferentes portes..... 58
Ilustración 10 Mejoramiento y conservación - canales 59
Ilustración 11 Mejoramiento y conservación de cerramientos 59
Ilustración 12 Actividades propias del equipo de contingencia..... 60
Ilustración 13 Implementación de plan de manejo de plagas en zonas no concesionadas. 60
Ilustración 14 Inspecciòn de maquinaria y equipos. 61
Ilustración 15 Tanqueo de combustible..... 61
Ilustración 16 Inspección de extintores, botiquín y camilla de emergencia, Contratista e Interventoria..... 62
Ilustración 17 Inspección actividad prolongación de la altura del cerramiento costado Fontibón..... 62
Ilustración 18 Inspección de documentación SST (preoperacionales, permisos y ATS)... 63
Ilustración 19 Recorrido inspecciòn roceria zona 45 63
Ilustración 20 Inspecciòn de sticker, jornada nocturna. 64
Ilustración 21 Inspecciòn de puntos ecologicos y acopio de residuos sòlidos y peligrosos. 64
Ilustración 22 Recorrido de inspecciòn de tubos Manejo Integrado de Plagas. 65
Ilustración 23 Recorrido inspecciòn de tubos Manejo Integrado de Plagas.Fuente: Elsa Torres Arenales. 65

TABLAS

Tabla 1 Datos generales de obra 9
Tabla 2 Datos generales de interventoría 10
Tabla 3 Comites seguimiento de obra 14
Tabla 4 Cuadro programado vs ejecutado 18
Tabla 5 Estados cobros obra 19
Tabla 6 Estados cobros interventoría 19
Tabla 7 Personal de obra que laboró durante el periodo 45
Tabla 8 Personal contratista operativo 51
Tabla 9 Personal contratista administrativo 52
Tabla 10 Personal Construbase SAS 53
Tabla 11 Personal cerramiento Construobras Viales 53
Tabla 12 Personal TECNICONTROL 53
Tabla 13 Personal OTILIO NICOLAS MORENO 54
Tabla 14 Personal JOSE ARGEON MORA 54
Tabla 15 Personal ASR INGENIERIA 54
Tabla 16 Equipamiento cuadrilla de contingencia 55
Tabla 17 Equipamento obra 55
Tabla 18 Registro precipitaciones durante el periodo 56
Tabla 19 Documentación recibida por interventoría No.1 66
Tabla 20 Documentación enviada por interventoría 67

1 INTRODUCCIÓN

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de la Misión Institucional guiada a garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del país.

El alcance del contrato de obra cuyo objeto es “REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ”, obliga al CONTRATISTA (CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022), a cumplir con lo previsto en los pliegos de condiciones, anexos técnicos y la normatividad vigente que rige este tipo de proyectos a nivel nacional.

La Interventoría a cargo de ELSA TORRES ARENALES como representante de la AEROCIVL realizará la supervisión, la vigilancia, control, seguimiento y acompañamiento a las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato No. 22001197 H3 DE 2022, que tiene por objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.

El siguiente informe contiene el estado y avance del contrato No. 22001132 H4 DE 2022, a cargo de CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022, en el periodo de facturación comprendido entre el 16 de diciembre de 2022 al 16 de enero de 2023.

2 ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El Aeropuerto Internacional El dorado se encuentra localizado a 13,35 kilómetros al occidente del centro (Plaza de Bolívar) de Bogotá, entre las localidades de Fontibón y Engativá. Se cataloga como el primer aeropuerto en transporte de carga y el tercer aeropuerto de mayor número de pasajeros movilizados en América Latina, luego del aeropuerto de la ciudad de México y el Aeropuerto de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Ubicado en las coordenadas ARP 04°42´05,76N – 74°08´49,00´W, a una altura de 2.548,16 MSL, con temperatura promedio de referencia de 20°C.

En la actualidad el lado tierra del Aeropuerto Internacional Eldorado, se encuentra concesionado a OPAIN S.A., y la AEROCIVIL tiene a su cargo en el lado aire: pistas y calles de rodaje, zonas de seguridad, sistema de radio ayudas y de navegación aérea, torre de Control y el Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia – CGAC. Actualmente el Aeropuerto Internacional El Dorado cuenta con dos pistas con orientación 13L/31R y 13R/31L), con longitudes de 3.800 metros y un ancho de 45 metros, las cuales operan a una elevación cercana a los 2.547 metros sobre el nivel medio del mar.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, se encuentra interesada en REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ con el fin de conllevar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, se tomará medidas preventivas y correctivas en la infraestructura aeroportuaria y de esta forma se garantiza la prestación y operación del servicio en el aeropuerto para lograr un avance de la actividad comercial, seguridad operacional y mayor cubrimiento del estado en zonas apartadas del país, basada en la normatividad vigente en materia aeroportuaria.

Además, se le da cumpliendo a uno de los propósitos de la Entidad el cual es preservar el patrimonio público mitigando el impacto negativo visual que genera el deterioro avanzado de la infraestructura aeroportuaria, así como mejorar la imagen institucional recuperando dicha infraestructura, realizando actividades de mantenimiento, adecuación y rehabilitación, teniendo en cuenta la normatividad establecida por la U.A.E.A.C (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil) en la sección décimo cuarto del reglamento aeronáutico de Colombia referente al numeral 14.2.2 Estudio, construcción y reformas de aeródromos, aeropuertos, helipuertos e Instalaciones, garantizando la seguridad y la calidad en la prestación de servicios a través del mantenimiento y conservación de la infraestructura aeroportuaria

Así mismo, y en consideración a la terminación del contrato de concesión No. CODAC 0110 OP suscrito desde el año 1995 entre la Compañía de Desarrollo Aeropuerto Eldorado CODAC S.A., y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, además con el fin de garantizar los niveles de seguridad en la operación del aeropuerto, existe la obligación por parte de la AEROCIVIL de llevar cabo procesos de contratación con el fin de ejecutar los mantenimientos rutinarios de la infraestructura lado aire, que se encontraban a cargo de dicho concesionario.

Áreas a cargo de la Aeronáutica Civil:

- Pistas
- Calles de Rodaje
- Torre de Control
- Edificios con equipos de radio-ayudas de aeronavegación y visuales
- Zonas de seguridad
- Edificio SEI

3 DATOS GENERALES

3.1 Estado general del contrato de obra e interventoría

El acta de inicio del contratista de oba CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022 y la Interventoría ELSA TORRES ARENALES para el presente proyecto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.” se suscribió el día 05 de septiembre de 2021, con un plazo estimado para la ejecución del presente contrato hasta el 16 de diciembre de 2022.

De acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato y las condiciones requeridas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, para esta contratación, se busca mejorar a corto plazo la prestación del servicio a los usuarios y proporcionar condiciones en infraestructura para el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional del orden Nacional e Internacional, mediante la ejecución de actividades de mantenimiento aplicados a la infraestructura lado aire, así como la atención oportuna de las eventualidades o casos de emergencia que surjan durante las 24 horas del día, en desarrollo del alcance del contrato de obra y durante su plazo de ejecución. Finalmente, el contrato permite contar con un plan de mantenimiento estructurado, el cual será aplicable para dar continuidad al mantenimiento de la infraestructura del aeropuerto El Dorado de Bogotá D.C.

El contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 22001132 H4 de 2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato, de igual forma el Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación de obras y/o inmuebles por adhesión en la zona del proyecto.

En este sentido con oficio INT-AERODORADO-219-2022 del 06 de diciembre del 2022 se hizo solicitud aprobación de prórroga por veinticuatro (24) días hasta el 09 de enero de 2023 a la Aerocivil, lo anterior en virtud de lo expuesto en el manual de contratación de la Aerocivil y la solicitud de trámite del contratista recibida por oficio 164-22-CLI-C&J2022-DIR, en donde se sustentaba las razones técnicas de requerir la prórroga debido al estado del clima y su afectación en la terminación de las actividades que se realizan a la intemperie.

El día 02 de enero de 2023 se recibió del CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022 el oficio 164-22-CLI-C&J2022-DIR donde solicitaba prorroga y adición presupuestal, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad operacional y correcto funcionamiento del aeropuerto Internacional El Dorado, posteriormente esta Interventoría pone a consideración de la Aeronáutica Civil dichos requerimientos, recibiendo aval el día 06 de enero del 2023, de prorrogar hasta el 28 de febrero de 2023 y adicionar recursos por la suma de $2.775.190.819,00 IVA incluido.

3.2 Información general del contrato de obra e interventoría

Se presenta la información general para los contratos de obra e interventoría.

3.2.1 Contrato de obra

Se presenta la información general para los contratos de obra.

Tabla 1 Datos generales de obra

CONTRATO NO.	22001132 H4 DE 2022
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
VALOR	$ 5.904.661.316.oo pesos m/cte.
EMAIL	lurrego@cyg.com.co
DIRECCIÓN	CARRERA 7 N° 75 – 52, oficina 602 Bogotá D.C
INTERVENTORÍA	ELSA TORRES ARENALES
SUPERVISOR	ING. CARLOS MAURICIO GUEVARA
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA.	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
PRÓRROGA	No. 1
PLAZO	VENTICUATRO (24) DÍAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA No.1	09 DE ENERO DE 2023
PRÓRROGA	No. 2
PLAZO	CINCUENTA (50) DÍAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA No.2	28 DE FEBRERO DE 2023
ADICIÓN	No. 1
VALOR EN NÚMEROS	$2.775.190.818
DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO	DADAS LAS NECESIDADES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

Fuente: Elsa Torres Arenales

3.2.2 Contrato de interventoría

Se presenta la información general para los contratos de interventoría.

Tabla 2 Datos generales de interventoría

CONTRATO NO.	22001197 H3 DE 2022
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ELSA TORRES ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA TORRES ARENALES
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
VALOR	$ 496.527.500.oo pesos m/cte.
EMAIL	etorresare@yahoo.es
DIRECCIÓN	Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94
SUPERVISOR	ING. CARLOS MAURICIO GUEVARA
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA.	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
PRÓRROGA	No. 1
PLAZO	VENTICUATRO (24) DÍAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA No.1	09 DE ENERO DE 2023
PRÓRROGA	No. 2
PLAZO	CINCUENTA (50) DÍAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA No.2	28 DE FEBRERO DE 2023
ADICIÓN	No. 1
VALOR EN NÚMEROS	$227.314.297 INCLUIDO IVA,
DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO	No aplica


Fuente: Elsa Torres Arenales

4 CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

4.1 Cumplimiento de programación

Mediante comunicado INT-AERODORADO-033-2022 está interventoría da aprobación a la programación de obra y el flujo de caja, recibido el día 03 de octubre del 2022 por medio de comunicado 015-22-CLI-C&J2022-DIR, por el cual se realizó el control de avance obra y las actividades adherentes al contrato de obra No. 22001132 H4 DE 2022.


Ilustración 1 Programación 03 de octubre de 2022

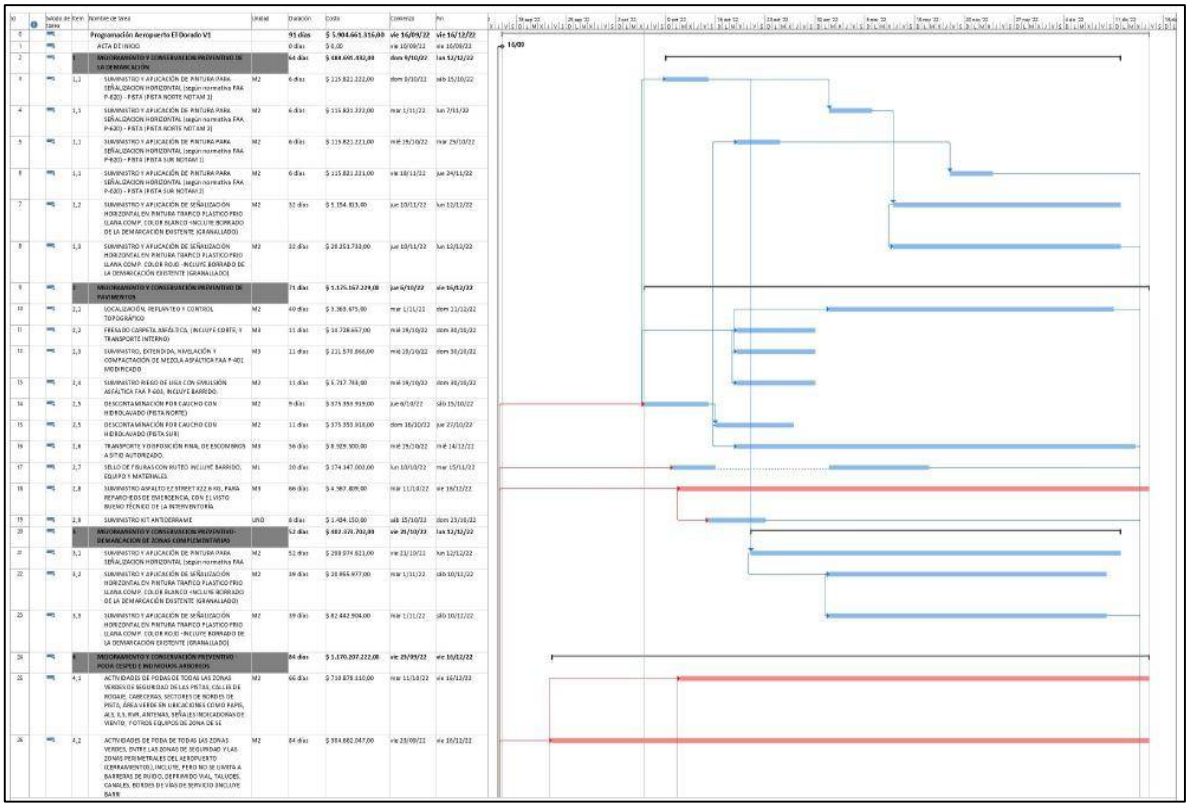

Fuente: Elsa Torres Arenales

Mediante comunicado INT-AERODORADO-219-2022, esta interventoría hizo remisión a la AEROCIVIL de solicitud de aprobación de prórroga del plazo contractual contrato de obra y actualización de programación de obra y el flujo de caja, correspondiente al modificatorio No. 1, por medio del cual se realiza el control de avance obra.


Ilustración 2 Programación 06 de diciembre de 2022

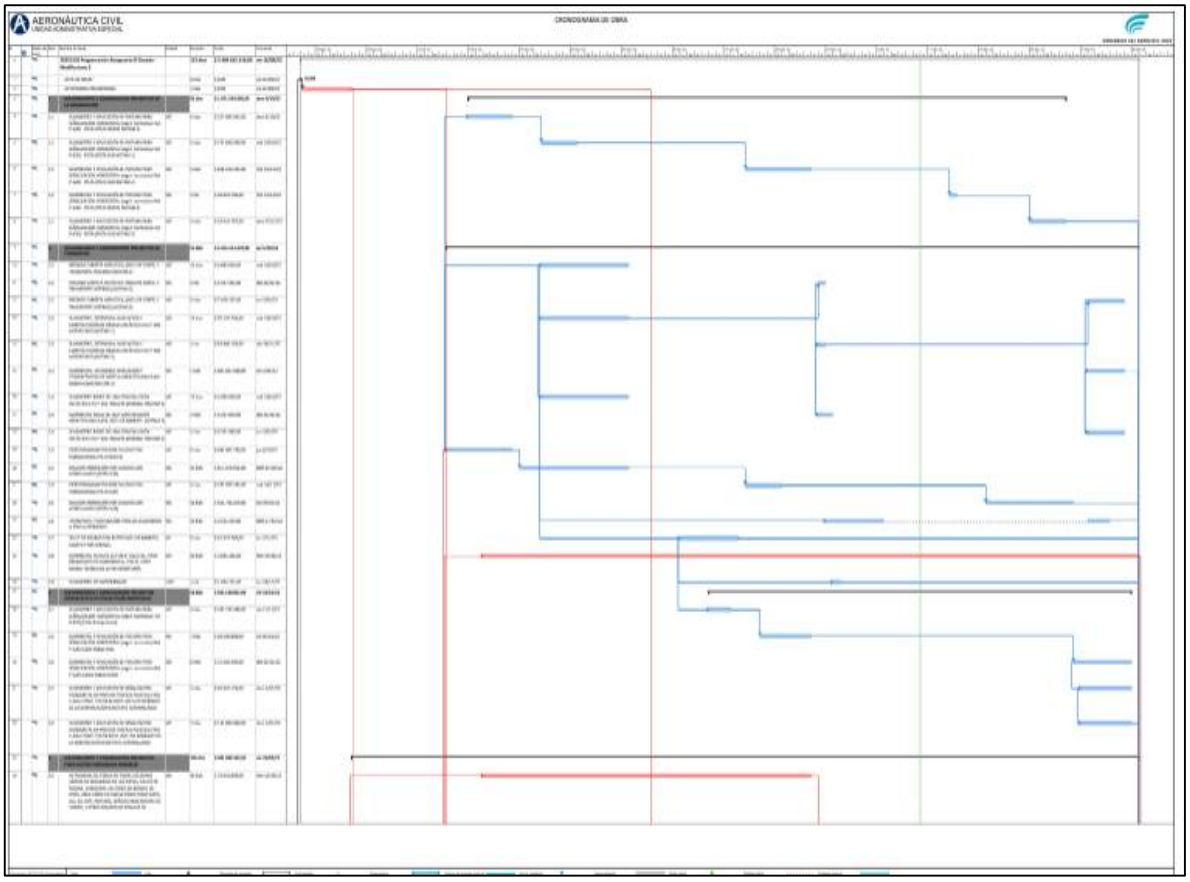

Fuente: Elsa Torres Arenales

Posteriormente, a través de oficio INT-AERODORADO-254-2022, esta interventoría hizo remisión a la AEROCIVIL de acta de modificación No.2, con asunto solicitud aprobación de prórroga y adición de recursos del contrato de obra No. 22001132 H4 de 2022, a partir de esto se realiza actualización de programación de obra y el flujo de caja, por el cual se ha realizado el control de avance obra.

Ilustración 3 Programación 06 de diciembre de 2022

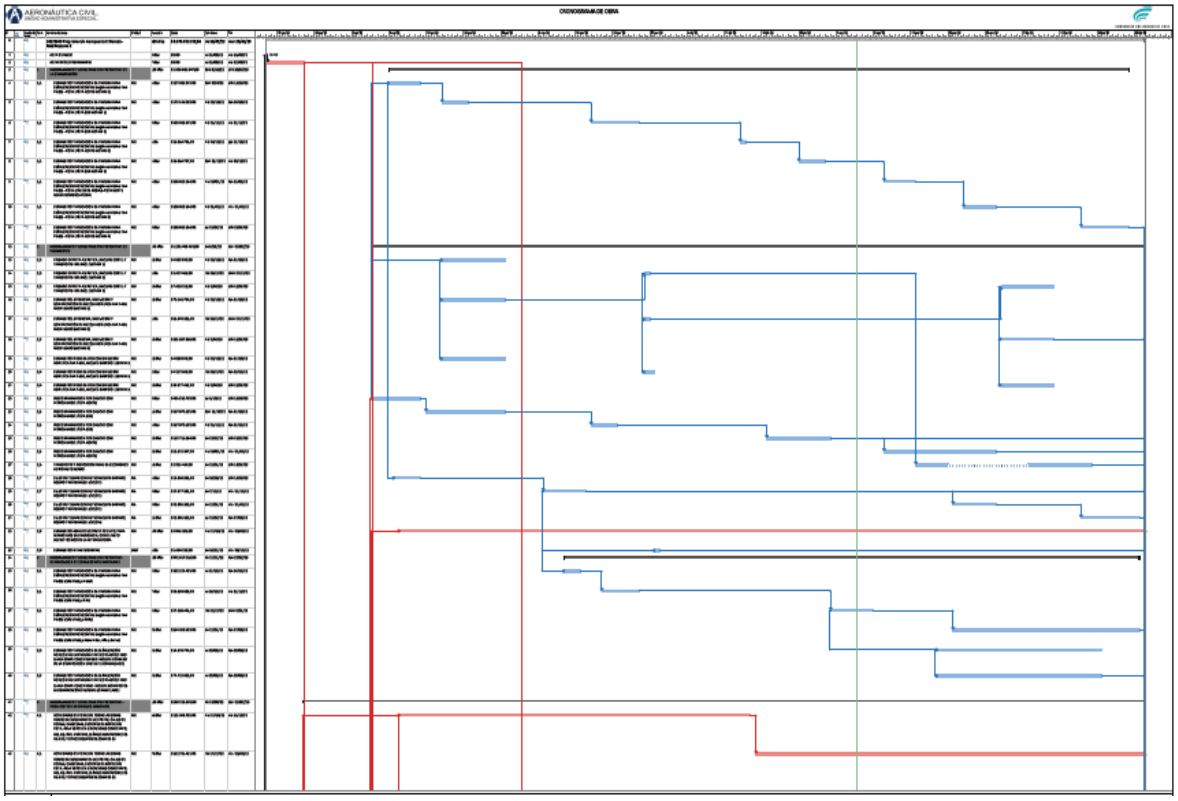

Fuente: Elsa Torres Arenales

4.2 Planes de trabajo ejecutados y programados

Para el presente mes el contratista presento a la Interventoría los planes de trabajo o procedimientos asociados a las actividades de:

- Suministro y aplicación de pintura para señalización horizontal en pista sur y pista norte, de acuerdo con nueva nomenclatura.
- Descontaminación por caucho con hidrolavado en pista norte.
- Suministro y aplicación de pintura para señalización horizontal en calles rodaje M.
- Actividades de podas de zonas verdes de seguridad de las pistas, calles de rodaje, cabeceras, sectores de bordes de pista, área verde en ubicaciones como papis, ALS, ILS, RVR, antenas, señales indicadoras de viento, y otros equipos de zona de seguridad.
- Actividades de poda de zonas verdes, entre las zonas de seguridad y zonas perimetrales del aeropuerto (cerramientos).
- Poda de árboles de altura variable y diferentes portes.

- Limpieza de rejillas, sumideros, encoles y descoles.
- Remoción de materiales sedimentados en canales pertenecientes a pista norte y pista sur.
- Mejoramiento y conservación de cerramiento externo perteneciente a perimetral de Fontibón.
- Mejoramiento y conservación de vías perimetrales de acceso y de servicio.
- Equipo de contingencia eventualidades y correctivos 24 horas incluye personal y equipos.
- Diagnóstico, implementación y mantenimiento rutinario del plan de manejo de plagas en zonas no concesionadas.

4.3 Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción

Se han realizado comités de obra, además de comités técnicos con Aerocivil para informar el estado de la obra. Se anexan actas de comité.

Tabla 3 Comites seguimiento de obra

CONTROL ACTAS DE OBRA				
CÓDIGO DE REFE.	**FECHA**	**ASUNTO**	**PARTICIPANTES**	**No. Anexo**
ACTA No. 11	12-ene-23	Seguimiento del contrato	Obra, Interventoría	Anexo 01 - ACTA No. 11

Fuente: Elsa Torres Arenales

4.4 Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato

Esta Interventoría realiza las siguientes gestiones para el cumplimiento del objeto del contrato, en la cual presenta comunicados hacia el contratista de obra, en donde se evidencia bajos rendimientos en la ejecución de las actividades necesarias para dar cumplimiento al contrato:

- INT-AERODORADO-234-2022. Asunto: actividades de mantenimiento de canales.
- INT-AERODORADO-236-2022. Asunto: reiteración programación de señalización horizontal con pintura de tráfico
- INT-AERODORADO-256-2022 Asunto: rendimientos actividades cerramiento, poda y canales.

4.5 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas

Estado actual de las actividades ejecutadas al **16-enero-2022**, presenta:


- Porcentaje de avance a la fecha de corte de este informe: 66.98%.
- Un porcentaje de adelanto, entre el costo programado vs costo ejecutado del 7,57% correspondiente a $ 657.381.946,00.

5 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

5.1 Gráfica avance físico del contrato de obra

Se presenta gráfico de avance del contrato por ítems.

Ilustración 4 Gráfico avance del contrato de obra

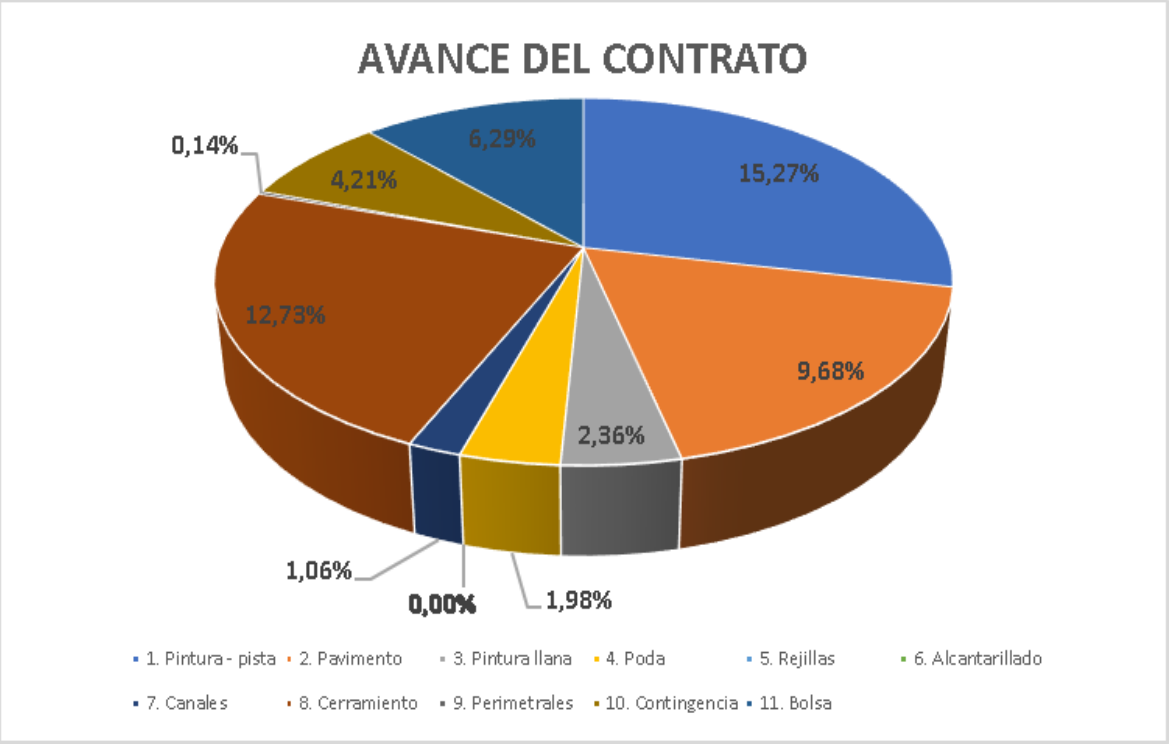

Fuente: Elsa Torres Arenales

5.2 Actividades ejecutadas en el periodo.

Durante este periodo en mención se realizaron las siguientes actividades:

- Suministro y aplicación de pintura para señalización horizontal en pista norte y pista sur.
- Actividades de podas de zonas verdes de seguridad de las pistas, calles de rodaje, cabeceras, sectores de bordes de pista, área verde en ubicaciones como papis, ALS, ILS, RVR, antenas, señales indicadoras de viento, y otros equipos de zona de seguridad.
- Actividades de poda de zonas verdes, entre las zonas de seguridad y zonas perimetrales del aeropuerto (cerramientos).

- Poda de árboles de altura variable y diferentes portes.
- Remoción de materiales sedimentados en canales pertenecientes a pista norte y pista sur.
- Mejoramiento y conservación de cerramiento externo perteneciente a perimetral de Fontibón.
- Equipo de contingencia eventualidades y correctivos 24 horas incluye personal y equipos.
- Diagnóstico, implementación y mantenimiento rutinario del plan de manejo de plagas en zonas no concesionadas.

5.3 Programación de actividades para el siguiente periodo.

De acuerdo con la programación presentada y aprobada por esta Interventoría el 06 de enero del 2023, se tiene programado realizar las siguientes actividades para el periodo de enero – febrero:

- Suministro y aplicación de pintura para señalización horizontal en pista.
- Descontaminación por caucho con hidrolavado en pista norte.
- Sello de fisuras en pista.
- Mejoramiento y conservación preventivo de pavimentos.
- Suministro y aplicación de pintura para señalización horizontal.
- Actividades de podas de zonas verdes de seguridad de las pistas, calles de rodaje, cabeceras, sectores de bordes de pista, área verde en ubicaciones como papis, ALS, ILS, RVR, antenas, señales indicadoras de viento, y otros equipos de zona de seguridad.
- Actividades de poda de zonas verdes, entre las zonas de seguridad y zonas perimetrales del aeropuerto (cerramientos).
- Poda de árboles de altura variable y diferentes portes.
- Tala de árboles de altura no mayor a 20 m y diámetros entre 0.61 m y 1,00 m.
- Limpieza de rejillas, sumideros, encoles y descoles.
- Limpieza interna de tuberías de alcantarillado, cárcamos y box coulverts.
- Remoción de materiales sedimentados en canales pertenecientes a pista norte y pista sur.
- Mejoramiento y conservación de cerramiento externo perteneciente a perimetral de Fontibón.
- Mejoramiento y conservación de vías perimetrales de acceso y de servicio.

- Equipo de contingencia eventualidades y correctivos 24 horas incluye personal y equipos.
- Diagnóstico, implementación y mantenimiento rutinario del plan de manejo de plagas en zonas no concesionadas.

5.4 Cuadro financiero del contrato

Se presenta a continuación, el listado de las actividades y el presupuesto ejecutado hasta la fecha del presente informe.

Tabla 4 Cuadro programado vs ejecutado

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
		PROG.	EJEC.
1	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVO DE LA DEMARCACIÓN	COP $ 1.280.014.579,00	COP $ 1.325.591.990,00
2	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PREVENTIVO DE PAVIMENTOS	COP $ 1.061.751.747,30	COP $ 839.924.565,00
3	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVO- DEMARCACION DE ZONAS COMPLEMENTARIAS	COP $ 304.754.989,42	COP $ 204.569.502,00
4	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PREVENTIVO - PODA CESPED E INDIVIDUOS ARBOREOS	COP $ 337.479.668,34	COP $ 172.054.818,00
5	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE REJILLAS, SUMIDEROS, ENCOLES Y DESCOLES	COP $ 55.016.834,48	COP $ -
6	LIMPIEZA INTERNA DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO, CÁRCAMOS Y BOX COULVERTS	COP $ 469.010,86	COP $ -
7	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION – CANALES	COP $ 114.397.298,02	COP $ 92.429.863,00
8	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN – CERRAMIENTOS	COP $ 1.422.299.664,86	COP $ 1.105.021.979,00
9	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION - VIAS PERIMETRALES DE ACCESO Y DE SERVICIO PAVIMENTADAS Y EN AFIRMADO	COP $ 63.654.118,00	COP $ 12.337.752,00
10	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CONTIGENCIA Y EMERGENCIA	COP $ 493.166.048,71	COP $ 365.074.515,00
11	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CONTIGENCIA Y EMERGENCIA	COP $ 23.386.967,00	COP $ 546.064.994,00

Fuente: Elsa Torres Arenales

5.4.1 Control de cobros y pagos

- Contrato de obra:
  - El corte de obra No. 01 correspondiente al periodo del 16-sep-2022 al 16-oct-2022 y fue tramitado.
  - El corte de obra No. 02 correspondiente al periodo del 16-oct-2022 al 16-nov-2022 el cual está en curso de trámite.
  - El corte de obra No. 03 correspondiente al periodo del 16-nov-2022 al 10-dic-2022 el cual está en curso de trámite.
  - El corte de obra No. 04 correspondiente al periodo del 11-dic-2022 al 16-ene-2023 el cual está en curso de trámite.

Tabla 5 Estados cobros obra

COBRO	VALOR ($)	ESTADO
Anticipo	$ 1.240.000.000,00	Pagado
Acta No. 1	$ 743.483.846,00	Pagado
Acta No. 2	$ 1,592,053,972.00	Pagado
Acta No. 3	$ 1,342,601,685.00	En tramite
Acta No. 4	$ 2,135,633,370.00	En tramite

Fuente: Elsa Torres Arenales

- Contrato de interventoría:
  - El corte de obra No. 01 correspondiente al periodo del 16-sep-2022 al 16-oct-2022, el cual está en curso de trámite.
  - El corte de obra No. 02 correspondiente al periodo del 16-oct-2022 al 16-nov-2022, el cual está en curso de trámite.
  - El corte de obra No. 03 correspondiente al periodo del 16-nov-2022 al 10-dic-2022, el cual está en curso de trámite.
  - El corte de obra No. 04 correspondiente al periodo del 11-dic-2022 al 16-ene-2023, el cual está en curso de trámite.

Tabla 6 Estados cobros interventoría

COBRO	VALOR ($)	ESTADO
Anticipo	$ 148,958,250,00	Pagado
Acta No. 1	$ 53.517.288,00	Pagado
Acta No. 2	$ 117.176.464,00	Pagado
Acta No. 3	$ 96.654.178,00	En tramite
Acta No. 4	$ 178.094.035,00	En tramite

Fuente: Elsa Torres Arenales

6 LABORATORIOS Y ENSAYOS

En el periodo del presente informe no se realizaron ensayos de laboratorio.

6.1 Copia de los laboratorios realizados durante el periodo

No aplica para este periodo.

6.2 Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos

No aplica para este periodo.

6.3 Informe de revisión de control técnico

En el periodo del presente informe, comprendido entre 16 de diciembre y 16 de enero no se realizaron ensayos de laboratorio, sin embargo durante la ejecución de las demás actividades se realizaron controles técnicos como sigue:

- Ítem 4.1 y 4.2. Actividades de podas de todas las zonas verdes dentro y fuera de las áreas de seguridad, de las pistas, calles de rodaje, cabeceras, sectores de bordes de pista, área verde en ubicaciones como PAPIS, ALS, ILS, RVR: En esta actividad se chequeó la altura del césped y se verificó la recolección y disposición final del residuo producto de la poda.
- Ítem 7.1. Mejoramiento y conservación – canales. En esta actividad se chequeó la limpieza y remoción de materiales sedimentados, reconformación de pendientes, limpieza de lodos y arenas, control de vegetación de canales de drenaje, encoles y descoles.

6.4 Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo

No aplica.

6.5 Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos

No aplica para este periodo.

7 CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

7.1 Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.

Respecto del avance del contratista sobre el cronograma de obra con fecha de inicio el 16 de septiembre de 2022 y su ejecución presupuestal se tiene los siguientes porcentajes:

	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO EN EL PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO
(%)	59,41%	16,78%	66,98%
Valor ejecutado ($)	$ 5.156.390.927,00	$1.456.841.490,57	$ 5,813,772,873.00


Estos porcentajes se presentan tomando como base la programación mensual, con un plazo de terminación al 28 de febrero del 2023, según Modificatorio No. 2.

7.2 Soporte de las actas de pago.

Los pagos correspondientes a este periodo se encuentran en trámite.

7.3 Grafica presupuestal.

Ilustración 5 Gráfica presupuestal contrato de obra No. 22001132 H4 DE 2022

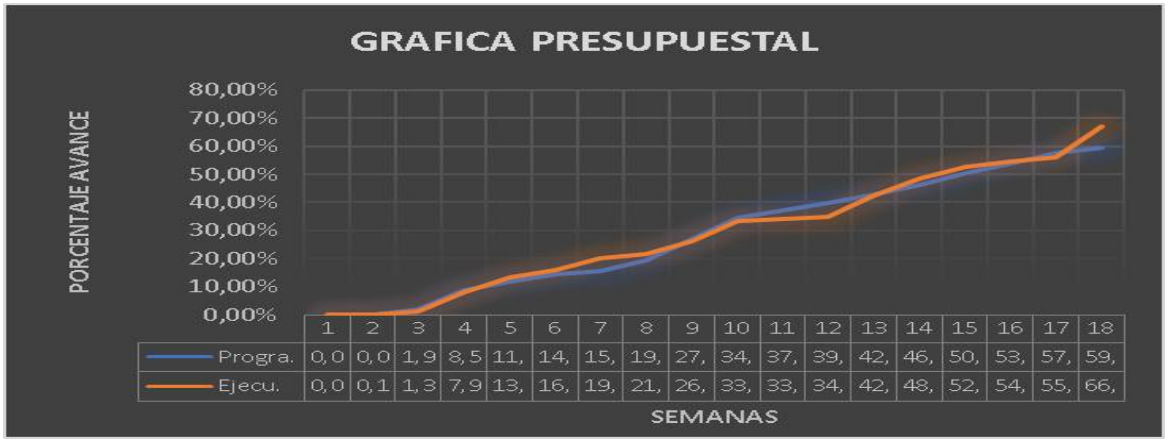

Fuente: Elsa Torres Arenales

Los porcentajes de ejecución y programación, se muestran de acuerdo al Modificatorio No. 2.

7.4 Cuadro control de pagos, gestión de pagos de obra e interventoría

Los relacionados en el ítem 5.4.1 Control de cobros y pagos.

8 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS

8.1 Gestión administrativa

Se presentan las siguientes gestiones en el presente periodo:

- Se tramitan documentos para la cartelización del personal de obra e interventoría.
- Se tramitan permisos de ingreso de maquinaria y equipos de obra e interventoría.
- Se hace entrega a la Aerocivil de informes semanales correspondientes a las actividades realizadas en obra durante el periodo en mención.
- Se ha dado alcance y tramitado los requerimientos realizados por la supervisión y contratista, dando cumplimiento a todo lo solicitado.

8.2 Gestión técnica

- Se adelantan actividades de mantenimiento en diferentes zonas de lado aire como lo son: pista norte y sur, calles de rodaje, zonas verdes dentro y fuera de áreas de seguridad y cerramiento perimetral. Entre las actividades de mantenimiento que se vienen desarrollando se puede mencionar las siguientes:
  - Suministro y aplicación de pintura para señalización horizontal en pista norte y pistar sur.
  - Actividades de podas de zonas verdes de seguridad de las pistas, calles de rodaje, cabeceras, sectores de bordes de pista, área verde en ubicaciones como papis, ALS, ILS, RVR, antenas, señales indicadoras de viento, y otros equipos de zona de seguridad.
  - Actividades de poda de zonas verdes, entre las zonas de seguridad y zonas perimetrales del aeropuerto (cerramientos).
  - Poda de árboles de altura variable y diferentes portes.
  - Remoción de materiales sedimentados en canales pertenecientes a pista norte y pista sur.
  - Mejoramiento y conservación de cerramiento externo perteneciente a perimetral de Fontibón.
  - Equipo de contingencia eventualidades y correctivos 24 horas incluye personal y equipos.
  - Diagnóstico, implementación y mantenimiento rutinario del plan de manejo de plagas en zonas no concesionadas.

- Se han atendido todas las contingencias presentadas y se han realizado acciones preventivas para evitar que se generen otras, dentro de estas actividades se ha realizado:
  - Chequeo constante del correcto funcionamiento de las motobombas, revisión del nivel del rio Bogotá.
  - Inspecciones en perímetros, cerramientos, calles de rodaje y pistas.
  - Disponibilidad de equipo de contingencia eventualidades y correctivos 24 horas x 7 días.

- Se han tramitado solicitud de prórroga y adición de recursos de acuerdo a las necesidades de seguridad operacional y correcto funcionamiento del aeropuerto Internacional El Dorado.

8.3 Gestión ambiental y social

8.3.1 Gestión ambiental

Para la ejecución de las actividades propias del contrato se cuenta con el personal, tanto por parte del Contratista como de la interventoría, en cumplimiento con el personal mínimo requerido en los documentos contractuales. Se continúa por parte del contratista, con la profesional en campo, la cual apoya las actividades desarrolladas en obra, referentes al aseguramiento de la gestión ambiental (Ingeniera Ambiental - Nerieth Del Pilar Salas Jara) y en labores documentales relacionadas con el componente, así como la Residente Ambiental de la Interventoría (Residente Ambiental – Kelly Johana Mercado García y la Especialista Ambiental Norella Galvis Méndez).

El contratista atiende la solicitud de registrar las actividades diarias desarrolladas en campo, en actas de comité, informes semanales y mensuales, del componente ambiental, según aplique.

De forma general se desarrollaron las siguientes actividades, relacionadas con el componente ambiental.

- Trabajo de carácter documental.
- Mantenimiento de señalización provisional (maletines con luces de obstrucción, colombinas etc.)
- Instalación y mantenimiento de señalización preventiva y protecciones generales, así como cartelera ambiental.
- Separación In situ de residuos sólidos.
- Entrega de residuos sólidos a gestor para trasporte, recolección, tratamiento y disposición final.
- Etiquetado de recipientes de sustancias químicas.

- Cumplimiento de capacitaciones e inducciones ambientales.
- Limpieza de canales.
- Inspecciones de área realizando ahuyentamiento de fauna, antes de iniciar labores.
- Actividades de rocería.
- Recolección de residuos de poda.
- Entrega de residuos aprovechables (pasto), generados por las actividades de rocería.
- Inducciones, capacitaciones y charlas ambientales.
- Implementación del Plan de Manejo Integral de Plagas para las áreas del Aeropuerto Internacional El Dorado.
- Mesas de trabajo Ambiental para la socialización del tercer avance de implementación de medidas contempladas en el Manejo Integrado de Plagas del Aeropuerto Internacional El Dorado en áreas concesionadas por Opain y áreas de Aerocivil.
- Poda de árboles, en el cerramiento de Fontibón, prolongación del doble cerramiento.

Asimismo, se realiza el seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente ambiental del Contratista, indicando lo siguiente:

Semana 1. Del 11 de diciembre de 2022 al 17 de diciembre de 2022.

MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE (PMA-02).

- El contratista no desarrolló actividades constructivas que generen material particulado (polvo).
- Los vehículos vinculados al contrato cuentan con los documentos vigentes aplicables al proyecto según lo estipulado en la normativa vigente Decreto 019 de 2012 y las resoluciones 3500 de 2005 y 2200 de 2006 de los Ministerios de Transporte, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los certificados de revisión técnico-mecánica y demás documentación conexa, se enuncian a continuación:

No.	TIPO	PLACA	TÈCNICO MECÁNICA
1	Camioneta	ZIU854	11/08/2023
2	Camión	GZZ966	N/A
3	Volqueta	EQO890	17/07/2023
4	Camioneta	JEF768	N/A
5	Camión	TTZ724	04/02/2023
6	Camión	WNM96	21/10/2023
7	Camioneta	TFT637	13/04/2023

- En la tabla anterior algunos automotores relacionados por el contratista no aplican en Revisión técnico-mecánica dando cumplimiento al Decreto ley 019/12 Artículo 202, donde indica: “Primera revisión de los vehículos automotores. Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico - mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6°) año contado a partir de la fecha de su matrícula”.
- De acuerdo con la Resolución 910 de 2008 del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y con base en la respuesta dada por el Ministerio de Transporte (Radicado MT No.: 20134200126561) los vehículos Nonroad (Maquinaria). NO DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA.
- Diariamente los colaboradores del contratista realizan preoperacional de las máquinas, equipos y vehículos adscritos al contrato; con la finalidad de revisar las condiciones generales (chasis, mecánicas, eléctricas y electrónicas) y llevar reporte oportuno del óptimo funcionamiento.
- El Consorcio C&J Aerocivil 2022, para las actividades constructivas del contrato, en la operación de maquinaria y equipos para el periodo reportado no realizo el uso del comprensor neumático.
- Para el periodo reportado el contratista realizo transporte de fresado, cumpliendo con los parámetros ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y técnicos, en donde las volquetas dotadas de carpas evitando emisiones de material particulado, derrame de partículas en la vía.
- Desde el área ambiental del contratista, se implementan medidas para la prevención de enfermedades auditivas, sensibilizando a los conductores que las bocinas o pitos sean utilizados en caso de emergencia, como señal de alerta y así evitar accidentes o incidentes, adicional del uso de elementos de protección personal como lo son los tapa oídos de copa e inserción.

MANEJO DE RESIDUOS (PMA-03).

Gestión:

- El contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, dispone de puntos ecológicos para la segregación de residuos sólidos convencionales (aprovechables, no aprovechables y aprovechables orgánicos) en el área administrativa se encuentra un punto con 4 canecas de 45cms, en el comedor canecas de 60cms; cumpliendo con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (P.M.A) de la Aeronáutica Civil y la resolución 2184 de 2019.
- El contratista desde el área ambiental realiza inducción de ingreso de personal directo y subcontratistas en temas ambientales, como segregación en la fuente, código de colores, contribuyendo a una educación ambiental en sensibilización y cultura al manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales, peligrosos y demás, dejando evidencia fotográfica, taller evaluativo y registro de asistencia.

Almacenamiento temporal:

- En el campamento del aeropuerto, el contratista cuenta con acopio temporal de residuos sólidos convencionales y peligrosos, los cuales cumplen con condiciones ambientales y de bioseguridad.

Transporte externo y disposición final:

- El contratista realiza entrega de 70 Kg de residuos no aprovechables (ordinarios) al gestor CIUDAD LIMPIA, el cual realiza recolección y transporte de los residuos con una frecuencia de tres días a la semana (lunes, martes y viernes) para su posterior disposición final.
- Los residuos peligrosos generados por las actividades de mantenimiento serán entregados al gestor Interaseo S.A.S, quien será el encargado del transporte, recolección, tratamiento y disposición final de los mismos; para el periodo no se realizó entrega de RESPEL al gestor.
- Los residuos orgánicos generados principalmente por la actividad de mantenimiento de zonas verdes (rocería y limpieza de canales), son recolectados y transportados por el contratista para ser aprovechados en calidad de donación por el señor Pedro Bautista, utilizado en actividades agroindustriales.
- El contratista lleva registro de las entregas de residuos orgánicos al señor Pedro Bautista producto de la rocería y limpieza de canales, en donde indica cantidad de viajes entregados, fecha de entrega, datos de la persona que entrega y la persona que recibe.
- Para esta semana el contratista reporta el aprovechamiento de 90729.32 Kg de residuos orgánicos, producto de la rocería, adicional de la poda de aproximadamente 5 árboles, ubicados en el jarrillo de Fontibón, los cuales los individuos arbóreos y las extensas ramas representan un limitante para la continuación de la actividad de "prolongación de la altura del cerramiento existente", con ramas que se extienden hasta dicho cerramiento en malla eslabonada (hacia el exterior del aeropuerto).

VERTIMIENTOS (PMA-04).

Canales de agua de lluvia.

- El Consorcio C&J Aerocivil 2022 de acuerdo con las condiciones climáticas e importancia en la evacuación de agua lluvia, realiza actividad de limpieza de canales (12), que consiste en realizar rocería en los taludes del canal, retiro de residuos, limpieza del fondo, y rocería en el espejo de agua.

REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL, DESCAPOTE Y DISPOSICIÓN DE SUELOS (PMA-05).

- El Consorcio C&J Aerocivil 2022, durante la semana no realizó actividades de retiro de cobertura vegetal, descapote y disposición de suelo.

MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE (PMA-05B).

- El grupo de Control Fauna de Opain, realizó sensibilización en temas: métodos de ahuyentamiento, como actuar si se encuentra fauna herida, etc., a los colaboradores del Consorcio C&J Aerocivil 2022 y subcontratistas.
- Al inicio de actividades de rocería el contratista realiza ahuyentamiento, (inspección de fauna silvestre), llevando registro y control por medio de formato, revisando que el área a intervenir no presente aves o cualquier otro animal silvestre que pueda ser afectado por la ejecución de las actividades, en esta semana el contratista no reportó avistamiento, ni nidos activos, ni fauna silvestre herida.
- Dando cumplimiento al cronograma de actividades en la implementación del Manejo Integral de Plagas, el contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022 en conjunto con los técnicos de Tecnicontrol Fumigaciones, termina la implementación de tubos cebaderos, mamparas y demás controles en las áreas concesionadas por Aerocivil. En las áreas de los canales, se está a la espera de la respuesta por parte del grupo de Control Fauna de OPAIN, para implementar el mecánico adecuado y acorde a las condiciones del área.

MANEJO DE MATERIALES Y SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN (PMA-06).

- Dando alcance a la ficha de manejo y control de calidad del aire (PMA-02), el contratista y su parque automotor (vehículos, maquinaria) cumplen con la revisión técnico-mecánica y de gases.
- Durante esta semana el contratista realizó transporte de fresado, aprovechado para la conformación de vías perimetrales; las volquetas utilizadas cumplen con las condiciones ambientales y de seguridad, carpadas para evitar emisiones de material particulado.

SEÑALIZACION (PMA-07).

- La señalización por parte del contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, con maletines con luces de obstrucción, en Pista Sur, motobomba No. 8, señalización provisional en la prolongación de la altura del cerramiento y señalización emergencia del campamento del Consorcio.

MANEJO DE SUELOS (PMA-09).

- En este periodo por parte del contratista no se presentaron incidentes ambientales (derrames de sustancias químicas), tampoco realizó mantenimientos a vehículos, equipo o maquinaria.
- Los vehículos y maquinaria vinculados al contrato cuentan con los documentos vigentes aplicables al proyecto según lo estipulado en la normativa vigente Decreto 019 de 2012 y las resoluciones 3500 de 2005 y 2200 de 2006 de los Ministerios de Transporte, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los certificados de revisión técnico-mecánica.

- En cada turno los operadores del contratista realizan los preoperacionales.

MANEJO AMBIENTAL PARA CAMPAMENTOS, TALLERES Y/O BODEGAS (PMA-10).

- El campamento en donde se encuentra ubicado el contratista cuenta con baños, por lo tanto, no es necesario la instalación de baños portátiles, se tiene conexión fija de agua potable y alcantarillado, este último es prestado por la empresa Interaseo Soluciones Ambientales.
- El agua para consumo humano es comprada en botellón, manteniendo un punto de hidratación.
- En las instalaciones del campamento, el contratista cuenta con un punto ecológico actualizado con el nuevo código de colores, adicional en varios puntos de obra el contratista instalo bolsas para segregación en la fuente.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN (PMA-PGS-04).

- Para el periodo reportado el contratista desde el área ambiental realizó inducción ambiental en temas: actualización de las fichas de manejo ambiental, control fauna, segregación en la fuente y nuevo código de colores al personal nuevo de pintura, subcontratista José Argeon Mora.

OBRAS CIVILES MENORES (PSM-12).

- Remoción de cobertura vegetal, descapote y disposición de suelo. Durante esta semana el contratista no realizó actividades constructivas.

Manejo de materiales y sobrantes de construcción:

Procedencia de materiales.

- Para el periodo en mención por parte del contratista no se realizó el ingreso de materiales como agregados y asfalto.

Transporte de materiales:

- Durante esta semana el contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, realizó transporte de fresado para la reconformación de vías perimetrales.

Almacenamiento temporal de material:

- El fresado generado por las actividades de mantenimiento el contratista almacena los residuos en un sitio adecuado con ubicación K4 +420, perimetral Fontibón, desde el área ambiental se verifica que por motivos de lluvia el material no tenga arrastre y ocasiones contaminación del recurso suelo, es por esto que el área se encuentra señalizada e impermeabilizada.

COMITÉS, REUNIONES:

- Durante este periodo el contratista no reporta comités o reuniones.

Atención a la comunidad.

- Para este periodo no se presentaron PQRS.

Semana 2. Del 18 de diciembre de 2022 al 24 de diciembre de 2022.

MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE (PMA-02).

- El contratista no desarrolló actividades constructivas que generen material particulado (polvo).
- Los vehículos vinculados al contrato cuentan con los documentos vigentes aplicables al proyecto según lo estipulado en la normativa vigente Decreto 019 de 2012 y las resoluciones 3500 de 2005 y 2200 de 2006 de los Ministerios de Transporte, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los certificados de revisión técnico-mecánica y demás documentación conexa, se enuncian a continuación:

No.	TIPO	PLACA	TÈCNICO MECÁNICA
1	Camioneta	ZIU854	11/08/2023
2	Camión	GZZ966	N/A
3	Volqueta	EQO890	17/07/2023
4	Camioneta	JEF768	N/A
5	Camión	TTZ724	04/02/2023
6	Camión	WNM96	21/10/2023
7	Camioneta	TFT637	13/04/2023

- En la tabla anterior algunos automotores relacionados por el contratista no aplican en Revisión técnico-mecánica dando cumplimiento al Decreto ley 019/12 Artículo 202, donde indica: “Primera revisión de los vehículos automotores. Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico - mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6°) año contado a partir de la fecha de su matrícula”.
- De acuerdo con la Resolución 910 de 2008 del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y con base en la respuesta dada por el Ministerio de Transporte (Radicado MT No.: 20134200126561) los vehículos Nonroad (Maquinaria). NO DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA.
- Diariamente los colaboradores del contratista realizan preoperacional de las máquinas, equipos y vehículos adscritos al contrato; con la finalidad de revisar las condiciones generales (chasis, mecánicas, eléctricas y electrónicas) y llevar reporte oportuno del óptimo funcionamiento.

- El Consorcio C&J Aerocivil 2022, para las actividades constructivas del contrato, en la operación de maquinaria y equipos para el periodo reportado no realizo el uso del comprensor neumático.
- Para el periodo reportado el contratista realizo transporte de fresado, cumpliendo con los parámetros ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y técnicos, en donde las volquetas dotadas de carpas evitando emisiones de material particulado, derrame de partículas en la vía.
- Desde el área ambiental del contratista, se implementan medidas para la prevención de enfermedades auditivas, sensibilizando a los conductores que las bocinas o pitos sean utilizados en caso de emergencia, como señal de alerta y así evitar accidentes o incidentes, adicional del uso de elementos de protección personal como lo son los tapa oídos de copa e inserción.

MANEJO DE RESIDUOS (PMA-03).

Gestión:

- El contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, dispone de puntos ecológicos para la segregación de residuos sólidos convencionales (aprovechables, no aprovechables y aprovechables orgánicos) en el área administrativa se encuentra un punto con 4 canecas de 45cms, en el comedor canecas de 60cms; cumpliendo con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (P.M.A) de la Aeronáutica Civil y la resolución 2184 de 2019.
- El contratista desde el área ambiental realiza inducción de ingreso de personal directo y subcontratistas en temas ambientales, como segregación en la fuente, código de colores, contribuyendo a una educación ambiental en sensibilización y cultura al manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales, peligrosos y demás, dejando evidencia fotográfica, taller evaluativo y registro de asistencia.

Almacenamiento temporal:

- En el campamento del aeropuerto, el contratista cuenta con acopio temporal de residuos sólidos convencionales y peligrosos, los cuales cumplen con condiciones ambientales y de bioseguridad.

Transporte externo y disposición final:

- El contratista realiza entrega de 39 Kg de residuos no aprovechables (ordinarios) al gestor CIUDAD LIMPIA, el cual realiza recolección y transporte de los residuos con una frecuencia de tres días a la semana (lunes, martes y viernes) para su posterior disposición final.
- Los residuos peligrosos generados por las actividades de mantenimiento serán entregados al gestor Interaseo S.A.S, quien será el encargado del transporte, recolección, tratamiento y disposición final de los mismos; para el periodo no se realizó entrega de RESPEL al gestor.
- Los residuos orgánicos generados principalmente por la actividad de mantenimiento de zonas verdes (rocería y limpieza de canales), realizando la poda

de 153920.48 m2 los cuales son recolectados y transportados por el contratista para ser aprovechados en calidad de donación por el señor Pedro Bautista, utilizado en actividades agroindustriales.

- El contratista lleva registro de las entregas de residuos orgánicos al señor Pedro Bautista producto de la rocería y limpieza de canales, en donde indica cantidad de viajes entregados, fecha de entrega, datos de la persona que entrega y la persona que recibe. Para esta semana el contratista reporta el aprovechamiento de 461761.44 Kg de residuos orgánicos, producto de la rocería, adicional de la poda de aproximadamente de 2 árboles, ubicados en el jarrillo de Fontibón, los cuales los individuos arbóreos y las extensas ramas representan un limitante para la continuación de la actividad de "prolongación de la altura del cerramiento existente", con ramas que se extienden hasta dicho cerramiento en malla eslabonada (hacia el exterior del aeropuerto).

VERTIMIENTOS (PMA-04).

Canales de agua de lluvia.

- El Consorcio C&J Aerocivil 2022 de acuerdo con las condiciones climáticas e importancia en la evacuación de agua lluvia, realiza actividad de limpieza de canales (8, 12), que consiste en realizar rocería en los taludes del canal, retiro de residuos, limpieza del fondo, y rocería en el espejo de agua.

REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL, DESCAPOTE Y DISPOSICIÓN DE SUELOS (PMA-05).

- El Consorcio C&J Aerocivil 2022, durante la semana no realizó actividades de retiro de cobertura vegetal, descapote y disposición de suelo.

MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE (PMA-05B).

- Al inicio de actividades de rocería el contratista realiza ahuyentamiento, (inspección de fauna silvestre), llevando registro y control por medio de formato, revisando que el área a intervenir no presente aves o cualquier otro animal silvestre que pueda ser afectado por la ejecución de las actividades, en esta semana el contratista no reportó avistamiento, ni nidos activos, ni fauna silvestre herida.

MANEJO DE MATERIALES Y SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN (PMA-06).

- Dando alcance a la ficha de manejo y control de calidad del aire (PMA-02), el contratista y su parque automotor (vehículos, maquinaria) cumplen con la revisión técnico-mecánica y de gases.
- Durante esta semana el contratista no adquirió o transporto material granular o fresado.

SEÑALIZACION (PMA-07).

- La señalización por parte del contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, con maletines con luces de obstrucción, en Pista Sur y calles de rodaje, para la ejecución de actividad de pintura.

MANEJO DE SUELOS (PMA-09).

- En este periodo por parte del contratista no se presentaron incidentes ambientales (derrames de sustancias químicas), tampoco realizó mantenimientos a vehículos, equipo o maquinaria.
- Los vehículos y maquinaria vinculados al contrato cuentan con los documentos vigentes aplicables al proyecto según lo estipulado en la normativa vigente Decreto 019 de 2012 y las resoluciones 3500 de 2005 y 2200 de 2006 de los Ministerios de Transporte, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los certificados de revisión técnico-mecánica.
- En cada turno los operadores del contratista realizan los preoperacionales.

MANEJO AMBIENTAL EN CAMPAMENTOS, TALLERES Y/O BODEGAS (PMA-10).

- El campamento en donde se encuentra ubicado el contratista cuenta con baños, por lo tanto, no es necesario la instalación de baños portátiles, se tiene conexión fija de agua potable y alcantarillado, este último es prestado por la empresa Interaseo Soluciones Ambientales.
- El agua para consumo humano es comprada en botellón, manteniendo un punto de hidratación.
- En las instalaciones del campamento, el contratista cuenta con un punto ecológico actualizado con el nuevo código de colores, adicional en varios puntos de obra el contratista instalo bolsas para segregación en la fuente.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN (PMA-PGS-04).

- Para el periodo reportado el contratista desde el área ambiental realizó inducción ambiental en temas: actualización de las fichas de manejo ambiental, control fauna, segregación en la fuente y nuevo código de colores al personal nuevo dos operadores.

OBRAS CIVILES MENORES (PSM-12).

- Remoción de cobertura vegetal, descapote y disposición de suelo. Durante esta semana el contratista no realizó actividades constructivas.

Manejo de materiales y sobrantes de construcción:

Procedencia de materiales.

- Para el periodo en mención por parte del contratista no se realizó el ingreso de materiales como agregados y asfalto.

Transporte de materiales:

- Durante esta semana el contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, no realizó transporte de fresado para la reconformación de vías perimetrales.

Almacenamiento temporal de material:

- El fresado generado por las actividades de mantenimiento el contratista almacena los residuos en un sitio adecuado con ubicación K4 +420, perimetral Fontibón, desde el área ambiental se verifica que por motivos de lluvia el material no tenga arrastre y ocasiones contaminación del recurso suelo, es por esto que el área se encuentra señalizada e impermeabilizada.

COMITÉS, REUNIONES:

- Mesa de trabajo, el día 21 de diciembre de 2022, bajo acta No. 9, con la finalidad de socializar el tercer avance del Plan de Manejo Integrado de Plagas entre las áreas no concesionadas AEROCIVIL y concesionadas por OPAIN S.A. periodo 1ero de diciembre de 2022 al 16 de diciembre de 2022, definida con el área de Infraestructura, con profesionales de la U.A.E.A.C. Ing. Ambiental de la DIAA, Ing. Ambiental del GGACF, funcionaria de la U.A.E.A.C. interventoría ETA -Residente Ambiental y SST, del Contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022 – Técnico Tecnicontrol Fumigaciones, Residente Ambiental, personal Técnico de Fumi Young, Funcionario de OPAIN y Funcionario de la Secretaría Distrital de Salud.

Atención a la comunidad

- Para este periodo no se presentaron PQRS.

Semana 3. Del 25 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE (PMA-02).

- El contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022 no desarrolló actividades constructivas que generen material particulado (polvo).
- Los vehículos vinculados al contrato cuentan con los documentos vigentes aplicables al proyecto según lo estipulado en la normativa vigente Decreto 019 de 2012 y las resoluciones 3500 de 2005 y 2200 de 2006 de los Ministerios de Transporte, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los certificados de revisión técnico-mecánica y demás documentación conexa, se enuncian a continuación:

NO	PLACA	TIPO DE VEHICULO	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE VIGENCIA
1	ZIU854	CAMIONETA	11/08/2022	11/08/2023
2	GZZ966	CAMIÓN	NO APLICA	NO APLICA
3	EQO890	VOLQUETA	15/07/2022	17/07/2023
4	TTZ724	CAMIÓN	04/02/2022	04/02/2023
6	TFT637	CAMIONETA	13/04/2022	13/04/2023
7	WLM580	VOLQUETA	06/07/2022	06/07/2023
8	WCV970	VOLQUETA	08/04/2022	08/04/2023
9	TAQ017	VOLQUETA	20/01/2022	20/01/2023
10	SZY801	VOLQUETA	22/03/2022	22/03/2022
11	SWP916	VOLQUETA	11/06/2022	11/06/2023
12	SPU118	VOLQUETA	08/06/2022	08/06/2023
13	LJT435	CAMIÓN GRUA	NO APLICA	NO APLICA
14	WDR762	CAMIONETA	22/07/2022	22/07/2023
16	SXW026	TRACTOCAMION	19/09/2022	19/09/2023
17	GUU798	CAMIONETA	02/03/2022	02/03/2023

- En la tabla anterior algunos automotores relacionados por el contratista no aplican en Revisión técnico-mecánica dando cumplimiento al Decreto ley 019/12 Artículo 202, donde indica: “Primera revisión de los vehículos automotores. Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico - mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6°) año contado a partir de la fecha de su matrícula”.
- De acuerdo con la Resolución 910 de 2008 del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y con base en la respuesta dada por el Ministerio de Transporte (Radicado MT No.: 20134200126561) los vehículos Nonroad (Maquinaria). NO DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA.
- Diariamente los operarios del consorcio realizan preoperacional de las máquinas, equipos y vehículos adscritos al contrato; con la finalidad de revisar las condiciones generales (chasis, mecánicas, eléctricas y electrónicas) para asi llevar reporte oportuno del óptimo funcionamiento.
- El Consorcio C&J Aerocivil 2022, para las actividades constructivas del contrato, en la operación de maquinaria y equipos para el periodo reportado no realizo el uso del comprensor neumático.
- Para el periodo reportado el contratista realizo transporte de fresado, cumpliendo con los parámetros ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y técnicos, en donde las volquetas dotadas de carpas evitando emisiones de material particulado, derrame de partículas en la vía.

- Desde el área ambiental del contratista, se implementan medidas para la prevención de enfermedades auditivas, sensibilizando a los conductores que las bocinas o pitos sean utilizados en caso de emergencia, como señal de alerta y así evitar accidentes o incidentes, adicional del uso de elementos de protección personal como lo son los tapa oídos de copa e inserción.

MANEJO DE RESIDUOS (PMA-03).

Gestión:

- El contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, dispone de puntos ecológicos para la segregación de residuos sólidos convencionales (aprovechables, no aprovechables y aprovechables orgánicos) en el área administrativa se encuentra un punto ecológico con 4 canecas de 45cms, en el comedor canecas de 60cms; cumpliendo con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (P.M.A) de la Aeronáutica Civil y la resolución 2184 de 2019, código de colores.
- El contratista desde el área ambiental realiza inducción de ingreso de personal directo y subcontratistas en temas ambientales, como segregación en la fuente, código de colores, contribuyendo a una educación ambiental en sensibilización y cultura al manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales, peligrosos y demás, dejando evidencia fotográfica, taller evaluativo y registro de asistencia.

Almacenamiento temporal:

- En el campamento del aeropuerto, el contratista cuenta con acopio temporal de residuos sólidos convencionales y peligrosos, los cuales cumplen con condiciones ambientales y de bioseguridad.

Transporte externo y disposición final:

- El contratista realiza entrega de 75 Kg de residuos no aprovechables (ordinarios) al gestor CIUDAD LIMPIA, el cual realiza recolección y transporte de los residuos con una frecuencia de tres días a la semana (lunes, martes y viernes) para su posterior disposición final.
- Los residuos peligrosos generados por las actividades de mantenimiento serán entregados al gestor Interaseo S.A.S, quien será el encargado del transporte, recolección, tratamiento y disposición final de los mismos; para el periodo no se realizó entrega de RESPEL al gestor.
- Los residuos orgánicos generados principalmente por la actividad de mantenimiento de zonas verdes (rocería y limpieza de canales), los cuales son recolectados y transportados por el contratista para ser aprovechados en calidad de donación por el señor Pedro Bautista, utilizado en actividades agroindustriales.
- El contratista lleva registro de las entregas de residuos orgánicos al señor Pedro Bautista producto de la rocería y limpieza de canales, en donde indica cantidad de viajes entregados, fecha de entrega, datos de la persona que entrega y la persona que recibe.

- La cuadrilla de contingencial del Consorcio C&J Aerocivil 2022, realizo la poda de una rama de un árbol por emergencia ya que presento caída ubicado en el jarrillon de Fontibón, adicional de la poda de dos (2) arboles los cuales los individuos arbóreos y las extensas ramas representan un limitante para la continuación de la actividad de "prolongación de la altura del cerramiento existente", con ramas que se extienden hasta dicho cerramiento en malla eslabonada (hacia el exterior del aeropuerto).

VERTIMIENTOS (PMA-04).

Canales de agua de lluvia:

- El Consorcio C&J Aerocivil 2022 de acuerdo con las condiciones climáticas e importancia en la evacuación de agua lluvia, realiza actividad de limpieza de canales (8, 12), que consiste en realizar rocería en los taludes del canal, retiro de residuos, limpieza del fondo, y rocería en el espejo de agua.
- Para el periodo reportado el contratista conto con el apoyo de dos maquinarias (retroexcavadora y excavadora), las cuales cumplen con la función del retiro del buchón de agua.

REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL, DESCAPOTE Y DISPOSICIÓN DE SUELOS (PMA-05).

- El Consorcio C&J Aerocivil 2022, durante la semana no realizó actividades de retiro de cobertura vegetal, descapote y disposición de suelo.

MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE (PMA-05B).

- Al inicio de actividades de rocería el contratista realiza ahuyentamiento, (inspección de fauna silvestre), llevando registro y control por medio de formato, revisando que el área a intervenir no presente aves o cualquier otro animal silvestre que pueda ser afectado por la ejecución de las actividades, en esta semana el contratista no reportó avistamiento, ni nidos activos, ni fauna silvestre herida.

MANEJO DE MATERIALES Y SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN (PMA-06).

- Dando alcance a la ficha de manejo y control de calidad del aire (PMA-02), el contratista y su parque automotor (vehículos, maquinaria) cumplen con la revisión técnico-mecánica y de gases.
- Durante esta semana el contratista no adquirió o transporto material granular o fresado.

SEÑALIZACION (PMA-07).

- La señalización por parte del contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, con maletines con luces de obstrucción, en Pista Sur y calles de rodaje, para la ejecución de actividad de pintura.

MANEJO DE SUELOS (PMA-09).

- En este periodo por parte del contratista no se presentaron incidentes ambientales (derrames de sustancias químicas), tampoco realizó mantenimientos a vehículos, equipo o maquinaria.
- Los vehículos y maquinaria vinculados al contrato cuentan con los documentos vigentes aplicables al proyecto según lo estipulado en la normativa vigente Decreto 019 de 2012 y las resoluciones 3500 de 2005 y 2200 de 2006 de los Ministerios de Transporte, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los certificados de revisión técnico-mecánica.
- En cada turno los operadores del contratista realizan los preoperacionales.

MANEJO AMBIENTAL PARA CAMPAMENTOS, TALLERES Y/O BODEGAS (PMA-10).

- El campamento en donde se encuentra ubicado el contratista cuenta con baños, por lo tanto, no es necesario la instalación de baños portátiles, se tiene conexión fija de agua potable y alcantarillado, este último es prestado por la empresa Interaseo Soluciones Ambientales.
- El agua para consumo humano es comprada en botellón, manteniendo un punto de hidratación.
- En las instalaciones del campamento, el contratista cuenta con un punto ecológico actualizado con el nuevo código de colores, adicional en varios puntos de obra el contratista instalo bolsas para segregación en la fuente.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN (PMA-PGS-04).

- Para el periodo reportado el contratista no realizó inducción, capacitación o sensibilización en temas ambientales.

OBRAS CIVILES MENORES (PSM-12).

- Durante esta semana el contratista no realizó actividades constructivas de remoción de cobertura vegetal, descapote y disposición de suelo.

Manejo de materiales y sobrantes de construcción:

Procedencia de materiales.

- Para el periodo en mención por parte del contratista no se realizó el ingreso de materiales como agregados y asfalto.

Transporte de materiales:

- Durante esta semana el contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, no realizó transporte de fresado para la reconformación de vías perimetrales.

Almacenamiento temporal de material:

- El fresado generado por las actividades de mantenimiento el contratista almacena los residuos en un sitio adecuado con ubicación K4 +420, perimetral Fontibón, desde el área ambiental se verifica que por motivos de lluvia el material no tenga arrastre y ocasiones contaminación del recurso suelo, es por esto que el área se encuentra señalizada e impermeabilizada.

COMITÉS, REUNIONES:

- Durante este periodo no se realizaron reuniones o comités

Atención a la comunidad.

- Para este periodo no se presentaron PQRS.

Semana 4. Del 1 de enero de 2023 al 07 de enero de 2023.

MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE (PMA-02).

- Para el periodo reportado el contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, no ejecutó actividades constructivas que generen material particulado (polvo).
- Los vehículos vinculados al contrato cuentan con los documentos vigentes aplicables al proyecto según lo estipulado en la normativa vigente Decreto 019 de 2012 y las resoluciones 3500 de 2005 y 2200 de 2006 de los Ministerios de Transporte, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los certificados de revisión técnico-mecánica y demás documentación conexa, se enuncian a continuación:

NO	PLACA	TIPO DE VEHICULO	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE VIGENCIA
1	ZIU854	CAMIONETA	11/08/2022	11/08/2023
2	GZZ966	CAMIÓN	NO APLICA	NO APLICA
3	EQO890	VOLQUETA	15/07/2022	17/07/2023
4	TTZ724	CAMIÓN	04/02/2022	04/02/2023
6	TFT637	CAMIONETA	13/04/2022	13/04/2023
7	WLM580	VOLQUETA	06/07/2022	06/07/2023
8	WCV970	VOLQUETA	08/04/2022	08/04/2023
9	TAQ017	VOLQUETA	20/01/2022	20/01/2023
10	SZY801	VOLQUETA	22/03/2022	22/03/2022
11	SWP916	VOLQUETA	11/06/2022	11/06/2023
12	SPU118	VOLQUETA	08/06/2022	08/06/2023
13	LJT435	CAMIÓN GRUA	NO APLICA	NO APLICA
14	WDR762	CAMIONETA	22/07/2022	22/07/2023
16	SXW026	TRACTOCAMION	19/09/2022	19/09/2023
17	GUU798	CAMIONETA	02/03/2022	02/03/2023

- En la tabla anterior algunos automotores relacionados por el contratista no aplican en Revisión técnico-mecánica dando cumplimiento al Decreto ley 019/12 Artículo 202, donde indica: “Primera revisión de los vehículos automotores. Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico - mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6°) año contado a partir de la fecha de su matrícula”.
- Para la presente semana los operarios del consorcio realizan preoperacional de las máquinas, equipos y vehículos adscritos al contrato; con la finalidad de revisar las condiciones generales (chasis, mecánicas, eléctricas y electrónicas) y así llevar reporte oportuno del optimo funcionamiento.
- El Consorcio C&J Aerocivil 2022, en la operación de maquinaria y equipos para el periodo reportado no realizo el uso del comprensor neumático.
- Desde el área ambiental del contratista, se implementan medidas para la prevención de enfermedades auditivas, sensibilizando a los conductores que las bocinas o pitos sean utilizados en caso de emergencia, como señal de alerta y así evitar accidentes o incidentes, adicional del uso de elementos de protección personal como lo son los tapa oídos de copa e inserción.

MANEJO DE RESIDUOS (PMA-03).

Gestión:

- El contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, dispone de puntos ecológicos para la segregación de residuos sólidos convencionales (aprovechables, no aprovechables y

aprovechables orgánicos) en el área administrativa se encuentra un punto ecológico con 4 canecas de 45cms, en el comedor canecas de 60cms; cumpliendo con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (P.M.A) de la Aeronáutica Civil y la resolución 2184 de 2019, código de colores.

- El contratista desde el área ambiental realiza inducción de ingreso de personal directo y subcontratistas en temas ambientales, como segregación en la fuente, código de colores, contribuyendo a una educación ambiental en sensibilización y cultura al manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales, peligrosos y demás, dejando evidencia fotográfica, taller evaluativo y registro de asistencia.

Almacenamiento temporal:

- En el campamento del aeropuerto, el contratista cuenta con acopio temporal de residuos sólidos convencionales y peligrosos, los cuales cumplen con condiciones ambientales y de bioseguridad.

Transporte externo y disposición final:

- El contratista realiza entrega de 67 Kg de residuos no aprovechables (ordinarios) al gestor CIUDAD LIMPIA, el cual realiza recolección y transporte de los residuos con una frecuencia de tres días a la semana (lunes, martes y viernes) para su posterior disposición final.
- Los residuos peligrosos generados por las actividades de mantenimiento serán entregados al gestor Interaseo S.A.S, quien será el encargado del transporte, recolección, tratamiento y disposición final de los mismos; para el periodo no se realizó entrega de RESPEL al gestor.
- Los residuos orgánicos generados principalmente por la actividad de mantenimiento de zonas verdes (rocería y limpieza de canales), los cuales son recolectados y transportados por el contratista para ser aprovechados en calidad de donación por el señor Pedro Bautista, utilizado en actividades agroindustriales.
- Durante esta semana se realizó poda, en las zonas 1, 52, 59B, 62 Y 64 con una totalidad de 50932.02 m2, generando aproximadamente 152796.06 Kg de residuo orgánico.
- El contratista lleva registro de las entregas de residuos orgánicos al señor Pedro Bautista producto de la rocería y limpieza de canales, en donde indica cantidad de viajes entregados, fecha de entrega, datos de la persona que entrega y la persona que recibe.

VERTIMIENTOS (PMA-04).

Canales de agua de lluvia.

- El Consorcio C&J Aerocivil 202 realizó actividad de limpieza de 700 ml en el canal 12, en el cual consiste en la rocería en los taludes del canal, retiro de residuos, limpieza del fondo, y rocería en el espejo de agua; para este periodo la cuadrilla de contingencia apoyo la ejecución con la limpieza de cunetas existentes en vías principales.

- Para el periodo reportado el contratista conto con el apoyo de dos maquinarias (retroexcavadora y excavadora), las cuales cumplen con la función del retiro del buchón de agua.

REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL, DESCAPOTE Y DISPOSICIÓN DE SUELOS (PMA-05).

- El Consorcio C&J Aerocivil 2022, durante la semana no realizó actividades de retiro de cobertura vegetal, descapote y disposición de suelo.

MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE (PMA-05B).

- Al inicio de actividades de rocería el contratista realiza ahuyentamiento, (inspección de fauna silvestre), llevando registro y control por medio de formato, revisando que el área a intervenir no presente aves o cualquier otro animal silvestre que pueda ser afectado por la ejecución de las actividades, en esta semana el contratista no reportó avistamiento, ni nidos activos, ni fauna silvestre herida.

MANEJO DE MATERIALES Y SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN (PMA-06).

- Dando alcance a la ficha de manejo y control de calidad del aire (PMA-02), el contratista y su parque automotor (vehículos, maquinaria) cumplen con la revisión técnico-mecánica y de gases.
- Durante esta semana el contratista no adquirió o transporto material granular o fresado.

SEÑALIZACION (PMA-07).

- La señalización por parte del contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, con maletines con luces de obstrucción, en Pista Sur, para la ejecución de actividades de rocería.

MANEJO DE SUELOS (PMA-09).

- En este periodo el contratista desde el área ambiental reporta que no se presentaron incidentes ambientales (derrames de sustancias químicas), tampoco realizó mantenimientos a vehículos, equipo o maquinaria.
- Los vehículos y maquinaria vinculados al contrato cuentan con los documentos vigentes aplicables al proyecto según lo estipulado en la normativa vigente Decreto 019 de 2012 y las resoluciones 3500 de 2005 y 2200 de 2006 de los Ministerios de Transporte, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto de los certificados de revisión técnico-mecánica.
- En cada turno los operadores del contratista realizan los preoperacionales a vehículos, maquinaria y equipos.

MANEJO AMBIENTAL PARA CAMPAMENTOS, TALLERES Y/O BODEGAS (PMA-10).

- El campamento cuenta con baños, por lo tanto, no es necesario la instalación de baños portátiles, se tiene conexión fija de agua potable y alcantarillado, este último es prestado por la empresa Interaseo Soluciones Ambientales.
- El agua para consumo humano es comprada en botellón, manteniendo un punto de hidratación.
- En las instalaciones del campamento, el contratista cuenta con un punto ecológico actualizado con el nuevo código de colores, adicional en varios puntos de obra el contratista instalo bolsas para segregación en la fuente.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN (PMA-PGS-04).

- Desde el área ambiental del contratista, se realiza capacitación ambiental generando sensibilización y concientización ambiental a los colaboradores directos y subcontratistas que ejecutan actividades constructivas.
- Para la presente semana, la Ingeniera Pilar Salas, residente Ambiental, realiza charla al subcontratista Construbase encargados de la prolongación del doble cerramiento, en tema de orden y aseo en el área de trabajo.

OBRAS CIVILES MENORES (PSM-12).

- Durante esta semana el contratista no realizó actividades constructivas de remoción de cobertura vegetal, descapote y disposición de suelo.

Manejo de materiales y sobrantes de construcción:

Procedencia de materiales.

- Para el periodo en mención por parte del contratista no se realizó el ingreso de materiales como agregados y asfalto.

Transporte de materiales:

- Durante esta semana el contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, no realizó transporte de fresado o materiales pétreos.

Almacenamiento temporal de material:

- El fresado generado por las actividades de mantenimiento el contratista almacena los residuos en un sitio adecuado con ubicación K4 +420, perimetral Fontibón, desde el área ambiental se verifica que por motivos de lluvia el material no tenga arrastre y ocasiones contaminación del recurso suelo, es por esto que el área se encuentra señalizada e impermeabilizada.

COMITÉS, REUNIONES:

- Durante este periodo el contratista no reporta comités o reuniones.

Atención a la comunidad.

- Para este periodo no se presentaron PQRS.

8.3.2 Gestión social

Tal como lo indica el Numeral 2.8.16 Manejo Ambiental Aspectos e impactos ambientales en las actividades constructivas. Las fichas de gestión (mínimas) social a implementar durante todas las etapas de desarrollo del proyecto, que quedaron establecidas en el documento PMA, son:

Tal como lo indica el numeral 2.6.4 Gestión Social: Efectuar la socialización con las partes interesadas del entorno del contrato, y llevar a cabo la gestión de la participación de interesados durante el desarrollo de este. Mediante veedurías ciudadanas, de ser requeridas en el desarrollo de este contrato.

Generación de empleos

La generación de empleos a la fecha de cierre de este informe corresponde a 80 empleos directos y aproximadamente cuarenta y siete (47) empleos indirectos (subcontratistas, gestores, especialistas, etc.). A continuación, se detalla la cantidad de personal vinculado al proyecto, para este periodo:

Semana 1. Del 11 de diciembre de 2022 al 17 de diciembre de 2022.

Durante el periodo se evidencio permanencia de 73 personas vinculadas al proyecto, entre empleos directos y aproximadamente diecinueve (19) empleos indirectos (subcontratistas, etc.).

Semana 2. Del 18 de diciembre de 2022 al 24 de diciembre de 2022.

Durante el periodo se evidencio permanencia de 73 personas vinculadas al proyecto, entre empleos directos y aproximadamente tres (03) empleos indirectos (subcontratistas, etc.).

Semana 3. Del 25 de Diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

Durante el periodo se evidencio permanencia de 74 personas vinculadas al proyecto, entre empleos directos y aproximadamente dos (2) empleo indirecto (subcontratistas, etc.).

Semana 4. Del 1 de enero de 2023 al 07 de enero de 2023.

Durante el periodo se evidencio permanencia de 80 personas vinculadas al proyecto, entre empleos directos y aproximadamente cero (0) empleos indirectos (subcontratistas, etc.).

Valla del proyecto

Tal como lo indica el numeral 2.8.7 VALLAS del FORMATO 8 A- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: "*El CONTRATISTA DE OBRA realizará a su costo el suministro e instalación de las vallas necesarias para la información del contrato de acuerdo con la normatividad vigente y/o que suministre la Entidad; El arte de la valla debe ser remitido vía email a la supervisión del contrato, el cual será remitido al Grupo de prensa de la Entidad para la revisión del mismo, una vez el arte de la valla cumpla con los parámetros exigidos será remitido por el Grupo de Prensa al Ministerio de Transporte, quien dará el visto bueno final y aprobación del mismo, el cual se remitirá al contratista de obra con copia a la interventoría para la impresión e instalación de la valla en el sitio indicado por el administrador del aeropuerto. La Interventoría verificará que el contratista las mantenga en correcto estado o realice la reposición si se presenta deterioro o vandalismo. En caso de prolongarse la intervención el CONTRATISTA DE OBRA procederá a la actualización que aplique a estas*".

Dando alcance al comunicado INT-AERODORADO-031-2022, radicado el día 03 de octubre de 2022, en donde se solicita al contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, información sobre la condición del proceso de suministro e instalación de la valla necesaria para la información del contrato de obra No. No. 22001132 H4 DE 2022, a la fecha 16 de noviembre de 2022, no se ha obtenido una respuesta por parte del contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, se solicita al Contratista respuesta reiterando el cumplimiento del ítem 2.8.7, por medio de comunicado INT-AERODORADO-153-2022 radicado el día 15 de noviembre de 2022.

Envió de correo al contratista Consorcio C&J Aerocivil, el día 12 de diciembre de 2022, bajo radicado INT-AERODORADO-223-2022 y asunto: ALCANCE A COMUNICADO INT-AERODORADO-153-2022 CON ASUNTO: REITERACIÒN COMUNICADO INT-AERODORADO-031-2022, CONDICIONES PROCESO DE VALLA, NUMERAL 2.8.7 FORMATO 8A-ESPECIFICACIONES TÈCNICAS, reiterando la solicitud de una respuesta oportuna, frente a la información solicitada.

Reiterando solicitud y dando alcance a los comunicados INT-AERODORADO-031-2022, INT-AERODORADO-153-2022, INT-AERODORADO-223-2022 y INT-AERODORADO-258-2022 radicados el día 03 de octubre de 2022, 15 de noviembre de 2022, 12 de diciembre de 2022 y 10 de enero de 2023, respectivamente, en donde se solicita al contratista Consorcio C&J Aerocivil 2022, información sobre la condición del proceso de suministro e instalación de la valla, lo anterior, dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 2.8.7 VALLAS del FORMATO 8 A- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

8.4 Gestión SST

A continuación, se relacionan las diferentes actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) realizadas por la empresa Contratista CONSORCIO C&J y por la Interventoría ELSA TORRES ARENALES durante el presente periodo:

- Aportes al Sistema de Gestión de Seguridad Social (SGSS)

  La Interventoría ELSA TORRES ARENALES realiza la vinculación del personal profesional acorde con las exigencias del contrato afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral: (salud, pensión y ARL y caja de compensación) y se anexa los soportes de pago de la seguridad social del periodo.

  - Anexo 02 - Planilla de seguridad social ELSA TORRES ARENALES.

  Al respecto, el Contratista CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022, presentó los correspondientes soportes de afiliaciones y/o pagos al sistema de seguridad social correspondientes, también se presentan los pagos de los subcontratistas que laboraron durante el periodo tal como se muestra a continuación:

Tabla 7 Personal de obra que laboró durante el periodo

Nombre	Contratista	Operativo	Cargo	No. De personas/ semana
Consorcio C&J Aerocivil 2022		X	Cuadrilla de contingencia civil.	24
Consorcio C&J Aerocivil 2022		X	Cuadrilla de contingencia eléctrica.	9
Consorcio C&J Aerocivil 2022	X	X	Guadañadores	10
Consorcio C&J Aerocivil 2022		X	Ingenieros, SST, Aux. administrativo, servicios generales, almacenista.	10
Consorcio C&J Aerocivil 2022		X	Especialista en Pavimentos.	1
Consorcio C&J Aerocivil 2022		X	Operario.	6
Consorcio C&J Aerocivil 2022		X	Conductores.	3
Consorcio C&J Aerocivil 2022		X	Auxiliares y ayudantes de poda.	17
Construbase	X	X	Guadañadores.	4
Construbase		X	Auxiliares.	2
Construbase			Supervisor, conductor.	2
Tecnicontrol fumigaciones S.A.S	X		Técnicos.	3
Otilio Nicolas Moreno Blanco LTDA	X	X	Guadañadores	5
Otilio Nicolas Moreno Blanco	X	X	Auxiliares	3

Nombre	Contratista	Operativo	Cargo	No. De personas/ semana
LTDA				
Construobras	X	X	Supervisor, SST, conductor.	3
Construobras	X	X	Soldadores.	2
Construobras	X	X	Ayudantes.	9
Construobras	X	X	Oficiales.	1
José Argeon Mora		X	Guadañadores.	2
José Argeon Mora		X	Auxiliares	5
ASR Ingeniería		X	Operarios, conductor	6

Fuente: Elsa Torres Arenales

- Anexo 03 - Planilla Seguridad Social CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022.
- Anexo 04 - Planilla Seguridad Social JMS INGENIERIA.
- Anexo 05 - INT-AERODORADO-269-2023. (A la fecha aún el subcontratista no ha realizado pago de la seguridad social, por lo cual esta Interventoría radicó comunicado INT-AERODORADO-269-2023 con asunto novedad de pago de seguridad social subcontratista CONSTRUBASE SAS, en donde se solicita el respectivo pago y la suspensión de actividades, en anexo 05 se presenta el comunicado emitido como soporte
- Anexo 06 – Planilla de Seguridad Social JOSE ARGEON MORA.
- Anexo 07 – Planilla Seguridad Social TECNICONTROL.
- Anexo 08- Planilla de seguridad social OTILIO NICOLAS MORENO.
- Anexo 09- Planilla de seguridad social CONSTRUOBRAS VIALES.
- Anexo 10- Soporte de afiliaciones EMPRESA JMS – INGENIERA AUXILIAR
- Anexo 11 - Planilla de Seguridad Social WILLIAM y Soportes de Afiliación
- Anexo 12. Planilla de Seguridad Social ASR INGENIERIA.
- Anexo 13. Planilla de Seguridad Social Omar Yesid Mojica

- Medicina preventiva y del trabajo

  Tanto el Contratista y subcontratistas realizaron exámenes médicos ocupacionales de ingreso para nuevo personal, los cuales han sido realizados con énfasis en los riesgos a los cuales están expuestos por la actividad laboral que van a realizar dentro del proyecto, estos exámenes médicos ocupacionales de ingreso son realizados por una IPS con licencia en Salud Ocupacional vigente expedida por la Secretaría de Salud Departamental o que corresponda, según la normatividad legal vigente.

- Inducción general en SST

  El contratista se encuentra en proceso de realización de los procesos de inducción general al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tocando los siguientes temas:

  - Accidente de Trabajo;
  - Enfermedad laboral;
  - Políticas del SG-SST;
  - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;
  - Peligros y riesgos a los cuales está expuesto en su trabajo.

  Adicionalmente, antes de que el personal por parte del contratista y la interventoría ingrese a la obra realiza y aprueba el proceso de inducción en la página web de OPAIN (enlace: https://www.opain.co/) buscando generar estándares adecuados de seguridad en el área concesionada y el cumplimiento de la normatividad nacional vigente, tratando los siguientes temas de seguridad:

  - Curso de inducción en Seguridad Aeroportuaria,
  - Curso de inducción en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el Sistema de Gestión Ambiental.
  - Capacitación en seguridad vial, normas de seguridad en plataforma.

  Estos documentos se encuentran en físico y en medio magnético en el campamento de obra.

- Capacitaciones SST y charlas de seguridad

  La empresa contratista reportó la realización de charlas de seguridad antes del inicio de labores en campo, para lo cual ha dejado evidencia fotográfica de la actividad y evidencia mediante planillas de asistencia a la actividad las cuales se encuentran en el archivo del contratista en medio físico y digital.

- Higiene Industrial

  El contratista en sus actividades constructivas realiza los respectivos ATS y permisos de trabajo, con el objetivo de que se evidencie que se está trabajando bajo un ambiente seguro, evidencia que queda registrada en los respectivos permisos los cuales se encuentran en el campamento de obra en medio magnético y físico.

- Seguridad Industrial

  Entrega de EPP: La interventoría ha evidenciado en campo el suministro de EPP al personal del contratista, así como el adecuado uso conforme a las actividades que se realizan en obra entre ellas están:

  - Actividades de poda Jarillón de Fontibón;
  - Poda y recolección zona 1, zona 2, zona 4, zona 5, zona 42, zona 42A, zona 51, zona 56, zona 57, zona 59B, 59C, 59D, zona 61, zona 62, zona 63, zona 64, zona 65;
  - Recolección de césped;
  - Pintura señales horizontales calle de rodaje Alfa 8 Pista Norte;
  - Pintura señales horizontales designadores Pista Sur cabeceras y Pista Norte cabeceras;
  - Pintura señales horizontales calle de rodaje Alfa 4;
  - Acopio y recolección de poda de árboles;
  - Poda de árbol Jarillón Fontibón;
  - Mantenimiento de canales 1,4,8, 12;
  - Prolongación malla a doble altura, instalación de ángulos, pie amigo y alambre cerramiento Fontibón;
  - Monitorio y control de tubos cebaderos para el control de plagas;
  - Inspección perímetros, motobombas, nivel del rio Bogotá, cerramientos, calles de rodaje, limpieza de cunetas vía acceso frente a Recinto de motores;

  Al respecto, se ha solicitado al contratista de obra la presentación de registros que evidencien la entrega de estos elementos y los tienen me medio físico en el almacén de obra.

  Señalización. El contratista realiza la señalización y demarcación de los lugares donde se realizan actividades de obra.

  Inspecciones. El contratista realiza inspecciones de seguridad de los extintores, los botiquines, de toda la maquinaria, equipos y vehículos que se encuentran operando en obra; los soportes de las inspecciones programadas durante el periodo se encuentran en obra en medio físico y medio magnético.

  Preoperacionales: Todas las herramientas, vehículos, equipos y maquinaria cuentan con sus respectivos preoperacionales los cuales son diligenciados de manera diaria, por tal motivo, en el campamento de obra se tienen los preoperacionales de la maquinaria en medio físico y en medio digital, la interventoría realiza revisión periódica del diligenciamiento de dichos formatos directamente en campo.

  Permisos de trabajo: La interventoría realiza la verificación del diligenciamiento y firma de los respectivos permisos de trabajo antes de iniciar labores y durante la ejecución

de estas, de igual manera se realiza revisión de estos documentos semanalmente; los permisos de trabajo se encuentran me medio físico y en medio magnético (formato PDF) en el campamento de obra.

ATS: Todas las actividades constructivas que realiza el contratista en campo cuentan con sus respectivos Análisis de Trabajo Seguro – ATS firmados por el personal operativo, por sus jefes inmediatos y por el personal SISOMA encargado; estos documentos son revisados y se encuentran en el campamento en medio físico en medio magnético en formato PDF.

- Accidentes de trabajo

  Hasta la fecha se han presentado en total un (1) accidente de trabajo el cual ha sido leve, dicho accidente de trabajo se encuentra debidamente reportado al FURAT por el subcontratista CONSTRUOBRAS S.A.S.

  Para este periodo, se presentó un (01) accidente de trabajo ocurrido el día veintiocho (28) de diciembre de 2022 siendo las 11:00 a.m. el colaborador refiere que se encontraba en el área de trabajo templando un alambre de púa, el cual se le enreda en su pierna izquierda generando un corte (herida), se atiende el hallazgo trasladándolo a un centro asistencial y se procede a realizar el debido reporte.

  Por parte de la interventoría no se presentaron accidentes de trabajo.

  - Anexo 14 – Reporte FURAT

- Protocolo de Bioseguridad

  Para los trabajadores que realizan su trabajo en campo, en caso de requerirse se les hace entrega de mascarilla quirúrgica; es preciso indicar que durante el periodo ni el personal de obra ni de la interventoría ha presentado casos sospechosos de contagio por COVID-19 y por lo tanto no se ha requerido tomar medidas de aislamiento.

8.5 Gestión seguros

A la fecha se han causado y dado cumplimiento a las diferentes pólizas contractuales. Se hace actualización de las pólizas conforme al modificatorio No. 2.

8.6 Gestión a la evaluación de riesgos.

- Se han analizado y enunciado particularmente para cada una de las diferentes especialidades.
- Se continua con el respectivo monitoreo de la matriz de riesgos.

8.7 Alcance contable.

- Se realiza el pago de nómina para el personal activo.
- Se realiza el pago de los proveedores.
- Se realiza la creación y pago de la planilla de seguridad social.

8.8 Otros alcances de gestión.

8.8.1 Gestión legal

Mediante comunicado INT-AERODORADO-253-2022 y INT-AERODORADO-254-2022, esta interventoría solicitó a la Aerocivil la actualización de tiempo en el contrato actual y actualización en el presupuesto del contrato, teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el que se considera que "(…) *Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración*".

Teniendo en cuenta lo anterior, el día 06 de enero del 2023 la Aerocivil da aval a esta solicitud, con el fin de garantizar la eficacia del contrato de obra e interventoría.

8.8.2 Gestión documental

Se realiza el respectivo control, seguimiento y archivado de los diferentes documentos contractuales y correspondencia, así como también, dando respuesta oportuna a los mismos.

9 FORMATOS DE CONTROL

9.1 Relación de personal en obra

El personal de contratista es el siguiente:

Tabla 8 Personal contratista operativo

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA OPERATIVO	
NOMBRE	**CARGO**
Albeiro Parra Sánchez	Oficial de cuadrilla
Carlos Colmenares Pico	Supervisor
Yesid Rojas Avellaneda	Ayudante General
Edwin Yesid Moreno Páez	Supervisor eléctrico
Cristian Gilberto Velasco Garavito	Auxiliar eléctrico
Jorge Iván Parra	Oficial eléctrico
David Alfonso Palacio Gómez	Supervisor eléctrico
Lalo León Villamizar Arredondo	Oficial de cuadrilla
Milton Javier Pava Mendoza	Ayudante
Ángelo Eduardo Capera	Guadañador
Cristian Camilo Pinzón Pérez	Guadañador
Katiusca Miley Martínez Acuña	Ayudante
José Gregorio Ochoa Rojas	Guadañador
Damaris Ruiz Diaz	Ayudante
Dagoberto Guerra León	Oficial
Briyith Farleydy Alarcón Rojas	Ayudante
Jorge Enrique Barrero González	Supervisor Guadañador
Abraham Antonio Paternina Barrios	Guadañador
Eulicen Rojas Avellaneda	Ayudante
Kelly Johana Cuava López	Ayudante
Montegranario Aroca Prada	Ayudante
José Javier Jiménez Vega	Supervisor
José Eliecer Brinez Bucuru	Guadañador
Sebastián Felipe Velásquez Martínez	Ayudante
Jerly Castro Torres	Supervisor
Neftalí Salcedo	Oficial de cuadrilla
Kevin Andrés Gómez Ortiz	Oficial de cuadrilla
Yobany Loaiza Useche	Oficial de cuadrilla
German Rodríguez	Oficial de cuadrilla
José Antonio Castro Mesa	Oficial de cuadrilla
Wilder Steven Tamayo Guayara	Ayudante general
Epaminondas Jiménez	Ayudante general
Yosep Alejandro Capera Roberto	Ayudante general
Daniel Eduardo Vargas Sarmiento	Ayudante general
Duván Francisco Villamizar	Ayudante general
Yuber Alexis Medina	Supervisor eléctrico
Fabian Yesid Barajas Puentes	Oficial eléctrico
Duván Camilo Quiroga	Ayudante eléctrico
Julián David Ruiz Anzola	Auxiliar eléctrico
Carlos Enrique Aroca	Guadañador
Diego Nicolas Velásquez Martínez	Ayudante de Poda
Edwin Alexander Medina Ariza	Ayudante
Jean Carlos Escobar Villalba	Ayudante

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA OPERATIVO	
NOMBRE	**CARGO**
Omar Yesid Mojica Jaime	Conductor
Jarly Miguel Medrano Puerta	Ayudante
Yeison Alexander Puentes Beltran	Ayudante de Poda
José Dimas Solís Portocarrero	Ayudante de Poda
José Ángel Jiménez Mahecha	Ayudante de Poda
David Fernando Rocha Lozano	Ayudante de Poda
Luis Carlos Uribe Camacho	Conductor
Carlos José Pinto López	Ayudante General
Blanca Yolanda Rocha Lozano	Servicios generales
Diego Fernando Parrado Rodríguez	Oficial de cuadrilla
Willinton Rojas Salazar	Oficial de cuadrilla
Said Cano Better	Oficial eléctrico
Edgar Andrés Vásquez Piedrahita	Ayudante de Poda
Ludwing Caballero Peña	Operador
Carlos Ramiro Cortes Cuellar	Conductor
Mauricio Castro Montaño	Operario tractor
Karen Tatiana Cortes Ariza	Ayudante Canales de poda
Fabian Bohorquez	Ayudante General
William Leonardo Oliveros Ramírez	Especialista en Pavimentos
Jefferson Sebastián Daza Celis	Ayudante Canales de poda
Huber David Culma	Guadañador
Arnobis José Rodríguez Gallego	Guadañador
Edwin Alexander Pérez Algarra	Guadañador
José Darío Guido Rojas	Operador
Bandermy Cuervo Suarez	Conductor
Carlos William Castiblanco Upegui	Auxiliar de Poda
Sergio Andrés Castillo Rodríguez	Auxiliar de Poda
Gabriel Emiro Arcia Pila	Ayudante de Poda
Carlos William Castiblanco Upegui	Auxiliar de Poda
Sergio Andrés Castillo Rodríguez	Auxiliar de Poda
Yefferson Sebastián Daza Celis	Auxiliar de Poda

Fuente: Elsa Torres Arenales

Tabla 9 Personal contratista administrativo

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	**CARGO**
Yessica Andrea Ortiz Murillo	Residente de obra
María Camila Arboleda Guayara	Inspector SST
María Alejandra Patiño Cárdenas	Auxiliar de ingeniería
José Alexander Caicedo Barrios	Ingeniero
Nerieth Del Pilar Salas Jara	Ingeniera Ambiental
Claudia Patricia Sánchez Grass	Inspector SST
Luis Fernando Ramírez Quintero	Inspector. Lado aire

Fuente: Elsa Torres Arenales

Tabla 10 Personal Construbase SAS

LISTADO CONTRATISTA PODA CONSTRUBASE S.A.S	
NOMBRE	**CARGO**
Cristian Chaid Seachoque Ovallo	Recolector
Sergio Andrés Navarro	Guadañador Recolector
Yovanny Antonio Mosquera	Recolector
Carlos Alberto Espitia Ardila	Supervisor
Brayan Alberto Espitia Rodríguez	Supervisor
Jimmi Méndez Fulleda	Guadañador Recolector
Juan de Dios Pacheco Villalba	Guadañador recolector
Yefferson Stiven Pacheco Morales	Guadañador recolector

Fuente: Elsa Torres Arenales

Tabla 11 Personal cerramiento Construobras Viales

LISTADO CONTRATISTA CONSTRUOBRAS VIALES	
NOMBRE	**CARGO**
Jessica Alejandra Corredor Paredes	SST
Juan Sebastián Barreto Bonilla	Inspector de obra
Michael Leonardo Becerra	Conductor
Numas Suarez Arrieta	Ayudante general
Carlos Andrés García Ríos	Operario
Cristian Fernando Sisa Estupiñán	Ayudante general
Edward Duván Sisa Estupiñán	Ayudante
Camilo Andrés García Rodríguez	Ayudante
Oscar Darío López Pinzón	Ayudante
Jorge Enrique Garay Torres	Oficial
José Luis Manzano Enrique	Soldador
Luis Tobías Mancera Pedraza	Soldador
Milton Rentería Ortiz	Ayudante General
Alberto Lombana Sánchez	Ayudante
Carlos Arturo Toro	Ayudante general
Oscar Fernando Toro	Ayudante general
Jorge Leonardo Garzón Ochoa	Ayudante general
Oscar Fernando Diaz Zarate	Ayudante general

Fuente: Elsa Torres Arenales

Tabla 12 Personal TECNICONTROL

LISTADO CONTRATISTA TECNICONTROL	
NOMBRE	**CARGO**
Oscar Alberto Diaz	Técnico
Johan Sebastián Ramírez Suarez	Técnico
Jesús Antonio Aguilera Bejarano	Técnico

Fuente: Elsa Torres Arenales

Tabla 13 Personal OTILIO NICOLAS MORENO

LISTADO CONTRATISTA OTILIO NICOLAS MORENO	
NOMBRE	**CARGO**
Efraín Vanegas Torres	Ayudante Forestal
Jair Oliveros Pardo	Ayudante Forestal
Luis Humberto Lima	Ayudante Forestal
Carlos Alberto Ariza Gutiérrez	Ayudante Forestal
Soleidis Peñaranda Pushaina	Auxiliar
Santos Briñez Ducuara	Ayudante Forestal
Miguel Ángel Restrepo Galvis	Ingeniero Residente
Yeison Andrés Lima Ávila	Ayudante Forestal
Daniel Herrera Suarez	Ayudante general
Samuel de Jesús Álvarez Solar	Ayudante general

Fuente: Elsa Torres Arenales

Tabla 14 Personal JOSE ARGEON MORA

LISTADO CONTRATISTA JOSE ARGEON MORA	
NOMBRE	**CARGO**
Lisnel Antonio Olaya Martínez	Guadañador
Wilmer José Peroso	Ayudante
Linario Adrián González Ipuana	Auxiliar
Carlos Andrés Serna Gallego	Guadañador
José Heriberto López Rojas	Ayudante
German Torrealba Tona	Ayudante
Nicolas Sánchez Cante	Ayudante

Fuente: Elsa Torres Arenales

Tabla 15 Personal ASR INGENIERIA

LISTADO CONTRATISTA ASR INGENIERIA	
NOMBRE	**CARGO**
José Manolo Romero Olarte	Oficial de pintura
Miguel Alfredo Ocampo Rodríguez	Aplicador de Pintura
Cristian Andrey Mendieta Rodríguez	Auxiliar de operaciones
Hernán Darío Perdomo Párraga	Aplicador de Pintura
Roger Harvey León Tafur	Jefe de logística
Luis Fermín Beltran Silva	Jefe de logística

Fuente: Elsa Torres Arenales

9.2 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.

El equipamiento del contratista es el siguiente:

Tabla 16 Equipamiento cuadrilla de contingencia

EQUIPO, HERRAMIENTA DE CUADRILLA DE CONTINGENCIA	CANT.
Barredora mecánica de cepillo. BC 60 Sweeper o similar, modelo ≥2014	1
Cargador 128 hp Bote min 0,43 m3	0
Torres de iluminación con planta eléctrica, planta y accesorios necesarios	1
Minicargador con accesorios. 52 hp. Modelo ≥2014	1
Comprensor (barrido y soplado)125 ft3 Ingersoll Rand o similar modelo ≥2014	1
Hidrolavadora, Katcher o similar	1
Vibrocompactador 10 ton Dynapac o similar modelo ≥ 2012	0
Volqueta 7 m3 modelo ≥2014	1
Planta eléctrica 0 a 12kva ft-145-. Dinco modelo ≥2014	1
Camioneta doble cabina 4x4 modelo ≥2014	1

Fuente: Elsa Torres Arenales

Tabla 17 Equipamento obra

TIPO	CONTRACTUAL (descripción)	ACTUAL (descripción)	CANTIDAD
Equipo menor	Torres de iluminación		2
Equipo		Tractor con roto Speed	1
Equipo menor		Cortadora de asfalto	1
Equipo menor		Rana	1
Equipo menor		saltarín	1
Equipo		Camioneta	1
Equipo		Compactador manual	1
Equipo	Volqueta		1
Equipo menor	Sopladora		1
Equipo menor	Sopladora		1
Equipo menor		Guadañadora	12
Equipo menor		Pulidora	2
Equipo menor		Fumigadora	2
Equipo		Minitractor podador	1
Equipo		Camiones	3

Fuente: Elsa Torres Arenales

9.3 Control climatológico y de horas trabajadas.

A continuación, se relaciona el reporte de lluvias presentado en el periodo en mención:

Tabla 18 Registro precipitaciones durante el periodo

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA BAJA	LLUVIA MODERADA	HORAS DE LLUVIA
Miércoles	21-dic-22	16:09	17:00			X	0:51
Jueves	29-dic-22	14:34	14:45			X	0:11
Domingo	08-ene-23	12:15	02:00			X	1:45
Martes	10-ene-23	02:18	03:45	X			1:27
		16:12	19:00	X			2:48
		23:45	23:59			X	0:14
Miércoles	11-ene-23	00:01	02:18			X	2:17
		12:30	12:46	X			0:16
		16:05	17:30			X	1:25
Jueves	12-ene-23	12:20	01:30			X	1:10
		01:30	02:10	X			0:40

Fuente: Elsa Torres Arenales

9.4 Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA.

No aplica.

10 REGISTRO FOTOGRÁFICO

10.1 Área técnica

Ilustración 6 Suministro y aplicación de pintura para señalización horizontal en pista sur


ID	INF-04-01	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Suministro y aplicación de pintura para señalización horizontal en pista norte y sur		
Ubicación:	14R- 32L - Aeropuerto Internacional El Dorado.		



Fuente: Elsa Torres Arenales

Ilustración 7 Poda de zonas verdes dentro de zona de seguridad de las pistas

ID	INF-04-02	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Poda de zonas verdes dentro de zona de seguridad de las pistas		
Ubicación:	Zonas de seguridad de pistas. Aeropuerto Internacional El Dorado.		

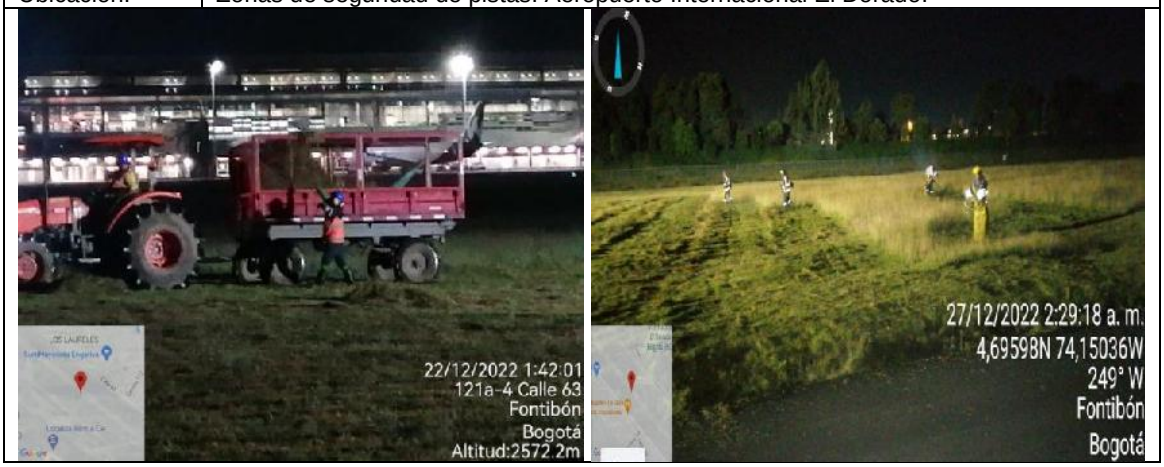

Fuente: Elsa Torres Arenales

Ilustración 8 Poda de zonas verdes fuera de zona de seguridad de las pistas

ID	INF-04-03	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Poda de zonas verdes fuera de zona de seguridad de las pistas		
Ubicación:	Zonas fuera de áreas de seguridad de pistas. Aeropuerto Internacional El Dorado.		





Fuente: Elsa Torres Arenales

Ilustración 9 Poda de árboles de altura variable y diferentes portes

ID	INF-04-04	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Poda de árboles de altura variable y diferentes portes		
Ubicación:	Jarillón Fontibón - Aeropuerto Internacional El Dorado.		



Fuente: Elsa Torres Arenales

Ilustración 10 Mejoramiento y conservación - canales

ID	INF-04-05	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Mejoramiento y conservación - canales		
Ubicación:	Limpieza de canales - Aeropuerto Internacional El Dorado		



Fuente: Elsa Torres Arenales

Ilustración 11 Mejoramiento y conservación de cerramientos

ID	INF-04-06	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Mejoramiento y conservación de cerramientos		
Ubicación:	Cerramiento externo – perimetral Fontibón - Aeropuerto Internacional El Dorado.		



Fuente: Elsa Torres Arenales

Ilustración 12 Actividades propias del equipo de contingencia

ID	INF-04-07	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Revisión periódica equipo de contingencia		
Ubicación:	Equipo de contingencia eventualidades y correctivos 24 horas - Aeropuerto Internacional El Dorado.		





Fuente: Elsa Torres Arenales

Ilustración 13 Implementación de plan de manejo de plagas en zonas no concesionadas.

ID	INF-04-08	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Implementación de plan de manejo de plagas		
Ubicación:	Aeropuerto Internacional El Dorado.		





Fuente: Elsa Torres Arenales

10.2 Área SISOMA

Ilustración 14 Inspecciòn de maquinaria y equipos.

ID	INF-04-09	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Inspección de equipos, herramienta y maquinaria.		
Ubicación:	Campamento - Aeropuerto Internacional El Dorado.		



Fuente: Elsa Torres Arenales.

Ilustración 15 Tanqueo de combustible.


ID	INF-04-10	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Tanqueo de combustible.		
Ubicación:	Campamento - Aeropuerto Internacional El Dorado.		



Fuente: Elsa Torres Arenales

Ilustración 16 Inspección de extintores, botiquín y camilla de emergencia, Contratista e Interventoria.

ID	INF-04-11	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Inspección de extintores y botiquín, Contratista e interventoría.		
Ubicación:	Campamento – Aeropuerto Internacional El Dorado.		

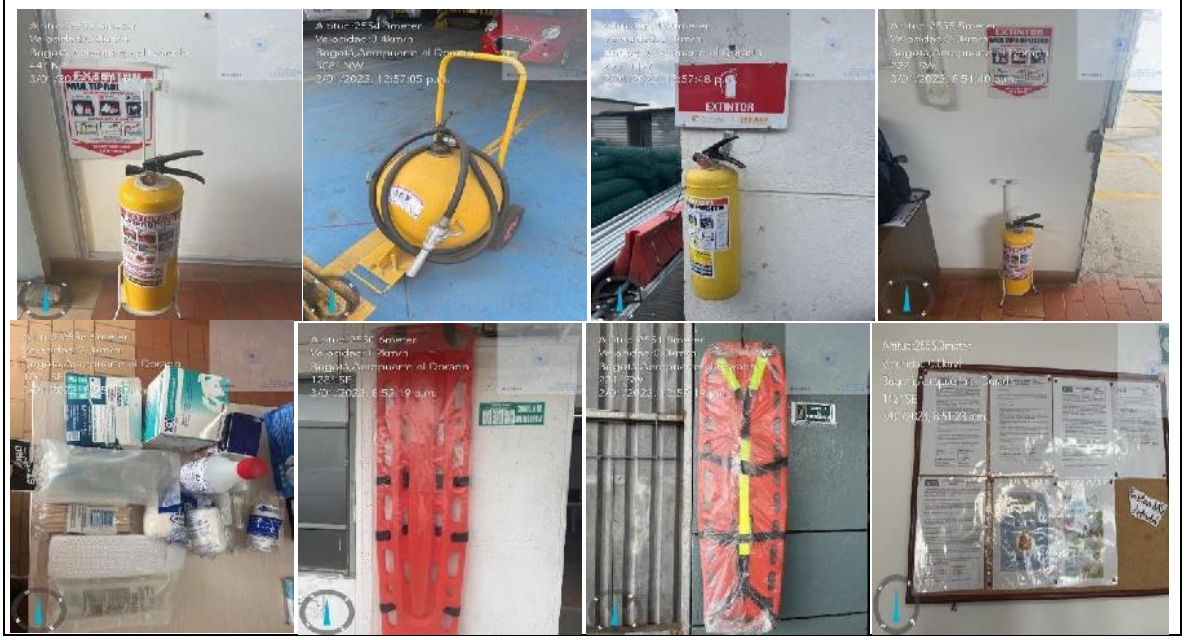

Fuente: Elsa Torres Arenales.

Ilustración 17 Inspección actividad prolongación de la altura del cerramiento costado Fontibón.


ID	INF-04-12	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Inspección actividad prolongación de la altura del cerramiento costado Fontibón.		
Ubicación:	Costado Fontibón.		



Fuente: Elsa Torres Arenales.

Ilustración 18 Inspección de documentación SST (preoperacionales, permisos y ATS).

ID	INF-04-13	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Inspección de documentación SST (preoperacionales, permisos y ATS).		
Ubicación:	Cerramiento costado Fontibón.		

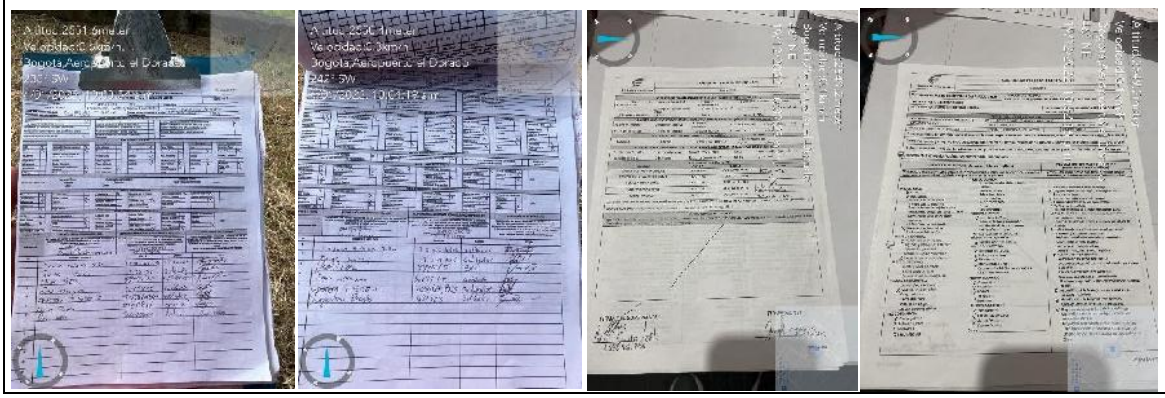

Fuente: Elsa Torres Arenales

Ilustración 19 Recorrido inspecciòn roceria zona 45

ID	INF-04-14	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Recorrido inspección rocería.		
Ubicación:	Perimetral Fontibón		



Fuente: Elsa Torres Arenales

Ilustración 20 Inspecciòn de sticker, jornada nocturna.

ID	INF-04-15	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Inspecciòn de sticker, jornada nocturna		
Ubicación:	Campamento Consorcio C&J Aerocivil 2022		



Fuente: Elsa Torres Arenales.

Ilustración 21 Inspecciòn de puntos ecologicos y acopio de residuos sòlidos y peligrosos.

ID	INF-04-16	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Inspecciòn de puntos ecologicos y acopio de residuos sòlidos y peligrosos.		
Ubicación:	Campamento Aeropuerto Internacional El Dorado.		



Fuente: Elsa Torres Arenales

Ilustración 22 Recorrido de inspecciòn de tubos Manejo Integrado de Plagas.

ID	INF-04-17	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Recorrido de inspecciòn de tubos Manejo Integrado de Plagas.		
Ubicación:	Perimetral Fontibón.		



Fuente: Elsa Torres Arenales

Ilustración 23 Recorrido inspecciòn de tubos Manejo Integrado de Plagas.Fuente: Elsa Torres Arenales.

ID	INF-04-18	Fecha:	Dic. Ene
Ítem:	Recorrido inspecciòn de tubos Manejo Integrado de Plagas.		
Ubicación:	Jarillón Engativá		



Fuente: Elsa Torres Arenales

11 GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES

11.1 Documentación recibida por interventoría

Se realiza el siguiente seguimiento:

Tabla 19 Documentación recibida por interventoría No.1

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA C&J		
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**
16/12/2022	179-22-CLI-C&J2022-DIR	RESPUESTA A COMUNICADO INT-AERODORADO-144-2022
16/12/2022	180-22-CLI-C&J2022-DIR	RESPUESTA A OFICIO INT-AERODORADO-238-2022-ACTA DE CORTE No 3
16/12/2022	181-22-CLI-C&J2022-DIR	RESPUESTA A OFICIO INT-AERODORADO-236-2022 REITERACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁFICO
16/12/2022	182-22-CLI-C&J2022-DIR	INGRESO DE PERSONAL SUBCONTRATISTA ASR INGENIERIA
16/12/2022	183-22-CLI-C&J2022-DIR	RESPUESTA AL CORREO RECIBIDO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 CON ASUNTO CON ASUNTO SOLICITUD DE ENTREGA DEL INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022
17/12/2022	184-22-CLI-C&J2022-DIR	ENTREGA STICKER DE PERSONAL SUBCONTRATISTA JOSE ARGEON MORA
19/12/2022	185-22-CLI-C&J2022-DIR	ENTREGA STICKER DE PERSONAL TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA
21/12/2022	186-22-CLI-C&J2022-DIR	INFORMACIÓN ACTIVIDADES DE PINTURA HORIZONTAL Y VERTICAL
21/12/2022	187-22-CLI-C&J2022-DIR	STICKER VEHICULO DE APLICACIÓN DE PINTUTRA
21/12/2022	188-22-CLI-C&J2022-DIR	ENTREGA DE INFORME MENSUALL SST
22/12/2022	189-22-CLI-C&J2022-DIR	ENTREGA LETREROS VERTICALES - DESMONTADOS
23/12/2022	190-22-CLI-C&J2022-DIR	HOJA DE VIDA INGENIERO AUXILIAR
23/12/2022	191-22-CLI-C&J2022-DIR	RESPUESTA A OFICIO INT-AERODORADO-245-2022 NOVEDAD ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 23 DE DICIEMBRE DE 2022 Y STICKER
23/12/2022	192-22-CLI-C&J2022-DIR	ENTREGA DE DOCUMENTOS INGRESO DE PERSONAL Y MAQUINARIA
24/12/2022	193-22-CLI-C&J2022-DIR	ENTREGA DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL
28/12/2022	195-22-CLI-C&J2022-DIR	COTIZACIONES DE LETREROS ADICIONALES DE SEÑALES VERTICALES DESIGNADORAS DE PISTA
29/12/2022	196-22-CLI-C&J2022-DIR	RESPUESTA A COMUNICADO INT-AERODORADO-250-2022 NOVEDAD ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS CERRAMIENTO AUSENCIA INSPECTORA SST SUBCONTRATISTA CONSTRUOBRAS
30/12/2022	197-22-CLI-C&J2022-DIR	RENOVACIÓN DE STICKER DE DOS TRACTORES CORTA CESPED
30/12/2022	198-22-CLI-C&J2022-DIR	SOLICITD DE CERTIFICADO DE FRESADO UTILIZADO Y AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
02/01/2023	199-22-CLI-C&J2022-DIR	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION PRESUPUESTAL
02/01/2023	200-22-CLI-C&J2022-DIR	PROGRAMACIÓN DE CAJA MODIFICATORIO No. 3
04/01/2023	201-22-CLI-C&J2022-DIR	ENTREGA DE COPIAS DE RENOVACIÓN STICKER PERSONAL, Y NUEVO PERSONAL
06/01/2023	202-22-CLI-C&J2022-DIR	RESPUESTA AL COMUNICADO INT-AERODORADO-248-2022 ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL LADO AIRE CANAL 4
06/01/2023	203-22-CLI-C&J2022-DIR	DOCUMENTOS INGRESO DE PERSONAL SUBCONTRATISTA CELQO SAS
06/01/2023	204-22-CLI-C&J2022-DIR	NUEVA COTIZACIÓN DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAGAS - AREAS NO CONCESIONADAS-
06/01/2023	205-22-CLI-C&J2022-DIR	INFORME MENSUAL No. 3 AREA TECNICA
07/01/2023	206-22-CLI-C&J2022-DIR	RESPUESTA A OFICIO INT-AERODORADO-265-2022 ALCANCE COMUNICACIÓN INT-AERODORADO-231-2022 MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS ESTACIÓN DE BOMBEO CATAM

Fuente: Elsa Torres Arenales

11.2 Documentación enviada por interventoría

Tabla 20 Documentación enviada por interventoría

CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONTRATISTA C&J		
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**
16/12/2022	INT-AERODORADO-238-2022	RESPUESTA A COMUNICADO 171-22-CLI-C&J2022-DIR ACTA DE CORTE No. 3
16/12/2022	INT-AERODORADO-239-2022	RESPUESTA A COMUNICADO 179-22-CLI-C&J2022-DIR RESPUESTA A COMUNICADO INT-AERODORADO-144-2022
17/12/2022	INT-AERODORADO-240-2022	APROBACIÓN COMUNICADO 174-22-CLI-C&J2022-DIR INGRESO DE PERSONAL SUBCONTRATISTA JOSE ARGEON MORA Y COMUNICADO 184-22-CLI-C&J2022-DIR ASUNTO ENTREGA STICKER DE PERSONAL SUBCONTRATISTA JOSE ARGEON MORA
19/12/2022	INT-AERODORADO-242-2022	APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMUNICADO 182-22-CLI-C&J2022-DIR INGRESO DE PERSONAL SUBCONTRATISTA ASR INGENIERÍA Y COMUNICADO 185-22-CLI-C&J2022-DIR ASUNTO STICKER DE PERSONAL Y VEHICULO TRABAJO APLICACIÓN DE PINTURA
21/12/2022	INT-AERODORADO-243-2022	RESPUESTA COMUNICADO 186-22-CLI-C&J2022-DIR CON ASUNTO SOLICITUD INFORMACIÓN ACTIVIDAD DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
23/12/2022	INT-AERODORADO-245-2022	NOVEDAD ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 23 DE DICIEMBRE DE 2022 Y STICKER
23/12/2022	INT-AERODORADO-246-2022	RESPUESTA COMUNICADO 190-22-CLI-C&j2022-DIR HOJA DE VIDA INGENIERO AUXILIAR
23/12/2022	INT-AERODORADO-247-2022	APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMUNICADO 192-22-CLI-C&J2022-DIR INGRESO DE PERSONAL CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022
27/12/2022	INT-AERODORADO-248-2022	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL LADO AIRE CANAL 4
28/12/2022	INT-AERODORADO-250-2022	NOVEDAD ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS CERRAMIENTO AUSENCIA INSPECTORA SST SUBCONTRATISTA CONTRUOBRAS
28/12/2022	INT-AERODORADO-251-2022	INT-AERODORADO-251 Solicitud Rendimientos financieros anticipo No. 22001132 H4 DE 2022
29/12/2022	INT-AERODORADO-252-2022	RESPUESTA A COMUNICADO 188-22-CLI-C&J2022-DIR APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COMPRENDIDO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022
4/1/2023	INT-AERODORADO-255-2022	NOVEDAD STICKER DE PERSONAL SUCONTRATISTAS C&J AEROCIVIL
4/1/2023	INT-AERODORADO-256-2022	RENDIMIENTOS ACTIVIDADES CERRAMIENTO, PODA Y CANALES
5/1/2023	INT-AERODORADO-257-2022	ALCANCE COMUNICACIÓN INT-AERODORADO-231-2022 MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS ESTACIÓN DE BOMBEO CATAM
10/1/2023	INT-AERODORADO-258-2022	REITERACIÓN Y ALCANCE A COMUNICADOS INT-AERODORADO-031-2022 INT-AERODORADO-153-2022 Y INT-AERODORADO-223 ASUNTO CONDICIONES PROCESO DE VALLA NUMERAL 2 8 7 FORMATO 8 A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
11/1/2023	INT-AERODORADO-259-2022	SOLICITUD RETIRO DE RESIDUOS CANAL NUMERO 12
11/1/2023	INT-AERODORADO-260-2022	SOLICITUD ENTREGA POR PARTE DEL CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022 DEL ICA DEL 2do SEMESTRE DEL AÑO 2022 MAXIMO AL MARTES 31 DE ENERO DE 2023 Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES
11/1/2023	INT-AERODORADO-261-2022	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA AL CONTRATO DE OBRA No. 22001132 H4 DE 2022
11/1/2023	INT-AERODORADO-262-2022	CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL GENERADO POR EL GESTOR QUE REALIZA EL TRANPOSRTE RECOLECCIÓNY DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES (ORDINARIOS) AL CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022
12/1/2023	INT-AERODORADO-263-2022	RESPUESTA A COMUNICADO 204-22-CLI-C&J2022-DIR NUEVA CTIZACIÓN DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAGAS AREAS NO CONCESIONADAS

Fuente: Elsa Torres Arenales

11.3 Copia del libro diario de obra

- Anexo 15 - Bitácora Obra desde el 16-dic-2022 al 16-ene-2022

11.4 Certificaciones y fichas técnicas

Fichas técnicas de materiales usados en el mes se encuentran almacenadas en el archivo de Interventoría.

11.4.1 Equipos de contratista

Lo presentando en el ítem 9.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.

11.4.2 Equipos de interventoría

No aplica.

12 ANEXOS

- Anexo 01 - ACTA No. 11
- Anexo 02 - Planilla de Seguridad Social INTERVENTORIA ELSA TORRES ARENALES
- Anexo 03 - Planilla Seguridad Social CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022.
- Anexo 04 - Planilla Seguridad Social JMS INGENIERIA
- Anexo 05 - Comunicado INT-AERODORADO-269-2023
- Anexo 06 - Planilla de Seguridad Social JOSE ARGEON MORA.
- Anexo 07 - Planilla de Seguridad Social TECNICONTROL
- Anexo 08 - Planilla de Seguridad Social OTILIO NICOLAS MORENO
- Anexo 09 - Planilla de Seguridad Social CONSTRUOBRAS VIALES.
- Anexo 10 - Soporte de afiliaciones EMPRESA JMS – INGENIERA AUXILIAR
- Anexo 11 - Planilla de Seguridad Social WILLIAM y Soportes de Afiliación
- Anexo 12 - Planilla de Seguridad Social ASR INGENIERIA.
- Anexo 13. Planilla de Seguridad Social Omar Yesid Mojica
- Anexo 14 - Reporte FURAT
- Anexo 15 - Bitácora Obra desde el 16-dic-2022 al 16-ene-2022

ANEXO 1

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Acta No. 11

Área / Proceso que realiza la reunión:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

❑ Contratista: ❑ Interventor: ❑ Supervisor:	CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022 ELSA TORRES ARENALES Ing. Carlos Mauricio Guevara Baracaldo.	Contrato N° 22001132 H4 DE 2022. Contrato N° 22001197 H3 DE 2022. AEROCIVIL.

Tema de la reunión:	❑ Seguimiento del contrato				
Fecha:	**12 enero de 2023**	Hora Inicio:	**10:10**	Hora Final:	**10:45**
Asistentes:	Los firmantes.				

1. AGENDA

Orden del día

1. Cronograma de ejecución del contrato.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reúnen en campamento de mantenimiento los firmantes, dando inicio al comité de la siguiente manera:

Contratista de obra expone la propuesta de programación para dar cumplimiento al plazo y adición de recursos aprobados en el Modificatorio No. 2:

- Se tiene programado iniciar actividad de pintura en pista y calles de rodaje la próxima semana, por otro lado, indica que les estarán entregando la pintura de trafico plástico en frio a finales de enero, por lo cual tienen programado iniciar esta actividad la primer semana de febrero.
- El día lunes iniciarían actividad de sello de fisuras en pista norte.
- La interventoría expresa su preocupación ante el rendimiento presentado en la prolongación de altura del cerramiento y propone aumentar el personal o equipo destinado para estas actividades.

Área / Proceso que realiza la reunión:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Contratista de obra indica que ha venido trabajando en el cerramiento a fin de dar entrega el 16 enero del 2023 de 2680ml en su totalidad, por otro lado expone que hoy inician con la instalación del cerramiento de la perimetral de Engativá.

Interventoría establece atender las recomendaciones realizadas por el Jefe Seguridad Aviación General y Perímetro (Camilo Catama), las cuales eran garantizar en todo momento la altura del cerramiento de 2,5m con alambre de púas y/o concertina o una altura de 5m de malla eslabonada (con sus respectivos parales a la misma altura).

- La instalación de mezcla asfáltica se tiene programado realizar en 3 jornadas, iniciando desde el 01 de febrero del 2023.

- Contratista de obra se compromete con iniciar esta semana la limpieza de maleza presente entre Calle L y H2 (reportado por SM de turno) y realizar limpieza de rejillas ubicadas en E.

- En cuanto a la conformación de vías perimetrales, contratista de obra tiene programado ingresar una motoniveladora para ejecutar esta actividad la próxima semana.

- Interventoría solicita recoger el material retirado de los canales (buchón y césped) pues esto puede afectar la seguridad operacional, contratista de obra indica que debido al estado del clima que se ha presentado últimamente, el retiro de este material se ha dificultado, ya que para el ingreso a estas zonas no es posible que un vehículo ingrese.

  Interventoría recomienda hacer el corte y la recolección simultáneamente para evitar acumulación de material retirado en los canales.

- Respecto a la actividad de tala de árboles, interventoría indica que se está a la espera de aprobación por parte de la Aerocivil desde el Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna, para iniciar con esta actividad.

- Contratista de obra expresa que actualmente están en búsqueda de más personal y equipos para realizar la actividad de poda y con esto espera incrementar el rendimiento dando el cumplimiento de la totalidad de la poda.

Siendo las 10:45 horas, firman quienes asistieron.

	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Acta No. 11
Área / Proceso que realiza la reunión:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ



3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

Los indicados en el acta.

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
	Inicio de pintura acrílica en pista y calles de rodaje	Consorcio C&J AEROCIVIL 2022	Semana del 16 al 22 de enero del 2023
	Inicio de pintura de trafico plástico en frio	Consorcio C&J AEROCIVIL 2022	Semana del 30 de enero al 05 de febrero del 2023
	Inicio de sello de fisuras	Consorcio C&J AEROCIVIL 2022	Lunes 16 de enero del 2023
	Entrega de 2680ml completos de cerramiento externo Fontibón	Consorcio C&J AEROCIVIL 2022	Lunes 16 de enero del 2023
	Instalación de mezcla asfáltica	Consorcio C&J AEROCIVIL 2022	Inicia la madrugada del 01 de febrero al 04 de febrero del 2023
	Limpieza de maleza en Calle L y H2.	Consorcio C&J AEROCIVIL 2022	Del 13 al 15 de enero del 2023
	Limpieza de rejillas ubicadas en E	Consorcio C&J AEROCIVIL 2022	Del 13 al 15 de enero del 2023
	Inicio de conformación de vías perimetrales	Consorcio C&J AEROCIVIL 2022	Semana del 16 al 22 de enero del 2023

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los **12** días del mes de **enero** del **2023** por los asistentes:

Nombre completo	Entidad / Empresa	Cargo	Firma
Ing. Luis Rodríguez	Interventoría ETA	Director de interventoría	
Ing. Felipe Vallejo	Interventoría ETA	Residente de interventoría	
Ing. Paula Orjuela	Interventoría ETA	Residente de interventoría	

	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Acta No. 11
Área / Proceso que realiza la reunión:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Nombre completo	**Entidad / Empresa**	**Cargo**	**Firma**
Yulder Rativa	Interventoría ETA	Inspector de apoyo lado aire y/o lado tierra	
Ing. Alejandro Espinosa	Consorcio C&J AEROCIVIL 2022	Director de obra	
Ing. Yessica Ortiz	Consorcio C&J AEROCIVIL 2022	Residente de obra	Yessica Ortiz

Control de cambios.

Fecha	Objeto

ANEXO 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELSA TORRES ARENALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	TELÉFONO:	7446234
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0006 - CONT.NO.22001197 H3 DE 2022-AEROCIVIL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7864726560**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/01/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1848121269

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 3.444.600	$ 0	$ 0	$ 94.500	$ 94.500	$ 0	$ 0	$ 3.633.600	$ 0	$ 3.633.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 2.885.500	$ 0	$ 0	$ 77.000	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 3.039.500	$ 0	$ 3.039.500
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 784.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 784.900	$ 0	$ 784.900
SUBTOTALES:										**$ 7.458.000**	**$ 0**	**$ 7.458.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.300	$ 0	$ 0	$ 124.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 260.000
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.900	$ 0	$ 0	$ 210.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.183.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.183.700	$ 0	$ 0	$ 1.183.700
SUBTOTALES:													**$ 1.778.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.778.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.979.400	$ 2.979.400	$ 0	$ 0	$ 2.979.400
SUBTOTALES:									**$ 2.979.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.979.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	9	$ 1.778.900	$ 0	$ 1.778.900
SUBTOTALES:			**$ 1.778.900**	**$ 0**	**$ 1.778.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELSA TORRES ARENALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	TELÉFONO:	7446234
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0006 - CONT.NO.22001197 H3 DE 2022-AEROCIVIL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**7864726560**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/01/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1848121269

TOTAL	$ 13.995.200

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

ANEXO 3

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901624349	1	CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO CYJ AEROCIVIL 2022	CRA 7 NO 75 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6401500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1866018898	9445493247	E	2023/01/12	2023/01/16	BANCO DE OCCIDENTE	4	$18,870,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO CYJ AEROCIVIL 2022 (26 Afiliados)																						$65,985,647	$10,714,700			$65,985,647	$2,623,700			$66,221,062	$2,614,200			$65,985,647		$2,832,700		$0	$0		$18,785,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)																						$895,933	$144,900			$895,933	$19,000			$895,933	$0			$895,933		$0		$0	$0		$163,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						$895,933	$144,900			$895,933	$19,000			$895,933	$0			$895,933		$0		$0	$0		$163,900
1	CC	93445614	AROCA CARLOS										X								25-14	1	$128,700	$22,000	EPS002	1	$128,700	$0	CCF24	1	$128,700	$0	14-4	1	$128,700	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,000
2	CC	1031160697	BERMUDEZ ALISON											X							231001	2	$100,000	$16,000	EPS005	2	$100,000	$4,000	CCF24	2	$100,000	$0	14-4	2	$100,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$20,000
3	CC	1010063741	CORTES KAREN											X							230301	10	$339,899	$54,400	EPS002	10	$339,899	$13,600	CCF24	10	$339,899	$0	14-4	10	$339,899	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$68,000
4	CC	1023933963	DAZA JEFERSSON										X								230301	1	$98,000	$15,700	EPS002	1	$98,000	$0	CCF24	1	$98,000	$0	14-4	1	$98,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,700
5	CC	1023933963	DAZA JEFERSSON										X								230301	1	$98,000	$15,700	EPS002	1	$98,000	$0	CCF24	1	$98,000	$0	14-4	1	$98,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,700
6	CC	1023933963	DAZA JEFERSSON										X								230301	1	$98,000	$15,700	EPS002	1	$98,000	$0	CCF24	1	$98,000	$0	14-4	1	$98,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,700
7	CC	1094371052	VILLAMIZAR DUVAN											X							230301	1	$33,334	$5,400	EPS008	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$0	14-4	1	$33,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,800

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901624349	1	CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO CYJ AEROCIVIL 2022	CRA 7 NO 75 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6401500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1866018898	9445493247	E	2023/01/12	2023/01/16	BANCO DE OCCIDENTE	4	$18,870,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$10,714,700	$48,600	$0	$10,763,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$414,100	$1,900	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,746,500	$12,500	$0	$2,759,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$5,320,900	$24,100	$0	$5,345,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,233,200	$10,100	$0	$2,243,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,832,700	$12,800	$0	$2,845,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	26	$2,832,700	$12,800	$0	$2,845,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,614,200	$11,800	$0	$2,626,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$2,614,200	$11,800	$0	$2,626,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				26	$2,623,700	$12,100	$0	$2,635,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$102,100	$500	$0	$102,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$160,400	$800	$0	$161,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$544,400	$2,500	$0	$546,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$239,100	$1,100	$0	$240,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$1,005,600	$4,600	$0	$1,010,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$572,100	$2,600	$0	$574,700
TOTAL				**26**	**$18,785,300**	**$85,300**	**$0**	**$18,870,600**

ANEXO 4

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900527061	7	JMS INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AEROPUERTO	CARRERA 45 A 91-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7030651	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1858140329	9445364273	E	2023/01/16	2023/01/11	BANCO DE BOGOTA	0	$29,725,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AEROPUERTO (51 Afiliados)																							$96,654,694	$15,515,400			$96,654,694	$3,840,700			$96,057,596	$3,816,800			$96,654,694		$6,552,100		$0	$0		$29,725,000
Centro de Trabajo: 5 (51 Afiliados)																							$96,654,694	$15,515,400			$96,654,694	$3,840,700			$96,057,596	$3,816,800			$96,654,694		$6,552,100		$0	$0		$29,725,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (51 Afiliados)																							$96,654,694	$15,515,400			$96,654,694	$3,840,700			$96,057,596	$3,816,800			$96,654,694		$6,552,100		$0	$0		$29,725,000
1	CC	1033816627	ALARCON BRIYITH									X									23030 1	30	$1,640,834	$262,600	EPS008	30	$1,640,834	$65,700	CCF24	30	$1,640,834	$65,700	14-11	30	$1,640,834	6.960%	$114,300	30	$0	$0	Si	$508,300
2	CC	1010223139	ARBOLEDA MARIA																		23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
3	CC	1106951856	ARDILA CARLOS		X															X	25-14	16	$1,066,667	$170,700	EPS037	16	$1,066,667	$42,700	CCF24	16	$1,327,778	$53,200	14-11	16	$1,066,667	6.960%	$74,300	16	$0	$0	Si	$340,900
4	CC	1030616292	BARAJAS FABIAN									X									23030 1	30	$2,594,334	$415,100	EPS017	30	$2,594,334	$103,800	CCF24	30	$2,594,334	$103,800	14-11	30	$2,594,334	6.960%	$180,600	30	$0	$0	Si	$803,300
5	CC	79497832	BARRERO JORGE									X									25-14	30	$1,427,344	$228,400	EPS017	30	$1,427,344	$57,100	CCF24	30	$1,427,344	$57,100	14-11	30	$1,427,344	6.960%	$99,400	30	$0	$0	Si	$442,000
6	CC	1121895357	BOHORQUEZ FABIAN									X									23030 1	30	$1,594,791	$255,200	EPS008	30	$1,594,791	$63,800	CCF24	30	$1,594,791	$63,800	14-11	30	$1,594,791	6.960%	$111,000	30	$0	$0	Si	$493,800
7	CC	80807543	BUITRAGO LUVIN	X																	23020 1	19	$950,000	$152,000	EPS008	19	$950,000	$38,000	CCF24	19	$950,000	$38,000	14-11	19	$950,000	6.960%	$66,200	19	$0	$0	Si	$294,200
8	CC	93089177	CAICEDO JOSE																		23100 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
9	CC	1110179534	CAPERA ANYELO									X									23030 1	30	$2,248,875	$359,900	ESSC24	30	$2,248,875	$90,000	CCF24	30	$2,248,875	$90,000	14-11	30	$2,248,875	6.960%	$156,600	30	$0	$0	Si	$696,500
10	CC	1110178391	CAPERA YOSEP									X									23100 1	30	$1,650,208	$264,100	EPS017	30	$1,650,208	$66,100	CCF24	30	$1,650,208	$66,100	14-11	30	$1,650,208	6.960%	$114,900	30	$0	$0	Si	$511,200
11	CC	79697843	CASTRO JOSE									X									25-14	30	$2,642,666	$422,900	EPS005	30	$2,642,666	$105,800	CCF24	30	$2,642,666	$105,800	14-11	30	$2,642,666	6.960%	$184,000	30	$0	$0	Si	$818,500
12	CC	79183385	CASTRO MAURICIO									X									23030 1	30	$1,961,604	$313,900	EPS037	30	$1,961,604	$78,500	CCF24	30	$1,961,604	$78,500	14-11	30	$1,961,604	6.960%	$136,600	30	$0	$0	Si	$607,500
13	CC	4228629	CORTES CARLOS									X									23030 1	30	$2,389,333	$382,300	EPS002	30	$2,389,333	$95,600	CCF24	30	$2,389,333	$95,600	14-11	30	$2,389,333	6.960%	$166,300	30	$0	$0	Si	$739,800
14	CC	1067093405	CUAVA KELLY										X								23030 1	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$0	CCF24	1	$33,334	$0	14-11	1	$33,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,400
15	CC	1067093405	CUAVA KELLY										X								23030 1	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$0	CCF24	1	$33,334	$0	14-11	1	$33,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,400
16	CC	1067093405	CUAVA KELLY									X									23030 1	28	$1,046,876	$167,600	EPS037	28	$1,046,876	$41,900	CCF24	28	$1,046,876	$41,900	14-11	28	$1,046,876	6.960%	$72,900	28	$0	$0	Si	$324,300
17	CC	1007866196	CULMA HUVER										X								23020 1	4	$180,000	$28,800	EPS017	4	$180,000	$0	CCF24	4	$180,000	$0	14-11	4	$180,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$28,800
18	CC	1007866196	CULMA HUVER									X									23020 1	26	$1,701,562	$272,300	EPS017	26	$1,701,562	$68,100	CCF24	26	$1,701,562	$68,100	14-11	26	$1,701,562	6.960%	$118,500	26	$0	$0	Si	$527,000
19	CC	1050040603	ESCOBAR JEAN										X								23030 1	1	$45,000	$7,200	ESSC07	1	$45,000	$0	CCF24	1	$45,000	$0	14-11	1	$45,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,200
20	CC	1050040603	ESCOBAR JEAN									X									23030 1	29	$1,458,281	$233,400	ESSC07	29	$1,458,281	$58,400	CCF24	29	$1,458,281	$58,400	14-11	29	$1,458,281	6.960%	$101,500	29	$0	$0	Si	$451,700
21	CC	80071044	GUIO JOSE									X									23020 1	30	$1,926,876	$308,400	EPS017	30	$1,926,876	$77,100	CCF24	30	$1,926,876	$77,100	14-11	30	$1,926,876	6.960%	$134,200	30	$0	$0	Si	$596,800
22	CC	79518437	LOAIZA YOBANY									X									23030 1	30	$2,642,666	$422,900	EPS002	30	$2,642,666	$105,800	CCF24	30	$2,642,666	$105,800	14-11	30	$2,642,666	6.960%	$184,000	30	$0	$0	Si	$818,500
23	CC	1016942987	MANRIQUE OTTO		X							X								X	23030 1	2	$542,083	$86,800	EPS005	2	$542,083	$21,700	CCF24	2	$622,639	$25,000	14-11	2	$542,083	6.960%	$37,800	2	$0	$0	Si	$171,300
24	CC	1007615938	MARTINEZ KATIUSCA										X								23030 1	1	$33,334	$5,400	EPS041	1	$33,334	$0	CCF24	1	$33,334	$0	14-11	1	$33,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,400
25	CC	1007615938	MARTINEZ KATIUSCA									X									23030 1	29	$1,013,542	$162,200	EPS041	29	$1,013,542	$40,600	CCF24	29	$1,013,542	$40,600	14-11	29	$1,013,542	6.960%	$70,600	29	$0	$0	Si	$314,000
26	CC	1030523973	MEDINA EDWIN									X									23030 1	30	$1,952,437	$312,400	EPS017	30	$1,952,437	$78,100	CCF24	30	$1,952,437	$78,100	14-11	30	$1,952,437	6.960%	$135,900	30	$0	$0	Si	$604,500
27	CC	1016032503	MORENO EDWIN									X									23030 1	30	$3,986,978	$638,000	EPS002	30	$3,986,978	$159,500	CCF24	30	$3,986,978	$159,500	14-11	30	$3,986,978	6.960%	$277,500	30	$0	$0	Si	$1,234,500
28	CC	1026270626	OLIVEROS WILLIAM											X		X					23030 1	9	$1,277,779	$217,300	EPS008	9	$1,277,779	$51,200	CCF24	5	$833,334	$33,400	14-11	9	$1,277,779	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$301,900
29	CC	1026270626	OLIVEROS WILLIAM																		23030 1	21	$3,500,000	$595,000	EPS008	21	$3,500,000	$140,000	CCF24	21	$3,500,000	$140,000	14-11	21	$3,500,000	6.960%	$243,600	21	$0	$0	Si	$1,118,600

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900527061	7	JMS INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AEROPUERTO	CARRERA 45 A 91-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7030651	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1858140329	9445364273	E	2023/01/16	2023/01/11	BANCO DE BOGOTA	0	$29,725,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	$15,515,400	$0	$0	$15,515,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,035,900	$0	$0	$1,035,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,289,100	$0	$0	$2,289,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$9,164,700	$0	$0	$9,164,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$3,025,700	$0	$0	$3,025,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$6,552,100	$0	$0	$6,552,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	51	$6,552,100	$0	$0	$6,552,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$3,816,800	$0	$0	$3,816,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	51	$3,816,800	$0	$0	$3,816,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				51	$3,840,700	$0	$0	$3,840,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$141,400	$0	$0	$141,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$566,900	$0	$0	$566,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$90,000	$0	$0	$90,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$140,000	$0	$0	$140,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$1,022,100	$0	$0	$1,022,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$58,400	$0	$0	$58,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$588,700	$0	$0	$588,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,600	$0	$0	$40,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$719,000	$0	$0	$719,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$473,600	$0	$0	$473,600
TOTAL				**51**	**$29,725,000**	**$0**	**$0**	**$29,725,000**

ANEXO 5

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-AERODORADO-269-2023

Bogotá, 16 de enero de 2023.

CE-196 RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA
CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022
NIT 901 624 349-1
RADICADO Int-Aerodorado-269-2023
FECHA: 16-01-2023 HORA: 2:30 p.m.
RECIBE: Pilar Sala

Señores
CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022.
Atn. ING. Carlos Alberto Ferreira Sandino
Representante Legal
Bogotá D.C

REF: CONTRATO No. 22001197 H3 de 2022, CUYO OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ"

ASUNTO: NOVEDAD PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, SUBCONTRATISTA CONSTRU BASE S.A.S.

Cordial saludo,

Esta interventoría en revisión de los pagos de planilla de Seguridad Social, evidencia que el subcontratista **Constru Base S.A.S.** empresa contrata por el Consorcio C&J Aerocivil 2022 y su quienes ejecutan actividades de poda, a la fecha 13 de enero de 2023 no ha realizado el pago correspondiente, como se evidencia en la siguiente imagen:

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901376523-2	CONSTRU BASE S.A.S.		KR 95 A 138 58	2224811	sandra.diazlopez@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C - MIPYME	BOGOTA PERSON	PPAL	SANTANDER	LEBRIJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	13/12/2022	64920842	$2.707.100	

Por tal razón, ***esta interventoría como garante de cumplimiento en todos los procesos contractuales y desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo SUSPENDE las actividades constructivas de poda ejecutadas por Constru Base S.A.S, ya que es un riesgo a la seguridad de los colaboradores, POR NO COBERTURA DE LA ARL (ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES)***, adicional se solicita una respuesta por parte del **Consorcio C&J Aerocivil 2022**, del pago actualizado de la planilla de Seguridad Social del subcontratista **Constru Base S.A.S**, ya que se evidencia el no ingreso de los colaboradores a desempeñar sus funciones y por lo tanto un **INCUMPLIMIENTO** respecto a la cantidad de personal que es insuficiente para la ejecución de la actividad de poda en la jornada diurna, lo que repercute en el bajo rendimiento con un porcentaje de atraso del **13.98%**, para dar cumplimiento del contrato de obra No. 22001132 H4.

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-AERODORADO-269-2023

Como cumplimiento de la normatividad Legal Vigente que enmarca el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidencia una falta a lo consagrado en la Ley 100 de 93: *"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"* y el Código Sustantivo del Trabajo.

Cordialmente,

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

ANEXO 6

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-01-10, 05:50:57 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 60267758

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** enero de 2023

PAGADO 07/01/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE ARGEON MORA SERRANO		
Documento	CC79257016	**Dirección**	CR 15C ESTE #22 - 22
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5751523
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	15	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032455022	CARLOS ANDRES SERNA GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1069176654	NICOLAS SANCHEZ CANTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1073692418	BRAYAN ALEXIS GARCIA CUELLAR	01	00	X																0	12	12	12	12	(231001) COLFONDOS	$ 400.000	$ 64.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 11510477	WALTER GERARDO ROJAS SEPULVEDA	01	00	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 500.000	$ 80.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 500.000	$ 20.000	6,960	$ 500.000	$ 34.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.800
CC 17872460	LINARIO ADRIAN GONZALEZ IPUANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 3080739	JOSE HERIBERTO LOPEZ ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 51970852	BLANCA FLOR QUINTERO VELANDIA	01	00	X																0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 166.667	$ 26.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 166.667	$ 6.700	6,960	$ 166.667	$ 11.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.800
CC 5935728	REINEL RIOS ZEA	01	00	X																0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 400.000	$ 64.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 79547095	JOSE FRANQUIN MORA SERRANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 79547096	OSCAR HERNANDO MORA SERRANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 79812948	GONZALO ROA SOLER	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 80740757	LISNEL ANTONIO OLAYA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
PT 5725928	ROSA MARIANA ALVARADO	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
PT 975468	GERMAN TORREALBA TONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
PT 993685	WILMER JOSE PEROZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.866.667	$ 11.866.667	$ 11.866.667	$ 11.866.667	$ 1.898.700	$ 474.700	$ 826.200	$ 474.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.674.300	$ 21.200	$ 3.695.500

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-01-10, 05:49:21 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 60268157

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 07/01/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE ARGEON MORA SERRANO		
Documento	CC79257016	**Dirección**	CR 15C ESTE #22 - 22
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5751523
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79257016	JOSE ARGEON MORA SERRANO	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.600	$ 2.200	$ 356.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 7

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **tecni control fumigaciones sas**, identificada con **NI** número **901098279**, aportó por el empleado **JESUS ANTONIO AGUILERA BEJARANO** identificado(a) con **CC** número **80246079** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2022 y 10 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	COTIZACION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CONFIRMADO
14-11	ARL SURA	1												0	30	$1,000,000	0.06960	$69,600	$0	$0	Septiembre - 2022	62377329	11/10/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1												0	30	$1,000,000	0.04000	$40,000	$0	$0	Septiembre - 2022	62377329	11/10/2022	Si
230301	Porvenir	1												0	30	$1,000,000	0.16000	$160,000	$0	$0	Septiembre - 2022	62377329	11/10/2022	Si
EPS002	Salud Total EPS	1												0	30	$1,000,000	0.04000	$40,000	$0	$0	Octubre - 2022	62377329	11/10/2022	Si

El presente certificado se expide a los **11** días del mes **Octubre** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **tecni control fumigaciones sas**, identificada con **NI** número **901098279**, aportó por el empleado **JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ SUAREZ** identificado(a) con **CC** número **1033781444** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2022 y 10 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	NUMERO SECUENCIA	I.R.P.	S.U.E.	I.T.	LICENCIA M.P.	V.S.T.	S.L.N.	I.G.E.	LICENCIA R.	AFP	AVP	VOLUNTARIOS	NOVEDADES	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTADO
14-11	ARL SURA	1												0	30	$1,000,000	0.06960	$69,600	$0	$0	Septiembre - 2022	62377329	11/10/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1												0	30	$1,000,000	0.04000	$40,000	$0	$0	Septiembre - 2022	62377329	11/10/2022	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1												0	30	$1,000,000	0.04000	$40,000	$0	$0	Octubre - 2022	62377329	11/10/2022	Si
230301	Porvenir	1												0	30	$1,000,000	0.16000	$160,000	$0	$0	Septiembre - 2022	62377329	11/10/2022	Si

El presente certificado se expide a los **11** días del mes **Octubre** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **tecni control fumigaciones sas**, identificada con **NI** número **901098279**, aportó por el empleado **OSCAR ALBERTO DIAZ** identificado(a) con **CC** número **80358175** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2022 y 10 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	PLANILLA	DIAS INCAP	DIAS LICE	DIAS LICE MAT	DIAS LICE PAT	DIAS VAC	DIAS VST	DIAS SLN	DIAS ING	DIAS RET	DIAS TDP	DIAS PENSION	DIAS CO	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CORRECCION
14-11	ARL SURA	1											0	30	$1,000,000	0.06960	$69,600	$0	$0	Septiembre - 2022	62377329	11/10/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1											0	30	$1,000,000	0.04000	$40,000	$0	$0	Septiembre - 2022	62377329	11/10/2022	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1											0	30	$1,000,000	0.04000	$40,000	$0	$0	Octubre - 2022	62377329	11/10/2022	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1											0	30	$1,000,000	0.16000	$160,000	$0	$0	Septiembre - 2022	62377329	11/10/2022	Si

El presente certificado se expide a los **11** días del mes **Octubre** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ANEXO 8

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830085821
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OTILIO NICOLAS MORENO BLANCO LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 64 A N 68 G 03	TELÉFONO:	3783717
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7865219034**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/01/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1848093260

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	10	$ 1.653.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.653.200	$ 0	$ 1.653.200
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 2.773.200**	**$ 0**	**$ 2.773.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 161.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.400	$ 0	$ 0	$ 161.400
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 285.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.400	$ 0	$ 0	$ 285.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 120.000
SUBTOTALES:													**$ 766.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 766.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.205.600	$ 1.205.600	$ 0	$ 0	$ 1.205.600
SUBTOTALES:									**$ 1.205.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.205.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	18	$ 766.800	$ 0	$ 766.800
SUBTOTALES:			**$ 766.800**	**$ 0**	**$ 766.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1006878929	LIMA AVILA YEISON ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1014253693	BLANCO SOTO JOSE FELIPE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1030626481	VANEGAS TORREZ EFRAIN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1033768188	PRIETO VARGAS MARIA ANGELICA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1069898116	PEÑA ALMONANSID LIMMAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 33.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 1.400	14-29-LA EQUIDAD	1	$ 33.334	02	$ 2.400	1	$ 33.334	CCF24-COMPENSAR	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1093922051	ALVAREZ SOLAR SAMUEL DE JESUS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1097666270	ARIZA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1101757215	HERRERA SUAREZ DANIEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1105055813	BRIÑEZ DUCUARA SANTOS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1125289805	MORENO VALENCIA ALIETH NICOLE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	03	$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 17221364	OLIVEROS PARDO JAIR	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830085821
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OTILIO NICOLAS MORENO BLANCO LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 64 A N 68 G 03	TELÉFONO:	3783717
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7865219034**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2022			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/01/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1848093260

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	CC 17221646	LIMA LUIS HUMBERTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 51735898	SOTO BERMEO NOHORA REGINA	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.835.000	FIJO			SI																		30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.835.000	$ 73.400	$ 0	$ 73.400	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.835.000	02	$ 127.800	30	$ 1.835.000	CCF24-COMPENSAR	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 53907542	PEÑARANDA PUSHAINA SOLEIDIS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 7063331	GAMEZ GONZALEZ YERLAN RAUL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 79041814	MORENO BLANCO OTILIO NICOLAS	DEPEND		$ 2.298.720	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.298.720	$ 367.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 367.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.298.720	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 2.298.720		$ 160.000	30	$ 2.298.720	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 79408549	BARRETO MORENO NELSON YESID	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	03	$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 79971347	BENAVIDES BOHORQUEZ GUSTAVO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 5.512.400**

Planilla Pagada

ANEXO 9

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900773521	7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUOBRAS	carrera 11 c 3-60 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4801213	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1799699224	9443899813	E	2022/12/06	2022/12/07	BANCO DAVIVIENDA	1	$13,391,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSTRUOBRAS (71 Afiliados)																							**$42,833,354**	**$6,855,400**			**$44,100,022**	**$1,766,200**			**$43,780,899**	**$1,753,500**			**$44,100,022**		**$3,001,100**		**$0**	**$0**		**$13,376,200**
Centro de Trabajo: CONSTRUOBRAS (70 Afiliados)																							**$42,833,354**	**$6,855,400**			**$43,100,022**	**$1,726,200**			**$42,780,899**	**$1,713,500**			**$43,100,022**		**$2,995,800**		**$0**	**$0**		**$13,290,900**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (70 Afiliados)																							**$42,833,354**	**$6,855,400**			**$43,100,022**	**$1,726,200**			**$42,780,899**	**$1,713,500**			**$43,100,022**		**$2,995,800**		**$0**	**$0**		**$13,290,900**
1	CC	1002299847	BARRERA BOLIVAR WILLIAM MAURICIO	X																	230301	28	$933,334	$149,400	EPS008	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-4	28	$933,334	6.960%	$65,000	28	$0	$0	Si	$289,200
2	CC	80735475	BARRERO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
3	CC	1023947834	BARRETO BONILLA JUAN SEBASTIAN																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
4	CC	1033693324	BEDOYA ALVAREZ OSCAR STEVENS											X							230201	1	$33,334	$5,400	EPS008	1	$33,334	$1,400	CCF24	0	$0	$0	14-4	1	$33,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$6,800
5	CC	1033693324	BEDOYA ALVAREZ OSCAR STEVENS																		230201	29	$966,667	$154,700	EPS008	29	$966,667	$38,700	CCF24	29	$966,667	$38,700	14-4	29	$966,667	6.960%	$67,300	29	$0	$0	Si	$299,400
6	CC	1103113755	BELTRAN BARBOZA ELVER EDUARDO	X	X																230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
7	CC	86030625	BERMUDEZ JOSE ARCADIO	X	X																25-14	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
8	CC	1031178473	BETANCOURT MORA HADE TATIANA																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
9	CC	1104807542	BONILLA BECERRA ARLEY	X	X																230301	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
10	CC	1019047880	BORDA ORTIZ ANDRES FELIPE	X	X																230301	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
11	CC	80084976	BUITRAGO MORENO LALLONEM	X	X																230201	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
12	CC	80371354	BUSTOS DUARTE JAIRO RAUL																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
13	CC	1005852285	CABALLERO ROMERO DUBAN FELIPE											X							230301	2	$66,667	$10,700	EPSC34	2	$66,667	$2,700	CCF24	0	$0	$0	14-4	2	$66,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$13,400
14	CC	1005852285	CABALLERO ROMERO DUBAN FELIPE																		230301	28	$933,334	$149,400	EPSC34	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-4	28	$933,334	6.960%	$65,000	28	$0	$0	Si	$289,200
15	CC	1006414961	CORREDOR VARGAS BRAYAN DAVID																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
16	CC	1010222752	CORREDOR PAREDES JESSICA ALEJANDRA																		230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$68,000	CCF24	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
17	CC	1079292893	CUESTA ROVIRA WILLINTON	X																	230201	10	$333,334	$53,400	EPS037	10	$333,334	$13,400	CCF24	10	$333,334	$13,400	14-4	10	$333,334	6.960%	$23,300	10	$0	$0	Si	$103,500
18	CC	73201476	DIAZ NARVAEZ CESAR AUGUSTO	X																	231001	15	$500,000	$80,000	EPS005	15	$500,000	$20,000	CCF24	15	$500,000	$20,000	14-4	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	Si	$154,800
19	CC	77021679	DIAZ OÑATE LUIS AGUSTIN	X	X																230201	1	$33,334	$5,400	EPSC34	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
20	CC	79912615	DIAZ ZARATE OSCAR BERNARDO	X																	230301	3	$100,000	$16,000	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF24	3	$100,000	$4,000	14-4	3	$100,000	6.960%	$7,000	3	$0	$0	Si	$31,000
21	CC	79132107	GARAY TORRES HENRY OSWALDO	X																	230901	28	$933,334	$149,400	EPSC34	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-4	28	$933,334	6.960%	$65,000	28	$0	$0	Si	$289,200
22	CC	79125708	GARAY TORRES JORGE ENRIQUE	X																	231001	28	$933,334	$149,400	EPS017	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-4	28	$933,334	6.960%	$65,000	28	$0	$0	Si	$289,200
23	CC	1014214357	GARCIA RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	X																	230301	28	$933,334	$149,400	EPS008	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-4	28	$933,334	6.960%	$65,000	28	$0	$0	Si	$289,200
24	CC	3146933	GARZON OCHOA JORGE LEONARDO	X																	230201	5	$166,667	$26,700	EPS041	5	$166,667	$6,700	CCF24	5	$166,667	$6,700	14-4	5	$166,667	6.960%	$11,700	5	$0	$0	Si	$51,800
25	CC	1019060999	GARZON GARCIA PEDRO HOSWALDO	X																	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900773521	7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUOBRAS	carrera 11 c 3-60 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4801213	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1799699224	9443899813	E	2022/12/06	2022/12/07	BANCO DAVIVIENDA	1	$13,391,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				68	$6,855,400	$7,600	$0	$6,863,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$650,800	$800	$0	$651,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$997,600	$1,100	$0	$998,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	$3,867,700	$4,200	$0	$3,871,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$1,189,900	$1,300	$0	$1,191,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$149,400	$200	$0	$149,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				71	$3,001,100	$3,300	$0	$3,004,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	71	$3,001,100	$3,300	$0	$3,004,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				71	$1,753,500	$1,900	$0	$1,755,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	71	$1,753,500	$1,900	$0	$1,755,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				71	$1,766,200	$2,300	$0	$1,768,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$132,300	$200	$0	$132,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$361,700	$400	$0	$362,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$44,100	$100	$0	$44,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	$584,300	$700	$0	$585,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$97,600	$200	$0	$97,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$53,400	$100	$0	$53,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$421,800	$500	$0	$422,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$71,000	$100	$0	$71,100
TOTAL				71	$13,376,200	$15,100	$0	$13,391,300

ANEXO 10

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas

No. de Radicación | Fecha de Radicación (D D M M A A A A)

166464914

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación | B. Reporte de Novedades
2. Tipo de Afiliación: A. Individual | B. Cotizante o Cabeza de Familia | C. Beneficiario o Afiliado adicional | B Colectiva | C. Institucional | D. De Oficio
3. Régimen: A. Contributivo Y | B. Subsidiado
4. Tipo de Afiliado: A. Cotizante X | B. Cabeza de Familia | C. Beneficiario
5. Tipo de Cotizante: A. Dependiente Y | B. Independiente | C. Pensionado
Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres
Primer Apellido: Patiño | Segundo Apellido: Cardenas | Primer Nombre: María | Segundo Nombre: Alejandra
7. Tipo de documento de identidad: CN | TI | CE | CO | RC | CC Y | PA | SC
8. Número del documento de identidad: 1.110.524.783
9. Sexo: Femenino Y | Masculino
10. Fecha de nacimiento: 04 07 1994

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales
11. Etnia
12. Discapacidad: Tipo F N M | Condición T P
13. Puntaje SISBÉN
14. Grupo de población especial
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: Sura
16. Administradora de Pensiones: Porvenir
17. Ingreso base de cotización - IBC: $2.900.000
18. Residencia
Dirección: Cra 96F # 23A-60
Teléfono Fijo
Teléfono Celular: 3156481402
Correo Electrónico: maria.a92@hotmail.com
Municipio / Distrito: Bogotá
Zona: Urbana Y | Rural
Localidad / Comuna
Departamento: D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante
19. Apellidos y nombres: Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre
20. Tipo de documento de identidad: CN | TI | CE | CO | RC | CC | PA | SC
21. Número del documento de identidad
22. Sexo: Femenino | Masculino
23. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos Complementarios

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)	29. Parentesco
B1			Femenino Masculino		
B2			Femenino Masculino		
B3			Femenino Masculino		
B4			Femenino Masculino		
B5			Femenino Masculino		

	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo	Condición	32. Datos de Residencia: Municipio/Distrito	Zona	Dirección	Teléfono Fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS)
B1		F N M	T P		Urbana Rural			
B2		F N M	T P		Urbana Rural			
B3		F N M	T P		Urbana Rural			
B4		F N M	T P		Urbana Rural			
B5		F N M	T P		Urbana Rural			

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	Fontibon	
B		
B		
B		

-Original: EPS -1a Copia: EMPLEADOR -2a Copia: AFILIADO-

Powered by CamScanner

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA/INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo documento de identificación (NIT ✓, CC, TI, PA, CE, CD)	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)
JMS Ingeniería	NIT ✓	900527061-7	

39. Ubicación
Dirección: Cra 45 A # 91-49 | Teléfono Fijo:

Correo Electrónico: | Municipio / Distrito: Bogotá | Departamento:

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- ☐ 3. Actualización del documento de identidad.
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código ☐
- ☒ 6. Reinscripción en la EPS.
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento.
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de Identificación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad (CN, TI, CE, CD, RC, CC, PA, SC)	Número del documento de identidad	Sexo (Femenino / Masculino)	Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)	42. Fecha
				22/12/2022

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código	45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones
Activa Salud		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- ☒ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☒ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- ☒ 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- ☒ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio
MARIA PATIÑO	Daniela Rivera.

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: Cantidad | CN | RC | TI | CC | PA | CE | CD | SC | TOTAL

- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- ☐ 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN POR LA EPS
9 DIC 2022
Recibido Por:

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN: Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento	Número de documento de identidad	71. Firma del Funcionario

Observaciones:

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 23 de Diciembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JMS INGENIERIA SAS, en el centro de trabajo 0000000007 - AEROPUERTO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1110524783	PATIÑO CARDENAS ALEJANDRA ALEJANDRA	22/12/2022		m321693U	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C519880652235752760

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/12/2022 14:39:20 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.31.35.33, 192.230.104.2, 172.16.42.57

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

MARIA ALEJANDRA PATIÑO CARDENAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.110.524.783**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 23 de Diciembre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

compensar

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
NIT.860.066.942-7

Bogotá D.C., 23 de Diciembre de 2,022

A QUIEN INTERESE

Compensar, Caja de Compensación Familiar, certifica que el cliente se encuentra afiliado en la modalidad TRABAJADOR DEPENDIENTE, con la siguiente información :

Tipo de Identificación	: CC
No. de Identificación	: 1110524783
Nombre	: MARIA ALEJANDRA PATIÑO CARDENAS
Empresa/Contratante	: JMS INGENIERIA SAS
Idenficación Empresa	: NIT
No. Identificación Empresa	: 900527061
Fecha de Afiliación a CCF	: 2022/12/23
Fecha de Ingreso a la empresa	: 2022/12/23
Estado	: Afiliado
Categoría	: B

La presente certificación se expide con destino a JMS y tiene vigencia de un mes a partir de la fecha de expedición.

Esta certificación no es válida para presentar los documentos requeridos para la acreditación del subsidio monetario, considerando solo validos el formato de inscripción, modificación a la Caja de Compensación

Atentamente.

Paula Andrea Ramírez

GESTIONAR INFORMACIÓN EMPRESARIAL
Elaboró: Portal Compensar

ISO 9001 icontec SC 5892-14
IQNet
VIGILADO SuperSubsidio

ANEXO 11

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JMS INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 900527061 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS WILLIAM CASTIBLANCO UPEGUI identificado(a) con CC 14323979

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vct	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9442420856	1739366312	E	2022-11-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30									X									$1,805,375	4%	$72,300
9442420856	1739366312	E	2022-11-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									$1,805,375	16%	$288,900
9442420856	1739366312	E	2022-11-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30									X									$1,805,375		$0
9442420856	1739366312	E	2022-11-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30									X									$1,805,375		$0
9442420856	1739366312	E	2022-11-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30									X									$0	0%	$0
9442420856	1739366312	E	2022-11-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30									X									$0	0%	$0
9442420856	1739366312	E	2022-11-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									$1,805,375	6.96%	$125,700
9442420856	1739366312	E	2022-11-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									$1,805,375	4%	$72,300
9441336830	1702298633	E	2022-10-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									$1,944,250	4%	$77,800
9441336830	1702298633	E	2022-10-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									$1,944,250	16%	$311,100
9441336830	1702298633	E	2022-10-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30									X									$1,944,250		$0
9441336830	1702298633	E	2022-10-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30									X									$1,944,250		$0
9441336830	1702298633	E	2022-10-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30									X									$0	0%	$0
9441336830	1702298633	E	2022-10-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30									X									$0	0%	$0
9441336830	1702298633	E	2022-10-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									$1,944,250	6.96%	$135,400
9441336830	1702298633	E	2022-10-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									$1,944,250	4%	$77,800
9439901864	1643808547	E	2022-09-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									$1,612,417	4%	$64,500
9439901864	1643808547	E	2022-09-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30									X									$1,612,417	16%	$258,000
9439901864	1643808547	E	2022-09-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	30									X									$1,612,417		$0
9439901864	1643808547	E	2022-09-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	30									X									$1,612,417		$0

SaludTotal

Bogotá, Noviembre 22 de 2022

Señor:
CASTILLO RODRIGUEZ SERGIO ANDRES
CC. 1007772949
CALLE13CSUR 9B 04 - 2999999
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Octubre 27 de 2021. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliación	Fecha de desafiliación EPS	Estado Actual	Discapacidad
CASTILLO RODRIGUEZ SERGIO ANDRES	1007772949	C	Oct-27-2021	17	26	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna
MEDINA NAVARRO KELLIS JOHANA	1044210562	C	Oct-27-2021	17	26	CONYUGE	VIGENTE			Ninguna
CASTILLO MEDINA WISNEY SOFIA	1073719213	R	Oct-27-2021	17	26	HIJO MENOR DE 18 AÑOS	VIGENTE			Ninguna
CASTILLO MEDINA THIAGO ANDRES	1074827304	R	Oct-27-2021	17	26	HIJO MENOR DE 18 AÑOS	VIGENTE			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
JMS INGENIERIA S A S	1007772949	Dependiente	CERRADO
JMS INGENIERIA S A S	1007772949	Dependiente	VIGENTE
SMART TRAVELS SAS	1007772949	Dependiente	CERRADO

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

JAVIER CARREÑO
GERENTE DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos

ARL | sura

Medellín, 22 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de JMS INGENIERIA S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000021 FUSA-RUTA 40		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1007772949	CASTILLO RODRIGUEZ SERGIO ANDRES	24/11/2022		hH21494y	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/11/2022 19:01:38 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.31.35.33, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

SERGIO ANDRES CASTILLO RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.007.772.949**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 21 de Noviembre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

compensar

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
NIT.860.066.942-7

Bogotá D.C., 22 de Novimbre de 2,022

A QUIEN INTERESE

Compensar, Caja de Compensación Familiar, certifica que el cliente se encuentra afiliado en la modalidad TRABAJADOR DEPENDIENTE, con la siguiente información :

Tipo de Identificación	: CC
No. de Identificación	: 1007772949
Nombre	: SERGIO ANDRES CASTILLO RODRIGUEZ
Empresa/Contratante	: JMS INGENIERIA SAS
Idenficación Empresa	: NIT
No. Identificación Empresa	: 900527061
Fecha de Afiliación a CCF	: 2022/11/22
Fecha de Ingreso a la empresa	: 2022/11/24
Estado	: Afiliado
Categoría	: A

La presente certificación se expide con destino a JMS y tiene vigencia de un mes a partir de la fecha de expedición.

Esta certificación no es válida para presentar los documentos requeridos para la acreditación del subsidio monetario, considerando solo validos el formato de inscripción, modificación a la Caja de Compensación

Atentamente.

Paula Andrea Ramírez

GESTIÓN DE INFORMACION EMPRESARIAL
Elaboró: Portal Compensar

ISO 9001 icontec SC 5692-14

IQNet

FOR-PGIE-044

VIGILADO SuperSubsidio

ANEXO 12

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **ASR INGENIERIA LTDA**, identificada con **NI** número **900361151**, aportó por el empleado **JOSE MANOLO ROMERO OLARTE.** identificado(a) con **CC** número **79925362** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **63716989** para el periodo de salud **2022-12** y pensiones **2022-11** de la siguiente forma.

COD CCF	NOMBRE CCF	COTIZANTE	SUSPENSION	RETIRO	ING	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIAS COT	SALARIO	FACTOR INTEGRAL	TARIFA INTEGRAL	COTIZACION OBLIGATORIA	TSP SOLIDARIO	TSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO	APORTANTE
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1	0	X														0	3	$100.000			$4.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0	X														0	3	$100.000			$4.000	$0	$0	Diciembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	0	X														0	3	$100.000	5		$7.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1	0	X														0	3	$100.000			$16.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **ASR INGENIERIA LTDA**, identificada con **NI** número **900361151**, aportó por el empleado **MIGUEL ALFREDO OCAMPO RODRIGUEZ**, identificado(a) con **CC** número **80259111** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **63716989** para el periodo de salud **2022-12** y pensiones **2022-11** de la siguiente forma.

CODIGO ENTIDAD	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	COTIZACION	DIAS COT	IBC	DIAS PENSION	TARIFA TASA PENSION	COTIZACION PENSION	FSP SOLIDARIDAD	VR COTIZACION	PERIODO	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO	CONCEPTO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1	0														0	30	$1.000.000			$40.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0														0	30	$1.000.000			$40.000	$0	$0	Diciembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	0														0	30	$1.000.000	5		$69.600	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1	0														0	30	$1.000.000			$160.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **ASR INGENIERIA LTDA**, identificada con **NI** número **900361151**, aportó por el empleado **CRISTIAN ANDREY MENDIETA RODRIGUEZ**, identificado(a) con **CC** número **1114120309** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **63716989** para el periodo de salud **2022-12** y pensiones **2022-11** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COMPANIA	DIAS INCAPACIDAD	DIAS LICENCIA	DIAS LICENCIA REMUNERADA	DIAS VACACIONES	DIAS ACCIDENTE TRABAJO	DIAS MATERNIDAD	DIAS PATERNIDAD	DIAS SUSPENSION	DIAS ERP	DIAS AUSENTISMO	DIAS VARIACION SALARIO	DIAS VARIACION TRANSITORIA	DIAS IBC	DIAS COTIZADOS	IBC	TARIFA	COTIZACION OBLIGATORIA	APORTE VOLUNTARIO	APORTE SOLIDARIDAD	PERIODO	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO	ESTADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0												0		30	$1.000.000			$160.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1	0												0		30	$1.000.000			$40.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0												0		30	$1.000.000			$40.000	$0	$0	Diciembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	0												0		30	$1.000.000	5		$69.600	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **ASR INGENIERIA LTDA**, identificada con **NI** número **900361151**, aportó por el empleado **HERNAN DARIO PERDOMO PARRAGA**, identificado(a) con **CC** número **1012332847** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **63716989** para el periodo de salud **2022-12** y pensiones **2022-11** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COT PENS	COT SALUD	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	NUM DIAS COT	SUELDO	IBC	TASA APORTES	TARIFA ESPECIAL	COTIZACION VOLUNTARIA	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	NOVEDAD
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filiar	1	0															0	30	$1.000.000			$40.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	0															0	30	$1.000.000	5		$69.600	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
230201	Proteccion (RIG + Proteccion)	1	0															0	30	$1.000.000			$160.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0	30	$1.000.000			$40.000	$0	$0	Diciembre - 2022	63716989	09/12/2022	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **ASR INGENIERIA LTDA**, identificada con **NI** número **900361151**, aportó por el empleado **ROGER HARVEY LEON TAFUR**, identificado(a) con **CC** número **1023937526** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **63716989** para el periodo de salud **2022-12** y pensiones **2022-11** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIAS	COTIZACION	HORAS	TARIFA	IBC	DIAS PERIODO	TARIFA APORTE PENSION	COTIZACION OBLIGATORIA	APORTE SOLIDARIDAD	APORTE SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO	AGENCIA
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filiar	1	0															0		30	$1.000.000			$40.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0															0		30	$1.000.000			$40.000	$0	$0	Diciembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$1.000.000			$160.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	0															0		30	$1.000.000		5	$69.600	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **ASR INGENIERIA LTDA**, identificada con **NI** número **900361151**, aportó por el empleado **LUIS FERMIN BELTRAN SILVA**, identificado(a) con **CC** número **79383208** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **63716989** para el periodo de salud **2022-12** y pensiones **2022-11** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	AFP	TDP	VSP	TAP	AVP	VTE	FSP	RTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVC	IRL	DIAS COTIZADOS	SMV	IBC	DIAS INCAP.	BOLSA TARIFA PENSION	COTIZACION VOLUNTARIA	ESE SOLIDARIDAD	ESE SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO PLANILLA	FECHA DE PAGO	CONSIG.
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		30	$1.000.000			$160.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Filiar	1	0															0		30	$1.000.000			$40.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
EPS010	EPS Sura	1	0															0		30	$1.000.000			$40.000	$0	$0	Diciembre - 2022	63716989	09/12/2022	S
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	0															0		30	$1.000.000	5		$69.600	$0	$0	Noviembre - 2022	63716989	09/12/2022	S

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ANEXO 13

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **OMAR YESID MOJICA JAIME**, identificada con **CC** número **1049372679**, aportó por el empleado **OMAR YESID MOJICA JAIME**, identificado(a) con **CC** número **1049372679** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **64572315** para el periodo de salud **2022-12** y pensiones **2022-12** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Pensiones	231001	Colfondos	800227940	57	0															0		30	$1.000.000	0,16000			$160.000	$0	$0	Diciembre - 2022	64572315	06/01/2023	N
Salud	EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	57	0															0		30	$1.000.000	0,12500			$125.000	$0	$0	Diciembre - 2022	64572315	06/01/2023	N
Riesgos Laborales	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	57	0															0		30	$1.000.000	0,06960	5		$69.600	$0	$0	Diciembre - 2022	64572315	06/01/2023	N

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Enero de 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Powered by CamScanner

ANEXO 14

AXA COLPATRIA

Creación



Apreciado Usuario(a),
CONSTRUORAS VIALES SAS

Recibe un cordial saludo,

Hemos recibido la solicitud **Reportes de Accidente de Trabajo** generado con documento de identidad **79238725,** para el cual ha sido asignado el caso **00940418.** Enviaremos respuesta a tu solicitud al correo electrónico jalejandracorredor@gmail.com a más tardar el **12/01/2023,** siempre y cuando la documentación e información radicada se encuentre completa y legible.

Te invitamos a consultar el estado del radicado en el siguiente enlace:
https://axacolpatria.force.com/serviciosarl/s/consultar-solicitud

Si no recibes la respuesta en tu bandeja de entrada, por favor revisa la bandeja de correos no deseados o spam.

Si tienes dudas acerca del diligenciamiento del formulario, te invitamos a consultar el instructivo que se encuentra en la página de radicación.

Correo informativo, favor no responder.

Cordialmente:

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA

Informe de Accidente de Trabajo del Empleador o Contratante

El informe de accidentes de trabajo deberá diligenciarse en forma completa, por parte del empleador, contratante o de sus respectivos representantes o delegados, sus variables no podrán ser modificadas por persona o entidad alguna.

EPS A LA QUE ESTÁ AFILIADO: Nueva EPS | CÓDIGO EPS | ARL A LA QUE ESTÁ AFILIADO: Colpatria | CÓDIGO ARL

AFP A LA QUE ESTÁ AFILIADO: Proteccion | SEGURO SOCIAL (Indicar nombre AFP u otro Seguro Social) SI ☐ NO ☐ ¿CUÁL? | CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL

(1) EMPLEADOR ☒ (2) CONTRATANTE ☐ (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ☐

SEDE PRINCIPAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Construcción de obras ing civil | CÓDIGO: 4290 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Construobras Viales Sas

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ NU ☐ PA ☐ PE ☐ CD ☐ | NO.: 900773521 | DIRECCIÓN: Cra 11 c # 3-60 Sur

TELÉFONO: NT | CELULAR: 3102273175 | CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): Construobras_Viales.sas@Hotmail.com

DEPARTAMENTO: Bogotá | CÓDIGO | MUNICIPIO: Bogotá | CÓDIGO | ZONA U ☒ R ☐

CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO: Aeropuerto el dorado | CÓDIGO | ¿SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL? SI ☐ NO ☒ SOLO EN CASO NEGATIVO, DILIGENCIAR LAS SIGUIENTES CASILLAS SOBRE CENTRO DE TRABAJO:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO: Construcción obras - Ing civil | CÓDIGO: 4290

DIRECCIÓN: Av. el dorado # 103-9 | TELÉFONO: NT | CELULAR: 3102273175

DEPARTAMENTO: Bogotá | CÓDIGO | MUNICIPIO: Bogotá | CÓDIGO | ZONA U ☐ R ☐

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

TIPO DE VINCULACIÓN: (1) PLANTA ☒ (2) MISIÓN ☐ (3) COOPERADO ☐ (4) ESTUDIANTE O APRENDIZ ☐ (5) INDEPENDIENTE ☐ | (5) CÓDIGO

PRIMER APELLIDO: Toro | SEGUNDO APELLIDO: NT | PRIMER NOMBRE: Carlos | SEGUNDO NOMBRE: Arturo

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: TI ☐ CC ☒ CE ☐ NU ☐ PA ☐ PE ☐ CD ☐ | NO.: 79238725 | FECHA DE NACIMIENTO: 13 01 1963 | SEXO M ☒ F ☐

DIRECCIÓN: Cra 20 A # 61 A - 21 Sur | TELÉFONO: NT | CELULAR: 3164182849

DEPARTAMENTO: Bogota | CÓDIGO | MUNICIPIO: Bogota | CÓDIGO | ZONA U ☒ R ☐ | CARGO: Ayudante obra

OCUPACIÓN HABITUAL: Ayudante Obra | CÓDIGO | TIEMPO OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE: 01

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA: 30 11 2022 | SALARIO U HONORARIOS (MENSUAL) | JORNADA DE TRABAJO HABITUAL: (1) DIURNA ☐ (2) NOCTURNA ☐ (3) MIXTA ☐ (4) TURNOS ☐

III. INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE: 28 12 2022 | HORA DEL ACCIDENTE (0-23 HRS): 11 00 | DÍA DE LA SEMANA EN QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: LU ☐ MA ☐ MI ☒ JU ☐ VI ☐ SA ☐ DO ☐ | JORNADA EN QUE SUCEDE: (1) NORMAL ☒ (2) EXTRA ☐

¿ESTABA REALIZANDO LABOR HABITUAL? (1) SI ☒ (2) NO ☐ | DILIGENCIAR SÓLO EN CASO NEGATIVO ¿CUÁL? | CÓDIGO | TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE: 04 00

TIPO DE ACCIDENTE: (1) VIOLENCIA ☐ (2) TRÁNSITO ☐ (3) DEPORTIVO ☐ (4) RECREATIVO O CULTURAL ☐ (5) PROPIOS DEL TRABAJO ☒

¿CAUSÓ LA MUERTE AL TRABAJADOR? (1) SI ☐ (2) NO ☒ | DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE: Bogota | CÓDIGO | MUNICIPIO DE ACCIDENTE: Bogotá | CÓDIGO

¿ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE? U ☒ R ☐ | ¿LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE? (1) DENTRO DE LA EMPRESA ☒ (2) FUERA DE LA EMPRESA ☐

INDIQUE CUÁL SITIO:
- ☐ (1) ALMACENES O DEPÓSITOS
- ☐ (2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN
- ☐ (3) ÁREAS RECREATIVAS O DEPORTIVAS
- ☐ (4) CORREDORES O PASILLOS
- ☐ (5) ESCALERAS
- ☐ (6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
- ☐ (7) OFICINAS
- ☐ (8) OTRAS ÁREAS COMUNES
- ☒ (9) OTRO, ESPECIFICAR: perimetral

TIPO DE LESIÓN: (MARQUE CON UNA X CUAL O CUÁLES)
- ☐ (10) FRACTURA
- ☐ (20) LUXACIÓN
- ☐ (25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA
- ☐ (30) CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO
- ☐ (40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (exclusión o pérdida del ojo)
- ☒ (41) HERIDA
- ☐ (50) TRAUMA SUPERFICIAL (incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)
- ☐ (55) GOLPE O CONTUSIÓN O APLASTAMIENTO
- ☐ (60) QUEMADURA
- ☐ (73) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA
- ☐ (90) EFECTO DEL TIEMPO, CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
- ☐ (81) ASFIXIA
- ☐ (82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
- ☐ (83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN
- ☐ (90) LESIONES MÚLTIPLES
- ☐ (99) OTRO, ESPECIFIQUE:

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO:
- ☐ (1) CABEZA
- ☐ (1.12) OJO
- ☐ (2) CUELLO
- ☐ (3) TRONCO (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
- ☐ (3.32) TORAX
- ☐ (3.33) ABDOMEN
- ☐ (4) MIEMBROS SUPERIORES
- ☐ (4.46) MANOS
- ☒ (5) MIEMBROS INFERIORES
- ☐ (5.56) PIES
- ☐ (6) UBICACIONES MÚLTIPLES
- ☐ (7) LESIONES GENERALES U OTRAS

AGENTE DEL ACCIDENTE "CON QUE SE LESIONÓ EL TRABAJADOR"
- ☐ (1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS
- ☐ (2) MEDIOS DE TRANSPORTE
- ☐ (3) APARATOS
- ☐ (3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS
- ☒ (4) MATERIALES O SUSTANCIAS
- ☐ (44) RADIACIONES
- ☐ (5) AMBIENTE DE TRABAJO (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, techados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ☐ (6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS
- ☐ (6.61) ANIMALES (vivos o productos animales)
- ☐ (7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE:
- ☐ (1) CAÍDA DE PERSONAS
- ☐ (2) CAÍDA DE OBJETOS
- ☐ (3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES
- ☐ (4) ATRAPAMIENTOS
- ☐ (5) SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
- ☐ (6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
- ☐ (7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
- ☐ (8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS O RADIACIONES O SALPICADURAS
- ☒ (9) OTRO, ESPECIFICAR: contusion

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

DESCRIBA DETALLADAMENTE DENTRO DE LA INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE, QUÉ LO ORIGINÓ O CAUSÓ Y LOS DEMÁS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE

El Trabajador Carlos Arturo Toro Refiere que el dia 28 de Diciembre del 2022 Siendo las 11:00 Am se encontraba en el area de Trabajo Templando Un alambre de pua, el Cual se le enreda en su pierna Izquierda generando Una herida.

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE

Hubo personas que presenciaron el accidente? SI ☒ NO ☐ En caso afirmativo diligencie la siguiente información:

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NO.	CARGO
Oscar Fernando Toro Arias	TI ☐ CC ☒ CE ☐ NU ☐ PA ☐ PE ☐ CD ☐	1052400538	Ayudante.
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NO.	CARGO
	TI ☐ CC ☐ CE ☐ NU ☐ PA ☐ PE ☐ CD ☐		

RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NO.	CARGO
Jessica Alejandra Conedor P	TI ☐ CC ☒ CE ☐ NU ☐ PA ☐ PE ☐ CD ☐	1010227752	Inspectora SST
CARGO: Inspectora SST	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME DEL ACCIDENTE: 28 12 2022	FIRMA: Jessica Conedor.	

- ORIGINAL EPS - EPS -

FORMA AFEPGA-SEPTIEMBRE - 2016

ANEXO 15

Personal de contingencia realiza inspección a perimetrales, cerramientos, motobombas y nivel del río bogotá

16- diciembre-22 Día: Viernes Condición climatica:

Personal interventoria: 3 ing residentes, 1 topografo, 1 Director, 1 cadenero, 2 ing ambiental- SST, 1 operacional

Personal Contratista: 1 Director, 2 ing auxiliares, 1 ing ambiental, 1 ing residente, 1 inspector SST, 1 operacional, 1 auxiliar SST, 3 cuadrilla contingencia.

Equipos en obra: Luminarias, camionetas, camión para poda, tractor, rotospeed. Guadañas, equipo soldadura

Horario diurno = 07:00 am - 4:30 pm

Horario nocturno: 00:00 - 05:00 am

En horario ~~nocturno~~ diurno se continua con instalación de malla y tubos para cerramiento a doble altura, de igual forma, se continua con poda y recolección de cesped en zona 42 y zona 32, también se realiza mantenimiento a canal 8 y 4; se realiza trabajo de plagas perimetrales.

En horario nocturno se realiza actividad de poda y recolección de cesped en zona 2, cabecera 13L (pista norte)

17- diciembre - 22 Día: Sabado Condición climatica: Seco

Personal interventoria: 3 ing. residentes, 2 ing ambiental-SST, 1 operacional, 1 Director, 1 topografo, 1 cadenero

Personal Contratista: 1 Director, 1 ing. residente, 1 ing auxiliar, 1 ing ambiental, 1 operacional, 1 inspector SST, 1 auxiliar SST, 3 cuadrilla de Contingencia

Equipos en obra: Luminarias, rotospeed, tractor, camión para poda, Guadañas, equipo soldadura

Horario diurno: 07:00 am - 12:00 pm horario nocturno: 00:00 - 05:00 am

Actividades horario diurno:

- Instalación de malla y tubos para cerramiento a doble altura - Fontibón
- Poda y recolección de cesped en zona 42 y 42A
- Mantenimiento canal 8, 4 y 12

En horario nocturno se realiza poda y recolección de cesped en zona

Personal de contingencia realiza inspección a perimetrales, cerramiento, motobombas y nivel del río Bogotá

18 diciembre-22 Día: Domingo Condición climatica:

Personal contratista: 1 director, 1 ing auxiliar, 1 ing residente, 1 ing ambiental, 1 operacional, 1 inspector SST, 1 auxiliar SST, 3 cuadrilla de contingencia

Personal interventoria: 3 ing residentes, 1 director, 2 ing ambiental-SST, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operacional

Equipos en obra: Camionetas, camión para poda, rotospeed, tractor, Guadañas, luminarias

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del río Bogotá, perimetrales y cerramiento

19 diciembre-22 Día: Lunes Condición climatica: Seco

Personal interventoria: 1 director, 3 ing. residentes, 2 ing ambiental-SST, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operacional

Personal contratista: 1 director, 1 ing residente, 1 ing auxiliar, 1 ing ambiental, 1 operacional, 1 inspector SST, 1 auxiliar SST, 3 cuadrilla de contingencia

Equipos en obra: Camionetas, luminarias, Camión para poda, rotospeed, tractor, Guadañas, equipo Soldadura

Horario diurno: 07:00 am - 4:30 pm Horario nocturno: 00:00 - 05:00 am

Actividades horario diurno

- Se continua con instalación de malla y tubos en cerramiento a doble altura - Fontibón
- Se realiza poda y recoleccion de cesped en Zona 42 y Zona 42 A
- Se continua con mantenimiento a canal 8,4 A y 12
- Se realizo instalación de letreros verticales designadores de pista en pista norte

Actividades horario nocturno

- Se realiza poda y recolección de cesped en zona
- Se realiza señalización horizontal designadores de pista en cabeceras de pista norte

NOTA: Se suspende actividad de pintura (designadores pista) por problemas logisticos del proveedor de pintura.

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del rio Bogotá, perimetrales y cerramiento

20 diciembre - 22

Día: Martes Condición climatica: Seco

Personal interventoria: 1 Director, 3 ing residentes, 2 ing ambiental-SST, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operacional

Personal contratista: 1 Director, 1 ing residente, 1 ing auxiliar, 1 ing ambiental, 1 operacional, 1 auxiliar SST, 1 inspector SST, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: Luminarias, camionetas, camión para poda, equipo soldadura, rotospeed, tractor, Guadañas, equipo pintura

Horario diurno: 07:00 - 4:30pm Horario nocturno: 00:00 - 05:00 am

En horario diurno se continua con las siguientes actividades:

- Prolongación de malla a doble altura, cerramiento externo de fontibón
- Poda y recolección de cesped en zona 1 y zona 57
- Mantenimiento a canal 8, 4 y 12
- Se continua con instalación de letreros verticales designadores de pista.

En horario nocturno se realiza:

- Poda y recolección de césped en zona 4
- Instalación de Señalización horizontal, designadoras de pista, en cabeceras de pista norte.

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del río Bogotá, perimetrales y Cerramiento

NOTA: Se cancela actividad de pintura de señales designadoras de pista norte por orden del Jefe de operaciones señor Jaime Cortes; indicación dada por el supervisor de área de maniobras de turno, el señor Edgar Acero, debido a que no hay publicación de notam de cambio de nomenclatura. Cabe resaltar, que el personal y equipos para realizar esta actividad, se encontraban con todo al dia para la ejecución de la misma.

21 diciembre - 22

Día: Miercoles Condición climatica: seco

Personal Contratista: 1 Director, 1 ing residente, 1 ing auxiliar, 1 ing ambiental, 1 operacional, 1 inspector SST, 3 cuadrilla contingencia

Personal interventoria: 1 Director, 3 ing residentes, 1 topografo, 2 ing ambiental-SST, 1 cadenero, 1 top Cadenero

Equipos en obra: Camionetas, luminarias, camión para poda, tractor, rotospeed, Guadañas, equipo soldadura, equipo pintura.

Horario diurno: 07:00 am - 4:30 pm Horario nocturno: 00:00 - 05:00 am

En horario diurno se continua con la ejecución de las siguientes actividades
- Prolongación de malla a doble altura, cerramiento externo de pantalón
- Poda y recolección de césped en Zona 1, Zona 57, Zona 42A y Jardín pantalón
- Mantenimiento a canal 8 y 12

En horario nocturno se realiza poda y recolección de césped en Zona 4, también se realiza pintura de señales horizontales designadoras de pista norte (cabeceras), al igual que borrado de las mismas

Personal de contingencia realiza inspección a nivel del río Bogotá, motobombas, cerramiento y perimetrales

22-Diciembre-22 Día: Jueves Condición climatica: Seco

Personal interventoria: 1 Director, 3 ing residentes, 2 ing ambiental-SST, 1 topografo, 1 operacional, 1 cadenero

Personal Contratista: 1 Director, 1 ing residente, 1 ing auxiliar, 1 ing ambiental, 1 operacional, 1 inspector SS 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: Camioneta, camión para poda, rotospeed, tractor, luminarias, Guadañas, equipo Soldadura

Hora diurna: 07:00 am - 4:30pm horario nocturno: 00:00 - 05:00 am

Actividades horario diurno
- Prolongación de malla a doble altura, cerramiento externo de pantalón, pie de amigo
- Poda y recolección de césped en Zona 1, Zona 57, y Zona 42A
- Acopio y recolección de poda de árboles
- Mantenimiento canal 8 y 12

Actividades horario nocturno
- Poda y recolección de césped en Zona 4

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del río Bogotá, perimetrales y cerramientos.

23- Diciembre-22 Día: Viernes Condición climatica: seco

Personal interventoria: 1 director, 3 ing residentes, 2 ing ambiental-SST, 1 operacional, 1 topografo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 ing ambiental, 1 inspector SST, 1 operacional, 3 cuadrilla contingencia

Horario diurno: 07:00 am - 4:30pm horario nocturno: 10:00 pm - 06:00 am

Actividades horario diurno:

- Instalación de malla para cerramiento a doble altura - Fontibón
- Poda y recolección de césped en zona 1 y zona 57
- Mantenimiento canal 4, 8 y 12
- Trabajos de pintura, señalización horizontal en calle de rodaje A4, A9, A10

Actividades horario nocturno

- Se realiza poda y recolección de césped en zona 5

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del río Bogotá, perimetrales y cerramiento

24-Diciembre-22 Día: Sabado Condición climatica:

Personal interventoria: 3 ing residentes, 2 ing ambiental-SST, 1 director, 1 operacional, 1 topografo 1 cadenero

Personal contratista: 1 director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 operacional, 1 inspector SST, 1 ing ambiental, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: 4 camionetas, camión para poda, rotospeed, tractor, Guadañas, luminarias, equipo soldadora, equipo pintura.

Horario diurno: 07:00 am -

ACTIVIDADES HORARIO DIURNO

- Se realiza poda y recolección de césped en zona 57
- Se continua con Mantenimiento en canal 8 y 12

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del rio Bogotá y perimetrales

25- Diciembre-22 Día: Domingo condición climatica: Seco

Personal interventoria: 3 ing residentes, 1 director, 1 operacional, 2 ing ambiental-SST, 1 topografo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 Director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 ing ambiental, 1 inspector SST, 1 operacional 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: Camionetas, camión para poda, luminarias, equipo soldadora, equipo pintura, rotospeed, tractor, Guadañas.

Cuadrillo de contingencia realiza demolicion y fundida en placa de carcamo de E1 (2.5*0.35*0.10) también realizan inspección a motobombas, nivel del río Bogotá, y perimetrales.

26- Diciembre-22 Día Lunes condición climatica

Personal interventoria: 1 Director de obra interventoria, 3 ing residentes, 2 ing ambiental-SST, 1 operacional, 1 topografo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 Director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 ing ambiental, 1 inspector SST, 1 operacional 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: Camionetas, luminarias, camión para poda, rotospeed, tractor, equipo soldadora, equipo pintura, Guadañas.

Horario Diurno: 07:00 - 4:30 pm Horario nocturno: 10:00pm - 06:00 am

ACTIVIDADES HORARIO DIURNO

- Instalación de malla en cerramiento a doble altura - fontibón
- Mantenimiento canal 8 y 12
- Poda y recolección de cesped en zona 1, zona 59 y zona 590
- Trabajos de pintura, señalización horizontal en Alpha 8 (calle de rodaje - cambio # designadores pista)

ACTIVIDADES HORARIO NOCTURNO

- Poda y recolección de cesped en zona , también se realiza trabajos de pintura, señalización designadores de pista sur (cabeceras)

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del río Bogotá y perimetrales.

27- diciembre - 22 Día: Martes condición climatica: seco

Personal interventoria: 1 director, 3 ing residentes, 2 ing ambiental - SST, 1 operacional, 1 topografo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 director, 1 ing residente, 1 ing ambiental, 2 ing auxiliares, 1 operacional, 1 inspector SST, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: Camionetas, camión para poda, rotospeed, tractor, Guadañas, equipo soldadura

Horario diurno: 07:00 am - 4:30 pm Horario nocturno: 10:00 pm - 06:00 am

Actividades Horario diurno

- Instalación malla, tubos y alambre para cerramiento a doble altura - Fontibón
- Mantenimiento canal 8 y 12.
- Poda y recolección de césped en zona 57, zona 1, zona 590 y zona 590

En horario nocturno se realiza poda y recolecaión de cesped en zona

Cuadrilla de contingencia realiza inspección a perimetrales, motobombas y nivel del río Bogotá

28- diciembre - 22 Día: Miercoles condición climatica: seco

Personal contratista: 1 Director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 ing ambiental, 1 operacional, 1 inspector SST, 3 cuadrilla contingencia

Personal interventoría: 1 director, 3 ing residente, 1 operacional, 2 ing ambiental - SST, 1 cadenero, 1 topógrafo

Equipos en obra: Camionetas, camión para poda, rotospeed, tractor, Guadañas, equipo soldadura.

Horario diurno: 07:00 am - 4:30 pm Horario nocturno: 10:00 pm - 06:00 am

En horario diurno se realiza actividades de:

- Instalación de malla y alambre en cerramiento a doble altura - Fontibón
- Poda y recolección de césped en zona 1, y zona 57, zona 598 y zona 590
- Mantenimiento canal 1, 8 y 12, también se realiza recolección de pasto en canal 4.

En horario nocturno se realiza poda y recolección de césped en zona 56 (pista sur)

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del río Bogotá y perimetrales

29- diciembre-22 día: Jueves Condición climatica: Seco

Personal interventoria: 1 Director, 3 ing residentes, 2 ing ambiental-SST, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operacional

Personal contratista: 1 Director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 ing ambiental, 1 operacional, 1 inspector SST, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: Camionetas, tractor, rotospeed, camión para poda, equipo soldadora, Guadañas, luminaria

Horario Diurno: 07:00 am- 4:30 pm Horario nocturno: 10:00 pm- 06:00 am

Actividades Jornada diurna:

- Instalación malla y alambre en cerramiento a doble altura- Fontibón
- Poda y recolección de cesped en zona 1, zona 57, zona 59B y zona 59C
- Mantenimiento a canal 4, 8 y 12

En horario nocturno se continua con poda y recolección de césped en zona 56 (pista sur)

Personal de contingencia realiza inspección a perimetrales, motobombas y nivel del río Bogotá

30 diciembre- 22 día: Viernes Condición climatica: Seco

Personal interventoria: 1 Director, 3 ing residentes, 2 ing ambiental-SST, 1 operacional, 1 topografo, 1 cadenero

Personal Contratista: 1 Director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 ing ambiental, 1 inspector SST, 1 operacional 3 cuadrilla de contingencia

Equipos en obra: luminaria, camionetas, camión para poda, rotospeed, tractor, Guadañas, equipo de soldadura

Horario diurno: 07:00 am- 4:30 pm Horario nocturno: 10:00 pm- 06:00 am

En horario diurno se continua con la instalación de malla y alambre en cerramiento a doble altura (Fontibón), también se continua con poda y recolección de césped en zona 1, 57, 59B y 59C

Se continua con recolección canal 8, Mantenimiento Canal 12, Canal 8 recolección, poda zona 59B.

En horario nocturno se continua con poda y recolección de césped en zona 56 (pista sur)

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del rio Bogotá y perimetrales

31- Diciembre - 22 | Día: Sábado | Condición Climatica: Seco

Personal interventoria: 1 Director, 3 ing residentes, 1 operacional, 2 ing ambiental- SST, 1 topografo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 Director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 operacional, 1 inspector SST, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: luminarias, camionetas, camión para poda, tractor, rotospeed, Guadañas, equipo Soldadora

Horario diurno: 07:00 am- 4:30pm | Horario nocturno: 10:00pm- 06:00 am

Actividades horario diurno:

- Se continua con poda y recolección de césped en zona 1, Zona 57, Zona 59B y 59C
- Se continua con instalación de malla y alambre en cerramiento a doble altura - Fontibón
- Cuadrilla de contingencia realiza limpieza de canetas en vias de acceso

Cuadrilla de contingencia realiza inspección a perimetrales, motobombas y nivel del río Bogotá

01- Enero - 23 | Día: Domingo | Condición climatica: Seco

Personal interventoria: 1 Director, 2 ing ambiental- SST, 3 ing residentes, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operacional

Personal contratista: 1 Director, 1 ing residente, 1 ing ambiental, 2 ing auxiliares, 1 operacional, 1 inspector SST, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: Camionetas, camión para poda, rotospeed, Guadañas, tractor, luminarias

Cuadrilla de contingencia realiza inspección a perimetrales, motobombas y nivel del río Bogotá

02- Enero - 23 | Día: Lunes | Condición climatica: Seco

Personal interventoria: 1 Director, 3 ing residentes, 2 ing ambiental-SST, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operacional

Personal contratista: 1 Director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 ing ambiental, 1 operacional, 1 inspector SST, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: luminarias, rotospeed, tractor, camión para poda, camionetas, equipo soldadora

Cuadrilla de contingencia continua con limpieza de cunetas en vias de acceso (frente a antinarcoticos), de igual forma, se continua con poda y recoleccion de césped, al igual que prolongación de cerramiento a doble altura.

Cuadrilla de contingencia realiza inspección a perimetrales, nivel del rio Bogotá y motobombas

03- Enero- 2023 Dia: Martes Condición climatica: Seco

Personal interventoria: 1 director, 3 ing residentes, 2 ing ambiental-SST, 1 operacional, 1 topografo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 director, 1 ing residente, 1 ing ambiental, 2 ing auxiliares, 1 inspector SST, 1 operacional, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: Camionetas, rotospeed, tractor, equipo soldadora, Camión para poda, Guadañas

En horario diurno se continua con actividades de poda y recolección de césped en Zona 1, Zona 57, Zona 59B, Zona 64 y Zona 62. también se continua con prolongación de cerramiento a doble altura, al igual que, mantenimiento de canal 12 y canal 1.

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del rio Bogotá y perimetrales.
En horario nocturno se realiza poda y recolección de césped en Zona 56

04- Enero 2023 Dia: Miercoles Condición climatica: Seco

Personal contratista: 1 director, 1 ing residente, 1 ing ambiental, 2 ing auxiliares, 1 operacional, 1 inspector SST, cuadrilla de contingencia

Personal interventoria: 1 director, 3 ing residentes, 1 topografo, 1 cadenero, 2 ing ambiental-SST, 1 operacional

Equipos en obra: camionetas, Guadañas, equipo soldadura, tractor, rotospeed, camión para poda.

Actividades horario diurno:

- Prolongación de cerramiento a doble altura- Fontibón
- Poda y recolección de cesped en Zona 1, Zona 57, 59B, 64 y 62
- Mantenimiento canal 12 y 1

En horario nocturno se continua con poda y recolección de césped en Zona 56 (pista sur)

Personal de contingencia realiza inspección a perimetrales, nivel del rio Bogotá y motobombas

05- Enero- 2023 Día: Jueves condición climatica: seco

Personal interventoria: 1 director, 3 ing residentes, 1 operacional, 2 ing ambiental- SST, 1 topografo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 director, 1 ing ambiental, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 operacional, 1 inspector SST, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: luminarias, camionetas, equipo soldadura, camión para poda, rotospeed, tractor

ACTIVIDADES HORARIO DIURNO

- Poda y recolección de césped zona 1, 57, 59B, 62 y 64
- Mantenimiento canal 12 y 1
- Prolongación malla a doble altura, instalación de ángulos, pie amigo y alambre para cerramiento externo portibón

En horario nocturno se continua con poda y recolección de césped en zona 56 (pista sur)

Personal de contingencia realiza inspección a perimetrales, nivel del rio Bogotá y motobombas

06- Enero- 2023 Día: Viernes condición climatica: seco

Personal interventoria: 1 director, 3 ing residentes, 2 ing ambiental- SST, 1 operacional, 1 topografo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 ing ambiental, 1 inspector SST, 1 operacional, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: luminarias, camionetas, camión para poda, tractor, rotospeed, equipo soldadora

ACTIVIDADES HORARIO DIURNO

- Poda y recolección de césped en zona 1, zona 57, zona 62, zona 63, zona 64, zona 65 y Jardín de Portibón
- Mantenimiento canal 12 y 1
- Prolongación malla a doble altura, instalación de ángulos, pie amigo y alambre en cerramiento externo portibón.

En horario nocturno se continua con poda y recolección de césped en zona 56 (pista sur)

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del río Bogotá y perimetrales.

07- Enero- 2023 Dia: Sabado Condición climatica: Seco

Personal interventoria: 1 Director, 3 ing residentes, 2 ing ambiental-SST, 1 operacional, 1 topografo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 director, 1 ing residente, 1 ing ambiental, 2 ing auxiliares, 1 inspector SST, 1 operacional, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: Camionetas, rotospeed, tractor, camión para poda, luminarias, Guadañas

En horario diurno se continua con las siguentes actividades:

- Prolongación de malla, alambre y pie amigo para cerramiento externo fontibón
- Mantenimiento canal 1 y 12
- Poda y recolección de césped en zona 1, 62, 63 y Barillón fontibón

En horario nocturno continua actividad de poda y recolección de césped en zona 56 (pista sur)

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del río Bogotá y perimetrales.

08- Enero - 2023 Dia: Domingo Condición climatica:

Personal interventoria: 1 director, 3 ing residentes, 2 ing ambiental-SST, 1 operacional, 1 topografo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 ing ambiental, 1 operacional, 1 inspector SST, 3 cuadrilla de contingencia

Equipos en obra: Guadañas, tractor, rotospeed, camion para poda, equipo soldadora, luminaria

Personal de contingencia realiza inspección a perimetrales, motobombas y nivel del rio Bogotá, el mismo personal continua con limpieza de cunetas en vias de acceso

09- Enero- 2023 Día: Lunes (Festivo) Condición climatica: Lluvias - Seco

Personal contratista: 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 Director, 1 ing ambiental, 1 inspector ssg 1 operacional, 3 cuadrilla contingencia

Personal interventoría: 3 ing residentes, 1 director, 1 operacional, 2 ing ambiental- SST, 1 topografo, 1 cadenero

Equipos en obra: rotospeed, tractor, camión para poda, camionetas, equipo soldadora, Guadañas.

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del río Bogotá y perimetrales.

En horario nocturno se realiza poda y recolección de césped en zona 56 (pista sur)

10- Enero- 2023 Día: Martes Condición climatica: Seco- Lluvias

Personal interventoria: 3 ing residentes, 1 Director, 1 ing ambiental SST, 1 operacional, 1 topografo. 1 cadenero

Personal contratista: 1 director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 ing ambiental, 1 operacional, 1 inspector SST, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: Guadañas, luminarias, equipo soldadora, rotospeed, tractor, camión para poda

En horario diurno se continua con actividades de:

- poda y recolección de césped en zona 1, 61 y Jardín Fontibón
- Mantenimiento canal 1 y 12
- Prolongación malla a doble altura, instalación de ángulos, pie amigo y alambre para cerramiento externo. Fontibón

En horario nocturno se continua con poda y recolección de césped en zona 56 (pista sur)

Personal de contingencia realiza inspección a perimetrales, motobombas y nivel del río Bogotá

Durante el día se presentaron lluvias leves.

11- Enero- 2023 día: Miercoles Condición climatica: seco

Personal interventoria: 1 director, 3 ing residentes, 1 operacional, 1 ing ambiental- SST, 1 topografo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 nuector, 1 ing residente, 1 ing ambiental, 2 ing auxiliares, 1 operacional, 1 inspector sst, 3 cuadrilla de contingencia

Equipos en obra: luminarias, camionetas, rotospeed, tractor, guadañas, camión para poda, equipo soldadora.

ACTIVIDADES JORNADA DIURNA

- Poda y recolección de césped en Zona 1, Zona 61, Zona 62 y Jarillón Fontibón
- Mantenimiento canal 12 y 1
- Prolongación malla a doble altura, instalación de ángulos, pie amigo y alambre para cerramiento fontibón

En horario nocturno se continua con poda y recolección de césped en Zona 56 (pista sur)

Personal de contingencia realiza inspección a motobombas, nivel del río Bogotá, y perimetrales, de igual forma, continuan con limpieza de cunetas en vias de acceso, frente a recinto motores

Durante el dia se presentaron lluvias fuertes, en horario nocturno (madrugada), también se registro lluvias fuertes, generando bajos rendimientos en la actividad de poda.

12- Enero- 23 día: Jueves Condición climatica:

Personal interventoria: 3 ing residentes, 1 director, 1 ing ambiental-sst, 1 operacional, 1 topógrafo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 director, 1 ing ambiental, 2 ingauxiliares, 1 ing residente, 1 operacional, 1 inspector SST, 3 cuadrilla contingencia.

Equipos en obra: Camionetas, camión para poda, tractor, rotospeed, Guadañas, luminarias, equipo soldadura

En horario diurno se continua con actividades de poda en Zona 1, Zona 61, Zona 62 y Jarillón de Fontibón, también se continua con prolongación de malla a doble altura, instalación de ángulos, pie amigo y alambre en cerramiento externo Fontibón, se continua con mantenimiento a canal 12.

En horario nocturno se continua con poda y recolección de cesped en zona 56 (pista sur)

Personal de contingencia realiza inspección a perimetrales, motobombas y nivel del río Bogotá (disponible 214x70)

Se presentaron lluvias leves en horas de la madrugada 2:40 am - 2:55 am

13-Enero-2023 Día: Viernes Condición climatica: Seco - húmedo

Personal interventoria: 1 Director, 3 ing residentes, 1 ing ambiental-SST, 1 operacional, 1 topografo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 Director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 ing ambiental, 1 inspector SST, 1 operacional, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: Luminarias, camionetas, camión para poda, tractor, rotospeed, equipo soldadura

ACTIVIDADES HORARIO DIURNO:

- Se continua con poda en Jarillón de Fontibón (costado sur) y zona 62 (costado sur de la perimetral de fontibón)
- Se continua con poda en zona 60 y 60A, desde S25 a S20, sector entre mallas de la perimetral de Engativá, de igual forma, se realiza recolección en zona 61 y zona 61A (desde S27 a S25)
- En pista norte se realiza poda y recolección de césped en zona 1
- Se realiza mantenimiento a canal 1 (desde S37 hacia Puerta 32), y canal 10 (ubicado entre K2-K3)
- Se continua con prolongación de malla a doble altura (instalación de ángulos, excavación, fundido de pie amigo e instalación de alambre en cerramiento externo fontibón

En horario nocturno se continua con poda y recolección de césped en zona 57 (pista sur)

Cuadrilla de contingencia realiza inspección a perimetrales, motobombas y nivel del rio Bogotá tambien realizan limpieza de material vegetal en borde de pista sur (costado sur).

14- Enero- 23 Día: Sabado Condición climatica: Seco

Personal interventoria: 1 Director, 3 ing residentes, 1 operacional, 1 topografo, 1 ing ambiental-SST, 1 cadenero

Personal contratista: 1 Director, 1 ing ambiental, 1 ing residente, 1 inspector SST, 1 operacional, 2 ing auxiliares 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: Equipo soldadora, camión para poda, rotospeed, tractor, luminarias, camionetas, minicargador

Horario diurno: 07:00 am - 4:00 pm Horario nocturno: 10:00 pm- 06:00am

En horario diurno se continua con poda y recolección de césped en Zona 62, Jardín fontibón, Zona 61, Zona 61A, Zona 60 y Zona 60A, y Zona 1, también se continua con mantenimiento a canal 1 y canal 10; se continua con prolongación de cerramiento a doble altura (instalación ángulos, excavación, fundida pie amigo e instalación de alambre), en cerramiento externo perimetral Fontibón y Engativá

Personal de contingencia realiza inspección a perimetrales, motobombas y nivel del rio Bogotá.

No se suspenden actividades nocturnas por lluvias fuertes.

15- Enero- 23 Día: Domingo condición climática: lluvias.

Personal contratista: 1 Director, 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 inspector SST, 1 ing ambiental, 1 operacional, 3 cuadrilla contingencia

Personal interventoria: 1 Director, 3 ing residentes, 1 ing ambiental-SST, 1 operacional, 1 topografo, 1 cadenero

Equipos en obra: Camión para poda, camionetas, luminarias, tractor, rotospeed, equipo soldadora, minicargador

Personal de contingencia realiza inspección a perimetrales, motobombas y nivel del rio Bogotá.

Madrugada del dia de hoy no se realizaron actividades por lluvias fuertes.

16- Enero- 23 Dia: Lunes condición climatica:

Personal interventoria: 3 ing residentes, 1 arrector, 1 ing ambiental - SST, 1 operacional, 1 topografo, 1 cadenero

Personal contratista: 1 ing residente, 1 arrector, 2 ing auxiliares, 1 ing ambiental, 1 operacional, 1 inspector SST, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: luminarias, camión para poda, camionetas, equipo soldadora, rotospeed, tractor

ACTIVIDADES HORARIO DIURNO

* Poda y recolección de césped en Zona 62, Zona 60, Zona 60A, Zona 1 y Jarillón Fontibón
* Mantenimiento canal 1, 9 y 12
* Prolongación de cerramiento a doble altura en perimetral fontibón y Engativá

Personal de contingencia realiza inspección a perimetrales, motobombas y nivel del río Bogotá
En horario nocturno se realiza poda en Zona 5 y 6, también se realiza pintura en pista norte

17-Enero-2023 Día: Martes Condición climatica:

Personal interventoría: 1 Director, 3 ing residentes, 1 operacional, 1 topografo, 1 cadenero, 1 ing ambiental-SST

Personal contratista: 1 ing residente, 2 ing auxiliares, 1 director, 1 ing ambiental, 1 inspector SST, 1 operacional, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: Equipo soldadura, tractor, rotospeed, luminarias, equipo soldadura, camionetas

En horario nocturno se continua con poda y recolección de césped en Jarillón fontibón, Zona 62, Zona 60, Zona 60A y Zona 1, también se continua con mantenimiento en canal 9 y 12, se continua con prolongación de malla a doble altura en cerramiento externo perimetral fontibón y Engativa.

Nota: Se cancelan actividades nocturnas por cancelación de NOTAM pista norte por fallas de ILS de pista sur.

Personal de contingencia realiza inspección a perimetrales, motobombas y nivel del rio Bogotá

18-Enero-23 Día: Miercoles Condición climatica: seco

Personal interventoría: 1 Director, 3 ing residentes, 1 operacional, 1 cadenero, 1 ing ambiental-SST, 1 topografo

Personal contratista: 1 director, 1 ing residente, 1 ing ambiental, 2 ing auxiliares, 1 operacional 1 inspector SST, 3 cuadrilla contingencia

Equipos en obra: luminarias, camionetas, camión para poda, rotospeed, tractor, equipo soldadura
