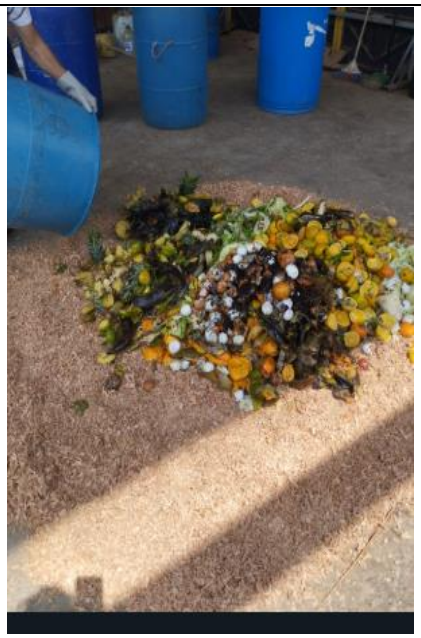
Contrato N.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 526-2024
Objeto general	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DEL ÁREA CERTIFICADA Y PLAZA DE MERCADO A TRAVÉS DE LA COMPOSTERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL.
Objetivo específico / Alcance	*Desarrollar el proceso de compostaje de los Residuos Sólidos Orgánicos recolectados, garantizando el paso a paso establecido en la guía técnica de operación.*

Actividad	**Fotografías**
Para el proceso de tratamiento se realiza el protocolo según el manual técnico de EARTHGREEN el cual fue diseñado para garantizar el correcto tratamiento de los R.S.O procesados en la planta de compostaje del municipio y se realiza el siguiente procedimiento: 2.1.descargue y pesado del material orgánico recolectado: para esta labor primero se realiza un el pesaje de una de las canecas de recolección sola para poder calibrar las bascula, posterior a esto se toma un peso de cada una de estas registrando así su medida y su origen en los formatos de registro de	 

ingreso de material orgánico.	 
2.2. En este paso se realiza el proceso de preparación de base del piso con viruta o material seco, posteriormente se realiza la incorporación de los R.S.O y la limpieza de todo material contamínate (plásticos, cartón, metales).	 

<table>
<tr>
<td rowspan="2">2.3.Después de realizado lo anterior se realiza el picado manual de los R.S.O de mayor tamaño (vástagos de racimos de plátano, coronas de piña y frutas de gran tamaño) con el fin de homogenizar el material orgánico, luego se incorpora más material seco durante el proceso de mezclado y volteo.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

	 
2.4. Posterior a esto se realiza la incorporación de este material ya homogenizado y mezclado con el material acompañante o material seco a las camas de compostaje.	 

2.5 Finalizado el proceso de incorporación de material orgánico preparado se procede a realizar un sellado de la parte superior de la cama con más material seco, generando un sello que impide la fuga de malos olores, la aparición de moscas y la generación de las condiciones ideales para que se dé el proceso de compostaje bajo los parámetros establecidos en el manual técnico suministrado por la empresa EARTHGREEN.	   

	 
Fecha	
04/11/2024 al 03/12/2024	
Lugar	
Compostera municipal	
