.

“INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.”

CONTRATISTA: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

Rep. Legal. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

INTERVENTORIA: INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

OSCAR LUIS HERAZO SEBA

Rep. Legal De INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

SUPERVISOR DE CONTRATO

FRANCY LORENA HERNÁNDEZ ARRIETA

SINCELEJO - SUCRE

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

FEBRERO DEL 2025

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

27 DE DICIEMBRE DE 2024-25 DE FEBRERO DE 2025

REGISTRO DE APROBACIÓN

PRESENTADO POR:

OSCAR LUIS HERAZO SEBA

Representante legal INGENORTE

Interventoría.

APROBO:

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

SUPERVISION.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 4
GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO 5
INFORMACIÓN GENERAL 5
CUADRO DE RESPONSABILIDADES 5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
CONTRATOS SUSCRITOS 7
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 7
CONTROL DE POLIZAS 8
CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 8
ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE INICIO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
CONTROL DE POLIZAS DE INTERVENTORIA 11
CONTROL LEGAL DEL CONTRATO 12
CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES 13
DISPOSICIONES LABORALES DE LA INTERVENTORÍA 13
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA POR INTERVENTORIA ... **¡Error! Marcador no definido.**
CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUCRITOS 14
BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA 14
BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 14
FORMA DE PAGO 15
FORMA DE PAGO DEL CONTRATISTA 15
FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA 15
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 15
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA EN PORCENTAJE 16
AVANCE DE OBRA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... **¡Error! Marcador no definido.**

INTRODUCCIÓN

Con el fin de adecuar y mejorar la infraestructura de la zona del gimnasio en la torre AB de **SINCELEJO**, en departamento de Sucre, se desarrolla el proyecto **"INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES."**

Mediante el **Contrato N°. MC 23 DE 2024** celebrado el **17 DE DICIEMBRE DE 2024** e iniciado el **20 DE DICIEMBRE DE 2025**; solo con vigilancia de la supervisión posteriormente se procedió a firmar el 27 de diciembre el acta de inicio del **CONTRATO DE INTERVENTORIA,** firmado por **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.,** ejerciendo las labores de **INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.**Con el propósito de adelantar las actividades de control y seguimiento sobre la ejecución del **CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA Nº MC-23-2024**, suscrito entre el **CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO,** cuyo objeto es la **"INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES."**
En aras de cumplir con el control y seguimiento del proyecto se constituye el presente documento, correspondiente al informe de interventoría número 1 del contrato de obra MC-23-2024 con objeto **"INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES."**, del periodo referente al plazo total de ejecución, comprendido desde el veintisiete (27) de DICIEMBRE de 2024 hasta el veinticinco (25) de FEBRERO del año 2025. También se presenta en el informe el estado en el que se encontró el contrato MC-23-2024 en el tiempo de 20 de diciembre hasta el 27 de diciembre de 2024.

En el cual se reporta el estado actual de las obras con relación a los aspectos generales y particulares del estado del Proyecto, los cuales son de orden técnico, administrativo, operativo, financiero y socio ambiental, donde se describe el seguimiento de la ejecución de las actividades contractuales desarrolladas por el contratista de obra, anexando el registro fotográfico, la medición y el cálculo del avance porcentual de ejecución.

Además, en el presente informe se presentan conclusiones y recomendaciones acerca del avance del proyecto, imprevistos, cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra y demás aspectos inherentes al desarrollo del contrato de obra pública, objeto de esta Interventoría.

Resaltando que, a partir de las conclusiones y recomendaciones que esta interventoría ponga en conocimiento del ente contratante, se tomen las acciones que contribuyan al buen

desarrollo de la obra, teniendo en cuenta que las actividades de ejecución, seguimiento y control, deben enmarcarse dentro de un código de integridad moral y ética profesional.

GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

OBRA	"**INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.**"					
INFORME No	1	**INFORME DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS CIVILES DE "INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES."**,"				
PERIODO		ENTRE	27/diciembre/ 2024	Y	25/FEBRERO/2025	
LOCALIZACION DEL PROYECTO	SINCELEJO, SUCRE-TORRE AB					

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

ELABORÓ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	ROBINSON VILLAMIL ROJAS
REVISÓ	OSCARLUISHERAZOSEBA R. Legal Interventoría
APROBÓ	OSCARLUISHERAZOSEBA R. Legal Interventoría

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

SUPERVISOR	No COPIAS	FECHA DE ENVIO	OBSERVACIONES
INGENIERA FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA	1	25 de Febrero de 2025	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objeto a desarrollar con **"INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES",** objeto del contrato de obra **MC 24 DE 2024** y tiene como finalidad la adecuacion y mejoramiento del gimnasio y zonas aledañas en la torre AB.

Las intervenciones del proyecto consistirán inicialmente ubicar nuevos elementos como aires acondicionados, muros en drywall, levante en muros, como también cambio de luminarias y mantenimiento al cielo razo, mantenimiento electrico y sistema de voz de datos .

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

TORRE AB, SINCELEJO SUCRE

El edificio gemtium esta ubicado en la zona centrica de Sincelejo.



CONTRATOS SUSCRITOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA MC 23 DE 2024
CONTRATANTE:	CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONTRATISTA:	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
NIT:	NIT. 1.102.851.781- 6
OBJETO:	"ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES"
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES M/CTE ($99.092.686,93).
VALOR ADICIONAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($49.546.343,47)
VALOR TOTAL OBRA:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($148.639.030,4)
PLAZO:	HASTA 25 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTORÍA:	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L OSCAR LUIS HERAZO SEBA
NIT:	901.752.114-6
OBJETO:	LA INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.
VALOR INICIAL:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($8.372.352,1).
VALOR ADICIONAL 1:	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($10.266.104,77)
VALOR ADICIONA 2:	SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($7.777.352,10).
VALOR TOTAL:	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($26.415.811,97).

SUPERVISIÓN:	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO:	(27) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA FINAL	25 DE FEBRERO DE 2025

CONTROL DE POLIZAS

CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA
POLIZA INICIAL

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101036019	17/12/2024	01/05/2025	$19,818,537.40
Estabilidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101036019	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.		$29.727.806.10
Salarios y prestaciones Sociales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101036019	17/12/2024	31/12/2027	$14,863,903.05
Predios labores y operaciones		53-40-101011637	17/12/2024	31/12/2024	$260,000,000.00

POLIZAS VIGENTES CON ADICIONAL Y PRORROGA

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101036019	20/12/2024	05/06/2025	$29,727,806.20
Estabilidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101036019	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.		$44.591.709.30
Salarios y prestaciones Sociales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101036019	20/12/2024	02/02/2028	$22,295,854.65
Predios labores y operaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-40-101011637	20/12/2024	05/02/2024	$260,000,000.00

CONTROL DE POLIZAS CON PRORROGA NUMERO 2

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101036019	20/12/2024	15/06/2025	$29,727,806.20
Estabilidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101036019	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA		$44.591.709.30

			FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.		
Salarios y prestaciones Sociales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101036019	20/12/2024	05/02/2028	$22,295,854.65
Predios labores y operaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-40-101011637	20/12/2024	15/02/2024	$284,700,000.00

CONTROL DE POLIZAS CON PRORROGA NUMERO 3

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101036019	20/12/2024	25/06/2025	$29,727,806.20
Estabilidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101036019	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.		$44.591.709.30

Salarios y prestaciones Sociales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-44-101036019	20/12/2024	25/02/2028	$22,295,854.65
Predios labores y operaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	53-40-101011637	20/12/2024	25/02/2024	$284,700,000.00

CONTROL DE POLIZAS DE INTERVENTORIA

POLIZAS INICIALES

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	75-44-101142269	26/12/2024	30/06/2025	$1.674.470,60
prestaciones Sociales	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	75-44-101142269	26/12/2024	31/12/2027	$837.235,30
Calidad del Servicio	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	75-44-101142269	31/12/2024	31/12/2027	$1.674.470,60

ACTUALIZACION DE POLIZAS CON ADICIONAL Y PRORROGA

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	75-44-101142269	26/12/2024	31/07/2025	$3.727.691,60
prestaciones Sociales	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	75-44-101142269	26/12/2024	31/01/2028	$1.863.845,80
Calidad del Servicio	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	75-44-101142269	31/01/2025	31/12/2028	$3.727.691,90

ACTUALIZACION DE POLIZAS CON PRORROGA 2

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	75-44-101142269	26/12/2024	11/08/2025	$3.727.691,60
prestaciones Sociales	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	75-44-101142269	26/12/2024	10/02/2028	$1.863.845,80
Calidad del Servicio	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	75-44-101142269	31/12/2024	31/12/2027	$3.727.691,90

ACTUALIZACION DE POLIZAS CON PRORROGA 3 Y ADICIONAL

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	75-44-101142269	26/12/2024	26/08/2025	$5.283.162,20
prestaciones Sociales	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	75-44-101142269	26/12/2024	25/02/2028	$2.641.581,10
Calidad del Servicio	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	75-44-101142269	31/12/2024	15/01/2028	$5.283.162,20

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Vigentes las pólizas	**SI**		Se anexan pólizas
Tiene reclamaciones		**NO**	
Certificación de parafiscales	**SI**		Se anexan planillas de pago
Exámenes ocupacionales de ingreso	**SI**		Se anexan exámenes ocupacionales

CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES
DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral del contratista, el cual fue verificado en obra.

N°	CANTIDAD	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	1	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY	DIRECTOR DE OBRA	50%
2	1	RAMON ANDRES LOPEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
3	1	KEYLA MARIA SOLIS MARTINEZ	SISO	100%

Se anexan certificados de ingreso ocupacional.

DISPOSICIONES LABORALES DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral de la interventoría, el cual hizo presencia en obra durante el periodo relacionado, dando cumplimiento al contrato de interventoría.

N°	CANTIDAD	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	1	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	70%
2	1	CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100%
3	1	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS	PROFESIONAL SISO	100%

CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUCRITOS

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA

El 17 de diciembre de 2024 fue emitida la carta de aceptación MC-23-2024 iniciado el 20 de diciembre, modificado y prorrogado el el dia 27 de Diciembre mediante el cual fue adicionado al contrato de obra un plazo hasta el de 31 de enero meses y el 50% en el valor, posteriormente con prorroga número 2, se extendió el plazo hasta el 10 de febrero de 2025 y luego mediante prorroga número 3 se extendió el plazo hasta el 25 de febrero de 2025, restando 0 días del plazo total del contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	TIEMPO EJECUTADO	TIEMPO POR EJECUTAR
67 DIAS	**67 DIAS**	**0 DIAS**

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El 30 de diciembre de 2024 fue aprobado el otrosí modificatorio N°1 mediante el cual fue adicionado al contrato de obra un plazo hasta el de 31 de enero meses, de los cuales han transcurrido 23 días hasta el 15 de enero de 2024, restando por ejecutar en total 16 días.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	TIEMPO EJECUTADO	TIEMPO POR EJECUTAR
64 DIAS	**64 DIAS**	**0**

ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO
En el período transcurrido la Interventoría realizó el seguimiento y control de los aspectos financieros así:

- **Control de la Inversión del contrato de obra**
- **Seguimiento financiero del contrato de obra.**

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO DEL CONTRATISTA

ACTAS PARCIALES	**EL CONTRATANTE PAGARA AL CONTRATISTA ACTAS PARCIALES CORRESPONDIENTES AL AVANCE DE LAS OBRAS**

FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA

ACTAS PARCIALES	**EL CONTRATANTE PAGARA AL INTERVENTOR MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE OBRA**

ACTAS PARCIALES DEL CONTRATISTA

Durante el periodo, no se presentaron Actas Parciales.

ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA


Durante el periodo, no se presentaron Actas Parciales.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

	Inversión programada (p)	**Inversión ejecutada (E)**	**E/P (%)**
EN EL MES:	**$ 148.639.030,40**	**$ $ 148.639.030,40**	**100%**
ACUMULADO:	**$$ 148.639.030,40**	**$ $ 148.639.030,40**	**100%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA EN PORCENTAJE

	Inversión programada (p)	Inversión ejecutada (E)	RETRASO
ACUMULADO	**100%**	**100%**	**0%**

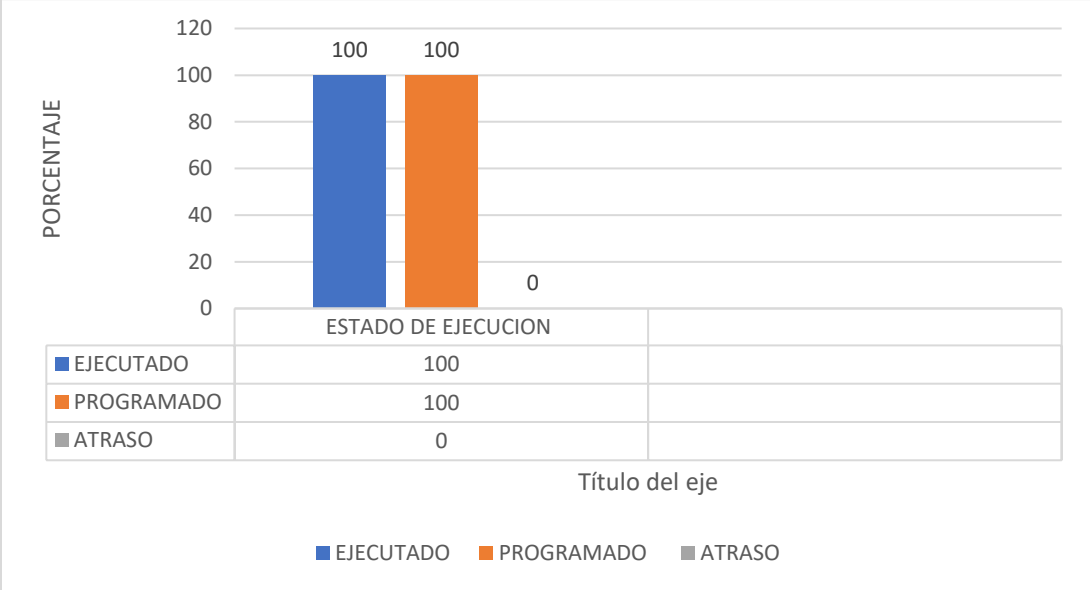

Se presenta una ejecución del 100%.




ITEM 1,01: CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA PLASTICA VERDE H:2 M
Se realizo el desmonte de cielo raso existente



ITEM 1,02: DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTON
Se realizo el desmonte de cielo raso existente



ITEM 1,03: DESMONTE Y ACARREO APARATOS SANIT.
Se realizo el de los aparatos sanitarios




ITEM 1,04: DESMONTE Y ACARREO DE PUERTAS
Se realizo el desmonte de puertas



ITEM 1,05: DESMONTE DE VENTANAS INCLUYE VIDRIOS
Se realizaron desmonte de ventanas y vidrios



ITEM 1.6: DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO E=0.08 M

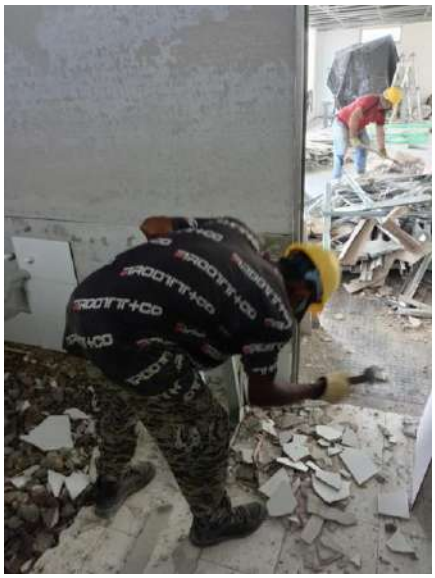


ITEM 1.7: DEMOLICION ENCHAPE



ITEM 1.8: TRAZADO Y REPLANTEO



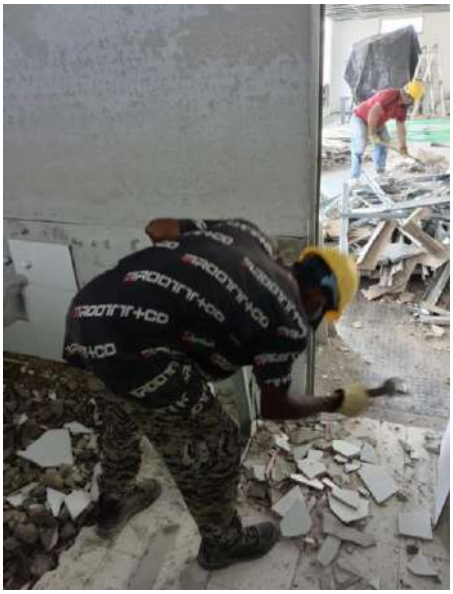

ITEM 1.10: RETIRO ESCOMBROS





ITEM 1.12: REGATAS SOBRE MUROS (INCLUYE RETIRO)





ITEM 2.2: PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.10 M. # 2 (CON REF.)

ITEM 2.3: DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO




ITEM 2.5: CIELO RASO PANEL YESO 12.7 MM




ITEM 2.6: PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) INTERIORES





ITEM 2,7: ENCHAPE CERAMICA 25x40





ITEM 2,8: PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) EXTERIORES



ITEM 3,1: SALIDA E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMP. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE





ITEM 5,01: LAVAMANOS INSTITUCIONAL SOBREPONER



ITEM 5,02: GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVANDALICO



ITEM 5,05: DUCHA SENCILLA ANTIVANDALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)





ITEM 6,01: DESMONTE TELA ASFALTICA

ITEM NP1: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA



ITEM NP2: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 9W



ITEM NP3: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 9W





ITEM NP4: SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED EN SILOCONA BLANCA



ITEM NP6: SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE





ITEM NP7: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", INCLUYE CABLEADO 2F+1T+1N Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN



ITEM NP8: SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS PVC 1/2"





ITEM NP9: SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PVC 4X4





ITEM NP10: SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE





ITEM NP11: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER Y MATERIALES ACORDE AL RETIE



ITEM NP12: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO CON ALTAVOCES FIJOS Y CONSOLA AMPLIFICADORA. INCLY CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN



ITEM NP13: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS SISTEMA 5020




ITEM NP14: REINSTALACION DE PUERTA. INCY CORTE SEGÚN NUEVAS MEDIADAS





ITEM NP15: REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN GYM. INCY TUBERIA DE COBRE, CABLEADO Y ACCESORIOS PAR A SU CORRECTA INSTALACION



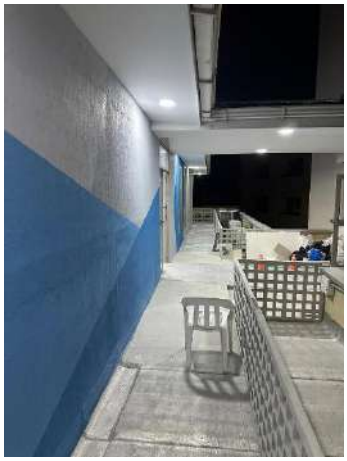

ITEM NP 2. 1.: SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS H=80CM





ITEM NP2. 2: MACHONES EN CONCRETO S=10X10 H=80CM INCLY ACERO Y ANCLAJE SOBRE PLACA



ITEM NP 2. 3.: ESTUCO SOBRE MUROS 3 MANOS





ITEM NP2. 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA




ITEM NP 2. 5: SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE





ITEM NP2. 6: SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE

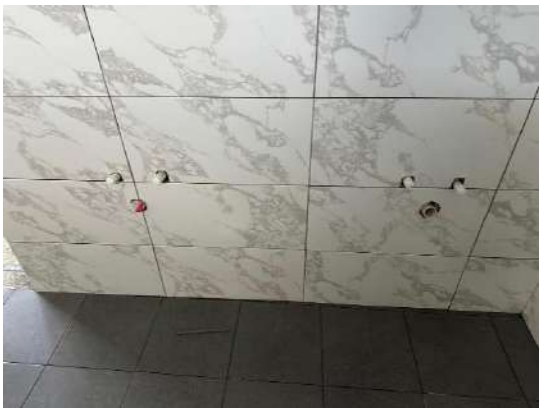

ITEM NP 2. 7: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION



ITEM NP2. 8: SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 2".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION



ITEM NP 2.9: SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 4".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION



ITEM NP2.10: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION DE 1/2"




ITEM NP 2. 11.: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2"



ITEM NP2. 12: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4"



ITEM NP 2. 13: RECOSTRUCCION DE MARCOS PARA VENTANAS, INCLUYE ESTRUCTURA

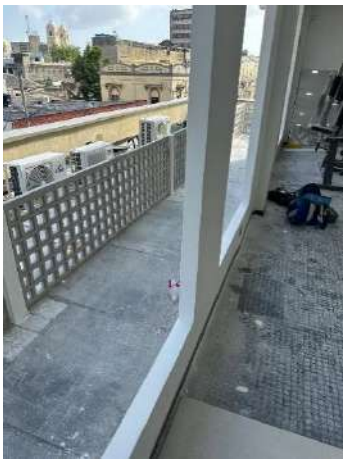

ITEM NP2. 14: ESTUCO Y PINTURA PARA FILOS DE VANTANA



ITEM NP2. 15: LEVANTE DE MURO EN PANEL DE ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA



ITEM NP2. 16: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE KRISTAL

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO CONTRATISTA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195I3-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 32 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
KEYLA MARIA SOLIS MARTINEZ	1.102.850.828	SISO

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: ☐	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951M

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 34 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA	1.102.837.708	DIRECTOR DE OBRA

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ] Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ] Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ] Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ] _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: [ ]	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: [ ]	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: [ ]	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: [ ]
Continuar tratamiento médico: [ ]	Utilización de ayudas ergonómicas: [ ]	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: [ ]	Charlas Manejo de cargas: [ ]	Reducir consumo de alcohol: [ ]
Seguimiento caso ARL: [ ]	Calificación de origen de patología: [ ]	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

LABORMED SAS
Especialistas en Medicina Laboral
Y SST

LABORMED IPS S.A.S
La salud de sus empleados en manos de especialistas!
NIT. 901079142-6
Carrera 19 N° 15 - 67 Calle de las Flores - Sincelejo, Colombia
Cel. 3183078651 - 3005115362 - Tel. 2786106 - E-mail. labormedsas@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 2,883

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
29 DÍA	11 MES	2024 AÑO	SINCELEJO (SUCRE, COLOMBIA) Ciudad	**EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO**

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

PARTICULARES CONTADO	**PARTICULARES**
Nombre de la empresa	**Empresa en misión**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	31 AÑOS	CC	1102851781
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

Cargo
CONTRATISTA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
SIN DEFECTO FÍSICO NI ENFERMEDAD QUE INTERFIERA SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	**TIPO**	**RECOMENDACIONES**
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL ✓	CONSULTA DE PSICOLOGIA ✓


RECOMENDACIONES MÉDICAS	**RECOMENDACIONES OCUPACIONALES**	**HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES**
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

MANTENER EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:
1. DISTANCIAMIENTO SOCIAL 2MTS.
2. USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS PERMANENTE.
3. LAVADO FRECUENTE DE MANOS.
4. REPORTAR A SU EMPLEADOR Y/O EPS EN CASO DE SINTOMAS SOSPECHOSO DE COVID 19 Y AISLARSE DE INMEDIATO.
5. USO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA HIGIENE DE MANOS.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico




Firma:

Nombre: ARRIETA ANGEL PETTY PATRICIA

R. M.: 7046704 **L.S.O.:** 365

Código de Seguridad
H819N1T1883

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

CC: 1102851781

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 59 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
ANTONIO JOSE PEREZ OCHOA	92.508.367	AYUDANTE DE OBRA CIVIL

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ]

Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ]

Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ]

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ]

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: [ ]	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: [ ]	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: [ ]	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: [ ]
Continuar tratamiento médico: [ ]	Utilización de ayudas ergonómicas: [ ]	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: [ ]	Charlas Manejo de cargas: [ ]	Reducir consumo de alcohol: [ ]
Seguimiento caso ARL: [ ]	Calificación de origen de patología: [ ]	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 43 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
OSCAR RAFAEL CONTRERAS VAQUERO	1.104.255.311	AYUDANTE DE OBRA CIVIL

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: ☐	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 46 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
JOSE ANTONIO CONTRERAS VILLALBA	92.534.484	AYUDANTE DE OBRA CIVIL

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: ☐	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 20 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
JUAN SEBASTIAN DIAZ OYOLA	1.192.714.633	AYUDANTE DE OBRA CIVIL

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ] Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ] Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ] Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ] _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: [ ]	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: [ ]	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: [ ]	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: [ ]
Continuar tratamiento médico: [ ]	Utilización de ayudas ergonómicas: [ ]	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: [ ]	Charlas Manejo de cargas: [ ]	Reducir consumo de alcohol: [ ]
Seguimiento caso ARL: [ ]	Calificación de origen de patología: [ ]	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 24 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
LUIS ANGEL BARRETO SERPA	1.005.569.998	AYUDANTE DE OBRA CIVIL

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ] Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ] Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ] Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ] _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: [ ]	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: [ ]	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: [ ]	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: [ ]
Continuar tratamiento médico: [ ]	Utilización de ayudas ergonómicas: [ ]	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: [ ]	Charlas Manejo de cargas: [ ]	Reducir consumo de alcohol: [ ]
Seguimiento caso ARL: [ ]	Calificación de origen de patología: [ ]	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 47 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
ORLANDO CORONADO PEREZ	1.127..617.091	AYUDANTE DE OBRA CIVIL

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: ☐	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 92519513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 43 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
OSCAR RAFAEL CONTRERAS VAQUERO	1.104.255.311	AYUDANTE DE OBRA CIVIL

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: ☐	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 43 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
WILMER DE JESUS BARRETO PALENCIA	92.601.623	AYUDANTE DE OBRA CIVIL

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ] Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ] Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ] Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ] _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: [ ]	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: [ ]	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: [ ]	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: [ ]
Continuar tratamiento médico: [ ]	Utilización de ayudas ergonómicas: [ ]	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: [ ]	Charlas Manejo de cargas: [ ]	Reducir consumo de alcohol: [ ]
Seguimiento caso ARL: [ ]	Calificación de origen de patología: [ ]	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 26 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
WILBERTO JOSE MEDINA HERNANDEZ	1.005..576.035	AYUDANTE DE OBRA CIVIL

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: ☐	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO INTERVENTORIA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General

No. ingreso	**2277652,693**	**Fecha Impresión**	**27/01/2025**
Fecha Ingreso	**27/01/2025**	**Nombre**	**HERAZO SEBA OSCAR LUIS**
CC	**1103118425**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**SECRETARIO DE INTERVENTORIA**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**24/09/1996**	**Edad**	**28**
Dirección	**CR 5 N 7 10 BRR CENTRO-SAN JUAN DE BETULIA**	**Teléfono**	**3114893115**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**Fecha de salida**	**27/01/2025**
Nombre Acompañante			



Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Rodrigo Alejandro Méndez G.
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
R.M. 1.032.395.042
unab

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Firma del trabajador: HERAZO SEBA OSCAR LUIS
CC:CC1103118425

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General

No. ingreso	**2266851,113**	**Fecha Impresión**	**27/01/2025**
Fecha Ingreso	**27/01/2025**	**Nombre**	**JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA**
CC	**24339586**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**SISO DE INTERVENTORIA**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**23/08/1985**	**Edad**	**39**
Dirección	**CR 5 N 7 10 BRR CENTRO**	**Teléfono**	**3005785192**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**Fecha de salida**	**27/01/2025**
Nombre Acompañante			



Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Rodrigo Alejandro Méndez G.
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
Medico R.M. 1.032.395.042

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Firma del trabajador: JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA
CC:CC24339586

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General

No. ingreso	**2288454,273**	**Fecha Impresión**	**27/01/2025**
Fecha Ingreso	**27/01/2025**	**Nombre**	**RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO**
CC	**1100622776**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**15/12/1985**	**Edad**	**39**
Dirección	**CR 5 N 7 10 BRR CENTRO-SAN JUAN DE BETULIA**	**Teléfono**	**3043572148**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**Fecha de salida**	**27/01/2025**
Nombre Acompañante			



Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Rodrigo Alejandro Méndez G.
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
R.M. 1.032.395.042
unab

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Firma del trabajador: RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO
CC:CC1100622776

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General

No. ingreso	**2310057,433**	**Fecha Impresión**	**27/01/2025**
Fecha Ingreso	**27/01/2025**	**Nombre**	**VILLAMIL ROJAS ROBINSON**
CC	**79048393**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**1/07/1966**	**Edad**	**58**
Dirección	**CR 5 N 7 10 BRR CENTRO-SAN JUAN DE BETULIA**	**Teléfono**	**3004918397**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**Fecha de salida**	**27/01/2025**
Nombre Acompañante			



Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Rodrigo Alejandro Méndez G.
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
R.M. 1.032.395.042
unab

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Firma del trabajador: VILLAMIL ROJAS ROBINSON
CC:CC79048393

POLIZAS CONTRATISTA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	**AGENCIA MONTERIA**	**53**	**53-40-101011637**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	**12**	**2024**	**17**	**12**	**2024**	**00:00**	**31**	**12**	**2024**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES	**CC: 1102.851.781**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	SINCELEJO, SUCRE	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO, SUCRE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

ASEGURADOS: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO, CC: 1102851781-6 Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**17/12/2024**	**31/12/2024**	**$260,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**17/12/2024**	**31/12/2024**	**$260,000,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**17/12/2024**	**31/12/2024**	**$260,000,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******50,062.00	$ *******3,000.00	$ ******10,081.00	$ ***********63,144.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101011637	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2024	17	12	2024	00:00	31	12	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**17/12/2024**	**31/12/2024**	**$260,000,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**17/12/2024**	**31/12/2024**	**$260,000,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**17/12/2024**	**31/12/2024**	**$260,000,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA



53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	**AGENCIA MONTERIA**	**53**	**53-44-101036019**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	**12**	**2024**	**20**	**12**	**2024**	**00:00**	**03**	**01**	**2028**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	275480

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20/12/2024**	**04/05/2025**	**$29,727,806.20**	**$19,818,537.40**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$44,591,709.30**	**$29,727,806.10**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**20/12/2024**	**03/01/2028**	**$22,295,854.65**	**$14,863,903.05**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LOS VALORES ASEGURADOS Y VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 01 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****138,746.00	$ *******8,000.00	$ ******27,881.00	$ **********174,628.00	$ *******96,615,370.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101036019

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101036019	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	20	12	2024	00:00	03	01	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101036019

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	**AGENCIA MONTERIA**	**53**	**53-40-101011637**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	**12**	**2024**	**20**	**12**	**2024**	**00:00**	**05**	**02**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	275480
BENEFICIARIO:	800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

ASEGURADOS: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO, CC: 1102851781-6 Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**05/02/2025**	**$260,000,000.00**	**$260,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**05/02/2025**	**$260,000,000.00**	**$260,000,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**05/02/2025**	**$260,000,000.00**	**$260,000,000.00**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LOS VALORES ASEGURADOS Y VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 01 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****118,004.00	$ *******3,000.00	$ ******22,990.00	$ **********143,995.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101011637	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	20	12	2024	00:00	05	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**05/02/2025**	**$260,000,000.00**	**$260,000,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**05/02/2025**	**$260,000,000.00**	**$260,000,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**05/02/2025**	**$260,000,000.00**	**$260,000,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101011637	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	20	12	2024	00:00	05	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	**AGENCIA MONTERIA**	**53**	**53-44-101036019**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	**12**	**2024**	**20**	**12**	**2024**	**00:00**	**05**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES	**CC: 1102.851.781**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	SINCELEJO, SUCRE	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20/12/2024**	**05/06/2025**	**$29,727,806.20**	**$29,727,806.20**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$44,591,709.30**	**$44,591,709.30**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**20/12/2024**	**05/02/2028**	**$22,295,854.65**	**$22,295,854.65**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LOS VALORES ASEGURADOS Y VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 01 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******11,555.00	$ *******4,000.00	$ *******2,955.00	$ **********18,510.00	$ *******96,615,370.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101036019

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101036019	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	20	12	2024	00:00	05	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101036019

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	**AGENCIA MONTERIA**	**53**	**53-44-101036019**	**6**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	**02**	**2025**	**20**	**12**	**2024**	**00:00**	**25**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES	**CC: 1102.851.781**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	SINCELEJO, SUCRE	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20/12/2024**	**25/06/2025**	**$29,727,806.20**	**$29,727,806.20**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$44,591,709.30**	**$44,591,709.30**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**20/12/2024**	**25/02/2028**	**$22,295,854.65**	**$22,295,854.65**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 03 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ ************14,280.00	$ *******96,615,370.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101036019

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101036019	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2025	20	12	2024	00:00	25	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101036019

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	**AGENCIA MONTERIA**	**53**	**53-44-101036019**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	**12**	**2024**	**17**	**12**	**2024**	**00:00**	**31**	**12**	**2027**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES	**CC: 1102.851.781**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	SINCELEJO, SUCRE	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**17/12/2024**	**01/05/2025**	**$19,818,537.40**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$29,727,806.10**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**17/12/2024**	**31/12/2027**	**$14,863,903.05**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****281,543.00	$ *******8,000.00	$ ******55,013.00	$ **********344,556.00	$ *******64,410,246.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101036019

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	**AGENCIA MONTERIA**	**53**	**53-44-101036019**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	**02**	**2025**	**20**	**12**	**2024**	**00:00**	**05**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES	**CC: 1102.851.781**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	SINCELEJO, SUCRE	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20/12/2024**	**15/06/2025**	**$29,727,806.20**	**$29,727,806.20**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$44,591,709.30**	**$44,591,709.30**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**20/12/2024**	**05/02/2028**	**$22,295,854.65**	**$22,295,854.65**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 02 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ ***********14,280.00	$ *******96,615,370.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101036019

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101036019	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	02	2025	20	12	2024	00:00	05	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101036019

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	**AGENCIA MONTERIA**	**53**	**53-40-101011637**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	**02**	**2025**	**20**	**12**	**2024**	**00:00**	**15**	**02**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	275480
BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

ASEGURADOS: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO, CC: 1102851781-6 Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**15/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**15/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**15/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LOS VALORES ASEGURADOS SEGUN SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE 2025 Y SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 02 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******39,155.00	$ *******3,000.00	$ *******8,009.00	$ ***********50,165.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101011637	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	02	2025	20	12	2024	00:00	15	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**15/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**15/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**15/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101011637	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	02	2025	20	12	2024	00:00	15	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	**AGENCIA MONTERIA**	**53**	**53-40-101011637**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	**02**	**2025**	**20**	**12**	**2024**	**00:00**	**05**	**02**	**2025**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES	**CC: 1102.851.781**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	SINCELEJO, SUCRE	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

ASEGURADOS: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO, CC: 1102851781-6 Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**05/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$260,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**05/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$260,000,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**05/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$260,000,000.00**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LOS VALORES ASEGURADOS SEGUN SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE 2025 Y SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 02 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ **********0.00	$ ********950.00	$ ************5,950.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101011637	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	02	2025	20	12	2024	00:00	05	02	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**05/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$260,000,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**05/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$260,000,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**05/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$260,000,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101011637	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	02	2025	20	12	2024	00:00	05	02	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	**AGENCIA MONTERIA**	**53**	**53-40-101011637**	**6**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	**02**	**2025**	**20**	**12**	**2024**	**00:00**	**25**	**02**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	275480
BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

ASEGURADOS: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO, CC: 1102851781-6 Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**25/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**25/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**25/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 03 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******39,156.00	$ *******3,000.00	$ *******8,009.00	$ ***********50,165.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101011637	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2025	20	12	2024	00:00	25	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**25/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**25/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2024**	**25/02/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101011637	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2025	20	12	2024	00:00	25	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES		**CC: 1102.851.781**
DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3216991697

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101011637

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZAS INTERVENTOR

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101142269**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**12**	**2024**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**31**	**12**	**2027**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	SAN JUAN BETULIA, SUCRE	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. MC 25 DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**26/12/2024**	**30/06/2025**	**$1,674,470.60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**26/12/2024**	**31/12/2027**	**$837,235.30**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2024**	**31/12/2027**	**$1,674,470.60**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******60,093.00	$ *******8,000.00	$ ******12,937.00	$ **********81,031.00	$ ********4,186,176.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

75-44-101142269

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101142269**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**12**	**2024**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**31**	**12**	**2027**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS		**NIT: 901.752.114-6**
DIRECCIÓN: CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	CIUDAD: SAN JUAN BETULIA, SUCRE	TELÉFONO:	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	275480

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******60,093.00	$ *******8,000.00	$ ******12,937.00	$ ************81,031.00	$ ********4,186,176.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013106880046(3900)000000081031(96)20251226

REFERENCIA PAGO:

1101310688004-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101142269**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	**01**	**2025**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**31**	**12**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	SAN JUAN BETULIA, SUCRE	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. MC 25 DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**26/12/2024**	**30/06/2025**	**$3,727,691.60**	**$1,674,470.60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**26/12/2024**	**31/12/2027**	**$1,863,845.80**	**$837,235.30**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2024**	**31/12/2027**	**$3,727,691.60**	**$1,674,470.60**

ACLARACIONES

DE ACUERDO A LA MODIFICACION N0. 1 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7175120 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN 31 DIAS MAS Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $10,266,104.77 MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******37,843.00	$ *******8,000.00	$ *******8,710.00	$ **********54,554.00	$ ********9,319,229.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101142269

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101142269**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	**01**	**2025**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**31**	**12**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO		SAN JUAN BETULIA, SUCRE		3114893115	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
CL 22 NRO. 16 - 40		SINCELEJO, SUCRE		275480	

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODIBLOCO

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******37,843.00	$ *******8,000.00	$ *******8,710.00	$ ************54,554.00	$ ********9,319,229.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013106891769(3900)000000054554(96)20260102

REFERENCIA PAGO:

1101310689176-9

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101142269	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	01	2025	26	12	2024	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	SAN JUAN BETULIA, SUCRE	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101142269

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101142269**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	**01**	**2025**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**31**	**01**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	SAN JUAN BETULIA, SUCRE	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. MC 25 DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**26/12/2024**	**31/07/2025**	**$3,727,691.60**	**$3,727,691.60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**26/12/2024**	**31/01/2028**	**$1,863,845.80**	**$1,863,845.80**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2024**	**31/12/2027**	**$3,727,691.60**	**$3,727,691.60**

ACLARACIONES

DE ACUERDO A LA MODIFICACION N0. 1 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7175120 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN 31 DIAS MAS Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $10,266,104.77 MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ **********14,280.00	$ ********9,319,229.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101142269

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101142269**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	**01**	**2025**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**31**	**01**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO		SAN JUAN BETULIA, SUCRE		3114893115	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
CL 22 NRO. 16 - 40		SINCELEJO, SUCRE		275480	

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ ************14,280.00	$ ********9,319,229.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013106891776(3900)000000014280(96)20251226

REFERENCIA PAGO:

1101310689177-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101142269	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	01	2025	26	12	2024	00:00	31	01	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	SAN JUAN BETULIA, SUCRE	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101142269

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101142269**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	**02**	**2025**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**10**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS		**NIT: 901.752.114-6**
DIRECCIÓN: CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	CIUDAD: SAN JUAN BETULIA, SUCRE	TELÉFONO:	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	275480

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. MC 25 DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**26/12/2024**	**11/08/2025**	**$3,727,691.60**	**$3,727,691.60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**26/12/2024**	**10/02/2028**	**$1,863,845.80**	**$1,863,845.80**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2024**	**31/12/2027**	**$3,727,691.60**	**$3,727,691.60**

ACLARACIONES

DE ACUERDO A LA MODIFICACION N.2 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7175120 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 10/02/2025 MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION.
NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ ***********14,280.00	$ ********9,319,229.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

75-44-101142269

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101142269**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	**02**	**2025**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**10**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	SAN JUAN BETULIA, SUCRE	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ ************14,280.00	$ ********9,319,229.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013106928205(3900)000000014280(96)20251226

REFERENCIA PAGO:

1101310692820-5

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101142269	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2025	26	12	2024	00:00	10	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	SAN JUAN BETULIA, SUCRE	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101142269

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101142269**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**02**	**2025**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**25**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	SAN JUAN BETULIA, SUCRE	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. MC 25 DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**26/12/2024**	**26/08/2025**	**$5,283,162.20**	**$5,283,162.20**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**26/12/2024**	**25/02/2028**	**$2,641,581.10**	**$2,641,581.10**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2024**	**15/01/2028**	**$5,283,162.20**	**$5,283,162.20**

ACLARACIONES

DE ACUERDO A LA MODIFICACION NO. 03 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7175120 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN QUINCE (15) DIAS MAS, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $7.777.352,10 MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******12,000.00	$ *******4,000.00	$ *******3,040.00	$ **********19,040.00	$ *******13,207,905.50	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101142269

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101142269**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**02**	**2025**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**25**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	SAN JUAN BETULIA, SUCRE	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******12,000.00	$ *******4,000.00	$ *******3,040.00	$ ************19,040.00	$ *******13,207,905.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013106938761(3900)000000019040(96)20251226

REFERENCIA PAGO:

1101310693876-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101142269	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	02	2025	26	12	2024	00:00	25	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO		SAN JUAN BETULIA, SUCRE		3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 22 NRO. 16 - 40		SINCELEJO, SUCRE		275480

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101142269

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101142269**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**02**	**2025**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**10**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	SAN JUAN BETULIA, SUCRE	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. MC 25 DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**26/12/2024**	**11/08/2025**	**$5,283,162.20**	**$3,727,691.60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**26/12/2024**	**10/02/2028**	**$2,641,581.10**	**$1,863,845.80**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2024**	**31/12/2027**	**$5,283,162.20**	**$3,727,691.60**

ACLARACIONES

DE ACUERDO A LA MODIFICACION NO. 03 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7175120 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN QUINCE (15) DIAS MAS, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $7.777.352,10 MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******28,942.00	$ *******8,000.00	$ *******7,019.00	$ ***********43,962.00	$ *******13,207,905.50	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101142269

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101142269**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**02**	**2025**	**26**	**12**	**2024**	**00:00**	**10**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 901.752.114-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	SAN JUAN BETULIA, SUCRE	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	275480

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******28,942.00	$ *******8,000.00	$ *******7,019.00	$ ************43,962.00	$ *******13,207,905.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013106938754(3900)000000043962(96)20260211

REFERENCIA PAGO:

1101310693875-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101142269	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	02	2025	26	12	2024	00:00	10	02	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS		**NIT: 901.752.114-6**
DIRECCIÓN: CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO	**CIUDAD:** SAN JUAN BETULIA, SUCRE	**TELÉFONO:**	3114893115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	275480

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101142269

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICADOS DE AFILIACION

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	1102851781
Nombre:	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO		
Dirección:	KR 4 C 29 C 4		
Departamento:	SUCRE	**Municipio:**	SINCELEJO
Correo electrónico:	SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM		
Teléfono:	3216991697	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1102851781	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-011-30295	04/01/2025	CC 92508367	ANTONIO JOSE PEREZ OCHOA	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: MI4ZZXrXqMs9vvgbTmd+PQ== Certificado impreso el día 03/01/2025 5:04:56 p. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

ANTONIO JOSE
PEREZ OCHOA
CC - 92508367

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	1102851781
Nombre:	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO		
Dirección:	KR 4 C 29 C 4		
Departamento:	SUCRE	**Municipio:**	SINCELEJO
Correo electrónico:	SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM		
Teléfono:	3216991697	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1102851781	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-011-197698	13/01/2025	CC 92542209	EDER LUIS HERNANDEZ DIMAS	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: uMMO6WDoIxOoZ1L6RKVWLg== Certificado impreso el día 12/01/2025 11:38:59 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EDER LUIS
HERNANDEZ DIMAS
CC - 92542209

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	1102851781
Nombre:	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO		
Dirección:	KR 4 C 29 C 4		
Departamento:	SUCRE	**Municipio:**	SINCELEJO
Correo electrónico:	SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM		
Teléfono:	3216991697	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1102851781	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-011-197722	13/01/2025	CC 92534484	JOSE ANTONIO CONTRERAS VILLALBA	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: SrthIpyZ+CyDQGz/4wMOlg== Certificado impreso el día 12/01/2025 11:44:07 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JOSE ANTONIO
CONTRERAS VILLALBA
CC - 92534484

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/12/2024

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	1102851781
Nombre:	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO		
Dirección:	KR 4 C 29 C 4		
Departamento:	SUCRE	**Municipio:**	SINCELEJO
Correo electrónico:	SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM		
Teléfono:	3216991697	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1102851781	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2024-01-022-655358	31/12/2024	CC 1192714633	JUAN SEBASTIAN DIAZ OYOLA	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: YqZh6bQ0spH9/g5ASLEzdg==

Certificado impreso el día 30/12/2024 10:42:56 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

JUAN SEBASTIAN
DIAZ OYOLA
CC - 1192714633

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	1102851781
Nombre:	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO		
Dirección:	KR 4 C 29 C 4		
Departamento:	SUCRE	**Municipio:**	SINCELEJO
Correo electrónico:	SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM		
Teléfono:	3216991697	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1102851781	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-011-197735	13/01/2025	CC 1005569998	LUIS ANGEL BARRETO SERPA	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: 6voQtsKDtXX8YpgJWAQB8A== Certificado impreso el día 12/01/2025 11:47:02 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

LUIS ANGEL
BARRETO SERPA
CC - 1005569998

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	1102851781
Nombre:	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO		
Dirección:	KR 4 C 29 C 4		
Departamento:	SUCRE	**Municipio:**	SINCELEJO
Correo electrónico:	SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM		
Teléfono:	3216991697	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1102851781	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-011-197728	13/01/2025	CC 1127617091	ORLANDO CORONADO PEREZ	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: ODgwB7XuA1pIUEJHPKDu7A== Certificado impreso el día 12/01/2025 11:45:36 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

ORLANDO
CORONADO PEREZ
CC - 1127617091

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	1102851781
Nombre:	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO		
Dirección:	KR 4 C 29 C 4		
Departamento:	SUCRE	**Municipio:**	SINCELEJO
Correo electrónico:	SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM		
Teléfono:	3216991697	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1102851781	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-011-197714	13/01/2025	CC 1104255311	OSCAR RAFAEL CONTRERAS BAQUERO	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: p9fpqtGN8QoBDg8Mgrn5Gg== Certificado impreso el día 12/01/2025 11:42:19 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

OSCAR RAFAEL
CONTRERAS BAQUERO
CC - 1104255311

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	1102851781
Nombre:	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO		
Dirección:	KR 4 C 29 C 4		
Departamento:	SUCRE	**Municipio:**	SINCELEJO
Correo electrónico:	SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM		
Teléfono:	3216991697	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1102851781	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-011-197693	13/01/2025	CC 1005576035	WILBERTO JOSE MEDINA HERNANDEZ	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: Csu8xEuPPddwRmqu580njg== Certificado impreso el día 12/01/2025 11:36:50 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

WILBERTO JOSE
MEDINA HERNANDEZ
CC - 1005576035

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	1102851781
Nombre:	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO		
Dirección:	KR 4 C 29 C 4		
Departamento:	SUCRE	**Municipio:**	SINCELEJO
Correo electrónico:	SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM		
Teléfono:	3216991697	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1102851781	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-011-197706	13/01/2025	CC 92601623	WILMER DE JESUS BARRETO PALENCIA	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: BvjMJChy9tykX/v7FmiRfg==

Certificado impreso el día 12/01/2025 11:40:46 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

WILMER DE JESUS
BARRETO PALENCIA
CC - 92601623

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

PLANILLAS CONTRATISTA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

JULIETH PAOLA MONTES TAMARA

CONTADORA PUBLICA

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA DEBIDAMENTE INSCRITA ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 43 de 1990 y el articulo 23 del aley 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento:

CERTIFICA QUE:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
***CON C.C* Nro. 1.102.851.781**

Ha dado cumplimiento oportuno y completo durante los últimos 3 meses, con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, Pensiones y riesgos laborales profesionales.

Se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de febrero del año 2025.

Atentamente,



JULIETH MONTES TAMARA
CONTADORA PUBLICA
TP Nro. 297993-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

297993-T



JULIETH PAOLA
MONTES TAMARA
C.C. 1010072767
RES. INSCRIPCION 2747 DEL 08/06/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

324922 344449

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.010.072.767

MONTES TAMARA

APELLIDOS

JULIETH PAOLA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-ABR-2000

SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

03-MAY-2018 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-2800100-01007842-F-1010072767-20180518 0061225835A 1 50696561

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8029460908814984

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIETH PAOLA MONTES TAMARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010072767 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 297993-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102837708		DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO	SINCELEJO-SUCRE	2821531	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1297381029	9482385016	I	2025/03/05	2025/02/28	BANCOLOMBIA	0	$527,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1102837708	DUPPERLEY MAGIER																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000	CCF41	30	$1,600,000	$32,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0	No	$527,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0		$527,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102837708		DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO	SINCELEJO-SUCRE	2821531	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1297381029	9482385016	I	2025/03/05	2025/02/28	BANCOLOMBIA	0	$527,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$0	$0	$39,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$0	$0	$32,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$32,000	$0	$0	$32,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**1**	**$527,000**	**$0**	**$0**	**$527,000**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102851781		LOPEZ CAMARGO RAMON ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 4 c 29 c 4	SINCELEJO-SUCRE	2800088	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1297380536	9482384593	I	2025/03/19	2025/02/28	BANCOLOMBIA	0	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1102851781	LOPEZ RAMON	230301	30	$1,600,000	$256,000	ESSC07	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$464,400	$0	$0	$464,400

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102850828		KEYLA MARIA SOLIS MARTINEZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 12 25 c 52	SINCELEJO-SUCRE	2800088	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1297381020	9482385005	I	2025/03/19	2025/02/28	BANCOLOMBIA	0	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1102850828	SOLIS KEYLA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,600,000**	**$256,000**			**$1,600,000**	**$200,000**			**$0**	**$0**			**$1,600,000**	**$8,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**1**	**$464,400**	**$0**	**$0**	**$464,400**

2025/02/28 09:05 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102851781		RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	KRA 4 C 29 C 4	SINCELEJO-SUCRE	2800000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1297365432	9482384733	E	2025/03/19	2025/02/28	BANCOLOMBIA	0	$736,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	92601623	BARRETO WILMER	25-14	25	$1,186,250	$190,000	CCFC33	25	$1,186,250	$47,500	CCF41	25	$1,186,250	$47,500	14-23	25	$1,186,250	$83,000	25	$0	$0
2	CC	92534484	CONTRERAS JOSE	231001	25	$1,186,250	$190,000	ESSC07	25	$1,186,250	$47,500	CCF41	25	$1,186,250	$47,500	14-23	25	$1,186,250	$83,000	25	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$2,372,500**	**$380,000**			**$2,372,500**	**$95,000**			**$2,372,500**	**$95,000**			**$2,372,500**	**$166,000**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$380,000	$0	$0	$380,000
COLFONDOS 231001		800,227,940	6	1	$190,000	$0	$0	$190,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$190,000	$0	$0	$190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$166,000	$0	$0	$166,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$166,000	$0	$0	$166,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$95,000	$0	$0	$95,000
COMFASUCRE CCF41		892,200,015	5	2	$95,000	$0	$0	$95,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$95,000	$0	$0	$95,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$47,500	$0	$0	$47,500
MUTUAL SER ESSC07		806,008,394	7	1	$47,500	$0	$0	$47,500
TOTAL				**2**	**$736,000**	**$0**	**$0**	**$736,000**

2025/02/28 07:48 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102837708		DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO	SINCELEJO-SUCRE	2821531	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1162198992	9479086697	I	2025/01/07	2024/12/30	BANCOLOMBIA	0	$527,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1102837708	DUPPERLEY MAGIER																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000	CCF41	30	$1,600,000	$32,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0	No	$527,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0		$527,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102837708		DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO	SINCELEJO-SUCRE	2821531	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1162198992	9479086697	I	2025/01/07	2024/12/30	BANCOLOMBIA	0	$527,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$0	$0	$39,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$0	$0	$32,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$32,000	$0	$0	$32,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**1**	**$527,000**	**$0**	**$0**	**$527,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102837708		DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO	SINCELEJO-SUCRE	2821531	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1246304107	9480524197	I	2025/02/05	2025/02/05	BANCOLOMBIA	0	$527,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1102837708	DUPPERLEY MAGIER																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000	CCF41	30	$1,600,000	$32,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0	No	$527,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0		$527,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102837708		DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO	SINCELEJO-SUCRE	2821531	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1246304107	9480524197	I	2025/02/05	2025/02/05	BANCOLOMBIA	0	$527,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$0	$0	$39,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$0	$0	$32,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$32,000	$0	$0	$32,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**1**	**$527,000**	**$0**	**$0**	**$527,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102851781		RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	KRA 4 C 29 C 4	SINCELEJO-SUCRE	2800000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1187694179	9480209929	E	2025/01/21	2025/01/13	BANCOLOMBIA	0	$190,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1005569998	BARRETO LUIS	230301	1	$43,334	$7,000	CCFC55	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
2	CC	92601623	BARRETO WILMER	25-14	1	$43,334	$7,000	CCFC33	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
3	CC	92534484	CONTRERAS JOSE	231001	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
4	CC	1104255311	CONTRERAS OSCAR	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
5	CC	1127617091	CORONADO ORLANDO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
6	CC	1192714633	DIAZ JUAN	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
7	CC	92542209	HERNANDEZ EDER	230301	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF41	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
8	CC	1005576035	MEDINA WILBERTO	230301	4	$173,334	$27,800	CCFC33	4	$173,334	$7,000	CCF41	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					**$606,672**	**$97,600**			**$606,672**	**$24,800**			**$606,672**	**$24,800**			**$606,672**	**$42,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$97,600	$0	$0	$97,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$7,000	$0	$0	$7,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$7,000	$0	$0	$7,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$83,600	$0	$0	$83,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$42,800	$0	$0	$42,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$42,800	$0	$0	$42,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$24,800	$0	$0	$24,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	$24,800	$0	$0	$24,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$24,800	$0	$0	$24,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$1,800	$0	$0	$1,800
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	$8,800	$0	$0	$8,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,800	$0	$0	$1,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$3,600	$0	$0	$3,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$1,800	$0	$0	$1,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$7,000	$0	$0	$7,000
TOTAL				**8**	**$190,000**	**$0**	**$0**	**$190,000**

2025/01/11 11:01 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102851781		RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	KRA 4 C 29 C 4	SINCELEJO-SUCRE	2800000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1259757431	9481595701	E	2025/02/19	2025/02/11	NEQUI	0	$1,082,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1005569998	BARRETO LUIS	230301	3	$142,350	$22,800	CCFC55	3	$142,350	$5,700	CCF41	3	$142,350	$5,700	14-23	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
2	CC	92601623	BARRETO WILMER	25-14	3	$142,350	$22,800	CCFC33	3	$142,350	$5,700	CCF41	3	$142,350	$5,700	14-23	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
3	CC	92534484	CONTRERAS JOSE	231001	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-23	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
4	CC	1104255311	CONTRERAS OSCAR	230301	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF41	5	$237,250	$9,500	14-23	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
5	CC	1127617091	CORONADO ORLANDO	230301	5	$237,250	$38,000	EPS010	5	$237,250	$9,500	CCF41	5	$237,250	$9,500	14-23	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
6	CC	1192714633	DIAZ JUAN	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF41	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
7	CC	92542209	HERNANDEZ EDER	230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF41	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
8	CC	1005576035	MEDINA WILBERTO	230301	6	$284,700	$45,600	CCFC33	6	$284,700	$11,400	CCF41	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
9	CC	92508367	PEREZ ANTONIO	230301	2	$94,900	$15,200	CCFC33	2	$94,900	$3,800	CCF41	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
10	CC	1004214897	ROSAS GUISELL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					**$3,511,300**	**$562,200**			**$3,511,300**	**$140,600**			**$3,367,217**	**$134,800**			**$3,511,300**	**$245,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$562,200	$0	$0	$562,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$68,400	$0	$0	$68,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$22,800	$0	$0	$22,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$471,000	$0	$0	$471,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$245,200	$0	$0	$245,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$245,200	$0	$0	$245,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$134,800	$0	$0	$134,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	10	$134,800	$0	$0	$134,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$140,600	$0	$0	$140,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$5,700	$0	$0	$5,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	3	$20,900	$0	$0	$20,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$9,500	$0	$0	$9,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$26,600	$0	$0	$26,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$9,500	$0	$0	$9,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$11,400	$0	$0	$11,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**10**	**$1,082,800**	**$0**	**$0**	**$1,082,800**

2025/02/11 03:12 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102851781		LOPEZ CAMARGO RAMON ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 4 c 29 c 4	SINCELEJO-SUCRE	2800088	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1187671764	9479631666	I	2025/01/21	2025/01/13	BANCOLOMBIA	0	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1102851781	LOPEZ RAMON	230301	30	$1,600,000	$256,000	ESSC07	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$464,400	$0	$0	$464,400

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102851781		LOPEZ CAMARGO RAMON ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 4 c 29 c 4	SINCELEJO-SUCRE	2800088	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1259659272	9481095320	I	2025/02/19	2025/02/11	BANCOLOMBIA	0	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1102851781	LOPEZ RAMON	230301	30	$1,600,000	$256,000	ESSC07	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,600,000**	**$256,000**			**$1,600,000**	**$200,000**			**$0**	**$0**			**$1,600,000**	**$8,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$464,400	$0	$0	$464,400

2025/02/11 02:48 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102850828		KEYLA MARIA SOLIS MARTINEZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 12 25 c 52	SINCELEJO-SUCRE	2800088	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1187672684	9479633641	I	2025/01/15	2025/01/10	BANCOLOMBIA	0	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1102850828	SOLIS KEYLA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,600,000**	**$256,000**			**$1,600,000**	**$200,000**			**$0**	**$0**			**$1,600,000**	**$8,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$464,400	$0	$0	$464,400

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102850828		KEYLA MARIA SOLIS MARTINEZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 12 25 c 52	SINCELEJO-SUCRE	2800088	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1259658941	9481096027	I	2025/02/19	2025/02/10	BANCOLOMBIA	0	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1102850828	SOLIS KEYLA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,600,000**	**$256,000**			**$1,600,000**	**$200,000**			**$0**	**$0**			**$1,600,000**	**$8,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**1**	**$464,400**	**$0**	**$0**	**$464,400**

PLANILLAS INTERVENTOR

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	24339586	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS	Calle 29 No. 29 - 31	3123701235	vijara8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	27/01/2025	83537881	$561.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	246.200	0		0		0	0	0	0	246.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	315.200	0	0	0	0	0	0		315.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	246.200	246.200
Pensión	1	315.200	315.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	561.400	561.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	24339586	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS		Calle 29 No. 29 - 31	3123701235	vijara8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	27/01/2025	83537881	$561.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	24339586	JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA	3	0			N																	25-14	1.969.600	315.200	0	0	0	0	EPS005	1.969.600	246.200		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	24339586	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS	Calle 29 No. 29 - 31	3123701235	vijara8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	03/01/2025	83081771	$770.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	337.800	0		0		0	0	0	0	337.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	432.400	0	0	0	0	0	0		432.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	337.800	337.800
Pensión	1	432.400	432.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	770.200	770.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	24339586	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS		Calle 29 No. 29 - 31	3123701235	vijara8@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	MEDELLÍN	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	03/01/2025	83081771	$770.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	24339586	JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA	3	0			N							X										25-14	2.702.000	432.400	0	0	0	0	EPS005	2.702.000	337.800		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	24339586	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS	Calle 29 No. 29 - 31	3123701235	vijara8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	24/02/2025	84400199	$561.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	246.200	0		0		0	0	0	0	246.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	315.200	0	0	0	0	0	0		315.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	246.200	246.200
Pensión	1	315.200	315.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	561.400	561.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	24339586	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS		Calle 29 No. 29 - 31	3123701235	vijara8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	24/02/2025	84400199	$561.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	24339586	JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA	3	0			N																	25-14	1.969.600	315.200	0	0	0	0	EPS005	1.969.600	246.200		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	32335697	Y	2025-01-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	91.700	1.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32335697	2025-01-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 24339586	JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA	1.300.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	90.500	N	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	32335697	Y	2025-01-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	91.700	1.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32335697	2025-01-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	90.500	0	1.200	0	91.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	90.500	0	1.200	0	91.700
Gran Total					90.500	0	1.200	0	91.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32340529	Y	2025-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	99.500	400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32340529	2025-02-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 24339586	JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA	1.423.500																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	99.100	N	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32340529	Y	2025-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	99.500	400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32340529	2025-02-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	400	0	99.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	99.100	0	400	0	99.500
Gran Total					99.100	0	400	0	99.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32586157	Y	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	99.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32586157	2025-03-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 24339586	JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA	1.423.500																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	99.100	N	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32586157	Y	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	99.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32586157	2025-03-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	0	0	99.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	99.100	0	0	0	99.100
Gran Total					99.100	0	0	0	99.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32013474	E	2024-12-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	698.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32013474	2025-01-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1005662343	ALEMAN MEDINA JOSE ANTONIO	1.300.000	F	X	X														0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	346.667	55.500	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	346.667	13.900	CCF DE SUCRE-CCF41	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	4429001
2	CC 1102818450	PEREZ CERVERA ANCIZAR	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1131201
3	CC 3837772	SIERRA ATANACIO VICENTE	1.300.000	F	X	X														0			4	4	4	4	COLPENSION ES-25-14	173.334	27.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	173.334	7.000	CCF DE SUCRE-CCF41	173.334	7.000	173.334	12.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	53.900	S	4429001
4	CC 1103098698	TOVAR QUIROZ MANUEL DAVID	1.300.000	F	X	X														0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	346.667	55.500	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	346.667	13.900	CCF DE SUCRE-CCF41	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	4429001
5	CC 79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	3	110.800	S	1711001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32013474	E	2024-12-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	698.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	32013474	2025-01-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.166.668	3.466.668	3.466.668	3.466.668	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	346.800	0	0	0	346.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	83.300	0	0	0	83.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	55.500	0	0	0	55.500
EPS(Administradoras: 4)				5	138.800	0	0	0	138.800
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	13.900	0	0	0	13.900
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	7.000	0	0	0	7.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	13.900	0	0	0	13.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras: 1)				5	74.100	0	0	0	74.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	74.100	0	0	0	74.100
CCF(Administradoras: 1)				5	138.800	0	0	0	138.800
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	5	138.800	0	0	0	138.800
Gran Total					698.500	0	0	0	698.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32336247	E	2025-01-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	219.300	3.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32336247	2025-01-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1103118425	HERAZO SEBA OSCAR LUIS	1.300.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	346.667	13.900	CCF DE SUCRE-CCF41	346.667	13.900	346.667	1.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	85.200	S	1711001
2	CC 1100622776	RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO	2.000.000	F	X															0			8	8	8	8	COLPENSIONES-25-14	533.334	85.400	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	533.334	21.400	CCF DE SUCRE-CCF41	533.334	21.400	533.334	2.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	131.000	S	4429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32336247	E	2025-01-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	219.300	3.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32336247	2025-01-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
880.001	880.001	880.001	880.001	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	140.900	0	2.000	0	142.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	55.500	0	800	0	56.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	85.400	0	1.200	0	86.600
EPS(Administradoras: 2)				2	35.300	0	500	0	35.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	13.900	0	200	0	14.100
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	21.400	0	300	0	21.700
ARP(Administradoras: 1)				2	4.700	0	100	0	4.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	4.700	0	100	0	4.800
CCF(Administradoras: 1)				2	35.300	0	500	0	35.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	2	35.300	0	500	0	35.800
Gran Total					216.200	0	3.100	0	219.300

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32512576	E	2025-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.471.000	6.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	32512576	2025-02-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1103118425	HERAZO SEBA OSCAR LUIS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001
2	CC 1102818450	PEREZ CERVERA ANCIZAR	1.423.500	F		X														0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	47.450	7.600	0	0	SANITAS-EPS005	47.450	1.900	CCF DE SUCRE-CCF41	47.450	1.900	47.450	300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	11.700	S	1131201
3	CC 1100622776	RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	2.000.000	80.000	CCF DE SUCRE-CCF41	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	4429001
4	CC 79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	100.000	CCF DE SUCRE-CCF41	2.500.000	100.000	2.500.000	13.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	613.100	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32512576	E	2025-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.471.000	6.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	32512576	2025-02-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.970.950	5.970.950	5.970.950	5.970.950	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	955.400	0	4.000	0	959.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	7.600	0	100	0	7.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	720.000	0	2.900	0	722.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	1.000	0	228.800
EPS(Administradoras: 3)				4	238.900	0	1.200	0	240.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	80.000	0	400	0	80.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	101.900	0	500	0	102.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	300	0	57.300
ARP(Administradoras: 1)				4	31.400	0	200	0	31.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	31.400	0	200	0	31.600
CCF(Administradoras: 1)				4	238.900	0	1.000	0	239.900
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	4	238.900	0	1.000	0	239.900
Gran Total					1.464.600	0	6.400	0	1.471.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32586128	E	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.269.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32586128	2025-03-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1103118425	HERAZO SEBA OSCAR LUIS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001
2	CC 1100622776	RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO	2.000.000	F		X														0			25	25	25	25	COLPENSIONES-25-14	1.666.667	266.700	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.666.667	66.700	CCF DE SUCRE-CCF41	1.666.667	66.700	1.666.667	8.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	408.800	S	4429001
3	CC 79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON	2.500.000	F		X														0			25	25	25	25	COLPENSIONES-25-14	2.083.334	333.400	0	0	SANITAS-EPS005	2.083.334	83.400	CCF DE SUCRE-CCF41	2.083.334	83.400	2.083.334	10.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	511.100	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901752114	6	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-702	CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO		3043572148			INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32586128	E	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.269.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	32586128	2025-03-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.173.501	5.173.501	5.173.501	5.173.501	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	827.900	0	0	0	827.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	600.100	0	0	0	600.100
EPS(Administradoras: 3)				3	207.100	0	0	0	207.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	83.400	0	0	0	83.400
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	66.700	0	0	0	66.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				3	27.100	0	0	0	27.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	27.100	0	0	0	27.100
CCF(Administradoras: 1)				3	207.100	0	0	0	207.100
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	3	207.100	0	0	0	207.100
Gran Total					1.269.200	0	0	0	1.269.200

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

CAPACITACIONES Y ENTREGA DE EPP

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Luis Angel Barrero Sepa			CEDULA	1005569998
CARGO	Electricista			CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	Ramon lopez	PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02/01/25	X		
Gafas	1	02/01/25	X		
Tapabocas	1	02/01/25	X		
Guantes.	1	02/01/25	X		
Guantes	1	16-01/24	X		
Tapabocas	1	16-01/24	X		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Kayla Solís M.	CEDULA No.	1102870828
CARGO	SST	FIRMA	Kayla Solís M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1005569998

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jose Rico Arrieta	CEDULA	1102840789
CARGO	Ayudante Mampostería	CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA: Ramon Lopez	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02/01/25	X		.
Guantes	1	02/01/25	X		.
Gafas	1	02/01/25	X		.
Tapabocas.	1	02/01/25	X		. Jose Carlos Rico

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Solís M.	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST.	FIRMA	Keyla Solís M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Jose Carlos Rico Arrieta

CEDULA No: 1102 840 789

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Wilmer Barreto			CEDULA	92601623
CARGO	Electricista			CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	Ramon Lopez	PLANTA		Sincelejo

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02/01/25	X		
Gafas	1	02/01/25	X		
Tapabocas	1	02/01/25	X		
Guantes	1	02/01/25	X		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Solis M.	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST.	FIRMA	Keyla Solis

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

x Wilmer Barreto

CEDULA No: x 92601623

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jose contreras			CEDULA	92534484
CARGO	Oficial Acabados.			CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	Ramon Lopez	PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02-01-25	X		.
Guantes	1	02-01-25	X		.
Gafas	1	02-01-25	X		Jose contreras V
Tapabocas	1	02-01-25	X		
Guantes poliestaleno	1	16-01/25		X	.
Tapabocas	1	16-01/25		X	. Jose contreras V

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Solis Martinez	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST	FIRMA	Keyla Solis

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Jose A Contreras V.

CEDULA No: 92534484.

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION	REGISTRO VERSION 1 02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Orlando Coronado			CEDULA	1127617091
CARGO	Ayudante Acabados.			CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	Ramón Lopez	PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02-01/25	X		.
Guantes	1	02-01/25	X		.
Gafas	1	02-01/25	X		Orlando Coronado
Tapabocas.	1	02-01-25	X		
Tapabocas	1	16-01/25	X	X	.
Guantes Polivalente	1	16-01/25		X	.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Solis M.	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST.	FIRMA	Keyla Solis M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Orlando Coronado

CEDULA No: 1127617091

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION	REGISTRO VERSION 1 02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Wilberto Medina Hernandez			CEDULA	1005576035
CARGO	Ayudante mamposteria			CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	Ramon Lopez	PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02/01/25	X		.
Guantes	1	02/01/25	X		.
TapaBocas	1	02/01/25	x		.
Gafas	1	02/01/25	x		WILBERTO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Solis Martinez	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST.	FIRMA	Keyla SolisM.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Wilberto

CEDULA No: 1005576035

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Eder Hernandez Dimas	CEDULA	92542209
CARGO	Oficial mamposteria	CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA Ramon Lopez	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02/01/25	X		
Guantes	1	02/01/25	X		
Tapabocas	1	02/01/25	X		
Gafas	1	02/01/25	X		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Kaylo Solis M.	CEDULA No.	1102800828
CARGO	SST	FIRMA	Kaylo Solis

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

x Eder

CEDULA No: 92 542 209

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Oscar contreras	CEDULA	1104255311
CARGO	Maestro de obra.	CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA Ramon lopez	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02/01/25	X		
Gafas	1	02/01/25	X		
Guantes	1	02/01/25	X		
tapabocas	1	02/01/25	X		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Sáis M.	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST.	FIRMA	Keyla Sáis M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1104255311

Scanned with CamScanner

INFORMES AMBIENTALES

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

INFORME AMBIENTAL PARA CONTRATO DE OBRA Nro. MC 23 DE 2024

OBJETO:

“ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO”

CONTRATANTE:

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
SINCELEJO - SUCRE

CONTRATISTA:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

SINCELEJO – SUCRE
FEBRERO DE 2025

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

1. INTRODUCCION

Con el crecimiento demográfico y en la misma proporción, se genera un aumento en la demanda del acceso de los servicios de la Rama Judicial, es así como se van presentando necesidades de nuevas sedes, ampliaciones, reparaciones o remodelaciones que deben estar a la vanguardia de las normas que ordenan la operación de la justicia, que exigen unas instalaciones determinadas que ofrezcan facilidades logísticas, tecnológicas y de seguridad en todos los procesos.

El presente documento establece los lineamientos ambientales de los sitios específicos de trabajo objeto de ejecución del proyecto “ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO, plasmando la gestión ambiental que realizara el contratista RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO dando cumplimiento y alcance a sus obligaciones contractuales y a las necesidades medio ambientales de cada sitio.

2. ALCANCE

El presente estudio tiene como resultado el Plan de Gestión Social y Ambiental a implementar durante la ejecución del proyecto de “ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO

El presente Plan de Manejo Ambiental recoge los aspectos y requisitos establecidos en el contrato No. MC 23 DE 2024 en el cual el equipo formulador del proceso de la entidad contratante estima la presencia de unos impactos iniciales, los cuales son complementados y evaluados mediante el análisis de las actividades contractuales realizado por el equipo ambiental del contratista, producto de una evaluación ambiental, orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo y contingencia.

La ejecución de las actividades contractuales de obra no requiere de licenciamiento ambiental ya que esta actividad no se enmarca dentro de las contempladas en el Decreto 2820 de 2010 por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993.

3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Formular un Plan de Gestión Social y Ambiental para la ejecución del contrato No. MC 23 DE 2024 cuyo objeto es “ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO”

3.2 ESPECIFICOS

- Identificar, definir y evaluar los impactos o afectaciones sobre los recursos naturales y el medio ambiente (físico, biótico y social), sobre la comunidad y los trabajadores participantes, que se puedan generar durante la ejecución de proyecto.
- Diseñar planes y programas específicos para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o efectos ambientales identificados en los componentes físico, biótico y social.
- Formular planes de monitoreo, contingencia y seguimiento ambiental que permitan la toma oportuna de decisiones y medidas encaminadas a evitar la generación de nuevos impactos ambientales no previstos inicialmente.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

De acuerdo a la Guía PGAS de la Rama judicial, se establecieron los posibles impactos ambientales a partir de la experiencia producida en la ejecución de obras civiles país para el funcionamiento de la Rama Judicial, la DEAJ – UIF, determinando los posibles impactos ambientales que pueden ocurrir de acuerdo a las actividades principales y los aspectos ambientales detectados, ordenándolos en los componentes abiótico, biótico y social.

Componente	Elemento ambiental	Impacto Ambiental (+/-)	Aplica al proyecto
Abiótico	Aguas superficiales y subterráneas	Contaminación del agua: Cambios en la calidad del agua, fisicoquímicos, microbiológicos e hidrobiológicos por contaminación con ductos químicos y sedimentos principalmente.	NO APLICA
		Alteración del cauce: Por cambios en su forma por su intervención, que puede ocasionar cambios hidrodinámicos en el cuerpo de agua.	NO APLICA
	Geomorfológico	Inicio de procesos erosivos: Por pérdida de cobertura vegetal o cambios de pendiente en el terreno, aumento de cargas que amplíen la posibilidad de deslizamientos.	NO APLICA
		Alteración de la morfología: Por cambios en la forma del terreno.	NO APLICA
	Atmosférico	Alteración de la calidad del aire: Por aporte de gases efecto invernadero y de material particulado.	NO APLICA
		Aumento de niveles de ruido: Cuando suben los niveles de emisión de ruido y ruido ambiental permitidos.	NO APLICA

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Componente	Elemento Ambiental	Impacto Ambiental (+/-)	APLICA AL PROYECTO
	Suelo	Pérdida o ganancia de suelo: Por el volumen que se excave o se rellene requerido por el proyecto. También por la extracción de materiales de consttuccion	NO APLICA
		Contaminación del suelo: por la adición de residuos sólidos, líquidos, sustancias peligrosas y otros que perjudican su contenido natural	NO APLICA
	Paisaje	Alteración de la unidad de paisaje: Por cambios en la visibilidad, calidad visual e intervención antrópica que afectan el valor escénico.	NO APLICA
Biótico	Fauna	Desplazamiento de fauna: Ocurre porque las especies faunísticas son forzadas a desplazarse de su nicho y hábitat natural.	NO APLICA
	Flora	Pérdida de la vegetación: Modificación de la vegetación natural del sitio intervenido o su pérdida total.	NO APLICA
	Social	Afectación de la infraestructura de predios: En los predios vecinos a la obra, privados o públicos.	NO APLICA
Socioeconómico y cultural	Social	Daños a la infraestructura de servicios públicos: Por daños en redes de acueducto, gas, energía y otras, cercanas a la obra.	NO APLICA

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

Socioeconomico y cultural	Social y económico	Alteración dinámica de las instituciones: Debido a la operación de la obra civil, se puede afectar la normal atención de usuarios de hospitales, colegios, de servicios de salud u otras, incluyendo las propias de la Rama Judicial y de carácter privado como el comercio local.	NO APLICA
	Social	Afectación movilidad peatonal y vehicular: Por la obstaculización temporal de las vías peatonales o vehiculares, en el área de influencia directa de las obras.	NO APLICA
	Social y económico	Generación de empleo: Aumento de la oferta de empleo local en el sitio a ejecutar la obra, también la llegada de foráneos al lugar.	NO APLICA
	Social, económico y cultural	Conflictos con la comunidad: Impactos propios de la obra pueden ocasionar dificultades con la comunidad, cuando es ineficiente la aplicación de las medidas de manejo ambiental, incumplimiento de acuerdos con vecinos y comunidad.	NO APLICA
	Social y economico	Aumento en la demanda de bienes y servicios: Por la necesidad creada a partir de la obra nueva, donde se requieren bienes y servicios para el personal que generalmente es foráneo.	NO APLICA

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

5. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS

Los proyectos de infraestructura de la Rama Judicial, generalmente por su tamaño y tipo de obra, no requieren de una licencia ambiental, como lo determina actualmente la legislación colombiana vigente Decreto 2041 de 2014, norma compilada en el Decreto 1076 de 2015; excepto en los casos que aplique. No obstante, siempre es pertinente realizar la respectiva consulta a la autoridad ambiental competente para que a través de oficio informe cuáles permisos, autorizaciones o concesiones deben adelantarse para la ejecución del proyecto.

A continuación, se presentan en el Programas y Planes del PGAS, que deberán ser incluidos y desarrollados por el Contratista, según corresponda a su proyecto y a la evaluación previamente hecha; lo que quiere decir que no todos los programas y proyectos deben desarrollarse en todos los proyectos, sino dependiendo de los que sean ciertamente necesarios.

En este programa se encuentran establecidos los proyectos que permiten determinar las herramientas para planificar, gestionar y desarrollar el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales que lleguen a producirse en el proyecto de obra civil.

5.1. PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES

El objetivo de un Plan de Contingencias Ambientales es de tener claro por parte del personal de obra, el cómo dar respuesta a cualquier tipo de contingencia que se presente en el desarrollo de las obras, de una manera rápida y precisa.

Para este contrato de acuerdo a los posibles impactos ambientales en que se puede incurrir es el derrame de agua que se pueda genera en el uso general de la obra.

CONTINGENCIA	ACTIVIDAD	PERSONAL	ACCION A TOMAR
Derrame de agua	Uso general de la obra	Residente de obra, maestros.	Cerrar registro y arreglar llave

5.2. PLANES DE GESTION

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	
OBJETIVOS	
Asegurar el cumplimiento de las medidas de manejo propuestas para minimizar, compensar, prevenir y/o corregir los impactos generados por la generación de residuos sólidos en los frentes de obra.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
• Personal de obra capacitado y sensibilizado en el adecuado manejo de residuos (>95%)	• Personal capacitado / Personal total en obra. (100%)
• Residuos dispuestos correctamente	• Residuos dispuestos correctamente (Kg) / Residuos generados en obra (100%)
ACTIVIDADES QUE LO PRODUCEN	**IMPACTOS A MANEJAR**
• Obras de concreto *in situ*. • Instalación de prefabricados. • Construcción de muros. • Funcionamiento de infraestructuras temporales	• √ Aumento en la generación de residuos • √ Evitar molestias en la población que transita por el área • √ Contaminación visual • √ Generación de olores ofensivos

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR			
PREVENCION	**CONTROL**	**MITIGACION**	**CORRECCION**
X	X		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1. **Clasificación y reducción en la fuente.**
   El Plan integrado de los residuos sólidos debe iniciarse a partir de la identificación y clasificación de los residuos en el sitio donde se producen, identificando sus características generales y las posibles alternativas de reducción de los mismos:

Tipo de Residuo	Características	Alternativas de Reducción
Chatarra y Llantas	Partes y piezas de equipos, residuos de varillas, tuberías, aceros y demás provenientes de las diferentes actividades constructivas. Se consideran residuos aprovechables	• Recuperación en el mercado de piezas recuperadas • Reincorporación al proceso constructivo.

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		
Empaques, Envases y embalajes	Metal, cartón, plástico y madera, las cuales se relacionan con insumos y compras del proyecto. Son aprovechables siempre y cuando no provengan de elementos o sustancias con características de peligrosidad	• Convenios con entidades y/o personal recuperador autorizado.
Papel blanco oficinas	Papelería que proviene de la gestión técnica y administrativa de la obra	• Utilizar las dos caras del papel • Rotación de documentos y uso de correo electrónico. • Reducir la impresión de documentos
Residuos Especiales o peligrosos	• Residuos d e productos químicos como aceites, pinturas, envases de combustibles, lubricantes, solventes, cemento y pinturas. • Residuos provenientes de enfermería o botiquines. • Materiales y/o elementos utilizados para contener o recoger derrame de combustibles. • Baterías secas utilizadas en quipos de comunicación o aparatos electrónicos. • Tonner de impresora • Filtros de aire, combustible o aceite, utilizados por vehículos, maquinaria y/o equipos.	Establecer convenios con proveedores para devolución de baterías, cartuchos, tonner, envase de combustibles, filtros y demás residuos con esta característica de peligrosidad.

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Residuos Domésticos	Se refiere a los desperdicios orgánicos provenientes de la operación de los campamentos que se encuentren dentro del área del proyecto, los cuales son considerados residuos aprovechables.	Una vez clasificado el material, se puede establecer convenio con las comunidades para la recolección y el reciclaje

PLAN DE GESTION INTERGRAL DE RESIDUOS

2. Almacenamiento temporal

- El almacenamiento de los residuos debe hacerse en tres (3) recipientes tipo caneca plásticas de 55 galones con tapa. Los recipientes estarán rotulados con el nombre de "BASURAS" para los ordinarios y "RECICLABLES" para el material reciclable. Las etiquetas de los recipientes deben contener información clara y entendible para todos, ser resistente al agua y estar impresas en gran formato.
- Se debe educar y capacitar a todo el personal que labora en la obra, sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en las canecas, según su etiqueta, y no apilar o dejar los residuos desprotegidos en otras áreas no autorizadas.
- Diariamente, al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde se realicen obras, recoger todos los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en el área.



3. Disposición Final

- Se identificará las personas o empresas que estén interesadas en recibir los materiales reciclables, resultantes de las actividades del proyecto para que estas se encarguen de su recolección periódica, transporte y transformación.

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

REGISTROS DE CUMPLIMIENTO
• Informes de gestion ambiental • Registro de inducción y capacitación. • Registro fotográfico
CUANTIFICACIÓN Y COSTOS
Los costos de las medidas planteadas forman parte del presupuesto de las obras de manejo ambiental.

PLAN DE GESTION DE RCD	
OBJETIVOS	
Asegurar el cumplimiento de las medidas de manejo propuestas para minimizar, compensar, reutilizar, prevenir y/o corregir los impactos generados por la producción de materiales en los frentes de obra.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
• Cumplir con el 100% de las medidas estipuladas para el manejo de escombros	• Número de medidas implementadas en el periodo / Número de medidas que debía ejecutar. (100%)
• Tener cero requerimientos por el manejo de los sobrantes de la obra.	• Número de requerimientos por manejo de los escombros / Número de requerimientos exigidos ambientales. (100%)
ACTIVIDADES QUE LO PRODUCEN	**IMPACTOS A MANEJAR**
• Transporte y colocación del material granular. • Obras de concreto *in situ*. • Instalación de prefabricados. • Construcción de muros en concreto. • Funcionamiento de infraestructuras temporales	• Generación de emisiones atmosféricas. • Generación de impacto al suelo. • Generación de ruido. • Molestias a peatones y usuarios de los sitios aledaños al desarrollo de obras. • Alteración del paisaje. • Alteración de tráfico.

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR			
PREVENCIÓN	CONTROL	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN
X	X		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
Las obras de infraestructura generan residuos sólidos provenientes del descapote, las excavaciones y demoliciones que pueden ser reutilizados en las obras, donde la mayoría de veces son utilizados como material de relleno, para reconformación de antiguas canteras o para nivelación de terrenos. Estos residuos deben ser manejados y controlados desde su fuente hasta la disposición final, dado los numerosos impactos que puede causar el manejo inadecuado de los mismos. A continuación, se describen las características de los residuos generados por las actividades constructivas con sus alternativas de reducción en la fuente:			

5.3 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Como los trabajos no se llevan a cabo por fuera de las instalaciones del Palacio de justicia, no se hace necesario presentar Plan de tráfico ya que no es necesario el cierre de vías.

Atentamente,

Ing. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO.
Contratista de Obras

CARSUCRE

El ambiente es de todos — Minambiente

EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

RESOLUCIÓN No. 0023
(02 FEB 2023)

"POR LA CUAL SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NO. 0748 DE AGOSTO 06 DE 2021 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA COPRORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE- CARSUCRE, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021, se autorizó al señor **DIONICIO GOMEZ PADILLA C.C 6.820.507** la **"DISPOSICIÓN DE MATERIAL TERREO PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO Y DE CANTERAS LEGALIZADAS"**, en el predio localizado en la finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – L a Gallera, georreferenciado en la coordenada (9°15´3.13"N – 75°24´21-92"O). En su **ARTÍCULO SEGUNDO** se estableció lo siguiente:

ARTICULO SEGUNDO: *Es viable autorizar al señor* ***DIONISIO GOMEZ PADILLA*** *identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.820.507 de Sincelejo, para que realice la "Disposición de material terreo proveniente de excavaciones y demoliciones de las obras que se realizan en el municipio de Sincelejo y de canteras legalizadas" en el predio localizado en la finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – L a Gallera, georreferenciado en la coordenada (9°15´3.13"N – 75°24´21-92"O), de su propiedad, siempre y cuando este material se componga únicamente de material terreo o balasto, el cual debe estar libre de escombros, residuos sólidos (plásticos, papel, materia orgánica, etc.) y residuos líquidos (grasas, aceites, etc.); toda vez que, se evidencio que dentro del predio no existen fuentes hídricas o espejos de agua que puedan ser afectados en dicho proceso ni individuos arbóreos que requieren ser talados.*

Que mediante Oficio con Radicado Interno No. 5891 de agosto 26 de 2022 el señor **DIONICIO GOMEZ PADILLA C.C 6.820.507**, en su calidad de titular de la autorización solicito lo siguiente:

- Que se permita la recepción de Residuos de Construcción y demolición, llámese materiales térreos y pétreos y/o de canteras legalizadas.

- Que se amplie la cobertura de recepción a cualquier proyecto que se realice en la región

- Que se amplie el área del proyecto a 30.000M2 según la información relacionada en los planos adjuntos.

Que mediante Auto No. 1014 de 02 de septiembre de 2022, se remitió el Expediente No. 148 de julio 02 de 2021 a la Subdirección de Gestión Ambiental, a fin de evaluar y conceptuar sobre el Oficio con Radicado Interno N° 5891 de agosto 26 de 2022, mediante el cual se solicitó la modificación de condiciones de la autorización otorgada mediante la Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021.

CARSUCRE

El ambiente es de todos — Minambiente

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0023
(02 FEB 2023)

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

Que la Subdirección de Gestión Ambiental rindió **INFORME DE VISITA NO. 0186 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que mediante **INFORME DE VISITA NO. 0186 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022,** realizado por funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE, se determinó lo siguiente que se cita a la literalidad:

52

CARSUCRE

530.4.1

INFORME DE VISITA No 0186

REFERENCIA:	Expediente Nº 148 del 02 de julio de 2021. Auto No 0917 de 22 de noviembre de 2022.
PETICIONARIO:	DIONISIO GOMEZ PADILLA, identificado con C.C. 6.820.507
LOCALIZACIÓN:	Finca la Estancia, Lote número 5, Variante Bremen – La Gallera
MUNICIPIO:	Sincelejo
ASUNTO:	Visita de Inspección Ocular y Técnica.
FECHA DE VISITA:	29 de septiembre de 2022
PARA:	Secretaria General

1. ANTECEDENTES:

- Expediente N. º 148 del 02 de julio de 2021.
- Resolución N°0748 del 06 de agosto de 2021.
- Auto No 1014 de 2 de septiembre de 2022

2. OBJETIVO DE LA VISITA:

2.1. Atención al ARTICULO PRIMERO del auto No 1014 de 2 de septiembre de 2022, donde se remite el Expediente Nº 148 del 02 de julio de 2021 a la Subdirección de Gestión Ambiental para que designe al profesional que corresponda de acuerdo al eje temático, para que practiquen visita de seguimiento y determine la viabilidad de la solicitud presentada con radicado interno No. 5891 de 26 de agosto de 2022, obrante en los folios 46 al 49. Se deberá precisar las coordenadas específicas del área del proyecto

3. DESARROLLO DE LA VISITA:

El día 29 de septiembre de 2022, la Ingeniera Civil María Monroy contratista adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental – CARSUCRE, procedió a realizar visita de inspección técnica al sitio donde se concedió la viabilidad ambiental de "Disposición de material terreo proveniente de excavaciones y demoliciones de las obras que se realizan en el municipio de Sincelejo y de Canteras Legalizadas", en el predio finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – La Gallera. Al llegar al sitio la visita fue atendida por Antonio Gómez de León con No de CC. 1. 102.851.083 de Sincelejo, en calidad de administrador del predio.

En toda el área de influencia donde se concedió la viabilidad ambiental del proyecto en mención, no se ha hecho ninguna intervención ni actividad, no se observan impactos ambientales asociados al proyecto, no se observa material dispuesto en sitio. Además, en el momento de la visita NO se estaba realizado ningún tipo de actividad tendiente a la intervención del área de influencia. Así mismo, no había presencia de personal, materiales, equipos y/o maquinaria que representen o estén al servicio del peticionario o algún tipo de intervención que altere el estado natural del área observada


Cra. 25 No 25 - 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605-2762037.
Línea verde 605 – 2762039, Dirección General: 605 - 2762045
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0027
(07 FEB 2023)

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

o que indique algún tipo de actividad antrópica referente a la intervención. En el punto georefenciado con coordenadas **E: 853925 - N: 1514922**, se evidencia un reservorio de agua natural en donde tributan cauces de escorrentía con crecimiento de vegetación en la lámina de agua, en el área adyacente a esta fuente hídrica y dentro el predio en mención se evidencian cultivos de pancoger. La vegetación general del área está compuesta por pastizales ya arbustos

Con el fin precisar las coordenadas específicas del área del proyecto este se encuentra georreferenciado como lo muestra la imagen No 1.

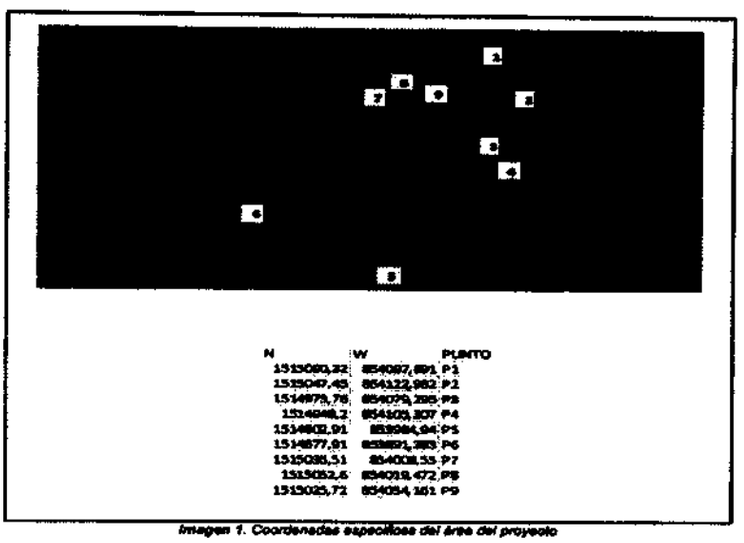

N	W	PUNTO
1515080,32	854087,891	P1
1515047,45	854122,982	P2
1514979,78	854079,285	P3
1514948,2	854103,207	P4
1514902,91	853984,94	P5
1514877,91	853891,385	P6
1515038,51	854008,55	P7
1515052,6	854019,472	P8
1515025,72	854054,161	P9

Imagen 1. Coordenadas específicas del área del proyecto

El peticionario solicita que se permita la recepción de residuos de construcción y demolición, es decir materiales térreos y pétreos y/o canteras legalizadas por lo cual se considera viable, siempre y cuando estos materiales conserven sus características inertes, y no vengan mezclados con otro tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos, utilizando técnicas adecuadas de ingeniería para la disposición controlada, confinación y aislamiento de estos materiales.

Con el fin de conservar las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y ecosistemitas del cuerpo de agua observado (reservorio) y evitar el lavado y arrastre de finos por efecto de escorrentía, se deben construir obras de drenaje adecuadas, tales como taludes y zonas de pendientes, cunetas perimetrales, las cuales deben ser propuestas por el peticionario antes de la intervención del área.

Además, se debe considerar dejar una franja forestal de protección de ancho variable paralela al cuerpo hídrico que cumpla con la función de amortiguamiento, y que

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0023
(02 FEB 2023)

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

SH

permita la toma de decisiones flexibles de manejo basado en principios ecológicos, condiciones específicas del sitio, intensidad del uso del suelo adyacente o la necesidad para mantener y proteger determinadas funciones identificadas por parte del peticionario. Se recomienda que la franja debe ser conformada por especies arbóreas, de pastizal o de macrófitas acuáticas y que estas especies presenten un amplio desarrollo de raíces, follaje denso y balanceado, sean nativas del área y tolerantes a las inundaciones y a la depositación de sedimentos. El ancho recomendado de la franja de amortiguamiento debe ser mayor a 10 m, siendo éste el mínimo necesario para que se desarrolle vegetación con una menor amenaza de invasión de malezas.

Además, se debe considerar construir las obras de ingeniería necesarias tales como enrocados de protección, gaviones para evitar procesos erosivos de inestabilidad del terreno, en caso de ser necesario.

También se solicita que se amplié la cobertura de recepción a cualquier proyecto que se realice en la región, es decir que la procedencia de estos residuos no se limite solo al municipio de Sincelejo, esta petición se considera viable ya que con esta actividad se permitirá minimizar el impacto ambiental generado por la inadecuada disposición de escombros no solo en la ciudad de Sincelejo, sino en toda la región, generando con ello manejo adecuado a dichos residuos y disposición final controlada de los mismos, por lo cual las condiciones técnicas, ambientales y las medidas de manejo deberán ser aprobadas previamente al inicio del proyecto, obra o actividad, por parte de la autoridad ambiental.

La tercera petición hace referencia a que se amplié el área del proyecto a 30000 m², según la información relacionada en los planos adjuntos. Lo anterior es viable ya que se prevé aumentar el alcance y las actividades dentro del proyecto con permiso ambiental mediante la resolución No 0748 del 6 de agosto de 2021.

Se reitera al peticionario que al iniciar la intervención este debe cumplir con las obligaciones contempladas dentro de la resolución N°0748 de 06 de agosto de 2021 y las posteriores que surjan producto del cambio de actividad.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO:



Imagen 1. Vista del predio finca la Estancia, lote número 5, vereda Bremen – La Gallera



Imagen 2. Vista de la cobertura vegetal en el predio finca la Estancia, lote número 5, vereda Bremen – La Gallera

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0023
(02 FEB 2022)

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

55

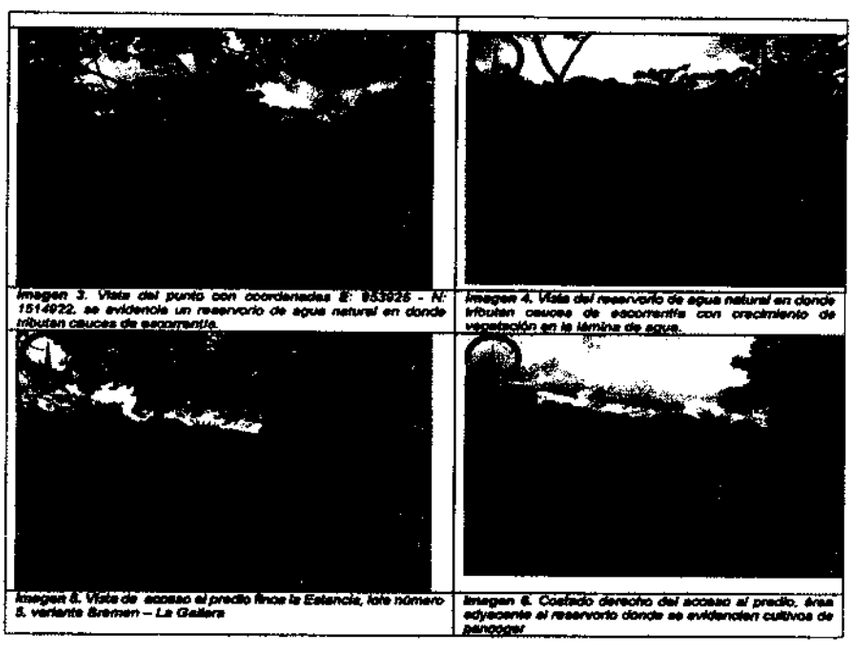


Imagen 3. Vista del punto con coordenadas E: 853026 - N: 1514922, se evidencia un reservorio de agua natural en donde tributan cauces de escorrentía.

Imagen 4. Vista del reservorio de agua natural en donde tributan cauces de escorrentía con crecimiento de vegetación en la lámina de agua.

Imagen 5. Vista de acceso al predio finca la Estancia, lote número 5. variante Bremen – La Gallera

Imagen 6. Costado derecho del acceso al predio, área adyacente al reservorio donde se evidencien cultivos de pancoger

5. CONCLUSIONES:

5.1. El señor Dionisio Gómez Padilla, identificado con **C.C. 6.820.507** de Sincelejo, no ha hecho ninguna intervención, no se observan impactos ambientales asociados al proyecto, no se observa ningún tipo de material dispuesto en sitio.

5.2. Se considera técnica y ambientalmente viable que se permita la recepción de residuos de construcción y demolición, es decir materiales térreos y pétreos y/o canteras legalizadas, siempre y cuando estos materiales conserven sus características inertes, y no vengan mezclados con otro tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos, utilizando técnicas adecuadas de ingeniería para la disposición controlada, confinación y aislamiento de estos materiales, con las determinaciones y condiciones que se establezcan, siempre y cuando se cumpla a cabalidad las medidas de manejo ambiental recomendadas.

5.3. Se debe conservar las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y ecosistemitas del cuerpo de agua observado (reservorio), realizando obras de drenaje adecuadas, las cuales deben ser propuestas por el peticionario antes de la intervención del área.

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0007
(02 FEB 2023)

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

5o

CARSUCRE

[redacted]

6.4. Se debe propender por conservar una franja forestal de protección de ancho variable paralela al cuerpo hídrico que cumpla con la función de amortiguamiento, la cual debe ser mayor a 10 m.

6.5. Se deben considerar construir las obras de ingeniería necesarias tales como enrocados de protección, gaviones para evitar procesos erosivos de inestabilidad del terreno, en caso de ser necesario

6.6. Se considera viable que se amplié la cobertura de recepción a cualquier proyecto que se realice en la región, ya que con esta actividad se permitirá minimizar el impacto ambiental generado por la inadecuada disposición de este tipo de material.

6.7. Con lo anterior se prevé aumentar el alcance y las actividades dentro del proyecto con permiso ambiental mediante la resolución No 0748 del 6 de agosto de 2021, por lo cual se considera viable que se amplié el área del proyecto a 30000 m2.

6. ANEXOS:

- Acta de visita de campo de fecha 29 de septiembre de 2022. Un (1) folio.

MARIA MONROY
Ing. Civil – Contratista
CARSUCRE

El suscrito subdirector de Gestión Ambiental Certifica que la contratista: Maria Monroy esta adscrita a esta subdirección.

Reviso:

JAIRO ENRIQUE OSORNO NAVARRO
Subdirector Gestión Ambiental
CARSUCRE

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Constitución Política de Colombia, en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre otras disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art 8°); la propiedad privada tiene una función ecológica (art 58); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art 95 numeral 8°). Así mismo establece en el Capítulo 3, denominado "DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE", en el articulo 79, que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, además, el articulo 80 ibidem dispone: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".

La Ley 99 de 1993 crea Las Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas por la Ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible..."

Que el artículo 30 de la precitada Ley establece que las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0027
(02 FEB 2023)
"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio.

Que el artículo 31, numeral 2) de la Ley 99 de 1993 le otorga a las Corporaciones Autónomas Regionales la competencia de ejercer las funciones de máxima autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que El Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 26 de mayo de 2015, articulo 2.2.23.3.2.1 establece que "este tipo de proyecto no requiere de Licencia Ambiental, lo anterior sin perjuicio de tramitar y obtener previamente ante la respectiva autoridad ambiental competente los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables".

Que al presente proyecto le es aplicable la normatividad vigente de Residuos de Construcción y Demolición – RCD.

CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta lo establecido en el **ARTICULO SEGUNDO** de la Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021, por el cual se viabilizo la autorización de "**DISPOSICIÓN DE MATERIAL TERREO PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO Y DE CANTERAS LEGALIZADAS**" en el predio localizado en la finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – L a Gallera, georreferenciado en la coordenada (9°15´3.13"N – 75°24´21-92"O) a favor del señor **DIONICIO GOMEZ PADILLA C.C 6.820.507** y teniendo en consideración el **INFORME DE VISITA NO. 0186 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022** producto de las conclusiones de la visita de campo realizada el día 29 de septiembre de 2022 por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Sucre, se considera viable ampliar la cobertura de recepción a cualquier proyecto que se realice en la Jurisdicción de CARSUCRE y ampliar el área del desarrollo de las actividades a 30.000 M2, por lo que es procedente a **MODIFICAR** el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021 el cual quedarán así:

ARTICULO SEGUNDO: *Es viable autorizar al señor* ***DIONISIO GOMEZ PADILLA*** *identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.820.507 de Sincelejo, para que realice la "Disposición de material terreo proveniente de excavaciones y demoliciones de las obras que se realizan en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Sucre y de canteras legalizadas" en un área de 30.000M2 en el predio localizado en la finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – L a Gallera, georreferenciado en la coordenada (9°15´3.13"N – 75°24´21-92"O), de su propiedad, siempre y cuando este material se componga únicamente de material terreo o balasto, el cual debe estar libre de escombros, residuos sólidos (plásticos, papel, materia orgánica, etc.) y residuos líquidos (grasas,*


310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0 0 2 7

(0 2 FEB 2023)

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

aceites, etc.); toda vez que, se evidencio que dentro del predio no existen fuentes hídricas o espejos de agua que puedan ser afectados en dicho proceso ni individuos arbóreos que requieren ser talados, a continuación se precisan las coordenadas especificas del área del proyecto:

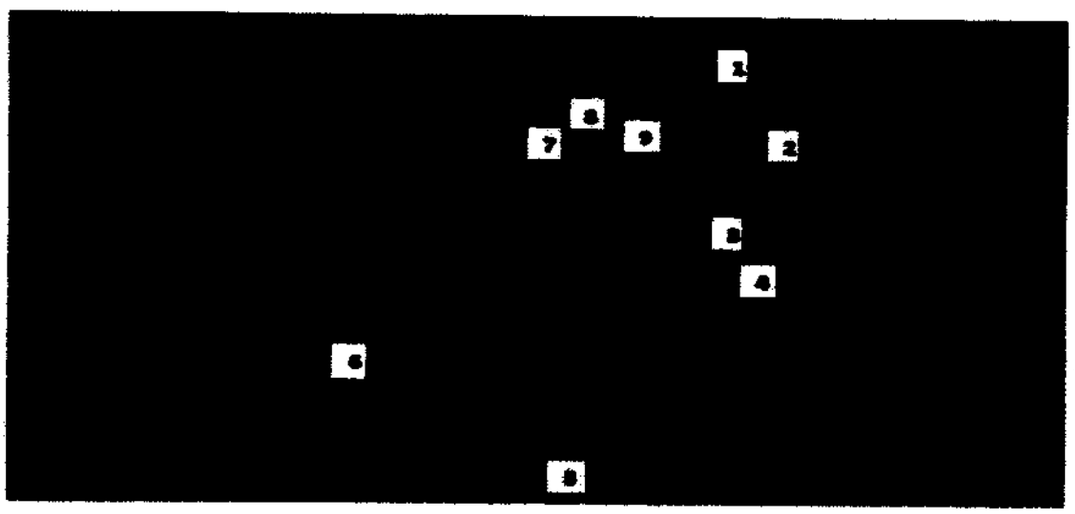

N	W	PUNTO
1515090,32	854087,891	P1
1515047,45	854122,932	P2
1514973,76	854079,295	P3
1514948,2	854106,307	P4
1514802,91	853984,94	P5
1514877,91	853891,383	P6
1515035,51	854008,55	P7
1515052,6	854019,472	P8
1515025,72	854054,161	P9

Asimismo, con base al **INFORME DE VISITA NO. 0186 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, producto de las conclusiones de la visita de campo realizada el día 29 de septiembre de 2022, rendido por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE, se estima procedente lo siguiente:

I. **ESTABLECER LOS SIGUIENTES PARAMETROS:** que se permite la recepción de residuos de construcción y demolición, es decir materiales térreos y pétreos y/o canteras legalizadas, siempre y cuando estos materiales conserven sus características inertes, y no vengan mezclados con otro tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos, utilizando técnicas adecuadas de ingeniería para la disposición controlada, confinación y aislamiento de estos

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0023
(02 FEB 2023)

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

materiales, con las determinaciones y condiciones que se establezcan, siempre y cuando se cumpla a cabalidad las medidas de manejo ambiental recomendadas.

- Se debe conservar las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y ecosistemitas, del cuerpo de agua observado (reservorio), realizando obras de drenaje adecuadas, las cuales deben ser propuestas por el peticionario ante de la intervención del área.

- Se debe propender por conservar una franja forestal de protección de ancho variable paralela al cuerpo hídrico que cumpla con la función de amortiguamiento, la cual debe ser mayor a 10.

- De deben considerar construir las obras de ingeniería necesarias tales como enrocados de protección, gaviones para evitar procesos erosivos de inestabilidad del terreno, em caso de ser necesario.

También, que mediante Oficio con Radicado Interno No. 8664 de diciembre 06 de 2022, el señor **DIONICIO GOMEZ PADILLA C.C 6.820.507**, solicito cesión total de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** a la **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868**. Para lo cual anexa la siguiente documentación:

- Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación legal.

- El documento de cesión total de los cedentes y el cesionario, en la cual se identifican los interesados y el Proyecto, obra o actividad;

- Copia de la Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021

- Registro Único Tributario de la CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4

Que el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 26 de mayo de 2015, indica lo siguiente:

Artículo 2.2.2.3.8.4. Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que en ella se derivan.

Que es del caso indicar que se acreditó ante esta Corporación, el interés jurídico de la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada

CARSUCRE

El ambiente es de todos — Minambiente

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. # 0023
(02 FEB 2023)

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868**, para ceder los derechos y obligaciones derivados de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** otorgada mediante Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021

Que en consecuencia de lo anterior, a partir de la fecha de ejecutoria de la presente resolución, se tendrá como beneficiario de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** otorgada mediante Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021 expedida por la Corporación Autónoma Regional de Sucre, a la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868**, quien asume como cesionario de todos los derechos y obligaciones derivados de los mismos y demás actos que de estos se deriven.

Que le es aplicable al cesionario la Resolución No. 0337 de 25 de abril de 2016 "POR MEDIO LA CUAL SE ADOPTAN LOS PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE TARIFAS POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS, CONCESIONES, AUTORIZACIONES Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL DE COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE – CARSUCRE".

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a favor de la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, la cesión total de los derechos y obligaciones originadas y derivadas de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** otorgada mediante Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021 expedida por CARSUCRE, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria de la presente resolución, tener como beneficiario de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** otorgada mediante Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021 expedida por CARSUCRE, a la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, quien asume como cesionario de todos los derechos y obligaciones derivados de los mismos y demás actos que de estos se deriven.

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente acto administrativo, la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, asume como cesionario todos los derechos y obligaciones contenidos en **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** otorgada

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0007


(02 FEB 2022)

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

mediante Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021, y en los demás actos administrativos que deriven de ellos.

ARTÍCULO CUARTO: MODIFICAR el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021 el cual quedarán así:

ARTICULO SEGUNDO: Es viable autorizar a la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, para que realice la "**DISPOSICIÓN DE MATERIAL TERREO PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE Y DE CANTERAS LEGALIZADAS**" en un área de 30.000M2 en el predio localizado en la finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – L a Gallera, georreferenciado en la coordenada (9°15´3.13"N – 75°24´21-92"O), siempre y cuando este material se componga únicamente de material terreo o balasto, el cual debe estar libre de escombros, residuos sólidos (plásticos, papel, materia orgánica, etc.) y residuos líquidos (grasas, aceites, etc.); toda vez que, se evidencio que dentro del predio no existen fuentes hídricas o espejos de agua que puedan ser afectados en dicho proceso ni individuos arbóreos que requieren ser talados, a continuación se precisan las coordenadas especificas del área del proyecto:



N	W	PUNTO
1515080,32	854087,891	P1
1515047,45	854122,982	P2
1514973,76	854078,295	P3
1514948,2	854105,307	P4
1514900,91	853984,94	P5
1514877,91	853901,389	P6
1515036,51	854008,55	P7
1515052,6	854019,471	P8
1515025,72	854054,351	P9

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0023
(02 FEB 2023)

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

ARTÍCULO QUINTO: La empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, en su calidad de beneficiario de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** del proyecto cuyo objeto es: **"DISPOSICIÓN DE MATERIAL TERREO PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE Y DE CANTERAS LEGALIZADAS"**, en el predio localizado en la finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – L a Gallera, georreferenciado en la coordenada (9°15'3.13"N – 75°24'21-92"O), teniendo en cuenta el **INFORME DE VISITA NO. 0186 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, producto de las conclusiones de la visita de campo realizada el día 29 de septiembre de 2022, deberán cumplir los siguientes parámetros:

- Se permite la recepción de residuos de construcción y demolición, es decir materiales térreos y pétreos y/o canteras legalizadas, siempre y cuando estos materiales conserven sus características inertes, y no vengan mezclados con otro tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos, utilizando técnicas adecuadas de ingeniería para la disposición controlada, confinación y aislamiento de estos materiales, con las determinaciones y condiciones que se establezcan, siempre y cuando se cumpla a cabalidad las medidas de manejo ambiental recomendadas.

- Debe conservar las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y ecosistemitas, del cuerpo de agua observado (reservorio), realizando obras de drenaje adecuadas, las cuales deben ser propuestas por el peticionario ante de la intervención del área.

- Deberá propender por conservar una franja forestal de protección de ancho variable paralela al cuerpo hídrico que cumpla con la función de amortiguamiento, la cual debe ser mayor a 10.

- Deberá considerar construir las obras de ingeniería necesarias tales como enrocados de protección, gaviones para evitar procesos erosivos de inestabilidad del terreno, em caso de ser necesario.

ARTÍCULO SEXTO: La empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, en su calidad de beneficiario de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** del proyecto cuyo objeto es: **"DISPOSICIÓN DE MATERIAL TERREO PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE Y DE CANTERAS LEGALIZADAS"**, deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente que regula los Residuos de Construcción y Demolición (Resolución No. 472 de 2017 y No. 1257 de 2021)

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. # 0027
(02 FEB 2023)

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y toda la legislación que regula la naturaleza del proyecto y la protección del medio ambiente y/o el desarrollo sostenible.

ARTÍCULO SEPTIMO: La empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, deberá dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021 y a la presente providencia.

ARTÍCULO OCTAVO: Hace parte integral de la presente providencia el **INFORME DE VISITA NO. 0186 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022**.

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente o por aviso según sea el caso, el contenido del presente acto administrativo de conformidad a lo estipulado en el artículo 8 de la ley 2213 de 2022 y en concordancia con los Art. 67 y 68 de la ley 1437 de 2011 al señor **DIONICIO GOMEZ PADILLA C.C 6.820.507**, en la Calle 25C N° 52-128 en Sincelejo, Sucre, al correo electrónico: dionisiogp@yahoo.com y la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, al correo electrónico: acjingenieria@gmail.com.

ARTÍCULO DECIMO: Una vez ejecutoriada la presente resolución remítase copia a la Procuraduría Judicial II, Ambiental y Agraria de Sucre.

ARTÍCULO UNDECIMO: Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1.993, publíquese en el boletín Oficial y en la página web de la Corporación.

ARTÍCULO DUODECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el director general de CARSUCRE, que deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella o a la notificación por aviso de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 Nuevo Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOHNNY ALBERTO AVENDAÑO ESTRADA
Director General
CARSUCRE

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Cristian Gomez Salgado	Asesor Jurídico	
Revisó	Laura Benavides Gonzalez	Secretaria General	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**LISTA DE CHEQUEO** **TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS - SUSTANCIAS QUIMICAS**	**SIGCMA**

GENERALIDADES

Nombre de quien diligencia el formato: Keylol Solis Martinez **Cargo:** SST

Fecha: 25/01/25 **Empresa transportadora** _____ **Placa** BFA 283 **Nit:** 1102851053

TRANSPORTE

ITEM	ASPECTOS A VERIFICAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.	El vehículo cuenta con la señalización e identificación requerida para el producto transportado (número UN y rombo).	✓			
2.	El vehículo cuenta con toda la documentación requerida (SOAT, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, licencia de conducción, polizas).	✓			
3.	El vehículo cuenta con los equipos de prevención y seguridad (gato, cruceta, señales de carretera, botiquín, extintor, tacos, caja de herramientas, linterna, llanta de repuesto)	✓			
4.	El vehículo cuenta con kit ambienal para manejo de derrames de sustancias trasportadas.			✓	
5.	Se cuenta con un listado de teléfonos de emergencias dentro del vehículo y es conocido por el personal que realiza el transporte.	✓			
6.	El producto se encuentra debidamente etiquetado.	✓			
7.	El producto se encuentra envasado, empacado y/o embalado adecuadamente.	✓			
8.	El transportador cuenta con la tarjeta de emergencia de los productos transportados.			✓	
9.	El conductor conoce el plan de emergencias y contigencias en caso de derrame del producto.	✓			
10.	El personal que realiza el transporte del producto cuenta con las afiliaciones o pagos de seguridad social. (solicitar y dejar copia)	✓			
11.	El personal cuenta con los EPP requeridos para la manipulación del producto transportado	✓			
12.	El personal se encuentra capacitado y entrenado para la actividad que realizan	✓			

C = Cumple **NC** = No cumple **NA** = No aplica

OBSERVACIONES/ HALLAZGOS/ PLANES DE ACCIÓN

Observaciones adicionales:

Scanned with CamScanner

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**LISTA DE CHEQUEO** **TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS - SUSTANCIAS QUIMICAS**	**SIGCMA**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SE REQUIERE		DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA	DESCIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES
	AC	PA			

Edgar Vergara Perez
NOMBRE DEL CONDUCTOR

Edgar Vergara Perez
FIRMA

Keyla Solis Martinez
NOMBRE FUNCIONARIO

Keyla Solis M.
FIRMA

CÓDIGO F-EVSG-16	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ CENDOJ – SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 03	FECHA 15/12/2019	FECHA 02/02/2020	FECHA 18/02/2020

Scanned with CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)	RELACIÓN RESIDUOS GENERADOS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO	SIGCMA Coordinación Nacional

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Ramón Lopez Camargo	SEDE	Rama Judicial Sincelejo	Nº CONTRATO	MC-023-2024

FECHA DE GENERACIÓN	TIPO DE RESIDUO	DESCRIPCIÓN DE RESIDUO	CANTIDAD EN KG GENERADA	FECHA DE ENTREGA AL GESTOR EXTERNO	NOMBRE DEL GESTOR	Nº DE MANIFIESTO
25-Enero-2025	RCD	Demolición construcción	521	25/Enero/25		

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-EVSG-32	LÍDER DEL PROCESO	CENDOJ – SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	FECHA	FECHA	FECHA
01	14/07/2023	24/01/2024	25/01/2024

Scanned with CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE ENTREGA DE RESIDUOS

SIGCMA

Acta de Entrega de Residuos (Aprovechables, Peligrosos, RCD o Especiales)

SEDE: Rama Judicial Sincelejo

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR FINAL: 25-01|25

DILIGENCIADO POR: Keyla Solis Martinez

CARGO: SST

ITEM	NOMBRE DEL RESIDUO	CANTIDAD Und	CANTIDAD Presentación	CANTIDAD Kg	PELIGROSIDAD		ITEM	TIPO DE DISPOSICIÓN		ITEM
1	Residuo Construcción - Demolición	521	Sacos	521	Corrosivo	☐		RE: Reciclaje	☐	
2					Reactivo	☐		IN: Incineración	☐	
3					Explosivo	☐		CO: Cogeneración	☐	
4					Tóxico	☐		RSE: Relleno Seguridad	☐	
5					Inflamable	☐		ENC. Encapsulamiento	☐	
6					Biológico	☐		RU: Reuso	☒	
7					Ecotóxico	☐		CVN: Comercialización o Venta Directa	☐	
8					Radioactivo	☐		CP: Compostaje	☐	
9					Precaución	☐			☐	
10					Ninguna	☒	RCD		☐	RCD

OBSERVACIONES

RESPONSABLE CSJ: Firma: Keyla Solis Martinez

GESTOR DE RESIDUOS (Nombre, firma y teléfono de contacto del gestor)

Nombre empresa gestora:

Nombre empleado gestor: Edgar Vergara Perez — Firma: Edgar Vergara Perez

Teléfono contacto: — Placa del vehículo: BFA 283

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-EVSG-10	LÍDER DEL PROCESO	CENDOJ – SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	FECHA	FECHA	FECHA
03	05/04/2018	15/06/2021	24/06/2021

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

BITACORA PESAJE DE RESIDUOS

SIGCMA

Día del mes	Cantidad de Residuos generados en kilogramos (Kg)																
Tipo de Residuo	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
RCD										521							0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	20
																	0
																	0
																	0
																	0
Orgánicos																	0
No Aprovechables																	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0	521	0	0	0	0	0	0	521

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-EVSG-11	LIDER DEL PROCESO	CENDOJ - SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 16/12/2019	FECHA: 15/06/2021	FECHA: 24/06/2021

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	BITACORA PESAJE DE RESIDUOS	SIGCMA

Sede: Rama Judicial | Seccional: Sincelejo - Sucre | Mes: Enero 2025

Dia del mes	Cantidad de Residuos generados en kilogramos (Kg)															
Tipo de Residuo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Total
																10
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
Orgánicos																0
No Aprovechables																0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CÓDIGO P-EVSG-11	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ CENDOJ – SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 03	FECHA 18/12/2018	FECHA 15/06/2021	FECHA 24/06/2021

Scanned with CamScanner

Nit: 901288481-4
(+57) 317 386 1956
(+57) 300 621 5602
acjingenieriasas@gmail.com

ACJ INGENIERIA SAS
NIT. 901288481-4
CERTIFICA:

Que el sr **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO C.C** 1102851781-6 durante el periodo comprendido entre el 20 de Diciembre de 2024 al 30 de Enero del 2025 realizo la disposición de 8,4mt^3 de terraplén crudo y escombros provenientes del contrato de obra **Nº MC 23 de 2024** cuyo objeto es "ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES "

Dicho material fue acopiado en el predio localizado en la finca LA ESTANCIA, lote número 5, VARIANTE BREMEN – LA GALLERA georreferenciado en la coordenada (9°15´3.13"N – 75°24´21-92"O).

PERIODO	AÑO	VOLUMEN
• ENERO	2024	**4,2 MT^3**
• DICIEMBRE	2025	**4,2 MT^3**
TOTAL		**8,4 MT^3**

Se expide esta certificación bajo la resolución Nº 0748 de Agosto de 2021 a los (19) días del mes de Febrero de 2025 Atentamente;

Andres Rocha

Andrés Felipe Rocha Berrio
C.C. 1100307868
Representante Legal
Teléfono: 3006215602 – 3173861956
acjingenieriasas@gmail.com

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

BITACORA DE OBRA

MC 23 DE 2024

"ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO"

FEBRERO DE 2025

SINCELEJO

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Viernes, 20 de diciembre de 2024

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se firma acta de inicio y se hace un recorrido para el reconocimiento del área de trabajo y se inicia de inmediato con el cerramiento y el desmonte de cielo raso existente del gimnasio.

Residente de obra

Sábado 21 de diciembre de 2024

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con el desmonte de estructura y lamina de cielo raso existente. Al mismo tiempo se hace un recorrido con el maestro para determinar las actividades a intervenir posteriormente.

Residente de obra

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Lunes 23 de diciembre de 2024

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se terminan las actividades de desmonte de estructura y laminas de cielo raso. A su vez se inician las actividades de desmonte de aparatos sanitarios.

Residente de obra

Martes 24 de diciembre de 2024

No se laboró en obra debido a las festividades de fin de año.

Residente de obra

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Miércoles 25 de diciembre de 2024

No se laboró en obra debido a las festividades de fin de año.

Residente de obra

Jueves 26 de diciembre de 2024

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se inicia con la actividad del desmonte de puertas metálicas y ventanas de vidrio. Asi mismo se inicia con el corte de los muros para la ampliación del área de ventanearía.

Residente de obra

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Viernes 27 de diciembre de 2024

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se inicia con la actividad de la demolición de plantillas y enchapes de piso y muro de los baños tanto de mujeres como de hombres. Es de resaltar que se decide demoler la plantilla debido a que la existente se encontraba en mal estado, se hallaron fugas hidráulicas y para evitar posibles humedades futuras, se decide reemplazar por completo dicha plantilla.

Residente de obra

Residente de interventoria

Sábado 28 de diciembre de 2024

No se laboro en la obra debido a las festividades de fin de año.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Martes 7 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Luego del gran receso por las festividades de fin de año, y teniendo en cuenta el puente festivo del día 06 de enero, se retoman actividades y se inicia la semana con la fundición de la plantilla de piso para los baños. Asi mismo se inicia con las actividades de cambio de tuberías, tanto hidráulicas como sanitarias, dado que las existentes estaban en mal estados.

Residente de obra

Residente de interventoria

Miércoles 8 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con las actividades de reubicación de puntos hidráulicos y sanitarios y tuberías de los mismos. Al mismo tiempo se culmina la actividad de plantilla de piso en concreto.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Jueves 9 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con las actividades de reubicación de puntos hidráulicos y sanitarios y tuberías de los mismos. Al mismo tiempo se culmina la actividad de plantilla de piso en concreto.

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes 10 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se inicia con la instalación de la estructura del cielo raso. Al mismo tiempo se hace el recorrido con la cuadrilla eléctrica para determinar las actividades a ejecutar.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Sábado 11 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso. Al mismo tiempo se inicial los trabajos de retiro de instalaciones eléctricas existentes.

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes 13 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso e instalaciónes eléctrica. Hoy se laboró hasta medio día debido a las fiestas enerinas del municipio de Sincelejo.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Martes 14 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso e instalaciones eléctrica. Se inicia con la colocación de las laminas de cielo raso. Al mismo tiempo se inicia con las actividades de enchape para piso de baños.

Residente de obra

Residente de interventoria

Miércoles 15 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso e instalaciones eléctrica. Se inicia con la colocación de las láminas de cielo raso. Al mismo tiempo se continua con la instalación de enchape para piso de baños.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Jueves 16 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso e instalaciones eléctrica. Se inicia con la colocación de las láminas de cielo raso. Al mismo tiempo se inicia con las actividades de enchape para piso de baños.

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes 17 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso e instalaciones eléctrica. Se inicia con la colocación de las láminas de cielo raso. Al mismo tiempo se continua con las actividades de enchape para piso de baños. Se inicia también con la colocación de las laminas de eterboard para los muros de los baños.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR


Sábado 18 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso e instalaciones eléctrica. Se inicia con la colocación de las láminas de cielo raso. Se culmina la actividad de piso para baños y se continua con la colocación de las laminas de eterboard y reforzamiento de la estructura de los muros de los baños.



Residente de obra



Residente de interventoria

Lunes 20 de enero de 2025

No se laboro en obra debido a las festividades en el municipio de Sincelejo.



Residente de obra



Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Martes 21 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se culminan las actividades de cielo raso e instalaciones eléctricas para las lámparas, se inicia con la colocación del enchape de pared en los baños.

Residente de obra

Residente de interventoria

Miércoles 22 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la colocación del enchape de pared en los baños y al mismo tiempo se trabaja en la instalación de los tomacorrientes dobles.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Jueves 23 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la colocación del enchape de pared en los baños y al mismo tiempo se trabaja en la instalación de los tomacorrientes dobles. Se realiza el trazado y replanteo para la instalación de los calados y la fundición de los machones.

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes 24 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la colocación del enchape de pared en los baños y al mismo tiempo se trabaja en la instalación de los tomacorrientes dobles. Se inicia con el anclaje del acero sobre la placa para la fundición de los machones, se funden algunos machones. En las horas de la tarde no se laboro por lluvias presentadas.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Sábado 25 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con los anclajes del acero para los machones, al mismo tiempo se funden los machones restantes. La cuadrilla eléctrica hace trabajo de regatas sobre muros para instalación de tuberías para los aires acondicionados.

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes 27 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se inicia con la instalación de los aires acondicionados y al mismo tiempo se inicia con la instalación de los calados.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Martes 28 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de los calados. Se inicia con la pintura externa del gimnasio.

Residente de obra

Residente de interventoria

Miércoles 29 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de los calados y con la pintura externa del gimnasio.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Jueves 30 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de los calados y con la pintura externa del gimnasio.

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes 31 de enero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se toman detalles de la instalación de los calados y se inicia estuco para muros de baños y pintura interna del gimnasio.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Sábado 1 de febrero de 2025

No se laboro en obra por condiciones climáticas adversas.

Estado de tiempo: Luvioso

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes 3 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se culminan las actividades de pintura y se hace la instalación del sonido interno del gimnasio. Se inicia con la instalación de piso de caucho.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Martes 4 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se hace la instalación de las barandas sobre los muros, se continua con la instalación del piso de caucho. Se toman también las medidas para la fabricación de las divisiones metálicas para los baños.

Residente de obra

Residente de interventoria

Miércoles 5 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se realiza la instalación de los espejos en el gimnasio, se instalan las duchas y los lavamanos institucionales con su respectiva grifería. Se culminan detalles de la instalación de pisos.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Jueves 6 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones metálicas.

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes 7 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones metálicas.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Sábado 8 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones metálicas. Se realiza aseo general a la obra.

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes 10 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica, jardinero.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones metálicas. Se realiza el suministro de las plantas con sus respectivas masetas.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Martes 11 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

Miércoles 12 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Jueves 13 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes 14 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Sábado 15 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes 17 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Martes 18 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

Miércoles 19 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Jueves 20 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes 21 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Sábado 22 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes 24 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se inicia la instalación de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Martes 25 de febrero de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se inicia la instalación de las divisiones y puertas en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

BITACORA DE OBRA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

CAPACITACIONES SST Y REGISTROS DE ENTREGAS DE EPP

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

CONTRATISTA RAMON LOPEZ CAMARGO	REGISTRO
SGSST REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION, INDUCCION Y/O REUNIONES	Versión: 01 02/01/2025

FECHA: 02/01/25

LUGAR: Rama Judicial zona Gimnasio

INDUCCION [X] CAPACITACION [ ] REUNION [ ] REINDUCCION [ ]

TEMA: Inducción en SGSST. Gestion de Peligros y Riesgos, Que es Accidente de trabajo y que Hacer ante una eventualidad

TIPO DE VINCULACION : PLANTA [ ] CONTRATISTA [X] NOMBRE: Keyla Solis M.

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL SGSST, EL TEMA ESPECIFICO Y POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Jaime Bueno P	Tecnico electricista	
Luis Angel Bancho	Tecnico Electricista	
Juan Sebastian Olaya Ortiz	Estudiante	
Juan Pantera Villalva	Estudiante	
Jose Rico	Ayudante	Jose Rico
Eduardo Cornejo	Ayudante	
Ceder H.D.	Ayudante	Ceder H.D.
Oscar Contreras	Maestro	Oscar Contreras

RESPONSABLE: Keyla Solis M. SST

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA RAMON LOPEZ CAMARGO	REGISTRO
SGSST REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION, INDUCCION Y/O REUNIONES	Versión: 01 02/01/2025

FECHA: 16/01/25

LUGAR: Rama Judicial Sincelejo

INDUCCION [ ] CAPACITACION [X] REUNION [ ] REINDUCCION [ ]

TEMA: Uso Adecuado de EPP
Mantenimiento y Reposición del mismo

TIPO DE VINCULACION : PLANTA [ ] CONTRATISTA [X] NOMBRE: Keyla Stis M.

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL SGSST, EL TEMA ESPECIFICO Y POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Wilmer Barreto Palomino OSCAR	Electricista	OSCAR
Jose Cantillo Villalba	Estucador	
Juan Sebastian Diaz Ceder H/D	estucador Mamposter	Juan Sebastian Ceder H/D

RESPONSABLE: Keyla Stis M.

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Luis Angel Barrios Sapa	CEDULA	1005569998
CARGO	Electricista	CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA Ramon Lopez	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02/01/25	X		
Gafas	1	02/01/25	X		
Tapabocas	1	02/01/25	X		
Guantes.	1	02/01/25	X		
Guantes	1	16-01/24		X	
Tapabocas	1	16-01/24		X	
Tapabocas	1	24-01/24		X	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Kayla Solis M.	CEDULA No.	1102870828
CARGO	SST	FIRMA	Kayla Solis M

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1005569998

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Wilmer Ramos			CEDULA	92601623
CARGO	Electricista			CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	Ramon Lopez	PLANTA		Sincelejo

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02/01/25	X		
Gafas	1	02/01/25	X		
Tapabocas	1	02/01/25	X		
Guantes	1	02/01/25	X		
Tapabocas	1	24/01/25		X	
Guantes Polivalente	1	24/01/25		X	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Solis M.	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST.	FIRMA	Keyla Solis

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

x

CEDULA No: x 92601623

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Frey Villegas Mercado			CEDULA	92533055
CARGO	Ayudante de Acabados.			CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	Ramon Lopez	PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	16-01/25	X		.
Guantes poliuretano	1	16-01/25	X		.
Tapabocas	1	16-01/25	X		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Solis Martinez	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST	FIRMA	Keyla SolisM

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

.

CEDULA No: . 92533055

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jose Contreras	CEDULA	92534484
CARGO	Oficial Acabados.	CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA: Ramon Lopez	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02-01-25	X		.
Guantes	1	02-01-25	X		.
Gafas	1	02-01-25	X		
Tapabocas	1	02-01-25	X		
Guantes poliestaleno	1	16-01/25		X	.
Tapabocas	1	16-01/25		X	.
Tapabocas	1	24/01/25		X	.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Solis Martinez	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST	FIRMA	Keyla Solis

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 92534484.

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Oscar contreras			CEDULA	1104255311
CARGO	Maestro de obra.			CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	Ramon lopez	PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02/01/25	X		
Gafas	1	02/01/25	X		
Guantes	1	02/01/25	X		
Tapabocas	1	02/01/25	X		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Sch M.	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST.	FIRMA	Keyla Sch M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1104255311

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Eder Hanaudet Dimas	CEDULA	92542209
CARGO	Oficial Mampostería	CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA Ramon Lopez	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Cosco	1	02/01/25	X		
Guantes	1	02/01/25	X		
Tapabocas	1	02/01/25	X		
Gafas	1	02/01/25	X		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Kayla Solis M.	CEDULA No.	1102880828
CARGO	SST	FIRMA	Kayla Solis

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

x Eder H 17

CEDULA No: 92 542 209

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Orlando Coronado			CEDULA	1127617091
CARGO	Ayudante Acabados.			CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	Ramón Lopez	PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Gafas	1	02-01/25	X		.
Guantes	1	02-01/25	X		.
Gafas	1	02-01/25	X		Orlando Coronado
Tapabocas.	1	02-01-25	X		
Tapabocas	1	16-01/25	X	X	.
Guantes Poliuretano	1	16-01/25		X	.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Solís M.	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST.	FIRMA	Keyla Solís M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Orlando Coronado

CEDULA No: 1127617091

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION	REGISTRO VERSION 1 02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Wilberto Medinol-Hernandez			CEDULA	1005576035
CARGO	Ayudante mamposteria			CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	Ramon Lopez	PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02/01/25	X		.
Guantes	1	02/01/25	X		.
TapaBocas	1	02/01/25	X		.
Gafas	1	02/01/25	X		WILBERTO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Solis Martinez	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST.	FIRMA	KeylaSolisM

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1005576035

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION	REGISTRO VERSION 1 02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jose Rico Arrieta			CEDULA	1102840789
CARGO	Ayudante Mamposteria			CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	Ramon Lopez	PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	02/01/25	X		.
Guantes	1	02/01/25	X		.
Gafas	1	02/01/25	X		. Jose Carlos Rico
tapabocas.	1	02/01/25	X		.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Solis M.	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST.	FIRMA	Keyla Solis M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Jose Carlos Rico Arrieta

CEDULA No: 1102 840 789

Scanned with CamScanner

SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Juan Sebastian Diaz ospina	CEDULA	1192714633
CARGO	Ayudante Acolbados	CIUDAD	Sincelejo
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA Ramon Lopez	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Guantes poliuretano	1	16-01/25	X		.
Casco	1	16-01/25	X		. Juan Sebastian
tapabocas	1	16-01/25	X		.
Tapabocas	1	24-01/25		X	Juan sebastian.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Keyla Solis M.	CEDULA No.	1102850828
CARGO	SST	FIRMA	Keyla Solis M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Juan Sebastian Diaz

CEDULA No: 1192 714 633

Scanned with CamScanner

CERTIFICADOS
LUCES LED

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

Marzo 18 de 2024, Bogotá D.C.

SEÑORES
FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCES Co., LTD
Atn.: Andy Lin
Representante
L.C.

Ref.: Autorización uso de certificados del GRUPO VTEK S.A.S.

Respetado señor,

Nosotros, GRUPO VTEK S.A.S., con NIT: 901.293.797-6 y con código de acreditación 19-CPR-004 de ONAC, se permite en confirmarle que hemos recibido solicitud de autorización de nuestro certificado de conformidad.

De igual manera, muestra compañía los autoriza a ceder las siguientes referencias del certificado de conformidad a la(s) compañía(s) que ustedes nos relacionan:

GRUPO VTEK S.A.S.	
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD	E5-RP-2726-2023
COMPAÑÍA AUTORIZADA PARA EL USO DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD.	GRUPO EMPRESARIAL MERCURY SAS. NIT: 900.490.594-9 Bogotá

Es responsabilidad del titular del certificado de conformidad el buen uso de este.

Saludos cordiales,

DIANA SHIRLEY OSTOS ROMERO
Firmado digitalmente por DIANA SHIRLEY OSTOS ROMERO
Fecha: 2024.03.18 16:34:32 -05'00'

Diana Shirley Ostos Romero
Representante Legal
GRUPO VTEK S.A.S
NIT: 901.293.797-6

ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

CERTIFICADO

DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Nº E5-RP-2726-2023

GRUPO VTEK S.A.S

NIT:901.293.797-6

DIRECCIÓN: Carrera 70ª#112-70, Bogotá

CERTIFICA QUE EL PRODUCTO:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
Panel LED	Ver hoja Nº2 – Listado de productos certificados

CUMPLE con todos los requerimientos de la resolución 180540 de 2010, marzo 30 de 2010 emitida por el Ministerio de Minas y Energía. ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP) y sus modificaciones con la Resolución 181568 del 1 de septiembre de 2010, Resolución 182544 del 29 de diciembre de 2010, Resolución 180173 del 14 de febrero de 2011, Resolución 91872 del 28 de diciembre de 2012, Resolución 90980 del 15 de noviembre de 2013. Resolución 40122 del 8 de febrero de 2016 numerales 300 y 320 y adicional con todas las actividades requeridas por el esquema de certificación estipulado.

TITULAR DEL CERTIFICADO

FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCES Co., LTD

DIRECCIÓN: NO.510, OFFICE BUILDING, NO.246 HUALIN ROAD, FUZHOU, FUJIAN, CHINA

TAX ID: 913501027937609000

FABRICADO POR

FUZHOU HUIFENG LIGHTING TECHNOLOGY

DIRECCIÓN: No. 88 Zhangfeng, Xindian, Jin'an Dsitrict, Fuzhou, Fujian, China

NIT: N/A

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN Nº5 ISO/IEC 17067

El informe de evaluación GV-FT-04 del proceso E5-RP-2726-2023. Detalla de manera específica todas las actividades llevadas a cabo para otorgar cumplimiento

Fecha de otorgamiento: 14/03/2024 Fecha de vencimiento: 13/03/2027

Fecha de última modificación: Nº N/A

Este certificado es válido por 3 años y está sujeto a las actividades de seguimiento a ser ejecutadas cada 12 meses.

Nota: La validez del presente certificado de conformidad dependerá de la ejecución y conformidad de las respectivas actividades de seguimiento. Puede verificar la validez de este certificado en https://sicerco.sic.gov.co/sicerco/.

DIANA SHIRLEY OSTOS ROMERO

Firmado digitalmente por DIANA SHIRLEY OSTOS ROMERO
Fecha: 2024.03.14 16:15:43 -05'00'

Firma representante legal

Nº 8585

ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

LISTADO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS – E5-RP-2726-2023			
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
1	WDL-S01-S377	PANEL LED. 24W-120W	N/A
2	W382LPG	PANEL LED.SQUARE 24-50W 85-265V	N/A
3	W38L2LPG	PANEL LED.SQUARE 24-50W	N/A
4	RW7230	PANEL LED.SQUARE 24-52W	N/A
5	W120LDG	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 1W-40W	N/A
6	W060LDG	PANEL LED. ROUND 1W-40W SURFACE TYPE	N/A
7	RW7225	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 1W-30W	N/A
8	RW7226	PANEL LED. ROUND 1W-36W	N/A
9	RW2011	PANEL LED. ROUND 1W-30W, RGB	N/A
10	W180LDG	PANEL LED.SQUARE 1W-40W	N/A
11	W150LDG	PANEL LED.SQUARE 1W-40W SURFACE TYPE	N/A
12	W090LDG	PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 1W - 30W	N/A
13	RW7228	PANEL LED CUADRADO 1W - 30W	N/A
14	RW7239	PANEL LED.SQUARE 1W-30W GLASS TYPE	N/A
15	PW2035	PANEL LED.SQUARE 1W-30W RGB	N/A
16	MER-01	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 1W-48W MER SERIES	N/A
17	MER-02	PANEL LED. SQUARE 1W-48W TYPE MER SERIES	N/A
18	MER-03	PANEL LED.ROUND 1W-48W MER SERIES	N/A
19	MER-04	PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 1W - 48W MER SERIES	N/A
20	SLINR	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 1W-48W SOLED SERIES	N/A
21	SLINC	PANEL LED. SQUARE 1W-48W TYPE SOLED SERIES	N/A
22	SLSPR	PANEL LED.ROUND 1W-48W SOLED SERIES	N/A
23	SLSPC	PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 1W - 48W SOLED SERIES	N/A
24	SLINR 3+3W	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 3+3W	N/A
25	SLINR 6+3W	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 6+3W	N/A
26	SLINR 12+4W	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 12+4W	N/A
27	SLINR 18+6W	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 18+6W	N/A
28	SLINC 3+3W	PANEL LED. SQUARE 3+3W TYPE	N/A
29	SLINC 6+3W	PANEL LED. SQUARE 6+3W TYPE	N/A
30	SLINC 12+4W	PANEL LED. SQUARE 12+4W TYPE	N/A
31	SLINC 18+6W	PANEL LED. SQUARE 18+6W TYPE	N/A
32	SLSPR 3+3W	PANEL LED.ROUND 3+3W SURFACE	N/A
33	SLSPR 6+3W	PANEL LED.ROUND 6+3W	N/A
34	SLSPR 12+4W	PANEL LED.ROUND 12+4W	N/A
35	SLSPR 18+6W	PANEL LED.ROUND 18+6W	N/A
36	SLSPC 3+3W	PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 3+3W	N/A
37	SLSPC 6+3W	PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 6+3W	N/A

Nº 8586

38	SLSPC 12+4W	PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 12+4W	N/A
39	SLSPC 18+6W	PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 18+6W	N/A
40	SKEM	PANEL LED INCRUSTAR 1W-60W	N/A
41	PLS	PANEL LED SOBREPONER 1W-60W	N/A
42	FU1716	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 3W	N/A
43	FU1717	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 6W	N/A
44	FU1718	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 9W	N/A
45	FU1719	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 12W	N/A
46	FU1720	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 18W	N/A
47	FU1721	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 24W	N/A
48	FU1728	PANEL LED. ROUND 6W SURFACE TYPE	N/A
49	FU1729	PANEL LED. ROUND 12W SURFACE TYPE	N/A
50	FU1730	PANEL LED. ROUND 18W SURFACE TYPE	N/A
51	FU1731	PANEL LED. ROUND 24W SURFACE TYPE	N/A
52	FU1722	PANEL LED.SQUARE 3W	N/A
53	FU1723	PANEL LED.SQUARE 6W	N/A
54	FU1724	PANEL LED.SQUARE 9W	N/A
55	FU1725	PANEL LED.SQUARE 12W	N/A
56	FU1726	PANEL LED.SQUARE 18W	N/A
57	FU1727	PANEL LED.SQUARE 24W	N/A
58	FU1732	PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 6W	N/A
59	FU1733	PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 12W	N/A
60	FU1734	PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 18W	N/A
61	FU1735	PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 24W	N/A

Fin de documento

Nº 8587

CANTIDADES

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

ACTA FINAL DE OBRA

FECHA 18/02/2025

ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO.

ÍTEM	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION Nro. 2					CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VAL. UNITARIO	VAL. PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANT FINAL	VALOR FINAL
	TORRE A -CUARTO PISO: ADECUACIÓN GIMNASIO												
1,00	**PRELIMINARES**				**$ 2.776.564,26**				**$ -**	**$ 2.776.564,26**	**$ 2.776.564,26**		**$ -**
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA PLASTICA VERDE H:2 M	m	42,00	$ 2.640,00	$ 110.880,00	0,00	42,00	42,00	$ -	$ 110.880,00	$ 110.880,00	0,00	$ -
1,02	DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTON	m2	146,36	$ 5.280,00	$ 772.761,79	0,00	146,36	146,36	$ -	$ 772.761,79	$ 772.761,79	0,00	$ -
1,03	DESMONTE Y ACARREO APARATOS SANIT.	und	7,00	$ 33.600,00	$ 235.200,00	0,00	7,00	7,00	$ -	$ 235.200,00	$ 235.200,00	0,00	$ -
1,04	DESMONTE Y ACARREO DE PUERTAS	und	9,00	$ 24.000,00	$ 216.000,00	0,00	9,00	9,00	$ -	$ 216.000,00	$ 216.000,00	0,00	$ -
1,05	DESMONTE DE VENTANAS INCLUYE VIDRIOS	und	10,00	$ 26.400,00	$ 264.000,00	0,00	10,00	10,00	$ -	$ 264.000,00	$ 264.000,00	0,00	$ -
1,06	DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO E=0.08 M	m2	17,55	$ 13.200,00	$ 231.617,76	0,00	17,55	17,55	$ -	$ 231.617,76	$ 231.617,76	0,00	$ -
1,07	DEMOLICION ENCHAPE	m2	71,84	$ 7.920,00	$ 568.947,46	0,00	71,84	71,84	$ -	$ 568.947,46	$ 568.947,46	0,00	$ -
1,08	TRAZADO Y REPLANTEO	m	63,00	$ 2.880,00	$ 181.440,00	0,00	63,00	63,00	$ -	$ 181.440,00	$ 181.440,00	0,00	$ -
1,09	DEMOLICION MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO	m	0,00	$ 34.800,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,10	RETIRO ESCOMBROS	m3	8,43	$ 18.800,00	$ 158.517,25	0,00	8,43	8,43	$ -	$ 158.517,25	$ 158.517,25	0,00	$ -
1,11	ESCARIFICACION PLANTILLA EXISTENTE	m2	0,00	$ 2.640,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,12	REGATAS SOBRE MUROS (INCLUYE RETIRO)	m	10,00	$ 3.720,00	$ 37.200,00	0,00	10,00	10,00	$ -	$ 37.200,00	$ 37.200,00	0,00	$ -
2,00	**PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA**				**$ 33.651.273,70**				**$ -**	**$ 33.651.273,70**	**$ 33.651.273,70**		**$ -**
2,01	PISO EN CAUCHO E=1.00 CM	m2	0,00	$ 298.375,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
2,02	PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.10 M. # 2 (CON REF.)	m2	23,03	$ 75.302,00	$ 1.733.964,09	0,00	23,03	23,03	$ -	$ 1.733.964,09	$ 1.733.964,09	0,00	$ -
2,03	DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO	m2	13,64	$ 1.185.875,00	$ 16.175.335,00	0,00	13,64	13,64	$ -	$ 16.175.335,00	$ 16.175.335,00	0,00	$ -
2,04	MESON CONCRETO 3.000 PSI 0.60x0.08 (INCLUYE REF N°3.)	m	0,00	$ 93.994,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
2,05	CIELO RASO PANEL YESO 12.7 MM	m2	146,36	$ 59.193,26	$ 8.663.312,15	0,00	146,36	146,36	$ -	$ 8.663.312,15	$ 8.663.312,15	0,00	$ -
2,06	PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) INTERIORES	m2	72,11	$ 12.286,00	$ 885.968,03	0,00	72,11	72,11	$ -	$ 885.968,03	$ 885.968,03	0,00	$ -
2,07	ENCHAPE CERAMICA 25x40	m2	62,55	$ 83.935,50	$ 5.250.400,54	0,00	62,55	62,55	$ -	$ 5.250.400,54	$ 5.250.400,54	0,00	$ -
2,08	PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) EXTERIORES	m2	73,81	$ 12.766,48	$ 942.293,89	0,00	73,81	73,81	$ -	$ 942.293,89	$ 942.293,89	0,00	$ -
3,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 1.107.765,00**				**$ -**	**$ 1.107.765,00**	**$ 1.107.765,00**		**$ -**
3,01	SALIDA E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMP. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	15,00	$ 73.851,00	$ 1.107.765,00	0,00	15,00	15,00	$ -	$ 1.107.765,00	$ 1.107.765,00	0,00	$ -
3,02	SALIDA E INSTALACION DE TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 15 AMP. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	0,00	$ 86.591,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	0,00	$ 71.941,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,04	SALIDA DE DATOS Y VOZ	und	0,00	$ 40.919,10	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,05	LAMPARAS LED INSTALACION Y SUMINISTRO	und	0,00	$ 104.034,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2"	m	0,00	$ 15.619,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
3,07	PUNTO ELECTRICO ILUMINACION	und	0,00	$ 98.794,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
4,00	**PUERTAS Y VENTANAS**				**$ -**				**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**
4,01	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8MM. INCLUYE INSTALACION	m2	0,00	$ 213.552,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
4,02	ESPEJO PARA BAÑO	m2	0,00	$ 190.583,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
4,03	ESPEJO CLARO 4 MM	m2	0,00	$ 110.437,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5,00	**EQUIPOS SANITARIOS**				**$ 1.467.979,00**				**$ -**	**$ 1.467.979,00**	**$ 1.467.979,00**		**$ -**
5,01	LAVAMANOS INSTITUCIONAL SOBREPONER	und	4,00	$ 189.105,00	$ 756.420,00	0,00	4,00	4,00	$ -	$ 756.420,00	$ 756.420,00	0,00	$ -
5,02	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVANDALICO	und	4,00	$ 149.105,00	$ 596.420,00	0,00	4,00	4,00	$ -	$ 596.420,00	$ 596.420,00	0,00	$ -
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED DE DUCHA	m2	0,00	$ 79.186,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA SALPICADERA LAVAMANOS	m2	0,00	$ 79.186,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5,05	DUCHA SENCILLA ANTIVANDALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	und	2,00	$ 57.569,50	$ 115.139,00	0,00	2,00	2,00	$ -	$ 115.139,00	$ 115.139,00	0,00	$ -
				TORRE A -CUARTO PISO: TERRAZA									
6,00	**PRELIMINARES**				**$ 108.838,08**				**$ -**	**$ 108.838,08**	**$ 108.838,08**		**$ -**
6,01	DESMONTE TELA ASFALTICA	m2	15,12	$ 7.200,00	$ 108.838,08	0,00	15,12	15,12	$ -	$ 108.838,08	$ 108.838,08	0,00	$ -
6,02	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO	und	0,00	$ 6.102,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
7,00	**PUSOS, MUROS Y ENCHAPES**				**$ -**				**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**
7,01	PISO EN GRAMA	m2	0,00	$ 42.917,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
7,02	LEVANTE CALADOS 50X50	m2	0,00	$ 68.217,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
7,03	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 8MM. INCLUYE INSTALACION	m2	0,00	$ 218.200,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
8,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ -**				**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**
8,01	LUMINARIA COLONIAL	und	0,00	$ 369.198,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ 60.466.840,02**				**$ -**	**$ 60.466.840,02**	**$ 60.466.840,02**		**$ -**
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA	m2	7,56	$ 1.290.875,00	$ 9.759.015,00	0,00	7,56	7,56	$ -	$ 9.759.015,00	$ 9.759.015,00	0,00	$ -
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 9W	und	16,00	$ 75.694,00	$ 1.211.104,00	0,00	16,00	16,00	$ -	$ 1.211.104,00	$ 1.211.104,00	0,00	$ -
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 18W	und	33,00	$ 84.194,00	$ 2.778.402,00	0,00	33,00	33,00	$ -	$ 2.778.402,00	$ 2.778.402,00	0,00	$ -
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED EN SILOCONA BLANCA	m	30,00	$ 17.859,00	$ 535.770,00	0,00	30,00	30,00	$ -	$ 535.770,00	$ 535.770,00	0,00	$ -
NP5	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	0,00	$ 85.194,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP6	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	2,00	$ 76.194,00	$ 152.388,00	0,00	2,00	2,00	$ -	$ 152.388,00	$ 152.388,00	0,00	$ -
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", INCLUYE CABLEADO 2F+1T+1N Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	m	180,00	$ 24.559,00	$ 4.420.620,00	0,00	180,00	180,00	$ -	$ 4.420.620,00	$ 4.420.620,00	0,00	$ -
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS PVC 1/2"	und	50,00	$ 5.259,00	$ 262.950,00	0,00	50,00	50,00	$ -	$ 262.950,00	$ 262.950,00	0,00	$ -
NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PVC 4X4	und	52,00	$ 9.773,00	$ 508.196,00	0,00	52,00	52,00	$ -	$ 508.196,00	$ 508.196,00	0,00	$ -
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	2,00	$ 68.329,00	$ 136.658,00	0,00	2,00	2,00	$ -	$ 136.658,00	$ 136.658,00	0,00	$ -
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER Y MATERIALES ACORDE AL RETIE	und	1,00	$ 527.729,00	$ 527.729,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 527.729,00	$ 527.729,00	0,00	$ -
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO CON ALTAVOCES FIJOS Y CONSOLA AMPLIFICADORA. INCLY CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	und	1,00	$ 2.885.930,00	$ 2.885.930,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 2.885.930,00	$ 2.885.930,00	0,00	$ -
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS SISTEMA 5020	m2	25,96	$ 310.000,00	$ 8.047.600,00	0,00	25,96	25,96	$ -	$ 8.047.600,00	$ 8.047.600,00	0,00	$ -
NP14	REINSTALACION DE PUERTA. INCY CORTE SEGÚN NUEVAS MEDIADAS	und	3,00	$ 175.103,53	$ 525.310,59	0,00	3,00	3,00	$ -	$ 525.310,59	$ 525.310,59	0,00	$ -
NP15	REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN GYM. INCY TUBERIA DE COBRE, CABLEADO Y ACCESORIOS PAR A SU CORRECTA INSTALACION	und	1,00	$ 2.099.487,00	$ 2.099.487,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 2.099.487,00	$ 2.099.487,00	0,00	$ -
NP16	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA CARRIL DE TROTE	m	0,00	$ 16.773,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP17	BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10MM. INCLUYE REGATA EN ALFAJIA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA FIJACION	m	0,00	$ 446.249,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP18	SIEMBRA ORNMENTAL DE PLANTAS. INCLYTE MACETA	und	8,00	$ 129.642,55	$ 1.037.140,44	0,00	8,00	8,00	$ -	$ 1.037.140,44	$ 1.037.140,44	0,00	$ -
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS 19X39CM	m2	0,00	$ 186.342,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO FLEXUBLE MODULAR AISLADOR ACUSTICO. INCLUYEN REMATES PARA DESNIVEL	m2	79,56	$ 321.500,00	$ 25.578.540,00	0,00	79,56	79,56	$ -	$ 25.578.540,00	$ 25.578.540,00	0,00	$ -
NP2	**ITEMS NO PREVISTOS 2**				**$ 22.686.949,03**				**$ -**	**$ 22.686.949,03**	**$ 22.686.949,03**		**$ -**
NP2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS H=80CM	m	63,00	$ 186.554,00	$ 11.752.902,00	0,00	63,00	63,00	$ -	$ 11.752.902,00	$ 11.752.902,00	0,00	$ -
NP2.2	MACHONES EN CONCRETO S=10X10 H=80CM INCLY ACERO Y ANCLAJE SOBRE PLACA	und	27,00	$ 49.927,00	$ 1.348.029,00	0,00	27,00	27,00	$ -	$ 1.348.029,00	$ 1.348.029,00	0,00	$ -
NP2.3	ESTUCO SOBRE MUROS 3 MANOS	m2	9,30	$ 17.319,00	$ 161.135,98	0,00	9,30	9,30	$ -	$ 161.135,98	$ 161.135,98	0,00	$ -
NP2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA	m2	9,00	$ 26.292,00	$ 236.533,35	0,00	9,00	9,00	$ -	$ 236.533,35	$ 236.533,35	0,00	$ -
NP2.5	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	3,00	$ 81.194,00	$ 243.582,00	0,00	3,00	3,00	$ -	$ 243.582,00	$ 243.582,00	0,00	$ -
NP2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	m	3,40	$ 284.005,52	$ 965.618,77	0,00	3,40	3,40	$ -	$ 965.618,77	$ 965.618,77	0,00	$ -
NP2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	und	9,00	$ 16.522,00	$ 148.698,00	0,00	9,00	9,00	$ -	$ 148.698,00	$ 148.698,00	0,00	$ -
NP2.8	SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 2".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	und	7,00	$ 27.942,00	$ 195.594,00	0,00	7,00	7,00	$ -	$ 195.594,00	$ 195.594,00	0,00	$ -
NP2.9	SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 4".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	und	2,00	$ 47.342,00	$ 94.684,00	0,00	2,00	2,00	$ -	$ 94.684,00	$ 94.684,00	0,00	$ -
NP2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION DE 1/2"	m	18,00	$ 18.524,00	$ 333.432,00	0,00	18,00	18,00	$ -	$ 333.432,00	$ 333.432,00	0,00	$ -
NP2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2"	m	12,00	$ 22.024,00	$ 264.288,00	0,00	12,00	12,00	$ -	$ 264.288,00	$ 264.288,00	0,00	$ -
NP2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4"	m	2,00	$ 43.434,00	$ 86.868,00	0,00	2,00	2,00	$ -	$ 86.868,00	$ 86.868,00	0,00	$ -
NP2.13	RECOSTRUCCION DE MARCOS PARA VENTANAS, INCLUYE ESTRUCTURA	m	67,60	$ 18.073,50	$ 1.221.768,60	0,00	67,60	67,60	$ -	$ 1.221.768,60	$ 1.221.768,60	0,00	$ -
NP2.14	ESTUCO Y PINTURA PARA FILOS DE VANTANA	m	67,60	$ 5.973,00	$ 403.774,80	0,00	67,60	67,60	$ -	$ 403.774,80	$ 403.774,80	0,00	$ -
NP2.15	LEVANTE DE MURO EN PANEL DE ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA	m2	62,55	$ 63.027,33	$ 3.942.530,53	0,00	62,55	62,55	$ -	$ 3.942.530,53	$ 3.942.530,53	0,00	$ -
NP2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE KRISTAL	m2	8,40	$ 153.275,00	$ 1.287.510,00	0,00	8,40	8,40	$ -	$ 1.287.510,00	$ 1.287.510,00	0,00	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

ACTA FINAL DE OBRA	FECHA 18/02/2025
ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO.	

ÍTEM	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION Nro. 2					CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VAL. UNITARIO	VAL. PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANT FINAL	VALOR FINAL
A	COSTO DIRECTO				$ 122.266.209,10				$ -	$ 122.266.209,10	$ 122.266.209,10		$ -
B	ADMINISTRACIÓN			15%	$ 18.339.931,36				$ -	$ 18.339.931,36	$ 18.339.931,36		$ -
C	IMPREVISTOS			1%	$ 1.222.662,09				$ -	$ 1.222.662,09	$ 1.222.662,09		$ -
D	UTILIDAD			3%	$ 3.667.986,27				$ -	$ 3.667.986,27	$ 3.667.986,27		$ -
E	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			2%	$ 2.445.324,18				$ -	$ 2.445.324,18	$ 2.445.324,18		$ -
F	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 696.917,39				$ -	$ 696.917,39	$ 696.917,39		$ -
A+B+C+D+E+F	TOTAL PRESUPUESTO				$ 148.639.030,40				$ -	$ 148.639.030,40	$ 148.639.030,40		$ -

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR CONTRATADO	$ 148.639.030,40
VALOR ACUMULADO AVANCE FISICO	$ 148.639.030,40
VALOR PRESENTE ACTA (100%)	$ 148.639.030,40

% ANTICIPO	-
VALOR ANTICIPO	$ -
% AVANCE FISICO ACUMULA	100,00%

DESCRIPCION	FECHA ACTA	VALOR FACTURADO (100%)	% PAGADO	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR FACTURAR	% PAGADO ACUMULAD
ACTA PARCIAL NRO 1	18-feb-25	$ 148.639.030,40	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.639.030,40	$ -	100,00%

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 148.639.030,40

Firma:
RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 11028851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
RL OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:		

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**1,00**	**PRELIMINARES**

ITEM:	**1,01**	**CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA PLASTICA VERDE H:2 M**				
UNIDAD:	**m**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**42,00**
GYM	1	42,00				42,00

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	


MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**1,00**	**PRELIMINARES**

ITEM:	**1,02**	**DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTON**				
UNIDAD:	**m2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**146,36**
GYM	1	18,18	7,48			135,99
ZONA DE ACCESO A GYM	1	3,40	3,05			10,37

Detalle:



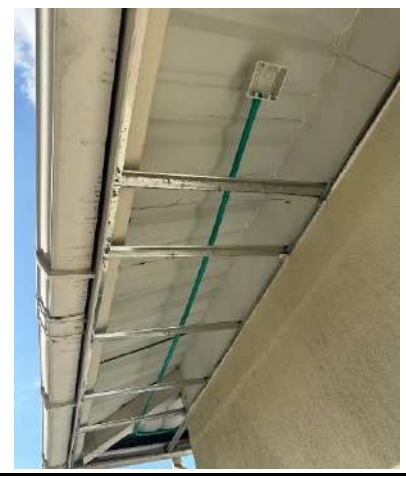

Firma:





RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

CC. 1102851781 DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

RL OSCAR HERAZO SEBA

INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**1,00**	**PRELIMINARES**

ITEM:	**1,03**
UNIDAD:	**und**

DESMONTE Y ACARREO APARATOS SANIT.

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**7,00**
BAÑO HOMBRES	4					4,00
BAÑO MUJERES	3					3,00

Detalle:







Firma:





RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

CC. 1102851781 DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

RL OSCAR HERAZO SEBA

INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**1,00**	**PRELIMINARES**

ITEM:	**1,04**	**DESMONTE Y ACARREO DE PUERTAS**				
UNIDAD:	**und**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**9,00**
BAÑO HOMBRES	4					4,00
BAÑO MUJERES	4					4,00
PUERTA PPPAL	1					1,00

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**1,00**	**PRELIMINARES**

ITEM:	**1,05**
UNIDAD:	**und**

DESMONTE DE VENTANAS INCLUYE VIDRIOS

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**10,00**
GYM	10					10,00

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**1,00**	**PRELIMINARES**

ITEM:	**1,06**
UNIDAD:	**m2**

DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO E=0.08 M

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**17,55**
BAÑO HOMBRE	1	2,92	2,84			8,29
BAÑO MUJER	1	2,92	2,95			8,61
PLANTILLA AIRE ACOND	1	0,8	0,80			0,64

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**1,00**	**PRELIMINARES**

ITEM:	**1,07**
UNIDAD:	**m2**

DEMOLICION ENCHAPE

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**71,84**
PISO BAÑO HOMBRE	1	2,92		2,84		8,29
PISO BAÑO MUJER	1	2,92		2,95		8,61
FRONTAL BAÑO HOMBRE	1	2,05		2,50		5,13
FRONTAL 2 BAÑO HOMBRE	1	0,8		0,55		0,44
FONDO BAÑO HOMBRE	1	2,84		2,50		7,10
LATERALES BAÑO HOMBRE	2	2,92		2,50		14,60
FRONTAL BAÑO MUJER	1	2,1		2,50		5,25
FONDO BAÑO MUJER	1	2,95		2,50		7,38
LATERALES BAÑO MUJER	2	2,92		2,50		14,60
FRONTAL 2 BAÑO MUJER	1	0,8		0,55		0,44

Detalle:





Firma:





RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**


PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**1,00**	**PRELIMINARES**

ITEM:	**1,08**	**TRAZADO Y REPLANTEO**				
UNIDAD:	**m**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**63,00**
CALADOS	1	63,00				63,00
,						

Detalle:

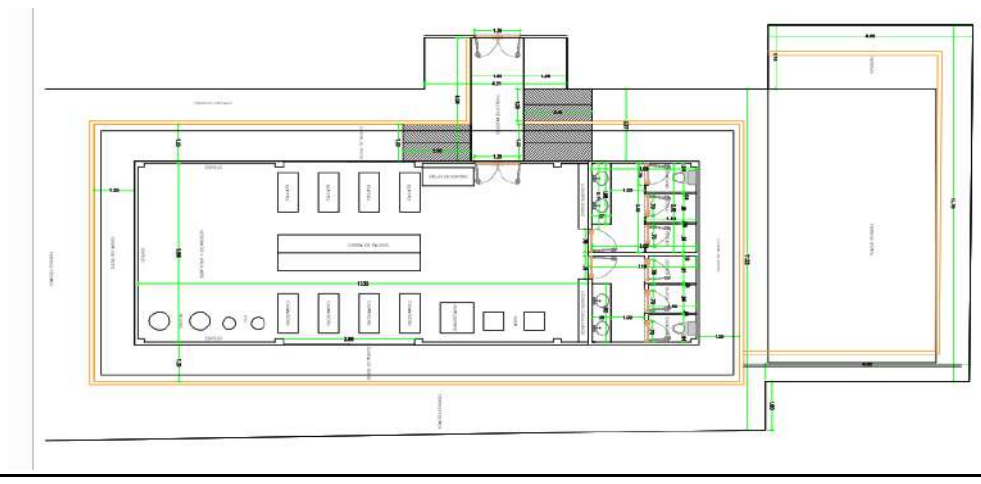

Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**1,00**	**PRELIMINARES**

ITEM:	**1,10**	**RETIRO ESCOMBROS**				
UNIDAD:	**m3**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**8,43**
CIELO RAZO	146,36			0,02	130%	3,81
ANDEN	17,55			0,08	130%	1,82
ENCHAPE	71,84			0,03	130%	2,80

Detalle:

Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**1,00**	**PRELIMINARES**

ITEM:	**1,12**	**REGATAS SOBRE MUROS (INCLUYE RETIRO)**				
UNIDAD:	**m**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**10,00**
MUROS GYM	1	10,00				10,00

Detalle:

Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**2,00**	**PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA**

ITEM:	**2,02**	**PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.10 M. # 2 (CON REF.)**				
UNIDAD:	**m2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**23,03**
BAÑO HOMBRE	1	2,92	2,84			8,29
BAÑO MUJER	1	2,92	2,95			8,61
RAMPAS	2	2,55	1,20			6,12

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**2,00**	**PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA**

ITEM:	**2,03**	**DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO**				
UNIDAD:	**m2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**13,64**
DIVISIONES	4		1,57	2,0		12,56
MODULOS FIJOS	2		0,27	2,0		1,08

Detalle:

Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**2,00**	**PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA**

ITEM:	**2,05**	**CIELO RASO PANEL YESO 12.7 MM**				
UNIDAD:	**m2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**146,36**
GYM	1	18,18	7,48			135,99
ZONA DE ACCESO A GYM	1	3,40	3,05			10,37

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

CC. 1102851781 DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

RL OSCAR HERAZO SEBA

INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**2,00**	**PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA**

ITEM:	**2,06**	**PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) INTERIORES**
UNIDAD:	**m2**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**72,11**
GYM LADO IZQ	1	13,54		2,5		33,85
DESCUENTO VENTANAS	-6	1,18		2,2		-15,58
FONDO GYM	1	5,88		2,5		14,70
DESCUENTO VENTANAS PEQ	-2	1,7		0,5		-1,63
GYM LADO DER	1	13,54		2,5		33,85
DESCUENTO VENTANAS	-4	1,18		2,2		-10,38
DESCUENTO PUERTA ACCESO	-1	1,4		2,5		-3,50
PARED LADO BAÑOS	1	5,88		2,5		14,70
DESCUENTO PEURTA BAÑOS	-2	0,8		2,0		-3,20
BAÑO MUJERES	1	11,74		0,4		4,70
BAÑO HOMBRES	1	11,52		0,4		4,61

Detalle:





Firma:





RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

CC. 1102851781 DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

RL OSCAR HERAZO SEBA

INTERVENTOR DE OBRA


PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**2,00**	**PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA**

ITEM:	**2,07**	**ENCHAPE CERAMICA 25x40**				
UNIDAD:	**m2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**62,55**
MURO BAÑO HOMBRE	1	11,52		2,1		24,19
MURO BAÑO MUJERES	1	11,74		2,1		24,65
PISO BAÑO HOMBRE	1	2,92	2,84			8,29
PISO BAÑO MUJERES	1	2,92	2,95			8,61
DESCUENTO PUERTA HOMBRES	-1	0,8		2,0		-1,60
DESPUESNTO PUERTA MUJERS	-1	0,8		2,0		-1,60

Detalle:

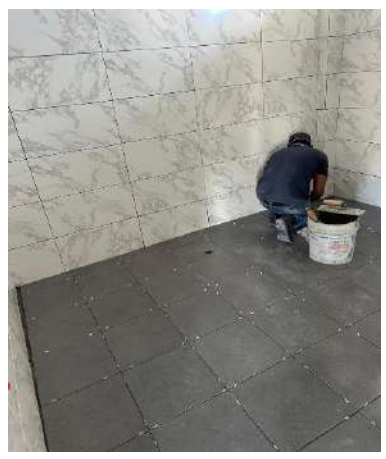



Firma:





RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

CC. 1102851781 DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

RL OSCAR HERAZO SEBA

INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**2,00**	**PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA**

ITEM:	**2,08**	**PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) EXTERIORES**				
UNIDAD:	**m2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**73,81**
GYM LADO IZQ	1	13,54		2,5		33,85
DESCUENTO VENTANAS	-6	1,18		2,2		-15,58
FONDO GYM	1	5,88		2,5		14,70
DESCUENTO VENTANAS PEQ	-2	1,7		0,5		-1,63
GYM LADO DER	1	13,54		2,5		33,85
DESCUENTO VENTANAS	-4	1,18		2,2		-10,38
DESCUENTO PUERTA ACCESO	-1	1,4		2,5		-3,50
PARED LADO BAÑOS	1	5,88		2,5		14,70
ALFAJIAS	1	78,00	0,10			7,80

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**3,00**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**

ITEM:	**3,01**	**SALIDA E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMP. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE**				
UNIDAD:	**und**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**15,00**
GYM	15					15,00

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**5,00**	**EQUIPOS SANITARIOS**

ITEM:	**5,01**	**LAVAMANOS INSTITUCIONAL SOBREPONER**				
UNIDAD:	**und**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**4,00**
BAÑO HOMBRE	2					2,00
BAÑO MUJER	2					2,00

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**5,00**	**EQUIPOS SANITARIOS**

ITEM:	**5,02**	**GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVANDALICO**				
UNIDAD:	**und**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**4,00**
BAÑO HOMBRE	2					2,00
BAÑO MUJERES	2					2,00

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**5,00**	**EQUIPOS SANITARIOS**

ITEM:	**5,05**	**DUCHA SENCILLA ANTIVANDALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)**				
UNIDAD:	**und**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
BAÑO HOMBRE	1					1,00
BAÑO MUJERES	1					1,00

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**6,00**	**PRELIMINARES**

ITEM:	**6,01**	**DESMONTE TELA ASFALTICA**				
UNIDAD:	**und**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**15,12**
MACHONES TERRAZA	27	0,56	0,60			9,00
RAMPAS	2	2,55	1,20			6,12

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

CC. 1102851781 DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

RL OSCAR HERAZO SEBA

INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP1**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA**				
UNIDAD:	**m2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**7,56**
BAÑOS	6		0,63	2,0		7,56

Detalle:

Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP2**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 9W**					
UNIDAD:	**und**						
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**					**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**			**16,00**
GYM	16						16,00

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	


MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP3**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 18W**				
UNIDAD:	**und**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**33,00**
GYM	21					21,00
ZONA EXTERNA	8					8,00
BAÑOS	4					4,00

Detalle:



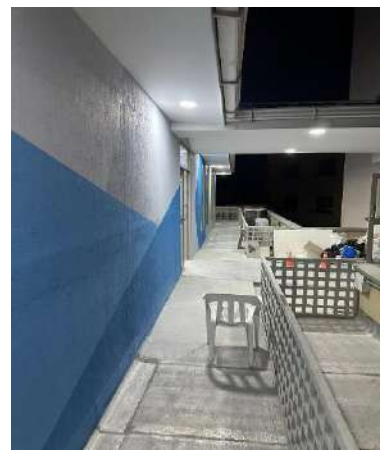

Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP4**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED EN SILOCONA BLANCA**				
UNIDAD:	**m**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**30,00**
GYM		30				30,00

Detalle:

Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP6**	**SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE**					
UNIDAD:	**und**						
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**					**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**			**2,00**
BAÑOS	2						2,00

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP7**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", INCLUYE CABLEADO 2F+1T+1N Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**					
UNIDAD:	**m**						
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**					**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**			**180,00**
GYM		180					180,00

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP8**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS PVC 1/2"**				
UNIDAD:	**und**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**50,00**
GYM	50					50,00
,						

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP9**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PVC 4X4**				
UNIDAD:	**und**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**52,00**
LUCES	52					52,00

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP10**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE**				
UNIDAD:	**und**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
BAÑOS	2					2,00

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP11**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER Y MATERIALES ACORDE AL RETIE**				
UNIDAD:	**und**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**1,00**
GYM	1					1,00

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP12**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO CON ALTAVOCES FIJOS Y CONSOLA AMPLIFICADORA. INCLY CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**
UNIDAD:	**und**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**1,00**
GYM	1					1,00

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP13**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS SISTEMA 5020**				
UNIDAD:	**m2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**25,96**
GYM	10		1,18	2,2		25,96

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP14**	**REINSTALACION DE PUERTA. INCY CORTE SEGÚN NUEVAS MEDIADAS**					
UNIDAD:	**und**						
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**					**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**			**3,00**
GYM	3						3,00

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP15**	**REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN GYM. INCY TUBERIA DE COBRE, CABLEADO Y ACCESORIOS PAR A SU CORRECTA INSTALACION**					
UNIDAD:	**und**						
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**					**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**			**1,00**
GYM	1						1,00

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP18**	**SIEMBRA ORNMENTAL DE PLANTAS. INCLYTE MACETA**				
UNIDAD:	**und**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**8,00**
GYM	8					8,00

Detalle:

Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

CC. 1102851781 DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

RL OSCAR HERAZO SEBA

INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	RAMON A. LOPEZ CAMARGO 1.102.851.781 INGENIERO CIVIL TP Nro. 22202-351254COR
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1

CAPÍTULO:	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**NP20**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO FLEXUBLE MODULAR AISLADOR ACUSTICO. INCLUYEN REMATES PARA DESNIVEL**				
UNIDAD:	**m2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**79,56**
PISO GYM	1	5,85	13,60			79,56

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 1102851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
RL OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2


CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.1**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS H=80CM**				
UNIDAD:	**m**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**63,00**
TERRAZA GYM	1	63,00				63,00

Detalle:





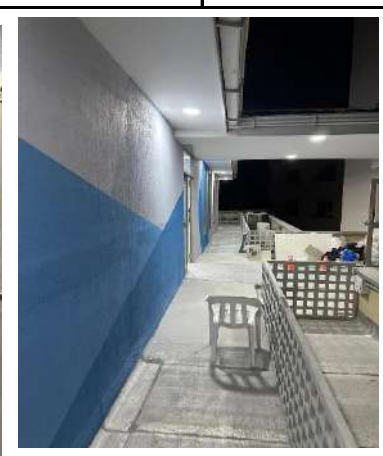

Firma:





RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.2**	**MACHONES EN CONCRETO S=10X10 H=80CM INCLY ACERO Y ANCLAJE SOBRE PLACA**
UNIDAD:	**und**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**27,00**
TERRAZA GYM	27					27,00

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

CC. 1102851781 DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

RL OSCAR HERAZO SEBA

INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.3**	**ESTUCO SOBRE MUROS 3 MANOS**				
UNIDAD:	**m2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**9,30**
BAÑO MUJERES	1	11,74		0,4		4,70
BAÑO HOMBRES	1	11,52		0,4		4,61

Detalle:



Firma:





RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.4**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA**
UNIDAD:	**m2**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**9,00**
MACHONES TERRAZA	27	0,56	0,60			9,00

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.5**	**SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE**
UNIDAD:	**und**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**3,00**
GYM	3					3,00

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.6**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE**				
UNIDAD:	**m**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**3,40**
ACCESO GYM	2	1,70				3,40

Detalle:





Firma:





RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 1102851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA

INGENO
RL OSCA
INTERVEN

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BA TERRAZA ADYACENTES AI**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CA**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - I**



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR


MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.7**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION**
UNIDAD:	**und**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**9,00**
BAÑOS	9					9,00

Detalle:

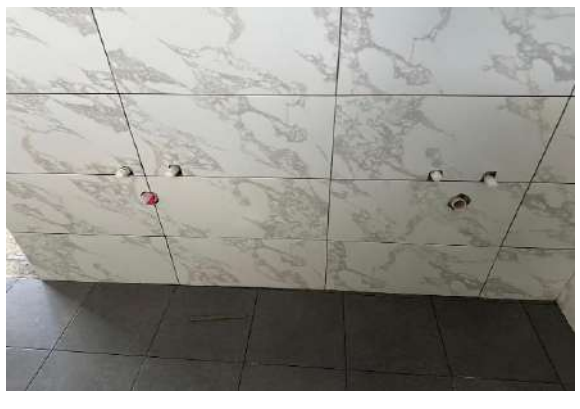



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
CC. 1102851781 DE SINCELEJO	**RL OSCAR HERAZO SEBA**
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTOR DE OBRA**

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.8**	**SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 2".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION**
UNIDAD:	**und**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**7,00**
BAÑOS	7					7,00

Detalle:





Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 1102851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
RL OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2


CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.9**	**SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 4".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION**
UNIDAD:	**und**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
BAÑOS	2					2,00

Detalle:



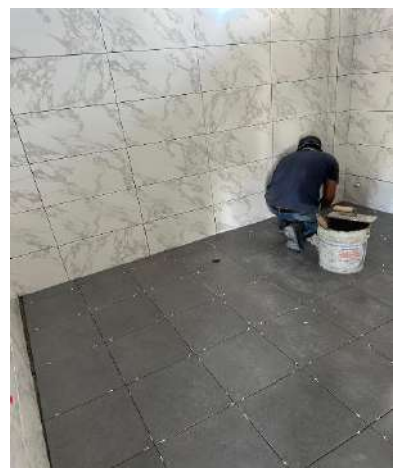

Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 1102851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
RL OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR DE OBRA


PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.10**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION DE 1/2"**					
UNIDAD:	**ml**						
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**					**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**			**18,00**
BAÑOS	18						18,00

Detalle:

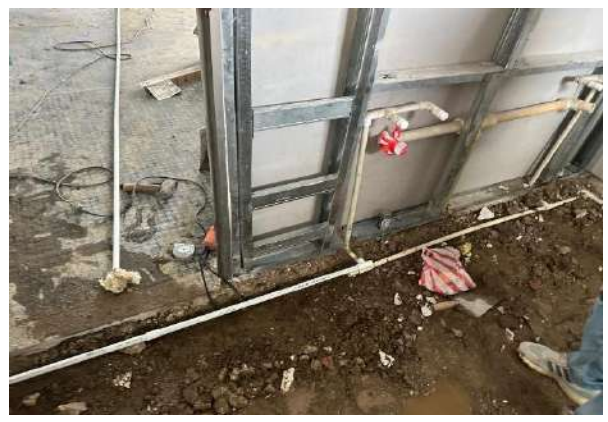

Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 1102851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
RL OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.11**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2"**
UNIDAD:	**ml**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**12,00**
BAÑOS	12					12,00

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 1102851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
RL OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.12**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4"**
UNIDAD:	**und**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
BAÑOS	6					2,00

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 1102851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
RL OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2


CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.13**	**RECOSTRUCCION DE MARCOS PARA VENTANAS, INCLUYE ESTRUCTURA**
UNIDAD:	**m**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**67,60**
VENTANAS GYM	10	6,76				67,60

Detalle:



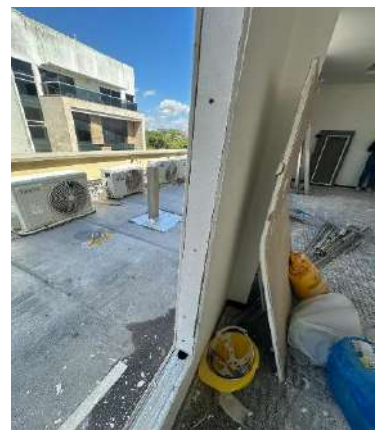

Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 1102851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
RL OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.14**	**ESTUCO Y PINTURA PARA FILOS DE VANTANA**				
UNIDAD:	**m**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**67,60**
VENTANAS GYM	10	6,76				67,60

Detalle:

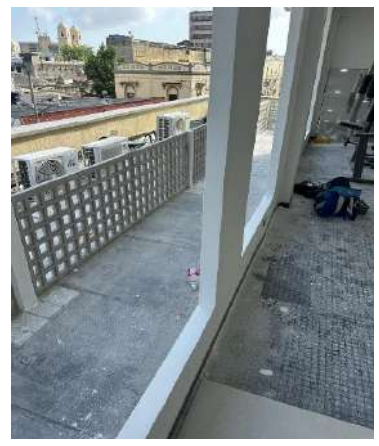

Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 1102851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
RL OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR DE OBRA

PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.15**	**LEVANTE DE MURO EN PANEL DE ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA**				
UNIDAD:	**m2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**62,55**
MURO BAÑO HOMBRE	1	11,52		2,1		24,19
MURO BAÑO MUJERES	1	11,74		2,1		24,65
PISO BAÑO HOMBRE	1	2,92	2,84			8,29
PISO BAÑO MUJERES	1	2,92	2,95			8,61
DESCUENTO PUERTA HOMBRES	-1	0,8		2,0		-1,60
DESPUESNTO PUERTA MUJERS	-1	0,8		2,0		-1,60

Detalle:



Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 1102851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
RL OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR DE OBRA


PROYECTO:	**ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONTRATISTA:	**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**	**RAMON A. LOPEZ CAMARGO** **1.102.851.781** **INGENIERO CIVIL** **TP Nro. 22202-351254COR**
INTERVENTOR:	**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.**	

MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

CAPÍTULO:	**NP2**	**ITEMS NO PREVISTOS 2**

ITEM:	**NP2.16**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE KRISTAL**				
UNIDAD:	**m2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**% Expansión**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**8,40**
GYM	1	5,60		1,5		8,40

Detalle:

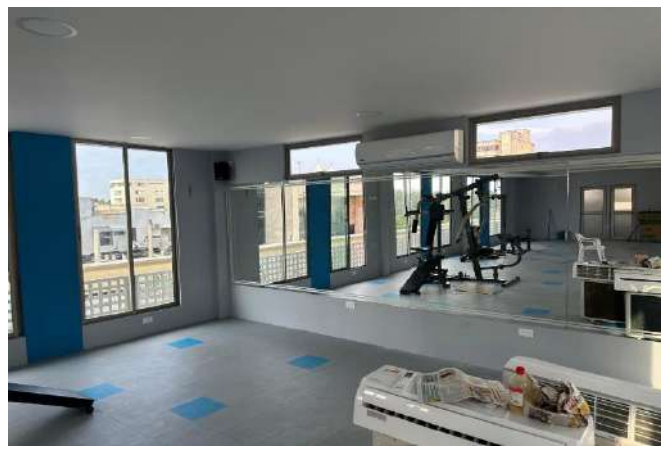

Firma:

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 1102851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
RL OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR DE OBRA

CORRESPONDENCIA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

San Juan de Betulia, 10 de febrero de 2025

Señores
RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CONTRATISTA

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

ASUNTO: AVAL DE PRORROGA

OSCAR LUIS HERAZO SEBA identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de INTERVENTOR, Revisada la solicitud emitida por el contratista **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** de PRORROGA número 3 "Mediante el presente escrito, permítanme solicitar de manera formal la solicitud de una prórroga al contrato en mención por ocho (08) días, debido a que la materia prima para la ejecución de los ítems 2.03: DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO y NP1: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA fue imposible encontrarla en el mercado local y por consiguiente tocó traerla de otra ciudad, es por eso que se solicita este tiempo para que durante estos días el material solicitado pueda llegar y poder fabricar lo que se requiere. Se espera que en este tiempo la obra haya culminado con todas sus actividades en los tiempos contractuales y a satisfacción". Esta interventoría la encuentra ajustada en la realidad por lo tanto se avala extender el plazo de ejecución 8 días más.

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Sincelejo, febrero 10 de 2025

OF-011-MC23-2024

Señores:

INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR DE OBRAS

Referencia: Contrato de obra Nro. MC 23 de 2024 cuyo objeto es "ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO"

Asunto: Solicitud de prorroga

Cordial saludo;

Mediante el presente escrito, permítanme solicitar de manera formal la solicitud de una prórroga al contrato en mención por ocho (08) días, debido a que la materia prima para la ejecución de los ítems 2.03: DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO y NP1: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA fue imposible encontrarla en el mercado local y por consiguiente tocó traerla de otra ciudad, es por eso que se solicita este tiempo para que durante estos días el material solicitado pueda llegar y poder fabricar lo que se requiere. Se espera que en este tiempo la obra haya culminado con todas sus actividades en los tiempos contractuales y a satisfacción.

Anexo:

- Reprogramación de obras
- Balance de obras
- Memoria de cantidades
- Apus de ítems no previstos
- Justificaciones técnicas de ítems no previstos
- Especificaciones técnicas de ítems no previstos
- Cotizaciones de ítems no previstos

Atentamente,

Ing. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO.
Contratista de Obras

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

Gmail **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>**

OF-010-MC23 DE 2024

2 mensajes

Ramon Lopez <ingramonlopez0401@gmail.com> 6 de febrero de 2025, 15:36
Para: "INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S" <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>, Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

BUENAS TARDES,

ENVIÓ RESPUESTA A SOLICITUD Y ADJUNTO ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS

3 adjuntos

3. JUSTIFICACIONES TECNICAS PARA MODF 2.xlsx
680K

1. ACTA DE MODIFICACION NRO 2 MC 23 DE 2024.xlsx
953K

OF-010-MC23-2024.pdf
173K

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com> 6 de febrero de 2025, 18:04
Para: Ramon Lopez <ingramonlopez0401@gmail.com>, Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

buenas tardes, se le sugiere acogerse a las sugerencias realizadas y evitar nuevas devoluciones:
1. el item NP. 18 DEBE SER EJECUTADO
2. las justificaciones tecnicas no son claras, ejemplo NP 2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS H=80CM LA JUSTIFICACION NO ES CLARA EN BASE EN QUE? los calados son mas resistentes a los anteriores se sugiere anexar concepto tecnico por profesional idonéo en el tema.
3. el item NP2.5 se le quito el cableado y el precio sigue igual, se debe bajar y evitar sobre costos
3. Los rendimientos deben ser ajustados no es logico que una cuadrilla en un dia solo instale 18 ml de tuberia en el dia no es logico, lo cual esta ocasionando incrementos en el valor unitario.

DE ANTE MANO SE LE SOLICITA A LA SUPERVISION COMITE PARA EVALUAR LOS TEMAS QUE PERSISTEN EN LA MODIFICACION NUMERO 2.
[El texto citado está oculto]

San Juan de Betulia, 05 de febrero de 2025

Señores
RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CONTRATISTA

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE BALANCE NUMERO 2

OSCAR LUIS HERAZO SEBA identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de INTERVENTOR, Revisada la solicitud emitida por el contratista **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** de balance numero 2 se hacen las siguientes observaciones:.

- ✓ Justificaciones técnicas de la necesidad del nuevo ítem, determinando su conveniencia en PRO DE LA OBRA.
- ✓ Justificación técnica de los ítems no ejecutados, expresando motivo y razón de la no ejecución

CASOS ESPECÍFICOS

NP16	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA CARRIL DE TROTE
NP17	BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10MM. INCLUYE REGATA EN ALFAJIA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA FIJACION
NP18	SIEMBRA ORNMENTAL DE PLANTAS. INCLYTE MACETA
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS 19X39CM

Se solicita la explicación técnica de la no ejecución de estos ítems, además se solicita incluir NP 18 puesto que no existe ningún motivo para la no ejecución de este ítem.

- ✓ Revisar APU NP2 2.4 algunas celdas no se encuentran sumando, ajustar APU
- ✓ APU NP2 2.5 Se incluye cableado y ya estos se encuentran en ítems anteriores
- ✓ Revisar APU NP2 2.6 los materiales a utilizar no son claros, revisar rendimientos no se ajustan a la realidad
- ✓ Ajustar Rendimientos APU NP2 2.7, NP2 2.8, NP2 2.9, NP2 2.10, NP2 2.11, NP2 2.12

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

Gmail **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>**

DOCUMENTOS PARA MODF 2

2 mensajes

Ramon Lopez <ingramonlopez0401@gmail.com> 3 de febrero de 2025, 10:04
Para: "INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S" <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>

Buenos días

Adjunto documentación para modificación nro 2 del contrato MC-23-2024

Gracias

7 adjuntos

- **2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE NP MODF 2.pdf** 322K
- **REPROGRAMACION_ADECUACIONES_GYM.pdf** 565K
- **3. JUSTIFICACIONES TECNICAS PARA MODF 2.xlsx** 679K
- **4. REPROGRAMACION MODF 2.xlsx** 693K
- **1. ACTA DE MODIFICACION NRO 2 MC 23 DE 2024.xlsx** 953K
- **5. COTIZACION 1.pdf** 7075K
- **6. COTIZACION 2.pdf** 5244K

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com> 5 de febrero de 2025, 15:55
Para: Ramon Lopez <ingramonlopez0401@gmail.com>, Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[El texto citado está oculto]

- **OBSERVACIONES A MODIFICACION 2 .pdf** 188K

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Sincelejo, enero 28 de 2025

OF-007-MC23-2024

Señores:

INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR DE OBRAS

Referencia: Contrato de obra Nro. MC 23 de 2024 cuyo objeto es "ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO"

Asunto: Solicitud de prorroga

Cordial saludo;

Mediante el presente escrito, permítanme solicitar de manera formal la solicitud de una prórroga al contrato en mención por 10 días, debido a que en el municipio de Sincelejo se realizaron las fiestas patronales y para esas fechas de 11 a 20 de enero de 2025 algunos proveedores y personal relacionado con la ejecución del contrato laboraban medio tiempo, lo que a veces impedía la compra de materiales. Sumado a esto, se tuvieron las fechas de navidad y fin de año, lo cual también evitó que se laborara de manera seguida para esos días.

Anexo:

- Reprogramación de obras
- Balance de obras
- Memoria de cantidades
- Apus de ítems no previstos
- Justificaciones técnicas de ítems no previstos
- Especificaciones técnicas de ítems no previstos

Atentamente,

Ing. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO.
Contratista de Obras

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

San Juan de Betulia, 29 de enero de 2024

Señores
RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CONTRATISTA

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OF-007-MC23-2024

OSCAR LUIS HERAZO SEBA identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de contratista del contrato de interventoría MC-24-2024, Revisada la solicitud emitida por el contratista **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** en el oficio con código de la referencia, expresamos que dicha solicitud de prorroga se ajusta a la realidad de ejecución del proyecto por lo tanto esta interventoría AVALA las programaciones presentadas, las solicitudes de prórroga presentadas, dándole traslado al ente contratante para su respectiva aprobación prorroga número 2. Se anexa la siguiente información.

- ✓ Reprogramación de obra
- ✓ Solicitud contratista

Referente a la solicitud de balance numero 2, esta interventoría **NO AVALA LA DOCUMENTACION PRESENTADA**, realizando las siguientes observaciones:

- ✓ No se presentan cotizaciones de ítems no previstos
- ✓ Justificaciones técnicas de la necesidad del nuevo ítem, determinando su conveniencia en PRO DE LA OBRA.
- ✓ Justificación técnica de los ítems no ejecutados, expresando motivo y razón de la no ejecución
- ✓ Verificar si existen nuevas actividades no contempladas

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

San Juan de Betulia, 29 de Diciembre de 2024

Señores
FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

REFERENCIA: CONTRATO NUMERO MC 25 DE 2024- INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA N°2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA EN REFERENCIA

OSCAR LUIS HERAZO SEBA identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de contratista del contrato de interventoría MC-245-2024, en cumplimiento del principio de buena fe, transparencia, responsabilidad y economía, de manera atenta presento solicitud de prórroga Y adición al mismo, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que, el plazo de ejecución del contrato se estipulo para el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, previa autorización y orden de inicio impartida por la Dirección seccional de administración judicial.

2. Que el día 27 de diciembre se realizó la orden de inicio de interventoría.

3. Que con la programación realizada establece una terminación del contrato de obra hasta 31 de enero de 2024 y se prorrogo hasta esa fecha.

4. Que el contratista solicita 10 días más de ejecución aportando la debida programación la cual es aprobada por interventoría.

5. Que la interventoría debe ir acorde con los tiempos de obra para llevar una ejecución paralela a los tiempos establecidos.

6. Que para garantizar que los tiempos de interventoría estén acorde con los tiempos de ejecución del contratista de obra, la interventoría asumirá los costos de los 10 días de prorroga sin ocasionar gastos al ente contratante.

Por los motivos anteriormente descritos se solicita la prorroga del contrato en mención por termino de 10 días calendarios al tiempo de ejecución inicial.

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

Gmail

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>

SOLICITUD DE PRORROGA NRO 2 MC 23 DE 2024

3 mensajes

Ramon Lopez <ingramonlopez0401@gmail.com> 28 de enero de 2025, 15:52
Para: ingenorteconstruccionessas@gmail.com

5 adjuntos

- **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE NP MODF 2.pdf** 321K
- **OF-007-MC23-2024 solicitud de prorroga.pdf** 170K
- **JUSTIFICACIONES TECNICAS PARA MODF 2.xlsx** 679K
- **REPROGRAMACION MODF 2.xlsx** 693K
- **ACTA DE MODIFICACION NRO 2 MC 23 DE 2024.xlsx** 943K

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com> 28 de enero de 2025, 17:24
Para: Ramon Lopez <ingramonlopez0401@gmail.com>

BUENAS TARDES PARA SOLICITUD DE PRÓRROGA SE SOLICITA PROGRAMACIÓN EN PROJECT Y PDF

El mar, 28 ene 2025 a las 15:52, Ramon Lopez (<ingramonlopez0401@gmail.com>) escribió:

Ramon Lopez <ingramonlopez0401@gmail.com> 29 de enero de 2025, 7:58
Para: "INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S" <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>, Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

BUENOS DIAS, ENVIO DOCUMENTACION SOLICITADA

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

- **REPROGRAMACION ADECUACIONES GYM.mpp** 339K
- **DIAGRAMA DE GANTT.pdf** 622K

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Sincelejo, enero 27 de 2025

OF-006-MC23-2024

Señores:

RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Arq. JUSTIN VILLA ORDOÑEZ
SUPERVISOR

Referencia: Contrato de obra Nro. MC 23 de 2024 cuyo objeto es "ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO"

Asunto: Respuesta a oficio de recomendación de plan de mejoramiento y reparaciones

Cordial saludo;

Mediante la presente y de acuerdo al oficio recibido el día 27 de enero del año 2025 mediante vía correo electrónico por parte de la interventoría de la obra en referencia (INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S) en donde se me solicita la corrección de los acabados de unos elementos estructurales tipo machones los cuales se fundieron con el objetivo de confinar los calados instalados en el gimnasio de la institución dentro del marco de la ejecución de dicho contrato (adjunto oficio), permítanme informarles que los elementos estructurales en mención, aun no han sido culminados en su totalidad, lo cual quiere decir que en los próximos días se tomaran todas las medidas necesarias para subsanar los pertinente.

Atentamente,

Ing. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO.
Contratista de Obras

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre

San Juan de Betulia, 28 de Enero de 2025.

Señores

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CONTRATISTA

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

REFERENCIA: CONTRATO NUMERO MC 25 DE 2024- INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

ASUNTO: PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIONES

OSCAR LUIS HERAZO SEBA identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de interventor del contrato **"ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES".** Se le solicita de manera inmediata realizar los mejoramientos necesarios en los ítems ejecutados como lo son **SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS 19X39CM,** ya que se evidencian malos acabados y afectaciones en las esquinas de los calados, se anexan evidencia fotográfica.









Se solicita que se radique la especificación técnica de las reparaciones a realizar para el seguimiento adecuado y oportuno de la interventoría.

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

Gmail **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>**

SOLICITUD TECNICA 1 -ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES

2 mensajes

INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com> 27 de enero de 2025, 9:54
Para: Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>, ingramonlopez0401@gmail.com

REQUIRIMIENTO TECNICO NUMERO 1.pdf
553K

Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co> 27 de enero de 2025, 13:46
Para: "INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S" <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>, "ingramonlopez0401@gmail.com" <ingramonlopez0401@gmail.com>

Buenas tardes
Cordial saludo,
Concerniente a lo expuesto anteriormente, se agradece que se atienda el requerimiento por parte de la interventoría en el menor tiempo posible.
Muchas gracias.
Atentamente;

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Ingeniera
Dirección Seccional de Administración Judicial
Oficina de Contratación.
Sincelejo – Sucre.
PBX: (5) 2754780 Ext. 1110
Celular: 301-304-1331

De: INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>
Enviado: lunes, 27 de enero de 2025 9:54 a. m.
Para: Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>; ingramonlopez0401@gmail.com <ingramonlopez0401@gmail.com>
Asunto: SOLICITUD TECNICA 1 -ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES

San Juan de Betulia, 28 de Enero de 2025.

Señores

RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CONTRATISTA

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

REFERENCIA: CONTRATO NUMERO MC 25 DE 2024- INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

ASUNTO: PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIONES

OSCAR LUIS HERAZO SEBA identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de interventor del contrato **"ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES".** Se le solicita de manera inmediata realizar los mejoramientos necesarios en los ítems ejecutados como lo son **SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS 19X39CM,** ya que se evidencian malos acabados y afectaciones en las esquinas de los calados, se anexan evidencia fotográfica.









Se solicita que se radique la especificación técnica de las reparaciones a realizar para el seguimiento adecuado y oportuno de la interventoría.

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Sincelejo, enero 23 de 2025

OF-003-MC23-2024

Señores:

INGENORTE S.A.S
ING. OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR

Referencia: Contrato de obra Nro. MC 23 de 2024 cuyo objeto es "ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO"

Asunto: Solicitud de suspensión

Cordial saludo;

Dentro de las actividades que hacen parte de la ejecución del contrato en mención, se encuentra el suministro e instalación de un piso de caucho, del que no se logró conseguir para entrega inmediata., esto implicó ordenar su fabricación la cual toma un tiempo de 30 días para su elaboración y respectiva entrega a satisfacción, teniendo también en cuenta que la empresa que suministrará el producto retomo labores el día 07 de enero de 2025 a causa de su periodo de vacaciones. Sabiendo esto, surge la necesidad de solicitar la suspensión de la obra con el objetivo de poder culminar el contrato a satisfacción en los tiempos contractuales estipulados.

Atentamente,

Ing. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO.
Contratista de Obras

CC ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISORA DEL CONTRATO
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre
