

Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
0	0	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE PALACIOS DE JUSTICIA**	**$ 498.843.701,00**			**117 días**	**mié 19/06/24**	**sáb 30/11/24**
1	1	**INICIO OBRA**	**$ 0,00**		**323CC+15 días**	**0 días**	**mié 19/06/24**	**mié 19/06/24**
2	2	**INICIO CHALAN**	**$ 0,00**	**169CC+12 días**	**5CC;51CC+15 días**	**0 días**	**mar 20/08/24**	**mar 20/08/24**
3	3	**PALACIO DE JUSTICIA DE CHALÁN**	**$ 50.449.601,00**			**30 días**	**mar 20/08/24**	**mié 25/09/24**
4	3.1	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**	**$ 6.423.263,00**			**7 días**	**mar 20/08/24**	**mié 28/08/24**
5	3.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO INCLUYE PEPENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA, RETIRO Y DISPOSICION DE MANTO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COR	$ 6.423.263,00	2CC	20CC+2 días;49;36CC;22C(	7 días	mar 20/08/24	mié 28/08/24
6	3.2	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 0,00**			**0 días**	**mar 20/08/24**	**mar 20/08/24**
7	3.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA	$ 0,00	2CC		0 días	mar 20/08/24	mar 20/08/24
8	3.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 24.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO B O C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COB	$ 0,00	2CC		0 días	mar 20/08/24	mar 20/08/24
9	3.3	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 659.811,00**			**3 días**	**vie 13/09/24**	**mar 17/09/24**
10	3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	$ 659.811,00	18	43	3 días	vie 13/09/24	mar 17/09/24
11	3.4	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 3.584.443,00**			**3 días**	**jue 22/08/24**	**lun 26/08/24**
12	3.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A	$ 871.243,00	20CC	15CC+2 días	3 días	jue 22/08/24	lun 26/08/24

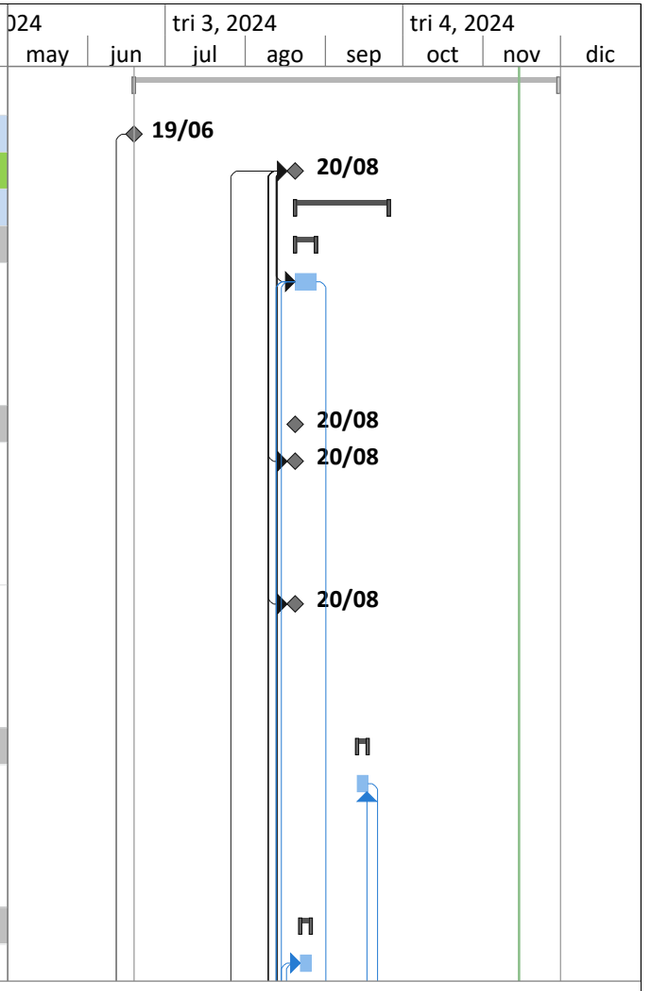

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
13	3.4.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 2.713.200,00	20CC	15CC+2 días;47	3 días	jue 22/08/24	lun 26/08/24
14	**3.5**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 671.750,00**			**5 días**	**sáb 24/08/24**	**vie 30/08/24**
15	3.5.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECT/	$ 671.750,00	12CC+2 días;13CC+2	19	5 días	sáb 24/08/24	vie 30/08/24
16	**3.6**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 23.042.854,00**			**18 días**	**jue 22/08/24**	**vie 13/09/24**
17	3.6.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 2.470.911,00	20;31;48	18	6 días	jue 29/08/24	jue 5/09/24
18	3.6.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 9.492.900,00	17	10	6 días	jue 5/09/24	vie 13/09/24
19	3.6.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 3.683.827,00	15	40;33	6 días	vie 30/08/24	vie 6/09/24
20	3.6.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 7.395.216,00	5CC+2 días	17;30CC;42CC;12(	6 días	jue 22/08/24	jue 29/08/24
21	**3.7**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**$ 61.360,00**			**3 días**	**mar 20/08/24**	**vie 23/08/24**
22	3.7.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	$ 61.360,00	5CC	50	3 días	mar 20/08/24	vie 23/08/24
23	**3.8**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**$ 286.194,00**			**11 días**	**mar 20/08/24**	**lun 2/09/24**
24	3.8.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 138.465,00	38	28CC	2 días	jue 29/08/24	sáb 31/08/24
25	3.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	2CC		0 días	mar 20/08/24	mar 20/08/24

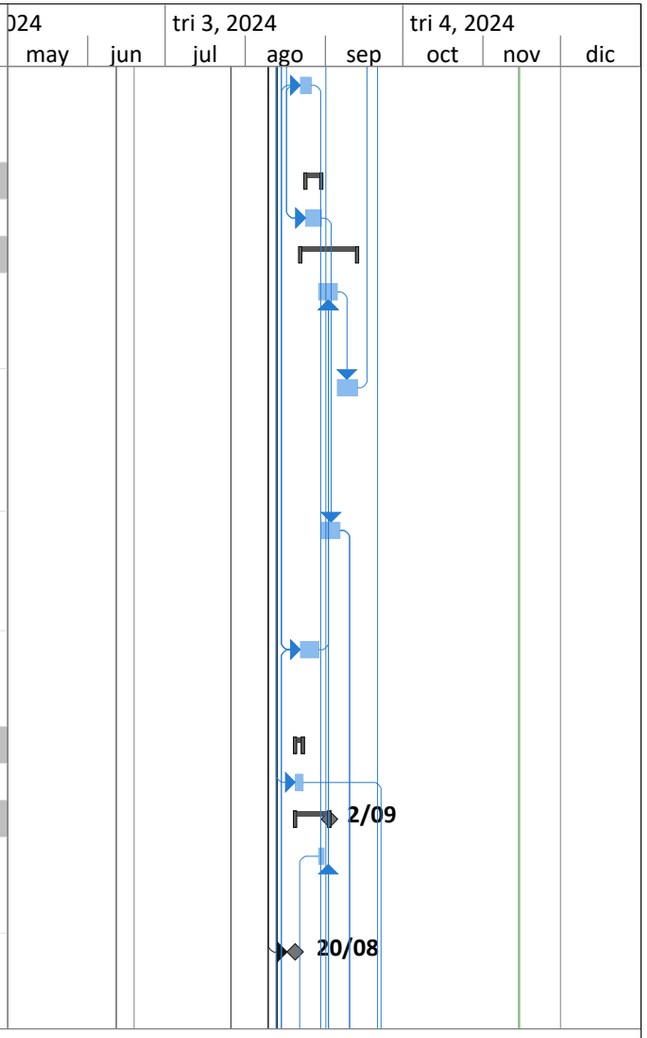

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
26	3.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	2CC		0 días	mar 20/08/24	mar 20/08/24
27	3.8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	2CC		0 días	mar 20/08/24	mar 20/08/24
28	3.8.5	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 147.729,00	24CC	50	3 días	jue 29/08/24	lun 2/09/24
29	**3.9**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 406.922,00**			**6 días**	**jue 22/08/24**	**jue 29/08/24**
30	3.9.1	SUMISNISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DOBLE INCLUYE DESMONTES DE LOS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 78.762,00	20CC	50	4 días	jue 22/08/24	mar 27/08/24
31	3.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200 W IP65 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE REFLECTOR EXISTENTE EN EL DEPOSITO QUE AUTORICE LA SUPERVISION".	$ 328.160,00	42CC+2 días	17	4 días	sáb 24/08/24	jue 29/08/24
32	**3.10**	**CARPINTERIA METALICA**	**$ 1.508.732,00**			**6 días**	**vie 6/09/24**	**sáb 14/09/24**
33	3.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 3.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 1.038.875,00	19	34	3 días	vie 6/09/24	mié 11/09/24
34	3.10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 2.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 469.857,00	33	50	3 días	mié 11/09/24	sáb 14/09/24
35	**3.11**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 1.104.520,00**			**8 días**	**mar 20/08/24**	**jue 29/08/24**
36	3.11.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE	$ 431.879,00	5CC	37CC	5 días	mar 20/08/24	lun 26/08/24
37	3.11.2	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO(CERTIFICADO DECRETO 1575	$ 431.879,00	36CC	38	5 días	mar 20/08/24	lun 26/08/24
38	3.11.3	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	$ 240.762,00	37	24	3 días	lun 26/08/24	jue 29/08/24
39	**3.12**	**SEGURIDAD**	**$ 403.721,00**			**2 días**	**vie 6/09/24**	**mar 10/09/24**

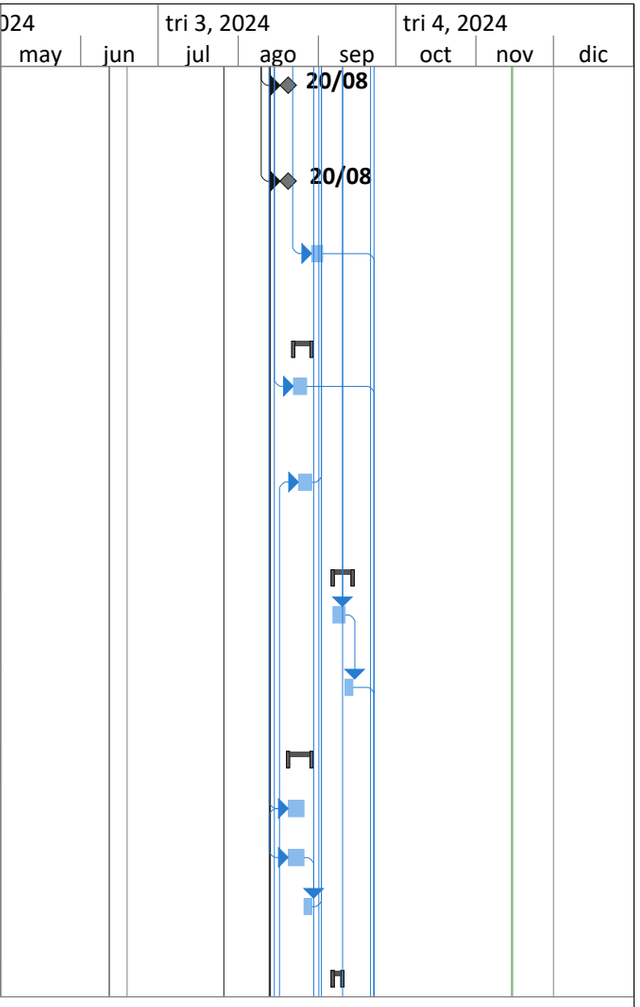

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
40	3.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	$ 403.721,00	19	50	2 días	vie 6/09/24	mar 10/09/24
41	**3.13**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 10.360.938,00**			**28 días**	**jue 22/08/24**	**mié 25/09/24**
42	3.13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE RACK 18 RU (90x60X60)	$ 838.249,00	20CC	31CC+2 días	5 días	jue 22/08/24	mié 28/08/24
43	3.13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO PARA VENTANA	$ 9.125.255,00	10	44;45	3 días	mar 17/09/24	vie 20/09/24
44	3.13.3	SUMINISTRO E INSTALACION ESTANTERÍA METÁLICA 29X85X2MT. 6 ENTRE-PAÑOS.	$ 328.468,00	43	50	3 días	vie 20/09/24	mar 24/09/24
45	3.13.4	APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA PARA SELLADO DE JUNTAS DE MARCOS DE VENTANAS	$ 68.966,00	43	50	4 días	vie 20/09/24	mié 25/09/24
46	**3.14**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 1.935.093,00**			**13 días**	**mar 20/08/24**	**mié 4/09/24**
47	3.14.1	PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PARA PROTECTORES METALICOS	$ 119.732,00	13	50	3 días	lun 26/08/24	jue 29/08/24
48	3.14.2	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 1.029.066,00	2CC	17	8 días	mar 20/08/24	jue 29/08/24
49	3.14.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	$ 786.295,00	5	50	6 días	mié 28/08/24	mié 4/09/24
50	**4**	**FIN CHALAN**	**$ 0,00**	**28;30;49;44;45;22;40;**	**122**	**0 días**	**mié 25/09/24**	**mié 25/09/24**
51	**5**	**INICIO PALMITO**	**$ 0,00**	**2CC+15 días**	**73CC;276CC+5 dí**	**0 días**	**vie 6/09/24**	**vie 6/09/24**
52	**6**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN ANTONIO DE PALMITO**	**$ 74.833.103,00**			**65 días**	**vie 6/09/24**	**sáb 30/11/24**
53	**6.1**	**CUBIERTA**	**$ 6.574.892,00**			**14 días**	**vie 6/09/24**	**mar 24/09/24**
54	6.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	$ 637.430,00	51CC	55CC	12 días	vie 6/09/24	sáb 21/09/24
55	6.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA PLANA ETERNIT , INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 1.410.027,00	54CC	59CC;75CC;56CC	6 días	vie 6/09/24	sáb 14/09/24

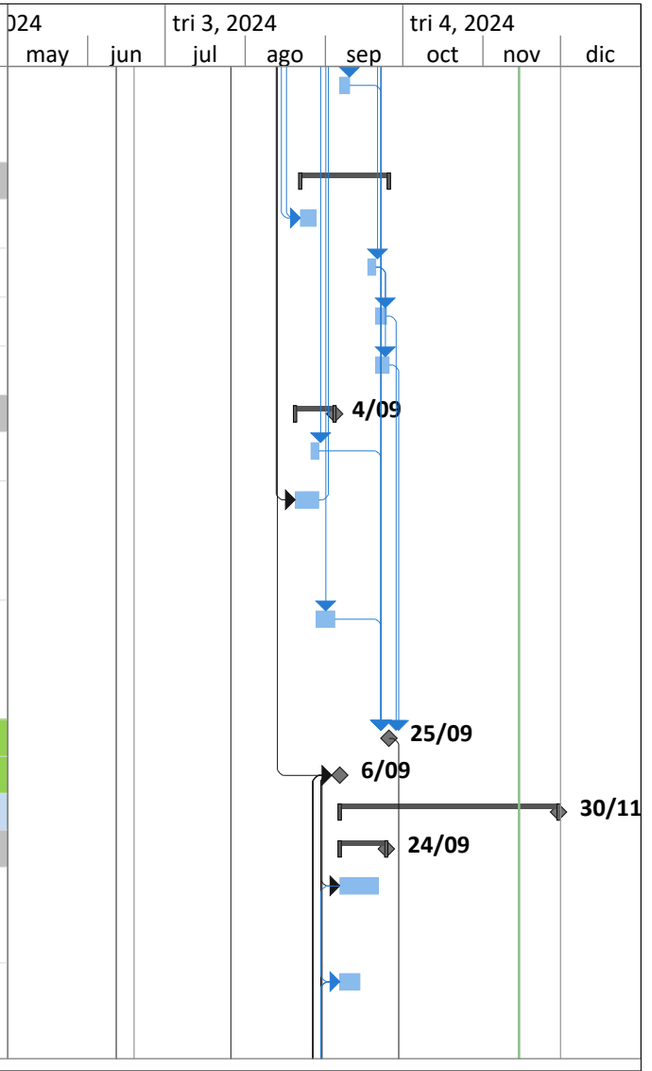

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
56	6.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA EN ETERNIT, INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 1.085.258,00	55CC	57	7 días	vie 6/09/24	lun 16/09/24
57	6.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO INCLUYE PEPENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA, RETIRO Y DISPOSICION DE MANTO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COR	$ 3.442.177,00	56	120	7 días	lun 16/09/24	mar 24/09/24
58	**6.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 1.353.514,00**			**7 días**	**vie 6/09/24**	**lun 16/09/24**
59	6.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA	$ 864.585,00	55CC	60CC	7 días	vie 6/09/24	lun 16/09/24
60	6.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA	$ 488.929,00	59CC	89CC	4 días	vie 6/09/24	jue 12/09/24
61	**6.3**	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 384.890,00**			**2 días**	**vie 4/10/24**	**lun 7/10/24**
62	6.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	$ 384.890,00	71	87	2 días	vie 4/10/24	lun 7/10/24
63	**6.4**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 880.917,00**			**6 días**	**sáb 14/09/24**	**sáb 21/09/24**
64	6.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	$ 461.246,00	73	65CC	3 días	sáb 14/09/24	mié 18/09/24
65	6.4.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDENCIAS METALICA CON CAMBIO DE CERRADURA; INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	$ 220.309,00	64CC	66	3 días	sáb 14/09/24	mié 18/09/24
66	6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ESMERILADO PARA VIDRIO LAMINADO EN PUERTA	$ 199.362,00	65	87	3 días	mié 18/09/24	sáb 21/09/24

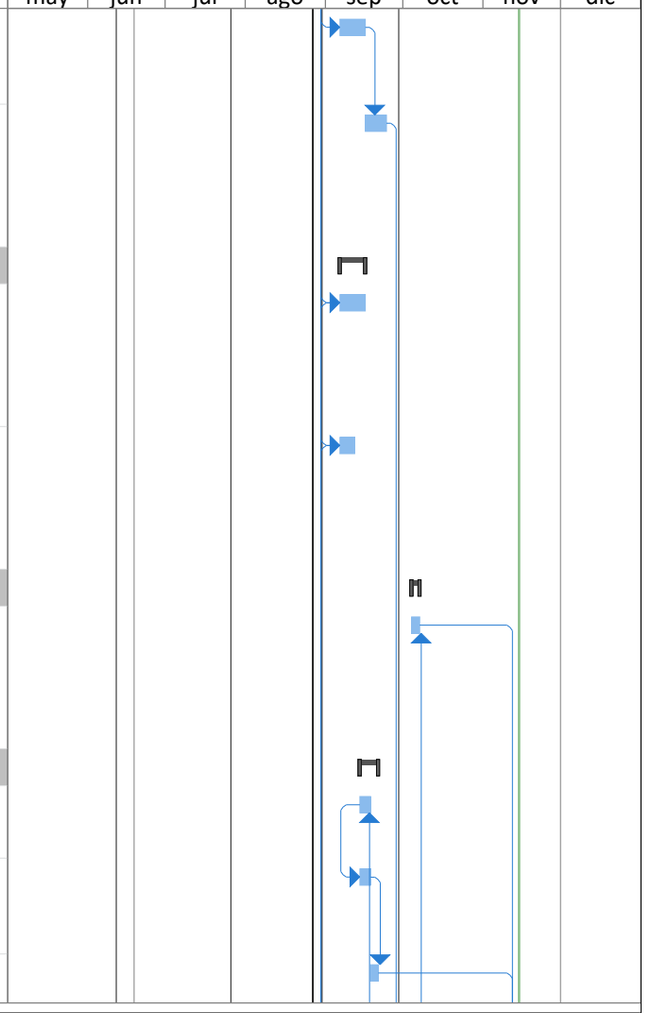

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Progress
Progreso manual


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
67	**6.5**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 354.571,00**			**2 días**	**lun 16/09/24**	**mié 18/09/24**
68	6.5.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTUR	$ 354.571,00	119CC	72;83CC+2 días	2 días	lun 16/09/24	mié 18/09/24
69	**6.6**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 10.363.554,00**			**22 días**	**vie 6/09/24**	**vie 4/10/24**
70	6.6.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, RESANES, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 1.787.202,00	73	71	8 días	sáb 14/09/24	mar 24/09/24
71	6.6.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 5.133.647,00	70	62	8 días	mar 24/09/24	vie 4/10/24
72	6.6.3	PINTURA ESMALTE EXTERIOR COLOR IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE CON PREVIA CAPA ANTICORROSIVA PARA PASAMANOS Y PROTECTORES DE VENTANAS EN FACHADA PRINCIPAL INCLUYE RASPADA, RESANES, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRE	$ 293.954,00	68	87;92	8 días	mié 18/09/24	vie 27/09/24
73	6.6.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 3.148.751,00	51CC	70;64;108CC;109C	6 días	vie 6/09/24	sáb 14/09/24
74	**6.7**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**$ 1.047.551,00**			**4 días**	**vie 6/09/24**	**jue 12/09/24**
75	6.7.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	$ 80.245,00	55CC	76CC	4 días	vie 6/09/24	jue 12/09/24
76	6.7.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA	$ 967.306,00	75CC	87	4 días	vie 6/09/24	jue 12/09/24
77	**6.8**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**$ 55.386,00**			**12 días**	**vie 6/09/24**	**sáb 21/09/24**
78	6.8.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 55.386,00	90	87	4 días	mar 17/09/24	sáb 21/09/24

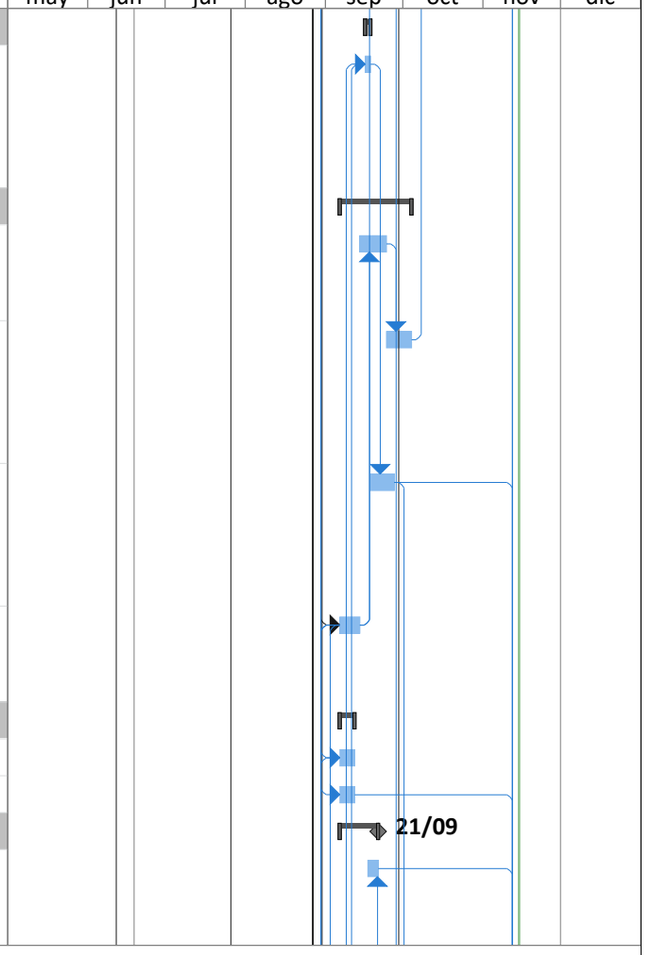

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
79	6.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	51CC		0 días	vie 6/09/24	vie 6/09/24
80	6.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	51CC		0 días	vie 6/09/24	vie 6/09/24
81	6.8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	51CC		0 días	vie 6/09/24	vie 6/09/24
82	**6.9**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 712.189,00**			**5 días**	**mié 18/09/24**	**mar 24/09/24**
83	6.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 30X30 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE	$ 333.200,00	68CC+2 días	84CC	3 días	mié 18/09/24	sáb 21/09/24
84	6.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REDONDO INCRUSTADO LED 18 W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS	$ 51.952,00	83CC	85CC	5 días	mié 18/09/24	mar 24/09/24
85	6.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200 W IP 65 " INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE REFLECTOR EXISTENTE EN EL DEPOSITO QUE AUTORICE LA SUPERVISION".	$ 327.037,00	84CC	87	5 días	mié 18/09/24	mar 24/09/24
86	**6.10**	**JARDINERIA VERTICAL EN FACHADA**	**$ 600.354,00**			**7 días**	**mar 12/11/24**	**mié 20/11/24**
87	6.10.1	PLANTAS ARTIFICALES PARA JARDIN VERTICAL	$ 600.354,00	120;85;105;72;66;62;7	121	7 días	mar 12/11/24	mié 20/11/24
88	**6.11**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 672.640,00**			**8 días**	**vie 6/09/24**	**mar 17/09/24**
89	6.11.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE	$ 431.878,00	60CC	90	4 días	vie 6/09/24	jue 12/09/24
90	6.11.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	$ 240.762,00	89	78	4 días	jue 12/09/24	mar 17/09/24
91	**6.12**	**SEGURIDAD**	**$ 3.897.417,00**			**5 días**	**vie 27/09/24**	**vie 4/10/24**
92	6.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	$ 3.897.417,00	72	87	5 días	vie 27/09/24	vie 4/10/24
93	**6.13**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 32.321.611,00**			**50 días**	**vie 6/09/24**	**mar 12/11/24**
94	6.13.1	PODA ARBOL VECINO	$ 0,00	51CC		0 días	vie 6/09/24	vie 6/09/24

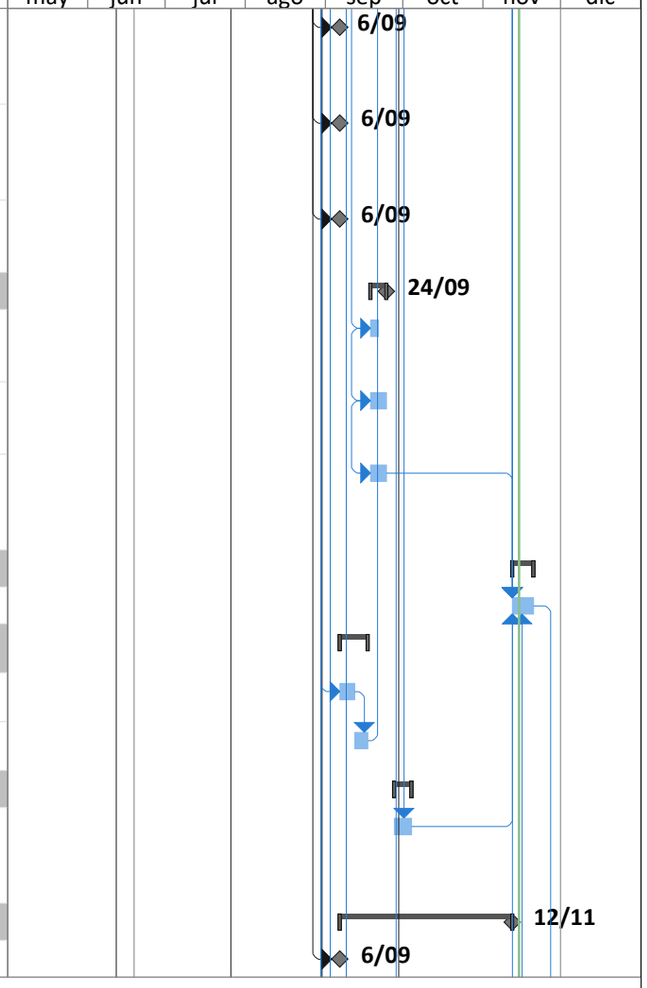

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
95	6.13.2	LIMPIEZA CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE CERRAMIENTO EN PATIO CON APLICACION DE DETERGENTE ANTIHONGOS (ALGUICIDAS) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$ 544.873,00	51CC	96CC+2 días	7 días	vie 6/09/24	lun 16/09/24
96	6.13.3	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO INCLUYE CORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS	$ 654.134,00	95CC+2 días	97	5 días	mar 10/09/24	lun 16/09/24
97	6.13.4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	$ 1.138.197,00	96	98	6 días	lun 16/09/24	lun 23/09/24
98	6.13.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO MEJORADO CON CEMENTO	$ 151.991,00	97	100	3 días	lun 23/09/24	jue 26/09/24
99	6.13.6	SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	$ 9.546.623,00	100	101	9 días	mié 2/10/24	sáb 12/10/24
100	6.13.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 17,5 MPa (2500 PSI) HECHO EN OBRA	$ 1.093.813,00	98	99	4 días	jue 26/09/24	mié 2/10/24
101	6.13.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPa (4,000 PSI) HECHO EN OBRA PARA FONDO DE TANQUE SUBTERRANEO	$ 6.665.665,00	99	102	5 días	sáb 12/10/24	lun 21/10/24
102	6.13.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPa (4,000 PSI) HECHO EN OBRA PARA MUROS DE TANQUE SUBTERRANEO	$ 4.847.756,00	101	103;117CC	5 días	lun 21/10/24	sáb 26/10/24
103	6.13.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPa (4,000 PSI) HECHO EN OBRA PARA LOSA SUPERIOR DE TANQUE SUBTERRANEO	$ 1.136.193,00	102	104	4 días	sáb 26/10/24	jue 31/10/24
104	6.13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO DE 28MPa (4000 PSI) CON BORDES EN ÁNGULO DE 2"X2" Y REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" DE MEDIDAS 1,70mX1,70m, INCLUYES BISAGRAS DE SEGURIDAD Y GANCHOS DE APERTURA.	$ 804.522,00	103	105;114	4 días	jue 31/10/24	mié 6/11/24
105	6.13.12	PAÑETE IMPERMEABILIZADO DOSIFICACIÓN 1:4	$ 5.737.844,00	104	87	3 días	jue 7/11/24	mar 12/11/24
106	**6.14**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 15.613.617,00**			**65 días**	**vie 6/09/24**	**sáb 30/11/24**
107	6.14.1	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .10 X .20.	$ 2.305.314,00	108	118CC	7 días	lun 16/09/24	mar 24/09/24
108	6.14.2	DEMOLICION DE VIGAS Y/O COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE .10 X .20.	$ 597.455,00	73CC	107;112	7 días	vie 6/09/24	lun 16/09/24
109	6.14.3	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	$ 1.198.513,00	73CC	110	15 días	vie 6/09/24	mié 25/09/24
110	6.14.4	CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	$ 349.449,00	109	111CC	6 días	mié 25/09/24	jue 3/10/24

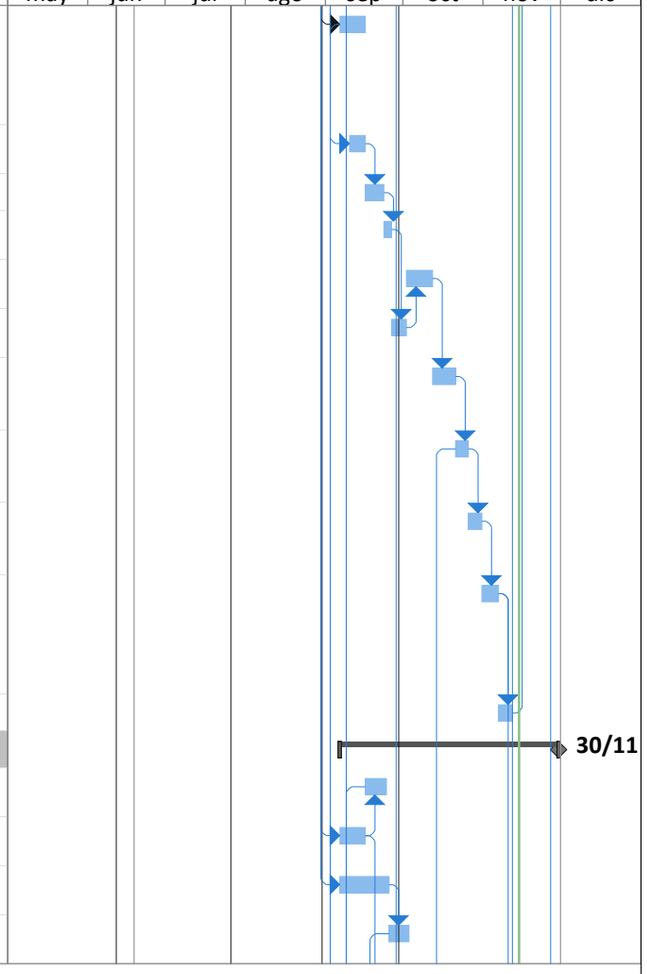

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
111	6.14.5	CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA	$ 779.844,00	110CC	121	5 días	mié 25/09/24	mié 2/10/24
112	6.14.6	TRASIEGO (MATERIAL SOBRANTE Y MATERIAL DE CONSTRUCCION)	$ 1.167.069,00	108	113	5 días	lun 16/09/24	sáb 21/09/24
113	6.14.7	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO	$ 1.639.743,00	112	121	5 días	sáb 21/09/24	vie 27/09/24
114	6.14.8	CASETA PARA ELECTROBOMBA DE 0,6 X 0,6 X 0,6 DIMENCIONES INTERNAS (INCLUYE PLACA EN CONCRETO 3000 PSI E = 8 CM Y PROTECTOR)	$ 563.557,00	104	115CC	8 días	jue 7/11/24	lun 18/11/24
115	6.14.9	SUMINISTRO E INSTALACIONDE ELECTROBOMBA DE 1/2 H	$ 722.725,00	114CC	116	10 días	jue 7/11/24	mié 20/11/24
116	6.14.10	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 CM	$ 933.052,00	115	121	8 días	mié 20/11/24	sáb 30/11/24
117	6.14.11	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	$ 220.212,00	102CC	121	5 días	lun 21/10/24	sáb 26/10/24
118	6.14.12	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 4.116.265,00	73CC;107CC	119CC	8 días	lun 16/09/24	mié 25/09/24
119	6.14.13	CIELO RASO PLANO EN PVC E=7MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES	$ 234.124,00	118CC	68CC	8 días	lun 16/09/24	mié 25/09/24
120	6.14.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	$ 786.295,00	57	87	8 días	mar 24/09/24	vie 4/10/24
121	**7**	**FIN PALMITO**	**$ 0,00**	**87;116;117;111;113**	**366**	**0 días**	**sáb 30/11/24**	**sáb 30/11/24**
122	**8**	**INICIO SAMPUES**	**$ 0,00**	**50**	**125CC;129CC;145**	**0 días**	**mié 25/09/24**	**mié 25/09/24**
123	**9**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUÉS**	**$ 37.518.164,00**			**19 días**	**mié 25/09/24**	**lun 21/10/24**
124	**9.1**	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**	**$ 6.901.691,00**			**9 días**	**mié 25/09/24**	**lun 7/10/24**
125	9.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	$ 401.500,00	122CC	126CC	8 días	mié 25/09/24	sáb 5/10/24
126	9.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO INCLUYE PEPENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA, RETIRO Y DISPOSICION DE MANTO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COR	$ 6.500.191,00	125CC	143CC;167FC+2 días;128CC	9 días	mié 25/09/24	lun 7/10/24

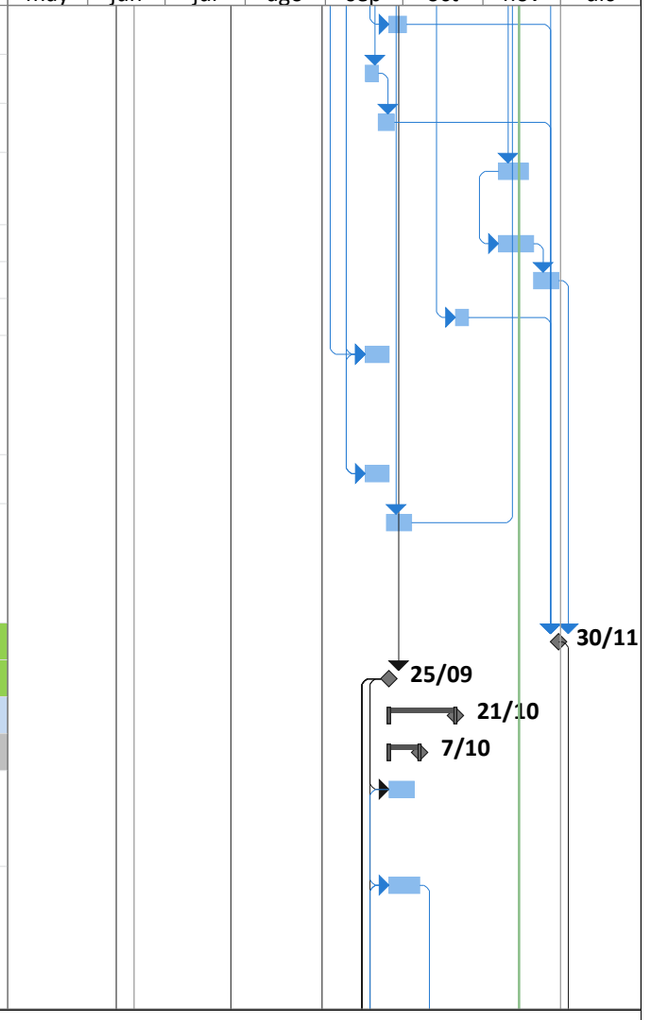

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
127	**9.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 1.152.780,00**			**3 días**	**mié 25/09/24**	**lun 30/09/24**
128	9.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA	$ 1.152.780,00	126CC	141CC+2 días;166	3 días	mié 25/09/24	lun 30/09/24
129	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 18.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COBRE 1	$ 0,00	122CC		0 días	mié 25/09/24	mié 25/09/24
130	**9.3**	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 384.890,00**			**2 días**	**vie 11/10/24**	**mar 15/10/24**
131	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	$ 384.890,00	139	168	2 días	vie 11/10/24	mar 15/10/24
132	**9.4**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 3.462.842,00**			**6 días**	**vie 27/09/24**	**sáb 5/10/24**
133	9.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	$ 461.246,00	141CC	134CC	3 días	vie 27/09/24	mié 2/10/24
134	9.4.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O	$ 74.426,00	133CC	135	3 días	vie 27/09/24	mié 2/10/24
135	9.4.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 2.713.200,00	134	136CC	2 días	mié 2/10/24	vie 4/10/24
136	9.4.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE CERRADURA DE SEGURIDAD) DE PUERTA DE PATIO POSTERIOR INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 213.970,00	135CC	138	3 días	mié 2/10/24	sáb 5/10/24
137	**9.5**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 16.677.810,00**			**17 días**	**vie 27/09/24**	**lun 21/10/24**

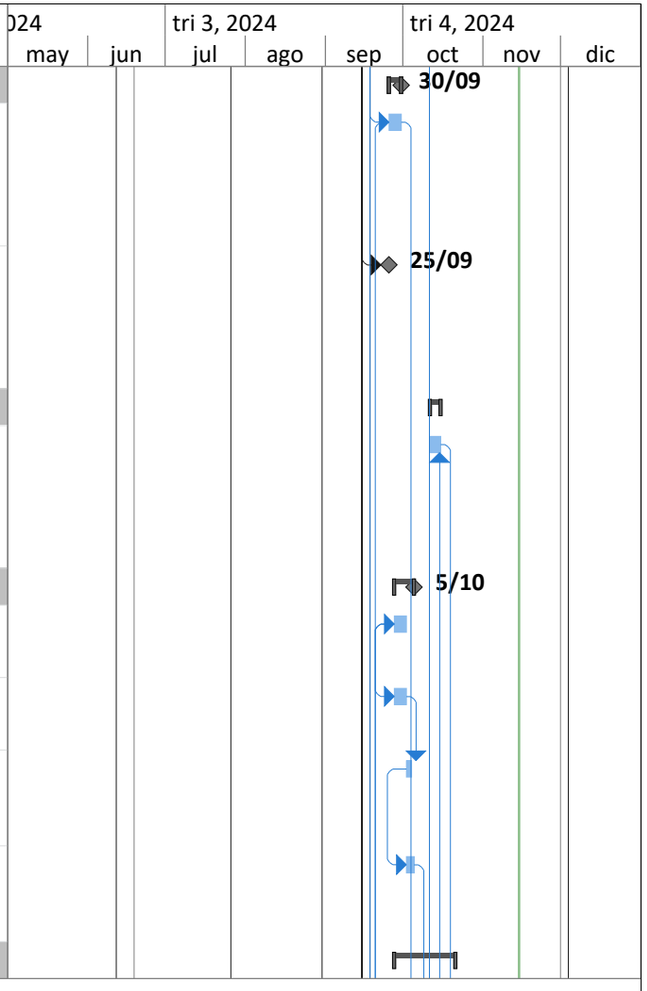

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
138	9.5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 3.972.783,00	136	139CC	5 días	sáb 5/10/24	vie 11/10/24
139	9.5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 7.205.062,00	138CC	131;162;153CC	5 días	sáb 5/10/24	vie 11/10/24
140	9.5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 2.932.053,00	157	168	5 días	sáb 12/10/24	lun 21/10/24
141	9.5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 2.567.912,00	128CC+2 días	133CC	5 días	vie 27/09/24	vie 4/10/24
142	**9.6**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**$ 95.415,00**			**4 días**	**mié 25/09/24**	**mar 1/10/24**
143	9.6.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	$ 95.415,00	126CC	159CC+2 días	4 días	mié 25/09/24	mar 1/10/24
144	**9.7**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**$ 1.254.210,00**			**19 días**	**mié 25/09/24**	**lun 21/10/24**
145	9.7.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 0,00	122CC		0 días	mié 25/09/24	mié 25/09/24
146	9.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	122CC		0 días	mié 25/09/24	mié 25/09/24
147	9.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	122CC		0 días	mié 25/09/24	mié 25/09/24
148	9.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	122CC		0 días	mié 25/09/24	mié 25/09/24
149	9.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO BISELADO 2.0X1.5 SUPERPUESTO A PARED INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 411.849,00	165	168	3 días	mié 16/10/24	lun 21/10/24

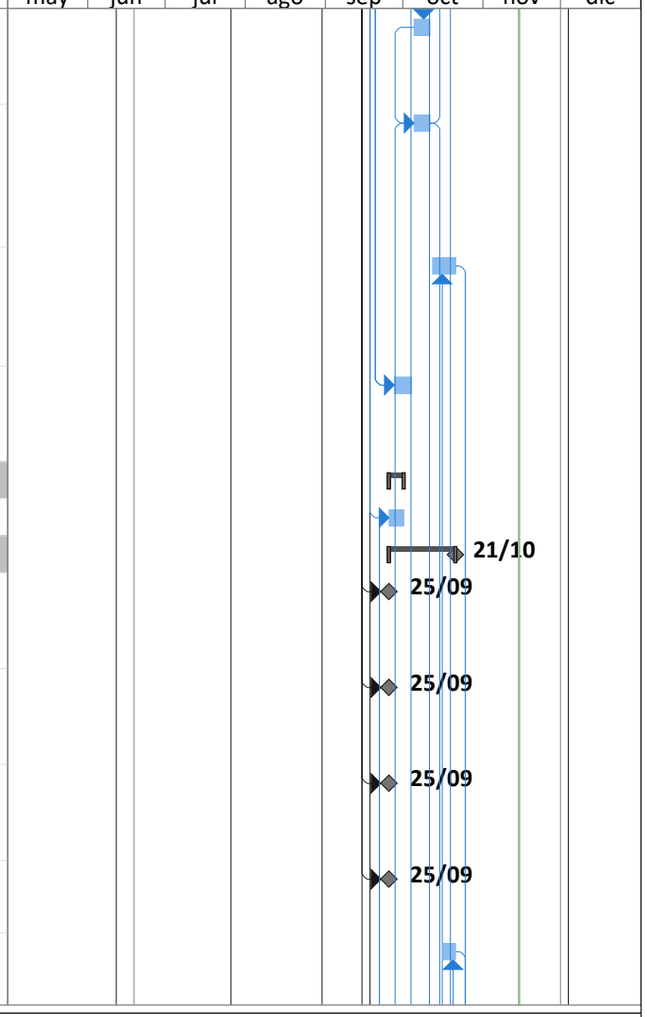

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
150	9.7.6	MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y	$ 103.718,00	159	151CC	3 días	lun 7/10/24	jue 10/10/24
151	9.7.7	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 738.643,00	150CC	165CC	3 días	lun 7/10/24	jue 10/10/24
152	**9.8**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 1.762.209,00**			**6 días**	**sáb 5/10/24**	**sáb 12/10/24**
153	9.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 20X20 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE	$ 165.391,00	139CC	154CC	6 días	sáb 5/10/24	sáb 12/10/24
154	9.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE	$ 772.246,00	153CC	155CC	6 días	sáb 5/10/24	sáb 12/10/24
155	9.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REDONDO INCRUSTADO LED 3" INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS	$ 92.277,00	154CC	156CC	6 días	sáb 5/10/24	sáb 12/10/24
156	9.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 463.656,00	155CC	157CC	6 días	sáb 5/10/24	sáb 12/10/24
157	9.8.5	MANTENIMIENTO DE SALIDAS ELECTRICA PARA LUMINARIAS LED 60X60	$ 268.639,00	156CC	140	6 días	sáb 5/10/24	sáb 12/10/24
158	**9.9**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 431.879,00**			**9 días**	**mié 25/09/24**	**lun 7/10/24**
159	9.9.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE	$ 431.879,00	143CC+2 días;164	150	4 días	mié 2/10/24	lun 7/10/24
160	9.9.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	$ 0,00	122CC		0 días	mié 25/09/24	mié 25/09/24
161	**9.10**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 161.789,00**			**2 días**	**vie 11/10/24**	**mar 15/10/24**
162	9.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO PARA VENTANA	$ 161.789,00	139	168	2 días	vie 11/10/24	mar 15/10/24
163	**9.11**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 5.232.649,00**			**17 días**	**mié 25/09/24**	**jue 17/10/24**
164	9.11.1	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	$ 119.261,00	122CC	159	5 días	mié 25/09/24	mié 2/10/24
165	9.11.2	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 3.087.199,00	151CC	149	7 días	lun 7/10/24	mié 16/10/24

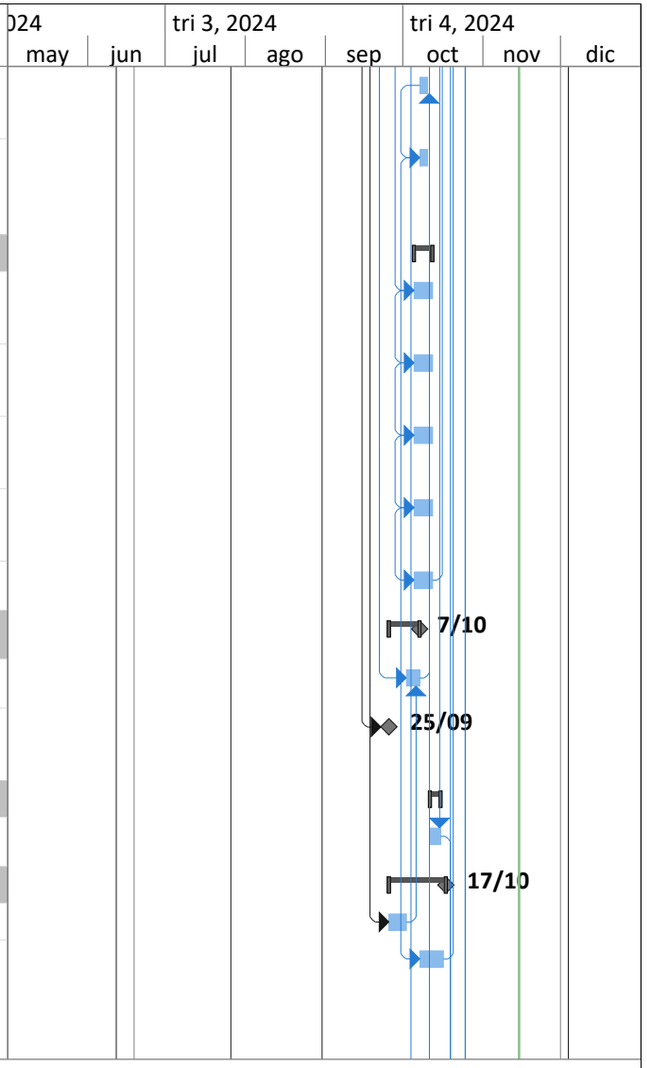

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
166	9.11.3	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 12.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TUBERÍAS DE COBRE 10 MTRS 5/8" Y 3/8", AISLAM	$ 1.239.894,00	128	168	5 días	lun 30/09/24	sáb 5/10/24
167	9.11.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	$ 786.295,00	126FC+2 días	168	6 días	mié 9/10/24	jue 17/10/24
168	**10**	**FIN SAMPUES**	**$ 0,00**	**167;166;149;131;162;**	**366**	**0 días**	**lun 21/10/24**	**lun 21/10/24**
169	**11**	**INICIO SAN BENITO ABAD**	**$ 0,00**	**223CC+8 días**	**174CC;203CC;2C(**	**0 días**	**vie 2/08/24**	**vie 2/08/24**
170	**12**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN BENITO ABAD**	**$ 40.030.034,00**			**75 días**	**vie 2/08/24**	**jue 7/11/24**
171	**12.1**	**CUBIERTA**	**$ 4.854.612,00**			**17 días**	**vie 2/08/24**	**lun 26/08/24**
172	12.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 1 A 3 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTR	$ 4.408.273,00	174CC+2 días	173CC+5 días;221	14 días	lun 5/08/24	sáb 24/08/24
173	12.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	$ 177.964,00	172CC+5 días	187	10 días	lun 12/08/24	lun 26/08/24
174	12.1.3	MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE ADECUACION DE REJILLAS, REGISTRO DE INSPECCION 40X40 DE INSPECCION, TOMA DE FUGAS.	$ 268.375,00	169CC	172CC+2 días;189	10 días	vie 2/08/24	jue 15/08/24
175	**12.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 0,00**			**0 días**	**vie 2/08/24**	**vie 2/08/24**
176	12.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA	$ 0,00	169CC		0 días	vie 2/08/24	vie 2/08/24

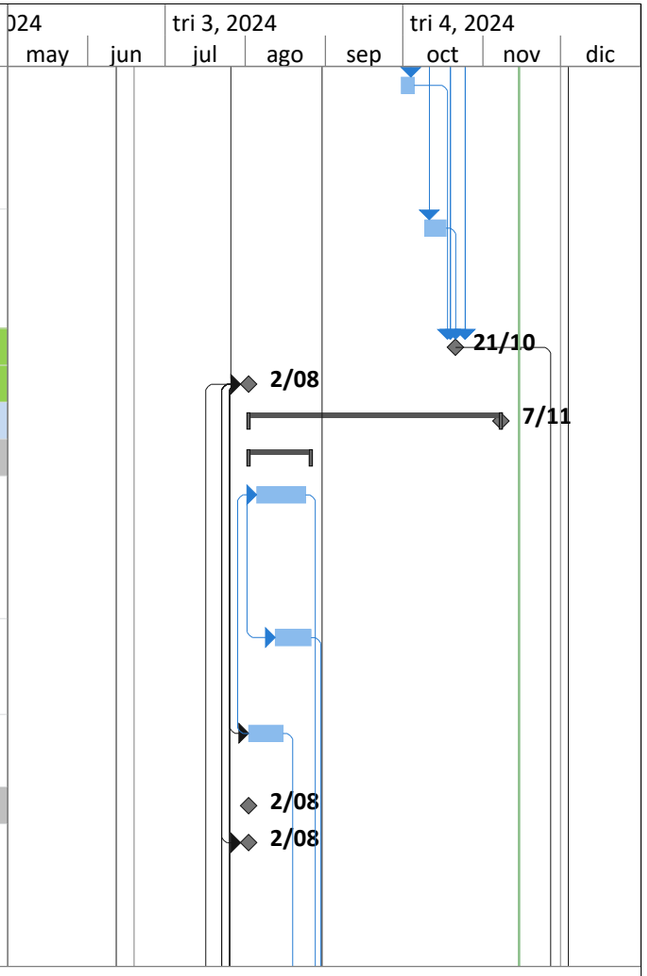

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
177	12.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE. DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA	$ 0,00	169CC		0 días	vie 2/08/24	vie 2/08/24
178	**12.3**	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 494.858,00**			**6 días**	**mar 15/10/24**	**mié 23/10/24**
179	12.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	$ 494.858,00	185	222	6 días	mar 15/10/24	mié 23/10/24
180	**12.4**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 3.225.696,00**			**10 días**	**mié 28/08/24**	**mar 10/09/24**
181	12.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	$ 512.496,00	220CC+2 días	182	5 días	mié 28/08/24	mar 3/09/24
182	12.4.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 2.713.200,00	181	184;215	5 días	mar 3/09/24	mar 10/09/24
183	**12.5**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 13.802.016,00**			**54 días**	**lun 26/08/24**	**vie 1/11/24**
184	12.5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 2.475.236,00	182	185	14 días	mar 10/09/24	jue 26/09/24
185	12.5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 6.455.062,00	184	186;179	14 días	jue 26/09/24	mar 15/10/24
186	12.5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 2.364.067,00	185	208	14 días	mar 15/10/24	vie 1/11/24

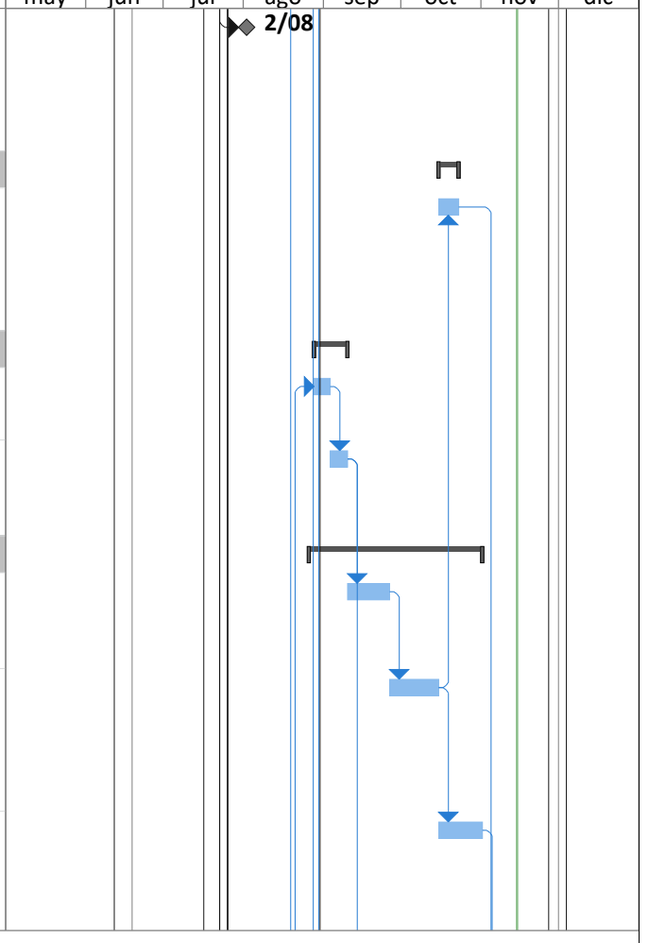

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
187	12.5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 2.507.651,00	173	220CC	12 días	lun 26/08/24	mar 10/09/24
188	**12.6**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**$ 128.873,00**			**7 días**	**jue 15/08/24**	**lun 26/08/24**
189	12.6.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	$ 128.873,00	174	222	7 días	jue 15/08/24	lun 26/08/24
190	**12.7**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**$ 541.961,00**			**14 días**	**vie 2/08/24**	**jue 22/08/24**
191	12.7.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 83.079,00	197CC	196CC	8 días	sáb 10/08/24	jue 22/08/24
192	12.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	169CC		0 días	vie 2/08/24	vie 2/08/24
193	12.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	169CC		0 días	vie 2/08/24	vie 2/08/24
194	12.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	169CC		0 días	vie 2/08/24	vie 2/08/24
195	12.7.5	MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA.	$ 207.435,00	204	197CC	6 días	sáb 10/08/24	mar 20/08/24
196	12.7.6	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 147.729,00	191CC	222	6 días	sáb 10/08/24	mar 20/08/24
197	12.7.7	MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y	$ 103.718,00	195CC	222;191CC	6 días	sáb 10/08/24	mar 20/08/24
198	**12.8**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 1.484.435,00**			**3 días**	**lun 26/08/24**	**jue 29/08/24**
199	12.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 20X20 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE	$ 82.696,00	220CC	200CC	3 días	lun 26/08/24	jue 29/08/24
200	12.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE	$ 1.235.593,00	199CC	201CC	3 días	lun 26/08/24	jue 29/08/24

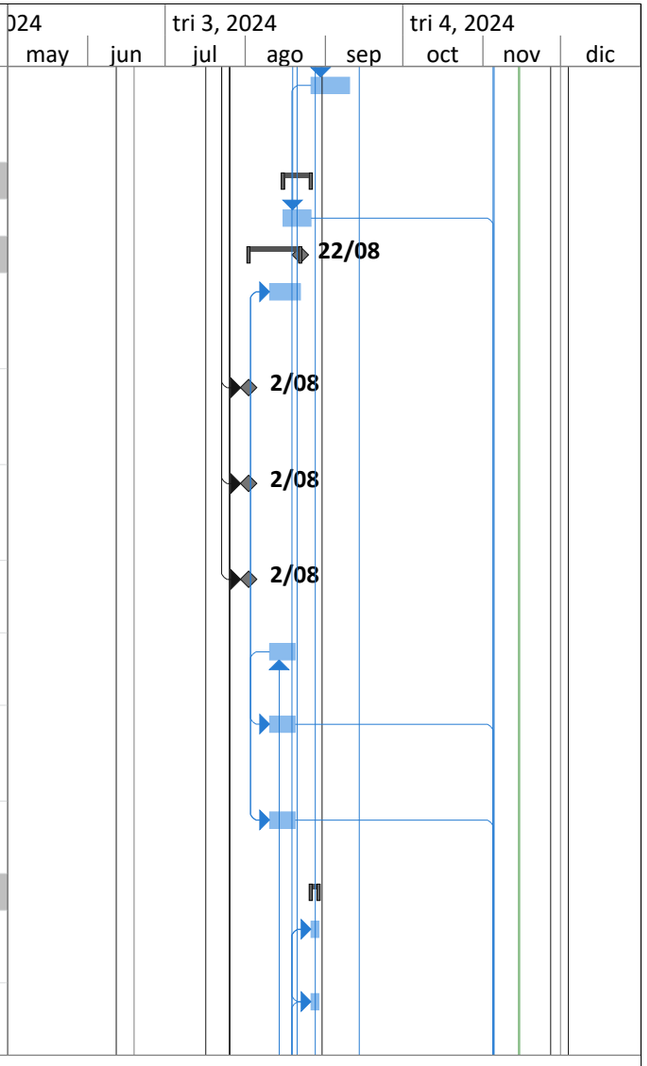

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
201	12.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 18 W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 166.146,00	200CC	222	3 días	lun 26/08/24	jue 29/08/24
202	**12.9**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 672.641,00**			**6 días**	**vie 2/08/24**	**sáb 10/08/24**
203	12.9.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO(CERTIFICADO DECRETO 1575	$ 431.879,00	169CC	204CC+1 día	5 días	vie 2/08/24	vie 9/08/24
204	12.9.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	$ 240.762,00	203CC+1 día	195	5 días	sáb 3/08/24	sáb 10/08/24
205	**12.10**	**IMPERMEABILIZACION DE JARDINERA**	**$ 798.545,00**			**4 días**	**mar 3/09/24**	**lun 9/09/24**
206	12.10.1	IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO DE 3 M.M (INCLUYE EXCAVACION, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN NECESARIA DE LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, GEOTEXTIL DE SEPARACION Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUN	$ 798.545,00	220	222	4 días	mar 3/09/24	lun 9/09/24
207	**12.11**	**CARPINTERIA METALICA**	**$ 1.555.850,00**			**4 días**	**vie 1/11/24**	**jue 7/11/24**
208	12.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 2.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 1.555.850,00	186	222	4 días	vie 1/11/24	jue 7/11/24
209	**12.12**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 500.506,00**			**10 días**	**vie 2/08/24**	**jue 15/08/24**
210	12.12.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	$ 229.560,00	169CC	211	5 días	vie 2/08/24	vie 9/08/24
211	12.12.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO MEJORADO CON CEMENTO	$ 270.946,00	210	222;216;219CC	5 días	vie 9/08/24	jue 15/08/24
212	**12.13**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 11.970.041,00**			**32 días**	**vie 2/08/24**	**vie 13/09/24**
213	12.13.1	PISA TECHO EN CONCRETO 2500 PSI	$ 194.510,00	221	222	4 días	sáb 31/08/24	jue 5/09/24
214	12.13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA TRAFICO	$ 457.373,00	169CC	222	5 días	vie 2/08/24	vie 9/08/24
215	12.13.3	PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PARA PROTECTORES METALICOS	$ 776.314,00	182	222	3 días	mar 10/09/24	vie 13/09/24
216	12.13.4	TABLETA GRES LISO DE 30 X 30 - MORTERO 1:4, JUNTA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 2.252.718,00	211	217	6 días	jue 15/08/24	sáb 24/08/24
217	12.13.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 1.076.014,00	216	218CC	6 días	sáb 24/08/24	sáb 31/08/24
218	12.13.6	ENCHAPE PARED 20 X 30 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 420.613,00	217CC	222	6 días	sáb 24/08/24	sáb 31/08/24

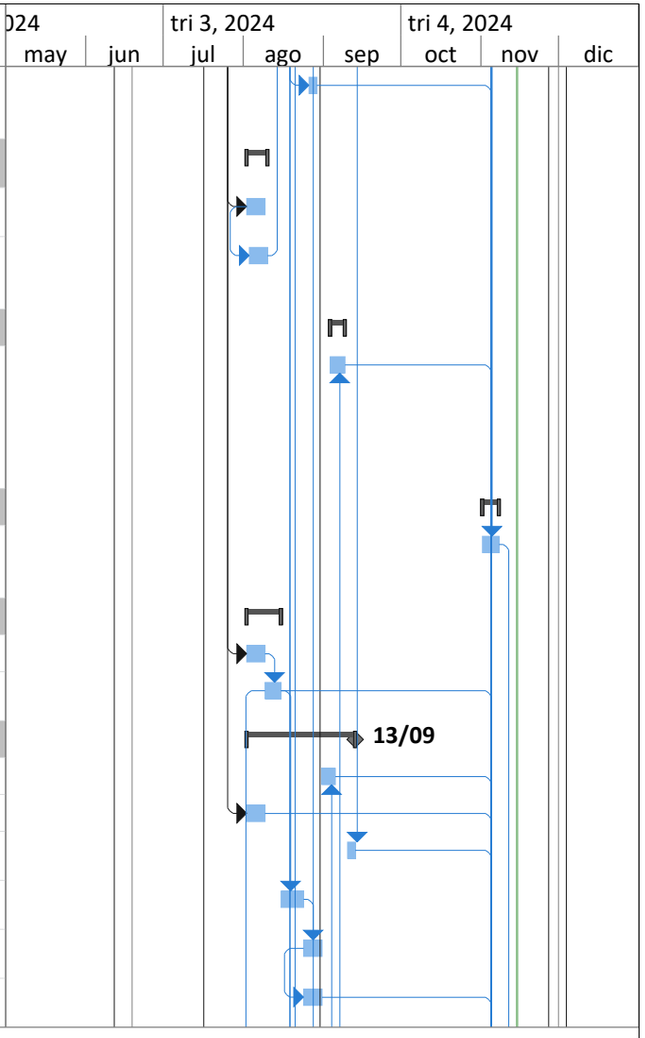

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
219	12.13.7	CUNETA EN CONCRETO DE 3,000 PSI DESARROLLO 60 CM E=10 CM	$ 2.404.471,00	211CC	222	5 días	vie 9/08/24	jue 15/08/24
220	12.13.8	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 3.601.733,00	187CC	199CC;206;181CC días	7 días	lun 26/08/24	mar 3/09/24
221	12.13.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	$ 786.295,00	172	213	6 días	sáb 24/08/24	sáb 31/08/24
222	**13**	**FIN SAN BENITO ABAD**	**$ 0,00**	**208;206;201;197;179;**	**366**	**0 días**	**jue 7/11/24**	**jue 7/11/24**
223	**14**	**INICIO CAIMITO**	**$ 0,00**	**323CC+2 días**	**228CC;242CC;260**	**0 días**	**mar 23/07/24**	**mar 23/07/24**
224	**15**	**PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO**	**$ 59.172.673,00**			**21 días**	**mar 23/07/24**	**mié 21/08/24**
225	**15.1**	**CUBIERTA**	**$ 7.325.932,00**			**17 días**	**mar 23/07/24**	**mié 14/08/24**
226	15.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAL EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 1 A 3 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCC	$ 2.721.848,00	228	274CC+3 días	9 días	vie 2/08/24	mié 14/08/24
227	15.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	$ 0,00	223CC		0 días	mar 23/07/24	mar 23/07/24
228	15.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA EN ETERNIT, INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 1.945.837,00	223CC	226;229	8 días	mar 23/07/24	vie 2/08/24
229	15.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA PLANA ETERNIT , INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 2.658.247,00	228	275	7 días	vie 2/08/24	lun 12/08/24
230	**15.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 0,00**			**0 días**	**mar 23/07/24**	**mar 23/07/24**

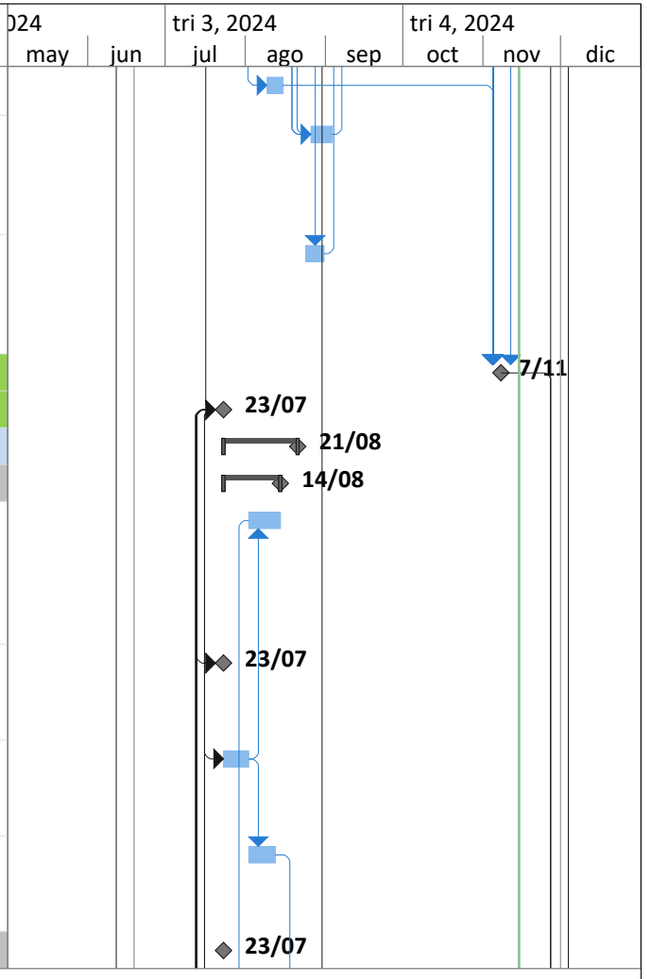

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
231	15.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA	$ 0,00	223CC		0 días	mar 23/07/24	mar 23/07/24
232	**15.3**	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**$ 549.842,00**			**2 días**	**mar 13/08/24**	**jue 15/08/24**
233	15.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	$ 549.842,00	240	275	2 días	mar 13/08/24	jue 15/08/24
234	**15.4**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 3.528.915,00**			**3 días**	**jue 1/08/24**	**lun 5/08/24**
235	15.4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDENCIAS METALICA CON CAMBIO DE CERRADURA; INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	$ 220.309,00	237CC	236CC	3 días	jue 1/08/24	lun 5/08/24
236	15.4.2	MANTENIMIENTO DE PUERTADE ACCESO A DEPENDENCIAS EN MADERA ENTAMBORADA INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O	$ 595.406,00	235CC	239;244	3 días	jue 1/08/24	lun 5/08/24
237	15.4.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 2.713.200,00	273	235CC;269	3 días	jue 1/08/24	lun 5/08/24
238	**15.5**	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 15.036.413,00**			**17 días**	**mar 23/07/24**	**mié 14/08/24**
239	15.5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 4.003.343,00	236	240CC	5 días	lun 5/08/24	lun 12/08/24
240	15.5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 6.314.703,00	239CC	233	6 días	lun 5/08/24	mar 13/08/24

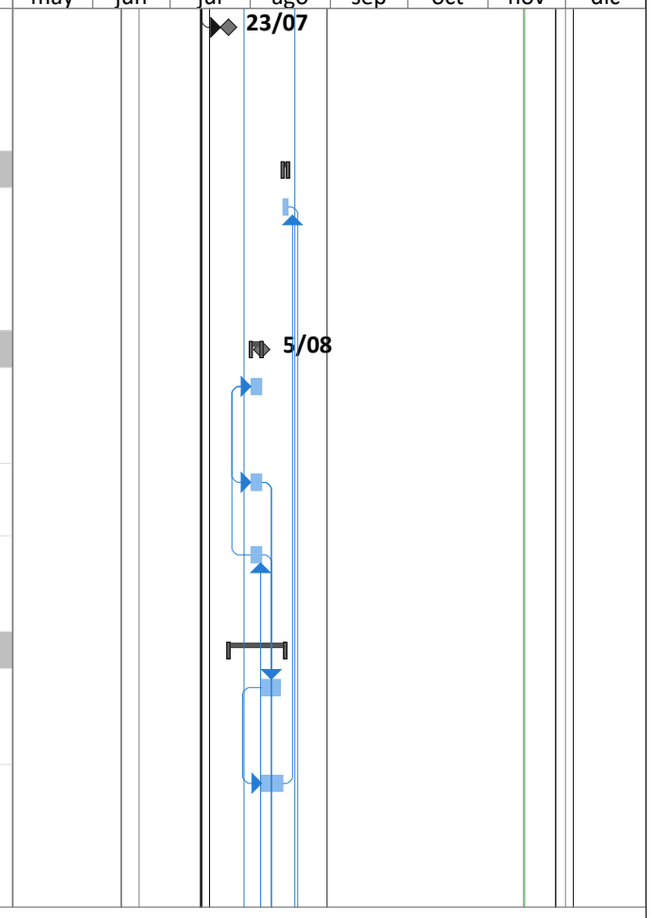

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
241	15.5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 1.897.965,00	257	275	4 días	vie 9/08/24	mié 14/08/24
242	15.5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 2.820.402,00	223CC	273CC;271	8 días	mar 23/07/24	vie 2/08/24
243	**15.6**	**CARPINTERIA METALICA**	**$ 4.148.934,00**			**4 días**	**lun 5/08/24**	**sáb 10/08/24**
244	15.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 2.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 4.148.934,00	236	275	4 días	lun 5/08/24	sáb 10/08/24
245	**15.7**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**$ 361.190,00**			**8 días**	**mar 23/07/24**	**vie 2/08/24**
246	15.7.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 109.743,00	260CC+2 días;264CC	247	2 días	jue 25/07/24	lun 29/07/24
247	15.7.2	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 147.729,00	246	248	2 días	lun 29/07/24	mié 31/07/24
248	15.7.3	MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA.	$ 103.718,00	247	275	2 días	mié 31/07/24	vie 2/08/24
249	15.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	223CC		0 días	mar 23/07/24	mar 23/07/24
250	15.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	223CC		0 días	mar 23/07/24	mar 23/07/24
251	15.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	223CC		0 días	mar 23/07/24	mar 23/07/24
252	**15.8**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 5.680.196,00**			**13 días**	**mar 23/07/24**	**vie 9/08/24**

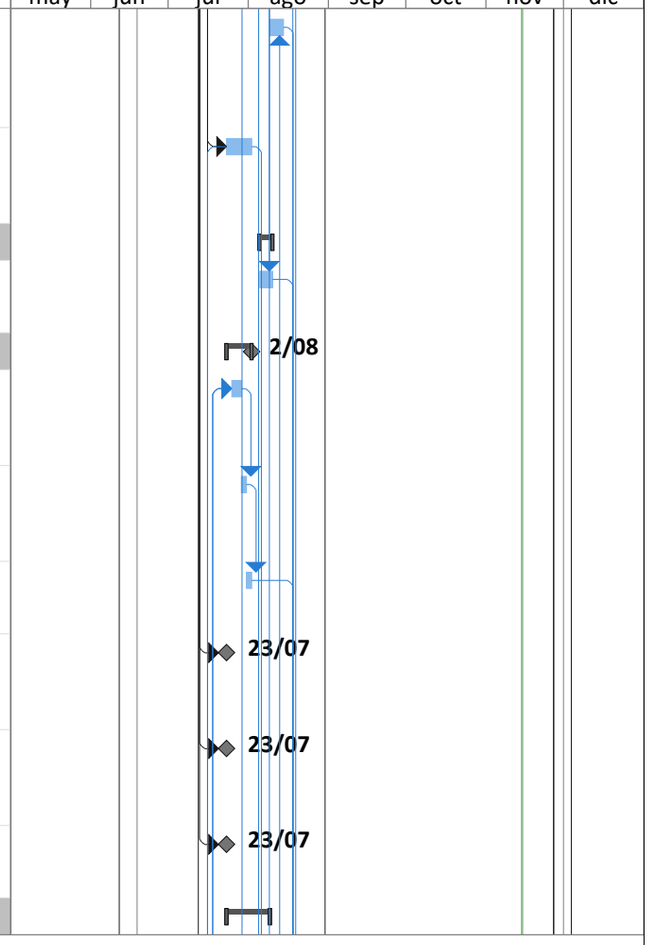

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
253	15.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL RECTANGULAR INCRUSTADO LED 120X30 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 2.165.778,00	262CC+2 días	254CC	4 días	sáb 3/08/24	vie 9/08/24
254	15.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE	$ 1.544.491,00	253CC	255CC	4 días	sáb 3/08/24	vie 9/08/24
255	15.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 18 W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 110.764,00	254CC	256CC	4 días	sáb 3/08/24	vie 9/08/24
256	15.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 24 W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 839.360,00	255CC	257CC	4 días	sáb 3/08/24	vie 9/08/24
257	15.8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 927.312,00	256CC	241	4 días	sáb 3/08/24	vie 9/08/24
258	15.8.6	SUMISNISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI DOBLE A 125V INCLUYE DESMONTES DE LOS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 92.491,00	273CC	275	4 días	mar 23/07/24	lun 29/07/24
259	**15.9**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 309.875,00**			**5 días**	**mar 23/07/24**	**mar 30/07/24**
260	15.9.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO(CERTIFICADO DECRETO 1575 DE	$ 309.875,00	223CC	246CC+2 días	5 días	mar 23/07/24	mar 30/07/24
261	**15.10**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 508.237,00**			**9 días**	**jue 1/08/24**	**mar 13/08/24**
262	15.10.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTUR	$ 508.237,00	273	253CC+2 días	9 días	jue 1/08/24	mar 13/08/24
263	**15.11**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 21.723.139,00**			**21 días**	**mar 23/07/24**	**mié 21/08/24**
264	15.11.1	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	$ 178.892,00	223CC	246CC	5 días	mar 23/07/24	mar 30/07/24
265	15.11.2	PISA TECHO EN CONCRETO 2500 PSI	$ 250.084,00	274CC	266CC	5 días	mar 6/08/24	mar 13/08/24
266	15.11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC DE 3" (AMAZONA) INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	$ 1.115.342,00	265CC	267CC	5 días	mar 6/08/24	mar 13/08/24
267	15.11.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC DE 3" (AMAZONA) INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	$ 482.643,00	266CC	268	5 días	mar 6/08/24	mar 13/08/24
268	15.11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA TRAFICO	$ 439.794,00	267	275	5 días	mar 13/08/24	mié 21/08/24

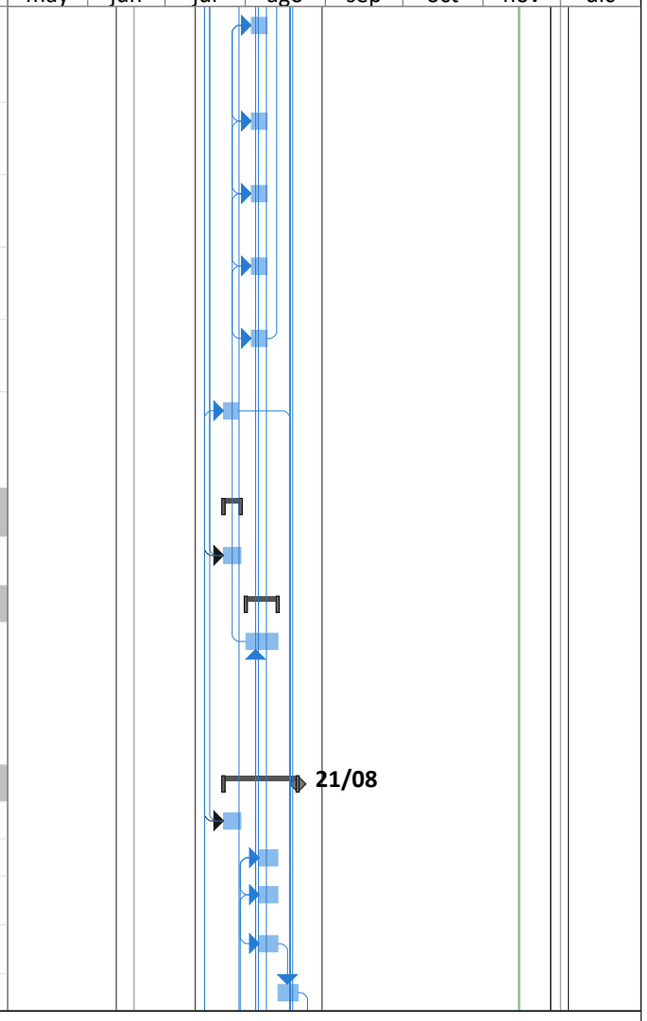

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
269	15.11.6	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 5.341.221,00	237	270CC	6 días	lun 5/08/24	mar 13/08/24
270	15.11.7	VENTANAS SERIE 744 ALUMINIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 807.626,00	269CC	275	4 días	lun 5/08/24	sáb 10/08/24
271	15.11.8	TABLETA GRES LISO DE 30 X 30 - MORTERO 1:4, JUNTA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 7.238.345,00	242	272CC	5 días	vie 2/08/24	vie 9/08/24
272	15.11.9	GUARDAESCOBA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 1.995.698,00	271CC	275	5 días	vie 2/08/24	vie 9/08/24
273	15.11.10	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 3.087.199,00	242CC	237;262;258CC	7 días	mar 23/07/24	jue 1/08/24
274	15.11.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	$ 786.295,00	226CC+3 días	275;265CC	5 días	mar 6/08/24	mar 13/08/24
275	**16**	**FIN CAIMITO**	**$ 0,00**	**241;244;248;258;274;**	**366**	**0 días**	**mié 21/08/24**	**mié 21/08/24**
276	**17**	**INICIO SUCRE**	**$ 0,00**	**51CC+5 días**	**279CC;297CC+2 d**	**0 días**	**vie 13/09/24**	**vie 13/09/24**
277	**18**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE**	**$ 82.902.222,00**			**30 días**	**vie 13/09/24**	**mar 22/10/24**
278	**18.1**	**CUBIERTA**	**$ 18.928.668,00**			**18 días**	**vie 13/09/24**	**sáb 5/10/24**
279	18.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR , INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 1.499.733,00	276CC	280CC;283CC	11 días	vie 13/09/24	jue 26/09/24
280	18.1.2	MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE ADECUACION DE REJILLAS, REGISTRO DE INSPECCION 40X40 DE INSPECCION, TOMA DE FUGAS.	$ 3.757.254,00	279CC	281	9 días	vie 13/09/24	mar 24/09/24
281	18.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 1 A 3 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTR	$ 13.671.681,00	280	314CC	9 días	mar 24/09/24	sáb 5/10/24
282	**18.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 1.704.040,00**			**4 días**	**vie 13/09/24**	**mié 18/09/24**

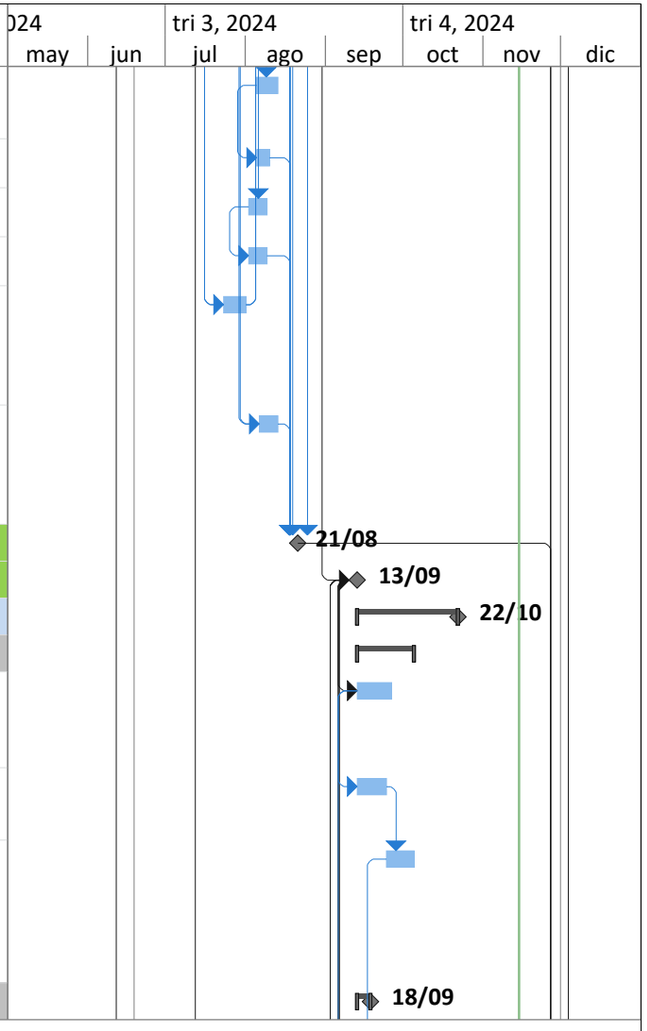

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
283	18.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA	$ 1.704.040,00	279CC	320	4 días	vie 13/09/24	mié 18/09/24
284	18.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 18.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COBRE 1	$ 0,00	276CC		0 días	vie 13/09/24	vie 13/09/24
285	**18.3**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 4.143.096,00**			**12 días**	**lun 16/09/24**	**mar 1/10/24**
286	18.3.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	$ 783.880,00	296CC	287	6 días	lun 16/09/24	lun 23/09/24
287	18.3.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDENCIAS METALICA CON CAMBIO DE CERRADURA; INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	$ 207.347,00	286	288CC	6 días	lun 23/09/24	mar 1/10/24
288	18.3.3	MANTENIMIENTO PUERTA METALICA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HOJA EN VIDRIO TRANSPARENTE ESMERILADO 5MM CON SELLO DE SILICONA	$ 438.669,00	287CC	289CC	6 días	lun 23/09/24	mar 1/10/24
289	18.3.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 2.713.200,00	288CC	293;291CC;313	6 días	lun 23/09/24	mar 1/10/24
290	**18.4**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 3.388.248,00**			**7 días**	**lun 23/09/24**	**mié 2/10/24**
291	18.4.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTUR	$ 3.388.248,00	289CC	295;306CC	7 días	lun 23/09/24	mié 2/10/24
292	**18.5**	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 38.863.948,00**			**28 días**	**lun 16/09/24**	**mar 22/10/24**
293	18.5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 2.993.640,00	289	294	8 días	mar 1/10/24	jue 10/10/24

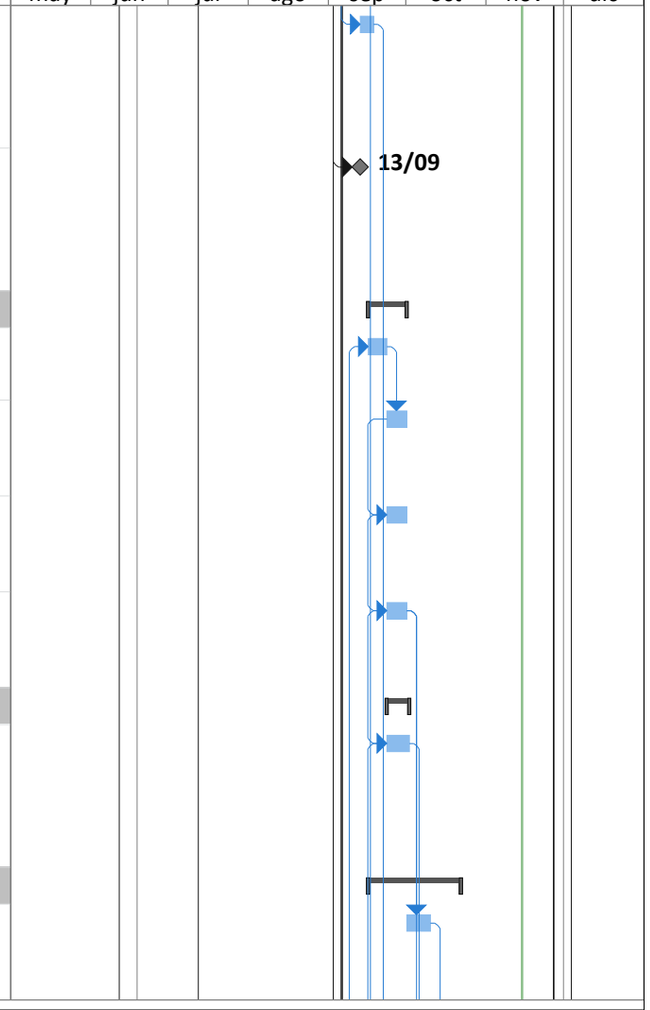

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
294	18.5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 16.411.834,00	293	322	8 días	jue 10/10/24	mar 22/10/24
295	18.5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 4.547.093,00	291	322;319	8 días	mié 2/10/24	vie 11/10/24
296	18.5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 8.523.258,00	321CC	286CC	8 días	lun 16/09/24	mié 25/09/24
297	18.5.5	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 6.388.123,00	276CC+2 días	321CC	8 días	lun 16/09/24	mié 25/09/24
298	**18.6**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**$ 389.912,00**			**11 días**	**vie 13/09/24**	**jue 26/09/24**
299	18.6.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 138.465,00	311	303CC	3 días	lun 23/09/24	jue 26/09/24
300	18.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	276CC		0 días	vie 13/09/24	vie 13/09/24
301	18.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	276CC		0 días	vie 13/09/24	vie 13/09/24
302	18.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	276CC		0 días	vie 13/09/24	vie 13/09/24
303	18.6.5	MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y	$ 103.718,00	299CC	304CC	3 días	lun 23/09/24	jue 26/09/24

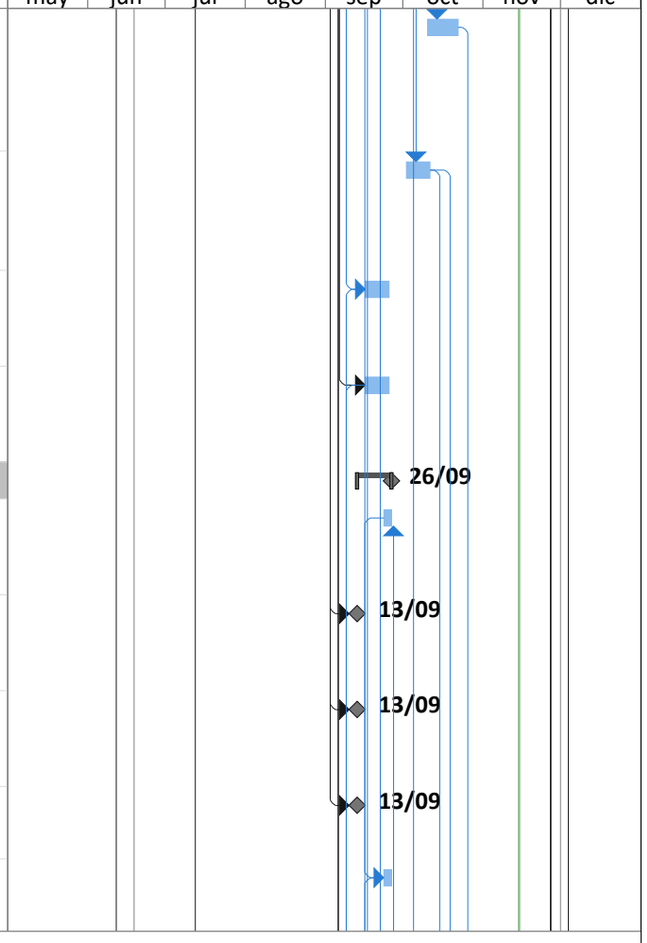

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
304	18.6.6	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 147.729,00	303CC	322	3 días	lun 23/09/24	jue 26/09/24
305	**18.7**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 3.426.460,00**			**10 días**	**lun 23/09/24**	**sáb 5/10/24**
306	18.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 24W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 698.267,00	291CC	307	5 días	lun 23/09/24	lun 30/09/24
307	18.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL RECTANGULAR INCRUSTADO LED 120X30 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 2.728.193,00	306	322	5 días	lun 30/09/24	sáb 5/10/24
308	**18.8**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 1.029.459,00**			**8 días**	**vie 13/09/24**	**lun 23/09/24**
309	18.8.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE	$ 426.373,00	276CC	310CC	4 días	vie 13/09/24	mié 18/09/24
310	18.8.2	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO (CERTIFICADO DECRETO 1575	$ 409.774,00	309CC	311	4 días	vie 13/09/24	mié 18/09/24
311	18.8.3	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	$ 193.312,00	310	299	4 días	mié 18/09/24	lun 23/09/24
312	**18.9**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 1.896.404,00**			**8 días**	**mar 24/09/24**	**vie 4/10/24**
313	18.9.1	APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA PARA SELLADO DE JUNTAS DE MARCOS DE VENTANAS	$ 97.597,00	289	315CC	3 días	mar 1/10/24	vie 4/10/24
314	18.9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 3 A 5 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTR	$ 1.403.064,00	281CC	322	7 días	mar 24/09/24	jue 3/10/24
315	18.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO PARA VENTANA	$ 395.743,00	313CC	322;318	3 días	mar 1/10/24	vie 4/10/24
316	**18.10**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 9.131.987,00**			**30 días**	**vie 13/09/24**	**mar 22/10/24**
317	18.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA TRAFICO	$ 424.071,00	276CC	322	8 días	vie 13/09/24	lun 23/09/24
318	18.10.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA VENTANA EN ALUMINIO INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y RODAMIENTOS.	$ 1.272.384,00	315	322	7 días	vie 4/10/24	sáb 12/10/24
319	18.10.3	EMBOQUILLADO ENCHAPE PARED Y PISO CERAMICO	$ 21.240,00	295	322	7 días	vie 11/10/24	mar 22/10/24

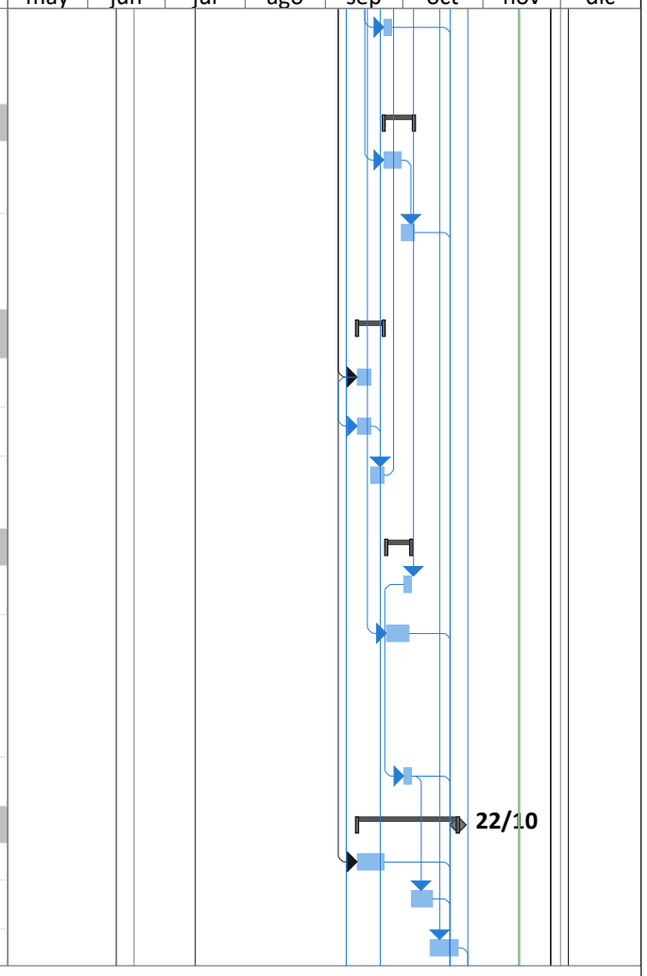

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
320	18.10.4	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 12.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TUBERÍAS DE COBRE 10 MTRS 5/8" Y 3/8", AISLAM	$ 1.239.894,00	283	322	5 días	mié 18/09/24	mar 24/09/24
321	18.10.5	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 6.174.398,00	297CC	296CC	8 días	lun 16/09/24	mié 25/09/24
322	**19**	**FIN SUCRE**	**$ 0,00**	**320;314;315;307;304;**	**366**	**0 días**	**mar 22/10/24**	**mar 22/10/24**
323	**20**	**INICIO SAN MARCOS**	**$ 0,00**	**1CC+15 días**	**331CC;349CC;326**	**0 días**	**vie 19/07/24**	**vie 19/07/24**
324	**21**	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN MARCOS**	**$ 153.937.904,00**			**40 días**	**vie 19/07/24**	**mié 11/09/24**
325	**21.1**	**CUBIERTA**	**$ 22.479.201,00**			**20 días**	**vie 19/07/24**	**jue 15/08/24**
326	21.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 3 A 5 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTR	$ 22.479.201,00	323CC	364	20 días	vie 19/07/24	jue 15/08/24
327	**21.2**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**$ 0,00**			**0 días**	**vie 19/07/24**	**vie 19/07/24**
328	21.2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA	$ 0,00	323CC		0 días	vie 19/07/24	vie 19/07/24
329	21.2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA	$ 0,00	323CC		0 días	vie 19/07/24	vie 19/07/24
330	**21.3**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**$ 4.424.817,00**			**12 días**	**vie 19/07/24**	**lun 5/08/24**

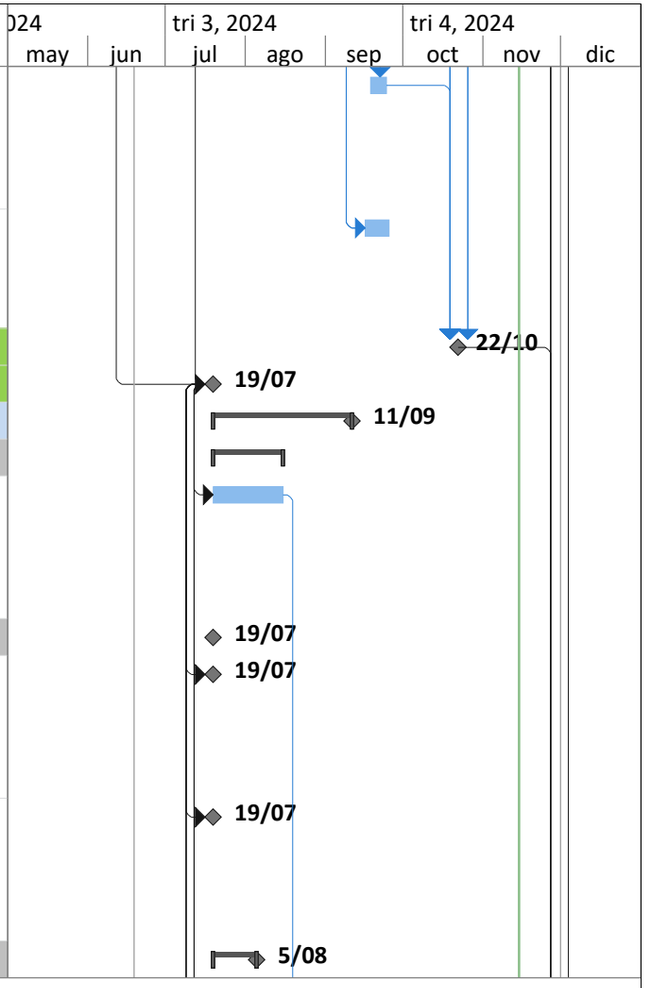

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
331	21.3.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS CON SUMINISTRO DE CERRADURA, INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	$ 152.016,00	323CC	338;332	6 días	vie 19/07/24	lun 29/07/24
332	21.3.2	MANTENIMIENTO PUERTA METALICA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HOJA EN VIDRIO TRANSPARENTE ESMERILADO 5MM CON SELLO DE SILICONA	$ 1.559.601,00	331	333CC	6 días	lun 29/07/24	lun 5/08/24
333	21.3.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	$ 2.713.200,00	332CC	352;359CC	5 días	lun 29/07/24	sáb 3/08/24
334	**21.4**	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**$ 70.515.294,00**			**34 días**	**lun 29/07/24**	**mié 11/09/24**
335	21.4.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 13.756.405,00	363	365	9 días	sáb 3/08/24	jue 15/08/24
336	21.4.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 22.643.764,00	339	354	9 días	vie 2/08/24	mié 14/08/24
337	21.4.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	$ 11.354.234,00	354	365	8 días	sáb 31/08/24	mié 11/09/24
338	21.4.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 3.672.493,00	331	363CC	7 días	lun 29/07/24	mar 6/08/24
339	21.4.5	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 19.088.398,00	363CC	336	4 días	lun 29/07/24	vie 2/08/24
340	**21.5**	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**$ 701.587,00**			**19 días**	**vie 19/07/24**	**mié 14/08/24**

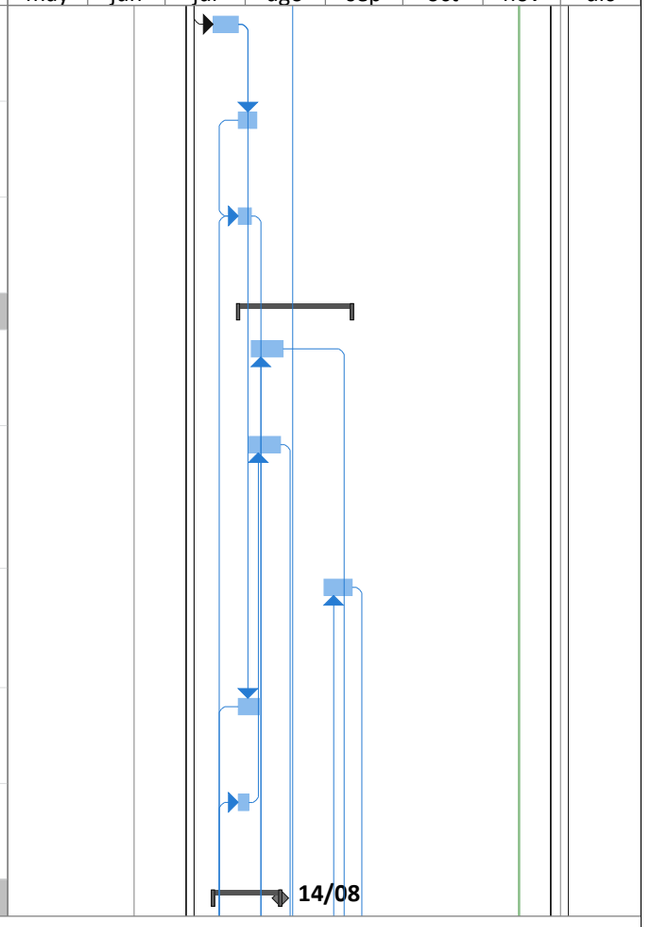

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	


Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
341	21.5.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 553.858,00	350;358	345CC	8 días	sáb 3/08/24	mié 14/08/24
342	21.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	323CC		0 días	vie 19/07/24	vie 19/07/24
343	21.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	323CC		0 días	vie 19/07/24	vie 19/07/24
344	21.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 0,00	323CC		0 días	vie 19/07/24	vie 19/07/24
345	21.5.5	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	$ 147.729,00	341CC	365	6 días	sáb 3/08/24	lun 12/08/24
346	**21.6**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 4.633.474,00**			**8 días**	**sáb 31/08/24**	**mié 11/09/24**
347	21.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	$ 4.633.474,00	354	365	8 días	sáb 31/08/24	mié 11/09/24
348	**21.7**	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**$ 1.104.517,00**			**11 días**	**vie 19/07/24**	**sáb 3/08/24**
349	21.7.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE	$ 863.755,00	323CC	350CC+5 días	6 días	vie 19/07/24	lun 29/07/24
350	21.7.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	$ 240.762,00	349CC+5 días	365;341	6 días	vie 26/07/24	sáb 3/08/24
351	**21.8**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**$ 7.574.408,00**			**6 días**	**sáb 3/08/24**	**lun 12/08/24**
352	21.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	$ 7.574.408,00	333	365	6 días	sáb 3/08/24	lun 12/08/24
353	**21.9**	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**$ 1.694.124,00**			**13 días**	**mié 14/08/24**	**sáb 31/08/24**

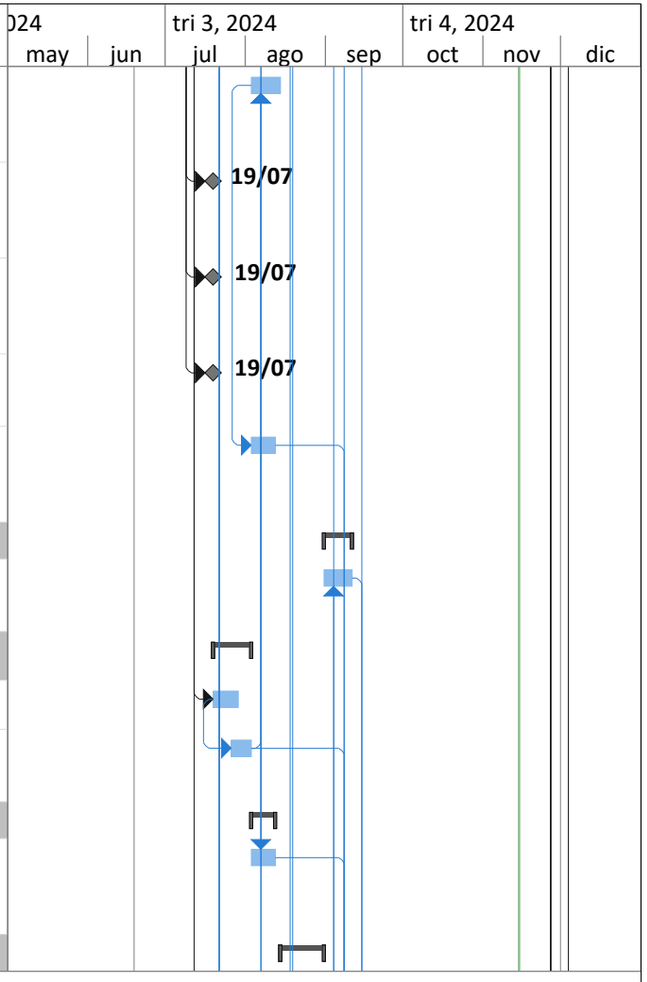

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	

Id	EDT	Task Name	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
354	21.9.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTUR	$ 1.694.124,00	336	337;347;356	13 días	mié 14/08/24	sáb 31/08/24
355	**21.10**	**CARPINTERIA METALICA**	**$ 4.228.715,00**			**3 días**	**sáb 31/08/24**	**mié 4/09/24**
356	21.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 2.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	$ 4.228.715,00	354	365	3 días	sáb 31/08/24	mié 4/09/24
357	**21.11**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 36.581.767,00**			**38 días**	**vie 19/07/24**	**lun 9/09/24**
358	21.11.1	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	$ 238.522,00	323CC	341	11 días	vie 19/07/24	sáb 3/08/24
359	21.11.2	DESMONTE Y REINSTALACION DE PROTECTOR METALICO Y VENTANA EN ALUMINIO	$ 4.922.791,00	333CC	360	5 días	lun 29/07/24	sáb 3/08/24
360	21.11.3	PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PARA PROTECTORES METALICOS	$ 1.810.948,00	359	361	6 días	sáb 3/08/24	lun 12/08/24
361	21.11.4	TABLETA GRES LISO DE 30 X 30 - MORTERO 1:4, JUNTA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 14.476.691,00	360	362	5 días	lun 12/08/24	mar 20/08/24
362	21.11.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO LAVADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 5.405.016,00	361		5 días	mar 20/08/24	lun 26/08/24
363	21.11.6	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD, ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	$ 8.810.454,00	338CC	339CC;335	5 días	lun 29/07/24	sáb 3/08/24
364	21.11.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	$ 917.345,00	326	365	18 días	jue 15/08/24	lun 9/09/24
365	**22**	**FIN SAN MARCOS**	**$ 0,00**	**364;350;347;352;335;**	**366**	**0 días**	**mié 11/09/24**	**mié 11/09/24**
366	**23**	**FIN DEL PROYECTO**	**$ 0,00**	**121;168;222;275;322;**		**0 días**	**sáb 30/11/24**	**sáb 30/11/24**

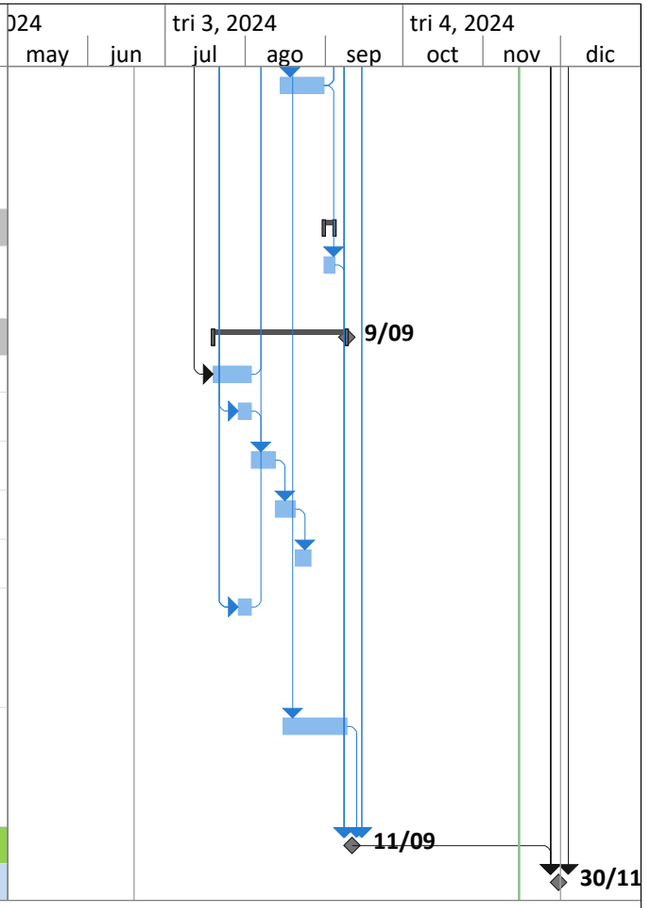

Project: ADECUACIONES Y REPAR
Date: vie 15/11/24

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only		
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline		
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		
Project Summary	Inactive Summary	Start-only			
