Alcaldía de IBAGUÉ

INFORME MENSUAL

No. 4009 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO

CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

IBAGUÉ– TOLIMA

Enero del 2025

Alcaldía de IBAGUÉ

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 4
2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
2.1.2 CONDICIONES INICIALES 4
2.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 5
3. CONTRATO DE OBRA 5
3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO 5
3.1.1 GENERALIDADES 5
3.1.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA 6
3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
3.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS 10
3.3 PLAZO CONTRACTUAL 11
3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO 12
4. CONCLUSIONES 15
5. ANEXOS 15
ANEXOS 16

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual tiene como finalidad documentar y evaluar el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el mes de enero en el marco del contrato suscrito para la prestación de servicios de mano de obra calificada y no calificada en el mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana del municipio de Ibagué.

Durante el periodo reportado, se han llevado a cabo diversas actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos contractuales, garantizando el adecuado mantenimiento, rehabilitación y optimización de la red vial urbana. En este sentido, este informe detalla las labores realizadas, los avances alcanzados, las dificultades presentadas y las estrategias implementadas para la continuidad eficiente del proyecto.

Asimismo, se incluyen registros fotográficos, cantidades ejecutadas asegurando la transparencia y trazabilidad de las actividades ejecutadas.


Con este informe, se busca proporcionar una visión clara y detallada de la gestión realizada, en cumplimiento de las condiciones contractuales y los lineamientos establecidos por la entidad competente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Ibagué se encuentra ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la cordillera central de los andes entre el cañón del Combeima y el valle del Magdalena en cercanías del nevado del Tolima, con coordenadas: Longitud75°12'02''-Latitud4°26'16''N. K4+850aK5+750



2.1.2 CONDICIONES INICIALES

En vista del crecimiento urbano y considerando las necesidades de mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio de Ibagué, se identifican sectores que requieren intervención para garantizar una movilidad segura y eficiente. Actualmente, algunas vías presentan deterioro significativo, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo económico de la región.

Por lo anterior, la Administración Municipal contempla la contratación de una entidad sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de mano de obra calificada y no calificada, con el propósito de ejecutar actividades orientadas al mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la conectividad del municipio.

2.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla todas las intervenciones necesarias para la ejecución de las distintas fases del proyecto que involucran las actividades relacionadas con el mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana del municipio de Ibagué.

Se hace necesaria la intervención en las diferentes fases o frentes del proyecto para dar mejor calidad de vida a cada uno de los transeúntes de la ciudad de Ibagué

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1.1 GENERALIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
OBJETO	CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
VALOR	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($656.229.349) MCTE IVA INCLUIDO SOBRE COSTOS INDIRECTOS
PLAZO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 1	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

DOCUMENTOS GENERADOS DENTRO DEL CONTRATO	
ACTA DE INICIO	23 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIO No.1	15 DE ENERO DE 2025
PRORROGA No.1	15 DE ENERO DE 2025

3.1.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA

- Un (1) director del Proyecto.
- Un (1) residente de obra.
- Un (1) auxiliar de ingeniería.
- Un (1) conductor.
- Un (1) Inspector topógrafo.
- Un (1) SST.
- Dos (2) cuadrillas: Conformadas por dos (2) oficiales, seis (6) y/o siete (7) ayudantes de obra y un (1) maestro.


3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista ejecuto la intervención de diferentes puntos de la ciudad de acuerdo a las directrices del Ingeniero asignado por la secretaria de infraestructura, realizando el cajeo, re parcheo y nivelaciones en las siguientes ubicaciones

- Intersección de la Cll. 25 x Av. Ambala y Av. Guabinal



- Cra. 3 entre Cll. 19-23

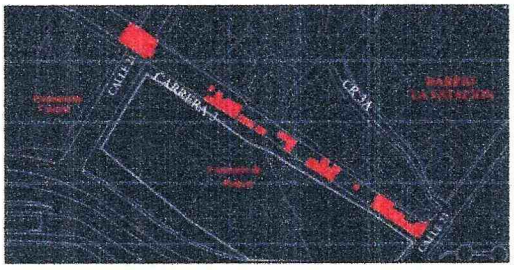


Alcaldía de IBAGUÉ


- Av. Ambala X Cll. 92



- Cll. 29 x Cra. 6




- Cll. 30 x Av. Guabinal

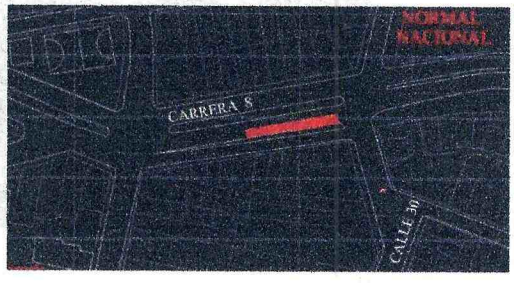


- Cll. 23 entre Cra. 3 y 4




- Cll. 29 entre Cra. 5 y 4H

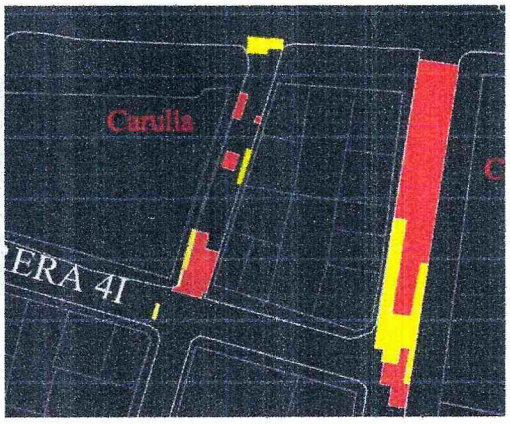

- Cll. 29 entre Cra.6 a 7

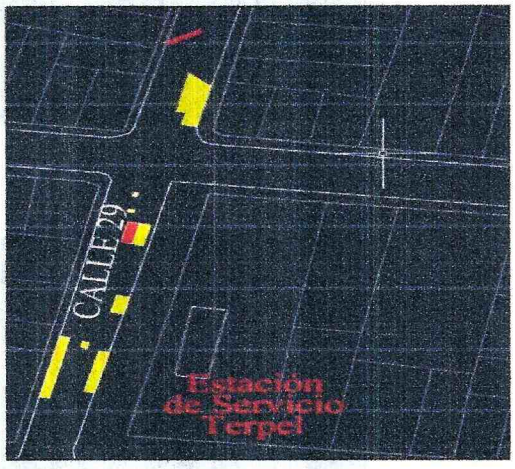


- Cll. 28A x entre Cra. 5 a 4I

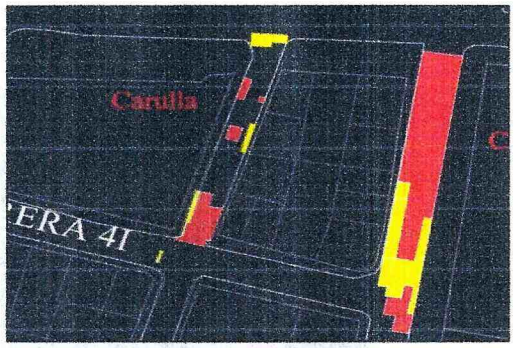


Alcaldía de
IBAGUÉ


- Cll. 31 x Cra.4F

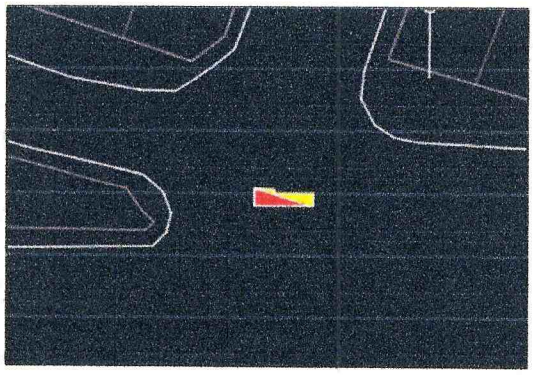

- Av. Ambala x Cll.45

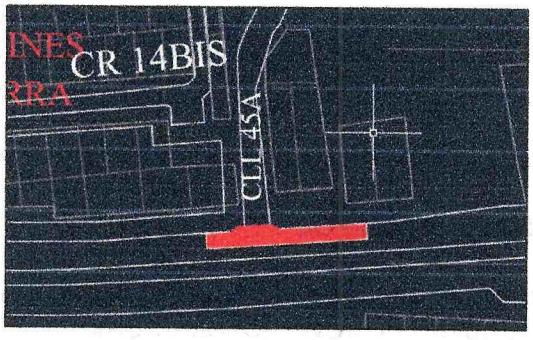

- Av. Ambala x Cll.92

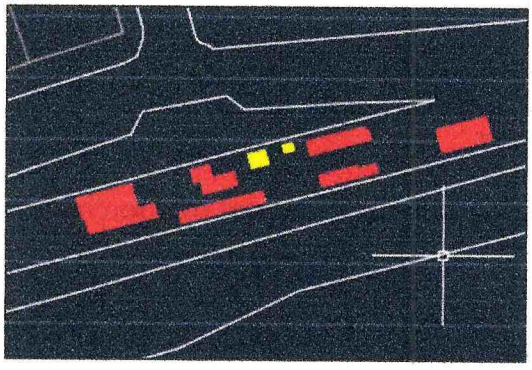

A continuación, se presenta la relación semanal de lo ejecutado:

- Semana del 15 al 18 enero

Área cajeo: 654,478 m2
Área nivelaciones: 140,213 m2
Volumen asfalto suelto: 78,01 m3
Viajes de escombros: 12 viajes

- Semana del 20 al 25 enero

Área cajeo: 1.161,70 m2
Área nivelaciones: 381,38 m2
Volumen asfalto suelto: 219,46 m3
Viajes de escombros: 21 viajes

- Semana del 27 al 31 enero

Área cajeo: 861,0981 m2
Área nivelaciones: 425,4229 m2
Volumen asfalto suelto: 184,26 m3
Viajes de escombros: 21 viajes

Se anexa Excel con las áreas, volúmenes y cantidades ejecutas (Ver anexo III).


3.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS

El contratista hace llegar al sitio de la obra los equipos necesarios para la ejecución de las actividades que requiere el proyecto tales como:

1. Una (1) Retro excavadora.
2. Dos (2) Volquetas.
3. Dos (2) Benitin.
4. Un (1) Vibro compactador.
5. Dos (2) Cortadoras de Pavimento.
6. Herramienta menor.

Los tiempos que se utilizaron esta maquinaria se encuentran en el anexo III





3.3 PLAZO CONTRACTUAL

PLAZO		DÍAS
INICIAL		8
PRORROGA No. 1		60
PLAZO TOTAL		68
ACTA	**FECHA**	**DÍAS EJECUTADOS**
INICIO	23/12/2024	
SUSPENSIÓN No.1	30/12/2024	8
REINICIO No.1	15/01/2025	8
FECHA ACTUAL	31/01/2025	17
TOTAL		**25**

3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS				
AMPAROS	**No. PÓLIZA**	**VALOR AMPARADO**	**VIGENCIA**	**ASEGURADORA**
CUMPLIMIENTO	I-100039457	$65,622,934.90	15/01/2025-21/10/2025	SEGUROS MUNDIAL
PRESTACIONES SOCIALES	I-100039457	$98,434,402.35	15/01/202521/04/2028	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	I-100039457	$65,622,934.90	15/01/2025-21/10/2025	SEGUROS MUNDIAL
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	I-100009683	$260,000,000.00	16/01/2024-21/10/2025	SEGUROS MUNDIAL

3.5 PERSONAL EN OBRA

PERSONAL	
CARGO	**NOMBRE**
MAESTRO	JUAN CARLOS ALBA QUINTERO
OFICIAL RASTRILLERO	LUIS ALBERTO BOBADILLA
OFICIAL RASTRILLERO	JOSÉ ALFREDO GIRALDO BEDOLLA
OFICIAL RASTRILLERO	SERGIO CASTELLANOS
OFICIAL RASTRILLERO	ANDRÉS FABIAN GARZÓN
OFICIAL	JOSÉ EMILIO FIGUEROA
OFICIAL	ENALBER LEAL MORENO
AYUDANTE	ALONSO GUZMÁN BELTRÁN
AYUDANTE	BRANDON STIVEN DIAZ BOBADILLA
AYUDANTE	GUILLERMO LEÓN HERNÁNDEZ
AYUDANTE	DOMINGO OLMOS
AYUDANTE	LUIS EDUARDO SALCEDO
AYUDANTE	CESAR AUGUSTO PÉREZ
AYUDANTE	JUAN CARLOS FLORES MARTÍNEZ
AYUDANTE	RAMIRO VARÓN CABIEDES
AYUDANTE	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ NARANJO
AYUDANTE	JOSÉ GREGORIO ARIAS APONTE
AYUDANTE	LEIXON DAVID CASTELLANOS GARCÍA


	CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA	
CONTROL DE PERSONAL		VERSIÓN 1


INFORMACIÓN GENERAL					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE	15-31 de enero		PLAZO	68 dias calendario	
CONTRATISTA	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS			CONTRATO No.	4009


PERSONAL DEL CONTRATISTA


FECHA / CARGO	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES	
DIRECTOR DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		
AUX INGENIERIA	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
INSPECTOR TOPOGRÁFO	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		
CONDUCTOR	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		
MAESTRO		1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
OFICIAL RASTRILLERO	2	2	2	2		2	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
OFICIAL	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2			1	1	1	1	1		
AYUDANTE DE OBRA	10	10	10	10	0	11	11	11	11	11	5		11	11	11	11	10		
INSPECTOR SST	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
PERSONAL CONTRATISTA	**20**	**21**	**21**	**21**		**22**	**23**	**23**	**23**	**23**	**8**		**23**	**23**	**23**	**23**	**22**	**TOTAL PERIODO**	**319**

3.6 GRÁFICOS DE AVANCE

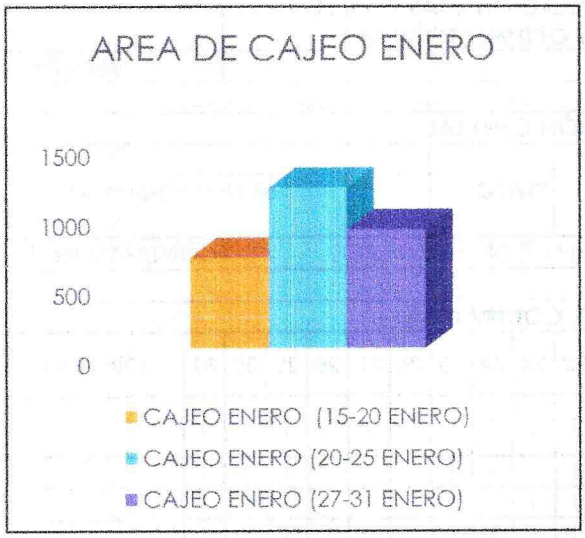

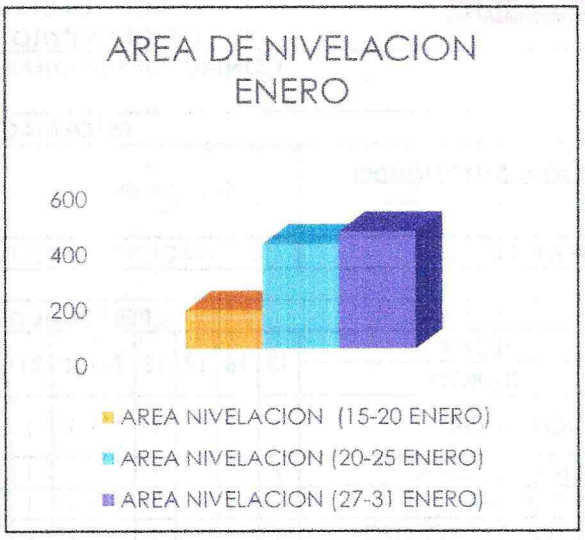

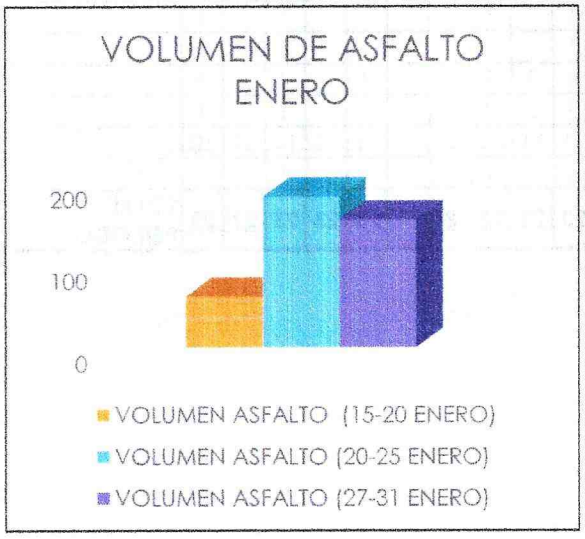

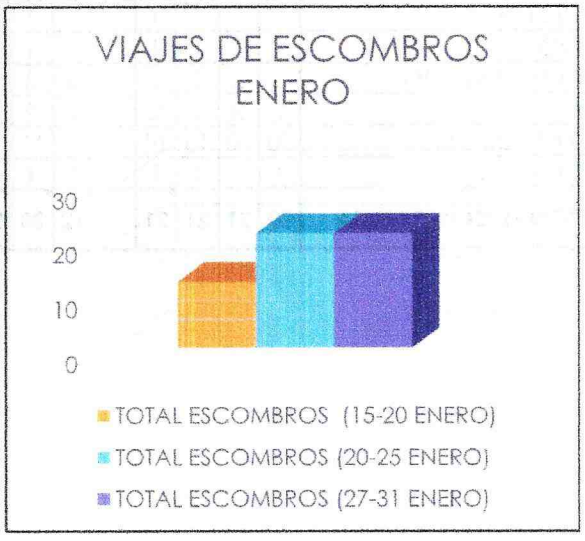

Enero

Alcaldía de IBAGUÉ

S.T.I.

4. CONCLUSIONES

- El contratista, contrato el personal profesional, técnico y operativo y administrativo requerido para dar cumplimiento al proyecto.
- EL contratista da cumplimiento a las instrucciones impartidas por la alcaldía por medio de la supervisión del ingeniero asignado por secretaria de infraestructura.
- El contratista cuenta con una oficina administrativa y campamentos móviles en sitio.

5. ANEXOS

I. Estado del tiempo.
II. Informe SST.
III. Excel de cantidades mensuales.

ING. FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Director De Obra

ANEXOS

I. Estado del tiempo

REGISTRO CLIMÁTICO DIARIO							
Obra:	CUADRILLAS 2025						
Fecha	Estado Climático	Hora		Intensidad			Observaciones
		Inicio	Fin	Baja	Media	Alta	
15/01/2025	SOLEADO						
16/01/2025	SOLEADO						
17/01/2025	SOLEADO						
18/01/2025	SOLEADO						
20/01/2025	SOLEADO						
21/01/2025	SOLEADO						
22/01/2025	SOLEADO						
23/01/2025	SOLEADO						
24/01/2025	SOLEADO						
25/01/2025	SOLEADO						
27/01/2025	SOLEADO						
28/01/2025	SOLEADO						
29/01/2025	SOLEADO						
30/01/2025	SOLEADO						
31/01/2025	SOLEADO						

II. Se anexa informe en modelo de EXCEL con el nombre "INFORME MENSUAL SST ENERO"

III. Se anexa informe en modelo de EXCEL con el nombre "INFORME MENSUAL ENERO"

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 4009 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS DE ENERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN TOTAL SUELTO
15/01/2024	CLL 25 CON AV. GUABINAL	1	0,77	3,10	2,40	0,06	0,14	
	SUB TOTAL				2,40		0,14	0,18
	CLL 25 CON AV. GUABINAL	2	4,40	4,60	20,24	0,06	1,21	
	SUB TOTAL				20,24		1,21	1,52
	CLL 25 CON AV. GUABINAL	3	0,81	1,60	1,30	0,07	0,09	
			2,62	10,18	26,67	0,06	1,60	
			4,27	14,59	62,30	0,06	3,74	
	SUB TOTAL				90,27		5,43	6,79
	AV. AMABALA X CLL.92	4	4,73	12,73	60,21	0,10	6,02	
			4,16	10,27	42,72	0,08	3,42	
	SUB TOTAL				102,94		9,44	11,80
16/01/2025	CLL 25 CON AV. GUABINAL	5	3,30	5,93	19,54	0,07	1,37	
			6,09	7,94	48,35	0,07	3,38	
			1,40	3,90	5,46	0,07	0,38	
			1,40	2,27	3,18	0,07	0,22	
	SUB TOTAL				76,53		5,36	6,70
	AV. AMABALA X CLL.92	6	0,80	1,60	1,28	0,06	0,08	
		7	1,70	0,95	1,62	0,06	0,10	
			0,60	3,40	2,04	0,06	0,12	
	SUB TOTAL				4,94		0,30	0,37
17/01/2025	CLL 25 CON AV. GUABINAL	8	1,90	5,20	9,88	0,07	0,69	
			2,40	7,70	18,48	0,07	1,29	
			4,70	1,72	8,08	0,07	0,57	
			2,10	7,40	15,54	0,07	1,09	
			6,25	1,90	11,88	0,07	0,83	
		9	0,45	4,75	2,14	0,07	0,15	
			1,57	3,28	5,15	0,07	0,36	
			1,08	0,52	0,56	0,07	0,04	
			0,60	0,50	0,30	0,07	0,02	
		10	2,65	4,07	10,79	0,07	0,75	
	SUB TOTAL				82,79		5,80	7,24
18/01/1900	CLL. 23 CON CRA.3	11	10,10	11,56	116,76	0,07	8,17	
			6,40	10,00	64,00	0,07	4,48	
			3,85	8,60	33,11	0,07	2,32	
	SUB TOTAL				213,87		14,97	18,71
	CLL. 23 CON CRA.3	12	7,29	8,30	60,51	0,07	4,24	
	SUB TOTAL				60,51		4,24	5,29
20/01/2025	CRA 3 ENTRE CLL 23 Y 21	1	4,20	7,60	31,92	0,13	4,15	
			10,50	2,50	26,25	0,13	3,41	
		SUBTOTAL			58,17		7,56	9,45
		2	2,96	2,53	7,49	0,10	0,75	
		SUBTOTAL			7,49		0,75	0,94
		3	5,23	7,17	37,50	0,12	4,50	
			6,15	12,16	74,78	0,12	8,97	
			3,67	4,26	15,63	0,12	1,88	
			3,67	4,50	16,52	0,12	1,98	
		SUBTOTAL			144,43		17,33	21,66
		4	4,55	3,66	16,65	0,11	1,83	
			3,82	10,24	39,12	0,11	4,30	
			2,65	2,48	6,57	0,11	0,72	
		SUBTOTAL			62,34		6,86	8,57
	CLL 25 CON AV. GUABINAL	5	2,54	2,57	6,53	0,11	0,72	
			1,91	4,56	8,71	0,11	0,96	
		SUBTOTAL			15,24		1,68	2,10
		6	6,10	3,00	18,30	0,11	2,01	
			0,89	0,39	0,35	0,11	0,04	
		SUBTOTAL			18,65		2,05	2,56
21/01/2025	CRA 3 ENTRE CLL 23 Y 21	7	3,54	5,86	20,74	0,10	2,07	
		SUBTOTAL			20,74		2,07	2,59
		8	3,55	10,57	37,52	0,10	3,75	
		SUBTOTAL			37,52		3,75	4,69
		9	3,20	4,50	14,40	0,12	1,73	
			9	3,30	29,70	0,12	3,56	
			6	3,95	23,70	0,12	2,84	
			7,05	7,15	50,41	0,12	6,05	
			7,75	3,90	30,23	0,12	3,63	
		SUBTOTAL			148,43		17,81	22,26
		10	3,40	2,40	8,16	0,16	1,31	
		SUBTOTAL			8,16		1,31	1,63
	CLL 44 ENTRE CRA 4B Y 5	11	1,44	7,49	10,79	0,13	1,40	
		SUBTOTAL			10,79		1,40	1,75
22/01/2025	CLL 29 CON AV. GUABINAL	12	3,23	4,75	15,34	0,15	2,30	
		SUBTOTAL			15,34		2,30	2,88
	CLL 28 CON AV. GUABINAL	13	3,28	3,97	13,02	0,11	1,43	
		SUBTOTAL			13,02		1,43	1,79
	CLL 30 CON CRA 7	14	0,68	2,55	1,72	0,15	0,26	
		SUBTOTAL			1,72		0,26	0,32
	AV. GUABINAL CON CLL 30	15	4,18	19,70	82,35	0,08	6,59	
		SUBTOTAL			82,35		6,59	8,23
	CLL 23 CON CRA 3	16	1,40	1,35	1,89	0,12	0,23	
			0,65	1,95	1,27	0,12	0,15	
			4,50	3,13	14,09	0,12	1,69	
			0,45	2,42	1,09	0,12	0,13	
			0,50	2,80	1,40	0,13	0,18	
			1,00	2,40	2,40	0,13	0,31	
		SUBTOTAL			22,13		2,69	3,37
		17	1,15	0,80	0,92	0,15	0,14	
			1,60	0,90	1,44	0,15	0,22	
			3,00	1,60	4,80	0,15	0,72	

		SUBTOTAL			7,16		1,07	1,34
		18	1,35	1,20	1,62	0,15	0,24	
		SUBTOTAL			1,62		0,24	0,30
23/01/2025	AV. GUABINAL CON CLL 30	19	3,93	20,61	80,98	0,16	12,96	
			3,40	19,78	67,33	0,15	10,10	
			1,03	0,65	0,67	0,15	0,10	
		SUBTOTAL			148,98		23,16	28,95
	CRA 3 ENTRE CLL 23 Y 21	20	2,11	4,73	9,98	0,12	1,20	
			1,56	1,11	1,73	0,12	0,21	
			1,90	4,28	8,13	0,13	1,02	
		SUBTOTAL			19,84		2,42	3,03
24/01/2025	CLL 21 CON CRA 3	21	13,30	20,80	276,64	0,15	41,50	
			8,12	0,50	4,06	0,15	0,61	
			4,40	0,90	3,96	0,15	0,59	
			3,60	0,90	3,24	0,15	0,49	
			0,10	2,30	0,23	0,15	0,03	
		SUBTOTAL			288,13		43,22	54,02
	CLL 29 CON CRA 6	22	0,58	1,90	1,10	0,12	0,13	
			5,54	4,18	23,16	0,12	2,78	
			5,10	1,63	8,18	0,12	0,62	
		SUBTOTAL			29,44		3,53	4,42
27/01/2025	CLL 29 CRA 5 A 4 H	35	3,78	5,64	21,32	0,13	2,77	
			2,16	7,88	17,02	0,13	2,21	
			3,07	4,92	15,09	0,13	1,96	
	SUB TOTAL				53,43		6,95	8,68
	CLL 29 CRA 5 A 4 H	36	9,04	12,60	113,90	0,19	21,64	
			9,04	22,50	203,40	0,19	38,65	
			9,04	1,50	13,56	0,19	2,58	
	SUB TOTAL				330,86		62,86	78,58
28/01/2025	CLL 29 CRA 5 A 4 H	37	6,29	10,40	65,42	0,13	8,50	
			4,54	12,50	56,75	0,13	7,38	
	SUB TOTAL				122,17		15,88	19,85
29/01/2025	CLL 28a CRA 5 A 4I	38	1,30	1,45	1,89	0,10	0,19	
	SUB TOTAL				1,89		0,19	0,24
29/01/2025	CLL 29 CRA 5 A 6	39	1,90	5,20	9,88	0,07	0,69	
	SUB TOTAL				9,88		0,69	0,86
29/01/2025	CLL 29 CRA 6 A 7	40	1,78	5,90	10,50	0,09	0,95	
	SUB TOTAL				10,50		0,95	1,18
29/01/2025	CLL 28a CRA 5 A 4I	41	1,08	11,22	12,12	0,12	1,45	
			4,26	12,87	54,87	0,12	6,58	
			0,60	5,55	3,33	0,12	0,40	
			1,48	0,68	1,01	0,12	0,12	
			2,88	3,54	10,20	0,12	1,22	
	SUB TOTAL				81,52		9,78	12,23
29/01/2025	CLL 29 CRA 6 A 7	42	0,67	6,30	4,22	0,12	0,51	
	SUB TOTAL				4,22		0,51	0,63
29/01/2025	CLL 28a CRA 5 A 4I	43	2,86	3,65	10,44	0,11	1,15	
	SUB TOTAL				10,44		1,15	1,44
30/01/2025	CLL 28 CRA 4F	44	0,70	4,43	3,10	0,13	0,40	
	SUB TOTAL				3,10		0,40	0,50
31/01/2025	AV AMBALÁ CLL 45	45	3,65	37,05	135,23	0,17	22,99	
			1,10	8,57	9,43	0,17	1,60	
	SUB TOTAL				144,66		24,59	30,74
31/01/2025	AV AMBALÁ CLL 92	46	2,77	5,90	16,34	0,06	0,98	
	SUB TOTAL				16,34		0,98	1,23
31/01/2025	AV AMBALÁ CLL 92	47	1,10	0,32	0,35	0,12	0,04	
			1,60	6,79	10,86	0,12	1,30	
	SUB TOTAL				11,22		1,35	1,68
31/01/2025	AV AMBALÁ CLL 92	48	1,00	2,03	2,03	0,08	0,16	
			1,30	4,48	5,82	0,07	0,38	
	SUB TOTAL				7,85		0,54	0,68
31/01/2025	AV AMBALÁ CLL 92	49	1,25	9,91	12,39	0,17	2,11	
	SUB TOTAL				12,39		2,11	2,63
31/01/2025	AV AMBALÁ CLL 92	50	1,53	3,92	6,00	0,12	0,72	
			1,54	2,13	3,28	0,12	0,39	
	SUB TOTAL				9,28		1,11	1,39
31/01/2025	AV AMBALÁ CLL 92	51	1,54	8,20	12,63	0,16	2,02	
			2,92	6,12	17,87	0,16	2,86	
			2,57	0,33	0,85	0,16	0,14	
	SUB TOTAL				31,35		5,02	6,27
TOTAL					2677,27496 m2		331,429 m3	414,286671 m3
Total Cajeo 1 SEMANA (15-18 ENERO)					654,48			
Total Cajeo 2 SEMANA (20-25 ENERO)					1.161,70			
Total Cajeo 3 SEMANA (27-31 ENERO)					861,10			
Total Acumulado del mes					2.677,27			

FERNANDO SÁNCHEZ CARDOZO

Presidente STI

	INFORME DE OBRA	FECHA: 1 ENERO 2025 — 31 ENERO 2025 VERSIÓN: 01 PAGINA: 1 DE

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
CONTRATO Nº:	4009
INTERVETOR	
SUPERVISOR :	GILBERTO LOZANO PEREZ
MES:	ENERO

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CLL 25 CON AV. GUABINAL







2. CLL 25 CON AV. GUABINAL







3. CLL 25 CON AV. GUABINAL







4. AV. AMBALA X CLL 92







5. CLL 25 CON AV. GUABINAL








6. AV. AMBALA X CLL 92







7. AV. AMBALA X CLL 92







8. CLL 25 CON AV. GUABINAL







9. CLL 25 CON AV. GUABINAL







10. CLL 25 CON AV. GUABINAL





11. CLL 23 CON CRA.3






12. CLL 23 CON CRA.3








13. CLL 23 CON CRA.3








14. CRA. 3 ENTRE CLL 23 Y 21






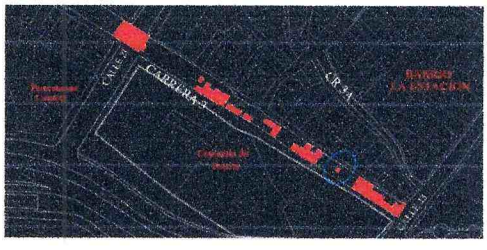

15. CRA. 3 ENTRE CLL 23 Y 21








16. CRA. 3 ENTRE CLL 23 Y 21







17. CLL 25 X AV. GUABINAL








18. CLL 25 X AV. GUABINAL






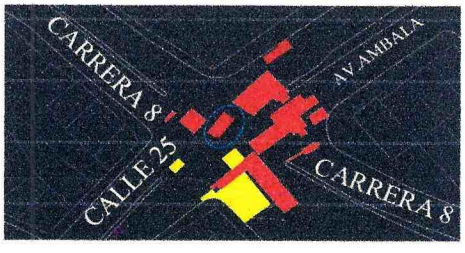

19. CRA. 3 ENTRE CLL 23 Y 21






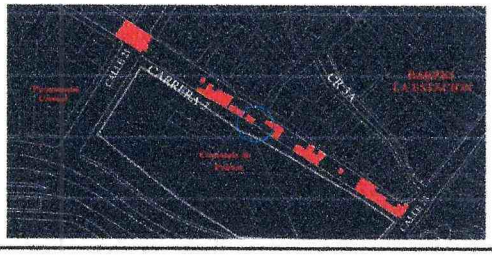

20. CRA. 3 ENTRE CLL 23 Y 21








21. CRA. 3 ENTRE CLL 23 Y 21








22. CRA. 3 ENTRE CLL 23 Y 21







23. CLL 44 ENTRE CRA 4B Y 5








24. AV. GUABINAL X CLL 29








25. AV. GUABINAL X CLL 28







26. CLL 30 ENTRE 7B Y AV. GUABINAL







27. AV. GUABINAL X CLL 30







28. CLL 23 ENTRE CRA 3 Y 4








29. CLL 23 ENTRE CRA 3 Y 4







30. CLL 23 ENTRE CRA. 3 Y 4





31. AV. GUABINAL X CLL. 30









32. CRA 3 X CLL 21




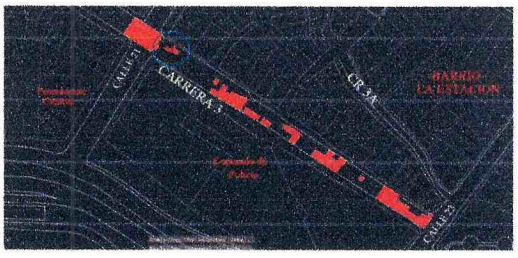


33. CRA 3 X CLL 21

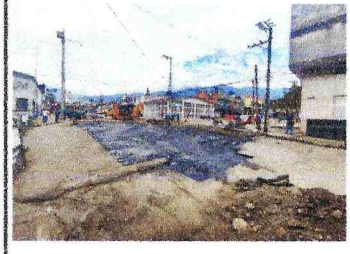






34. CLL 29 X CRA. 6






35. CLL 29 CRA 5 A 4 H






36. CLL 29 CRA 5 A 4 H






37. CLL 28a CRA 5 A 4I






38. CLL 29 CRA 5 A 6



39 CLL 29 CRA 6 A 7







40. CLL 28a CRA 5 A 4I








41. CLL 29 CRA 6 A 7		
		





42. CLL 28a CRA 5 A 4I		
		

43. CLL 31 CRA 4F		
		

44. AV AMBALÁ CLL 45		
		

45. AV AMBALÁ CLL 92		
		

46. AV AMBALÁ CLL 92		
		

47. AV AMBALÁ CLL 92		
		
48. AV AMBALÁ CLL 92		
		
49. AV AMBALÁ CLL 92		
		
50. AV AMBALÁ CLL 92		
		




SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS



CONVENIO Nº 4009 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE NIVELACION DE ENERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA	PROFUNDIDAD	VOLUMEN	VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN TOTAL SUELTO
16/01/2024	CLL 25 CON AV. GUABINAL	1	2,10	3,25	6,83	0,05	0,34	0,34	
		2	9,20	10,50	96,60	0,06	5,80	5,80	
			1,1	3,7	4,07	0,06		0,24	
		3	3,75	4,20	15,75	0,06	0,95	0,95	
		SUB TOTAL			123,25			7,33	9,16
17/01/2025	AV. AMABALA X CLL 92	4	1,28	2,60	3,33	0,06	0,20	0,20	
			2,00	6,82	13,64	0,06		0,82	
		SUB TOTAL			16,97			1,02	1,27
20/01/2025	CLL 25 CON AV. GUABINAL	5	1,27	3,20	4,06	0,06		0,24	
			2,70	0,80	2,16	0,06		0,13	
		6	2,6	7,35	19,11	0,06		1,15	
		7	2,77	4,51	12,49	0,06		0,75	
		8	0,65	0,72	0,47	0,06		0,03	
		9	2,06	5,50	11,33	0,06		0,68	
			6,78	11,59	78,58	0,06		4,71	
			2,51	8,62	21,64	0,06		1,30	
			2,26	3,62	4,09	0,06		0,25	
		SUB TOTAL			153,93			9,24	11,54
21/01/2025	CLL 42 CRA 5	10	0,52	2,04	1,06	0,06		0,06	
		11	0,74	0,74	0,55	0,06		0,03	
		12	0,98	5,68	5,57	0,06		0,33	
		13	2,5	19,21	48,03	0,06		2,88	
			2,47	3,58	8,84	0,06		0,53	
		14	0,48	3,71	1,78	0,06		0,11	
		15	1,12	2,36	2,64	0,06		0,16	
		16	6,95	9,86	68,53	0,06		4,11	
			0,66	5,05	3,33	0,06		0,20	
			1,87	0,92	1,72	0,06		0,10	
		17	8,23	6,85	56,38	0,06		3,38	
			4,18	1,92	4,01	0,06		0,24	
			8,77	4,21	18,46	0,06		1,11	
		SUB TOTAL			220,90			13,25	16,57
22/01/2025	AV. GUABINAL CON CLL 29	18	1	4	4	0,06		0,24	
		SUB TOTAL			4			0,24	0,3
23/01/2025	CRA 3 ENTRE CLL 23 Y 21	19	1,7	1,5	2,55	0,06		0,15	
		SUB TOTAL			2,55			0,15	0,18
27/01/2025	CLL 29 CRA 5 A 4 H	20	1,35	2,70	3,65	0,05	0,18	0,18	
		SUB TOTAL			3,65			0,18	0,23
29/01/2025	CLL 29 CRA 5 A 4 H	21	31,40	2,75	86,35	0,04	3,45	3,45	
		SUB TOTAL			86,35			3,45	4,32
29/01/2025	CLL 29 CRA 5 A 4 H	22	1,29	7,88	10,17	0,05	0,51	0,51	
			3,45	7,25	25,01	0,05	1,25	1,25	
			1,75	12,50	21,88	0,05	1,09	1,09	
			11,10	3,67	40,74	0,05	2,04	2,04	
		SUB TOTAL			97,79			4,89	6,11
29/01/2025	CLL 29 CRA 5 A 6	23	15,93	1,67	26,60	0,05	1,33	1,33	
		SUB TOTAL			26,60			1,33	1,66
29/01/2025	CLL 29 CRA 5 A 6	24	1,75	10,59	18,53	0,05	0,93	0,93	
		SUB TOTAL			18,53			0,93	1,16
29/01/2025	CLL 29 CRA 5 A 6	25	2,17	4,29	9,31	0,05	0,47	0,47	
		SUB TOTAL			9,31			0,47	0,58
29/01/2025	CLL 29 CRA 5 A 6	26	1,56	1,10	1,72	0,05	0,09	0,09	
		SUB TOTAL			1,72			0,09	0,11
29/01/2025	CLL 29 CRA 5 A 6	27	1,87	5,20	9,72	0,05	0,49	0,49	
		SUB TOTAL			9,72			0,49	0,61
29/01/2025	CLL 29 CRA 5 A 6	28	0,68	0,87	0,59	0,05	0,03	0,03	
			1,04	0,69	0,72	0,05	0,04	0,04	
		SUB TOTAL			1,31			0,07	0,08
29/01/2025	CLL 29 CRA 6 A 7	29	2,55	3,18	8,11	0,05	0,41	0,41	
			9,88	3,64	35,97	0,05	1,80	1,80	
		SUB TOTAL			44,08			2,20	2,75
30/01/2025	CLL 28A CRA 4I A 5	30	0,62	3,45	2,14	0,05	0,11	0,11	
		SUB TOTAL			2,14			0,11	0,13
30/01/2025	CLL 28A CRA 4I A 5	31	9,21	1,05	9,67	0,05	0,48	0,48	
			4,10	0,45	1,85	0,05	0,09	0,09	
		SUB TOTAL			11,52			0,58	0,72
30/01/2025	CLL 28A CRA 4I A 5	32	8,00	1,00	7,96	0,05	0,40	0,40	


30/01/2025	CLL 28A CRA 4I A 5	33	4,45	3,42	15,22	0,05	0,76	0,76	
			2,10	3,54	7,43	0,05	0,37	0,37	
			SUB TOTAL		22,65			1,13	1,42
30/01/2025	CLL 31 CRA 4F	34	4,43	0,47	2,07	0,05	0,10	0,10	
			SUB TOTAL		2,07			0,10	0,13
30/01/2025	CLL 31 CRA 4F	35	1,70	1,19	2,03	0,05	0,10	0,10	
			2,44	1,60	3,90	0,05	0,20	0,20	
			SUB TOTAL		5,93			0,30	0,37
30/01/2025	CLL 21 CRA 3	36	3,24	4,47	14,48	0,05	0,72	0,72	
			SUB TOTAL		14,48			0,72	0,91
30/01/2025	CLL 21 CRA 3	37	5,23	2,01	10,51	0,05	0,53	0,53	
			SUB TOTAL		10,51			0,53	0,66
30/01/2025	CLL 21 CRA 3	38	2,15	3,70	7,96	0,05	0,40	0,40	
			SUB TOTAL		7,96			0,40	0,50
30/01/2025	CLL 21 CRA 3	39	1,52	2,59	3,94	0,05	0,20	0,20	
			SUB TOTAL		3,94			0,20	0,25
31/01/2025	AV AMBALA CLL 45	40	9,50	3,50	33,25	0,04	1,33	1,33	
			SUB TOTAL		33,25			1,33	1,66
31/01/2025	AV AMBALA CLL 45	41	20,24	2,70	54,65	0,04	2,19	2,19	
			SUB TOTAL		54,65			2,19	2,73
31/01/2025	AV AMBALÁ CLL 92	42	0,85	1,11	0,94	0,05	0,05	0,05	
			SUB TOTAL		0,94			0,05	0,06
31/01/2025	AV AMBALÁ CLL 92	43	1,86	1,62	3,01	0,05	0,15	0,15	
			SUB TOTAL		3,01			0,15	0,19
TOTAL						1001,66155 m2		51,30233 m3	66,86032 m3
Total Nivelaciones 1 SEMANA (15-18 ENERO)						140,21			
Total Nivelaciones 2 SEMANA (20-25 ENERO)						381,38			
Total Nivelaciones 3 SEMANA (27-31 ENERO)						480,07			
Total Acumulado						1.001,66			

5. CLL 25 CON AV. GUABINAL	
	
6. CLL. 25 CON AV. GUABINAL	
	
7. CLL. 25 CON AV. GUABINAL	
	
8. CLL. 25 CON AV. GUABINAL	
	
9. CLL. 25 CON AV. GUABINAL	
	

10, 11 Y 12. CLL 42 CRA 5	
	
13. CLL 42 CRA 5	
	
14. CLL 42 CRA 5	
	
15. CLL 42 CRA 5	
	
16. CLL 42 CRA 5	
	

17. CLL 42 CRA 5





18. AV. GUABINAL CON CLL 29





19. CRA 3 ENTRE CLL 23Y 21






20. CLL 25 CON AV. GUABINAL




21. CLL 29 CRA 5 A 4 H

















22. CLL 29 CRA 5 A 4 H





23. CLL 29 CRA 5 A 6	
	
24. CLL 29 CRA 5 A 6	
	
25. CLL 29 CRA 5 A 6	
	
26. CLL 29 CRA 5 A 6	
	
27. CLL 29 CRA 5 A 6	
	
28. CLL 29 CRA 5 A 6	
	
29. CLL 29 CRA 6 A 7	
	

30. CLL 28A CRA 4I A 5	
	
31. CLL 28A CRA 4I A 5	
	
32. CLL 28A CRA 4I A 5	
	
33. CLL 28A CRA 4I A 5	
	
34. CLL 31 CRA 4F	
	
35. CLL 31 CRA 4F	
	
36. CLL 21 CRA 3	
	

37. CLL 21 CRA 3	
	
38. CLL 21 CRA 3	
	
39. CLL 21 CRA 3	
	
40. AV AMBALA CLL 45	
	
41. AV AMBALA CLL 45	
	
42. AV AMBALA CLL 92	
	
43. AV AMBALA CLL 92	
	

	INFORME DE OBRA	FECHA:		
		1	ENERO	2025
		31	ENERO	2025
		VERSIÓN: 01		
		PAGINA: 1 DE		

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
CONTRATO Nº:	4009
INTERVETOR	
SUPERVISOR :	GILBERTO LOZANO PEREZ
MES:	ENERO

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CLL 25 CON AV. GUABINAL





2. CLL 25 CON AV. GUABINAL





3. 1. CLL 25 CON AV. GUABINAL





4. AV. AMABALA X CLL.92





INFORME SEMANAL DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA

FECHA SEMANA : 15 al 31 de Enero del 2025
FRENTE: 1 y 2

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA

ELABORADO POR: Anna Lorena Campos Henao

PERIODO: 1

FECHA ELABORACION: 03 de Febrero del 2025

1. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

PROMEDIO TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	No ACCIDENTES		DIAS PERDIDOS POR AT		INDICE DE FRECUENCIA		INDICE DE SEVERIDAD		INDICE DE LESION INCAPACITANTE
		0	ACUMULADO	ENERO	ACUMULADO	ENERO	ACUMULADO	ENERO	ACUMULADO	
19	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00

2. PERSONAL EN OBRA.

FRENTE 1

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	Empresa
Alba Quintero Juan Carlos	*Maestro*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Arias Aponte Jose Gregorio	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Castellanos Garcia Sergio Alirio	*oficial*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Figueroa Garzón Jesúa Emilio	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Perez Cesar Augusto	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Rodriguez Naranjo Luis Eduardo	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Varón Cabiedes Ramiro	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Florez Martinez Juan Carlos	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Garzon Andres Fabian	*Auxiliar de Obra*	

FRENTE 2

Bobadilla Gomez Luis Alberto	*Oficial*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Diaz Bobadilla Brando Steven	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Guzman Beltrán Alonso	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Hernandez Guillermio León	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Leal Moreno Enalber	*Oficial*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Olmos Domingo	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Salsedo Rodriguez Luis Eduardo	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
José Alfredo Giraldo Bedoya		*Sociedad Tolimense de ingenieros*
		Sociedad Tolimense de ingenieros

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO OPERATIVO

Llano Gomez Jorge Alberto	Ingeniero Residente	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Morales Aranguren Hannya Lucía	Ingeniera Residente	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Aroca Laguna Laura Juliana	Ingeniera Residente	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Calderón Andrés Mauricio	Inspector Topografo	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Campos Henao Anna Lorena	Profesional SST	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Sanchez Cardozo Fernando	Director de obra	*Sociedad Tolimense de ingenieros*

INGRESO DE PERSONAL

Se inició labores con el personal el 15 de Enero, se presentaron 3 ingresos en el mes de Enero (16 de Enero del Maestro Juan Carlos Alba, 22 de Enero Garzón Andrés Fabian y el 27 de Enero del señor José Alfredo Giraldo Bedoy

RETIROS EN EL PERIODO

FECHA DE RETIRO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA
24/01/2025	Leal Moreno Edalber	Oficial	Frente 2
30/01/2025	Castellanos Garcia Leixon David	Auxiliar de Obra	Frente 1 / Trabajador no se presenta a laborar el 31 de Enero sin aviso previo a la empresa y Jefe inmediato, por lo tanto se da por terminado su contrato por abandono de puesto de trabajo sin justa causa y se le hace la respectiva desafiliación de la seguridad Social

AUSENTISMOS

NOMBRES	CARGO	AREA	CAUSAS Y/O DIAGNOSTICO	TIEMPO		ACUMULADO
				DIAS	FECHA INCAPACIDAD	
Castellanos Garcia Leixon David	Auxiliar de Obra	Frente 1	OTROS SINTOMAS QUE INVOLICRAN KLA FUNCIÓN COGNOSCITIVA Y LA CONCIENCIA Y LOS NO ESPECIFICADOS	5	15 -19 de Enero	5
Salsedo Rodriguez Luis Eduardo	Auxiliar de Obra	Frente 2	Procedimiento en Boca/ Extracción de muela/	1	Recomendación Médica	1
		Por recomendación médica el profesional				
		indica no estar expuesto al sol				

LLAMADOS DE ATENCION

NOMBRES	CARGO	AREA	OBSERVACION	NUMERO DE LLAMADOS DE ATENCION	ACUMULADO
Diaz Bobadilla Brando Steven	Auxiliar de Obra	Frente 2	Se hace llamado de atención al trabajador que en repetidas ocasiones ha llegado tarde lo cual se le indica su respectiva observación	3	3

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PERIODO			
ACTIVIDAD	**TEMA**	**CONTRATISTA**	**Controles para Eliminar Reducir los Riesgos**
INSPECCIONES	INSPECCION Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS Y PIGO	SE INSPECIONA SI EL PERSONAL SE ENCUENTRA CON LOS EPP Y EN BUEN ESTADO PARA SU ACTIVIDAD Y REALIZACIÓN DE CADA TAREA, SE RECOMIENDA A TODO EL PERSONAL EL PORTE OBLIGATORIO DE ESTOS ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES .
	HERRAMIENTAS MANUALES	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS Y PIGO	SE INSPECIONA LAS HERRAMIENTAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO(BARRAS, PICAS, PALAS, CEPILLOS, RASTRILLOS,NIVELETES EN LAS ACTIVIDADES PARA DESAROLLAR DURANTE LA SEMANA. SE RECOMIENDA TENER ORDEN Y ASEO EN EL SITIO DE TRABAJO Y EL ADECUADO ASEO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LAS LABORES.
	SEÑALIZACION	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS Y PIGO	SE REALIZA LA UBICACIÓN PERTINENTE EN LOS FRENTES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INTERVENCIÓN (Interseccion Avenida Guaviba con calle 25, Gaviota, Policia Distrito metopolitana de la Cra 2, Avenida Guavinal con calle 29 y 30
	CHARLAS Y PAUSAS ACTIVAS	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS Y PIGO	SE REALIZAN CHARLAS DE SEGURIDAD Y SENSIBILIZACIÓN DE RIESGOS PAALA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
ENTREGA DE EPP	ENTRGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS Y PIGO	SE REALIZA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL : **GUANTES DE VAQUETA:** EL **DÍA 16 Y 17** EN LOS FRENTES 1 Y 2 EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE MEJORAMIENTO VIAL / CALLE 25 CON GUAVINAL Y POLICIA DE LA CRA 2. LOS **DÍAS 20 Y 23** DE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE **TAPABOCAS INDUSTRIALES** EN LOS MISMOS PUNTOS QUE SE MENCIONARON ANTERIORMENTE.
HIDRATACCION	ENTREGA DE HIDRATACIÓN PESONAL DE OBRA	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS Y PIGO	SE HACE ENTREGA TODOS LOS DÍAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO 2 VECES AL DÍA PARA SU RESPECTIVA HIDRATACIÓN DURANTE SU JORNADA LABORAL , SE LES INDICA A TODO EL PERSONAL LA IMPORTANCIA DE HACERLO PARA EVITAR ENFERMEDADES RELACIONADAS AL CALOR , PREVENCIÓN DE CALAMBRES MUSCULARES ENTRE OTROS.

	FECHA	TEMA	HORAS	No. DE PERSONAS CONVOCADAS	%
CHARLAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	16/01/2025	IDENTIFICACION DE RIESGOS, SOCIALIZACIÓN DE INCIDENTE DEL TRABAJADOR LEIXON CASTELLANOS DE ORIGEN COMÚN , IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN	15 MINUTOS	10	100
	17/01/2025	IMPORTANCIA EN EL USO , Y REVISION DIARIA DE LAS HERRAMIENTAS Y PREVENCIÓN DE LESIONES EN MANO	15 MINUTOS	5	100
	18/01/2025	PRECVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAIO, REORTE DE ACCIDENTES, DEFINICIÓN DE AT, ORDEN Y LIMPIEZA EN FRENTES DE TRABAIO	15 MINUTOS	13	100
	20/01/2025	USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	10 MINUTOS	9	100
	21/01/2025	PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES EN EL PARE Y SIGA	10 MINUTOS	7	100

	24/01/2025	PAUSAS ACTIVAS , EJERCICIO DE CALESTENIA	10 MINUTOS	6	100
	28/01/2025	PREVENCIÓN CÁNCER DE PIEL	15 MINUTOS	15	100
	30/01/2025	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y REQUERIMIENTO DE LOS TRABAJADORES	16 MINUTOS	7	100

8. ENTREGA DE DOTACION

TRABAJADORES QUE INGRESARON EN EL PERIODO	TRABAJADORES QUE RECIBIERON DOTACION		COBERTURA %
	NUEVOS	ANTIGUOS	
3	1	16	94%


CONTROL PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DD/MM/AA
INGRESO DE OBRA: SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL PERSONAL, SE LLAMA ASISTENCIA	LLEVAR CONTROL DE ASISTENCIA EN OBRA	SI	15 al 31 de Enero del 2025
VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MECÁNICAS SEGÚN LA NECESIDAD DE LOS FRENTES DE TRABAJO	VERIFICACIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS	SI	15 al 31 de Enero del 2025
SE REALIZA CHARLAS DE SST	SE CONCENTIZA AL TRABAJADOR SOBRE LOS DIFERENTES RIESGOS, AUTOCUIDADO Y LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTALIDAD	SI	15 al 31 de Enero del 2025
SE ORGANIZA LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACION.	SE HACE SEÑALIZACION DEL AREA EN OBRA.	SI	15 al 31 de Enero del 2025
SE REALIZA INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS, EPP DE ACUERDO A LAS NECESUIDADES Y DEMANDA DE TRABAJO EN CADA FRENTEDE TRABAJO.	SE INSPECCIONA LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SABER COMO ESTA FUNCIONANDO Y RECOMENDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SI	15 al 31 de Enero del 2025
SE REALIZA ORDEN Y ASEO, CARGUE DE SEÑALIZACION Y HERRAMIENTAS EN CADA FRENTE DE TRABAJO.	SE REALIZA JORNADA DE ASEO SE RECOJE EL ESCOMBRO, SE LLEVA AL CENTRO DE ACOPIO	SI	15 al 31 de Enero del 2025

10. ACTIVIDADES Y/O PROPUESTAS PARA EJECUTAR PROXIMO PERIODO

ACCIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PERIODO SIGUIENTE (En este espacio se deben plasmar las acciones de mejora de acauerdo a su frente de trabajo.)	REVISION
HIDRATACION 2 VECES AL DIA	DIARIO
INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	DIARIO
REVISION E INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN EN CADA FRENTE DE TRABAJO	DIARIO
ORDEN Y ASEO EN CADA FRENTE DE TRABAJO	DIARIO

TEMA: SEÑALIZACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL FRENTE 1

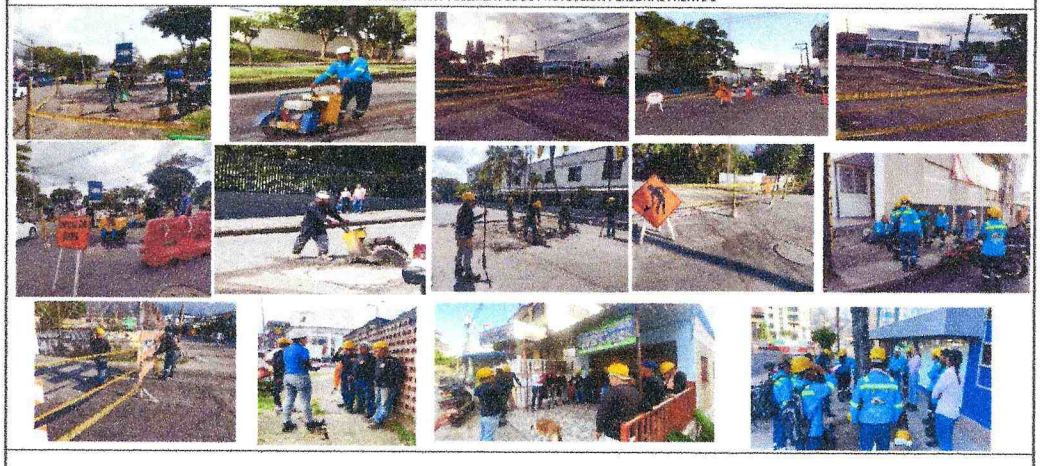

FRENTE 2
















ELABORADO POR:

ANNA LORENA CAMPOS HENAO
PROFESIONAL SST
Sociedad Tolimense de Ingenieros

Alcaldía de IBAGUÉ

INFORME MENSUAL

No. 4009 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO

CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

IBAGUÉ– TOLIMA

Febrero del 2025

Alcaldía de IBAGUÉ

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
   2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 4
      2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
      2.1.2 CONDICIONES INICIALES 4
      2.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 5
3. CONTRATO DE OBRA 5
   3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO 5
      3.1.1 GENERALIDADES 5
      3.1.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA 6
   3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
      3.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS 7
   3.3 PLAZO CONTRACTUAL 8
   3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO 9
4. CONCLUSIONES 11
5. ANEXOS 11

ANEXOS 12

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual tiene como finalidad documentar y evaluar el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el mes de enero en el marco del contrato suscrito para la prestación de servicios de mano de obra calificada y no calificada en el mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana del municipio de Ibagué.

Durante el periodo reportado, se han llevado a cabo diversas actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos contractuales, garantizando el adecuado mantenimiento, rehabilitación y optimización de la red vial urbana. En este sentido, este informe detalla las labores realizadas, los avances alcanzados, las dificultades presentadas y las estrategias implementadas para la continuidad eficiente del proyecto.

Asimismo, se incluyen registros fotográficos, cantidades ejecutadas asegurando la transparencia y trazabilidad de las actividades ejecutadas.


Con este informe, se busca proporcionar una visión clara y detallada de la gestión realizada, en cumplimiento de las condiciones contractuales y los lineamientos establecidos por la entidad competente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Ibagué se encuentra ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la cordillera central de los andes entre el cañón del Combeima y el valle del Magdalena en cercanías del nevado del Tolima, con coordenadas: Longitud75°12'02''-Latitud4°26'16''N. K4+850aK5+750



2.1.2 CONDICIONES INICIALES

En vista del crecimiento urbano y considerando las necesidades de mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio de Ibagué, se identifican sectores que requieren intervención para garantizar una movilidad segura y eficiente. Actualmente, algunas vías presentan deterioro significativo, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo económico de la región.

Por lo anterior, la Administración Municipal contempla la contratación de una entidad sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de mano de obra calificada y no calificada, con el propósito de ejecutar actividades orientadas al mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la conectividad del municipio.

2.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla todas las intervenciones necesarias para la ejecución de las distintas fases del proyecto que involucran las actividades relacionadas con el mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana del municipio de Ibagué.

Se hace necesaria la intervención en las diferentes fases o frentes del proyecto para dar mejor calidad de vida a cada uno de los transeúntes de la ciudad de Ibagué

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1.1 GENERALIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
OBJETO	CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
VALOR	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($656.229.349) MCTE IVA INCLUIDO SOBRE COSTOS INDIRECTOS
PLAZO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 1	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

DOCUMENTOS GENERADOS DENTRO DEL CONTRATO	
ACTA DE INICIO	23 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIO No.1	15 DE ENERO DE 2025
PRORROGA No.1	15 DE ENERO DE 2025

3.1.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA

- Un (1) director del Proyecto.
- Un (1) residente de obra.
- Un (1) auxiliar de ingeniería.
- Un (1) conductor.
- Un (1) Inspector topógrafo.
- Un (1) SST.
- Dos (2) cuadrillas: Conformadas por dos (2) oficiales, seis (6) y/o siete (7) ayudantes de obra y un (1) maestro.

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista ejecuto la intervención de diferentes puntos de la ciudad de acuerdo a las directrices del Ingeniero asignado por la secretaria de infraestructura, realizando el cajeo, re parcheo y nivelaciones en las siguientes ubicaciones:

- Cra 4f Entre Cll. 34 Y 35
- Av. Ambala Entre Cll 91 Y 94
- Cll 95 Entre Av. Ambala Y Cra 15
- Cll 37 Cra 5 Y 6
- Av. Ambalá Entre Cll. 64 Y 60
- Glorieta Av. Ambalá Cll. 60
- Cll. 29 entre Av. Guabinal Y Av. Ambalá
- Cll. 91 entre Cra 3b Y 3
- Cll 62 Entre Cra 6a Y 8
- Cll 47 Con Av. Guabinal
- Cll 60 Entre Cra 8 Y Av. Guabinal
- Cll 62 Cra 7
- Cll. 62 Entre Cra 6a Y 8
- Cra 4 H Cll 32
- Cra 7 Cll 61
- Cll 32 Cra 4h
- Av. Ambala Cll 104
- CRA 4H ENTRE CLL 32 Y 34
- CRA 7 ENTRE CLL 69 Y 67
- CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30
- CRA. 7 ENTRE CLL. 62 Y 64
- CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO
- CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34

A continuación, se presenta la relación semanal de lo ejecutado:

- Semana del 3 al 7 febrero

Área cajeo: 809.97 m2
Área nivelaciones: 328,72 m2
Volumen asfalto suelto: 148,21 m3
Viajes de escombros: 14

- Semana del 10 al 15 enero

Área cajeo: 539.60 m2
Área nivelaciones: 697,88 m2
Volumen asfalto suelto: 114,32 m3
Viajes de escombros: 15

- Semana del 17 al 22 enero

Área cajeo: 746,12 m2
Área nivelaciones: 423,15 m2
Volumen asfalto suelto: 139,10 m3
Viajes de escombros: 12

- Semana del 24 al 28 enero

Área cajeo: 579,10 m2
Área nivelaciones: 287,62 m2
Volumen asfalto suelto: 142,28 m3
Viajes de escombros: 14

Se anexa Excel con las áreas, volúmenes y cantidades ejecutas (Ver anexo III).

3.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS

El contratista hace llegar al sitio de la obra los equipos necesarios para la ejecución de las actividades que requiere el proyecto tales como:

1. Una (1) Retro excavadora.
2. Dos (2) Volquetas.
3. Dos (2) Benitin.
4. Un (1) Vibro compactador.
5. Dos (2) Cortadoras de Pavimento.
6. Herramienta menor.

Los tiempos que se utilizaron esta maquinaria se encuentran en el anexo III



3.3 PLAZO CONTRACTUAL

PLAZO		DÍAS
INICIAL		8
PRORROGA No. 1		60
PLAZO TOTAL		68
ACTA	**FECHA**	**DÍAS EJECUTADOS**
INICIO	23/12/2024	
SUSPENSIÓN No.1	30/12/2024	8
REINICIO No.1	15/01/2025	8
FECHA ACTUAL	28/08/2025	47
TOTAL		**55**

3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS				
AMPAROS	**No. PÓLIZA**	**VALOR AMPARADO**	**VIGENCIA**	**ASEGURADORA**
CUMPLIMIENTO	I-100039457	$65,622,934.90	15/01/2025-21/10/2025	SEGUROS MUNDIAL
PRESTACIONES SOCIALES	I-100039457	$98,434,402.35	15/01/202521/04/2028	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	I-100039457	$65,622,934.90	15/01/2025-21/10/2025	SEGUROS MUNDIAL
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	I-100009683	$260,000,000.00	16/01/2024-21/10/2025	SEGUROS MUNDIAL


3.5 PERSONAL EN OBRA


PERSONAL	
CARGO	**NOMBRE**
MAESTRO	JUAN CARLOS ALBA QUINTERO
OFICIAL RASTRILLERO	LUIS ALBERTO BOBADILLA
OFICIAL RASTRILLERO	JOSÉ ALFREDO GIRALDO BEDOLLA
OFICIAL RASTRILLERO	SERGIO CASTELLANOS
OFICIAL RASTRILLERO	ANDRÉS FABIAN GARZÓN
OFICIAL	JOSÉ EMILIO FIGUEROA
AYUDANTE	ALONSO GUZMÁN BELTRÁN
AYUDANTE	BRANDON STIVEN DIAZ BOBADILLA
AYUDANTE	GUILLERMO LEÓN HERNÁNDEZ
AYUDANTE	DOMINGO OLMOS
AYUDANTE	LUIS EDUARDO SALCEDO
AYUDANTE	CESAR AUGUSTO PÉREZ
AYUDANTE	JUAN CARLOS FLORES MARTÍNEZ
AYUDANTE	RAMIRO VARÓN CABIEDES
AYUDANTE	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ NARANJO
AYUDANTE	JOSÉ GREGORIO ARIAS APONTE
AYUDANTE	JORGE ELIECER BETANCUR CASTAÑEDA


Alcaldía de IBAGUÉ


S.T.I.

3.6 GRÁFICOS DE AVANCE

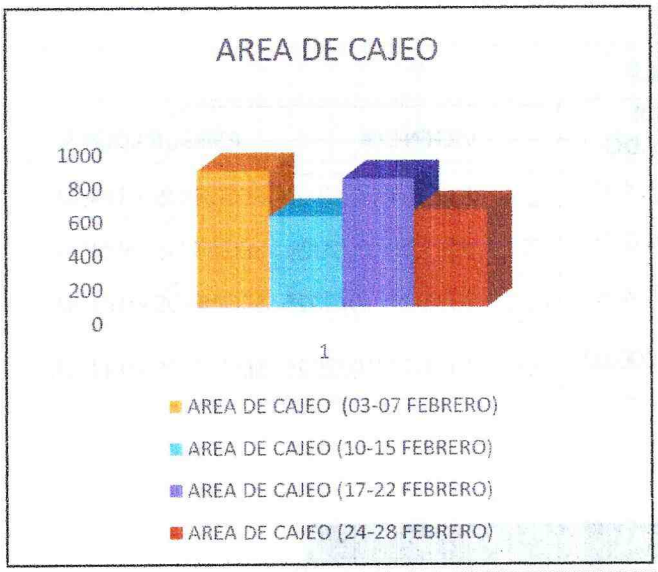

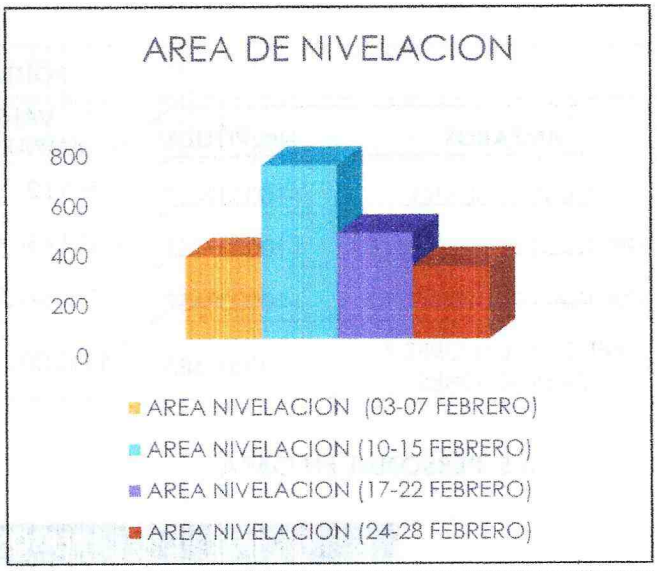

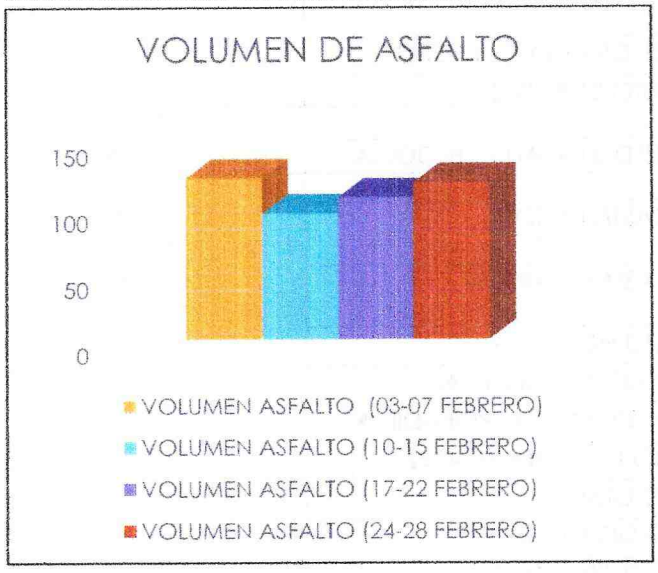

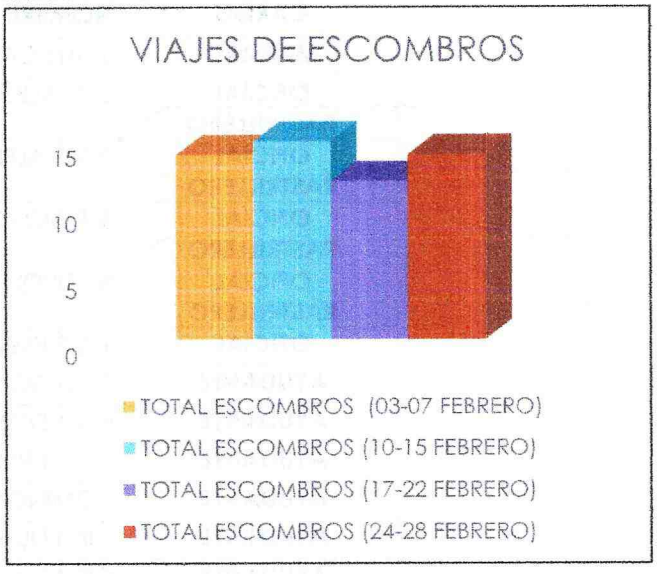

Febrero

4. CONCLUSIONES

- El contratista, contrato el personal profesional, técnico y operativo y administrativo requerido para dar cumplimiento al proyecto.
- EL contratista da cumplimiento a las instrucciones impartidas por la alcaldía por medio de la supervisión del ingeniero asignado por secretaria de infraestructura.
- El contratista cuenta con una oficina administrativa y campamentos móviles en sitio.

5. ANEXOS

I. Estado del tiempo.
II. Informe SST.
III. Excel de cantidades mensuales.

ING. FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Director De Obra

ANEXOS

I. Estado del tiempo

REGISTRO CLIMÁTICO DIARIO

FEBRERO

Obra: CUADRILLAS 2025

Fecha	Estado Climático	Horario		Intensidad			Observaciones
		AM	PM	Baja	Media	Alta	
1/02/2025	SOLEADO						
3/02/2025	SOLEADO						
4/02/2025	LLUVIAS	X	X			X	
5/02/2025	LLUVIAS	X				X	
6/02/2025	SOLEADO						
7/02/2025	SOLEADO						
8/02/2025	LLUVIAS	X				X	
10/02/2025	LLUVIAS	X	X			X	
11/02/2025	LLUVIAS		X			X	
12/02/2025	SOLEADO						
13/02/2025	LLUVIAS	X				X	
14/02/2025	SOLEADO						
17/02/2025	LLUVIAS		X			X	
18/02/2025	SOLEADO						
19/02/2025	SOLEADO						
20/02/2025	LLUVIAS		X			X	
21/02/2025	SOLEADO						
22/02/2025	SOLEADO						
24/02/2025	LLUVIAS	X				X	
25/02/2025	LLUVIAS	X				X	
26/02/2025	LLUVIAS	X				X	
27/02/2025	LLUVIAS	X				X	
28/02/2025	SOLEADO						

II. Se anexa informe en modelo de EXCEL con el nombre "INFORME MENSUAL SST FEBRERO"

III. Se anexa informe en modelo de EXCEL con el nombre "INFORME MENSUAL FEBRERO"

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 4009 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS DE FEBRERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN SUELTO
3/02/2025	CRA 4H CLL35	1	5,15	6,55	33,73	0,15	5,06	
			6,74	4,72	31,81	0,15	4,77	
			4,14	12,10	50,09	0,15	7,51	
		SUB TOTAL			115,64		17,35	21,68
	AV. AMBALA CLL 91	2	3,94	2,04	8,04	0,10	0,80	
			0,99	3,45	3,42	0,10	0,34	
		SUB TOTAL			11,45		1,15	1,43
4/02/2025	AV. AMBALA ENTRE CLL 91 Y 94	3	3,91	10,50	41,06	0,10	4,11	
			2,46	6,16	15,15	0,10	1,52	
		SUB TOTAL			56,21		5,62	7,03
		4	2,35	2,75	6,46	0,09	0,58	
			1,80	1,62	2,92	0,09	0,26	
		SUB TOTAL			9,38		0,84	1,06
		5	3,15	5,60	17,64	0,11	1,94	
		SUB TOTAL			17,64		1,94	2,43
	CRA 4H CLL35	6	3,12	4,00	12,48	0,11	1,37	
		SUB TOTAL			12,48		1,37	1,72
		7	4,28	10,42	44,55	0,14	6,24	
			3,56	2,60	9,26	0,14	1,30	
			0,58	6,00	3,48	0,14	0,49	
			9,02	8,00	72,16	0,14	10,10	
		SUB TOTAL			129,44		18,12	22,65
		8	3,37	3,05	10,28	0,09	0,93	
		SUB TOTAL			10,28		0,93	1,16
		9	1,50	1,19	1,79	0,13	0,23	
		SUB TOTAL			1,79		0,23	0,29
5/02/2025	CRA 4H CLL 34A	10	4,06	7,60	30,86	0,13	4,01	
			3,46	16,60	57,44	0,13	7,47	
		SUB TOTAL			88,29		11,48	14,35
	CLL 95 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 15	11	8,72	7,16	62,44	0,10	6,24	
		SUB TOTAL			62,44		6,24	7,80
6/02/2025	CRA 4H CLL 34A	12	3,63	4,62	16,77	0,13	2,18	
		SUB TOTAL			16,77		2,18	2,73
	CLL 95 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 15	13	12,90	3,45	44,51	0,11	4,90	
			3,89	12,90	50,18	0,11	5,52	
		SUB TOTAL			94,68		10,42	13,02
	CRA 4H CLL 34	14	2,69	2,16	5,80	0,11	0,64	
		SUB TOTAL			5,80		0,64	0,80
		15	2,23	6,13	13,67	0,10	1,37	
			0,95	5,08	4,83	0,10	0,48	
		SUB TOTAL			18,50		1,85	2,31
7/02/2025	CLL 95 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 15	16	5,96	3,07	18,30	0,10	1,83	
			0,67	4,01	2,69	0,10	0,27	
			1,50	4,01	3,01	0,10	0,30	
		SUB TOTAL			23,99		2,40	3,00
	CLL 95 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 15	17	3,68	5,69	20,94	0,10	2,09	
			2,85	1,15	3,28	0,10	0,33	
		SUB TOTAL			24,22		2,42	3,03
	CLL 37 CRA 5 Y 6	18	5,80	6,29	36,48	0,12	4,38	
			2,67	5,72	15,27	0,12	1,83	
		SUB TOTAL			51,75		6,21	7,76
		19	1,92	6,31	12,12	0,10	1,21	
			3,45	1,10	3,80	0,10	0,38	
			2,63	10,36	27,25	0,10	2,72	
		SUB TOTAL			43,16		4,32	5,39
		20	0,76	3,77	2,87	0,10	0,29	
		SUB TOTAL			2,87		0,29	0,36
		21	3,01	3,41	10,26	0,10	1,03	
			0,99	2,97	2,94	0,10	0,29	
		SUB TOTAL			13,20		1,32	1,65
10/02/2025	CRA 4F ENTRE CLL. 34 Y 35	22	3,30	20,14	66,46	0,10	6,65	
		SUB TOTAL			66,46		6,65	8,31
		23	3,95	14,00	55,30	0,10	5,53	
			3,59	7,00	25,10	0,10	2,51	
		SUB TOTAL			80,40		8,04	10,05
11/02/2025	AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60	24	0,25	0,60	0,15	0,09	0,01	
			1,29	1,25	1,61	0,09	0,15	
			0,74	2,13	1,58	0,09	0,14	
		SUB TOTAL			3,34		0,30	0,38
		25	0,58	1,82	1,06	0,12	0,13	
		SUB TOTAL			1,06		0,13	0,16
		26	3,90	36,00	140,40	0,19	26,68	
			3,90	10,60	41,34	0,19	7,85	
		SUB TOTAL			181,74		34,53	43,16
		27	4,00	15,00	60,00	0,15	9,00	
		SUB TOTAL			60,00		9,00	11,25
12/02/2025	AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60	28	0,91	3,43	3,12	0,10	0,31	
			0,19	1,13	0,21	0,10	0,02	
		SUB TOTAL			3,34		0,33	0,42
		29	4,61	4,17	19,22	0,07	1,35	
		SUB TOTAL			19,22		1,35	1,68
			1,29	2,75	3,55	0,09	0,32	

	GLORIETA AV. AMBALÁ CLL. 60	30	4,30	1,72	7,40	0,09	0,67	
			3,90	1,97	7,68	0,09	0,69	
			0,36	1,80	0,65	0,09	0,06	
		SUB TOTAL			19,27		1,73	2,17
13/02/2025	CLL. 29 ENTRE AV. GUABINAL Y AV. AMBALÁ	31	3,20	3,12	9,98	0,08	0,80	
			3,38	7,35	24,84	0,08	1,99	
		SUB TOTAL			34,83		2,79	3,48
		32	0,89	0,56	0,50	0,07	0,03	
		SUB TOTAL			0,50		0,03	0,04
		33	2,61	1,37	3,58	0,08	0,29	
			2,33	1,73	4,03	0,08	0,32	
			1,38	1,03	1,42	0,08	0,11	
		SUB TOTAL			9,03		0,72	0,90
		34	1,32	1,28	1,69	0,08	0,14	
		SUB TOTAL			1,69		0,14	0,17
		35	0,50	1,53	0,77	0,08	0,06	
			0,92	1,52	1,40	0,08	0,11	
			0,50	0,50	0,25	0,08	0,02	
		SUB TOTAL			2,41		0,19	0,24
		36	1,12	2,10	2,36	0,06	0,14	
			1,55	2,20	3,41	0,06	0,20	
			1,15	0,45	0,52	0,06	0,03	
		SUB TOTAL			6,29		0,38	0,47
		37	1,27	1,62	2,06	0,06	0,12	
		SUB TOTAL			2,06		0,12	0,15
		38	0,78	0,59	0,46	0,08	0,04	
		SUB TOTAL			0,46		0,04	0,05
14/02/2025	CLL. 91 ENTRE CRA 3B Y 3	39	4,15	1,82	7,55	0,10	0,76	
			3,15	2,70	8,51	0,10	0,85	
		SUB TOTAL			16,06		1,61	2,01
		40	0,43	1,49	0,64	0,10	0,06	
			2,07	1,73	3,58	0,10	0,36	
			0,17	1,10	0,19	0,10	0,02	
		SUB TOTAL			4,41		0,44	0,55
		41	2,73	0,60	1,64	0,09	0,15	
			5,65	5,20	29,38	0,09	2,64	
			0,20	2,14	0,43	0,09	0,04	
		SUB TOTAL			31,45		2,83	3,54
17/02/2025	CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8	42	3,13	6,77	21,19	0,1	2,12	
			1,5	1,4	2,10	0,09	0,19	
			5,86	4,42	25,90	0,09	2,33	
		SUB TOTAL			49,19		4,64	5,80
	CRA 7 CON CLL 64	43	1,45	1,13	1,64	0,12	0,20	
		SUB TOTAL			1,64		0,20	0,25
	CLL 47 CON AV. GUABINAL	44	0,52	1,13	0,59	0,12	0,07	
		SUB TOTAL			0,59		0,07	0,09
	CLL 60 ENTRE CRA 8 Y AV. GUABINAL	45	0,35	0,80	0,28	0,12	0,03	
		SUB TOTAL			0,28		0,03	0,04
		46	0,55	1,00	0,55	0,12	0,07	
		SUB TOTAL			0,55		0,07	0,08
18/02/2025	CLL 62 CRA 7	47	7,46	4,76	35,51	0,10	3,55	
			5,55	7,27	40,35	0,10	4,03	
			3,43	1,86	6,38	0,10	0,64	
			1,55	6,70	11,06	0,10	1,11	
		SUB TOTAL			93,29		9,33	11,66
	CRA 4F CLL 34	48	1,50	0,85	1,28	0,11	0,14	
			4,81	8,17	39,30	0,11	4,32	
			2,86	5,70	16,30	0,11	1,79	
			4,55	4,44	20,20	0,11	2,22	
			2,10	1,27	2,67	0,11	0,29	
			5,05	5,13	25,91	0,11	2,85	
		SUB TOTAL			105,65		11,62	14,53
19/02/2025	CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8	49	3,50	3,22	11,27	0,10	1,13	
			0,81	1,60	1,30	0,10	0,13	
			2,25	5,80	13,05	0,10	1,31	
			3,23	0,55	1,78	0,10	0,18	
			1,30	4,95	6,44	0,10	0,64	
			0,60	1,77	1,06	0,10	0,11	
		SUB TOTAL			34,89		3,49	4,36
	CRTA 4 H CLL 32	50	2,19	0,37	0,81	0,15	0,12	
			0,37	2,82	0,52	0,15	0,08	
			4,55	2,82	12,83	0,15	1,92	
			4,59	2,00	9,18	0,15	1,38	
			8,00	2,52	20,16	0,15	3,02	
			1,77	10,42	18,45	0,15	2,77	
			12,85	8,30	106,66	0,15	16,00	
			6,83	8,30	56,69	0,15	8,50	
		SUB TOTAL			225,30		33,79	42,24
		51	4,30	1,89	8,13	0,10	0,81	
		SUB TOTAL			8,13		0,81	1,02
	CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8	52	0,60	1,70	1,02	0,12	0,12	
		SUB TOTAL			1,02		0,12	0,15
		53	0,85	1,70	1,44	0,10	0,14	
		SUB TOTAL			1,44		0,14	0,18
		54	0,76	2,13	1,62	0,10	0,16	
		SUB TOTAL			1,62		0,16	0,20
		55	1,11	2,16	2,40	0,10	0,24	
		SUB TOTAL			2,40		0,24	0,30
		56	2,10	2,09	4,39	0,10	0,44	

		57	0,58	1,75	1,02	0,13	0,13	
		SUB TOTAL			1,02		0,13	0,16
		58	0,88	1,12	0,99	0,12	0,12	
		SUB TOTAL			0,99		0,12	0,15
20/02/2025	CRA 7 CLL 61	59	4,87	10,86	52,89	0,10	5,29	
			0,55	2,70	1,49	0,10	0,15	
		SUB TOTAL			54,37		5,44	6,80
	CLL 32 CRA 4H	60	3,80	21,80	82,84	0,10	8,28	
		SUB TOTAL			82,84		8,28	10,36
21/02/2025	CLL 32 CRA 4H	61	3,8	5,3	20,14	0,1	2,01	
		SUB TOTAL			20,14		2,01	2,52
	AV. AMBALA CLL 104	62	0,55	1,60	0,88	0,10	0,09	
		SUB TOTAL			0,88		0,09	0,11
		63	0,80	1,10	0,88	0,10	0,09	
			0,40	1,80	0,72	0,10	0,07	
		SUB TOTAL			1,60		0,16	0,20
		64	1,47	1,60	2,35	0,15	0,35	
			2,36	7,24	17,09	0,15	2,56	
			3,15	6,90	21,74	0,15	3,26	
			1	9,55	12,75	0,15	1,91	
		SUB TOTAL			53,92		8,09	10,11
24/02/2025	CRA 4H ENTRE CLL 32 Y 34	65	0,6	0,52	0,31	0,10	0,03	
		SUB TOTAL			0,31		0,03	0,04
		66	0,66	0,65	0,43	0,10	0,04	
		SUB TOTAL			0,43	0,10	0,04	0,05
		67	0,89	0,78	0,69	0,10	0,07	
		SUB TOTAL			0,69		0,07	0,09
		68	1,65	0,78	1,29	0,07	0,09	
			1,36	1,04	1,41	0,12	0,17	
			0,42	1,46	0,61	0,10	0,06	
		SUB TOTAL			3,31		0,32	0,40
		69	0,29	13,40	3,87	0,12	0,48	
		SUB TOTAL			3,87		0,48	0,60
		70	0,65	0,89	0,58	0,10	0,06	
		SUB TOTAL			0,58		0,06	0,07
		71	1.73	0.98	1.70	0.13	0.22	
			0,46	2,30	1,06	0,10	0,11	
		SUB TOTAL			2,75		0,33	0,41
		72	2,22	5,10	11,32	0,15	1,70	
		SUB TOTAL			11,32		1,70	2,12
	CRA 7 ENTRE CLL 69 Y 67	73	1,97	6,60	13,00	0,15	1,95	
			4,60	9,50	43,70	0,15	6,46	
		SUB TOTAL			56,70		8,41	10,51
	CLL 7 NETRE CRA 4 Y 5	74	1,40	1,50	2,10	0,10	0,21	
		SUB TOTAL			2,10		0,21	0,26
25/02/2025	CRA 7 ENTRE CLL 69 Y 67	75	4,00	5,81	23,24	0,12	2,68	
		SUB TOTAL			23,24		2,68	3,35
	CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30	76	2,23	3,20	7,12	0,13	0,91	
		SUB TOTAL			7,12		0,91	1,14
		77	1,26	1,00	1,26	0,12	0,15	
		SUB TOTAL			1,26		0,15	0,19
		78	3,56	1,53	5,44	0,14	0,74	
			0,60	10,80	6,48	0,11	0,69	
		SUB TOTAL			11,92		1,43	1,79
		79	5,78	3,64	21,04	0,16	3,43	
			2,00	6,74	13,48	0,10	1,35	
			5,40	1,86	10,04	0,10	1,00	
			0,65	1,95	1,27	0,14	0,18	
		SUB TOTAL			45,83		5,96	7,45
		80	1,09	1,00	1,09	0,10	0,11	
		SUB TOTAL			1,09		0,11	0,14
		81	0,56	1,49	0,84	0,10	0,08	
		SUB TOTAL			0,84		0,08	0,11
	CRA 7 ENTRE CLL 69 Y 67	82	3,30	0,44	1,45	0,10	0,15	
		SUB TOTAL			1,45		0,15	0,18
		83	3,38	8,50	28,73	0,13	3,77	
		SUB TOTAL			28,73		3,77	4,72
		84	0,30	2,18	0,65	0,10	0,07	
		SUB TOTAL			0,65		0,07	0,08
	CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30	85	0,45	2,73	1,23	0,10	0,12	
			0,84	0,30	0,25	0,10	0,03	
			3,20	2,26	7,23	0,10	0,72	
			0,35	0,93	0,33	0,10	0,03	
		SUB TOTAL			9,04		0,90	1,13
		86	2,10	1,83	3,84	0,10	0,38	
			1,36	0,34	0,46	0,10	0,05	
		SUB TOTAL			4,31		0,43	0,54
26/02/2025	CLL 60 CRA 6	87	1,00	9,10	9,10	0,10	0,91	
			0,90	1,15	1,04	0,12	0,13	
		SUB TOTAL			10,14		1,04	1,29
	CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34	88	8,00	21,50	172,00	0,20	34,40	
		SUB TOTAL			172,00		34,40	43,00
		89	1,19	1,43	1,70	0,11	0,19	
		SUB TOTAL			1,70		0,19	0,24
		90	1,90	1,93	3,67	0,10	0,37	
		SUB TOTAL			3,67		0,37	0,46
		91	4,30	4,33	18,62	0,10	1,86	

		SUB TOTAL			18,62		1,86	2,33
27/02/2025	CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34	92	2,50	5,40	13,50	0,13	1,82	
		SUB TOTAL			13,50		1,82	2,27
	CRA. 7 ENTRE CLL. 62 Y 64	93	5,47	9,57	52,35	0,17	8,90	
		SUB TOTAL			52,35		8,90	11,12
28/02/2025	CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34	94	1,15	1,70	1,96	0,14	0,28	
			2,40	1,34	3,22	0,15	0,47	
		SUB TOTAL			5,17		0,75	0,94
		95	0,86	1,50	1,29	0,10	0,13	
		SUB TOTAL			6,46		0,89	1,11
28/02/2025	CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO	96	2,40	1,39	3,34	0,10	0,33	
			0,60	1,10	0,66	0,10	0,07	
		SUB TOTAL			4,00		0,40	0,50
		97	1,60	2,35	3,76	0,10	0,38	
		SUB TOTAL			3,76		0,38	0,47
		98	0,77	3,05	2,35	0,17	0,40	
			1,48	0,58	0,86	0,17	0,15	
			0.60	0.48	0,29	0.17	0.05	
			1,50	2,00	3,00	0,17	0,51	
			2,70	1,20	3,24	0,17	0,55	
			2,35	1,00	2,35	0,17	0,40	
		SUB TOTAL			12,08		2,05	2,57
		99	1,35	1,50	2,03	0,10	0,20	
		SUB TOTAL			2,03		0,20	0,25
		100	2,30	1,90	4,37	0,10	0,44	
		SUB TOTAL			4,37		0,44	0,55
		101	3,15	1,95	6,14	0,11	0,66	
		SUB TOTAL			6,14		0,66	0,82
		102	1,20	3,00	3,60	0,10	0,36	
		SUB TOTAL			3,60		0,36	0,45
		103	1,30	5,15	6,70	0,10	0,67	
		SUB TOTAL			6,70		0,67	0,84
		104	0,80	4,35	3,48	0,11	0,40	
			1,50	1,35	2,03	0,11	0,23	
		SUB TOTAL			5,51		0,62	0,78
		105	1,26	1,05	1,32	0,10	0,13	
		SUB TOTAL			1,32		0,13	0,17
		106	1,30	1,20	1,56	0,10	0,16	
		SUB TOTAL			1,56		0,16	0,20
		107	1,20	4,30	5,16	0,10	0,52	
		SUB TOTAL			5,16		0,52	0,65
		108	3,50	2,70	9,45	0,11	1,04	
		SUB TOTAL			9,45		1,04	1,30
		109	0,90	2,00	1,80	0,10	0,18	
		SUB TOTAL			1,80		0,18	0,23
		110	2,95	1,30	3,84	0,13	0,51	
		SUB TOTAL			3,84		0,51	0,64
		111	2,15	1,15	2,47	0,10	0,25	
		SUB TOTAL			2,47		0,25	0,31
		112	0,72	1,70	1,22	0,10	0,12	
		SUB TOTAL			1,22		0,12	0,15
		113	2,25	1,30	2,93	0,10	0,30	
		SUB TOTAL			2,93		0,30	0,38
TOTAL					2674,78967 m2		345,6388 m3	432,044 m3

Total Cajeo ENERO	2.677,27
Total Cajeo 1 SEMANA (3-7 FEBRERO)	809,97
Total Cajeo 2 SEMANA (10-15 FEBRERO)	544,01
Total Cajeo 3 SEMANA (17-22 FEBRERO)	746,12
Total Cajeo 4 SEMANA (24-28 FEBRERO)	579,10
Total Acumulado A La Fecha	**5.356,47**

FERNANDO SÁNCHEZ CARDOZO

Presidente STI

	INFORME DE OBRA	FECHA:		
		1	FEBRERO	2025
		28	FEBRERO	2025
		VERSIÓN: 01		
		PAGINA: 1 DE		

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
CONTRATO Nº:	4009
INTERVETOR	
SUPERVISOR :	GILBERTO LOZANO PEREZ
MES:	FEBRERO

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CRA 4H CLL35








2 . AV. AMBALA CLL 91








3. AV. AMBALA ENTRE CLL 91 Y 94








4. AV. AMBALA ENTRE CLL 91 Y 94






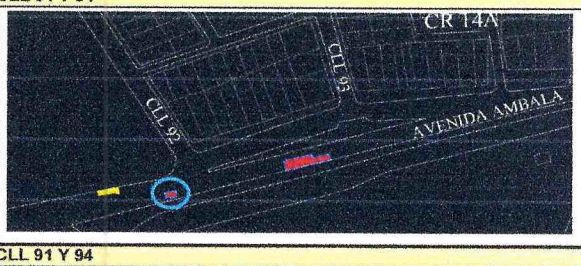

5. AV. AMBALA ENTRE CLL 91 Y 94







6. CRA 4H CLL35





7. CRA 4H CLL35





8. CRA 4H CLL35








9. CRA 4H CLL35




10. CRA 4H CLL 34A


11. CLL 95 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 15

12. CRA 4H CLL 34

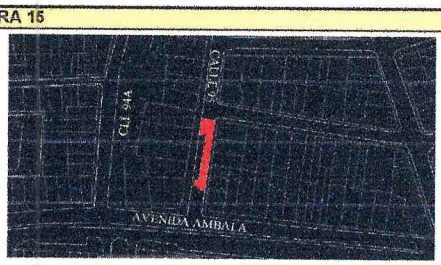



13. CRA 4H CLL 34






14. CLL 95 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 15







15. CLL 37 CRA 5 Y 6






16. CLL 37 CRA 5 Y 6


17. CLL 37 CRA 5 Y 6






18. CLL 37 CRA 5 Y 6




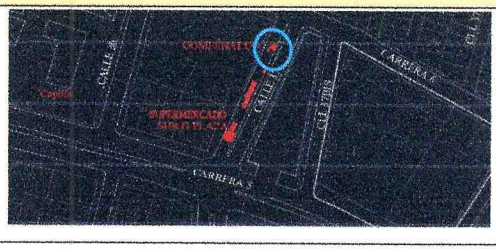


19. CRA 4F ENTRE CLL. 34 Y 35






20 . CRA 4F ENTRE CLL. 34 Y 35


21. AV. AMBALA ENTRE CLL. 64 Y 60







22. AV. AMBALA ENTRE CLL. 64 Y 60









23. AV. AMBALA ENTRE CLL. 64 Y 60

24. AV. AMBALA ENTRE CLL. 64 Y 60






25. AV. AMBALA ENTRE CLL. 64 Y 60

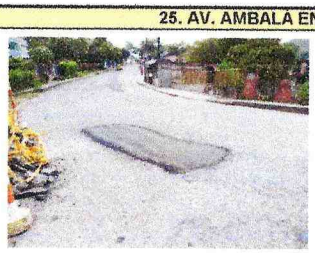
26. AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60





27. GLORIETA AV. AMBALÁ CLL. 60





28. CLL. 29 ENTRE AV. GUABINAL Y AV. AMBALÁ





29. CLL. 29 ENTRE AV. GUABINAL Y AV. AMBALÁ






30. CLL. 29 ENTRE AV. GUABINAL Y AV. AMBALÁ





31. CLL. 29 ENTRE AV. GUABINAL Y AV. AMBALÁ





32. CLL. 29 ENTRE AV. GUABINAL Y AV. AMBALÁ





33. CLL. 29 ENTRE AV. GUABINAL Y AV. AMBALÁ





34. CLL. 29 ENTRE AV. GUABINAL Y AV. AMBALÁ






35. CLL. 29 ENTRE AV. GUABINAL Y AV. AMBALÁ






36. CLL. 91 ENTRE CRA 3B Y 3







37. CLL. 91 ENTRE CRA 3B Y 3





38. CLL. 91 ENTRE CRA 3B Y 3

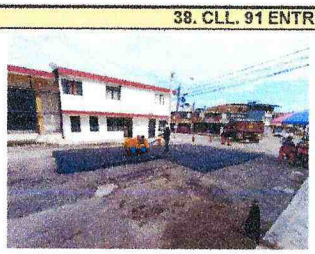39. CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8






40. CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8






41. CLL 47 CON AV. GUABINAL


42. CLL 60 ENTRE CRA 8 Y AV. GUABINAL






43. CLL 60 ENTRE CRA 8 Y AV. GUABINAL






44. CLL 62 CRA 7






45. CRA 4F CLL 34






46. CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8






47. CRTA 4 H CLL 32






48. CRTA 4 H CLL 32





49. CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8





50. CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8






51.CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8





52. CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8






53. CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8





54. CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8




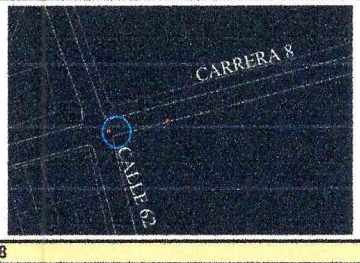

55. CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8








56. CRA 7 CLL 61






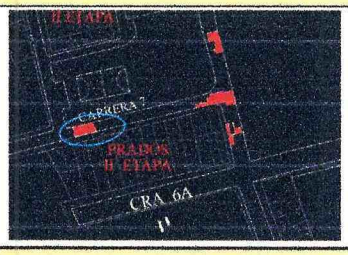

57. CLL 32 CRA 4H








58. AV. AMBALA CLL 104






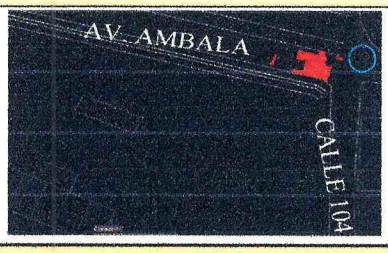

59. AV. AMBALA CLL 104








60. AV. AMBALA CLL 104





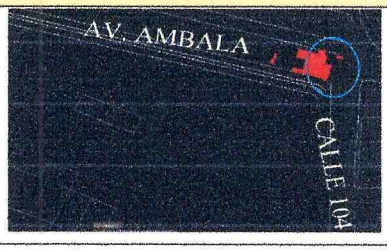

61. CRA 4H ENTRE CLL 32 Y 34





62. CRA 4H ENTRE CLL 32 Y 34





63. CRA 4H ENTRE CLL 32 Y 34






64. CRA 4H ENTRE CLL 32 Y 34





65. CRA 4H ENTRE CLL 32 Y 34





66. CRA 4H ENTRE CLL 32 Y 34







67. CRA 4H ENTRE CLL 32 Y 34






68. CRA 4H ENTRE CLL 32 Y 34





69. CRA 7 ENTRE CLL 69 Y 67






70. CLL 7 NETRE CRA 4 Y 5






71. CRA 7 ENTRE CLL 69 Y 67






72. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30






73. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30






74. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30






75. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30






76. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30






77. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30






78. CRA 7 ENTRE CLL 69 Y 67






79. CRA 7 ENTRE CLL 69 Y 67






80. CRA 7 ENTRE CLL 69 Y 67






81. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30





82. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30






83. CLL 60 CRA 6





84. CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34






85. CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34






86. CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34






87. CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34






88. CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34






89. CRA. 7 ENTRE CLL. 62 Y 64





90. CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34






91. CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34





92. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO





93. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO







94. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO






95. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO






96. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO





97. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO






98. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO





99. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO





100. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO





101. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO





102. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO





103. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO





104. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO






105. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO






106. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO






107. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO






108. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO





109. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO





SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 4009 ALCALDIA DE IBAGUE






CUADROS DE NIVELACION DE FEBRERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN TOTAL SUELTO
3/02/2025	AV AMBALA CLL 92	1	1,50	5,57	8,36	0,05	0,42	0,52
			4,59	26,97	123,66	0,05	6,18	7,73
			1,55	8,10	12,55	0,05	0,63	0,78
			0,60	1,80	0,54	0,05	0,03	0,03
		2	0,53	1,35	0,72	0,05	0,04	0,04
		3	1,00	1,00	1,00	0,05	0,05	0,06
		4	0,60	3,00	1,80	0,05	0,09	0,11
		5	1,30	1,50	1,95	0,05	0,10	0,12
4/02/2025	CRA 4H CLL 35	6	2,39	5,08	12,12	0,05	0,61	0,76
	AV AMBALA CLL 92	7	1,60	2,20	3,52	0,05	0,18	0,22
5/02/2024	CRA 4H ENTRE CLL 35 Y 34	8	0,50	6,65	3,33	0,05	0,17	0,21
		9	1,00	1,12	1,12	0,05	0,06	0,07
		10	2,35	9,30	21,86	0,05	1,09	1,37
			0,53	3,75	1,99	0,04	0,08	0,10
		11	4,74	15,25	72,21	0,04	2,89	3,61
6/02/2025	CRA 4H ENTRE CLL 35 Y 34	12	3,63	3,50	12,71	0,04	0,51	0,64
		13	0,94	1,20	1,13	0,05	0,06	0,07
		14	1,02	1,23	1,25	0,05	0,06	0,08
		15	2,81	6,00	16,86	0,05	0,84	1,05
		16	1,65	2,65	4,37	0,05	0,22	0,27
	AV. AMBALA CLL 91	17	4,00	1,40	5,60	0,05	0,28	0,35
		18	2,96	3,70	10,94	0,05	0,55	0,68
			0,70	1,90	1,33	0,05	0,07	0,08
		19	0,88	2,10	1,85	0,05	0,09	0,12
7/02/2025	PL	20	2,05	2,92	5,99	0,05	0,30	0,37
10/02/2025	CRA 4F ENTRE CLL. 34 Y 35	21	3,25	3,60	11,70	0,05	0,59	0,73
			8,10	21,36	86,51	0,04	3,46	4,33
		22	0,87	2,00	1,73	0,05	0,09	0,11
		23	0,90	3,20	2,88	0,05	0,14	0,18
11/02/2025	AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60	24	4,44	27,00	119,88	0,04	4,80	5,99
		25	4,30	14,40	61,92	0,04	2,48	3,10

12/02/2025	AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60	26	4,55	16,10	73,26	0,04	2,93	3,66
		27	5,60	27,00	151,20	0,04	6,05	7,56
		28	3,80	1,50	5,70	0,05	0,29	0,36
		29	7,90	3,15	24,89	0,05	1,24	1,56
		30	1,70	3,80	6,46	0,05	0,32	0,40
			0,80	5,20	4,16	0,05	0,21	0,26
		31	3,34	7,73	25,82	0,05	1,29	1,61
		32	4,28	1,92	8,22	0,05	0,41	0,51
	GLORIETA AV. AMBALÁ CLL. 60	33	1,03	1,74	1,79	0,05	0,09	0,11
			2,25	3,53	7,94	0,05	0,40	0,50
		34	2,00	1,93	3,86	0,05	0,19	0,24
		35	1,45	2,76	4,00	0,05	0,20	0,25
		36	2,70	2,06	5,56	0,05	0,28	0,35
		37	2,40	3,71	8,90	0,05	0,45	0,56
			2,20	3,97	8,73	0,05	0,44	0,55
		38	3,60	12,40	44,64	0,05	2,23	2,79
		39	0,50	2,90	1,45	0,04	0,06	0,07
13/02/2025	CLL. 29 ENTRE AV. GUABINAL Y AV. AMBALÁ	40	1,11	1,12	1,24	0,05	0,06	0,08
		41	2,17	3,45	7,49	0,04	0,30	0,37
14/02/2025	CLL. 91 ENTRE CRA 3B Y 3	42	3,63	4,30	15,61	0,04	0,62	0,78
		43	1,53	1,53	2,34	0,04	0,09	0,12
17/02/2025	AV. AMBALA CON CLL 61C	44	0,55	0,90	0,50	0,06	0,03	0,04
			5,20	18,35	95,42	0,06	5,73	7,16
			5,50	11,50	63,25	0,06	3,80	4,74
			5,90	15,20	89,68	0,06	5,38	6,73
			4,15	9,25	38,39	0,06	2,30	2,88
	CRA 6A CLL 64	45	1,65	1,75	2,89	0,06	0,17	0,22
18/02/2025	CRA 4F CLL 34	46	1,50	4,35	6,53	0,07	0,46	0,57
			2,57	5,85	15,03	0,07	1,05	1,32
	CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8	47	1,92	2,20	4,22	0,07	0,30	0,37
19/02/2025	CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8	48	1,13	2,17	2,45	0,06	0,15	0,18
		49	0,97	1,33	1,28	0,06	0,08	0,10
		50	1,22	1,45	1,77	0,06	0,11	0,13
		51	1,15	1,20	1,38	0,06	0,08	0,10
20/02/2025	cra 7 cll 61	52	5,90	17,01	100,36	0,07	7,03	8,78
24/02/2025	CRA. 4 H ENTRE CLL. 32 Y 34	53	1,83	1,00	1,83	0,05	0,09	0,11
		54	5,85	2,68	15,68	0,05	0,78	0,98
			1,34	2,09	2,80	0,07	0,20	0,25
			2,90	2,10	6,09	0,04	0,24	0,30
		55	3,10	2,20	6,82	0,07	0,48	0,60
			1,29	6,55	8,45	0,07	0,59	0,74
		56	0,62	3,10	1,92	0,04	0,08	0,10
			2,16	4,22	9,12	0,05	0,46	0,57
	CRA. 7 ENTRE CLL. 69 Y 67	57	0,85	9,50	8,08	0,07	0,57	0,71
		58	1,23	2,30	2,83	0,07	0,20	0,25

	CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30	59	0,46	11,20	5,15	0,07	0,36	0,45
		60	1,50	0,90	1,35	0,05	0,07	0,08
		61	0,55	1,20	0,66	0,07	0,05	0,06
			0,62	1,05	0,65	0,04	0,03	0,03
		62	0,86	3,40	2,92	0,07	0,20	0,26
			1,30	1,60	2,08	0,07	0,15	0,18
		63	1,20	11,35	13,62	0,06	0,82	1,02
		64	1,76	21,40	37,66	0,08	3,01	3,77
26/02/2025	CRA. 7 ENTRE CLL. 69 Y 67	65	0,78	2,30	1,79	0,07	0,13	0,16
			2,31	8,70	20,14	0,06	1,21	1,51
			0,92	2,38	2,19	0,06	0,13	0,16
		66	5,54	8,70	48,24	0,06	2,89	3,62
		67	2,27	20,00	45,40	0,05	2,27	2,84
		68	1,90	1,10	2,09	0,04	0,08	0,10
		69	2,38	2,55	6,07	0,07	0,42	0,53
27/02/2025	CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34	70	3,50	4,05	14,18	0,06	0,85	1,06
		71	1,85	1,70	3,15	0,07	0,22	0,28
28/02/2025	CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34	72	4,05	1,78	7,21	0,05	0,36	0,45
		73	1,30	1,30	2,47	0,07	0,17	0,22
			0,65	0,86	0,56	0,04	0,02	0,03
			0,50	0,85	0,43	0,07	0,03	0,04
			0,85	0,60	0,51	0,07	0,04	0,04
	CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO	74	1,10	1,10	1,21	0,09	0,11	0,14
		75	1,10	3,90	4,29	0,04	0,17	0,21
TOTAL							1737,37	111,7324044 m3

Total Nivelaciones ENERO	1.001,66
Total Nivelaciones 1 SEMANA FEBRERO (3-7 FEBRERO)	328,72
Total Nivelaciones 2 SEMANA FEBRERO (10-15 FEBRERO)	697,88
Total Nivelaciones 3 SEMANA FEBRERO (17-22 FEBRERO)	423,15
Total Nivelaciones 4 SEMANA FEBRERO (24-28 FEBRERO)	287,62
Total Acumulado A La Fecha	**2.739,04**

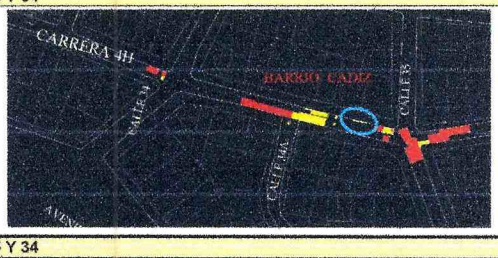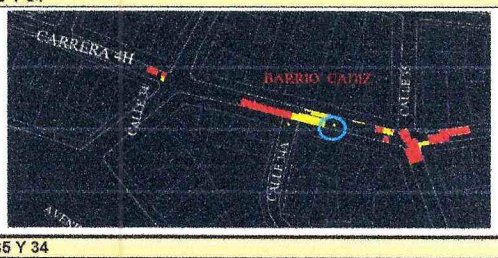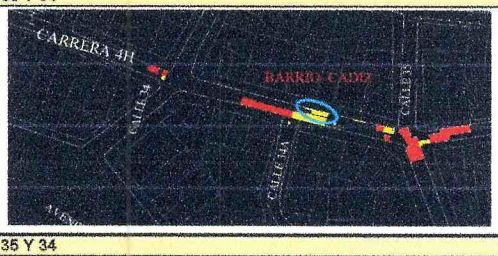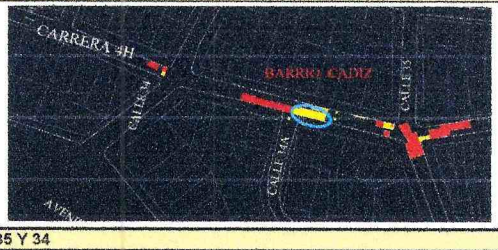7. AV AMBALA CLL 92	
	
8. CRA 4H ENTRE CLL 35 Y 34	
	
9. CRA 4H ENTRE CLL 35 Y 34	
	
10. CRA 4H ENTRE CLL 35 Y 34	
	
11. CRA 4H ENTRE CLL 35 Y 34	
	
12. CRA 4H ENTRE CLL 35 Y 34	
	


14. CRA 4H ENTRE CLL 35 Y 34





15. CRA 4H ENTRE CLL 35 Y 34






16. CRA 4H ENTRE CLL 35 Y 34






17. AV. AMBALA CLL 91







18. AV. AMBALA CLL 91






19. AV. AMBALA CLL 91


















20. CLL 95 ENTRE CRA 15 Y AV. AMBALA






21. CRA 4F ENTRE CLL. 34 Y 35	
	
22. CRA 4F ENTRE CLL. 34 Y 35	
	
23. CRA 4F ENTRE CLL. 34 Y 35	
	
24. AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60	
	
25. AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60	
	
26. AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60	
	
27. AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60	
	

28. AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60	
	
29. AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60	
	
30. AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60	
	
31. AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60	
	
32. AV. AMBALÁ ENTRE CLL. 64 Y 60	
	
33. GLORIETA AV. AMBALÁ CLL. 60	
	
34. GLORIETA AV. AMBALÁ CLL. 60	
	

35. GLORIETA AV. AMBALÁ CLL. 60	
	
36. GLORIETA AV. AMBALÁ CLL. 60	
	
37. GLORIETA AV. AMBALÁ CLL. 60	
	
38. GLORIETA AV. AMBALÁ CLL. 60	
	
39. GLORIETA AV. AMBALÁ CLL. 60	
	
40. CLL. 29 ENTRE AV. GUABINAL Y AV. AMBALÁ	
	
41. CLL. 29 ENTRE AV. GUABINAL Y AV. AMBALÁ	
	


42. CLL. 91 ENTRE CRA 3B Y 3






43. CLL. 91 ENTRE CRA 3B Y 3





44. AV. AMBALA CON CLL 61C





45. CRA 6A CLL 64





46. CRA 4F CLL 34





47. CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8























48.CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8











49. CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8	
	
50.CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8	
	
51. CLL 62 ENTRE CRA 6A Y 8	
	
52. cra 7 cll 61	
	
53. CRA. 4 H ENTRE CLL. 32 Y 34	
	
54. CRA. 4 H ENTRE CLL. 32 Y 34	
	
55. CRA. 4 H ENTRE CLL. 32 Y 34	
	

56. CRA. 4 H ENTRE CLL. 32 Y 34	
	
57. CRA. 7 ENTRE CLL. 69 Y 67	
	
58. CRA. 7 ENTRE CLL. 69 Y 67	
	
59. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30	
	
60. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30	
	
61. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30	
	
62. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30	
	

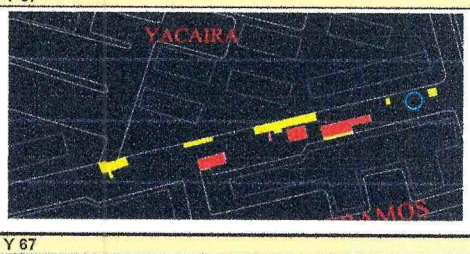63. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30	
	
64. CRA 4F ENTRE CLL 32 Y 30	
	
65. CRA. 7 ENTRE CLL. 69 Y 67	
	
66. CRA. 7 ENTRE CLL. 69 Y 67	
	
67. CRA. 7 ENTRE CLL. 69 Y 67	
	
68. CRA. 7 ENTRE CLL. 69 Y 67	
	
69. CRA. 7 ENTRE CLL. 69 Y 67	
	

70. CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34	
	
71. CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34	
	
72. CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34	
	
73. CRA 4D ENTRE CLL. 32 Y 34	
	
74. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO	
	
75. CLL. 143 ENTRE CRA 17 SUR Y AV MIROLINDO	
	

TIEMPO LABORADO POR EL PERSONAL OPERATIVO

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
MAESTRO	JUAN CARLOS ALBA QUINTERO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44
OFICIAL RASTRILLERO	LUIS ALBERTO BOBADILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OFICIAL RASTRILLERO	JOSE ALFREDO GIRALDO BEDOLLA														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OFICIAL RASTRILLERO	SERGIO CASTELLANOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OFICIAL RASTRILLERO	ANDRES FABIAN GARZON							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	217
OFICIAL	JOSE EMILIO FIGUEROA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OFICIAL	ENALBER LEAL MORENO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																				
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	ALONSO GUZMAN BELTRAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	BRANDON STIVEN DIAZ BOBADILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	GUILLERMO LEON HERNANDEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	DOMINGO OLMOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	LUIS EDUARDO SALCEDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	CESAR AUGUSTO PEREZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	JUAN CARLOS FLOREZ MARTINEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	488
AYUDANTE DE OBRA	RAMIRO VARON CABIEDES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ NARANJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	JOSE GREGORIO ARIAS APONTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	JORGE ELIECER BETANCUR CASTAÑEDA																									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE DE OBRA	LEIXON DAVID CASTELLANOS GARCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																													
		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	

RELACION HORAS EXTRAS PERSONAL OPERATIVO

PERSONAL	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31		1	3	4		5	6	7	10		11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28
															dia	noche			dia	noche				dia	RECARGO NOCTURNO																
JUAN CARLOS ALBA QUINTERO		2,5	3	5	4	4	3,5				1,5		0,5	0,5	4,5	2			3,5		2	1,5	1,5	2		2,5	1	1			1		0,5	0,5	1		1	2,5	2,5	1	0
LUIS ALBERTO BOBADILLA		2	1	4	4	4	1	2			1,5			0,5	2				4	1		2			5,5		3	1	1		1		2	1	1	3			3		
JOSE ALFREDO GIRALDO BEDOLLA											1,5			0,5	2				4	1		2			5,5		3	1	1	2,5							1		3		
SERGIO CASTELLANOS	1	3	3	4	4	1,5	3,5		3,5		1,5		0,5	0,5	4,5	2			3,5		2	2	1,5	2		4	1				1,5	1,5	0,5	2,5	1		1,5	3	0,5	1,5	1
ANDRES FABIAN GARZON						1,5	1	0,5	3,5		1,5		0,5	0,5	4,5	2			3,5		2	1,5	1,5	2		4	1	1			1,5	1		0,5	1		1	2,5		1	1
ENALBER LEAL MORERO		2	1	4	4	4	1	2	1																															
JOSE EMILIO FIGUEROA		2,5	3	4	4	1,5	3,5		3,5		1,5		0,5		2				3,5		2	1,5	1,5	2		1,5	1	1			1,5	1		0,5	1		1	2,5		1	1
ALONSO GUZMAN BELTRAN			1	4	4	4,5	1	2			1			0,5	2				4	1					5,5			3	1	1		1		2	1	1		1		3		
BRANDON STIVEN DIAZ BOBADILLA		2	1	4	4	4	1	2			1			0,5	2				4	1		2			5,5			3	1	1		1		2	1	1		1		3		
GUILLERMO LEON HERNANDEZ		2	1	4	4	4	1	2		5,5	1			0,5	2				4	1		2			5,5			3	1	1		1		2	1	1		1		3		
DOMINGO OLMOS		2	1	4	4	4	1	2		5,5	1			0,5	2				4	1		2			5,5			3	1	1		1		2	1	1		1		3		
LUIS EDUARDO SALCEDO		2	1	4	4	4	1	2		5,5	1			0,5	2				4	1		2			5,5			3	1	1		1		2	1	1		1		3		
CESAR AUGUSTO PEREZ	1	3	3	4	4	1,5	3,5		3,5		1,5		0,5	0,5	4,5	1			3,5		2	1,5	1,5	2		4	1	1			1,5	1			1		1	2,5		1	1
JUAN CARLOS FLOREZ MARTINEZ		2	3,5	4	4	4	1	0,5	3,5	4			0,5	0,5	4,5	2	2,5		3,5		2	1,5	3	2		2,5	1	1	1		1,5	1		2	1	3	1	2,5	1	1	1
RAMIRO VARON CABIEDES	1	2,5	3	5	4		3,5		3,5	4			0,5	0,5	4,5	2	2,5		3,5		2	1,5	2,5	2		3,5	1	1	1		1,5	1		0,5	1		1	3		1	1
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ NARANJO	1	2,5	3	4	4	1,5	3,5	0,5	3,5		1,5		0,5	0,5	4,5	2			3,5		2	1,5	3	2		4	1				1,5	1		0,5	1		1	2,5	2,5	1	
JOSE GREGORIO ARIAS APONTE	1	2,5	3,5	4	4	1,5	3,5		3,5		1,5		0,5		4,5	2			3,5			1,5	1,5	2		2,5	1	1			1,5	1	0,5	2	1		1	2,5		1	1
LEIXON DAVID CASTELLANOS GARCIA					4	1,5	0		3,5		1,5																													
JORGE ELIECER BETANCUR CASTAÑEDA																								2	1	3		2	1		1,5	1	2	2		3	1	2,5	2,4	1	1

RELACION HORAS EXTRAS PERSONAL OPERATIVO						
DIA	NOCHE	RECARGO NOCTURNO	VALOR DIURNO	VALOR NOCTURNO	VALOR RECARGO NOCTURNO	TOTAL
54	2	0	$ 645.652	$ 33.478		$ 679.130
44	1	5,5	$ 454.348	$ 14.457	$ 61.337	$ 530.141
21,5	1	5,5	$ 222.011	$ 14.457	$ 61.337	$ 297.804
61	2	0	$ 629.891	$ 28.913		$ 658.804
39,5	2	0	$ 407.880	$ 28.913		$ 436.793
19	0	0	$ 175.543	$ 0		$ 175.543
49,5	0	0	$ 457.337	$ 0		$ 457.337
38	1	5,5	$ 293.978	$ 10.831	$ 45.953	$ 350.762
41,5	1	5,5	$ 321.054	$ 10.831	$ 45.953	$ 377.838
47	1	5,5	$ 363.604	$ 10.831	$ 45.953	$ 420.388
47	1	5,5	$ 363.604	$ 10.831	$ 45.953	$ 420.388
47	1	5,5	$ 363.604	$ 10.831	$ 45.953	$ 420.388
56	1	0	$ 433.230	$ 10.831		$ 444.061
67	2	0	$ 518.329	$ 21.662		$ 539.990
62,5	2	0	$ 483.516	$ 21.662		$ 505.177
58,5	2	0	$ 452.571	$ 21.662		$ 474.232
54,5	2	0	$ 421.626	$ 21.662		$ 443.287
10,5	0	0	$ 81.231	$ 0		81230,625
25,4	0	1	$ 196.820	$ 0	$ 8.355	$ 205.175
				TOTAL		**$ 7.918.471**

	MES	HORA DIURNA	RECARGO NOCTURNO	HORA EXTRA DIURNA	HORA EXTRA NOCTURNA
AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	$ 6.189	$ 8.355	$ 7.736	$ 10.831
OFICIAL	$ 1.700.000	$ 7.391	$ 9.978	$ 9.239	$ 12.935
OFICIAL RASTRILLERO	$ 1.900.000	$ 8.261	$ 11.152	$ 10.326	$ 14.457
MAESTRO	$ 2.200.000	$ 9.565	$ 12.913	$ 11.957	$ 16.739

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO

FECHA SEMANA : 3 al 28 de Febrero del 2025	
FRENTE: 1 y 2	

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA

ELABORADO POR: Anna Lorena Campos Henao

PERIODO: 1

FECHA ELABORACION: 03 de Marzo del 2025

1. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

PROMEDIO TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	No ACCIDENTES		DIAS PERDIDOS POR AT		INDICE DE FRECUENCIA		INDICE DE SEVERIDAD		INDICE DE LESION INCAPACITANTE
		0	ACUMULADO	ENERO	ACUMULADO	ENERO	ACUMULADO	ENERO	ACUMULADO	
19	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00

2. PERSONAL EN OBRA.

FRENTE 1

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	Empresa
Alba Quintero Juan Carlos	*Maestro*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Arias Aponte Jose Gregorio	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Castellanos Garcia Sergio Alirio	*oficial*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Figueroa Garzón Jesúa Emilio	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Perez Cesar Augusto	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Rodriguez Naranjo Luis Eduardo	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Varón Cabiedes Ramiro	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Florez Martinez Juan Carlos	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Garzon Andres Fabian	*Auxiliar de Obra*	

FRENTE 2

Bobadilla Gomez Luis Alberto	*Oficial*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Diaz Bobadilla Brando Steven	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de Ingenieros*
Guzman Beltrán Alonso	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Hernandez Guillermio León	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Leal Moreno Enalber	*Oficial*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Olmos Domingo	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Salsedo Rodriguez Luis Eduardo	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
José Alfredo Giraldo Bedoya	*Oficial*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Jorge Eliécer Betancur Castañeda	*Auxiliar de Obra*	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO OPERATIVO		
Llano Gomez Jorge Alberto	Ingeniero Residente	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Morales Aranguren Hannya Lucía	Conductora	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Aroca Laguna Laura Juliana	Ingeniera Auxiliar	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Calderón Andrés Mauricio	Inspector Topógrafo	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Campos Henao Anna Lorena	Profesional SST	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Sanchez Cardozo Fernando	Director de Obra	*Sociedad Tolimense de ingenieros*

INGRESO DE PERSONAL

NO HUBO INGRESO DE PERSONAL EN ESTE PERIODO

RETIROS EN EL PERIODO

FECHA DE RETIRO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA
			No hubo retiro de personal para esta semana

AUSENTISMOS

NOMBRES	CARGO	AREA	CAUSAS Y/O DIAGNOSTICO	TIEMPO		ACUMULADO
				DIAS	FECHA INCAPACIDAD	
Diaz Bobadilla Brando Steven	Auxiliar de Obra	Frente 2	ATENDIDO POR SU EPS SALUD TOTALE 8 ENFERMEDAD COMÚN)	1	28 de Febrero	1

LLAMADOS DE ATENCION

NOMBRES	CARGO	AREA	OBSERVACION	NUMERO DE LLAMADOS DE ATENCION	ACUMULADO
			NO SE PRESENTARON LLAMADOS DE ATENCIÓN		

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PERIODO			
ACTIVIDAD	**TEMA**	**CONTRATISTA**	**Controles para Eliminar Reducir los Riesgos**
INSPECCIONES	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE INSPECIONA SI EL PERSONAL SE ENCUENTRA CON LOS EPP Y EN BUEN ESTADO PARA SU ACTIVIDAD Y REALIZACIÓN DE CADA TAREA, SE RECOMIENDA A TODO EL PERSONAL EL PORTE OBLIGATORIO DE ESTOS ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES .
	HERRAMIENTAS MANUALES	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE INSPECIONA LAS HERRAMIENTAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO(BARRAS, PICAS, PALAS. CEPILLOS. RASTRILLOS,NIVELETES, CARRETILLAS EN LAS ACTIVIDADES A DESAROLLAR DURANTE LA SEMANA. SE LES RECOMIENDA TENER ORDEN Y ASEO EN EL SITIO DE TRABAJO ASEO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LAS LABORES. DE IGUAL MANERA TENER EN CUENTA CON QUE ELEMENTOS CUENTA CADA CUADRILLA A DIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS LABORES
	SEÑALIZACION	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE REALIZA LA UBICACIÓN PERTINENTE EN LOS FRENTES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INTERVENCIÓN (Gaviota, Cadiz Carrera 4H(Entre calles 33 y 32) y Calle 37 entre carreras 5 y 6,Avenida Ambalá-fuente los rosales, Avenida Ambalá entre calles 64 y 60,Calle 29 entre guavinal Ambalá y Cra 4H con calle 35,Cra 4H con calle 33 Y 35, CARRERA 4F DESDE LA RESGITRADURIA HASTA PROFAMILIA, CRA 4H CON CALLE 32, FRENTE A LA CLÍNICA DE OJOS DEL TOLIMA, PRADOS DEL NORTE,Cra 4H con 31 , CARRERA 4H CON 35 Y 33 CARRERA 4F 32 Y 35 SECTOR CÁDIZ, Y SECTOR LOS OCOBOS CALLE 69 ENTRE 6Y7
	SENSIBILIZAR ,CHARLAS Y PAUSAS ACTIVAS	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE REALIZAN CHARLAS DE SEGURIDAD Y SENSIBILIZACIÓN DE RIESGOS PAALA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
ENTREGA DE EPP	ENTRGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE REALIZA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL : **GUANTES DE VAQUETA**: EL **DÍA 3 Y 5** EN LOS FRENTES 1 Y 2 EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE MEJORAMIENTO VIAL **GUANTES TIPO NYLON POLIURETANO** Y **TAPABOCAS INDUSTRIALES**: EL DÍA **25** DE FEBRERO Y EL **28** DE FEBRERO EN EL FRENTE 1, Y TAPABOCAS INDUSTRIALES A LAS 2 CUADRILLAS
HIDRATACCION	ENTREGA DE HIDRATACIÓN PESONAL DE OBRA	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE HACE ENTREGA TODOS LOS DÍAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO 2 VECES AL DÍA PARA SU RESPECTIVA HIDRATACIÓN DURANTE SU JORNADA LABORAL , SE LES INDICA A TODO EL PERSONAL LA IMPORTANCIA DE HACERLO PARA EVITAR ENFERMEDADES RELACIONADAS AL CALOR , PREVENCIÓN DE CALAMBRES MUSCULARES ENTRE OTROS.

SENSIBILIZACIONES	FECHA	TEMA	HORAS	No. DE PERSONAS CONVOCADAS	% DE PARICIPACIÓN
	3/02/2025	IMPORTANCIA EN LA REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD	15 MINUTOS	7	78%
	6/02/2025	TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO: Definición de conceptos, diferencias entre grupos de trabajo y trabajo en equipo	15 MINUTOS	9	100
	7/02/2025	PAUSAS ACTIVAS: Importancia en la realización de ejercicios de calestenia para evitar molestias musculares	15 MINUTOS	8	89%

CHARLAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	12/02/2025	**IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:** CICLO PHVA SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE DECRETO 1072/2015	15 MINUTOS	17	100%
	13/02/2025	**PAUSAS ACTIVA:** REALIZAR ESTIRAMIENTOS PARA EVITAR AFECTACIONES MUSCULARES Y LIBERAR TENSIÓN	15 MINUTOS	9	77%
	19/02/2025	CLASIFICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN (Reglamentaria, preventiva, obligatoria y transitoria): importancia en la identificación y uso adecuado en los frentes de trabajo	15 MINUTOS	9	66%
	28/02/2025	ENTREGA DE EPP: importancia en el uso adecuado de los tapabocas industriales	15 MINUTOS	9	10%

8. ENTREGA DE DOTACION

TRABAJADORES QUE INGRESARON EN EL PERIODO	TRABAJADORES QUE RECIBIERON DOTACION		COBERTURA %
	NUEVOS	ANTIGUOS	
0	0	3	100%Se hizo entrega dotación faltante de camisas a los trabajadores: Jose Alfredo Giraldo (2) y Andrés Fabián Garzón (1) y Alonso Guzmán (1) el día 25 de Febrero

CONTROL PROGRAMACIÓN DEL PERIODO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DD/MM/AA
INGRESO DE OBRA: SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL PERSONAL, SE LLAMA ASISTENCIA	LLEVAR CONTROL DE ASISTENCIA EN OBRA	SI	3 al 28 de Febrero del 2025
VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MECANICAS SEGÚN LA NECESIDAD DE LOS FRENTES DE TRABAJO	VERIFICACIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS	SI	3 al 28 de Febrero del 2025
SE REALIZA CHARLAS DE SST	SE CONCENTIZA AL TRABAJADOR SOBRE LOS DIFERENTES RIESGOS, AUTOCUIDADO Y LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTALIDAD	SI	3 al 28 de Febrero del 2025
SE ORGANIZA LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACION.	SE HACE SEÑALIZACION DEL AREA EN OBRA.	SI	3 al 28 de Febrero del 2025
SE REALIZA INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS, EPP DE ACUERDO A LAS NECESUIDADES Y DEMANDA DE TRABAJO EN CADA FRENTE DE TRABAJO.	SE INSPECCIONA LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SABER COMO ESTA FUNCIONANDO Y RECOMENDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SI	3 al 28 de Febrero del 2025
SE REALIZA ORDEN Y ASEO, CARGUE DE SEÑALIZACIÓN Y HERRAMIENTAS EN CADA FRENTE DE TRABAJO.	SE REALIZA JORNADA DE ASEO SE RECOJE EL ESCOMBRO, SE LLEVA AL CENTRO DE ACOPIO	SI	3 al 28 de Febrero del 2025

10. ACTIVIDADES Y/O PROPUESTAS PARA EJECUTAR PROXIMO PERIODO

ACCIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PERIODO SIGUIENTE (En este espacio se deben plasmar las acciones de mejora de acuerdo a su frente de trabajo.)	REVISION
ORGANIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN CADA FRENTE DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR TALES COMO: SEÑALIZACION Y HERRAMIENTAS QUE SON UTILIZADAS AL INICIO Y FINAL DE LA JORNADA LABORAL	DIARIO
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CHARLAS DE SEGURIDAD EN CADA FRENTE DE TRABAJO CON LOS LÍDERES DE CUADRILLA Y CUMPLIMIENTO DE LA TAREA ASIGNADA DENTRO DEL PROCESO SST	DIARIO

TEMA: SEÑALIZACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL FRENTE 1















FRENTE 2







ELABORADO POR:

ANNA LORENA CAMPOS HENAO
PROFESIONAL SST
Sociedad Tolimense de Ingenieros
