CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 19001553 DE 2019

OBJETO: "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES DE: EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTIDADES DISTRITALES, CURADURÍA Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS; REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AÉREOS (VIGENCIA FUTURA)"

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 19001298 H3 DE 2019

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 1

CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2020

BOGOTÁ D.C, FEBRERO DE 2020

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 1

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No. DE COPIAS
Aeronáutica civil	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTO	**INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES DE: EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTIDADES DISTRITALES, CURADURÍA Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS; REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AÉREOS (VIGENCIA FUTURA)**
NÚMERO	BRV-INT-CIAA-001-2020
ELABORÓ	ALVARO RUIZ – R.L. INTERVENTORIA
FIRMA	

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 5
1.1 Localización General 5
1.2 Localización Específica 6
2 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7
2.1 Información General del Contrato 7
2.2 Control Legal 7
2.2.1 Obligaciones laborales 7
2.3 Control Administrativo 8
2.3.1 Comités semanales 8
2.3.2 Correspondencia Enviada 8
2.3.3 Correspondencia Recibida 9
2.3.4 Listado – Datos Personal Aprobado Consultoría 10
2.3.5 Listado – Datos Personal Aprobado Interventoría 11
2.4 Control financiero 11
2.4.1 Resumen Financiero de Consultoría 11
2.4.2 Resumen Financiero de Interventoría 12
2.5 Actividades Técnicas Ejecutadas 12
3 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 13
3.1 Información General del Contrato 13
3.2 Descripción General de Actividades 13
4 CONTROL TÉCNICO 14
4.1 Etapa de Investigación y Diagnostico 14

4.2 Análisis y Aplicación Normativa 14
4.3 Levantamiento Topográfico 14
4.4 Suelos y Geotecnia 15
4.5 Programa Arquitectónico y Propuesta de Zonificación Arquitectónica 15
4.6 Recopilación de información y solicitud de disponibilidad de servicios públicos 15

Lista de figuras

Figura 1-1 Localización General del proyecto 5
Figura 1-2 Localización Específica del proyecto 6

Lista de tablas

Tabla 2-1 Cuadro de Control de Documentos Legales 7
Tabla 2-2 Correspondencia enviada 8
Tabla 2-3 Correspondencia recibida 9
Tabla 2-4 Personal de Consultoría 10
Tabla 2-5 Personal de Interventoría 11
Tabla 2-6 Control Financiero Consultoría 11
Tabla 2-7 Control Financiero Interventoría 12

Lista de Anexos

ANEXO 1. Certificación de Obligaciones Laborales y Aportes Parafiscales Interventoría 16
ANEXO 2. Registro Fotográfico 17


1 INTRODUCCIÓN

BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN S.A.S es la firma encargada de realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es: "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES DE: EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTIDADES DISTRITALES, CURADURÍA Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS; REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AÉREOS (VIGENCIA FUTURA)", adelantada por el contratista CONSORCIO ECO EDISEÑOS. El presente informe tiene un periodo de realización del 16 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020.

1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL

El proyecto se encuentra ubicado en el país de Colombia, departamento de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá D.C. En la Figura 1-1 se muestra la localización general del proyecto.

Figura 1-1 Localización General del proyecto

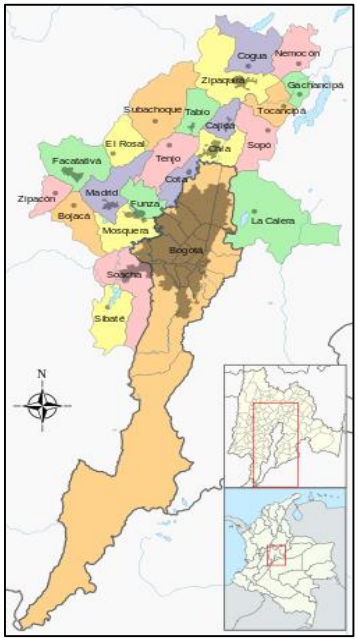


Fuente: Wikipedia.org.

1.2 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA

Más específicamente, el proyecto se encuentra ubicado en el barrio la Cabaña en la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá D.C., en el predio con nomenclatura urbana Avenida Carrera 72 N.º 63F - 20. En este predio se va a encontrar ubicado el Centro de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA) de la AEROCIVIL, en el cual se desarrollará el proyecto. En la Figura 1-2 se muestra la localización específica del proyecto.

Figura 1-2 Localización Específica del proyecto

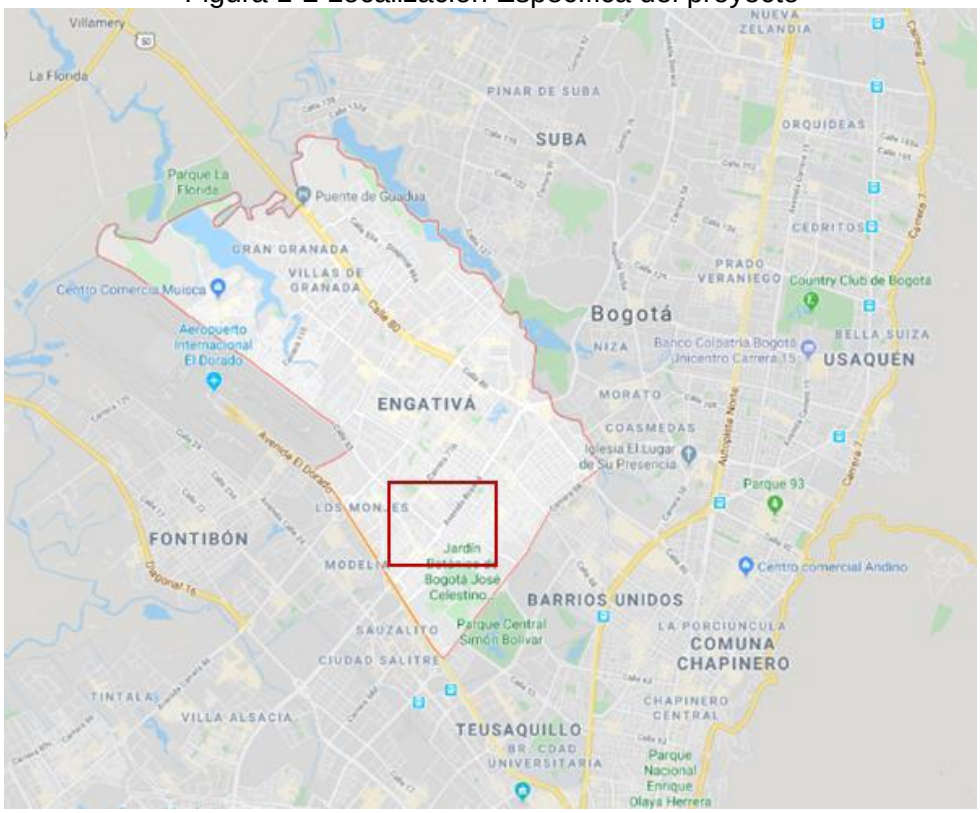

Fuente: Google Maps.

2 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Nombre Interventor: BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN S.A.S.

NIT: 900664302-3

Contrato No.: No. 19001553 DE 2019

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES DE: EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTIDADES DISTRITALES, CURADURÍA Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS; REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AÉREOS (VIGENCIA FUTURA)"

Fecha de Inicio del Contrato: 16/01/2020
Fecha de Terminación del Contrato: 15/09/2020
Valor del Contrato: $ 56´289.380

2.2 CONTROL LEGAL

Tabla 2-1 Cuadro de Control de Documentos Legales

Documento Contractual	Fecha del Documento
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 19001553 DE 2019	27-12-2019
Acta de Inicio del contrato de Interventoría	16-01-2020

Fuente: BRV Ingeniería y Planeación S.A.S.

2.2.1 Obligaciones laborales

En el anexo 1 "Certificación de Obligaciones Laborales y Aportes Parafiscales de Interventoría" se adjuntan las certificaciones antes enunciadas para la empresa BRV Ingeniería y Planeación SAS.

2.3 CONTROL ADMINISTRATIVO

2.3.1 Comités semanales

Durante el desarrollo del contrato se están realizando comités semanales en la ciudad de Bogotá, en las OFICINAS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES – Sala despacho en el Edificio NEAA 5to Piso, a estos comités asisten supervisión, interventoría y consultoría. En estos comités se discute el desarrollo de las diferentes actividades contractuales.

Los comités realizados para el presente periodo del informe son los siguientes:

1. Comité N° 1 (16 de Enero de 2020).
2. Comité N° 2 (22 de Enero de 2020).
3. Comité N° 3 (30 de Enero de 2020).
4. Comité N° 4 (06 de Febrero de 2020).
5. Comité N° 5 (13 de Febrero de 2020).

2.3.2 Correspondencia Enviada

A continuación, se hace una relación de la correspondencia enviada por parte de la Interventoría en lo correspondiente al periodo del presente informe mensual.

Tabla 2-2 Correspondencia enviada

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
BRV-INT-CIAA-001-2020	21/01/2020	Actualización póliza del contrato de Interventoría	Supervisión
BRV-INT-CIAA-002-2020	21/01/2020	Solicitud del programa arquitectónico	Supervisión
BRV-INT-CIAA-003-2020	21/01/2020	Solicitud de ingreso al predio del personal topográfico de consultoría	Supervisión
BRV-INT-CIAA-004-2020	22/01/2020	Observaciones a la Programación de actividades del contrato de consultoría	Consultoría
BRV-INT-CIAA-005-2020	22/01/2020	Observaciones a las Hojas de Vida del grupo de trabajo de consultoría	Consultoría
BRV-INT-CIAA-006-2020	22/01/2020	Entrega hojas de vida del grupo de trabajo de Interventoría	Supervisión
BRV-INT-CIAA-007-2020	04/02/2020	Observaciones a la Programación de actividades del contrato de consultoría	Consultoría
BRV-INT-CIAA-008-2020	30/01/2020	Actualización póliza del contrato de Consultoría No. 19001298 H3 de 2019	Supervisión
BRV-INT-CIAA-009-2020	05/02/2020	Respuesta al oficio C-ECOEDI-26-2020. Solicitud de documentos	Consultoría

BRV-INT-CIAA-010-2020	05/02/2020	Alcance al oficio C-ECOEDI-26-2020. Observaciones a las Hojas de Vida del grupo de trabajo de consultoría	Consultoría
BRV-INT-CIAA-011-2020	05/02/2020	Aprobación de ingreso al predio del personal de geotecnia de consultoría	Supervisión
BRV-INT-CIAA-012-2020	05/02/2020	Observaciones al Plan de Exploración Geotécnico de consultoría	Consultoría
BRV-INT-CIAA-013-2020	05/02/2020	Observaciones al cronograma de actividades ajustado de consultoría	Consultoría
BRV-INT-CIAA-014-2020	06/02/2020	Aprobación del cronograma de actividades de consultoría	Consultoría
BRV-INT-CIAA-015-2020	06/02/2020	Concepto de interventoría a la solicitud de renuncia al anticipo y la modificación en la forma de pago del contrato de consultoría	Supervisión
BRV-INT-CIAA-016-2020	07/02/2020	Aprobación del cronograma de actividades de consultoría	Supervisión
BRV-INT-CIAA-017-2020	07/02/2020	Solicitud de modificación en la forma de pago del contrato de interventoría	Supervisión
BRV-INT-CIAA-018-2020	13/02/2020	Alcance al oficio BRV-INT-CIAA-016-2020. Aprobación del cronograma de actividades de consultoría	Supervisión
BRV-INT-CIAA-019-2020	13/02/2020	Alcance al oficio BRV-INT-CIAA-015-2020. Concepto de interventoría a la solicitud de renuncia al anticipo y la modificación en la forma de pago del contrato de consultoría	Supervisión
BRV-INT-CIAA-020-2020	13/02/2020	Alcance al oficio BRV-INT-CIAA-017-2020. Solicitud de modificación en la forma de pago del contrato de interventoría	Supervisión

Fuente: BRV Ingeniería y Planeación S.A.S.

2.3.3 Correspondencia Recibida

A continuación se hace una relación de la correspondencia recibida por la Interventoría, radicada por el Consultor en lo correspondiente al periodo del informe al que hace referencia este informe mensual, incluyendo la correspondencia recibida antes de la fecha del acta de inicio del contrato.

Tabla 2-3 Correspondencia recibida

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
C-ECOEDI–20– 2020	16/01/2020	Entrega de plan de trabajo programación y hojas de vida	Interventoría
C-ECOEDI–24– 2020	20/01/2020	Solicitud programa arquitectónico	Interventoría
C-ECOEDI–25– 2020	20/01/2020	Solicitud de acceso al predio para realización de labores topográficas	Interventoría
1003.383. - 2020002736	29/01/2020	Programa arquitectónico proyecto Edificio CIAA	Interventoría

C-ECOEDI–26– 2020	29/01/2020	Solicitud remisión documentación dando alcance al comunicado C-ECODI-10-2020 radicado R-2020002120	Interventoría
C-ECOEDI–26– 2020	29/01/2020	Entrega de cronograma actualizado, documentación pendiente para anexar al paquete de hojas de vida y pólizas actualizadas	Interventoría
C-ECOEDI–31– 2020	04/02/2020	Solicitud acceso de personal, para realización de labores geotecnia	Interventoría
C-ECOEDI–32– 2020	04/02/2020	Plan de perforaciones propuestas estudio de suelos	Interventoría
C-ECOEDI–33– 2020	04/02/2020	Cronograma ajustado	Interventoría
C-ECOEDI–28– 2020	05/02/2020	Solicitud documentación para cumplir con requerimiento disponibilidad servicio acueducto por parte de la EEAB	Interventoría
C-ECOEDI–33– 2020	06/02/2020	Respuesta oficio BRV-INT-CIAA-013-2020	Interventoría
C-ECOEDI–35– 2020	07/02/2020	Respuesta oficio BRV-INT-CIAA-014-2020	Interventoría
C-ECOIDI–36– 2020	10/02/2020	Ajuste cronograma – fecha ajuste fase 2	Interventoría
C-ECOEDI–37– 2020	13/02/2020	Cambio de profesional ingeniero civil especialista estructural	Interventoría
C-ECOEDI–38– 2020	13/02/2020	Respuesta oficio BRV-INT-CIAA-010-2020 hojas de vida	Interventoría
C-ECOEDI–39– 2020	13/02/2020	Entrega cronograma final	Interventoría
C-ECOEDI–40– 2020	14/02/2020	Solicitud poder para tramites	Supervisión

Fuente: BRV Ingeniería y Planeación S.A.S.

2.3.4 Listado – Datos Personal Aprobado Consultoría

A continuación se enuncian los profesionales del grupo de Consultoría:

Tabla 2-4 Personal de Consultoría

NOMBRE	CARGO
CARLOS ARTURO MONZON GONZALEZ	DIRECTOR Y COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ BENAVIDES	COORDINADOR TRAMITOLOGIA Y PERMISOS
FRANCO ERNESTO RODRIGUEZ ZAMBRANO	ARQUITECTO O INGENIERO (DIRECTOR DE PROYECTO)
LUIS ROBERTO ISAZA	ESP. ESTRUCTURAL
FABIAN TAFUR SANCHEZ	ESPECIALISTA EN URBANISMO VIAS Y TRANSPORTE
CHRISTIAN CAMILO SANABRIA CONTRERAS	ARQUITECTO DISEÑADOR DE APOYO
LEOPOLDO GONZALEZ VELANDIA	DELINEANTE O DIBUJANTE DE APOYO
JUAN CARLOS MURCIA DURAN	ING CIVIL DE APOYO
YEIMY CORET RUIZ SAAVEDRA	DELINEANTE O DIBUJANTE DE APOYO
DIEGO VICENTE CORTES SALAZAR	TOPOGRAFO
DANNY ANDRES PULIDO MEJIA	CADENERO 1
CHRISTIAN ANDRES BENAVIDES	CADENERO 2
ALFONSO URIBE SARDIÑA	ING CIVIL GEOTECNISTA ESPECIALISTA
IVAN DARIO PACHECO RIOS	INGENIERO CIVIL DE APOYO
MAIRON RAMIRO NAVARRO SALAS	AUXILIAR 1
ELVER JAIR GUEVARA ROJAS	AUXILIAR 2

ANDRES MAURICIO GARCIA TRUJILLO	ESPECIALISTA BIOCLIMATICO
GERSON JAVIER TORRES MUÑOZ	ESPECIALISTA PAISAJISMO
EUGENIA VILLEGAS BOTERO	INGENIERO ESPECIALISTA HIDRAULICO Y SANITARIO
MARCO ELIAS BULLA RUIZ	INGENIERO ELÉCTRICO
XIOMARA ALEXANDRA VELASQUEZ QUIMBAY	INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES
RICARDO OCTAVIO CARRANZA RODRIGUEZ	INGENIERO MECANICO (PARA EQUIPOS)
LIZ MAGDY DELGADO MARTINEZ	PROFESIONAL DE MOBILIARIO
LEIDY BIBIANA QUIMBAY RIVERA	SECRETARIA
SEIDY YESLIN DIAZ MORALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PROGRAMADOR)
EDWIN ALEXANDER DIAZ SEPULVEDA	MENSAJERIA

Fuente: BRV Ingeniería y Planeación S.A.S.

2.3.5 Listado – Datos Personal Aprobado Interventoría

A continuación se enuncian los profesionales del grupo de Interventoría:

Tabla 2-5 Personal de Interventoría

NOMBRE	CARGO
LEONARDO ALFONSO GONZÁLEZ DÍAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	INGENIERO CIVIL DE APOYO
CARLOS ANDRÉS VASQUEZ QUINTERO	ARQUITECTO ESPECIALISTA
FABIO ESNEIDER FORERO MORENO	SECRETARIO

Fuente: BRV Ingeniería y Planeación S.A.S.

2.4 CONTROL FINANCIERO

En el periodo del presente informe mensual no se programaron pagos para los contratos de consultoría e interventoría.

2.4.1 Resumen Financiero de Consultoría

Tabla 2-6 Control Financiero Consultoría

Contrato de Interventoría	Valor ($)	Porcentaje (%)
Contrato	$ 680´031.116	100%
Valor facturado y pagado	$ -	-
Valor pendiente de pago	$ 680´031.116	100%

Fuente: BRV Ingeniería y Planeación S.A.S.

2.4.2 Resumen Financiero de Interventoría

Tabla 2-7 Control Financiero Interventoría

Contrato de Interventoría	Valor ($)	Porcentaje (%)
Contrato	$ 56´289.380	100%
Valor facturado y pagado	$ -	-
Valor pendiente de pago	$ 56´289.380	100%

Fuente: BRV Ingeniería y Planeación S.A.S.

2.5 ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas para el presente periodo de informe por parte de la Consultoría.

1. Etapa de Investigación y Diagnostico
2. Análisis y Aplicación Normativa
3. Levantamiento Topográfico
4. Suelos y Geotecnia
5. Programa Arquitectónico y Propuesta de Zonificación Arquitectónica
6. Recopilación de información y solicitud de disponibilidad de servicios públicos.

3 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Nombre Consultor: CONSORCIO ECO EDISEÑOS

Contrato No.: 19001298 H3 de 2019

Objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTIDADES DISTRITALES, CURADURÍA Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES AÉREOS (VIGENCIA FUTURA).

Fecha de Inicio del Contrato: 16/01/2020
Fecha de Terminación del Contrato: 15/09/2020
Valor del Contrato: $ 680´031.016

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES

El consultor es el encargado de dar cumplimiento al objeto del contrato descrito anteriormente, en el cual se destacan las actividades de estudios, diseños y obtención de autorizaciones requeridas para la construcción del Centro de Investigaciones de Accidentes Aéreos (CIAA).

4 CONTROL TÉCNICO

4.1 ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNOSTICO

Se realizó una visita técnica al lote en el predio con nomenclatura urbana Avenida Carrera 72 N.º 63F - 20 donde se proyecta construir el CIAA de la AEROCIVIL, en la cual se observó el estado del lote, el cual posee un cerramiento en mampostería y malla metálica y tiene una pequeña vivienda de una planta donde se alberga el personal de seguridad, el lote no se encuentra invadido y también se observó su ubicación, sus vías de acceso, entre otros aspectos relevantes.

Se revisó el anexo técnico de consultoría entre las partes del proyecto, con lo que se definieron las actividades a realizar a lo largo del contrato y posteriormente se entregó el cronograma de actividades a la interventoría el cual fue aprobado.

4.2 ANÁLISIS Y APLICACIÓN NORMATIVA

El predio posee un área de 2169 m2, sobre esta se realiza el respectivo retiro por la Reserva vial sobre la Av. Boyacá de 10 metros con un área de 299.37 m2, además se realiza un retiro obligatorio de Antejardín de 5m con un área de 150.95 m2, esto nos arroja un área útil de 1719 m2, sobre los cuales se realizan los cálculos de índices de edificabilidad y ocupación. Se realizó el cálculo de la altura máxima permitida según la normatividad vigente, para lo cual nos da como resultado un tope máximo de 22.5 metros que serán distribuidos en 5 pisos.

4.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Se realizó la solicitud de ingreso del personal de topografía, se inician labores del levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico, inspección de redes e inventario mobiliario y forestal del CIAA, con un área aproximada de 2169 M2, el terreno es plano con poca vegetación, el tránsito de vehículos no afecta la lectura de los puntos topográficos, el sector presenta problemas de seguridad y la pendiente es inferior al 5%. Se está digitalizando la información recopilada en campo para realizar la entrega del producto.

4.4 SUELOS Y GEOTECNIA

Se realizó la solicitud de ingreso del personal de perforación para adelantar los trabajos de campo de geotecnia. Posteriormente, el consultor entrego un plan de perforación donde se registraba la ubicación de los sondeos a realizar y sus profundidades. La interventoría aprobó este plan de perforación y de esta manera se dio inicio a las labores de este componente. Aún no se cuenta con el informe geotécnico debido a los resultados de laboratorio.

4.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA

La Entidad realizó la entrega del programa arquitectónico el cual fue revisado detalladamente por el consultor y la interventoría. Este documento se maneja como insumo principal para realizar la zonificación arquitectónica por el consultor. El programa arquitectónico ha sido socializado en los comités semanales, despejando dudas que se tienen en cuanto a los requisitos de la Entidad. El consultor realizará una entrega de la propuesta de zonificación arquitectónica definitiva, la cual será revisada por la interventoría y por la Entidad.

4.6 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

Durante el primer mes de ejecución del contrato, se radicaron solicitudes de información y disponibilidad de servicios no solo ante las empresas responsables de servicios públicos, sino también ante entidades del orden distrital que pudieran tener injerencia en el alcance del proyecto. Lo anterior con el fin de incluir todos los posibles interesados, sin embargo, a la fecha de este informe, no todas las entidades públicas han otorgado respuesta alguna.

ANEXO 1. Certificación de Obligaciones Laborales y Aportes Parafiscales Interventoría

ANEXO 2. Registro Fotográfico

PERSONA JURÍDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal, de BRV Ingeniería y Planeación SAS, identificada con Nit. 900.664.302, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los 18 días del mes de febrero de 2020.

FIRMA_____
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

	PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	
	REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	FECHA:	
		PÁGINA:	

FECHA ELABORACIÓN:	**18**	**2**	**2020**	**No. INFORME**	**1**

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	**"INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES DE: EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTIDADES DISTRITALES, CURADURÍA Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS; REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AÉREOS (VIGENCIA FUTURA)"**

CONTRATO OBRA No:	19001298 H3 de 2019	**CONTRATISTA**	CONSORCIO ECO EDISEÑOS
CONTRATO INTERVENTORIA No:	No. 19001553 DE 2019	**INTEVENTORIA**	BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN S.A.S.

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 10- 02 - 2020
DESCRIPCION: VISITA AL PREDIO



FECHA FOTO: 10- 02 - 2020
DESCRIPCION: VISITA AL PREDIO



FECHA FOTO: 10- 02 - 2020
DESCRIPCION: VISITA AL PREDIO



FECHA FOTO: 10- 02 - 2020
DESCRIPCION: VISITA AL PREDIO



FECHA FOTO: 13- 02 - 2020
DESCRIPCION: ELABORACION ESTUDIO DE SUELOS



FECHA FOTO: 13- 02 - 2020
DESCRIPCION: ELABORACION ESTUDIO DE SUELOS
