CONSORCIO CIVILES
NIT: 901735084-1

INFORME 1 DE OBRA

OBJETO DEL PROYECTO:

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS ÁREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLÍN.

CONTRATO:

23000750 H4 A DE 2023

CONTRATISTA:

CONSORCIO CIVILES

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

SUPERVISOR:

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

PLAZO INICIAL:

CUATRO (4) MESES

FECHA INICIO DE OBRA:

25 DE AGOSTO DE 2023

CONSORCIO CIVILES
NIT: 901735084-1

INFORME ACTA 1

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL NIT: 899999059-3

CONTRATO: No. 23000750 H4 A DE 2023

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS ÁREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLÍN.

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTA 1

A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica, realizadas por el personal de obra y el Ingeniero residente desde el 25 de agosto hasta el 29 de septiembre.

- **Desmonte vidrios rotos, incluye retiro y traslado a botadero certificado, en lado aire**
- **Suministro e instalación vidrio incoloro Peldar o similar de 5 mm en lado aire**

Se realizo el desmonte y monte de los vidrios rotos de las oficinas de la torre de control antigua





.

- **Desmonte cielo raso en DryWall, incluye retiro y traslado a botadero certificado, en lado aire.**
- **Suministro e instalación cielo raso en DryWall. en lado aire.**

Se realizó el desmonte y monte de una parte de cielo raso en la oficina de soporte técnico



- **Desmonte, suministro e instalación de grifería para lavaplatos Mono control en acero inoxidable, en lado aire.**

Se realizó el cambio de griferías en mal estado de la torre de control nueva y oficina de la aerocivil





- **Mantenimiento puntos sanitarios, fugas sifones, en lado aire.**

Se realizó el mantenimiento del baño del tercer piso de la torre de control antigua.





- **Suministro e instalación de impermeabilización con Restrucreto MIP o similar y pintura Supercryl larga vida o similar. (terraza en lado aire)**


Se realizó la impermeabilización de la terraza de las oficinas de la aeronáutica civil.








- **Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie. en lado aire.**

Se realizó el suministro y aplicación de pintura blanca en las oficinas de la aeronáutica civil y parte de la torre de control antigua.

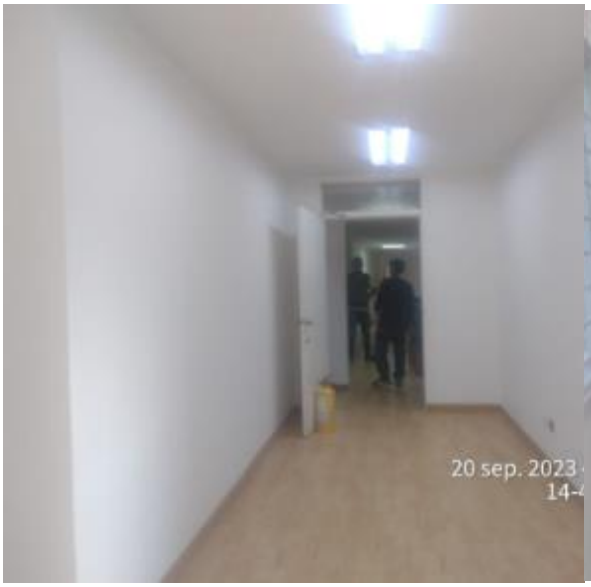

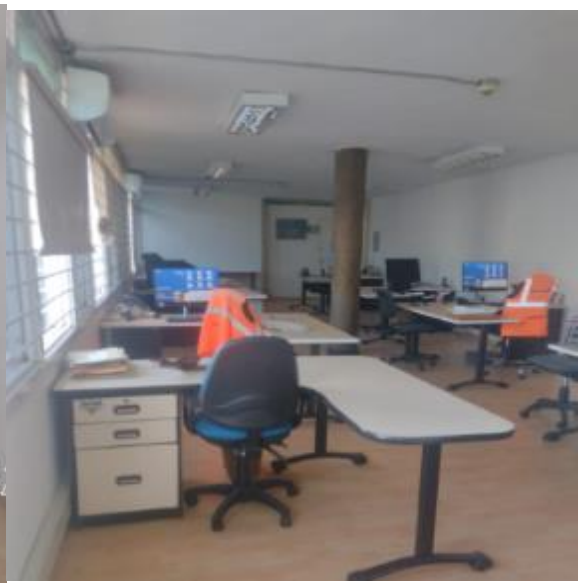



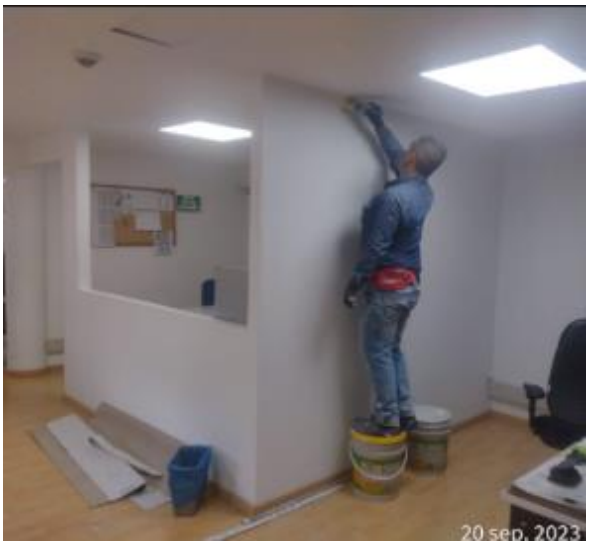


- **Suministro e instalación de piso laminado en madera**

Se realizó la instalación de piso laminado en la oficinas y áreas comunes de la Aerocivil





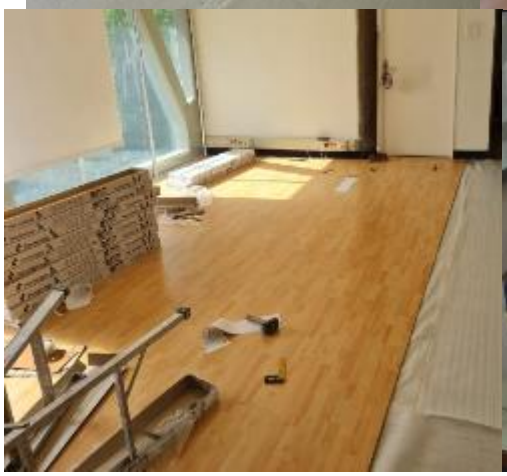



- **Suministro e instalación de guarda escoba en madera**

Se realizó la instalación de guarda escoba en la oficinas y áreas comunes de la Aerocivil



- **Suministro e instalación gato hidráulico para puerta, en lado aire.**

Se suministro e instaló gatos hidráulicos en puertas de la las oficinas de la Aerocivil y de la torre de control antigua



- **Suministro y aplicación Sellado de junta de contracción con masilla elástica, Sika Flex o similar, torre de control, en lado aire.**

Se aplicó el sellado de juntas en la torre de control nueva.



- **Desmonte, Suministro e instalación asiento de sanitario**

Se cambiaron asientos sanitarios en los baños de la torre de control nueva.









- **Desmonte, Suministro e instalación Extractor Baño Helicoidal Extrapl Decor300 o similar, 127v, en lado aire.**

Se realiza el cambio de extractores de los baños de la torre de control nueva

.








PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL.

Todo el personal que laboró en obra estuvo afiliado al sistema de seguridad social.

DIANA MARCELA MÉNDEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
