INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2314 DE 2022, MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **FEBRERO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACÁ		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$ 1.470.717.000	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$ 0	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 1.470.717.000	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	27/02/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	VITERBO GÓMEZ CARVAJAL		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Norman Eduardo Ortiz Tovar	27/12/2022	19/02/2023
	Héctor Iván Ayala dueñas	20/02/2023	30/06/2023
	Edgar Ricardo González Patiño	01/07/2023	20/07/2023
	Hernando de Jesus Perez Perez	21/07/2023	13/09/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	14/09/2024	30/09/2024
	Pahola Andrea Ardila Puerto	01/10/2024	31/10/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	01/11/2024	11/11/2024
	Viterbo Gómez Carvajal	12/11/2024	A la fecha
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Dario Fernando Cordoba Jurado	01/02/2023	30/06/2023
	Dario Fernando Cordoba jurado	12/07/2023	31/12/2023
	Dario Fernando Cordoba jurado	11/01/2024	29/10/2024
	Juan Sebastián Fernández Pulido	30/10/2024	31/12/2024
	Maria Alejandra Jiménez	01/01/2025	12/02/2025
	Edwin Andrés Torres Angel	13/02/2025	A la fecha
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 169522	28/12/2022	31/12/2022
	No. 17423	20/01/2023	31/12/2023
	No. 9024	16/01/2024	31/12/2024
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2023-042664 (Rad. Aprobación de vigencias futuras por MinHacienda)		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 169522	22/12/2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3522682-4	27/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	Primera Prórroga	Fecha: 25/07/2023	
	Segunda Prórroga y Primera Modificación	Fecha: 07/09/2023	
	Tercera Prórroga	Fecha: dd/mm/aaaa	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	Suspensión No.1	Fecha: 23/04/2024	
	Reanudación No.1	Fecha: 23/06/2024	
	Suspensión No.2	Fecha: 25/06/2024	
	Reanudación No.2	Fecha: 25/07/2024	

	Suspensión No.3	Fecha: 26/07/2024
	Ampliación 1 a la Suspensión No. 3	Fecha: 23/08/2024
	Segunda ampliación a la Suspensión No.3	Fecha: 25/10/2024
	Tercera ampliación a la Suspensión No. 3	Fecha: 19/12/2024
	Reanudación No.3	Fecha: 26/02/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	Fecha: 27/01/2024	
	Fecha: 01/07/2024	
	Fecha: 01/05/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 98.048.000	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR DE OBRA	$ 1.225.597.000	
VALOR INTERVENTORÍA	N/A	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Del cuarenta por ciento (40%) del valor del convenio equivalente a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($588.286.800), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	29/12/2022	$ 588.286.800
SEGUNDO DESEMBOLSO	Del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	08/03/2024	$ 367.679.250
TERCER DESEMBOLSO	Del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	01/04/2024	$ 367.679.250
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Del diez por ciento (10%) del valor del convenio equivalente a la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($147.071.700), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 147.071.700
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.323.645.300
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (Con corte a 02/07/2024)				$ 1.137.674.368

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: SURAMERICANA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3522682-4	Cumplimiento	$ 294.143.400	27/12/2022	01/05/2025
			27/12/2022	01/05/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños Y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: LP-001-2023	ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA		$ 1.323.645.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE R, LEGAL: INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS		NIT: 800.099.187-6 CC: 37.444.976
Fecha de Acta de inicio del contrato	14/04/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	Prórroga No.1	11/07/2023	
	Prórroga No.2	23/12/2023	
	Prórroga No.3	22/02/2024	
	Suspensión No.1	22/03/2024	
	Ampliación No.1 a la suspensión No.1	22/04/2024	
	Ampliación No.2 a la suspensión No.1	22/05/2024	
	Ampliación No.3 a la suspensión No.1	22/06/2024	
	Reanudación	24/02/2025	
Fecha de terminación del contrato	24/02/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.323.645.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	49-44-101030283		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento: 13/04/2023 / Responsabilidad civil: 10/04/2023		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: CMA-003-2023	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO PUBLICO DENOMINADO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"	$147.072.000,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA	
Fecha de Acta de inicio del contrato	14/04/2023	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	Prórroga No.1	11/07/2023	
	Prórroga No.2	23/12/2023	
	Prórroga No.3	22/02/2024	
	Suspensión No.1	22/03/2024	
	Ampliación No.1 a la suspensión No.1	22/04/2024	
	Ampliación No.2 a la suspensión No.1	22/05/2024	
	Ampliación No.3 a la suspensión No.1	22/06/2024	
	Reanudación	24/02/2025	
Fecha de terminación del contrato	24/02/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$147.072.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**49-44-10103287**		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento: 14/04/2023 / Responsabilidad civil: 13/04/2023		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO_2025	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA (Reporte financiero con corte al mes de ENERO de 2025)	$ 155.303.370,89	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100%**
% EJECUTADO DE OBRA	**100%**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

06/02/2025, Se remite oficio al municipio mediante 2025-2-003122-000715 Id: 475781 *"Solicitud documentación frente a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2314 - 2022."*

"(…) En atención al seguimiento a la ejecución y la última modificación contractual "Ampliación No.3 a la Suspensión No.3" del Convenio interadministrativo No. 2314 del 2022, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Tipacoque - Boyacá, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ", la supervisión por parte del Ministerio del Interior se permite solicitar de manera urgente la entrega de la siguiente información: 1. Informes de supervisión por el Municipio con corte a 31 de diciembre 2024. 2. Informe financiero con corte a 31 de diciembre 2024. 3. Póliza actualizada de acuerdo con la última Reanudación. 4. Estado técnico, jurídico y financiero actual de los contratos derivados del convenio, tanto obra como interventoría. 5. Informe ejecutivo frente al avance de los hechos que motivaron la Ampliación No.3 a la Suspensión No.3 del Convenio Interadministrativo No. 2314-2022, indicando si las causas han sido subsanadas, así como, las acciones adelantadas con el propósito de superar los hechos. Lo anterior, teniendo en cuenta que si en efecto el convenio se encuentra suspendido hasta el 25 de febrero 2025 con una posible fecha reanudación 26 de febrero 2025 y un plazo final de ejecución para el próximo 27 de febrero 2025, por parte del Ministerio del Interior en su función de supervisión requiere contar la información anteriormente mencionados, toda vez que, la Entidad Territorial deberá garantizar el cumplimiento de requisitos para la reactivación del convenio que permitan garantizar la satisfacción de los fines estatales en cumplimiento del 100 % del objeto del convenio. Así las cosas, se solicita amablemente que el Municipio de Tipacoque - Boyacá, en un término máximo de dos (2) días siguientes al recibo de esta

comunicación, emita respuesta a lo descrito, enviando los respectivos soportes y documentación que permita determinar el estado y avance de las gestiones. (…)"

11/02/2025, Se remite correo electrónico: *"RE: AVANCE DE LOS HECHOS ESTIPULADOS DENTRO DEL ACTA DE REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024."*

"(…) Cordial saludo, conforme al informe remitido, hacemos la siguiente solicitud:

- *Solicitamos la evidencia fotográfica de la señalética del GYM VITAL.*

MUNICIPIO DE TIPACOQUE Nit: 800.099.187-6	GESTIÓN DOCUMENTAL	CODIGO:	M-MECI-GD-FO-03
	SECRETARIA DE PLANEACION	VERSION:	02
	INFORME	FECHA DE EMISION:	2024

3- Zona de Gym Vital: en la placa del concreto y bordillo presenta asentamientos pronunciados que se debe subsanar y enviar reporte a la supervisión del ministerio, Falta la señalética del GYM vital.

Se demolió la respectiva Viga y se hizo el mejoramiento de la misma

Registro fotográfico.



Para lo anterior, agradecemos se dé cumplimiento en el término de dos (2) días hábiles. (…)"

14/02/2025, Se remite oficio al municipio mediante 2025-2-003122-003238 Id: 492161 *"Solicitud documentación frente al recibo del Convenio Interadministrativo No.2314 - 2022"*

"(…) En atención al convenio 2314 de 2022 suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de TIPACOQUE-BOYACA, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ", mediante el presente comunicado, para la cual se tiene programada como posible fecha de visita al Municipio el jueves 27 de febrero de 2024 para realizar el recibo del proyecto Sacúdete, la cual debe ser acompañada por funcionarios de la administración (supervisor del convenio), así como interventoría y contratista, por lo cual, el Municipio deberá garantizar la seguridad y el acompañamiento necesario durante su estadía en el Municipio. Por lo anterior se debe entregar la siguiente información:

• Acta final firmada por todos los profesionales, con sus respectivas sábanas de actividades ejecutadas (ACTA FINAL DE OBRA). (Contratista Obra, Contratista Interventoría de obra y supervisión del Municipio). • Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la interventoría al contratista de obra, firmada por los siguientes profesionales (Contratista de Interventoría y contratista de obra). • Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la supervisión del municipio al contratista de interventoría, firmada por los siguientes profesionales (supervisor del Municipio y contratista de interventoría). • Certificado de conexión eléctrica definitiva. (empresa de energía). • Certificado de la empresa prestadora del servicio de energía en la cual garantiza la prestación del servicio definitivo de energía al SACUDETE. • Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del supervisor del convenio. • Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del contratista de obra e interventoría de obra. • Certificado conexión acueducto y alcantarillado. Certificado de garantía y calidad de los juegos infantiles. • Certificado de garantía y calidad de los equipos de gimnasio. • Certificado grama sintética. •

Actualización de póliza cargada y aprobada por el Ministerio en SECOP II según última actuación (suspensión). • Acta final de cantidades y presupuesto. • Acta de Inventario por Espacios del SACUDETE. • Manual de Operación y Mantenimiento del SACUDETE y las Llaves de los espacios cerrados. • Planos récord en PDF firmados por el supervisor del convenio, el contratista de obra y el interventor de obra. • Informe final de interventoría y todos los informes semanales de interventoría ordenados cronológicamente. • Registro fotográfico en medio magnético. • Informe final de la supervisión del Municipio. o Informes mensuales de supervisión completos y ordenados cronológicamente debidamente publicados en la plataforma SECOPII. • Certificación RETIE. • Certificación RETILAP. • Informe financiero Final por parte de tesorero Municipal con sus soportes (ordenes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros).

Lo anterior se requiere en medio magnético para la visita del Ministerio del Interior, que sea legible y debidamente firmado por los responsables, al correo edwin.torres@mininterior.gov.co con copia al correo viterbo.gomez@mininterior.gov.co

En este sentido, recordamos la CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
"(…) 30. Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo las visitas de seguimiento que realicen. 35. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento controla la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación del contratista de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes. 37. Publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO un (1) informe final a la terminación del convenio, al que deberán adjuntarse, los siguientes documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. c) Balance Financiero discriminado del proyecto. d) Informe final de Interventor, el cual deberá contener como mínimo la información que para tal fin le sea requerida por el MINISTERIO. e) Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por el MINISTERIO en virtud del presente convenio. f) Certificación de la cuenta bancaria del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia de consignación al Tesoro Nacional de ser el caso dentro del término legal. 38. El Municipio se obliga a no poner funcionamiento disponer el uso de la obra construida, hasta tanto suscriba el acta de recibo de obra y se realice la entrega oficial de la misma al municipio por parte del MINISTERIO. En todo caso, la puesta en funcionamiento no podrá superar el término de un (1) mes, una vez ocurran las dos condiciones descritas anteriormente. 39. Asumir con sus propios recursos, la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento, sostenibilidad, custodia, vigilancia, destinación, saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del inmueble objeto del proyecto. 40. Entregar dentro del mes siguiente a la terminación del plazo del convenio todos los documentos e información requerida para la liquidación del convenio. El MUNICIPIO se obliga a entregar las actas de liquidación de los contratos derivados en donde se señale que las partes se encuentran en paz y salvo de toda obligación. Así mismo se obliga a mantener vigentes las garantías solicitadas en el convenio hasta la suscripción del acta de liquidación del mismo. 41. Suscribir la correspondiente acta de liquidación dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo del convenio, previo requerimiento del MINISTERIO. 42. Vigilar la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, con el fin de verificar que los aportes desembolsados por EL MINISTERIO sean invertidos única y exclusivamente en el cumplimiento del objeto del convenio. 43. Reintegrar al MINISTERIO DEL INTERIOR o al Tesoro Nacional según sea el caso, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al último desembolso, los saldos y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO DEL INTERIOR cierre de cuenta, que no hayan sido comprometidos ni reinvertidos dentro del plazo de ejecución pactado. 51. Entregar al Ministerio, previo al último desembolso, los planos récord de la obra, suscritos por el contratista, el interventor y la entidad territorial contratante. El MUNICIPIO deberá conservar copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de la obra. 52. Entregar copia de los contratos de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos. 53. Presentar, si da lugar a ello, el respectivo balance técnico y financiero del contrato al MINISTERIO sobre mayores cantidades de obra, desde lo técnico. El MINISTERIO no reconocerá mayores cantidades de obra desde lo técnico sin ser justificadas previamente por parte del contratista e interventor y sin que se encuentren amparadas por el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal con el que se garantice cierre financiero del proyecto, para su terminación funcional al 100%. 55. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 56. Exigir al contratista de estudios, diseños y obra y al de interventoría, la constitución de las garantías a las que haya lugar, con los amparos y suficiencias necesarios para conjurarlos riesgos identificados en la etapa precontractual. (…)"

Lo anterior, teniendo en cuenta que si en efecto el convenio se encuentra suspendido hasta el 25 de febrero 2025 con una posible fecha reanudación 26 de febrero 2025 y un plazo final de ejecución para el próximo 27 de febrero 2025, por parte del Ministerio del Interior en su función de supervisión requiere contar la información anteriormente mencionada, toda vez que, la Entidad Territorial deberá garantizar el cumplimiento de requisitos para la reactivación del convenio que permitan garantizar la satisfacción de los fines estatales en cumplimiento del 100 % del objeto del convenio. Así las cosas, se solicita amablemente que el Municipio de Tipacoque - Boyacá, en un término máximo de cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación, emita respuesta a lo descrito, enviando los respectivos soportes y documentación que permita determinar el estado y avance de las gestiones.

Lo anterior, teniendo en cuenta que si en efecto el convenio se encuentra suspendido hasta el 25 de febrero 2025 con una posible fecha reanudación 26 de febrero 2025 y un plazo final de ejecución para el próximo 27 de febrero 2025, por parte del Ministerio del Interior en su función de supervisión requiere contar la información anteriormente mencionados, toda vez que, la Entidad Territorial deberá garantizar el cumplimiento de requisitos para la reactivación del convenio que permitan garantizar la satisfacción de los fines estatales en cumplimiento del 100 % del objeto del convenio. Así las cosas, se solicita amablemente que el Municipio de Tipacoque - Boyacá, en un término máximo de dos (2) días siguientes al recibo de esta comunicación, emita respuesta a lo descrito, enviando los respectivos soportes y documentación que permita determinar el estado y avance de las gestiones. (…)"

Observaciones:

Se suscribe el Acta de Reanudación del convenio con fecha 26 de febrero de 2025 y un plazo final de ejecución para el próximo 27 de febrero 2025.

Se realiza el recibo del proyecto con fecha 27 de febrero de 2025, mediante Anexo 26 "Acta de Recibo y Entrega de Bienes", que se anexa al presente informe.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

03/05/2023	29/11/2023	27/09/2024	27/02/2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. VITERBO GOMEZ CARVAJAL Supervisor Convenio No. 2314 – 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**ARQ. EDWIN ANDRES TORRES ANGEL** Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-003238 Id: 492161
Folios: 4 Fecha: 13-02-2025 16:44:46
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: HECTOR_SEGUNDO_RAMIREZ_ESCOBAR

Bogotá D.C.

Sr.
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ ESCOBAR
Alcalde Municipal
Municipio de Tipacoque - Boyacá.
contactenos@tipacoque-boyaca.gov.co

Sr.
CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA
Secretario de Planeación
Municipio de Tipacoque - Boyacá.
planeacion@tipacoque-boyaca.gov.co

ASUNTO: Solicitud documentación frente al recibo del Convenio Interadministrativo No.2314 - 2022.

REF.: Convenio Interadministrativo No. 2314 - 2022.

Cordial saludo,

En atención al convenio **2314 de 2022** suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de TIPACOQUE-BOYACA**,** cuyo objeto es: ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ"***, mediante el presente comunicado, para la cual se tiene programada como posible fecha de visita al Municipio el **jueves 27 de febrero de 2024** para realizar el recibo del proyecto Sacúdete, la cual debe ser acompañada por funcionarios de la administración (supervisor del convenio), así como interventoría y contratista, por lo cual, el Municipio deberá garantizar la seguridad y el acompañamiento necesario durante su estadía en el Municipio.

Por lo anterior se debe entregar la siguiente información:

- Acta final firmada por todos los profesionales, con sus respectivas sábanas de actividades ejecutadas (ACTA FINAL DE OBRA). (Contratista Obra, Contratista Interventoría de obra y supervisión del Municipio).
- Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la interventoría al contratista de obra, firmada por los siguientes profesionales (Contratista de Interventoría y contratista de obra).
- Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la supervisión del municipio al contratista de interventoría, firmada por los siguientes profesionales (supervisor del Municipio y contratista de interventoría).
- Certificado de conexión eléctrica definitiva. (empresa de energía).
- Certificado de la empresa prestadora del servicio de energía en la cual garantiza la prestación del servicio definitivo de energía al SACUDETE.
- Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del supervisor del convenio.
- Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del contratista de obra e interventoría de obra.
- Certificado conexión acueducto y alcantarillado.

- Certificado de garantía y calidad de los juegos infantiles.
- Certificado de garantía y calidad de los equipos de gimnasio.
- Certificado grama sintética.
- Actualización de póliza cargada y aprobada por el Ministerio en SECOP II según última actuación (suspensión).
- Acta final de cantidades y presupuesto.
- Acta de Inventario por Espacios del SACUDETE.
- Manual de Operación y Mantenimiento del SACUDETE y las Llaves de los espacios cerrados.
- Planos récord en PDF firmados por el supervisor del convenio, el contratista de obra y el interventor de obra.
- Informe final de interventoría y todos los informes semanales de interventoría ordenados cronológicamente.
- Registro fotográfico en medio magnético.
- Informe final de la supervisión del Municipio.
    - Informes mensuales de supervisión completos y ordenados cronológicamente debidamente publicados en la plataforma SECOPII.
- Certificación RETIE.
- Certificación RETILAP.
- Informe financiero Final por parte de tesorero Municipal con sus soportes (ordenes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros).

Lo anterior se requiere en medio magnético para la visita del Ministerio del Interior, que sea legible y debidamente firmado por los responsables, al correo edwin.torres@mininterior.gov.co con copia al correo viterbo.gomez@mininterior.gov.co

En este sentido, recordamos la **CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

"(...) ***30.*** *Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo las visitas de seguimiento que realicen.*
35. *Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento controla la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación del contratista de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.*
37. *Publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO un (1) informe final a la terminación del convenio, al que deberán adjuntarse, los siguientes documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. c) Balance Financiero discriminado del proyecto. d) Informe final de Interventor, el cual deberá contener como mínimo la información que para tal fin le sea requerida por el MINISTERIO. e) Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por el MINISTERIO en virtud del presente convenio. f) Certificación de la cuenta bancaria del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia de consignación al Tesoro Nacional de ser el caso dentro del término legal.*
38. *El Municipio se obliga a no poner funcionamiento disponer el uso de la obra construida, hasta tanto suscriba el acta de recibo de obra y se realice la entrega oficial de la misma al municipio por parte del*

MINISTERIO. En todo caso, la puesta en funcionamiento no podrá superar el término de un (1) mes, una vez ocurran las dos condiciones descritas anteriormente.

***39.** Asumir con sus propios recursos, la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento, sostenibilidad, custodia, vigilancia, destinación, saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del inmueble objeto del proyecto.*

***40.** Entregar dentro del mes siguiente a la terminación del plazo del convenio todos los documentos e información requerida para la liquidación del convenio. El MUNICIPIO se obliga a entregar las actas de liquidación de los contratos derivados en donde se señale que las partes se encuentran en paz y salvo de toda obligación. Así mismo se obliga a mantener vigentes las garantías solicitadas en el convenio hasta la suscripción del acta de liquidación del mismo.*

***41.** Suscribir la correspondiente acta de liquidación dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo del convenio, previo requerimiento del MINISTERIO.*

***42.** Vigilar la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, con el fin de verificar que los aportes desembolsados por EL MINISTERIO sean invertidos única y exclusivamente en el cumplimiento del objeto del convenio.*

***43.** Reintegrar al MINISTERIO DEL INTERIOR o al Tesoro Nacional según sea el caso, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al último desembolso, los saldos y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO DEL INTERIOR cierre de cuenta, que no hayan sido comprometidos ni reinvertidos dentro del plazo de ejecución pactado.*

***51.** Entregar al Ministerio, previo al último desembolso, los planos récord de la obra, suscritos por el contratista, el interventor y la entidad territorial contratante. El MUNICIPIO deberá conservar copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de la obra.*

***52.** Entregar copia de los contratos de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos.*

***53.** Presentar, si da lugar a ello, el respectivo balance técnico y financiero del contrato al MINISTERIO sobre mayores cantidades de obra, desde lo técnico. El MINISTERIO no reconocerá mayores cantidades de obra desde lo técnico sin ser justificadas previamente por parte del contratista e interventor y sin que se encuentren amparadas por el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal con el que se garantice cierre financiero del proyecto, para su terminación funcional al 100%.*

***55.** Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.*

***56.** Exigir al contratista de estudios, diseños y obra y al de interventoría, la constitución de las garantías a las que haya lugar, con los amparos y suficiencias necesarios para conjurarlos riesgos identificados en la etapa precontractual. (...)"*

Lo anterior, teniendo en cuenta que si en efecto el convenio se encuentra suspendido hasta el 25 de febrero 2025 con una posible fecha reanudación 26 de febrero 2025 y un plazo final de ejecución para el próximo 27 de febrero 2025, por parte del Ministerio del Interior en su función de supervisión requiere contar la información anteriormente mencionada, toda vez que, la Entidad Territorial deberá garantizar el cumplimiento de requisitos

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-003238 Id: 492161
Folios: 4 Fecha: 13-02-2025 16:44:46
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: HECTOR_SEGUNDO_RAMIREZ_ESCOBAR

para la reactivación del convenio que permitan garantizar la satisfacción de los fines estatales en cumplimiento del 100 % del objeto del convenio. Así las cosas, se solicita amablemente que el Municipio de Tipacoque - Boyacá, en un término máximo de ***cinco (5) días*** siguientes al recibo de esta comunicación, emita respuesta a lo descrito, enviando los respectivos soportes y documentación que permita determinar el estado y avance de las gestiones.

Cordialmente,

VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio 2314-2022
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana - Ministerio del Interior

Anexos: Acta de Ampliación Suspensión No. 3 a la Suspensión No. 3. Tres (3) folios.
Elaboró: Edwin Andrés Torres Angel – Apoyo a la Supervisión SPSCC

Outlook

Solicitud documentación frente a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2314 - 2022.

Desde Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>
Fecha Jue 06/02/2025 12:02
Para 535_ALC <contactenos@tipacoque-boyaca.gov.co>; planeacion tipacoque-boyaca <planeacion@tipacoque-boyaca.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Hermes Mauricio Guarnizo Lopera <hermes.guarnizo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

1 archivo adjunto (213 KB)
2025-2-003122-000715 ID 475781.pdf;

Bogotá, D.C.

Sr.
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ ESCOBAR
Alcalde Municipal
Municipio de Tipacoque - Boyacá.
contactenos@tipacoque-boyaca.gov.co

Sr.
CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA
Secretario de Planeación
Municipio de Tipacoque - Boyacá.
planeacion@tipacoque-boyaca.gov.co

ASUNTO: Solicitud documentación frente a la ejecución del Convenio Interadministrativo No.2314 - 2022.

REF.: Reiteración oficio con Radicado 2025-2-003122-000715 Id: 475781 del 15 de enero de 2025.

Cordial Saludo,

En atención al seguimiento a la ejecución y la última modificación contractual *"Ampliación No.3 a la Suspensión No.3"* del Convenio interadministrativo No. 2314 del 2022, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Tipacoque - Boyacá, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ"*, la supervisión por parte del Ministerio del Interior se permite solicitar de manera urgente la entrega de la siguiente información:

1. Informes de supervisión por el Municipio con corte a 31 de diciembre 2024.
2. Informe financiero con corte a 31 de diciembre 2024.
3. Póliza actualizada de acuerdo con la última Reanudación.
4. Estado técnico, jurídico y financiero actual de los contratos derivados del convenio, tanto obra como interventoría.
5. Informe ejecutivo frente al avance de los hechos que motivaron la Ampliación No. 3 a la Suspensión No.3 del Convenio Interadministrativo No. 2314-2022, indicando si las causas han sido subsanadas, así como, las acciones adelantadas con el propósito de superar los hechos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que si en efecto el convenio se encuentra suspendido hasta el 25 de febrero 2025 con una posible fecha reanudación 26 de febrero 2025 y un plazo final de ejecución para el próximo 27 de febrero 2025, por parte del Ministerio del Interior en su función de supervisión requiere contar la información anteriormente mencionados, toda vez que, la Entidad Territorial deberá garantizar el cumplimiento de requisitos para la reactivación del convenio que permitan garantizar la satisfacción de los fines estatales en cumplimiento del 100 % del objeto del convenio. Así las cosas, se

solicita amablemente que el Municipio de Tipacoque - Boyacá, en un término máximo de ***dos (2) días*** siguientes al recibo de esta comunicación, emita respuesta a lo descrito, enviando los respectivos soportes y documentación que permita determinar el estado y avance de las gestiones.

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Edwin Andrés Torres Angel
edwin.torres@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

RE: AVANCE DE LOS HECHOS ESTIPULADOS DENTRO DEL ACTA DE REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Desde Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 11/02/2025 17:26
Para planeacion tipacoque-boyaca <planeacion@tipacoque-boyaca.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Hermes Mauricio Guarnizo Lopera <hermes.guarnizo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Cordial saludo, conforme al informe remitido, hacemos la siguiente solicitud:

- Solicitamos la evidencia fotográfica de la señalética del GYM VITAL.



MUNICIPIO DE TIPACOQUE Nit: 800.099.187-6	GESTIÓN DOCUMENTAL	CODIGO:	M-MECI-GD-FO-03
	SECRETARIA DE PLANEACION	VERSION:	02
	INFORME	FECHA DE EMISION:	2024

3- Zona de Gym Vital: en la placa del concreto y bordillo presenta asentamientos pronunciados que se debe subsanar y enviar reporte a la supervisión del ministerio, Falta la señalética del GYM vital.

Se demolió la respectiva Viga y se hizo el mejoramiento de la misma

Registro fotográfico.

Para lo anterior, agradecemos se de cumplimiento en el término de dos (2) días hábiles.

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Edwin Andrés Torres Angel
edwin.torres@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: planeacion tipacoque-boyaca <planeacion@tipacoque-boyaca.gov.co>
Enviado: martes, 11 de febrero de 2025 15:17
Para: Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>; Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>
Asunto: AVANCE DE LOS HECHOS ESTIPULADOS DENTRO DEL ACTA DE REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cordial saludo, por medio del presente me permito remitir informe referente a Informe frente al avance de los hechos estipulados dentro del acta de reunión realizada el día 27 de septiembre de 2024 entre la supervisión del ministerio del interior, interventoría, contratista y supervisión por parte del municipio del proyecto denominado sacúdete al parque tipo 1 del municipio de Tipacoque – Boyacá

Sin otro particular, quedamos atentos a la trazabilidad referente al proyecto
--

ARQ. CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIÓN
CEL. 3172901255

Outlook

Solicitud documentación frente al recibo del Convenio Interadministrativo No.2314 - 2022

Desde Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 14/02/2025 10:11
Para planeacion tipacoque-boyaca <planeacion@tipacoque-boyaca.gov.co> <planeacion@tipacoque-boyaca.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Hermes Mauricio Guarnizo Lopera <hermes.guarnizo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

2 archivos adjuntos (1 MB)
2025-2-003122-003238.pdf; ACTA DE AMPLIACION SUSPENSION No 03 CONVENIO 2314 DE 2022.pdf;

Bogotá, D.C.

Sr.
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ ESCOBAR
Alcalde Municipal
Municipio de Tipacoque - Boyacá.
contactenos@tipacoque-boyaca.gov.co

Sr.
CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA
Secretario de Planeación
Municipio de Tipacoque - Boyacá.
planeacion@tipacoque-boyaca.gov.co

ASUNTO: Solicitud documentación frente al recibo del Convenio Interadministrativo No.2314 - 2022.

REF.: Convenio Interadministrativo No. 2314 - 2022.

Cordial saludo,

En atención al convenio **2314 de 2021** suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de TIPACOQUE-BOYACA**,** cuyo objeto es: ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ"***, mediante el presente comunicado, para la cual se tiene programada como posible fecha de visita al Municipio el **jueves 27 de febrero de 2024** para realizar el recibo del proyecto Sacúdete, la cual debe ser acompañada por funcionarios de la administración (supervisor del convenio), así como interventoría y contratista, por lo cual, el Municipio deberá garantizar la seguridad y el acompañamiento necesario durante su estadía en el Municipio.

Por lo anterior se debe entregar la siguiente información:

- Acta final firmada por todos los profesionales, con sus respectivas sábanas de actividades ejecutadas (ACTA FINAL DE OBRA). (Contratista Obra, Contratista Interventoría de obra y supervisión del Municipio).
- Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la interventoría al contratista de obra, firmada por los siguientes profesionales (Contratista de Interventoría y contratista de obra).
- Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la supervisión del municipio al contratista de interventoría, firmada por los siguientes profesionales (supervisor del Municipio y contratista de interventoría).
- Certificado de conexión eléctrica definitiva. (empresa de energía).
- Certificado de la empresa prestadora del servicio de energía en la cual garantiza la prestación del servicio definitivo de energía al SACUDETE.

- Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del supervisor del convenio.
- Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del contratista de obra e interventoría de obra.
- Certificado conexión acueducto y alcantarillado.
- Certificado de garantía y calidad de los juegos infantiles.
- Certificado de garantía y calidad de los equipos de gimnasio.
- Certificado grama sintética.
- Actualización de póliza cargada y aprobada por el Ministerio en SECOP II según última actuación (suspensión).
- Acta final de cantidades y presupuesto.
- Acta de Inventario por Espacios del SACUDETE.
- Manual de Operación y Mantenimiento del SACUDETE y las Llaves de los espacios cerrados.
- Planos récord en PDF firmados por el supervisor del convenio, el contratista de obra y el interventor de obra.
- Informe final de interventoría y todos los informes semanales de interventoría ordenados cronológicamente.
- Registro fotográfico en medio magnético.
- Informe final de la supervisión del Municipio.
    - Informes mensuales de supervisión completos y ordenados cronológicamente debidamente publicados en la plataforma SECOPII.
- Certificación RETIE.
- Certificación RETILAP.
- Informe financiero Final por parte de tesorero Municipal con sus soportes (ordenes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros).

Lo anterior se requiere en medio magnético para la visita del Ministerio del Interior, que sea legible y debidamente firmado por los responsables, al correo edwin.torres@mininterior.gov.co con copia al correo viterbo.gomez@mininterior.gov.co

En este sentido, recordamos la **CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

"(…) 30. Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo las visitas de seguimiento que realicen.
35. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento controla la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación del contratista de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.
37. Publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO un (1) informe final a la terminación del convenio, al que deberán adjuntarse, los siguientes documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. c) Balance Financiero discriminado del proyecto. d) Informe final de Interventor, el cual deberá contener como mínimo la información que para tal fin le sea requerida por el MINISTERIO. e) Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por el MINISTERIO en virtud del presente convenio. f) Certificación de la cuenta bancaria del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia de consignación al Tesoro Nacional de ser el caso dentro del término legal.
38. El Municipio se obliga a no poner funcionamiento disponer el uso de la obra construida, hasta tanto suscriba el acta de recibo de obra y se realice la entrega oficial de la misma al municipio por parte del MINISTERIO. En todo caso, la puesta en funcionamiento no podrá superar el término de un (1) mes, una vez ocurran las dos condiciones descritas anteriormente.
39. Asumir con sus propios recursos, la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento, sostenibilidad, custodia, vigilancia, destinación, saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del inmueble objeto del proyecto.
40. Entregar dentro del mes siguiente a la terminación del plazo del convenio todos los documentos e información requerida para la liquidación del convenio. El MUNICIPIO se obliga a entregar las actas de liquidación de los contratos derivados en donde se señale que las partes se encuentran en paz y salvo de toda obligación. Así mismo se obliga a mantener vigentes las garantías solicitadas en el convenio hasta la suscripción del acta de liquidación del mismo.
41. Suscribir la correspondiente acta de liquidación dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo del convenio, previo requerimiento del MINISTERIO.
42. Vigilar la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, con el fin de verificar que los aportes desembolsados por EL MINISTERIO sean invertidos única y exclusivamente en el cumplimiento del objeto del convenio.
43. Reintegrar al MINISTERIO DEL INTERIOR o al Tesoro Nacional según sea el caso, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al último desembolso, los saldos y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO DEL INTERIOR cierre de cuenta, que no hayan sido comprometidos ni reinvertidos dentro del plazo de ejecución pactado.

51. Entregar al Ministerio, previo al último desembolso, los planos récord de la obra, suscritos por el contratista, el interventor y la entidad territorial contratante. El MUNICIPIO deberá conservar copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de la obra.
52. Entregar copia de los contratos de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos.
53. Presentar, si da lugar a ello, el respectivo balance técnico y financiero del contrato al MINISTERIO sobre mayores cantidades de obra, desde lo técnico. El MINISTERIO no reconocerá mayores cantidades de obra desde lo técnico sin ser justificadas previamente por parte del contratista e interventor y sin que se encuentren amparadas por el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal con el que se garantice cierre financiero del proyecto, para su terminación funcional al 100%.
55. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
56. Exigir al contratista de estudios, diseños y obra y al de interventoría, la constitución de las garantías a las que haya lugar, con los amparos y suficiencias necesarios para conjurarlos riesgos identificados en la etapa precontractual. (…)"

Lo anterior, teniendo en cuenta que si en efecto el convenio se encuentra suspendido hasta el 25 de febrero 2025 con una posible fecha reanudación 26 de febrero 2025 y un plazo final de ejecución para el próximo 27 de febrero 2025, por parte del Ministerio del Interior en su función de supervisión requiere contar la información anteriormente mencionada, toda vez que, la Entidad Territorial deberá garantizar el cumplimiento de requisitos para la reactivación del convenio que permitan garantizar la satisfacción de los fines estatales en cumplimiento del 100 % del objeto del convenio. Así las cosas, se solicita amablemente que el Municipio de Tipacoque - Boyacá, en un término máximo de ***cinco (5) días*** siguientes al recibo de esta comunicación, emita respuesta a lo descrito, enviando los respectivos soportes y documentación que permita determinar el estado y avance de las gestiones.

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Edwin Andrés Torres Angel
edwin.torres@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO N.º 2314 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA.
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN ENERO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACÁ."		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	Calle 1 No. 3 -97 Tipacoque-B		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$1.470.717.000
	APORTES MIN – FONSECON		$1.470.717.000
	APORTES MUNICIPIO		$0.00
	OTROS APORTES		$
FECHA SUSCRIPCION	27 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONVENIO	27 DE JULIO DE 2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	**VITERBO GÓMEZ CARVAJAL**		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Viterbo Gómez Carvajal	ACTUAL	ACTUAL
	Pahola Andrea Ardila Puerto	01/10/2024	31/10/2024
	Sergio Sanjuán Santiago	14/09/2024	30/09/2024
	Hernando De Jesús Pérez	21/07/2023	30/09/2024
	Edgar Ricardo González Patiño	01/07/2023	20/07/2023
	Héctor Iván Ayala Dueñas	20/02/2023	30/06/2023
	Norman Eduardo Ortiz Tobar	27/12/2022	19/02/2023
SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO	**CRISTIAN FERNANDO PÉREZ ACOSTA**		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Cristian Fernando Pérez Acosta	04/01/2024	ACTUAL
	Rodrigo salcedo corredor	28/12/2022	31/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No 169522, con rubro de afectación presupuestal A03- 03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON	22/12/2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	radicado No. 2-2022060095 con cargo al cupo de aprobación de	14/12/2022	

	vigencias futuras		
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	No. 3522682-4	FECHA INICIAL: 27-DIC-2022	FECHA VENCIMIENTO: 01 -MAY-2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	**28 DE DICIEMBRE DE 2022**		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION		FECHA: 07/09/2023
	PRORROGA N°01		FECHA: 25/07/2023
	PRORROGA N°02		FECHA: 07/09/2023
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION N° 01		FECHA: 23/04/2024
	REINICIO N° 01		FECHA: 24/06/2024
	SUSPENSION N° 02		FECHA: 25/06/2024
	REINICIO N° 02		FECHA: 25/07/2024
	SUSPENSION N° 03		FECHA: 26/07/2024
	AMPLIACION SUSPENSION N°01 A SUSPENSION N° 03		FECHA: 23/08/2024
	AMPLIACION SUSPENSION N°02 A SUSPENSION N° 03		FECHA: 25/10/2024
	AMPLIACION SUSPENSION N°03 A SUSPENSION N° 03		FECHA: 26/12/2024
	REINICIO		FECHA: 26/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	27/02/2025		
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 27/01/2024		
	FECHA: 01/07/2024		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	1.323.645.000,000		
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$147.072.000,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR

PRIMER DESEMBOLSO	Del cuarenta por ciento (40%) del valor del convenio equivalente a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($588.286.800), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	29/12/2022	$588.286.800,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	Del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	08/03/2024	$367.679.250,00
TERCER DESEMBOLSO	Del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	01/04/2024	$367.679.250,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Del diez por ciento (10%) del valor del convenio equivalente a la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($147.071.700), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio	100%	DD/MM/AAAA	$147.071.700,00

	designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$1.323.645.300,00**
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$0,00**

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: **SURAMERICANA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3522682-4	Cumplimiento	$ 294.143.400,00	27/12/2022	27/01/2024
			27/12/2022	28/10/2024

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR		
LICITACION PUBLICA LP N° 001 DE 2023	***ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"***		**$1.323.645.000,00**		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00		
	DD/MM/AAAA		$ 0,00		
Nombre contratista	**UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE,** con Representante Legal INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS		NIT: 800.099.187-6 CC: 37.444.976		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**14/04/2023**	**Fecha de Terminación inicial del contrato**	**13/09/2023**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**PRORROGAS**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

	PRORROGA N° 01 (Tres meses (03) y Diez (10) Días)	11/07/2023	13/09/2023	24/12/2023	24/12/2023
	PRORROGA N° 02 (Dos meses (02)	23/12/2023	13/12/2023	24/02/2024	24/02/2024
	PRORROGA N° 03 (Un mes (01)	22/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	24/03/2024
	SUSPENSIONES Y REINICIOS	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	SUSPENSION No. 01 (un mes (01)	22/03/2024	22/03/2024	22/04/2024	24/04/2024
	AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	24/05/2024
	AMPLIACIÓN N° 02 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/05/2024	22/05/2024	22/06/2024	24/06/2024
	AMPLIACIÓN N° 03 A LA SUSPENSION NO. 01 (Ocho meses (08)	22/06/2024	22/06/2024	22/02/2025	24/02/2025
Fecha de terminación del Contrato	**24/02/2025**				
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$1.323.645.000,00**		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS EL ESTADO S.A.**				
POLIZA DE CUEMPLIMIENTO N°	**49-44-101030283**				
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°	**49-40-101009631**				
FECHA DE LA POLIZA DE CUEMPLIMIENTO	**13/04/2023**				
FECHA DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**10/04/2023**				

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE CONSULTORÍA C.M.A. No. 002 DE 2023	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO PUBLICO DENOMINADO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ"**	**$147.072.000,00**
Adicional en valor (adjuntar	DD/MM/AAAA	$ 0,00

celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00		
Nombre contratista	**GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA**		CC: 88.204.293		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**14/04/2023**	**Fecha de Terminación inicial del contrato**	**13/09/2023**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**PRORROGAS**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	PRORROGA N° 01 (Tres meses (03) y Diez (10) Días)	11/07/2023	13/09/2023	24/12/2023	24/12/2023
	PRORROGA N° 02 (Dos meses (02)	23/12/2023	13/12/2023	24/02/2024	24/02/2024
	PRORROGA N° 03 (Un mes (01)	22/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	24/03/2024
	SUSPENSIONES Y REINICIOS	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	SUSPENSION No. 01 (un mes (01)	22/03/2024	22/03/2024	22/04/2024	24/04/2024
	AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	24/05/2024
	AMPLIACIÓN N° 02 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/05/2024	22/05/2024	22/06/2024	24/06/2024
	AMPLIACIÓN N° 03 A LA SUSPENSION NO. 01 (Ocho meses (08)	22/06/2024	22/06/2024	22/02/2025	24/02/2025
Fecha de terminación del Contrato	**24/02/2025**				
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$147.072.000,00**		

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS EL ESTADO S.A.**
POLIZA DE CUEMPLIMIENTO N°	**49-44-10103287**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°	**49-40-101009643**
FECHA DE LA POLIZA DE CUEMPLIMIENTO	**14/04/2023**
FECHA DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**13/04/2023**

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MAYO_2024	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$458.058.073,39	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	100%
% EJECUTADO DE OBRA	100%

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% AVANCE DE OBRA	0,00	0,00	0,00	8.74 %	23.05 %	27.05 %	41.63 %	48.17 %	90.05 %	96.68%	98.37 %	99.31%
	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
	99.31 %	99.31 %	100,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME: NUMERO 12
AVANCE: 100.00 %
ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: $1.323.645.300,00
Pendiente por recibir: $147.071.700,00

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE ABRIL DE 2023: NO se realizaron actividades
MES DE MAYO DE 2023: NO se realizaron actividades
MES DE JUNIO DE 2023: NO se realizaron actividades
MES DE JULIO DE 2023: ACTIVIDADES

	
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA	**CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA**
	
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA	**CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA**

MES DE AGOSTO DE 2023: ACTIVIDADES

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**

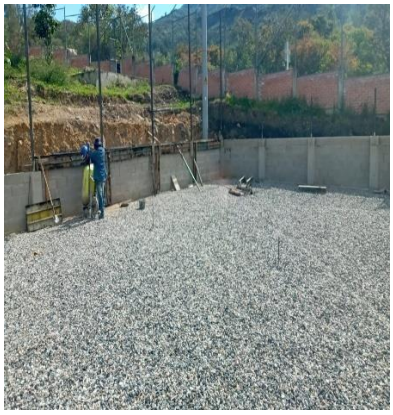
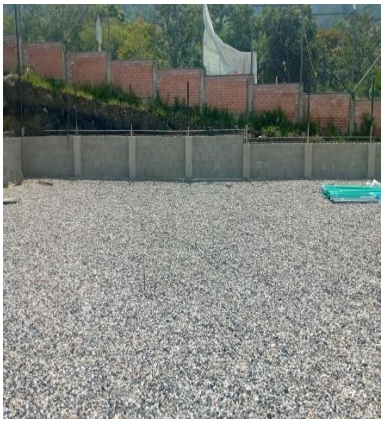
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**
	
AMARRE DE ACERO EN VIGAS	**AMARRE DE ACERO EN VIGAS**

	
AMARRE DE ACERO EN VIGAS	**AMARRE DE ACERO EN VIGAS**

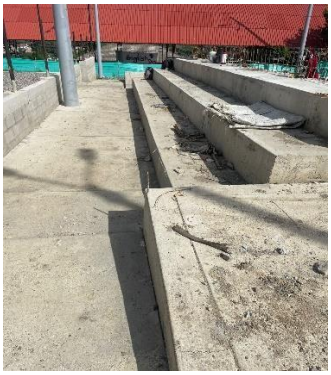
MES DE SEPTIEMBRE DE 2023: ACTIVIDADES

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**

	
RELLENO GRAVILLA	**RELLENO GRAVILLA**
	
RELLENO GRAVILLA	**TUBERIA SANITARIA**
	
TUBERIA SANITARIA	**TUBERIA SANITARIA**

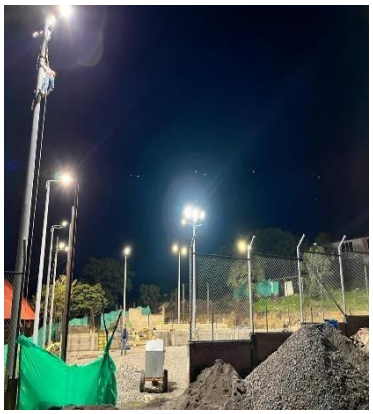
	
AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS	**AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS**
	
AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS	**AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS**
	
CONCRETO EN ZAPATAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**

	
CONCRETO GRADERIA	**CONCRETO GRADERIA**
	
BORDILLOS EN CONCRETO	**BORDILLOS EN CONCRETO**
	
CONCRETO EN ZAPATAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**

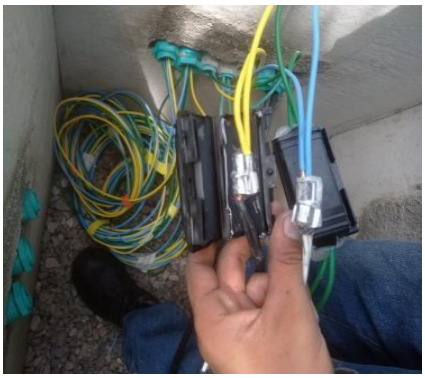
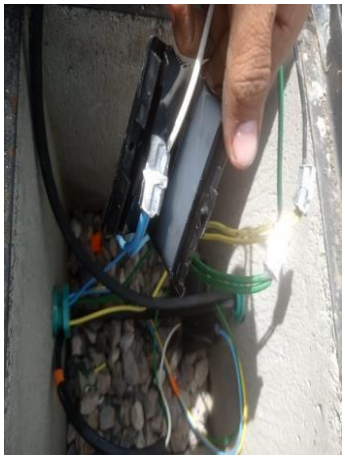
	
CONCRETO EN VIGA	**CONCRETO EN VIGA**
	
CONCRETO EN VIGA	**CONCRETO EN VIGA**

MES DE OCTUBRE DE 2023: ACTIVIDADES

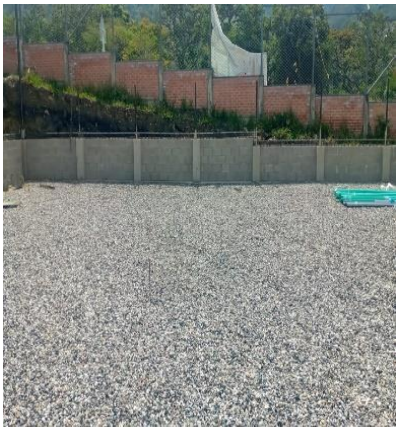
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200W.	**SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200W.**
	
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO STREET DE 120W	**SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO STREET DE 120W**
	
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO STREET DE 120W	**SOPORTE METALICO PARA RELECTORES CANCHAS.**
	
SOPORTE METALICO PARA RELECTORES CANCHAS.	**SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE FIBRA VIDRIO DE 12 m X 750 Kgf**

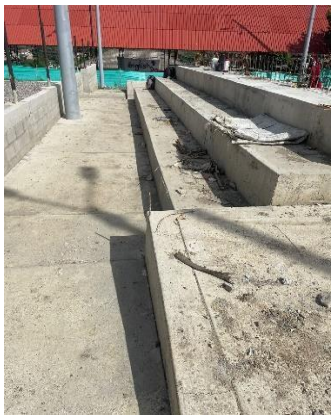
	
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE FIBRA VIDRIO DE 12 m X 750 Kgf	**SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y FUNDIDA DE MASTIL EN FIBRA DE VIDRIO DE 10mX150Kgf PARA MONTAJE DE LAMPARAS TIPO STREET**
	
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y FUNDIDA DE MASTIL EN FIBRA DE VIDRIO DE 10mX150Kgf PARA MONTAJE DE LAMPARAS TIPO STREET	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA DISTRIBUCION ELECTRICA EN POSTE - (CANCHA SINTETICA).**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA DISTRIBUCION ELECTRICA EN POSTE - (CANCHA SINTETICA).	**. ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN PROYECTADO POR BT - CONCENTRICO 2X8+8 AWG**

	
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE AISLADO 3X#12 AWG	**SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE AISLADO 3X#12 AWG**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME EN DERIVACION EN GEL	**SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME EN DERIVACION EN GEL**

	
CAJA DE PASO A.L. 30x30 cm.	**CAJA DE PASO A.L. 30x30 cm.**
	
CAJA DE PASO A.L. 60x60 cm.	**TUBERIA PVC DE 3/4"**
	
TUBERIA PVC DE 1"	**TUBERIA PVC DE 1"**

	
SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS	**SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS**
	
TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.	**TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.**
	
ESTRUCTURA RED TRENZADA FINAL DE CIRCUITO	**ESTRUCTURA RED TRENZADA CON DERIVACION**

	
CONEXION A ACOMETIDA BAJA TENSION EXISTENTE	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	**CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)**

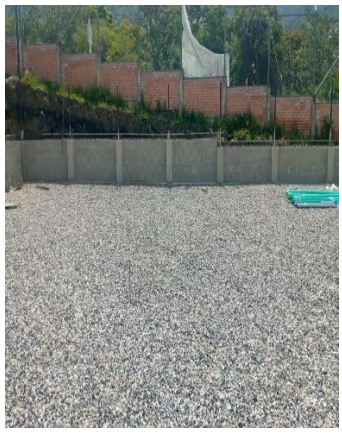
	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**ACERO FIGURADO 60000 PSI**
	
CONCRETO EN ZAPATAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**
	
CONCRETO GRADERIA	**CONCRETO GRADERIA**

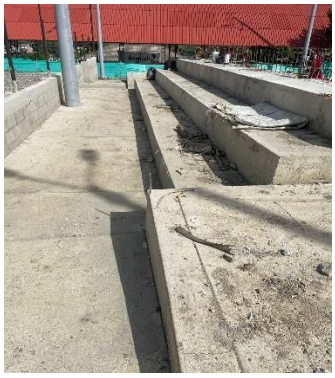
	
MALLA ELECTROSOLDADA	**CONCRETO PARA VIGAS**
	
CONCRETO PARA VIGAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**

MES DE NOVIEMBRE DE 2023: ACTIVIDADES

	
TUBERIA PVC DE 1"	**TUBERIA PVC DE 1"**

	
SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS	**SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS**
	
TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.	**TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.**
	
ESTRUCTURA RED TRENZADA FINAL DE CIRCUITO	**ESTRUCTURA RED TRENZADA CON DERIVACION**

	
CONEXION A ACOMETIDA BAJA TENSION EXISTENTE	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	**CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)**

	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**ACERO FIGURADO 60000 PSI**
	
BORDILLOS EN CONCRETO	**BORDILLOS EN CONCRETO**
	
CONCRETO GRADERIA	**CONCRETO GRADERIA CANCHA SINTETICA**

	
MALLA ELECTROSOLDADA	**CONCRETO PARA VIGAS**
	
CONCRETO PARA VIGAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**
MES DE DICIEMBRE DE 2023: ACTIVIDADES	
	

CONCRETO PARA VIGAS DEL TEATRO	**CONCRETO PARA VIGAS DEL TEATRO**
	
CONCRETO PARA COLUMNAS DEL TEATRO	**COMPACTACION SENDERO PEATONAL**
	
INSTALACION MAMPOSTERIA MURO LADRILLOSPLIT PARA TEATRO	**INSTALACION MAMPOSTERIA MURO LADRILLOSPLIT PARA TEATRO**
	

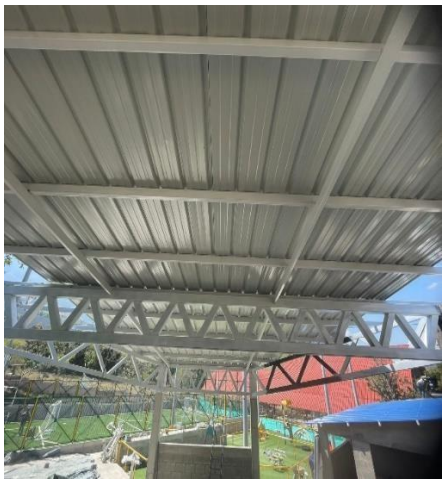
MAMPOSTERIA MURO LADRILLO SPLIT PARACAFETERIA, BAÑOS, SALA COMUNITARIA	**CONCRETO PARA GRADAS DEL TEATRO**
	
CONCRETO PARA SENDEROS PEATONALES YAREAS DE GYM VITAL – AREA JUEGOS	**CONCRETO PARA SENDEROS PEATONALES YAREAS DE GYM VITAL – AREA JUEGOS**
	
CONCRETO PARA GRADERIA DEL TEATRO	**CONCRETO PARA GRADERIA DEL TEATRO**
	

MAMPOSTERIA EN LADRILLO SPLIT PARA AREATEATRO	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO SPLIT PARA AREATEATRO**
	
VIGAS AEREAS PARA AREA DE BAÑOS, CAFETERIAY SALA COMUNITARIA	**JUEGOS INFANTILES EN EL SITIO**

MES DE FEBRERO DE 2024: ACTIVIDADES

	
SUMINISTRO E INSTALACION CIRCUITO MEDIEVAL MULTIFUNCION	**SUMINISTRO E INSTALACION COLUMPIO CANASTA ROTOMOLDEADORA**
	
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA JUEGOS MULTIPLES M-80	**SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE SILLAS DOBLES**

	
SUMINISTRO E INSTALACION GYM VITAL	**CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA**
	
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	**SUMNISTRO E INSTALACION TEJA LAMINA Y CORREAS Y CERCHAS**
	
SUMNISTRO E INSTALACION TEJA LAMINA Y CORREAS Y CERCHAS	**SUMINISTRO E INSTALACION PORTERIAS DE FUTBOL**

	
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA**
	
INSTALACION DE CUBIERTA BLOQUE DEL TEATRO	**INSTALACION DE CUBIERTA BLOQUE DEL TEATRO**
	
INSTALACION DE GRAMA PARA PAISAJISMO AREA JUEGOS	**SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA JUEGOS MULTIPLES M-80**

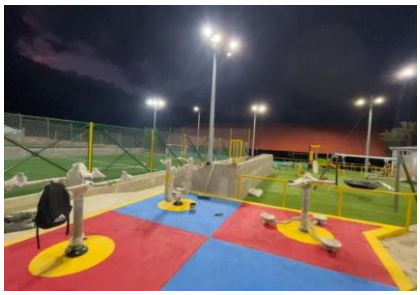
	
INSTALACION PUERTAS DE BAÑOS	**INSTALACION PUERTA DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS**
	
PUERTA ACCESO BAÑO DE MJERES	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 1"**
	
ALISTADO PISOS	**CANALETA Y BAJANTE TIPO AMAZONAS O**

	SIMILAR
	
CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA	**CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA**

MES DE MARZO DE 2024: ACTIVIDADES

	
CANCHA SINTETICA - CERRAMIENTO	**BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE**
	

SUMINISTRO E INSTALACION PLACA PARQUE	SUMINISTRO E INSTALACION CANCHA
	
PLACA SACUDETE AL PARQUE	**CICLOPARQUEADERO M100**
	
CANECA TIPO M-120	**VENTANA TIPO PERSIANA- PUERTA CAFETERIA**
	

SUMINISTRO E INSTALACION GYM VITAL	SUMINISTRO E INSTALACION COLUMPIOCANASTA
	
CHEQUEO DE ILUMINACION	CHEQUEO DE ILUMINACION

MES DE ABRIL DE 2024: SUSPENDIDO –Falta de documentación, obra culminada
MES DE MAYO DE 2024: SUSPENDIDO- Falta de documentación, obra culminada
MES DE JUNIO DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE JULIO DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE AGOSTO DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE SEPTIEMBRE DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE OCTUBRE DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE NOVIEMBRE DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE DICIEMBRE DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE ENERO DE 2025: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada

El contrato está Ejecutado al 100%

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	20/03/2024
25/04/2024	10/05/2024	14/06/2024	23/07/2024	30/08/2024	17/09/2024
24/08/2024	19/09/2024	18/10/2024	26/11/2024	27/12/2024	16/01/2025

CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA
Supervisor del contrato

INFORME MENSUAL DE EJECUCION

CONVENIO N.º 2314 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA.

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN FEBRERO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACÁ.**"**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	Calle 1 No. 3 -97 Tipacoque-B		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$1.470.717.000
	APORTES MIN – FONSECON		$1.470.717.000
	APORTES MUNICIPIO		$0.00
	OTROS APORTES		$
FECHA SUSCRIPCION	27 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONVENIO	27 DE JULIO DE 2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	**VITERBO GÓMEZ CARVAJAL**		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Viterbo Gómez Carvajal	ACTUAL	ACTUAL
	Pahola Andrea Ardila Puerto	01/10/2024	31/10/2024
	Sergio Sanjuán Santiago	14/09/2024	30/09/2024
	Hernando De Jesús Pérez	21/07/2023	30/09/2024
	Edgar Ricardo González Patiño	01/07/2023	20/07/2023
	Héctor Iván Ayala Dueñas	20/02/2023	30/06/2023
	Norman Eduardo Ortiz Tobar	27/12/2022	19/02/2023
SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO	**CRISTIAN FERNANDO PÉREZ ACOSTA**		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Cristian Fernando Pérez Acosta	04/01/2024	ACTUAL
	Rodrigo salcedo corredor	28/12/2022	31/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No 169522, con rubro de afectación presupuestal A03- 03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON	22/12/2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	radicado No. 2-2022060095 con cargo al cupo de aprobación de	14/12/2022	

	vigencias futuras		
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	No. 3522682-4	FECHA INICIAL: 27-DIC-2022	FECHA VENCIMIENTO: 01 -MAY-2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	**28 DE DICIEMBRE DE 2022**		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION		FECHA: 07/09/2023
	PRORROGA N°01		FECHA: 25/07/2023
	PRORROGA N°02		FECHA: 07/09/2023
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION N° 01		FECHA: 23/04/2024
	REINICIO N° 01		FECHA: 24/06/2024
	SUSPENSION N° 02		FECHA: 25/06/2024
	REINICIO N° 02		FECHA: 25/07/2024
	SUSPENSION N° 03		FECHA: 26/07/2024
	AMPLIACION SUSPENSION N°01 A SUSPENSION N° 03		FECHA: 23/08/2024
	AMPLIACION SUSPENSION N°02 A SUSPENSION N° 03		FECHA: 25/10/2024
	AMPLIACION SUSPENSION N°03 A SUSPENSION N° 03		FECHA: 26/12/2024
	REINICIO		FECHA: 26/02/2025
	TERMINACIÓN		FECHA: 27/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	27/02/2025		
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 27/01/2024		
	FECHA: 01/07/2024		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	1.323.645.000,000		
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$147.072.000,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Del cuarenta por ciento (40%) del valor del convenio equivalente a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($588.286.800), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	29/12/2022	$588.286.800,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	Del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	08/03/2024	$367.679.250,00
TERCER DESEMBOLSO	Del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	01/04/2024	$367.679.250,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Del diez por ciento (10%) del valor del convenio equivalente a la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS	100%	DD/MM/AAAA	$147.071.700,00

	PESOS M/L ($147.071.700), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$1.323.645.300,00**
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$0,00**

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: **SURAMERICANA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3522682-4	Cumplimiento	$ 294.143.400,00	27/12/2022	27/01/2024
			27/12/2022	28/10/2024

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
LICITACION PUBLICA LP N° 001 DE 2023	***ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"***		**$1.323.645.000,00**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	**UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE,** con Representante Legal INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS		NIT: 800.099.187-6 CC: 37.444.976
Fecha de Acta de inicio del contrato	**14/04/2023**	**Fecha de Terminación inicial del contrato**	**13/09/2023**

Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**PRORROGAS**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
	PRORROGA N° 01 (Tres meses (03) y Diez (10) Días)	11/07/2023	13/09/2023	24/12/2023	24/12/2023	
	PRORROGA N° 02 (Dos meses (02)	23/12/2023	13/12/2023	24/02/2024	24/02/2024	
	PRORROGA N° 03 (Un mes (01)	22/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	24/03/2024	
	SUSPENSIONES Y REINICIOS	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
	SUSPENSION No. 01 (un mes (01)	22/03/2024	22/03/2024	22/04/2024	24/04/2024	
	AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	24/05/2024	
	AMPLIACIÓN N° 02 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/05/2024	22/05/2024	22/06/2024	24/06/2024	
	AMPLIACIÓN N° 03 A LA SUSPENSION NO. 01 (Ocho meses (08)	22/06/2024	22/06/2024	22/02/2025	24/02/2025	
	ACTA DE REINICIO NO. 001	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	
Fecha de terminación del Contrato	**24/02/2025**					
VALOR TOTAL CONTRATADO:					**$1.323.645.000,00**	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS EL ESTADO S.A.**					
POLIZA DE CUEMPLIMIENTO N°	**49-44-101030283**					
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°	**49-40-101009631**					
FECHA DE LA POLIZA DE CUEMPLIMIENTO	**13/04/2023**					
FECHA DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**10/04/2023**					

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE CONSULTORÍA C.M.A. No. 002 DE 2023	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO**	**$147.072.000,00**

	PUBLICO DENOMINADO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ"				
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA				$ 0,00
	DD/MM/AAAA				$ 0,00
Nombre contratista	**GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA**				CC: 88.204.293
Fecha de Acta de inicio del contrato	**14/04/2023**	**Fecha de Terminación inicial del contrato**	**13/09/2023**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**PRORROGAS**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	PRORROGA N° 01 (Tres meses (03) y Diez (10) Días)	11/07/2023	13/09/2023	24/12/2023	24/12/2023
	PRORROGA N° 02 (Dos meses (02)	23/12/2023	13/12/2023	24/02/2024	24/02/2024
	PRORROGA N° 03 (Un mes (01)	22/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	24/03/2024
	SUSPENSIONES Y REINICIOS	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESDE**	**HASTA**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	SUSPENSION No. 01 (un mes (01)	22/03/2024	22/03/2024	22/04/2024	24/04/2024
	AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	24/05/2024
	AMPLIACIÓN N° 02 A LA SUSPENSION NO. 01 (Un mes (01)	22/05/2024	22/05/2024	22/06/2024	24/06/2024
	AMPLIACIÓN N° 03 A LA SUSPENSION NO. 01 (Ocho meses (08)	22/06/2024	22/06/2024	22/02/2025	24/02/2025
	ACTA DE REINICIO NO. 001	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025
Fecha de terminación del Contrato	**24/02/2025**				
VALOR TOTAL CONTRATADO:					**$147.072.000,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS EL ESTADO S.A.**				
POLIZA DE CUEMPLIMIENTO N°	**49-44-10103287**				

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°	**49-40-101009643**
FECHA DE LA POLIZA DE CUEMPLIMIENTO	**14/04/2023**
FECHA DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**13/04/2023**

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MAYO_2024	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$458.058.073,39	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	100%
% EJECUTADO DE OBRA	100%

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% AVANCE DE OBRA	0,00	0,00	0,00	8.74 %	23.05 %	27.05 %	41.63 %	48.17 %	90.05 %	96.68%	98.37 %	99.31%
	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
	99.31 %	99.31 %	100,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME: NUMERO 12
AVANCE: 100.00 %
ESTADO: ACTIVO
RECURSOS GIRADOS: $1.323.645.300,00
Pendiente por recibir: $147.071.700,00

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE ABRIL DE 2023: NO se realizaron actividades
MES DE MAYO DE 2023: NO se realizaron actividades
MES DE JUNIO DE 2023: NO se realizaron actividades
MES DE JULIO DE 2023: ACTIVIDADES

	
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA	**CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA**
	
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA	**CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONA**

MES DE AGOSTO DE 2023: ACTIVIDADES

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**

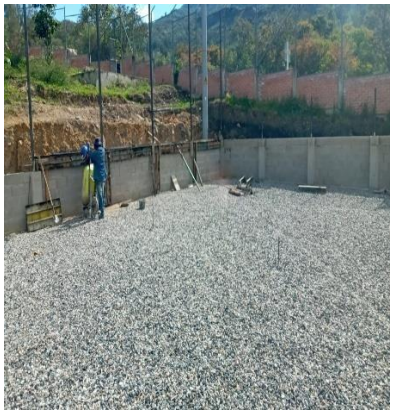
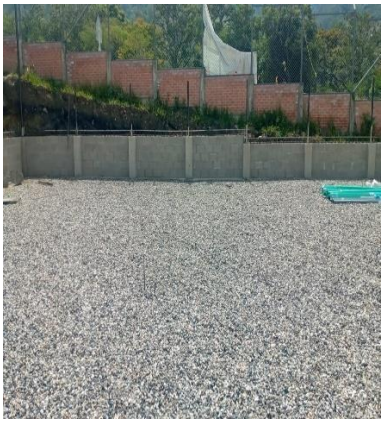
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**
	
AMARRE DE ACERO EN VIGAS	**AMARRE DE ACERO EN VIGAS**

	
AMARRE DE ACERO EN VIGAS	**AMARRE DE ACERO EN VIGAS**

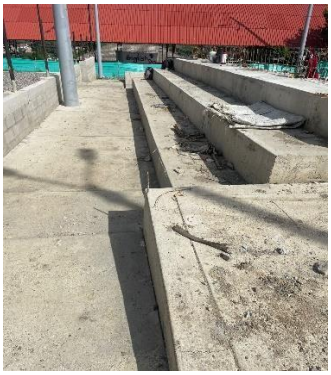
MES DE SEPTIEMBRE DE 2023: ACTIVIDADES

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**
	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**

	
EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA	**EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA**
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**
	
EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA	**EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA**

	
RELLENO GRAVILLA	**RELLENO GRAVILLA**
	
RELLENO GRAVILLA	**TUBERIA SANITARIA**
	
TUBERIA SANITARIA	**TUBERIA SANITARIA**

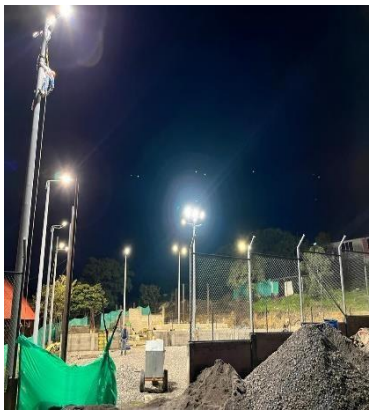
	
AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS	**AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS**
	
AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS	**AMARRE DE ACERO EN ZAPATA Y COLUMNAS**
	
CONCRETO EN ZAPATAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**

	
CONCRETO GRADERIA	**CONCRETO GRADERIA**
	
BORDILLOS EN CONCRETO	**BORDILLOS EN CONCRETO**
	
CONCRETO EN ZAPATAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**

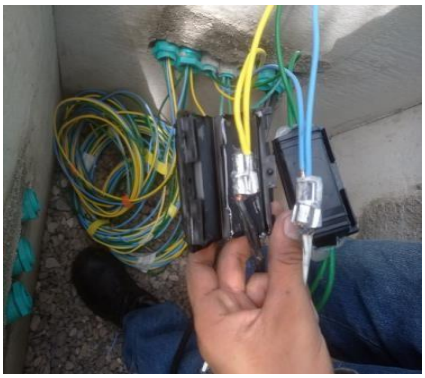
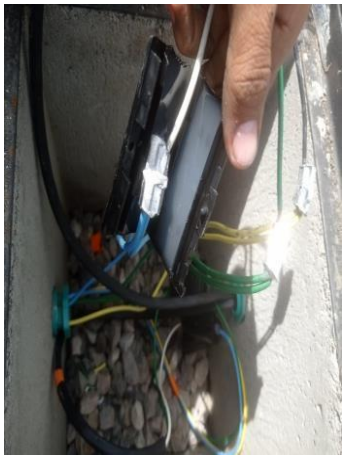
	
CONCRETO EN VIGA	**CONCRETO EN VIGA**
	
CONCRETO EN VIGA	**CONCRETO EN VIGA**

MES DE OCTUBRE DE 2023: ACTIVIDADES

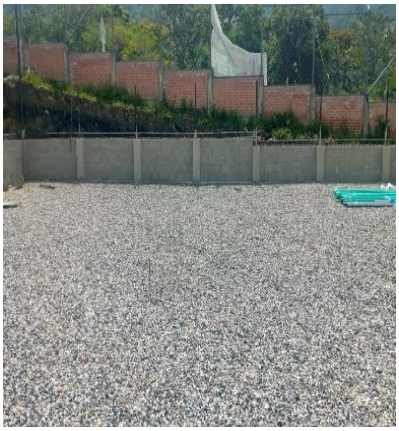
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200W.	**SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200W.**
	
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO STREET DE 120W	**SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO STREET DE 120W**
	
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO STREET DE 120W	**SOPORTE METALICO PARA RELECTORES CANCHAS.**
	
SOPORTE METALICO PARA RELECTORES CANCHAS.	**SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE FIBRA VIDRIO DE 12 m X 750 Kgf**

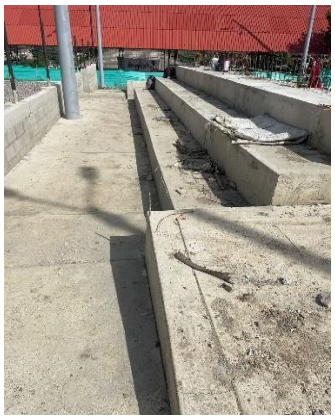
	
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE FIBRA VIDRIO DE 12 m X 750 Kgf	**SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y FUNDIDA DE MASTIL EN FIBRA DE VIDRIO DE 10mX150Kgf PARA MONTAJE DE LAMPARAS TIPO STREET**
	
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y FUNDIDA DE MASTIL EN FIBRA DE VIDRIO DE 10mX150Kgf PARA MONTAJE DE LAMPARAS TIPO STREET	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA DISTRIBUCION ELECTRICA EN POSTE - (CANCHA SINTETICA).**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA DISTRIBUCION ELECTRICA EN POSTE - (CANCHA SINTETICA).	**. ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN PROYECTADO POR BT - CONCENTRICO 2X8+8 AWG**

	
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE AISLADO 3X#12 AWG	**SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE AISLADO 3X#12 AWG**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME EN DERIVACION EN GEL	**SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME EN DERIVACION EN GEL**

	
CAJA DE PASO A.L. 30x30 cm.	**CAJA DE PASO A.L. 30x30 cm.**
	
CAJA DE PASO A.L. 60x60 cm.	**TUBERIA PVC DE 3/4"**
	
TUBERIA PVC DE 1"	**TUBERIA PVC DE 1"**

	
SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS	**SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS**
	
TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.	**TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.**
	
ESTRUCTURA RED TRENZADA FINAL DE CIRCUITO	**ESTRUCTURA RED TRENZADA CON DERIVACION**

	
CONEXION A ACOMETIDA BAJA TENSION EXISTENTE	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	**CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)**

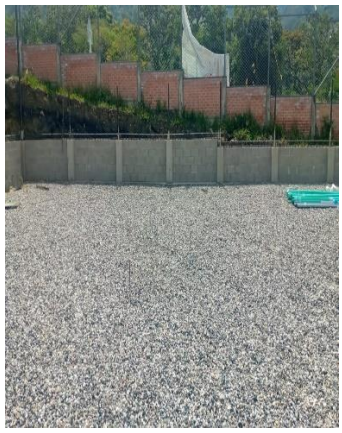
	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**ACERO FIGURADO 60000 PSI**
	
CONCRETO EN ZAPATAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**
	
CONCRETO GRADERIA	**CONCRETO GRADERIA**

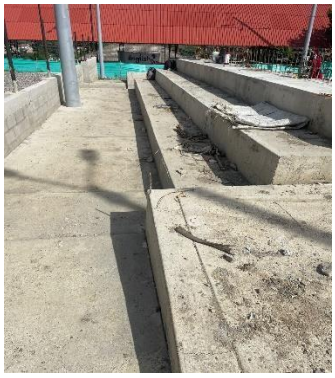
	
MALLA ELECTROSOLDADA	**CONCRETO PARA VIGAS**
	
CONCRETO PARA VIGAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**

MES DE NOVIEMBRE DE 2023: ACTIVIDADES

	
TUBERIA PVC DE 1"	**TUBERIA PVC DE 1"**

	
SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS	**SUMINISTRO E HINCADO DE VARILLA DE COBRE SOLIDO DE 5/8" x 2.4 METROS**
	
TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.	**TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.**
	
ESTRUCTURA RED TRENZADA FINAL DE CIRCUITO	**ESTRUCTURA RED TRENZADA CON DERIVACION**

	
CONEXION A ACOMETIDA BAJA TENSION EXISTENTE	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M**
	
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	**CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)**

	
MURO LADRILLO SPLIT E=0,15M	**ACERO FIGURADO 60000 PSI**
	
BORDILLOS EN CONCRETO	**BORDILLOS EN CONCRETO**
	
CONCRETO GRADERIA	**CONCRETO GRADERIA CANCHA SINTETICA**

	
MALLA ELECTROSOLDADA	**CONCRETO PARA VIGAS**
	
CONCRETO PARA VIGAS	**CONCRETO EN ZAPATAS**
MES DE DICIEMBRE DE 2023: ACTIVIDADES	
	

CONCRETO PARA VIGAS DEL TEATRO	**CONCRETO PARA VIGAS DEL TEATRO**
	
CONCRETO PARA COLUMNAS DEL TEATRO	**COMPACTACION SENDERO PEATONAL**
	
INSTALACION MAMPOSTERIA MURO LADRILLOSPLIT PARA TEATRO	**INSTALACION MAMPOSTERIA MURO LADRILLOSPLIT PARA TEATRO**
	

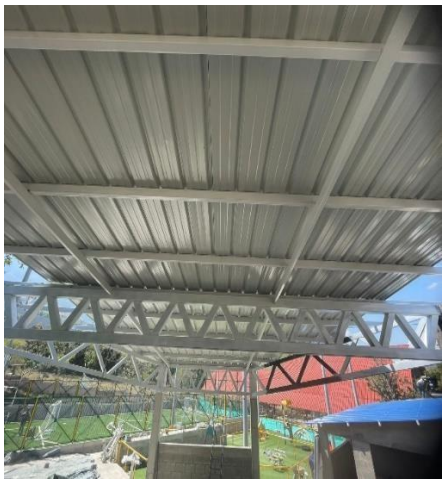
MAMPOSTERIA MURO LADRILLO SPLIT PARACAFETERIA, BAÑOS, SALA COMUNITARIA	**CONCRETO PARA GRADAS DEL TEATRO**
	
CONCRETO PARA SENDEROS PEATONALES YAREAS DE GYM VITAL – AREA JUEGOS	**CONCRETO PARA SENDEROS PEATONALES YAREAS DE GYM VITAL – AREA JUEGOS**
	
CONCRETO PARA GRADERIA DEL TEATRO	**CONCRETO PARA GRADERIA DEL TEATRO**
	

MAMPOSTERIA EN LADRILLO SPLIT PARA AREATEATRO	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO SPLIT PARA AREATEATRO**
	
VIGAS AEREAS PARA AREA DE BAÑOS, CAFETERIAY SALA COMUNITARIA	**JUEGOS INFANTILES EN EL SITIO**

MES DE FEBRERO DE 2024: ACTIVIDADES

	
SUMINISTRO E INSTALACION CIRCUITO MEDIEVAL MULTIFUNCION	**SUMINISTRO E INSTALACION COLUMPIO CANASTA ROTOMOLDEADORA**
	
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA JUEGOS MULTIPLES M-80	**SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE SILLAS DOBLES**

	
SUMINISTRO E INSTALACION GYM VITAL	**CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA**
	
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	**SUMNISTRO E INSTALACION TEJA LAMINA Y CORREAS Y CERCHAS**
	
SUMNISTRO E INSTALACION TEJA LAMINA Y CORREAS Y CERCHAS	**SUMINISTRO E INSTALACION PORTERIAS DE FUTBOL**

	
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA**
	
INSTALACION DE CUBIERTA BLOQUE DEL TEATRO	**INSTALACION DE CUBIERTA BLOQUE DEL TEATRO**
	
INSTALACION DE GRAMA PARA PAISAJISMO AREA JUEGOS	**SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA JUEGOS MULTIPLES M-80**

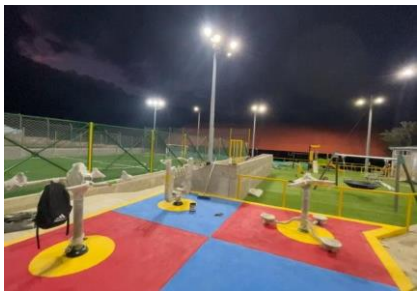
	
INSTALACION PUERTAS DE BAÑOS	**INSTALACION PUERTA DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS**
	
PUERTA ACCESO BAÑO DE MJERES	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 1"**
	
ALISTADO PISOS	**CANALETA Y BAJANTE TIPO AMAZONAS O**

	SIMILAR
	
CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA	**CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA**

MES DE MARZO DE 2024: ACTIVIDADES

	
CANCHA SINTETICA - CERRAMIENTO	**BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE**
	

SUMINISTRO E INSTALACION PLACA PARQUE	SUMINISTRO E INSTALACION CANCHA
	
PLACA SACUDETE AL PARQUE	**CICLOPARQUEADERO M100**
	
CANECA TIPO M-120	**VENTANA TIPO PERSIANA- PUERTA CAFETERIA**
	

SUMINISTRO E INSTALACION GYM VITAL	SUMINISTRO E INSTALACION COLUMPIOCANASTA
	
CHEQUEO DE ILUMINACION	CHEQUEO DE ILUMINACION

MES DE ABRIL DE 2024: SUSPENDIDO –Falta de documentación, obra culminada
MES DE MAYO DE 2024: SUSPENDIDO- Falta de documentación, obra culminada
MES DE JUNIO DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE JULIO DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE AGOSTO DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE SEPTIEMBRE DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE OCTUBRE DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE NOVIEMBRE DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE DICIEMBRE DE 2024: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE ENERO DE 2025: SUSPENDIDO -Falta de documentación, obra culminada
MES DE FEBRERO DE 2025: REINICIO- Y TERMINACIÓN –documentación total y obra culminada

El contrato está Ejecutado al 100%

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	20/03/2024
25/04/2024	10/05/2024	14/06/2024	23/07/2024	30/08/2024	17/09/2024
24/08/2024	19/09/2024	18/10/2024	26/11/2024	27/12/2024	16/01/2025
24/02/2025					

CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA
Supervisor del contrato

CONVENIO 2314-22

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I EN ELMUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACA

INFORME FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO DE TIPACOQUE

PROYECTO (S): SACUDETE TIPO 1

CUENTA (AHORROS) No. 339019630 **DEL BANCO:** **BANCO DE BOGOTA**

VALOR CONVENIO **$ 1.440.717.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.440.717.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 1 **$ 588.286.800,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 2 **$ 367.679.250,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 3 **$ 367.679.250,00**
GIRO 4 **$**

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.323.645.300,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 1.323.645.300,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	$ 1.323.645.000,00		$ 1.323.645.000,00	$ 1.323.645.000,00
CMA 002 2023	GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA	$ 147.072.000,00		$ 147.072.000,00	$ 147.072.000,00
TOTAL CONTRATADO				$ 1.470.717.000,00	$ 1.470.717.000,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202311080001	202311090001	9/11/2023	$ 98.048.000,00	$ 0,00	$ 98.048.000,00
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202311270001	202311270001	27/11/2023	$ 471.229.667,61	$ 0,00	$ 471.229.667,61
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202312110007	202404042	12/04/2024	$ 297.280.451,00	$ 0,00	$ 297.280.451,00
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202407002	202407002	2/07/2024	$ 324.690.118,50	$ 0,00	$ 324.690.118,50
CMA 002 2023	GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA	202312110008	202411101	20/11/2024	$ 96.284.454,00	$ 0,00	$ 96.284.454,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 1.287.532.691,11	$ 0,00	$ 1.287.532.691,11

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2023	$ 4.899,00
31/01/2023	$ 73.487,00
28/02/2023	$ 73.496,00
31/03/2023	$ 73.505,00
30/04/2023	$ 73.514,00
31/05/2023	$ 73.524,00
30/06/2023	$ 73.533,00
31/07/2023	$ 73.542,00
31/08/2023	$ 73.551,00
30/09/2023	$ 73.560,00
31/10/2023	$ 73.569,00
30/11/2023	$ 58.918,00
31/12/2023	$ 7.154,00
31/01//2024	$ 826,00
29/02/2024	$ 826,00
31/03/2024	$ 24.949,00
30/04/2024	$ 74.699,00
31/05/2024	$ 63.339,00
30/06/2024	$ 63.346,00
31/07/2024	$ 11.948,00
31/08/2024	$ 9.836,00
30/09/2024	$ 9.837,00
31/10/2024	$ 9.837,00
30/11/2024	$ 8.603,00
31/12/2024	$ 6.470,00
TOTAL (3)	$ 1.090.769,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

CONVENIO 2314-22

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I EN ELMUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACA

INFORME FINANCIERO AL 31 DE ENERO DE 2025
MUNICIPIO DE TIPACOQUE

PROYECTO (S): SACUDETE TIPO 1

CUENTA (AHORROS) No. 339019630 **DEL BANCO:** **BANCO DE BOGOTA**

VALOR CONVENIO **$ 1.440.717.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.440.717.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 1 **$ 588.286.800,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 2 **$ 367.679.250,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 3 **$ 367.679.250,00**
GIRO 4 **$**

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.323.645.300,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 1.323.645.300,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	$ 1.323.645.000,00		$ 1.323.645.000,00	$ 1.323.645.000,00
CMA 002 2023	GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA	$ 147.072.000,00		$ 147.072.000,00	$ 147.072.000,00
TOTAL CONTRATADO				$ 1.470.717.000,00	$ 1.470.717.000,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202311080001	202311090001	9/11/2023	$ 98.048.000,00	$ 0,00	$ 98.048.000,00
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202311270001	202311270001	27/11/2023	$ 471.229.667,61	$ 0,00	##############
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202312110007	202404042	12/04/2024	$ 297.280.451,00	$ 0,00	$ 297.280.451,00
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202407002	202407002	2/07/2024	$ 324.690.118,50	$ 0,00	$ 324.690.118,50
CMA 002 2023	GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA	202312110008	202411101	20/11/2024	$ 96.284.454,00	$ 0,00	$ 96.284.454,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 1.287.532.691,11	$ 0,00	$ 1.287.532.691,11

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2023	$ 4.899,00
31/01/2023	$ 73.487,00
28/02/2023	$ 73.496,00
31/03/2023	$ 73.505,00
30/04/2023	$ 73.514,00
31/05/2023	$ 73.524,00
30/06/2023	$ 73.533,00
31/07/2023	$ 73.542,00
31/08/2023	$ 73.551,00
30/09/2023	$ 73.560,00
31/10/2023	$ 73.569,00
30/11/2023	$ 58.919,00
31/12/2023	$ 7.154,00
31/01//2024	$ 826,00
29/02/2024	$ 826,00
31/03/2024	$ 24.949,00
30/04/2024	$ 74.699,00
31/05/2024	$ 63.339,00
30/06/2024	$ 63.346,00
31/07/2024	$ 11.948,00
31/08/2024	$ 9.836,00
30/09/2024	$ 9.837,00
31/10/2024	$ 9.837,00
30/11/2024	$ 8.603,00
31/12/2024	$ 6.470,00
31/01/2025	$ 6.471,00
TOTAL (3)	$ 1.097.240,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO.					
A. CONDICIONES INICIALES					
CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA LP-001-2023					
OBJETO DEL CONTRATO:	**"ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ"**				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Cinco (05) meses a partir de la firma del acta de inicio				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	14	DE	ABRIL	DE	2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13	DE	SEPTIEMBRE	DE	2023
VALOR DEL CONTRATO	**$1.323.645.000.00**				
MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL MONEDA CORRIENTE					
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE. R/L Ingrid del Rocio Tovar Ovallos				
SUPERVISOR	**CRISTIAN FERNANDO PÉREZ ACOSTA** Secretario de Planeación, Infraestructura y Contratación				

En el Despacho de la Alcaldía del Municipio de TIPACOQUE, se reunieron los señores **HÉCTOR SEGUNDO RAMÍREZ ESCOBAR** en calidad de Alcalde Municipal, **UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE** con Nit 901.690.869-0 con Representante Legal **INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS** identificado con cedula de ciudadanía No.37.444.976 expedida en Cúcuta-Norte de Santander , en calidad de contratista y **CRISTIAN FERNANDO PÉREZ ACOSTA**, Secretario de Planeación, Infraestructura y Contratación en calidad de Supervisor del Contrato.

Con el fin de protocolizar la entrega y recibo final del objeto contractual de acuerdo con las condiciones que a continuación se relacionan...

B. PRORROGAS		
PRÓRROGA	TIEMPO (MESES/ DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE APROBACIÓN
PRORROGA No 01	3 MESES Y 10 DIAS	24 DE DICIEMBRE 2023
PRORROGA No 02	2 MESES	24 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA No 03	1 MES	24 DE MARZO DE 2024

C. SUSPENSIONES Y/O AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN		
ACTA N°	TIEMPO (MESES/ DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE APROBACIÓN
SUSPENSION No 01	UN (01) MES	22 DE MARZO DE 2024
AMPLIACION No 01 A LA SUSPESION No 1	UN (01) MES	22 DE ABRIL DE 2024
AMPLIACION No 01 A LA SUSPESION No 02	UN (01) MES	22 DE MAYO DE 2024
AMPLIACION No 01 A LA SUSPESION No 03	OCHO (08) MESES	22 DE JUNIO DE 2024

D. ADICIONES		
ACTA N°	VALOR	FECHA DE APROBACIÓN

DOCUMENTO CONTROLADO

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO.

E. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	24	DE	FEBRERO	DE	2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24	DE	FEBRERO	DE	2025

VALOR EJECUTADO FINAL **$1.323.645.000.00**

FECHA DE RECIBO: 24 DE FEBRERO DE 2025

F. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

CONCEPTO	%	VALOR A PAGAR	VALORES PAGADOS Y SALDOS	VER. ACUMULADO
VALOR DEL CONTRATO	100	$1.323.645.000.00		
VALOR ACTA PARCIAL 01	7,41%		$ 98.048.000,00	
VALOR ACTA PARCIAL 02	35,60%		$ 471.229.667,61	$569.277.667,61
VALOR ACTA PARCIAL 03	22,46%		$ 297.280.451,00	$866.558.118,61
VALOR ACTA PARCIAL 4	32,91%		$ 324.690.118,50	$1.191.248.237,11
SALDO POR PAGAR	10,00%		$ 132.396.762,89	$1.323.645.000,00
SUMAS IGUALES	**100,00%**	**$1.323.645.000.00**	**$1.323.645.000.00**	

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 132.396.762,89)

1. EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO.
2. EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

Por lo señalado anteriormente, el municipio se encuentra a paz y salvo con el contratista. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los:

Veinticuatro 24 Días del mes de Febrero de 2025

HÉCTOR SEGUNDO RAMÍREZ ESCOBAR
Alcalde Municipal.

UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE
R/L INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
Contratista.

CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA
Supervisor.

GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA
R/L GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA
Interventor.

DOCUMENTO CONTROLADO

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022123112CD5010052554



343303 5-6

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
343303

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2022**

Desde: Diciembre 01	Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número:	339019630
Tipo de Cuenta:	Superdía Oficial
Cod. Origen:	1840
ZZ-INDIVIDUAL	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000001 Abonos:	588,286,800.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	4,899.00
Saldo Final:	**588,291,699.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/12	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio Del Inter	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	588,286,800.00	588,286,800.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		4,899.00	588,291,699.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023020101AH3152244441



62056 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
62056

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2023**
Desde: Enero 01 Hasta: Enero 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**588,291,699.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-21.00
Total Retencion:	-5,144.00
Total Intereses:	73,487.00
Saldo Final:	**588,360,021.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		73,487.00	588,365,186.00
31/01	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Duitama	G. Oficial Red 1		-5,144.00	588,360,042.00
31/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Duitama	G. Oficial Red 1		-21.00	588,360,021.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023030102AH3153032825



59240 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
59240

FECHA EXTRACTO **Febrero - Febrero 2023**
Desde: Febrero 01 Hasta: Febrero 28
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**588,360,021.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	73,496.00
Saldo Final:	**588,433,517.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		73,496.00	588,433,517.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023040203CD3153515200

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



323013 5-6

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
323013

FECHA EXTRACTO **Marzo - Marzo 2023**
Desde: Marzo 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**588,433,517.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	73,505.00
Saldo Final:	**588,507,022.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		73,505.00	588,507,022.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023042904AH3154938928



59822 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
59822

FECHA EXTRACTO **Abril - Abril 2023**
Desde: Abril 01 Hasta: Abril 30
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**588,507,022.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	73,514.00
Saldo Final:	**588,580,536.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		73,514.00	588,580,536.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023060105AH3155375162

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



60036 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
60036

FECHA EXTRACTO **Mayo - Mayo 2023**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**588,580,536.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	73,524.00
Saldo Final:	**588,654,060.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		73,524.00	588,654,060.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023070106CD3156121417

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



328962 5-6

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
328962

FECHA EXTRACTO **Junio - Junio 2023**
Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**588,654,060.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	73,533.00
Saldo Final:	**588,727,593.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/06	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		73,533.00	588,727,593.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023080107AH3157762538

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



60005 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
60005

FECHA EXTRACTO **Julio - Julio 2023**
Desde: Julio 01 Hasta: Julio 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**588,727,593.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	73,542.00
Saldo Final:	**588,801,135.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/07	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		73,542.00	588,801,135.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023090108AH3158011954



60173 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
60173

FECHA EXTRACTO **Agosto - Agosto 2023**
Desde: Agosto 01 Hasta: Agosto 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**588,801,135.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	73,551.00
Saldo Final:	**588,874,686.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		73,551.00	588,874,686.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023093009CD0296046588

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



332561 5-8

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
332561

FECHA EXTRACTO **Septiembre - Septiembre 2023**
Desde: Septiembre 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**588,874,686.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	73,560.00
Saldo Final:	**588,948,246.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/09	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		73,560.00	588,948,246.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023110110AH3168097369



60084 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
60084

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2023**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**588,948,246.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	73,569.00
Saldo Final:	**589,021,815.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		73,569.00	589,021,815.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023123012CD3168623811

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



336299 5-8

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
336299

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2023**
Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**114,010,198.39**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000007 Cargos:	-94,201,967.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	7,154.00
Saldo Final:	**19,815,385.39**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/12	0637	Cargo Transferencia ACH a Ban Agrario a cuenta ahorros numero 415863002430 por ICBS BUSINESS	Duitama	G. Oficial Red 1	000000	-14,231,900.00	99,778,298.39
15/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-11,386,000.00	88,392,298.39
26/12	0637	Cargo Transferencia ACH a Ban Agrario a cuenta corriente numero 015860003167 por ICBS BUSINESS	Duitama	G. Oficial Red 1	000000	-270,700.00	88,121,598.39
26/12	0637	Cargo Transferencia ACH a Ban Agrario a cuenta corriente numero 015860003167 por ICBS BUSINESS	Duitama	G. Oficial Red 1	000000	-5,692,777.00	82,428,821.39
26/12	0637	Cargo Transferencia ACH a Ban Agrario a cuenta ahorros numero 415863002473 por ICBS BUSINESS	Duitama	G. Oficial Red 1	000000	-11,385,600.00	71,043,221.39
26/12	0637	Cargo Transferencia ACH a Ban Agrario a cuenta ahorros numero 415863002481 por ICBS BUSINESS	Duitama	G. Oficial Red 1	000000	-22,771,107.00	48,272,114.39
26/12	0637	Cargo Transferencia ACH a Ban Agrario a cuenta ahorros numero 415863002198 por ICBS BUSINESS	Duitama	G. Oficial Red 1	000000	-28,463,883.00	19,808,231.39
31/12	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		7,154.00	19,815,385.39
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024020101AH3169809891

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



60149 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
60149

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2024**
Desde: Enero 01 Hasta: Enero 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**19,815,385.39**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	826.00
Saldo Final:	**19,816,211.39**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		826.00	19,816,211.39
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024030102AH3170705360

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



60482 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
60482

FECHA EXTRACTO **Febrero - Febrero 2024**
Desde: Febrero 01 Hasta: Febrero 29
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**19,816,211.39**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	826.00
Saldo Final:	**19,817,037.39**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/02	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		826.00	19,817,037.39
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024032803CD3171932565

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



340005 5-8

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
340005

FECHA EXTRACTO **Marzo - Marzo 2024**
Desde: Marzo 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**19,817,037.39**
Total 000001 Abonos:	367,679,250.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	24,949.00
Saldo Final:	**387,521,236.39**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/03	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio Del Inter	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	367,679,250.00	387,496,287.39
31/03	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		24,949.00	387,521,236.39
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024050104AH3172651607

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



25269 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CR 5 5-04
CENTRO
TIPACOQUE,BOYACA
Entrega: EM Oficina: 1840
25269

FECHA EXTRACTO **Abril - Abril 2024**
Desde: Abril 01 Hasta: Abril 30
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**387,521,236.39**
Total 000001 Abonos:	367,679,250.00
Total 000001 Cargos:	-248,229,176.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	74,699.00
Saldo Final:	**507,046,009.39**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/04	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio Del Inter	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	367,679,250.00	755,200,486.39
12/04	0216	Cargo transferencia por Business	Duitama	G. Oficial Red 1	000000	-248,229,176.00	506,971,310.39
30/04	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		74,699.00	507,046,009.39
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024060105AH3173401046

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



25608 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CR 5 5-04
CENTRO
TIPACOQUE,BOYACA
Entrega: EM Oficina: 1840
25608

FECHA EXTRACTO **Mayo - Mayo 2024**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**507,046,009.39**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	63,339.00
Saldo Final:	**507,109,348.39**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		63,339.00	507,109,348.39
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024062906AH3173877366

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



69978 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CR 5 5-04
CENTRO
TIPACOQUE,BOYACA
Entrega: EM Oficina: 1840
69978

FECHA EXTRACTO **Junio - Junio 2024**
Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**507,109,348.39**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	63,346.00
Saldo Final:	**507,172,694.39**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/06	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		63,346.00	507,172,694.39
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024080107AH3174756562

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



25551 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CR 5 5-04
CENTRO
TIPACOQUE,BOYACA
Entrega: EM Oficina: 1840
25551

FECHA EXTRACTO **Julio - Julio 2024**
Desde: Julio 01 Hasta: Julio 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**507,172,694.39**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-271,116,249.50
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	11,948.00
Saldo Final:	**236,068,392.89**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Duitama	G. Oficial Red 1	000000	-271,116,249.50	236,056,444.89
31/07	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		11,948.00	236,068,392.89
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024083108AH3175626446

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



24850 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CR 5 5-04
CENTRO
TIPACOQUE,BOYACA
Entrega: EM Oficina: 1840
24850

FECHA EXTRACTO **Agosto - Agosto 2024**
Desde: Agosto 01 Hasta: Agosto 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**236,068,392.89**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	9,836.00
Saldo Final:	**236,078,228.89**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	Duitama	GCIA OFICIAL 184		9,836.00	236,078,228.89
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024100109AH3176302906

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



69597 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CR 5 5-04
CENTRO
TIPACOQUE,BOYACA
Entrega: EM Oficina: 1840
69597

FECHA EXTRACTO **Septiembre - Septiembre 2024**
Desde: Septiembre 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**236,078,228.89**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	9,837.00
Saldo Final:	**236,088,065.89**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/09	GT01	Intereses ganados	Duitama	GCIA OFICIAL 184		9,837.00	236,088,065.89
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024110110AH0344564991

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



25953 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CR 5 5-04
CENTRO
TIPACOQUE,BOYACA
Entrega: EM Oficina: 1840
25953

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2024**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**236,088,065.89**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	9,837.00
Saldo Final:	**236,097,902.89**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados	Duitama	GCIA OFICIAL 184		9,837.00	236,097,902.89
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024113011AH3177427023

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



26102 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CR 5 5-04
CENTRO
TIPACOQUE,BOYACA
Entrega: EM Oficina: 1840
26102

FECHA EXTRACTO **Noviembre - Noviembre 2024**
Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**236,097,902.89**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-80,816,076.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	8,603.00
Saldo Final:	**155,290,429.89**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Duitama	GCIA OFICIAL 184	000000	-80,816,076.00	155,281,826.89
30/11	GT01	Intereses ganados	Duitama	GCIA OFICIAL 184		8,603.00	155,290,429.89
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024123112AH3178169753

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



69983 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CR 5 5-04
CENTRO
TIPACOQUE,BOYACA
Entrega: EM Oficina: 1840
69983

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2024**
Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**155,290,429.89**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	6,470.00
Saldo Final:	**155,296,899.89**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/12	GT01	Intereses ganados	Duitama	GCIA OFICIAL 184		6,470.00	155,296,899.89
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025020101AH3178761614

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



26681 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CR 5 5-04
CENTRO
TIPACOQUE,BOYACA
Entrega: EM Oficina: 1840
26681

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2025**
Desde: Enero 01 Hasta: Enero 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**155,296,899.89**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	6,471.00
Saldo Final:	**155,303,370.89**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Duitama	GCIA OFICIAL 184		6,471.00	155,303,370.89
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-008877 Id: 499378
Folios: 1 Fecha: 26-02-2025 20:33:03
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá,D.C.

PARA: **ASTRID CAROLINA SANCHEZ**
Subdirección de Gestión Contractual

DE: **VITERBO GÓMEZ CARVAJAL**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

ASUNTO: Remisión solicitud de reanudación de la suspensión No 3, Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No 2314-2022 suscrito entre el Ministerio de Interior y el municipio de Tipacoque, Boyaca.

En calidad de supervisor designado, remito para su estudio y tramite, la solicitud de reanudación de la Suspensión No. 3 al Convenio Interadministrativo No.2314-2022 suscrito entre el Ministerio del Interior y el municipio de Tipacoque – Boyaca, teniendo en cuenta que fueron superados los hechos que motivaron dicha suspensión.

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Reanudación
2. Solicitud por parte del municipio
3. RETIE/RETILAP
4. Soporte matricula conexión EBSA
5. Informe técnico

Cordialmente,

VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Profesional especializado 2028 Grado 19
Supervisor del Convenio 2314-2022

Elaboró:Arq.Edwin Andrés Torres– Apoyo a la Supervisión

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

ACTA DE REANUDACION No.	3
FECHA DEL ACTA	26/02/2025
CIUDAD	Bogotá, D.C.
CONTRATO/CONVENIO No.	2314 de 2022

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

FECHA DE SUSPENSION	26/07/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	Siete (7) meses
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO/CONVENIO	Un (1) día
FECHA DE REANUDACIÓN	26/02/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	27/02/2025

MOTIVOS DE REINICIO DEL CONTRATO/CONVENIO

Se suscribe acta de reanudación del convenio No. 2314 de 2022 entre el Municipio de Tipacoque - Boyacá y el Ministerio del Interior- FONSECON, en cumplimiento a los términos de tiempo establecidos en la ampliación No. 2 de la suspensión No. 3, donde se estipulo la fecha de reanudación del convenio para el 26 de febrero de 2025.

La supervisión del Ministerio del Interior verifica que los hechos que motivaron la suspensión No. 3 fueron superados, es decir, que la compañía energética la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A. E.S.P. realizó la conexión eléctrica definitiva y la instalación del medidor de corriente eléctrica y sean entregados los documentos de recibo, a la fecha han sido superados; el supervisor considera viable reiniciar el convenio y proceder a recibir el proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el marco del convenio No. 2314 de 2022, junto con los documentos Certificado RETIE con dictamen No. RYR-52789 - Resolución de Acreditación No. 16-OIN-035 del 23 de marzo de 2024 y Certificado RETILAP con dictamen No. RYR-52790 del 23 de marzo de 2024 - Conexión del servicio No. SAL-NOR-0000672-2024 del 11 de junio de 2024 con radicado SIEC 3555061, están adjuntados a esta acta para corroborar lo mencionado.

Con la suscripción de la presente acta de reanudación, el contratista/convenido se compromete a la modificación de la garantía correspondiente, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación del Ministerio.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Firma Supervisor
VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio
Ministerio del Interior
C.C. 91.494.257

Firma alcalde
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ ESCOBAR
Alcalde municipal
Municipio de Tipacoque-Boyacá
C.C. 9.398.832

Bogotá, 27 febrero de 2025,

La presente se suscribe verificado el cumplimiento de los compromisos pactados en la visita del 27 de febrero de 2025 por parte del profesional de apoyo designado por el Ministerio del Interior - Ing. Viterbo Gómez Carvajal y el Arq. Edwin Andrés Torres Ángel, quien verificó las condiciones técnicas, financieras y contractuales en marco del convenio 2314-2022 que tiene por objeto: "***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ.***"

ASISTENTES			
No	**NOMBRE**	**CARGO**	**REPRESENTA A**
1	HECTOR SEGUNDO RAMIREZ ESCOBAR	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIPACOQUE
2	CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MUNICIPIO DE TIPACOQUE
3	WILMAR MARTINEZ CASTRO	APOYO SUPERVISION MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TIPACOQUE
4	MANUEL VELAZCO VERJEL	RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA DE OBRA
5	INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS	REPRESENTANTE LEGAL OBRA	CONTRATISTA DE OBRA
6	MILADY ALVAREZ MANTILLA	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
7	GERMAN RICARDO VASQUEZ CHICHILLA	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
8	VITERBO GÓMEZ CARVAJAL	SUPERVISOR DEL CONVENIO	MINISTERIO DEL INTERIOR
9	EDWIN ANDRES TORRES ANGEL	APOYO A LA SUPERVISIÓN	MINISTERIO DEL INTERIOR

Nota: Se hace preciso indicar que, de acuerdo con los documentos de acta de recibo de obra suscrita por la interventoría de Obra GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA cuyo Contrato de interventoría C.M.A. No. 002 de 2023 y la Supervisión del municipio Arq. CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA (Secretario de Planeación, Infraestructura y Contratación), por parte del municipio de Tipacoque – Boyacá, el proyecto culminó su ejecución física en el mes de FEBRERO DE 2025. Por eso y considerando los conocimientos profesionales y experticia, se realiza el recibo y entrega del proyecto cumplidas y verificadas las condiciones anteriores con la visita del Arq. Edwin Andrés Torres Ángel delegado por el ing. Viterbo Gómez Carvajal como supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior, para que, en la fecha de esta acta, el apoyo a la supervisión del convenio firma la presente acta en Tipacoque – Boyacá.

1 ANTECEDENTES

El 27 de diciembre de 2022, EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO, suscribieron el Convenio Interadministrativo No.2314 de 2022, por valor de $1.470.717.000 M/L, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ."*

Durante el desarrollo del convenio se presentaron las siguientes actuaciones:

Generalidades – Convenio 2314-2022	
Suscripción del Convenio	27 de diciembre de 2022
Suscripción de acta de inicio del Convenio	28 de diciembre de 2022
Expedición de la Garantía	27 de diciembre de 2022
Suscripción de acta de inicio de los contratos de Estudios, diseños y obra.	14 de abril de 2023
Suscripción del Anexo 22 (Acta de entrega de estudios y diseños - Cierre financiero del proyecto e inicio del proyecto.	26 de junio 2023
Inicio de Fase de Construcción	27 de junio 2023

vgc

Acreditación Retie	Dictamen No. RYR-52789 - Resolución de Acreditación No. 16-OIN-035 del 23 de marzo de 2024
Acreditación Retilap	Dictamen No. RYR-52790 del 23 de marzo de 2024
Conexión eléctrica definitiva	Conexión del servicio No. SAL-NOR-0000672-2024 del 11 de junio de 2024 con radicado SIEC 3555061
Suscripción de acta terminación y recibo del municipio a los contratos derivados	24 de febrero de 2025
Plazo final del contrato derivado de Estudios, Diseños y Construcción e Interventoría	24 de febrero de 2025
Finalización del plazo del Convenio	27 de febrero de 2025

Descripción de Contratos de obra e Interventoría y supervisión por parte del Municipio de Tipacoque – Boyacá.

Supervisor del convenio: CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA
Cargo: SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIÓN
Cédula: 1.056.592.714 expedida Tipacoque - Boyacá.

Contrato de obra	Contrato de Interventoría
Contrato de obra No. 001 DE 2023 UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE NIT: 800.099.187-6	**Contrato de interventoría C.M.A. No. 002 DE 2023 GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA CC: 88.204.293**
R/L. INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS	**R/L. GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA**
Cédula: 37.444.976	**CC: 88.204.293 de Cúcuta**

DESARROLLO

- **COMPONENTE TÉCNICO**

A continuación, los bienes relacionados cumplen con las especificaciones establecidas en los requerimientos técnicos acorde con lo certificado por el interventor y lo que observó en la visita. El Ministerio del Interior formaliza el recibo y entrega del proyecto, previa acta firmada por la interventoría, supervisión de Municipio y contratista. Según el informe y acta de recibo a satisfacción de la Interventoría, el proyecto cumple con las áreas, materiales y las especificaciones técnicas requeridas en el presupuesto de obra conforme al proyecto viabilizado por el Ministerio del Interior.

Áreas construidas del proyecto por zonas:

La construcción del sacúdete al parque tipo 1 opción 1 en el municipio de Tipacoque – Boyacá, fue desarrollado en un predio de área aproximada de 1.200 m2, compuesto por las siguientes áreas útiles:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	AREA (M2) PROPUESTA	AREA (M2) EJECUTADA
1	Cancha sintética con cerramientos laterales y cerramiento de malla contra impacto	M2	550,40	544,88
2	Graderia	M2	26,72	26,66
3	Teatrino al aire libre	M2	106,60	104,60
4	Sala de juntas	M2	16,38	16,18
5	Baterías Sanitarias	M2	42,53	42,52
6	Cafetería	M2	19,59	19,82
7	Zona de juegos	M2	202,31	234,65
8	Gimnasio (Gym vital)	M2	38,60	44,59
9	Ciclo parqueo	M2	13,10	13,10
10	Áreas Verdes y Circulación	M2	184,77	188,17
	TOTAL		**1200,00**	**1235,17**

vgc

De acuerdo con la visita realizada el 27 de febrero de 2025 por el arquitecto Edwin Andrés Torres Ángel, así como la revisión técnica-documental, se efectuó una verificación de los planos, ítems y especificaciones técnicas de la fase 1 (estudios y diseños) frente a la ejecución física del proyecto, producto de lo cual se confirmó y validó el cumplimiento del objeto del Convenio, conforme al recibo de obra realizado por la Interventoría de Obra GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA cuyo Contrato de interventoría C.M.A. No. 002 de 2023 y la Supervisión del municipio Arq. CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA (Secretario de Planeación, Infraestructura y Contratación).

La supervisión por parte de Ministerio del Interior evidenció que el municipio de Tipacoque – Boyacá NO realizó adiciones a sus contratos derivados.

3. COMPONENTE FINANCIERO:

- El valor del Convenio 2314-2022 suscrito con el Municipio de Tipacoque – Boyacá, se pactó de la siguiente manera:

VALOR DEL CONVENIO		DISTRIBUCIÓN SEGÚN VIABILIDAD DEL PROYECTO	
DESCRIPCION	VALOR INICIAL DEL CONVENIO	DESCRIPCION	VALOR INICIAL DEL FASE DE ESTUDIOS
APORTES MINISTERIOR DEL INTERIOR	**$ 1.470.717.000**	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 98.048.000
APORTES MUNICIPIO	**$0,00**	INTERVENTORIA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 147.072.000
		OBRA Y CONSTRUCCION	$ 1.225.597.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 1.470.717.000**	**VALOR TOTAL DEL CONVENIO**	**$ 1.470.717.000**

- Posterior a la suscripción del convenio, el municipio realizó la contratación derivada para la fase 1 (Estudios y diseños) y fase 2 (ejecución de obra), incluyendo la contratación de interventoría. De acuerdo con lo anterior y el resultado de la fase 1, se obtuvieron los siguientes valores:

CONTRATO DERIVADO	DESCRICPION	VALOR INICIAL DE LOS CONTRATOS
Contrato de obra No. 001 DE 2023	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION	$ 1.323.645.000,00
Contrato de interventoría No. C.M.A. No. 002 DE 2023	INTERVENTORIA ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRA	$ 147.072.000,00
VALOR FINAL TOTAL DEL PROYECTO		**$1.470.717.000,00**

Notas:

- Como Resultado de la contratación derivada (contrato estudios, diseños y obra) el municipio contrató la totalidad de los recursos del convenio.

- No se realizaron adiciones al convenio. Por lo anterior expuesto, el valor del convenio quedó de la siguiente manera:

APORTES PARA EL CIERRE FINANCIERO	
DESCRIPCION	VALOR INICIAL DEL CONVENIO
APORTES MINISTERIOR DEL INTERIOR	**$1.470.717.000,00**
APORTES MUNICIPIO COFINANCIACION	$ 0,00
ADICIÓN MUNICIPIO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$1.470.717.000,00**

Ahora bien, de acuerdo con la cláusula sexta del Convenio, el Ministerio del Interior ha tramitado los siguientes desembolsos:

vgc

- **Pagos del Convenio 2314-2022:** Por parte del Ministerio del Interior, se ha realizado los pagos por concepto de primer, segundo y tercer desembolso para una suma total de $1.323.645.300 ML, lo que equivale al 90% de los aportes del Ministerio.

PRIMER DESEMBOLSO	SEGUNDO DESEMBOLSO	TERCER DESEMBOLSO	CUARTO DESEMBOLSO
Vigencia 2022	Vigencia 2024	Vigencia 2024	Vigencia 2025 Reserva
$588.286.800	$367.679.250	$367.679.250	Pendiente por pagar $147.071.700

ESTADO FINANCIERO			
DESEMBOLSO	VALOR	FECHA	ESTADO
Desembolso No. 1	$588.286.800	2022-12-29	Pagado
Desembolso No. 2	$367.679.250	2024-08-03	Pagado
Desembolso No. 3	$367.679.250	2024-01-04	Pagado
Desembolso No. 4	$147.071.700	Pdte. Por Pagar	Pdte. Por Pagar

- **Pagos de los Contratos Derivados:** Con sustento en el Informe financiero presentado por la Administración Municipal, durante la ejecución de los contratos derivados, el Municipio de Tipacoque – Boyacá, realizo los siguientes pagos:

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR		$ 1.440.717.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO		$ 0,00
	FECHA DE GIRO	
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	GIRO 1	$ 588.286.800,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	GIRO 2	$ 367.679.250,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	GIRO 3	$ 367.679.250,00
	GIRO 4	$
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 1.323.645.300,00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)		$ 1.323.645.300,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
LP_001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	$ 1.323.645.000,00		$ 1.323.645.000,00	$ 1.323.645.000,00
CMA_002 2023	GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA	$ 147.072.000,00		$ 147.072.000,00	$ 147.072.000,00
TOTAL CONTRATADO				$ 1.470.717.000,00	$ 1.470.717.000,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
LP_001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202311080001	202311090001	9/11/2023	$ 98.048.000,00	$ 0,00	$ 98.048.000,00
LP_001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202311270001	202311270001	27/11/2023	$ 471.229.667,61	$ 0,00	$ 471.229.667,61
LP_001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202312110007	202404042	12/04/2024	$ 297.280.451,00	$ 0,00	$ 297.280.451,00
LP_001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202407002	202407002	2/07/2024	$ 324.890.118,50	$ 0,00	$ 324.890.118,50
CMA_002 2023	GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA	-47	202411101	20/11/2024	$ 96.284.454,00	$ 0,00	$ 96.284.454,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 1.287.532.691,11	$ 0,00	$ 1.287.532.691,11

Valor pagado al Contrato de Obra No. 001 DE 2023	**$ 1.191.248.237,11**
Valor pagado al Contrato de interventoría No. C.M.A. No. 002 DE 2023	**$ 96.284.454,00**
Total pagado a la fecha	**$ 1.287.532.691,11**

Teniendo en cuenta el Anexo de Condiciones Contractuales del Convenio Interadministrativo, en la CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES, numeral 43, que establece: *"(…).Reintegrar al MINISTERIO DEL INTERIOR o al Tesoro Nacional según sea el caso, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al último desembolso, los saldos y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO DEL INTERIOR cierre de cuenta, que no hayan sido comprometidos ni reinvertidos dentro del plazo de ejecución pactado. (…)"*

Dicho lo anterior, los rendimientos financieros generados en la cuenta maestra del Convenio con corte al mes de **diciembre 2024**, registraron un valor total de **$ 1.090.769,00** sin embargo, teniendo en cuenta que se tiene al pendiente el pago por parte del Ministerio

vgc

del Interior por concepto de ultimo desembolso por valor $147.071.700, el Municipio de Tipacoque – Boyacá , deberá realizar el reintegro, abarcando los rendimientos totales acumulados hasta la fecha del cierre de la mencionada cuenta maestra.

En estas circunstancias, el Ente territorial previo al cierre de cuenta debe realizar el reintegro total de los saldos no ejecutados y rendimientos financieros, de acuerdo con los valores relacionados a continuación:

DESCRIPCION	VALOR
Rendimientos financieros	$ 1.090.769,00
VALOR TOTAL A REINTEGRAR	$ 1.090.769,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2023	$ 4.899,00
31/01/2023	$ 73.487,00
28/02/2023	$ 73.496,00
31/03/2023	$ 73.505,00
30/04/2023	$ 73.514,00
31/05/2023	$ 73.524,00
30/06/2023	$ 73.533,00
31/07/2023	$ 73.542,00
31/08/2023	$ 73.551,00
30/09/2023	$ 73.560,00
31/10/2023	$ 73.569,00
30/11/2023	$ 58.919,00
31/12/2023	$ 7.154,00
31/01/2024	$ 826,00
29/02/2024	$ 826,00
31/03/2024	$ 24.949,00
30/04/2024	$ 74.699,00
31/05/2024	$ 63.339,00
30/06/2024	$ 63.346,00
31/07/2024	$ 11.948,00
31/08/2024	$ 9.836,00
30/09/2024	$ 9.837,00
31/10/2024	$ 9.837,00
30/11/2024	$ 8.603,00
31/12/2024	$ 6.470,00
TOTAL (3)	$ 1.090.769,00

Por lo anterior expuesto, la entidad Territorial deberá realizar el reintegro a la cuenta de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, por un monto de **$ 1.090.769,00**, valor correspondiente a los rendimientos financieros generados una vez completado el pago correspondiente al último desembolso y cerrada la cuenta del Convenio 2314-2022. Este reembolso debe realizarse en un plazo no superior a 30 días hábiles, contados a partir del giro del último desembolso por parte del Ministerio del Interior.

4. COMPONENTE CONTRACTUAL

Durante la ejecución del convenio 2314-2022 se suscribieron las siguientes actuaciones contractuales:

ACTOS ADMINISTRATIVOS CONVENIO 2314-2022		
Tipo de Actuación	**Fecha de Suscripción**	**Fecha de Terminación**
Primera Prórroga	25 de julio de 2023	31 de diciembre de 2023
Segunda Prórroga y Primera Modificación	07 de septiembre de 2023	27 abril de 2024
Suspensión No. 1	23 de abril de 2024	27 de junio de 2024
Reanudación a la Suspensión No. 1	23 de junio de 2024	27 de junio de 2024
Suspensión No. 2	25 de junio de 2024	27 de julio de 2024
Reanudación a la Suspensión No. 2	25 de julio de 2024	27 de julio de 2024

vgc

Suspensión No. 3	26 de julio de 2024	27 de agosto de 2024
Ampliación 1 a la Suspensión No. 3	23 de agosto de 2024	27 de octubre de 2024
Ampliación 2 a la Suspensión No. 3	25 de octubre de 2024	27 de diciembre de 2024
Ampliación 3 a la Suspensión No. 3	19 de diciembre de 2024	27 de febrero de 2025

De igual manera, por parte del ente territorial se realizaron actuaciones contractuales a los contratos de obra e interventoría, tal como se relacionan a continuación:

A. Actuaciones contractuales contrato de obra:

ACTUACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2023 UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE		
Tipo de Actuación	**Fecha de Suscripción**	**Fecha de Terminación**
Contrato de Obra No. 001 DE 2023	13 de marzo de 2023	13 de septiembre de 2023
Acta de Inicio del Contrato	14 de abril de 2023	13 de septiembre de 2023
Prorroga No. 01	11 de julio de 2023	24 de diciembre de 2023
Prorroga No. 02	23 de diciembre de 2023	24 de febrero de 2024
Prorroga No. 03	22 de febrero de 2024	24 de marzo de 2024
Suspensión No.01	22 de marzo de 2024	22 de abril de 2024
Ampliación a Suspensión No.01	22 de abril de 2024	22 de mayo de 2024
Ampliación No. 2 a Suspensión No.01	22 de mayo de 2024	22 de junio de 2024
Ampliación No. 3 a Suspensión No.01	22 de junio de 2024	22 de febrero de 2025
Reanudación a la Suspensión No. 1	24 de febrero de 2025	24 de febrero de 2025

Actuaciones contractuales contrato de interventoría:

ACTUACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. C.M.A. No. 002 DE 2023 GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA		
Tipo de Actuación	**Fecha de Suscripción**	**Fecha de Terminación**
Contrato de Interventoría C.M.A. No. 002 DE 2023	14 de abril de 2023	13 de septiembre de 2023
Acta de Inicio del Contrato	14 de abril de 2023	13 de septiembre de 2023
Prorroga No. 01	11 de julio de 2023	24 de diciembre de 2023
Prorroga No. 02	23 de diciembre de 2023	24 de febrero de 2024
Prorroga No. 03	22 de febrero de 2024	24 de marzo de 2024
Suspensión No.01	22 de marzo de 2024	22 de abril de 2024
Ampliación a Suspensión No.01	22 de abril de 2024	22 de mayo de 2024
Ampliación No. 2 a Suspensión No.01	22 de mayo de 2024	22 de junio de 2024
Ampliación No. 3 a Suspensión No.01	22 de junio de 2024	22 de febrero de 2025
24 de febrero de 2025	24 de febrero de 2025	24 de febrero de 2025

A la fecha se expidieron y aprobaron las siguientes garantías del convenio 2314-2022:

POLIZAS CONVENIO							
ASEGURADORA	ACTUACIÓN	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		APROBACIÓN
					FECHA INICIO	FECHA FINAL	
SURAMERICANA DE SEGUROS	Acta de inicio	3522682-4	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	$ 294.143.400	27/12/2022	27/01/2024	28/12/2022
SURAMERICANA DE SEGUROS	Prorroga No.1	3522682-4	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	$ 294.143.400	27/12/2022	01/07/2024	06/09/2023
SURAMERICANA DE SEGUROS	Prorroga No.2, modificación No.1	3522682-4	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	$ 294.143.400	27/12/2022	28/10/2024	28/12/2023
SURAMERICANA DE SEGUROS	Ampliación 1 a la Suspensión No. 3	3522682-4	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	$ 294.143.400	27/12/2022	26/08/2024	01/05/2025

vgc

5. RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Con la formalización de la presente acta, se recomienda al municipio de Tipacoque – Boyacá, tener en cuenta lo siguiente:

Se resalta que el Municipio, dentro del convenio suscrito con el Ministerio del interior, para asumir la custodia, funcionamiento y mantenimiento, se encuentra, según la "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO" en las siguientes obligaciones:

"(...) 38. El Municipio se obliga a no poner en funcionamiento ni disponer el uso de la obra construida, hasta tanto se suscriba el acta de recibo de obra y se realice la entrega oficial de la misma al municipio por parte del MINISTERIO. En todo caso, la puesta en funcionamiento no podrá superar el término de un (1) mes, una vez ocurran las dos condiciones descritas anteriormente.
39. Asumir con sus propios recursos, la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento, sostenibilidad, custodia, vigilancia, destinación, saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del proyecto.
40. Entregar dentro del mes siguiente a la terminación del plazo del convenio todos los documentos e información requerida para la liquidación del convenio. El MUNICIPIO se obliga a entregar las actas de liquidación de los contratos derivados en donde se señale que las partes se encuentran a paz y salvo de toda obligación. Así mismo se obliga a mantener vigentes las garantías solicitadas en el convenio hasta la suscripción del acta de liquidación del mismo.
41. Suscribir la correspondiente acta de liquidación dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo del convenio, previo requerimiento del MINISTERIO.
43. Reintegrar al MINISTERIO DEL INTERIOR o al Tesoro Nacional según sea el caso, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al último desembolso, los saldos y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO DEL INTERIOR a cierre de cuenta, que no hayan sido comprometidos ni reinvertidos dentro del plazo de ejecución pactado.
44. Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo.
45. Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.
51. Entregar al Ministerio, previo al último desembolso, los planos récord de la obra, suscritos por el contratista, el interventor y la entidad territorial contratante. El MUNICIPIO deberá conservar copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de la obra.
54. Responder por cualquier situación (excepto fuerza mayor o caso fortuito) que afecte la ejecución del proyecto e impida el cabal cumplimiento del objeto del convenio.
55. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoria, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 56. Exigir a al contratista de estudios, diseños y obra y al de interventoría, la constitución de las garantías a las que haya lugar, con los amparos y suficiencias necesarias para conjurar los riesgos identificados en la etapa precontractual. El MUNICIPIO se obliga a exigir a los contratistas incorporar como beneficiarios de las garantías a las que se refiere el numeral anterior, al MINISTERIO DEL INTERIOR. (...)".

Las recomendaciones técnicas para la correcta operación y mantenimiento del Proyecto son:

- ✓ *Se resalta que el recibo de las obras objeto del presente contrato, no implica que la construcción no esté susceptible de presentar novedades técnicas, las cuales, en todo caso, deberán ser resueltas por el municipio de Tipacoque – Boyacá, satisfactoriamente.*
- ✓ *El Municipio informa y deja constancia que durante el transcurso de la obra se realizaron las pruebas hidráulicas, sanitarias y eléctricas vigiladas y aprobadas por la interventoría y avalada por el municipio de Tipacoque – Boyacá, necesarias para el buen funcionamiento de la obra, las cuales se describen en el informe final de interventoría.*
- ✓ *Se recomienda el buen manejo y cuidado en paredes, pisos, así como en todos los elementos que contiene la obra.*
- ✓ *Se recomienda al municipio de Tipacoque – Boyacá, hacer los mantenimientos preventivos necesarios a la cancha sintética, sistemas eléctricos, hidrosanitarios, y todos los demás espacios o componentes que se relacionen a la obra producto del presente convenio, así como hacer buen uso de estas áreas.*
- ✓ *Se deja constancia que los delegados y/o supervisores de la Alcaldía Municipal de Tipacoque – Boyacá, realizaron la visita e inspección conjunta y hacen la recepción de la obra a entera satisfacción, verificando ítem por ítem y espacio por espacio de la edificación sin novedad y reclamación alguna.*

vgc

2 DOCUMENTOS/ ELEMENTOS

Se entregan digitalmente como soportes a la entrega e inicio del último desembolso por parte del Municipio por medio de un drive, y se aborda el compromiso por parte del Municipio a enviarlos como radicados vía correo electrónico, los siguientes documentos:

1. Acta de Recibo a Satisfacción
2. Acta de Inventario del Bien
3. Acta final de recibo de obra
4. Acuerdo del Concejo municipal donde se le confieren facultades al alcalde (Vigente)
5. Informe final de ejecución presentado por el supervisor del Municipio
6. Informe final de interventoría
7. Manual de Operación y Mantenimiento
8. Planos Récord del Proyecto en medio magnético
9. Memorias gráficas
10. Las Llaves de los espacios cerrados.
11. Registro fotográfico en medio magnético
12. Garantía de los Equipos
13. Verificación de conexión a servicios públicos
14. Certificado RETIE
15. Certificado RETILAP
16. Certificación juegos
17. Certificado equipos de gimnasio.
18. Certificado grama sintética
19. Compilado de informes de supervisión, financiero y extracto bancario de los meses.
20. Copia de la última actualización de póliza cargada y aprobada por el Ministerio en SECOP II
21. Informes mensuales de supervisión completos y ordenados cronológicamente
22. Informes semanales de interventoría completos y ordenados cronológicamente
23. Órdenes de pago y comprobantes de egreso de los pagos realizados por el municipio a los contratistas
24. Informe financieros organizados cronológicamente
25. Extractos bancarios completos y organizados cronológicamente

CONCLUSIONES

- El Convenio 2314 de 2022, termina su plazo de ejecución contractual el 27 de febrero 2025, sin embargo, el 27 de febrero 2025, se procede a suscribir ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE BIENES PROYECTOS FONSECON Y SIES ANEXO 26, previas las siguientes verificaciones:

  1. De acuerdo con los antecedentes consignados, el **27 de febrero 2025** se efectuó visita al proyecto por parte del Arq. Edwin Andrés Torres Ángel delegado por el ing. Viterbo Gómez Carvajal como supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior, en calidad de apoyo técnico a la supervisión, verificándose el estado de la obra, con una ejecución del 100%.

  2. El día 15 de noviembre 2024, el municipio de Tipacoque – Boyacá remite a la supervisión, a través del a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, la ruta electrónica por medio por la cual realizó el cargue de la correspondiente documentación soporte para el recibo del proyecto sacúdete al parque tipo 2 opción 1. No obstante, una vez verificada la información por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, se determinó que la información presentada se encuentra completa para suscribir el Anexo 26 Acta de Recibo y Entrega de Bienes.

- Conforme a lo señalado, se logra verificar que las actividades de obra se ejecutaron dentro del plazo del Convenio No. 2314-2022, y se logró perfeccionar el recibo dado que se contaba con las formalidades documentales, ajustes presupuestales y demás requisitos para poder proceder a la suscripción del documento de entrega al Ministerio del Interior

- La construcción del proyecto Sacúdete al Parque cumplirá con el objetivo de promover la cohesión social y mejorar la calidad de vida de las comunidades, alineándose con el propósito de fortalecer el tejido social y promover la convivencia pacífica en los territorios.

- El proyecto "Sacúdete al Parque" del Municipio Tipacoque – Boyacá fue ejecutado y entregado conforme a lo pactado en el convenio y de acuerdo con los estudios y diseños establecidos. La obra ha cumplido con lo alcanzando, los objetivos previstos y garantizando la satisfacción de todas las partes involucradas. Además, ha proporcionado a la comunidad local un espacio renovado y funcional, contribuyendo significativamente a su bienestar, en alineación con la misión del Ministerio del Interior de Colombia, que se enfoca en fortalecer el desarrollo territorial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la ejecución de proyectos de infraestructura pública.

vgc

6. COMPROMISOS

1. Actualizar las garantías de cumplimiento del convenio, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava del convenio.
2. Entregar dentro del mes siguiente al recibo del proyecto, todos los documentos e información requerida para la suscripción del acta de liquidación.
3. Gestionar con sus propios recursos, la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento, sostenibilidad, custodia, vigilancia, destinación, saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del proyecto.
4. Reintegrar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al pago último desembolso, los saldos por concepto de recursos no ejecutados, saldos de contratación y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON al cierre de la cuenta maestra del convenio.
5. Exigir al contratista de estudios, diseños y obra (Contrato de obra No. 001 DE 2023 UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE) y al de interventoría (Contrato de interventoría C.M.A. No. 002 de 2023 GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA), la actualización de las garantías correspondientes, con el propósito de garantizar la estabilidad y calidad de la obra.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 27 días del mes de febrero del año 2025 por los que intervinieron en ella en dos (2) originales,

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:
Por parte de: ***MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACA***	*Por parte de:* ***MINISTERIO DEL INTERIOR***
Nombre y firma: HECTOR SEGUNDO RAMIREZ ESCOBAR Cargo: ALCALDE MUNICIPIO Email: alcaldia@tipacoque-boyacá.gov.co Móvil:	Nombre y firma: VITERBO GÓMEZ CARVAJAL Cargo: Supervisor del Convenio – Mininterior. Email: viterbo.gomez@mininterior.gov.co Móvil: 312 522 10 54
Por parte de: ***MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACA***	**Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR**
Nombre y firma: CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA Cargo: Secretario de Planeación - SUPERVISOR DEL CONVENIO Email: planeacion@tipacoque-boyacá.gov.co Móvil: 3172901255	**Nombre y firma: EDWIN ANDRÉS TORRES ANGEL** Cargo: profesional de apoyo a la Supervisión Email: edwin.torres@mininterior.gov.co Móvil: 3152601542
Por parte de: ***CONTRATISTA Y OBRA***	*Por parte de:* ***INTERVENTORIA***
Nombre y firma: INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS Cargo: Representante Legal de Obra Email: uttipacoque@gmail.com Móvil: 3013242070	**Nombre y firma: GERMAN RICARDO VASQUEZ CHICHILLA** Cargo: Representante Legal de Interventoría Email: interventoriatipacoque2023@gmail.com Móvil: 3208310173

Por parte de: ***CONTRATISTA Y OBRA***	Por parte de: ***INTERVENTORIA***
Nombre y firma: MANUEL VELAZCO VERJEL Cargo: Residente de obra Email: uttipacoque@gmail.com Móvil: 3124564309	Milady Alvarez M. **Nombre y firma: MILADY ALVAREZ MANTILLA** Cargo: Residente de Interventoría Email: interventoriatipacoque2023@gmail.com Móvil: 3124449103

ANEXO - REGISTRÓ FOTOGRÁFICO



Imagen 1. Teatro al aire libre SACUDETE AL PARQUE Tipo 1 opción 1

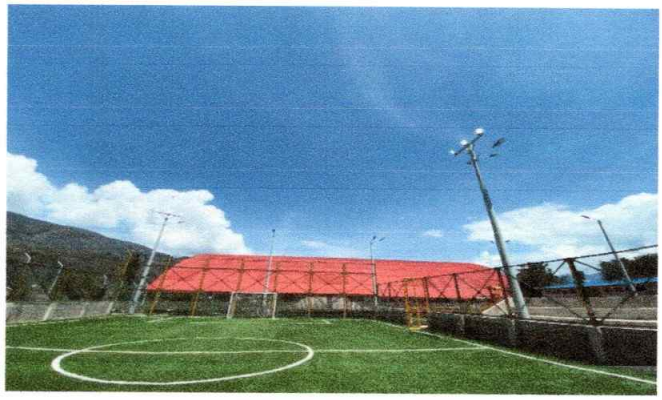


Imagen 2. Cancha sintética SACUDETE AL PARQUE Tipo 1 opción 1



Imagen 3. Baterías sanitarias mujeres y hombres SACUDETE AL PARQUE Tipo 2 opción 1



Imagen 4. Baño personas con Móvilidad reducida SACUDETE AL PARQUE Tipo 1 opción 1



Imagen 5. Parque infantil SACUDETE AL PARQUE Tipo 1 opción 1



Imagen 6. Parque infantil SACUDETE AL PARQUE Tipo 1 opción 1



Imagen 7. Gym vital SACUDETE AL PARQUE Tipo 1 opción 1



Imagen 8. Gym vital SACUDETE AL PARQUE Tipo 1 opción 1



Imagen 9. Gradería, Zona de juegos y Cancha SACUDETE AL PARQUE Tipo 1 opción 1



Imagen 10. Teatro al aire libre y cicloparqueo SACUDETE AL PARQUE Tipo 1 opción 1



Imagen 11. Gradería, zona de juegos y Batería de baños SACUDETE AL PARQUE Tipo 1 opción 1

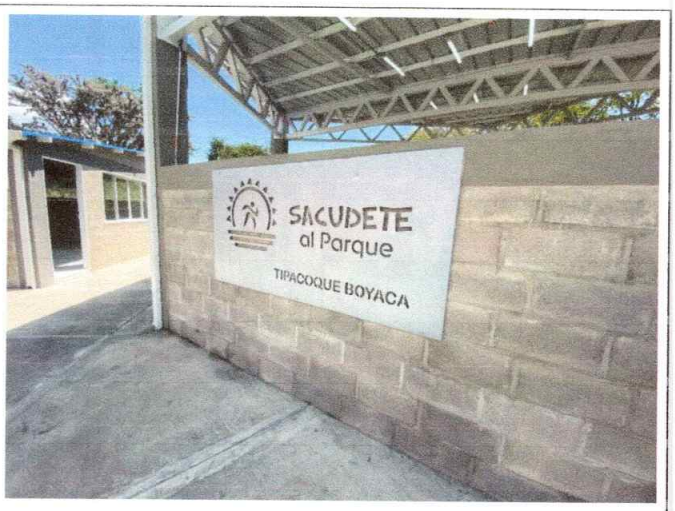


Imagen 12. Cafetería y Logo SACUDETE AL PARQUE Tipo 1 opción 1



Imagen 13. Medidor de energía eléctrica y Acometida de acueducto SACUDETE AL PARQUE Tipo 1 opción 1



Imagen 14. Gradería, Cerramiento lateral y Cancha Sintética SACUDETE AL PARQUE Tipo 1 opción 1



Imagen 13. Vista general del proyecto
