FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL		
Página: 1 de 2	DIA	2	MES	3	AÑO	2025

SEMANA N°	3	DEL	10/03/2025	AL	16/03/2025
FECHA INICIO :	24/02/2025	FECHA TERMINO :	24/06/2025		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	SOSTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS HANGARES DE UH-60, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024				
INTERVENTOR	INTERVENTORIAS DINAMICAS Y GESTION DE PROYECTOS COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C.	901651560-4	CONTRATO N°	284-COADE-DICRE–CENACINGENIEROS-2024
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL HANGARES 2024	NIT O C.C.	900901523-0	CONTRATO N°	278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA				PORCENTAJE DE EJECUCION X CAPITULO	PORCENTAJE DE PROGRAMADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
ITEM	Comienzo	Fin	Nombre de tarea				
1	24/02/2025	24/06/2025	FRENTE I: "MANTENIMIENTO DE HANGAR N°1 Y HANGAR No.4"	9%	10%		
1	24/02/2025	13/06/2025	HANGAR UH-60 BAMAV 2	7,73%	8,57%	Adecuación, suministro e	Se encuentra a la espera de definir el sitio de instalación del mueble por parte de la unidad
2	24/02/2025	24/06/2025	HANGAR VERDE BAMAV 2	10,08%	10,08%		
			SUBTOTAL	**9,49%**	**9,70%**		

DOCUMENTOS ADICIONALES			COMENTARIOS
Informe de visita	50%	50%	SE ENVIA INFORE DE VISITAS PARA REVISIÓN DE INTERVENTORÍA
Sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo	50%	50%	PENDIENTE REVISION DE INTERVENTORIA
Plan de manejo ambiental	50%	50%	PENDIENTE REVISION DE INTERVENTORIA
Plan de manejo rcd	0%	0%	
Plan Integral de Calidad	100%	100%	REVISADO Y APROBADO INTERVENTORIA
Plan de Gestión de Riesgo	100%	100%	REVISADO Y APROBADO INTERVENTORIA
Programa de gerencia de proyecto con la documentación del respectivo profesional	0%	0%	

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL PROYECTO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	$ 895.388.066,75	9,49%	$ 84.939.294,99	$ 810.448.771,77		3	9,49%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA Y/U OFICINA

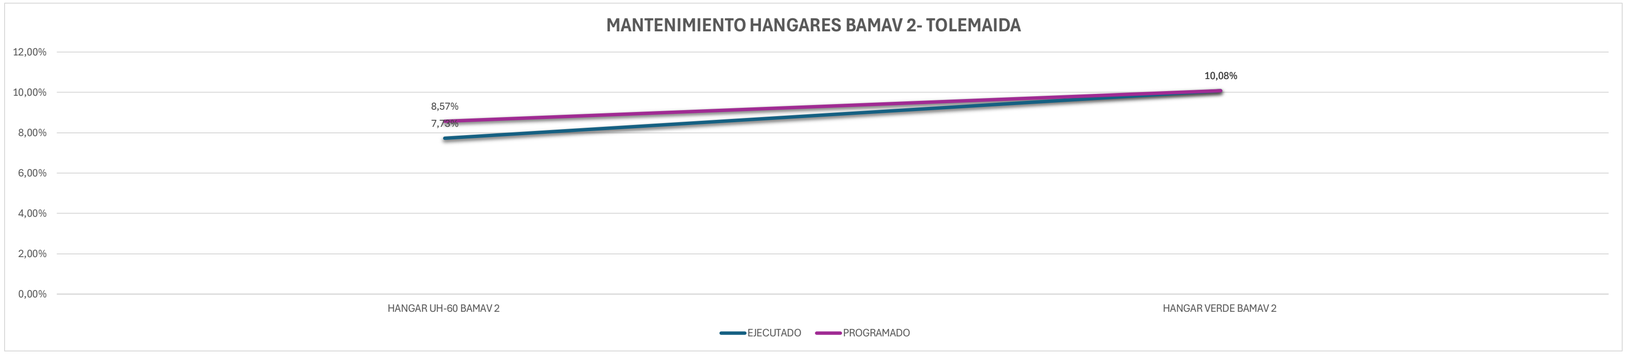
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	1	MAESTRO OBRA	0,00
INGENIEROS	5	OFICIALES	2,00
TOPÓGRAFO	0	AYUDANTES	4,00

V.ESTADO DEL TIEMPO


PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☐

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



Semana	0	S#1	S#2	S#3	S#4	S#5	S#6	S#7	S#8	S#9	S#10	ACUMULADO
Fecha	**24/02/2025**	**2/03/2025**	**9/03/2025**	**16/03/2025**								
Programado Semanal	0,000%	2,12%	4,00%	3,58%								9,70%
Programado Acumulado	0,000%	2,12%	6,12%	9,70%								
Ejecutado Semanal	0,000%	4,31%	3,25%	1,93%								9,49%
Ejecutado Acumulado	0,000%	4,31%	7,56%	9,49%								
Balance	0,000%	2,19%	1,44%	-0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,21%

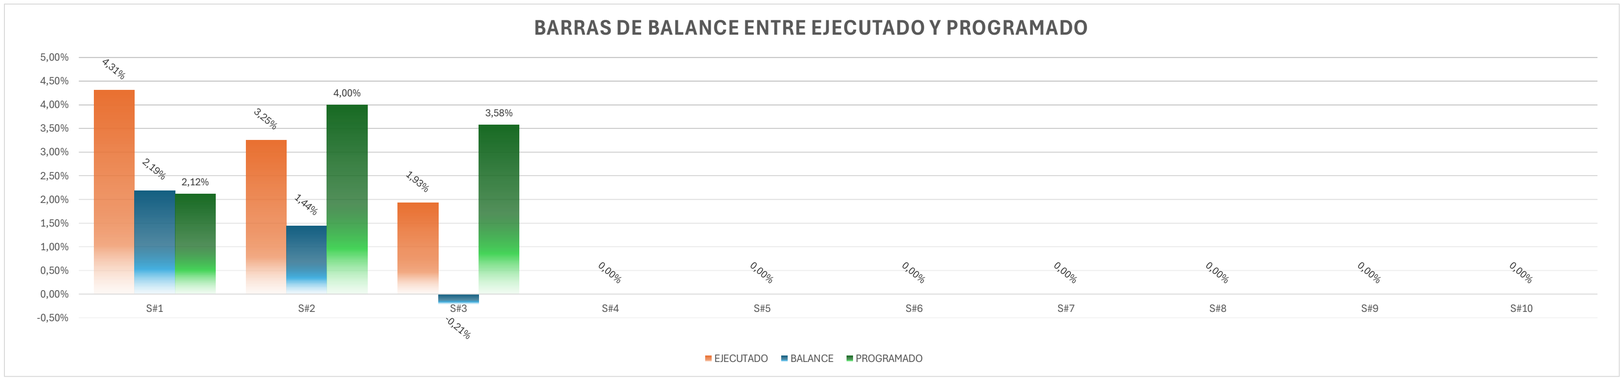

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

SE REALIZO ACTA DE INICIO CON FECHA 24 FEBRERO/2024

SE RECIBE POR PARTE DEL CONTRATISTA EL DIA 24 DE FEBRERO/2025, ACTA DE PRECONSTRUCCIÓN, ACTA DE VISITA LAS CUALES SE FIRMARON Y HACEN PARTE DEL ACTA DE INICIO.

TAMBIEN SE RECIBIERON PREBALANCES Y PROGRAMACION DE OBRA, SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA. SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 05/03/2025 Y SE ESPERA RESPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA

SE REALIZO REUNIÓN CON EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA PARA 1-ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO Y AFECTACION DE LAS INCONSISTENCIAS




Valentina Aponte R.

VALENTINA MARIA APONTE RESTREPO
CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.003.382.667 de Valledupar
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL INTERMANTENIMIENTOS 254 U.T.

Paola Quisel Galvan R.

PAOLA QUISEL GALVAN RESTREPO
CEDULA DE CIUDADANIA No. 22.564.327 de Barranquilla.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS 311 UT

	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJÉRCITO NACIONAL**						**INFORME SEMANAL**				
Código:				**Versión:**				**Página:**			
SEMANA Nº	3	**DEL**		**10/03/2025**			**AL**			**16/03/2025**	
FECHA INICIO :	**24/02/2025**		**FECHA TERMINO :**	**25/06/2025**							
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA											
OBJETO DEL CONTRATO	**SOSTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS HANGARES DE UH-60, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024"**										
INTERVENTOR	**INTERVENTORIAS DINAMICAS Y GESTION DE PROYECTOS COLOMBIA S.A.S**			**NIT O C.C.**	**901.651.560-4**		**CONTRATO Nº**			**284-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024**	
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL HANGARES 2024**			**NIT O C.C.**	**901.900.523-0**		**CONTRATO Nº**			**278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024**	
FRENTE I: MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA, BATALLON COLOMBIA											
OBRA: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA, BATALLON COLOMBIA"											

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD		EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO	BREVE DESCRIPCIÓN
HANGAR UH-60 BAMAV 2								
1	1	Desmonte y montaje del sistema de apertura y cierre de la puerta del hangar principal (8 secciones (7,80 x 4,30) mts, c/u), ambas caras incluye: lijado, pulido, retiro de áreas con corrosión y reemplazo de secciones deterioradas de acuerdo con el material existente, aplicación de 2 capas de cromado de zinc, 3 capas de pintura 3 en 1 de excelente resistencia y calidad para exteriores color gris (igual al existente), por todas las caras.	GLB	1		20,00%	 	
2	2	Desmonte, suministro e instalación de rodamientos, superiores e inferiores, de 4" en acero de alta resistencia, engrasado y lubricado de cada una de las secciones que hacen parte de las puertas	UND	48		20,00%		
3	3	Desmonte, suministro e instalación de rieles en acero tipo U para guía superior del sistema de apertura y cierre de la puerta del hangar principal.	ML	192		10,00%	  	
INFORME SST								
		Se llevo a cabo charlas diarias de seguridad con el objetivo de informar y sensibilizar al personal sobre diversos temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Estas sesiones buscan promover una cultura de prevención, fomentar buenas prácticas laborales y reducir los riesgos asociados a las actividades diarias.	UND	6		86%	     	1. MANEJO DE CARGAS 2. AUTOCUIDADO 3. PERDIDA AUDITIVA 4. PROTECCION DE MANOS 5. RIESGO FISICO 6. RIESGO MECANICO

		Se realizaron pausas activas con el propósito de promover el bienestar físico y mental de los trabajadores. Estas pausas consisten en breves ejercicios de estiramiento y movilidad que ayudan a reducir el estrés, prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar la concentración, contribuyendo así a un ambiente laboral más saludable y productivo.	UND	2		29%	 	

Valentina Aponte R.

VALENTINA MARIA APONTE RESTREPO
CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.003.382.667 de Valledupar
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL INTERMANTENIMIENTOS 254 U.T.

Paola Quisel Galvan R.

PAOLA QUISEL GALVAN RESTREPO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS 311 UT
