INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL ACTA DE COSTOS No. 28 CONTRATO NÚMERO 1053 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Tabla de contenido

Tabla de contenido 1

1. INTRODUCCIÓN 20

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 22

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 23

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 25

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 30

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 56

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 62

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO 63

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 63

3.1.1.1. Actividades Administrativas 63

3.1.1.2. Actividades Técnicas 65

3.1.1.3. Actividades ambientales 66

3.1.1.4. Actividades sociales 66

3.1.1.5. Actividades SST 67

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 67

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN 68

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 68

3.2.1.1. Actividades Administrativas 68

3.2.1.2. Actividades ambientales 70

3.2.1.3. Actividades Sociales 70

3.2.1.4. Actividades SST 70

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 70

3.2.1.6. Etapa de Construcción 71

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758 73

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 73

3.3.1.1. Actividades Administrativas 73

3.3.1.2. Actividades ambientales 75

3.3.1.3. Actividades Sociales 75

3.3.1.4. Actividades SST 75

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 75

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA 78

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 78

3.4.1.1. Actividades Administrativas 79

3.4.1.2. Actividades Técnicas 79

3.4.1.3. Actividades ambientales 80

3.4.1.4. Actividades Sociales 80

3.4.1.5. Actividades SST 81

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos 81

3.4.3. Estado de avance del proyecto 81
3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO..... 83
3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas..... 84
3.5.1.1. Actividades Administrativas 84
3.5.1.2. Actividades Técnicas..... 85
3.5.1.3. Actividades ambientales 85
3.5.1.4. Actividades Sociales..... 85
3.5.1.5. Actividades SST 85
3.5.1.6. Seguimiento Ítems No Previstos..... 86
3.5.2. Estado de avance del proyecto 86
3.5.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños..... 86
3.5.2.2. Etapa de Construcción 89
4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN .. 91
3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas..... 91
3.6.1.1 Actividades Administrativas 92
3.6.1.2. Actividades Técnicas..... 92
3.6.1.3. Actividades ambientales 94
3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos..... 94
3.6.3. Estado de avance del proyecto. 94
3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños...... 94
3.6.3.3. Etapa de Construcción 95

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA 96
3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 96
3.7.1.1. Actividades Administrativas 96
3.7.1.2. Actividades Técnicas 97
3.7.1.3. Actividades ambientales 98
3.7.1.4. Actividades sociales 98
3.7.1.5. Actividades SST 99
3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 99
3.7.1.7. Etapa de Construcción 99
3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943 101
3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 101
3.8.1.1. Actividades Administrativas 102
3.8.1.2. Actividades Técnicas 103
3.8.1.3. Actividades Ambientales 111
3.8.1.4. Actividades Sociales 135
3.8.1.5. Actividades SST 143
3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos 159
3.8.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 159
3.8.2.2. Etapa de Construcción 172
3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052 213
3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 213

3.9.1.1. Actividades Administrativas 213
3.9.1.2. Actividades Técnicas 214
3.9.1.3. Actividades ambientales 215
3.9.1.4. Actividades Sociales 215
3.9.1.5. Actividades SST 215
3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos 215
3.9.3. Estado de avance del proyecto 216
3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 216
3.9.3.2. Etapa de Construcción 217
3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814 218
3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 218
3.10.1.1. Actividades Administrativa 219
3.10.1.2. Actividades Técnicas 219
3.10.1.3. Actividades ambientales 220
3.10.1.4. Actividades Sociales 220
3.10.1.5. Actividades SST 220
3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos 221
El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 24 de diciembre de 2024 221
3.10.3. Estado de avance del proyecto 221
3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 221
3.10.3.2. Etapa de Construcción 221

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S..... 223

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 223

3.11.1.1. Actividades Administrativas 223

..... 258

3.11.1.2. Actividades Técnicas 258

3.7.1.1. Actividades ambientales 268

3.7.1.2. ACTIVIDADES SOCIALES 272

3.7.1.3. Actividades SST 275

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 278

3.7.1.2. Etapa de Construcción 304

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría. 325

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:..... 326

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO 327

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN 328

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758 329

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA..... 331

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra..... 331

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO 332

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA..... 333

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA..... 333

4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943 334

..... 348

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052 349

4.9. PROYECTO OCAÑA 1814 349

4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033 350

4.10.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 351

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 354

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 354

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 354

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022. 354

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022 355

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052 355

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022 356

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022 356

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022 357

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022 357

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022 358

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022 360

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407 360

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 360

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS 363

5.2.10. Actividades administrativas 367

5.2.11. Actividades técnicas 367

5.2.12. Actividades financieras 368

5.2.13. Informes especialistas y profesionales 370

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 370

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 370

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 370

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 371

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 372

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 373

6.6. Bitácora de Obra 374

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 374

8. ANEXOS 379

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato 24

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar 27

Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar 28

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución 61

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra 62
Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago 63
Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago 64
Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago 66
Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago. 67
Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán 68
Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán 68
Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán 70
Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán 71
Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758 73
Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758 74
Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758 75
Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira 78
Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira 79
Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira 80
Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira 81
Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas 82
Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego 83
Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego 84
Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego 85
Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego 89

Tabla 26 Cantidades a la fecha ejecutadas 89
Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa 91
Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa..... 92
Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa 93
Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa 95
Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita 96
Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita..... 97
Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita 98
Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita 99
Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943..... 101
Tabla 36 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943 102
Tabla 37 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943 172
Tabla 38 Cantidades de placa huella ejecutada a la fecha – Gobernación 1943..... 173
Tabla 39 Condiciones del contrato - Gobernación 2052..... 213
Tabla 40 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052 214
Tabla 41 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052..... 215
Tabla 42 Cantidades realizadas en el periodo 217
Tabla 43 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814..... 218
Tabla 44 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814..... 219
Tabla 45 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814 220
Tabla 46 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814 221

Tabla 47 Condiciones del contrato - Gobernación 2033 223

Tabla 48 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033 226

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033 228

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033 229

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033 231

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033 233

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033 235

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033 237

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033 239

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033 241

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033 244

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033 . 246

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033 247

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033 . 251

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033 253

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033 255

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033 256

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033 258

Tabla 65 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023. 279

Tabla 66 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023. 281

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023. 283

Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023. 285

Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023 288

Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023. 290

Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023 292

Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-067-2023 294

Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023 295

Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023 296

Tabla 75 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-056-2023 297

Tabla 76 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-082-2023 297

Tabla 77 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023 299

Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023 300

Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023 302

Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023 303

Tabla 81 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-049-2023 303
Tabla 82 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota 305
Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia 306
Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas 308
Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos 309
Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario 310
Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano 311
Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes 313
Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira 314
Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander 315
Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta 316
Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita 317
Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 318
Tabla 94 Cantidades ejecutadas en el municipio de Herrán 319
Tabla 95 Cantidades ejecutadas en el municipio de Santiago 320
Tabla 96 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 322
Tabla 97 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 324
Tabla 98 Garantías Municipio de Santiago 328
Tabla 99 Garantías Municipio de Herrán 329
Tabla 100 Garantías Municipio de Ocaña 331
Tabla 101 Garantías Municipio de Cáchira 331

Tabla 105 Garantías Municipio de Abrego 333
Tabla 103 Garantías Municipio de La Playa 333
Tabla 104 Garantías Municipio de Pamplonita 334
Tabla 105 Reporte informes semanales Gobernación 1943 334
Tabla 106 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943 335
Tabla 107 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943 345
Tabla 108 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943 346
Tabla 109 Garantías Gobernación 1943 348
Tabla 110 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943 348
Tabla 111 Garantías Gobernación 2052 349
Tabla 112 Garantías Municipio de Ocaña 1814 350
Tabla 113 Garantías Gobernación 2033 353
Tabla 114 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022 354
Tabla 115 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Santiago 355
Tabla 116 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Herrán 355
Tabla 117 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Ocaña - 1758 356
Tabla 118 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Cáchira 356
Tabla 119 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego 357
Tabla 120 Trazabilidad oficios enviados del municipio de La Playa 357
Tabla 121 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Pamplonita 357
Tabla 122 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943 358

Tabla 123 Trazabilidad oficios enviados a la Gobernación 2052 360

Tabla 124 Trazabilidad oficios enviados al municipio de Ocaña - 1814..... 360

Tabla 125 Trazabilidad oficios enviados de la Gobernación 2033 363

Tabla 126 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS 366

Tabla 127 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 370

Tabla 128 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 370

Tabla 129 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 371

Tabla 130 Seguimiento Financiero Interventoría 372

Tabla 131 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 373

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander..... 25

Ilustración 2 Comités de seguimiento y control de actividades de campo 111

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago 31

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán 31

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña 33

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña..... 34

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira..... 35

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego 36

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa 37

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita 37

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814 39

Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas 40

Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Gramalote 41

Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios 42

Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios 43

Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia. 44

Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario 45

Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona 46

Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos.... 47

Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas 48

Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota 49

Fotografía 20 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – San Cayetano 49

Fotografía 21 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Lourdes51

Fotografía 22 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Santiago 51

Fotografía 23 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Mutiscua 52

Fotografía 24 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Herrán. 52

Fotografía 25 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplonita 53

Fotografía 26 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Ricaurte 53

Fotografía 27 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Puerto Santander 54

Fotografía 28 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cáchira 54

Fotografía 29 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Gramalote 55

Fotografía 30 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa Caro 55

Fotografía 34 Entrega de EPP – Gobernación 1943 155

Fotografía 35 Maquinarias y Equipos Gobernación 1943 156

Fotografía 36 Equipos de Emergencia Gobernación 1943 157

Fotografía 37 Implementación protocolo de bioseguridad 158

LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago 67

Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán 72

Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758 77
Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira 82
Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego 90
Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa 95
Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita 100
Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943 174
Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052 217
Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814 222
Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota 305
Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia 306
Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona 308
Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas 309
Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos 310
Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario 311
Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano 313
Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes 314
Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira 315
Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander 316
Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta 317
Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita 318
Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua 319

Gráfico 24 Avance Financiero Municipio de Herrán 320

Gráfico 25 Avance Financiero Municipio de Santiago 321

Gráfico 26 Avance Financiero Municipio de Mutiscua 323

Gráfico 27 Avance Financiero Municipio de Villa Caro 324

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES, en su calidad de Interventor, del contrato No. 1053 DE 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” adjudicado previo Concurso de Méritos No CMA-DTE-SEP-197-2021, reporta a la entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por los contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa “COLOMBIA RURAL” Mantenimiento y Mejoramiento De la Red Terciaria 2019 – 2022, cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, el seguimiento a los once convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1758-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052 adjudicado a CONSORCIO OK 2022 por valor de $ 1.711.146.620,00. Municipio de Santiago: Convenio Interadministrativo 1821-2021, Contrato de Obra No. LP-OP-01-2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 por valor de $ 4.430.879.655,00. Municipio de Herrán: Convenio Interadministrativo 1861-2021, Contrato de Obra No. 146 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRÁN 2022 por valor de $ 1.781.999.648,00. Municipio de Cáchira: Convenio Interadministrativo 1859-2021, Contrato de Obra No. 160 de 2022 adjudicado a CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA por valor de $ 2.658.435.877,00. Municipio de Abrego: Convenio Interadministrativo 1791-2021, adjudicado a CONSORCIO AD VÍAS por valor de $ 4.494.012.623,00. Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1814-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 por valor de $ 2.700.000.000,00, Municipio de la Playa de Belén: Convenio Interadministrativo 1863-2021, Contrato de Obra No. LP-004-2022 adjudicado a CONSORCIO LA PLAYA 2022 por valor de $ 2.268.620.424,00. Municipio de Pamplonita: Convenio Interadministrativo 1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA por valor de $ 1.703.523.226,00. Gobernación: Convenios Interadministrativos 1943-2021, adjudicado a UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 por valor de $ 24.463.027.326,00,

Convenio Interadministrativo 2033-2021 adjudicado a EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S. por valor de $ 10.000.000.000,00 y, Convenio Interadministrativo 2052-2021, Contrato de Obra No. 02332 DEL 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 por valor de $ 6.045.781.859,50.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó al Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE como Supervisor del Contrato de Interventoría. Así mismo, el INVIAS designó a la Ingeniero.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el gobierno nacional y en consecuencia para la gestión del Instituto Nacional de Vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios Interadministrativos con los municipios de Ocaña, Abrego, Santiago, Cáchira, Herrán, La Playa de Belén, Pamplonita, y 3 convenios con la Gobernación de Norte de Santander. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales bajo la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos que se suscribieron entre el INVIAS y Municipios del Departamento de Norte de Santander.

Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Construcción de Placa Huella.
Pavimentos Convencionales.
Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
Construcción de Filtros y/o cunetas.
Bases Estabilizadas.
Tecnologías Alternativas.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Conformación de la calzada existente.
Mejoramiento de la subrasante con adición de material.
Suministro e instalación de afirmado.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.
Rocería.
Reparación de baches.
Limpieza de alcantarillas y descoles.
Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor.
Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

Caracterización vial e inventario vial del corredor productivo seleccionado, de acuerdo a la Resolución 1321 del 2018 o la legislación vigente emitida por el Ministerio de Transporte.

Implementación y adaptación de los diseños tipo de la CARTILLA OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL a las obras a ejecutar en el corredor postulado.

Para la ejecución de las obras se realizará el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 11 convenios Interadministrativos con el Departamento de Norte de Santander, los cuales cuentan con la ejecución de 29 Municipios los cuales se detallan a continuación:

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
1	ABREGO	1791-2021	ABREGO
2	LA PLAYA	1863-2021	LA PLAYA

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
3	OCAÑA	1814-2021	OCAÑA
4	OCAÑA	1758-2021	OCAÑA
5	CACHIRA	1859-2021	CACHIRA
6	HERRÁN	1861-2021	HERRÁN
7	PAMPLONITA	1878-2021	PAMPLONITA
8	SANTIAGO	1821-2021	SANTIAGO
9	GOBERNACIÓN	1943-2021	ARBOLEDAS
			GRAMALOTE
			LOS PATIOS (Vía principal acceso vereda california)
10	GOBERNACIÓN	2052-2021	LOS PATIOS (La Mutis)
11	GOBERNACIÓN	2033-2021	VILLA CARO
			PAMPLONITA
			HERRÁN
			El ZULIA
			GRAMALOTE
			LOURDES
			MUTISCUA
			PAMPLONA
			PUERTO SANTANDER
			CACOTA
			SALAZAR DE LAS PALMAS
			CACHIRA
			CÚCUTA
			VILLA DEL ROSARIO
			SAN CAYETANO
			SANTIAGO
			SILOS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato

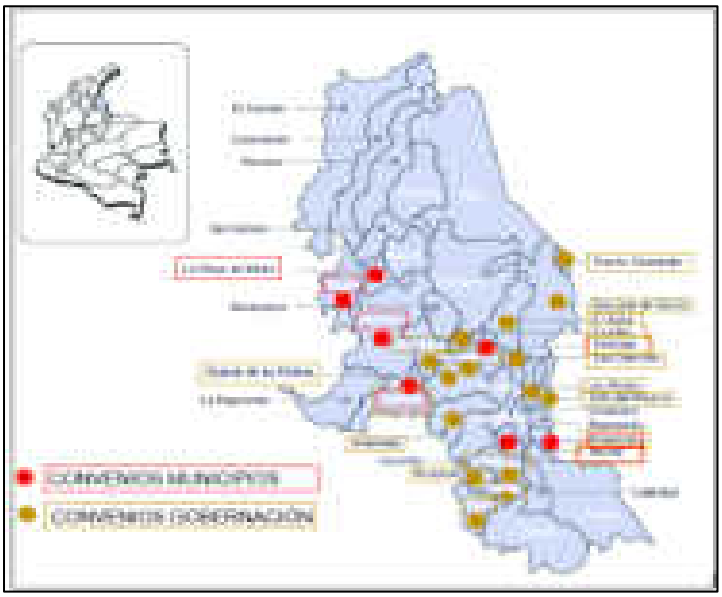


Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este contrato por ser supervisión a un contrato multiproyecto se divide en 29 municipios que serán beneficiados dentro del programa “COLOMBIA RURAL”, los cuales se describe su ejecución inicial a continuación:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS	ABREGO	Construcción de 1320 mts de placa huella y 9 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1285 mts de placa huella y 28 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA DE BELEN	Construcción de 800 mts de placa huella y 4 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 600 mts de placa huella y 7 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1890 mts de placa huella y 10 alcantarillas y 2 muros de gavión.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3 de parcheo, 692 mts de placa huella, 4 alcantarillas y 4 muros de gavión.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CACHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: construcción de 7 alcantarillas y construcción de 600 metros lineales de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón: construcción de 2 alcantarillas y construcción de 200 metros lineales de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba: construcción de 8 alcantarillas y construcción de 566 metros lineales de placa huellas.
VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRÁN	Construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZONA RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 2.140 mts de Placa Huella y 4 unidades de Alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas.
VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	GOBERNACIÓN-1943	Arboledas con una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada-Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36”, Municipio de Gramalote con una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y Municipio de Los Patios con una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 Und de

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
		alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y 50 m3 de muro en gaviones.
LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRÁN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VÍA LA UNIÓN VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCÓN - LA COPITA VÍA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO	GOBERNACIÓN-2033	Adelantar las actividades de Mejoramiento en la vía 1) LOS MANGOS LA CARRER. 2) VÍA CHINÁVEGA. 3) PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 4) LAS DELICIAS-EL MAMÓN 5) LA GARZA-ZUMBADOR 6) HERRÁN-SIBERIA 7) LOURDES-CAMPORICO 8) MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA 9) VÍA LA UNIÓN 10) VÍA PÁRAMO - PICA PICA 11) PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE 12) SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO 13) ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA 14) LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO 15) LOS RINCÓN - LA COPITA 16) VÍA EL MOLINO PUERTO RICO 17) CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 6.180 mts de placa huella y 25 alcantarillas y 60 M3 de muros de gavión

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar

Luego de dar aprobación por parte de la interventoría a la Actualización de Estudios y Diseños para cada uno de los convenios interadministrativos, se realiza un balance de acuerdo a los Diseños obtenidos y/o creación de Ítems No Previstos de acuerdo a necesidades propias de cada uno de los Contrato de Obra, por lo cual para los Proyectos de Ocaña 1758, Santiago, Abrego, Herrán, Pamplonita, La Playa, Cáchira, Ocaña 1814 y Gobernación 2052. se tiene la siguiente meta física a ejecutar, de acuerdo al Balance de acuerdo a Estudios y Diseños:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1150 mts de placa huella y 6 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1251.35 mts de placa huella y 13 alcantarillas entre el proyecto.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON	OCAÑA -1758	Construcción de 572,69 m3 de parcheo, 520 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 3.300 mts de placa huella y 16 alcantarillas.
VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRÁN	Construcción de 1.200 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZONA RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 1.766 mts de Placa Huella y 4 Alcantarillas.
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA	Construcción de 630 mts de placa huella y 2 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 545 mts de placa huella y 3 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CÁCHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: 7 alcantarillas y 633 metros de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón 2 alcantarillas y 264 metros de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba 8 alcantarillas y 566 metros de placa huellas.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1550 mts de placa huella y 10 alcantarillas.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 4003 mts de placa huella y 22 alcantarillas.

Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar

Gracias a la intervención de estos proyectos se logrará mejorar las condiciones de vida de los habitantes aledaños a los corredores viales de los municipios, obteniendo beneficios de crecimiento económico; dentro del cual los campesinos se verán beneficiados al obtener mejores condiciones para el transporte de sus productos y beneficios de crecimiento social; dentro del cual se mejoran las condiciones de movilidad mejorando de esta forma su calidad

de vida y por otro lado permitiendo el fácil acceso de los sistemas de salud y educación del sector.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

A la fecha de corte del presente informe, se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el INVIAS y el departamento de Norte de Santander. De los cuales se encuentra en ejecución uno (01) correspondiente al municipio de GOBERNACIÓN 1943. A la fecha se encuentran terminados 9 correspondiente al municipio de GOBERNACIÓN 2033, ABREGO, PAMPLONITA, OCAÑA-1814 y GOBERNACIÓN 2052 los cuales se encuentran en proceso de liquidación y OCAÑA 1758, HERRÁN, SANTIAGO y LA PLAYA liquidados, a continuación, se presenta el estado actual del corredor a intervenir en cada uno de los. convenios ejecutados. Se encuentra finalizado el tiempo contractual el municipio de CACHIRA.

2.3.1. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Santiago.

	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto



Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago

2.3.2. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Herrán.



Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán





2.3.3. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1758.

Sector 1: Avenida Francisco Fernández de Contreras, pasando por el sector del lago en la cual ser requiere de intervenciones de parcheo desde el punto PR 00+0070 hasta el punto PR 06+0180.








Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña

Sector 2: Vía terciaria limites- Morrison hasta el punto PR 18+0200.




	
PR 15+400, Corredor la Samaritana	PR 18+300, Corredor la Samaritana

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña

2.3.4. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Cáchira.



Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira

2.3.5. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Abrego.







Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego

2.3.6. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de La Playa.



Corredor Corral Viejo – Llano Grande



Corredor 2 - Clavelinas





Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa

2.3.7. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Pamplonita.



Vereda Bataga



Vereda Bataga

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita

	
Vereda Batagá	Vereda Batagá

2.3.8. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1814.

	
Tramo 1 Avícola	Tramo 2 Placa Huella Ext.
	
Tramo 3 Alto Grande	Tramo 4 Buenavista

	
Tramo 5 Bosquecito	Tramo 7 Curvon

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814

2.3.9. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-1943.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Arboledas.




Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Arboledas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.







Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Gramalote

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Los Patios.







Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios

2.3.10. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2052.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de los Patios.






Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios

2.3.11. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2033.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de El Zulia.






Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Villa del Rosario.







Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplona.






Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Silos.







Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Salazar de las Palmas.






Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Cacota.







Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de San Cayetano.




Fotografía 20 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – San Cayetano

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Lourdes.





Fotografía 21 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Lourdes

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Santiago.





Fotografía 22 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Santiago

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Mutiscua.





Fotografía 23 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Mutiscua

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Herrán.





Fotografía 24 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Herrán

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplonita.



Fotografía 25 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplonita

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Ricaurte.



Fotografía 26 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Ricaurte

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Santander.



Fotografía 27 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Puerto Santander

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Cáchira.



Fotografía 28 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cáchira

A continuación, se presente el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.





Fotografía 29 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Gramalote

A continuación, se presente el registro fotográfico para el corredor del municipio de Villa Caro.





Fotografía 30 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa Caro

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander, de los cuales está en ejecución uno (01) correspondiente a GOBERNACIÓN 1943 y terminados los convenios con los municipios de ABREGO, OCAÑA-1758, HERRÁN, SANTIAGO, OCAÑA-1814, LA PLAYA, PAMPLONITA, GOBERNACIÓN 2033, GOBERNACIÓN 2052 y CACHIRA su plazo contractual finalizo. A continuación, se presentan sus características técnicas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
SANTIAGO	CUPERENA – AZUL ALTO	Existen actualmente 7 Kilómetros de vía en condiciones de mal estado, por la cual las comunidades del sector utilizan para sacar sus productos provenientes de las actividades agropecuarias en vehículos. La superficie de rodadura actual es en afirmado en mal estado de conservación por falta de mantenimiento y drenajes insuficientes. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto, que se hace necesario la intervención de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas para mejorar las condiciones actuales del corredor vial.
HERRÁN	VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	La red vial del municipio de Herrán está conformada en su mayoría por vías terciarias, las cuales se encuentran en material de afirmado, sin mejoramiento definitivo con pavimentación en alguna de sus modalidades. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto que se hace necesario el mejoramiento de la vía en la vereda El Ramal, en el cual se establece la construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
OCAÑA	OCAÑA-LIMITES-MORRISON	En la vía a intervenir se presenta bajo nivel de servicio en la en la vía rural que comunica en este punto la zona rural con la cabecera municipal, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvia y el paso de vehículos pesados. Ante esta situación se observa la necesidad de construir sobre la vía en menciones tramos de placa huella con señalización, además de la construcción de alcantarillas para el manejo de la escorrentía y la construcción de muros en gaviones con el fin de estabilizar la banca en algunos tramos críticos.
CÁCHIRA	CORREDORES EL LUCERO- ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	Algunos tramos de los corredores viales presentan puntos críticos que condicionan el tránsito de vehículos debido a fenómenos de remoción en masa, deslizamientos, el deterioro en el tiempo de la calzada, perdida y afectación de cunetas, el deterioro y/o colapso de tuberías de paso o alcantarillas, le erosión laminar y por surcos; también la perdida de la bancada de algunos tramos y la baja frecuencia de mantenimiento rutinarios. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
ABREGO	VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	El municipio de Abrego cuenta con una precaria infraestructura vial terciaria acorde a las necesidades de competitividad que se requiere para su desarrollo socioeconómico y para realizar mejoras en el nivel de vida de sus habitantes. Las vías terciarias se encuentran principalmente sin capa de rodadura o en estado regular a malo, dificultando el tránsito y movilidad rural, generando espacios que afectan la calidad de vida de los habitantes, así mismo, la atención de las vías se dificulta

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
		puesto que no se cuenta con información sobre las condiciones de la red vial. La vía Brisas del Tarra- La Arenosa y la vía Santa lucia-Canoas, se encuentra destapada, que en épocas de fuertes precipitaciones se dificulta el acceso, generando el aumento en recorridos, dificultas de traslado a servicios médicos, inasistencia de estudiantes a los centros educativos e incremento en los costos de transporte de carga y pasajeros. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
LA PLAYA DE BELÉN	LLANO GRANDE – SAN PEDRO ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello el tránsito por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento. Es por ello que para mejorar el transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1863 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS
PAMPLONITA	VÍA TERCIARIA VEREDA BATAGA	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello la transitabilidad por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
		afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento, etc. Es por ello que para mejorar le transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1878 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, convenio con el cual se busca intervenir de manera puntual la vía terciaria ubicada en la VEREDA BATAGA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6.4 Km específicamente en los sectores BATAGA – LA VIRGEN iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 300 y BATAGA – CUENCA iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 100
OCAÑA 1814	CORREDOR VIAL PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo nivel de servicio en la vía rural que comunica todo el corregimiento de Buenavista, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvias y el paso de vehículos pesados. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de Ocaña corregimiento de Buenavista, en una longitud de 1890 ml de placa huella, construcción de 10 Alcantarillas de 36” y 2 Muros de contención.
GOBERNACIÓN 1943	VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios del Departamento Norte de Santander, distribuidos de la siguiente manera: Municipio de Arboledas en una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada- Cinera- El Helechar - Juan

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
		Bueno, 51 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote en una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios en una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
GOBERNACIÓN 2052	VÍA TERCERÍA EN LA ZONA SUR QUE CONECTA LAS VEREDAS DE LA GARITA- LA MUTIS	Actualmente esta vía tercería en la zona sur que conecta las veredas de La Garita- La Mutis cuenta con tramos en placa huella y afirmado, durante el recorrido se evidencian algunos problemas como la falta de intervención para el mejoramiento, mantenimiento y condiciones de drenaje inadecuadas, existen cambio del ancho de la vía, erosión en algunos costados generados por mal manejo de agua. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de la Mutis, en las veredas La Garita – La Mutis, en una longitud de 6180 ml de placa huella, construcción de 25 Alcantarillas de 36" y 2 Muros de contención.
GOBERNACIÓN 2033	LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRÁN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA	Debido a las olas invernales presentadas en los últimos años, las vías han presentado un gran deterioro. Estas afectaciones sumado a diseños inadecuados, desatención a sitios críticos (bancas deterioradas e inestabilidad de los taludes) poca presencia de obras de arte, deterioro de la capa de rodadura y poca inversión han dificultado la intercomunicación terrestre de la población rural y urbana aislando sitios de producción y comercialización de las diferentes regiones del departamento, provocando grandes pérdidas en las cosechas, poco desarrollo social, bajo desarrollo productivo, incremento en los valores de productos, aumento en los tiempos

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
	VÍA LA UNIÓN VÍA PÁRAMO - PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCÓN - LA COPITA VÍA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO	de viaje, aumento en los costos de transporte, poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar., poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar. Por estas razones es prioritario mejorar las condiciones de circulación vehicular a fin de asegurar el acceso a los servicios sociales, reducir tiempos de viaje, costos de transporte, reducir número de accidentes, reducir costos de mercancía y mejorar el comercio y las comunicaciones en general. Es por esto que se da la necesidad de intervenir los corredores viales objeto del contrato interadministrativo No. 4164-2022. Con una longitud total de 8.663 ml de Placa Huella y 59 Alcantarillas.

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 11 convenios interadministrativos con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en 29 Municipios del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 11 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios y su estado actual.

Municipio	Estado contrato de obra	No. Convenio y No. Contrato de obra	Contratista
Abrego	Adjudicado En liquidación	1791-2021 Contrato de Obra No. 252 de 2022	CONSORCIO AD VÍAS
La Playa de Belén	Adjudicado Liquidado	1863-2021 Contrato de Obra No. LP-004 de 2022	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Ocaña	Adjudicado Liquidado	1758-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052	CONSORCIO OK 2022
Ocaña	Adjudicado Liquidado	1814-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407	UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Cáchira	Adjudicado Liquidado	1859-2021 Contrato de Obra No.160 De 2022	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Herrán	Adjudicado Liquidado	1861-2021 Contrato de Obra No.146 De 2022	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRÁN 2022
Pamplonita	Adjudicado Liquidado	1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
Santiago	Adjudicado Liquidado	1821-2021 Contrato de Obra No. LP-OP-001-2022	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Gobernación-1943	Adjudicado En Ejecución	1943-2021 Contrato de Obra No. 02590 DE 2022	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Gobernación-2033	Adjudicado En liquidación	2033-2021 Contrato de Obra Interadministrativo No. 4164 DE 2022	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Gobernación-2052	Adjudicado En liquidación	2052-2021 Contrato de Obra No. 02332 DE 2022	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-OP-001- 2022
Objeto:	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 de julio de 2022
Valor Inicial:	$ 4.430.879.655,00 M/CTE
Fecha de inicio:	18 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial:	17 de junio de 2023
Fecha de Suspensión:	15 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	30 de marzo de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 30 de abril de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	1.5 meses hasta el 15 de junio de 2024
Fecha de terminación Final:	15 de junio de 2024

Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El día 10 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.1.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el Contratista ha realizado la entrega de la totalidad de los documentos de pre construcción, a la fecha el contratista tiene todos los documentos aprobados por parte de la Interventoría.

A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 30 de junio de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-168-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-043-22 del 17-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1010-24 del 10-May-24
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1010-24 del 10-May-24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-701-22 del 20-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-073-22 del 29-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-218-22 del 24-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1172-22- 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-226-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-645-22 del 09-May-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-231-22 del 30-Ene-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-347-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-313-22 del 27-Feb-23
Plan De Gerencia	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-191-22 del 18-Ene-23

Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago






3.1.1.2. Actividades Técnicas

El presente contrato de obra se encuentra liquidado.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas en el proyecto.

LPOP - 001 - 2022 CON OBJETO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 30-JUN-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						**3,300.00**		
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,056.00	81,316.00	$ 85,869,696.00	1894.21	154,029,580.36
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,878.95	729,305.00	$ 1,370,323,983.00	2129.11	1,552,770,568.55
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	155,875.01	8,217.83	$ 1,280,954,322.00	135475.63	1,113,315,696.48
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	2,024.01	163,747.00	$ 331,425,197.00	2058.01	336,992,963.47
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	557.66	380,604.00	$ 212,249,206.00	719.65	273,901,668.60
					SUB TOTAL	**$ 3,280,822,404.00**	$	3,431,010,477.46
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:						**20.00**		
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,182.50	81,316.00	$ 96,156,170.00	738.54	60,055,118.64
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	172.80	729,305.00	$ 126,023,904.00	111.17	$ 81,076,836.85
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	17.40	518,332.00	$ 9,018,977.00	23.24	$ 12,046,035.68
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	291.20	35,105.00	$ 10,222,576.00	276.73	$ 9,714,606.65
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	120.00	818,747.00	$ 98,249,640.00	90.00	$ 73,687,230.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11,578.00	8,217.83	$ 95,146,036.00	9258.72	$ 76,086,586.98
					SUB TOTAL	**$ 434,817,303.00**	$	312,666,414.80
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	23,218.00	1,927.00	$ 44,741,086.00		
					SUB TOTAL	**44,741,086.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	6.00	613,816.50	$ 3,682,899.00	5.00	3,069,082.50
					SUB TOTAL	**3,682,899.00**		
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS								
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO	m3	6,522.85	69,400.00	$ 452,685,628.00	6,965.70	$ 483,419,580.00
NP-02		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	kg	275,587.71	648.00	$ 178,580,835.00	151,971.04	$ 98,477,233.92
					SUB TOTAL	**631,266,463.00**	$	581,896,813.92
TOTAL EJECUTADO							**$**	**4,325,573,706.18**

Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago

3.1.1.3. Actividades ambientales

El día 10 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.1.1.4. Actividades sociales

El día 10 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.1.1.5. Actividades SST

El día 10 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista cuenta con aprobación de la totalidad de los Estudios y Diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-223-22 del 26-Ene-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-391-22 del 21-Mar-23 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-1001-22 del 05-Sept-23 - **RESPUESTA A CONTRATISTA DE LA SUBBASE**
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-1212-22 del 20-Oct-23 - **APROBACIÓN VALIDACIÓN CUANTÍA DE ACEROS**
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-410-22 del 28-Mar-23 - **APROBADO**

Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago.

Etapa de Construcción

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

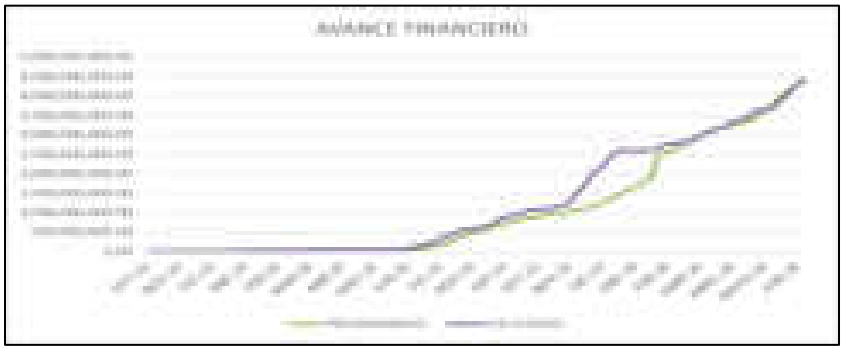


Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	146 de 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRÁN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRÁN 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de septiembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.781.999.648,00 M/CTE
Fecha de inicio:	19 de octubre de 2022
Fecha de Suspensión:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	10 de junio de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 30 de abril de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 30 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2022
Fecha de terminación Final:	30 de diciembre de 2023

Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra firmo acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024.


3.2.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20-Dic-22

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-199-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-324-22 del 06-Mar-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 09-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-075-22 del 30-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-234-22 del 31-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1187-22 del 13-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-230-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-717-22 del 26-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-300-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-216-22 del 24-Ene-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-315-22 del 27-Feb-23





Proyecto finalizado	Acta de liquidación

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

CONTRATO No 146 DE 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								EJECUTADO AL 31-ENERO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA									
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	2,025.74	42,047.00	$	85,176,290.00	2025.74	85,176,289.78
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	751.29	857,957.00	$	644,574,515.00	751.29	644,574,514.53
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	50,800.94	7,255.89	$	368,606,033.00	50800.94	368,606,032.54
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	918.01	274,215.00	$	251,732,112.00	918.01	251,732,112.15
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	273.84	494,679.00	$	135,462,897.00	273.84	135,462,897.36
					SUB TOTAL	**$**	**1,485,551,847.00**	$	1,485,551,846.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	238.14	42,047.00	$	10,013,073.00	238.14	10,013,072.58
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.36	857,957.00	$	26,905,532.00	31.36	26,905,531.52
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	12.40	650,737.00	$	8,069,139.00	12.40	8,069,138.80
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	87.57	33,094.00	$	2,898,042.00	87.57	2,898,041.58
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	24.00	812,424.00	$	19,498,176.00	24.00	19,498,176.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,314.68	7,255.89	$	16,795,063.00	2314.68	16,795,063.47
					SUB TOTAL	**$**	**84,179,025.00**	$	84,179,023.95
TRANSPORTES									
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m). MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	10,089.50	2,249.00	$	22,691,286.00	10089.50	22,691,285.50
					SUB TOTAL		**22,691,286.00**	$	22,691,285.50
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									-
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	14.00	611,676.00	$	8,563,464.00	9.00	5,505,084.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS								$	5,505,084.00
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES PETREOS	m3	2,912.60	39,871.64	$	96,565,125.00	2912.60	116,130,138.66
NP-02		TRANSPORTE INTERNO MATERIALES DE PESO	kg	55,771.40	445.65	$	28,850,699.00	55771.40	24,854,524.41
					SUB TOTAL		**125,415,824.00**	$	140,984,663.07
TOTAL EJECUTADO								**$**	**1,738,911,902.88**

Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán

3.2.1.2. Actividades ambientales

Se firmó acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024.

3.2.1.3. Actividades Sociales

Se firmó acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024.

3.2.1.4. Actividades SST

Se firmó acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024.

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental del estado al finalizar el contrato de obra de los componentes a Estudios y Diseños que se encuentran observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-229-22 del 30-Ene-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-1396-24 del 10-Oct-2024 - APROBADO
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-310-22 del 24-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-1396-24 del 10-Oct-2024 - APROBADO
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-224-22 del 26-Ene-23 - APROBADO
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-322-22 del 03-Mar-23 - APROBADO

Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán

3.2.1.6. Etapa de Construcción

El contratista dio por terminada la ejecución del 100% del proyecto.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

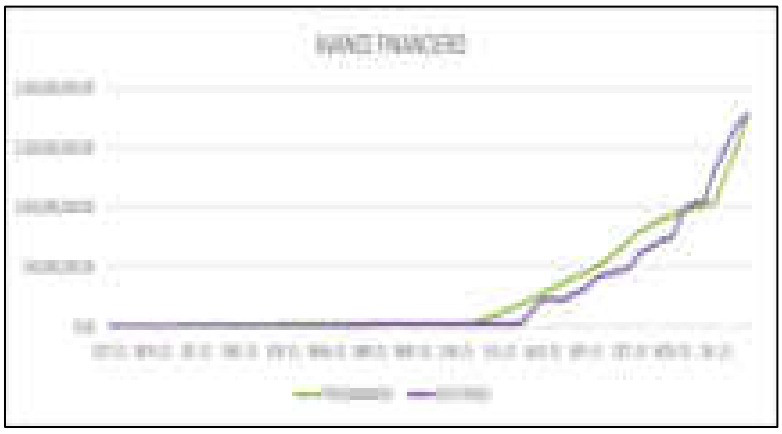


Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán

Se firmó acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.3879052
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONTRATISTA OK 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	10 de agosto del 2022
Valor Inicial:	$ 1.711.146.620,00 M/CTE
Fecha de inicio:	01 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	30 de abril de 2023
Fecha finalización Prorroga 1:	2 meses hasta el 30 de junio de 2023
Fecha finalización Prorroga 2:	1 mes hasta el 30 de julio de 2023
Fecha Nueva de terminación:	30 de julio de 2023

Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

Se firmo acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

3.3.1.1. Actividades Administrativas

A continuación, se describe la trazabilidad administrativa de documentación.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-179-22 del 16-Ene-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-056-22 del 24-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-538-22 12-May-2023
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-121-22 del 22-Dic-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-497-22 del 05-May-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-058-22 del 24-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-178-22 del 13-Ene-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-057-22 del 24-Nov-22
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-1219-22 del 23-Oct-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-252A-22 del 06-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-403-22 del 27-Mar-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-112-22 del 20-Dic-22
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-397-22 del 24-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-385-22 del 17-Mar-22

Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758

Actividades Técnicas

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha de terminación del contrato de obra.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER							
CONTRACTUAL						EJECUTADO AL 31-JULIO-23	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 520 MTS							
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	645.44	$ 40,896.00	$ 26,395,914.24	645.44	$ 26,395,914.24
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	301.21	$ 697,659.00	$ 210,141,867.39	301.21	$ 210,141,867.39
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	13,986.12	$ 7,674.00	$ 107,329,484.88	13986.12	$ 107,329,484.88
4	Sub - Base Granular clase C	m3	390.00	$ 180,365.00	$ 70,342,350.00	390.00	$ 70,342,350.00
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	131.22	$ 377,182.00	$ 49,493,822.04	131.22	$ 49,493,822.04
6	Sello de Juntas	m	4,536.00	$ 14,021.00	$ 63,599,256.00	4536.00	$ 63,599,256.00
Subtotal					$ 527,302,694.55		$ 527,302,694.55
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (4) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	31.22	$ 40,896.00	$ 1,276,773.12	31.22	$ 1,276,773.12
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	6.52	$ 697,659.00	$ 4,548,736.68	6.52	$ 4,548,736.68
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	15.40	$ 33,692.00	$ 518,856.80	15.40	$ 518,856.80
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	5.00	$ 780,444.00	$ 3,902,220.00	5.00	$ 3,902,220.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.95	$ 502,830.00	$ 477,688.50	0.95	$ 477,688.50
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	852.13	$ 7,674.00	$ 6,539,245.62	852.13	$ 6,539,245.62
Subtotal					$ 17,263,520.72		$ 17,263,520.72
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (4) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	0.00	$ 40,896.00	$ 0.00	0.00	$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	0.00	$ 262,291.00	$ 0.00	0.00	$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.00	$ 502,830.00	$ 0.00	0.00	$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	0.00	$ 33,692.00	$ 0.00	0.00	$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m3	0.00	$ 134,307.00	$ 0.00	0.00	$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	0.00	$ 9,459.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
PARCHEO Y/O BACHEO: (730) m3							
19	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	5912.74	$ 1,711.00	$ 10,116,698.14	5794.05	$ 9,913,619.55
20	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	572.69	$ 680,033.00	$ 389,448,098.77	560.83	$ 381,382,907.39
21	Fresado de pavimento asfaltico	m2	0.00	$ 17,874.00	$ 0.00	0.00	$ -
22	Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	3265.84	$ 101,820.00	$ 332,527,828.80	3194.35	$ 325,248,717.00
23	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	m3	886.90	$ 156,888.00	$ 139,143,967.20	869.12	$ 136,354,498.56
24	BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA	m3	887.50	$ 173,590.00	$ 154,061,125.00	535.02	$ 92,874,121.80
Subtotal					$ 1,025,297,717.91		$ 945,773,864.30
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
25	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	$ 113,357.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
26	POSTE DE REFERENCIA	und	0.00	$ 356,982.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS							
27	COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	und	1.00	$ 10,436,640.00	$ 10,436,640.00	1.00	$ 10,436,640.00
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS							
	TERRAPLENES	m3	1087.47	$ 106,535.00	$ 115,853,616.45	1063.71	$ 113,322,344.85
SUBTOTAL OBRAS							$ 1,603,662,424.42

Tabla 11 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758

3.3.1.2. Actividades ambientales

Se firmó acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

3.3.1.3. Actividades Sociales

Se firmó acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

3.3.1.4. Actividades SST

Se firmó acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental entregados y aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - **APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX** - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - **APROBACIÓN PH**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con el comunicado OK-169-2022 del 14-Jun-2024 (PLANOS RÉCORD) - Hace entrega con el comunicado OK-174-2022 del 16-Jul-2024 (PLANOS RÉCORD) - GIC-INVIAS-NTS-1152-24 del 16-Ago-2024 - **APROBACIÓN DE PLANOS RÉCORD**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-539-22 del 12-May-2023
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - APROBACIÓN PH
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-274-22 del 17-Feb-23 - APROBADO (D. Alcantarilla) - GIC-INVIAS-NTS-455-22 del 18-Abr-23 – APROBADO OBSERVACIONES PH - GIC-INVIAS-NTS-746-22 del 30-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con el comunicado OK-108-2022 del 05-Jul-23 – Cuneta - GIC-INVIAS-NTS-771-22 del 10-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Se mantiene al contratista que se mantiene las observaciones de la cuneta Samaritana.

Etapa de Construcción
Se firmó acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

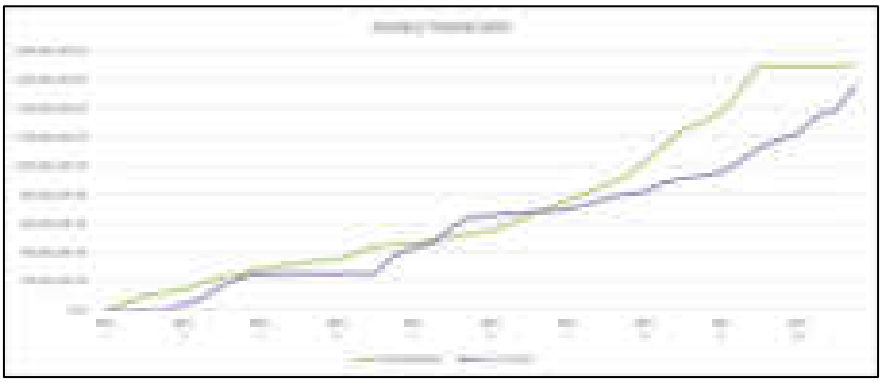


Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758

Se ejecuto el 100% de las actividades contractuales.

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	160 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	04 de octubre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.658.435.877,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	15 de marzo de 2023
Fecha de Suspensión 1:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	05 de julio de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	3 meses hasta el 30 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	1 meses hasta el 30 de julio de 2024
Fecha Suspensión 2:	30 de julio de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de julio de 2024

Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra su tiempo contractual finalizo.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo.

3.4.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 30 de noviembre de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-201-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-150-22 del 28-Dic-22
Programa de Obra	Entregado	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Flujo de Caja	Entregado	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-304-22 del 23-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-856-22 del 03-Ago-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Entrega documento con oficio MATI-CACHI-083-24 del 21-Jun-24 – (Balance)
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-312-22 del 24-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-291-22 del 21-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-581-24 del 15-Abr-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-227-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-823-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-302-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22

Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira

3.4.1.2. Actividades Técnicas

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

"MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER"								
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO AL 30- JUNIO-2024	
							CANTIDAD	VALOR TOTAL
CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 633 MTS								
1	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.00	50,374.00	$ 6,145,628.00	477.00	24,028,398.00
2	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	502.74	813,055.00	$ 408,756,897.00	30.79	25,033,963.45
3	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	30,675.92	8,166.00	$ 250,499,563.00	1985.06	16,209,999.96
4	320.3	Sub - Base Granular clase C	m3	479.63	236,999.00	$ 113,670,948.00	474.88	112,546,085.12
5	630.7	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	152.33	455,564.00	$ 69,394,060.00	10.77	4,906,424.28
6		Sello de Juntas	m	5,438.00	14,837.00	$ 80,683,606.00		-
					SUB TOTAL	**$ 929,150,702.00**	$	182,724,870.81
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (7) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	428.93	50,374.00	$ 21,606,668.00	148.28	7,469,456.72
8	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	63.20	813,055.00	$ 51,387,657.00	21.07	17,131,068.85
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	101.92	35,653.00	$ 3,633,754.00	47.04	1,677,117.12
10	661.2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	42.00	872,886.00	$ 36,661,212.00	24.00	20,949,264.00
11	630.4	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.09	602,283.00	$ 3,667,903.00	2.88	1,734,575.04
12	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	4,472.30	8,166.00	$ 36,520,802.00	1722.90	14,069,201.40
					SUB TOTAL	**$ 153,477,996.00**	$	63,030,683.13
CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBON								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 264 MTS								
1	600.1.1-2	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	41.00	50,374.00	$ 2,065,334.00	209.51	10,553,856.74
2	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	138.13	953,275.00	$ 131,678,736.00	204.23	194,687,353.25
3	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	11,935.83	8,209.00	$ 97,981,228.00	10985.47	90,179,723.23
4	320.3-2	Sub - Base Granular clase C	m3	199.98	347,000.00	$ 69,393,060.00	212.10	73,598,700.00
5	630.7-2	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	43.16	455,564.00	$ 19,663,554.00	46.58	21,220,171.12
6		Sello de Juntas	m	1,813.00	14,837.00	$ 26,899,481.00		-
					SUB TOTAL	**$ 347,681,393.00**	$	390,239,804.34
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.55	50,374.00	$ 6,173,334.00	110.88	5,585,469.12
8	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	18.06	953,275.00	$ 17,214,288.00	7.02	6,694,850.33
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	29.12	35,653.00	$ 1,038,215.00	36.00	1,283,508.00
10	661.2-2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	12.00	872,886.00	$ 10,474,632.00	12.00	10,474,632.00
11	630.4-2	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	1.74	602,283.00	$ 1,047,972.00	1.44	867,287.52
12	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	1,275.80	8,166.00	$ 10,418,183.00	1110.07	9,064,831.62
					SUB TOTAL	**$ 46,366,624.00**	$	33,970,578.59
CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 566 MTS								
1	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	115.00	50,374.00	$ 5,793,010.00	433.71	21,847,707.54
2	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	441.64	998,507.00	$ 440,982,628.00	160.40	160,160,522.80
3	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	27,309.05	8,220.00	$ 224,480,391.00	8420.07	69,212,975.40
4	320.3-3	Sub - Base Granular clase C	m3	424.96	382,000.00	$ 162,333,765.00	464.24	177,339,680.00
5	630.7-3	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	88.12	455,564.00	$ 40,144,732.00	22.88	10,423,304.32
6		Sello de Juntas	m	5,129.00	14,837.00	$ 76,098,973.00		-
					SUB TOTAL	**$ 949,833,499.00**	$	438,984,190.06
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND								
7	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	507.40	50,374.00	$ 25,559,768.00	175.28	8,829,554.72
8	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	72.23	998,507.00	$ 72,124,357.00	35.12	35,067,565.84
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	116.48	35,653.00	$ 4,152,861.00	70.14	2,500,701.42
10	661.2-3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	48.00	872,886.00	$ 41,898,528.00	30.00	26,186,580.00
11	630.4-3	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.96	602,283.00	$ 4,191,890.00	3.60	2,168,218.80
12	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,111.20	8,220.00	$ 42,014,064.00	2887.58	23,735,907.60
					SUB TOTAL	**$ 189,941,468.00**	$	98,488,528.38
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
13	720.8	Postes de referencia - Corredor 1	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-
14	720.8	Postes de referencia - Corredor 2	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-
15	720.8	Postes de referencia - Corredor 3	und	5.00	377,759.00	$ 1,888,795.00		-
					SUB TOTAL	**6,421,903.00**	$	-
						TOTAL EJECUTADO	$	1,207,438,655.31

Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira

3.4.1.3. Actividades ambientales

Se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024

3.4.1.4. Actividades Sociales

Se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024

3.4.1.5. Actividades SST

Se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024

3.4.3. Estado de avance del proyecto

Se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024

Etapa de Actualización Estudios y Diseños

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-708-22 del 23-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Entrega documento con MATICCES - CACHI – 045 -2022 del 22-Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-731-22 del 27-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con MATICCES-CACHI-040-2022 del 16- Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-748-22 del 04-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-727-22 del 27-Jun-22 - **APROBADO**

Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira

Etapa de Construcción

Se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INICIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
CACHIRA	633	CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ	54	54	579
	264	CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBÓN	264	264	0
	566	CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA	224.10	224.10	341.90
TOTAL	1.463		**TOTAL**	542.10	920.90

Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

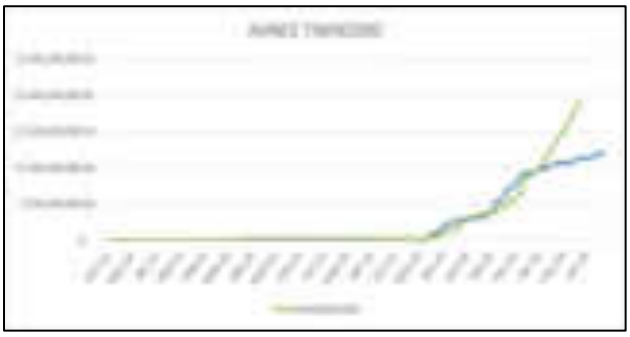


Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira

3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	252 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL
Contratista:	CONSORCIO AD VÍAS
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	24 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 4.314.324.054,00 M/CTE
Adicción 1:	$ 179.688.569,00 M/CTE
Valor Total:	$ 4.494.012.623,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de enero de 2023
Fecha de terminación inicial:	16 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3 meses hasta el 15 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 29 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 11 de noviembre de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	1.3 meses hasta el 20 de diciembre de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Suspensión 1:	14 de diciembre de 2023
Reinicio 1:	29 de enero de 2024
Suspensión 2:	28 de mayo de 2024
Reinicio 2:	11 de julio de 2024
Fecha Nueva de terminación:	31 de diciembre de 2024

Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.5.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista tiene aprobados la totalidad de documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27-Feb-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 12-Feb-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-959-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-259-22 del 09-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21-Feb-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 01-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-250-22 del 03-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-255-22 del 07-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1118-22 del 29-Sept-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-278-22 del 17-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-635-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1237-22 del 26-Oct-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23

Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego

3.5.1.2. Actividades Técnicas

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha de terminación del contrato de obra.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 1: SANTA - LUCIA Y DEL CORREO VIAL 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER						
No	**DESCRIPCION**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
CORREDOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS					**EJECUTADO A 30/NOVIEMBRE/2024**	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**$**	**1,752,862,689.760**
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 135,458,439.00	2,699.90	$ 136,004,762.60
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 511,745,326.00	757.21	$ 546,145,284.60
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 521,881,063.00	63,071.31	$ 512,643,632.06
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 150,062.00	$ 259,053,816.00	2,064.58	$ 309,815,003.96
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 400,909.00	$ 106,889,385.00	261.76	$ 104,941,939.84
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 146,506,473.00	9,659.10	$ 143,312,066.70
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**$**	**134,540,680**
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 15,063,282.00	352.76	$ 17,769,932
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 39,999,204.00	50.43	$ 36,373,142
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 3,189,728.00	115.19	$ 4,106,869
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 832,991.00	$ 34,985,622.00	42.00	$ 34,985,622
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 534,825.00	$ 3,627,397.00	25.39	$ 13,579,207
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 27,727,534.00	3,411.16	$ 27,725,908
CORREDOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**$**	**1,371,145,986**
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 145,851,329.00	2,225.52	$ 112,108,344
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 749,647.00	$ 589,641,797.00	595.84	$ 446,669,668
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 572,099,840.00	43,656.40	$ 354,839,219
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 188,607.00	$ 350,791,532.00	1,409.63	$ 265,866,085
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 441,176.00	$ 127,143,361.00	183.65	$ 81,021,972
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 141,185,925.00	7,457.08	$ 110,640,696
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**$**	**126,102,097**
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 35,147,658.00	249.20	$ 12,553,201
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 780,529.00	$ 101,000,921.00	55.45	$ 43,280,333
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 7,862,734.00	94.51	$ 3,369,565
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro in	m	$ 925,603.00	$ 90,709,094.00	38.00	$ 35,172,914
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 590,380.00	$ 9,343,118.00	6.78	$ 4,002,776
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 64,697,580.00	3,410.84	$ 27,723,308
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					**$**	**2,266,554**
13	Postes de referencia corredor1	und	377,759.00	$ 2,266,554	6.00	$ 2,266,554
14	Postes de referencia corredor 2	und	377,759.00	$ 3,777,590	-	$ -
ITEM NO PREVISTO					**$**	**270,261,977**
15	Transporte a distancia adicional a la contractual			$ 409,487,845.00	0.46	$ 270,261,977
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$**	**3,657,179,984**

Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego

3.5.1.3. Actividades ambientales

El contrato finalizó el 31 de diciembre de 2024, se encuentra en proceso de liquidación

3.5.1.4. Actividades Sociales

El contrato finalizó el 31 de diciembre de 2024, se encuentra en proceso de liquidación

3.5.1.5. Actividades SST

El contrato finalizó el 31 de diciembre de 2024, se encuentra en proceso de liquidación

3.5.1.6. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se ha presentado ítem con actividad no prevista en el proyecto la cual es:

- Sobre acarreos por un valor $409,487.845 a razón de:

*"(...) Desde la firma del convenio en referencia, la entidad territorial municipio de Abrego N.S ha adelantado acciones en búsqueda de fuentes de material de cantera y de arrastre sobre los cauces o lechos de los ríos aledaños al proyecto, en especial al corredor 2, encontrando calidad en la deficiente calidad del material en posibles canteras y dejando como única alternativa el material del arrastre sobre el cauce del río El Tarra; fuente hídrica que desde el mes de noviembre del año anterior (2022) se encuentra altamente contaminada a raíz de movimientos de remoción en masa presentados aguas arriba en límites con el municipio de Villa Caro N.S y que ha ocasionado altas afectaciones ambientales de flora y fauna; situación que a la fecha imposibilita cualquier tipo de acceso y extracción, así como trámite de licenciamiento ambiental y que **deja como única alternativa el acarreo de material desde la planta con permisos ambientales y legales vigentes** (...)" (negrilla y subrayado fuera de texto original)*

3.5.2. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.5.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados los Estudios y Diseños del corredor 1; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría. En cuanto al Corredor 2, se tiene aprobado el componente Estructural e Hidráulico y, los componentes de Diseño de Pavimentos, Diseño Geométrico y Topografía aprobado con observaciones.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Entrega con correo electrónico del 04-Feb-23 - MESA DE TRABAJO 06-02-2023 - Entrega con OFC-CADV-GIC-012-2023 del 15-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-276-22 del 17-Feb-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con OFC-CADV-GIC-019-2023 del 22-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-311-22 del 24-Feb-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-022-2023 del 25-Feb-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-027-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-026-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-331-22 del 06-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-353-22 del 10-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-033-2023 del 14-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-383-22 del 16-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-034-2023 del 21-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-039-2023 del 22-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-402-22 del 24-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-409-22 del 27-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-078-2023 del 24-May-2023 - CORREDOR 2 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-077-2023 del 24-May-2023 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-583-22 del 26-May-2023 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-137-2023 del 18-Sep-2023 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-1102-22 del 25-Sept-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-153-2023 del 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1214-22 del 20-Oct-23 - APROBADO CORREDOR 1 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-006-2024 del 31-Ene-2024 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-220-24 del 06-Feb-24 – OBSERVADO - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-039-2024 del 28-mayo-2024 PLANOS RÉCORDS - GIC-INVIAS-NTS-863-24 del 07-Jun-24 - OBSERVADO PLANOS RÉCORDS - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-044-2024 del 19-Jun-2024 - PLANOS RÉCORDS - OFC-CADV-GIC-089-2024 - ENTREGA OBSERVACIONES TRAMO 2 - 21/11/2024 - OFC-CADV-GIC-100-2024 - TOPOGRAFÍA - 11/12/2024
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-649-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 (corredor 1 y 2)** - GIC-INVIAS-NTS-778-22 del 11-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-085-2024 ENTREGA OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 1 – 15/11/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- OFC-CADV-GIC-094 -2024 ENTREGA OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 1 CHORRO 1 Y 2 - 03/12/2024 - GIC-INVIAS-NTS-1711-24 del 19/12/2024 – **APROBADO** - OFC-CADV-GIC-095 -2024 ENTREGA **OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 2** - 06/12/2024 - GIC-INVIAS-NTS-1732-24 - 24/12/2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-014-2023 del 17-Feb-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-296-22 del 22-Feb-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-345-22 del 08-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **OBSERVACIONES - CONCEPTO DE LOS TALUDES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-025-2023 del 02-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-323-22 del 03-Mar-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023 del 18-May-2023 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-574-22 del 25-May-23 - **APROBADO CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-460-22 del 25-Sept-23 **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-140-2023 del 22-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-1109-22 del 25-Sept-23 **APROBADO CON OBSERVACIONES CHORRO 1 Y 2**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-413-22 del 29-Mar-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-049-2023 del 04-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-454-22 del 18-Abr-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-054-2023 del 18-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-464-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-099-2023 del 30-Jun-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-110-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - GIC-INVIAS-NTS-904-22 del 15-Ago-23 **OBSERVACIONES ALCANTARILLA PR 7+410** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-128-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla El Chorro 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-1109-22 del 25-Sept-23 - A**PROBADO MURO ALCANTARILLA CHORRO 1 Y 2**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
PLANOS RÉCORD	- Entrega documento con OFC-CADV-GIC-091-2023 del 23/11/2024 – ENTREGA PLANOS RÉCORDS – TRAMO SAN VICENTE CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-1688-24 de 16/12/2024 - **OBSERVACIONES**

3.5.2.2. Etapa de Construcción

El contrato finalizó el 31 de diciembre de 2024, se encuentra en proceso de liquidación

A continuación, se relacionan las cantidades de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INICIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ABREGO	2401.35	CORREDOR 1 VEREDA SANTA LUCIA - CANOAS	1150	2401,00	0
		CORREDOR 2 VEREDA BRISAS DEL TARRA – LA RENOSA	1251		

Tabla 26 Cantidades a la fecha ejecutadas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego

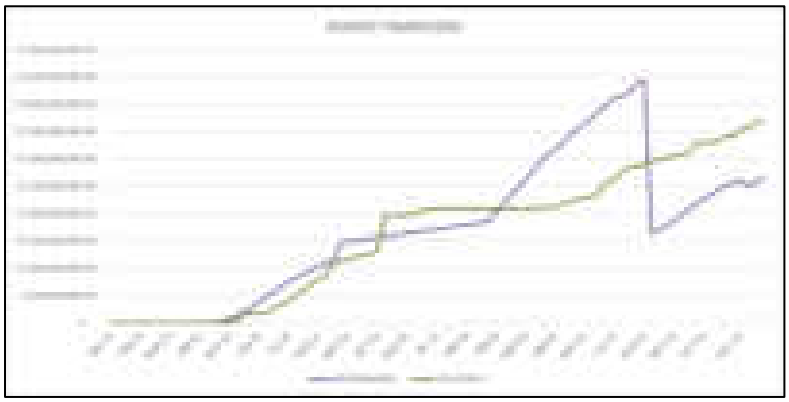


Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego

Se da por terminado actividades en el tramo de San Juan con una ejecución de 300 m, San Vicente con una ejecución de 415 m.

La Vega del Tigre con un avance de 191.62 m

En el tramo San Luis finalizo la construcción de 298.93 m

En la vereda Milagros finalizo la construcción de 61.32 m

4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-004 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.
Contratista:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de enero de 2023
Valor Inicial:	$ 2.203.091.392,21 M/CTE
Adicional No. 1:	$ 65.529.031,39 M/CTE
Valor total:	$ 2.268.620.424,00 M/CTE
Fecha de inicio:	06 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial:	06 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3.5 meses hasta el 21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 18 de abril de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	1.5 meses hasta el 02 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	01 meses hasta el 06 de julio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	01 meses hasta el 06 de agosto de 2024
Fecha de Suspensión 1:	31 de julio de 2024
Fecha de Reinicio 1:	19 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	26 de agosto de 2024

Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.6.1.1 Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista al finalizar el contrato se encontró al día con los documentos de pre construcción como se presenta a continuacón:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10-Abr-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-435-22 del 10-Abr-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-580-24 del 15-Mar-24
Programa de Obra	Aprobado	Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-053-2024 del 06-07-2024 (Prorroga 5) GIC-INVIAS-NTS-1012-24 del 09-Jul-24 - **APROBADO PRORROGA**
Flujo de Caja	Aprobado	Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-053-2024 del 06-07-2024 (Prorroga 5) GIC-INVIAS-NTS-1012-24 del 09-Jul-24 - **APROBADO PRORROGA**
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-365-22 del 14-Mar-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-366-22 del 14-Mar-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-386-22 del 17-Mar-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-367-22 del 14-Mar-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-370-22 del 14-Mar-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1165-22 del 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-434-22 del 10-Abr-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-636-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-427-22 del 03-Abr-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-473-22 del 28-Abr-23 OFC-CLP-GIC-028-2023 del 25-May-2023 – Entrega documentación

Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa

3.6.1.2. Actividades Técnicas

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO 31/07/2024
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CORREDOR 1: LLANO GRANDE - SAN PEDRO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 800 MTS				$ 1,076,212,491.85				
1	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	1601.64	$ 71,112,816
2	630.4	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	491.70	$ 381,067,500
3	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	41842.52	$ 335,577,010
4	320.3	320.3.2		Sub - Base Granular clase C	m3	$ 201,000	1003.73	$ 201,749,730
5	630.7	630.7		Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 420,000	67.37	$ 28,295,400
6		410.1	410.1P	Sello de Juntas	m	$ 13,200	4560.94	$ 60,204,408
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND				$ 40,260,415.12				
7	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	99.68	$ 4,425,792
8	630.4	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	18.49	$ 14,329,750
9			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 30,000	31.51	$ 945,300
10	661.2			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 850,000	12.00	$ 10,200,000
11	630.4	630.4		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 550,000	2.26	$ 1,243,000
12	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	1137.12	$ 9,119,702
CORREDOR 2: ESPERANZA - ESPERANCITA - CLAVELLINOS								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 600 MTS				$ 954,963,397.86				
1	600.1.1-2	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	1376.63	$ 61,122,372
2	630.4 - 2	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	446.65	$ 346,153,750
3	640.1-2	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	36584.20	$ 293,405,284
4	320.3-2	320.3.2		Sub - Base Granular clase C	m3	$ 201,000	922.69	$ 185,460,690
5	630.7-2	630.7		Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 420,000	49.44	$ 20,764,800
6		410.1	410.1P	Sello de Juntas	m	$ 13,200	3647.24	$ 48,143,568
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (3) UND				$ 71,550,425.99				
7	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	164.17	$ 7,289,148
8	630.4 - 3	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	32.17	$ 24,931,750
9			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 30,000	63.70	$ 1,911,000
10	661.2-2			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 850,000	18.00	$ 15,300,000
11	630.4	630.4		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 550,000	3.64	$ 2,002,000
12	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	2180.61	$ 17,488,492
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				$ 4,550,000				
13	720.8		720.8P	Postes de referencia corredor1	und	$ 350,000	7.00	$ 2,450,000
14	720.8		720.8P	Postes de referencia corredor 2	und	$ 350,000	6.00	$ 2,100,000
ITEMS NO PREVISTO:				$ 94,850,758			0.00	$ -
	900.2.8	Transporte a distancia adicional a la contractual			gl	$ 57,577,010	0.85	$ 48,940,459
	N.P 1	Suministro E Instalación De Tubería Pvc 6" Drenaje Sin Filtro			ML	$ 46,361	115.66	$ 5,362,113
	N.P 2	Construcción De Filtro A Cualquier Profundidad Con Material Filtrante Según Norma Invias, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000			ML	$ 275,909	115.66	$ 31,911,635
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)						$ 2,242,387,489		$ 2,233,007,469

Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa

3.6.1.3. Actividades ambientales

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

Actividades Sociales

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

Actividades SST

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Se presentaron los ítems con actividades no previstas en el proyecto, de sobre acarreo e instalación de un filtro.

3.6.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se dividió en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de La Playa de Belén, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-644-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CORREDOR 1 Y 2**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-743-22 del 29-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-031-2023 del 24-May-2023 C 1 Y 2

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-602-22 del 30-May-23 - APROBADO CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-024-2024 del 11-03-2024 MURO ESPERANCITA - GIC-INVIAS-NTS-509-24 del 04-Abr-2024 – APROBADO MURO ESPERANCITA
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-017-2023 del 21-Abr-2023 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-466-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-036-2023 del 05-Jun-2023 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-670-22 del 13-Jun-13 - **APROBADO CORREDOR 1**

Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa

3.6.3.3. Etapa de Construcción

En el presente periodo el contratista se encuentra con la totalidad de estudios y diseños aprobados por parte de la interventoría, se finalizaron las actividades de construcción y el contrato de obra se encuentra liquidado.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

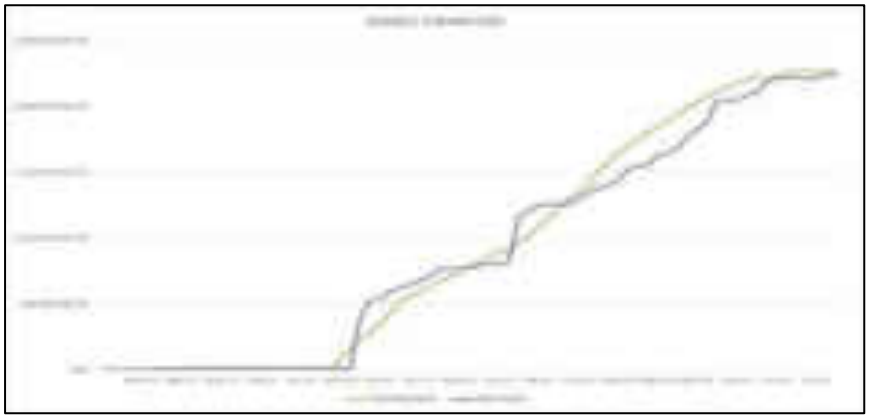


Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	202 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	21 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.703.523.226,00 M/CTE
Fecha de inicio:	14 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	13 de octubre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	2.67 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 30 de mayo de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de mayo de 2024

Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción para revisión de la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-789-22 del 14-Jul-2023
Protocolo de Bioseguridad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-697-22 del 20-Jun-2023
Programa de Obra	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Flujo de Caja	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Programa de Generación de Empleo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-621-22 del 05-Jun-2023
Equipo Mínimo Obligatorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-673-22 del 13-Jun-2023
Análisis de Precios Unitarios		En Revisión de Interventoría
Instalaciones Provisionales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-620 del 05- Jun-2023
Plan de Manejo de Transito - PMT	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-765-22 del 07-Jul-2023
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-082-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-989-22 del 01-Sep-2023
Fuente de Materiales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-699-22 del 20-Jun-2023
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-623-22 del 06-Jun-2023

Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita

3.7.1.2. Actividades Técnicas

En el presente contrato de obra, se ejecutó el 100% del objeto contractual, el contrato se liquidó el 08 de enero de 2025.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a la finalización de las actividades desarrolladas en el proyecto.



A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 31-MAYO-2024		
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:									
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	289.00	33,000.00	$ 9,537,000.00	1474.64	48,663,120.00	
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,220.00	670,000.00	$ 817,400,000.00	1071.61	717,978,700.00	
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	57,780.00	8,300.00	$ 479,574,000.00	65636.94	544,786,602.00	
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-SO	m3	1,391.00	120,000.00	$ 166,920,000.00	1288.96	154,675,200.00	
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	278.20	360,000.00	$ 100,152,000.00	317.12	114,163,200.00	
						SUB TOTAL	**$ 1,573,583,000.00**	$	1,580,266,822.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	176.00	33,000.00	$ 5,808,000.00	194.70	$ 6,425,100.00	
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.20	670,000.00	$ 20,904,000.00	28.48	$ 19,081,600.00	
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	3.20	520,000.00	$ 1,664,000.00	6.19	$ 3,218,800.00	
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	88.00	32,000.00	$ 2,816,000.00	77.66	$ 2,485,120.00	
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	28.01	550,000.00	$ 15,405,500.00	24.00	$ 13,200,000.00	
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,316.00	8,300.00	$ 19,222,800.00	2314.68	$ 19,211,844.00	
						SUB TOTAL	**$ 65,820,300.00**	$	63,622,464.00
TRANSPORTES									
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m), MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,900.00	$ 16,454,000.00		-	
						SUB TOTAL	**16,454,000.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	600,000.00	$ 4,200,000.00	7.00	4,200,000.00	
						SUB TOTAL	**4,200,000.00**		
							TOTAL EJECUTADO	**$**	**1,643,889,286.00**

Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita

3.7.1.3. Actividades ambientales

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 08 de enero de 2025.

3.7.1.4. Actividades sociales

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 08 de enero de 2025.

3.7.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 08 de enero de 2025.

3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista cuenta con aprobación de los documentos correspondientes a los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 008 – 2023 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-631-22 del 08-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 018– 2023 del 20-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-706-22 del 22-Jun-2023 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 022 – 2023 del 04-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-762-22 del 07-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-590-22 del 26-May-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 025 – 2023 del 19-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-821-22 del 25-Jul-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 029– 2023 del 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-907-22 del 15-Ago-2023 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-605-22 del 31-May-2023 - **APROBADO** - Entrega documentación con PHP2022-034 y 035-2022 del 20-Sept-23 – Validación cuantía de aceros
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 020 – 2023 del 23-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-770-22 del 10-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 024 – 2023 del 10-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-830-22 del 27-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 027 – 2023 del 03-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-908-22 del 15-Ago-2023 - **APROBADO**

Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita

3.7.1.7. Etapa de Construcción

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

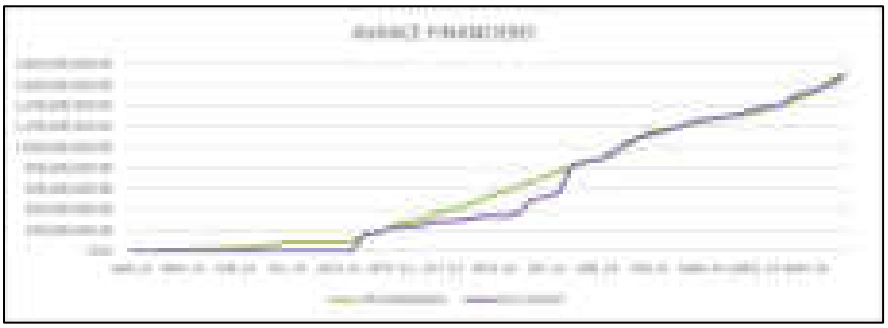


Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

A corte del 31 de mayo de 2024, se dio por finalizada la ejecución de actividades del contrato.

3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02590 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 16.898.027.326,00 M/CTE
Valor adicional 1:	$ 7.565.000.000,00 M/CTE
Valor total del contrato:	$ 24.463.027.326,00 M/CTE
Fecha de inicio:	10 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	09 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 09 de junio de 2024
Suspensión 1:	20 de diciembre de 2023
Prorroga suspensión 1:	16 de enero hasta el 04 de febrero de 2024
Prorroga suspensión 2:	05 de febrero hasta el 20 de febrero de 2024
Fecha reinicio 1:	20 de febrero de 2024
Fecha de terminación Prorroga 2:	04 meses hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	2 meses hasta el 28 de febrero de 2025
Fecha de terminación Final:	28 de febrero de 2025

Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943

3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte de este informe, el contratista de obra sigue llevando a cabo actividades administrativas y técnicas relacionadas con la ejecución del contrato de obra 2590 de 2022, con el objetivo de cumplir con las obligaciones contractuales. A continuación, se detallan las acciones realizadas y su importancia para el avance del proyecto.

3.8.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas a la fecha, se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 31 de enero de 2025:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24-Nov-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-643-22 del 08-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-475-22 del 28-Abr-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-0043-25 del 28-Ene-2025
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-0043-25 del 28-Ene-2025
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25-Jul-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	
Instalaciones Provisionales	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-1069-22 del 18-Sep-23 GIC-INVIAS-NTS-1070-22 del 18-Sep-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1179-22 del 12-Oct-23 GIC-INVIAS-NTS-1180-22 del 12-Oct-23 GIC-INVIAS-NTS-1256-22 del 27-Oct-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1635-22 del 28-Dic-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-876-22 del 09-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-824-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-766-22 del 07-Jul-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1126-22 del 02-Oct-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1126-22 del 02-Oct-23

Tabla 36 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943

Cabe destacar que dentro de las actividades administrativas realizadas en la semana también se encuentran las siguiente:

- El contratista de obra, mediante el comunicado UTET-02590-445 del 23 de enero de 2025, solicitó una prórroga del contrato. En respuesta, la interventoría, con base en el comunicado 2024S-VBOG-087251 del 21 de noviembre de 2024, emitido por INVIAS como entidad contratante, señaló que, en caso de que el tiempo de prórroga de la interventoría no sea suficiente para garantizar el acompañamiento en la ejecución de las obras derivadas, será la Gobernación de Norte de Santander quien deberá aportar los recursos necesarios para extender la interventoría y asegurar el control y seguimiento de dichas obras.

  Por lo anterior, se dio respuesta tanto al contratista de obra como a la Gobernación de Norte de Santander, presentando el presupuesto correspondiente de la interventoría con el propósito de gestionar los recursos necesarios para su continuidad.

- Se realizan mesa de trabajo junto con el contratista de obra para verificar actividades de obra ejecutadas y avance semanal a la fecha.
- Se verifican las actividades a ejecutar en campo de acuerdo a estudios y diseños especialmente en la vereda Corozal – california donde se ejecutará sumidero transversal para el manejo de aguas lluvia, lo cual hace necesario incluir un apu No previsto al proyecto.
- De acuerdo a la verificación de cantidades de obra chequeadas en oficina en mesa de trabajo con el contratista de obra una vez planeada la modificación No5 al contrato de obra con el fin de incluir mayores y menores obra y de igual manera ítem no previsto y alcances definitivos, se reestructura la misma teniendo en cuenta la solicitud realizada por parte de la interventoría con directriz del INVIAS donde se debe realizar un ajuste al contrato de obra teniendo en cuenta que el mismo de acuerdo a la modificación No4 con cumplía con los rubros específicos de acuerdo al convenio 1943 de cual se deriva dicho contrato de obra 02590.
- Se viene trabajando junto con el contratista de obra en la verificación de cantidades y alcances definitivos con el fin de dar cumplimiento al recurso del contrato de acuerdo a lo emanado en el convenio rubros específicos.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO	$ 2.393.000.000,00
MEJORAMIENTO	$ 22.772.000.000,00

3.8.1.2. Actividades Técnicas

Durante el mes de enero se llevaron a cabo una serie de actividades técnicas en los tres municipios seleccionados para la intervención: Los Patios, Arboledas y, finalmente, en Gramalote, donde se realizaron trabajos de mantenimiento periódico. Estas acciones tuvieron como objetivo principal atender puntos críticos en la infraestructura vial, mediante la implementación de soluciones específicas y efectivas, como la construcción de placas huella, lo que permitió mejorar la estabilidad y la transitabilidad de las vías en dichas áreas.

Además, se realizaron importantes intervenciones en el ámbito hidráulico, con la construcción de obras de drenaje esenciales para gestionar de manera adecuada el flujo del agua de escorrentía, previniendo posibles daños a la infraestructura. De manera complementaria, se ejecutaron labores de mantenimiento periódico, que incluyeron la adecuación de la subrasante y la ejecución de cuneteo en aquellas zonas donde el deterioro del terreno era considerable, lo que contribuyó a garantizar un mejor rendimiento y durabilidad de las vías en el futuro.

Las intervenciones abarcaron las siguientes veredas en cada municipio:

- **En el municipio de Los Patios**: Actividades de mejoramiento mediante la construcción de placa huella y obras de drenaje.
- **En el municipio de Arboledas**: Actividades de mejoramiento mediante la construcción de placa huella y obras de drenaje se realizaron trabajos en las veredas Santo Domingo, Rinconada, Volcán, Cinera, Chicagua Bajo, Potreros.
- **En el municipio de Gramalote**: Se llevaron a cabo intervenciones en las veredas Boyacá, San Isidro y Santa Anita.

Municipio de los Patios

Vereda Corozal – California

El contratista retoma las actividades en campo el 07 de enero de 2025, iniciando la primera semana con labores de logística, que incluyen el suministro y distribución de materiales y

equipos en las áreas de intervención a lo largo del corredor vial Vereda Corozal – California. Esta fase es clave para garantizar una ejecución eficiente y organizada de los trabajos programados.

Actualmente, el proyecto contempla la intervención de un total de 12 tramos de placa huella, de los cuales en el mes de enero se han ejecutado trabajos en los siguientes sectores:

- **Tramo No. 2**
- **Tramo No. 3**
- **Tramo No. 4**
- **Tramo No. 6**

En estos tramos, el contratista ha desarrollado actividades como la preparación del terreno, la instalación de estructura base, el vaciado de concreto y las adecuaciones necesarias para garantizar la calidad de la obra.

Además de la construcción de la placa huella, se han adelantado trabajos relacionados con el sistema de drenaje, el cual es crucial para la conservación de la vía y la adecuada evacuación de aguas lluvias.

De manera específica, durante el mes se ha realizado la construcción de obras de drenaje Alcantarillas y se continua con actividades en sumidero transversal en el Tramo No. 1, que permitirá canalizar y evacuar de manera eficiente el agua, evitando encharcamientos y erosión en la estructura vial.

Actividades ejecutadas:

- Se realiza instalación de formaleta de madera para modulación de elementos a lo largo de los tramos No2, No3, No4 y No6 sección de placa huella tradicional.
- Teniendo en cuenta que durante el avance de la obra aún quedan cunetas pendientes por ejecutar, se continúa con el vaciado de concreto de 21 MPa en estas estructuras.
- Se lleva a cabo la instalación del geotextil 2400N, un material diseñado específicamente para la estabilización de la subrasante, con el propósito de mejorar sus condiciones estructurales.
- Se ejecutan las actividades de distribución, humectación y compactación de la subbase granular en los tramos faltantes 2 y 4, como parte del desarrollo continuo de la placa huella.

- Durante el periodo se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para los diferentes elementos de placa huella en los tramos intervenidos durante el mes tramo 2,3,4 y 6.
- Durante el periodo se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para elementos de franja central y sobreancho de placa huella en los tramos donde se ejecutan actividades durante el mes.

Municipio de Arboledas

A lo largo del mes de enero, se continuaron ejecutando los trabajos de mejora vial, con un enfoque en la construcción de placas huella en las veredas de Cinera, Santo Domingo, Volcán, Chicagua Bajo, Potreros y Rinconada. Estas actividades se llevaron a cabo con el propósito de avanzar en los tramos de placa huella pendientes y en la ejecución de las obras de drenaje proyectadas, asegurando así la continuidad del proceso constructivo y la optimización de la infraestructura vial.

Las actividades ejecutadas en cada uno de los frentes de trabaja en el Municipio de arboledas fueron las siguiente:

Vereda Santo Domingo

Durante el mes de enero, los trabajos se concentraron exclusivamente en actividades relacionadas con la **construcción de la placa huella en el Tramo No. 1C,** avanzando en diferentes frentes de obra para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas.

Se continuaron las actividades de suelo-cemento, que incluyeron:

- Escarificación de la subrasante para mejorar la compactación y adherencia del material.
- Mezcla de cemento con el suelo existente para incrementar la resistencia y estabilidad de la base.
- Compactación del material conforme a los diseños establecidos, asegurando una base homogénea y resistente.
- Se llevó a cabo la **instalación de formaleta de madera en el Tramo No. 2C**, utilizada para la **modulación de los diferentes elementos de la placa huella,** garantizando una alineación precisa y un correcto proceso constructivo.
- Vaciado de concreto de 14 MPa con piedra pegada en la franja central, con el objetivo de modular y delimitar los elementos de la placa huella.

- Instalación de acero de refuerzo #3 – 3/8”, tanto en dirección longitudinal como transversal, para proporcionar mayor resistencia estructural a la placa huella a lo largo del tramo intervenido.
- Vaciado de concreto de 21 MPa, elaborado en obra, para todos los elementos de la placa huella, incluyendo la viga riostra, huellas, cuneta y bordillo, completando así la sección estructural de la vía.

Vereda Rinconada

Durante el mes, se reanudaron las actividades en el Tramo No. 1 de la placa huella, dando continuidad a la proyección establecida en el alcance final del proyecto. Las principales actividades realizadas fueron las siguientes:

- Adecuación de la subrasante a lo largo del Tramo No. 1, seguida de su compactación para asegurar una base sólida y estable para la placa huella.
- Instalación de formaleta de madera para la modulación de los elementos de placa huella, lo que permitió dar forma a las diferentes secciones a lo largo del tramo.
- Vaciado de concreto de 14 MPa con piedra pegada, elaborado en obra, para los elementos de placa huella, permitiendo la formación de los primeros componentes estructurales.
- Instalación de acero de refuerzo #3 – 3/8” en las direcciones longitudinal y transversal para los elementos de placa huella, incluyendo la viga riostra, huellas, cuneta y bordillo, asegurando la resistencia y durabilidad de la estructura.
- Vaciado de concreto de 21 MPa, también elaborado en obra, para los diferentes elementos de la sección transversal de la placa huella, que incluye la viga riostra, huellas, cuneta y bordillo, completando la estructura de la vía.

Vereda Chicagua

Durante el periodo se realizan actividades de obras de drenaje (Alcantarillas) a lo largo del corredor vial de acuerdo a la proyección de diseños.

- Se realizaron **excavaciones sin clasificar** para la instalación de **zanjas de tubería** y los elementos de **encole (poceta)** y **descole (cabezote)** de la **alcantarilla** en los puntos **Pr0+734, Pr1+014 y Pr1+199**, como parte de las obras de drenaje y manejo de aguas en el proyecto. Estas excavaciones son fundamentales para asegurar una correcta instalación de los sistemas de drenaje y su funcionamiento adecuado.
- Se llevó a cabo la **instalación de acero de refuerzo #3 y #4** en los **elementos de alcantarilla** correspondientes a la **poceta de encole** y el **cabezote de descole,** conforme a los **diseños establecidos.**

- Se realizó la **instalación de formaleta** para la **modulación de los elementos de encole y descole de alcantarillas,** siguiendo el **dimensionamiento** establecido en los diseños. Esta actividad es crucial para garantizar la correcta forma y alineación de los elementos de la alcantarilla.
- Se llevó a cabo el **vaciado de concreto de 21 MPa**, elaborado en obra, para los **elementos de encole y descole de alcantarillas de acuerdo al dimensionamiento de los elementos de encole y descole**.

Vereda Cinera

Durante el periodo, se continuaron las **actividades de mejoramiento y construcción de placa huella** en las áreas pendientes, así como la ejecución de **obras de drenaje,** específicamente en las **alcantarillas.** Se avanzó en el **vaciado de concreto en los elementos de encole y descole**, completando las tareas que estaban pendientes y asegurando la funcionalidad del sistema de drenaje en las secciones intervenidas.

- Se realiza la instalación de acero de refuerzo #3 – 3/8 longitudinal y transversal para los diferentes elementos de alcantarilla (Poceta de encole y descole de alcantarilla).
- Durante el periodo, se llevó a cabo el vaciado de concreto de 21 MPa en los elementos pendientes de cunetas y bordillos en áreas específicas de alcantarillas, particularmente en la entrada de descole de cunetas.

Vereda Potreros

Durante este periodo, se continuaron las actividades en el **Tramo No. 2** de la **placa huella**, con el objetivo de concluir el **alcance** previsto para este tramo. Se avanzó en las tareas necesarias para completar la ejecución de la obra en esta sección.

- Armado de acero de refuerzo #3 – 3/8” en direcciones longitudinal y transversal para los elementos de cuneta y bordillo pendientes a lo largo del tramo, garantizando la resistencia y durabilidad de estas estructuras.
- Instalación de formaleta de madera para la modulación de los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo), asegurando la correcta forma y alineación de las secciones.
- Vaciado de concreto de 21 MPa, elaborado en obra, para los elementos de cuneta y bordillos pendientes a lo largo del tramo en intervención, completando así las tareas relacionadas con el drenaje y la estructura vial.

- Vaciado de concreto de 14 MPa, también elaborado en obra, para los elementos de la franja central y sobreancho en el área final del Tramo No. 2 de la placa huella, contribuyendo a la estabilización y funcionalidad de la vía.

Vereda Volcán

Durante el periodo el contratista realiza actividades que tiene que ver con la culminación de obras de drenaje a lo largo del corredor vial vereda volcán donde se ejecutan las siguientes actividades en campo.

- Se realizan actividades de vaciado de concreto de 14 Mpa para solados para los elementos de encole y descole de alcantarillas a lo largo del corredor vial.
- Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para losa de fondo de elementos de encole y descole de alcantarillas a lo largo del corredor vial.
- Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 y #4 longitudinal y transversal para elementos de encole y descole de alcantarilla Pr1+151.
- Se realiza excavación sin clasificar para zanjas de tubería, poceta de encole y cabezote descole de alcantarillas Pr0+317.
- Se realiza instalación de tubería de PVC de 36” pulgadas para alcantarilla ubicada en el Pro+317.
- Se realiza relleno con material de excavación y se realiza la debida compactación de la misma con el fin de habilitar el paso.

Durante el periodo, se desarrollaron diversas actividades en los corredores viales del municipio de Arboledas, logrando un avanzar en 105 metros lineales de placa huella. De igual manera se continúa avanzando en las diferentes obras de drenaje (alcantarillas) en los corredores viales con el fin de dar cumplimiento a la totalidad del alcance proyectado para el municipio de arboledas.

Municipio de Gramalote

Durante la última semana de enero, el contratista asignado al mantenimiento de los corredores viales del Municipio de Arboledas llevó a cabo actividades de mantenimiento periódico y remoción de derrumbes en las veredas Boyacá, San Isidro y Santa Anita. Las actividades incluyeron:

1. **Mantenimiento periódico**: Se realizaron tareas de mejoramiento de la subrasante a lo largo del corredor vial de la vereda Boyacá y santa anita con el fin de mejorar las condiciones actuales del terreno.

2. **Remoción de derrumbes**: Se llevaron a cabo trabajos de retiro de material producto de deslizamientos en los corredores viales, lo que permitió restablecer el tránsito en las zonas afectadas en el corredor vial de la vereda San isidro con el fin de habilitar el paso y se cuantifican en campo cada uno de estos.

Estas labores contribuyeron significativamente a mejorar las condiciones de las vías y reducir los riesgos para los habitantes y viajeros del municipio.



Ilustración 2 Comités de seguimiento y control de actividades de campo

3.8.1.3. Actividades Ambientales

Al finalizar este mes de diciembre cumple entregando la información de las actividades realizadas durante el mes terminado mediante oficio UTET-02590-456 del 01 de febrero de 2025.

El PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) consta de cinco (5) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.
De un total de 13 proyectos, todos se han implementado:

Nombres de los programas		Si	No	Justificación
Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental.	Conformación del grupo de gestión social y ambiental	X		
	Capacitación y concientización para el personal de obra	X		
	Cumplimiento requerimientos legales.	X		
Programa de actividades constructivas	Manejo integral de materiales de construcción.	X		
	Manejo integral de explotación fuentes de materiales de construcción		X	**El proveedor seleccionado para los tres frentes de obra es la Trituradora la Amarilla**
	señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	X		
	manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción, demolición (RCD) y lodos	X		

Nombres de los programas		Si	No	Justificación
	manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales	X		
	manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales		X	**No se realizará afectación de áreas, las zonas a intervenir son corredores viales existente**
Programa Gestión Hídrica.	Proyecto de manejo de aguas superficiales.	X		
	Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	X		
Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal.		X	**No se realizará afectación de áreas, las zonas a intervenir son corredores viales existente**
	Proyecto de recuperación de Áreas Afectadas.		X	**No se realizará afectación de áreas, las zonas a intervenir son corredores viales existente**
	protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles		X	**El área a intervenir no se encuentra dentro de ecosistemas sensibles**
	Protocolo de Fauna en obra	X		
	protección de la fauna en vías		X	**El área a intervenir no se encuentra dentro de ecosistemas sensibles**

Nombres de los programas		Si	No	Justificación
	Compensación ambiental		X	**No se realizará afectación de áreas, las zonas a intervenir son corredores viales existente**

Fuente: Contratista de obra

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: El grupo de gestión ambiental y social para el desarrollo de las actividades constructivas, realiza aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero William Quintero Pabón, la Profesional Ambiental Dayana Melina Salazar Ortega, la auxiliar social Darly Galvis, la profesional social, el ingeniero residente de obra en el municipio de Arboledas Brayan Alberto Abellaneda y el ingeniero residente de obra del municipio de Los Patios Gramalote Cesar Andrés Cárdenas Coll, quienes realizan seguimiento al cumplimiento de las medidas propuestas y verifican su cumplimiento.
Durante el mes de enero se realiza reunión virtual con los profesionales que hacen parte del comité socio ambiental, con el fin de identificar avances de la gestión social y ambiental en cada uno de los frentes de obra.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Durante el mes de enero se realizan las siguientes capacitaciones programadas en el cronograma del PAGA:

1. Inducción ambiental
2. Cuidado de la flora y fauna presente en el área de influencia del proyecto

Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de los Patios.



Fuente Contratista

- Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de Gramalote



Fuente Contratista

- Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de Arboledas





Fuente Contratista

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de las obras a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.
La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como, de suministro de agua, materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Arboledas, gramalote y Los Patios, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportado y dispuestos en el relleno sanitario.
Con respecto a los requerimientos de material constructivo, la UT EDIVIAL TROJA utilizará como fuente de materiales a la Trituradora La Amarilla quienes cuentan con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: Los vehículos de transporte se encuentran en buen estado, con carpa y cuenta con la documentación correspondiente.

- Municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Municipio de Los Patios



Fuente Contratista

- Municipio de Gramalote



Fuente Contratista

Se cuenta con almacén para el resguardo de los materiales. El almacén se encuentra limpio y ordenado.

- Almacén del municipio de Arboledas



Fuente: contratista

- Almacenamiento del municipio de Los Patios









Durante este periodo el contratista recibió materiales de la Trituradora La Amarilla.

Tabla 2. Fuente de materiales

Localización	Volumen utilizado	Tipo de fuente	Numero de licencia ambiental
Santiago Norte de Santander	Ver tablas 3,4 y 5.	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 344 de 09 de junio 2021

Se han recibido las siguientes cantidades de materiales provenientes de cantera durante el mes de enero del año 2025.

Tabla 3. Materiales utilizados en obra municipio de Los Patios

Materiales petreos en m3	
Materiales	Enero
Triturado	184,21
Arena	117,92
Piedra	39,43
Subbase	462,07

Tabla 4. Materiales utilizados en obra municipio de Arboledas

Materiales petreos en m3	
Materiales	Enero
Triturado	107,70
Arena	68,35
Piedra	8,95
Subbase	20,86

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se realizó la señalización del frente de obra.

- Señalización en el municipio de Arboledas:



Fuente contratista

- Señalización en el municipio de Los Patios



Fuente Contratista

Proyecto 4: MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS., PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de construcción y demolición generados a partir de la actividad de excavación serán dispuestos en predios autorizados por los dueños y por la alcaldía de cada municipio.
El municipio de Arboledas y Gramalote cuenta con la autorización de la secretaria de planeación donde consta que si está permitido la disposición de materiales en el área seleccionada. Se anexan las certificaciones.
El municipio de Los Patios cuenta con la autorización del propietario del predio, quien solicitó el material de excavación con el propósito de adecuar y nivelar el terreno. Se adjunta el certificado correspondiente.

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se instalan puntos ecológicos para la segregación de residuos según la normativa vigente. El punto ecológico cuenta con la respectiva señalización, tapas y bolsas de colores para garantizar una adecuada separación de residuos.

- Punto ecológico en el municipio de los Patios:





Fuente Contratista

- Punto ecológico en el municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Punto ecológico en el municipio de Gramalote:



Fuente Contratista

Durante el mes de enero se realizan jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de obra.

- Municipio de Gramalote



Fuente: Contratista

- Municipio de Arboledas



Fuente: Contratista

- Municipio de Los Patios



Fuente: Contratista

Durante el mes de enero se generaron las siguientes cantidades de residuos sólidos:

Frente de obra	Tipo de residuos	Cantidad (Kg)	Color
Los Patios-Vereda California	No aprovechable	4 kg	Negro
	Aprovechable	0.0 kg	Blanco
	Residuos Orgánicos aprovechables	0.0	Verde
	Peligrosos	5 kg	Roja
Total		9 kg	

Tabla 6. Residuos Sólidos generados en el municipio de Arboledas

Frente de obra	Tipo de residuos	Cantidad (Kg)	Color
Arboledas-Vereda Santa Anita	No aprovechable	4 kg	Negro
	Aprovechable	0.0 kg	Blanco
	Residuos Orgánicos aprovechables	0.0	Verde
	Peligrosos	5 kg	Roja
Total		9 kg	

Fuente Contratista

PROGRAMA DE GESTIÓN HÍDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: En Los municipios de Gramalote, Los Patios y Arboledas se realiza la compra de agua para uso industrial, en una empresa que certifique la disponibilidad del suministro de agua y cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad vigentes.

Durante el mes de enero se realiza jornada de riego, en la vía existente con el objetivo de minimizar la generación de material particulado

.



Fuente: Contratista

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: En los diferentes frentes de obra se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietarios de vivienda aledaña a los campamentos, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza y disponibilidad de papel higiénico y jabón.

- Baño del municipio de Gramalote



Fuente: Contratista

- Baño del municipio de Los Patios



Fuente: Contratista

- Baño municipio de Arboledas



Fuente: Contratista

Debido a que solo se está manejando ACPM y anti sol, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

- Municipio de Arboledas



Fuente: Contratista

- Municipio de Los Patios



Fuente: Contratista

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas: Durante este periodo, el proyecto no ha realizado intervenciones en Áreas Protegidas, En caso de realizarse alguna intervención se implementarán Medidas de conservación áreas de interés ecológico y se reportara en el informe mensual.

Se realizarán charlas de sensibilización a los trabajadores con el fin de informar que está prohibido extraer de los ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales

SUBPROGRAMA 4 PROTOCOLOS DE FAUNA EN OBRA

Actividades ejecutadas: En caso de ser necesario se realizará el rescate de especímenes de anfibios, reptiles, aves y/o mamíferos que se vean afectados por las obras constructivas de manera manual y se hará entrega a el hogar de paso de CORPONOR ubicado en la vereda Las Piedras del municipio El Zulia.
En el caso que se realice algún rescate se reportará en el informe mensual respectivo, registrando los datos en el formato para registro de fauna.
Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con este proyecto.

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler viviendas cercanas las cuales se utilizan como campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, igualmente se utilizan como bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas.

- Campamento municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Campamento en el municipio de los Patios



Fuente Contratista

- Campamento en el municipio de Gramalote:



Fuente Contratista

SUBPROGRAMA 5.3 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Los vehículos utilizados en la ejecución de las obras cuentan con el certificado de revisión técnico – mecánica (que incluye análisis de gases) y SOAT vigentes (ver informe SST).
Se realiza revisión de la maquinaria, como mínimo buen funcionamiento de frenos, sistema de dirección, sistemas de suspensión, estado adecuado de llantas, vidrios y espejos.
El operario cuenta con todos los elementos de protección personal (EPP), que son necesarios para realizar su trabajo.
Se prohíbe el lavado, mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria en los frentes de obra.
La maquinaria cuenta con la documentación correspondiente.
Para el manejo de la maquinaria se cuenta con la respectiva señalización.
En el periodo no ocurrieron derrames de aceites o combustibles dentro de la obra.

- Municipio de Arboledas:



- Municipio de Los Patios:



FUENTE: Contratista

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se logra evidenciar que el contratista durante el mes de junio ejecutó los programas contemplados en el documento PAGA.

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del contratista con el fin de revisar la documentación ambiental que se encuentra pendiente por entregar hasta la fecha.

Durante el periodo de enero se radico oficio GIC-INVIAS-NTS- 00016-25 RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-406 CON ASUNTO: SOPORTES PARA COBRO DEL PLAN GUIA A LA ADAPTACIÓN AMBIENTAL (PAGA), también se ha mantenido un monitoreo constante y detallado de los frentes de obra en los dos municipios, asegurando que se

cumplan los compromisos ambientales estipulados en el PAGA y promoviendo un manejo responsable de los recursos naturales.
- UTET-02590-450 INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE AÑO 2023 COMPONENTE AMBIENTAL.
-Se recibe oficio UTET-02590-453 INFORME TRIMESTRAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE AÑO 2024 COMPONENTE AMBIENTAL.

3.8.1.4. Actividades Sociales

3.8.1.4.1. Proyecto de atención a la comunidad

3.8.1.4.2. Subprograma Atención a la comunidad.

Objetivo: se realiza seguimiento al canal de comunicación que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes PQRS presentadas por la población, a través de un buzón de sugerencias, con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas presentadas por la comunidad y a su vez mantener la confianza de los actores sociales en el área de influencia de apoyo.

3.8.1.4.3. Proyecto de información y divulgación.

3.8.1.4.4. Seguimiento de la oficina de información y atención a la comunidad.

Objetivo: Establecer un canal efectivo y continuo de comunicación entre la comunidad y el proyecto, asegurando que las inquietudes, solicitudes y observaciones de la comunidad sean atendidas de manera oportuna y adecuada, con el fin de promover la transparencia, generar confianza y facilitar la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades de la obra.

En el mes de enero, se llevó a cabo el seguimiento a la Oficina de Información y Atención a la Comunidad, encontrando que no se registraron Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias (PQRS) en ninguno de los municipios: Los Patios, Arboledas y Gramalote. En este último, la ausencia de PQRS se atribuye a la finalización de la construcción de la placa huella en el municipio.

MUNICIPIO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	IMPLEMENTACIÓN
PATIOS COROZAL		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación en la vereda California y con los siguientes canales de atención: Horarios: de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
ARBOLEDAS EL CINERA		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación el municipio de Arboledas y con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m. - 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

MUNICIPIO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	IMPLEMENTACIÓN
ARBOLEDAS HELECHAR		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación el municipio de Arboledas y con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m. - 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
ARBOLEDAS SANTO DOMINGO		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación el municipio de Arboledas y con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m. - 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

MUNICIPIO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	IMPLEMENTACIÓN
ARBOLEDAS VOLCÁN		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación el municipio de Arboledas y con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m. - 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
ARBOLEDAS JUAN BUENO		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación el municipio de Arboledas y con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m. - 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

MUNICIPIO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	IMPLEMENTACIÓN
ARBOLEDAS POTRERO		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación el municipio de Arboledas y con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m. - 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
GRAMALOTE SANTA ANITA		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación el municipio de Gramalote y con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m. - 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

MUNICIPIO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	IMPLEMENTACIÓN
GRAMALOTE SAN ISIDRO		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación el municipio de Gramalote y con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m. - 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

3.8.1.4.5. Proyecto para el manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos

3.8.1.4.6. Sub programa Actas de vecindad

Objetivo: Implementar un sistema de monitoreo y mantenimiento preventivo para la infraestructura de servicios públicos en el área de influencia del proyecto, a fin de minimizar el impacto de las actividades de obra sobre estos servicios, asegurar su adecuado funcionamiento y prevenir posibles interrupciones en el suministro de agua, energía eléctrica, redes de alcantarillado y telecomunicaciones.

3.8.1.4.7. Proyecto de recuperación del derecho vial

3.8.1.4.8. Sub programa Control y Monitoreo del Derecho de Vía

Objetivo: Establecer un sistema continuo de control y monitoreo del derecho de vía en áreas de influencia del proyecto, con el fin de identificar, prevenir y gestionar ocupaciones no autorizadas de manera oportuna, asegurando así la preservación y el uso adecuado de estas áreas conforme a la normativa vigente y los estándares de seguridad vial.

3.8.1.4.9. Proyecto cultura vial y participación.

3.8.1.4.10. Sub programa Educación vial para la comunidad.

Objetivo: Desarrollar e implementar un programa educativo dirigido a la comunidad para fomentar la cultura vial, promoviendo el conocimiento y respeto por las normas de tránsito y el uso adecuado de la infraestructura vial. Este subprograma buscará sensibilizar a los ciudadanos, peatones y conductores sobre la importancia de la seguridad vial, la prevención de accidentes, y la participación activa en el cuidado del derecho de vía, contribuyendo a crear un entorno vial más seguro y colaborativo.

3.8.1.4.11. Proyecto de contratación de mano de obra

3.8.1.4.12. Sub programa promoción de empleo local en obra.

Objetivo: Facilitar la contratación de mano de obra local en las distintas etapas del proyecto, priorizando a los habitantes de las comunidades cercanas a la obra, con el fin de contribuir al desarrollo económico local, reducir la tasa de desempleo en la zona de influencia y fortalecer el vínculo entre el proyecto y la comunidad.

#	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FRENTE	CONTRATISTA
1	SUAREZ VILLALBA FREDIS JOSÉ	1101387669	TOPÓGRAFO	PATIOS	UTEDIVIAL-TROJA 2590
2	DARLY JUDITH RODRÍGUEZ GALVIS	1090393766	RESIDENTE SISO	GRAMALOTE-ARBOLEDAS	UTEDIVIAL-TROJA 2590
3	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	88261502	ING AMBIENTAL	TODO PROYECTO	UTEDIVIAL-TROJA 2590
4	LUIS NÚÑEZ	1094426602	ING RESIDENTE	GRAMALOTE	UTEDIVIAL-TROJA 2590
5	NATALIA HURTADO	1090506478	SST-AMBIENTAL-SOCIAL	TODO PROYECTO	UTEDIVIAL-TROJA 2590
6	ANGIE STELLA DUARTE	1090508619	AUXILIAR CONTABLE	ADMINISTRACIÓN	UTEDIVIAL-TROJA 2590
7	GUSTAVO NIÑO GARCÍA	1090497738	ING COMPRAR	ADMINISTRACIÓN	UTEDIVIAL-TROJA 2590
8	LEIDY JAIME	1091664068	AUXILIAR INGENIERÍA	ADMINISTRACIÓN	UTEDIVIAL-TROJA 2590
9	WILLIAM PABÓN	13278653	DIRECTOR DE OBRA	ADMINISTRACIÓN	UTEDIVIAL-TROJA 2590

10	LISBETH AVELLANEDA	1.004.809.328	OPERADOR	ADMINISTRACIÓN	UT EDIVIAL-TROJA 2590
11	BRAYAN ALBERTO FUENTES AVELLANEDA	1094427498	ING RESIDENTE	ARBOLEDAS	UT EDIVIAL-TROJA 2590
12	CARLOS ALBERTO LAGUADO RODRÍGUEZ	1092646457	TOPÓGRAFO	ARBOLEDAS	UTEDIVIAL-TROJA 2590
13	ÁLVARO ROJAS	1094427632	OPERADOR	ARBOLEDAS	UT EDIVIAL-TROJA 2590
14	LEDY MARÍA CARVAJAL	60397386	CONTADORA	TODO PROYECTO	UT EDIVIAL-TROJA 2590
15	JUAN DE JESÚS FUENTES MARCIALES	1092645215	OFICIOS VARIOS	ARBOLEDAS	UT EDIVIAL-TROJA 2590

Número del personal contratada del área de influencia directa = 15
Número de personal contratistas foráneos (Del área de influencia indirecta) = 1

3.8.1.4.13. Proyectos productivos:

No aplica

3.8.1.4.14. Proyecto de gestión socio predial:

No aplica

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el mes la interventoría recibe informe mensual de enero por parte del contratista para revisión, concepto y aprobación.

- Se logra evidenciar que el contratista durante el mes de enero ejecutó los programas contemplados en el documento PAGA. Por tanto, la interventoría hace recorrido durante la obra, evidenciando que en los frentes ya se visualiza las actividades que se relacionan al componente social, aplicando los subprogramas del documento PAGA: como la cartelera informativa, buzón de sugerencias, valla publicitaria, entre otras.

- La interventoría durante el mes de enero realizó seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

• La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

3.8.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Contratación del personal

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
3	FRANKLYN AARON GIRALDO	LOGÍSTICA	79685180	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCÍA	COMPRAS	1090497738			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
6	JHONATAN ALEXIS HERNÁNDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1004877143			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
7	WILLIAM PACHECO	OPERADOR DE MAQUINARIA	13392290	RETIRO	30/10/2024	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	ARISTOBULO ZABALA	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
9	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFÍA	1007909639			UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
10	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
12	CESAR ANDRÉS CÁRDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
13	EDWAR HERNÁNDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	RETIRADO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
14	DARLY JUDITH RODRÍGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
15	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO		INDEPENDIENTE	TODO EL PROYECTO
16	HÉCTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
17	FREDIS JOSÉ SUAREZ VILLALBA	TOPÓGRAFO	1101387669	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
18	LUIS EDUARDO GARCÍA PALACIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093761965	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
19	ELIAN ALEXIS CARRILLO	OPERADOR	1007953522	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
20	WILLIAM JOEL FLÓREZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005543179	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
21	ÁLVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERÍA	1094427632	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
22	ANGELICA CAROLINA LÓPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
23	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
24	DANIEL STEVEN CÁRDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
25	FERNANDO SOTO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093789563	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
26	GEOVANY ORTIZ	AUX INGENIERÍA	1090515100	RETIRO	31/10/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
27	CARLOS ALBERTO LAGUADO RODRÍGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1092646457	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
28	ÁLVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERÍA	1094427632	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
29	JUAN DE JESÚS MARCIALES	OPERADOR DE MAQUINARIA	1092645215	INGRESO	05/11/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
30	JESÚS MANUEL CASERES	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093795633	ACTIVO	15/10/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	DOUGLA URIBE TORRES	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
2	EUGENIO URIBE MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	7618618	13/06/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
3	HEILER PÉREZ	AYUDANTE DE OBRA	PT1168414	ACTIVO		SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
4	JESÚS SIERRA	AYUDANTE DE OBRA	1007444967	RETIRADO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
5	ÁLVARO CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13413081	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
6	ÁNGEL MARÍA JAIMES	AYUDANTE DE OBRA	13412578	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
7	DOUGLAS URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	14/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
8	RONALD SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA	1092644428	1/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
9	YOSSER CARVAJAL	AYUDANTE DE OBRA	1004941773	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
10	DIEGO JESÚS BOHADA	AYUDANTE DE OBRA	1092644511	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
11	LUIS ÁNGEL ANTOLÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645613	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
12	FABIO URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1098621938	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
13	FRANCISCO SANDOVAL	AYUDANTE DE OBRA	1090462244	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
14	RAMON GELVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647522	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
15	EUGENIO MARTÍNEZ MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	7618618	ACTIVO		SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
16	EDWIN ENRIQUE HOYOS	AYUDANTE DE OBRA	1096183008	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
17	FRANKI BRAVO DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1068577126	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
18	CESAR AUGUSTO DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1063153505	ACTIVO	11/09/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
19	CRISTIAN ANDRÉS BRAVO	AYUDANTE DE OBRA	1003066670	ACTIVO		SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
20	JESÚS ENRIQUE LÓPEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645869	13/06/2024	07/09/2024	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
21	CARLOS ANDRÉS BAUTISTA	AYUDANTE DE OBRA	1093414104	17/06/2024		SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
22	DARÍO PASCUAL GARCÍA	AYUDANTE DE OBRA	1005011416	ACTIVO	01/07/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
23	EDWIN SANTIAGO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644912	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
24	GERSON JAVIER GARCÍA	AYUDANTE DE OBRA	1091353753	ACTIVO	01/07/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
25	JOSÉ FERNANDO CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	1007444989	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
26	JOSÉ GREGORIO MOYA	AYUDANTE DE OBRA	7175554	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
27	JUAN CARLOS VEGA	AYUDANTE DE OBRA	88168922	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
28	MARCO BARRIENTO	AYUDANTE DE OBRA	88252815	ACTIVO	01/07/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
29	EDUARD CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA	1092646081	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
30	SERGIO GUTIÉRREZ	AYUDANTE DE OBRA	1090505404	08/06/2024	RETIRADO	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
31	AUGUSTO MEDINA	AYUDANTE DE OBRA	1653558	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
32	FREDY MONCADA	AYUDANTE DE OBRA	13412374	08/06/2024	RETIRADO	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
33	JAVIER COLMENARES	AYUDANTE DE OBRA	4535674	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
34	JHON DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1092644442	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
35	MANUEL BUSTOS	AYUDANTE DE OBRA	13412179	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
36	ADRIÁN ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	1092644875	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
37	LUIS ALBERTO RUIZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645020	08/07/2024		CONSTRUCCIONE S SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
38	JESÚS DIAZ GALVIS	AYUDANTE DE OBRA	1092644524	22/08/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
39	GERMAN ALIRIO GELVEZ ORTEGA	AYUDANTE DE OBRA	1094242516			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
40	JOSÉ RICARDO LAGUADO LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	88179263			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
41	HUGO RAMON PEÑALOZA	AYUDANTE DE OBRA	1004941337			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
42	ABEL ANTONIO CARVAJAL PABÓN	AYUDANTE DE OBRA	1004941319			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
43	JOSÉ NICASIO VILLAMIZAR LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	13411728			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
44	DIOMEDES BAUTISTA PADILLA	AYUDANTE DE OBRA	1092646678			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
45	HEYSON CONTRERAS CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1004941117			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
46	ERIKSON FABIAN GARCÍA PARADA	MAESTRO DE OBRA	1093884815			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
47	BISMARK MORA	AYUDANTE DE OBRA	1095799437	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
48	ERASMO MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73583603	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
49	JHON JAIRO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1085100485	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
50	JOSÉ ANTONIO MORA	AYUDANTE DE OBRA	1051747008	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
51	JOSÉ DE JESÚS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1002426166	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
52	JOSÉ DE LOS SANTOS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1131359803	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
53	JOSE BELEÑO GUTIÉRREZ	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
54	LUIS FERNANDO ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1131359342	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
74	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ	AYUDANTE DE OBRA	1002304255	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
75	RAFAEL MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73584569	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
76	SATURNINO MORA	AYUDANTE DE OBRA	73592013	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
77	JOSÉ DE LA HOS BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
78	YULIS PAOLA BEÑEO	AYUDANTE DE OBRA	1065660929	10/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
79	JOSÉ DEL CARMEN VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13481520	18/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
80	YOMEL FERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6202934	18/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
81	YONATHAN HERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
82	ANGELICA CAROLINA LÓPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA 2590	PATIOS
83	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA 2590	PATIOS
84	DANIEL STEVEN CÁRDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA 2590	PATIOS
85	LUZ DARY RUBIO ORTEGA	RESIDENTE SISO	1093413884	ACTIVO	13/07/2024	SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
86	JORGE ELIECER GÓMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1115793688	ACTIVO		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
87	JUAN CARLOS GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	1116791522	ACTIVO		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
88	JHOAN SEBASTIÁN OSPINO	AYUDANTE DE OBRA	1098699992	ACTIVO		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
89	EDER VANEGAS ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1051743874	10/08/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
90	CRISTIAN DANIEL FULEDAS	AYUDANTE DE OBRA	1007883115	10/08/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
91	HENRY JAVIER AGUILLON CÁCERES	AYUDANTE DE OBRA	5455903	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
92	DEYNER JAVIER AGUILLÓN CRIZ	AYUDANTE DE OBRA	1092525258	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
93	NEFTALI ARÉVALO NAVARRO	AYUDANTE DE OBRA	88001685	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
94	FRANCISCO GABRIEL CELIS CAICEDO	AYUDANTE DE OBRA	1193443662	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
95	JOSÉ ASCENCION CRUZ GRIMALDOS	AYUDANTE DE OBRA	13411827	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
96	ALEXIS EDUARDO GUTIERREZ ALEJOS	AYUDANTE DE OBRA	5179902	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
97	LUIS JAVIER MORILLO ALEJO	AYUDANTE DE OBRA	6316312	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
98	JOSE GREGORIO PADRON LIRA	AYUDANTE DE OBRA	6996284	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
99	CRISTIAN STIVEN RODRIGUEZ OJEDA	AYUDANTE DE OBRA	1093741724	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
100	ANCIZAR HENAO OSORIO	AYUDANTE DE OBRA	10238188	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS

Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social

UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- Gobernación 1943 se entregan las afiliaciones y seguridad del mes vencido por temas de fechas de pago.

Política de Seguridad Y salud en el Trabajo

La UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- Cuenta con la política de seguridad y salud en el trabajo y es verificada en los documentos iniciales.

Marco legal en seguridad y salud en el trabajo

La UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- cuentan con la matriz de requisitos legales y es verificada en los documentos iniciales.

Reglamento de Higiene y seguridad Industrial

UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590-

cuentan con un reglamento de higiene y seguridad industrial el cual, fue evidenciado y aprobado al previo inicio de las actividades de obra.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST

La UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590-

Cuentan con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Comité de Convivencia Laboral

La UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590, cuentan con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Diagnóstico inicial de condiciones de Trabajo.

UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590, se identificaron y priorizaron los diferentes riesgos presentes en las actividades, a través de la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, este documento se aprobó en la etapa de preliminares

2. **Exámenes de ingreso**

En el periodo se presentaron los siguientes exámenes de ingreso:

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	NOMBRE DEL DEL PROFESIONAL	LICENCIA	CONTRATISTA
1	ANCIZAR HENAO OSORIO	10238188	AYUDANTE	14/01/2025	ERGOMEDIC	JAVIER VILLAMIZAR	8967	BRENDA CÁCERES

3. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	DÍAS PERDIDOS
UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943 ARBOLEDAS, GRAMALOTE, PATIOS	0

4. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

La UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- se continua con actividades de mejoramiento y trabajos con maquinaria, se continua con actividades constructivas, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

5. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de octubre de 2024 se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

ARBOLEDAS	PATIOS
	

Fotografía 31 Entrega de EPP – Gobernación 1943

6. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.



Fotografía 32 Maquinarias y Equipos Gobernación 1943

7. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Arboledas



Los Patios

Fotografía 33 Equipos de Emergencia Gobernación 1943

8. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2025.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UT EDIVIAL – TROJA 2590	0	0	0

9. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero 2025 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MUNICIPIOS	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UT EDIVIAL – TROJA 2590	Arboledas	10	13
	Patios		19

10. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL – TROJA 2590	enero	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.

Para el presente informe el contratista se adjunta registro fotográfico, protocolo COVID y lavado de manos.

	
Arboledas	Los Patios

Fotografía 34 Implementación protocolo de bioseguridad

3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Durante este período, se han llevado a cabo mesas de trabajo con el contratista de la obra con el fin de verificar las obras de drenaje proyectadas para la vereda Corozal – California. Asimismo, se han evaluado actividades no previstas que requieren ejecución. Una vez finalizado este proceso de verificación, se tiene previsto presentar estos apus para su revisión y aprobación

- Suministro e instalación de rejilla metálica para sumidero.
- Remoción de derrumbes.

Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.8.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

Durante el periodo la interventoría emite concepto de algunos estudios y diseños pendientes.

MUNICIPIO	VEREDA	COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑO				
		TOPOGRAFÍA	DISEÑO GEOMÉTRICO	ESTUDIO DE SUELOS	DISEÑO DE PAVIMENTO	DISEÑO HIDRÁULICO
ARBOLEDAS	Santo Domingo	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Volcán	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO
	Potreros	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Chicagua	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Rinconada	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Cinera	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Juan Bueno	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Helechal	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
GRAMALOTE	Boyacá	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	San Isidro	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO

	Santa Anita	APROBADO	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO
LOS PATIOS	Corozal-California	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
TOTALES	**12**	**12**	**10**	**12**	**12**	**8**

Convenciones

49		APROBADO FINAL
2		OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
9		APROBADO CON OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
2		NO HA PRESENTADO

Durante este período, el contratista de la obra ha realizado observaciones sobre la subsanación de los estudios y diseños pendientes de aprobación definitiva. Estas han sido revisadas progresivamente en cada presentación de los componentes, con el fin de garantizar su cumplimiento antes de la aprobación final.

A continuación, se presenta el avance de la subsanación de estudios y diseños pendientes de aprobación definitiva, con base en las observaciones realizadas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACÁ - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACÁ** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL-CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACIÓN RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACÁ** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024-Volcán - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024-Juan Bueno - GIC-INVIAS-NTS-241-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-608-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-609-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-610-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES POTREROS**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-611-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCÁN** - UTET-02590-379 Estudios de geotecnia, diseño y estructural de pavimento para tramo 1 ancho de 7.00 m Vereda Corozal del 05-Oct-2024 - GIC-INVIAS-NTS-1390-24 del 10-Oct-2024 - **APROBACIÓN TRAMO 1 COROZAL** - UTET-02590-395 - 09/11/2024 - Vereda Corozal - GIC-INVIAS-NTS-1534-24 - 15/11/2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-396 del 13/11/2024- CINERA ARBOLEDAS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-397 del 13/11/2024- JUAN BUENO ARBOLEDAS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-398 del 13/11/2024 - SAN ISIDRO GRAMALOTE - Entrega documento con comunicado UTET-02590-399 del 13/11/2024 - SANTA ANITA GRAMALOTE - Entrega documento con comunicado UTET-02590-400 del 13/11/2024 - POTREROS ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-1538-24 - 18/11/2024 - CINERA ARBOLEDAS - **APROBACIÓN** - GIC-INVIAS-NTS-1539-24 del 18/11/2024 - JUAN BUENO ARBOLEDAS - **APROBACIÓN** - GIC-INVIAS-NTS-1540-24 - 18/11/2024 - SAN ISIDRO GRAMALOTE - **APROBACIÓN** - GIC-INVIAS-NTS-1541-24 - 18/11/2024 - SANTA ANITA GRAMALOTE - **APROBACIÓN** - GIC-INVIAS-NTS-1542-24 - 18/11/2024 - POTREROS ARBOLEDAS – **APROBACIÓN** - UTET-02590-415 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1690-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – **APROBACIÓN** - UTET-02590-416 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1691-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – **APROBACIÓN** - UTET-02590-417 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1692-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – **APROBACIÓN** - UTET-02590-420 del 10/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1693-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – **APROBACIÓN** - UTET-02590-421 - 12/12/2024 - COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1534-24 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS VEREDA VOLCÁN MUNICIPIO DE ARBOLEDA - UTET-02590-422 - 12/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1694-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – **APROBACIÓN** - UTET-02590-424 - 14/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1695-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - **APROBACIÓN**
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFÍA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - OBSERVADO SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-755-22 del 05-Jul-2023 - **OBSERVADO CHICAGUA ALTO Y BAJO** - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con CORREO del 10-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-795-22 del 17-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - OBSERVACIONES EN LLAMADA DEL 24-07-2023 - VEREDA SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-040 del 24-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-828-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-041 del 26-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-042 del 26-Jul-2023 - municipio de los Patios. - GIC-INVIAS-NTS-834-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACÁ del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-854-22 del 03-Ago-2023 - OBSERVACIONES SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-860-22 del 04-Ago-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-058 del 08-Ago-2023 - municipio de LOS PATIOS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-057 del 08-Ago-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-052 del 04-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-871-22 del 09-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-063 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-062 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-061 del 11-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-909-22 del 15-Ago-2023 - APROBADO - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-067 del 16-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFÍA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-069 del 16-Ago-2023 - la vereda de VOLCÁN del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-927-22 del 17-Ago-2023 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-935-22 del 18-Ago-2023 - APROBADO LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-074 del 18-Ago-2023 - la vereda de BOYACÁ del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-938-22 del 22-Ago-2023 - APROBADO SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-941-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-942-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-092 del 25-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-093 del 25-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-094 del 25-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-957-22 del 29-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-968-22 del 30-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES BOYACÁ** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-098 del 30-Ago-2023 - VEREDA HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-099 del 30-Ago-2023 - VEREDA VOLCÁN del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-0100 del 30-Ago-2023 - la vereda de BOYACÁ del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-977-22 del 31-Ago-23 - **APROBADO VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-1021-22 del 08-Sep-2023 - **APROBACIÓN CHICAGUA (500 M)** - GIC-INVIAS-NTS-1024-22 del 08-Sep-2023 - **APROBACIÓN RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-1025-22 del 08-Sep-2023 - **APROBACIÓN POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1026-22 del 08-Sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-116 del 13-Sept-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-126 del 25-Sept-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1100-22 del 25-Sep-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1119-22 del 29-Sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-152 del 10-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-132 del 05-Oct-2023 - TRAMO ADICIONAL 2 Y 3 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1150-22 del 10-Oct-2023 - **APROBADO BOYACÁ** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-154 del 10-Oct-2023 - JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-1193-22 del 13-Oct-2023 - **APROBADO CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1204-22 del 18-Oct-2023 - **APROBADO JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1203-22 del 18-Oct-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO TRAMOS ADICIONALES** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-172 del 20-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-173 del 20-Oct-2023 - RAMO ADICIONAL 2 Y 3 SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1240-22 del 30-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1293-22 del 02-Nov-23 - **APROBACIÓN TRAMO 2 Y 3 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-217 del 06-Dic-2023 HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1540-22 del 12-Dic-23 – **APROBADO HELECHAR**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- UTET-02590-425 14/12/2024 COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1268-24 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - UTET-02590-426 14/12/2024 COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1279-24 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA VEREDA VOLCÁN TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-013 del 15-May-2023 - Vía de la vereda de Santo Domingo del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-567-22 del 23-May-2023 – **OBSERVADO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-014 del 23-May-2023 - Vía de la Helechar del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-015 del 01-Jun-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - **OBSERVADO SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - MESA DE TRABAJO 17-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-802-22 del 17-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 1 - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-822-22 del 25-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 2 al 12 - LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-843-22 del 31-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES SANTA ANITA – GRAMALOTE** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACÁ del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-053 del 04-Ago-2023 - Vía de la HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-051 del 04-Ago-2023 - vereda SANTA ANITA Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-056 del 08-Ago-2023 - la vereda de BOYACÁ del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-892-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-065 del 16-Ago-2023 - la vereda de BOYACÁ del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-068 del 16-Ago-2023 - LOS PATIOS T1 A T5.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-926-22 del 17-Ago-2023 - APROBADO T1 Y T1-A Y APROBADO CON OBSERVACIONES T2 SANTA ANITA – GRAMALOTE - GIC-INVIAS-NTS-932-22 del 18-Ago-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-087 del 24-Ago-2023 - LOS PATIOS T6 AL 12 - GIC-INVIAS-NTS-956-22 del 29-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACÁ - GIC-INVIAS-NTS-1019-22 del 07-Sep-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-115 del 12-Sept-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1037-22 del 07-Sep-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-123 del 18-Sept-2023 - BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-124 del 25-Sept-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-125 del 25-Sept-2023 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1104-22 del 25-Sep-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES T1 A T3 Y **OBSERVACIONES T4 - BOYACÁ** - GIC-INVIAS-NTS-1101-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1121-22 del 29-Sep-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-129 del 30-Sept-2023 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1123-22 del 29-Sep-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-133 del 05-Oct-2023 – BOYACÁ - GIC-INVIAS-NTS-1144-22 del 09-Oct-2023 - **APROBACIÓN LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-158 del 11-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-1183-22 del 12-Oct-2023 - **APROBACIÓN BOYACÁ** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-167 del 13-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-168 del 14-Oct-2023 - POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-1195-22 del 17-Oct-2023 - **APROBACIÓN T4 Y OBS T1,2,3 Y 5 VEREDA SAN ISIDRO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-170 del 20-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-171 del 20-Oct-2023 - VOLCÁN - GIC-INVIAS-NTS-1213-22 del 20-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - GIC-INVIAS-NTS-1239-22 del 26-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1285-22 del 31-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VEREDA POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1286-22 del 31-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES T1 Y OBS T2 VEREDA VOLCÁN** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-193 del 02-Nov-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1349-22 del 16-Nov-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-205 del 10-Nov-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1376-22 del 20-Nov-2023 - **APROBACIÓN RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1429-22 del 28-Nov-2023 - **APROBACIÓN CON OBS T1 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-245 del 24-Ene-2024 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-247 del 25-Ene-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-210-24 del 05-Feb-2024 - OBSERVACIONES LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-238-24 del 07-Feb-2024 - REVISIÓN SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-262 del 07-Feb-2024 - LOS PATIOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-353-24 del 28-FEB-20234 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-307 del 15-abril-2024 - CINERA - GIC-INVIAS-NTS-623-24 del 22-abril-2024 - OBSERVACIONES CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-337 del 15-Jul-2024 - JUAN BUENO
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACÁ - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACÁ** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL-CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACIÓN RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACÁ** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1459-22 del 30-Nov-2023 - **APROBADO LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024 – VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-255 del 07-Feb-2024 – POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-256 del 07-Feb-2024 – CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-258 del 07-Feb-2024 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-259 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-240-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-241-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-254 del 07-Feb-2024 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-282-24 del 12-Feb-2024 - APROBADO HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-284-24 del 12-Feb-2024 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-285-24 del 12-Feb-2024 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-286-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-287-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES CINERA - UTET-02590-379 Estudios de geotecnia, diseño y estructural de pavimento para tramo 1 ancho de 7.00 m Vereda Corozal del 05-Oct-2024 - GIC-INVIAS-NTS-1390-24 del 10-Oct-2024 - APROBACIÓN TRAMO 1 COROZAL - UTET-02590-395 - 09/11/2024 - Vereda Corozal - Entrega documento con comunicado UTET-02590-396 del 13/11/2024- CINERA ARBOLEDAS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-397 del 13/11/2024- JUAN BUENO ARBOLEDAS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-398 del 13/11/2024 - SAN ISIDRO GRAMALOTE - Entrega documento con comunicado UTET-02590-399 del 13/11/2024 - SANTA ANITA GRAMALOTE - Entrega documento con comunicado UTET-02590-400 del 13/11/2024 - POTREROS ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-1538-24 - 18/11/2024 - CINERA ARBOLEDAS – APROBACIÓN - GIC-INVIAS-NTS-1539-24 del 18/11/2024 - JUAN BUENO ARBOLEDAS – APROBACIÓN - GIC-INVIAS-NTS-1540-24 - 18/11/2024 - SAN ISIDRO GRAMALOTE - APROBACIÓN - GIC-INVIAS-NTS-1541-24 - 18/11/2024 - SANTA ANITA GRAMALOTE – APROBACIÓN - GIC-INVIAS-NTS-1542-24 - 18/11/2024 - POTREROS ARBOLEDAS – APROBACIÓN - UTET-02590-415 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1690-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – APROBACIÓN - UTET-02590-416 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1691-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – APROBACIÓN - UTET-02590-417 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1692-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – APROBACIÓN - UTET-02590-420 del 10/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1693-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – APROBACIÓN - UTET-02590-421 - 12/12/2024 - COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1534-24 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS VEREDA VOLCÁN MUNICIPIO DE ARBOLEDA - UTET-02590-422 - 12/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1694-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – APROBACIÓN - UTET-02590-424 - 14/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1695-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACIÓN
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documentos con comunicado UTET-02590-118 del 13-Sept-2023 LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1106-22 del 25-Sept-2023 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-130 del 04-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1130-22 del 11/Oct/2023 - **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-306 del 11-Abr-2023 - GIC-INVIAS-NTS-719-24 del 10/Mayo/2024 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-315 del 23-May-2024 - GIC-INVIAS-NTS-839-24 del 29/Mayo/2024 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-324 del 13-Jun-2024 - GIC-INVIAS-NTS-906-24 del 14/Jun/2024 – **APROBACIÓN** - UTET-02590-379 Estructural tramo 1 Corozal - GIC-INVIAS-NTS-1417-24 del 18-Oct-2024 – OBSERVACIONES - UTET-02590-415 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1676-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 11/12/2024 - UTET-02590-416 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1677-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 11/12/2024 - UTET-02590-417 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1678-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 11/12/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- UTET-02590-420 del 10/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1681-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 12/12/2024 - UTET-02590-422 - 12/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1684-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 16/12/2024 - UTET-02590-424 - 14/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1707-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 18/12/2024 - UTET-02590-430 17/12/2024 INFORME DISEÑO ESTRUCTURAL TRAMOS ADICIONALES MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1714-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 19/12/2024 - UTET-02590-436 26/12/2024 COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1714-24 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES INFORME DISEÑO ESTRUCTURAL (GAVIONES)
INFORME HIDRÁULICO	- ENTREGA SOLICITUD CAMBIO TUB 36" ALCANTARILLAS - GIC-INVIAS-NTS-495-22 del 05-May-2023 - - Entrega documento con comunicado UTET-02590-043 del 26-Jul-2023 - VEREDAS SANTO DOMINGO Y RINCONADA DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-045 del 28-Jul-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO Y BAJO DE MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-887-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Y RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-891-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-080 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-081 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-086 del 23-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-107 del 06-Sep-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1044-22 del 14-Sep-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-127 del 26-Sep-2023 - MUNICIPIO LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1122A-22 del 02-Oct-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1146-22 del 06-Oct-2023 - OBSERVACIONES LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-150 del 06-Oct-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-166 del 13-Oct-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1171-22 del 11-Oct-2023 - APROBACIÓN SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-174 del 20-Oct-2023 -LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1257-22 del 27-Oct-2023 - APROBACIÓN RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-186 del 28-Oct-2023 - BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-195 del 04-Nov-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-196 del 04-Nov-2023 - RINCONADA

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1321-22 del 09-Nov-2023 - APROBACIÓN LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1322-22 del 09-Nov-2023 - APROBACIÓN RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1323-22 del 09-Nov-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-200 del 11-Nov-2023 – HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-208 del 20-Nov-2023 - CHICAGUA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-209 del 20-Nov-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-213 del 24-Nov-2023 – BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-214 del 24-Nov-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1397-22 del 22-Nov-2023 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-222 del 11-Dic-2023 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1570-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1571-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN BOYACÁ - GIC-INVIAS-NTS-1572-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1573-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCÁN - GIC-INVIAS-NTS-104-22 del 17-Ene-2024 - APROBACIÓN HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-118-24 del 18-Ene-2024 - APROBACIÓN VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-244 del 24-Ene-2024 - CONCEPTO ALCANTARILLA EXISTENTE LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-260 del 07-Feb-2024 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-261 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-288-24 del 13-Feb-2024 - APROBACIÓN POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-333-24 del 22-Feb-2024 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-273 del 22-Feb-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-371-24 del 01-Mar-2024 - OBSERVACIONES ALCANTARILLAS LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-383-24 del 05-Mar-2024 - APROBACIÓN SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-384-24 del 05-Mar-2024 - APROBACIÓN SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-286 del 07-Mar-2024 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-512-24 del 02-Abr-2024 APROBACIÓN CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-314 del 23-May-2024 - CINERA - GIC-INVIAS-NTS-991-24 del 28-Jun-2024 - OBSERVACIONES - Entrega documento con comunicado UTET-02590-338 del 18-Jul-2024 - JUAN BUENO - Diseño hidráulico vereda Cinera, municipio de Arboledas. GIC-INVIAS-NTS-1326-24 – 17/09/2024 – APROBACIÓN - UTET-02590-381 -18-10-2024 - DISEÑO HIDRÁULICO DESCOLES TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS - UTET-02590-385 - 28/10/2024 - DISEÑO HIDRÁULICO DESCOLES TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1458-24 - 29/10/2024 – OBSERVACIONES - UTET-02590-401 - 13/11/2024 - DISEÑO HIDRÁULICO DESCOLES TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1535-24 - 15/11/2024 – APROBACIÓN - UTET-02590-431 18/12/2024 AJUSTE DISEÑO HIDRÁULICO DESCOLE PR0+630 TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- UTET-02590-432 19/12/2024 COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1649-24 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CONCEPTO GENERAL CAMBIO OBRAS TRANSVERSALES.

Tabla 37 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943

3.8.2.2. Etapa de Construcción

El contrato a la fecha tiene un avance del 81,70% en la ejecución del proyecto de acuerdo al semanal No 87, evidenciando progresos en los diferentes frentes de trabajo ubicados en los municipios de Arboledas y Los patios. Dentro de estos avances, se resalta la ejecución de obras de drenaje, específicamente la construcción e instalación de alcantarillas proyectadas en cada uno de los frentes, lo que contribuye al adecuado manejo de aguas y la estabilidad de la infraestructura.

La interventoría ha reiterado al contratista la importancia de cumplir con los plazos establecidos, asegurando que las actividades programadas se desarrollen conforme al cronograma previsto. Esto cobra especial relevancia dado que la fecha de finalización del contrato está estipulada para el 28 de febrero de 2024, por lo que se ha enfatizado la necesidad de optimizar los recursos y tiempos para garantizar la entrega del proyecto en la fecha acordada.

Finalmente, se presentan las cantidades de placa huella completadas como parte del seguimiento al progreso del proyecto, considerando la actualización de alcances establecida en el Acta de Modificación No. 4. Esta información permitirá evaluar el nivel de avance y cumplimiento de los objetivos establecidos en el cronograma de obra.

MUNICIPIO	ALCANCE PROYECTO NUEVO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ARBOLEDAS	7055	VEREDA SANTA DOMINGO	1595	6568	487
		VEREDA RINCONADA	467		
		VEREDA HELECHAR	540		
		VEREDA VOLCÁN	762		
		VEREDA CHICAGUA BAJO	732		
		VEREDA JUAN BUENO	834		
		VEREDA CINERA	1038		
		VEREDA POTREROS	600		
GRAMALOTE	2905,2	VEREDA BOYACÁ	1288,8	2905,2	0

		VEREDA SAN ISIDRO	1022,20		
		VEREDA SANTA ANITA	457		
LOS PATIOS	4554	COROZAL - CALIFORNIA	3784,4	3784,4	769,6
TOTAL	14514,20		**TOTAL**	13257,6	1256,6

Tabla 38 Cantidades de placa huella ejecutada a la fecha – Gobernación 1943

Observación: Cabe aclarar que, considerando el valor directo destinado al Municipio de Gramalote, a la fecha se ha logrado un mayor alcance construido. Por ello, esta información será actualizada en el Acta de Modificación No. 5 una vez esté en firme y posteriormente verificada en la próxima actualización de los alcances definitivos.

3.6. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

1. Realizar mesas de trabajo con los especialistas del Contratista con el fin de no generar más de 1 versión en la elaboración y revisión de estudios y diseños.
2. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.
3. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.
4. Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.
5. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.
6. Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943

Con corte al 31 de enero de 2025, el estado de avance ejecutado equivalente en pesos a $ 19.986.564.986,01 vs un programado equivalente en pesos a $ 19.594.547.845,81

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE LA VEREDA CALIFORNIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					$ 6.137.172.960,71
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 26.251,00	7525,60	$ 197.554.525,60
1.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 807.348,00	2696,78	$ 2.177.239.939,44
1.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.279,00	122844,62	$ 1.139.875.228,98
1.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	$ 170.537,00	6930,26	$ 1.181.865.749,62
1.5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G) - CICLÓPEO	M3	$ 423.017,00	1027,22	$ 434.531.522,74
1.6	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	$ 697.707,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
2.1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	$ 302.839,00	0,00	$ -
3.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 26.251,00	805,15	$ 21.135.992,65
3.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 807.348,00	172,77	$ 139.485.513,96
3.3	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (F)	M3	$ 573.756,00	14,50	$ 8.319.462,00
3.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 36.448,00	281,33	$ 10.253.915,84
3.5	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	$ 915.776,00	0,00	$ -
3.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.279,00	13168,11	$ 122.186.892,69

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
4.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 2.050,00	97757,14	$ 200.402.137,00
5.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	$ 729.960,00	0,00	$ -
6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.445,00	15236,68	$ 22.017.002,60
6.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M2	$ 3.041,00	0,00	$ -
NP1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36”/900 MM	M	$ 1.530.542	32,00	$ 48.977.344,00
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	$ 650.789	8,00	$ 5.206.312,00
NP9	GEOTEXTIL TEJIDO 2400 N PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	$ 17.565	22.080,86	$ 387.850.305,90
NP10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	$ 307.133	75,93	$ 23.320.608,69

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
NP11	DEMOLICIÓN DE ROCA	M3	$ 295.305	57,40	$ 16.950.507,00
NP 12	DREN TIPO FRANCES (SECCIÓN 1,0X0,6 M) (LOS PATIOS)	ML	$ 149.477	0,00	$ -
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA SANTO DOMINGO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				$ 1.952.869.142,42
7.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	555,60	$ 37.399.658,40
7.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	975,69	$ 980.293.305,42
7.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	46440,88	$ 435.197.486,48
7.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	$ 357.666,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
7.5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G) - CICLÓPEO	M3	$ 610.918,00	168,36	$ 102.854.154,48
8.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	80,10	$ 5.391.851,40
8.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	14,73	$ 14.799.496,14
8.3	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (F)	M3	$ 797.129,00	1,41	$ 1.123.951,89
8.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 38.182,00	33,25	$ 1.269.551,50
8.5	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	$ 989.156,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
8.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	1164,66	$ 10.914.028,86
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 2.227,00	7243,68	$ 16.131.675,36
10.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	$ 749.983,00	0,00	$ -
11.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.954,00	0,00	$ -
11.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M2	$ 4.424,00	11573,35	$ 51.200.500,40
NP1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	$ 1.530.542,00	11,50	$ 17.601.233,00
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	$ 302.603,00	683,96	$ 206.968.347,88

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
NP5	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	$ 69.619,00	1024,89	$ 71.351.816,91
NP11	DEMOLICIÓN DE ROCA	M3	$ 295.305,00	1,26	$ 372.084,30
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA VOLCÁN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				$ 1.095.909.372,84
12.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	778,66	$ 52.414.719,24
12.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	454,94	$ 457.086.406,92
12.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	21916,36	$ 205.378.209,56
12.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	$ 357.666,00	112,75	$ 40.326.841,50
12.5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G) - CICLÓPEO	M3	$ 610.918,00	97,55	$ 59.595.050,90

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
13.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	303,43	$ 20.425.087,02
13.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	36,56	$ 36.732.490,08
13.3	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (F)	M3	$ 797.129,00	4,42	$ 3.523.310,18
13.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 38.182,00	156,85	$ 5.988.846,70
13.5	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	$ 989.156,00	0,00	$ -
13.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	2954,33	$ 27.685.026,43

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
14.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 2.227,00	10379,69	$ 23.115.569,63
15.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	$ 749.983,00	0,00	$ -
16.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.954,00	0,00	$ -
16.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M2	$ 4.424,00	10767,35	$ 47.634.756,40
NP1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36”/900 MM	M	$ 1.530.542,00	48,00	$ 73.466.016,00
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	$ 650.789,00	0,00	$ -
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	$ 302.603,00	119,96	$ 36.300.255,88

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
NP6	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL (INCLUYE SUMINISTRO DE CAL)	M2	$ 26.893,00	0,00	$ -
NP7	PEDRAPLÉN COMPACTO (ARBOLEDAS)	M3	$ 358.436,00	17,40	$ 6.236.786,40
NP 12	DREN TIPO FRANCES (SECCIÓN 1,0X0,6M) (ARBOLEDAS)	ML	$ 222.293,00	100,00	$ 22.229.300,00
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA POTREROS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				$ 1.106.016.897,51
17.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	723,73	$ 48.717.161,22
17.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	351,52	$ 353.178.471,36
17.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	17050,18	$ 159.777.236,78
17.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	$ 357.666,00	467,21	$ 167.105.131,86

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
17.5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G) - CICLÓPEO	M3	$ 610.918,00	162,42	$ 99.225.301,56
18.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	374,37	$ 25.200.342,18
18.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	42,73	$ 42.931.600,14
18.3	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (F)	M3	$ 797.129,00	4,92	$ 3.921.874,68
18.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 38.182,00	167,51	$ 6.395.866,82
18.5		ML	$ 989.156,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR				
18.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	3493,98	$ 32.742.086,58
19.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 2.227,00	10094,39	$ 22.480.206,53
20.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	$ 749.983,00	0,00	$ -
21.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.954,00	0,00	$ -
21.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M2	$ 4.424,00	6145,90	$ 27.189.461,60
NP1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36”/900 MM	M	$ 1.530.542,00	48,60	$ 74.384.341,20

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	$ 302.603,00	140,00	$ 42.364.420,00
NP6	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL (INCLUYE SUMINISTRO DE CAL)	M2	$ 26.893,00	15,00	$ 403.395,00
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA CHICAGUA BAJO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				$ 1.161.804.118,48
22.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	536,03	$ 36.082.323,42
22.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	475,37	$ 477.612.795,66
22.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	22562,82	$ 211.436.186,22

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
22.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	$ 357.666,00	416,52	$ 148.975.042,32
22.5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G) - CICLÓPEO	M3	$ 610.918,00	66,44	$ 40.589.391,92
23.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	281,66	$ 18.959.661,24
23.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	26,02	$ 26.142.762,36
23.3	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (F)	M3	$ 797.129,00	2,46	$ 1.960.937,34
23.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 38.182,00	167,22	$ 6.384.794,04

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
23.5	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	$ 989.156,00	0,00	$ -
23.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	2233,56	$ 20.930.690,76
24.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 2.227,00	6928,35	$ 15.429.435,45
25.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	$ 749.983,00	0,00	$ -
26.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.954,00	0,00	$ -
26.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	$ 4.424,00	6028,72	$ 26.671.057,28

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
NP1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	$ 1.530.542,00	49,50	$ 75.761.829,00
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	$ 650.789,00	3,00	$ 1.952.367,00
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	$ 302.603,00	170,69	$ 51.651.306,07
NP6	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL (INCLUYE SUMINISTRO DE CAL)	M2	$ 26.893,00	5,00	$ 134.465,00
NP7	PEDRAPLÉN COMPACTO (ARBOLEDAS)	M3	$ 358.436,00	3,15	$ 1.129.073,40
NP10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	$ 307.133,00	0,00	$ -
NP11	DEMOLICIÓN DE ROCA	M3		22,79	$ -
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA LA RINCONADA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				$ 639.732.384,29
27.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	161,93	$ 10.900.156,02
27.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	281,67	$ 282.998.919,06

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
27.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	13522,25	$ 126.717.004,75
27.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	$ 357.666,00	0,00	$ -
27.5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G) - CICLÓPEO	M3	$ 610.918,00	93,93	$ 57.383.527,74
28.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	48,55	$ 3.268.094,70
28.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	14,93	$ 15.000.439,74
28.3	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (F)	M3	$ 797.129,00	1,66	$ 1.323.234,14

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
28.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 38.182,00	55,95	$ 2.136.282,90
28.5	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	$ 989.156,00	0,00	$ -
28.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	1097,36	$ 10.283.360,56
29.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 2.227,00	1740,12	$ 3.875.247,24
30.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	$ 749.983,00	0,00	$ -
31.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.954,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
31.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M2	$ 4.424,00	13360,95	$ 59.108.842,80
NP1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	$ 1.530.542,00	11,90	$ 18.213.449,80
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	$ 650.789,00	1,00	$ 650.789,00
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	$ 302.603,00	156,57	$ 47.378.551,71
NP10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	$ 307.133,00	1,61	$ 494.484,13
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA CINERA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				$ 1.430.521.043,77
32.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	777,69	$ 52.349.424,66

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
32.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	716,17	$ 719.548.890,06
32.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	32623,08	$ 305.710.882,68
32.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	$ 357.666,00	0,00	$ -
32.5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G) - CICLÓPEO	M3	$ 610.918,00	170,24	$ 104.002.680,32
33.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	177,25	$ 11.931.406,50
33.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	27,39	$ 27.519.226,02

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
33.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	$ 797.129,00	2,58	$ 2.056.592,82
33.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 38.182,00	112,42	$ 4.292.420,44
33.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	$ 989.156,00	0,00	$ -
33.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	2329,32	$ 21.828.057,72
34.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 2.227,00	9126,54	$ 20.324.804,58
35.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	$ 749.983,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
36.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.954,00	0,00	$ -
36.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M2	$ 4.424,00	4300,00	$ 19.023.200,00
NP1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	$ 1.530.542,00	30,80	$ 47.140.693,60
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	$ 650.789,00	3,00	$ 1.952.367,00
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	$ 302.603,00	125,00	$ 37.825.375,00
NP 5	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	$ 69.619,00	790,23	$ 55.015.022,37
NP12	DREN TIPO FRANCES (SECCIÓN 1,0X0,6M) (ARBOLEDAS)	ML	$ 222.293,00	85,00	$ 18.894.905,00
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA EL HELECHAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				$ 754.481.852,60
37.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	540,450	$ 36.379.851,30

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
37.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	332,940	$ 334.510.810,92
37.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	16075,690	$ 150.645.290,99
37.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	$ 357.666,00	0,000	$ -
37.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	$ 610.918,00	91,950	$ 56.173.910,10
38.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	70,750	$ 4.762.465,50
38.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	0,000	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
38.3	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (F)	M3	$ 797.129,00	0,000	$ -
38.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 38.182,00	34,520	$ 1.318.042,64
38.5	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	$ 989.156,00	0,000	$ -
38.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	0,000	$ -
39.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 2.227,00	4952,080	$ 11.028.282,16
40.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	$ 749.983,00	0,000	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
41.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.954,00	0,000	$ -
41.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M2	$ 4.424,00	10218,380	$ 45.206.113,12
NP1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36”/900 MM	M	$ 1.530.542,00	17,00	$ 26.019.214,00
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	$ 650.789,00	6,00	$ 3.904.734,00
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	$ 302.603,00	200,27	$ 60.602.302,81
NP 5	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	$ 69.619,00	343,74	$ 23.930.835,06
NP 10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	$ 307.133,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA JUAN BUENO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				$ 1.235.650.912,19
42.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	1219,80	$ 82.109.617,20
42.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	558,18	$ 560.813.493,24
42.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	26428,20	$ 247.658.662,20
42.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	$ 357.666,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
42.5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G) - CICLÓPEO	M3	$ 610.918,00	60,84	$ 37.168.251,12
43.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 67.314,00	262,38	$ 17.661.847,32
43.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 1.004.718,00	41,30	$ 41.494.853,40
43.3	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (F)	M3	$ 797.129,00	4,92	$ 3.921.874,68
43.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 38.182,00	131,59	$ 5.024.369,38
43.5	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	$ 989.156,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
43.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.371,00	3493,98	$ 32.742.086,58
44.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 2.227,00	15745,13	$ 35.064.404,51
45.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	$ 749.983,00	0,00	$ -
46.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.954,00	0,00	$ -
46.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M2	$ 4.424,00	8998,80	$ 39.810.691,20
NP1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	$ 1.530.542,00	34,30	$ 52.497.590,60
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	$ 302.603,00	133,14	$ 40.288.563,42

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
NP 5	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	$ 69.619,00	565,86	$ 39.394.607,34
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMO DE VEREDA BOYACA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				$ 1.783.366.925,42
47.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 50.209,00	1269,89	$ 63.759.907,01
47.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 858.595,00	800,21	$ 687.056.304,95
47.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.276,00	38067,53	$ 353.114.408,28
47.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	$ 213.373,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
47.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	$ 473.617,00	385,40	$ 182.531.991,80
48.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 50.209,00	530,61	$ 26.641.397,49
48.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 858.595,00	53,85	$ 46.235.340,75
48.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	$ 636.830,00	7,99	$ 5.088.271,70
48.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 38.182,00	216,04	$ 8.248.839,28
48.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	$ 962.935,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
48.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.276,00	6198,97	$ 57.501.645,72
49.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 2.227,00	17780,32	$ 39.596.772,64
50.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	$ 743.614,00	0,00	$ -
51.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.954,00	0,00	$ -
51.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M2	$ 4.424,00	19237,00	$ 85.104.488,00
NP1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	$ 1.530.542,00	78,00	$ 119.382.276,00
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	$ 650.789,00	3,00	$ 1.952.367,00

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
NP4	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (GRAMALOTE)	M3	$ 184.614,00	92,76	$ 17.124.794,64
NP 5	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	$ 69.619,00	1041,78	$ 72.527.681,82
NP 10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	$ 307.133,00	56,98	$ 17.500.438,34
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMO DE VEREDA SAN ISIDRO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				$ 1.402.269.210,62
52.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 50.209,00	1553,85	$ 78.017.254,65
52.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 858.595,00	592,33	$ 508.571.576,35
52.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.276,00	27809,81	$ 257.963.797,56
52.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	$ 213.373,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
52.5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G) - CICLÓPEO	M3	$ 473.617,00	258,35	$ 122.358.951,95
53.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 50.209,00	391,22	$ 19.642.764,98
53.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 858.595,00	76,29	$ 65.502.212,55
53.3	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (F)	M3	$ 636.830,00	7,31	$ 4.655.227,30
53.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 38.182,00	175,88	$ 6.715.450,16
53.5		ML	$ 962.935,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR				
53.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.276,00	6568,62	$ 60.930.519,12
54.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 2.227,00	22512,83	$ 50.136.072,41
55.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	$ 743.614,00	0,00	$ -
56.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.954,00	0,00	$ -
56.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M2	$ 4.424,00	15573,65	$ 68.897.827,60
NP1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36”/900 MM	M	$ 1.530.542,00	53,50	$ 81.883.997,00

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
NP4	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (GRAMALOTE)	M3	$ 184.614,00	107,30	$ 19.809.082,20
NP 5	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	$ 69.619,00	766,82	$ 53.385.241,58
NP 8	PEDRAPLÉN COMPACTO (GRAMALOTE)	M3	$ 260.269,00	0,00	$ -
NP 10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	$ 307.133,00	12,37	$ 3.799.235,21
NP13	DREN TIPO FRANCES (SECCIÓN 1,0X0,6M) (GRAMALOTE)	ML	$ 180.222,00	126,00	$ 22.707.972,00
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA SANTA ANITA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				**$ 716.180.232,89**
57.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 50.209,00	426,46	$ 21.412.130,14
57.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 858.595,00	305,02	$ 261.888.646,90
57.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.276,00	14.893,91	$ 138.155.909,16

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
57.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	$ 213.373,00	401,55	$ 85.679.928,15
57.5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G) - CICLÓPEO	M3	$ 473.617,00	149,05	$ 70.592.613,85
58.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 50.209,00	0,00	$ -
58.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	$ 858.595,00	0,00	$ -
58.3	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (F)	M3	$ 636.830,00	0,00	$ -
58.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 38.182,00	0,00	$ -

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
58.5	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	$ 962.935,00	0,00	$ -
58.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 9.276,00	0,00	$ -
59.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 2.227,00	5.130,56	$ 11.425.757,12
60.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	$ 743.614,00	0,00	$ -
61.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.954,00	0,00	$ -
61.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M2	$ 4.424,00	9.536,01	$ 42.187.308,24

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
NP1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	$ 1.530.542,00	0,00	$ -
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	$ 650.789,00	5,00	$ 3.253.945,00
NP4	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (GRAMALOTE)	M3	$ 184.614,00	19,23	$ 3.550.127,22
NP6	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL (INCLUYE SUMINISTRO DE CAL)	M2	$ 26.893,00	2.677,00	$ 71.992.561,00
NP 8	PEDRAPLÉN COMPACTO (GRAMALOTE)	M3	$ 260.269,00	0,00	$ -
NP 10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	$ 307.133,00	19,67	$ 6.041.306,11
	COSTO TOTAL PROYECTO:				**$ 19.415.975.054**

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02332 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 5.159.028.732,00 M/CTE
Fecha de inicio:	11 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	03 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	05 meses hasta el 30 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de agosto de 2024

Tabla 39 Condiciones del contrato - Gobernación 2052

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ejecuto el 100% el proyecto, se encuentra en proceso de liquidación el contrato de obra.

3.9.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas se detallan los documentos de pre construcción presentados por el contratista de obra al finalizar el contrato:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09-Jun-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-895-22 14-Ago-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-726-22 del 27-Jun-23
Programa de Obra	Aprobado	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024
Flujo de Caja	Aprobado	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-688-22 del 14-Jun-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-728-22- 27-Jun-23 Aprobado Vibro compactador
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	PHM2022-064-2024 del 25-Abr-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-741-22- 29-Jun-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-764-22- 07-Jul-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-084-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-983-22- 04-Sep-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-700-22- 20-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-739-22- 29-Jun-23

Tabla 40 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052

3.9.1.2. Actividades Técnicas

La obra se ejecutó al 100% de su programación, encontrándose en proceso de liquidación, la interventoría y el contratista de obra se encuentran gestionando la documentación pertinente.

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas por el contratista de obra:

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO AL 30-AGOSTO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						CANTIDAD	VALOR TOTAL
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	4,441.83	46,761.00	$ 207,704,413.00	3,438.00	$ 160,764,318.00
630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	3,809.85	673,567.00	$ 2,566,186,507.00	2,902.50	$ 1,955,028,217.50
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	233,288.76	8,013.00	$ 1,869,342,834.00	186,218.19	$ 1,492,166,356.47
320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	7,982.49	123,502.00	$ 985,853,109.00	6390.62	$ 789,254,351.24
630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	825.58	332,272.00	$ 274,318,530.00	720.78	$ 239,495,012.16
				SUB TOTAL	**$ 5,903,405,393.00**	**$**	**4,636,708,255.37**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,478.13	46,761.00	$ 69,118,603.00	893.00	$ 41,757,573.00
630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	216.00	673,567.00	$ 145,490,472.00	171.90	$ 115,786,167.30
630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	21.75	456,117.00	$ 9,920,545.00	27.80	$ 12,680,052.60
	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	364.00	32,313.00	$ 11,761,932.00	345.70	$ 11,170,604.10
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	175.00	764,951.00	$ 133,866,425.00	129.00	$ 98,678,679.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14,472.50	8,013.00	$ 115,968,143.00	12,589.20	$ 100,877,259.60
				SUB TOTAL	**$ 486,126,120.00**	**$**	**380,950,335.60**
TRANSPORTES							
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,396.00	$ 12,089,360.00	0	$ -
				SUB TOTAL	**12,089,360.00**	**$**	**-**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	592,435.00	$ 4,147,045.00	-	$ -
				SUB TOTAL	**4,147,045.00**	**$**	**-**
PERFILADO Y CUNETEO							
700.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	33,444.82	1,427.00	$ 47,725,758.00	33,444.82	$ 47,725,758.14
				SUB TOTAL	**47,725,758.00**	**$**	**47,725,758.14**
CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES							
681.1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBRIMIENTO EN ZINC	M3	60.00	226,932.00	$ 13,615,920.00	40.98	9,299,673.36
				SUB TOTAL	**13,615,920.00**	**$**	**9,299,673.36**
					VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA=		**5,074,684,022.47**

Tabla 41 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052

3.9.1.3. Actividades ambientales

El presente contrato se encuentra en etapa de liquidación.

3.9.1.4. Actividades Sociales

El presente contrato de obra, se encuentra en proceso de liquidación.

3.9.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos

No se presentaron ITEMs no previstos.

3.9.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describen a continuación:

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 **- APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHM2022 – 009 – 2022 del 08-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-659-22- 09-Jun-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con documento PHM2022-013-2022 el 20-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-723-22- 27-Jun-23 – OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-1584-24 25/11/2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con documento PHM2022-020-2022 el 27-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-776-22- 11-Jul-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-026 y 27-2022 el 01-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-893-22- 14-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-035-2022 el 07-Sept-2023 - Hace entrega con documento PHM2022-036-2022 el 07-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1030-22- 11-Sept-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-642-22- 08-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-029-2022 el 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-906-22- 15-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-037-2022 el 12-SEPT-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1062-22- 15-Sept-23 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-1458-22- 30-Nov-23 – APROBADO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-646-22- 09-Jun-23 – APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con documento PHM-039-2022 el 01-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1145-22- 06-10-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-043-2022 el 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1329-22- 09-Nov-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

3.9.3.2. Etapa de Construcción

A continuación, se presenta un resumen detallado del total de metros de placa huella que se ejecutaron en el contrato de obra:

TRAMO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	TOTAL
TRAMO No1	238,60	0	238,60
TRAMO No2	1411	0	1411
TRAMO 3A	518,3	0	518,3
TRAMO 3B	790,2	0	790,2
TRAMO 4	701,2	0	701,2
TRAMO 5	344,8	0	344,8
TOTAL	4004	0	4004

Tabla 42 Cantidades realizadas en el periodo

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

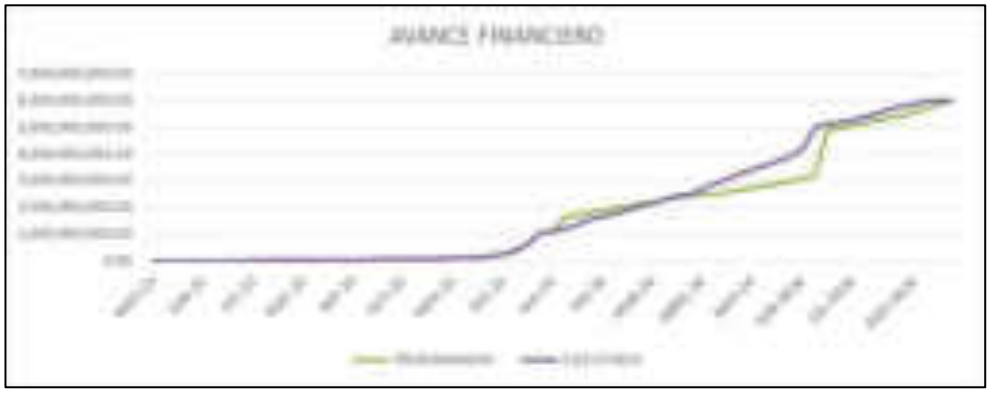


Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.4352407
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.499.989.139,00 M/CTE
Fecha de inicio:	02 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	01 de septiembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	3.50 meses hasta el 17 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	01 mes hasta el 17 de enero de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 17 de marzo de 2024
Fecha Terminación Prorroga 4:	01 mes hasta el 17 de abril de 2024
Fecha Terminación Prorroga 5:	1.5 meses hasta el 01 de junio de 2024
Fecha Terminación Prorroga 6:	1.5 meses hasta el 24 de agosto de 2024
Fecha Suspensión No. 1:	27/05/2024
Fecha Prorroga No. 1 Suspensión 1:	17/06/2024
Fecha Reinicio No. 1:	05/07/2024
Fecha de terminación Final:	24/08/2024

Tabla 43 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contrato se encuentra en proceso de liquidación y se detallan las actividades desarrolladas durante la ejecución del Proyecto.

3.10.1.1. Actividades Administrativa

Dentro de las actividades administrativas el contratista presentó los documentos de pre construcción y a continuación se relaciona su estado al finalizar el contrato de obra:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23-May-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-675-22 del 13-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-961-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1322-24 del 17-Sept-24
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-560-22 del 23-May-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Hace entrega con comunicado GBE-002-2022 del 24-Mar-2023
Instalaciones Provisionales		No ha presentado
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-768-22 del 07-Jul-23
Instalación de valla		Interventoría envía instructivo 2023 al Contratista el 03-05-2023 Contratista realizo entrega del arte al INVIAS EL 10-May-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-141-24 del 23-Ene-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-896-22 del 04-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-463-22 del 20-Abr-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-767-22 del 07-Jun-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-705-22 del 22-Jun-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-656-22 del 13-Jun-23

Tabla 44 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814

3.10.1.2. Actividades Técnicas

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 24 de diciembre de 2024.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.							
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						EJECUTADO A 22-AGOSTO-2024	
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	384.00	$ 40,038.00	$ 15,374,592.00	4,776.65	$ 191,247,512.70
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	1,474.00	$ 652,033.00	$ 961,096,642.00	1,179.38	$ 768,994,679.54
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	74,561.00	$ 7,513.00	$ 560,176,793.00	102,295.80	$ 768,548,345.40
4	Sub - Base Granular clase C	m3	2,027.00	$ 147,033.00	$ 298,035,891.00	2,668.08	$ 392,295,806.64
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	605.00	$ 340,636.00	$ 206,084,780.00	392.06	$ 133,549,750.16
6	Sello de Juntas	m	17,128.00	$ 13,727.00	$ 235,116,056.00	14,196.82	$ 194,879,748.14
SUB TOTAL					$ 2,275,884,754.00	$	2,449,515,842.58
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (10) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	440.00	$ 40,038.00	$ 17,616,720.00	227.43	$ 9,105,842.34
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	78.00	$ 652,033.00	$ 50,858,574.00	95.37	$ 62,184,387.21
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	106.70	$ 32,986.00	$ 3,519,606.00	93.15	$ 3,072,645.90
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro	m	70.00	$ 764,092.00	$ 53,486,440.00	55.00	$ 42,025,060.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	8.00	$ 458,877.00	$ 3,671,016.00	33.13	$ 15,202,595.01
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,789.00	$ 7,513.00	$ 43,492,757.00	3,986.91	$ 29,953,654.83
SUB TOTAL					$ 172,645,113.00	$	161,544,185.29
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (2) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	36.00	$ 40,038.00	$ 1,441,368.00		$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CL	m3	52.00	$ 256,795.00	$ 13,353,340.00		$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	12.00	$ 458,877.00	$ 5,506,524.00		$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	12.00	$ 32,986.00	$ 395,832.00		$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m4	7.20	$ 101,941.00	$ 733,975.00		$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m	52.80	$ 9,261.00	$ 488,981.00		$ -
SUB TOTAL					$ 21,920,020.00	$	-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
19	Postes de referencia	und	8.00	$ 349,502.00	$ 2,796,016.00	8.00	$ 2,796,016.00
220.1	TERRAPLENES	m3	522.80	129177		522.50	$ 67,494,982.50
SUB TOTAL							
TOTAL						$	2,681,351,026.37

Tabla 45 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814

3.10.1.3. Actividades ambientales

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 24 de diciembre de 2024

3.10.1.4. Actividades Sociales

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 24 de diciembre de 2024

3.10.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 24 de diciembre de 2024

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 24 de diciembre de 2024

3.10.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describen a continuación.

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El contratista realizó la entrega de los componentes de estudios y diseños del corredor de Buenavista Municipio de Ocaña, donde se han emitido su aprobación y/u observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- Hace entrega con comunicado GBE-015-2022 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-641-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado GBE-058-2022 del 08-Sep-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13-Sept-23 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado GBE-059-2022 del 11-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1154-22 del 10-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1283-22 del 31-Oct-23 - APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- GIC-INVIAS-NTS-879-22 del 09-Ago-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-046-2022 del 23-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1161-22 del 10-Oct-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-510-24 del 02-Abr-24 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-650-24 del 26-Abr-24 – **OBSERVACIONES** - GBE-238-2022 - 16/12/2024 - ENTREGA OBS GRADA DISIPADORA - GIC-INVIAS-NTS-1712-24 del 19/12/2024 – **APROBADO** - GBE-239-2022 - 18/12/2024 - ENTREGA OBS DIS ESTRUCTURAL ALCANTARILLA
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado GBE-021-2022 del 22-Jun-2023 T1, 4, 5, 7 Y 9 - GIC-INVIAS-NTS-747-22 del 16-Jun-23 - **APROBADO**

Tabla 46 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814

3.10.3.2. Etapa de Construcción

Se finalizo con la actividad de construcción de la placa huella.

MUNICIPIO	ALCANCE INICIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
OCAÑA	1550	BUENAVISTA	1692	1692	0
OCAÑA	8	BUENAVISTA	8	8	0
TOTAL	1550		**TOTAL**	1692	0

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

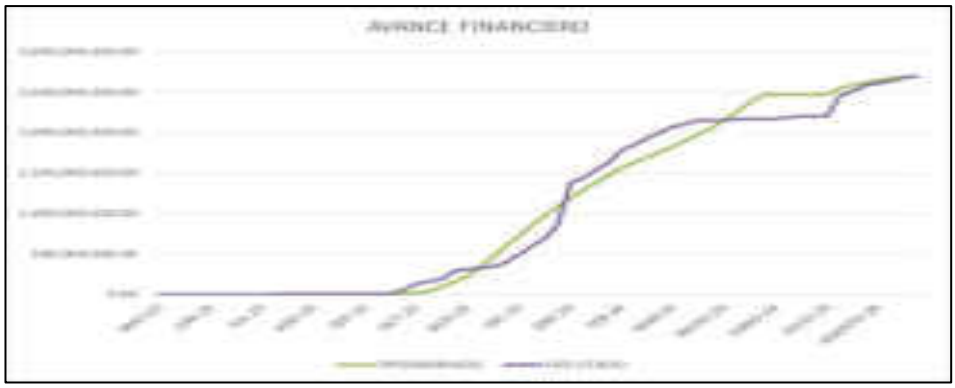


Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814

El contratista de obra ejecuto la totalidad del valor del contrato $2.700.000.000.

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	4164 DE 2022
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
Contratista:	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 octubre de 2021
Valor Inicial:	$ 10.000.000.000,00 M/CTE
Fecha de inicio:	07 de noviembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	07 febrero de 2024
Fecha de terminación Final:	31 diciembre de 2024

Tabla 47 Condiciones del contrato - Gobernación 2033

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.11.1.1. Actividades Administrativas

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	14/06/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-071-2023	05/08/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-049-2024	18/10/2024

Dentro de las actividades administrativas el contratista realizó la entrega de los siguientes documentos. A continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrucción y de estudios, diseños presentados por el Contratista a la fecha.

3.11.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** CD-FC-065-2023-030 el 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-596-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**

Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1577-22 del 19-Dic-2023 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-012 del 07-Feb-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 **- APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-022 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-422-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-020 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con observaciones	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-017 del 13-Feb-2024 - **REVISIÓN** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-021 del 11-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-742-24 del 16-May-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-744-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-309-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-018 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-424-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-023 del 08-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-011 del 03-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 48 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033

3.11.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic – 2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-219-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-039 del 10-Abr– 2024 GIC-INVIAS-NTS-594-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb– 2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 – **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 - GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 – OBSERVADO GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1582-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-010 del 10-Ene-2023 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-032 del 29-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-408-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Aprobado	APROBADO POR EL INVIAS 02/02/2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12-Dic – 2023 - **REVISIÓN** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-033 del 11-Mar– 2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-653-24 del 26-Abr-24 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-732-24 del 14-May-24 – **REVISIÓN AL INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Se envió mediante correo electrónico el 15-agosto-2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1645-22 del 29-Dic-2023 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb– 2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-014 del 15-Ene–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033

3.11.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Sin entregar	
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	El contratista hace entrega con oficio por correo del 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-300-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1579-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Hace entrega con oficio por correo del 03-Ene-24 REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-662-24 del 29-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-748-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-545-24 del 08-Abr-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	El contratista hace entrega de oficio por correo del 26-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033

3.11.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene - 2024 GIC-INVIAS-NTS-166-24 del 25-Ene-2024 – OBSERVACIONES CONTRATISTA hace entrega con N° 020-CD-FC-074-2023 del 12-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-359-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-572-24 del 12-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2 GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2 GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1580-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con N° 021-CD-FC-074-2023 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN CONTRATISTA hace entrega con N° 028-CD-FC-074-2023 del 01-Mar-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-736-24 del 14-May-2024 - **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-737-24 del 14-May-2024 – REVISIÓN AL INVIAS
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-870-24 del 11-Jul-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-311-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con N° 026-CD-FC-074-2023 del 23-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-446-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033

3.11.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-597-24 del 16-Abr-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1581-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio No. 020-2024 el 12-Feb-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Entregado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN
Instalación De Valla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-755-24 del 17-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-756-24 del 17-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-578-24 del 14-Abr-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033

3.11.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023 **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-218-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-029 del 12-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-523-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 20-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-835-24 del 29-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1583-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-007 del 11- Ene- 2024-REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-025 del 01-Maro-2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-024 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISIÓN CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-026 del 11 - Mar – 2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-746-24 del 16-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-747-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-062-023 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISIÓN
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-027 del 07 - Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-017 del 07 - Feb – 2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-05-2024 - **APROBADO**

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033

3.11.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-031 el 13-Mar-2024 (Seguimiento Plan de Calidad) GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-033 el 10-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-595-24 del 17-Abr-2024 – **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-023 el 27-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1584-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-025 el 01-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 REVISIÓN Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-026 el 11-Mar-2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-654-24 del 26-Abr-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-741-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033

3.11.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-006 el 08-Abr-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-592-24 del 17-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1361-24 del 02-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Protocolo De Bioseguridad	N/A	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** **NO APLICA – NO SE CUENTA CON EL RUBRO**
Hojas de vida	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-abril-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Obra	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 **OBSERVADO** Contratista envía oficio OBR-CACH-006 del 02-May-2024 Contratista envía oficio OBR-CACH-024 del 24-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-1418-24 del 21-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Entregado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-013 el 10-Abr-2024 - **OBSERVADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1405 del 15-Oct-2024 - APROBADO
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024
Fuente De Materiales	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** OBR-CACH-019 del 15-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-750-24 del 16-May-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033

3.11.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-448-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-376-24 del 04-Mar-2024 Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-473-24 del 19-Mar-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-564-24 del 09-Abr-2024 – **AVAL RESIDENTE**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 03-May-2024
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 02-May-2024 IC-INVIAS-NTS-987-24 del 03-MAY-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-474-24 del 19-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-565-24 del 09-Abr-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 de 15-May-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista presenta con oficio MATICCES-LOURDES-012-2024 el 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-398-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-563-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-733-24 del 14-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS** GIC-INVIAS-NTS-734-24 del 14-May-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-425-24 del 08-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-566-24 del 19-Abr-2024 – **OBSERVADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 del 15-May-2024 - **APROBADO**

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033

3.11.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-706-24 del 06-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1150-24 del 15-Ago-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 – **SOLICITUD** Se reitera la solicitud de documento PAGA con el oficio GIC-INVIAS-NTS-1150-24 del 15-Oct-2024
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Fuente De Materiales	Observación	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-635-24 del 24-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033

3.11.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-593-24 del 17-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** CCVN-014-2024 - 18/04/2024 - ATIENDE OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1591-24 del 27/11/2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-603-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-655-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-013-2024 el 18-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-721-24 del 10-05-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - OBSERVACIONES El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-020-2024 el 29-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-599-24 del 16-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1148-24 del 13-agosto-2024 – **SOLICITUD** El contratista mediante SSVN-028-2024 – del 05-Sept-2024 Entrega documento PAGA y anexos GIC-INVIAS-NTS-1282-24 del 09-Sept-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1599-24 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABR-2024 - SOLICITUD El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033

3.11.1.1.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	No entregado	
Protocolo De Bioseguridad	No entregado	
Hojas de vida	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-918-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	No entregado	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	No entregado	Contratista envía por correo el 16-05-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1419-24 del 21-Oct-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-860-24 de l07-Jun-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	No entregado	
Diseño de Mezcla	No entregado	

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033

3.11.1.1.13. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-903-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Enviado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio N007-CD-FC-082-2023 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA Contratista presenta por medio de oficio N014-CD-FC-082-2023 el 17/06/2024 – RESIDENTE DE OBRA GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - APROBACIÓN RESIDENTE GIC-INVIAS-NTS-1078-24 del 28-MAY2024 - **APROBACIÓN DIRECTORA**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 Contratista hace entrega por medio de oficio N013-CD-FC-082-2023 el 17-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Instalaciones Provisionales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-917-24 del 18-Jun-2024 - **APROBACIÓN**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1468-24 del 29-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-917-24 del 18-Jun-2024 - **APROBACIÓN**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista entrega por medio de oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-0010 - 18-07-2024
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°015-CD-FC-082-2023 el 18-07-2024

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033

3.11.1.1.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-904-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-002 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1391-24 del 26-Ago-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-916-24 del 28-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1465-24 del 29-Oct-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-Jun-2024 Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-916-24 del 28-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	No entregado	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033

3.11.1.1.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06- CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1064-24 del 17-JUL-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1171-24 DEL 22/08/2024 **APROBACIÓN**
Protocolo De Bioseguridad	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Hojas de vida	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Obra	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 – **APROBACIÓN** Reprogramación No. 1 por prórroga y Modificación de cantidades No.01 - WRGR-CD-FC-058-2023-013 GIC-INVIAS-NTS-1321-24 - 17/09/2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1377-24 del 08-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Instalaciones Provisionales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-
Plan De Manejo De Transito - PMT	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Instalación De Valla	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 Mediante oficio WRGR-CD-FC-058-2023-016 del 30-Sep-2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-1478-24 del 05-nov-2024 - **APROBACIÓN**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Entregado	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 Entrega el contratista por medio WRGR-CD-FC-058-2023-019 del 09-Oct-2024
Fuente De Materiales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Diseño de Mezcla	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033

3.11.1.1.16. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1172-24 DEL 22/08/2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Instalación De Valla		
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Mediante oficio SCCY-071-009 del 22-Oct-2024 se envía documento para su revisión GIC-INVIAS-NTS-1576-24 del 05-nov-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033

3.11.1.1.17. CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1503-24 12/11/2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1532-24 - 15/11/2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1532-24 - 15/11/2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla		GIC-INVIAS-NTS-1457-24 29/10/2024 - SOLICITUD
Plan De Manejo Ambiental - PAGA		GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1532-24 - 15/11/2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033

3.11.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto están:

3.11.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 03 de septiembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 237 metros lineales de placa huella y 15204 m^2 de actividades de mantenimiento periódico en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.2 CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12 de julio de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y dos (02) alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.3 CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12 de septiembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.4 CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 13 de julio de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de mayo, ejecutándose 296 metros lineales de placa huella y tres (03) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.5 CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12 de septiembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 375 metros lineales de placa huella, tres (03) alcantarillas y el mantenimiento periódico de 19948,80 m^2 en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.6 CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 02 de septiembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 157 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.7 CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12 de julio de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y 16224,69 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.8 CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 03 de diciembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 385 metros lineales de placa huella, 01 alcantarilla y 14387.23 m^2 de mantenimiento en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.9 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 03 de diciembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y 14387.23 m^2 de mantenimiento en el corredor vial y una alcantarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.10 CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 13 de diciembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 179.37 metros de placa huella y 13803.10 m^2 de mantenimiento en el corredor vial y una alcantarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.11 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 09 de diciembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de julio, ejecutándose 270 metros lineales de placa huella y 12350.14 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 15 de octubre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de agosto, ejecutándose 296 metros lineales de placa huella, 16699.60 m^2 de mantenimiento y 02 alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 27 de diciembre de 2024

Se ejecutaron 280 metros lineales de placa huella, 13441.69 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial. El contrato entra en proceso de liquidación.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 27 de diciembre de 2024

Se ejecutaron 295 metros lineales de placa huella, 16201.11 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial. El contrato entra en proceso de liquidación.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.14 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 29 de noviembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de octubre, con 390 metros lineales de placa huella, 16964.05 m^2 de mantenimiento periódico y 03 alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.16 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 06 de diciembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en noviembre, con 360 metros lineales de placa huella, 15460.91 m^2 de mantenimiento periódico y 04 alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.17 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 26 de diciembre de 2024

Se ejecutaron 267 metros lineales de placa huella y una alcantarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.7.1.1. Actividades ambientales

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

3.7.1.1.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Con comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0047-25 se da respuesta comunicados 2024S-VBOG-050170 y 2024S-VBOG-044343; entrega informes mensuales, trimestral y balance de estado del proyecto Lourdes - aprobación, componente social y ambiental.

3.7.1.1.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se radica oficio GIC-INVIAS-NTS-0011-25 dando respuesta a comunicado 2024S-VBOG-099982 subsanación de la documentación solicitada del componente ambiental y social correspondiente al contrato NO. CD-FC-067-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

3.7.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASOS DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0007-25 donde se subsana la documentación solicitada del componente ambiental, correspondiente al contrato NO. CD-FC-077-2023, “MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER”

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0044-25 se da respuesta COMUNICADO 2024S-VBOG-099071 subsanando la documentación solicitada del componente ambiental y social correspondiente al contrato No. CD-FC-081-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARADITA - LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER".

3.11.1.2.15 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.11.1.2.16 CD-FC-071-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0013-25 dando respuesta comunicado 2024S-VBOG-100430 - subsanación de la documentación solicitada del componente ambiental y social. correspondiente al contrato CD-FC-071-2023 "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES – GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER".

3.11.1.2.17 CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.2. ACTIVIDADES SOCIALES

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte de cada uno de los contratistas de los proyectos correspondientes al Convenio 2033, del documento PAGA con los ajustes requeridos por la interventoría conforme a la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS, actas de vecindad y demás documentación de terminación de obra, para la respectiva revisión y aprobación de los mismos.

3.7.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022-

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Con comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0047-25 se da respuesta comunicados 2024S-VBOG-050170 y 2024S-VBOG-044343; entrega informes mensuales, trimestral y balance de estado del proyecto Lourdes - aprobación, componente social y ambiental.

3.7.1.2.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se radica oficio GIC-INVIAS-NTS-0011-25 dando respuesta a comunicado 2024S-VBOG-099982 subsanación de la documentación solicitada del componente ambiental y social correspondiente al contrato NO. CD-FC-067-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**CD-FC-056-2023**

3.7.1.2.10. MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASOS DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0007-25 donde se subsana la documentación solicitada del componente ambiental, correspondiente al contrato NO. CD-FC-077-2023, “MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER”

3.7.1.2.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0044-25 se da respuesta COMUNICADO 2024S-VBOG-099071 subsanando la documentación solicitada del componente ambiental y social correspondiente al contrato No. CD-FC-081-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARADITA - LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER”.

3.11.1.2.15 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El 27 de diciembre se da aprobación al asunto RESPUESTA OFICIO SCCY-071-018 CON ASUNTO ENTREGA DE BALANCE TRIMESTRAL COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL – APROBACIÓN con oficio GIC-INVIAS-NTS-1743-24

3.11.1.2.16 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0013-25 dando respuesta comunicado 2024S-VBOG-100430 - subsanación de la documentación solicitada del componente ambiental y social. correspondiente al contrato CD-FC-071-2023 “MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES – GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER”.

3.11.1.2.17 CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN-AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.3. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra de los siguientes municipios, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

3.7.1.3.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS

PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.8. CD-FC-079-2023 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASOS DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.13. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST

3.7.1.3.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE

SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.16. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.17. CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

3.7.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.
En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1352-22 del 17 - Nov- 2023 - OBSERVACIONES Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-002 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1503-22 del 05- Dic- 2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-005 del 19 de Ene de 2023 GIC-INVIAS-NTS-188-24 del 31-ene-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1353-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-004 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-085-24 del 15-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-006 del 24 de Ene de 2024 GIC-INVIAS-NTS-249-24 del 08-feb-2024- **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-029 del 22-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-571-24 del 11-Abr-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1357-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1537-22 del 12-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1403-22 del 17-Nov-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-026 del 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-541-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-031 del 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-708-24 del 07-May-2024 – **APROBACIÓN**

Tabla 65 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023.

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1388-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1511-22 del 06-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1389-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1517-22 del 07-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-006 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-049-24 del 10-Ene-24- **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-013 15-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-105-24 del 17-Ene-24- **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1358-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1538-22 del 12-Dic-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1484-22 del 03-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-119-24 del 18-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-017 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-319-24 del 20-feb-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-037 del 18-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 del 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-696-24 del 03- May - 2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 66 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes. Teniendo solo observado el PLANO RÉCORD del componente de topografía, se espera que el contratista de obra subsane dichas observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobación con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1354-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1597-22 del 21-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 25 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-250-24 del 08-feb-2024 **–** **APROBACIÓN** Contratista hace entrega por correo PLANOS RÉCORDS EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-809-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1363-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1625-22 del 27-Dic-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-313-24 del 16-feb-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1356-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-120-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 22 - Ene - 2023 GIC-INVIAS-NTS-203-24 del 02 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-511-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 10 - Abr - 2024 GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 26-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1405-22 del 23 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-060-24 del 12 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-NTS-318-24 del 20 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 03-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-669-24 del 30-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1381-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1552-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-1A-22 del 23-Ene-2024 - OBSERVACIONES El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024-**REVISIÓN.** GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1348-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con correo del 05 - Dic - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1539-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N° 008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024-**OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 06-FEB-2024 (AJUSTADA) El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 08-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-272-24 del 09-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N° 043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-643-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°045- CD-FC-074-2023 DEL 30-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-743-24 del 16-May-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega con correo del 04 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-061-24 del 12-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°014- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024- **OBSERVADO** El CONTRATISTA hace entrega con N°022- CD-FC-074-2023 DEL 19-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-394-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-644-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El CONTRATISTA hace entrega con N° 008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024 El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06 – Feb – 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024-**REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-205-24 del 02-Feb-2024 - **APROBACIÓN**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1404-22 del 23-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-088-24 del 16-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°011- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-209-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°019- CD-FC-074-2023 DEL 12-FEB-2024 GIC-INVIAS-NTS-385-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista presentó los estudios y diseños, en la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 06 - Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24 GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024 Se envían observaciones por WhatsApp el 20-Jun-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1430-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1612-22 del 26-Dic-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 042-2024 del 14-May-24 - PLANOS RÉCORD GIC-INVIAS-NTS-758-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 044-2024 del 23-May-24 - PLANOS RÉCORD GIC-INVIAS-NTS-831-24 del 28- May - 2024 – **OBSERVACIONES** Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 12/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1158-24 - SE EMITE CORREO DE APROBACIÓN DE LOS PLANOS RÉCORD 20/08/2024 - ING. JAIRO
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1431-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1613-22 del 26-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 07-Feb-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 08-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-268-24 del 09-Feb-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 041-2024 del 14-May-24 GIC-INVIAS-NTS-752-24 del 17-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 045-2024 del 23-May-24 Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 023-2024 del 22-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 -Abr- 2024 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24 GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024 Se envían observaciones por WhatsApp el 20-06-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-06-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1360-22 del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 30-11-2023 GIC-INVIAS-NTS-1536-22 del 12- Dic - 2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 15-12-2023 GIC-INVIAS-NTS-121-24 del 18 - Ene - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-401-24 del 06 - Mar - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 037-2024 del 18-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-649-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1509-22 del 06-Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 012-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1587-22 del 19-Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con oficio No. 030-2024 del 20-Mar-24 GIC-INVIAS-NTS-534-24 del 04-Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 038-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-757-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 047-2024 del 27-MAY-24 Especialista envía observaciones el 28-06-2024 se envían por WhatsApp al contratista Especialista envía observaciones el 17-07-2024 se envían por WP al contratista Especialista envía observaciones el 29-08-2024 se envían por WP al contratista.

Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con APROBACIÓN de los diferentes componentes de los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1485-22 del 01-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1518-22 del 07-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1510-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-003 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-089-24 del 16- Ene - 2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-010 del 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-244-24 del 08- Feb - 2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1361-22 del del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-204-24 del 02-Feb-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1586-22 del del 19- Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 13-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-332-24 del 22- Feb – 2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-028 del 08-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-513-24 del 02-Abr-2024 Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-036 del 15-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-695-24 del 03- May - 2024 - **APROBADO**

Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023.

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACIÓN a los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-129-24 del 19-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-011 del 23- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-170-24 del 29-Ene-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-028 del 07- Mar- 2024 GIC-INVIAS-NTS-449-24 del 13-Mar-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-032 del 15- Mar- 2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-003 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-019-24 del 04-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-009 del 17- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-174-24 del 31-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-012 del 31- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-292-24 del 14-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-029 del 07- Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-529-24 del 03-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	. El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1359-22 del 17 -Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-124-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-037 del 30- Abr- 2024 GIC-INVIAS-NTS-717-24 del 09 -MAYO - 2024 - **APROBACIÓN**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1486-22 del 01 -Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-179-24 del 30 -Ene-2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-027 del 07- Mar- 2024 GIC-INVIAS-NTS-433-24 del 11-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023

3.7.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACIÓN al componente geotécnico, topografía y pavimentos, quedando con OBSERVACIÓN los demás componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
TOPOGRAFÍA	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-337-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-497-24 del 22-Mar-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-031 el 06-09-2024 GIC-INVIAS-NTS-1312-24 del 16/09/2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-338-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-493-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-008 el 02-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-540-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-012 el 08-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-622-24 del 22-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-21 el 15-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-771-24 del 21-May-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-032 el 06-Sept-2024 Ing. JAIRO solicita reunión 30/09/2023 - Tramo 1: K0+000 – K0+136.06 – **OBSERVACIONES**. Tramo 2: K3+695.92 – K3+825.92 – **OBSERVACIONES**. Tramo 3: K5+269.35 – K5+399.35 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**. Entrega planos de OBR-CACH-045 -3/10/2024 OBR-CACH-048 ATIENDE OBSERVACIONES - 08/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1424-24 - 22/10/2024 **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-341-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-495-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** OBRA-CACH-035 del 10/09/2024 - Hace entrega de observaciones GIC-INVIAS-NTS-1319-24 - 17/09/2024 – **OBSERVACIONES** OBR-CACH-049 - 08/10/2024 - Entrega observaciones GIC-INVIAS-NTS-1604-24 - 29/11/2024 - **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobación**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-342-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-496-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-009 el 08-Abr-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-740-24 del 15-May-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-043 el 18-09-2024 GIC-INVIAS-NTS-1378-24 del 08/10/2024 - OBSERVACIONES Entrega planos de OBR-CACH-050 -9/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1506-24 del 07/11/2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-067-2023

3.7.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-207-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-330-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-795-24 del 22-May-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 026 - 2024 del 12/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1158-24 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIÓN** 20/08/2024
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024

		GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 07 -2024 del 19-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-331-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-794-24 del 22-May-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-202-24 del 02-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-327-24 del 21-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES-LOURDES-25-2024 del 28-Jun-24 El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 026 - 2024 del 12/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1378-24 del 08/10/2024 - OBSERVACIONES El contratista hace entrega de subsanaciones con comunicado MATICCES – LOURDES – 028 - 2024 del 18/09/2024 Atiene observaciones MATICCES – LOURDES – 031 - 2024 - 09/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1415-24 - 17/10/2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023

3.7.1.1.10. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-279-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-386-24 del 05-Mar-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-280-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-393-24 del 05-Mar-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-011-2024 el 13-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-628-24 del 23-abr-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-021-2024 el 30-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-928-24 del 19-Jun-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-026-2024 el 03-07-2024 Se aprueba con observaciones se envía por WHATSAPP el 22-07-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-316-24 del 16-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1605-24 del 29/11/2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-301-24 del 14-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 03-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-670-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**

3.7.1.1.11. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES diseño geométrico, estructural.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-720-24 del 10-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-735-24 del 14-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-716-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-808-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**

Tabla 75 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-056-2023

3.7.1.1.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en la mayoría de sus componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-802-24 del 23-May-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1223-24 - 29/08/204 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-824-24 del 23-May-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1259-24 del 04/09/2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-838-24 del 29-May-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-830-24 del 28-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 **APROBACIÓN** – 17-Sep-2024

CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-854-24 del 04-Jun-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1173-24ª del 26/08/2024 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-849-24 del 31-May-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1194-24 del 26/08/2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-840-24 del 29-May-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 Se envían observaciones a las alcantarillas mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1195-24 del 26/08/2024
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-990-24 del 28-Jun-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024

3.7.1.1.13. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

Tabla 77 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-676-24 del 02-May-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 08/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-763-24 del 20-May-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 13/06/2024 GIC-INVIAS-NTS-1000-24 del 04-julio-2024 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-711-24 del 09-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 15/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1136-24 DEL 13/08/2024 APROBADO CON OBSERVACIONES Contratista hace entrega por correo 14/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1167-24 del 22-agosto-2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-715-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-806-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**

3.7.1.1.14. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el *Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023* presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-989-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACIÓN Contratista hace envió por medio de oficio WRGR-CD-FC-058-2023-004 DEL 17-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1142-24 - 14/08/2024 - **OBSERVACIONES** Correo 27/08/2024 - REMITE CORRECCIÓN A OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1302-24- 10/09/2024 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-995-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 – REITERACIÓN CONTRATISTA HACE ENVÍO CON COMUNICADO NO. WRGR-CD-FC-058-2023-009 DEL 09/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1156-24- **APROBACIÓN CON OBSERVACIÓN** 20/08/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-998-24 del 02-JUL-2024 - OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 – REITERACIÓN CONTRATISTA ENVÍA COMUNICADO NO. WRGR-CD-FC-058-2023-009 DEL 09/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1222-24 del 28/08/2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-992-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACIÓN CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-006 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1190-24 del 26/08/2024 **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** WRGR-CD-FC-058-2023-015 DEL 23/09/2024 - SUBSANACIÓN INFORME

Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023

3.7.1.1.15. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN a los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Se envían observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1260-24 del 04/09/2024 SCCY-071-006 contratista entrega observaciones 01/10/2024 Se envían observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1373-24 del 04/10/2024 - OBSERVACIONES SCCY-071-010 contratista entrega atendiendo observaciones 25/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1509-24 - 12/11/2024 - OBSERVACIONES SCCY-071-016 - ENTREGA OBSERVACIONES 20/11/2024 GIC-INVIAS-NTS-1578-24 - 25/11/2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1191-24 del 26/08/2024 SCCY-071-005 del 30/09/2024 GIC-INVIAS-NTS-1519-24 del 14/11/2024- **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega 21/08/2024 Se envían observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1193-24 del 26/08/2024 - OBSERVACIONES SCC-071-007 Contratista entrega 07/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1492-24 - 06/11/2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** SCCY-071-022 contratista entrega 27/11/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1260-24 del 04/09/2024 – **OBSERVACIONES** SCCY-071-016 - ENTREGA OBSERVACIONES 20/11/2024 GIC-INVIAS-NTS-1578-24 - 25/11/2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado con observaciones**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega 21/08/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1192-24 del 26/08/2024 SCCY-071-016 - ENTREGA OBSERVACIONES 20/11/2024
		SCCY-CD-FC-071-2023-002 contratista entrega

Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023

INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	Se envían observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1363-24 del 03/10/2024 – **OBSERVACIONES** SCC-071-015 Contratista envía correcciones - 19/11/2024

3.7.1.1.16. CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con los estudios y diseños aprobados.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1510-24 - 12/11/2024 – **OBSERVACIONES** G&P-CD-FC-049-2024-016 - 19/12/2024 - **ENTREGA OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1718-24 - 20/12/2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado con observaciones**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1459-24 - 29/10/2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1523-24 - 14/11/2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1510-24 - 12/11/2024 – **OBSERVACIONES** G&P-CD-FC-049-2024-016 - 19/12/2024 - **ENTREGA OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1718-24 - 20/12/2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1459-24 - 29/10/2024 - **APROBADO PARA TRAFICO LIVIANO**

Tabla 81 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-049-2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	Aprobado	G&P-CD-FC-049-2024-003 - 01/11/2024 - contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1616-24 - 02/12/2024 - **APROBADO**

3.7.1.2. Etapa de Construcción

En el presente mes se finalizan las actividades de construcción de placa huella en el municipio de Villa Caro correspondiente al convenio administrativo No. 4164 – 2022, con actividades de encofrado, corte, figurado e instalación de acero para placa huella, viga riostra, cuneta y bordillo.

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los contratos de obra por municipio derivados del contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

3.7.1.2.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	195.00	EJECUTADO A 07-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	626.17	615.29	21,085,853.45
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	196.28	160.86	164,004,865.05
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9,809.00	9,361.00	95,454,117.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	366.48	366.48	121,882,452.48
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	70.56	64.56	37,600,454.16
						SUB TOTAL		$ 440,027,742.14
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	0		
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	-		-
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	-		-
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	-		-
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	-		-
						SUB TOTAL	$ -	$ -
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,674.48	$ 4,674.48	13,831,782.23
						SUB TOTAL		13,831,782.23
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	15.00		-
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,204.1	15,204.15	28,568,597.85
						SUB TOTAL		28,568,598.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		482,428,122.38

Tabla 82 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

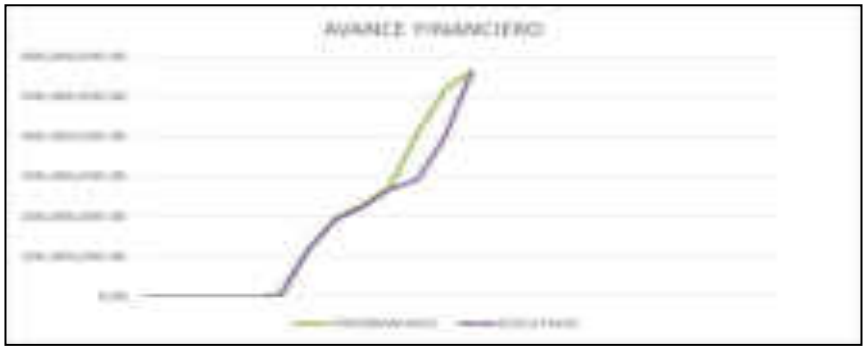


Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota

Se ejecutaron $564.759.919,91 dando el 100,00% de la inversión.

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**ML**	**320.00**	**EJECUTADO A 17-FEBRERO-2024**	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	769.26	769.26	$ 26,678,706.06
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.80	$ 238.56	$ 207,220,611.36
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	12,588.00	$ 11,947.32	$ 121,695,401.52
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	490.50	490.50	$ 91,985,917.50
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	107.46	100.00	$ 44,935,700.00
						SUB TOTAL	$ 13,545.64	$ 492,516,336.44
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**UND**	**2**		
7			600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	$ 88.23	$ 4,374,636.63
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 15.60	$ 15.60	$ 13,550,643.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	$ 1.61	$ 1,008,466.97
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 43.45	$ 43.45	$ 1,748,775.60
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	$ 12.00	$ 11,604,036.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,159.38	$ 1,159.39	$ 11,809,546.54
						SUB TOTAL	$ 1,320.28	$ 44,096,105.34
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 11,522.46	$ 11,450.00	$ 30,399,750.00
						SUB TOTAL	11,450.00	30,399,750.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	5.00	-	$ -
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	17,919.81	17,919.81	$ 34,656,912.54
						SUB TOTAL		34,656,913.00
ITEMS NO PREVISTOS								
				DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	m2	1,177.20	1,177.20	$ 26,109,118.80
						SUB TOTAL		26,109,119.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		**627,778,223.78**

Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100,00% de las actividades de obra.

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	CANT	VALOR TOTAL
						EJECUTADO A 27-FEBRERO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		**ML**	**282.00**				363,860,410
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	299.11	34,605.00	10,350,702.00	291.67	$ 10,093,240.00
2	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	192.64	931,262.00	179,398,312.00	181.21	$ 168,753,987.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	9,661.59	10,167.00	98,229,386.00	9,587.47	$ 97,475,807.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	220.80	256,347.00	56,601,418.00	220.80	$ 56,601,418.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	56.31	504,912.00	28,431,595.00	61.27	$ 30,935,958.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		**UND**	**1.00**				$ 23,974,357.00
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	89.00	51,382.00	4,572,998.00	44.0	$ 2,260,808.00
8	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	8.00	931,262.00	7,450,096.00	8.0	$ 7,450,096.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0.80	714,548.00	571,638.00	0.8	$ 571,638.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	25.00	39,451.00	986,275.00	25.0	$ 986,275.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	6.00	1,134,780.00	6,808,680.00	6.0	$ 6,808,680.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	580.00	10,167.00	5,896,860.00	580.0	$ 5,896,860.00
TRANSPORTES							$ 4,361,640.08
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1,552.44	2,954.00	4,585,908.00	1,477	$ 4,361,640.08
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							$ -
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UND	5.00	708,305.00	3,541,525.00		$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 22,911,850.64
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	12,988.38	1,876.00	24,366,201.00	12,213	$ 22,911,850.64
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)	**431,791,594.00**		$ 415,108,257.72

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

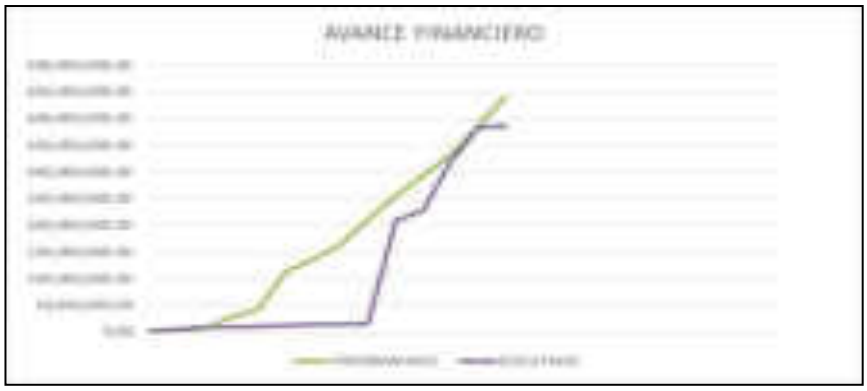


Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 31 de mayo de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	300.00		31 DE MAYO DE 2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	460.00	39,920.00	539.8	$ 21,548,816.00
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.71	1,031,028.00	173.38	$ 178,759,634.64
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10,982.98	10,215.00	11516.29	$ 117,638,902.35
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	300.00	345,406.00	303	$ 104,658,018.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	75.60	608,531.00	73.98	$ 45,019,123.38
							SUB TOTAL		$ 467,624,494.37
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	2			
7	600,1.1P		600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	51,383.00	173.31	$ 8,905,187.73
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 11.48	1,031,028.00	15.25	$ 15,723,177.00
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	816,269.00	3.69	$ 3,012,032.61
10	610.1P		610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 43.45	42,165.00	100.74	$ 4,247,702.10
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	1,054,707.00	15.00	$ 15,820,605.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,166.70	10,215.00	1,639.27	$ 16,745,143.05
							SUB TOTAL		$ 64,453,847.49
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3,609.18	3,397.00	$ 5,240.78	$ 17,802,929.66
							SUB TOTAL		17,802,929.66
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	8.00	716,148.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,246.17	2,181.00	15,246.17	$ 33,251,896.77
							SUB TOTAL		33,251,897.00
				DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m2	7.99	222,924.00	7.54	$ 1,680,846.96
				REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m2	21.08	80,445.00	19.27	$ 1,550,175.15
				FILTRO CON GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	65.00	209,271.00	60.00	$ 12,556,260.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		586,364,190.63

Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

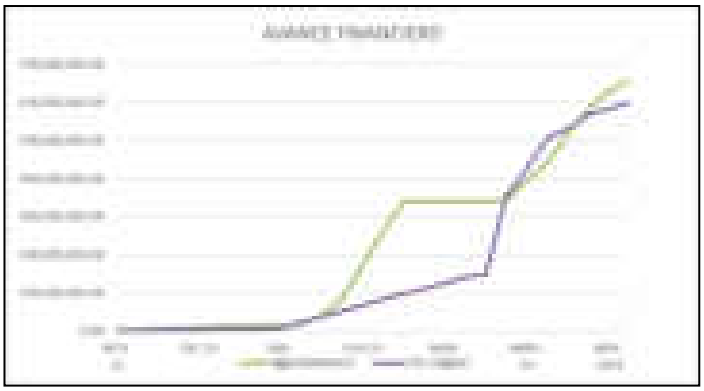


Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de abril de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	372.00		EJECUTADO A 31-MARZO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,881.00	34,583.00	2002.82	**69,263,524.06**
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	248.81	1,066,119.00	241.23	**257,179,886.37**
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,167.94	10,205.00	12,529.48	**127,863,343.40**
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	51.23	373,147.00	51.45	**19,198,413.15**
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	94.95	623,489.00	92.42	**57,622,853.38**
							SUB TOTAL		$ 531,128,020.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	3			-
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	170.00	51,347.00	170	**8,728,990.00**
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,066,119.00	23.40	**24,947,184.60**
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	2.40	855,574.00	2.40	**2,053,377.60**
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	26.40	39,424.00	26.40	**1,040,793.60**
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	18.00	1,134,000.00	18.00	**20,412,000.00**
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,736.70	10,205.00	1,736.70	**17,723,023.50**
							SUB TOTAL		$ 74,905,369.30
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,455.97	2,957.00	4455.97	**13,176,303.29**
							SUB TOTAL		13,176,303.29
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X	unid	5.00	707,819.00		-
							SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	19,939.8	1,878.00	19939.82	**37,446,981.96**
							SUB TOTAL		37,446,982.00
NO PREVISTOS									
16	NP001			SUELO CEMENTO DE 0,15 DE ESPESOR	m3	293.8	70,974.00	293.81	**20,852,870.94**
17	NP002			DEMOLICION DE PLACA HUELLA EXISTENTE 0.20 m	m2	265.0	43,836.00	**266.44**	**11,679,689.99**
							SUB TOTAL		32,532,561.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		689,189,235.95

Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

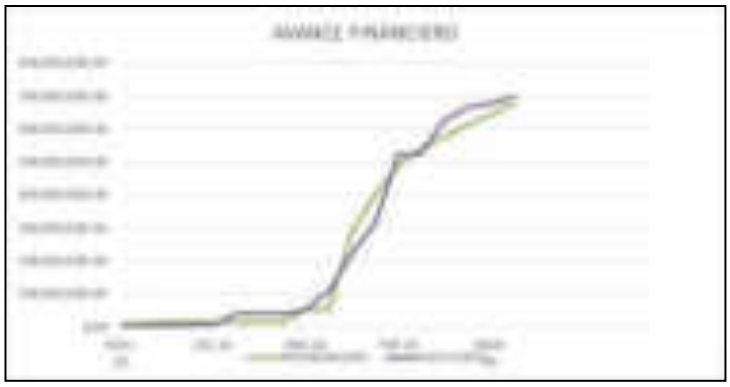


Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL	
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	155.00	EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024		
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	862.70	862.70	$	29,919,298.70
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	90.65	90.65	$	77,883,760.50
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	4,405.13	4,405.13	$	44,910,300.35
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	620.00	620.00	$	110,761,760.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	40.57	40.57	$	17,893,560.78
						SUB TOTAL	$ 6,019.05	$	281,368,680.33
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	1			
7			600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 45.28	45.28	$	2,245,208.80
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 5.78	5.78	$	4,966,002.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	1.61	$	992,560.17
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 22.15	22.15	$	891,493.20
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 6.00	6.00	$	5,777,994.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 782.70	782.69	$	7,979,524.55
						SUB TOTAL	$ 863.51	$	22,852,783.32
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 5,650.81	5,650.81	$	15,002,900.55
						SUB TOTAL	5,650.81		15,002,900.55
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	5.00		$	-
						SUB TOTAL	-		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	$ 11,381.50	11,381.50	$	22,011,821.00
						SUB TOTAL	11,382.00		22,011,821.00
NO PREVISTO									
16	NP 001			PEDRAPLEN COMPACTADO	m3	$ 237.50	237.50	$	37,836,837.50
17	NP 002			FILTRO PARA GEOTEXTIL	m	$ 190.00	190.00	$	31,462,670.00
									69,299,507.50
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	23,915.00		410,535,693.00

Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

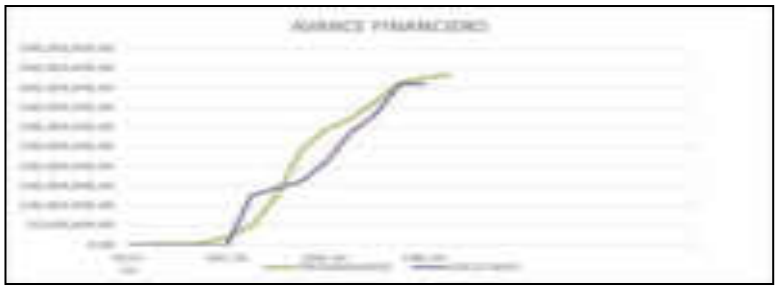


Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	279.00	EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	820.98	819.27	$ 28,413,102.87
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	290.19	280.59	$ 241,074,510.30
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	14,612.00	14,515.00	$ 147,907,850.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	480.56	480.56	$ 86,197,086.08
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	50.40	50.40	$ 22,229,121.60
						SUB TOTAL	$ 16,145.82	$ 525,821,670.85
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	7,154.55	$ 7,139.65	$ 18,955,770.75
						SUB TOTAL	7,139.65	18,955,770.75
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	7.00		$ -
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	16,224.69	16,224.69	$ 31,378,550.46
						SUB TOTAL	16,225.00	31,378,550.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		576,155,992

Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

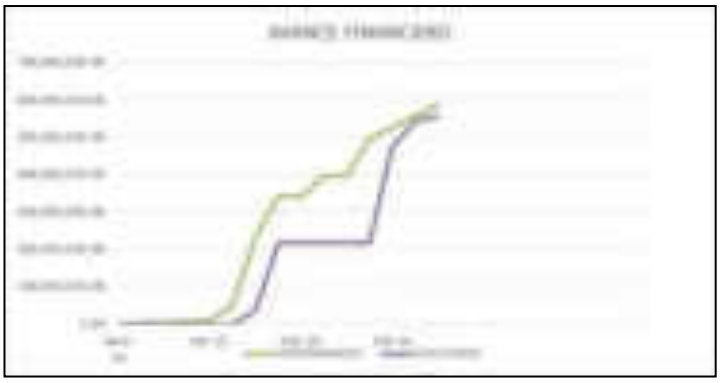


Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 30 de junio de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								**30 DE JUNIO DE 2024**	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	68.00	39,920.00	286.52	$ 11,437,878.40
2	630.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	285.00	1,015,260.00	235.91	$ 239,509,986.60
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,500.00	10,210.00	14,915.94	$ 152,291,747.40
4	320.3	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	325.00	331,796.00	229.22	$ 76,054,279.12
5	630.7	630.7		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	68.00	594,692.00	63.46	$ 37,739,154.32
							SUB TOTAL		$ 517,033,045.84
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
7	600.1.1	600.1.2.1	600,1,1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	132.00	51,383.00	47.55	$ 2,443,261.65
8	630.4	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,015,260.00	6.01	$ 6,101,712.60
9	630.6	630.6		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	2.40	799,801.00	1.03	$ 823,795.03
10			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	66.00	42,165.00	21.40	$ 902,331.00
11	661.1			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	21.00	1,048,033.00	6.00	$ 6,288,198.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,737.00	10,210.00	550.86	$ 5,624,280.60
							SUB TOTAL		$ 22,183,578.88
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	918.00	1,958.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	720.8		SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	5.00	637,714.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	2,211.34	2,181.00	14,387.00	$ 31,378,047.00
17	230.1	230.13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m2	5,868.0	4,583.91		31,378,047.00
							SUB TOTAL		**570,594,671.72**

Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

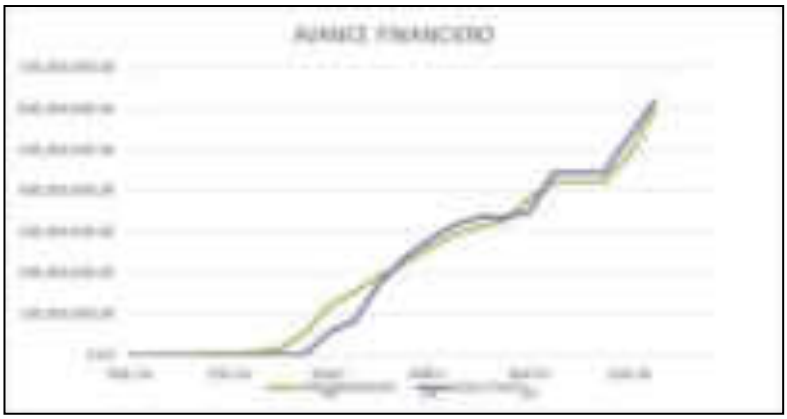


Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes

3.7.1.2.9. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANTOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.					
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	316.07	$ 38,121.00	$ 11,688,661.00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	234.96	$ 1,138,016.00	$ 250,727,685.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11032.81	$ 10,242.00	$ 123,211,158.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	299.39	$ 428,491.00	$ 130,316,968.00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	119.10	$ 677,827.00	$ 71,117,609.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:				
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	103.54	$ 49,585.00	$ 2,567,015.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	15.70	$ 1,138,016.00	$ 8,899,285.00
9	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	1.60	$ 890,664.00	$ 712,531.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	23.76	$ 64,380.00	$ 764,834.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	12.00	$ 1,090,746.00	$ 6,544,476.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1157.36	$ 10,242.00	$ 5,590,698.00
	TRANSPORTES				
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	5454.95000	$ 3,397.00	$ 18,530,465.00
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA) REFLECTIVO TIPO IX (1.25*0.45)	UND	7.00	$ 719,407.00	$ 5,035,849.00
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO				
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	17393.5200	$ 2,181.00	$ 37,936,314.00
	VALOR BÁSICO OBRA				**$ 673,643,548.00**

Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

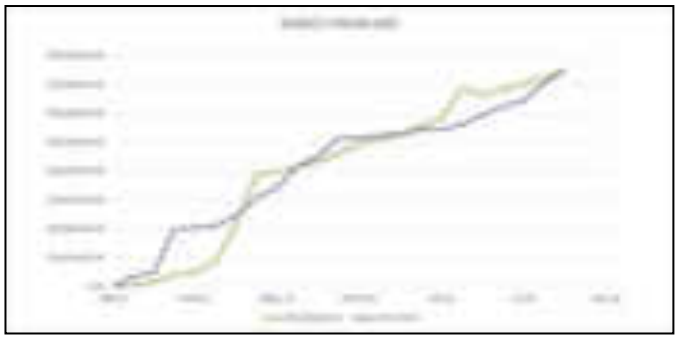


Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira

Se ha ejecutado el 100% de las actividades en el proyecto.

3.7.1.2.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.						CANT	VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	V/R PARCIAL	EJECUTADO A 31-MAYO-2024	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA							$ 107,647,342.75
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	581.41	$ 34,681.00	$ 20,163,880.00	301.65	$ 10,461,523.65
1.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	213.63	$ 985,280.00	$ 210,482,563.00		$ -
1.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11068.00	$ 10,234.00	$ 113,269,912.00	1000	$ 10,234,000.00
1.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-SO	M3	343.30	$ 288,254.00	$ 98,957,598.00	301.65	$ 86,951,819.10
1.5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	30.24	$ 551,760.00	$ 16,685,222.00		$ -
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS							$ -
2.1	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	0	$ 49,585.00	0.00		$ -
2.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	0	$ 985,450.00	0.00		$ -
2.3	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0	$ 748,239.00	0.00		$ -
2.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	0	$ 40,248.00	0.00		$ -
2.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	UND	0	$ 1,016,390.00	0.00		$ -
2.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	0	$ 10,234.00	0.00		$ -
TRANSPORTES							$ -
3.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS	M3/KM	4209.50	$ 2,655.00	$ 11,176,215.00		$ -
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD							$ -
4.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (0.25mX0.045m)	UND	7.00	$ 705,224.00	$ 4,936,568.00	0	$ -
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 21,355,228.00
5.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	138103.10	$ 1,934.00	$ 26,695,187.00	11042	$ 21,355,228.00
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	$ 502,367,145.00		$ 129,002,570.75

Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

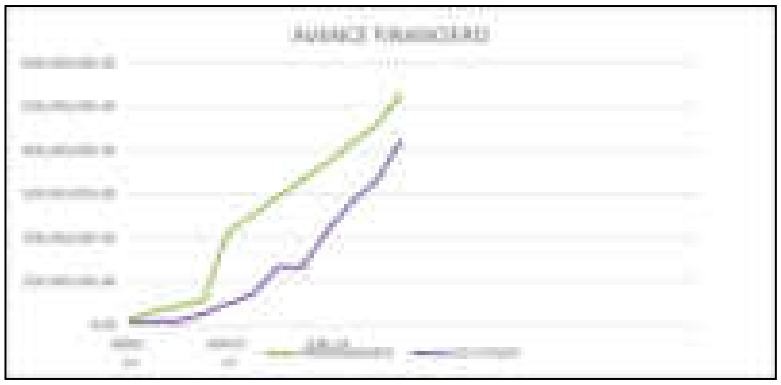


Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						CANT	VALOR TOTAL
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO A 30-JUNIO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	44.56	34,681.00	$ 1,545,309.00	43.2	$ 1,498,219.20
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MI	m3	214.00	890,706.00	$ 190,611,084.00	158.1	$ 140,820,618.60
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10,152.00	10,205.00	$ 103,601,160.00	9949.62	$ 101,535,872.10
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	244.00	206,590.00	$ 50,407,960.00	243	$ 50,201,370.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14M	m3	48.90	468,731.00	$ 22,920,946.00	47.42	$ 22,227,224.02
				SUB TOTAL	$ 369,086,459.00		$ 316,283,303.92
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88.00	49,585.00	$ 4,363,480.00		$ -
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - ME	m3	15.60	890,706.00	$ 13,895,014.00		$ -
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa	m3	1.60	649,432.00	$ 1,039,091.00		$ -
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MAT	m3	44.00	40,248.00	$ 1,770,912.00		$ -
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CL	m	12.00	976,347.00	$ 11,716,164.00		$ -
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,205.00	$ 11,817,390.00		$ -
				SUB TOTAL	$ 44,602,051.00		$ -
TRANSPORTES							
13	TRANSPORTE DE MATERIALES	m3/km	1,215.29	2,655.00	$ 3,226,605.00	341.4	$ 906,417.00
				SUB TOTAL	3,226,605.00		$ 906,417.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-	unid	12.00	705,224.00	$ 8,462,688.00		$ -
				SUB TOTAL	8,462,688.00		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTE	m2	12,350.13800	1,934.00	$ 23,885,167.00	12350.138	$ 23,885,166.89
				SUB TOTAL	23,885,167.00		$ 23,885,166.89
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	449,262,970.00		$ 341,074,887.81

Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

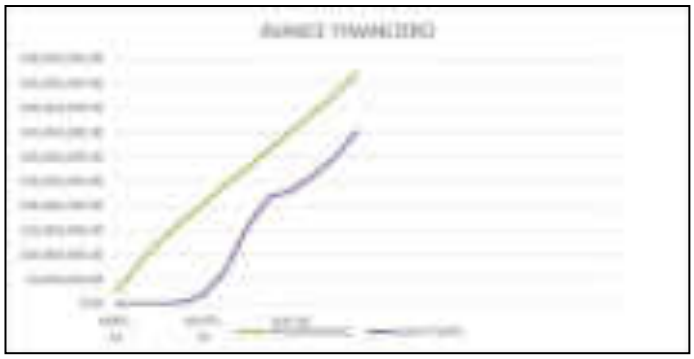


Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta

3.7.1.2.12. CD-FC-077-2023 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades que se realizaron en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO - PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.						CANT	VALOR TOTAL
		UND	CANT	V UNITARIO	V TOTAL	EJECUTADO A 30-JUNIO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA							$ 179,602,332.00
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	384.47	$ 34,600.00	$ 13,302,524.00	219.07	$ 7,579,822.00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	218.04	$ 884,000.00	$ 192,745,857.00	58.67	$ 51,864,280.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	14619.64	$ 10,200.00	$ 149,120,328.00	6803.46	$ 69,395,190.00
320.3.1	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	338.26	$ 215,500.00	$ 72,894,168.00	208.68	$ 44,970,540.00
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	50.22	$ 463,400.00	$ 23,271,948.00	12.6	$ 5,792,600.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS							$ 20,271,960.00
600.1.1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88	$ 51,000.00	$ 4,488,000.00	48.18	$ 2,457,180.00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	16	$ 884,000.00	$ 14,144,000.00	3.32	$ 2,934,880.00
630.1.6	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	1.6	$ 665,000.00	$ 1,064,000.00	0.88	$ 585,200.00
610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	50	$ 40,000.00	$ 2,000,000.00	14.07	$ 562,800.00
661.2	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	12	$ 1,134,000.00	$ 13,608,000.00	10	$ 11,340,000.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1160	$ 10,200.00	$ 11,832,000.00	234.5	$ 2,391,900.00
TRANPORTES							$ 1,940,216.00
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3307.26	$ 2,900.00	$ 9,591,080.00	669.04	$ 1,940,216.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							$ -
710.1.3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI- 04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1.25m X 0,45m)	UND	8	$ 706,480.00	$ 5,651,840.00		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 69,133,795.00
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	37572.71	$ 1,840.00	$ 69,133,795.00	37572.71	$ 69,133,795.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS							$ -
NP-01	TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	KG	15779.64	$ 480.00	$ 7,574,227.00		$ -
VALOR TOTAL BASICO DE OBRA = (A)					**$ 590,421,747.00**		$ 270,948,303.00

Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

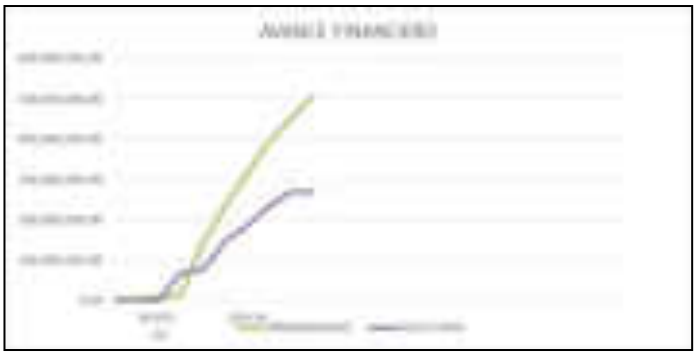


Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

3.7.1.2.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades que se realizaron en el proyecto.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT EJECUTADO A 30-SEP-2024	VALOR TOTAL EJECUTADO A 30-SEP-2024	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	58.00	34,607.00	$ 2,007,206.00	58	$	2,007,206.00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	243.00	994,334.00	$ 241,623,162.00	243	$	241,623,162.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	11,529.00	10,189.00	$ 117,468,981.00	11529	$	117,468,981.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	278.00	310,651.00	$ 86,360,978.00	278	$	86,360,978.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	55.50	560,269.00	$ 31,094,929.50	55.5	$	31,094,930.00
				SUB TOTAL	**$ 478,555,256.50**		$	478,555,257.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88.00	51,383.00	$ 4,521,704.00	88	$	4,521,704.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	15.60	994,334.00	$ 15,511,610.40	15.6	$	15,511,610.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SI	m3	1.60	780,421.00	$ 1,248,673.60	1.6	$	1,248,674.00
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVAC	m3	44.00	39,452.00	$ 1,735,888.00	44	$	1,735,888.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm D	m	12.00	1,134,794.00	$ 13,617,528.00	12	$	13,617,528.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,189.00	$ 11,798,862.00	1158	$	11,798,862.00
				SUB TOTAL	**$ 48,434,266.00**		$	48,434,266.00
	TRANSPORTES							
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA	m3/km	1,375.20	2,959.00	$ 4,069,226.36	1375.20323	$	4,069,226.00
				SUB TOTAL	**4,069,226.36**		$	4,069,226.00
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE	unid	16.00	708,315.00	$ 11,333,040.00	16	$	11,333,040.00
				SUB TOTAL	**11,333,040.00**		$	11,333,040.00
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	16,201.10700	1,879.00	$ 30,441,880.05	16201.11	$	30,441,885.69
				SUB TOTAL	**30,441,880.00**		$	30,441,885.69
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	**572,833,669.00**		$	572,833,674.69

Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

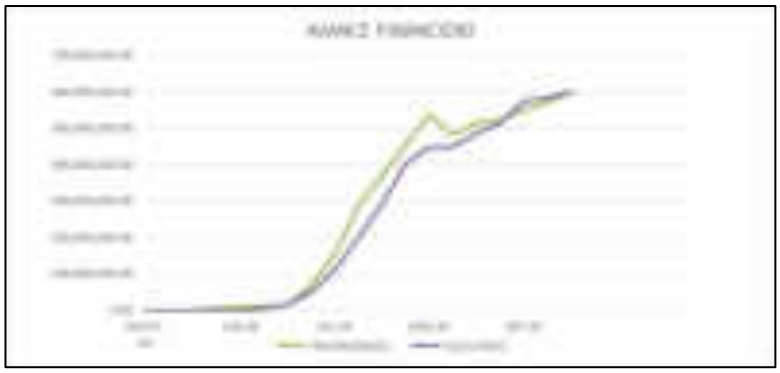


Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua

3.7.1.2.14. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER. GOBERNACIÓN 2033							
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						EJECUTADO A AGOSTO-2024	
No	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	49.00	35,953.00	$ 1,761,697.00	48.12	1,730,058.36
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	208.00	1,025,581.00	$ 213,320,848.00	99.00	101,532,519.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9,855.00	10,194.00	$ 100,461,870.00	8654.38	88,222,749.72
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	237.00	327,669.00	$ 77,657,553.00	321.12	105,219,430.94
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	47.50	571,437.00	$ 27,143,258.00	44.45	25,400,374.65
				SUB TOTAL	$ 420,345,226.00	$	322,105,132.67
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	88.00	49,585.00	$ 4,363,480.00	86.20	4,274,227.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	12.00	1,025,581.00	$ 12,306,972.00	11.51	11,804,437.31
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	1.60	788,692.00	$ 1,261,907.00	1.54	1,214,585.68
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	44.00	41,886.00	$ 1,842,984.00	43.00	1,801,098.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	12.00	1,023,650.00	$ 12,283,800.00	12.00	12,283,800.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,194.00	$ 11,804,652.00	1105.54	11,269,874.76
				SUB TOTAL	$ 43,863,795.00	$	42,648,022.75
TRANSPORTES							
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	1,118.14	3,271.00	$ 3,657,436.00	876.83	2,868,110.93
				SUB TOTAL	3,657,436.00	$	2,868,110.93
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	11.00	705,522.00	$ 7,760,742.00	0.00	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO						$	-
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	13,441.68	1,986.00	$ 26,695,176.48	13441.69	26,695,196.34
				SUB TOTAL	502,322,375.48	$	26,695,196.34
TOTAL EJECUTADO						$	394,316,462.69

Tabla 94 Cantidades ejecutadas en el municipio de Herrán

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

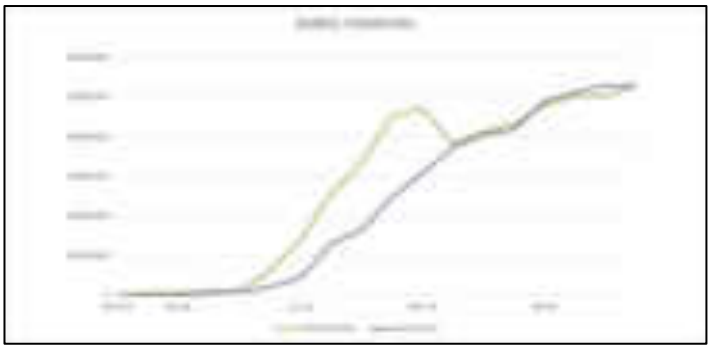


Gráfico 24 Avance Financiero Municipio de Herrán

3.7.1.2.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.							
	ITEMS DE PAGO	INFORMACIÓN INICIAL				AVANCE 25/10/2024	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	ACUMULADO	Valor total
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	73.00	$ 39,920.00	$ 2,914,160.00	744.48	$ 29,719,641.60
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	306.00	$ 920,653.00	$ 281,719,818.00	299.25	$ 275,505,410.25
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14499.00	$ 10,181.00	$ 147,614,319.00	14458.91	$ 147,206,162.71
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	349.00	$ 250,131.00	$ 87,295,719.00	408.96	$ 102,293,573.76
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	69.80	$ 511,663.00	$ 35,714,077.00	35.01	$ 17,913,321.63
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	176.00	$ 51,383.00	$ 9,043,408.00	131.84	$ 6,774,334.72
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	31.20	$ 920,653.00	$ 28,724,374.00	23.52	$ 21,653,758.56
9	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	3.20	$ 700,995.00	$ 2,243,184.00	2.40	$ 1,682,388.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	88.00	$ 42,165.00	$ 3,710,520.00	65.92	$ 2,779,516.80
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	24.00	$ 1,007,990.00	$ 24,191,760.00	18.00	$ 18,143,820.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2316.00	$ 10,181.00	$ 23,579,196.00	1743.33	$ 17,748,842.73
	TRANSPORTES	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1167.07770	$ 3,397.00	$ 3,964,562.95	4641.72000	$ 15,767,922.84
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA) REFLECTIVO TIPO IX (1.25*0.45)	UND	12.00	$ 712,462.00	$ 8,549,544.00	12.00	$ 8,549,544.00
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	16964.0500	$ 2,173.00	$ 36,862,880.65	16964.0500	$ 36,862,880.65
	TOTAL OBRA				$ 696,127,523.00	$	702,601,118

Tabla 95 Cantidades ejecutadas en el municipio de Santiago

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

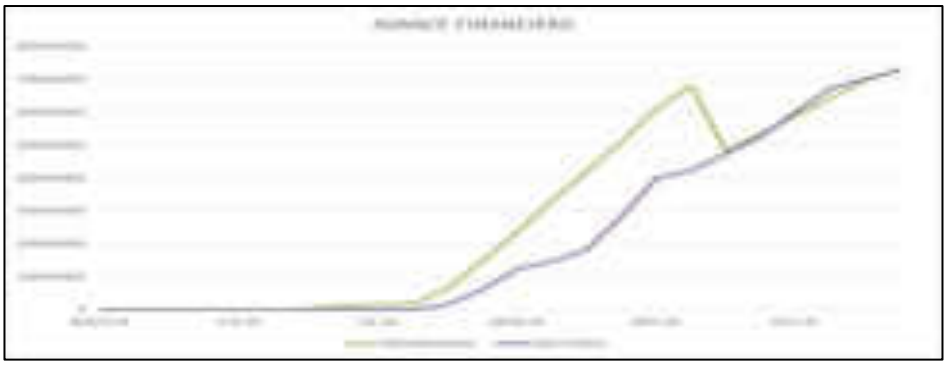


Gráfico 25 Avance Financiero Municipio de Santiago

3.7.1.2.16. CD-FC-71-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.. GOBERNACIÓN 2033					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 39,920.00	400	$ 15,968,000.00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 983,725.00	145.12	$ 142,758,172.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10,197.00	9700	$ 98,910,900.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 304,574.00	270	$ 82,234,980.00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	$ 567,016.00	72	$ 40,825,152.00
SUB TOTAL					$ 380,697,204.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 51,383.00	162.000	$ 8,324,046.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 983,725.00	31.000	$ 30,495,475.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 766,866.00	3.400	$ 2,607,344.00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 42,165.00	84.000	$ 3,541,860.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 1,034,686.00	24.000	$ 24,832,464.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10,197.00	2308.000	$ 23,534,676.00
SUB TOTAL					$ 93,335,865.00
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 3,397.00		$ -
SUB TOTAL					$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 714,568.00		$ -
SUB TOTAL					$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 2,181.00	15460.91	$ 33,720,236.00
SUB TOTAL					$ 33,720,236.00
TOTAL EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					507,753,305.00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					507,753,305.00
COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					5,076,552.00
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					964,545.00
VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					513,794,402.00
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					14,386,243.26
TOTAL EJECUTADO					528,180,645.26

Tabla 96 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

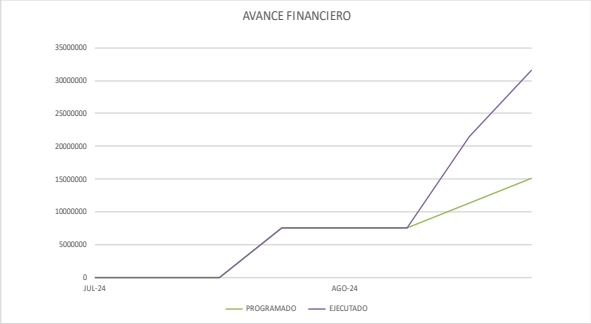


Gráfico 26 Avance Financiero Municipio de Mutiscua

3.7.1.2.17. CD-FC-49-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER							
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							
No	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA							
1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 43,214.00	581.82	$ 25,142,769.00
2	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1,135,605.00	193.43	$ 219,660,075.00
3	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 7,568.00	9514.19	$ 72,003,389.00
4	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 423,543.00	353.06	$ 149,536,091.00
5	630.7		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	$ 698,305.00	33.87	$ 23,651,590.00
SUB TOTAL							$ 489,993,914.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS							
7	600.1.2.1	600,1,1	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 43,214.00	43.950	$ 1,899,255.00
8	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1,135,605.00	8.240	$ 9,357,385.00
9	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 907,833.00	0.800	$ 726,266.00
10		610.1P	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 47,432.00	21.990	$ 1,043,029.00
11			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 925,669.00	6.000	$ 5,554,014.00
12	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 7,568.00	581.110	$ 4,397,840.00
SUB TOTAL							$ 22,977,789.00
TRANSPORTES							
13		900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 3,208.00	4,738.23	$ 15,200,237.00
SUB TOTAL							$ 15,200,237.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 1,052,084.00	13	$ 13,677,092.00
SUB TOTAL							$ 13,677,092.00
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
15			CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 20,934.00	1682.76	$ 35,226,872.00
SUB TOTAL							$ 35,226,872.00
TOTAL EJECUTADO							
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)							$ 577,075,904.00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLMENTARIAS = (B)							$ -
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)							$ 577,075,904.00
COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)							$ 9,324,387.00
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)							$ 1,771,634.00
VALOR TOTAL= C+D+E							$ 588,171,925.00
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)							$ 16,468,813.90
TOTAL EJECUTADO							$ 604,640,738.90

Tabla 97 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

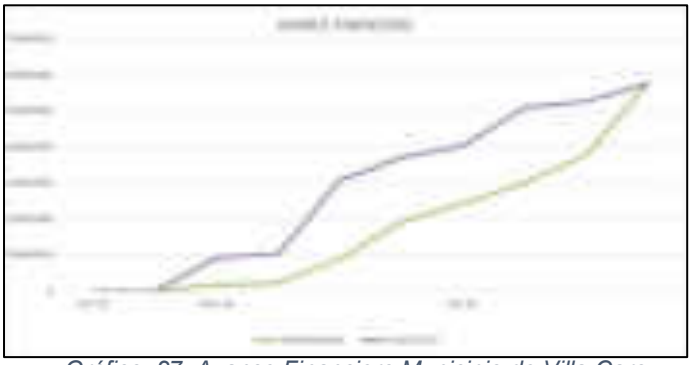


Gráfico 27 Avance Financiero Municipio de Villa Caro

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

7. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

8. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

9. Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

10. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

11. Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

12. Continuar solicitando al contratista de obra, la entrega inmediata de la reprogramación de obra y flujos de caja, a la fecha no ha entregado la información solicitada, y por parte de la interventoría se requiere continuar haciendo un seguimiento estricto a las actividades programadas y ejecutadas.

13. Continuar verificando las distintas actas de modificación de los contratos que conforman el convenio.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:

A la fecha de corte del presente Informe, se han finalizado 10 convenios su ejecución de obras y se tienen en ejecución 01 de los 11 Convenios interadministrativos suscritos con el INVIAS, el convenio de Gobernación 1943 se encuentra en etapa de ejecución de actividades de obra de placa huella y alcantarillas. Los convenios de Abrego 1791 y Gobernación 2033 (Villa Caro), finalizaron el 31 de diciembre de 2024.

El convenio de Ocaña 1758, su ejecución termino el 31 de julio de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución. Se firmó el acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

El convenio de Herrán 1861, su ejecución termino el 30 de diciembre de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución. Se firmo acta de liquidación el 15 de octubre de 2024.

El convenio de Pamplonita 1878, su ejecución termino el 30 de mayo de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución, se firmó acta de liquidación el 08 de enero de 2025.

El convenio de Santiago 1821, su ejecución termino el 15 de junio de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución, se firmó acta de liquidación el 05 de diciembre de 2025.

El convenio de Ocaña 1814, su ejecución termino satisfactoriamente el 24 de agosto de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución, se firmó acta de liquidación el 24 de diciembre de 2025.

El convenio de La Playa de Belén 1863, su ejecución termino satisfactoriamente el 26 de agosto de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución, se firmó acta de liquidación el 23 de diciembre de 2025.

El convenio de Abrego 1971, su ejecución termino satisfactoriamente el 31 de diciembre de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución, está en proceso de liquidación.

El convenio de Gobernación 2052, su ejecución termino el 30 de agosto de 2024, por lo cual el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Cáchira 1859, finalizo su tiempo contractual el 30 de julio de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución, se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2025.

Del convenio Gobernación 2033, los contratos de los municipios de Gramalote, Santiago, Herrán, Mutiscua, Pamplonita, Cáchira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia, Villa Caro finalizaron las actividades de obra.

Por lo anterior, únicamente se presentan reportes de obra para los contratos del municipio Gobernación-1943.

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO

El día 18 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. LP-OP-001- 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER y su ejecución finalizo el 15 de junio de 2024. El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA No. Póliza 475 47 994000054633 y 475 74 994000009416.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	29/07/2022	29/03/2023
Suspensión y Reinicio 1.			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2023

Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/07/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	03/07/2023	03/01/2024
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/05/2024

Tabla 98 Garantías Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN

El día 19 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 146 de 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRÁN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, y su ejecución finalizo el 30 de diciembre de 2024. El acta de liquidación se firmó el 15 de octubre de 2015.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A No. Póliza 49-40-101009041 y 49-44-101028950.

Igualmente, a la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación, y se deberá ajustar las garantías con fechas finales de actas de cobro y recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	27/09/2022	27/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/09/2022	27/12/2025
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	27/09/2022	30/12/2022
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/05/2026
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/05/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/07/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/01/2027
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/01/2024

Tabla 99 Garantías Municipio de Herrán

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758

El día 01 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3879052, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, y su ejecución finalizo el 30 de julio de 2024. Se firmo acta de liquidación el día 06 de septiembre de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CG-1037616 y No. CG-1008105.

Pólizas Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Pólizas Inicio Contrato			
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/02/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo 10/02/2028	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	27/04/2023	30/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	30/06/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/06/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	20/06/2023	01/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	01/08/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	

Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/07/2023

Tabla 100 Garantías Municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA

El día 16 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 160-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, durante el periodo se adelantan actividades de construcción de placa huella. El presente contrato se liquidó el 27 de diciembre de 2024.

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza 1000227435 y 100052635.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	04/10/2022	04/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	04/10/2022	04/02/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	16/11/2022	16/03/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	05/07/2023	10/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	05/07/2023	10/07/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	10/10/2022	10/11/2023

Tabla 101 Garantías Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO

El día 16 de enero de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 252-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. Se encuentra en liquidación, finalizó el 31 de diciembre de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO No. Póliza 21-44-101400517 y 21-40-101201370.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	24/11/2022	24/07/2023
Prorroga 1 y Adicción 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	16/04/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	16/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	15/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	15/12/2023
Suspensión 1 y Reinicio 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/05/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	29/01/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	31/01/2024
Modificatorio 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/10/2024

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	30/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 520.000.000	16/01/2023	31/06/2024

Tabla 102 Garantías Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA

El día 06 de marzo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra LP-004-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. El contrato de obra finalizo el 26 de agosto de 2024 y se liquido el 23 de diciembre de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora HDI SEGUROS No. Póliza 4001580 y 4007857.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/08/2028
Calidad del servicio	$ 220.309.139.30	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	232.000.000	27/01/2023	27/08/2023

Tabla 103 Garantías Municipio de La Playa

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El día 14 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 202 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. El contrato de obra finalizo el 30 de mayo de 2024 y se encuentra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora NACIONAL DE SEGUROS No. Póliza 400047393 y 400047383.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
PRORROGA No. 02			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	27/02/2024	30/09/2027
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024

Tabla 104 Garantías Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943

El día 10 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02590 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS. Se encuentran activos todos los frentes de obra.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
83	27/12/2024 a 02/01/2025
84	03/01/2025 a 09/01/2025
85	10/01/2025 a 16/01/2025
86	17/01/2025 a 23/01/2025
87	24/01/2025 a 30/01/2025

Tabla 105 Reporte informes semanales Gobernación 1943

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25 de julio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpilar-2016	7855 kg
Motoniveladora	Caterpilar-2015	13500 kg
Bulldozer	Komatsu d61ex 2006	3,8 M3
Bobcat	S570- 2018	947 kg
Compactador min 7 Ton	Caterpilar-2015	7 TON
Dumper AUSA	D600APG	6000 KG
Volqueta 1	Internacional 2012	6 M3
Volqueta 2		6 M3

Tabla 106 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
3	FRANKLYN AARON GIRALDO	LOGÍSTICA	79685180	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCÍA	COMPRAS	1090497738			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
6	JHONATAN ALEXIS HERNÁNDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1004877143			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
7	WILLIAM PACHECO	OPERADOR DE MAQUINARIA	13392290	RETIRO	30/10/2024	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	ARISTOBULO ZABALA	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
9	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFÍA	1007909639			UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
10	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
12	CESAR ANDRÉS CÁRDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
13	EDWAR HERNÁNDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	RETIRADO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
14	DARLY JUDITH RODRÍGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
15	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO		INDEPENDIENTE	TODO EL PROYECTO
16	HÉCTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
17	FREDIS JOSÉ SUAREZ VILLALBA	TOPÓGRAFO	1101387669	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
18	LUIS EDUARDO GARCÍA PALACIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093761965	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
19	ELIAN ALEXIS CARRILLO	OPERADOR	1007953522	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
20	WILLIAM JOEL FLÓREZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005543179	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
21	ÁLVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERÍA	1094427632	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
22	ANGELICA CAROLINA LÓPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
23	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
24	DANIEL STEVEN CÁRDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
25	FERNANDO SOTO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093789563	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
26	GEOVANY ORTIZ	AUX INGENIERÍA	1090515100	RETIRO	31/10/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
27	CARLOS ALBERTO LAGUADO RODRÍGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1092646457	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
28	ÁLVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERÍA	1094427632	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
29	JUAN DE JESÚS MARCIALES	OPERADOR DE MAQUINARIA	1092645215	INGRESO	05/11/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
30	JESÚS MANUEL CASERES	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093795633	ACTIVO	15/10/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	DOUGLA URIBE TORRES	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
2	EUGENIO URIBE MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	7618618	13/06/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
3	HEILER PÉREZ	AYUDANTE DE OBRA	PT1168414	ACTIVO		SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
4	JESÚS SIERRA	AYUDANTE DE OBRA	1007444967	RETIRADO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
5	ÁLVARO CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13413081	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
6	ÁNGEL MARÍA JAIMES	AYUDANTE DE OBRA	13412578	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
7	DOUGLAS URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	14/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
8	RONALD SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA	1092644428	1/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
9	YOSSER CARVAJAL	AYUDANTE DE OBRA	1004941773	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
10	DIEGO JESÚS BOHADA	AYUDANTE DE OBRA	1092644511	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
11	LUIS ÁNGEL ANTOLÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645613	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
12	FABIO URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1098621938	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
13	FRANCISCO SANDOVAL	AYUDANTE DE OBRA	1090462244	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
14	RAMON GELVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647522	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
15	EUGENIO MARTÍNEZ MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	7618618	ACTIVO		SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
16	EDWIN ENRIQUE HOYOS	AYUDANTE DE OBRA	1096183008	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
17	FRANKI BRAVO DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1068577126	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
18	CESAR AUGUSTO DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1063153505	ACTIVO	11/09/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
19	CRISTIAN ANDRÉS BRAVO	AYUDANTE DE OBRA	1003066670	ACTIVO		SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
20	JESÚS ENRIQUE LÓPEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645869	13/06/2024	07/09/2024	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
21	CARLOS ANDRÉS BAUTISTA	AYUDANTE DE OBRA	1093414104	17/06/2024		SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
22	DARÍO PASCUAL GARCÍA	AYUDANTE DE OBRA	1005011416	ACTIVO	01/07/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
23	EDWIN SANTIAGO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644912	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
24	GERSON JAVIER GARCÍA	AYUDANTE DE OBRA	1091353753	ACTIVO	01/07/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
25	JOSÉ FERNANDO CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	1007444989	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
26	JOSÉ GREGORIO MOYA	AYUDANTE DE OBRA	7175554	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
27	JUAN CARLOS VEGA	AYUDANTE DE OBRA	88168922	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
28	MARCO BARRIENTO	AYUDANTE DE OBRA	88252815	ACTIVO	01/07/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
29	EDUARD CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA	1092646081	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
30	SERGIO GUTIÉRREZ	AYUDANTE DE OBRA	1090505404	08/06/2024	RETIRADO	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
31	AUGUSTO MEDINA	AYUDANTE DE OBRA	1653558	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
32	FREDY MONCADA	AYUDANTE DE OBRA	13412374	08/06/2024	RETIRADO	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
33	JAVIER COLMENARES	AYUDANTE DE OBRA	4535674	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
34	JHON DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1092644442	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
35	MANUEL BUSTOS	AYUDANTE DE OBRA	13412179	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
36	ADRIÁN ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	1092644875	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
37	LUIS ALBERTO RUIZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645020	08/07/2024		CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
38	JESÚS DIAZ GALVIS	AYUDANTE DE OBRA	1092644524	22/08/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
39	GERMAN ALIRIO GELVEZ ORTEGA	AYUDANTE DE OBRA	1094242516			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
40	JOSÉ RICARDO LAGUADO LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	88179263			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
41	HUGO RAMON PEÑALOZA	AYUDANTE DE OBRA	1004941337			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
42	ABEL ANTONIO CARVAJAL PABÓN	AYUDANTE DE OBRA	1004941319			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
43	JOSÉ NICASIO VILLAMIZAR LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	13411728			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
44	DIOMEDES BAUTISTA PADILLA	AYUDANTE DE OBRA	1092646678			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
45	HEYSON CONTRERAS CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1004941117			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
46	ERIKSON FABIAN GARCÍA PARADA	MAESTRO DE OBRA	1093884815			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
47	BISMARK MORA	AYUDANTE DE OBRA	1095799437	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
48	ERASMO MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73583603	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
49	JHON JAIRO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1085100485	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
50	JOSÉ ANTONIO MORA	AYUDANTE DE OBRA	1051747008	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
51	JOSÉ DE JESÚS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1002426166	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
52	JOSÉ DE LOS SANTOS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1131359803	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
53	JOSE BELEÑO GUTIÉRREZ	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
54	LUIS FERNANDO ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1131359342	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
74	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ	AYUDANTE DE OBRA	1002304255	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
75	RAFAEL MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73584569	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
76	SATURNINO MORA	AYUDANTE DE OBRA	73592013	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
77	JOSÉ DE LA HOS BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
78	YULIS PAOLA BEÑEO	AYUDANTE DE OBRA	1065660929	10/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
79	JOSÉ DEL CARMEN VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13481520	18/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
80	YOMEL FERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6202934	18/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
81	YONATHAN HERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
82	ANGELICA CAROLINA LÓPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA 2590	PATIOS
83	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA 2590	PATIOS
84	DANIEL STEVEN CÁRDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA 2590	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
85	LUZ DARY RUBIO ORTEGA	RESIDENTE SISO	1093413884	ACTIVO	13/07/2024	SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
86	JORGE ELIECER GÓMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1115793688	ACTIVO		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
87	JUAN CARLOS GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	1116791522	ACTIVO		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
88	JHOAN SEBASTIÁN OSPINO	AYUDANTE DE OBRA	1098699992	ACTIVO		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
89	EDER VANEGAS ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1051743874	10/08/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
90	CRISTIAN DANIEL FULEDAS	AYUDANTE DE OBRA	1007883115	10/08/2024		SUBCONTRATISTA JOSÉ BELEÑO	PATIOS
91	HENRY JAVIER AGUILLON CÁCERES	AYUDANTE DE OBRA	5455903	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
92	DEYNER JAVIER AGUILLÓN CRIZ	AYUDANTE DE OBRA	1092525258	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
93	NEFTALI ARÉVALO NAVARRO	AYUDANTE DE OBRA	88001685	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
94	FRANCISCO GABRIEL CELIS CAICEDO	AYUDANTE DE OBRA	1193443662	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
95	JOSÉ ASCENCION CRUZ GRIMALDOS	AYUDANTE DE OBRA	13411827	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
96	ALEXIS EDUARDO GUTIERREZ ALEJOS	AYUDANTE DE OBRA	5179902	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
97	LUIS JAVIER MORILLO ALEJO	AYUDANTE DE OBRA	6316312	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
98	JOSE GREGORIO PADRON LIRA	AYUDANTE DE OBRA	6996284	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
99	CRISTIAN STIVEN RODRIGUEZ OJEDA	AYUDANTE DE OBRA	1093741724	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS
100	ANCIZAR HENAO OSORIO	AYUDANTE DE OBRA	10238188	14/01/2025		SUBCONTRATISTA BRENDA CÁCERES	PATIOS

Tabla 107 Reporte afiliaciones a seguridad social
Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha prestado cuatro actas de recibo parcial de obra.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA						
ACTA No.	**TIPO DE ACTA**	**MES-AÑO**	**VALOR ACTA SIN IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
1	PARCIAL	abr-24	$ 2.057.114.694,00	$ 30.400.000,00	$ 2.087.514.694,00	$ 2.087.514.694,00
2	PARCIAL	may-24	$ 1.410.068.530,00		$ 1.410.068.530,00	$ 3.497.583.224,00
3	PARCIAL	jun-24	$ 2.160.465.319,00		$ 2.160.465.319,00	$ 5.658.048.543,00

4	PARCIAL	jul-24	$ 1.565.952.191,00		$ 1.565.952.191,00	$ 7.224.000.734,00
5	PARCIAL	ago-24	$ 3.061.424.966,00		$ 3.061.424.966,00	$ 10.285.425.700,00
6	PARCIAL	oct-24	$ 3.030.122.314,00		$ 3.030.122.314,00	$ 13.315.548.014,00
7	PARCIAL	nov-24	$ 2.711.691.954,77	$15.168.067,23	$ 2.726.860.022,00	$ 16.042.408.036,00
8	PARCIAL	dic-24	$ 3.066.810.473,77	$15.168.067,23	$ 3.081.978.541,00	$ 19.124.386.577,00
TOTAL			$ 19.063.650.442,54	$ 60.736.134,46	$ 19.124.386.577,00	$ 19.124.386.577,00

Tabla 108 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403451 y 21-40-101203708.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/12/2026

Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/12/2023
Prorroga 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/06/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/06/2024
Prorroga 01 Modificación 01			
Valor Asegurado	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/12/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/08/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/08/2024
Prorroga 02			
Valor Asegurado	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	$ 2.446.302.732,60	10/04/2023	30/04/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 4.892.605.465,20	10/04/2023	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 7.338.908.197,80	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 611.575.683,15	10/04/2023	31/12/2024
Prorroga 03			

Valor Asegurado	Valor Asegurado	Valor Asegurado	Valor Asegurado
Cumplimiento	$ 2.446.302.732,60	10/04/2023	28/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 4.892.605.465,20	10/04/2023	28/02/2028
Calidad del servicio	$ 7.338.908.197,80	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 1.223.151.366,30	10/04/2023	28/02/2025

Tabla 109 Garantías Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad se encuentra aprobado con comunicado GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24 de noviembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación de obra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Para el presente Informe, el contrato de obra se encuentra suspendido hasta el 20 de febrero de 2024.

Acta de Reunión	Fecha
82	08/01/2025
83	10/01/2025
84	13/01/2025
85	23/01/2025

Tabla 110 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CCT-100004561 y CCT-100001101.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/06/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/06/2023
Adicional No. 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	10/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	10/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	11/05/2023	31/12/2023

Tabla 111 Garantías Gobernación 2052

4.9. PROYECTO OCAÑA 1814

El día 02 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4352407, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. El contrato finalizo el 24 de agosto de 2024 y liquido el día 24 de diciembre de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403960 y 21-40-101204283.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 249.998.913,90	29/12/2022	28/08/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 124.999.456,95	29/12/2022	28/04/2026
Calidad del servicio	$ 249.998.913,90	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	29/12/2022	29/04/2023

Tabla 112 Garantías Municipio de Ocaña 1814

4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164 – 2022, celebrado entre la gobernación de Norte de Santander y la Empresa Industrial y Comercial del Estado FARO del Catatumbo S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE	CD-FC-062-2023	7/11/2023

SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022		
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	14/06/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-071-2023	05/08/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-049-2024	18/10/2024

4.10.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías para los contratos de obra.

CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/08/2023	07/02/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024
CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/11/2023	03/02/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	27/02/2024
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/03/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/11/2026
Calidad del servicio	$ 197.190.841,58	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	17/08/2023	17/11/2023
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/02/2027
Calidad del servicio	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	07/02/2024

Tabla 113 Garantías Gobernación 2033

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	1053 de 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.
Contratista:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Representante legal	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Fecha de Inicio:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
Plazo acumulado:	VEINTISIETE (27) MESES
Valor Inicial:	$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Adición No. 1	$ 268.536.435,20 M/CTE
Adición No. 2	$ 500.000.000,00 M/CTE
Valor Total:	$ 5.056.701.345,20 M/CTE
Nueva de terminación:	28 DE FEBRERO DE 2025

Tabla 114 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se muestra un resumen detallado de las actividades realizadas por el interventor por cada municipio, correspondiente a este periodo.

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022.

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos

necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0023-25	16/01/2025	REITERACIÓN COMUNICADOS NO. GIC-INVIAS-NTS-1635-24, GIC-INVIAS-NTS-1438-24 y GIC-INVIAS-NTS-1232-24 "SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO."

Tabla 115 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Santiago

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría realizó actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0020-25	16-ene-25	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1758 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.

Tabla 116 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Herrán

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0022-25	16-ene-25	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1814 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.

Tabla 117 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Ocaña - 1758

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A

Tabla 118 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Cáchira

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0001-25	7-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO No. OFC-CADV-GIC-100-2024 CON ASUNTO "RESPUESTA OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-1665-24 APROBACIÓN CON OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA CORREDOR 2."
GIC-INVIAS-NTS-0005-25	7-ene-25	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-114-2024 CON ASUNTO: INFORME FINAL SST DICIEMBRE 2024 - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0021-25	16-ene-25	REITERACIÓN COMUNICADOS No. GIC-INVIAS-NTS-1641-24 y No. GIC-INVIAS-NTS-1436-24 "SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1791 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE ABREGO"

GIC-INVIAS-NTS-0042-25	28-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO No. OFC-CADV-GIC-085 -2024 CON ASUNTO "ENTREGA SUBSANACIÓN OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 1." - APROBACIÓN.

Tabla 119 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0025-25	16-ene-25	REITERACIÓN COMUNICADO No. GIC-INVIAS-NTS-1634-24 CON ASUNTO "SOLICITUD REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1863 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN."

Tabla 120 Trazabilidad oficios enviados del municipio de La Playa

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0026-25	16-ene-25	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1878 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE PAMPLONITA.

Tabla 121 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Pamplonita

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0003-25	7-ene-25	RESPUESTA OFICIO UTET-02590-434 CON ASUNTO: INFORMES SST DICIEMBRE 2024 - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0014-25	14-ene-25	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-425 CUYO ASUNTO ES "COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1268-24 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA TRAMO 5 VEREDA SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS." OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-0015-25	15-ene-25	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE ENERO DE 2025
GIC-INVIAS-NTS-0016-25	15-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-406 CON ASUNTO: SOPORTES PARA COBRO DEL PLAN GUIA A LA ADAPTACIÓN AMBIENTAL (PAGA).
GIC-INVIAS-NTS-0017-25	16-ene-25	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-426 CUYO ASUNTO ES "COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1279-24 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA VEREDA VOLCÁN TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS." - OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-0019-25	16-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-443 – OBSERVACIONES REPROGRAMACIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL ADICIONAL No3 EN TIEMPO.
GIC-INVIAS-NTS-0027-25	16-ene-25	REITERACIÓN COMUNICADOS No. GIC-INVIAS-NTS-1441-24, GIC-INVIAS-NTS-1441-24 y No. GIC-INVIAS-NTS-1237-24 SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1943 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.
GIC-INVIAS-NTS-0034-25	17-ene-25	SOLICITUD ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA – EJECUCIÓN OBRAS HIDRÁULICAS FALTANTES POR EJECUTAR.
GIC-INVIAS-NTS-0037-25	24-ene-25	RESPUESTA OFICIO UTET-02590-445, CON ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA N° 04 AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.
GIC-INVIAS-NTS-0043-25	28-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-444 - APROBACIÓN REPROGRAMACIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL ADICIONAL 03 EN TIEMPO.

Tabla 122 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943

5.2.8.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** El contratista continua realizado entrega y/o subsanaciones de los 6 componentes de diseño a revisar Topografía (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California) Diseño Geométrico (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California , Estudio de suelos y pavimentos (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California), Diseño estructural (Vereda Rinconada), Informe hidráulico (Santo Domingo, Chicagua, Rinconada, Corozal - California), a la fecha continúa avalando las aprobaciones a los mismos una vez revisado por parte de los especialistas.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales.

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra para el municipio de Arboledas y Los Patios con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0029-25	16-ene-25	REITERACIÓN COMUNICADO No. GIC-INVIAS-NTS-1637-24, GIC-INVIAS-NTS-1442-24 y No. GIC-INVIAS-NTS-1238-24 SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2052 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.

Tabla 123 Trazabilidad oficios enviados a la Gobernación 2052

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0022-25	16-ene-25	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1814 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.

Tabla 124 Trazabilidad oficios enviados al municipio de Ocaña - 1814

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos

necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
GIC-INVIAS-NTS-0004-25	7-ene-25	RESPUESTA OFICIO G&P-CD-FC-049-2024-019 CON ASUNTO: APROBACIÓN INFORMES CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE E INFORME FINAL 2024	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS Gerente FARO DEL CATATUMBO SAS Gobernación 2033 Ingeniera GILMA PINTO JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS Cúcuta – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-0018-25	16-ene-25	RESPUESTA A OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-027 CON ASUNTO “ENTREGA DE PLANOS RÉCORD” – OBSERVACIONES.	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Contratista Cúcuta Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-0028-25	16-ene-25	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2033 de 2021.	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Avenida 5 Calle 13 y 14 esquina. Cúcuta, Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-0040-25	27-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO No. G&P-CD-FC-049-2024-016 con asunto “CORRECCIÓN TOPOGRAFÍA Y SUELOS Y PAVIMENTOS”– TOPOGRAFÍA APROBACIÓN.	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora

			GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-0045-25	28-ene-25	RESPUESTA A COMUNICADO SCCVN-CD-FC-081-2023-0017 CON ASUNTO: ENTREGA FINAL DE REPORTES TRIMESTRALES DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL - APROBACIÓN - MUTISCUA	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-0050-25	30-ene-25	RESPUESTA OFICIO SCCY-071-017 CON ASUNTO “INFORME SOCIAL PERIODO OCTUBRE a NOVIEMBRE”- APROBACIÓN, COMPONENTE SOCIAL	Ingeniero DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista Gramalote – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-0051-25	30-ene-25	RESPUESTA A OFICIO SCCY-071-013 DE LA ENTREGA INFORME SOCIAL PERIODO 2	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-0052-25	30-ene-25	RESPUESTA A OFICIO G&P-CD-FC-049-2024-013 Y G&P-CD-FC-049-2024-017 DE LA ENTREGA INFORMES MENSUALES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniera GILMA PINTO JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO

			CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS Cúcuta – Norte de Santander

Tabla 125 Trazabilidad oficios enviados de la Gobernación 2033

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS

A continuación, se muestra un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor, al Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
GIC-INVIAS-NTS-0002-25	7-ene-25	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander
GIC-INVIAS-NTS-0006-25	8-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CD-FC-058-2023, MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0007-25	8-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-099991 SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-077-2023, “MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER”	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0008-25	9-ene-25	SOPORTES ACTA DE COSTOS NO. 28 E INFORME MENSUAL No. 27 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024.	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander

			Av. Demetrio Mendoza # 21-105 Cúcuta.
GIC-INVIAS-NTS-0009-25	10-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CD-FC-067-2023, "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER."	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0010-25	13-ene-25	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander
GIC-INVIAS-NTS-0011-25	13-ene-25	RESPUESTA A COMUNICADO 2024S-VBOG-099982 SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-067-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0013-25	13-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-100430 - SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL N. CONTRATO CD-FC-071-2023 "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES – GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER".	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0030-25	17-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CONTRATO CD-FC-082-2023 "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER.". - FARO	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vías Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0031-25	17-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CTO. CD-FC-081-2023, MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA –	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales

		LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0032-25	17-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - LP-OP-01-2022, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA RURAL CUPERENA – ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0033-25	17-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA – contrato de obra No. 202 DE 2022 con objeto "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS"	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0035-25	20-ene-25	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander
GIC-INVIAS-NTS-0036-25	21-ene-25	NO GENERACIÓN DE PASIVOS Y PENDIENTES AMBIENTALES.	Doctor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0038-25	24-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0039-25	24-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA – CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –

		MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.”	INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0041-25	28-ene-25	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander
GIC-INVIAS-NTS-0044-25	28-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-099071 SUBSANANDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-081-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARADITA - LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER”.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0046-25	28-ene-25	ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-0044-25, RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-099071 SUBSANANDO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-081-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL - LA ARADITA - LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER”.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0047-25	28-ene-25	RESPUESTA COMUNICADOS 2024S-VBOG-050170 y 2024S-VBOG-044343; ENTREGA INFORMES MENSUALES, TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO DEL PROYECTO LOURDES - APROBACIÓN, COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C
GIC-INVIAS-NTS-0048-25	29-ene-25	ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-0047-25; RESPUESTA COMUNICADOS 2024S-VBOG-050170 y 2024S-VBOG-044343; ENTREGA INFORMES MENSUALES, TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO DEL PROYECTO LOURDES - APROBACIÓN, COMPONENTE SOCIAL	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C

Tabla 126 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS

5.2.10. Actividades administrativas

Durante el periodo del presente informe las actividades administrativas realizadas por la Interventoría fueron:

- ✓ Presencia permanente del Personal de la interventoría (director, Especialistas, coordinadora de proyectos, Residentes e Inspectores), realizando labores administrativas y técnicas, atendiendo las solicitudes del contratista, entidad contratante y Municipio.

- ✓ Seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida por el contratista de obra.

- ✓ Elaboración de informes semanales y presentados al INVIAS.

- ✓ Coordinación de reuniones y mesas de trabajo con el Contratista, Especialista e INVIAS.

- ✓ Elaboración de Informes semanales, mensuales y Actas de costos.

5.2.11. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ La Interventoría ha realizado revisión a Estudios y Diseños de los Municipios de Gobernación 1943.

- ✓ La Interventoría ha realizado seguimiento a las actividades realizadas en campo en los municipios del convenio de la Gobernación 1943.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión a las actividades de obra de los municipios del convenio de la Gobernación 1943 en la construcción de Placa Huella y Alcantarillas.
- ✓ Cuantificación de cantidades de las obras que se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe.
- ✓ Reporte de bitácora para el contrato en ejecución.
- ✓ Seguimiento de calidad de los materiales a través de ensayos de laboratorio los cuales deben cumplir con las especificaciones del INVIAS.

5.2.12. Actividades financieras

El contrato de Interventoría a la fecha del presente informe, ha presentado al INVIAS las cuentas que se describen en la siguiente tabla.

CONTROL FINANCIERO							
Acta No.	**PERIODO**	**VALOR FACTURA**	**RADICADO INVIAS**	**RADICADO INVIAS EN CUENTAS POR PAGAR**	**ESTADO**	**No. FACTURA**	**FECHA DE PAGO**
1	Sep-22	$ -	-	-		-	
2	oct-22	$ 18.224.516,80	126144 DE 21-11-2022	135914 de 13/12/2022	PAGA	FE 402 del 06/12/2023	7/02/2023
3	nov-22	$ 21.768.789,00	133999 del 7/12/2022	138491 de 16/12/2022	PAGA	FE 407 del 13/12/2022	14/02/2023
4	dic-22	$ -	-	30405 de 28/03/2023		-	
5	ene-23	$ 133.892.136,00	25494 del 15/03/2023	30405 de 28/03/2023	PAGA	FE 472 del 23/03/2023	24/04/2023
6	feb-23	$ 143.926.977,60	31127 del 29/03/2023	51262 de 24/05/2023	PAGA	FE 514 (nota crédito)- 24/05/2023 FE 516 (RADICADA)- 26/05/2023	21/07/2023
7	mar-23	$ 188.412.604,80	V0 - 46080 del 10/05/2023 V1 - 59596 del 20/06/2023	80426 de 22/08/2023	PAGA	FE 556 del 18/08/2023	30/08/2023

8	abr-23	$	143.904.748,40	V0 - 59624 del 20/06/2023 V1 - 65006 del 05/07/2023	80425 de 22/08/2023(Glosada) 82649 de 05/10/2023	PAGA	FE 557 del 18/08/2023	17/10/2023
9	may-23	$	127.024.217,60	71779 del 24/07/2023	81576 de 13/09/2023	PAGA	FE 571 del 12/09/2023	20/09/2023
10	jun-23	$	152.688.662,00	V0 - 23/08/2023 V1 - 06/09/2023 V2 - 03/10/2023	82864 el 10/10/2023	PAGA	FE 594 del 09/10/2023	13/10/2023
11	jul-23	$	163.215.045,00	2023E-VUVRAZ-009683 - 15/09/2023 V1 - 03/10/2023	83561 el 24/10/2023	PAGA	FE 599 del 24/10/2023	7/11/2023
12	ago-23	$	165.630.388,00	2023E-VUVRAZ-014289 - 29/09/2023	83750 el 27/10/2023	PAGA	FE 603 del 27/10/2023	2/11/2023
13	Sep-23	$	179.467.708,00	2023E-VUVRAZ-022099 - 25/10/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-025631 - 07/11/2023	84658 el 10/11/2023	PAGA	FE 618 del 10/11/2023	21/11/2023
14	oct-23	$	198.631.706,00	2023E-VUVRAZ-028858 - 16/11/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-031862 - 27/11/2023	86428 el 04/12/2023	PAGA	FE 640 del 04/12/2023	20/12/2023
15	nov-23	$	173.212.500,80	2023E-VUVRAZ-033952 - 1/12/2023	87087 el 07/12/2023	PAGA	FE 650 del 07/12/2023	20/12/2023
16	dic-23	$	268.536.436,00	2023E-VUVRAZ-040497 - 21-12-2023	89506 el 21/12/2023	PAGA	FEM 666 del 21/12/2023	
17	ene-24	$	271.165.700,41	2024E-VUVRAZ-025474 - 2024-03-20	3738 el 07/05/2024	PAGA	FEM 712 24/04/2024	
18	feb-24	$	261.502.976,00	2024E-VUVRAZ-026211 - 2024-03-21	3735 el 07/05/2024	PAGA	FEM 713 24/04/2024	
19	mar-24	$	230.895.621,60	2024E-VUVRAZ-034008 - 17-04-2024	4794 el 27/05/2024	PAGA	FEM 719 24/05/2024	
20	abr-24	$	239.569.064,38	2024E-VUVRAZ-045350 - 21-05-2024	5332 el 06/06/2024	PAGA	FEM 722 05/06/2024	
21	may-24	$	278.413.692,20	2024E-VUVRAZ-054894 18-06-2024	6645 el 27/06/2024	PAGA	FEM 738 26/06/2024	
22	jun-24	$	262.954.801,89	2024E-VUVRAZ-063264 11-07-2024	7888 el 25/07/2024	PAGA	FEM 749 24/07/2024	
23	jul-24	$	262.954.801,89	2024E-VUVRAZ-075481	10236 el 04/09/2024	PAGA	FEM 764 02/09/2024	
24	Ago-24	$	234.430.238,00	5 septiembre de 2024	13096 el 16/10/2024	FACTURA DEFINITIVA	FEM 775 16/09/2024	
25	Sep-24	$	226.761.640,00	2024E-VUVRAZ-098214 05-10-24	14397 el 05/11/2024	FACTURA DEFINITIVA	FEM 809 05/11/2024	
26	Oct-24	$	205.905.652,40	2024E-VUVRAZ-11088106/11/24	16969 el 02/12/2024	FACTURA DEFINITIVA	FEM 809 05/11/2024	
27	Nov-24	$	190.809.360,00	2024E-VUVRAZ-123154 04/12/24		FACTURA DEFINITIVA	FEM 809 05/12/2024	
27	Dic-24	$	157.984.400,00	2024E-VUVRAZ-12421705/12/24		FACTURA DEFINITIVA	FEM 843 13/12/2024	
	TOTAL	$	4.885.242.208,08					

Tabla 127 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2.13. Informes especialistas y profesionales

A la fecha del presente informe, se ha adelantado revisión a estudios y diseños, para este mes el contrato de obra no contaba con los recursos para la continuidad de sus especialistas.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

La Interventoría a la fecha cuenta con los siguientes vehículos en el proyecto:

Vehículo	Placa	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Renault Duster Dynamique	ENM-086	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Motocicleta	HPS38F	DT-NSA 30822 -31-05-2023	100%
Motocicleta	GRF92G	2023S-VNSA-028800 - 14-12-2023	100%

Tabla 128 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

La Interventoría cuenta con el siguiente personal en el Proyecto:

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE ENERO DE 2025		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Jairo Andrés Quintero Gómez	Director de Interventoría	100%
José Hildebrando Torres Suarez	Residente Interventoría	100%
Diego Mauricio Camargo Gómez	Ingeniero Auxiliar De Interventoría	100%
Juan Alex Díaz	Profesional Ambiental	50%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE ENERO DE 2025		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Shirle Adriana Lizarazo Rincón	Inspectora SST	50%
Diana Marcela Alfonso Fuente	Secretaria	100%
Jesús Manuel Silva Martínez	Conductor	100%
Cristian Aleizer Rivera Cáceres	Inspector de Intv. Los Patios	100%
Paola Andrea León Pacheco	Profesional Social	50%
Rubiel Eugenio Espitia	Inspector Arboledas	100%

Tabla 129 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

A continuación, se hace un resumen del estado financiero y presupuestal del contrato de Interventoría.

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	sep.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 40.000.000,00	$5.056.701.345,20
2	oct.-22	$ 15.314.720,00	$ 2.909.796,80	$ 18.224.516,80	931422 - 2022/08/22	$ 1.775.483,20	$5.038.476.828,40
3	nov.-22	$ 18.293.100,00	$ 3.475.689,00	$ 21.768.789,00	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40
4	dic.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40
5	ene.-23	$ 5.625,38	$ 1.068,82	$ 6.694,20	931422 - 2022/08/22	$ -	$5.016.701.345,20
5	ene.-23	$ 112.508.774,62	$ 21.376.667,18	$ 133.885.441,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.636.114.558,20	$4.882.815.903,40
6	feb.-23	$ 120.947.040,00	$ 22.979.937,60	$ 143.926.977,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.492.187.580,60	$4.738.888.925,80
7	mar.-23	$ 158.329.920,00	$ 30.082.684,80	$ 188.412.604,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.303.774.975,80	$4.550.476.321,00
8	abr.-23	$ 120.928.360,00	$ 22.976.388,40	$ 143.904.748,40	148423 - 2023/02/14	$ 1.159.870.227,40	$4.406.571.572,60
9	may.-23	$ 106.743.040,00	$ 20.281.177,60	$ 127.024.217,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.032.846.009,80	$4.279.547.355,00

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
10	jun.-23	$ 128.309.800,00	$ 24.378.862,00	$ 152.688.662,00	148423 - 2023/02/14	$ 880.157.347,80	$4.126.858.693,00
11	jul.-23	$ 137.155.500,00	$ 26.059.545,00	$ 163.215.045,00	148423 - 2023/02/14	$ 716.942.302,80	$3.963.643.648,00
12	ago.-23	$ 139.185.200,00	$ 26.445.188,00	$ 165.630.388,00	148423 - 2023/02/14	$ 551.311.914,80	$3.798.013.260,00
13	sep.-23	$ 150.813.200,00	$ 28.654.508,00	$ 179.467.708,00	148423 - 2023/02/14	$ 371.844.206,80	$3.618.545.552,00
14	oct.-23	$ 166.917.400,00	$ 31.714.306,00	$ 198.631.706,00	148423 - 2023/02/14	$ 173.212.500,80	$3.419.913.846,00
15	nov.-23	$ 145.556.723,36	$ 27.655.777,44	$ 173.212.500,80	148423 - 2023/02/14	$ -	$3.246.701.345,20
16	dic.-23	$ 225.660.869,92	$ 42.875.565,28	$ 268.536.435,20	1408823 - 2023/12/20	$ 268.536.435,20	$2.978.164.910,00
17	ene.-24	$ 227.870.336,48	$ 43.295.363,93	$ 271.165.700,41	218724 - 2024/03/15	$ 2.206.999.209,59	$2.706.999.209,59
18	feb.-24	$ 219.750.400,00	$ 41.752.576,00	$ 261.502.976,00	218724 - 2024/03/15	$ 1.945.496.233,59	$2.445.496.233,59
19	mar.-24	$ 194.029.934,12	$ 36.865.687,48	$ 230.895.621,60	218724 - 2024/03/15	$ 1.714.600.611,99	$2.214.600.611,99
20	abr.-24	$ 201.318.541,50	$ 38.250.522,88	$ 239.569.064,38	218724 - 2024/03/15	$ 1.475.031.547,61	$1.975.031.547,61
21	may.-24	$ 233.961.085,88	$ 44.452.606,32	$ 278.413.692,20	218724 - 2024/03/15	$ 1.196.617.855,41	$1.696.617.855,41
22	jun.-24	$ 220.970.421,76	$ 41.984.380,13	$ 262.954.801,89	218724 - 2024/03/15	$ 933.663.053,52	$1.433.663.053,52
23	jul.-24	$ 208.967.800,00	$ 39.703.882,00	$ 248.671.682,00	218724 - 2024/03/15	$ 684.991.371,52	$1.184.991.371,52
24	ago-24	$ 197.000.200,00	$ 37.430.038,00	$ 234.430.238,00	218724 - 2024/03/15	$ 452.920.189,52	$ 952.920.189,52
25	sep-24	$ 190.556.000,00	$ 36.205.640,00	$ 226.761.640,00	218724 - 2024/03/15	$ 226.158.549,52	$ 726.158.549,52
26	oct-24	$ 173.029.960,00	$ 32.875.692,40	$ 205.905.652,40	218724 - 2024/03/15	$ 20.252.897,12	$ 520.252.897,12
27	Nov-24	$17.019.241,27	$3.233.655,84	$ 20.252.897,12	218724 - 2024/03/15	$-	$500.000.000,00
27	nov-24	$143.324.758,73	$27.231.704,16	$ 170.556.462,88	510624 - 2024/06/05	$ 329.443.537,12	$329.443.537,12
28	Dic-24	$132.760.000,00	$25.224.400,00	$ 157.984.400,00	510624 - 2024/06/05	$ 171.459.137,12	$171.459.137,12
TOTALES		**$4.105.245.553,02**	**$779.996.655,07**	**$4.885.242.208,08**		$ 171.459.137,12	$171.459.137,12

Tabla 130 Seguimiento Financiero Interventoría

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de interventoría con la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. No. Póliza 140991.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	$ 428.816.491	24/06/2022	30/06/2025

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.632.982	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 857.632.982	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.286.449.473	31/12/2024	31/12/2029
Amparo	**Valor Asegurado**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**DESDE**
ADICIÓN No.1			
Cumplimiento	$ 505.670.134,52	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.616.760,14	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.011.340.269,04	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.517.010.403,56	24/06/2022	31/12/2029
PRORROGA No.1			
Cumplimiento	$ 505.670.134,52	24/06/2022	28/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.616.760,14	24/06/2022	28/08/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.011.340.269,04	24/06/2022	28/02/2028
Calidad del servicio	$ 1.517.010.403,56	28/02/2025	28/02/2030

Tabla 131 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

La Interventoría hace entrega para revisión y aprobación del INVIAS el Plan de Calidad mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del pasado 20 de febrero de 2023.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6. Bitácora de Obra

Durante el presente periodo se han adelantado trabajos de obra en los municipios del convenio de la Gobernación 1943.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el actual periodo, correspondiente al mes número 28 de ejecución, se informa que dentro del marco contractual se han ejecutado y finalizado 10 de los 11 convenios interadministrativos planificados. Estos convenios involucran a los municipios de Santiago, Herrán, Ocaña-1758, Cáchira, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Ocaña-1814, Gobernación 2052 y Gobernación 2033. Dejando solo en etapa de construcción al convenio GOBERNACIÓN 1943.

En el municipio de Ocaña 1758, se firmó el acta de inicio el 01 de noviembre de 2022, y el contrato concluyó el 31 de julio de 2023 con la exitosa construcción de 1 alcantarilla, 520 metros lineales de Placa Huella y el parcheo de 572.69 m2. Se llevaron a cabo actividades de Parcheo y Bacheo en el sector de Juan XXIII. El acta de liquidación se firmó el día 06 de septiembre de 2024.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 19 de octubre de 2022, el contrato concluyó el 31 de diciembre de 2023, termino con éxito la ejecución de 1200 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. El acta de liquidación se firmó el día 15 de octubre de 2024.

En Pamplonita, se firmó el acta de inicio el 14 de abril, el contrato concluyo el 30 de mayo de 2024, se ejecutó en su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1770 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. El acta de liquidación se firmó el día 08 de noviembre de 2025.

En Santiago, se firmó el acta de inicio el 18 de octubre de 2022 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 3309 metros lineales de placa huella y 15 alcantarillas. Se firmó acta de liquidación el 10 de diciembre de 2024.

En Cáchira, el acta de inicio se firmó el 16 de noviembre de 2022. Cuenta con todos los componentes aprobados. El contrato finalizó con un atraso del 52.21% debido al inicio tardío de actividades por parte del contratista y a las precipitaciones constantes en la zona del proyecto, adicional que al presentarse el presunto hurto cibernético no se contaba con la totalidad de los recursos para pagarle al contratista las actividades por parte de la Alcaldía de Cachira, se ejecutaron 542 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas. El presente contrato finalizo su tiempo contractual el día 30 de julio de 2024, y se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024.

En La Playa de Belén, se firmó el acta de inicio el 06 de marzo de 2023 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1175 metros lineales de placa huella y 5 alcantarillas. Se firma acta de liquidación el 23 de diciembre de 2024.

En el contrato de la Gobernación 2052, firmado el 11 de mayo de 2023. A la fecha de este informe, el contrato termina su ejecución al 100% de su programación. Ejecutando 4004 metros lineales de Placa Huella, 22 alcantarillas terminadas y 33444.82 de mejoramiento periódico. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Ocaña 1814, se firmó el acta de inicio el 02 de mayo de 2023 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1692 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas. Se firma acta de liquidación el 24 de diciembre de 2024.

En el contrato de la Gobernación 1943, firmado el 10 de abril de 2023, el contratista cuenta con la aprobación de la mayoría de los estudios y diseños. La terminación del contrato está proyectada para el 28 de febrero de 2025. El contratista continúa ejecutando actividades de obra de placa huella en los frentes de obra, en los cuales al corte del presente informe se puede mencionar:

Municipio de Arboledas: 6568 metros lineales, 60451.44 m2 de mejoramiento periódico y 34 alcantarillas.

Municipio de Gramalote: 2900 metros lineales, 39276.66 m2 de mejoramiento periódico y 14 alcantarillas. Dando el 100% de ejecución de los tramos de placa huella.

Municipio de Los Patios: 3784,4 metros lineales, 15236.68 m2 de mejoramiento periódico y 9 alcantarillas.

En Abrego, se firmó el acta de inicio el 16 de enero de 2023 y a la fecha del presente informe se ha construido en el tramo de Santa Lucia – Canoas 1150 metros de placa huella y en el tramo 2 906.82 metros de placa huella, 13 alcantarillas en total en el proyecto, se adelanta el proceso de liquidación del contrato.

En cuanto al contrato del convenio interadministrativo de la Gobernación 2033, se cuenta con la finalización de todos los contratos de obra.

Se cuentan liquidados con todos los contratos de obra de los municipios de: Gramalote, Santiago, Cúcuta, Lourdes, Pamplonita, Cáchira, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia, Villa Caro, Herrán, Mutiscua y Puerto Santander.

En Zulia, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 325 m de placa huella y la construcción de 2 alcantarillas y el mantenimiento de 17919.81 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 12 de julio de 2024.

En Cacota, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 237 m de placa huella y el mantenimiento de 15204 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 03 de septiembre de 2024.

En Salazar, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, el contrato se prorroga 30 días, fijándose como fecha final el 16 de mayo del 2024, a fecha del presente informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 296 m de placa huella, 3 alcantarillas y 15246.17 de mejoramiento periódico. Se firmo acta de liquidación el 31 de julio de 20240.

En Pamplona, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 279 m de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 12213.14 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 12 de septiembre de 2024.

En Villa del Rosario, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 157 m de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 11468.63 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 02 de septiembre de 2024.

En San Cayetano, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 279 m de placa huella y mantenimiento de 16224.69 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 12 de julio de 2024.

En Silos, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 375 m de placa huella, 3 alcantarillas y mantenimiento de 19948.8 m2. Se firmo acta de liquidación el 12 de septiembre de 2024.

En Lourdes, donde se firmó el acta de inicio el 22 de enero de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a

320 m de placa huella, 1 alcantarilla y mantenimiento de 14387.23 m2. Se firmo acta de liquidación el 03 de diciembre de 2024.

En Ricaurte, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 270 m de placa huella y mantenimiento de 12350.14 m2. Se firmo acta de liquidación el 09 de diciembre de 2024.

En Puerto Santander, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 179.37 m de placa huella y mantenimiento de 13803.10 m2. Se firmo acta de liquidación el 13 de diciembre de 2024.

En Cáchira, donde se firmó el acta de inicio el 21 de febrero de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 385 m de placa huella, 1 alcantarilla y mantenimiento de 14387.23 m2. Se firmo acta de liquidación el 03 de diciembre de 2024.

En Pamplonita, donde se firmó el acta de inicio el 22 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 296 m de placa huella, 2 alcantarillas y mantenimiento de 16699.60 m2. Se firma acta de liquidación el 15 de octubre 2024

En Mutiscua, donde se firmó el acta de inicio el 17 de mayo de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 295 m de placa huella, 2 alcantarillas y 16201.11 m2 de mejoramiento periódico. Se firma acta de liquidación el 27 de diciembre 2024

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 14 de mayo de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 280 m de placa huella, 2 alcantarillas y 13441.69 m2 de mejoramiento periódico. Se firma acta de liquidación el 27 de diciembre 2024

En Santiago, donde se firmó el acta de inicio el 14 de junio de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 390 m de placa huella, 3 alcantarillas y 16964.05 m2 de mejoramiento. Se firmo acta de liquidación el 29 de noviembre de 2024.

En Gramalote, donde se firmó el acta de inicio el 05 de agosto de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a

360 m de placa huella, 4 alcantarillas y 15460.91 m2 de mejoramiento. Se firmo acta de liquidación el 06 de diciembre de 2024.

En Villa Caro, donde se firmó el acta de inicio el 18 de octubre de 2024, finalizó las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 267 m de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla. Se firmo acta de liquidación el 26 de diciembre de 2024.

8. ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N.A **Contratista:** N.A

Contrato de Interventoría No. 1053 DE 2022 **Interventoría:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 28 **MES O PERIODO:** ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. ____3036___ de fecha _____19/08/2022____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO
CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 18/10/2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.430.879.655,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.430.879.655,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	29	7	2022	29	3	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	29	7	2022	29	3	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475 47 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	29	7	2022	29	3	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475 74 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	7	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18	6	2023	3	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74-994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	3	7	2023	3	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47- 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18	10	2022	3	5	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

Observaciones: Los anexos de la actualización de garantias fueron enviados a la entidad contratante para la respectiva revisión y aprobación.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE HERRAN

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 19/10/2022

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.781.999.648,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.781.999.648,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	27 9 2022	27 6 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	27 9 2022	27 12 2025
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	27 9 2022	30 12 2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	5	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	19	10	2022	21	5	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19	10	2022	21	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19	10	2022	21	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 1/11/2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.711.146.620,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.711.146.620,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10	8	2022	10	6	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 85.557.331,00	10	8	2022	10	2	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	10	8	22	10	2	23
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	31/8/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10/8/2022	30/4/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	30/04/2023	30/04/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	10/8/22	10/2/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	30/10/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10/8/2022	30/6/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	30/06/2023	30/06/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	10/8/22	30/6/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	1/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10/8/2022	1/8/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	1/08/2023	1/08/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.031.481,67	10/8/22	30/7/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	1/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10/8/2022	1/8/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	31/07/2023	31/07/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 5 - Terminación

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE CACHIRA
CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 16/11/2022

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.658.435.877,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.658.435.877,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	4 10 2022	4 6 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 132,921,793,85	4 10 2022	4 2 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	4 10 22	4 2 23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	4	10	2022	10	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 132,921,793,85	4	10	2022	10	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	10	7	2023	10	7	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232,000,000	4	10	2022	10	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 16/01/2023

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.314.324.054,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.494.012.623,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/7/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	24/11/2022	24/7/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 449.401.262,30	16 1 2023	31 5 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898.802.524,60	16 1 2023	16 4 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 898.802.524,60	16 1 2023	15 12 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.348.203,90	15 9 2023	15 9 2028
Calidad de Servicio		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	16 1 2023	15 12 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 449.401.262,30	16 1 2023	20 4 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898.802.524,60	16 1 2023	20 4 2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 898.802.524,60	16 1 2023	20 12 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.348.203.786,90	15 9 2023	15 9 2029
Calidad de Servicio		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 12

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00
Otros		

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
16	1	2023		20	12	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 11

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 6/03/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

VALOR ACUMULADO: $ 2.203.091.392,61
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27	1	2023	27	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27	1	2023	27	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 440.618.278,60	6	3	2023	19	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 440.618.278,60	6	3	2023	19	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 440.618.278,60	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232.000.000,00	27	1	2023	29	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 453.724.084,80	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232.000.000,00	27	1	2023	29	4	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 453.724.084,80	6	3	2023	6	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 453.724.084,80	6	3	2023	6	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 453.724.084,80	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	27	1	2023	6	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 453.724.084,80	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
27	1	2023		26	8	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 8

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Contrato de obra suspendido

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE PAMPLONITA
CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	1	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

FECHA DE INICIO: 14/04/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.703.523.226,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.703.523.226,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	29	3	2023	29	9	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 90.000.000,00	29	3	2023	29	9	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	29	3	2023	29	9	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	27	2	2024	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	27	2	2024	30	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	30	9	2024	30	9	2029
			5 AÑOS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	14	4	2023	30	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de polizas de acuerdo con la Prorroga de Tiempo (2 meses), que se suscribio el 22 de Marzo 2024, a la fecha el contratista de obra, no ha entregada la actualización de polizas para aprobación por parte de la entidad contratante.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 02590

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 10/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2025
PLAZO ACUMULADO: 20 MESES Y 20 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 16.898.027.326,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 7.565.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 24.463.027.326,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	14.514,20
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	150.715,56
	Mejoramiento	m2	145.885,47
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	97
	Boxculvert	Und	14
	Gavion	m3	50

Se anexa Otras obras (Boxculvert) los cuales por error de edicion no se incluyeron al cuadro de alcance del mes anterior.

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	328,5	13257,60
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Corformacion	m2	0	15236,68
	mejoramiento	m2	2.570,00	115.740,11
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	6,00	56,00
	Boxculvert	Und	0,00	5,00
	Gavion	m3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 23.770.799.444,00		$ 23.770.799.444,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872.843,00		$ 171.872.843,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 386.852.974,00	$ 73.502.065,00	$ 460.355.039,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.389.525.261,00	$ 73.502.065,00	**$ 24.463.027.326,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 435.848.359,74		$ 435.848.359,74	$ 19.504.964.985,03
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				$ 45.000.000,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ 414.400.000,98
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD				$ 22.200.000,00
VALOR EJECUTADO			$ 435.848.359,74	**$ 19.986.564.986,01**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 24.463.027.326,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 19.986.564.986,01
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **81,70%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 53
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 17
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 16
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **86**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

	FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISTA GENERAL SECCION DE PKACA HUELLA LOS PATIOS



CORTE DILATACION BORDILLOS VEREDA SANTA ANITA

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN CAMPO VEREDA CINERA



MANTENIMIENTO PERIODICO (CUNETEO MEJORAMIENTO DE VIA)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpilar-2016	7855 kg	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Motoniveladora	Caterpilar-2015	13500 kg	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Bulldozer	Komatsu d61ex 2006	3,8 M3	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Bobcat	S570- 2018	947 kg	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Compactador min 7 Ton	Caterpilar-2015	7 TON	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Dumper AUSA	D600APG	6000 KG	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Volqueta 1	Internacional 2012	6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Volqueta 2		6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0		0	0	8	8	8	8		8	8	7	8	8	8		0	0	8	0	0	8		0	0	8	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	8	8	8	8		8	8	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		8	8	0	8	8	0		8	8	0	8	8

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	216	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	103	48%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	112	52%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: WILLIAM QUINTERO PABON
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL -TROJA 2590

MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.		INVIAS Y GOBERNACION	02590 DE 2022	$ 16.898.027.326	
2024	4624	MEJORAMIENTO VIAS TERCEARIAS		INVIAS Y GOBERNACION	ADICIONAL No2 TIEMPO Y VALOR	$ 7.565.000.000	
			TOTAL			$ 24.463.027.326	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 24.463.027.326,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	abr-24	$ 2.057.114.694,00	$ 30.400.000,00	$ 2.087.514.694,00						$ 22.375.512.632,00				
2	PARCIAL	may-24	$ 1.410.068.530,00	$ -	$ 1.410.068.530,00						$ 20.965.444.102,00				
3	PARCIAL	jun-24	$ 2.160.465.319,00	$ -	$ 2.160.465.319,00						$ 18.804.978.783,00				
4	PARCIAL	jul-24	$ 1.565.952.191,00	$ -	$ 1.565.952.191,00						$ 17.239.026.592,00				
5	PARCIAL	sep-24	$ 3.061.424.966,00	$ -	$ 3.061.424.966,00						$ 14.177.601.626,00				
6	PARCIAL	oct-24	$ 3.030.122.314,00	$ -	$ 3.030.122.314,00						$ 11.147.479.312,00				
7	PARCIAL	nov-24	$ 2.711.691.954,77	$ 15.168.067,23	$ 2.726.860.022,00						$ 8.420.619.290,00				
8	PARCIAL	dic-24	$ 3.066.810.473,77	$ 15.168.067,23	$ 3.081.978.541,00						$ 5.338.640.749,00				
TOTALES			**$19.063.650.442,54**	**$60.736.134,46**	**$ 19.124.386.576,00**					**$ -**	**$ 5.338.640.749,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 18.743.986.577,00		$ 18.743.986.577,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			$ -
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 319.663.865,54	$ 60.736.134,46	$ 380.400.000,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
			$ -
VALOR TOTAL	$ 19.063.650.442,54	$ 60.736.134,46	**$ 19.124.386.576,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 de 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (ARBOLEDAS)																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (GRAMALOTE)																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	20	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	735
Lluvias moderadas	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (LOS PATIOS)																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	20	22	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	732
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:
El contratista no ejecuta actividades durante el periodo

Firma
Nombre: WILLIAM QUINTERO PABON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	3/12/2024	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA HELLECHAR PIEDRA PEGADA TRAMO 1 FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2635	SI	
2	5/12/2024	MUNICIPIO DE LOS PATIOS VEREDA CALIFORNIA TRAMO 1 CONCRETO DE 14 MPA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2908	SI	
3	5/12/2024	MUNICIPIO DE LOS PATIOS VEREDA CALIFORNIA TRAMO 1 CONCRETO DE 14 MPA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2822	SI	
4	5/12/2024	MUNICIPIO DE LOS PATIOS VEREDA CALIFORNIA TRAMO 1 CONCRETO DE 14 MPA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2871	SI	
5	30/11/2024	MUNICIPIO DE LOS PATIOS CEREDA CALIFORNIA BOX CULVERT PR3+530 21MPA	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3251	SI	
6	30/11/2024	MUNICIPIO DE LOS PATIOS CEREDA CALIFORNIA BOX CULVERT PR3+530 21MPA	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3156	SI	
7	30/11/2024	MUNICIPIO DE LOS PATIOS CEREDA CALIFORNIA BOX CULVERT PR3+530 21MPA	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3232	SI	
8	15/11/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA VEREDA COROZAL - CALIFORNIA	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	100,85%	SI	
					2	≥ 95%	100,69%	SI	
					3	≥ 95%	100,91%	SI	
					4	≥ 95%	100,27%	SI	
					5	≥ 95%	100,55%	SI	

OBSERVACIONES:

El contratista a la fecha no ha hecho entrega de resultados de ensayos

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

FECHA DE INICIO: 10/04/2023

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 16.898.027.326,00

VALOR ACUMULADO: $ 16.898.027.326,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10 4 2023	12 4 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10 4 2023	12 12 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10 4 2023	12 12 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSION No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	11	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	11	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSION No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 2.446.302.732,60	10 4 2023	30 4 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 4.892.665.465,20	10 4 2023	31 12 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 7.388.908.197,80	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 13
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 1.223.151.366,30	10 4 2023	12 8 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSION No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 2.446.302.732,60	10 4 2023	28 6 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 4.892.665.465,20	10 4 2023	28 2 2028
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 7.338.908.197,80	12 12 2023	12 12 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 14
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 1.223.151.366,30	10	4	2023	28	2	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 10

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2024

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

FECHA DE INICIO: 10/04/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 28/02/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO X VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO X FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES ICE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER
PROGRAMA DE INVERSIONES
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3000 DE 2022
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTUDIOS Y OBRAS 2022
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1003 DE 2022
INTERVENTOR: CAVUNCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/06/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/01/2024 (Incluya las suspensiones, indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A):** $ 16.896.077.326,00
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B):** $ 24.463.027.326,00

PLAZO ACUMULADO: 20 MESES 2 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/05/2024 (Incluya el día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 7.565.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA de pesos Miles	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	%Programado $ Valor programado	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado %Ejecutado	0	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 6.891.288,90	28,17%		%P																						61,25%	0,84%	10,49%
				$ P																						$ 9.889.133,88	$ 3.921,96	$ 1.286.254,11
				$ E																								
				%E																								
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 732.786,38	3,00%		%P																						43,07%	0,49%	56,93%
				$ P																						$ 615.587,53	$ 2.935,96	$ 414.263,28
				$ E																								
				%E																								
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	0,89%		%P																						10,13%	0,22%	89,64%
				$ P																						$ 22.065,93	$ 489,96	$ 195.228,80
				$ E																								
				%E																								
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 9.302.047,34	38,02%		%P																						86,93%	0,28%	12,82%
				$ P																						$ 8.085.847,98	$ 23.986,96	$ 1.192.813,41
				$ E																								
				%E																								
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 2.058.111,50	8,40%		%P																						40,66%	1,57%	58,33%
				$ P																						$ 834.720,41	$ 24.084,29	$ 1.197.306,80
				$ E																								
				%E																								
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	1,69%		%P																						76,53%	0,47%	22,99%
				$ P																						$ 315.844,82	$ 1.930,38	$ 94.906,49
				$ E																								
				%E																								
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3.293.185,18	13,46%		%P																						97,69%	0,31%	1,91%
				$ P																						$ 3.217.564,01	10.040,77	62.454,40
				$ E																								
				%E																								
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 632.217,83	2,58%		%P																						82,82%	1,97%	17,21%
				$ P																						$ 523.548,87	$ 12.421,83	$ 108.737,92
				$ E																								
				%E																								
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.716,51	0,95%		%P																						79,77%	0,64%	19,59%
				$ P																						$ 185.639,06	1.478,05	45.597,45
				$ E																								
				%E																								
TOTAL OTROS ITEMS				%P																								
				$ P																								
				$ E																								
				%E																								
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 23.776.799,31**	**97,17%**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																												

SUSPENSION

SUSPENSION

Programación

EJECUCION

Reprogramación No.3

Reprogramación No.2

Reprogramación No.3 Modificación de contrato

Reprogramación No.4 Adicional y prorroga

Reprogramación No.5 Modificación al contrato

Reprogramación No.6 Modificación al contrato

Reprogramación No.7 Modificación al contrato

100%
50%
0%

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%																									79,75%	0,40%	19,90%
	VALOR (Miles de Pesos)																									$ 19.497.092,78	$ 97.515,07	$ 4.868.479,48
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%																									79,75%	80,15%	100,05%
	VALOR (Miles de Pesos)																									$ 19.497.092,78	$ 19.594.547,85	$ 24.463.027,33
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%																											
	VALOR (Miles de Pesos)																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																											
	VALOR (Miles de Pesos)																											

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.672,84 / $ -		%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47 / $ 214.987,50		%
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000,00 / $		%
VALOR IVA Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32.654,44 / $ 40.847,63		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ($)	$ 692.227,88		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ($')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 24.463.027,19**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		**0,00%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:
Se ajusta reprogramacion de acuerdo a prorroga

Aprueba Firma:
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Pajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma:
Nombre:
Matrícula Profesional No.:
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/0025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 20250 DE 2025

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONVIAL TRIVIA 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2025

INTERVENTOR: CAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/04/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2025 (Indique la suspensión(es) que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 16.868.007.326,00 (Valores en pesos colombianos)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 24.463.071.190,00

PLAZO ACUMULADO: 20 MESES 0 DIAS (En meses según las prórrogas y/o suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 09/09/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/05/2026 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 7.595.063.864,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 6.891.289,90	28,17%	24,30%	% P																						61,26%	0,04%	16,69%
			5.777.157,66	$ P																						$ 10.335.813,00	$ 1.000,00	$ 7.288.264,11
				% E																						13,50%	2,61%	
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 732.786,36	3,00%	1,50%	% P																						67,67%	0,40%	56,93%
			355.565,43	$ P																						$ 11.415.787,00	$ 7.000,00	$ 414.263,28
				% E																						9,30%	1,97%	
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	0,89%	0,09%	% P																						67,67%	0,40%	89,66%
			22.017,00	$ P																						$ 11.415.787,00	$ 7.000,00	$ 155.228,80
				% E																						9,30%	1,97%	
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 9.302.047,34	38,02%	34,50%	% P																						66,93%	0,25%	12,82%
			8.201.885,98	$ P																						$ 11.053.127,00	$ 116.255,71	$ 1.192.813,41
				% E																						12,82%	1,43%	
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 2.056.111,50	8,40%	3,82%	% P																						66,93%	0,25%	59,53%
			908.170,33	$ P																						$ 11.053.127,00	$ 116.255,71	$ 5.197.368,89
				% E																						12,82%	1,43%	
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	1,69%	1,33%	% P																						76,93%	0,47%	22,86%
			315.844,62	$ P																						$ 315.844,62	$ 1.910,28	$ 94.054,10
				% E																						3,66%	0,02%	
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3.293.165,18	13,46%	13,58%	% P																						97,89%	0,31%	1,91%
			3.228.372,35	$ P																						$ 223.664,01	10.046,77	59.454,60
				% E																						2,59%	0,12%	
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 632.217,83	2,58%	2,10%	% P																						80,82%	1,97%	17,21%
			499.958,98	$ P																						$ 510.948,87	$ 12.471,69	$ 108.797,02
				% E																						5,92%	0,14%	
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.715,51	0,95%	0,83%	% P																						79,77%	0,64%	19,59%
			196.189,62	$ P																						$ 185.939,99	1.479,05	40.527,45
				% E																						2,15%	0,02%	
TOTAL OTROS ITEMS				% P																						$ 11.060,00	$ 11.370	4,59%
				$ P																								
				% E																								
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 23.775.799,31**	**97,17%**		% P																								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			**$ 19.504.964,98**	$ P																								
				% E																								

SUSPENSION
SUSPENSION
Programacion
Reprogramación No.1
Reprogramación No.2
Reprogramación No.3 Modificacion de contrato
Reprogramación No.4 Modificacion de contrato
50%
0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,12%	0,15%	0,87%	4,95%	13,41%	17,69%	29,37%	34,36%	8,27%	8,27%	8,27%	10,32%	5,35%	8,51%	10,56%	17,76%	32,77%	2,95%	7,61%	8,61%	79,76%	0,46%	
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20.629,96	$ 26.069,13	$ 147.806,14	$ 836.733,97	$ 2.266.195,33	$ 2.987.895,09	$ 4.266.880,92	$ 5.774.360,48	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.743.306,00	$ 903.926,92	$ 1.438.499,79	$ 1.784.754,77	$ 3.000.445,46	$ 8.017.000,44	$ 721.638,05	$ 1.860.865,54	$ 2.106.814,40	$ 19.497.032,78	$ 97.515,07	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,12%	0,27%	1,14%	5,09%	18,50%	36,18%	65,56%	99,92%	8,27%	16,53%	24,79%	35,12%	40,47%	48,98%	59,54%	77,30%	110,07%	112,96%	120,57%	129,18%	208,94%	209,40%	
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20.629,96	$ 46.699,10	$ 194.505,24	$ 1.030.239,22	$ 3.296.434,54	$ 6.214.329,63	$ 10.501.210,55	$ 16.275.571,03	$ 1.398.097,90	$ 2.796.195,80	$ 4.194.293,70	$ 5.937.599,70	$ 6.841.526,62	$ 8.280.026,41	$ 10.064.781,18	$ 13.065.226,64	$ 21.082.227,08	$ 21.803.865,13	$ 23.664.730,67	$ 25.771.545,07	$ 45.268.577,85	$ 45.366.092,92	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,77%	0,41%	0,91%	2,25%	2,67%	8,27%	8,27%	8,27%	4,39%	3,73%	7,90%	10,28%	10,74%	7,73%	8,12%	9,74%	10,83%	11,82%	
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 0,00	$ 8.180,80	$ 6.135,60	$ 129.399,36	$ 69.207,82	$ 154.041,58	$ 384.482,79	**451.305,65**	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 740.324,93	$ 829.160,64	$ 1.355.998,92	$ 1.737.268,29	$ 1.813.868,33	$ 1.891.825,54	$ 2.250.044,50	$ 2.364.740,85	$ 2.453.328,94	$ 2.861.147,76	$ 480.848,36	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	1,26%	2,17%	4,45%	7,12%	8,27%	8,27%	8,27%	12,65%	16,38%	24,28%	34,56%	45,30%	39,02%	48,14%	57,89%	67,92%	79,74%	81,70%	
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 0,00	$ 8.180,80	$ 14.316,39	$ 143.715,75	$ 212.923,57	$ 366.965,16	$ 751.447,95	**$ 1.202.749,87**	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 2.138.422,83	$ 2.787.583,47	$ 4.103.492,39	$ 5.840.760,68	$ 7.654.629,01	$ 9.546.454,55	$ 11.776.499,05	$ 14.141.239,90	$ 16.614.568,84	$ 19.505.716,63	$ 19.986.564,99	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye N/A, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872,84	$ 45.000,00	%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47	$ 348.235,29	%
	$ 214.987,50		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000,00	$ 22.200,00	%
	$ -		
VALOR N/A(Y/O) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32.654,44	$ 66.164,71	%
	$ 40.847,63		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 692.227,88		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 24.463.027,19**	**$ 19.986.564,99**	**81,70%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: AURO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

FECHA DE INICIO: 11/05/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00

VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	28 12 2022	28 12 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	28 12 2022	28 6 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	28 12 2022	28 6 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	11	5	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	30	11	2024	30	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	11	5	2023	30	11	2029
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100004561 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	30	5	2024	30	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00	11	5	2023	30	11	2029
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100004561 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA N° 02332 DE 2022 por ajuste de precios se incrementa el valor asegurado.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 2/05/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.499.989.139,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.700.000.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 249.998.913,90	29/12/2022	28/8/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 124.999.456,95	29/12/2022	29/4/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 249.998.913,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403960

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	29/12/22	29/4/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101204283 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 270.000.000,00	2 5 2023	20 1 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 135.000.000,00	2 5 2023	20 9 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 270.000.000,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403960

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	29 12 22	20 9 24
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101204283 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/08/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 MUNICIPIO DE EL ZULIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 684.946.301,00

VALOR ACUMULADO: $ 684.946.301,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	1/8/2023	1/3/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	1/8/2023	1/11/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 ANOS	5 ANOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	1/11/2023
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	1/11/2023
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	1/11/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	1 8 2023	1 3 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	1 8 2023	1 11 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	1 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7	11	2023	17	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7	11	2023	17	2	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1	8	2023	17	2	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1	8	2023	17	2	2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1	8	2023	17	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7	11	2023	17	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7	11	2023	17	2	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	16	2	2024	16	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **7**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1	8	2023	17	2	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1	8	2023	17	2	2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1	8	2023	17	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 434.981.351,08

VALOR ACUMULADO: $ 434.981.351,08
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	3/8/2023	3/3/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	3/8/2023	3/11/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3/8/2023	3/11/2023
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3/8/2023	3/11/2023
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3/8/2023	3/11/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009947** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009947** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009947 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7	11	2023	7	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	7	11	2023	7	2	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	6	2	2024	6	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031244

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009947 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 453.602.771,30

VALOR ACUMULADO: $ 453.602.771,30 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento del contrato	30%	$ 136.080.831,39	3 8 2023	3 3 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 136.080.831,39	3 8 2023	3 11 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031270**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023
Responsabilidad civil cruzada	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023
Gastos médicos	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009953** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento del contrato	30%	$ 136.080.831,39	7	11	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 136.080.831,39	7	11	2023	5	3	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 136.080.831,39	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031270**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	3	11	2023	5	3	2024
Responsabilidad civil cruzada	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	3	11	2023	5	3	2024
Gastos médicos	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	3	11	2023	5	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009953** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 MUNICIPIO DE SILOS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 740.182.949,07

VALOR ACUMULADO: $ 740.182.949,07 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	9 8 2023	9 3 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	9 8 2023	9 11 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 ANOS	5 ANOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **460-47--994000067941**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	9 8 2023	9 11 2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	9 8 2023	9 11 2023
RCE paronal		$ 232.000.000,00	9 8 2023	9 11 2023
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	9 8 2023	9 11 2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **460-74-994000006724** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	7 11 2023	10 7 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	7 11 2023	10 3 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 ANOS	5 ANOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **460-47--994000067941**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	7	11	2023	27	2	2024
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	7	11	2023	27	2	2024
RCE paronal		$ 232.000.000,00	7	11	2023	27	2	2024
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	7	11	2023	27	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	7	11	2023	7	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	7	11	2023	7	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 ANOS			5 ANOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47--994000067941

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	7	11	2023	10	3	2024
Contratistas y subcontratistas		$ 260.000.000,00	7	11	2023	10	3	2024
RCE paronal		$ 260.000.000,00	7	11	2023	10	3	2024
Vehiculos propios y no propios		$ 260.000.000,00	7	11	2023	10	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.253.964,86

VALOR ACUMULADO: $ 620.253.964,86
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	29/8/2023	29/3/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	29/8/2023	29/11/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29/8/2023	29/11/2023
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29/8/2023	29/11/2023
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29/8/2023	29/11/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	10 8 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	10 4 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	10 4 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	10 4 2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	10 4 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7	11	2023	10	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7	11	2023	10	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **7**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	10	4	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	10	4	2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	10	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 MUNICIPIO DE CACOTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 564.759.919,91

VALOR ACUMULADO: $ 564.759.919,91
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 2 2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031211**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-10101009940** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 6 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 169.427.975,97	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031211

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE CACHIRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

PLAZO INICIAL: 4,5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 749.903.341,00

VALOR ACUMULADO: $ 749.903.341,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	30%	$ 224.971.002,30	21	2	24	21	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	30%	$ 224.971.002,30	21	2	24	21	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 224.971.002,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-747-994000068033

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	35%	$ 260.000.000,00	16	11	23	21	5	24
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: **23/02/204**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	30,00%	$ 224.971.002,30	21	2	24	6	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30,00%	$ 224.971.002,30	21	2	24	6	7	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 224.971.002,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-747-994000068033

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	35%	$ 224.971.002,00	24	5	2024	5	7	24
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. ANEXO 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 MUNICIPIO DE LOURDES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 22/01/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.216.911,63

VALOR ACUMULADO: $ 620.216.911,63
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 186.065.073,49	27/7/2023	24/2/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 186.065.073,49	24/7/2023	24/10/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 186.065.073,49	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47-994000067697

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	24/7/2023	24/10/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-47-994000006685 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 186.065.073,49	22	1	2024	22	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 186.065.073,49	22	1	2024	22	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 186.065.073,49	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47-994000067697

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 260.000.000,00	24	10	2023	22	4	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-47-994000067697 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Pendiente pólizas actualizadas a terminación del contrato de obra

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-056-2023 MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-056-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 8/04/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 527.540.312,28

VALOR ACUMULADO: $ 527.540.312,28
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.975.869,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.975.869,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 158.262.093,60	22/11/2023	22/6/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 158.262.093,60	22/11/2023	22/2/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 158.262.093,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032677

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	22/11/2023	22/2/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010371 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Pendiente pólizas actualizadas a terminación del contrato de obra

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-077-2023 MUNICIPIO DE CUCUTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-077-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 8/04/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 471.956.681,24

VALOR ACUMULADO: $ 471.956.681,24
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.346.230,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.346.230,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 141.587.004,37	18 8 2023	18 3 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 141.587.004,37	18 8 2023	18 11 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 141.587.004,37	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031483

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	18 8 2023	18 11 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009985 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 141.587.004,37	18	8	2023	18	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 141.587.004,37	18	8	2023	18	11	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 141.587.004,37	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031483

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	18	8	2023	18	11	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009985 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 141.587.004,37	8	4	2024	7	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 141.587.004,37	8	4	2024	10	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 141.587.004,37	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031483

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 260.000.000,00	8	4	2024	10	7	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010643 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONITA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 22/04/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.245.837,49

VALOR ACUMULADO: $ 620.245.837,49
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.904.217,77

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.904.217,77

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 186.073.751,10	22	4	2024	22	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 186.073.751,10	22	4	2024	23	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 186.073.751,10	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101033204

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	22	4	2024	23	7	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010560 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 MUNICIPIO DE HERRAN

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 14/05/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 527.697.300,71

VALOR ACUMULADO: $ 527.697.300,71
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.023.671,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.023.671,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 158.309.190,30	20/11/2023	1/7/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 158.309.190,30	20/11/2023	1/3/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 158.309.190,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032676

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	20/11/2023	1/3/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010370 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRORROGA No.:** ..... **MODIFICACION No.:** ..... **SUSPENSION No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 158.309.190,30	20	11	2023	1	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 158.309.190,30	20	11	2023	1	3	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 158.309.190,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101032676**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20	11	2023	1	3	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20	11	2023	1	3	2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20	11	2023	1	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010370** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **1**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 MUNICIPIO DE MUTISCUA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 17/05/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 601.770.256,56

VALOR ACUMULADO: $ 601.770.256,56
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.728.748,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.728.748,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 180.531.077,10	20/11/2023	1/7/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 180.531.077,10	20/11/2023	1/3/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.531.077,10	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-11-101032680

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	20/11/2023	1/3/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010373 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 14/06/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 731.291.151,02

VALOR ACUMULADO: $ 731.291.151,02 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.283.917,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.283.917,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	22	11	2023	22	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 219.387.345,30	22	11	2023	22	2	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	22	11	2023	22	2	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	24	6	2024	23	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 219.387.345,30	24	6	2024	25	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	22	11	2023	14	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-10-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	24	6	2024	23	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 219.387.345,30	24	6	2024	25	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	22	11	2023	14	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-10-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	24	6	2024	23	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 219.387.345,30	24	6	2024	25	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	22	11	2023	14	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-10-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	24	6	2024	23	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 219.387.345,30	24	6	2024	25	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	22	11	2023	14	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-10-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	24	6	2024	23	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 219.387.345,30	24	6	2024	25	9	2027
Calidad del servicio		$ 219.387.345,30	24	6	2024	25	9	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	22	11	2023	14	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-10-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-071-2023 MUNICIPIO DE GRAMALOTE

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-071-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 5/08/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 666.564.206,31

VALOR ACUMULADO: $ 666.564.206,31 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.551.371,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.551.371,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 199.969.261,89	8 8 2023	8 3 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 199.969.261,89	8 8 2023	8 11 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 199.969.261,89	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-10-1031289

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	8 8 2023	8 11 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009956 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 199.969.261,89	5 8 2024	3 8 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 199.969.261,89	8 8 2024	6 11 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 199.969.261,89	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-10-1031289

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	8 8 2023	5 11 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009956 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 199.969.261,89	5 8 2024	3 8 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 199.969.261,89	8 8 2024	6 11 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 199.969.261,89	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-10-1031289

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	8 8 2023	5 11 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009956 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 199.969.261,89	5 8 2024	3 8 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 199.969.261,89	8 8 2024	6 11 2027
Calidad del servicio		$ 199.969.261,89	4 11 2024	4 11 2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 199.969.261,89	4 11 2024	4 11 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-10-1031289

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-049-2023 MUNICIPIO DE VILLA CARO

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-049-2024 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCIONES G&P COMPANY S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 18/10/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 500.200.540,23

VALOR ACUMULADO: $ 604.640.738,90
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 11.096.021,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 11.096.021,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 150.060.162,07	15	10	2024	15	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 150.060.162,07	15	10	2024	15	1	2028
Calidad del servicio		$ 150.060.162,07	15	1	2025	15	1	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 150.060.162,07	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101034623

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	15	10	2024	15	1	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101011058 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 150.060.162,07	18	11	2024	18	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 150.060.162,07	18	11	2024	18	2	2028
Calidad del servicio		$ 150.060.162,07	18	2	2025	18	2	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 150.060.162,07	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101034623

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	18	10	2024	18	1	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101011058 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 150.060.162,07	18	11	2024	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 150.060.162,07	18	11	2024	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 150.060.162,07	18	2	2025	18	2	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 150.060.162,07	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101034623

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	18	10	2024	31	12	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101011058 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 45
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Norte de Santander 1053 del 2022.

Se da inicio a la reunión presentándose el Ingeniero Jean Ariel Curmen Cepeda como el nuevo Gestor Técnico del Instituto Nacional de Vías y además hace presencia en esta reunión el Ingeniero Juan Gabriel Corredor.

Procede el ingeniero Jairo a explicar los cuadros resumen de los convenios en su estado actual.

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está liquidado, la interventoría radico el informe final al INVIAS, como última actuación el municipio hizo el pago de la última acta del contrao de obra.

2)Herrán 1861 de 2021. Contrato liquidado, la interventoría ya hizo la radicación del informe final al INVIAS. Se reitera solicitud de cierre financiero, pero hasta el momento no se ha pronunciado el municipio.

3)La Playa 1863 de 2021. Este contrato está liquidado, Se presentó informe final mediante el comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1587-24. El contratista ejecuto en el corredor uno 630 ml y 2 alcantarillas, en el corredor dos 545 y 3 alcantarillas.

4)Pamplonita 1878 de 2021. Este contrato está liquidado, se dio aprobación del acta parcial Nº 5 ya se le realizo el pago al contratista. Y como última actuación se firmó el acta de liquidación el día 08 de enero de 2025. Como compromiso se va entregar el informe final al INVIAS

5)Santiago 1821 de 2021. Este contrato esta liquidado, se ejecutó 3309 y 15 alcantarillas. El día 10 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato y se realiza el pago de la última acta al contratista, se va entregar el informe final al INVIAS.

6)Ocaña 1814 de 2021. Este contrato ya terminó, en proceso de liquidación. La interventoría dio aprobación al diseño geométrico de los tramos 4 y 7, APU y a los documentos de liquidación y está pendiente de pago el acta final al contratista.

7)Gobernación 2052 de 2021. En proceso de liquidación. La interventoría dio aprobación a los estudios de topografía, además realiza el levantamiento topográfico final del corredor vial.

8)Cachira 1859 de 2021. Tiempo contractual finalizado, debido a que se dio por terminado el contrato de manera unilateral debido al proceso y demoras por del hurto cibernético. El contratista solo alcanzo a realizar en el tramo (1) 54 ml y 4 alcantarillas, en tramo (2) con 264 ml y 2 alcantarillas terminado al 100%, el tramo (3) con 224 ml y 5 alcantarillas.

El ingeniero Jairo indica que como compromiso se agende reunión en donde se le solicite al municipio información respecto al caso del hurto.

9)Abrego convenio 1791 de 2021. En proceso de liquidación, en esta semana llevan ejecutado en el Tramo de Santa Lucia- Canoas el 100% con 1150 metros de placa huella y 6 alcantarillas; Tramo de Brisas del Tarra - la Arenosa lleva ejecutado 906.62 metros de placa huella y 7 alcantarillas, de los cuales se especifican así:

-San Vicente: 415 m de placa huella
-San Juan: 300 m de placa huella
-Vega del Tigre: 191.62
-San Luis: 0
-Milagros: 0 ya está instalada la subbase
se tiene programado 61.20% ejecutado 87.15% y un avance de 25.95%.
El contratista se comprometió en terminar las obras hasta el 20 de enero, por la situación de invierno y seguridad. Se espera recibir para esa fecha con su respectiva limpieza y señalización.

10)Gobernación 1943 de 2021.

Los Patios
El contratista aun no inicia actividades porque el personal aún no ha retomado, la interventoría realizo visita y le solicito al contratista el inicio de actividades, y la programación hasta el 28 de febrero y además se le sugirió al contratista incrementar trabajo sábado y domingo, así como las cuadrillas.
Se tiene un avance del 79% con 3608.10 y 7 alcantarillas.
-Tramo 1: 1950 m de placa huella
-Tramo 2: 291 m de placa huella
-Tramo 4: 323 m de placa huella
-Tramo 5: 714.10 m de placa huella
-Tramo 6: 330 m de placa huella

Arboledas
El contratista lleva ejecutado 6460 m de placa huella porcentaje de 87.96 %, veintisiete (27) alcantarillas sencillas y dos (2) alcantarillas doble ducto, lo cual se especifica a continuación por veredas y tramos activos.

Santo Domingo:
-Tramo 1: 870 metros
-Tramo 2: 130 metros
-Tramo 3: 202 metros
-Tramo: 4: 130 metros
-Tramo: 5: 224 metros
Volcán:
-Tramo 1: 90 metros
-Tramo 2: 410 metros
-Tramo 3: 51 metros
-Tramo 4: 90 metros
-Tramo 5: 121 metros
Potreros:
-Tramo 1: 300 metros
-Tramo 2: 285 metros
Chicagua Bajo:
-Tramo 1: 79 metros
-Tramo 2: 370 metros
-Tramo 3: 70 metros
-Tramo 4: 168 metros
-Tramo 5: 45 metros
Rinconada:
-Tramo 1: 213 metros
-Tramo 2-1:162 metros
-Tramo 2-2: 38 metros.
Cinera:
-Tramo 1: 213 metros
-Tramo 2: 74 metros
-Tramo 2 A: 58 metros
-Tramo 3: 487 metros
-Tramo 4: 206 metros
Helechal:
-Tramo 1: 195 metros
-Tramo 2: 192 metros
-Tramo 3: 153 metros
Juan Bueno:
-Tramo 1: 367 metros
-Tramo 2: 210 metros
-Tramo 3: 186 metros
-Tramo 1 A: 71 metros

Gramalote.
En este municipio ya se terminó el 100% el 29 de diciembre se hizo recorrido con la comunidad, veedores y presidentes de las juntas de acción comunal, el cual ya firmaron el acta de recibo por la comunidad. El contratista ejecuto 2900 m de placa huella porcentaje de 100% y quince (15) alcantarillas sencillas, dos (2) alcantarillas doble ducto y un (1) box culvert 2x2. El cual se especifica en las veredas
-Boyacá: en tramo 4 se ha ejecutado 1342 m
-San Isidro:
* Tramo 1: 13 m
* Tramo 2:141 m
* Tramo 3: 80 m
* Tramo 4: 71 m
* Tramo 5: 712 m.
-Santa Anita:
- Tramo 1: 164 m
- Tramo 2: 377 m

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Villa Caro. El contratista ya termino la obra, la interventoría presentó el informe final mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1745-24

-Herrán. Este contrato esta en proceso de liquidación. El contrato fue pequeño, el cual se ejecutó alrededor de dos meses se realizo 13441.69 de actividades de mejoramiento y 280 m de placa huella con 2 alcantarillas.

-Mutiscua. En proceso de liquidación, se ejecuto 295 m de placa huella, 2 alcantarillas y 16201.11 de actividades de mantenimiento. La interventoría a través del topógrafo estaba haciendo el respectivo levantamiento de los planos records.

-Puerto Santander. Se ejecuto 179 m de placa huella y 13803 m2 de actividades de mejoramiento, la calzada tenía una vía existente de 9 metros de ancho por lo que tanto, se dejó ese anchor en la vía.

-Ricaurte. Se ejecuto 270 m de placa huella con 12350 de actividades de mejoramiento. El informe final ya está entregado al INVIAS.

-Lourdes. Se ejecuto 320 m de placa huella, 1 alcantarilla y 14387.23 de actividades de mejoramiento. El informe final ya esta radicado en el INVIAS

-Cachira. Se ejecuto 385 m de placa huella con 1 alcantarilla y 14387.23 de actividades de mejoramiento. Ya se entrego el informe final al INVIAS.

-Gramalote. Se ejecuto 360 m de placa huella con 4 alcantarilla y 15460.91 de actividades de mejoramiento. Ya está remitido el informe final al INVIAS.

-Santiago. Se ejecuto 390 m de placa huella con 3 alcantarillas y 16964.05 actividades de mejoramiento. Fue remitido el informe final al INVIAS

-Pamplonita. Se ejecuto 296 m de placa huella con 2 alcantarillas y 16699.60 de actividades de mejoramiento. Fue remitido el informe final al INVIAS.

-Salazar de las Palmas. Se ejecuto 296 m de placa huella con 3 alcantarillas y 15246.17 de actividades de mejoramiento.

-Silos. Se ejecuto 375 m de placa huella con 3 alcantarillas y 19948.8 de actividades de mantenimiento. Fue remitido el informe final al INVIAS.

-Cacota. Se ejecuto 237 m de placa huella con 15204 de actividades de mantenimiento. Fue remitido el informe final al INVIAS.

-Pamplona. Se ejecuto 279 m de placa huella con 1 alcantarilla 12213.14 de actividades de mejoramiento. Ya fue remitido el informe final al INVIAS.

-San Cayetano. Se ejecuto 279 m de placa huella con 16224.69 de actividades de mantenimiento. Se remitió el informe final al INVIAS

-Villa del Rosario. Se ejecuto 157 m de placa huella, 1 alcantarilla y 11468.63 de actividades de mejoramiento. Se hizo la remisión del informe final al INVIAS.

-El Zulia. Se ejecuto 325 m de placa huella, 2 alcantarillas y 17919.81 actividades de mejoramiento. Ya fue remitido el informe final del INVIAS.

El ingeniero Juan Gabriel pregunta que si la situación del contrato del 1943 son dos temas diferentes o es el mismo.

El ingeniero Jairo explica que el tema es lo relacionado al PAGA y la interventoría tiene una postura respecto a esto ya que en su momento se hizo la solicitud al INVIAS y como respuesta indicaron que no se debe pagar, porque en el contrato no está estipulado el PAGA pues se menciona otro ítem de complementario. Aunque la Gobernación si realizo un oficio donde menciona el PAGA por lo tanto el contratista esta sustentando con este ultimo oficio.

El ingeniero Juan Gabriel propone hacer una reunión junto con la Gobernación, para la próxima semana.

Se da por terminado el comite.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
		5 de 5
AGENDAR REUNIÓN CON EL MUNICIPIO DE CACHIRA EN DONDE SE LE SOLICITE AL MUNICIPIO INFORMACIÓN RESPECTO AL CASO DEL HURTO.	17/01/2025	GAVINCO SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 17/01/2024
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH OMAIRA SEPULVEDA.	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRES QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
JUAN GABRIEL CORREDOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
JEAN ARIEL CURMEN CEPEDA	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA: 17/01/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 46
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRÁN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACIÓN DE NTS)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se da inicio a la reunión la ingeniera Lizeth explica los cuadros resumen de los convenios en su estado actual.

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está liquidado, el municipio hizo el pago de la última acta del 2024. La interventoría radico el informe final al INVIAS y además le solicito al municipio la totalidad de los rendimientos financieros.

2)Herrán 1861 de 2021. Contrato liquidado, la interventoría ya hizo la radicación del informe final al INVIAS. Se reitera solicitud de cierre financiero.

3)La Playa 1863 de 2021. Este contrato está liquidado, se radico el informe final mediante el comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1587-24 al INVIAS y se le solicito al municipio reintegro de los rendimientos financieros, y hacer el cierre de la cuenta conjunta.

4)Pamplonita 1878 de 2021. Este contrato está liquidado, se firmó el acta de liquidación el día 08 de enero de 2025, la interventoría le solicito al municipio remitir los soportes del reintegro de los rendimientos financiero y el cierre del convenio.

5)Santiago 1821 de 2021. Este contrato esta liquidado, se radico el informe final al INVIAS. Además, se hizo la solicitud al municipio de entrega de reintegro de los rendimientos financieros y el cierre de la cuenta conjunta.

6)Ocaña 1814 de 2021. Este contrato ya terminó, en proceso de liquidación. El municipio tiene pendiente el pago del acta final al contratista, se espera que el municipio se reporte porque debe solicitar los recursos para poderle pagar al contratista.

7)Gobernación 2052 de 2021. En proceso de liquidación. Se está adelantando las actuaciones necesarias para la liquidación del contrato, la interventoría realizo la solicitud al municipio sobre el reintegro de los rendimientos financieros. El ingeniero Jairo interviene para comprometerse que este contrato se va radicar la próxima semana con el informe final.

8)Cachira 1859 de 2021. Tiempo contractual finalizado, se firmó el acta de terminación y liquidación el 27 de diciembre de 2024, en donde se dejo estipulado que quedó un saldo del convenio $1.453.275.114 lo que se entiende que es lo del hurto cibernético.

9)Abrego convenio 1791 de 2021. En proceso de liquidación, el contratista realizo las actividades de obra en el Tramo de Santa Lucia-Canoas el 100% con 1150 metros de placa huella y 6 alcantarillas; Tramo de Brisas del Tarra - la Arenosa ejecuto 1251 metros de placa huella y 7 alcantarillas, de los cuales se especifican así:

-San Vicente: 415 m de placa huella
-San Juan: 300 m de placa huella
-Vega del Tigre: 191.62 m de placa huella.
-San Luis: 298.93 m de placa huella
-Milagros: 61.32 m de placa huella
El contratista se comprometió en terminar con las señales verticales, pero ha sido difícil el acceso por orden público.

10)Gobernación 1943 de 2021.

Los Patios
El contratista ha presentado la solicitud de pago de la implementación del PAGA pero sin soportes, por lo tanto, la interventoría a través de oficio GIC-INVIAS-NTS-0016-25 le solicita al contratista los soportes para el respectivo cobro.
Se tiene un avance del 80,29% con 3608.10 y 13 alcantarillas las cuales se clasifican: tres (3) de doble ducto, cuatro (4) sencillas, dos (2) box Culvert de 1,5*1,5 y cuatro (4) box Culvert de 2*2.
-Tramo 1: 1950 m de placa huella
-Tramo 2: 291 m de placa huella
-Tramo 3: 25,6 m de placa huella
-Tramo 4: 323 m de placa huella
-Tramo 5: 714.10 m de placa huella
-Tramo 6: 352 m de placa huella

El contratista presento reprogramación por la prórroga N° 3, el cual la interventoría hizo las respectivas observaciones.

Arboledas
El contratista lleva ejecutado 6493 m de placa huella porcentaje de 92.03 %, veintisiete (27) alcantarillas sencillas y dos (2) alcantarillas doble ducto, lo cual se especifica a continuación por veredas y tramos activos.

Santo Domingo:
-Tramo 1: 891 metros
-Tramo 2: 130 metros
-Tramo 3: 202 metros
-Tramo: 4: 130 metros
-Tramo: 5: 224 metros

Volcán:
-Tramo 1: 90 metros
-Tramo 2: 410 metros
-Tramo 3: 51 metros
-Tramo 4: 90 metros
-Tramo 5: 121 metros
Potreros:
-Tramo 1: 300 metros
-Tramo 2: 285 metros
Chicagua Bajo:
-Tramo 1: 79 metros
-Tramo 2: 370 metros
-Tramo 3: 70 metros
-Tramo 4: 168 metros
-Tramo 5: 45 metros
Rinconada:
-Tramo 1: 225 metros
-Tramo 2-1:162 metros
-Tramo 2-2: 38 metros.
Cinera:
-Tramo 1: 213 metros
-Tramo 2: 74 metros
-Tramo 2 A: 58 metros
-Tramo 3: 487 metros
-Tramo 4: 206 metros
Helechal:
-Tramo 1: 195 metros
-Tramo 2: 192 metros
-Tramo 3: 153 metros
Juan Bueno:
-Tramo 1: 367 metros
-Tramo 2: 210 metros
-Tramo 3: 186 metros
-Tramo 1 A: 71 metros

Gramalote.
En este municipio ya se terminó el 100% el 29 de diciembre se hizo recorrido con la comunidad, veedores y presidentes de las juntas de acción comunal, el cual ya firmaron el acta de recibo por la comunidad. El contratista ejecuto 2900 m de placa huella porcentaje de 100% y siete (7) alcantarillas sencillas, dos (2) alcantarillas doble ducto y un (1) box Culvert 2x2. El cual se especifica en las veredas
-Boyacá: en tramo 4 se ha ejecuto 1342 m
-San Isidro:
* Tramo 1: 13 m
* Tramo 2:141 m
* Tramo 3: 80 m
* Tramo 4: 71 m
* Tramo 5: 712 m.
-Santa Anita:
•Tramo 1: 164 m
•Tramo 2: 377 m
El programado para el convenio 1943 es de 79.90% y un ejecutado de 80.09% con un avance del 0,19%.
El ingeniero Jairo interviene y señala que se va hacer un oficio al contratista donde se le va solicitar un plan de contingencia para acometer las obras hidráulicas faltantes, ya que son aproximadamente 25 obras hidráulicas y son 41 días restante del contrato de obra.
El plan de contingencia debe estar discriminado en cuadrillas individuales y diferentes a las que ya están, que sea medible y cuantificable para que se le pueda hacer el seguimiento en los días que hace falta.
El ingeniero Juan Gabriel Corredor interviene para preguntar sobre los tres temas de la reunión que son: el PAGA, los derrumbes y que la comunidad pide más mejoramiento.

El ingeniero Jairo responde que para el PAGA el contratista ya había remitido la solicitud para el cobro del PAGA en el mes de diciembre, pero le faltaba unos soportes, por lo tanto, la interventoría le hizo el requerimiento de entregar todos los soportes para proceder según lo acordado en la reunión.
Respecto al tema de los derrumbes, menciona que se habló con el Ingeniero Jorge Arias pero que muy posiblemente la respuesta va ser negativa, pero se esta revisando bajo la especificación de INVIAS para ver si contractualmente conforme a lo presupuestal se puede atender el tema de los derrumbes.
Y conforme al mejoramiento en el municipio de Los Patios, señala que evidenciaron que a ese contrato se le adiciono 7.565.000.000 y de eso 1.500.000.000 para las actividades de mantenimiento, pero el presupuesto que salió de la gobernación para actividades de mantenimiento solo fue de 863.000.000 por lo tanto hay una variación y se esta estudiando ese tema. Agrega además que el presupuesto total del convenio con la adición son 25.165.000.000 y el contrato de obra quedó fue por 24.463.000.000 conforme a lo anterior se responde a la pregunta que realizo en el comité anterior el ingeniero Juan Gabriel de que, si existe algún remanente. Pues se puede tener la posibilidad por la existencia de ese remanente, y solicitar prorroga al convenio de interventoría.
El Ingeniero Juan Gabriel Corredor indica que respecto a lo remanente no es viable porque ya se exploró con el área jurídica y esos dineros deben regresar Hacienda y demás, por lo tanto, no es recomendable. Y añade que los rubros que se giran a la Gobernación no se pueden adicionar a interventoría porque es solamente para obra.
Se agenda como compromiso para la próxima semana reunión y se va inviar al ingeniero Efraín Pacheco y el ingeniero Leonel Valero, para dejar claro los topes con los cuadros comparativos y valores ajustados.
11)Gobernación 2033 de 2021.

Municipios que ya fueron remitidos los informes finales de interventoría son: Villa caro, Herrán, Mutiscua, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Cachira, Gramalote, Santiago, Pamplonita, Salazar de las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario y el Zulia.

El ingeniero Jean Ariel Curmen indica que los informes finales que fueron remitidos el 30 de diciembre tienen inconveniente con el abrir el link, no están activos.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
AGENDAR PARA LA PRÓXIMA SEMANA REUNIÓN E INVITAR AL INGENIERO EFRAÍN PACHECO Y EL INGENIERO LEONEL VALERO	21/01/2025	GAVINCO SAS
COMPARTIR CON LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE OCAÑA AL INGENIERO ELÍAS JAIME EL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA.	22/01/2025	GAVINCO SAS
RADICAR EL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA DEL CONVENIO 2052 AL INVIAS.	24/01/2025	GAVINCO SAS
HABILITAR LOS LINKS DE LOS INFORMES FINALES REMITIDOS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.	17/01/2025	GAVINCO SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 24/01/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH OMAIRA SEPÚLVEDA.	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRÉS QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
JUAN GABRIEL CORREDOR	INGENIERO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JEAN ARIEL CURMEN CEPEDA	GESTOR TÉCNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 47
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRÁN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACIÓN DE NTS)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

AGENDAR PARA LA PRÓXIMA SEMANA REUNIÓN E INVITAR AL INGENIERO EFRAÍN PACHECO Y EL INGENIERO LEONEL VALERO

COMPARTIR CON LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE OCAÑA AL INGENIERO ELÍAS JAIME EL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA.

HABILITAR LOS LINKS DE LOS INFORMES FINALES REMITIDOS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.
RADICAR EL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA DEL CONVENIO 2052 AL INVIAS.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA N° 1053-2022

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se da inicio a la reunión con la intervención del ingeniero Juan Gabriel Corredor en donde señala el tema del oficio para avalar la prórroga de 1 mes del contrato de obra, aclarando que hubo un error de trascripción por parte de la Gobernación al responder un oficio al contratista indicando que el convenio se había prorrogado hasta el 28 de febrero; explica el ingeniero que a la Gobernación en su momento se le había dado respuesta que el convenio interadministrativo se había prorrogado por 6 meses y que además el INVIAS le aclaro que el recurso para los derivados (interventoría) del convenio solo van hasta febrero.

Por lo anterior, el ingeniero Juan Gabriel decide que el aval de la prórroga quedará supeditado a la respuesta de la Gobernación para saber si ellos cuentan con el presupuesto para la gestión presupuestal de la interventoría para ese mes que piden de prórroga del contrato de obra.

El ingeniero Jairo explica los cuadros resumen de los convenios en su estado actual.
1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está liquidado. La interventoría radico el informe final al INVIAS y además le solicito al municipio la totalidad de los rendimientos financieros.

2)Herrán 1861 de 2021. Contrato liquidado, la interventoría ya hizo la radicación del informe final al INVIAS. Se reitera solicitud de cierre financiero. Este proyecto ejecuto 1200 Metros de placa huella y 4 alcantarillas.

3)La Playa 1863 de 2021. Este contrato está liquidado, se radico el informe final al INVIAS y se le solicito al municipio reintegro de los rendimientos financieros, y hacer el cierre de la cuenta conjunta.

4)Pamplonita 1878 de 2021. Este contrato está liquidado. La interventoría mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-0033-25 realiza la remisión del informe final al INVIAS.

5)Santiago 1821 de 2021. Este contrato esta liquidado y se radico el informe final al INVIAS.

6)Ocaña 1814 de 2021. Este contrato ya está liquidado. El municipio tiene pendiente el pago del acta final al contratista, se espera que el municipio se ponga al día con el pago.

7)Gobernación 2052 de 2021. Contrato pendiente de liquidación. La interventoría reitero la solicitud al municipio sobre el reintegro de los rendimientos financieros y mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-0038-25 se realiza entrega del informe final de interventoría.

8)Cachira 1859 de 2021. Tiempo contractual finalizado, el INVIAS remitió un oficio donde se explica de manera jurídica cuales son los pasos a seguir y que procedimiento debe realizar para la defensa de la alcandía frente al Banco. Pendiente que el contratista entregue planos récords.

9)Abrego convenio 1791 de 2021. En proceso de liquidación, al contratista le hace falta la instalación de las señales verticales y terminar unos pequeños detalles, pero por la situación de peligro que se está viviendo en esa zona por los grupos al margen de la ley a todos los obreros les tocó irse, se espera que tan pronto se pueda ingresar a la obra el contratista termine lo pendiente.

10)Gobernación 1943 de 2021.

Los Patios
El contratista tiene un avance en el tramo 6, en el tramo 4 y tramo 3. Se comprometió a iniciar con una cuadrilla de metalurgia y realizar un descole de aguas lluvias.
Se tiene un avance del 82,09% con 3738,4 y 13 alcantarillas las cuales se clasifican: tres (3) de doble ducto, cuatro (4) sencillas, dos (2) box Culvert de 1,5*1,5 y cuatro (4) box Culvert de 2*2.
-Tramo 1: 1950 m de placa huella
-Tramo 2: 313 m de placa huella
-Tramo 3: 33 m de placa huella
-Tramo 4: 345 m de placa huella
-Tramo 5: 714.10 m de placa huella
-Tramo 6: 382m de placa huella

El contratista va iniciar desde el tramo 7 hasta el 12, La interventoría hizo observaciones respecto al plan de contingencia, además se solicita al contratista nuevo ingreso de personal para las obras de drenaje.

Arboledas
El contratista avanza en la construcción de alcantarillas, lleva ejecutado 6529 m de placa huella porcentaje de 92.54 %, veintiocho (28) alcantarillas sencillas y dos (2) alcantarillas doble ducto, lo cual se especifica a continuación por veredas y tramos activos.

Santo Domingo:
-Tramo 1: 906 metros
-Tramo 2: 130 metros
-Tramo 3: 202 metros
-Tramo: 4: 130 metros
-Tramo: 5: 224 metros

Volcán:
-Tramo 1: 90 metros
-Tramo 2: 410 metros
-Tramo 3: 51 metros
-Tramo 4: 90 metros
-Tramo 5: 121 metros
Potreros:
-Tramo 1: 300 metros
-Tramo 2: 285 metros
Chicagua Bajo:
-Tramo 1: 79 metros
-Tramo 2: 370 metros
-Tramo 3: 70 metros
-Tramo 4: 168 metros
-Tramo 5: 45 metros
Rinconada:
-Tramo 1: 246 metros
-Tramo 2-1:162 metros
-Tramo 2-2: 38 metros.
Cinera:
-Tramo 1: 213 metros
-Tramo 2: 74 metros
-Tramo 2 A: 58 metros
-Tramo 3: 487 metros
-Tramo 4: 206 metros
Helechal:
-Tramo 1: 195 metros
-Tramo 2: 192 metros
-Tramo 3: 153 metros
Juan Bueno:
-Tramo 1: 367 metros
-Tramo 2: 210 metros
-Tramo 3: 186 metros
-Tramo 1 A: 71 metros

Gramalote.
Se está estudiando el tema de la remoción de los derrumbes, la próxima semana se revisa si se va realizar más alcance por las alcantarillas, siendo reflejadas en Santa Anita y Boyacá.
El programado para el convenio 1943 es de 80.00% y un ejecutado de 81.11% con un avance del 1.11%.

11)Gobernación 2033 de 2021.

Municipios que ya fueron remitidos los informes finales de interventoría son: Villa caro, Herrán, Mutiscua, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Cachira, Gramalote, Santiago, Pamplonita, Salazar de las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario y el Zulia.

El ingeniero Jean Ariel Curmen pregunta si ¿las cantidades están supeditadas a los ajustes realizados para dar los alcances del rubro de mantenimiento?
El ingeniero Jairo responde que si.
El ingeniero Jean Ariel Curmen hace observaciones a los informes finales que fueron remitidos y a los informes mensuales que no tienen firma del Ingeniero Leonel.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
REMITIR EL OFICIO A LA GOBERNACIÓN PARA CONTINUAR CON EL ESTUDIO DE LA APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA.	30/01/2025	GAVINCO SAS
VERIFICAR LAS CARPETAS DEL INFORME FINAL.	31/01/2025	GAVINCO SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH OMAIRA SEPÚLVEDA.	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRÉS QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
JUAN GABRIEL CORREDOR	INGENIERO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JEAN ARIEL CURMEN CEPEDA	GESTOR TÉCNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	[illegible]
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 08/12/25

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 82

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión Temporal Edival - Troya 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Covinoc Ingenieros Consultores SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control Contrato de obra 2590 - Corozal - California.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

① Inicio de Actividades y Actividades a la Fecha.
② Continuidad en los Trabajos y Horarios que se Van a Manejar.
③ Incremento de Personal y Frentes de Trabajo
④ Inicio de Actividades Sumidero - entrega de Item No Previsto
⑤ Apertura de Vía Tramos Ejecutados.
⑥ Limpieza General.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

① Actualmente el Contratista se encuentra realizando la logistica de Inicio de Actividades Ingreso de Maquinaria e Ingreso de Personal a los Puntos de Intervencion Actual Tramo #6 y #2, Que Son los Proyectados para la Continuidad de Actividades
De igual Manera Se le solicita al Contratista la Continuidad de las Diferentes Obras de Drenajes Pendientes:
Tramo 1 (Sumidero Transversal)
Tramo 5 (Terminacion Rellenos Box Culvert y filtro Franceses)
Tramo 4 (Terminacion Rellenos Box Culvert)
De Acuerdo a lo Manifestado por el Contratista esta Semana se Alcanza finalizado todo el tema de Materiales y A partir de la Proxima Semana Se Iniciara Con el Vaciado de elementos de Concreto.

② La interventoria le Manifiesta al Contratista de Obra Sobre los Horarios Laborales Que Se Van a Manejar

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP-MIN-05-14-PR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 08/01/25

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Con el fin de que se contemple un plan de contingencia para dar cumplimiento en el plazo actual del contrato que es hasta el 28 de febrero de 2025.
Por parte del contratista manifiesta que a partir de la fecha se tiene. Programado el horario Normal, por lo tanto se tiene pendiente reunion con el personal con el fin de establecer en conjunto los Nuevos horarios. y Avances semanales con el fin de cumplir con los tiempos.

③ El Contratista Manifiesta que se intervendra los tramo #4, #3 y #2 Cada uno de ellos con una cuadrilla compuesta de 7 personas.

④ El Contratista Manifiesta que el Dia Lunes 13 de Enero realizara la Entrega del item no previsto de la Reglilla por lo tanto queda como pendiente esta entrega.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

y de igual Manera se indica una vez se tenga la Aprobacion de este Nuevo Item

⑤ La interventoria le Manifiesta al Contratista los Compromisos Realizados Con la Comunidad de California, donde se Queda en habilitar el Paso por obras Hidraulicas Box Culvert y los tramos ya ejecutado en la Vereda, de igual Manera se debe habilitar el Tramo #1 hasta el Progresiva.

El Contratista Manifiesta que esta Semana se tendra la Maquinaria para la ejecucion de estas trabajos Con el fin de tener Paso Normal y Continuar con Actividades en el tramo #6.

⑥ Se le Recuerda al Contratista la Importancia de Realizar limpieza General en los Tramos de Placa Huella ejecutados y Asi Mismo Mantener durante la ejecucion Limpia la Areas

DESARROLLO DE LA REUNION

de Trabajo.

Finalizando la Reunion se evidencia la Presencia de Maquinaria Amarilla (Motoniveladora) para Adecuacion de Subrasante para posterior Instalacion de Estructura (subbase Granular) en Rellenos en Box Culvert.

Se evidencia Personal de Topografia e Ingenieros en los drenajes 4-6 y 1. en Trabajos de Cunetas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPVAM01.08.14.F.V.2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	08/01/25 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Inicio Vaciado de Concretos	13/01/2025	Contratista Obra
Entrega Tapón Pozo Pantalla	13/01/2025	

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose H. Torres	Residente Int	Conviasa	
Guillermo Quintero	Director de Obra	UT Edvial-Trojes	
Luis Ramiro Ulloa	Ingeniero Obra	UT Edvial Trojes	
Cristian Ramos	Inspector Técnico	Conviasa	
Sindy Adriana Vizcaino R.	Insp SST	Conviasa	
Alvaro Andres Rojas	Ingeniero Residente	UT Edvial Trojes	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	[illegible]
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	10/01/25 (DD/MM/AAAA)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No: 43
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión Temporal Edival - Inga 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cavinca Ingenieros Consultores SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Seguimiento Contrato de obra 2590 - Reunion Comunidad California (Verificacion en Campo obras Hidraulicas).

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1) Socializacion obras Hidraulicas Definitivas a ejecutar

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

① Teniendo en Cuenta la Solicitud Realizada por parte de la Comunidad de la Vereda California en donde han Venido Manifestando que se les Socialice las Obras Hidraulicas Definitivas a Ejecutar debido a Algunas observacion que ellos tienen, se Realiza Recorrido en Cada uno de los Tramos y se Verifica lo existente y lo que se Va a Ejecutar.

finalmente se Ejecutaran las Siguientes Obras Hidraulicas:

Tramo 2

Por Solicitud de la Comunidad se Reubica Alcantarilla Doble Ducto que Inicialmente estaba en el Pr2+820 y pasa al Pr2+644.

Tramo 3

A la fecha se encuentra Ejecutada las Obras Hidraulicas Inicialmente Proyectadas.

Tramo 4.

Por Solicitud de la Comunidad No se Ejecutara la Alcantarilla Pr3+297 y

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

a la fecha se cuenta ejecutado lo proyectado Box Culvert 2x2 Pr3+485, Box Culvert 2x2 Pr3+530.

Tramo 5.

La Comunidad manifiesta que el Diseño del Predio donde se tenía proyectado la ejecución del Box Culvert 1.5x1.5 Pr4+338 No Autorizo el Descole del Mismo por lo tanto No se ejecutara. el .

Las Demas obras se tienen ya todas ejecutadas.

Tramo 6.

La Comunidad manifiesta que las siguientes obras Hidraulicas proyectadas No so Necesarias debido a que la existente son funcionales y de igual Manera Algunos Vecinos No Autorizaron la Ubicación de los Mismos

Pr4+726	Box Culvert 2x2
Pr4+900	Alcantarilla Sencilla
Pr4+985	Alcantarilla Doble Ducto
Pr5+170	Alcantarilla Sencilla

las demas obras se ejecutaron de Acuerdo a lo proyectado.

Tramo 10

Por solicitud de la Comunidad manifiestan que no se ejecute debido a que la Dueña del Predio No Autorizo el Descole de la obra Hidraulica.

Tramo 9

La Comunida Manifiesta que la obra existente tiene la Capacidad para Descabar el Agua de escorrentia y Durante Muchos Años no se, ha presentado Ningun inconveniente por lo tanto No se ejecuto la obra proyectada.

Finalmente la Comunidad Requiere que Con el Recurso Sobrante se Supla la Necesidad que hay en Varias Sitios Dentro de Carretera Vial Referente a Cunetas para estabilidad de Taludes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	[illegible]
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	10/01/16 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Carlos M. Galvez	Residente Calibración	Calipavimento	
Cristian Alfonso Ramos	Ingeniero Técnico	Gavinco	
Ramiro Polo	Residente Verificación	Cahpacia	
William Quintero	Director de Obra	UT Edival Tuja	
Alvaro A. Rojas Silva	Ing. Residente	UT Edival Tuja	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3/01/2019 (Día | Mes | Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No: 84
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión Temporal Edival - Tiaja 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gaviria Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control Contrato de Obra — Veredas Santo Domingo y Rincanada Municipio de Arboledas.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Actividades a la fecha Vereda Santo Domingo
2. Actividades a la fecha Vereda la Rincanada
3. Compromiso de ejecución de M1 de Placa Huella Semanal
4. Obras Hidraulicas Pendientes
5. Observaciones finales
6. Observaciones otros Componentes

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1.06-16.075-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	13/01/15 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

① El Contratista el Dia de hoy se encuentra ejecutando Actividades de Vaciado de Concreto de 21 Mpa para Cunetas, se tiene el siguiente Personal y Maquinaria en Campo.

- Personal
  (1) Maestro
  (1) Oficial
  (3) Ayudantes
- Maquinaria:
  (1) Volqueta
  (1) Dumper
  (1) Mezcladora

② En la Vereda Rincanada se encuentra personal Realizando Actividades de Adecuacion de Subrasante y Campantacion para Ventana por Vacio elementos de Placa Huella.

- Personal
  (1) Maestro
  (1) Oficial
  (5) Ayudantes
- Maquinaria
  (1) Dumper
  (1) Mezcladora
  (1) Pajanta

Teniendo en Cuenta lo evidenciado en Campo el Dia de hoy, no se Registra Avance en Ml de Placa Huella en estos Dos Corredores Viales, se espera que el Contratista finalizando la semana tenga un Avance Significativo.

③ Teniendo en Cuenta los Ml faltantes en el Municipio de Albergues se le Recuerda al Contratista de Obra la importancia de tener un Avance Semanal de 100 ml de ejecucion Global de Placa Huella con el fin de Dar Cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

con los tiempos establecidos
De igual Manera a la fecha se evidencia Muy poco personal.

④ De Acuerdo al Recorrido Realizado en los frentes de trabajo y al No evidenciar Actividades en Obras de Drenajes, Se le solicita al Contratista el Ingreso de Cuadrillas en los frentes donde se tienen pendientes (obras de Drenajes) Alcantarillas y Box culvert.

Asi Mismo es Importante de que se Realicen Actividades con personal Distinto al de la placa huella exclusivamente para obras de Drenajes.

Se Deja establecido en la Presente Acta fecha de Ingreso de Personal para estas Actividades.

⑤ De Acuerdo a todo lo Mencionado Anteriormente la Interventoria estara Corroborando el Avance de entrada de Maquinas, personal, Rendimientos, por lo tanto si el Contratista

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

No termina en los Tiempos establecidos se Notifica a la entidad Contratante Gobernacion Norte de Santander para el Inicio de Sanciones, Segun Sea el Caso.

⑥ Componente SST

Se solicita al contratista la documentación inicial de los trabajadores que van a ingresar, asi mismo la entrega de dotación y la capacitación al personal que se encuentra vinculado laboralmente.

Se le solicita al contratista realizar la actividad de orden y aseo en todas las frentes de obra vigentes (limpieza, recolección de bolsas de cemento, recolección de cinta vieja y deteriorada)

Se le solicita al contratista ubicar los puntos de emergencias en las obras donde se encuentre personal laborando.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: MEP-GIN-LIN-14-FR-2 VERSIÓN: 1 PÁGINA: FECHA: 13/01/25 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Ingreso Personal Obra Hidraulicos	El contratista en dia Fecha	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose H Torres S.	Residente Int.	Conunca	
Carlos Alberto Rivera	Inspector Tecnico	Consorcio	
Jhon A Avendaño	Residente Obra	UT: Conunca - Tapias	
David J Galvis R	Residente SST	UT. Edival - Tapias	
Ruben Eduardo Espitia	Hsq Interventoria	Ingenieros SAS	
William Quintero	Director De Obra	UT Edival. Tapias	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	23/01/25

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 85
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión Temporal Edival Inpo - 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cavinca Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Recorrido en Campo Tramos en ejecución
2. Observaciones Realizadas
3. Compromisos Establecidos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza recorrido a lo largo de los tramos de Placa Huella en ejecución 6,2 y 4 Con el fin de evidenciar las actividades que se ejecutan en Campo.

Tramo #6

① Excavación sin Clasificar para Vía Rastra
② Compactación de Subbase granular
③ Corte, figurado y Armado de Acero de Refuerzo #3
④ Vaciado de Concreto de 21 Mpa y 14 Mpa
⑤ Excavaciones para Adecuación de Anchos.

Tramo 2

① Excavación Sin Clasificar para Vía Rastra
② Compactación Área de Subbase
③ Armado de Acero de Refuerzo #3
④ Vaciado de Concreto para elemento de Placa Huella

Tramo 4.

① Armado de formaleta para elementos
② Vaciado de Concreto de 21 Mpa y 14 Mpa

La interventoría le Manifiesta al Contratista la importancia de que se continue

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

con las Actividades de las obras de Drenajes en el Tramo #1 que se tienen pendiente Sumidero Transversal, Rampa Bateon, Colector Tuberia de Pvc 36", de igual Manera se Hecha el Aseo General en Diferentes Sitios Donde se Evidencia la Necesidad de Limpieza

(2) Se le Manifiesta al Contratista la Necesidad de que se Implementen Jornadas extendidas de Trabajo con el Fin de Cumplir con los Tiempos Contractuales.

(3) Se Dejan los siguientes Compromisos:
Terminacion del Tramo 6 - 20 al 25 feb
Terminacion Tramo 2 y 4 - 15 feb.
Inicio Actividades en Tramos - A partir del 15 febrero
Del 7 al 12
Inicio Actividades de Sumidero - 27 Enero
Ingreso de Nueva Cuadrilla - 27 Enero
Obras de Drenaje

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Contratista manifiesta que el día hoy fue enviada la solicitud de prorroga, queda pendiente la respuesta por parte de la interventoría.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MAN-04-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 23 | 01 | 25
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PROXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
José H. Dries	Residente Int	Conirco	
Alvaro A Rojas Silva	Residente Obra	UT EDUARD TROJA	
Luis Ramiro Muñoz	Ingeniero Obra	UT EDUARD TROJA	
William Quintero P.	Director de Obra	UT Eduard Troja	
Jaime A. Quintero	Director Int	Conirco	

INFORMES SEMANALES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 83 del 27/12/2024 al 2/01/2025 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

GOBERNACIÓN - 1943

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 7.565.000.000,00
			$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 24.463.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO DE 2025		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	2.806.705,773	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	171.459.137	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 19.497.032.778,64	79,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.069.116.625,29	77,95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (427.916.153,35)	-1,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 436.600.000,98	63,07%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.497.032.778,64	79,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.505.716.626,27	79,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 8.683.847,63	0,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.231.513,66	0,05%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-10 - FEUT-11 del 12/12/2024

PERIODO FACTURADO: dic-24

VALOR FACTURA: $ 3.081.978.541,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.885.242.207,01	96,61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.885.242.207,01	96,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024

PERIODO FACTURADO: oct-24

VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 80,86% | Avance o Atraso Físico %: 0,04%

Meta Física Ejecutada %: 80,90%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCÁN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	89,20%				89,20%	1,68%
					Ejec	90,02%				90,02%	1,69%
Construcción De Placa Huella	ML	3723			Prog	413	1556	762	732	3463	18,07%
					Ejec	413	1556	762	732,00	3463	18,07%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	34			Prog	2	2	4	4	12	1,41%
					Ejec	2	2	4	4	12	1,41%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	44820,92			Prog	13360,95	11573,35	10767,35	6028,72	41730,37	0,75%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	6028,72	41730,37	0,75%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo POTREROS	Tramo CINERA	Tramo HELECHAR	Tramo JUAN BUENO	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3332			Prog	585	1038	539	838	3000	16,74%
					Ejec	585	1038	539	838	3000	16,74%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (30), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	34			Prog	6	5	1	6	17	2,25%
					Ejec	6	5	1	6	18	2,27%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	48461,61			Prog	6145,90	4300,00	10218,38	8998,80	29663,08	0,54%
					Ejec	6145,90	4300,00	10218,38	8998,80	29663,08	0,54%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Motoniveladora	1	0
Compactador min 7 Ton	1	0
Volquetas	2	0
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		0
Dumper		0
Total	5	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACÁ	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2905,2			Prog	1342	1022	535		2899	13,43%
					Ejec	1342,00	1022,20	535		2899	13,43%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (20), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 2X2 (1).	UND	23,00			Prog	10,00	8,00	0,00		18	2,02%
					Ejec	10	8	0		18	2,02%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	52602,95			Prog	17987,00	15573,65	8216,01		41776,66	0,76%
					Ejec	17987,00	15573,65	8216,01		41776,66	0,76%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Motoniveladora	1	0
Compactador min 7 Ton	1	0
Volquetas	2	0
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		0
Dumper		
Total	5	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** _____	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo LOS PATIOS**				**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	3567,10				3567	22,07%
					Ejec	3567,10				3567	22,07%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	7				7	1,05%
					Ejec	7,00				7	1,05%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	150715,56			Prog	15236,68				15236,68	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Excavadora hidráulica 320	0	0
Motoniveladora	1	0
Compactador min 7 Ton	1	0
Volquetas	2	0
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		0
Dumper		
Total	5	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se realiza corrección en ejecutado ml de placa huella Los patios, por error de digitación no se incluyo el valor real el cual es a la fecha 2987,10

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO: SI X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL: SI X	NO
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la vía que conduce a Cúcuta al Municipio de Santiago	PERMISO MINERO: SI X	NO
	TRITURADORA LA AMARELA	LICENCIA AMBIENTAL: SI X	NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o título minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda
Corozal, Cinera.

OBSERVACIONES:
Se tienen puntos de atención al usuario en cada uno de los Municipios, Los Patios, Gramalote y Los patios.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Durante la semana, el contratista lleva a cabo la entrega de subsanaciones correspondientes a los componentes de estudios y diseños pendientes, con el objetivo de concluir la etapa actual.


ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo, no se llevan a cabo actividades técnicas en ninguno de los corredores viales correspondientes a los frentes de trabajo en los municipios de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según lo acordado con el contratista de obra, el inicio de las actividades administrativas y operativas en campo está previsto para el 7 de enero de 2025.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



MUNICIPIO DE LOS PATIOS - SIN ACTIVIDADES



MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - SIN ACTIVIDADES



MUNICIPIO DE GRAMALOTE - SIN ACTIVIDADES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL EDVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Se le recuerda al contratista de obra la importancia de cumplir con sus obligaciones generales para garantizar que se respeten los plazos establecidos en el contrato de acuerdo al Adicional No3 en tiempo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 84 del 3/01/2025 al 9/01/2025 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

GOBERNACIÓN - 1943

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	16.898.027.326,00	
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$	7.565.000.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$	24.463.027.326,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO DE 2025		$	-	
			$	-	
			$	-	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4.288.164.910,00	
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$	268.536.435,20	
		VALOR ADICIONES:	$	500.000.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	5.056.701.345,20	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO DE 2025	VALOR ANTICIPO:		N/A	
		VALOR AMORTIZADO:		N/A	
		SALDO POR AMORTIZAR:		N/A	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	2.806.705.773	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	171.459.137	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	19.497.032.778,64	79,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	19.069.116.625,29	77,95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(427.916.153,35)	-1,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	436.600.000,98	63,07%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	19.497.032.778,64	79,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	19.505.716.626,27	79,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	8.683.847,63	0,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	12.231.513,66	0,05%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-10 - FEUT-11 del 12/12/2024
PERIODO FACTURADO: dic-24
VALOR FACTURA: $ 3.081.978.541,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	4.905.653.476,29	97,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	4.885.242.208,09	96,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	20.411.269,28	0,40%
	$	20.411.269,28	0,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 80,98% | Avance o Atraso Físico %: -0,07%
Meta Física Ejecutada %: 80,91%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCÁN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	90,00%				90,00%	1,69%
					Ejec	90,02%				90,02%	1,69%
Construcción De Placa Huella	ML	3723			Prog	413	1556	762	732	3463	18,07%
					Ejec	413	1556	762	732,00	3463	18,07%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	34			Prog	2	2	4	4	12	1,41%
					Ejec	2	2	4	4	12	1,41%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	44820,92			Prog	13360,95	11573,35	10767,35	6028,72	41730,37	0,75%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	6028,72	41730,37	0,75%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo POTREROS	Tramo CINERA	Tramo HELECHAR	Tramo JUAN BUENO	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3332			Prog	585	1038	539	838	3000	16,74%
					Ejec	585	1038	539	838	3000	16,74%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (30), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	34			Prog	6	5	1	6	17	2,25%
					Ejec	6	5	1	6	18	2,27%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	48461,61			Prog	6145,90	4300,00	10218,38	8998,80	29663,08	0,54%
					Ejec	6145,90	4300,00	10218,38	8998,80	29663,08	0,54%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		0
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACÁ	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2905,2			Prog	1342	1022	535		2899	13,43%
					Ejec	1342,00	1022,20	535		2899	13,43%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (20), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 2X2 (1).	UND	23,00			Prog	11,00	8,00	0,00		19	2,14%
					Ejec	9	8	0		17	1,91%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	52602,95			Prog	17987,00	15573,65	8216,01		41776,66	0,76%
					Ejec	17987,00	15573,65	8216,01		41776,66	0,76%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Motoniveladora	1	0
Compactador min 7 Ton	1	0
Volquetas	2	0
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		0
Dumper		
Total	5	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	3567,10				3567	22,07%
					Ejec	3567,10				3567	22,07%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	7				7	1,05%
					Ejec	7,00				7	1,05%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	150715,56			Prog	15236,68				15236,68	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
Se realiza corrección en ejecutado ml de placa huella Los patios, por error de digitación no se incluyo el valor real el cual es a la fecha 2987,10

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Excavadora hidráulica 320	0	0
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la vía que conduce a Cúcuta al Municipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o título minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	15	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 33

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda
Corozal, Cinera.

OBSERVACIONES:
Se tienen puntos de atención al usuario en cada uno de los Municipios, Los Patios, Gramalote y Los patios.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la semana, el contratista lleva a cabo la entrega de subsanaciones correspondientes a los componentes de estudios y diseños pendientes, con el objetivo de concluir la etapa actual.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

1 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Durante la semana, el contratista realiza acopio de materiales (arena, triturado, subbase granular, varillas corrugada #3, cemento y tubería de PVC de 36") en el almacén situado en el Municipio de Arboledas con el fin de trasladar los mismos a las diferentes veredas.

Tramo 1C - Vereda Santo Domingo

Se inicia el almacenamiento de materiales pétreos a lo largo del tramo en intervención con el fin de adecuar los espacios para inicio de actividades en campo.

Se realiza el almacenamiento de cemento y varilla corrugada #3 para el inicio del corte y figurado de acuerdo a las diferentes dimensiones de elementos de placa huella.

2 MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Durante la semana, el contratista realiza traslado de materiales (arena, triturado, subbase granular, varillas corrugada #3 y cemento) a lo diferentes puntos de intervención tramo 6, 2 y 3 para el inicio formal de actividades.

Se inicia actividades de reconformación y compactación para adecuación de subbase granular ya instalada para inicio de actividades de ejecución de placa huella.

Se realiza excavaciones sin clasificar para adecuación de anchos de vía en los tramos 6, 2 y 3 para estructura de placa huella.

Se da inicio al vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de cuneta y bordillos pendientes en el tramo No1 con el fin de dar por terminado la sección completa de placa huella.

ACTIVIDADES SOCIALES

Durante los días laborales, se efectúa la revisión de registros del área social para determinar los temas pendientes y entregar la información correspondiente al componente ambiental PAGA.

ACTIVIDADES SST

Se lleva a cabo la inspección en terreno para asegurar el cumplimiento de los aspectos relacionados con seguridad y salud ocupacional, considerando la reactivación de labores por parte del contratista de obra.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana, se realiza la revisión de documentación del componente ambiental con el propósito de identificar los asuntos pendientes y proporcionar la información correspondiente al componente ambiental PAGA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo a lo dialogado con el contratista de obra en reunión en campo el día miércoles 08 de enero de 2025 se tiene proyectado inicio de vaciado de concreto y avance físico a partir del día 13 de enero de 2025.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



PROGRAMADO

MANTENIMIENTO | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACIÓN | TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL | PUENTE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



MAQUINARIA EN CAMPO PARA INICIO DE ACTIVIDADES



ACOPIO DE MATERIALES PÉTREOS



ACOPIO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLAS

LOS PATIOS



REUNIÓN EN CAMPO PARA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN CAMPO



TRASLADO DE MAQUINARIA AMARILLA (MOTONIVELADORA)



VISTA GENERAL ESTADO ACTUAL TRAMOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Se le recuerda al contratista de obra la importancia de cumplir con sus obligaciones generales para garantizar que se respeten los plazos establecidos en el contrato de acuerdo al Adicional No3 en tiempo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 85 del 10/01/2025 al 16/01/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

GOBERNACIÓN - 1943

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 7.565.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 24.463.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO DE 2025		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	2.806.705.773	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	171.459.137	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 19.545.958.833,29	79,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.155.408.047,26	78,30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (390.550.786,03)	-1,60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 436.600.000,98	63,07%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.545.958.833,29	79,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.592.008.048,24	80,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 46.049.214,95	0,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.653.414,00	0,10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 86.291.421,97	0,35%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-10 - FEUT-11 del 12/12/2024
PERIODO FACTURADO: dic-24
VALOR FACTURA: $ 3.081.978.541,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.926.064.745,57	97,42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.885.242.208,09	96,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 20.411.269,28	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.411.269,28	0,40%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 81,11% — Avance o Atraso Físico %: 0,43%
Meta Física Ejecutada %: 81,54%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCÁN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	90,00%				90,00%	1,69%
					Ejec	90,02%				90,02%	1,69%
Construcción De Placa Huella	ML	3723			Prog	413	1556	762	732	3463	18,07%
					Ejec	425	1577	762	732,00	3496	18,24%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	34			Prog	2	2	4	4	12	1,41%
					Ejec	2	2	3	4	11	1,29%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	44820,92			Prog	13360,95	11573,35	10767,35	6028,72	41730,37	0,75%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	6028,72	41730,37	0,75%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo POTREROS	Tramo CINERA	Tramo HELECHAR	Tramo JUAN BUENO	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3332			Prog	585	1038	539	838	3000	16,74%
					Ejec	585	1038	539	838	3000	16,74%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (30), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	34			Prog	6	5	2	6	18	2,38%
					Ejec	6	5	1	6	18	2,27%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	48461,61			Prog	6145,90	4300,00	10218,38	8998,80	29663,08	0,54%
					Ejec	6145,90	4300,00	10218,38	8998,80	29663,08	0,54%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACÁ	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2905,2			Prog	1342	1022	535		2899	13,43%
					Ejec	1342,00	1022,20	535		2899	13,43%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (20), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 2X2 (1).	UND	23,00			Prog	11,00	8,00	0,00		19	2,14%
					Ejec	9	8	0		17	1,91%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	52602,95			Prog	17987,00	15573,65	8216,01		41776,66	0,76%
					Ejec	17987,00	15573,65	8216,01		41776,66	0,76%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Motoniveladora	1	0
Compactador min 7 Ton	1	0
Volquetas	2	0
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		0
Dumper		
Total	5	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** ____	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo LOS PATIOS**				**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	3567,10				3567	22,07%
					Ejec	3656,20				3656	22,62%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	7				7	1,05%
					Ejec	8,00				8	1,20%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	150715,56			Prog	15236,68				15236,68	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se realiza corrección en ejecutado ml de placa huella Los patios, por error de digitación no se incluyo el valor real el cual es a la fecha 2987,10

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Excavadora hidráulica 320	0	0
Motoniveladora	1	1
Compactador mín 7 Ton	1	1
Volquetas	2	2
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: Municipio, El Zulia — CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN: Quebrada La Amarilla con la vía que conduce a Cúcuta al Municipio de Santiago — TRITURADORA LA AMARILLA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o título minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	38	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	30	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 48

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda
Corozal, Cinera

OBSERVACIONES:
Se tienen puntos de atención al usuario en cada uno de los Municipios, Los Patios, Gramalote y Los patios.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

A lo largo de la semana, se generan ciertos conceptos relacionados con las observaciones de estudios y diseños pendientes, con el propósito de completar todos los componentes.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

1 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Tramo 1C - Vereda Santo Domingo
Se continúan actividades de estabilización de la subrasante con cemento (Suelo - Cemento) en la continuidad del tramo 1C.
Se realiza compactación del suelo - cemento a lo largo del tramo 1C con el fin de darle adherencia a la mezcla de terreno natural con cemento.
Durante la semana se realiza corte, figurado e instalación de acero de refuerzo #3 - 3/8" longitudinal y transversal para los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huella, cuneta y bordillo).
Considerando el proceso constructivo en curso, se realiza la instalación de formaleta de madera para la modulación de los elementos de la franja central y otros componentes modulados.
Se realiza el vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para elementos de franja central dando continuidad en los elementos del tramo 1C.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de palca huella tramo No1C (viga riostra, huella, cuneta y bordillo).
Tramo 1 - Vereda Rinconada
Se realiza compactación de la subrasante natural con el fin de nivelar la sección transversal a lo largo del tramo No1.
Se lleva a cabo el traslapo del acero de refuerzo #3 - 3/8" longitudinal para los distintos elementos de la placa huella, así como la instalación del acero transversal correspondiente a dichos elementos.
Se realiza el vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para elementos de franja central dando continuidad en los elementos del tramo 1.
Se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa, producido en obra, destinado a los elementos de la placa huella en el tramo No.1, abarcando la viga riostra, la huella, la cuneta y el bordillo.
Se lleva a cabo la continuidad de excavación sin clasificar en el tramo No. 1, con el propósito de realizar las adecuaciones necesarias en los anchos de la vía. Esta actividad incluye la remoción de material existente para garantizar que las dimensiones de la vía.

2 MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Tramo 2, 3 y 6- Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California
Se realiza reconformación y compactación de subbase granular a lo largo del tramo No2.
Se continua con el extendido, compactación y humectación de material de subbase granular a lo largo del tramo No3.
Se continua con el corte, figurado e instalación de acero de refuerzo #3 - 3/8 para los diferentes elementos de placa huella en los tramos 3 y 6.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para elementos de franja central y sobreanchos en los tramos de placa huella 3 y 6.
Durante toda la semana el contratista reanuda nuevamente el vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para la continuación en los tramos de placa huella No3 y No6.
Se realiza excavación sin clasificar para la adecuación de anchos de vía a lo largo de los tramos 4 y 6.

La interventoría está llevando a cabo el seguimiento al inicio de las obras de drenaje pendientes hasta la fecha, considerando que aún no se han iniciado las actividades relacionadas, lo que está provocando retrasos en las obras hidráulicas.

ACTIVIDADES SOCIALES

A lo largo de la semana, se lleva a cabo la verificación en campo del cumplimiento de los aspectos sociales, realizando una inspección directa de los mismos en el lugar.
Se revisa la documentación de este componente con el objetivo de emitir observaciones sobre posibles faltantes.

ACTIVIDADES SST

Se realiza una inspección en el sitio para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional, tras la reactivación de las labores por parte del contratista.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

A lo largo de la semana, se revisa la documentación del componente ambiental para identificar los pendientes y solicitar la información necesaria para el componente ambiental PAGA.
Se verifica en campo el cumplimiento de los aspectos ambientales en cada uno de los frentes de trabajo donde se ejecutan actividades actualmente.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar actividades en los corredores viales del Municipio de arboledas y Los patios e inicio de obras de drenaje pendiente a la fecha.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 1C



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA



ADECUACIÓN DE ANCHOS DE VÍA PARA TRAMO No1 VEREDA LA RINCONADA



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 - 3/8"

LOS PATIOS



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO TRAMO 6 VEREDA CALIFORNIA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ELEMENTOS DE VIGA RIOSTRA



COMPACTACIÓN Y HUMECTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Por parte de la interventoría durante el período se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna: 1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-0014-25 del 14 de enero de 2025 se realizan observaciones al componente de topografía tramo 5 Vereda Santo Domingo Municipio de Arboledas. 2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-0015-25 del 15 de enero de 2025 se le solicita al contratista de obra la entrega de informes SST, Ambiental y Social de Enero de 2025. 3. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-0017-25 del 16 de enero de 2025 se realizan observaciones al componente de topografía tramo 5 Vereda Volcán Municipio de Arboledas. 4. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-0019-25 del 16 de enero de 2025 se realizan observaciones a la reprogramación de obra de acuerdo al adicional en tiempo No3. 5. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-0034-25 del 17 de enero de 2025 se le solicita al contratista de obra la entrega de un plan de contingencia ejecución obras hidráulicas faltantes por ejecutar.	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 86 del 17/01/2025 al 23/01/2025 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

GOBERNACIÓN - 1943

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	16.898.027.326,00	
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$	7.565.000.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$	24.463.027.326,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO DE 2025		$	-	
			$	-	
			$	-	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4.288.164.910,00	
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$	268.536.435,20	
		VALOR ADICIONES:	$	500.000.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	5.056.701.345,20	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO DE 2025	VALOR ANTICIPO:		N/A	
		VALOR AMORTIZADO:		N/A	
		SALDO POR AMORTIZAR:		N/A	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	2.806.705.773	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	171.459.137	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	19.569.894.431,38	80,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	19.404.645.122,72	79,32%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(165.249.308,66)	-0,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	436.600.000,98	63,07%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	19.569.894.431,38	80,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	19.841.245.123,70	81,11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	271.350.692,32	1,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	24.653.414,43	0,10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	249.237.075,46	1,02%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-10 - FEUT-11 del 12/12/2024
PERIODO FACTURADO: dic-24
VALOR FACTURA: $ 3.081.978.541,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	4.946.476.014,85	97,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	4.885.242.208,09	96,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20.411.269,28	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	20.411.269,28	0,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 81,46% | Avance o Atraso Físico %: 1,17%
Meta Física Ejecutada %: 82,62%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCÁN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	90,00%				90,00%	1,69%
					Ejec	90,02%				90,02%	1,69%
Construcción De Placa Huella	ML	3723			Prog	415	1565	768	735	3483	18,18%
					Ejec	446	1592	762	732,00	3532	18,43%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	34			Prog	2	2	4	4	12	1,41%
					Ejec	2	2	4	5	13	1,53%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	44820,92			Prog	13454,00	11573,35	10830,48	6028,72	41886,55	0,76%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	6028,72	41730,37	0,75%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ———**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3332			Prog	592	1043	542	840	3017	16,84%
					Ejec	585	1038	539	838	3000	16,74%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (30), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	34			Prog	6	3	2	6	17	2,21%
					Ejec	6	5	1	6	18	2,27%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	48461,61			Prog	6284,14	4438,24	10293,91	8998,80	30015,09	0,54%
					Ejec	6145,90	4300,00	10218,38	8998,80	29663,08	0,54%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACÁ	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2905,2			Prog	1342	1022	535		2899	13,43%
					Ejec	1342,00	1022,20	535		2899	13,43%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (20), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 2X2 (1).	UND	23,00			Prog	9,00	8,00	0,00		17	1,91%
					Ejec	9	8	0		17	1,91%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	52602,95			Prog	18130,77	15681,00	8408,00		42219,77	0,76%
					Ejec	17987,00	15573,65	8216,01		41776,66	0,76%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Motoniveladora	1	0
Compactador min 7 Ton	1	0
Volquetas	2	0
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		0
Dumper		
Total	5	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** ———	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo LOS PATIOS**				**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	3602,00				3602	22,28%
					Ejec	3738,40				3738	23,13%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	9				9	1,35%
					Ejec	9,00				9	1,35%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	150715,56			Prog	15524,48				15524,48	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
Se realiza corrección en ejecutado ml de placa huella Los patios, por error de digitación no se incluyo el valor real el cual es a la fecha 2987,10

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Excavadora hidráulica 320	0	0
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	2
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la vía que conduce a Cúcuta al Municipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	86	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	17	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	53	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 96

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Corozal Cinera

OBSERVACIONES:
Se tienen puntos de atención al usuario en cada uno de los Municipios, Los Patios, Gramalote y Los patios.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Durante la semana, se lleva a cabo una mesa de trabajo técnica con el propósito de verificar la información relacionada con los componentes de estudios y diseños, además de tratar temas relacionados con el plazo contractual del proyecto.
El 23 de enero de 2025, el contratista presenta una solicitud formal de prorroga al contrato, con el fin de contar con el tiempo adicional necesario para completar todas las obras previstas en el proyecto y cumplir con los requisitos y plazos establecidos para su finalización.

ACTIVIDADES TÉCNICAS
1 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS
Tramo 1C - Vereda Santo Domingo

Se prosiguen las actividades de estabilización de la subrasante a lo largo del tramo 1C y se realiza compactación del mismo.
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillos faltantes a lo largo del tramo 1C.
Durante la semana, se lleva a cabo el proceso de corte, figurado e instalación del acero de refuerzo #3 - 3/8" en ambos sentidos, destinado a los diferentes componentes de la placa huella, como la viga riostra, la huella, la cuneta y el bordillo.
Se realiza la instalación de formaleta para modulación de elementos de franja central placa huella 1C.
Se realiza el vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para elementos de franja central dando continuidad en los elementos del tramo 1C.
Se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa, preparado en el lugar, para los elementos de la placa huella del tramo 1C, incluyendo la viga riostra, la huella, la cuneta y el bordillo.
Durante la semana el contratista realiza logística para inicio de actividades de alcantarillas a lo largo del corredor vial pendientes a la fecha.

Tramo 1 - Vereda Rinconada
Se continúa con la excavación no clasificada en el tramo No. 1, con el objetivo de realizar las adecuaciones requeridas en los anchos de la vía. Esta actividad implica la remoción del material existente para asegurar que las dimensiones de la vía sean las adecuadas.
Durante la semana, se continúa con la instalación del acero de refuerzo #3 - 3/8" en dirección longitudinal y transversal, avanzando en los elementos estructurales de la placa huella, como la viga riostra, la huella, la cuneta y el bordillo, correspondientes al tramo 1.
Se realiza armado de formaleta de madera para la modulación de los elementos de placa huella en la continuidad del presente tramo en ejecución.
Se lleva a cabo el vaciado de concreto de 14 MPa, elaborado en el sitio, para los elementos de la franja central y sobreancho, asegurando la continuidad en las estructuras del tramo 1.
Se realiza el vaciado de concreto de 21 MPa, elaborado en obra, para los elementos de la placa huella en el tramo No. 1, incluyendo la viga riostra, la huella, la cuneta y el bordillo.

Obras de drenaje - Vereda Volcán
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para solado de limpieza en los elementos de encole y descole alcantarilla Pr1+151.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 y #4 longitudinal y transversal para los elementos de encole y descole de alcantarilla Pr1+151.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de alcantarilla Pr1+151 pendiente elementos.
Se realiza excavación sin clasificar para alcantarilla para zanja y elementos de encole y descole alcantarilla Pr0+317
Se realiza instalación de tubería de PVC de 36 pulgadas para alcantarilla Pr0+317.
Se realiza relleno con material de excavación y se procede a la compactación del mismo para habilitar el paso por el corredor vial..

Obras de drenaje - Vereda Chicagua
Durante la semana se realiza excavación sin clasificar para zanja de tubería y elementos de encole y descole alcantarilla Pr0+734, Pr1+014 y Pr1+199.
Se realiza instalación de tubería de PVC de 36 pulgadas para alcantarilla Pr0+734, Pr1+014 y Pr1+199.
Se realiza relleno con material de excavación y se procede a la compactación del mismo para habilitar el paso por el corredor vial..
Se da inicio armado de formaleta de madera para nueva alcantarillas y se procede al vaciado de concreto de 21 Mpa losas de fondo elementos.

Obras de drenaje- Vereda Potreros
El contratista de la obra lleva a cabo el traslado de tubería de PVC de 36" para completar la alcantarilla faltante, así como el transporte de materiales pétreos para dar inicio a la construcción de la misma.

2 MUNICIPIO DE LOS PATIOS


Tramo 2, 3, 4 y 6- Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California
Se llevan a cabo actividades de excavación sin clasificar para la adecuación de los anchos de vía y, de manera similar, para el cajeo de la estructura de placa huella, con el fin de dar continuidad a los tramos de placa huella.
Se finalizan actividades de construcción de placa huella en el tramo No3 realizando el vaciado de concreto de 21 Mpa y 14 Mpa elaborado en obra de elementos de placa huella.
Se continua la instalación de geotextil 2400 N a lo largo del tramo No2 dando continuidad longitudinal en la placa huella en construcción.
Se continua con el extendido, compactación y humectación de subbase granular a lo largo del tramo No2 hasta la abscisa de finalización.
Durante la semana se continua con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 - 3/8 longitudinal y transversal para los diferentes elementos de placa huella en los tramos que se intervienen simultáneamente 2,4 y 6.
De acuerdo al proceso constructivo que se realiza, se vacía concreto de 14 Mpa para modulación de elementos de placa huella a lo largo de los tramos 2, 4 y 6.
A lo largo de la semana, el contratista continua el vaciado de concreto de 21 MPa preparado en obra para avanzar en los tramos de placa huella en ejecución 2,4 y 6.
Se realiza excavación sin clasificar para la adecuación de anchos de vía a lo largo de los tramos 4 y 6.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa solado de limpieza para elementos de encole y descole de alcantarilla doble ducto Pr2+995.
Se realiza armado de acero de refuerzo #4 y #3 longitudinal y transversal para poceta de encole y cabezote descole alcantarilla Pr2+995.
Se realiza armado de formaleta para modulación de elementos de encole y descole de acuerdo a las dimensiones especificas.
Se realiza excavación sin clasificar para zanja de tubería, elementos de encole y descole alcantarilla ubicada en el tramo No2 Pr2+820.
Se realiza instalación de tubería de PVC de 36" de acuerdo a especificaciones de la alcantarilla Pr2+820.
Se realiza relleno de zanja con material procedente de excavación con el fin de habilitar el paso por la presente abscisa.
Durante la semana se realiza densidades de campo para el seguimiento de la compactación en los diferentes tramos de placa huella
La interventoría solicita al contratista abrir el tramo No. 1, desde el PR0+00 hasta el PR0+650, siendo este último el lugar de ubicación del sumidero, y se procede con la señalización correspondiente.

ACTIVIDADES SOCIALES
Durante la semana, se efectúa la verificación en el sitio del cumplimiento de los aspectos sociales, realizando una inspección directa de los mismos en el lugar de trabajo.
ACTIVIDADES SST
Durante la semana, se observa en el sitio el incumplimiento de la señalización en algunos frentes de trabajo, por lo que se le solicita al contratista que tome las medidas correspondientes para corregir la situación.
Se lleva a cabo la verificación de la documentación relacionada con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
ACTIVIDADES AMBIENTALES
A lo largo de la semana, se efectúa un análisis de los documentos relacionados con el área ambiental para detectar los elementos pendientes y requerir la información indispensable para el componente ambiental PAGA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar las actividades de obra pendientes hasta la fecha, relacionadas con el mejoramiento a través de la construcción de placas huella y las obras de drenaje en los distintos frentes.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR PARA ADECUACIÓN DE ANCHOS DE VÍA VEREDA SANTO DOMINGO



VISTA GENERAL DE ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA CURVA



EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR PARA ZANJA ALCANTARILLA Y ELEMENTOS



VISTA GENERAL ARMADO DE FORMALETA Y VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA VEREDA RINCONADA



VISTA GENERAL INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ELEMENTOS HUELLA Y VIGA RIOSTRA



VISTA GENERAL DE ELEMENTO DE ENCOLE Y DESCOLE VACIADOS EN CONCRETO DE 21 MPA VEREDA VOLCÁN



EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR PARA ALCANTARILLA ZANJA TUBERÍA, ENCOLE Y DESCOLE



INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" DE PVC PARA ALCANTARILLA



VISTA GENERAL DE EXCAVACIÓN PARA ELEMENTOS DE ENCOLE Y DESCOLE ALCANTARILLA VEREDA CHICAGUA BAJO



VISTA EXCAVACIÓN DE DESCOLE



VISTA GENERAL TUBERÍA PVC DE 36" Y RELLENO DE LA MISMA

LOS PATIOS



VISTA GENERAL DE ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL #3 TRAMO 6 VEREDA COROZAL



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA



TOMA DE DENSIDADES DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO % DE COMPACTACIÓN

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. De manera reiterada, se le comunica al contratista el plazo establecido en el contrato y se le solicita aumentar las cuadrillas en los distintos frentes de trabajo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 87 del 24/01/2025 al 30/01/2025 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

GOBERNACIÓN - 1943

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	16.898.027.326,00	
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$	7.565.000.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$	24.463.027.326,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO DE 2025		$	-	
			$	-	
			$	-	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4.288.164.910,00	
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$	268.536.435,20	
		VALOR ADICIONES:	$	500.000.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	5.056.701.345,20	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO DE 2025	VALOR ANTICIPO:		N/A	
		VALOR AMORTIZADO:		N/A	
		SALDO POR AMORTIZAR:		N/A	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	2.806.705.773	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	171.459.137	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	19.594.547.845,81	80,10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	19.504.964.985,03	79,73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(89.582.860,78)	-0,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	481.600.000,98	69,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	19.594.547.845,81	80,10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	19.986.564.986,01	81,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	392.017.140,20	1,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	24.653.414,43	0,10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	145.319.862,31	0,59%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-10 - FEUT-11 del 12/12/2024
PERIODO FACTURADO: dic-24
VALOR FACTURA: $ 3.081.978.541,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	4.966.887.284,13	98,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	4.885.242.208,09	96,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$	20.411.269,28	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$	20.411.269,28	0,40%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 81,46% | Avance o Atraso Físico %: 1,70%
Meta Física Ejecutada %: 83,16%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCÁN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	90,00%				90,00%	1,69%
					Ejec	90,02%				90,02%	1,69%
Construcción De Placa Huella	ML	3723			Prog	415	1565	768	735	3483	18,18%
					Ejec	467	1595	762	732,00	3556	18,56%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	34			Prog	2	2	4	4	12	1,41%
					Ejec	2	2	4	5	13	1,53%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	44820,92			Prog	13454,00	11573,35	10830,48	6028,72	41886,55	0,76%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	6028,72	41730,37	0,75%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ———**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3332			Prog	592	1043	542	840	3017	16,84%
					Ejec	600	1038	539	838	3015	16,83%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (30), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	34			Prog	6	3	2	6	17	2,21%
					Ejec	6	5	1	6	18	2,27%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	48461,61			Prog	6284,14	4438,24	10293,91	8998,80	30015,09	0,54%
					Ejec	6145,90	4300,00	10218,38	8998,80	29663,08	0,54%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACÁ	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2905,2			Prog	1342	1022	535		2899	13,43%
					Ejec	1342,00	1022,20	535		2899	13,43%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (20), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 2X2 (1).	UND	23,00			Prog	9,00	8,00	0,00		17	1,91%
					Ejec	9	8	0		17	1,91%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	52602,95			Prog	18130,77	15681,00	8408,00		42219,77	0,76%
					Ejec	19237,00	15573,65	9536,01		44346,66	0,80%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	0
Volquetas	2	1
Bulldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	3602,00				3602	22,28%
					Ejec	3784,40				3784	23,41%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	9				9	1,35%
					Ejec	9,00				9	1,35%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	150715,56			Prog	15524,48				15524,48	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
Se realiza corrección en ejecutado ml de placa huella Los patios, por error de digitación no se incluyo el valor real el cual es a la fecha 2987,10

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Excavadora hidráulica 320	0	0
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	2
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la vía que conduce a Cúcuta al Municipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	86	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	17	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	53	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 96

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Corozal, Cinera

OBSERVACIONES:
Se tienen puntos de atención al usuario en cada uno de los Municipios, Los Patios, Gramalote y Los patios.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
A lo largo de la semana, se reciben documentos relacionados con los estudios y diseños de gaviones, así como las subsanaciones correspondientes a las observaciones pendientes hasta la fecha.
Se lleva a cabo una mesa de trabajo con el contratista de la obra para revisar las actividades relacionadas con obras de drenaje en el tramo No. 1, ubicado en la vereda Corozal - California. Asimismo, se verifica la inclusión de un ítem adicional no previsto correspondiente a la rejilla para el sumidero.
Se lleva a cabo una reunión de trabajo con el contratista de la obra para verificar las cantidades y ajustar el balance de la obra para modificación No. 5, conforme a lo solicitado por el INVIAS en relación con el cumplimiento de rubros específicos.

ACTIVIDADES TÉCNICAS
1 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS
Tramo 1C - Vereda Santo Domingo

Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 - 3/8 para los diferentes elementos de placa huella (cuneta y bordillo).
Durante toda la semana el contratista realiza vaciado de concreto de 21 Mpa de los elementos de placa huella cuneta y bordillo dando terminación a la sección transversal de placa huella.
A la fecha se tiene pendiente la ejecución de alcantarillas por lo tanto se tienen ventanas pendiente de fundida para finalización de sección transversal de placa huella.

Tramo 1 - Vereda Rinconada
Se continua con excavaciones sin clasificar para adecuación de anchos de vía, con el fin de dar cumplimiento a la sección de placa huella.
Se continua con el vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central y sobreancho dando continuidad en el tramos de placa huella en ejecución.
Se continua con el traslape de acero de refuerzo #3 - 3/8 para elemento de placa huella cuneta, bordillo para finalización de sección transversal de placa huella completa.
Durante la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos (viga riostra, huella, cuneta y bordillo) par placa huella en ejecución.
Se le realiza la solicitud al contratista de obra de dar continuidad a las alcantarillas faltantes por ejecutar.

Obras de drenaje - Vereda Volcán
Durante la semana el contratista realiza vaciado de concreto de 21 Mpa de elementos de cuneta y bordillos pendiente para culminación de sección transversal de placa huella completa.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 y #4 para elementos de encole y descole de alcantarilla Pr0+317 de acuerdo a diseños.

Obras de drenaje - Vereda Cinera
Se realiza armado de acero de refuerzo #3 - 3/8" para elementos de encole y descole de alcantarillas pendientes a la fecha.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos pendiente de cuneta y bordillo en áreas de alcantarillas.

Obras de drenaje - Vereda Chicagua
Durante la semana el contratista realiza traslado de materiales para el inicio de armado de acero de refuerzo y fundida de elementos de encole y descole de alcantarilla Pr0+734, Pr1+014 y Pr1+199.
Se realiza perfilación de excavaciones de elementos de encole y descole de alcantarilla.

Tramo 2- Vereda Potreros
Se realiza limpieza general de elementos de cuneta y bordillos pendientes en el tramo No2 para continuación de fundida de elementos de cuneta y bordillo.
Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 - 3/8 para elementos de placa huella tramo No2 faltantes, viga riostra, huellas, cuenta y bordillo.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de cuneta y bordillos faltantes en el tramo 2 dando continuidad a los mismos.
El contratista de la obra lleva a cabo el traslado de tubería de PVC de 36" para completar la alcantarilla faltante, así como el transporte de materiales pétreos para dar inicio a la construcción de la misma.

2 MUNICIPIO DE GRAMALOTE
Mantenimiento periódico - Vereda Boyacá
Se realizan actividades de mantenimiento periódico sobre el corredor vial vereda Boyacá con el fin de adecuar y mejorar las subrasante actual.
Mantenimiento periódico - Vereda Santa Anita
Se realizan actividades de mantenimiento periódico sobre el corredor vial vereda Santa Anita con el fin de adecuar y mejorar las subrasante actual.
Mantenimiento periódico - Vereda San Isidro
Se llevan a cabo labores de limpieza y retiro de escombros en zonas específicas a lo largo del corredor vial, considerando la inestabilidad de los taludes causada por las lluvias de los meses anteriores.


3 MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Tramo 2, 4 y 6- Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California
Dando continuidad a los tramos en ejecución actual el contratista de obra realiza actividades de construcción de placa huellas de acuerdo al proceso constructivo que se lleva.
Se realiza instalación de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella en los tramos 2,4 y 6.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa mezclado en obra para elementos de franja central y sobreancho a lo largo del tramo 2,4 y 6.
Se continua con el traslape de acero de refuerzo #3 - 3/8 de elementos de placa huella en general para los tramos 2,4 y 6.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de placa huella (Huella, viga riostra, cuneta y bordillo) en los tramos 2,4 y 6.
Se continua armado de acero de refuerzo #4 y #3 longitudinal y transversal para elemento de encole y descole alcantarilla.
Se realiza armado de formaleta para elementos de encole y descole de alcantarilla de acuerdo a dimensionamiento de cada uno de los elementos.


ACTIVIDADES SOCIALES
Se realiza una revisión en el lugar para asegurar el acatamiento de las condiciones sociales, llevando a cabo una supervisión presencial en el entorno de trabajo.
ACTIVIDADES SST
Se efectúa una revisión en terreno de todo el equipo de trabajadores, comprobando el uso adecuado de los elementos de labor.
ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana, se lleva a cabo una revisión de la documentación vinculada al área ambiental con el fin de identificar aspectos pendientes y solicitar la información esencial para el componente ambiental PAGA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar las actividades de obra pendientes hasta la fecha, relacionadas con el mejoramiento a través de la construcción de placas huella y las obras de drenaje en los distintos frentes.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



VISTA GENERAL SECCIÓN TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA TRAMO 1C VEREDA SANTO DOMINGO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGA RIOSTRA



VISTA GENERAL ACTIVIDADES EN CAMPO



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO TRAMO 1 VEREDA RINCONADA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS, VIGA RIOSTRA



VISTA GENERAL DE EXCAVACIÓN PARA ADECUACIÓN DE ANCHOS DE VÍA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETAS FALTANTES VEREDA VOLCÁN



VISTA GENERAL DESCOLE CUNETA A ALCANTARILLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO



VISTA GENERAL CONTINUIDAD DE VACIADO DE ELEMENTO DE ENCOLE ALCANTARILLA VEREDA CINERA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 Y #4 PARA ALCANTARILLAS



ADECUACIÓN DE EXCAVACIÓN PARA ELEMENTO DE ALCANTARILLA POR FUNDIR



VISTA GENERAL ACERO DE REFUERZO #3 Y #4 PARA POCETA ALCANTARILLA



INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" PULGADAS DE PVC



ARMADO DE FORMALETA DE MADERA PARA MODULACIÓN DE ALCANTARILLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGA RIOSTRA CONTINUIDAD TRAMO 2 VEREDA POTREROS



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL #3



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN CAMPO

GRAMALOTE



MANTENIMIENTO PERIÓDICO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE



VISTA GENERAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO



ADECUACIÓN DE ANCHO DE VÍA Y MEJORAMIENTO



REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VEREDA SAN ISIDRO



RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBES



VISTA GENERAL DE LIMPIEZA SECCIÓN TRANSVERSAL VÍA PLACA HUELLA



VISTA GENERAL DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO CORREDOR VIAL SANTA ANITA



VISTA GENERAL ADECUACIÓN DE CUNETAS



VISTA GENERAL CORREDOR VIAL MEJORADO

LOS PATIOS



VISTA GENERAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL TRAMO 1 VEREDA COROZAL - CALIFORNIA, LOS PATIOS



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO



COMPACTACIÓN SUBBASE GRANULAR

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-0043-25 del 28 de enero de 2025 se emite aprobación de la reprogramación de obra de acuerdo al adicional No3 en tiempo una vez realizadas las observaciones por parte del contratista de obra.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-0037-25 del 30 de enero de 2025 se emite concepto respecto a la solicitud de prorroga recibido por parte del contratista de obra y se remite a la entidad contratante Gobernación de Norte de Santander.
3. Se le reitera al contratista de obra la importancia de dar cumplimiento con las obligaciones contractuales y los tiempos establecidos para la terminación del plazo del contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-25

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2021

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CONTRATOS DE OBRA No. Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTAS: N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	**8**	9	10	11	12	13	14	**15**	16	17	18	19	20	21	**22**	23	24	**25**	26	27	28	**29**	30	31
VEHÍCULO	Renault Duster ENM-086		A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	XR150L Honda HPS38F		A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - GRF92G		A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

SOAT VEHÍCULO EMN 086 : Desde 07-06-2024 hasta el 06-06-2025.
TECNOMECANICA: Desde 30-10-2024 hasta el 30-10-2025
SOAT MOTOCICLETA HPS 38F : Desde 20-03-2024 hasta el 19-03-2025.
TECNOMECANICA: Desde 20-03-2024 hasta el 20-03-2025
SOAT MOTOCICLETA GRF92G: Desde 24-08-2024 hasta el 24-08-2025.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2023

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No.: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS) **CONTRATISTA:** N/A

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes | | |

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 26/09/2022

PLAZO INICIAL: 27 MESES Y 17 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

VALOR ADICIONES $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES $ 500.000.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 4110039402
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/08/2022

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ACTA DE INICIO N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/10/2022

ADICION No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 455.670.134,50	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 911.340.270,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.367.101.404,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/03/2024

ADICION No. 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 505.670.134,52	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.011.340.269,04	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.517.010.403,56	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 13/06/2024

PRORROGA No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 505.670.134,52	24	6	2022	28	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	28	8	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.011.340.269,04	24	6	2022	28	2	2028
Calidad del servicio		$ 1.517.010.403,56	28	2	2025	28	2	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

FECHA DE INICIO: 26/09/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 27 MESES Y 17 DÍAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 28/02/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELÉN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRÁN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACIÓN DE NTS) (Indicar número y año)

CONTRATISTA: N.A

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ---------- APROBADO: SI ------ NO ------ X VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **17/01/2023**

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI --------- NO x
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI --------- NO x

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ---------- APROBADO: SI ------ NO X FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ x NO ------

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han generado no conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han presentado quejas y/o reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**100%**	**Nº de Informes entregados en el período, sin reclamaciones debido a la fecha de entrega / Nº de Informes entregados en el período *100**
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Maquina de los Ángeles	Arcinge	1022019	1/08/2022	6/09/2022		
2	Maquina de ensayos a Compresión	No presenta	PSGS-01	1/08/2022	6/08/2022		
3	Manómetro Humedometro	Vincicol	No presenta	1/08/2022	6/09/2022		
4	Instrumento de Pesaje no automático	Mavin	2018010102	1/08/2022	5/08/2022		
5	Instrumento de Pesaje no automatice	Trumax	3202085057	1/08/2022	5/08/2022		
6	Instrumento de Pesaje no automático	OHAUS	B337764871	1/08/2022	5/08/2022		
7	MAQUINA SEMIAUTOMATICA DIGITAL PARA ENSAYOS MARSHALL Y CBR	VINCICOL INGENIERÍA S.A.S.	140219 // J180911306	1/08/2022	6/08/2022		

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general reanudación de actividades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: vista general reanudación de actividades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: vista general reanudación de actividades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general señalización de áreas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general áreas de intervención.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general herramienta en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: vista señalización en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Maquinaria que llego a campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general estado actual acopio de materiales.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Acopio de materiales para alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Acopio en puntos de intervención de cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Inicio de excavaciones adecuación anchos de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Adecuación en campo de subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Inicio de acopio de materiales pétreos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Acero de refuerzo para inicio de actividades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella tramo 1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Subbase granular vista general.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista sección transversal.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Reconformación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista inicio compactación de subbase en obras hidráulicas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Adecuación se subbase granular obras hidráulicas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general extendido de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista limpieza en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general subbase extendida existente.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**03 AL 09 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Reunión con comunidad vereda california verificación obras hidráulicas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para adecuación ancho de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Adecuaciones ancho de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Replanteo de subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Replanteo y compactación de subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general tramo No1 continuidad.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación para viga riostras.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho y franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de refuerzo No3 – 3/8".

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo longitudinal y transversal #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para losa transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones sin clasificar para adecuación de ancho de vía Curva.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general adecuación ancho de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general suelo – cementos para estabilización subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Escarificación de la subrasante para suelo - cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto tramo 1C.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo #3 cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general excavación adecuación ancho de curva.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general adecuación ancho de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado sección transversal de placa huella tramo 1C.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de concreto de 14 Mpa franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acopio de materiales.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general instalación de piedra pegada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general compactación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de subbase granular instalada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general compactación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de refuerzo #3 longitudinal y transversal.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo tramo No6.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general Actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Toma de muestras de concreto.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Toma de muestras de concreto.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de acero de refuerzo #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de subbase granular instalada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos estructural.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo longitudinal y transversal #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo #3 para elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general mezclado de concreto realizado en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Continuación de instalación de Geotextil 2400 N.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 AL 16 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda California
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista acabado final concreto.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Concreto de 14 Mpa piedra pegada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general concreto de 14 Mpa piedra pegada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación de elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general concreto de 14 Mpa para modulación de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación de elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones sin clasificar para adecuación de anchos de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general escarificación para suelo cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para adecuación de anchos de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de suelo - cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para losa de concreto transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general suelo - cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general adecuación de anchos y suelo - cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acero de refuerzo #3 para curva de transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella tramo 1C.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para adecuación de anchos de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación talud para adecuación ancho de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para losa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista genera vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 y #4 para cabezote alcantarilla doble.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 para fondo cabezal.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa fondo cabezote descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa fondo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para cabezote de alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Retranque de formaleta para vaciado de elemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para adecuación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cabezote alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general finalización vaciado de concreto de 21Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de tubería de PVC de 36 " para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Perfilación excavación poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Relleno con material de excavación para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de tubería y relleno alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista salida de tubería descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Perfilación de excavación poceta de encole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista excavación de descole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Perfilación excavación para poceta alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Relleno para excavación de alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general elementos de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de vaciado de concreto de 14 Mpa piedra pegada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación para viga riostras.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Acopios de material en sitio de triturado, cemento y arena.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Continuación de la instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto de 3000 psi para elementos de huellas, cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (66)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 3000 psi para elementos de huellas, cunetas, vigas riostra de la zona de cruce.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (67)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Subbase granular extendida y parcialmente compactada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (68)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Subbase granular extendida y parcialmente compactada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (69)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Subbase granular extendida y parcialmente compactada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (70)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 3
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (71)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 3
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de formaletas y vaciado de concreto para terminación de bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (72)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 3
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de formaletas y vaciado de bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (73)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: toma de densidades de la subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (74)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de formaleta de madera y vaciado de concreto de 14 MPA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (75)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 MPA con instalación de piedra redonda.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (76)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Demarcación espina de pescado huella placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (77)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de formaleta de madera y vaciado de concreto de 21 MPA en bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (78)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Avance longitudinal de elementos construidos de la placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (79)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa – piedra pegada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (80)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de formaleta de madera y vaciado de concreto de 14 MPA franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (81)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Traslado de tubería PVC para alcantarillas a punto de intervencion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (82)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**17 AL 23 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (83)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Verificación de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Concreto de Vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista excavaciones para adecuación de anchos de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de excavaciones taludes adecuación ancho de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general adecuación ancho de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades de excavación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de material de excavación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de compactación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreta cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 placa huella 1c.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella tramo 1C.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella tramo 1C.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista actividades de campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Acabado de concreto 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista acabado de concreto cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Bordillo de concreto de 21 Mpa de bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de formaleta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto cuneta acceso a alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado de concreto de 21Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acero de refuerzo para poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cabezote descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de tubería de PVC de 36” para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de acero de refuerzo #3 elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado de concreto.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado acero de refuerzo #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de elemento de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo poceta alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general elemento de descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista perfilación de excavación para poceta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Remoción de derrumbes a lo largo del corredor vial.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Retiro de material de derrumbes.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de limpieza derrumbe.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (66)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general remoción de derrumbes.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (67)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de derrumbes sobre la placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (68)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general limpieza total derrumbe.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (69)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general mantenimiento periódico.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (70)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de mantenimiento periódico.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (71)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general estado final vía mejorada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (72)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza lateral.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (73)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (74)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico vereda santa Anita.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (75)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista genera mantenimiento periódico (cuneteo).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (76)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (77)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda corozal -Tramo 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Apertura de la vía al tránsito.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (78)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda corozal -Tramo 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Cierre de la vía, sección del sumidero.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (79)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda corozal -Tramo 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto en placa de sumidero.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (80)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda corozal -Tramo 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Figurado del acero para sumidero.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (81)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda corozal -Tramo 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ventana del sumidero.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (82)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda corozal -Tramo 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ventana del sumidero.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (83)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda corozal -Tramo 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ventana del sumidero.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (84)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda corozal -Tramo 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ventana del sumidero.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (85)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Subbase granular extendida y compactada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (86)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Subbase granular extendida y compactada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (87)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de tubería en PVC para alcantarillado y vaciado de concreto para solado.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (88)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de tubería en PVC para alcantarillado e instalación de acero de refuerzo para encoles de las alcantarillas con vaciado de concreto en placa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (89)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 3000 psi para huellas y vigas riostras con instalación de acero de refuerzo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (90)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de formaleta de madera y vaciado de concreto en bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (91)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda Corozal -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto en cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (92)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto empalme con placa huella existente.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (93)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades en campo interventoría.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (94)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades en campo interventoría.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (95)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y vigas riostras.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (96)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de formaleta de madera y vaciado de concreto de 21 MPA en bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (97)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto ciclópeo de 21 Mpa con acero de refuerzo instalado para huellas y vigas riostras.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (98)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Muestras de concreto tomadas en tramo 2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (99)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Conformación de huellas en concreto ciclópeo con instalación de piedra redonda.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (100)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Conformación de huellas en concreto ciclópeo con instalación de piedra redonda.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (101)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de refuerzo Fy 4200 con vaciado y texturizado de concreto de 21 MPA para cunetas

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (102)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de refuerzo F´y 4200 con vaciado y texturizado de concreto de 21 MPA para cunetas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (103)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Conformación de huellas en concreto ciclópeo con instalación de piedra redonda.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (104)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Conformación de elementos de placa huella (huellas y vigas riostras).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (105)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Subbase granular extendida y compactada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (106)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Subbase granular extendida y compactada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (107)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades en campo por parte de la interventoría

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (108)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades en campo por parte de la interventoría

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (109)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de formaleta de madera y piedra redonda para vaciado de concreto de 14 Mpa para márgenes en ciclópeo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (110)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de formaleta de madera y piedra redonda para vaciado de concreto de 14 Mpa para márgenes en ciclópeo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (111)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto en cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (112)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto en elementos de placa huellas (vigas riostras y huellas).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (113)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto en elementos de placa huellas (vigas riostras y huellas).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 AL 30 ENERO 2025**

FOTOGRAFÍA (114)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California-Tramo 6.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto en elementos de placa huellas (vigas riostras y huellas).

CONTROL CORRESPONDENCIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

ENVIADA





PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-0001-25	7-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO No. OFC-CADV-GIC-100-2024 CON ASUNTO "RESPUESTA OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-1665-24 APROBACION CON OBSERVACIONES TOPOGRAFIA CORREDOR 2."	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO
GIC-INVIAS-NTS-0002-25	7-ene-25	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0003-25	7-ene-25	RESPUESTA OFICIO UTET-02590-434 CON ASUNTO: INFORMES SST DICIEMBRE 2024 - APROBACIÓN	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA EDIVIAL – TROJA 2590 ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante legal Cúcuta – Colombia	GOBERNACION 1943
GIC-INVIAS-NTS-0004-25	7-ene-25	RESPUESTA OFICIO G&P-CD-FC-049-2024-019 CON ASUNTO: APROBACION INFORMES CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE E INFORME FINAL 2024	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS Gerente FARO DEL CATATUMBO SAS Gobernación 2033 Ingeniera GILMA PINTO JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-0005-25	7-ene-25	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-114-2024 CON ASUNTO: INFORME FINAL SST DICIEMBRE 2024 - APROBACIÓN	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO
GIC-INVIAS-NTS-0006-25	8-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CD-FC-058-2023, MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0007-25	8-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-099991 SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-077-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER"	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0008-25	9-ene-25	SOPORTES ACTA DE COSTOS NO. 28 E INFORME MENSUAL No. 27 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024.	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza # 21-105 Cúcuta.	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0009-25	10-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CD-FC-067-2023, "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER."	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-0010-25	13-ene-25	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0011-25	13-ene-25	RESPUESTA A COMUNICADO 2024S-VBOG-099982 SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-067-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DESANTANDER	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0012-25	13-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO No. PHS2022 – 0103 – 2024 CON ASUNTO "PLANOS RECORD FINALES" - OBSERVACIONES.	1	Ingeniero JHONN FREDDY QUINTERO LEON Representante Legal UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022 Cúcuta – Norte de Santander	SANTIAGO
GIC-INVIAS-NTS-0013-25	13-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-100430 - SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL N. CONTRATO CD-FC-071-2023 "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES – GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER".	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0014-25	14-ene-25	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-425 CUYO ASUNTO ES "COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1268-24 DE FECHA 06 DE SEPTIEMRE DE 2024 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA TRAMO 5 VEREDA SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS." OBSERVACIONES.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943
GIC-INVIAS-NTS-0015-25	15-ene-25	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE ENERO DE 2025	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943
GIC-INVIAS-NTS-0016-25	15-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-406 CON ASUNTO: SOPORTES PARA COBRO DEL PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL (PAGA).	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943
GIC-INVIAS-NTS-0017-25	16-ene-25	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-426 CUYO ASUNTO ES "COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1279-24 DE FECHA 09 DE SEPTIEMRE DE 2024 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA VEREDA VOLCÁN TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS." - OBSERVACIONES.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943
GIC-INVIAS-NTS-0018-25	16-ene-25	RESPUESTA A OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-027 CON ASUNTO "ENTREGA DE PLANOS RECORD" – OBSERVACIONES.	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista Cúcuta Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-0019-25	16-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-443 – OBSERVACIONES REPROGRAMACIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL ADICIONAL No3 EN TIEMPO.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943
GIC-INVIAS-NTS-0020-25	16-ene-25	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1758 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.	1	Ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda ALCALDIA DE OCAÑA Norte de Santander	OCAÑA 1758
GIC-INVIAS-NTS-0021-25	16-ene-25	REITERACIÓN COMUNICADOS No. GIC-INVIAS-NTS-1641-24 y No. GIC-INVIAS-NTS-1436-24 "SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1791 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE ABREGO"	1	Doctor HUBER DARIO SANCHEZ ORTEGA Alcalde municipal Calle 14 con Carrera 5ª - Palacio Municipal Abrego - Norte de Santander	ABREGO
GIC-INVIAS-NTS-0022-25	16-ene-25	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1814 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.	1	Ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda ALCALDIA DE OCAÑA Norte de Santander	OCAÑA 1814
GIC-INVIAS-NTS-0023-25	16-ene-25	REITERACIÓN COMUNICADOS NO. GIC-INVIAS-NTS-1635-24, GIC-INVIAS-NTS-1438-24 y GIC-INVIAS-NTS-1232-24 "SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO."	1	DOCTOR DANIS CARLEWIS RAMIREZ VILORA Alcalde Municipio Santiago Carrera 3 N° 3-61 Barrio El Centro Santiago – Norte de Santander.	SANTIAGO
GIC-INVIAS-NTS-0024-25	16-ene-25	REITERACIÓN SOLICITUD CIERRE FINANCIERO HERRÁN 1861 DE 2021	1	SEÑOR SALVADOR AVELLANEDA ALCALDE MUNICIPIO HERRÁN HERRÁN – NORTE DE SANTANDER	HERRAN
GIC-INVIAS-NTS-0025-25	16-ene-25	REITERACIÓN COMUNICADO No. GIC-INVIAS-NTS-1634-24 CON ASUNTO "SOLICITUD REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1863 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN."	1	ANDREA PAOLA OVALLOS BALLESTEROS SECRETARIA HACIENDA Y SALUD LA PLAYA (e) LA PLAYA DE BELÉN – NTE DE SANTANDER	LA PLAYA
GIC-INVIAS-NTS-0026-25	16-ene-25	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1878 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE PAMPLONITA.	1	Señor: FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ Alcalde Municipal – Pamplonita Calle 3 N 2-08 Barrio Centro Pamplonita – Colombia	PAMPLONITA
GIC-INVIAS-NTS-0027-25	16-ene-25	REITERACIÓN COMUNICADOS No. GIC-INVIAS-NTS-1441-24, GIC-INVIAS-NTS-1441-24 y No. GIC-INVIAS-NTS-1237-24 SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1943 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.	1	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Cúcuta, Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943
GIC-INVIAS-NTS-0028-25	16-ene-25	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2033 de 2021.	1	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Avenida 5 Calle 13 y 14 esquina. Cúcuta, Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-0029-25	16-ene-25	REITERACIÓN COMUNICADO No. GIC-INVIAS-NTS-1637-24,GIC-INVIAS-NTS-1442-24 y No. GIC-INVIAS-NTS-1238-24 SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2052 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.	1	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Avenida 5 Calle 13 y 14 esquina. Cúcuta, Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2052
GIC-INVIAS-NTS-0030-25	17-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CONTRATO CD-FC-082-2023 "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER.". - FARO	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-0031-25	17-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CTO. CD-FC-081-2023, MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0032-25	17-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - LP-OP-01-2022, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA RURAL CUPERENA – ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0033-25	17-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA – contrato de obra No. 202 DE 2022 con objeto "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS"	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0034-25	17-ene-25	SOLICITUD ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA – EJECUCIÓN OBRAS HIDRAULICAS FALTANTES POR EJECUTAR.	2	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943
GIC-INVIAS-NTS-0035-25	20-ene-25	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0036-25	21-ene-25	NO GENERACIÓN DE PASIVOS Y PENDIENTES AMBIENTALES.	1	Doctor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0037-25	24-ene-25	RESPUESTA OFICIO UTET-02590-445, CON ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA N° 04 AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.	2	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander Arquitecto EFRAÍN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías del Departamento SECRETARIA DE VÍAS GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943
GIC-INVIAS-NTS-0038-25	24-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORIA - CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-0039-25	24-ene-25	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA – CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER."	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0040-25	27-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO No. G&P-CD-FC-049-2024-016 con asunto "CORRECCION TOPOGRAFÍA Y SUELOS Y PAVIMENTOS"– TOPOGRAFÍA APROBACIÓN.	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-0041-25	28-ene-25	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0042-25	28-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO No. OFC-CADV-GIC-085 -2024 CON ASUNTO "ENTREGA SUBSANACION OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 1." - APROBACIÓN.	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO
GIC-INVIAS-NTS-0043-25	28-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-444 - APROBACIÓN REPROGRAMACIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL ADICIONAL 03 EN TIEMPO.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943
GIC-INVIAS-NTS-0044-25	28-ene-25	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-099071 SUBSANANDO LA DOCUMENTACION SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-081-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARADITA - LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER".	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0045-25	28-ene-25	RESPUESTA A COMUNICADO SCCVN-CD-FC-081-2023-0017 CON ASUNTO: ENTREGA FINAL DE REPORTES TRIMESTRALES DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL - APROBACIÓN - MUTISCUA	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-0046-25	28-ene-25	ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-0044-25, RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-099071 SUBSANANDO LA DOCUMENTACION SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-081-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL - LA ARADITA - LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER".	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-0047-25	28-ene-25	RESPUESTA COMUNICADOS 2024S-VBOG-050170 y 2024S-VBOG-044343; ENTREGA INFORMES MENSUALES, TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO DEL PROYECTO LOURDES - APROBACIÓN, COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL.	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0048-25	29-ene-25	ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-0047-25; RESPUESTA COMUNICADOS 2024S-VBOG-050170 y 2024S-VBOG-044343; ENTREGA INFORMES MENSUALES, TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO DEL PROYECTO LOURDES - APROBACIÓN, COMPONENTE SOCIAL	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-0049-25	29-ene-25	Entrega informe final de interventoría del contrato No. 160 de 2022, MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER	1	MANUEL ALEXIS SEPÚLVEDA JAIMES Secretario de Planeación Municipal ALCALDÍA DE CACHIRA Carrera 3 N° 3-61 Barrio el Centro Cachira - Norte de Santander	CACHIRA
GIC-INVIAS-NTS-0050-25	30-ene-25	RESPUESTA OFICIO SCCY-071-017 CON ASUNTO "INFORME SOCIAL PERIODO OCTUBRE a NOVIEMBRE"- APROBACIÓN, COMPONENTE SOCIAL	1	Ingeniero DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista Gramalote – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-0051-25	30-ene-25	RESPUESTA A OFICIO SCCY-071-013 DE LA ENTREGA INFORME SOCIAL PERIODO 2	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-0052-25	30-ene-25	RESPUESTA A OFICIO G&P-CD-FC-049-2024-013 Y G&P-CD-FC-049-2024-017 DE LA ENTREGA INFORMES MENSUALES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniera GILMA PINTO JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

RECIBIDA

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO
OFC-CADV-GIC-113 -2024	31-dic-24	ENTREGA DE INFORMES AREA AMBIENTAL – DICIEMBRE	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO
OFC-CADV-GIC-114 -2025	7-ene-25	ENTREGA DE INFORMES FINAL SST	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO
2024S-VBOG-100432	31-dic-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-133605 LA LAJA CUPERENA ? CACAHUALA - ALTO FRIO MUNICIPIO SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER?	003 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SAS CRA 48 NO. 101 A - 29 vsantos@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033
2024S-VBOG-100433	31-dic-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-133607 RESPUESTA AMBIENTAL Y SOCIAL BALANCE N. SANTANDER CONVENIO	003 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SAS CRA 48 NO. 101 A - 29 vsantos@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033
2024S-VBOG-100430	31-dic-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-133594 RESPUESTA OBSERVACIONES BALANCE SOCIO AMBIENTAL GRAMALOTE	003 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SAS CRA 48 NO. 101 A - 29 vsantos@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033
CORREO	2-ene-25	INFORMACIÓN SOBRE ESTADO TERMINACIÓN DE OBRAS.	001 FOLIOS	Cordial saludo respetados ingenieros	YENI LORENA VELOZA	GOBERNACIÓN 2033
OFC-CADV-GIC-112-2024	30-dic-24	ENTREGA ACTA DE COBO No 9- FINAL	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO
UTET-02590-442	9-ene-25	ALCANCE COMUNICACION UTET-02590-428 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITUD REMOCION DE DERRUMBES.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá. Señor: EFRAÍN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías SECRETARÍA DE VIAS GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER Avenida 5 esquina entre calles 13 y 14 Cúcuta – N. de S.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943
CARTA AUTORIZACIÓN	11-ene-25	CARTA AUTORIZACIÓN ENTREGA CHEQUES	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS Oficina de Interventoría Ciudad	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO
UTET-02590-443	15-ene-25	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1717-24 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITUD REPROGRAMACION DE OBRA DE ACUERDO AL ADICIONAL 3 EN TIEMPO.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943
CORREO	15-ene-25	ENTREGA INFORMACION COMPONENTE SOCIAL- INFORMES TRIMESTRALES CON ANEXOS	002 FOLIOS	GAVINCO	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA
UTET-02590-444	21-ene-25	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-0019-25 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2025 OBSERVACIONES REPROGRAMACION DE OBRA DE ACUERDO AL ADICIONAL No. 03 EN TIEMPO.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943
UTET-02590-445	23-ene-25	SOLICITUD DE PRORROGA N° 04 AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.	002 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943
OFC-CADV-GIC-116 -2025	23-ene-25	RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1744-24 (COMPONENTE SOCIAL)	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO
UTET-02590-446	24-ene-25	APERTURA TRAMO 1 HASTA PR0+650 (SECTOR SUMIDERO).	001 FOLIOS	Señor: MARIO ALEJANDRO OTERO VELANDIA Presidente JUNTA DE ACCION COMUNAL COROZAL Vereda Corozal Señor: CARLOS ALFREDO GELVEZ Presidente JUNTA DE ACCION COMUNAL CALIFORNIA Vereda California Señora: CARMEN YASMIN ROLON ASCENCIO Presidente VEEDURÍA CIUDADANA CALIFORNIA Vereda California	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943
UTET-02590-447	24-ene-25	TOPOGRAFIA Y DISEÑO DE GAVIONES TRAMO 6 VEREDA CALIFORNIA MUNICIPIO DE LOS PATIOS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943
UTET-02590-448	24-ene-25	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-0034-25 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2025 SOLICITUD ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA - EJECUCION OBRAS HIDRAULICAS FALTANTES POR EJECUTAR.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943
UTET-02590-449	24-ene-25	INFORME TRIMESTRAL JUNIO-JULIO-AGOSTO AÑO 2024 COMPONENTE AMBIENTAL.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943
UTET-02590-450	24-nov-25	INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE AÑO 2023 COMPONENTE AMBIENTAL.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943
OFC-CADV-GIC-118-2025	27-ene-25	SOLICITUD RESPUESTA A OFICIO – COMPONENTE PAVIMENTO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO
OFC-CADV-GIC-101-2024	12-dic-24	RESPUESTA OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-797-22 RESPUESTA DISEÑO DE PAVIMENTO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO
UTET-02590-452	28-ene-25	INFORME SST CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943
CORREO	29-ene-25	ENTREGA INFORME TECNICO FINAL CTO 252 22	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO
UTET-02590-453	30-ene-25	INFORME TRIMESTRAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE AÑO 2024 COMPONENTE AMBIENTAL.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943
UTET-02590-454	30-ene-25	ITEMS NO PREVISTOS REJILLA SUMIDERO Y REMOCION DE DERRUMBES.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO
UTET-02590-455	30-ene-25	INFORME COMPONENTE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943

BITACORA

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Del 01 al 07 de enero de 2025
Vereda Coneal - California
Personal de obra = No hay personal en obra
Personal de interventoría = No hay, 2 inspector de interventoría y 1 Residente de interventoría
Equipo y maquinaria = Herramientas menores en almacen
Actividades = El contratista realizo actividades de logistica para recibir labores del año.

Director de obra

Jose H. Ipias Suarez
Residente de Interventoria

8 de enero de 2025
Vereda Coneal - California
Personal de obra = (No hay personal)
Para hoy el proyecto 3 operadores de maquinaria amarillo 1 auxiliar, 1 inspector, 1 topografo y un ambiental
Turno 1 = 2 obreros
Turno 2 = No hay personal.
Turno 3 = No hay personal.
Turno 4 = 1 maestro y 4 obreros
Turno 6 = No hay personal
Maquinaria y herramientas = Retroexcavadora, vibrocompactador, 02 Motosierras y herramientas menores
Actividades realizadas
Turno 1: Se realizo recibo de obra en campo y limpieza en la entrada del proyecto
Turno 2 = No se realizo actividad
Turno 3 = Se realizo recibo de materiales de oficina
Turno 4: Se realizo recorrido y adecuación de la entrada para el ingreso de la retroexcavadora de oficina en compañía de los comuneros topografo y se dejaron señalizados materiales y herramientas

Director de obra

Jose H. Ipias Suarez
Residente de Interventoria

9 de enero de 2025
Clima: Soleado con precipitaciones

Personal:

Durante todo el proyecto: 3 operadores de maquinaria pesada, 1 residente, 1 inspector, 1 topógrafo y 2 cadeneros

Torre 1 y Torre 5: No hay personal

Torre 4: 2 maestros y 4 obreros

Torre 6: No hay personal

Maquinaria y herramientas: Retroexcavadora, vibrocompactador, motoniveladora y herramientas menores

Torre 2: No se realizó actividad

Torre 3: Instalación de [illegible] no hubo, instalación eléctrica y compactación de relleno, se depositan 40 tons

Torre 7: Semana de semana y media

Torre 8: instalación de [illegible] no hubo, relleno y compactación de relleno, cuando en el uso de la retro excavadora y retroexcavadora, depositan de colores en las bases relleno, vaciado de concreto de 3000 psi en zapata perimetral

Torre 9: Depósitos de colores en las bases

Torre 6: No se realizó actividad

Jose H. Lopez Juarez
Residente de Ingeniería

10 de enero de 2025

Versión Extensa

Personal de obra: 3 operadores

Durante todo el proyecto: 3 operadores, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 topógrafo, 2 cadeneros, 1 inspector ambiental

Torre 1 y 5: No hay personal

Torre 4: 2 maestros y 4 obreros

Torre 6: No hay personal

Maquinaria y herramientas: Retroexcavadora, vibrocompactador, motoniveladora y herramientas menores

Actividades realizadas:

Torre 2: No se realizó

Torre 3: Excavación y Compactación de relleno

Tramo 3 = Excavación y compactación de subbase

Tramo 4 = Instalación de Cable guardahil, señalización y compactación de subbase.

Tramo 5 = No se realizan actividades

Nota: Revisión de los cuadrillas. Herramientas revisadas con el fin de dotar el abrigo y botiquín apto para las actividades a desarrollar, cumpliendo los requisitos.

José H. Ortiz Suárez
Residente de Mantenimiento

Sábado 11 enero 2025

Clima = Soleado en la mañana, por la tarde en horas de la tarde.

Personal = 3 operadores, 1 maestro de obra y ayudante de 1 ayudante, 1 maestro soldador, 1 ayudante soldador

Turno 3 = No hay personal

Tramo 4 = 1 maestro y 1 ayudante

Tramo 6 = 3 obreros y maestro

Maquinaria y herramientas = Herramientas, retroexcavadora, motoniveladora y herramientas menores

Tramo 1 = No se realizan actividades

Tramo 2 = Se suministra material (cuneta, cemento, ladrillo)

Tramo 3 = No hay actividades

Tramo 4 = Instalación de Cable guardahil, señalización y compactación de Subbase granular, material de cantera para bacheo.

Tramo 6 = Compactación de Subbase, suministro de herramientas, equipo de protección, ingreso de material, pesaje y descargue de acero.

José H. Ortiz Suárez
Residente de Mantenimiento

Domingo 12 enero 2025 = No se labora por ser día festivo

José H. Ortiz Suárez
Residente de Mantenimiento

13 de enero de 2025

Tramo General = Bolívar

Personal = para total ejecutado (3 operadores, 1 maestro de

obra, 1 capataz de obra, 1 ayudante, 1 encofrador carpintero, 1 ayudante encofrador.

Tramo 2 : No hay personal

Tramo 3 : 1 maestro, 1 oficial y 3 obreros

Tramo 4 : 2 maestro, 2 oficial y 2 obreros

Tramo 5 - No hay personal de obra

Tramo 6 - 2 maestro, 2 oficial y 2 obreros

Observaciones y recomendaciones: Faltan cuadros informativos reglamentarios, y herramientas menores.

Pruebas realizadas: No se realizan actividades. Tramo (2): ningún personal de obra, no difieren en nada al replanteo de la dimensiones de la placa base, posteriormente encuentros rematados, pues vigas, pilares y forjados. Tramo 3: ingreso de personal de obra con difuntos materiales se ajustan con el replanteo, de la dimensiones de la placa base, y del encofrado de la no podrían realizarse de los formaletes de madera y accesorios necesarios. Tramo (4). Se realizan con las actividades de ningún personal y ningún de soldadura, ayudas, en el de la realizadas dependiendo la organización. Tramo (5): Se realizan con la observaciones las siguientes de la columna con la planta existente del bar cafetería. Tramo (6): Como de la con ingreso del personal de obra con diferentes elementos se ajustan con el replanteo de la dimensiones de la placa base y del encofrado de la con para la posterior instalación de la formaleta de madera para cimentaciones.

Jefe de Obra

Jefe de Obra Suarez
Residente de Mantenimiento.

14 de enero de 2025

Vereda Cascajal - Cabecera

Personal de obra:

Para dicho proyecto: 1 residente de obra, 2 ayudantes, 1 capataz de obra, 1 ayudante, 1 residente de mantenimiento 1 capataz de mantenimiento.

Tramo 2 = No hay personal
Tramo 3 = 1 maestro, 1 oficial y 2 obreros
Tramo 4 = No hay personal de obra
Tramo 5 = No hay personal de obra
Tramo 6 = 1 maestro, 1 oficial y 4 obreros
Equipamiento de herramientas = Retroexcavadora, retroexcavadora, motoniveladora y herramientas menores
Actividades realizadas = Tramo 1 = Ya se realizó actividades
Tramo 2 = instalación de formaletas de madera para losa, instalación de pasadores metálicos, vaciado de concreto de 210 KG/CM2, se realizaron ranuras de material particular (cemento, arena, triturado), ranuras de cierre de retracción
Tramo 5 y Tramo 6 = instalación de formaletas de madera para losas, con instalación de pasador metálicos y vaciado de concreto de 210 KG/CM2 y se realizo excavación de material de cualquier en la zona en la diferencia para la, Se realizaron ranuras de material particular (cemento, triturado) y ranuras de cierre de retracción.

Residente de obra

Residente de interventoría

15 de enero 2022

Versión = Carácter - Colchonero
Observ = Se presentaron lluvias en la mañana durante de la jornada laboral
Personal de obra = 3 ayudantes, 1 cadenero de obra, 1 operador de obra, 1 operador de retroexcavadora, 1 residente de interventoría.
Tramo 1 = No hay personal
Tramo 2 = 1 maestro, 1 oficial, 10 obreros
Tramo 3 = 1 maestro, 1 oficial y 2 obreros
Tramo 4 = No hay personal de obra
Tramo 5 = 1 maestro, 1 oficial, y 10 obreros
Equipamiento de obra y herramientas = Retroexcavadora, retrocargadora, motoniveladora, herramientas menores
Actividades realizadas = Tramo 1 = Ya se realizo actividades

Tramo 3 = Se realizará de vaga, madera y cemento posteriormente, se realiza la colocación de acero de refuerzo para hacer la viga, vaciado y compactado posteriormente se realizan los encofrados de concreto de 3 pulgadas, Para el vaciado de concreto por parte de la supervisión, se autorizan vaciar el concreto

Tramo 5 = Excavación de viga madera y cemento posteriormente, se realiza colocación de acero de refuerzo para viga madera y cemento posteriormente se realiza vaciado de concreto con Pendiente y encofrados según lo indicado planos. Tramo 6 = Se realizara actividades de subir e grandes, Tramo 6 = Excavación = de viga madera y cemento, colocación de acero para hacer la viga madera vaciado de concreto posteriormente se realiza actividad de subir con actividad de filtro de geotextil con piedra graduada

Jose H. Ruiz Suarez
Residente de interventoria

Buenaventura

16 de enero de 2025

Vereda Central - Calicanto

Clima: Se presentan lluvias durante la mañana y tarde de la tarde soleado

Personal: Hoy hubo 1 propietario, 3 operadores, 2 ayudantes, 1 inspector de obra, 1 topógrafo, 1 residente de interventoria, 1 inspector ambiental

Tramo 1 = No hay personal

Tramo 2 = 1 maestro, 2 oficial y ayudantes

Tramo 3 = 1 maestro, 2 oficial y 2 ayudantes

Tramo 4 = No hay personal de obra

Tramo 6 = 1 maestro, 2 oficial 10 ayudantes

Maquinaria y herramientas: 1 retroexcavadora, motosierra, volqueta, herramienta menor, 1 compactador

Observaciones:

Tramo (2) = Hoy no hubo actividad, Tramo 2 y 4 vaciado de concreto ciclopeo en bolos, pero se realizo, colocación

de subbase. Tramo (3): vaciado de concreto en cunetas. Tramo (4): pavimentación del ancho de la vía hasta y demarcación de la misma. Tramo (5): Señalización preventiva, alertas, reglas y consejos, instalación de postes para luminarias y vigías, vaciado de concreto, colocación y conformación de subbase granular con [illegible] en sector de tramo pavimentado

Jefe de Obra

José H. Jones Suárez
Residente de Interventoría

21 de enero de 2025

Vereda: Carrizal Colorado

Clima: Se presentan lluvias jornada de la mañana jornada de la tarde soleado

Personal de obra: 1 residente, 1 inspector, 3 operadores 1 ayudante, 1 topógrafo, 1 inspector ambiental

Tramo 1: No hay personal

Tramo 2: 1 maestro, 1 oficial, 4 obreros

Tramo 3: No hay personal

Tramo 4: 1 maestro, 1 oficial y 4 obreros

Tramo 6: 1 maestro, 1 oficial y 10 obreros

Maquinaria y herramientas: Retroexcavadora, vibrocompactador, motoniveladora y herramientas menores

Actividades: Tramo (2): cunetas y alcantarillas de concreto, vaciado de concreto y fundición en la zona de cajas, suministro y extendido de subbase en sección completa del tramo. Tramo (4): El personal de obra de tramo 3 pasa a laborar en tramo 4, vaciado de concreto de pegas, margen izquierda y derecha. Extendido de subbase y compactación con motoniveladora de [illegible] granular. Tramo (5): vaciado de concreto reforzado y compactación de subbase granular con motoniveladora de [illegible] granular. se realiza más lejano y arda cunetas del acero

Jefe de Obra

José H. Jones Suárez
Residente de Interventoría

22 de enero de 2025

Vereda: General - Calderon.
Obras: Salud
Personal: Para todo el proyecto (3 operadores, 1 oficial de obra, 1 medio oficial de obra, 2 ayudantes, 1 capataz de albañilería, 1 Ayudante) Torre (2): 1 maestro, 1 oficial, 10 obreros. Torre (4): 1 maestro, 1 oficial, 9 obreros. Torre (6): 1 maestro, 1 oficial, 9 obreros.
Maquinaria y Herramientas: Retroexcavadora, Vibro-compactador, motosoldadora, herramienta menor y EPP completo.
Actividades: Torre (2): Fondo, armado e instalación de acero de refuerzo para elaboración de losa nivel 3 cuarto. Vereda de ancheta en todo el lado de la zona de recreo. Se construye con el suministro de soldadura, para la elaboración se realiza la instalación del formaleta, vaciado de mezcla, y elaboración de las columnas construidas. Torre (4): Construcción de columnas y placa nivel 3 con el uso del vibrocompactador para armado y instalación de acero. Así como la elaboración mensual para losa nivel 4, cuarto y terraza. Torre (6): Vaciado de concreto reforzado con bombeado, extendido y compactado del material de soldadura y mezcla, con utilización de 6 Kg gasolina. Elaboración del torre y placa nivel 3, instalación de pegamento, continuación con figurado y armado del acero.

Jose H. Mier Suarez
Residente de Interventoria

19 de enero de 2025: Nada mas observado por ser

Jose H. Mier Suarez
Residente de Interventoria

20 de enero de 2025
Obras: Nada mas observado por el momento
Vereda: General - Calderon
Personal: Para todo el proyecto 1 residente de

[illegible] 1 capataz de albañilería, 3 ayudantes, 1 maestro albañil, 1 capataz de albañil, 1 Ayudante
Tramo 2: 1 maestro, 1 oficial y 12 obreros
Tramo 4: 1 maestro, 1 oficial y [illegible] obreros 7
Tramo 6: 1 maestro, 1 oficial y 11 obreros
Maquinaria y herramientas: Retroexcavadora, vibrocompactador, motoniveladora y herramientas menores y 4 juegos de andamios de cuadro
Actividades realizadas: Tramo 1) = (No se realizó actividad
Tramo 3 (Cambio de ubicación de obra de referencia para demarcación de placa huella, eje vial, cambio, vaciado de concreto 6m) referencia en hueco de cerca de cruce, retiro de materiales de subbase granular, se realizó demarcación por parte de la residencia en la cual se [illegible] topografía completada y el eje vial listo para ser retirado para realización de formaleta. Tramo 5) Colocación de concreto de concreto de 3) referencia, se continua realizando el colocado y compactación de material de subbase granular con vibrocompactador, colocación de la geotextil de diario, procedió, corte y colocado e instalación de acero para la placa huella, por último se hizo el [illegible] formaleta, por parte de la residencia en los sectores del Tramo ya completamente con puntos.

Jose H. Torres Salazar
Residente de Interventoría

22 de enero de 2023
Clima: Nublado en la mañana, soleado presentando [illegible] precipitaciones
Novedad General - Calderon
Personal: Pintado Rios Jefe de proyecto, 3 operadores, 1 maestro obra, 1 inspector de obra, 1 topografo, 1 residente de obra, 1 inspector residente, 1 residente de interventoria, 1 ambiental. Tramo 2: 1 maestro, 1

atrasado 10 obreros. Tramo (4): 1 maestro, 1 oficial
Tramo 5) y 2 obreros. Tramo 6: 1 maestro,
1 oficial y 11 obreros.
Maquinaria y herramientas: Retroexcavadora,
Vibrocompactador, motoniveladora, herramienta
menor y 11 excavadoras Tipo Rampa.
Actividades evaluadas: Trama (2): Vaciado de concreto
de 21 MPA en losetas, vigas y columnas. Trama 10
Construcción vaciado de concreto de 21 MPA en Chanflan
cerrado, losetas, vigas de cal como se especifica en
planos. del acero estado entre del empalme con
el bar calvo?
Trama 6: Vaciado de concreto de 21 MPA con su
Pendiente, por otra parte, se evidencia realizando
el colocado y compactación de material de
Sobre granular con medidores de Pte. gradual
en sentido del Norte, posterior, cabe dejando
demanda del acero para los dados planos de
la placa. losetas por ellipse se comprueba realizando
Ejecución de pruebas de sobre agregado y
Relación P/V para los elementos

Ing. Residente de Obra

Ing. M. Diaz Suarez
Residente de Interventoria

22 de enero de 2025
Clima: Nublado precipitante
Viernes: Laboral - Calurosa
Personal: Llego todo el personal a recibir la obra
1 maestro de obra 1 Ayudante, 3 operadores 1
maestro de albañilería, 1 Ingeniero residente de
interventoría. Trama 2: 1 maestro, 1 oficial, 10 obreros
Trama 4: 1 maestro, 1 oficial y 2 obreros. Trama 6
1 maestro, 1 oficial y 11 obreros.
Maquinaria y equipo: Retroexcavadora, vibrocompactador,
vibrocompactador, herramienta menor y 11 excavadoras
de rampa.
Actividades evaluadas: Trama 2 se continua con

...arte enmarcado, fraguado e instalación de acero para obra. Para la primera huella se realiza replanteo de las circunferencias, se continua con vaciado de concreto reforzado para formación de bordes y anclaje. Tramo H, se realiza vaciado de concreto reforzado con fortalecido y se realizan especificaciones mencionadas para huella siguiente, y se instala modulación de formaletas de madera para huella en voladizo. Tramo 6: Se continua con el vaciado de concreto ciclopeo con inclusión de piedra y fortalecido. Se culmina con el corte enmarcado y fraguado del acero, se realizan actividades de excavación y conformación de la plataforma y se inicia la instalación del Cofre general.

Jose H Ortiz Sanz
Residente de Interventoría

Director de Obra

23 de enero de 2023

Viernes General - Calderon.

Personal: 1 ingeniero residente, 1 inspector de obra, 1 Topografo, 2 cadeneros, 2 operadores, 1 modulo, 1 oficial, 1 ayudante de obra. Tramo 2: 1 maestro, 1 oficial, Tramo 40 obreros. Tramo H: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero. Tramo 6: 1 maestro, 1 oficial, 11 obreros.

Equipo y apoyo: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Herramienta menor, Formaletas de madera, Concreto.

Actividades: Tramo 2: culminación de excavación, instalación de formaletas en madera, Tramo H: Vaciado de concreto ciclopeo con piedra pegadora. Tramo 6: Vaciado de concreto ciclopeo con inclusión de piedra, se continua con vaciado de concreto en huellas, instalación de acero de refuerzo en una parte tramo 20 voladizo.

Jose H Ortiz Sanz

24 de enero 2025

Unidad Comunal - California

Personal: Pico Todo el proyecto, 2 operadores, 1 maestro de obra, 1 capataz de obra, 1 capataz, 10 ayudantes, 1 auxiliar administrativo, 1 Ingeniero a Tramo 1 = 1 maestro, 1 oficial y 9 obreros a Tramo 4 = 1 maestro, 1 oficial y 7 obreros, Tramo 6 = 1 maestro, 1 oficial, 11 obreros.

Maquinaria y equipos = Retroexcavadora, vibrocompactador, motoniveladora, herramienta menor, 4 camiones mixer de concreto

Actividades realizadas = Tramo 2 Se depositan rellenos en ambas alcantarillas para continuidad de las mismas, se realizan compactaciones y entrada de relleno granular de por ahora parte se instala formaleta de madera para cunetas y placa piso. Y se vierte concreto. Tramo 3 se realiza vaciado de concreto ciclopeo en placa cabezal para muros de ala cabezal y lateral. Tramo 4. Se realiza instalación de formaletas de madera y vaciado de concreto en placa cabezal. Tramo 6: Se continua con el corte hasta encontrar la cota de rasante, se realizan excavaciones manuales para cunetas laterales y aguas arriba, se instala geotextil no tejido en zonas de taludes para evitar erosión y se realizan cunetas en concreto.

Jose M. Tinoco Suarez
Residente de Interventoría

25 de enero de 2025

Unidad Comunal - California

Clima: Soleado en la mañana

Personal: Pico Todo el proyecto: 2 operarios, 1 cuadrilla de 2 oficiales y 2 ayudantes, 1 ayudante de almacenista, 1 cuadrilla (2 ayudantes) Tramo 2 = 1 maestro, 1 oficial, 9 obreros. Tramo 4: 1 maestro, 1 oficial, 9 obreros Tramo 6 = 1 maestro, 1 oficial, 11 obreros

Maquinaria y Equipos: 2 Retroexcavadoras, 1 Motoniveladora, 1 Vibrocompactador, herramienta menor, 4 trompos mezcladores de concreto

Actividades: Tramo 2: Se realizan excavación de zapatas y se realiza colocación de acero de refuerzo para vigas centro, muros y columnas, por otra parte se realiza vaciado de concreto reforzado de 21 MPa de columnas, muros y vigas centro, se evidencia acopio de material pétreo (arena y gravilla). Tramo 4: Se realizan excavaciones de zapatas y vaciado de concreto de columnas, muros, vigas centro y canales, Tramo 6: Se continua con la conformación de la zapata, vaciado concreto de vigas centro, canal y bordillo a concreto, se evidencia almacenamiento de material para excavación de franja canal y bordillo para luego ser retirado con excavadora de punta retroexcavadora. Se evidencia acopio de material pétreo (arena, gravilla, piedra de peña triturada)

Jefe de Obra

ING. H. JAIMES SUAREZ
Residente de Interventoría

26 de enero de 2025: No se realizan actividades debido a que es un día festivo y el personal de obra no se presenta

Jefe de Obra

ING. H. JAIMES SUAREZ
Residente de Interventoría

27 de enero de 2025
Clima: Soleado
Vereda: Corral Colorado
Personal de obra: 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 3 operadores de maquinaria, 1 topógrafo, 1 inspector interventoría, 3 residente de interventoría.
Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora, retrocargador, volqueta, 2 vibro, herramienta menor, 4 bombas mezcladoras de concreto.
Actividades: El contratista Tramo 2: Se continua con el armado y figurado del acero anteriormente instalado para muros, vigas centro, canales y bordillo por otra parte se realizo vaciado de concreto reforzado para bordillo, y se realizo formaleta de madera para parte de la pollamuro vía, y se realizo chequeo por el residente realizando de medidas de acero, espesores de elementos concretados,

Trabajos y horas adicionales del concreto. Turno 4
se realizo vaciado de concreto en muros y bombilla
por otra parte se realizaron las actividades
de retiro para fundir, cuadro, bombilla, viga cantera
de 2 muros se realizaron la colocación de formaleta
de madera con vaciado de concreto de 3000 PSI
para mayores de hasta cortical y detalle con
colocación de piedra redondeada quedando mayor
de material gastro, cemento, arena, piedra. Turno
6: Se realizo Turno de domingo por parte de los
albañiles en campo y se dieron chapeos
de la misma. por otra parte se continuo al
vaciado de concreto en viga y se hizo
apoyos los demas avances de material, gastro
(cemento, arena, piedra, piedra redonda) se
realizo la continuidad de actividades y completación
de relleno general en Terraza de manera paralela

Supervisor de obra
Ing. Jhon Suarez
Residente de Interventoria

25 de enero de 2025.

Clima: Soleado

Visita: Cenizal - Colibrí

Personal de obra: 1 residente de obra, 1 ingeniero de obra,
3 operadores de maquinaria, 1 Zanjero, 1
inspector de alcantarillado, 1 residente de interventoria
Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora, Vibrocompactador
Vibrocompactador, Herramienta menor, 11 Juegos
formaleta de concreto

Personal en Obra: Turno 1: 4 albañiles, 1 maestro
Turno 2: 3 maestro, 3 oficial, 9 obrero. Turno 4:
1 maestro, 1 oficial, 7 obreros. Turno 6: 1 maestro, 1 oficial
6 obreros

Actividades realizadas: Turno 1: El concreto realizo
vaciado de concreto para placas de los corredores se realizo
el cada formaleta vaciado e instalación de acero corrugado
donde el vaciado concreto, por otra parte

Tramo 2: Se realizan perforaciones mediante se fijan y realiza colocación de acero para los alojamientos de anclas de las alcantarillas, por otro parte se continua con el conte, fijaciones anclo e instalación del acero para alojamientos de placa huella posteriormente se realizan vaciado de concreto de 3000psi. Tramo 4: se realizan excavaciones manuales para vigas riostras y bandillas, se realizo vaciado de concreto de 3000psi para huellas y vigas. Tramo 6: Se realizo vaciado de concreto en alojamiento de huellas, vigas riostras y contra.

Ing. Alfredo [illegible]
Dirección de Obra

Ing. H. Diaz Suarez
Residente de Interventoría

19 de enero de 2023

Viendo: Contrato Celebrado

Personal: para todo el proyecto 1 residente, 1 inspector de obra, 3 operadores, 1 topografo y 1 residente de interventoría, 1 inspector de interventoría. Tramo 1: 3 Maquinaria y equipo

obreros, Tramo 2: 1 maestro, 1 oficial, 9 obreros, Tramo 4: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros Tramo 6: 1 maestro 1 oficial y 5 obreros

Maquinaria y equipos: Retroexcavadora, Vibrocompactador Motoniveladora, herramienta menor y 11 mezcladoras de concreto tipo Reciclo.

Actividades: Tramo 2: Se realizan con el mismo diseño e instalación del acero para parrilla e rendijas de sumidero, Tramo 2: Se realizo conte armado y figurado para alojamiento de la placa huella y alcantarilla, se realizo perforaciones de vigas y diafragmas con anclas mecánicas, y por otra parte se realizo excavaciones manuales de vigas riostras, riostras y bandillas por otra parte se realizo vaciado de concreto en la bandillas y vigas riostras con bomba. Tramo 4: se realizo excavaciones manuales e instalación de formaletas de madera para vaciado de concreto colocado con retroexcavadora

de piedra existente. Se tomen chequeos de demoramo por parte del observador. Tramo 6: Se realice movimiento de acero de refuerzo para alargado de la placa huella pedraplenada. Se realice vaciado de concreto de 3000 psi. para la huella y banqueta se retire altura.

Ing. Mauricio Alvarez
Director de Obra

Ing. H. Nilo Suárez
Residente de Interventoría

30 de enero de 2023

Viernes: Cuadrilla Cubierta

Personal: para 2do. d proyecto: 1 conductor de obra, 1 inspector de obra, 2 ayudantes, 1 Ayudante de albañilería, 1 inspector de interventoría, Tramo 1: No hay personal. Tramo 2: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero. Tramo 4: 1 maestro, 1 oficial, 2 obreros. Tramo 5: 1 maestro, 1 oficial y 2 obreros.

Maquinaria, herramientas y equipos: 1 Retroexcavadora, 2 Mini volquetas, 1 vibrocompactador, herramienta menor, 1 mezcladora de concreto, 1 pala, 1 pica.

Actividades en obra: Tramo 2: Se realice movimiento de tierra para la adecuación de la cuneta del sendero se realicen chequeos y observaciones del almacenamiento por parte del observador. Tramo 2: Se realice corte, regado, compactación de acero de refuerzo para placa huella y alcantarilla por otra parte se realice vaciado de concreto en cuneta y huellas. A su vez se instala formaleta de madera para adecuación de medidores de placas huella de manera correcta y laborales en concreto reforzado. Tramo 4: Se realice o se continúe con excavación y compactación de relleno apisonado a su mismo se realice el suministro de la misma, por otra parte se realice corte, regado, nivelado e instalación de acero, por otra parte se realice vaciado de concreto en huellas de manera continua y laborales con adecuación de medidores.

Ing. Mauricio Alvarez
Director de Obra

Ing. H. Nilo Suárez
Residente de Interventoría

31 de enero de 2023

Clima: Soleado

Vendaval: General: Cabeceo

Personal de obra: El cadd para 2do el proyectista, 1 residente de ingeniería, 1 inspector de aseguramiento, 3 operadores de maquinaria, 1 cadenero de obra, 1 inspector de obra, 1 topógrafo. Turno 2 = 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros. Turno 4 = 1 maestro, 2 oficial, 7 obreros. Turno 6 = 1 maestro, 2 oficial, 11 obreros. Maquinaria y equipos = 1 Retroexcavadora, 1 motoniveladora, 1 compactadora manual vibrocompactador, 1 revolvedora de concreto, 2 pipa Agua.

Actividades ejecutadas: Turno 2= se realizo nivelación de formaletas de cimentación para vaciado de concreto en bordillo y se realizo vaciado de concreto en bordillo y luego realizo por otro pedio se continuo el vaciado de bordillo de concreto en las alcantarillas para las diagonales de oeste y sentido, se tienen chuzos para el vibrado con respecto a la nivelación de acero de las alcantarillas. Turno 4 se realizo vaciado de concreto en nivelación realizado para cunetas de tierra en concreto colocar malla de alcantarillo, a su vez se realizo vaciado de concreto en cunetas. Turno 6: Se continuo con el vaciado de concreto en huella de cunetas central y lateral con vibradores de pedal rotador, por otro pedio se realizo retiro y compactado de subbase granular con vibrador de tipo pedestal, a su vez se continuo con el corte y armado del acero de refuerzo para las alcantarillas de placa huella.

Ing. Yimmi Alvarez
Director de Obra

José H. Díaz Suárez
Residente de Interventoría

Actividades siguientes: Se continuó con la revisión
actividades del C.D.P. Iniciada el miércoles 01 enero de
2025 quedando pendientes 5 actividades. Se dio por
concluida con el siguiente acta constitutiva.

Cordoba — Vocal II Dina Solis
Residente de Inducción

10 de primavera de 2025.

Observaciones: Debido a las festividades decembrinas,
la comunidad no asistió a actividades del día, lo
cual se hizo constar en el libro de actividades para
el día 07 de enero del 2025.

Cordoba — Vocal II Dina Solis
Residente de Inducción

21 al 06 Enero de 2025
El Residente de área no ejecutó labores
relativas de campo en las fechas de
labores de Mandato de Inducción, se
hace constar el Reporte de Actividades
el día de Mañana 07 Enero de 2025.

Director de Obra — Vocal II Dina Solis
Residente de Inducción

07 Enero de 2025
Verano Santa Tomas — Cinta Soledad
Personal de área Diagonal Residente,
Ing. Ingrid Aguilar, Residente de Inducción
Inspector de Inducción.
• Reporte de Mañana: Mañana
• Actividades Ejecutadas.

El día de hoy se realizo recorrido con el ingeniero residente e inspector con el fin de verificar las actividades que se tenian programadas a ejecutar

Director de Obra

Ing. [illegible]
Residente Supervisor

05 de Enero de 2026
Viernes Soleado Tarapoto
• Recorrido de obra con el residente residente de supervisión [illegible] residente de supervisión
Inspector de supervisión
• Maquinaria y equipo utilizado, trabajos
• Actividades ejecutadas.
El día de hoy el contratista realizo suministro de materiales acarreo y demas en el jiron de Acopio que se tiene en el Municipio de Tarapoto con el fin de iniciar el suministro y traslado a los frentes de trabajo a ejecutar actividades.

Director de Obra

Ing. [illegible]
Residente de supervisión

09 de Enero de 2026
Viernes Soleado Tarapoto
• Recorrido de obra con el residente residente de supervisión [illegible] residente de supervisión
Inspector de supervisión
• Maquinaria y equipo utilizado, trabajos

Informe

El día de hoy el [illegible] de doña [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] de [illegible] y estuve muy [illegible] [illegible] [illegible]

Reunión de integración
- Inducción de cada área
- Actividades específicas
El primero será la parte de Mikaela y cada día se incluirá, desde el segundo en el Manejo de Niños o Niñas.

Lic. [illegible]
Directora de Área

Lic. [illegible]
Jefe de Sección

11 de Enero de 2022 Lunes
Hoy será la inducción a Recepción
- Jefatura de Área: Mi Jefatura de Área, Inducción a la Jefatura de Recepción, Jefatura de Información y Orientación, Operadores
- Inducción a Recepción: Mikaela Hernández, Tania
- Actividades específicas
Se realizarán actividades de Jefatura de Recepción, para Mikaela de 8:30, llenado a los puntos de Recepción con el fin de realizar actividades en la Jefatura

Lic. [illegible]
Directora de Área

Lic. [illegible]
Jefe de Sección

13 de Enero de 2022
Hoy será Jefatura, Lunes
- Jefatura de Área: Mi Jefatura de Área, Mi Jefatura de Recepción, Jefatura de Información y Orientación, Operadores

Libreta

(1) Maestro (1) Oficial, (3) Ayudantes
Maquinaria de equipo pesado, Volqueta,
Herramientas. Materiales de concreto (Lunes
Actividades ejecutadas:
Se continuan actividades de excavacion
con Cadenal (4ta Excavacion de 1.20m
de Ancho y 0.70 de profundidad) Se realizo
Nivelacion y Compactacion de Suelo-Cemento
para continuar con el Llano de Placa
Huella K.
Se realizo Vaciado de Concreto de Zapata
Aislada en Eje 1 para Fundido de Columna
de Tijera y Bovedillas.

Mano Obra Utilizada: (1) Maestro Albañil
(1) Oficial de Obra (1) Residente de Obra
(1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Ingeniería
Inspector de Ingeniería, (1) Maestro, (1) Oficial
(3) Ayudantes
Maquinaria y Equipo: Herramientas de
Mezcla, Manuales, Vibrador
Actividades Ejecutadas:
El Contratista realizo Actividades de
Excavacion y Compactacion de la Subra-
sante para inicio de Armado de
Zapata (1ra) Aislada de Escalera
de Placa Huella, se realizo Nivelac
y Compactacion de Base Niveles de
Cimientos de Cerco y Nivel de Aceras

Ing. Alfredo [illegible]
Director de Obra

Jose A. Lopez Sosa
Residente de Ingeniería
Obra

14 de Enero de 2025
Nombre Sofía Ramírez Díaz Salón
Asistencia de hoy (1) Nombre de Ana,
(1) Jennifer Avila, Residente de Chiquimula
Ausencia de Mercedes (3) Ofrendas
(1) Nicole, (1) Ana, (3) Pequeños
Maestra de Jóvenes Hermandad, Biblia
Adoración, Lunes, Predicador
Actividades Generales
El día de hoy se reunió con el Team
de Líderes de Sofía para elaborar el
Evento y Invitar a el Pastor de
se termina con la Adoración de Jesús
de Nazaret 33-36 por Jueves Semana
de Oración de Toda Iglesia
se realizo Juntos de Jóvenes para
Planeación de elementos de Vida Nueva
Iglesia de

Nombre Amanda Díaz Salón
Asistencia de Hoy (1) Nombre de Ana, (1)
Amanda Avila, Residente Chiquimula,
Ausencia Mercedes, (1) Nicole, (1) Ana
(3) Pequeños
Maestra de Jóvenes Hermandad.
Adoración de Biblia, Lunes
Actividades Generales
se realizo Actividades de evangelización
con Jóvenes para Recaudación de Ayuda
de la O a la Hoja del Jueves 16
se realizo Visita de Hogar de
Ana para elaborar el Plan Semana
de Evangelismo, se realizo Asistencia de

• Maquinaria y/o Equipo: Retroexcavadora, Taladro Manual, Bomba, Motosierra
• Actividades Ejecutadas
Se realiza Vaciado de Concreto de 21 Mpa para Instalación de elementos de Placa Huella Loma N°1

Viernes Veinte, Lluvia, Soleado
• Personal de Obra: (1) Residente de Obra (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (4) Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora de Concreto
Se Realiza Armado de Acero de Refuerzo #4 y #3 para elementos de Viga de Amarre y Pedestal de Alcantarillado Doble 1.1+1.5!

Supervisor de Obra — Jefe de Obra Sandra Residente de Interventoría

19 de Abril de 2015
Viernes Santo Domingo, Lluvia Soleado
• Personal de Obra: (1) Residente de Obra (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial (4) Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo: Retroexcavadora Bobcat, Vibrador, Bomba, Motosierra
• Actividades Ejecutadas
Se Continuan Actividades de Vaciado de Concreto de 21 Mpa elaborado en Obra para Cuneta y Bordillos a lo largo

del Tramo 10, se continua con excavación en Roca, Vía Lenta con el fin de dejar Niveles de Vía para el Cambio con Niveles Mínimos de +10 mts.

Vaciado Losa Lenta
- Personal de obra (1) Residente de obra, (1) Ingeniero Civil, Residente de Interventoría, (1) Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes
- Maquinaria y Equipo: Mezcladora de Concreto, Vibrador, Volqueta, Bomba, Motosierra
- Actividades Ejecutadas

Se continua con el Armado de Acero de Refuerzo #3 - #5 para elementos de Cuneta y Bordillo, Así mismo se realiza Vaciado de Concreto de 2500 psi para Cuneta y Bordillo Laterales, se realiza Compactación a lo largo del Tramo #1 donde continuara el Tramo en Ejecución.

Vaciado Losas
- Personal de Obra: (1) Residente de obra, (1) Ing Auxiliar, Residente de Interventoría, (1) Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (6) Ayudantes
- Maquinaria y Equipo: Mezcladora de Concreto
- Actividades Ejecutadas

Se realizo Vaciado de Concreto de 2500 psi para Losa de Fondo Lenta de entrada Interpuesta y se realizo Instalación de Acero de Refuerzo #3.

Ing. H. Andres Suarez
Residente de Interventoría

Ingeniero Civil

18 de Enero de 2025

• Personal de obra (1) Residente de obra, (1) Asistente residente, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, (1) Maestro (2) Oficial, (6) Ayudantes.

• Maquinaria y/o Equipo: Retroexcavadora, Cortadora Vibratoria, Dumper, Motoniveladora.

• Actividades ejecutadas:

Se continuo Actividades de Vaciado de Concreto de 21Mpa para elementos de Cuneta y Bordillo. Se realizo excavacion sin Clasificar (Corte) en la Via con el fin de Ampliar y dar cumplimiento al Ancho proyectado.

Se realiza Acopio de Materiales Petreos en Campo trasportados desde Acopio en el Municipio de Aratoca.

Vaciado Proyectado

• Personal de obra: (1) Residente de obra, Asistente residente, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes

• Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora de Concreto Bobcat, Vibrador, Dumper

• Actividades ejecutadas:

Se continua con el Armado de Formaleta de Madera para Fundicion de elementos de Via Cuneta y Se realiza Vaciado de Concreto de 21Mpa elaborado en obra para Franja Central y Sobreancho

Vaciado Volcan

• Personal de Obra: (1) Residente de obra, Asistente residente, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (4) Ayudantes

Material

Maquinaria Vía Equipo Mecanizado de Concreto
• Actividades Realizadas
El Contratista continua realizando actividades de corte, retiro y limpieza de terreno de ampliación #3 y #4 para Alcantarilla.

Observaciones a la fecha No se ejecutan Actividades en la Vereda Nacional.

Ing. [illegible]
Director de Obra

Víctor H. Jones Suárez
Residente de Interventoría

30 de enero de 2025
Vereda Santo Domingo Clima Nublado
• Personal de obra, (1) Residente de obra, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría. Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (2) Oficial (6) Ayudantes.
• Maquinaria y Equipo.
Se realizan actividades de Instalación de Formaleta de Madera para Ampliación de Cunetas de Placa Huella, del Lado Izquierdo del Sentido Longitudinal y Transversal, #3, #4 para Continuidad Cunetas de Placa Huella.

Vereda Limonado Clima Soleado
Personal de obra (1) Residente de obra (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría, Inspector Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficiales, (6) Ayudantes
• Maquinaria y Equipo. Mezcladora de Concreto Retroexcavadora, Volqueta, Vibrador.

Se realiza Instalación de Acero de Refuerzo #3-3/8 para elementos de Losa Huella (Viga inversa, Huella, Contra y Bordillo) y se realiza Vaciado de Concreto de 210kg/cm² para elementos de Huellas y Viga Inversa (1 de luego del Tramo #1

Vereda Vatican
- Personal de Obra (1) Residente de Obra, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría (1) Maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes
- Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora de Concreto
- Actividades ejecutadas
Se realizó Armado de Formaleta para Instalación de elementos de Concreto y Resane de Alcantarilla Tipo 151 de Tuberia a 2 Tuberías.

Ing. Residente de Obra — José H. Torres Suárez, Residente de Interventoría

21 de enero de 2025
Vereda Santo Domingo — Clima: Nublado
- Personal de Obra (1) Residente de Obra (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial (5) Ayudantes
- Maquinaria y/o Equipo: Retroexcavadora, Volqueta, Vibrador, Motosierra
- Actividades ejecutadas.
Se continua con el Armado de Formaleta de Madera para Instalación de elementos de Losa Huella Tramo 10, se continua

fidera

Con el Vaciado de Concreto de Sintra colocado en dos filas Elementos de Cuneta y Sardineles pendientes en el Tramo

Vaciado Ejecutado Clima: Soleado
- Personal de Obra: (1) Residente de Obra, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Intervención, Supervisor de Intervención, (1) Maestro, (1) Oficial, (5) Ayudantes.
- Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora de Concreto Concreto, Vaciado, Vibrador.
- Actividades ejecutadas

Se continua con Vaciado de losa de Veredas de 3m Para los diferentes elementos de Pista, Vereda, Se realizo Vaciado de Concreto de 4Mpa para Veredas de Media Sección y Sobrecimiento a lo largo del Tramo en Calle #1 teniendo en Cuenta lo, Juntas Peatonales de Vaciado de Concreto de 17Mpa Se intervienen Mediante Vaciado en Bajo Nivel

Vaciado Volcan Clima: Soleado
- Personal de Obra: (1) Residente de Obra, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Intervención Supervisor de Intervención, (1) Maestro, (1) Oficial, (6) Ayudante
- Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora de Concreto.
- Actividades ejecutadas

El Concreto se Continua con el Vaciado de Veredas para los elementos de Alcantarilla (Veredas de Cabecera y Cabecera Media) de Acuerdo a Dimensiones y

Seguidamente se realiza vaciado en concreto de 4 mts 3m1.91
Se realiza excavacion con Cheyene para zanja viga Hegantillo ref 319 y elemento de apoyo y Desde
Se realiza instalacion de linea de Pvc de 36" y se procede al retiro de la misma vida realizado el paso en el punto intervenido

Jose H Pinto Suarez
Residente de Interventoria

22 de enero de 2025
Vereda Santo Domingo Clima Soleado
• Personal de obra (1) Residente de obra, (1) Ingeniera Auxiliar, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, (1) Maestro, (1) Oficial (5) Ayudantes
• Maquinaria y Equipo Retroexcavadora Cheyene, Volqueta, Mixer
• Actividades efectuadas
Se continua con el Armado de Acero de Refuerzo para elementos de Viga Huella y la Viga del Tramo 1 en Voladizo Compuesto de 3/8 Viga Huella, Cuerda, Bordillo y Viga Central.

Vereda Rincanada Clima Soleado
• Personal de obra; (1) Residente de obra, (1) Ingeniera Auxiliar, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, (1) Maestro, (1) Oficial, (5) Ayudantes

Viernes

• Actividades ejecutadas.
Se realiza Visita de Inicio de 2 días
planificada en una Mesa Técnica de Trabajo
Conjunta y Visita Insitu
Se realiza Instalación de Faena de Izamiento
#3 - 3pc Viga Cantidad de Cinco (5) Modulos.
a la Viga del Tramo 1

Nueva Valcan Chile Spa
Personal de Obra (1) Residente de Obra, (1) Ingeniero
Asistente Residente de Inspección, Inspector de
Inspección, (1) Maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes
• Maquinaria y/o equipo Manejado
Se Continua Vaciado de Concreto de Losa
de Hormigón Premezclado en Concreto de 3ª
Etapa de Acuerdo a Especificaciones

Jose H. Jones Soto
Residente de Inspección

23 de Abril de 2023
Nueva Santa Lorenza Chile Spa
• Personal de Obra (1) Residente de Obra, (1)
Ingeniero Auxiliar, Residente de Inspección,
Inspector de Inspección, (1) Maestro, (1) Oficial
(5) Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo Utilizado, Retroexcavadora
Vagoneta, Dumper
• Actividades Ejecutadas
Se Continua con la instalación de Formaleta
de Madera para la Fundición de Elementos
de Losa Nueva y Continua se realiza
Trabajo de Acero de Refuerzo de los

liderar

Viviendas existentes de Viga Huella
Cuneta y bordillo

Vereda Rinconada Clima: soleado
- Personal de obra: (1) Residente de obra, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Intervención, Inspector de Intervención, (1) Maestro, (1) Oficial, (5) Ayudantes.
- Maquinaria y Equipo: Mezcladora de Concreto, Vibrador, Winche.
- Actividades Ejecutadas:
Se realizo Vaciado de Concreto de f'c 175 kg/cm2 para elementos de Viga Central y Solera de Viga Huella, se realizo excavaciones de Viga Huella a lo largo del Tramo y se retiro Tierra de Material Longitudinal y Transversal #3 - 3/8.

Vereda Volcan Clima: soleado
- Personal de obra: (1) Residente de obra, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Intervención, Inspector de Intervención, (1) Maestro, (1) Oficial (6) Ayudantes
- Maquinaria y Equipo: Mezcladora
- Actividades ejecutadas:
Se finalizo Vaciados de Concreto de f'c 175 kg/cm2 para elementos de Alcantarilla se realizo Refines en Veredas Ingreso a Alcantarillas con el fin de poder el Armado de Acero de Refuerzo para Cuneta y Bordillo.

Vereda Chagua Baja

Personal de obra: (1) Ingeniero Residente, (1) Maestro
auxiliar, Residente de Ingeniería, Inspector de
Construcción, (1) Peón, (1) Chofer, (3) Ayudantes
• Maquinaria y equipo: Retroexcavadora
• Actividades ejecutadas:
El contratista de obra realiza durante el
día la excavación con maquinaria pesada
para la zapata, dejando de cada
excavación 1.50 x 1.50 x 1.40 de profundidad,
durante el día anterior se instaló la malla
en el fondo.
Se realiza inspección de obra de la
de 30 cm de concreto simple y se procede a
la nivelación del terreno y compactación
de la misma.

Victor Ramos
Personal en obra: (1) Ingeniero Residente, (1) Ingeniero
auxiliar, Residente de Ingeniería, Inspector de
Construcción, (1) Maestro, (3) Albañiles.
• Maquinaria y equipo: Mezcladora de concreto
• Actividades ejecutadas:
Se realiza el vaciado de concreto de dicha
Zapata con dimensiones de 1.50 x 1.50 x 0.30
El contratista realiza el vaciado de concreto
de 30 zapatas y realiza traslado de
material pétreo y cemento para
continuación de actividades de vaciado

Victor H. Ramos Suárez
Residente de Ingeniería

Interna

24 de enero de 2025

Vereda Santo Domingo Clima soleado

- Personal de obra: (1) Ingeniero Residente, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial, (5) Ayudantes.
- Maquinaria y/o equipo: Bobcat, Retroexcavadora Vibrocreto, Bomba.
- Actividades ejecutadas:

El contratista en día de hoy realizo vaciado de concreto de 3000 psi en obra para elementos de cuneta y bordillo de la vía del tramo 10.

Vereda Buenavista Clima: Soleado

- Personal de obra: (1) Ingeniero Residente, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial, (5) Ayudantes.
- Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora de concreto Bobcat, Vibrador y Mixer.
- Actividades ejecutadas:

Se continua con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de los pozos, elementos de muelas, Viga cabezal y cunetas y Asi mismo se continua con el vaciado de estos elementos en el tramo #1

Vereda Volcan, Clima Soleado

- Personal de obra: (1) Ingeniero Residente, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial

Ildefonso

10 Fundamentos
• Actividades ejecutadas:
Se realiza descarga de Formaleta de elementos de Fondo de cajón y Vaciado y se realiza retiro de elementos. Se realiza Aplicado de Acpm de Sika para Curado y Nivelo cajón de elementos de Fundación

Nombre Firma Cédula Salario
• Personal de obra: (1) Residente de obra, (1) Ingeniero Auxiliar, (1) Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial
• Maquinaria y/o equipo: Ninguno (Herramienta Menor)
• Actividades Recibidas
El personal, Realiza Actividades Netamente de Obras de Drenaje, realizando el armado de Aleta de Referencia #3 y #4 en elementos de concreto y Vaciado

Jose H. Jones Suarez
Residente de Interventoría

05 Enero de 2025
Nombre Cargo Firma Salario Mínimo
• Personal de obra: (1) Ingeniero Residente (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial (6) Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo: Retroexcavadora Vaciadora, Vibrador
• Actividades ejecutadas

liberar

Se realiza instalacion de formaleta de Madera para Modulacion de elementos de Placa Huella, Se realiza excavacion de Viga portante y se realiza instalacion de Acero de refuerzo #3-5/8 para elemento.

Viernes Finalizado Clima: Soleado
Personal de Obra (1) Ingeniero Residente, (1) Ing Auxiliar, Residente de Interventoria, (1) Inspector de Interventoria, (1) Maestro, (1) Oficial, (5) Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora de Concreto Vibrador, Volqueta, Formaleta.
• Actividades Ejecutadas
Se continua con el Armado de Formaleta para Modulacion de elementos de Placa Huella, se realiza Vaciado de Concreto de 4.000 psi para Viga Central y Sobrecimiento (Lado Izquierdo)

Viernes Nublado Clima: Soleado
• Personal de Obra: (1) Ingeniero Residente, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoria Inspector de Interventoria, (1) Maestro, (4) Oficial, (6) Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora
• Actividades Ejecutadas
Se realiza Armado de Acero de Refuerzo #3-3/8 para elementos de Grada, y Descole (Concreto y Bordillos) de Mezzanina Posterior

Viernes Cinco Clima: Soleado

- Personal de Obra (1) Residente de Obra (1) Ingeniero Auxiliar (1) Residente de Interventoría Inspector de Interventoría (1) Maestro (1) Oficial (6) Ayudantes
- Maquinaria y/o Equipo Herramienta Menor
Actividades Ejecutadas
Se continuó con el retiro de tapa de alcantarilla #8-36 Horizontal de concreto de Alcantarilla

Víctor H. Díaz Suárez
Residente de Interventoría

20 de enero de 2025
Viernes Santo Domingo Clima Soleado
- Personal de Obra (1) Ingeniero Residente, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial (6) Ayudantes
- Maquinaria y/o Equipo Retroexcavadora Volqueta, Pumper
- Actividades Ejecutadas
Durante el día se realizo Vaciado de Concreto de 21 Mts para elementos de Cuneo y Pantallas faltantes a la Viga del Tramo 6

Viernes Santo Clima Soleado
- Personal de Obra (1) Ingeniero Residente, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial (6) Ayudantes
- Maquinaria y/o Equipo Mezcladora de Concreto Retroexcavadora, Volqueta, Pumper
- Actividades ejecutadas

Se continua con armado de tapa de registro de 30 para elementos de viga tipo 1 y se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y rodillos.

Vaciado Veloz

- Personal de obra, (1) Ingeniero Residente (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de intervención Inspector de intervención. (1) Maestro, (1) Oficial (6) Ayudantes
- Maquinaria y/o equipo: Mezcladora de concreto
- Actividades ejecutadas

Se finaliza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y rodillo pendientes hacia Pescado Alcantarilla. Se trasladan materiales y herramientas hacia el siguiente punto de intervención

Vaciado Cruce

- Personal de obra (1) Ingeniero Residente (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de intervención Inspector de intervención. (1) Maestro, (1) Oficial
- Maquinaria y/o equipo: Mezcladora
- Actividades Ejecutadas

Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para finalización de tramo Pescado Alcantarilla (Altos y Quebradas)

José H. Jones Suarez
Residente de Interventoría

Liderar

25 de enero de 2025
Vereda Santo Domingo Clima soleado
• Personal de obra (1) Ingeniera residente, (1) Ingeniera Auxiliar, residente de interventoría (1) Inspector de interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial (2) Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo: Retroexcavadora Volqueta, Vibrador.
Actividades ejecutadas
Se continua con Vaciado de Concreto de Viga Cimentación (Placa Aligerada) y se continua con Vaciado de Concreto de 21 Mpa para Cuneta y Bordillo

Vereda Lucinda Clima soleado
• Personal de obra (1) Ingeniera residente (1) Ingeniera Auxiliar, residente de interventoría, Inspector de interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial (6) Ayudantes
• Maquinaria y Equipo: Mezcladora de Concreto Vibrador, Volqueta, Vibrador
• Actividades Ejecutadas
En el día de hoy el Contratista realizo Actividades de, Cortar, Fundido y Armado de Acero de Refuerzo #3-3/8" para Continuidad Cimentación de Cuneta y Bordillo, Se Realizo Vaciado de Concreto de 21Mpa en obra para Cuneta y Bordillos Borde Izquierdo y Derecha

Vereda Volcán Clima: Soleado
• Personal de obra (1) Ingeniera, Residente, (1) Ingeniera Auxiliar, Residente de Interventoría

Sidera

Inspector de Intervención, (1) Maestro, (1) Oficial (6) Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora
• Actividades Ejecutadas:
Durante el día se realiza vaciado de Viga de amarre de cimiento de Eje 1 y Bordillo perteneciente a la Loza de Contacto Vial, con el fin de dar por terminado Sección completa de Mala Hierba.

Vereda Chicagua Bajo. Clima: Soleado
• Personal de Obra: (1) Ingeniero Residente, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría Inspector de Intervención, (1) Maestro, (1) Oficial (3) Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora de Concreto
• Actividades Ejecutadas:
Durante el día se realiza se realizo fundido de Viga de amarre de elemento de Cerca y Escala y se Ejecuta el Corte, figurado y Armado del Acero de Refuerzo #3 y #4 para elemento de Cerca y Escala.

Ing. [illegible]
Director de Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

29 de enero de 2026
Vereda Sitio Nuevo Clima: Soleado
• Personal de Obra: (1) Ingeniero Residente, (1) Ingeniero Auxiliar, Residente de Interventoría

Inspector de intervento, (1) Maestro, (1) Oficial
(2) Ayudantes
Actividades ejecutadas:
Se realiza instalación de formaleta de Madera para Modulación de elementos de Placa Huella, se continua con el Armado de Acero de Refuerzo #3 - #6 para Cuneta y Vía Nueva.
Se realizan Actividades de socialización, Mercadeo, de Material para Estabilización de la subrasante, Ayuda, Incluyendo la Compactación de la Mezcla para el Día de Mañana.

Nombre Encargado Firma Soldado
: Personal de obra (1) Ingeniero Residente, (1) Auxiliar de Ingeniería, Residente de Interventoría Inspector de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial (6) Ayudantes
: Maquinaria y/o Equipo Mezcladora (Concreto Bobcat, Volqueta y Bumper
· Actividades ejecutadas
Se realizo Instalación de Formaleta de Madera, para Modulación de elementos de Placa Huella y se Procede al Vaciado de Concreto de 4 Mpa para Franja Central y Subrasante
Se continua con Vaciado de Concreto de 21 Mpa y Armado de Acero de Refuerzo #3 para elementos de Placa Huella

Nombre Encargado Raúl Firma Soldado
: Personal de Obra: (1) Ingeniero Residente, (1) Auxiliar de Ingeniería, Residente de Interventoría

liderar

Inspector de interventoría, (1) Maestro, (1) Ayudante (3) Auxiliares
- Maquinaria y/o equipo: Mezcladora de concreto
- Actividades relacionadas
Se realiza fundido de fundación de Muelle, Una Modulación de elementos de Plataforma Puesta de cargue y descargue, se realiza Vaciado de concreto de 21 Mpa para los Muelles.

Viernes 10 de enero Clima: Soleado
- Personal de obra: (1) Ingeniero Residente, (1) Auxiliar de ingeniería, Residente de interventoría Inspector interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial y (4) obreros
- Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora de Concreto
- Actividades ejecutadas.
Se realiza corte, figurado, y fundido de viga de fundación #3 - 3/6 Viga elemento de Placa huella y se vaciado al Vaciado de los Muelles en concreto de 21 Mpa elaborado en obra, Localizando Vigas de Placa huella por fundir

Jefe de obra
Vo.Bo. Ing. Residente de Interventoría

30 de Enero de 2025
Viernes Santo, Domingo Clima Soleado
- Personal de obra: (1) Ingeniero Residente, (1) Auxiliar de ingeniería, Residente de interventoría Inspector de interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial

Liderazgo

31 De Diciembre 2024
Vereda Boyaca - Santanita - San Isidro
No se ejecutan actividades en campo, teniendo en cuenta que a la fecha se suspenden Actividades por festividades Decembrinas.

Jose H. Tapias Suarez
Residente de Interventoria

28 de enero de 2025
Vereda Boyaca
Personal de obra: (1) Residente de obra, Residente de Interventoria, (3) Operadores
Maquinaria y/o equipo: Motoniveladora, Bobcat, Retroexcavadora
Actividades ejecutadas:
Se realizan Actividades de Mantenimiento Rutinario a lo largo del Corredor Vial con el fin de mejorar las Condiciones de la Via (Subrasante natural), se realiza Cunteo a lo largo del Corredor.

Vereda Santa Anita
Personal de obra: (1) Residente de obra, Residente de Interventoria, (3) Operadores
Maquinaria y/o equipo: Bobcat, Retroexcavadora.
Actividades ejecutadas:
Se Realizan Actividades de Mantenimiento Rutinario a lo largo del Corredor Vial Vereda Santa Anita, Con el fin de mejorar las Condiciones Actuales de la Via (Subrasante Natural).

Vereda San Isidro
Personal de obra: (1) Residente de obra, Residente de Interventoria, (2) Operadores
Maquinaria y/o Equipo: Bobcat, Volqueta y Retroexcavadora

Actividades ejecutadas
Se realizo Actividades de Remocion de Derrumbes en sitios Criticos donde se presentaron taponamiento en las Placa Huella debido la Inestabilidad de Taludes Causado por lluvias.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

29 de enero de 2025
Vereda Bayoca
Personal de obra: (1) Residente de Obra, Residente de Interventoria, (3) Operadores.
Maquinaria y/o equipo: Motoniveladora, Bobcat, Retroexcavadora
Actividades ejecutadas.
Se continuan labores de Mantenimiento Periodico a lo largo del Corredor y se realiza Cunetero a lo largo del Tramo Vereda Bayoca.

Vereda Santa Anita
Personal de Obra: (1) Residente de obra, Residente Interventoria, (3) Operadores.
Maquinaria y/o equipo: Bobcat, Retroexcavadora
Actividades Ejecutadas.
Se Continuan Actividades de Mantenimiento Periodico a lo largo del Corredor Vial que dirige a la Vereda Santa Anita Con el Fin de mejorar el estado Actual de la Subrasante.

Vereda San Isidro
Personal de obra: (1) Residente de obra, Residente de Interventoria, (2) Operadores
Maquinaria y/o equipo. Bobcat, Volqueta y Retroexcavadora.

Actividades ejecutadas
Se continuan con actividades de limpieza de cunetas de las partes donde se presenta asentamiento debido a inestabilidad de taludes con lluvia, se realizo retiro de material al destino final.



Jose H. Tolpes Suarez
Residente de Interventoria

30 de enero de 2025
Vereda Laguna
Personal de obra: (1) Residente de obra, Residente de Interventoria, (3) Operadores
Maquinaria y/o equipo: Motoniveladora, Bobcat, Retroexcavadora
Actividades ejecutadas
Se continuan actividades de cunetas con Retroexcavadora y de igual manera mejoramiento de la subrasante de la parte baja de Corredor Vial para mejorar las condiciones actuales

Vereda Santa Anita
Personal de obra: (1) Residente de obra, Residente de Interventoria, (3) Operadores.
Maquinaria y/o equipo: Bobcat, Retroexcavadora
Actividades Ejecutadas
Se continuan labores de Mantenimiento Rutinario para Mejoramiento de la Subrasante Actual de la parte del Corredor Vial Vereda Santa Anita.

Vereda San Isidro
Personal de obra: (1) Residente de obra, Residente de Interventoria, (2) Operadores
Maquinaria y/o equipo: Bobcat, Volqueta y Retroexcavadora.

Actividades ejecutadas
Se continuan actividades de demolicion de elementos en diferentes puntos criticos y se realiza lectura de material de la presente actividad al punto final.



Jose H. Ibañez Suarez
Residente de interventoria.

31 de enero de 2025
Vereda Bajada
Personal de obra: (1) Residente de obra, Residente de interventoria, (3) Operadores.
Maquinaria y/o equipo: Motoniveladora, Bobcat, Retroexcavadora.
Actividades ejecutadas
Se continuan actividades, Actividades de Mantenimiento periodico a lo largo del Corredor Vial para el Mejoramiento de la Subrasante Actual

Vereda Santa Anita
Personal de obra: (1) Residente de obra, Residente de interventoria, (3) operadores
Maquinaria y/o equipo: Bobcat, Retroexcavadora
Actividades ejecutadas
El dia de hoy el Contratista continua con Actividades de Mantenimiento periodico a lo largo del Corredor Vial, y se realizo Cunetas en los Sitios requeridos.

Vereda San Isidro
Personal de obra: (1) Residente de obra, Residente de interventoria, (3) Operadores.
Maquinaria y/o equipo: Bobcat, Volqueta, Retroexcavadora.
Actividades ejecutadas.

Se sirve la ejecución de Remoción de Derrumbe en Puntos Críticos a lo largo del Corredor Vial V de Rural Manera Se Retira dicho este Material al Destino Final Indicado.

José H. Jaimes Suárez
Residente de Interventoría
