	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N° 178-2023 **Contratista:** CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS B-V

Contrato de Interventoría No. 2274-2021 **Interventoría:** CONSORCIO NACIONAL ET

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL

INFORME MENSUAL No. 31 **MES O PERIODO:** JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		7
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8
2.4	Características técnicas del proyecto		8
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		10
3.1	Información general del contrato		10
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		11
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		11
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		11
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		12
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	13
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	26
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	28
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	32
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	35
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	37
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	44
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN15-FR-14	92
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		94
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	94
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	94
	• Seguimiento Programa de Obra		96
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	98
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	99
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	101
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		102
5.1	Información general del contrato		102
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		103
5.3	Informes especialistas y profesionales		105
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		200
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	200
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	203
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	205
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	208
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	217
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo		
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	220
	• Seguimiento al Plan de Cargas		
7	**Conclusiones y recomendaciones**		222
8	**Anexos**		223
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		223
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		225
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		236
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		241

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 558 de 17 de FEBRERO DE 2022
Revisó Jesus D Salgado H

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

IN I U O N" ION" D "
RO O MI ION" J U I N D ROJ O D IN R" RU UR" D R"N OR
M"NU" D IN R N OR " O R" I "
R UM N M N U" "DO N R" D ROJ O

C DIGO	M PI M I R
RSIO	
P GI "	

C " 0 0
Da Mes " o

UNID" D J U OR" S DIR CCIO D I" S R GIO " S **DIR I N RRI ORI"** CORDO " **RIODO M** Ju io de 0

ON R" O D O R" ND D 0

O J O M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CI D CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D
S" " G D P" R " M O D C RDO "

ON R" I " CO SORCIO CORR DOR S R R" S

" O INI I" M S S
" D INI IO D S P I M R D 0
" D U N I N "
" D R " NUD" I N "
" D N IMI N O 0 D J IO D 0
" O" UMU " DO 0 M S S

" OR INI I" u dD I " 0 0 0 00
" OR " DI ION" u dD I "
" OR " UMU " DO u dD I " 0 0 0 00
" N I I O ON DIDO
" N I I O " MOR I " DO

ON R" O D IN R N OR " D 0 **IN R N OR** CO SORCIO " CIO " **U R I OR D ON R" O D IN R N OR "** S OR " M S I " DI GO

" " N I O ON R" " DO

" I ID" D		UNID" D	" N ID" D
Pa imen aci n	Cons rucci n	me ros	0
	Mejoramien o		
	Re a ii aci n		
s ruc uras	ne es		
	Puen es		
	Pon ones		
Man enimien o			
O ros speci icar cua es			

" " N I O J U " DO D ON R" O

" I ID" D		UNID" D	" N ID" D M	" N ID" D " UMU " D"
Pa imen aci n	Cons rucci n	me ros		
	Mejoramien o			
	Re a ii aci n			
s ruc uras	ne es			
	Puen es			
	Pon ones			
Man enimien o				
O ros speci icar cua es				

" " N IN" N I RO

" OR O " ON R" " DO IN UIDO O " DI ION"

	I O	I "	O "
O R" S	0		0
" J S S O R" S COMP M " RI" S J O O R" S " DICIO " S			
JOR " D" S D R" " JO OR" S DI" RI" S DI" S D " S M" " I MI " CI			
S DIOS J DIS OS			
G S I " M I " SOCI" PR DI" J D SOS I I ID" D			
" OR O " D CO R" O	0 0 0		0 0 0

D D D d Drr D d r D r D dD rD u D rD d

" OR O " J U " DO N M

	I O	I "	O "	" UMU " DO
O R" S				0 00
" J S S				
O R" S COMP M " RI" S J O O R" S " DICIO " S				
JOR " D" S D R" " JO OR" S DI" RI" S DI" S D " S M" " I MI " CI				
S DIOS J DIS OS				
G S I " M I " PR " C "				
G S I SOCI" PR " C "				
G S I PR DI" PR " C "				
G S I D SOS I I ID" D PR " C "				
" OR J C " DO				0 0 0

	IN I U O N" ION" D " RO O MI ION" J U I N D ROJ O D IN R" RU UR" D R"N OR M"NU" D IN R N OR " O R" I " R UM N M N U" "DO N R" D ROJ O	C DIGO M PI M I R RSIO P GI "

C " 0 0
Da Mes " o

IN R I N NO R"

I RSI O R" PROGR" M" D" " C M " D" "	0 0 0 00
I RSI O R" J C " D" " C M " D"	0 0 0 00
" " C D O R" "	00 00

M O N R"DO N M

M" O D O R" C" I IC" D"	0
M" O D O R" O C" I IC" D"	
MP OS I DIR C OS G R" DOS	
O " MP OS G R" DOS	

R I RO O O R I O



D D ND r D D D



D D ND r D

RO DIMI N O D MU " O "N I N I d r dD ru u r rD D d r Dd u D

irma
om re M" RI" S " J IO GO a" a
Direc or de In er en or a
Ma r cu a Pro esiona o 0 0 COR

Origina In orme mensua de In er en or a " rc i o de Ges i n de l I" S
Copias In er en or Direcci n erri oria

1. INTRODUCCION

En el marco del Programa Colombia Rural, el Instituto Nacional de INVIAS (INVIAS) y la Alcaldía Municipal de Sahagún suscribieron el Convenio Interadministrativo 917 de 2021, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

Según lo dispuesto en el PARAGRAFO QUINTO de la CLAUSULA PRIMERA del Convenio Interadministrativo 917 de 2021, la Alcaldía Municipal de Sahagún contrató las obras llevando a cabo un proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública. A través de la licitación LP-012-2023 se seleccionó al Contratista ejecutor del contrato de obra 178 de 2023, contrato cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL".

Según lo dispuesto en el PARRAGRAFO PRIMERO DE LA CLAUSULA PRIMERA del Convenio Interadministrativo 917 de 2021, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) contrató la Interventoría responsable del seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero y ambiental de las obras objeto del convenio. A través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DO-SRT-167-2021 se adjudicó al CONSORCIO NACIONAL ET el contrato 2274 de 2021 con ID del contrato en SECOP No. CO1.SLCNTR.7829516 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3".

Se le impartió orden de inicio al contrato de interventoría No. 2274 de 2021 mediante comunicado SVR 3493 del 27 de enero de 2022. De igual forma para el control y vigilancia el INVIAS designó como Supervisor del Contrato al ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO y al ingeniero ÁLVARO DE JESÚS GALVIS como Gestor Técnico de Proyecto.

En el marco de las obligaciones adquiridas por el CONSORCIO NACIONAL ET, y según lo estipulado en el Contrato de Interventoría 2274 de 2021, se presenta a consideración el Informe Mensual del Interventoría No 30 correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) y el treinta (30) de julio de 2024. En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo del contrato en los componentes técnico, administrativo, financiero y ambiental, con el fin de garantizar la calidad de las obras y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

CONTRATO DE OBRA No. 178 DE 31 DE AGOSTO DE 2023

Convenio No. 917 de 2021

CORREDORES VIALES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CORDOBA

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:

El proyecto tiene como objeto:

En el marco del Programa "Colombia Rural", realizar un mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación del corredor vial Apartada- el Olivo-San Francisco-La Padilla, ubicado en el Municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba, considerando que la capa de rodadura existente no ofrece una adecuada transpirabilidad a los usuarios de la vía. Se busca garantizar una movilidad de tránsito de manera segura, cómoda y amigable con el medio ambiente.

ALCANCE FÍSICO DEL PROYECTO:

Según lo estipulado en el PARÁGRAFO PRIMERO de la Cláusula Primera del Convenio Interadministrativo 917 de 2021, el alcance es el siguiente:

"Adelantar las actividades de la red vial terciaria a cargo del Municipio de Sahagún, de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos y el Anexo Técnico."

En acta modificatoria No 1, luego de balance de mayores y menores cantidades de obra, se estipula que el alcance físico del proyecto es la intervención de 870 metros lineales del corredor vial Apartada- el Olivo-San Francisco-La Padilla, ubicado en la zona rural del Municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba, mediante la construcción de pavimento rígido dispuesto en dos tramos de vía.

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto está localizado en el corregimiento El Olivo el cual está localizado en el Municipio de Sahagún, en la parte suroriental del departamento de Córdoba. Se encuentra a 71 Km de la capital del departamento de Córdoba a una altura de 75 metros sobre el nivel del mar. El Municipio de Sahagún limita al norte con el municipio de Chinú, al sur con el Municipio de Pueblo Nuevo, al oeste con el Municipio de Ciénaga de Oro y al este con los municipios de Chinú y la Unión.

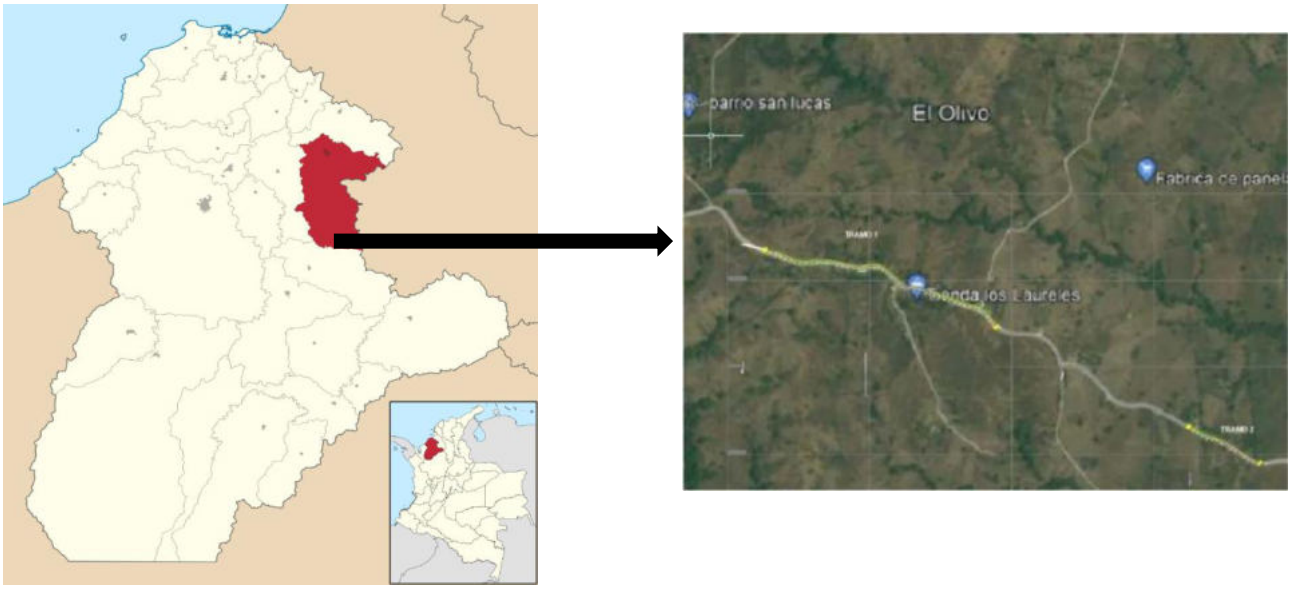


Figura 1 Ubicación del Municipio de Sahagún en el Departamento de Córdoba

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La zona de influencia del proyecto es eminentemente rural, la constituyen las poblaciones de Apartada El Olivo, San Francisco, La Padilla. Aledaña a las poblaciones de Aguas Vivas, Montañitas, Dividivi, las Cruces, Pisa Flores, entre otras.

Actualmente es difícil la intercomunicación terrestre de la población rural del Municipio de Sahagún, debido al mal estado de la red terciaria, intransitables en temporada invernal o con restricciones de tránsito. Aunado a esto hay deficiente mantenimiento por parte de la Entidad Territorial. Esto genera: aumento de los tiempos de viaje que repercute en la comercialización de productos desde y hacia la zona rural, aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros, deterioro de la calidad de los habitantes en las inmediaciones del proyecto, inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios, incremento en el costo de vida de la población, dificultad de acceder a puestos de salud y hospitales, y en general una

reducción de las oportunidades de desarrollo integral de los habitantes de la región.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

- La carretera que comunica las poblaciones Apartada El Olivo, San Francisco y la Padilla tiene un ancho promedio de 6 metros y con una longitud de 3540 m con rodadura en tierra.
- Las condiciones climáticas de la zona del proyecto, son las siguientes. La carretera a intervenir se encuentra ubicada en un piso térmico cálido, que corresponde a las tierras localizadas entre 0 m y los 1000 m de altura sobre el nivel del mar, con precipitaciones media anual de 1000 mm. En la zona existe un régimen de lluvia bimodal, comprendido entre marzo y mayo y entre septiembre y noviembre, con los demás meses de periodo seco. La temperatura media anual es de 26,9 °C, los valores más altos coinciden con la época de verano.
- Se puede evidenciar en los resultados de los apiques que el suelo está compuesto por un material granular de tipo arena limosa en el corregimiento El Olivo en la parte superior de la subrasante.

2.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

- La vía a intervenir consta de una calzada bidireccional, desde el punto de vista vial es un segmento recto, plano y con buena visibilidad.
- La topografía del sector a intervenir consiste en una zona plana, la pendiente está entre el 3% y el 4%, razón por la cual no se requiere ningún tipo de obra de contención.
- El subsuelo entre 1.20 m y 1.50 m de profundidad está compuesto por arena limosa y arenosa de mediana plasticidad, por lo cual los cambios volumétricos se deben considerar como variable fundamental.
- Las exploraciones realizadas demuestran que en la zona de estudio la vía no se encuentra en presencia de nivel freático. El suelo de la vía ubicada en el corregimiento de El Olivo presenta problemas de cambios volumétricos, un contenido de materia orgánica sin

problemas de turbas, un grado de expansión bajo, por lo cual es necesario realizar un reemplazo de la subrasante por un material seleccionado con características granulares, ya que la composición geotécnica de la subrasante está dada por suelos de baja resistencia afectando la capacidad portante.

- Según los Estudios realizados por el Contratista y aprobados por Interventoría, la estructura de pavimento rígido corresponde a 20 cm de espesor en losa de concreto, apoyada sobre una capa de subbase granular de 20 cm de espesor, que a su vez se apoya en una capa de mejoramiento con material seleccionado de 30 cm de espesor.

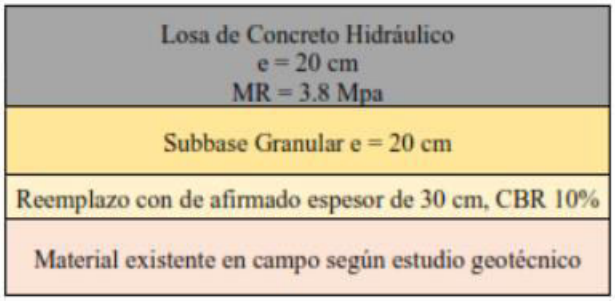


Figura No 2. Estructura pavimento rígido según Ajustes a Estudios y Diseños

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Número del Proceso de Selección	Licitación de Obra Pública No LP-012-2023
Entidad Contratante:	Alcaldía Municipal de Sahagún
Link del SECOP 1	
Número del Contrato:	178 de 2023
Fecha de Suscripción del Contrato:	31 de agosto de 2023
Objeto del Contrato:	Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos en el Municipio de Sahagún, departamento de Córdoba.
CONDICIONES INICIALES	
Contratista de la Obra:	Consorcio Corredores Rurales B-V
Integrantes del Consorcio:	Volga Construcciones SAS (90%) Nit: 901.510.700-4 Belisario Alfredo de León Narváez (10%) c.c. 15.041.209
Representante Legal del Consorcio:	Adriana Patricia de León Otero, identificada con la c.c. 53.120.632 de Bogotá.
Valor Inicial del Contrato de Obra:	Dos mil doscientos millones trescientos dos mil novecientos cuatro pesos M/Cte ($2.210.302.904,00)
Plazo de ejecución inicial:	Tres meses y 1 semana (3.25 meses)
Fecha de inicio:	25 de septiembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
MODIFICACIONES REALIZADAS	
• **PRORROGA(S) EN TIEMPO:**	
Prorroga No 1:	Hasta el 31 de marzo de 2024.
Prorroga No 2:	Hasta el 15 de abril de 2024.
Prorroga No 3:	Hasta el 30 de junio de 2024.
Prorroga N. 4:	Hasta el 30 de Julio de 2024
Fecha de Suspensión No 1:	10 de abril de 2024.
Fecha de Reinicio No 1:	25 de abril de 2024.
Fecha de vencimiento actual:	Hasta el 30 de julio de 2024.
Plazo de ejecución final:	Nueve meses y 3 semanas (9.75 meses)

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y al 30 de julio de 2024, el Contratista realizó las siguientes actividades:

- Realizó ensayo en laboratorio de viguetas y cilindros para verificación de resistencia de diseño de pavimento.
- Realizó fundida de concreto para pavimento entre abscisas K3+670 al K3+500 carril derecho.
- Se instalaron bordillos prefabricados en tramo comprendido entre k3+870 hasta k3+500 carril izquierdo y derecho

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A fecha de corte del presente informe mensual, el Contratista de Obra cuenta con la aprobación de los siguientes APU No previstos:

- Ítem 201.22 Demolición de estructuras tipo cuneta. Unidad: ml.
- Ítem 672.8 Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; incluye la preparación de la superficie de apoyo.
- Ítem 201.4.7 Remoción de ductos de servicio existente – Traslado y reinstalación de tubería de acueducto.
- NP Mortero 1:3

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

A corte de 30 de julio de 2024 el estado de avance de la obra es el siguiente:

- Porcentaje programado acumulado según programa de inversión aprobado: 100%
- Porcentaje ejecutado acumulado: 100%.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Durante el periodo transcurrido se presentan un total de cinco (5) informes semanales en donde se describen las actividades realizadas por el contratista durante el presente periodo mensual. Estos informes se anexan a este informe a través de formato MEPI-MN1-IN-15-FR- 3 INFORME SEMANAL.

Adicionalmente, estos informes se encuentran en la plataforma CIFRA del Instituto Nacional de Vías para las respectivas revisiones por parte del supervisor del contrato de interventoría y el gestor técnico del proyecto.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES.

	IN I U ON" ION" D " RO O MI ION" J U I ND ROJ O D IN R" RU UR" D R" N OR M" NU" D IN R N OR." O R" I " IN ORM M" N"	C DIGO	M PI M I R
		RSI	
		P Gi "	

C " 0 0 Da Mes " o

I IN ORM" I N N R"

PROJ C O CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G C RDO "

ID" D J C OR" S DIR CCIO D I" S R GIO " S DIR CCI RRI ORI" C RDO " S M" " o de 0 0 a 0 0 imo In orme Semana SI ☐ umeraci n consecu i a

S P R ISOR CO R" O I R OR " S OR M S I " DI GO G S OR C ICO D PROJ C O " " RO D J S S G" IS

O J O CO R" O D O R" M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CIO D CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G C RDO "

" C" C SICO CO R" C " Indicar a me a sica a ejecu ar de acuerdo con e a cance de con ra o

In er enci n de 0 me ros inea es de corredor ia " par ada e O i o San rancisco a Padi a u icado en a ona rura de Municipio de Sa ag n en e depar amen o de C rdo a median e a cons rucci n de pa imen o r gido dispues o en dos ramos de a

D SCRIPCI R C" R" C R S IC" S C IC" S D PROJ C O

Seg n os s udios Inicia es a es ruc ura de pa imen o r gido corresponde a 0 cm de espesor en osa de concre o apo ada so re una capa de su ase granu ar de 0 cm de espesor r ue a su e se apo a en una capa de mejoramien o con ma eria se eccionado de 0 cm de espesor

ON R" OD O R"

CO R" IS " Consorcio Corredores Rura es
I GR" S o ga Cons ruc iones S" S 0 e isario " redo de e n O ero 0
CO R" O o de 0
C " D I ICIO 0 0
C " D CIMI O I ICI" 0
C " D CIMI O IG 0 0
" OR I ICI" 0 0 0 00
" OR " DICIO S
" OR " C M " DO 0 0 0 00
" OR " ICIPO 0 0 0
" OR " MOR la" DO
" OR POR " MOR la" R

ON R" OD IN R N OR "

I R OR Consorcio aciona
I GR" S sa orres " rena es 0 R erra S" S 0
CO R" O o de 0
C " D I ICIO 0 0
C " D CIMI O I ICI" 0 0
C " D CIMI O IG 0 0
" OR I ICI" 0 00
" OR " DICIO S 0 0 000 00
" OR " C M " DO 0 00
" OR " ICIPO
" OR " MOR la" DO
S" DO POR " MOR la" R

II IN ORM" I N R U U " J " "N IN" N I RO

DI RI U I ND R UR O R U U " ON R" OD O R" OR I N I"

ON R" O	I N I"				
o R"	R UR O OR I N I"	0 0 000			
	J U "DO D " I N I"				
	" DO D I N I"				
IN R N OR"	R UR O OR I N I"				
	J U "DO D " I N I"				
	" DO D I N I"				

jecu ado de a igencia corresponde a a or o a ejecu ado acumu ado
Indicar a ores en pesos

O R"

" OR SICO CO R" O D O R" " 0 00
I RSI O R" PROGR" M" D" " C M " D" 0 0 00 00
I RSI O R" J C " D" " C M " D" 0 0
" " C O " R" SO D O R"
O R" S I RSIO S J C " D" S 0 0
s udios Dise os ges i n predia socia am ien a o ras

O " I RSI PROGR" M" D" 0 0 0 00 00 00
O " I RSI J C " D" 0 0
" " C O " R" SO " I RSI
I RSI PROGR" M" D" " S M" " 0 0 0 0
I RSI J C " D" " S M" " 00 00

	I	NO
R" DICO " C R" D P RIODO " RIOR		

o R" DIC" DO J C " D " "C R" C " S POR P" G" R
P RIODO " C R" DO
" OR " C R"

n e e en o de no a erse ac urado en e mes an erior in ormar e es ado de r mi e
O ser aciones Seg n In orme Semana de In er en oria se regis ra o siguien e " ance programado 00 " ance ejecu ado Se e idencia un a raso de

IN R N OR "

O " I RSI 0 00 0
PROGR" M" D"
O " I RSI 0
J C " D"

I RSI PROGR" M" D" 00 0
" S M" "
I RSI J C " D" 00 0
" S M" "

	I	NO
R" DICO " C R" D P RIODO " RIOR		

o R" DIC" DO J C " D " "C R" C " S POR P" G" R
P RIODO " C R" DO
" OR " C R"

n e e en o de no a erse ac urado en e mes an erior in ormar e es ado de r mi e
O ser aciones

" N I I O	
O Dr dD	SI " ICIPO
" Dr dD	"
dD	"

INDI " DOR I	
	0
" u u dD	

" N I I O	
O Dr dD	
" Dr dD	
dD	

III " "N I O

Me a sica Programada 00 " ance o " raso sico
Me a sica jecu ada

M" UIN" RI" J UI O

M rD r d O r					M rD r d j u d " u u d					
D r d M D r u	U d d	d d			" D	r D D Dr	r D D Dr	r D D Dr	D	
ca aciones	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
" irmado	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
Su ase granu ar	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
Pa imen o	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	

D r	ru DM D	D D D
o r ue a M		
i rocompac ador		
Mo oni e adora		
Carro anr ue de agua		
i rador de concre o		
Reg a i ra oria de ni e aci n		
Cor adora		
Minicargador		
Re roe ca adora		
D		

In er en or iden i ica a me a sica apro ada en e programa de o ra por igencia inc uido os es udios dise os dem s pro isiones con emp adas con rac ua men e e a ance sico semana acumu ado Se de e inc uir a in ormaci n por ramo o sec or

r uipo m nimo corresponde a e igido en e p iego de condiciones

R" MO J O S C OR " P" DI " S" R" CISCO S" " C CI I" R" MO J O S C OR S" " C CI I" O I O " " P" R " D"
R" MO J O S C OR n

I I N "M I N "

U N D M" RI"

IC" CI C" R" " S " S" S
CI " G" D ORO
IC" CI

DISPO I

P RMISO MI RO SI O
IC CI" " M I " SI O
P RMISO MI RO SI O
IC CI" " M I " SI O

RMI O " M I N " J O I N I" MI N O" M I N "

aO " S D D POSI O SI O "
IC CI" " M I " SI O "
" PRO C " MI O OR S " SI O "
CO C SI D " G " S SI O "
OC P" CI D C" C S SI O "
R IMI OS SI O "
MISIO S SI O "
O ROS speci icar cua SI O "

O R " ION Sin o ser aciones

O R " ION Con ra o de o ra de 0 para su ejecuci n no rer uiere icencia am ien a permiso de apro ec amien o ores a permiso de apro ec amien o ores a permiso de concesi n de aguas o permiso de ocupaci n de cauces

" " RO R" M" D " D" " I N" " U" " M I N "

S " DO " PRO " DO

O R " ION con ra is a cuen a ac ua men e con P" G" apro ado

I N O I"

	O R"	I R
O " MP OS G R" DOS		
MP OS DIR C OS G R" DOS		
MP OS I DIR C OS G R" DOS		
MP OS " aO " D I CI"		

o D SOCI" la" CIO S R " la" D" S O
o D C" P" CI " CIO S R " la" D" S
DIR CCI S D S R ICIO D " CI " S " RIO " C" DI"

O R " ION
En el área SST se verificó permanencia de señalización de acuerdo al plan de manejo vial, y la entrega de documentación de afiliaciones a seguridad social, entrega y reposición y uso de EPP en los frentes de obra. El contratista continua sin radicar informe SST del mes de junio 2024 ncluyendo planilla de seguridad social del mes de junio-julio 2024.

En el área social, se envian oficio al contratista donde Solicita entrega de informe mensual del mes de junio de 2024.

O " MP OS D PROJ C O

I I N R DI"

O " S IM" DO PR DIOS " " D IRIR 0 PR DIOS
IC " S PR DI" S " PRO " D" S 0 IC " S
" " OS " PRO " DOS 0 " " OS " PRO " DOS
PR DIOS " D IRIDOS 0 PR DIOS " D IRIDOS

O R " ION P" R" " J C CI D PROJ C O O S R I R " D ISICI D PR DIOS

II I ND O NI I ID" D

O " P IC"

III " I ID" D R " I " D" N " M" N" J " UMU " D"


n a presen e semana e Con ra is a rea i undida de concre o para pa imen o en re a scisas 00 carri i r uierdo re i a ins a acion de ordi os pre a ricados en ramo

I " I ID" D " R " I " R N " I UI N M" N"


n a siguien e semana e Con ra is a de e con inuar con a ac i idad de undida de concre o para pa imen o

U M" R I O " " N M " I " RO R" M" D" M " I " J U " D"

RO R" M" DO



J U " DO



e ca aciones su ase

a irmado pa imen o

esr uema gr ico ser de inido por e In er en or de acuerdo con a me a sica programada s me a sica ejecu ada de con ra o de o ra seg n as indicaciones dadas en e ins ruc i o M PI M I de Manua de In er en or a

I R I RO O O R I O



D D ND I D d Drd D



D D ND Drd D dD D rr



D D ND u d d r d D

NO " as can idades a ores consignados en e presen e repor e son responsa iidad e c usi a de in er en or

Il D RI IR " " ION " UIR OR " R D " IN R N OR " U ON RI UJ" N " UM IMI N O D " O I " ION ON R" U" OR " R D ON R" I " D O R"	**DIR OR D IN R N OR "**
S G IMI O J CO RO D PROGR" M" CI D O R" MI IR D" DO C" SO COM IC" DOS CO " R " S " R SP C O RI IC" CIO J R I R" CIO D " P R R" D R S D O R" RI IC" CIO D " I I" CIO S " S G RID" D SOCI" D P RSO " D O R" J P" GO D " S R SP C I " S P " I " S R " la" CIO D COMI S C ICOS D O R" J COMI S D D RI" P" R" S G IMI O J " " CIO D PROJ C O	IRM" OM R M" RI" S " J IO GO a" a Ma r cu a Pro esiona o 0 0 COR

Origina In orme mensua de In er en or a " rc i o de Ges i n de l I" S
Copias nidad jecu ora Su direcci n de Sos eni i idad Con ra is a In er en or Direcci n erri oria

	IN I U ON" ION" D " RO O MI ION" J U I ND ROJ O D IN R" RU UR" D R" N OR M" NU" D IN R N OR." O R" I " IN ORM M" N"	C DIGO	M Pl M I R
		RSI	
		P Gi "	

C " 0 0 Da Mes " o

I IN ORM" I N N R"

PROJ C O CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G C RDO "

ID" D J C OR" S DIR CCIO D I" S R GIO " S DIR CCI RRI ORI" C RDO " S M" " o 0 de 0 0 a 0 0 imo In orme Semana SI ☐ umeraci n consecu i a

S P R ISOR CO R" O I R OR " S OR M S I " DI GO G S OR C ICO D PROJ C O " " RO D J S S G" IS

O J O CO R" O D O R" M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CIO D CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G C RDO "

" C" C SICO CO R" C " Indicar a me a sica a ejecu ar de acuerdo con e a cance de con ra o

In er enci n de 0 me ros inea es de corredor ia " par ada e O i o San rancisco a Padi a u icado en a ona rura de Municipio de Sa ag n en e depar amen o de C rdo a median e a cons rucci n de pa imen o r gido dispues o en dos ramos de a

D SCRIPCI R C" R" C R S IC" S C IC" S D PROJ C O

Seg n os s udios Inicia es a es ruc ura de pa imen o r gido corresponde a 0 cm de espesor en osa de concre o apo ada so re una capa de su ase granu ar de 0 cm de espesor r ue a su e se apo a en una capa de mejoramien o con ma eria se eccionado de 0 cm de espesor

ON R" O D O R"

CO R" IS " Consorcio Corredores Rura es
I GR" S o ga Cons ruc iones S" S 0 e isario " redo de e n O ero 0
CO R" O o de 0
C " D I ICIO 0 0
C " D CIMI O I ICI" 0
C " D CIMI O IG 0 0
" OR I ICI" 0 0 0 00
" OR " DICIO S
" OR " C M " DO 0 0 0 00
" OR " ICIPO 0 0 0
" OR " MOR la" DO
" OR POR " MOR la" R

ON R" O D IN R N OR "

I R OR Consorcio aciona
I GR" S sa orres " rena es 0 R erra S" S 0
CO R" O o de 0
C " D I ICIO 0 0
C " D CIMI O I ICI" 0 0
C " D CIMI O IG 0 0
" OR I ICI" 0 00
" OR " DICIO S 0 0 000 00
" OR " C M " DO 0 00
" OR " ICIPO
" OR " MOR la" DO
S" DO POR " MOR la" R

II IN ORM" I N R U U " J " "N IN" N I RO

DI RI U I ND R UR O R U U " ON R" O D O R" OR I N I"

ON R" O	I N I"				
o R"	R UR O OR I N I"	0 0 000			
	J U "DO D " I N I"				
	" DO D I N I"	0			
IN R N OR "	R UR O OR I N I"				
	J U "DO D " I N I"				
	" DO D I N I"				

jecu ado de a igencia corresponde a a or o a ejecu ado acumu ado
Indicar a ores en pesos

O R"

" OR SICO CO R" O D O R" " 0 00
I RSI O R" PROGR" M" D" " C M " D" 0 0 00 00
I RSI O R" J C " D" " C M " D" 0
" " C O " R" SO D O R"
O R" S I RSIO S J C " D" S 0 0
s udios Dise os ges i n predia socia am ien a o ras

O " I RSI PROGR" M" D" 0 0 0 00 00 00
O " I RSI J C " D" 0 0
" " C O " R" SO " I RSI
I RSI PROGR" M" D" " S M" " 0 0 0 0
I RSI J C " D" " S M" " 00

I	NO

R" DICO " C R" D P RIODO " RIOR
o R" DIC" DO J C " D " "C R" C " S POR P" G" R
P RIODO " C R" DO
" OR " C R"

n e e en o de no a erse ac urado en e mes an erior in ormar e es ado de r mi e
O ser aciones Seg n In orme Semana de In er en oria se regis ra o siguien e " ance programado 00 " ance ejecu ado 0 Se e idencia un a raso de

IN R N OR "

O " I RSI 0 0
PROGR" M" D"
O " I RSI 0 0
J C " D"

I RSI PROGR" M" D" 00 0
" S M" "
I RSI J C " D" 00 0
" S M" "

I	NO

R" DICO " C R" D P RIODO " RIOR
o R" DIC" DO J C " D " "C R" C " S POR P" G" R
P RIODO " C R" DO
" OR " C R"

n e e en o de no a erse ac urado en e mes an erior in ormar e es ado de r mi e
O ser aciones

" N I I O	
O Dr dD	SI " ICIPO
" Dr dD	"
dD	"

INDI " DOR I	
	0
" u u dD	

" N I I O	
O Dr dD	
" Dr dD	
dD	

III " "N I O

Me a sica Programada 00 " ance o " raso sico
Me a sica jecu ada 0

M" UIN" RI" J UI O

M rD r d O r					M rD r d j u d " u u d					
D r d M D r u	U d d	d d			" D	r D D Dr	r D D Dr	r D D Dr	D	
ca aciones	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
" irmado	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
Su ase granu ar	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
Pa imen o	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	

D r	ru DM D	D D D
o r ue a M		
i rocompac ador		
Mo oni e adora		
Carro anr ue de agua		
i rador de concre o		
Reg a i ra oria de ni e aci n		
Cor adora		
Minicargador		
Re roe ca adora		
D		

In er en or iden i ica a me a sica apro ada en e programa de o ra por igencia inc uido os es udios dise os dem s pro isiones con emp adas con rac ua men e e a ance sico semana acumu ado Se de e inc uir a in ormaci n por ramo o sec or

r uipo m nimo corresponde a e igido en e p iego de condiciones

R" MO J O S C OR " P" DI " S" R" CISCO S" " C CI I" R" MO J O S C OR S" " C CI I" O I O " " P" R " D"
R" MO J O S C OR n

I I N "M I N "

U N D M" RI"

IC" CI C" R" " S " S" S
CI " G" D ORO
IC" CI

DISPO I
P RMISO MI RO SI O
IC CI" " M I " SI O
P RMISO MI RO SI O
IC CI" " M I " SI O

O R " ION Sin o ser aciones

RMI O " M I N " J O I N I" MI N O "M I N "

aO " S D D POSI O SI O "
IC CI" " M I " SI O "
" PRO C " MI O OR S " SI O "
CO C SI D " G " S SI O "
OC P" CI D C" C S SI O "
R IMI OS SI O "
MISIO S SI O "
O ROS speci icar cua SI O "

O R " ION Con ra o de o ra de 0 para su ejecuci n no rer uiere icencia am ien a permiso de apro ec amien o ores a permiso de apro ec amien o ores a permiso

" " RO R" M" D " D" " I N" " U" "M I N "

S " DO " PRO " DO

O R " ION con ra is a cuen a ac ua men e con P" G" apro ado

I N O I"

	O R"	I R
O " MP OS G R" DOS		
MP OS DIR C OS G R" DOS		
MP OS I DIR C OS G R" DOS		
MP OS " aO " D I CI"		

o D SOCI" la" CIO S R " la" D" S O
o D C" P" CI " CIO S R " la" D" S
DIR CCI S D S R ICIO D " CI " S " RIO " C" DI"

O R " ION
En el área SST se verificó permanencia de señalización de acuerdo al plan de manejo vial, y la entrega de documentación de afiliaciones a seguridad social, entrega y reposición y uso de EPP en los frentes de obra. El contratista continua sin radicar informe SST del mes de junio 2024 incluyendo planilla de seguridad social del mes de junio-julio 2024.

En el área social, el contratista envió informe mensual del mes de junio de 2024.

O " MP OS D PROJ C O

I I N R DI"

O " S IM" DO PR DIOS " " D IRIR 0 PR DIOS
IC " S PR DI" S " PRO " D" S 0 IC " S
" " OS " PRO " DOS 0 " " OS " PRO " DOS
PR DIOS " D IRIDOS 0 PR DIOS " D IRIDOS

O R " ION P" R" " J C CI D PROJ C O O S R I R " D ISICI D PR DIOS

II I ND O NI I ID" D

O " P IC"

III " I ID" D R " I " D" N " M" N" J " UMU " D"


n a presen e semana e Con ra is a rea i undida de concre o para pa imen o en re a scisas 00 carri i r uierdo 0 00 carri derec o re i a ins a acion de ordi os pre a ricados en ramo

I " I ID" D " R " I " R N " I UI N M" N"


n a siguien e semana e Con ra is a de e con inuar con a ac i idad de undida de concre o para pa imen o

U M" R I O " " N M " I " RO R" M" D" M " I " J U " D"

RO R" M" DO



J U " DO



e ca aciones su ase

a irmado pa imen o

esr uema gr ico ser de inido por e In er en or de acuerdo con a me a sica programada s me a sica ejecu ada de con ra o de o ra seg n as indicaciones dadas en e ins ruc i o M PI M I de Manua de In er en or a

I R I RO O O R I O



D D ND R D d d d d D



D D ND r d d rr D Dr D D r



D D ND D d ju r Drd D r r dD

NO " as can idades a ores consignados en e presen e repor e son responsa iidad e c usi a de in er en or

Il D RI IR " " ION " UIR OR " R D " IN R N OR " U ON RI UJ" N " UM IMI N O D " O I " ION ON R" U" OR " R D ON R" I " D O R"	**DIR OR D IN R N OR "**
S G IMI O J CO RO D PROGR" M" CI D O R" MI IR D" DO C" SO COM IC" DOS CO " R " S " R SP C O RI IC" CIO J R I R" CIO D " P R R" D R S D O R" RI IC" CIO D " I I" CIO S " S G RID" D SOCI" D P RSO " D O R" J P" GO D " S R SP C I " S P " I " S R " la" CIO D COMI S C ICOS D O R" J COMI S D D RI" P" R" S G IMI O J " " CIO D PROJ C O	IRM" OM R M" RI" S " J IO GO a" a Ma r cu a Pro esiona o 0 0 COR

Origina In orme mensua de In er en or a " rc i o de Ges i n de l I" S

Copias nidad jecu ora Su direcci n de Sos eni i idad Con ra is a In er en or Direcci n erri oria

IN I U ON" ION" D "
RO OMI ION" J U I ND ROJ O D IN R" RU UR" D R"N OR
M" NU" D IN R N OR" O R" I "
IN ORM M" N"

C DIGO	M PlM I R
RSI	
P GI "	

C " 0 0
Da Mes " o

I IN ORM" I N N R"

PROJ C O CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G C RDO "

ID" D J C OR" S DIR CCIO D l" S R GIO " S DIR CCI RRI ORI" C RDO "

S M" " o de 0 0 a 0 0 imo In orme Semana SI ☐
umeraci n consecu i a

S P R ISOR CO R" O I R OR " S OR M S I " DI GO G S OR C ICO D PROJ C O " "RO D J S S G" IS

O J O CO R" O D O R" M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CIO D CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G C RDO "

" C" C SICO CO R" C " Indicar a me a sica a ejecu ar de acuerdo con e a cance de con ra o

In er enci n de 0 me ros inea es de corredor ia " par ada e Oi o San rancisco a Padi a u icado en a ona rura de Municipio de Sa ag n en e depar amen o de C rdo a median e a cons rucci n de pa imen o r gido dispues o en dos ramos de a

D SCRIPCI R C" R" C R S IC" S C IC" S D PROJ C O

Seg n os s udios Inicia es a es ruc ura de pa imen o r gido corresponde a 0 cm de espesor en osa de concre o apo ada so re una capa de su ase granu ar de 0 cm de espesor r ue a su e se apo a en una capa de mejoramien o con ma eria se eccionado de 0 cm de espesor

ON R" OD O R"

CO R" IS " Consorcio Corredores Rura es
I GR" S oga Cons ucciones S" S 0 e isario " redo de e n O ero 0
CO R" O o de 0 " OR I ICI" 0 0 0 00
C " D I ICIO 0 0 " OR " DICIO S
C " D CIMI O I ICI" 0 " OR " C M " DO 0 0 0 00
C " D CIMI O IG 0 0 " OR " ICIPO 0 0 0
" OR " MOR la" DO
" OR POR " MOR la" R

ON R" OD IN R N OR"

I R OR Consorcio aciona
I GR" S sa orres " rena es 0 R erra S" S 0
CO R" O o de 0 " OR I ICI" 0 00
C " D I ICIO 0 0 " OR " DICIO S 0 0 000 00
C " D CIMI O I ICI" 0 0 " OR " C M " DO 0 00
C " D CIMI O IG 0 0 " OR " ICIPO
" OR " MOR la" DO
S" DO POR " MOR la" R

II IN ORM" I N R U U " J " "N IN" N I RO

DI RI U I ND R UR O R U U " ON R" OD O R" OR I N I"

ON R" O					
O R"	R UR O OR I N I"	0 0 000			
	J U "DOD " I N I"	0 0			
	" DO D I N I"	0 0			
IN R N OR"	R UR O OR I N I"				
	J U "DO D " I N I"				
	" DO D I N I"				

jecu ado de a igencia corresponde a a or o a ejecu ado acumu ado
Indicar a ores en pesos

O R"

" OR SICO CO R" O D O R" " 0 00
I RSI O R" PROGR" M" D" " C M " D" 0 0 00 00
I RSI O R" J C " D" " C M " D" 0
" " C O " R" SO D O R"
O R" S I RSIO S J C " D" S 0 0
s udios Dise os ges i n predia socia am ien a o ras

O " I RSI PROGR" M" D" 0 0 0 00 00 00
O " I RSI J C " D" 0 0 0
" " C O " R" SO " I RSI

I RSI PROGR" M" D" " S M" "
I RSI J C " D" " S M" " 00 0

I NO
R" DICO " C R" D P RIODO " RIOR
o R" DIC" DO J C " D " " C R" C " S POR P" G" R
P RIODO " C R" DO
" OR " C R"

n e e en o de no a erse ac urado en e mes an erior in ormar e es ado de r mi e
O ser aciones Seg n In orme Semana de In er en oria se regis ra o siguien e " ance programado 00 " ance ejecu ado Se e idencia un a raso de 0

IN R N OR"

O " I RSI 0 0
PROGR" M" D"
O " I RSI 0 0
J C " D"

I RSI PROGR" M" D" 00 0
" S M" "
I RSI J C " D" 00 0
" S M" "

I NO
R" DICO " C R" D P RIODO " RIOR
o R" DIC" DO J C " D " " C R" C " S POR P" G" R
P RIODO " C R" DO
" OR " C R"

n e e en o de no a erse ac urado en e mes an erior in ormar e es ado de r mi e
O ser aciones

" N I I O	
O Dr dD	SI " ICIPO
" Dr dD	"
dD	"

	INDI " DOR I
	0
" u u dD	

" N I I O	
O Dr dD	
" Dr dD	
dD	

III " "N I O

Me a sica Programada 00 " ance o " raso sico 0
Me a sica jecu ada

M" UIN" RI" J UI O

M rDr d Or					M rDr d j u d " u u d					
D r d M D r u	U d d	d d			" D	r D D Dr	r D D Dr	r D D Dr	D	
ca aciones	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
" irmado	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
Su ase granu ar	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
Pa imen o	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0

D r	r u DM D	D D D
o r ue a M		
i rocompac ador		
Mo oni e adora		
Carro anr ue de agua		
i rador de concre o		
Rega i ra oria de ni e aci n		
Cor adora		
Minicargador		
Re roe ca adora		
D		

In er en or iden i ica a me a sica apro ada en e programa de o ra por igencia inc uido os es udios dise os dem s pro isiones con emp adas con rac ua men e e a ance sico semana acumu ado Se de e inc uir a in ormaci n por ramo o sec or

r uipo m nimo corresponde a e igido en e p iego de condiciones

R" MO J O S C OR " P" DI " S" R" CISCO S" " C CI I" R" MO J O S C OR S" " C CI I" O I O " "P" R " D"
R" MO J O S C OR n

I I N"M I N "

U N D M" RI"

IC" CI C" R" " S " S" S
CI " G" D ORO
IC" CI

DISPO I
P RMISO MI RO SI O
IC CI" " M I " SI O
P RMISO MI RO SI O
IC CI" " M I " SI O

O R " ION Sin o ser aciones

RMI O " M I N " J O I N I" MI N O" M I N "

aO " S D D POSI O SI O "
IC CI" " M I " SI O "
" PRO C " MI O OR S " SI O "
CO C SI D " G " S SI O "
OC P" CI D C" C S SI O "
R IMI OS SI O "
MISIO S SI O "
O ROS speci ica cua SI O "

O R " ION Con ra o de o ra de 0 para su ejecuci n no rer uiere icencia am ien a permiso de apro ec amien o ores a permiso de apro ec amien o ores a permiso de concesi n de aguas o permiso de ocupaci n de cauces

" " RO R" M" D "D" " I N" " U" "M I N "

S " DO " PRO " DO

O R " ION con ra is a cuen a ac ua men e con P" G" apro ado

I N O I"

	O R"	I R
O " MP OS G R" DOS		

o D SOCI" la" CIO S R " la" D" S O

MP OS DIR C OS G R" DOS		
MP OS I DIR C OS G R" DOS		
MP OS " aO " D I CI"		

o D C" P" CI " CIO S R " la" D" S
DIR CCI S D S R ICIO D " CI " S " RIO ..... " C" DI" .....

O R " ION
En el área SST se verificó permanencia de señalización de acuerdo al plan de manejo vial, y la entrega de documentación de afiliaciones a seguridad social, entrega y reposición y uso de EPP en los frentes de obra. El contratista radico informe SST del mes de junio 2024 incluyendo planilla de seguridad social del mes de junio-julio 2024. se envio oficio No conformidades area SST, area ambiental, Plan de manejo vial.

En el área social, el contratista envió informe mensual del mes de junio de 2024.se recomienda continuar con las actividades de gestion social paga.

O " MP OS D PROJ C O .....

I I N R DI"

O " S IM" DO PR DIOS " " D IRIR
IC " S PR DI" S " PRO " D" S
" " OS " PRO " DOS
PR DIOS " D IRIDOS

0 PR DIOS .....
0 IC " S .....
0 " " OS " PRO " DOS .....
0 PR DIOS " D IRIDOS .....

O R " ION P" R" " J C CI D PROJ C O O S R I R " D ISICI D PR DIOS

II I N D O NI I ID" D

O " P IC"

III " I ID" D R " I " D" N " M" N" J " UMU " D"


n a presen e semana e Con ra is a rea i undida de concre o para pa imen o en re a scisas 00 0 carri derec o cu minando es a ac i iadad se con inua rea i ando ins a acion de ordi os pre a ricados en ramo se o de jun as de pa imen o

I " I ID" D " R " I " R N " I UI N M" N"


n a siguien e semana e Con ra is a de e con inuar con a ac i idad de ins a acion de ordi os se o de jun as de pa imen o

U M" R I O" " N M " I " RO R" M" D" M " i " J U " D"

RO R" M" DO



J U " DO



e ca aciones su ase

a irmado pa imen o

esr uema gr ico ser de inido por e In er en or de acuerdo con a me a sica programada s me a sica ejecu ada de con ra o de o ra seg n as indicaciones dadas en e ins ruc i o M PI M l de Manua de In er en or a

I R I RO O O R I O



D D ND u d d d D



D D ND I D d Drd D



D D ND D d ju Drd D r r dD D d Drd D

NO " as can idades a ores consignados en e presen e repor e son responsa i idad e c usi a de in er en or

Il D RI IR " " ION " UIR OR " R D " IN R N OR " U ON RI UJ " N " UM IMI N O D " O I " ION ON R" U" OR " R D ON R" I " D O R"	**DIR OR D IN R N OR "**
S G IMI O J CO RO D PROGR" M" CI D O R" MI IR D" DO C" SO COM IC" DOS CO " R " S " R SP C O RI IC" CIO D R S D O R" RI IC" CIO D P" GO D " S R SP C I " S P " I " S R " la" CIO D COMI S C ICOS D O R" J COMI S D D RI" P" R" S G IMI O J " " CIO D PROJ C O	IRM" OM R M" RI" S " J IO GO a" a Ma r cu a Pro esiona o 0 0 COR

Origina In orme mensua de In er en or a " rc i o de Ges i n de l i" S
Copias nidad jecu ora Su direcci n de Sos eni i idad Con ra is a In er en or Direcci n erri oria

IN I U ON" ION" D "
RO OMI ION" J U I ND ROJ O D IN R" RU UR" D R"N OR
M"NU" D IN R N OR" O R" I "
IN ORM M" N"

C DIGO	M PIM I R
RSI	
P GI "	

C " 0 0
Da Mes " o

I IN ORM" I N N R"

PROJ C O CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G C RDO "

ID" D J C OR" S DIR CCIO D I" S R GIO " S DIR CCI RRI ORI" C RDO "

S M" " o de 0 0 a 0 0 imo In orme Semana SI ☐
umeraci n consecu i a

S P R ISOR CO R" O I R OR " S OR M S I " DI GO G S OR C ICO D PROJ C O " "RO D J S S G" IS

O J O CO R" O D O R" M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CIO D CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G C RDO "

" C" C SICO CO R" C " Indicar a me a sica a ejecu ar de acuerdo con e a cance de con ra o

In er enci n de 0 me ros inea es de corredor ia " par ada e Oi o San rancisco a Padi a u icado en a ona rura de Municipio de Sa ag n en e depar amen o de C rdo a median e a cons rucci n de pa imen o r gido dispues o en dos ramos de a

D SCRIPCI R C" R" C R S IC" S C IC" S D PROJ C O

Seg n os s udios Inicia es a es ruc ura de pa imen o r gido corresponde a 0 cm de espesor en osa de concre o apo ada so re una capa de su ase granu ar de 0 cm de espesor r ue a su e se apo a en una capa de mejoramien o con ma eria se eccionado de 0 cm de espesor

ON R" O D O R"

CO R" IS " Consorcio Corredores Rura es
I GR" S oga Cons rucciones S" S 0 e isario " redo de e n O ero 0
CO R" O o de 0
C " D I ICIO 0 0
C " D CIMI O I ICI" 0
C " D CIMI O IG 0 0
" OR I ICI" 0 0 0 00
" OR " DICIO S
" OR " C M " DO 0 0 0 00
" OR " ICIPO 0 0 0
" OR " MOR la" DO
" OR POR " MOR la" R

ON R" O D IN R N OR"

I R OR Consorcio aciona
I GR" S sa orres " rena es 0 R erra S" S 0
CO R" O o de 0
C " D I ICIO 0 0
C " D CIMI O I ICI" 0 0
C " D CIMI O IG 0 0
" OR I ICI" 0 00
" OR " DICIO S 0 0 000 00
" OR " C M " DO 0 00
" OR " ICIPO
" OR " MOR la" DO
S" DO POR " MOR la" R

II IN ORM" I N R U U " J " "N IN" N I RO

DI RI U I ND R UR O R U U " ON R" O D O R" OR I N I"

ON R" O					
O R"	R UR O OR I N I"	0 0 000			
	J U "DO D " I N I"	0			
	" DO D I N I"	0			
IN R N OR"	R UR O OR I N I"				
	J U "DO D " I N I"				
	" DO D I N I"				

jecu ado de a igencia corresponde a a or o a ejecu ado acumu ado
Indicar a ores en pesos

O R"

" OR SICO CO R" O D O R" " 0 00
I RSI O R" PROGR" M" D" " C M " D" 0 0 00 00
I RSI O R" J C " D" " C M " D" 0 0
" " C O " R" SO D O R"
O R" S I RSIO S J C " D" S 0 0
s udios Dise os ges i n predia socia am ien a o ras

O " I RSI PROGR" M" D" 0 0 0 00 00 00
O " I RSI J C " D" 0 0
" " C O " R" SO " I RSI

I RSI PROGR" M" D" " S M" "
I RSI J C " D" " S M" " 00 0 0

I NO
R" DICO " C R" D P RIODO " RIOR

o R" DIC" DO J C " D " " C R" C " S POR P" G" R
P RIODO " C R" DO
" OR " C R"

n e e en o de no a erse ac urado en e mes an erior in ormar e es ado de r mi e
O ser aciones Seg n In orme Semana de In er en oria se regis ra o siguien e " ance programado 00 " ance ejecu ado Se e idencia un a raso de 0

IN R N OR"

O " I RSI 0
PROGR" M" D"
O " I RSI 0 0
J C " D"

I RSI PROGR" M" D" 00 0
" S M" "
I RSI J C " D" 00 0
" S M" "

I NO
R" DICO " C R" D P RIODO " RIOR

o R" DIC" DO J C " D " " C R" C " S POR P" G" R
P RIODO " C R" DO
" OR " C R"

n e e en o de no a erse ac urado en e mes an erior in ormar e es ado de r mi e
O ser aciones

"N I I O	
O Dr dD	SI " ICIPO
" Dr dD	"
dD	"

INDI "DOR I	
" u u dD	

"N I I O	
O Dr dD	
" Dr dD	
dD	

III " "N I O

Me a sica Programada 00 " ance o " raso sico 0
Me a sica jecu ada

M" UIN" RI" J UI O

M rDr d Or					M rDr d j u d " u u d					
D r d M D r u	U d d	d d			" D	r D D Dr	r D D Dr	r D D Dr	D	
ca aciones	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
" irmado	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
Su ase granu ar	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
Pa imen o	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0

D r	r u DM D	D D D
o r ue a M		
i rocompac ador		
Mo oni e adora		
Carro anr ue de agua		
i rador de concre o		
Rega i ra oria de ni e aci n		
Cor adora		
Minicargador		
Re roe ca adora		
D		

In er en or iden i ica a me a sica apro ada en e programa de o ra por igencia inc uido os es udios dise os dem s pro isiones con emp adas con rac ua men e e a ance sico semana acumu ado Se de e inc uir a in ormaci n por ramo o sec or

r uipo m nimo corresponde a e igido en e p iego de condiciones

R" MO J O S C OR " P" DI " S" R" CISCO S" " C CI I"
R" MO J O S C OR n

R" MO J O S C OR S" " C CI I" O I O " "P" R " D"

I I N"M I N "

U N D M" RI"

IC" CI C" R" " S " S" S
CI " G" D ORO

P RMISO MI RO SI O
IC CI" " M I " SI O

IC" CI

P RMISO MI RO SI O
IC CI" " M I " SI O

DISPO I

O R " ION Sin o ser aciones

RMI O " M I N " J O I N I" MI N O" M I N "

aO " S D D POSI O	SI		O		"
IC CI" " M I "	SI		O		"
" PRO C " MI O OR S "	SI		O		"
CO C SI D " G " S	SI		O		"
OC P" CI D C" C S	SI		O		"
R IMI OS	SI		O		"
MISIO S	SI		O		"
O ROS speci ica cua	SI		O		"

O R " ION Con ra o de o ra de 0 para su ejecuci n no re uiere icencia am ien a permiso de apro ec amien o ores a permiso de apro ec amien o ores a permiso de concesi n de aguas o permiso de ocupaci n de cauces

" " RO R" M" D "D" " I N" " U" "M I N "

S " DO " PRO " DO

O R " ION con ra is a cuen a ac ua men e con P" G" apro ado

I N O I"

	O R"	I R
O " MP OS G R" DOS		

o D SOCI" la" CIO S R " la" D" S O

MP OS DIR C OS G R" DOS		
MP OS I DIR C OS G R" DOS		
MP OS " aO " D I CI"		

o D C" P" CI " CIO S R " la" D" S
DIR CCI S D S R ICIO D " CI " S " RIO ..... " C" DI" .....

.....

O R " ION
En el área SST se verificó permanencia de señalización de acuerdo al plan de manejo vial, y la entrega de documentación de afiliaciones a seguridad social, entrega y reposición y uso de EPP en los frentes de obra.
Se envio comunicado ET-2274-1991, Solicitud documentos del area SST para cierre de proyecto.

En el área social, Se envia comunicado ET-2274-1995 Solicitud requerimientos para finalizacion del proceso de terminacion de contrato en la gestion social.

O " MP OS D PROJ C O .....

I I N R DI"

O " S IM" DO PR DIOS " " D IRIR
IC " S PR DI" S " PRO " D" S
" " OS " PRO " DOS
PR DIOS " D IRIDOS

0 PR DIOS .....
0 IC " S .....
0 " " OS " PRO " DOS .....
0 PR DIOS " D IRIDOS .....

O R " ION P" R" " J C CI D PROJ C O O S R I R " D ISICI D PR DIOS

II I N D O NI I ID" D

O " P IC"

III " I IID" D R " I "D" N " M" N" J " UMU "D"

n a presen e semana e Con ra is a se con inua rea i ando ins a acion de ordi os pre a ricados en ramo se o de jun as de pa imen o

I " I IID" D " R " I "R N " I UI N M" N"

n a siguien e semana e Con ra is a de e cu minar con a ac i idad de ins a acion de ordi os se o de jun as de pa imen o ins a acion de se a es er ica es de ransi o ineas de demarcacion " rreg o de p acas isuradas

U M" R I O" "N M " I " RO R" M" D" M " I " J U "D"

RO R" M" DO

J U "DO

K3+200 K3+230 K3+870 K4+950 K5+150

e ca aciones su ase

a irmado pa imen o

esr uema gr ico ser de inido por e In er en or de acuerdo con a me a sica programada s me a sica ejecu ada de con ra o de o ra seg n as indicaciones dadas en e ins ruc i o M PI M l de Manua de In er en or a

I R I RO O O R I O



D D ND R" MO RMIN" DO



D D ND I D d Drd D



D D ND D I

NO " as can idades a ores consignados en e presen e repor e son responsa i idad e c usi a de in er en or

Il D RI IR " " ION " UIR OR " R D " IN R N OR " U ON RI UJ " N " UM IMI N O D " O I " ION ON R" U" OR " R D ON R" I " D O R"	**DIR OR D IN R N OR "**
S G IMI O J CO RO D PROGR" M" CI D O R" MI IR D" DO C" SO COM IC" DOS CO " R " S " R SP C O RI IC" CIO D R S D O R" RI IC" CIO D P" GO D " S R SP C I " S P " I " S R " la" CIO D COMI S C ICOS D O R" J COMI S D D RI" P" R" S G IMI O J " " CIO D PROJ C O	IRM" OM R M" RI" S " J IO GO a" a Ma r cu a Pro esiona o 0 0 COR

Origina In orme mensua de In er en or a " rc i o de Ges i n de l I" S
Copias nidad jecu ora Su direcci n de Sos eni i idad Con ra is a In er en or Direcci n erri oria

RO O MI ION" J U I N D ROJ O D IN R" RU UR" D R" N OR M" NU" D IN R N OR " O R" I " IN ORM M" N"	C DIGO	M PI M I R	
	RSI		
	P GI "		

C " 0 0
Da Mes " o

I IN ORM" I N N R"

PROJ C O CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G C RDO "

ID" D J C OR" S DIR CCIO D I" S R GIO " S DIR CCI RRI ORI" C RDO " S M" " o de 0 0 a 0 0 imo In orme Semana SI ☐
umeraci n consecu i a

S P R ISOR CO R" O I R OR " S OR M S I " DI GO G S OR C ICO D PROJ C O " " RO D J S S G" IS

O J O CO R" O D O R" M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CIO D CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G C RDO "

" C" C SICO CO R" C " Indicar a me a sica a ejecu ar de acuerdo con e a cance de con ra o

In er enci n de 0 me ros inea es de corredor ia " par ada e O i o San rancisco a Padi a u icado en a ona rura de Municipio de Sa ag n en e depar amen o de C rdo a median e a cons rucci n de pa imen o r gido dispues o en dos ramos de a

D SCRIPCI R C" R" C R S IC" S C IC" S D PROJ C O

Seg n os s udios Inicia es a es ruc ura de pa imen o r gido corresponde a 0 cm de espesor en osa de concre o apo ada so re una capa de su ase granu ar de 0 cm de espesor r ue a su e se apo a en una capa de mejoramien o con ma eria se eccionado de 0 cm de espesor

ON R" O D O R"

CO R" IS "	Consorcio Corredores Rura es				
I GR" S	o ga Cons rucciones S" S 0 e isario " redo de e n O ero 0				
CO R" O o	de 0	" OR I ICI"	0 0 0 00		
C " D I ICIO	0 0	" OR " DICIO S			
C " D CIMI O I ICI"	0	" OR " C M " DO	0 0 0 00		
C " D CIMI O IG	0 0	" OR " ICIPO	0 0 0		
		" OR " MOR la" DO			
		" OR POR " MOR la" R			

ON R" O D IN R N OR "

I R OR	Consorcio aciona		
I GR" S	sa orres " rena es 0 R erra S" S 0		
CO R" O o	de 0	" OR I ICI"	0 00
C " D I ICIO	0 0	" OR " DICIO S	0 0 000 00
C " D CIMI O I ICI"	0 0	" OR " C M " DO	0 00
C " D CIMI O IG	0 0	" OR " ICIPO	
		" OR " MOR la" DO	
		S" DO POR " MOR la" R	

II IN ORM" I N R U U " J " " N IN" N I RO

DI RI U I N D R UR O R U U " ON R" O D O R" OR I N I"

ON R" O	I N I"				
O R"	R UR O OR I N I"	0 0 000			
	J U " DO D " I N I"	0 0 0			
	" DO D I N I"	0 0			
IN R N OR "	R UR O OR I N I"				
	J U " DO D " I N I"				
	" DO D I N I"				

jecu ado de a igencia corresponde a a or o a ejecu ado acumu ado
Indicar a ores en pesos

O R"

" OR SICO CO R" O D O R" "	0 00	
I RSI O R" PROGR" M" D" " C M " D"	0 0	00 00
I RSI O R" J C " D" " C M " D"	0 0	00 00
" " C O " R" SO D O R"		
O R" S I RSIO S J C " D" S	0	00 00
s udios Dise os ges i n predia socia am ien a o ras		
O " I RSI PROGR" M" D"	0 0 0 00	00 00
O " I RSI J C " D"	0 0 0 00	00 00
" " C O " R" SO " I RSI		
I RSI PROGR" M" D" " S M" "		
I RSI J C " D" " S M" "	0	0

R" DICO " C R" D P RIODO " RIOR	I	NO

o R" DIC" DO J C " D " " C R" C " S POR P" G" R
P RIODO " C R" DO
" OR " C R"

n e e en o de no a erse ac urado en e mes an erior in ormar e es ado de r mi e

O ser aciones Seg n In orme Semana de In er en oria se regis ra o siguien e " ance programado 00 " ance ejecu ado Se e idencia un a raso de 0

IN R N OR "

O " I RSI	0	0
PROGR" M" D"		
O " I RSI	0	
J C " D"		
I RSI PROGR" M" D"	00	0
" S M" "		
I RSI J C " D"	00	0
" S M" "		

R" DICO " C R" D P RIODO " RIOR	I	NO

o R" DIC" DO J C " D " " C R" C " S POR P" G" R
P RIODO " C R" DO
" OR " C R"

n e e en o de no a erse ac urado en e mes an erior in ormar e es ado de r mi e

O ser aciones

" N I I O	
O Dr dD	SI " ICIPO
" Dr dD	"
dD	"

	INDI " DOR I
	0
" u u dD	

" N I I O	
O Dr dD	
" Dr dD	
dD	

III " " N I O

Me a sica Programada 00 " ance o " raso sico
Me a sica jecu ada 00 00

M rD r d O r					M rD r d j u d " u u d					
D r d M D r u	U d d	d d			" D	r D D Dr	r D D Dr	r D D Dr	D	
ca aciones	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
" irmado	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
Su ase granu ar	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0
Pa imen o	m	0			Prog	00	0		0	00 0
					jec	00	0		0	00 0

In er en or iden i ica a me a sica apro ada en e programa de o ra por igencia inc uido os es udios dise os dem s pro isiones con emp adas con rac ua men e e a ance sico semana acumu ado Se de e inc uir a in ormaci n por ramo o sec or

M" UIN" RI" J UI O

D r	r u DM D	D D D
o r ue a M		
i rocompac ador		
Mo oni e adora		
Carro anr ue de agua		
i rador de concre o		
Reg a i ra oria de ni e aci n		
Cor adora		
Minicargador		
Re roe ca adora		
D		

r uipo m nimo corresponde a e igido en e p iego de condiciones

R" MO J O S C OR " P" DI " S" R" CISCO S" " C CI I"
R" MO J O S C OR n

R" MO J O S C OR S" " C CI I" O I O " " P" R " D"

I I N"M I N "

U N D M" RI"

IC" CI	C" R" " S " S" S	P RMISO MI RO SI O
	CI " G" D ORO	IC CI" " M I " SI O
IC" CI		P RMISO MI RO SI O
		IC CI" " M I " SI O

O R " ION Sin o ser aciones

RMI O "M I N " J O I N I"MI N O"M I N "

aO " S D D POSI O	SI	O	"	
IC CI" " M I "	SI	O	"	
" PRO C " MI O OR S "	SI	O	"	
CO C SI D " G " S	SI	O	"	
OC P" CI D C" C S	SI	O	"	
R IMI OS	SI	O	"	
MISIO S	SI	O	"	
O ROS speci icar cua	SI	O	"	

O R " ION Con ra o de o ra de 0 para su ejecuci n no rer uiere icencia am ien a permiso de apro ec amien o ores a permiso de apro ec amien o ores a permiso de concesi n de aguas o permiso de ocupaci n de cauces

" " RO R" M" D " D" " I N " " U" "M I N "

S " DO " PRO " DO

O R " ION con ra is a cuen a ac ua men e con P" G" apro ado

I N O I"

	O R"	I R
O " MP OS G R" DOS		
MP OS DIR C OS G R" DOS		
MP OS I DIR C OS G R" DOS		
MP OS " aO " D I CI"		

o D SOCI" la" CIO S R " la" D" S O
o D C" P" CI " CIO S R " la" D" S
DIR CCI S D S R ICIO D " CI " S " RIO " C" DI"

O R " ION
En el área SST se verificó permanencia de señalización de acuerdo al plan de manejo vial, y la entrega de documentación de afiliaciones a seguridad social, entrega y reposición y uso de EPP en los frentes de obra.El contratista debe radicar pago de seguridad social a corte 31 de julio y los examenes medicos de egreso laboral del personal de obra contratado en la ejecucion del proyecto.

En el área social, el contratista debe entregar informe social del mes de julio 2024.

O " MP OS D PROJ C O

I I N R DI"

O " S IM" DO PR DIOS " " D IRIR 0 PR DIOS
IC " S PR DI" S " PRO " D" S 0 IC " S
" " OS " PRO " DOS 0 " " OS " PRO " DOS
PR DIOS " D IRIDOS 0 PR DIOS " D IRIDOS

O R " ION P" R" " J C CI D PROJ C O O S R I R " D ISICI D PR DIOS

II I N D O NI I ID" D

O " P IC"

III " I ID" D R " I " D" N " M" N" J " UMU " D"


n a presen e semana e Con ra is a cu mina as ac i idades de ins a acion de ordi os pre a ricados en ramo se o de jun as de pa imen o se encuen ra erminando e re eno de espa dades de ordi os ins a ados rea i a impie a genera de o ra es a pendien e de a reposicion de p acas isuradas en ramo a ins a acion de se a es er ica es de ransi o as ineas de demarcacion en a ia

I " I ID" D " R " I " R N " I UI N M" N"


n a siguien e semana e Con ra is a de e cu minar con a ac i idad de ins a acion de ordi os se o de jun as de pa imen o ins a acion de se a es er ica es de ransi o ineas de demarcacion " rreg o de p acas isuradas

U M" R I O" " N M " I " RO R" M" D" M " I " J U " D"

RO R" M" DO



J U " DO



e ca aciones su ase

a irmado pa imen o

esr uema gr ico ser de inido por e In er en or de acuerdo con a me a sica programada s me a sica ejecu ada de con ra o de o ra seg n as indicaciones dadas en e ins ruc i o M Pl M I de Manua de In er en or a

I R I RO O O R I O



D D ND R Dd d r Drd D



D D ND R D d r d Drd D



D D ND r d

NO " as can idades a ores consignados en e presen e repor e son responsa i idad e c usi a de in er en or

Il D RI IR " " ION " UIR OR " R D " IN R N OR " U ON RI UJ " N " UM IMI N O D " O I " ION ON R" U" OR " R D ON R" I " D O R"	**DIR OR D IN R N OR "**
S G IMI O J CO RO D PROGR" M" CI D O R" MI IR D" DO C" SO COM IC" DOS CO " R " S " R SP C O RI IC" CIO D R S D O R" RI IC" CIO D P" GO D " S R SP C I " S P " I " S R " la" CIO D COMI S C ICOS D O R" J COMI S D D RI" P" R" S G IMI O J " " CIO D PROJ C O	IRM" OM R M" RI" S " J IO GO a" a Ma r cu a Pro esiona o 0 0 COR

Origina In orme mensua de In er en or a " rc i o de Ges i n de I I" S
Copias nidad jecu ora Su direcci n de Sos eni i idad Con ra is a In er en or Direcci n erri oria

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATO DE OBRA

En el mes de julio de 2024, la Interventoría realizó control de la cantidad y calidad de la maquinaria y equipo empleado por el Contratista en cada frente de obra, dicha información se detalla en el formato anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA

	IN I U ON" ION" D " RO O MI ION" J U I ND ROJ O D IN R" RU UR" D R" N OR M" NU" D IN R N OR " O R" I " M" UIN" RI" J UI O ON R" O D O R"	C DIGO	M PI M I R
		RSI	
		P GI "	

C " 0 0
Da Mes " o

UNID" D J U OR" S DIR CIO D I" S R GIO " S DIR I N RRI ORI" CORDO "

ON RO DI" RIO D M" UIIN" RI" J UI O ON R" O D O R"

RIODO M IN ORM M N U" Ju io de 0 ROJ O CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G C RDO "

ON R" O ND de 0 ON R" I " CO SORCIO CORR DOR S R R" S

ON R" O IN R N OR " ND de 0 IN R N OR " CO SORCIO " CIO "

M" UIN" RI" J UI O				D " D M																																			
D RI I N	M" R " MOD O	" " ID" D	O " I " I N																																					
C" RMI			O I O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ROMPO			O I O	I	I	I	"	"	"	I	I	"	"	I	"	"	I	"	I	"	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	"	"							
I ROCOMP" C " DOR			O I O	I	I	I	"	"	"	I	I	"	"	I	"	"	I	"	I	"	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	"	"							
COR " DOR"			O I O	I	I	I	"	"	"	I	I	"	"	I	"	"	I	I	I	"	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	"	"							
O "			O I O	I	I	I	I	I	"	I	I	"	"	"	I	I	I	"	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
O " M" UIN" RI" J UI O																																									
O " " I O				0	0	0	0		0	0							0			0			0			0		0													
O " N R "R" I N				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O " IN" I O										0	0													0																	

R UM N RIODO M	ND	
O " D M" UIN" RI" J UI O	0	00
O " D M" UIN" RI" J UI O " I O "		
O " D M" UIN" RI" J UI O N R "R" I N R	0	0
O " D M" UIN" RI" J UI O IN" I O I		

ON N ION " I O " N R "R" I N R IN" I O I

R OR D " M" UIN" RI" J UI O u dD u r "l "D" r r " d r r D d u dD

O R " ION D " IN R N OR "

" IN R N OR " R I I " U ON R" I " UM I ON " DI ONI I ID" D D M" UIN" RI" J UI O M NIMO I IDO "R" ROJ O

NO "

In er en or de e indicar de manera re e as ra ones por as cua es a mar uinaria er uipo re acionada se encuen ran R P" R" CI R I "C I O I

Se en iende por "" c i o" e es ado de a mar uinaria disponi e en uso por "Inac i o" e es ado de a mar uinaria r ue es ando disponi e no se encuen ra en uso "en reparaci n" e es ado de a mar uinaria no disponi e por es ar en man enimien o o en reparaci n

s responsa i idad de a In er en or a rea i ar e seguimien o con ro diario de a mar uinaria er uipo u i i ado por e Con ra is a de o ra para a ejecuci n de pro ec o

n e e en o en r ue e Con ra is a de o ra no cump a con a mar uinaria er uipo m nimo rer ueridos a In er en or a de e indicar en a casi a "O ser aciones de a In er en or a" as acciones r ue ade an a o ade an ar endien es a ograr e cump imien o de es a o igaci n

" s mismo en a casi a "O ser aciones de a in er en or a" e in er en or de e consignar as o ser aciones r ue considere per inen es re acionadas con a mar uinaria er uipos

Firma:
Nombre: Adriana Patricia de León
Cargo: Representante Legal Contratista
Matrícula Profesional No.:

irma
om re Diana ucia Corra es Mar e o
Residen e de In er en or a

Origina In orme mensua de In er en or a " rc i o de Ges i n de I I" S
Copias In er en or Direcci n erri oria

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

IN I U ON" ION" D "
RO OMI ION" J U I ND ROJ O D IN R" RU UR" D R"N OR
M"NU" D IN R N OR"O R" U I "
R ON" ON RO " OR " J URID"D O I" ON R" OD O R"

C DIGO	M PI M I R
RSI	
P GI "	

C " 0 0
Da Mes " o

UNID"D J U OR" S DIR CCIO D I"S R GIO " S

DIR I N RRI ORI" CORDO "

ON R" OD O R" ND 178 – 2023

M J " OD IN ORM M N U" J IO D 0

ON R" OD IN R N OR " ND D 8

NOM R "R

ON R" I " CO SORCIO CORR DOR S R R" S

ROJ O CONTRATO DE OBRA No. 178 DE 2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, CORDOBA

IN R N OR CO SORCIO " CIO "

NOM R "J" D OM N " I N COM " COR

Ri I " I N R ON" DO UM N " I N" OR " J URID"D O I"

ND	ND r " dD		r D	rD	D d M	R D d R D d D r D	D	URID"D O I"								"R" I "			O r D I d r D d d d D d r D r D r D rD	
								Dr D dD "R	d R D D I	ND r	ND	Dr D dD	ND r "d r dDr d D dD d D	ND	Dr D dD	Dr j d D	Dr N"	Dr I		
	P R a M" R I a RODRIGO	CC 00	O ICI" D O I	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		00		C" J" COPI		00	0 0 PRO CCI O		00	00	"	"		
	P R a M" R I a IS "	CC 00 00000	" J D"	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		00		C" J" COPI		00	0 0 POR IR		00	00	"	"		
	R " D a P RO " R O MIO	CC 00		00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		00		M " S R		00	OR NIR		00	00	"	"		
	MO RKO S J" D" D" ID JOS	CC 00 0 0	I G I RO " I I" R	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		0 00		M " S R		000	0 0 POR IR		0 000	000	"	"		
	O O CO R R" S IC M" RI"	CC 0	" I I" R PGIO	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		0 00		M " S R		000	0 0 POR IR		0 000	000	"	"		
	PIMI " ROJ" S JOS D" ID	CC 0	O ICI" D O R"	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		00		C" J" COPI		00	0 0 PRO CCIO		00	00	"	"		
	" R" JO RG" R" M IS"	CC 0 00 0	PRO SIO " SOCI"	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		00		" PS		0 00	0 0 PRO CCI O		00	0 00	"	"		
	S" a RGOS S" I" GO RIC" RDO	CC	" J D"	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		00		C" J" COPI		00	0 0 POR IR		00	00	"	"		
	MOR" S SO O R" " " O IO	CC 0 0	M" S RO	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		00		" PS		00			0	00	"	"		
0	OJOS M" R I a DI R O " O IO	CC 0 0	" J D"	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		00		" PS		00	0 0 POR IR		00	00	"	"		
	MO I RaO " C" R OS " R RO	CC 0	" J D"	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		00		" PS		00	0 0 PRO CCI O		00	00	"	"		
	S" a OJOS G" RI	CC 0	" J D"	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		00		C" J" COPI		00	CO P SI O S		00	00	"	"		
	D OJOS S" G" DO J" I R S G DO	CC 0 0	" J D"	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		00		" PS		00	CO P SI O S		00	00	"	"		
	M S R" M JI" M" RICIO " O IO	CC 00	" J D"	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		00		S R" M RIC"		00	0 0 POR IR		00	00	"	"		
	O I DO P" RR" MI O J S S	CC	R SID D O R"	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		0 00		S R" M RIC"		000	0 0 POR IR		0 000	000	"	"		
	O I DO " " R a MI O RI	CC 0	DIR C OR D O R"	00 000		CORR DOR S R R" S J PROD C I O		0 00		S R" M RIC"		000			0	000	"	"		

O R " ION D " IN R N OR " Nu r d D d dd r D r r u r dD

os da os re acionados en e presen e orma o se re oman de acuerdo a a pani a de seguridad socia o de J IO J IO 0 de persona dependien e de con ra is a Ca e ano arr rue e con ra is a de e en regar p ani a de seguridad socia a cor e de de ju io 0 a respec o de ju io 0 se en i Se en i COM IC" DO " S O SO ICI D DOC M OS D R " SS P" R" CI RR D PROJ C O

con ra is a adjun a a cer i icaci n de ec a a a r ue se re iere a no a de presen e orma o

NO "

s responsa i idad de a ln er en or a eri icar r ue e persona pro esiona es e de idamen e apro ado se cumpla con a dedicaci n con rac ua

s responsa i idad de a ln er en or a re acionar odo e persona u i i ado duran e e mes para a ejecuci n de con ra o inc uida mano de o ra ca i icada no ca i icada di igenciar a casi a "O ser aciones"

n e e en o en r ue e Con ra is a no cumpla con a dedicaci n de persona pro esiona es a ecido con rac ua men e e ln er en or de e indicar en a casi a "O ser aciones" as acciones r ue ade an a o ade an ar endien es a ograr e cumpl imien o de es a o igaci n

con ra is a es e responsa e de a a iaci n pago de os apor es a sis ema de a seguridad socia con ri uciones para isca es de os emp eados a su cargo inc uidos por con ra o a ora asociados a a ejecuci n de con ra o Cuando se ra a de Consorcio o ni n empora de e indicarse e in egran e r ue rea i a os pagos os pagos pueden ser rea i ados por e Con ra is a o por uno de os in egran es de Con ra is a en e caso de Consorcio o ni n empora os cua es de en corresponder con a in ormaci n consignada en a n mina e ec r nica cuando ap ir ue

n e e en o en r ue e pago de os apor es se e ec ue por uno de os in egran es de Consorcio o ni n empora de e indicarse e nom re de in egran e r ue e ec ua os pagos

ln er en or es e responsa e de a eri icaci n de pago de os " por es ega es Seguridad Socia de persona inc uida a Con ra o de O ra as como e cumpl imien o por par e de con ra is a de a norma i idad igen e en reaci n con a n mina e ec r nica cuando ap ir ue

Con ra is a es e responsa e de eri icar r ue sus con ra is as de pres aci n de ser icios asociados a a ejecuci n de a o ra cumpan con sus o igaciones con e sis ema de a seguridad socia para o cua de e presen ar a a ln er en or a a cer i icaci n suscri a por e Represen an e ega o Re isor isca seg n e caso en a cua se re acionen os nom res de os con ra is as de pres aci n de ser icios e mon o correspondien e a os pagos de seguridad socia de cada uno de con ormidad con a norma i idad igen e a en idad pres adora de ser icio

ln er en or de e se a ar con un a con inuaci n de nom re e persona inc uido por con ra o de pres aci n de ser icios " s mismo de e di igenciar a dedicaci n en os d as r ue pres e ser icio

irma

om re milton oviedo
Direc or de a O ra
Ma r cu a Pro esiona o

irma

om re M" RI" S " J IO
Direc or de ln er en or a
Ma r cu a Pro esiona o 0 0 COR

Oriqina l norme nsua de ln er en or a " rc i o de Ges i n de l I" S
Copias ln er en or Direcci n err ria

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901748217
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAHAGUN	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CR 23 114 61 OF 205	TELÉFONO:	3157251
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - PRINCIPAL CORDOBA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7932656951**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	5						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	766402756		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.275.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 1.275.900	$ 4.800	$ 1.280.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 319.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 319.000	$ 1.200	$ 320.200
230201	230201- PROTECCION	4	$ 520.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 520.100	$ 2.000	$ 522.100
SUBTOTALES:										**$ 2.115.000**	**$ 8.000**	**$ 2.123.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 107.500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 107.500	$ 500	$ 0	$ 108.000
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 199.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 199.500	$ 800	$ 0	$ 200.300
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 119.700	$ 0	$ 500	$ 0	$ 119.700	$ 500	$ 0	$ 120.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143.900	$ 0	$ 600	$ 0	$ 143.900	$ 600	$ 0	$ 144.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 13.900	$ 0	$ 100	$ 0	$ 13.900	$ 100	$ 0	$ 14.000
SUBTOTALES:													**$ 584.500**	**$ 2.500**	**$ 0**	**$ 587.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.016.900	$ 1.016.900	$ 3.900	$ 0	$ 1.020.800
SUBTOTALES:									**$ 1.016.900**	**$ 3.900**	**$ 0**	**$ 1.020.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	16	$ 584.500	$ 2.200	$ 586.700
SUBTOTALES:			**$ 584.500**	**$ 2.200**	**$ 586.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901748217
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAHAGUN	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CR 23 114 61 OF 205	TELÉFONO:	3157251
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - PRINCIPAL CORDOBA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7932656951**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	766402756

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
11	CC 15043548	MONTIEL URZOLA CARLOS ARTURO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23															230201-PROTECCION	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	NUEVA EPS CM	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-11 - ARL SURA	23	$ 996.667		$ 69.400	23	$ 996.667	CCF16-COMFACOR	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 15047949	SAEZ HOYOS GABRIEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23															25-14 COLPENSIONES	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-11 - ARL SURA	23	$ 996.667		$ 69.400	23	$ 996.667	CCF16-COMFACOR	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 15050551	DE HOYOS SALGADO JAVIER SEGUNDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23															25-14 COLPENSIONES	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	NUEVA EPS CM	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-11 - ARL SURA	23	$ 996.667		$ 69.400	23	$ 996.667	CCF16-COMFACOR	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 7369002	MESTRA MEJIA MAURICIO ANTONIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23															230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-11 - ARL SURA	23	$ 996.667		$ 69.400	23	$ 996.667	CCF16-COMFACOR	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 78762197	OVIEDO PARRA MILTON JESUS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 9092557	OVIEDO ALVAREZ MILTON ENRIQUE	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.300.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 4.317.500**

Planilla Pagada

4.4INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

	IN I U ON" ION" D " RO OMI ION" J U I ND ROJ O D IN R" RU UR" D R"N OR M"NU" D IN R N OR" O R" I " IN ORM IN"N I ROJ R U U " ON R" OD O R"	C DIGO	M PI M I R
		RSI	
		P GI "	

C " 0 0
D a Mes " o

UNID" D J U OR" S DIR CCIO D I" S R GIO " S DIR I N RRI ORI" C RDO "

ON R" O D O R" ND D 0 ON R" I " CO SORCIO CORR DOR S R R" S

M IN ORM M N U" ju ROJ O CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G C RDO "

ON R" O D IN R N OR" ND D 0 IN R N OR CO SORCIO " CIO "

R " I ND R I RO R U U " D ON R" O D O R"

	R rD ND	rD r u rD r rD D	R ur D ND	u d N D rD D	D r D r "d D ND	Dr	dD d " " r Dr
0	0	Programa In raes ruc ura red ia regiona Su programa In ersec oria ranspor e Pro ec o Mejoramien o man enimien o re a i i acion de corredores rura es produc i os	Sa do Con enio de 0 " diciona Con enio de 0	aci n " por es l l" S	de 0	0 0 000 0 000 000	
			O "				

" OR " UMU " DO D ON R" O

UIMI N O IN"N I ROJ R U U " ON R" O D O R"

" ND	Dd "	M " Dd j u	Dr " l "	Dr l "	Dr D j u dD " u u dD"	" D " Dr dD"	Dr D dD D D dD " D	dD" D Dr " Dr r	ND d R rD	dD R rD r u u	dD d D r D	ND d R d u Dr r IN l"	l d r D r Dr ll l	 NO	O r D
		sep							de 0 0	0 0	0 0	"			o se rami ac a
		oc							de 0 0	0 0	0 0	"			o se rami ac a
		no							de 0 0	0 0	0 0	"			o se rami ac a
		dic							de 0 0	0 0	0 0	"			o se rami ac a
		ene							de 0 0	0 0	0 0	"			o se rami ac a
		e							de 0 0	0 0	0	"			ac a parcia n
		mar							de 0 0	0 0	0	"			o se rami ac a
		a r							de 0 0	0 0	0	"			o se rami ac a
		ma			0		0		de 0 0	0 0		"			" c a parcia n
0		jun			0		0		de 0 0	0 0		"			" c a parcia n
		jun			0		0		0 de 0 0	0 0		"			" c a parcia n
		ju			0 0		0 0		de 0 0	0 0		"			" c a parcia n
		ju			0		0		de 0 0	0 0	0	"			" c a parcia n
O "															

Dd " rD d Dr l r Dr d r D r D D ur d

IN I U ON" ION" D "
RO O MI ION" J U I ND ROJ O D IN R" RU UR" D R"N OR
M"NU" D IN R N OR" O R" I "
IN ORM IN" N I RO J R U U " ON R" O D O R"

C DIGO	M PI M I R
RSI	
P GI "	

C " 0 0
D a Mes " o

R UM N IN" N I RO " UMU " DO

	" OR I O	I "	O "
S O " COS O DIR C O O R"	0 00		
O R" S D COMP S" CIO " M I " J O COMP M " RI" S	00		
O " S DIOS J DIS OS R ISIO " J S J O " C " la" CIO J O MODI IC" CIO J O COMP M " CIO D S DIOS J DIS OS	00		
" OR O "			

D D D d Drr D d r D r D dD rD u D rD d

NO "
s responsa i idad de In er en or rea i ar a comparaci n de orma o con e repor e SII e inc uir as ac araciones per inen es

Firma:
Nombre: Milton Oviedo Parra
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

irma
om re M" RI" S " J IO GO a" a
Direc or de In er en or a
Ma r cu a Pro esiona o 0 0 COR

Origina In orme mensua de In er en or a " rc i o de Ges i n de l I" S
Copias In er en or Direcci n erri oria

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El seguimiento al estado general del tiempo se relaciona en el formato MEPI-MN-IN-15-FR-10. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN-IN-15-FR-10. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	IN I U O N" ION" D " RO O MI ION" J U I N D ROJ O D IN R" RU UR" D R" N OR M" NU" D IN R N OR " D O R" I " "DO N R" D I M O	C DIGO	M PI M I R 0
		RSI	
		P GI "	

C " 0 0
D a Mes " o

UNID" D J U OR" S DIR CCIO D l" S R GIO " S **DIR I N RRI ORI"** CORDO "

ON R" O D O R" ND D 0 **ON R" I "** CO SORCIO CORR DOR S R R" S

M J " O D IN ORM M N U" ju **ROJ O** M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CI D CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G C RDO " CO OM I" R R"

ON R" O D IN R N OR " ND 0 **IN R N OR** CO SORCIO " CIO "

"DO N R" D I M O

d D	**D " D M**																														
																															D
Seco					0						0																				0
u ias moderadas																															
u ias in ensas																															
D Dr																															

N "D" " I " D INDI "R N M RO D OR" OR D " U RM" N " " D I M O " OR" D D "

NO "
" ne ar Regis ro p u iom rico de ID " M correspondien e a a s aci n m s cercana a Pro ec o

O R " ION

irma
om re DI" " CI" CORR" S M" R O
Residen e de In er en or a
Ma r cu a Pro esiona o 0 COR

Firma:
Nombre: Adriana Patricia de León
Cargo: Representante Legal Contratista
Matrícula Profesional No.:

Origina In orme mensua de In er en or a " rc i o de Ges i n de l l" S
Copias In er en or Direcci n erri oria

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

A continuación, se relacionan los resultados de los ensayos de laboratorio en mención y realizados en el periodo.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN-IN- 15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS LABORATORIO.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
	VERSIÓN	1
	PAGINA	

FECHA: 31-jul-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 178 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V

MES Y AÑO DEL INFORME MI jul-24 **PROYECTO:** CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTOI 2274 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NACIONAL ET

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES INTERVENTORIA

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
1	2/07/2024	GRANULOMETRIA SUB BASE GRANULAR	INV E - 213	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	ARTICULO 320 -13	N/A	SI	
2	2/07/2024	INDICE DE PLASTICIDAD SUB BASE GRANULAR	INV E - 125 - 126	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	4-9%	NP	SI	
3	2/07/2024	LIMITE LIQUIDO SUB BASE GRANULAR	INV E - 125 - 126	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	MAX 40%	NL	SI	
4	4/07/2024	PROCTOR SUB BASE GRANULAR	INV E - 142	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	N/A	2,203 g/cm3 - 8,0	SI	
5	8/07/2024	DENSIDADES METODO CONO DE ARENA SUB BASE GRANULAR	INV E - 161	**K3+500 - K3+400 CARRIL IZQ**	3	95%	95,7%	SI	
6	9/07/2024	GRANULOMETRIA SUB BASE GRANULAR	INV E - 213	**K3+400 - K3+320 CARRIL IZQ**	1	ARTICULO 320 -13	N/A	SI	
7	9/07/2024	INDICE DE PLASTICIDAD SUB BASE GRANULAR	INV E - 125 - 126	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	4-9%	NP	SI	
8	9/07/2024	LIMITE LIQUIDO SUB BASE GRANULAR	INV E - 125 - 126	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	MAX 40%	NL	SI	
9	10/07/2024	DENSIDADES METODO CONO DE ARENA SUB BASE GRANULAR	INV E - 161	**K3+320 - K3+395 CARRIL IZQ**	3	95%	97,2%	SI	
10	10/07/2024	PROCTOR SUB BASE GRANULAR	INV E - 142	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	N/A	2,197 g/cm3 - 8,2	SI	
11	15/07/2024	DENSIDADES METODO CONO DE ARENA SUB BASE GRANULAR	INV E - 161	**K3+600 - K3+680 CARRIL IZQ**	5	95%	97,8%	SI	
10	29/06/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+680 - K1+700 CARRIL IZQ**	1	3,8 MPA	3,98 MPA A 28 DIAS	SI	
11	29/06/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+680 - K1+700 CARRIL IZQ**	1	3,8 MPA	3,99 MPA A 28 DIAS	SI	
12	29/06/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+680 - K1+700 CARRIL IZQ**	1	3,8 MPA	4,06 MPA A 28 DIAS	SI	

13	6/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+439 - K1+403 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,16 MPA A 28 DIAS	SI	
14	6/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+439 - K1+403 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,12 MPA A 28 DIAS	SI	
15	6/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+439 - K1+403 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,09 MPA A 28 DIAS	SI	
16	10/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+499 - K1+439 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	3,98 MPA A 28 DIAS	SI	
17	10/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+499 - K1+439 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	3,99 MPA A 28 DIAS	SI	
18	10/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+499 - K1+439 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,06 MPA A 28 DIAS	SI	
19	16/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+439 - K1+403 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,13 MPA A 28 DIAS	SI	
20	16/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+439 - K1+403 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,17 MPA A 28 DIAS	SI	
21	16/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+439 - K1+403 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,17 MPA A 28 DIAS	SI	

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de



Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
'ventor, Dirección Territorial.

Firma

Nombre: MARIA ESTHELA JULIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202170671 COR

ENSAYOS REALIZADOS POR INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	31/07/2024

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: LP -007 - 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS

MES Y AÑO DEL INFORME MES: 31/07/2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA INTERSECCION VIA CERETE - CABUYA - COROZA MEDIO - MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍ: 2274 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NACIONAL ET

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
OBSERVACIONES:									
Se solicita al contratista los ensayos de las actividades adelantadas en obra hasta la fecha deacuerdo a su plan de inspeccion de ensayos									
ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
1	7/07/2024	GRANULOMETRIA SUB BASE GRANULAR	INV E - 213	**ACOPIO**	**1**	ARTICULO 320 -13	N/A	SI	
2	7/07/2024	INDICE DE PLASTICIDAD SUB BASE GRANULAR	INV E - 125 - 126	**ACOPIO**	**1**	4-9%	NP	SI	
3	7/07/2024	LIMITE LIQUIDO SUB BASE GRANULAR	INV E - 125 - 126	**ACOPIO**	**1**	MAX 40%	NL	SI	
4	7/07/2024	PROCTOR SUB BASE GRANULAR	INV E - 142	**ACOPIO**	1	N/A	2,210 g/cm3 - 7,9	SI	
5	19/07/2024	DENSIDADES METODO CONO DE ARENA SUB BASE GRANULAR	INV E - 161	**K0+210 - K0+310 CARRIL IZQ**	**4**	95%	96,4%	SI	
6	21/07/2024	GRANULOMETRIA SUB BASE GRANULAR	INV E - 213	**ACOPIO**	**1**	ARTICULO 320 -13	N/A	SI	
7	21/07/2024	INDICE DE PLASTICIDAD SUB BASE GRANULAR	INV E - 125 - 126	**ACOPIO**	**1**	4-9%	NP	SI	
8	21/07/2024	LIMITE LIQUIDO SUB BASE GRANULAR	INV E - 125 - 126	**ACOPIO**	**1**	MAX 40%	NL	SI	
6	27/07/2024	DENSIDADES METODO CONO DE ARENA SUB BASE GRANULAR	INV E - 161	**K0+995 - K0+865 CARRIL DR**	**4**	95%	95,3%	SI	
12	10/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K0+636 - K0+552 CARRIL IZQ**	1	4,0 MPA%	4,28 MPA A 28 DIAS	SI	
13	10/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K0+636 - K0+552 CARRIL IZQ**	1	4,0 MPA%	4,24 MPA A 28 DIAS	SI	
14	10/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K0+636 - K0+552 CARRIL IZQ**	1	4,0 MPA%	4,29 MPA A 28 DIAS	SI	
15	12/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K0+552 - K0+470 CARRIL IZQ**	1	4,0 MPA%	4,33 MPA A 28 DIAS	SI	
16	12/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K0+552 - K0+470 CARRIL IZQ**	1	4,0 MPA%	4,28 MPA A 28 DIAS	SI	
17	12/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K0+552 - K0+470 CARRIL IZQ**	1	4,0 MPA%	4,26 MPA A 28 DIAS	SI	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	31/07/2024

18	13/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K0+470 - K0+389 CARRIL IZQ**	1	4,0 MPA%	4,39 MPA A 28 DIAS	SI	
19	13/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K0+470 - K0+389 CARRIL IZQ**	1	4,0 MPA%	4,43 MPA A 28 DIAS	SI	
20	13/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K0+470 - K0+389 CARRIL IZQ**	1	4,0 MPA%	4,33 MPA A 28 DIAS	SI	
21	14/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K0+389 - K0+308 CARRIL IZQ**	1	4,0 MPA%	4,30 MPA A 28 DIAS	SI	
22	14/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K0+389 - K0+308 CARRIL IZQ**	1	4,0 MPA%	4,31 MPA A 28 DIAS	SI	
23	14/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K0+389 - K0+308 CARRIL IZQ**	1	4,0 MPA%	4,33 MPA A 28 DIAS	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JUAN GUILLERMO VARGAS
)irector de Obra
ula Profesional No.: 22202-161539COR

Firma

Nombre: :MARIA ESTHELA JULIO GONZALEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202170671 CO

Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
ventor, Dirección Territorial.

ENSAYOS REALIZADOS POR CONTRATISTA

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS

Se presenta a continuación la relación de pólizas del contrato de obra pública en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

	IN I U ON" ION" D " RO O MI ION" J U I N D ROJ O D IN R" RU UR" D R" N OR M" NU" D IN R N OR" O R" I " UIMI N O "R" N " J URO ON R" O D O R"	C DIGO	M PI M I R
		RSI	
		P GI "	

C " | | | 0
D a | Mes | " o

UNID" D J U OR" S DIR CCIO D I" S R GIO " S **DIR I N RRI ORI"** CORDO "

ON R" O D O R" ND D 0 **ON R" I "** CO SORCIO CORR DOR S R R" S

O J O D ON R" O

"M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CIO D CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G D P" R " M O D C RDO " "

" D INI IO 0 0

" O INI I" M S S

" D N IMI N O " U" 0 D J IO D 0
Inc u e pr rrogas suspensiones

" OR INI I" 0 0 0 00

" OR " UMU " DO 0 0 0 00
Inc u e adiciones

" OR INI I" M UDIO J DI O 00

" OR " UMU " DO M UDIO J DI O 00

ON R" O D IN R N OR " ND D 0 **IN R N OR** CO SORCIO " CIO "

" R" N " NI " D UM IMI N O I ID" N ON R" O RIN I "

" rD	" rD	Dr " ur dD
Cump imien o	0	0 0 0 0
uen manejo correc a in ersi n de an icipo	o ap ica	o ap ica
Pago de Sa arios pres aciones socia es ega es e indemni aciones	0	0 0 0 00
Ca idad de s udios Dise os	0	0 0 0
s a i idad o Ca idad de O ra	0	0 0 0

I N I"					
D d					
		0			0
D a	Mes	" o	D a	Mes	" o
		0			0
		0			0

Cinco a os con ados a par ir de a ec a de suscripci n de ac a de en rega reci o de ini i o de o ras

" R" N " NI " D UM IMI N O ND 0 0

r dD d Dd D D ND 0
Se a ar e imo cer i icado de modi icaci n o ane o apro ado por e Ins i u o correspondien e a as condiciones inicia es de con ra o

R D D " ur dDr S G ROS D S " DO S "

d rD d r Dr d O

URO I IDO N ON R" O RIN I "

urD	" ur dD	Dr " ur dD
Responsa i idad Ci i racon rac ua RC		000 000 00
O ros		

I N I"					
D d					
		0			0
D a	Mes	" o	D a	Mes	" o

I " D URO R ND 0 0 0 **O R" I " ND**

r dD d Dd D D ND 0
Se a ar e imo cer i icado de modi icaci n o ane o apro ado por e Ins i u o correspondien e a as condiciones inicia es de con ra o

R D D " ur dDr S G ROS D S " DO S"

d rD d urD Dr d O

	IN I U O N" ION" D " RO O MI ION" J U I N D ROJ O D IN R" RU UR" D R" N OR M" NU" D IN R N OR " O R" I " UIMI N O "R" N " J URO ON R" O D O R"	C DIGO	M PI M I R
		RSI	
		P GI "	

C " | | | 0
D a Mes " o

"R" N " NI " D UM IMI N O N" " D INI IO

" con inuaci n indicar os amparos igencias de os cer i icados de modi icaci n o ane os apro ados por e Ins i u o en su orden consecu i o

"DI ION" ND ..... R RRO " ND ..... MODI I " I N ND ..... U N I N ND .....

" rD	" rD	Dr " ur dD
Cump imien o	0	0 0 0 0
uen manejo correc a in ersi n de an icipo	o ap ica	o ap ica
Pago de Sa arios pres aciones socia es ega es e	0	0 0 0 0
Ca idad de Ser icio	0	0 0 0
s a i idad o Ca idad de O ra	0	0 0 0

I N I"						
D d						
		0				0
D a	Mes	" o		D a	Mes	" o
		0				0
		0				0
Se ampara a os 0 meses d a						

"R" N " NI " D UM IMI N O ND 0 0

r dD d Dd D D ND .....
Se a ar cer i icado de modi icaci n o ane o apro ado por e Ins i u o

R D D " ur dDr ..... S G ROS D S " DO S "

d rD d r Dr d O .....

URO I IDO N" " D INI IO

" con inuaci n indicar os amparos igencias de os cer i icados de modi icaci n o ane os apro ados por e Ins i u o en su orden consecu i o

"DI ION" ND ..... R RRO " ND ..... MODI I " I N ND ..... U N I N ND .....

urD	" ur dD	Dr " ur dD
Responsa i idad Ci i racon rac ua RC		000 000 00
O ros		

I N I"						
D d						
		0				0
D a	Mes	" o		D a	Mes	" o

I " D URO R ND 0 0 0 O R" I " ND .....

r dD d Dd D D ND .....
Se a ar cer i icado de modi icaci n o ane o apro ado por e Ins i u o

R D D " ur dDr ..... S G ROS D S " DO S"

d rD d urD Dr d O .....

O R " ION

POR M DIO D " O S " J S " " IG CI" D " C RDO " " C " D I ICIO CO C " D IRM" D D S P I M R D 0

	IN I U O N" ION" D " RO O MI ION" J U I N D ROJ O D IN R" RU UR" D R" N OR M" NU" D IN R N OR" O R" I " UIMI N O "R" N " J URO ON R" O D O R"	C DIGO	M PI M I R
		RSI	
		P GI "	

C "

		0
D a	Mes	" o

"R" N " NI " D UM IMI N O IN UJ NDO " DI ION MODI I " ION R RRO " J U N ION

" con inuaci n indicar os amparos igencias de os cer i icados de modi icaci n o ane os apro ados por e Ins i u o en su orden consecu i o

" DI ION" ND ..... **R RRO " ND** ..... **MODI I " I N ND** ..... **U N I N ND** .....

" rD	" rD	Dr " ur dD	I N I"					
			D d					
Cump imien o	0	0 0 0 0			0			0
uen manejo correc a in ersi n de an icipo	o ap ica	o ap ica	D a	Mes	" o	D a	Mes	" o
Pago de Sa arios pres aciones socia es ega es e indemni aciones	0	0 0 0 0			0			0
Ca idad de s udios Dise os	0	0 0 0			0			0
s a i idad o Ca idad de O ra	0	0 0 0	Se ampara a os 0 meses d a					

"R" N " NI " D UM IMI N O ND 0 0

r dD d Dd D D ND .....

Se a ar cer i icado de modi icaci n o ane o apro ado por e Ins i u o

R D D " ur dDr S G ROS D S " DO S "

d rD d r Dr d O .....

URO I IDO IN UJ NDO " DI ION MODI I " ION R RRO " J U N ION

" con inuaci n indicar os amparos igencias de os cer i icados de modi icaci n o ane os apro ados por e Ins i u o en su orden consecu i o

" DI ION" ND ..... **R RRO " ND** ..... **MODI I " I N ND** ..... **U N I N ND** .....

urD	" ur dD	Dr " ur dD	I N I"					
			D d					
Responsa i idad Ci i racon rac ua RC		000 000 00			0			0
O ros			D a	Mes	" o	D a	Mes	" o

I " D URO R ND 0 0 0 ..... **O R" I " ND** .....

r dD d Dd D D ND .....

Se a ar cer i icado de modi icaci n o ane o apro ado por e Ins i u o

R D D " ur dDr S G ROS D S " DO S "

d rD d urD Dr d O .....

O R " ION

"R" N " NI " D UM IMI N O IN UJ NDO " DI ION MODI I " ION R RRO " J U N ION

" con inuaci n indicar os amparos igencias de os cer i icados de modi icaci n o ane os apro ados por e Ins i u o en su orden consecu i o

" DI ION" ND ..... **R RRO " ND** ..... **MODI I " I N ND** ..... **U N I N ND** .....

" rD	" rD	Dr " ur dD	I N I"					
			D d					
Cump imien o	0	0 0 0 0			0			0
uen manejo correc a in ersi n de an icipo	o ap ica	o ap ica	D a	Mes	" o	D a	Mes	" o
Pago de Sa arios pres aciones socia es ega es e indemni aciones	0	0 0 0 0			0			0
Ca idad de s udios Dise os	0	0 0 0			0			0
s a i idad o Ca idad de O ra	0	0 0 0	Se ampara a os 0 meses d a					

	IN I U O N" ION" D " RO O MI ION" J U I N D ROJ O D IN R" RU UR" D R" N OR M" NU" D IN R N OR" O R" I " UIMI N O "R" N " J URO ON R" O D O R"	C DIGO	M PI M I R
		RSI	
		P GI "	

C " | | | 0
D a Mes " o

"R" N " NI " D UM IMI N O ND 0 0

r dD d Dd D D ND
Se a ar cer i icado de modi icaci n o ane o apro ado por e Ins i u o

R D D " ur dDr S G ROS D S "DO S"

d rD d r Dr d O

URO I IDO IN UJ NDO "DI ION MODI I " ION R RRO " J U N ION

" con inuaci n indicar os amparos igencias de os cer i icados de modi icaci n o ane os apro ados por e Ins i u o en su orden consecu i o

"DI ION" ND **R RRO " ND** **MODI I " I N ND** **U N I N ND**

urD	" ur dD	Dr " ur dD
Responsa i idad Ci i racon rac ua RC		000 000 00
O ros		

I N I"					
D d					
		0			0
D a	Mes	" o	D a	Mes	" o

I " D URO R ND 0 0 0 **O R" I " ND**

r dD d Dd D D ND
Se a ar cer i icado de modi icaci n o ane o apro ado por e Ins i u o

R D D " ur dDr S G ROS D S "DO S"

d rD d urD Dr d O

O R " ION

URO I IDO IN UJ NDO "DI ION MODI I " ION R RRO " J U N ION

" con inuaci n indicar os amparos igencias de os cer i icados de modi icaci n o ane os apro ados por e Ins i u o en su orden consecu i o

"DI ION" ND **R RRO " ND** **MODI I " I N ND** **U N I N ND**

urD	" ur dD	Dr " ur dD
Responsa i idad Ci i racon rac ua RC		000 000 00
O ros		

I N I"					
D d					
		0			0
D a	Mes	" o	D a	Mes	" o

I " D URO R ND 0 0 0 **O R" I " ND**

r dD d Dd D D ND
Se a ar cer i icado de modi icaci n o ane o apro ado por e Ins i u o

R D D " ur dDr S G ROS D S "DO S"

d rD d urD Dr d O

"R" N " NI " D UM IMI N O IN UJ NDO "DI ION MODI I " ION R RRO " J U N ION

" con inuaci n indicar os amparos igencias de os cer i icados de modi icaci n o ane os apro ados por e Ins i u o en su orden consecu i o

"DI ION" ND **R RRO " ND** **MODI I " I N ND** **U N I N ND**

" rD	" rD	Dr " ur dD
Cump imien o	0	0 0 0 0
uen manejo correc a in ersi n de an icipo	o ap ica	o ap ica
Pago de Sa arios pres aciones socia es ega es e	0	0 0 0 0
Ca idad de s udios Dise os	0	0 0 0
s a i idad o Ca idad de O ra	0	0 0 0

I N I"					
D d					
		0			0
D a	Mes	" o	D a	Mes	" o
		0			0
		0			0
Se ampara a os 0 meses d a					

"R" N " NI " D UM IMI N O ND 0 0

	IN I U O N" ION" D " RO O MI ION" J U I N D ROJ O D IN R" RU UR" D R" N OR M" NU" D IN R N OR " O R" I " UIMI N O "R" N " J URO ON R" O D O R"	C DIGO	M PI M I R
		RSI	
		P GI "	

C " | | | 0
D a Mes " o

r dD d Dd D D ND .....
Se a ar cer i icado de modi icaci n o ane o apro ado por e Ins i u o

R D D " ur dDr S G ROS D S " DO S " .....

d rD d r Dr d O .....

" R" N " NI " D UM IMI N O IN UJ NDO " DI ION MODI I " ION R RRO " J U N ION

" con inuaci n indicar os amparos igencias de os cer i icados de modi icaci n o ane os apro ados por e Ins i u o en su orden consecu i o

" DI ION" ND ..... R RRO " ND ..... MODI I " I N ND ..... U N I N ND .....

" rD	" rD	Dr " ur dD
Cump imien o	0	0 0 0 0
uen manejo correc a in ersi n de an icipo	o ap ica	o ap ica
Pago de Sa arios pres aciones socia es ega es e	0	0 0 0 0
Ca idad de s udios Dise os	0	0 0 0
s a i idad o Ca idad de O ra	0	0 0 0

I N I"						
D d						
		0		0		0
D a	Mes	" o		D a	Mes	" o
		0		0		0
		0				0
Se ampara a os 0 meses d a						

" R" N " NI " D UM IMI N O ND 0 0

r dD d Dd D D ND .....
Se a ar cer i icado de modi icaci n o ane o apro ado por e Ins i u o

R D D " ur dDr S G ROS D S " DO S " .....

d rD d r Dr d O .....

O R " ION

irma

om re M" RI" S " J IO GO a" a
Direc or de a In er en or a
Ma r cu a Pro esiona o 0 0 COR

POLIZAS INICIALES Y APROBACION

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101207543	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	09	2023	31	08	2023	00:00	31	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V	NIT: 901.748.217-0	
DIRECCIÓN: CR 23 114 61 0F 205	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE SAHAGUN	NIT: 800.096.777-8	
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	CIUDAD: SAHAGUN, CORDOBA	TELÉFONO: 7778326

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 178-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL

ASEGURADO ADICIONAL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 806.215.867-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/08/2023	31/12/2023	$221,030,290.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/08/2023	31/12/2026	$442,060,580.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$663,090,871.20
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/12/2028	$663,090,871.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DE LEON NARVAEZ BELISARIO ALFREDO	15041209	10.00
VOLGA CONSTRUCCIONES SAS	901510700-4	90.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **14,736,967.00	$ *****25,000.00	$ ***2,804,773.00	$ ********17,566,741.00	$ ****1,989,272,613.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A, SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

NATALIAJIMENEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101207543, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 06 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101055228	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	09	2023	31	08	2023	00:00	31	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO CORREDORES RURALES B V — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.748.217-0

DIRECCIÓN: CR 23 114 61 OF 205 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SAHAGUN — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.096.777-8

DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL — CIUDAD: SAHAGUN, CORDOBA — TELÉFONO 7778326

BENEFICIARIO: 800096777 - MUNICIPIO DE SAHAGUN — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 178-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL

ASEGURADO ADICIONAL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/08/2023	31/12/2023	$348,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DE LEON NARVAEZ BELISARIO ALFREDO	15041209	10.00
VOLGA CONSTRUCCIONES SAS	901510700-4	90.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****465,271.00	$ *******3,000.00	$ ******88,971.00	$ **********557,242.00	$ ******348,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101055228

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101055228	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	09	2023	31	08	2023	00:00	31	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V	NIT: 901.748.217-0	3157251177

DIRECCIÓN: CR 23 114 61 0F 205 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE SAHAGUN	NIT: 800.096.777-8	7778326

DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL — CIUDAD: SAHAGUN, CORDOBA

BENEFICIARIO: — ADICIONAL:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Mundo Red · Bancolombia · éxito · Gaseosa · Efecty · Servibanca

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****465,271.00	$ *******3,000.00	$ ******88,971.00	$ **********557,242.00	$ ******348,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-50/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709938021167(8020)110006249366 70(3900)000000557242(96)20240830

REFERENCIA PAGO: 1100062493667-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Powered by CamScanner

RESOLUCIÓN No. 2716

"Por el cual se aprueba una póliza única de seguro de cumplimiento y una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor del Municipio de Sahagún".

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN

En uso de sus atribuciones legales y en especial lo dispuesto en el articulo 41 de la ley 80 de 1993 y el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015, y resolución No. 0010 de enero 14 de 2004 de la Alcaldía Municipal.

CONSIDERANDO

Que el **CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V,** identificado con el NIT No 9017482170, representado por **ADRIANA PATRICIA DE LEON OTERO,** identificada con la C.C No 53.120.632 de Bogotá D.C., presentó a este despacho la póliza única de seguro de cumplimiento No. 11-44-101207543 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101055228 de la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** que amparan los siguientes conceptos:

Que el objeto de la póliza única de cumplimiento es garantizar los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$221.030.290,40	31-08-2023 a 31-12-2023
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$442.060.580,80	31-08-2023 a 31-12-2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	$663.090.871,20	5 AÑOS
Calidad del Servicio	$663.090.871,20	31-12-2023 a 31-12-2028

Que el objeto de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual es garantizar los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Predios labores y operaciones	$348.000.000	31-08-2023 a 31-12-2023

En desarrollo del contrato de obra Pública No. 178 de fecha 31 de Agosto de 2023, que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL."**

Que en virtud de lo expuesto,

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Apruébese la póliza única de seguro de cumplimiento No. 11-44-101207543 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101055228 de la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** dentro del contrato de obra Pública No. 178 de fecha 31 de Agosto de 2023, que tiene por

Powered by CamScanner

objeto **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL."** Presentada por el **CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V,** identificado con el NIT No 901748217O, representado por **ADRIANA PATRICIA DE LEON OTERO,** identificada con la C.C No 53.120.632 de Bogotá D.C, por llenar los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993, en su artículo 41, inciso 2 y 25, numeral 19, su Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y ajustarse a lo estipulado en el contrato.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Sahagún a los 11 días del mes de Agosto de 2023

LUIS VICENTE CARRASCAL SÁNCHEZ.
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Powered by CamScanner

POLIZAS ACTA DE INICIO Y APROBACION

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101207543	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	25	09	2023	00:00	25	01	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V		NIT: 901.748.217-0
DIRECCIÓN: CR 23 114 61 0F 205	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN		NIT: 800.096.777-8
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	CIUDAD: SAHAGUN, CORDOBA	TELÉFONO 7778326
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 178-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL

ASEGURADO ADICIONAL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/09/2023	25/01/2024	$221,030,290.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/09/2023	25/01/2027	$442,060,580.80	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$663,090,871.20	
CALIDAD DEL SERVICIO	25/01/2024	25/01/2029	$663,090,871.20	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO CON FECHA DE FIRMA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **14,736,967.00	$ ******25,000.00	$ ***2,804,773.00	$ ********17,566,741.00	$ ****1,989,272,613.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101207543	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	25	09	2023	00:00	25	01	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V			NIT: 901.748.217-0
DIRECCIÓN: CR 23 114 61 0F 205	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE SAHAGUN			NIT: 800.096.777-8
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7778326

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DE LEON NARVAEZ BELISARIO ALFREDO	15041209	10.00
VOLGA CONSTRUCCIONES SAS	901510700-4	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA. Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF11327-4A

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101207543, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de DICIEMBRE de 2023

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101055228	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	25	09	2023	00:00	25	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V		NIT: 901.748.217-0
DIRECCIÓN: CR 23 114 61 0F 205	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN		NIT: 800.096.777-8
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	CIUDAD: SAHAGUN, CORDOBA	TELÉFONO 7778326
BENEFICIARIO: 800096777 - MUNICIPIO DE SAHAGUN	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 178-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL

ASEGURADO ADICIONAL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/09/2023**	**25/01/2024**	**$348,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE SE AJUSTA LA VIGENCIA CON ACTA DE INICIO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****465,271.00	$ *******3,000.00	$ ******88,971.00	$ **********557,242.00	$ ******348,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101055228

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101055228	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	25	09	2023	00:00	25	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V	NIT: 901.748.217-0	CR 23 114 61 OF 205	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
MUNICIPIO DE SAHAGUN	NIT: 800.096.777-8	CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

BENEFICIARIO. 800096777 - MUNICIPIO DE SAHAGUN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DE LEON NARVAEZ BELISARIO ALFREDO	15041209	10.00
VOLGA CONSTRUCCIONES SAS	901510700-4	90.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101055228

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF113274A

Powered by CamScanner

RESOLUCIÓN No. 3447

"Por el cual se aprueba una póliza única de seguro de cumplimiento y una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor del Municipio de Sahagún".

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN

En uso de sus atribuciones legales y en especial lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015, y resolución No. 0010 de enero 14 de 2004 de la Alcaldía Municipal.

CONSIDERANDO

Que el **CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V,** identificado con el NIT No 9017482170, representado por **ADRIANA PATRICIA DE LEON OTERO,** identificada con la C.C No 53.120.632 de Bogotá D.C., presentó a este despacho el anexo No. 2 a la la póliza única de seguro de cumplimiento No. 11-44-101207543 y el anexo No. 2 a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101055228 de la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** Correspondiente a la Actualización mediante Acta de Inicio**,** que amparan los siguientes conceptos:

Que el objeto de la póliza única de cumplimiento es garantizar los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$221.030.290,40	25-09-2023 a 25-01-2024
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$442.060.580,80	25-09-2023 a 25-01-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$663.090.871,20	5 AÑOS Y 1 DIAS
Calidad del Servicio	$663.090.871,20	25-01-2024 a 25-09-2029

Que el objeto de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual es garantizar los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Predios labores y operaciones	$348.000.000	25-09-2023 a 28-01-2024

En desarrollo del contrato de obra Pública No. 178 de fecha 31 de Agosto de 2023, que tiene por objeto "**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL.**"

Que en virtud de lo expuesto,

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Apruébese el anexo No. 2 a la la póliza única de seguro de cumplimiento No. 11-44-101207543 y el anexo No. 2 a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101055228

de la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** Correspondiente a la Actualización mediante Acta de Inicio, dentro del contrato de obra Pública No. 178 de fecha 31 de Agosto de 2023, que tiene por objeto "**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL.**" Presentada por el **CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V,** identificado con el NIT No 9017482170, representado por **ADRIANA PATRICIA DE LEON OTERO,** identificada con la C.C No 53.120.632 de Bogotá D.C, por llenar los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993, en su artículo 41, inciso 2 y 25, numeral 19, su Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y ajustarse a lo estipulado en el contrato.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Sahagún a los 11 días del mes de Diciembre de 2023

LUIS VICENTE CARRASCAL SÁNCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

POLIZAS SEGÚN PRORROGA No 1 Y APROBACION

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101207543	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	25	09	2023	00:00	25	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V	NIT: 901.748.217-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 23 114 61 0F 205	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN	NIT: 800.096.777-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 178-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL

ASEGURADO ADICIONAL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/09/2023	31/03/2024	$221,030,290.40	$221,030,290.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/09/2023	31/03/2027	$442,060,580.80	$442,060,580.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$663,090,871.20	$663,090,871.20
CALIDAD DEL SERVICIO	25/01/2024	25/01/2029	$663,090,871.20	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE ACUERDO A LA PRORROGA N1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 178-2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****213,642.00	$ *******8,000.00	$ ******42,112.00	$ **********263,754.00	$ ****1,989,272,613.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101207543	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	25	09	2023	00:00	25	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORREDORES RURALES B V		NIT: 901.748.217-0
DIRECCIÓN: CR 23 114 61 0F 205	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAHAGUN		NIT: 800.096.777-8
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7778326

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DE LEON NARVAEZ BELISARIO ALFREDO	15041209	10.00
VOLGA CONSTRUCCIONES SAS	901510700-4	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101055228	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	12	2023	25	09	2023	00:00	31	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V	NIT: 901.748.217-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 23 114 61 0F 205	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN	NIT: 800.096.777-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

BENEFICIARIO: 800096777 - MUNICIPIO DE SAHAGUN ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 178-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL

ASEGURADO ADICIONAL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/09/2023	31/03/2024	$348,000,000.00	$348,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE ACUERDO A LA PRORROGA N1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 178-2023

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****251,704.00	$ *******3,000.00	$ ******48,393.00	$ **********303,097.00	$ ******348,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101055228

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101055228	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	12	2023	25	09	2023	00:00	31	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORREDORES RURALES B V		NIT: 901.748.217-0
DIRECCIÓN: CR 23 114 61 0F 205	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAHAGUN		NIT: 800.096.777-8
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7778326

BENEFICIARIO: 800096777 - MUNICIPIO DE SAHAGUN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DE LEON NARVAEZ BELISARIO ALFREDO	15041209	10.00
VOLGA CONSTRUCCIONES SAS	901510700-4	90.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101055228

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 3603

"Por el cual se aprueba una póliza única de seguro de cumplimiento y una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor del Municipio de Sahagún".

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN

En uso de sus atribuciones legales y en especial lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015, y resolución No. 0010 de enero 14 de 2004 de la Alcaldía Municipal.

CONSIDERANDO

Que el **CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V,** identificado con el NIT No 9017482170, representado por **ADRIANA PATRICIA DE LEON OTERO,** identificada con la C.C No 53.120.632 de Bogotá D.C., presentó a este despacho el anexo No. 3 a la la póliza única de seguro de cumplimiento No. 11-44-101207543 y el anexo No.3 a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101055228 de la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** Correspondiente a la Actualización mediante Prorroga No. 1**,** que amparan los siguientes conceptos:

Que el objeto de la póliza única de cumplimiento es garantizar los siguientes amparos:

AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	$221.030.290,40	25-09-2023 a 31-03-2024
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$442.060.580,80	25-09-2023 a 31-03-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$663.090.871,20	5 AÑOS Y 1 DIAS
Calidad del Servicio	$663.090.871,20	25-01-2024 a 25-01-2029

Que el objeto de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual es garantizar los siguientes amparos:

AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Predios labores y operaciones	$348.000.000	25-09-2023 a 31-03-2024

En desarrollo del contrato de obra Pública No. 178 de fecha 31 de Agosto de 2023, que tiene por objeto "**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL.**"

Que en virtud de lo expuesto,

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Apruébese el anexo No. 3 a la la póliza única de seguro de cumplimiento No. 11-44-101207543 y el anexo No.3 a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101055228

de la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** Correspondiente a la Actualización mediante Prorroga No. 1**,** dentro del contrato de obra Pública No. 178 de fecha 31 de Agosto de 2023, que tiene por objeto "**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL.**" Presentada por el **CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V,** identificado con el NIT No 9017482170, representado por **ADRIANA PATRICIA DE LEON OTERO,** identificada con la C.C No 53.120.632 de Bogotá D.C, por llenar los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993, en su artículo 41, inciso 2 y 25, numeral 19, su Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y ajustarse a lo estipulado en el contrato.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Sahagún a los 29 días del mes de Diciembre de 2023

LUIS VICENTE CARRASCAL SÁNCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

POLIZAS PRORROGA No 2 Y APROBACION

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101207543	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	04	2024	25	09	2023	00:00	25	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V		NIT: 901.748.217-0
DIRECCIÓN: CR 23 114 61 0F 205	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN		NIT: 800.096.777-8
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	CIUDAD: SAHAGUN, CORDOBA	TELÉFONO 7778326
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 178-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL

ASEGURADO ADICIONAL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/09/2023	15/04/2024	$221,030,290.40	$221,030,290.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/09/2023	15/04/2027	$442,060,580.80	$442,060,580.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$663,090,871.20	$663,090,871.20
CALIDAD DEL SERVICIO	25/01/2024	25/01/2029	$663,090,871.20	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE ACUERDO CON EL ACTA PRORROGA No 2 , AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA #178-2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******49,050.00	$ *******8,000.00	$ ******10,839.00	$ **********67,890.00	$ ****1,989,272,613.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101055228	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	04	2024	25	09	2023	00:00	30	04	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V	NIT: 901.748.217-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 23 114 61 0F 205	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN	NIT: 800.096.777-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

BENEFICIARIO: 800096777 - MUNICIPIO DE SAHAGUN ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 178-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL

ASEGURADO ADICIONAL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/09/2023**	**15/04/2024**	**$348,000,000.00**	**$348,000,000.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGECIA DE ACUERDO A LA PRORROGA No 2 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 178-2023

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******57,205.00	$ *******3,000.00	$ ******11,439.00	$ **********71,644.00	$ ******348,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101055228

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 1099

"Por el cual se aprueba una póliza única de seguro de cumplimiento y una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor del Municipio de Sahagún".

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN

En uso de sus atribuciones legales y en especial lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015, y resolución No. 0010 de enero 14 de 2004 de la Alcaldía Municipal.

CONSIDERANDO

Que el **CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V,** identificado con el NIT No 9017482170, representado por **ADRIANA PATRICIA DE LEON OTERO,** identificada con la C.C No 53.120.632 de Bogotá D.C., presentó a este despacho el anexo No. 4 a la la póliza única de seguro de cumplimiento No. 11-44-101207543 y el anexo No.4 a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101055228 de la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** Correspondiente a la Actualización mediante Prorroga No. 2, que amparan los siguientes conceptos:

Que el objeto de la póliza única de cumplimiento es garantizar los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$221.030.290,40	25-09-2023 a 15-04-2024
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$442.060.580,80	25-09-2023 a 15-04-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$663.090.871,20	5 AÑOS Y 1 DIAS
Calidad del Servicio	$663.090.871,20	25-01-2024 a 25-01-2029

Que el objeto de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual es garantizar los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Predios labores y operaciones	$348.000.000	25-09-2023 a 15-04-2024

En desarrollo del contrato de obra Pública No. 178 de fecha 31 de Agosto de 2023, que tiene por objeto

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL."

Que en virtud de lo expuesto,

Powered by CamScanner

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Apruébese el anexo No. 4 a la la póliza única de seguro de cumplimiento No. 11-44-101207543 y el anexo No.4 a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101055228 de la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** Correspondiente a la Actualización mediante Prorroga No. 2, dentro del contrato de obra Pública No. 178 de fecha 31 de Agosto de 2023, que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL."** Presentada por el **CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V,** identificado con el NIT No 9017482170, representado por **ADRIANA PATRICIA DE LEON OTERO,** identificada con la C.C No 53.120.632 de Bogotá D.C, por llenar los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993, en su artículo 41, inciso 2 y 25, numeral 19, su Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y ajustarse a lo estipulado en el contrato.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Sahagún a los 17 días del mes de Abril de 2024

LUIS VICENTE CARRASCAL SÁNCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Powered by CamScanner

POLIZAS PRORROGA No 3 Y APROBACION

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101207543	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	05	2024	25	09	2023	00:00	25	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V	NIT: 901.748.217-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 23 114 61 0F 205	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN	NIT: 800.096.777-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 178-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL

ASEGURADO ADICIONAL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/09/2023	30/06/2024	$221,030,290.40	$221,030,290.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/09/2023	30/06/2027	$442,060,580.80	$442,060,580.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$663,090,871.20	$663,090,871.20
CALIDAD DEL SERVICIO	25/01/2024	25/01/2029	$663,090,871.20	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y PRORROGA No 3 SE MODIFICA FECHA DE VIGENCIA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****215,822.00	$ *******8,000.00	$ ******42,526.00	$ **********266,348.00	$ ****1,989,272,613.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101207543	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	05	2024	25	09	2023	00:00	25	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V	NIT: 901.748.217-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 23 114 61 0F 205	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN	NIT: 800.096.777-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito CODIDROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****215,822.00	$ *******8,000.00	$ ******42,526.00	$ **********266,348.00	$ ****1,989,272,613.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000627045891(3900)000000266348(96)20240924

REFERENCIA PAGO:

1100062704589-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101207543	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	05	2024	25	09	2023	00:00	25	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORREDORES RURALES B V		**NIT: 901.748.217-0**
DIRECCIÓN: CR 23 114 61 0F 205	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAHAGUN		**NIT: 800.096.777-8**
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7778326

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DE LEON NARVAEZ BELISARIO ALFREDO	15041209	10.00
VOLGA CONSTRUCCIONES SAS	901510700-4	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101207543, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 14 días del mes de MAYO de 2024

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

RESOLUCIÓN No. 1414

"Por el cual se aprueba una póliza única de seguro de cumplimiento y una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor del Municipio de Sahagún".

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN

En uso de sus atribuciones legales y en especial lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015, y resolución No. 0010 de enero 14 de 2004 de la Alcaldía Municipal.

CONSIDERANDO

Que el **CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V,** identificado con el NIT No 9017482170, representado por **ADRIANA PATRICIA DE LEON OTERO,** identificada con la C.C No 53.120.632 de Bogotá D.C., presentó a este despacho el anexo No. 6 a la la póliza única de seguro de cumplimiento No. 11-44-101207543 y el anexo No. 5 a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101055228 de la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** Correspondiente a la Actualización mediante Prorroga No. No. 3**,** que amparan los siguientes conceptos:

Que el objeto de la póliza única de cumplimiento es garantizar los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$221.030.290,40	25-09-2023 a 30-06-2024
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$442.060.580,80	25-09-2023 a 30-06-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$663.090.871,20	5 AÑOS Y 1 DIAS
Calidad del Servicio	$663.090.871,20	25-01-2024 a 25-01-2029

Que el objeto de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual es garantizar los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Predios labores y operaciones	$348.000.000	25-09-2023 a 30-06-2024

En desarrollo del contrato de obra Pública No. 178 de fecha 31 de Agosto de 2023, que tiene por objeto

"**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL.**"

Que en virtud de lo expuesto,

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Apruébese el anexo No. 6 a la la póliza única de seguro de cumplimiento No. 11-44-101207543 y el anexo No. 5 a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101055228 de la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** Correspondiente a la Actualización mediante Prorroga No. No. 3**,** dentro del contrato de obra Pública No. 178 de fecha 31 de Agosto de 2023, que tiene por objeto "**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL.**" Presentada por el **CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V,** identificado con el NIT No 9017482170, representado por **ADRIANA PATRICIA DE LEON OTERO,** identificada con la C.C No 53.120.632 de Bogotá D.C, por llenar los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993, en su artículo 41, inciso 2 y 25, numeral 19, su Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y ajustarse a lo estipulado en el contrato.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Sahagún a los 14 días del mes de Mayo de 2024

LUIS VICENTE CARRASCAL SÁNCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

POLIZAS PRORROGA Nº 4

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101055228	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	07	2024	25	09	2023	00:00	30	07	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V	NIT: 901.748.217-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 23 114 61 0F 205	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN	NIT: 800.096.777-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

BENEFICIARIO: 800096777 - MUNICIPIO DE SAHAGUN ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 178-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL

ASEGURADO ADICIONAL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/09/2023**	**30/07/2024**	**$348,000,000.00**	**$348,000,000.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRORROGA N 4 SE AJUSTA LA VIGENCIA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****114,410.00	$ *******3,000.00	$ ******22,308.00	$ **********139,719.00	$ ******348,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101055228

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101055228	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	07	2024	25	09	2023	00:00	30	07	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V	NIT: 901.748.217-0	CR 23 114 61 0F 205	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE SAHAGUN	NIT: 800.096.777-8	CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****114,410.00	$ *******3,000.00	$ ******22,308.00	$ **********139,719.00	$ ******348,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000627437332(3900)000000139719(96)20240924

REFERENCIA PAGO:

1100062743733-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101055228	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	07	2024	25	09	2023	00:00	30	07	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO CORREDORES RURALES B V	**NIT: 901.748.217-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 23 114 61 0F 205	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE SAHAGUN	**NIT: 800.096.777-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

BENEFICIARIO: 800096777 - MUNICIPIO DE SAHAGUN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DE LEON NARVAEZ BELISARIO ALFREDO	15041209	10.00
VOLGA CONSTRUCCIONES SAS	901510700-4	90.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101055228

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101207543	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	07	2024	25	09	2023	00:00	25	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V	NIT: 901.748.217-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 23 114 61 0F 205	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN	NIT: 800.096.777-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 178-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL

ASEGURADO ADICIONAL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/09/2023	30/07/2024	$221,030,290.40	$221,030,290.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/09/2023	30/07/2027	$442,060,580.80	$442,060,580.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$663,090,871.20	$663,090,871.20
CALIDAD DEL SERVICIO	25/01/2024	25/01/2029	$663,090,871.20	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRORROGA N 4 SE AJUSTA LA VIGENCIA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******98,101.00	$ *******8,000.00	$ ******20,159.00	$ ***********126,260.00	$ ****1,989,272,613.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101207543	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	07	2024	25	09	2023	00:00	25	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORREDORES RURALES B V	NIT: 901.748.217-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 23 114 61 0F 205	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN	NIT: 800.096.777-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******98,101.00	$ *******8,000.00	$ ******20,159.00	$ **********126,260.00	$ ****1,989,272,613.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G.C.S. L	113274	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000627449594(3900)000000126260(96)20240924

REFERENCIA PAGO:

1100062744959-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101207543	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	07	2024	25	09	2023	00:00	25	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CORREDORES RURALES B V		**NIT: 901.748.217-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 23 114 61 0F 205	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3157251177

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAHAGUN		**NIT: 800.096.777-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DE LEON NARVAEZ BELISARIO ALFREDO	15041209	10.00
VOLGA CONSTRUCCIONES SAS	901510700-4	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101207543, anexo 7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 11 días del mes de JULIO de 2024

11-44-101207543

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Se relaciona el Formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

	IN I U ON" ION" D " RO OMI ION" J U I ND ROJ O D IN R" RU UR" D R"N OR M"NU" D IN R N OR" O R" I " UIMI N O" "N D " ID"D ON R" OD O R"	C DIGO	M PI M I R
		RSI	
		P GI "	

C " 0 0
Da Mes " o

UNID"D J U OR" S DIR CCIO D I"S R GIO " S **DIR I N RRI ORI"** CORDO "

ON R" O D O R" ND D 0
Indicar n mero a o

O J OD ON R" O D O R"
"M JOR" MI O M" IMI O J R " I I "CIO D CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" "G D P" R "M OD C RDO " "

ON R" I " CO SORCIO CORR DOR S R R" S

" D INI IO 0 0
Indicar d a mes a o

" OINI I" M S S

" D N IMI N O 0 0 0
Incu e pr rrogas suspensiones

ON R" O D IN R N OR " ND D 0
Indicar n mero a o

IN R N OR CO SORCIO "CIO "

"N D " ID"D

PR S "DO SI ------ NO ------ "PRO "DO SI X NO ------ RSI o C " D RSI 0

D

"UDI ORI" D " ID"D

PROGR" M" " DI ORI" PR S "DO SI ------ NO ---------- o D " DI OR " S PROGR" M" D" S 0 C " IM" " DI OR "
PR S O I ORM D " DI OR " SI ------ NO ---X--------- o D " DI OR " S R " la" D" S 0 C " PR IM" " DI OR "

O R " ION

"ND IN I N M DI I NJ N "JO IM

PR S "DO SI ------ NO ------ "PRO "DO SI ------ NO ------ C " D "PRO "CI 0 0

o O " D S" JOS PROGR" M" DOS M S o O " D S" JOS J C "DOS M S
C MP IDO P " D PIM M S SI ------ NO --X---

O R " ION

p an de Inspecci n medici n ensa o de e cump ir en un odo con as e igencias con rac ua es as normas de ensa os as especi icaciones de cons rucci n de Ins i u o aciona de as
a can idad de ensa os r ue se de en rea i ar en e mes se de ine con ase en as e igencias de PIM en a o ra r ue se ejecu e
a can idad de ensa os rea i ados de e responder a as e igencias de PIM de a o ra ejecu ada

R OR D NO ON ORMID"D

ND d ND D Dr d d r Dr d 0
ND d ND D Dr d d d d rr 0
ND u u dDd ND D Dr d d d d r D r D 0
ND u u dDd ND D Dr d d rr d r D r D 0
ND u u dDd ND D Dr d d d d rr r D r D 0

O R " ION

U J" J R "MO

ND D ru j r D r d 0
ND D ru j r D dd 0
ND D ru j r D d d 0
ND " u u dDd D ru j r D r d Dr D r D 0
ND " u u dDD ru j r D d d Dr D r D 0
ND " u u dDd D ru j r D dd D r D 0

O R " ION

as r uejas rec amos ienen como origen undamen a a os usuarios de pro ec o a a comunidad de a ona

	IN I U ON" ION" D " RO OMI ION" J U I ND ROJ O D IN R" RU UR" D R"N OR M"NU" D IN R N OR" O R" I " UIMI N O" "N D " ID" D ON R" OD O R"	C DIGO	M PI M I R
		RSI	
		P GI "	

C " 0 0
Da Mes " o

NDI D I NI Para cada o je i o de ca idad de P an de Ca idad se de e es a ecer a menos un ndice de ges i n r ue permi a e a uar su es ado de cump imien o

uD d dDrd	Drd l	D rD D r l d dDrd " r r r u D d r D d d l
IG ndice de ges i n		
IG ndice de ges i n		
IG ndice de ges i n		
IG ndice de ges i n		
IG ndice de ges i n		
IGn ndice de ges i n n		

Para cada indicador de ges i n se de e de inir un u o represen a i o de mismo

O R " ION

" I R" I ND UI O IN I N M DI I NJ N "JO Se de e re acionar odo e er uipo r ue rer uiera de ca i raci n

ND	Dd ru D	M r	r	d r	ND r dDd r	d D r	D rD

O R " ION

NO "
Siempre r ue a guna de as respues as de es e orma o sea " O" e In er en or de e indicar en e espacio de o ser aciones as acciones omadas para dar cump imien o a a o igaci n

Firma:
Nombre: Milton Oviedo Parra
Director de Obra
Matricula Profesional No.:

irma
om re
Pro esiona en Ca idad Con ra o de O ra
Ma r cu a Pro esiona o

irma
om re M" RI" S " J IO GO a" a
Direc or de a In er en or a
Ma r cu a Pro esiona o 0 0 COR

irma
om re O " P IC"
Pro esiona en Ca idad Con ra o de In er en or a
Ma r cu a Pro esiona o

Origina In orme mensua de In er en or a " rc i o de Ges i n de l l" S
Copias nidad jecu ora In er en or Direcci n erri oria

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

Según CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO del Contrato de Obra Pública No 178 de 2023, el Municipio de Sahagún no pagará al Contratista de Obra anticipo y/o pago anticipado.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO DE OBRA

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

Según CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO del Contrato de Obra Pública No 178 de 2023, el Municipio de Sahagún no pagará al Contratista de Obra anticipo y/o pago anticipado.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO OBRA.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

- En el mes de julio de 2024 el Contratista entregó la reprogramación No 4 teniendo en cuenta la nueva prórroga.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
PROGRAMA DE OBRA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES

Se anexa el FORMATO MEPI-MN-IN-6-FR-1 PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN-IN-6-FR-1 PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA			
FECHA	1 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CORDOBA **PROGRAMA DE INVERSIONES** [x]

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 178-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** VIA APARTADA EL OLIVO - SAN FRANCISCO - LA PADILLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2274 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NACIONAL ET

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PLAZO ACUMULADO: 9,75 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/09/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ FECHA DE REANUDACIÓN: _____

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.210.302.904,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.210.302.904,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	
EXPLANACIONES	$49.491.088,00	2,26%		% P			0,02%	1,84%								
				$ P			$364.620,00	$ 40.190.730,00								
	$40.555.350,00	1,85%		$ E												
				% E												
PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO ANCHO CALZADA 6 M	$2.026.102.749,00	92,66%		% P				12,67%	10,14%	0,91%	1,14%	16,00%	9,15%	16,72%	16,72%	
				$ P				$277.027.856,00	$221.773.331,00	$20.000.000,00	$25.000.000,00	$349.734.346,15	$200.000.000,00	$365.642.572,00	$365.642.572	
	$1.824.820.677,00	83,46%		$ E												
				% E												
TRANSPORTE	$95.814.160,00	4,38%		% P				3,59%								
				$ P				$78.514.676,00								
	$78.514.676,00	3,59%		$ E												
				% E												
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	$12.265.980,00	0,56%		% P										0,32%	0,45%	
				$ P										$6.946.090,60	$9.785.549,00	
	$16.731.640,00	0,77%		$ E												
				% E												
CARACTERIZACION VIAL	$2.832.000,00	0,13%		% P										0,09%	0,04%	
				$ P										$1.865.922,00	$966.078,00	
	$2.832.000,00	0,13%		$ E												
				% E												
ITEM NO PREVISTO	$0,00	0,00%		% P					0,69%				4,54%	4,98%		
				$ P					$15.024.194,00				$99.231.480	$108.795.960		
	$223.051.634,00	10,20%		$ E												
				% E												
VALOR TOTAL DE OBRA (A)	$ 2.186.505.977,0	100%														
VALOR TOTAL DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 2.186.505.977,00	100%	0,00%													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,02%**	**18,10%**	**10,83%**	**0,91%**	**1,14%**	**16,00%**	**13,69%**	**22,10%**	**17,21%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$364.620**	**$395.733.262**	**$236.797.525**	**$20.000.000**	**$25.000.000**	**$349.734.346**	**$299.231.480**	**$483.250.545**	**$376.394.199**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,02%**	**18,12%**	**28,95%**	**29,86%**	**31%**	**47%**	**61%**	**83%**	**100%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$364.620**	**$396.097.882**	**$632.895.407**	**$652.895.407**	**$677.895.407,0**	**$1.027.629.753**	**$1.326.861.233**	**$1.810.111.778**	**$2.186.505.977**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$	4.842.131,30
	$	4.842.131,30
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	15.928.400,00
	$	15.928.400,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	3.026.396,00
	$	3.026.396,00
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$	23.796.927,30
	$	23.796.927,30
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C= (A+B)	$	2.210.302.904,30
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$	2.210.302.904,30

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES				
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO			EJECUTADO
BARRAS	$ Valor			$ Valor
CURVAS				

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: Milton Oviedo Parra
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: MARIA ESTHELA JULIO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se anexa el formato MEPIMN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPIMN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN-IN-14-FR-2 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

ACTAS DE REUNIÓN

En este periodo no se realizo acta de reunión.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Numero de proceso de Selección	CMA-DO-SRT-167-2021
Numero ID del SECOP	CO1.SLCNTR.7829516
Número del Contrato	2274 de 2021
Fecha de Suscripción	30 de diciembre de 2021
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3
Contratista	CONSORCIO NACIONAL ET NIT: 901.551.949-6 Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50%
Valor Inicial	$ 2.504.561.357,00
Adiciones	$1.750.480.000,00
Valor acumulado	$ 4.255.041.357,00
Fecha de Inicio	27 de enero de 2024.
Fecha de Terminación Inicial	31 de julio de 2022.
Suspensión No 1	10 de abril de 2024.
Reinicio No 1	25 de abril de 2024.
Fecha de Terminación Actual	Hasta el 31 de octubre de 2024.
Dirección	Diagonal 50a- #4-134 Villa del Rio, Montería
Número de Teléfono	312 6608540 – 3143149681

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA

Se relaciona a continuación las actividades desarrolladas por la Interventoría CONSORCIO NACIONAL ET durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2024.

- La supervisión, revisión, comprobación y verificación de la labor planeada y ejecutada por el Contratista de obra estuvo a cargo de personal dispuesto por la Interventoría en obra.

- La Interventoría CONSORCIO NACIONAL ET en el mes de junio de 2024 verificó si el Contratista contó con los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos, de acuerdo a los términos del contrato, y la correcta utilización de tales recursos durante la fase de ejecución del contrato. Para verificación de lo anterior, se cuenta con las anotaciones realizadas en la bitácora de obra (ver anexo-copia de bitácora).

- Los resultados de evaluar el avance y resultados del contrato, en comparación con el cronograma y plan previstos se resumen en los Informes Semanales de Interventoría.

- La Interventoría en el mes de julio de 2024 dispuso, administró y mantuvo en obra de personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de laboratorio y topográfico para el desarrollo de las funciones y compromisos adquiridos por el CONSORCIO NACIONAL ET.

- La Interventoría en el mes de julio de 2024 realizó seguimiento al avance físico-financiero y presupuestal del contrato de obra 099-2018, los resultados se plasmaron en informes semanales e informe Mensual.

- Durante el mes de julio de 2024 el CONSORCIO NACIONAL ET presentó cinco (5) Informes Semanales y un (1) Informe Mensual para fines pertinentes.

- La Interventoría llevó junto con el Contratista un diario de obra (bitácora), en el cual diariamente se consignan de manera legible todas las instrucciones, observaciones, ejecuciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra.

- El CONSORCIO NACIONAL ET lleva, mantiene actualizado y tiene a disposición el archivo con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demás documentos requeridos para el control de la ejecución de las obras. Este archivo hace parte de los anexos de los Informes Mensuales que la Interventoría presenta al INVIAS.

- El CONSORCIO NACIONAL ET realizó el pago de los aportes legales parafiscales y de seguridad social del personal vinculado a la Interventoría según la normatividad vigente para periodo.

5.3INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

En este periodo se contó con los siguientes especialistas y profesionales:

NOMBRE	CARGO
María Esthela Julio González	Directora de interventoría
Diana Lucia Corrales Martelo	Residente de interventoría
Erika Ruiz	Especialista ambiental de interventoría
Luz Angela Perdomo	Profesional social
Yudi Rosales	Profesional SST

A continuación, se relacionan los informes de las actividades realizadas en el periodo desde el 1 al 30 de julio de 2024.

INFORME EJECUTIVO DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA ESTHELA JULIO

CONSORCIO NACIONAL ET
NIT. 901.551.949-6

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

INTERVENTORIA: N° 2274-2021

OBJETO: técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento de vias terciarias del programa Colombia rural en los municipios del departamento de córdoba- grupo 3

Montería – Córdoba - Colombia

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-2024.

Elaborado:

Diagonal. 50ª # 4 – 134.
Villa del Rio.
TEL; 7931026

EMAIL: **consorcionacionalet@gmail.com**

MARIA ESTHELA JULIO G.
Directora de Interventoría.

Tabla de contenido

INTRODUCCION……..3

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO…….5

1.1 Localizacion…….5

1.2 informacion general del contrato de interventoria……...5

2. INFORME EJECUTIVO DE DIRECTOR DE OBRA……..…6

2.1. Funciones del director de obra…….6

3. DESCRIPCIONES DE ACTIVIDADES REALIZADAS ……7

4. RECOMENDACIÓN POR LA INTERVENTORIA ……..9

INTRODUCCION

El presente informe está orientado a la labor de Dirección de Interventoría realizada al Contrato de Obra No N° 2274-2021, que tiene por objeto técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los municipios del departamento de córdoba- grupo 3, la cual se encuentra a cargo de la Territorial Córdoba del INVIAS, suscribió convenios interadministrativos con municipios del Departamento de Córdoba cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", en los Municipios de Sahagún, San Carlos y San Pelayo, donde adelantaron los procesos contractuales bajo la modalidad de licitación pública, para los cuales se contrataron las siguientes obras cuyo objeto son:

1. AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGUN donde se suscribió el convenio No. 917 de 2021.
2. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL, donde se suscribió el convenio No. 919 de 2021
3. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL, donde se suscribió los convenios 937
4. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA- CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Mediante convenio suscrito 1180 de 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"


5. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS INTERSECCION VIA CERETE – CABUYA-COROZAMEDIO MUNICIPIO DE SAN CARLOS- DPTO. DE CORDOBA" DEL CONTRATO DE OBRA N° L.P.O.I.T-004-2023.
6. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"
7. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. - COLOMBIA RURAL.

Las tareas realizadas corresponden al seguimiento control y dirección de los procesos que ejecutan los contratistas de obra y en el periodo en curso de la garantizar la correcta ejecución de las obras contratadas en cada frente de trabajo. De igual manera se realiza seguimiento administrativo y financiero a los contratos de obra y convenio.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 **Localización**.

Las obras a construir se encuentran ubicadas en los municipios San Carlos, San Pelayo y Sahagún del departamento de Córdoba.

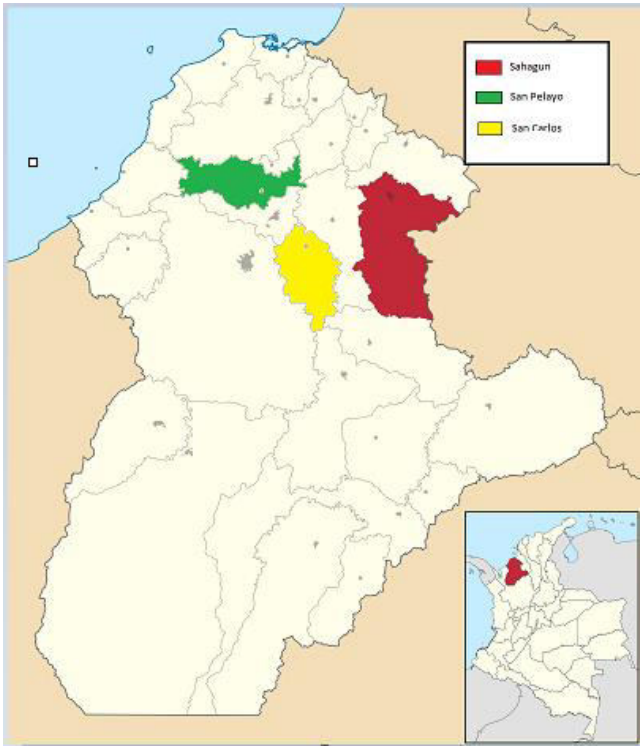

1.2 **información general del contrato de interventoría**

CONTRATO INVIAS DE INTERVENTORIA No.: 2274 DE 2021	
OBJETO:	técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los municipios del departamento de córdoba- grupo 3
VALOR INICIAL:	$ 2.504.561,357
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022
PRORROGA 1:	Hasta el 31 de Diciembre 2022
PRORROGA 2:	Hasta el 31 de Diciembre 2023
PRORROGA 3:	Hasta el 15 de Abril del 2024
PRORROGA 4:	Hasta el 31 octubre del 2024
FECHA DE INICIO:	Enero 27 de 2022
INTERVENTOR:	Consorcio Nacional ET

2. INFORME EJECUTIVO DE DIRECTOR DE OBRA

2.1 **funciones de director de interventoría**

- Dirigir, coordinar y verificar la ejecución de las obras contenidos en el objeto contractual, desde su iniciación hasta el recibo a satisfacción de las mismas

- Vigilar por el cumplimiento de los procedimientos y normas aplicables al proyecto en ejecución

- Verificar que el contrato se desarrolle dentro de los parámetros establecidos.

- Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre aspectos técnicos y resolverlas oportunamente.

- Controlar el avance de las obras de acuerdo con los programas y recomendaciones de las especificaciones de diseño, efectuar evaluaciones periódicas correspondientes.

- Semanalmente presentar informe de interventoría de acuerdo con lo solicitado por la entidad contratante.

- Mensualmente presentar informe de interventoría de acuerdo con lo solicitado por la entidad contratante.

- Tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación del contrato, si ello fuere necesario.

- Estudiar y conocer las características del proyecto y los requisitos contractuales.

- Asistir y asesorar a la entidad contratante en los aspectos contractuales especificados en el proyecto.

- Coordinar con el personal del contratista los compromisos adquiridos.

- Las demás que sean asignadas por el jefe inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo.

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS.

Las actividades realizadas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2024, Son las siguientes:

- Verificación y revisión de la documentación recibida por los contratistas e INVIAS.
- Revisar los informes semanales y mensuales de cada frente de obra.
- Coordinar el seguimiento por parte de los Ingenieros residentes, auxiliares e inspectores en cada una de las obras.
- Coordinar la topografía en las obras para verificación de sitios y cantidades.
- Revisar las cantidades ejecutadas en cada obra.
- Coordinar el seguimiento a la toma de densidades de cilindros y viguetas en cada obra.
- Se realiza actas de seguimiento con la veeduría de cada frente de obra.
- Se coordina la revisión y/o aprobación de los informes mensuales ambientales.
- Se coordina la revisión y/o aprobación de los informes mensuales sociales.
- Se hace seguimiento a los rendimientos generados por la cuenta conjunta en los Municipios.
- Se coordina el seguimiento en el proceso de seguridad en el trabajo (SST) y la verificación del cumplimiento del PAPSO en las obras.
    - Se verifica el plan de inspección de ensayos mensual.
    - Se hace seguimiento al control de calidad en las obras.
    - Se coordina el seguimiento social en cada frente de obra.
    - Asisto a comités de obra con INVIAS, municipios y contratistas.
    - Se realiza recorridos mensuales a las diferentes obras, con INVIAS, contratista y Municipios.
- Se hace seguimiento de obras físicas en los siguientes frentes:

1 **vía san Carlos** – cerete (cuatro caminos) el cañito - soledad vía Ciénega de oro, como directora de interventoría, me complace informar que el contrato de obra ha concluido satisfactoriamente. Tras una supervisión exhaustiva y constante, puedo confirmar que todas las actividades y entregables especificados en el contrato han sido cumplidos de acuerdo con los estándares de calidad y los plazos establecidos.

2 **Vía San Pelayo** – santa lucia con el corregimiento cuero curtido. Se terminaron las obras al 100% de acuerdo a lo contratado, se terminaron el dia 30 de julio del 2024. y se encuentra en proceso de liquidacion.

3 **Vía san Pelayo** – la madera, el contrato de obra termino el 30 de septiembre del 2023. se encuentra en proceso de liquidación.

4 **Vías que pertenecen al municipio de Sahagún. al contratista se le inicio**

Se terminaron obras el 30 de abril del 2024. Y se encuentra en proceso de liquidación.

- ✓ Vía la montañita – pica Flores – pica- pical.
- ✓ Vía apartada el olvido- san francisco – la padilla.
- ✓ Vía salitral – la ye
- ✓ Vías las manuelitas – la perla- Holanda – ranchería.
- ✓ Vía las llanadas – salcipuedes
- ✓ Vía Sahagún Maturín.
- ✓ Agua viva.

5. Vía de corredores rurales productivos intersección vía cerete – cabuya-coroza medio municipio de san Carlos.

- Se realizó socialización el 16 se agosto en san Carlos sector de cabuya del contrato de obra N° L.P.O.I.T-004-2023.
- Se realizó acta de inicio del contrato de obra N° L.P.O.I.T-004-2023. Con fecha del 16 de agosto.
- Se realizó conformación de la veeduría para el contrato de obra N° L.P.O.I.T-004-2023.
- Se continua en la ejecución del pavimento.

6. Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación del corredor rural que comunica desde la variante santa lucia – san Pelayo con el corregimiento de cuero curtido en el municipio de san Pelayo, córdoba"

Contrato N. LP- 007- 2023

- Se realizó reunión técnica inicial y acta de inicio el 25 de septiembre del 2023 el contrato termino el 31 de julio del 2024, al 100% de laas obras contratadas

- El contratista se encuentra en liquidacion del contrato de obra

y se encuentra en tramites la liquidacion del convenio.

7. Vía la aparata el olivo - san francisco – la padilla que pertenecen al municipio de Sahagún.

Contrato N. 178 de 2023**.**

- Se realizó reunión técnica inicial y acta de inicio el 25 de septiembre del 2023
- El contratista termino el contrato el 31 de julio del 2024.

El contratista termino las obras al 100% de lo contratado.

se termino el dia 30 de julio del 2024. y se encuentra en liquidacion.

4. RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Una vez terminada el periodo transcurrido de este informe se le recomiendo a los contratistas.

- Se recomienda a los contratistas aumentar el rendimiento en las actividades para evitar retrasos en las obras.


- Los contratistas deberán entregar mes a mes el plan de inspección de ensayos de los materiales a utilizar.

- Los municipios deberán realizar la devolución de los rendimientos mes a mes de la cuenta conjunta a la cuenta del tesoro nacional.

- Se recomienda a los contratistas entregar los informes mensuales ambientales y sociales.

- Se realizan comité de veeduría mensual en cada contrato de obra.

Esta interventoría en cumplimiento a sus funciones técnica, administrativa, financiera y ambiental, ha realizado el debido seguimiento a cada una de las obras contratadas.



MARIA ESTHELA JULIO
Directora de interventoría
MP: 22202170671COR

INFORME RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIANA LUCIA CORRALES MARTELO

CONSORCIO NACIONAL ET
NIT. 901.551.949-6

MINISTERIO DE TRANSPORTE

O J O l r Dr
d r r
r
D d r r
d rD r DD rur
D u D d d r D
d rdD ru D

ON R" O D O R" ND
O J O
MM JOR" MI N O
M" N NIMI N O J
R " I I " I N D
ORR DOR RUR"
RODU I O N MUNI I IO
D " N " JO
D " R " M N O D RDO "
– O OM I" RUR"

MD r – rdD DD

D D –
d R D

M" I consorcionacionalet@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

IN ORM
D " I ID" D M D
JU IO

Dr dD

DIANA LUCIA CORRALES MARTELO
Residente de Interventoría.

INTRODUCCION

Este informe tiene como fin presentar las actividades realizadas por parte de la residencia en interventoría durante el periodo comprendido entre los días 1 al 30 de JULIO de 2024, en lo que se refiere al Contrato de Interventoría No 2274-2021, que tiene por Objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3", en aras de cumplir lo especificado en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías.

Las tareas realizadas corresponden al seguimiento y control que se enfocaron en el continuo desarrollo de las actividades en obra, las que deben estar enfocadas en el plan de calidad, papso y con los parámetros establecidos en el Manual de Interventoría de Invias.

De igual manera se realiza seguimiento administrativo y financiero de cada uno del contrato de obra No 178 DE 31 DE AGOSTO DE 2023 que tiene por objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL

INFORME EJECUTIVO DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FUNCIONES DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Dentro de las funciones del ingeniero residente de interventoría, se encuentran las siguientes:

- Conocer las Especificaciones de cada uno de los proyectos
- Elaborar un cronograma que contendrá las actividades a desarrollar por la interventoría, durante la ejecución del contrato, el cual deberá estar acorde con el desarrollo de la construcción.
- Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar
- Elaborar todos los informes semanales, mensuales y demás que requieran durante la ejecución del proyecto y que se encuentren relacionados con la ejecución del contrato.
- Velar por el cumplimiento del cronograma establecido por el contratista
- Controlar el programa de inversión del constructor
- Efectuar la revisión de cada informe soporte de los cobros por parte del constructor
- Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance de obra, en relación con el cronograma, con el fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos inherentes a este proyecto.
- Elaborar el acta mensual de recibo de informe de pago de acuerdo con las reglas de participación y con los trabajos efectuados por el constructor.
- Solicitar las Fichas técnicas, catálogos, planos de instalación y demás documentos

- Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con lo establecido en los planos y especificaciones técnicas de construcción, dando cumplimiento a las normas vigentes de construcción.

- Inspeccionar la instalación de cada ítem de manera correcta

- Mantener balanceado el contrato de obra

- Realizar mediciones y elaborar Pre-actas de obra de las actividades a su cargo.
- Verificar que el contratista realice las actualizaciones permanentes a los planos de construcción, consignando la modificación que se realice durante la ejecución de la actividad.

- Revisar y aprobar los planos récords de las actividades a su cargo

- Elaborar informes semanales de avance de actividades a su cargo, los cuales deben entregarse a la dirección de interventoría

- Elaborar informes mensuales de avance de actividades a su cargo las cuales deben entregarse a la dirección de interventoría

- Coordinar con los demás profesionales de la interventoría y contratista, la ejecución de las actividades a su cargo, de tal forma que eviten traumatismo por causas de interferencias o sobreasignación de recursos.

- Mantener informado a la dirección de interventoría acerca de los

hechos que se presenten durante la ejecución de las actividades

- Diligenciar y tramitar las actas de comité de obra que se realicen con el contratista de obra, supervisión e interventoría.

- Diligenciar la Bitácora de actividades del contrato de obra que está asignado a su cargo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo comprendido entre los días 1 al 30 Julio de 2024, se realizó por parte de la residencia de interventoría las siguientes actividades:

1. Realización de la Bitácora de actividades de obra

2. Supervisión a las actividades realizadas en obra.

3. Entrega de oficios y recomendaciones al contratista solicitando mayor rendimiento en todas las actividades a ejecutar debido a que durante este periodo se finaliza el contrato.

4. Se realizó acompañamiento, a la reunión con la veeduría, contratista e interventoría se menciona avance de obra y se explicó las actividades que se realizarán para la entrega oportuna de la obra.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo transcurrido de este informe podemos concluir lo siguiente:

1. Con respecto al avance general del contrato tenemos una ejecución del 100% contra un programado de 100%, esto evidencia que el contratista realizo todas las actividades relacionadas en la programación.

2. El contratista durante este periodo presento y ejecutó plan de contingencia para dar cumplimiento a satisfacción de todas las actividades pendientes de obra, para dar cumplimiento como estaba programado.

3. Verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Contratista.

4. Realizar los levantamientos topográficos y las mediciones de campo necesarias para el control de cantidades ejecutadas y por ejecutar.

5. Control del personal y maquinaria mínimo ofrecido por el contratista.

6. Realizar seguimiento y control al cronograma de obra.

7. Realizar seguimiento a los procesos constructivos de las actividades que se realizan dentro de la ejecución del contrato.



Diana Corrales Martelo
Ing. Residente de Interventoría
M.P 22202112825COR

INFORME DE GESTION AMBIENTAL

ON OR IO N" ION"

I ORM M S "
"M I " o 0

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3

ON R" O ND d

Tabla de contenido

I ROD CCIO 2
D SCRIPCIO D PROJ C O 3
oca i aci n 3
In ormaci n genera de con ra o de In er en or a....3
In ormaci n genera de os con ra os de o ra....4
" C I ID" D S R " la" D" S....4
" c i idades de a in er en or a....4
Re isi n de P" G" S....4
Se remi i ersi n a p an de in ersi n am ien a en ceros 0 para os siguien es con ra os 5
In ormes mensua es de seguimien o am ien a 5
O icios remi idos....9
Regis ro o ogr ico 10
CO C SIO S J R COM D" CIO S 11

IS " D " " S

Tabla 1 Información Contrato 4
Tabla 2 Información contractual 4
Tabla 3 Estado PAGA en cada contrato 5
Tabla 4 Relación de informes mensuales contratos etapa No 1....8
Tabla 5 Relación de informes mensuales contratos etapa No 2....9
Tabla 6 Oficios remitidos....10
Tabla 7 Registro fotográfico 11

IS " D I S R" CIO S

Ilustración 1 Ubicación obras 3

IN RODU ION

ins i u o aciona de l l" S suscri i e con ra o o D 0 para rea i ar a l R OR " C IC" " DMI IS R" I " I " CI R" " M l " P" R" M" IMI O J M JOR" MI O D RCI" RI" S D PROGR" M" "CO OM I" R R" " M ICIPIOS D D P" R " M O D C RDO " – GR PO den ro de desarro o de os con ra os de o ra suscri o con di eren es a ca d as de depar amen o de C rdo a

n consecuencia es e documen o se presen a para dar cump imien o a rer uerimien o de presen aci n por par e de es a in er en or a de in orme mensua de a ges i n rea i ada periodo de in orme comprendido en re a de ju io de 0

presen e in orme se encuen ra es ruc urado con ase en os rer uerimien os so ici ados en e Manua de In er en or a de l l" S a Gu a de Manejo " m ien a de pro ec os de in raes ruc ura su sec or ia segunda edici n de a ri de 0 me odo og a p an de cargas de ra ajo de P iego de Condiciones e " p ndice D – Ges i n " m ien a de concurso de m ri os CM" DO SR 0

D RI ION D ROJ O

D

as o ras a cons ruir se encuen ran u icadas en e D P" R " M O D CORDO " en os municipios San Car os San Pe a o Sa ag n

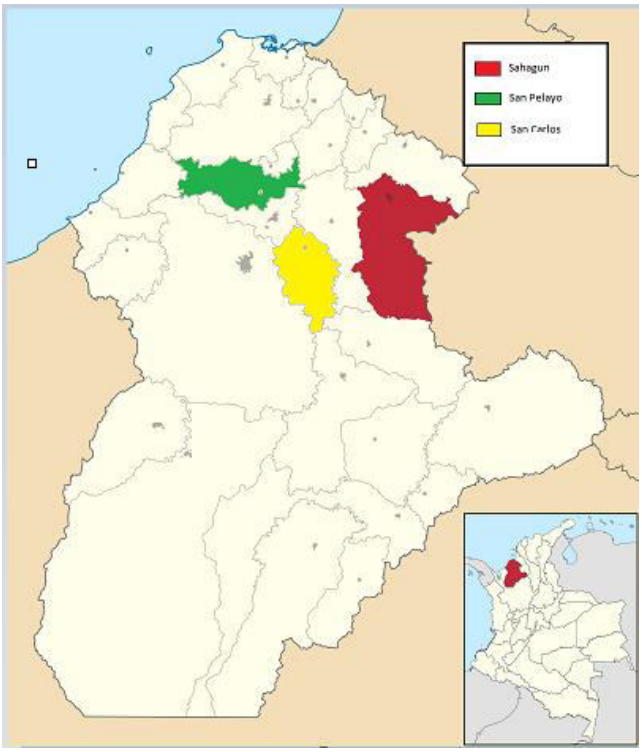


Ilustración 1 Ubicación obras

l Dr r d D r D d l r Dr

ON R" O IN I" D IN R N ORI" ND D	
O J O	I R OR " C IC" " DMI IS R" I " I " CI R" " M I " P" R" M" IMI O J M JOR" MI O D RCI" RI" S D PROGR" M" "CO OM I" R R" " M ICIPIOS D D P" R " M O D C RDO " – GR PO
" OR " C " la" DO	0 0
P " aO I ICI"	as a e de diciem re de 0
C " D I ICIO	nero de 0

C " D RMI " CIO	Oc u re de 0

Tabla 1 Información Contrato

l Dr r d D D r D d D r

ND	R N	ON R" RI "	" OR	R UR O " "	" " D INI IO	" IN" I " ION
	Con ra o de O ra p ica o de a o 0 Municipio de Sa ag n	I RSIO S PS" a S" S	0	0 0	0	0 0
	Con ra o de O ra p ica o P I 00 de a o 0 Municipio de San Car os	CO SORCIO P " " R P O SC			0	0 0
	Con ra o de O ra p ica P 00 0 Municipio de San Pe a o	CO SORCIO RRO	0	0 0	0	0 0
	Con ra o de O ra p ica P 0 0 0 Municipio de San Pe a o	CO SORCIO I" " M" D R"	0	0	0	0 0 0
	Con ra o De O ra P ica o P O I 00 0 San Car os	CO SORCIO CORR DOR S PROD C I OS	4.698.545.127		0 Inicio sico de o ras 0	0 0
	Con ra o de o ra o D 0 Municipio de Sa ag n	CO SORCIO CORR DOR S R R" S	2.210.302.904		0 0 Inicio sico de o ras 0	0 0
	Con ra o de o ra p ica P 00 0 Municipio de San Pe a o	CO SORCIO I" S D P " J O	4.592.475.403		0 0 Inicio sico de o ras 0	0 0

Tabla 2 Información contractual

" l lD" D R " l " D"

" d d d r Dr

R d " "

" a ec a se an rea i ado a re isi n de os P" G" S de os siguien es con ra os os cua es cuen an con orden de inicio

ND	R N	" "

	Con ra o de O ra p ica o de a o 0 Municipio de Sa ag n	" pro ado en ersi n o con concep o de acep aci n de In ias
	Con ra o de O ra p ica o P I 00 de a o 0 Municipio de San Car os	" pro ado en ersi n o con concep o de acep aci n de In ias
	Con ra o de O ra p ica P 00 0 Municipio de San Pe a o	" pro ado en ersi n o con concep o de acep aci n de In ias
	Con ra o de O ra p ica P 0 0 0 Municipio de San Pe a o	" pro ado en ersi n o con concep o de acep aci n de In ias
	Mejoramien o J Man enimien o De Corredores Rura es Produc i os Municipio De San Car os Dp o De C rdo a	" pro ado en ersi n o con concep o de acep aci n de In ias
	Mejoramien o man enimien o re a i i aci n de corredores rura es produc i os – “Colombia rural” en el municipio de Sa ag n C rdo a	" pro ado en ersi n remi ido a in ias median e o icio
	Mejoramien o man enimien o re a i i aci n de corredor rura r ue comunica desde a arian e san a ucia San Pe a o con e corregimien o cuero cur ido en e municipio de San Pe a o C rdo a	" pro ado en ersi n o Remi ido a in ias median e o icio

Tabla 3 Estado PAGA en cada contrato

Se remi i ersi n a p an de in ersi n am ien a en ceros 0 para os siguien es con ra os

- Con ra o de O ra p ica o P I 00 de a o 0 Municipio de San Car os
- Con ra o de O ra p ica P 00 0 Municipio de San Pe a o
- Con ra o de O ra p ica P 0 0 0 Municipio de San Pe a o
- Con ra o de O ra p ica P de a o 0 Municipio de Sa ag n

Se remi i ersi n a p an de in ersi n am ien a en ceros 0 para e siguien e con ra o

- Con ra o De O ra P ica o P O I 00 0 Municipio de San Car os
- Con ra o de o ra p ica P 00 0 Municipio de San Pe a o
- Con ra o de o ra o D 0 Municipio de Sa ag n

l Dr u d u D

n a a a o se re aciona e es ado de cada uno de os in ormes mensua es de seguimien o am ien a

INFORME	**D r Dd O r ND d D Mu D d**	**D r Dd O r ND l d D Mu Dd r D**	**D r Dd O r Mu Dd D**	**D r Dd O r Mu Dd D**
l Dr ND – d r Dd	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o

l Dr ND – d r d	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o
l Dr ND – d Dd	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o
l Dr ND – d ju Dd	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o
l Dr ND – d ju Dd	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o	" pro ado en ersi n o
l Dr ND – d D Dd	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS 0	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS 0	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS 0
l Dr ND d r d	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS 0	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS 0
l Dr ND d D u r d	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS 0	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS 0
l Dr ND d D r d	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS	Remi ido a In ias median e comunicado de de diciem re de 0	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS	Remi ido a In ias median e comunicado de de e rero de 0
l Dr ND d d r d	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS	Remi ido a In ias median e comunicado de 0 de e rero de 0	Remi ido a In ias median e comunicado de de e rero de 0	Remi ido a In ias median e comunicado de de e rero de 0
l Dr ND d rDd	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS	Remi ido a In ias median e comunicado de 0 de e rero de 0	Remi ido a In ias median e comunicado de de e rero de 0	Remi ido a In ias median e comunicado de de e rero de 0
l Dr ND d r rDd	" pro ado median e o icio	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS 0	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS	Remi ido a In ias median e comunicado de de a ri de 0

l Dr ND d r Dd	" pro ado median e comunicado de de mar o de 0	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS	" cep ado por Su direcci n de sos eni i idad median e comunicado SS	Remi ido a In ias median e comunicado de de a ri de 0
l Dr ND d r d	" pro ado median e comunicado de de mar o de 0	Remi ido a In ias median e comunicado 0 de de junio de 0	Se remi i median e 0 a In ias	Se remi i median e a In ias
l Dr ND d Dd	" pro ado median e comunicado de de mar o de 0	Remi ido a In ias median e comunicado 0 de de junio de 0	Se remi i median e 0 a In ias	Se remi i median e a In ias
l Dr ND d ju Dd	" pro ado median e comunicado de de mar o de 0	Remi ido a in ias median e comunicado 0	Se remi i median e 0 a In ias	Se remi i median e a In ias
l Dr ND d ju Dd	" pro ado median e comunicado de de mar o de 0	Remi ido a in ias median e comunicado 0	Se remi i median e 0 a In ias	Se remi i median e a In ias
l Dr ND d D Dd	" pro ado median e comunicado de de mar o de 0	Remi ido a in ias median e comunicado	" pro ado median e comunicado	" pro ado median e o icio
l Dr ND d r d	" pro ado median e comunicado de de mar o de 0	Remi ido a In ias median e comunicado	" pro ado median e comunicado	" pro ado median e o icio
l Dr ND d D u r d	" pro ado median e comunicado de de mar o de 0	Remi ido a In ias median e comunicado	" pro ado median e comunicado	" con ra o ina i ado
l Dr ND d D r d	" pro ado median e o icio	Remi ido a In ias median e	" pro ado median e	" con ra o ina i ado

		comunicado	comunicado	
l Dr ND d d r d	" pro ado median e o icio	Remi ido a In ias median e comunicado	" pro ado median e comunicado	" con ra o ina i ado
l Dr ND – d rD	So ici ado 0	Remi ido a In ias median e comunicado	" pro ado median e comunicado	" con ra o ina i ado
l Dr ND – d r rD	So ici ado	So ici ado median e o icio 0	So ici ado	" con ra o ina i ado
l Dr ND – d r D	So ici ado median e o icio	So ici ado median e o icio 0	o a sido remi ido por e con ra is a	" con ra o ina i ado
l Dr ND – d r	" con ra o ina i ado	" pro ado	o a sido remi ido por e con ra is a	" con ra o ina i ado
l Dr ND – d D	" con ra o ina i ado	" pro ado	o a sido remi ido por e con ra is a	" con ra o ina i ado
l Dr ND – d ju D	" con ra o ina i ado	o a sido remi ido por e con ra is a	o a sido remi ido por e con ra is a	" con ra o ina i ado

Tabla 4 Relación de informes mensuales contratos etapa No 1

Para os con ra os r ue iniciaron en e segundo semes re de a o 0 e es ado de os in ormes de seguimien o am ien a es e siguien e

INFORME	**D r D D O r ND O l r D**	**D r D d D r ND D Mu D d**	**D r D d D r N Mu D d D**
l Dr ND – d D r	Remi ido a In ias median e o icio 00	" pro ado median e comunicado	as o ras no en an inicio sico
l Dr ND – d d r	Remi ido a In ias median e o icio 00	O ser ado median e comunicado Rei erado median e comunicado	Remi ido a In ias median e o icio 0
l Dr ND – d rD	Remi ido a In ias median e o icio	O ser ado median e comunicado Rei erado median e comunicado Rei erado median e comunicado	" pro ado median e comunicado 0
l Dr ND – d r rD	" pro ado remi idos a in ias	O ser ado median e comunicado	" pro ado median e comunicado

l Dr ND – d r D	" pro ado remi idos a in ias	O ser ado median e comunicado 0	" pro ado median e comunicado
l Dr ND – d r	" pro ado remi idos a in ias	O ser ado	" pro ado median e 0
l Dr ND – d D	" pro ado	o a sido remi ido por e con ra is a	" pro ado
l Dr ND – d ju D	o a sido remi ido por e con ra is a	o a sido remi ido por e con ra is a	" pro ado

Tabla 5 Relación de informes mensuales contratos etapa No 2

O D r dD

Duran e e periodo es a in er en or a emi i os siguien es o icios

O D	**" u D**
	" PRO " CIO M S " O J IO 0 CO R" O P 00 S" P " J O
	SO ICI D " " C " M I " " " RMI " CI D CO R" O J SO ICI D M S " J IO D 0 D CO R" O D O R" O P 00 D 0 C J O O J O S M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CI D CORR DOR R R" COM IC" D SD " " RI" S" " CI" – S" P " J O CO CORR GIMI O D C RO C R IDO M ICIPIO D S" P " J O C RDO "
	SO ICI D " " C " M I " " " RMI " CIO D " O R" CO R" O P 00 S" P " J O
	SO ICI D " " C " M I " " " RMI " CI CO R" O J SO ICI D D I ORM M S " D J IO 0 D S" RRO O D CO R" O D O R" O P I 00 D 0 C J O O J O S M JOR" MI O M DI" " CO S R CCI D P" IM O R GIDO " " I RS CCI " S" C" R OS C R C " RO C" MI OS – C" I O SO D" D " CI " G" D ORO M ICIPIO D S" C" R OS
	R I R" CIO 0 0 SO ICI D " " C " M I " CO R" O D O R" o D 0 C J O O J O S M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CI D CORR DOR S R R" S PROD C I OS “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO D S" " G C RDO "
	R I R" CIO COM IC" DOS 0 0 SO ICI D I ORM R RO J M" RaO 0 D D CO R" O D O R" o D 0 C J O O J O S M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CI D CORR DOR S R R" S PROD C I OS “COLOMBIA RURAL” EN EL M ICIPIO D S" " G C RDO "
	R I R" CI COM IC" DO SO ICI D " C " M I " " " RMI " CI D CO R" O D O R"
	R I R" CI COM IC" DOS 0 J O S R " CIO S M S " DICI M R 0 RO 0 R RO 0 M" RaO 0

	O S R " CIO S " RI 0 SO ICI D M S " M" J O J J IO 0
00	R SPS S " 0 S OG 0 0 J 0 S OG 0 CO R" O D O R" O P O I 00 0 C J O O J O S “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES PROD C I OS M ICIPIO D S" C" R OS DP O D C RDO "
00	R MISI RIM S R" O CO R" O D O R" O D 0 C J O O J O S M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CI D CORR DOR S R R" S PROD C I OS – “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA

Tabla 6 Oficios remitidos

R rD D D r D



D D ND Se a i aci n O ra – Municipio de San Car os con ra o de o ra o P O I 00 0



D D ND Se a i aci n O ra – Municipio de San Car os con ra o de o ra o P O I 00 0



D D ND Se a i aci n con ra o 00 – Municipio de San Pe a o



D D ND Se a i aci n con ra o 00 – Municipio de San Pe a o

	
D D ND Se e idencia a a de se a i aci n con ra o 00 – Municipio de San Pe a o	**D D ND** Se e idencia a a de se a i aci n con ra o 00 –Municipio de San Pe a o

Tabla 7 Registro fotográfico

ON U ION J R OM ND" ION

" con inuaci n se re aciona as conc usiones as recomendaciones r ue par en de a re isi n de os documen os P" G" en regados por e con ra is a

os in ormes mensua es de en ser en regados a m s ardar e d a de cada mes

2. " a ec a se a presen ado e in orme rimes ra o de seguimien o am ien a de os Con ra os de O ra p ica o P I 00 de a o 0 Municipio de San Car os J San Pe a o erron n e con ra o de Sa ag n de 0 se encuen ra presen ado as a e rimes ra o

   Para e con ra o de Sa ag n de 0 e cua ina i o e d a de mar o de 0 se encuen ra pendien e e en i de os in ormes de e rero mar o de 0 e a ance am ien a a a erminaci n de con ra o de O ra se a rer uerido a a a ca d a de Sa ag n e proceso de incump imien o por e no cump imien o de es a o igaci n de con ra is a I RSIO S PS" a S" S a a ec a a a ca d a no a emi ido ning n pronunciamien o so re a so ici ud de incump imien o rea i ada por a no en rego de mensua es a ance am ien a

   con ra o de Madera se remi i a ance am ien a a a erminaci n de con ra o de o ra a In ias e cua ue apro ado median e comunicado 0 S OG 0

   Para e con ra o de Con ra o De O ra P ica o P O I 00 0 Municipio de San Car os se an en regado rimes ra os cua es ueron apro ados por a

direcci n de sos eni i idad se radico e rimes ra o e cua se encuen ra pendien e de apro aci n

Para e Con ra o de o ra p ica P 00 0 Municipio de San Pe a o se an en regado rimes ra

Con ra o de o ra o D 0 Municipio de Sa ag n iene os in ormes mensua es o ser ados desde e in orme correspondien e a os meses de e rero mar o a ri de 0 no a remi ido e in orme de mes de ma o de 0

Se remi i rimes ra o de con ra o de o ra o D 0 Municipio de Sa ag n



RI " " O " RUI R" N
Ingeniera Ci i GC
sp en gerencia de Cons rucciones P J
sp en am ien e desarro o oca D JC

INFORME DE GESTION SOCIAL
LUZ ANGELA PERDOMO

CONSORCIO NACIONAL ET **NIT. 901.551.949-6**	
INTERVENTORIA: N° 2274-2021 **OBJETO: técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los municipios del departamento de córdoba- grupo 3** **Montería – Córdoba - Colombia** **Diagonal. 50ª # 4 – 134.** **Villa del Rio.** **TEL; 7931026** **EMAIL:** **consorcionacionalet@gmail.com**	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA **INFORME** DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA DE GESTION SOCIAL - PROYECTO SAHAGUN - MES DE JULIO- 2024. **Elaborado:** LUZ ANGELA PERDOMO MORALES. Social de Interventoría.

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN EL ÁREA SOCIAL.

PROYECTO SAHAGÚN.

CONTRATO DE OBRA No. 178 DE 2023 CUYO OBJETO ES **"**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, CORDOBA".
se desarrolla en el tramo vía apartada el Olivo -San Francisco zona rural del municipio de Sahagún.

En el área social de Interventoría, se envió a la contratista el siguiente comunicado:

- El día 22 de julio se envió al contratista oficio ET-2274-1995 ASUNTO: SOLICITUD REQUERIMIENTOS PARA FINALIZACION DEL PROCESO DE TERMINACION DE CONTRATO EN LA GESTION SOCIAL.

- El día 18 de julio se realizo visita a obra, con el fin de verificar las actividades de gestión social, verificación punto de atención al ciudadano, buzón de sugerencia con sus respectivos formatos de PQRS, seguimiento a actividades del plan de manejo vial, entre otras.

OBSERVACIONES:

En la carpeta digital del contrato se encuentran los anexos:

- ✓ SE ANEXAN EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES SOCIALES
- ✓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 REGISTRO FOTOGRÁFICO-JULIO.

Luz Angela Perdomo M.

LUZ ANGELA PERDOMO MORALES

Social de Interventoría.

INFORME DE PROFESIONAL SST

YUDIS ROSALES MORALES

CONSORCIO NACIONAL ET **NIT. 901.551.949-6**	
INTERVENTORIA: N° 2274-2021 **OBJETO: técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los municipios del departamento de córdoba- grupo 3** **Montería – Córdoba - Colombia** **Diagonal. 50ª # 4 – 134.** **Villa del Rio.** **TEL; 7931026** **EMAIL:** **consorcionacionalet@gmail.com**	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA **INFORME** DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – PROYECTO SAHAGUN **178** - MES DE JULIO - 2024. **Elaborado:** YUDY DIREY ROSALES MUÑOZ. Profesional SST Interventoría.

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

PROYECTO SAHAGUN OLIVOS 178.

En el área de INSPECCIÓN SST de la interventoría para el **CONTRATO DE OBRA No. 178 DE 2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, CORDOBA** se realizó las siguientes actividades:

SEMANA DEL 1 AL 6 DE JULIO 2024

Se realizó visita de seguimiento y se verificó las siguientes actividades acordes a la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la obra: afiliaciones de seguridad social de personal, exámenes de ingreso laboral, inducciones, entrega de dotación y EPP, charla y capacitaciones SST, inspecciones de seguridad de obra, instalación y permanencia de kit de emergencia, punto ecológico, implementación de plan de manejo vial, entre otras,

Se redactó párrafo de gestión SST-social-ambiental para incluir a corte de en informe semanal:

En el área SST se verificó permanencia de señalización de acuerdo al plan de manejo vial, y la entrega de documentación de afiliaciones a seguridad social, entrega y reposición y uso de EPP en los frentes de obra. El contratista continúa sin radicar informe SST de junio incluyendo planilla de seguridad social junio-julio 2024. En el área social, se envía comunicado al contratista ET-2274-1946 SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE JUNIO DE 2024, a la fecha el contratista no ha entregado informe mensual social del mes de junio de 2024.

SEMANA DEL 8 AL 13 DE JULIO 2024

Se realizó visita de seguimiento y se verificó las siguientes actividades acordes a la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la obra: afiliaciones de seguridad social de personal, exámenes de ingreso laboral, inducciones, entrega de dotación y EPP, charla y capacitaciones SST, inspecciones de seguridad de obra, instalación y permanencia de kit de emergencia, punto ecológico, implementación de plan de manejo vial, entre otras.

Se redactó párrafo de gestión SST-social-ambiental para incluir a corte de en informe semanal:

En el área SST se verificó permanencia de señalización de acuerdo al plan de manejo vial, y la entrega de documentación de afiliaciones a seguridad social, entrega y reposición y uso de EPP en los frentes de obra. El contratista continúa sin radicar informe SST de junio incluyendo planilla de seguridad social junio-julio 2024. En el área social, el contratista envió informe mensual social del mes de junio.

SEMANA DEL 15 AL 20 JULIO 2024

Se realizó visita de seguimiento y se verificó las siguientes actividades acordes a la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la obra: afiliaciones de seguridad social de personal, exámenes de ingreso laboral, inducciones, entrega de dotación y EPP, charla y capacitaciones SST, inspecciones de seguridad de obra, instalación y permanencia de kit de emergencia, punto ecológico, implementación de plan de manejo vial, entre otras,

El 18 de julio 2024 se envió COMUNICADO ET-2274-1983 NO CONFORMIDADES ÁREA SST, ÁREA AMBIENTAL, PLAN DE MANEJO VIAL

Se redactó párrafo de gestión SST-social-ambiental para incluir a corte de en informe semanal:

En el área SST se verificó permanencia de señalización de acuerdo al plan de manejo vial, y la entrega de documentación de afiliaciones a seguridad social, entrega y reposición y uso de EPP en los frentes de obra. El contratista radicó informe SST de junio incluyendo planilla de seguridad social junio-julio 2024. Se envió comunicación ET-2274-1983 ASUNTO: NO CONFORMIDADES ÁREA SST, ÁREA AMBIENTAL, PLAN DE MANEJO VIAL. En el área social, el contratista envió informe mensual social del mes de junio. En el área social se recomienda continuar con las actividades de gestión social paga.

SEMANA DEL 22 AL 27 DE JULIO 2024

Se realizó visita de seguimiento y se verificó las siguientes actividades acordes a la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la obra: afiliaciones de seguridad social de personal, exámenes de ingreso laboral, inducciones, entrega de dotación y EPP, charla y capacitaciones SST, inspecciones de seguridad de obra, instalación y permanencia de kit de emergencia, punto ecológico, implementación de plan de manejo vial, entre otras

El 22 de julio 2024 se envió Se envió COMUNICADO ET-2274-1991 ASUNTO: SOLICITUD DOCUMENTOS DEL ÁREA SST PARA CIERRE DE PROYECTO.

Se redactó párrafo de gestión SST-social-ambiental para incluir a corte de en informe semanal:

En el área SST se verificó permanencia de señalización de acuerdo al plan de manejo vial, y la entrega de documentación de afiliaciones a seguridad social, entrega y reposición y uso de EPP en los frentes de obra. Se envió COMUNICADO ET-2274-1991 ASUNTO: SOLICITUD DOCUMENTOS DEL ÁREA SST PARA CIERRE DE PROYECTO, En el área social, COMUNICADO ET-2274-1995 SOLICITUD REQUERIMIENTOS PARA FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO EN LA GESTIÓN SOCIAL.

SEMANA DEL 29, 30 Y 31 DE JULIO 2024

Se realizó visita de seguimiento y se verificó las siguientes actividades acordes a la ejecución del

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la obra: afiliaciones de seguridad social de personal, exámenes de ingreso laboral, inducciones, entrega de dotación y EPP, charla y capacitaciones SST, inspecciones de seguridad de obra, instalación y permanencia de kit de emergencia, punto ecológico, implementación de plan de manejo vial, entre otras

NOTA ACLARATORIA.

- ✓ El contratista entregó informe SST de junio incluyendo planilla de seguridad social del mes de junio-julio 2024.
- ✓ El contratista entregó informe SST julio 2024.
- ✓ Tiene pendiente entregar planilla de seguridad social de julio 2024, la cual debe ser cancelada a corte de 31 de julio 2024.
- ✓ Todos los documentos pendientes por entregar, son de conocimiento del contratista mediante oficios enviados por la interventoría.

ANEXOS:

- ✓ MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA JULIO 2024- SAHAGUN OLIVOS 178.
- ✓ INFORME SST CONTRATISTA MES DE JUNIO 2024 -PERIODO PASADO.
- ✓ INFORME SST CONTRATISTA MES DE JULIO 2024
- ✓ PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE JUNIO-JULIO 2024 DE PERSONAL DEPENDIENTE CONTRATISTA. (PAGADA EN JULIO)

Yudy D. Rosales M.

YUDY DIREY ROSALES MUÑOZ

Profesional SST Interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Foto No. 1: Verificación de señalización de obra.	Foto No. 2:
	
Foto No. 3: Verificación de señalización de obra.	Foto No. 4: Verificación de señalización de obra.
	
Foto No. 5: Verificación de recolección de residuos.	Foto No. 6: verificación uso de EPP.

	
Foto No. 7: Verificación de orden y aseo	Foto No. 8: Verificación de señalización de obra.

INFORME DE ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA

EDSON DAVID ESPITIA MONTES

ON OR IO N" ION"

NI

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Subdirección Red terciaria y Férrea

INFORME MENSUAL TOPOGRAFICO No30 MUNICIPIO DE SAHAGUN

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL



DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO NACIONAL ET.
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024
OBJETIVOS

El objetivo de un Estudio Topográfico es proporcionar información básica y necesaria basada en informes recopilados y evaluados, en data topográfica tomada en campo y procesada en gabinete de la topografía, cartografía, elementos estructurales, y demás de la zona materia del estudio.

INODCCUION

EL CONSORCIO NACIONAL ET, presenta al Instituto Nacional de Vías, el **Informe Mensual de Topografía No.30** correspondiente al periodo comprendido entre el **1 y 31 de Julio de 2024**, el cual contiene las actividades realizadas por la comisión topográfica y el seguimiento efectuado por la misma a las actividades topográficas realizadas por los contratistas de obra en los diferentes frentes de trabajo que componen el alcance del objeto contractual del contrato de Interventoría cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

LOCALIZACIÓN

El contrato de interventoría se encuentra enmarcado en la ejecución del programa COLOMBIA RURAL, administrado por el Instituto nacional de vías – INVIAS. Las actividades topográficas se desarrollan en diferentes vías de la zona rural del departamento de Córdoba. Para la fecha del presente informe los proyectos donde se desarrollaron las actividades topográficas son la Siguientes:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO DE SAHAGUN– AGUAS VIVAS, RINCON GRANDE, SAN FRANCISCO, LAS MANUELITAS, LAS MONTAÑITAS, Y SALITRAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Sahagún, es un municipio ubicado en el Departamento de Córdoba, Colombia, fundado en 1776 por Antonio de la Torre y Miranda, fue erigido como municipio en 1834. Tiene una extensión de 992 km.

La Capital Cultural de Córdoba, como se le conoce, está localizada sobre la carretera troncal de occidente, a 69 kilómetros al nororiente de Montería. Sus terrenos son planos, conformando la región conocida como las sábanas de Córdoba. Sahagún se ha convertido en la quinta ciudad más poblada de Córdoba.

Las obras se encuentran ubicadas en la zona rural de este, en las veredas de Aguas vivas, Ricon grande, San francisco, Las manuelitas, Las montañitas y salitral



DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

GEOREFERANCIACION.

Es un método de aplicación en campo que tiene como objetivo determinar la superficie o área de terreno, ubicación georreferenciada y definición de linderos, mediante la obtención de coordenadas de los vértices, empleando equipos de posicionamiento global satelital, cuyo resultado es una representación gráfica, principalmente planimétrica de la superficie del terreno. La georreferenciación debe estar ligada o amarrada a coordenadas de la red de densificación MAGNA-SIRGAS. Los puntos materializados deben ser georreferenciados mediante el posicionamiento con equipos GNSS - Sistema Global de Navegación Satelital - L1 o L1/L2, aplicando el método estático diferencial.

EQUIPOS UTILIZADOS.

GPS-NAVSTAR (Navigation System and Ranging - Global Position System): Sistema de navegación por satélite, además de ofrecernos una posición geográfica ofrece una referencia temporal muy precisa.



Figura 1. GPS.

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.

Es el conjunto de operaciones y procedimientos utilizados para determinar la posición de puntos sobre la superficie contemplando las elevaciones que tiene el terreno, sobre un plano de referencia. No se considera la verdadera forma de la tierra, sino que se supone esta como en una superficie plana; en caso de tomar medidas de ángulos, estos se consideran planos.

NIVELACION GEOMETRICA SIMPLE: Es aquella en la cual desde un punto o una sola posición del aparato se puede conocer las cotas o elevaciones de los diferentes puntos que deseamos nivelar. En este se sitúa el nivel en el punto mas conveniente el cual ofrezca mejores condiciones de visibilidad. se va leyendo la mira sobre los puntos. Las diferencias de lectura de mira darán el desnivel entre los puntos.

NIVELACION GEOMETRICA COMPUESTA: Es una cadena de mediciones simples. Con la única diferencia que el aparato se plantara más de una vez, es necesario tomar una serie de puntos intermedios (de cambio), obteniéndose el desnivel entre cada dos consecutivos. Los puntos cuyo desnivel se desea conocer serán los extremos del camino a recorrer (itinerario) y deben estar materializados en el terreno de acuerdo con el tiempo que vayan a ser utilizados (mojón, estaca, accidente natural o artificial, etc.) y ser fácilmente localizables.

CONCEPTOS CLAVES.

Altura instrumental: Es aquella elevación del nivel o equipo de medición utilizado, a partir de una superficie de referencia conocida.

Cota: Es la altura entre un punto y un determinado nivel de referencia.

Puntos de cambio: Es un punto intermedio en el cual se hacen dos referencias, una adelante y una hacia atrás.

Vista adelante: Es la lectura que se toma en el punto el cual queremos saber su elevación, generalmente se usa cuando se hace un punto de cambio.

Vista atrás: Es una lectura realizada sobre el BM o un punto de referencia fija.

Vista intermedia: Es la lectura que se le realiza a puntos cuya altura queremos saber.

ECUACIONES.

Cálculo de alturas instrumentales:

$$\mathrm{Hi} = \mathrm{BM} + \mathrm{Vista\ atras}$$

Cálculo de cotas: Para el cálculo de cotas se utiliza la siguiente ecuación.

$$\mathrm{V1} = \mathrm{Hi} - \mathrm{Vista\ intermedia}$$

Como se realizaron punto de cambios para poder calcular sus cotas se utilizó la siguiente ecuación:

$$\mathrm{PC} = \mathrm{Hi} - \mathrm{V.\,adelante}$$

EQUIPOS UTILIZADOS.

Nivel: Equipo encargado de medir los desniveles que existen en un terreno entre determinados puntos que se encuentran en diferentes alturas.



Figura 2. Equialtimetro o Nivel topográfico.

Trípode: Se utiliza para sostener el nivel o la estación total, consta de tres patas plegables y graduables.



Figura 3. Trípode.

Mira: Se utiliza para medir distancias verticales a un punto determinado que está ubicado en el terreno.



Figura 4. Mira topográfica.

Cinta métrica: Con este instrumento se pueden medir las distancias horizontales del terreno.



Figura 5. Cinta métrica.

RADIACION.

El método de radiación es el método comúnmente empleado en levantamientos de superficies de mediana y gran extensión, en zonas topográficas accidenta con vegetación espesa. Este método se apoya en una poligonal base previamente levantada a partir de cuyos vértices se hacen radiaciones a fin de determinar la ubicación o coordenadas (X, Y, H) desde un punto fijo para situar los puntos de relleno y detalles. Tomando nota de las lecturas acimutales, cenitales, distancia de los diferentes puntos y la altura del instrumento. Los datos previos que requiere el método son las coordenadas del punto de estación y el acimut (o las coordenadas, que permitirán deducirlo) de al menos una referencia. Si se ha de enlazar con trabajos topográficos anteriores, estos datos previos habrán de sernos proporcionados antes de comenzar el trabajo, si los resultados para los que se ha decidido aplicar el método de radiación pueden estar en cualquier sistema, estos datos previos podrán ser arbitrarios.

Radiación Simple: Consiste en hacer un barrido horizontal con el anteojo de la estación, para realizar la medición de todos los puntos que constituyan la superficie a medir. Esté método tiene la necesidad de exigir visibilidad desde el punto de estacionamiento a todos aquellos puntos que definan la superficie a estudiar o levantar.

Radiación Compuesta: Esto se realiza tomando lecturas de los ángulos horizontales, distancia entre puntos y altura instrumental. Con diferencia a el sistema de levantamiento por radiación es simple, que se toman puntos por lo general fuera de la poligonal (deltas) que sirven de transición para lograr una visualización del terreno cuando se encuentran obstáculos que no permitan la visibilidad de la zona y se emplea si el área de terreno es relativamente pequeña.

CONCEPTOS CLAVES.

Angulo de deflexión: Es el ángulo que forma una línea de una poligonal con la prolongación de una línea inmediatamente anterior. Los ángulos de deflexión se consideran positivos (+) cuando la poligonal deflacta hacia la derecha y negativos (-) cuando deflacta a la izquierda.

Azimut: Es en ángulo medida respecto a un norte real o arbitrario en sentido de las manecillas del reloj en un rango de 0°-360°. Se usa para determinar orientaciones en un sistema de triangulación.

Coordenadas: Conjunto de puntos y valores que permiten definir de manera precisa la ubicación de un en el espacio, generalmente sobre los ejes "X" y "Y" y si se requiere un espacio tridimensional se utiliza el "Z".

Distancias: Es una medida longitudinal que separa 2 o más puntos.

Mojón: Construcción realizada en la superficie terrestre a fin de materializar e indicar la posición de un punto en el terreno.

Poligonales: Es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y direcciones son determinadas a partir de mediciones en campo.

Poligonal Abierta: Las líneas no regresan al punto de partida.

Poligonal Cerrada: Las líneas regresan al punto de partida, formándose así un polígono cerrado geométrica y analíticamente.

Rumbo: Es el ángulo medido con respecto al meridiano Norte -Sur tomando en el sentido Este-Oeste en un rango de 0°-90°.

ECUACIONES.

Los cálculos de coordenadas de un punto radiado, P, desde una determinada estación, E, se realiza mediante el paso de coordenadas polares (azimut y distancia reducida) a rectangulares (coordenadas ΔX, ΔY)

$$X_c = X_a + D_{ac} * \mathrm{Sen}(\mathrm{Azimut}_{ac})$$

$$Y_c = Y_a + D_{ac} * \mathrm{Cos}(\mathrm{Azimut}_{ac})$$

EQUIPOS UTILIZADOS.

Estación total: Este instrumento se utiliza para medir distancias y ángulos, acimuts, también guarda información en tiempo real.



Figura 6. Estación total

Jalones: Se utiliza para determinar la localización de un punto en el terreno o para indicar la dirección de un punto a otro.



Figura 7. Jalón.

Prisma: Se utiliza para devolver la señal enviada por el láser de la estación total y así obtener las coordenadas del ponto donde este se encuentra.



Figura 8. Prisma.

Estacas de madera: Son objetos largos y afilados que se clavan en el suelo, se usan intención demarcar de los deltas o puntos de interés para la nivelación.



Figura 9. Estaca de madera.

Pintura y brocha: Una brocha es un instrumento que tiene cerdas unidas por medio de un mango que se utiliza para pintar, mientras que la pintura es una sustancia o producto de textura líquida o espesa con que se da color a una cosa, permitiendo que la demarcación se observe con mayor claridad.



Figura 10. Pintura y Brocha.

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTAS

julio de 2024
Actividad realizada: chequeo de niveles rieles y subbase

El desplazamiento de la comisión topográfica a la zona de estudio fue en coordinación de la ingeniera Diana Corrales

El desarrollo vertical desde el alineamiento se presenta a través del perfil longitudinal. Este perfil corresponde a la vista en alzado de eje longitudinal de la vía. Normalmente se traza a partir de un perfil topográfico del terreno por donde pasará la vía, sobre el cual de definen las futuras pendientes y gradientes del pavimento, además de las curvas verticales (cóncavas o convexas) en los encuentros de éstas.

Este chequeo se realiza por medio de una nivelación, es un proceso de medición de elevaciones o altitudes de puntos sobre la superficie de la Tierra. Entendiéndose por elevación o altitud a la distancia vertical medida desde una superficie de referencia hasta el punto considerado.

El trabajo de campo consistió en obtener toda la altimetría, curvas de nivel, perfiles, secciones transversales, terrazas, etc.


El ejemplo más característico es el movimiento de tierras en desmonte o terraplén que tiene lugar en la excavación o relleno de una obra lineal

Se realizo el levantamiento con el fin de calcular el volumen total de terraplén que se había extendió en la vía, en el tramo de aguas vivas.

.

ANEXOS



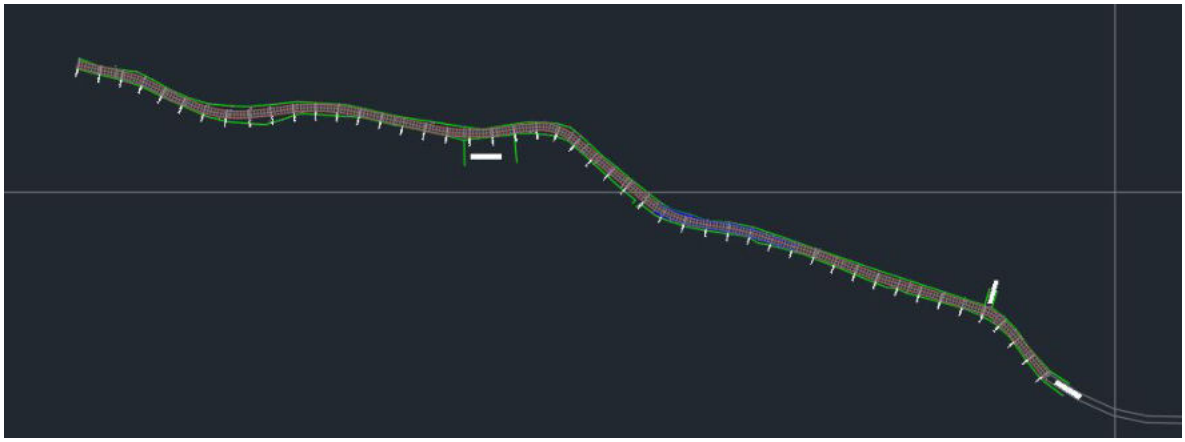

TOPOGRAFÓ PROFESIONAL

EDSON DAVID ESPITIA MONTES

CC: 1016095903

FIRMA:

CONTROL DE CALIDAD DE INTERVENTORIA

ENSAYOS DE LABORATORIO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
	VERSIÓN	1
	PAGINA	

FECHA: 31-jul-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 178 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V

MES Y AÑO DEL INFORME MI jul-24 **PROYECTO:** CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTOI 2274 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NACIONAL ET

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES INTERVENTORIA

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
1	2/07/2024	GRANULOMETRIA SUB BASE GRANULAR	INV E - 213	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	ARTICULO 320 -13	N/A	SI	
2	2/07/2024	INDICE DE PLASTICIDAD SUB BASE GRANULAR	INV E - 125 - 126	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	4-9%	NP	SI	
3	2/07/2024	LIMITE LIQUIDO SUB BASE GRANULAR	INV E - 125 - 126	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	MAX 40%	NL	SI	
4	4/07/2024	PROCTOR SUB BASE GRANULAR	INV E - 142	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	N/A	2,203 g/cm3 - 8,0	SI	
5	8/07/2024	DENSIDADES METODO CONO DE ARENA SUB BASE GRANULAR	INV E - 161	**K3+500 - K3+400 CARRIL IZQ**	3	95%	95,7%	SI	
6	9/07/2024	GRANULOMETRIA SUB BASE GRANULAR	INV E - 213	**K3+400 - K3+320 CARRIL IZQ**	1	ARTICULO 320 -13	N/A	SI	
7	9/07/2024	INDICE DE PLASTICIDAD SUB BASE GRANULAR	INV E - 125 - 126	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	4-9%	NP	SI	
8	9/07/2024	LIMITE LIQUIDO SUB BASE GRANULAR	INV E - 125 - 126	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	MAX 40%	NL	SI	
9	10/07/2024	DENSIDADES METODO CONO DE ARENA SUB BASE GRANULAR	INV E - 161	**K3+320 - K3+395 CARRIL IZQ**	3	95%	97,2%	SI	
10	10/07/2024	PROCTOR SUB BASE GRANULAR	INV E - 142	**K3+520 - K3+400 CARRIL IZQ**	1	N/A	2,197 g/cm3 - 8,2	SI	
11	15/07/2024	DENSIDADES METODO CONO DE ARENA SUB BASE GRANULAR	INV E - 161	**K3+600 - K3+680 CARRIL IZQ**	5	95%	97,8%	SI	
10	29/06/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+680 - K1+700 CARRIL IZQ**	1	3,8 MPA	3,98 MPA A 28 DIAS	SI	
11	29/06/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+680 - K1+700 CARRIL IZQ**	1	3,8 MPA	3,99 MPA A 28 DIAS	SI	
12	29/06/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+680 - K1+700 CARRIL IZQ**	1	3,8 MPA	4,06 MPA A 28 DIAS	SI	

13	6/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+439 - K1+403 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,16 MPA A 28 DIAS	SI	
14	6/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+439 - K1+403 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,12 MPA A 28 DIAS	SI	
15	6/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+439 - K1+403 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,09 MPA A 28 DIAS	SI	
16	10/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+499 - K1+439 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	3,98 MPA A 28 DIAS	SI	
17	10/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+499 - K1+439 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	3,99 MPA A 28 DIAS	SI	
18	10/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+499 - K1+439 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,06 MPA A 28 DIAS	SI	
19	16/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+439 - K1+403 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,13 MPA A 28 DIAS	SI	
20	16/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+439 - K1+403 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,17 MPA A 28 DIAS	SI	
21	16/07/2024	RESISTENCIAS A LA FLEXION VIGUETAS DE CONCRETOS	INV E - 414	**K1+439 - K1+403 CARRIL DR**	**1**	3,8 MPA	4,17 MPA A 28 DIAS	SI	

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de



Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
'ventor, Dirección Territorial.

Firma

Nombre: MARIA ESTHELA JULIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202170671 COR

CONTROL DE CALIDAD
REALIZADO POR
INTERVENTORIA

RESULTADOS DE
LABORATORIO

CONTRATO.LP-178-2023

SAHAGUN

ENSAYOS INTERVENTORIA

DENSIDADES

ON OR IO N" ION"	O UNI " RIO D U O N RR NO M ODO D ONO D " R N" ORM" I I" S	Re

ID N I I " ION D ROJ O	
rD D	M JOR" MI O M" IMI OJ R " I I " CIO D CORR DOR S R R" S PROD C I OS "CO OM I" R R" " M ICIPIO D S" " G CORDO "
D r DND	0
ID N I I " ION D M" RI"	
D r	S " S GR" " R
rD d	" S " a" S **d D** ju
D d	IC" C" P"
D	00 00 C" RRI la
D d d M Dr Dr D r	0
u d d O d Dr Dr D	0

" MI D R R N I"	**"**	**ND**

N " JO NUM RO						
" scisa oma de Mues ra m	00	0	0			
Margen oma de Mues ra	00 la	0 la	0 0 la			
Pro undidad cm	0 0	0 0	0 0			
ipo de Capa	S G	S G	S G			
Peso rasco " rena Inicia gr		0				
Peso rasco " rena Res an e gr						
Peso " rena o a sada gr						
Cons an e de Cono						
Peso " rena en e ueco gr	0					
Densidad de a " rena gr cm						
o umen de ueco cm						
Masa um Ma raido p ami de re grs			0			
Masa um Ma raa do Re de Re gsr						
Gra speci Ma Re ami de Re grs cc	00	00	00			
dad Ma eria Pasa ami de Re erencia		0				
umedad Par icu as Gruesas "	0	0	0			
Masa Seca Ma eria Pasa ami de Re grs						
Masa Seca Ma eria Re enido ami de Re grs	0	0				
Par icu as Gruesas "						
Par cu as inas "						
Peso uni ario Seco Ma eria raido grs cc						
Peso ni ario Ma Correg por S grs cc						
de Compac aci n						
Gci						
Des iasion s andar S	0					
p	0					
GCı 0						
GC 0	**" " O**					

O R " ION

" OR	I G R SID	DIR C OR" I R ORI"
irrma Edison Ariza C.	irrma	irrma
DISO " " D R " Rla" C" RDOaO		M" RI" S " J IO

ON OR IO N" ION"	O UNI " RIO D U O N RR NO M ODO D ONO D " R N" ORM" I I" S	Re

ID N I I " ION D ROJ O	
rD D	M JOR" MI O M" IMI OJ R " I I " CIO D CORR DOR S R R" S PROD C I OS "CO OM I" R R" " M ICIPIO D S" " G CORDO "
D r D ND	0

ID N I I " ION D M" RI"			
D r	S " S GR" " R		
rD d	" S " a" S	d D	0 ju
D d	IC" C" P"		
D	0 C" RRI la		
D d d M Dr Dr D r			
u d d O d Dr Dr D			

" MI D R R N I"	"	ND

N " JO NUM RO						
" scisa oma de Mues ra m	0	0				
Margen oma de Mues ra	0 0 la	0 la	la			
Pro undidad cm	0 0	0 0	0 0			
ipo de Capa	S G	S G	S G			
Peso rasco " rena Inicia gr	0	0	0			
Peso rasco " rena Res an e gr		0				
Peso " rena o a sada gr			0			
Cons an e de Cono						
Peso " rena en e ueco gr	0	0	0			
Densidad de a " rena gr cm						
o umen de ueco cm			0			
Masa um Ma raido p ami de re grs		0	00			
Masa um Ma raa do Re de Re gsr		0	00			
Gra speci Ma Re ami de Re grs cc	00	00	00			
dad Ma eria Pasa ami de Re erencia	0					
umedad Par icu as Gruesas "	0	0	0			
Masa Seca Ma eria Pasa ami de Re grs						
Masa Seca Ma eria Re enido ami de Re grs	0					
Par icu as Gruesas "						
Par cu as inas "						
Peso uni ario Seco Ma eria raido grs cc			0			
Peso ni ario Ma Correg por S grs cc						
de Compac aci n	0	0				
Gci						
Des iasion s andar S	0					
p	0					
GCı 0						
GC 0	" " O					

O R " ION

" OR	I G R SID	DIR C OR" I R ORI"
irrma Edison Ariza C.	irrma	irrma
DISO " " D R " Rla" C" RDOaO		M" RI" S " J IO

ON OR IO N" ION"	O UNI " RIO D U O N RR NO M ODO D ONO D " R N" ORM" I I" S	Re

ID N I I " ION D ROJ O	
rD D	M JOR" MI O M" IMI OJ R " I I " CIO D CORR DOR S R R" S PROD C I OS "CO OM I" R R" " M ICIPIO D S" " G CORDO "
D r D ND	0

ID N I I " ION D M" RI"			
D r	S " S GR" " R		
rD d	" S " a" S	d D	ju
D d	IC" C" P"		
D	0 00 C" RRI DR		
D d d M Dr Dr D r			
u d d O d Dr Dr D			

" MI D R R N I"	"	ND

N " JO NUM RO						
" scisa oma de Mues ra m	0	0	0	0	00	
Margen oma de Mues ra	0 DR	0 0 DR	00 DR	0 0 DR	0 DR	
Pro undidad cm	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
ipo de Capa	S G	S G	S G	S G	S G	
Peso rasco " rena Inicia gr	0		0			
Peso rasco " rena Res an e gr			0			
Peso " rena o a sada gr						
Cons an e de Cono						
Peso " rena en e ueco gr		0	0 0	0	0	
Densidad de a " rena gr cm						
o umen de ueco cm		0		0		
Masa um Ma raido p ami de re grs			0		0	
Masa um Ma raa do Re de Re gsr						
Gra speci Ma Re ami de Re grs cc	00	00	00	00	00	
dad Ma eria Pasa ami de Re erencia					0	
umedad Par icu as Gruesas "	0	0	0	0	0	
Masa Seca Ma eria Pasa ami de Re grs		0				
Masa Seca Ma eria Re enido ami de Re grs		0	0			
Par icu as Gruesas "				0		
Par cu as inas "				0		
Peso uni ario Seco Ma eria raido grs cc	0	0				
Peso ni ario Ma Correg por S grs cc						
de Compac aci n		00			0	
Gci						
Des iasion s andar S	0					
p	0					
GCı 0						
GC 0	" " O					

O R " ION

" OR	I G R SID	DIR C OR" I R ORI"
irrma Edison Ariza C.	irrma	irrma
DISO " " D R " Rla" C" RDOaO		M" RI" S " J IO

CARACTERIZACION

ON OR IO N" ION"

R" NU OM RI" D " R " DO NORM" IN


CO R" O D I R ORI" o de 0

R" NU OM RI"

R U " DO O NIDO				NORM"	
" MI	R NIDO	R NIDO	" "	IN RIOR	U RIOR
			00	00	00
			00	00	00
			00	00	00
				0	
				0	0
				0	0
					0
O "					

" R S " S GR" " R
" N R" N I O
" MU ju
" N " ju
ON R" I " CO SORCIO CORR DOR S R R" S
O R" M JOR" MI N O M" N NIMI N O J R " I I " ION D ORR DOR RUR" RODU I O N
0 00 C" RRI la
P " " " S " a" S
M S R"

UR " R" NU OM RI "

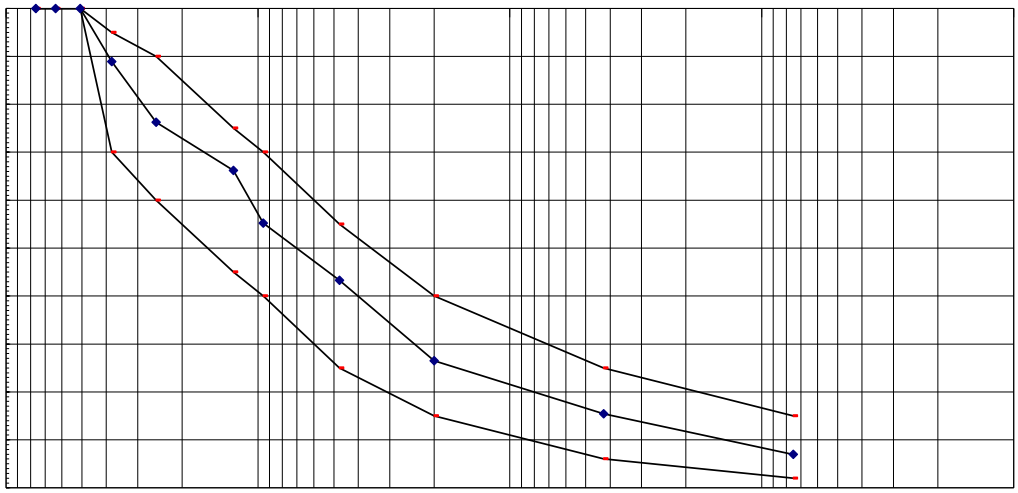

" R UR"

" " " " " " "

O S R " CIO S

DISO " " D R " Rla" C" RDOaO
a ora orio In er en or a

R ISO

M" RI" S " J IO
Direc ora de in er en oria

ON OR IO N" ION"	OM " " ION RO OR MODI I " DO " " NORM" IN I"	Mu r ND

ID N I I " ION D ROJ O

D r	CO SORCIO CORR DOR S R R" S		
rD D	M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CIO D CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G D P" R " M O D CORDO "		
I r Dr	CO SORCIO " CIO "		

ID N I I " ION D M" RI"

rD d	" S " a" S		ju		R N OS O I OS
M r	00	0 C" RRI la		d D	0 ju
D	CI " G" D ORO	M R" N			

" R" RI I " D M" R I O **" R" RI I " D MO D**

Dimensiones	cm	Peso	gr
Peso	0	Di me ro	cm
" ura de Caida	"	" ura	cm


RU "				
umedad a ura				
mero de Go pes por Capa				
mero de Capas				
Peso de a Mues ra umeda Mo de gr	0			
Peso de Mo de gr	0	0	0	
Peso de a Mues ra umeda gr		00		
o umen de Mo de cm	0	0	0	
Densidad umeda de Ma eria gr cm				
umedad			0	
Densidad Seca de Ma eria gr cm				
M D" D				
Peso c psu a sue o medo g				
Peso c psu a sue o seco g				
Peso c psu a g		0		
umedad			0	

O R " ION

D SID" D M" IM" grs cm

CO IDO D M D" D OP

R" I O D OM " " ION

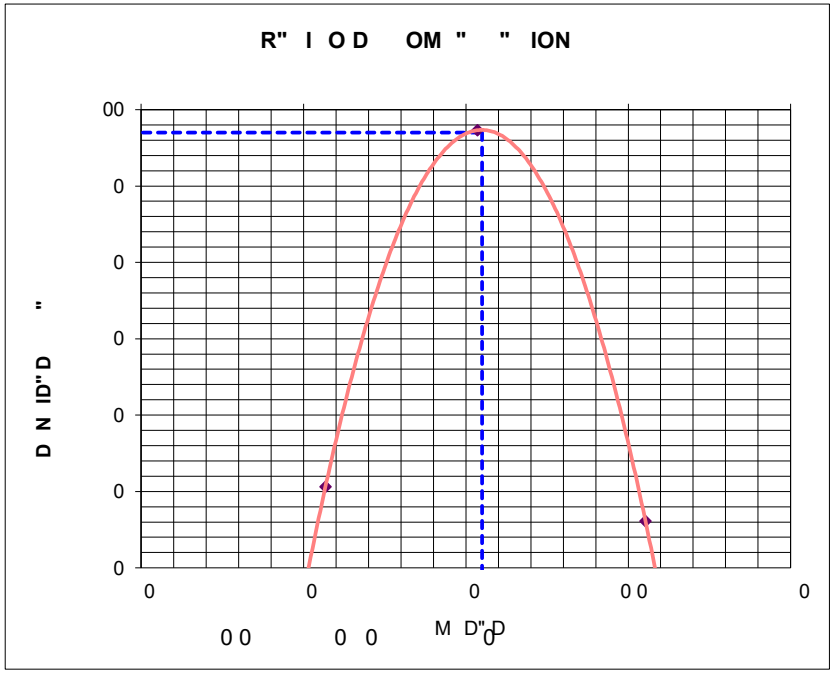

Dr dD Dr		" rD dD Dr	
irma		irma	
om re	DISO " " D R " RIa"	om re	M" RI" S " J IO
Cargo	a ora oris a	Cargo	Direc ora in er en oria

ON OR IO N" ION"

R" NU OM RI" D " R " DO NORM" IN


CO R" O D I R ORI" o de 0

R" NU OM RI"

R U " DO O NIDO				NORM"	
" MI	R NIDO	R NIDO	" "	IN RIOR	U RIOR
			00	00	00
			00	00	00
			00	00	00
				0	
				0	0
				0	0
					0
O "					

" R S " S GR" " R
" N R" N I O
" MU ju
" N " ju
ON R" I " CO SORCIO CORR DOR S R R" S
O R" M JOR" MI N O M" N NIMI N O J R " I I " ION D ORR DOR RUR" RODU I O N
00 0 C" RRI la
P " " " S " a" S
M S R"

UR " R" NU OM RI "

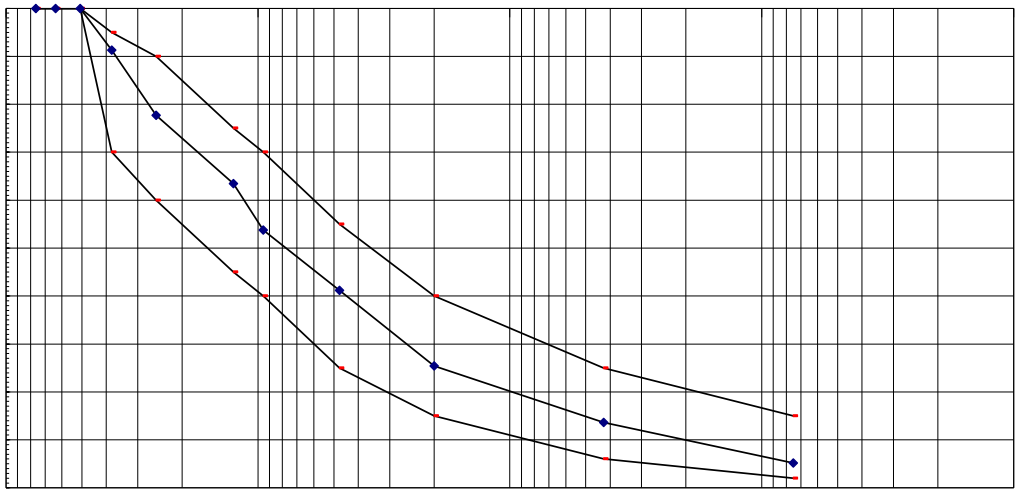

" R UR"

" " " " " " "

O S R " CIO S

DISO " " D R " Rla" C" RDOaO

a ora orio In er en or a

R ISO

M" RI" S " J IO

Direc ora de in er en oria

CONSORCIO NACIONAL ET INTERVENTORIA	LIMITES DE CONSISTENCIA Y GRADACIÓN (INV E-125 E-126)

ON R" I "	CO SORCIO CORR DOR S R R" S	O	ON
O " I " I N	0 00 C" RRI la	"	de ju io de 0
MU R"	M	" N	de ju io de 0
D RI I N	S " S GR" " R		

LÍMITES DE CONSISTENCIA

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	0	0	0
Vidrio No	0	0	0
$W_{rmh,}$ (g)	0,00	0,00	0,00
$W_{rms,}$ (g)	0,00	0,00	0,00
$W_{rl,}$ (g)	0,00	0,00	0,00
Contenido de Humedad, w (%)	***NL***	***NL***	***NL***


LÍMITE PLÁSTICO **HUMEDAD**

Vidrio No	0	0	
$W_{rmh,}$ (g)	0	0,00	
$W_{rms,}$ (g)	0	0,00	
$W_{rl,}$ (g)	0	0,00	
Contenido de Humedad (%)	***NP***	***NP***	

GRANULOMETRÍA

P1 (g) =	8.125,3	P2 (g) =	
Tamiz Tamaño	Peso Retenido (g)	(%) Retenido	(%) Pasa
3"			
2 1/2			
2"			
11/2"			
1"			
3/4"			
3/8"			
Nº 4			
Nº 10			
Nº 40			
Nº 200			
PASA			

Gravas (%)	56,7
Arenas (%)	36,3
Finos (%)	6,9

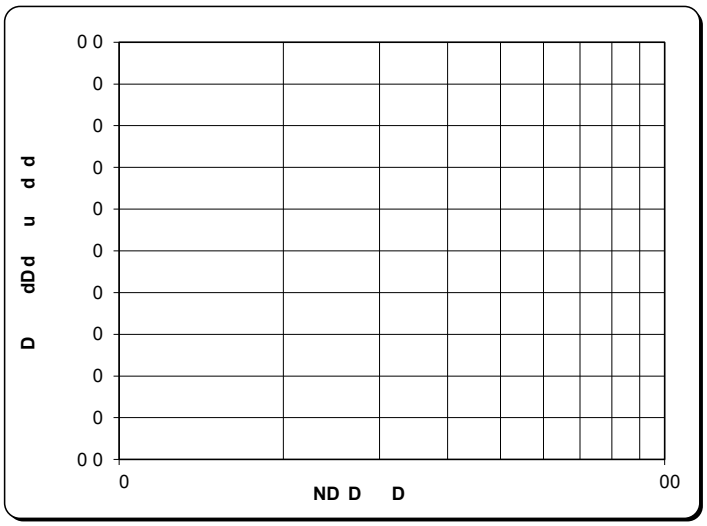

RESULTADOS

Humedad Natural:		%
Límite Líquido :	**NL**	%
Límite Plástico :	**NP**	%
Índice Plasticidad :	**NP**	%
USC :		
Índice de Grupo :		
AASHTO :	**A-6**	

Observaciones:

EDISON ARIZA
Laboratorista

MARIA ESTHELA JULIO
Directora interventoria

CONSORCIO NACIONAL ET INTERVENTORIA	LIMITES DE CONSISTENCIA Y GRADACIÓN (INV E-125 E-126)

ON R" I "	CO SORCIO CORR DOR S R R" S	O	ON
O " I " I N	00 0 C" RRI la	"	de ju io de 0
MU R"	M	" N	de ju io de 0
D RI I N	S " S GR" " R		

LÍMITES DE CONSISTENCIA

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	0	0	0
Vidrio No	0	0	0
$W_{rmh,}$ (g)	0,00	0,00	0,00
$W_{rms,}$ (g)	0,00	0,00	0,00
$W_{rl,}$ (g)	0,00	0,00	0,00
Contenido de Humedad, w (%)	***NL***	***NL***	***NL***


LÍMITE PLÁSTICO **HUMEDAD**

Vidrio No	0	0	
$W_{rmh,}$ (g)	0	0,00	
$W_{rms,}$ (g)	0	0,00	
$W_{rl,}$ (g)	0	0,00	
Contenido de Humedad (%)	***NP***	***NP***	

GRANULOMETRÍA

P1 (g) =	7.139,9	P2 (g) =	
Tamiz Tamaño	Peso Retenido (g)	(%) Retenido	(%) Pasa
3"			
2 1/2			
2"			
11/2"			
1"			
3/4"			
3/8"			
Nº 4			
Nº 10			
Nº 40			
Nº 200			
PASA			

Gravas (%)	58,8
Arenas (%)	36,0
Finos (%)	5,2

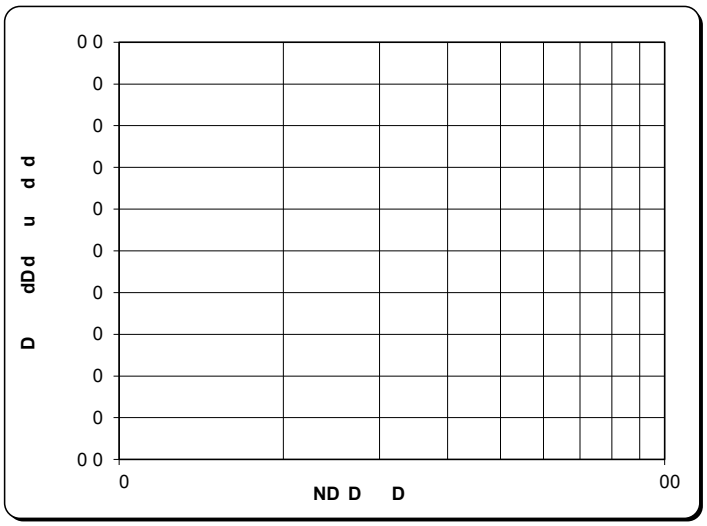

RESULTADOS

Humedad Natural:		%
Límite Líquido :	**NL**	%
Límite Plástico :	**NP**	%
Índice Plasticidad :	**NP**	%
USC :		
Índice de Grupo :		
AASHTO :	**A-6**	

Observaciones:

EDISON ARIZA
Laboratorista

MARIA ESTHELA JULIO
Directora interventoria

ON OR IO N" ION"	OM " " ION RO OR MODI I " DO " " NORM" IN I"	Mu r ND

ID N I I " ION D ROJ O

D r	CO SORCIO CORR DOR S R R" S		
rD D	M JOR" MI O M" IMI O J R " I I " CIO D CORR DOR S R R" S PROD C I OS M ICIPIO D S" " G D P" R " M O D CORDO "		
I r Dr	CO SORCIO " CIO "		

ID N I I " ION D M" RI"

rD d	" S " a" S		ju		R N OS O I OS
M r	0	00 C" RRI la		d D	ju
D	CI " G" D ORO	M R" N			

" R" RI I " D M" R I O **" R" RI I " D MO D**


Dimensiones	cm	Peso	gr
Peso 0		Di me ro	cm
" ura de Caida "		" ura	cm

RU "				
umedad a ura				
mero de Go pes por Capa				
mero de Capas				
Peso de a Mues ra umeda Mo de gr	0			
Peso de Mo de gr	0	0	0	
Peso de a Mues ra umeda gr	0	00		
o umen de Mo de cm	0	0	0	
Densidad umeda de Ma eria gr cm				
umedad	0	0	0	
Densidad Seca de Ma eria gr cm		0		
M D" D				
Peso c psu a sue o medo g			0	
Peso c psu a sue o seco g				
Peso c psu a g		0		
umedad	0	0	0	

O R " ION

D SID" D M" IM"	0 grs cm
CO IDO D M D" D OP	0

R" I O D OM " " ION

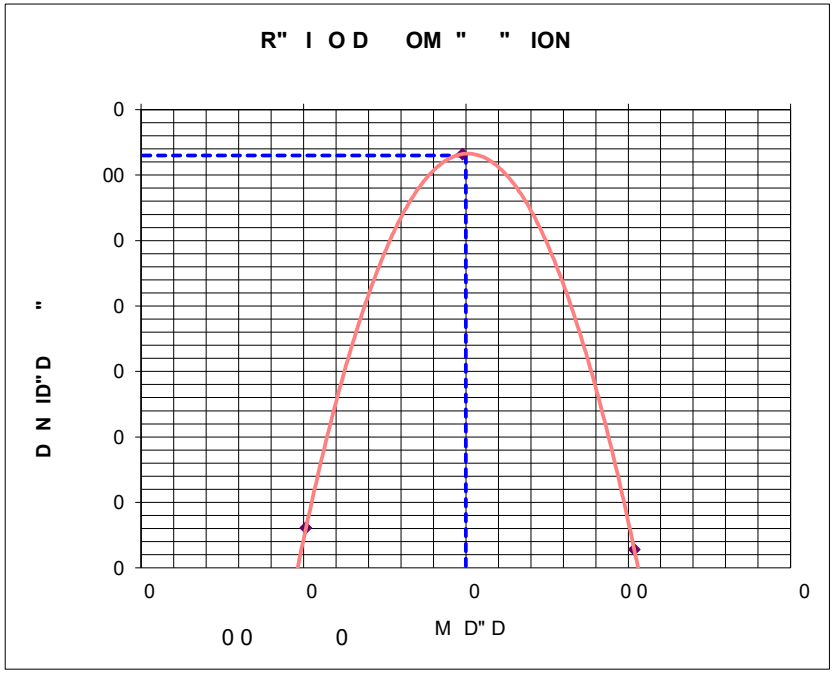

Dr dD Dr
irma
om re DISO " " D R " RIa"
Cargo a ora oris a

" rD dD Dr
irma
om re M" RI" S " J IO
Cargo Direc ora in er en oria

RESISTENCIA

JS GEOSUELOS S.A.S	*ESTUDIO DE SUELOS* *DISEÑO DE PAVIMENTOS* *CARACTERIZACION DE MATERIALES* *DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETOS* *ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD*	

RESISTENCIA A LA FLEXION DE CONCRETO

PROYECTO: M JOR" MI O M" IMI OJ R " I I " CIO D CORR DOR S R R" S PROD C I OS "CO OM I" R R" " M ICIPIO D S" " G CORDO "

INTERVENTORIA: CONSORCIO NACIONAL ET

CONTRATISTA: CONSORCIO CORRE3DORES RURALES B-V

FECHA: 31/07/2024

RESISTENCIA ESPERADA MR: MR 38

1	K1+680 - K1+700 CARRIL IZQ	1/06/2024	29/06/2024	28	160	155	545	495	32,00	42,02	4,12
2	K1+680 - K1+700 CARRIL IZQ	1/06/2024	29/06/2024	28	160	155	545	495	31,90	41,89	4,11
3	K1+680 - K1+700 CARRIL IZQ	1/06/2024	29/06/2024	28	160	155	545	495	32,20	42,28	4,15
4	K1+559 - K1+499 CARRIL DR	8/06/2024	6/07/2024	28	160	155	545	495	32,30	42,41	4,16
5	K1+559 - K1+499 CARRIL DR	8/06/2024	6/07/2024	28	160	155	545	495	32,00	42,02	4,12
6	K1+559 - K1+499 CARRIL DR	8/06/2024	6/07/2024	28	160	155	545	495	31,80	41,76	4,09
7	K1+499 - K1+439 CARRIL DR	12/06/2024	10/07/2024	28	160	155	545	495	30,90	40,58	3,98
8	K1+499 - K1+439 CARRIL DR	12/06/2024	10/07/2024	28	160	155	545	495	31,00	40,71	3,99
9	K1+499 - K1+439 CARRIL DR	12/06/2024	10/07/2024	28	160	155	545	495	31,50	41,36	4,06
10	K1+439 - K1+403 CARRIL DR	18/06/2024	16/07/2024	28	160	155	545	495	32,10	42,15	4,13
11	K1+439 - K1+403 CARRIL DR	18/06/2024	16/07/2024	28	160	155	545	495	32,40	42,54	4,17
12	K1+439 - K1+403 CARRIL DR	18/06/2024	16/07/2024	28	160	155	545	495	32,40	42,54	4,17

OBSERVACIONES: MUESTRAS SUMINISTRADAS POR EL SOLICITANTE

Jesus A. Sanchez

LABORATORISTA
JESUS ALBERTO SANCHEZ

COORDINADOR DE LAB.
ING. CARLOS DURANGO

5.4INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La información correspondiente al seguimiento del PAC se reporta en el siguiente formato.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

Se presenta a continuación el seguimiento a la matriz de los riesgos del contrato de interventoría.

	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO		M PRO P INTER TRAT Y CO DE
			INVIAS	CONTRATISTA INTERVENTOR					ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	
	Orden público: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zona de influencia de las obras, no obstante, el contratista Interventor conoce que las obras objeto de interventoría se realizarán en zonas de mayor conflicto. (Zonas ZOMAC) y municipios PDET.	Imposibilidad de realizar las labores de Interventoría	**X**	**X**	Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas y vías de influencia de las obras. Trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión con las autoridades competentes. Establecer planes de contingencia.	contratista interventor, Entes Contratantes	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento	No se prop me fech mate
	Climáticos: Se refiere a los perjuicios ocasionados por cambios en la naturaleza, lluvias intensas, desbordamientos, derrumbes en los sitios o zonas de afectación de las obras.	Posible ausentismo del personal de interventoría a las obras		**X**	El contratista de Interventoría, deberá garantizar la presencia de sus colaboradores en las obras y zonas de influencia de las mismas, para garantizar los protocolos y manejos para la mitigación de los eventos.	contratista interventor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Mantener al día los reportes asociados al clima y el estado de las vías.	Diario	No se prop me fech mate

	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO		M PRO P INTER TRAT Y CO DE
			INVIAS	CONTRATISTA INTERVENTOR					ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	
	R**iesgo por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA**, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. **Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado**. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones.		**X**	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de los requisitos para el personal profesional de la obra establecido en el pliego de condiciones y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo en la dedicación prevista en el mismo. El Supervisor de Contrato y/o Gestor deberá observar al Interventor cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al respecto como Interventor.	Interventor, Supervisores y/o Gestores	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación.	Permanente en la ejecución de la obra.	No se prop me fech mate
	Riesgo por la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso o por defecto.		**X**	Mediciones de obra ejecutada con el debido detalle, revisión de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. Corrección oportuna de las mediciones erróneas.	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría.	La correspondiente a la medición de cada tipo de obra.	No se prop me fech mate

	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO		M PRO P INTER TRAT Y CO DE
			INVIAS	CONTRATISTA INTERVENTOR					ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	
	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.		**X**	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario	No se prop me fech mate

	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO		M PRO P INTER TRAT Y CO DE
			INVIAS	CONTRATISTA INTERVENTOR					ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	
	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontinúas, inconclusas o con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Obras discontinúas, inconclusas o con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada		**X**	El Interventor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin.	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto, realización de los ajustes necesarios. Seguimiento a Informes de Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado vigente.	Mensual o cuando el Interventor lo considere necesario.	No se prop me fech mate

	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO		M PRO P INTER TRAT Y CO DE
			INVIAS	CONTRATISTA INTERVENTOR					ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	
	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Ejecución inadecuada del proyecto, impacto negativo en el logro de las metas del alcance del proyecto		**X**	El Interventor debe exigir al Contratista de Obra los frentes obligatorios de obra y efectuar el seguimiento de manera que se cumpla la ejecución de las obras previstas en dichos frentes. Seguimiento de esta obligación del Interventor por parte de los Supervisores y/o Gestores	Interventor, Supervisores y/o Gestores	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en los frentes obligatorios de obra. Seguimiento a informes de Interventoría. Visitas de Supervisión.	Permanente del Interventor. Mensual del Supervisor y/o Gestor	No se prop me fech mate
	Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfases económicos en la utilización del presupuesto del proyecto.		**X**	Control y vigilancia de la ejecución del proyecto por parte del Interventor. Análisis por parte del Interventor de los problemas que se presenten, apoyándose en su personal, que le permitan adoptar las decisiones correspondientes en forma oportuna y eficaz, para no afectar la ejecución del proyecto.	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que detecte a tiempo los problemas que se presenten, los analice y los resuelva oportunamente.	Permanente en la ejecución de la obra.	No se prop me fech mate

	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO		M PRO F INTER TRAT Y CO DE
			INVIAS	CONTRATISTA INTERVENTOR					ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	
	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la post contractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc., o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados,		**X**	Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o post contractual, en lo de su competencia	Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa post contractual.	No se prop me fech mate

	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	**Consecuencia de ocurrencia del evento**	**A QUIEN SE ASIGNA**		**TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO**	**RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	**FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO**	**FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	**SEGUIMIENTO**		**M PRO P INTER TRAT Y CO DE**
			INVIAS	**CONTRATISTA INTERVENTOR**					**ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA**	**PERIODICIDAD**	
	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	**X**		Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	Gestores y/o Supervisores, Interventor	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual	No se prop me fech mate

	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO		M PRO P INTER TRAT Y CO DE
			INVIAS	CONTRATISTA INTERVENTOR					ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	
	Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.		**X**	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales, y evitar que se generen perjuicios técnicos y/o pasivos ambientales por esta causa. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos.	Permanente	No se prop me fech mate
	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Interventor, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio		**X**	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor Invias	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal	No se prop me fech mate

	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO		M PRO P INTER TRAT Y CO DE
			INVIAS	CONTRATISTA INTERVENTOR					ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	
	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Interventor no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos		**X**	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor Invias	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario	No se prop me fech mate
	Ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato. Consiste en la posibilidad que el contratista de Interventoría, solicite a INVIAS el reconocimiento y pago de mayores gastos por cambio de vigencia durante el tiempo de ejecución del contrato. Los gastos están representados en costo de insumos, tarifas, equipos, asesorías, sueldos (A excepción los de salario mínimo), honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno.	Expectativa financiera desfavorable para el contratista Interventor.		**X**	El contratista interventor, deberá realizar cuidadosamente el cálculo de sus gastos y costos y proyectarlos hasta para tres vigencias conservando las mismas tarifas, esto en razón a que el Programa Colombia Rural no dispone de recursos adicionales que permitan sufragar la eventualidad e INVIAS no reconocerá incremento alguno diferente a los establecidos en el contrato.	contratista interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente al control de gastos	semanal	No se prop me fech mate

	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO		M PRO F INTER TRAT Y CO DE
			INVIAS	CONTRATISTA INTERVENTOR					ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	
	No adjudicación oportuna de la Licitación Pública de las obras civiles. Es un proceso independiente adelantado por el Ente Público Contratante que podría incurrir en demoras por observaciones presentadas al proceso, notificaciones de ley, o quedar desierto, entre otros aspectos.	Retraso en la ejecución del contrato de interventoría		**X**	El contratista Interventor deberá realizar las gestiones pertinentes ante el Invias para prorrogar el contrato en caso que se requiera	Contratista Interventor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Verificar la adjudicación del contrato de obra y que el plazo de ejecución de la interventoría cubra en su totalidad el plazo de ejecución de la obra.	Cuando se presente el evento	No se prop me fech mate

	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO		M PRO P INTER TRAT Y CO DE
			INVIAS	CONTRATISTA INTERVENTOR					ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	
	Ejecución Parcial y/o no Ejecución de los Proyectos objeto de Interventoría. Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Obra o ejecución parcial de la misma, o la no ejecución total de una o más obras.	Modificación en el alcance de las actividades de interventoría		**X**	El contratista interventor deberá establecer acciones preventivas a la manifestación del Riesgo a fin de mantener informado al Invias. El contrato de Interventoría está ligado contractualmente al desarrollo de los Contratos de Obra suscritos por el Ente Público Contratante. El contrato de Interventoría, será liquidado conforme a los recursos realmente ejecutados en su desarrollo y no dará lugar a indemnización alguna.	Contratista Interventor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Disponer de permanente y confiable información con la Ente Público Contratante de la Obra.	Cuando se presente el evento	No se prop me fech mate
	Salarios, Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el contratista Interventor no reconozca o demore los pagos (salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato.	Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo.		**X**	El contratista interventor, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con INVIAS.	contratista Inventora	Con el Acta de Inicio	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión.	Con cada Acta de Pago	No se prop me fech mate

	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO		M PRO F INTER TRAT Y CO DE
			INVIAS	CONTRATISTA INTERVENTOR					ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	
	Control de la gestión Financiera y Contable. Se refiere a la no aplicación de acciones para el manejo de los anticipos entregados al contratista de la obra por parte de la Entidad Contratante de la misma.	Falta de Controles Financieros		**X**	El contratista Interventor, deberá establecer los controles pertinentes para el manejo de los anticipos.	Contratista	Con el Acta de Inicio	A la Liquidación del Contrato	Generación de Estado de Cuenta.	Las veces requeridas hasta la amortización total del anticipo.	No se prop me fech mate

5.6 INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

A la fecha de elaboración de este informe no se han adelantado actividades en los otros programas y aplicativos según los pliegos de condiciones.

6.REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Interventoría 2274 de 2021, la Interventoría cuenta con los recursos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-24

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2274 - 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO NACIONAL ET

CONTRATO DE OBRA No.	199-2021	**CONTRATISTA:**	INVERSIONES PSAVZ SAS
CONTRATO DE OBRA No.	L.P.I.T. 008 - 2022	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC
CONTRATO DE OBRA No.	LP-009-2021	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO TERRÓN
CONTRATO DE OBRA No.	LP-010-2021	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VIAL LA MADERA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**DÍAS DEL MES**																														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	Camioneta TOYOTA HILUX modelo 2015 de placas WLL096	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	Camioneta HONDA CR-V 5DR LXC 2WD de placas UGK634	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5/08/2024 (Día / Mes / Año)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
SOAT: 02/02/2025
REVISION TM: 15/02/2025

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 68202-45346 STD

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La relación del personal de la interventoría se reporta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría, el cual se adjunta a continuación.

En esta interventoría se hace seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aprobada. El personal de la interventoría está sujeto a la aprobación del plan de cargas aprobado por el supervisor del contrato de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2274-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO NACIONAL ET

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3.

CONTRATO DE OBRA No.:	199-2021	**CONTRATISTA:**	INVERSIONES PSAVZ SAS
CONTRATO DE OBRA No.:	L.P.I.T. 008 - 2022	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-009-2021	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO TERRÓN
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-010-2021	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VIAL LA MADERA

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MARÍA ESTHELA JULIO GONZALEZ	30.685.373	Directora de Interventoría	$ 6.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO NACIONAL ET	$ 6.500.000	$ 452.400	V	NUEVA EPS	7936378204	$ 260.000	COLFONDOS	7936378204	$ 1.105.300	$ 260.000	$ -	$ -	
2	DIANA LUCIA CORRALES MARTELO	50.933.451	Residente de Interventoría 1	$ 4.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO NACIONAL ET	$ 4.400.000	$ 143.000	V	SALUD TOTAL	7936378204	$ 82.200	COLPENSIONES	7936378204	$ 328.600	$ 82.200	$ -	$ -	
3	RENALDO ANTONIO RICARDO JARABA	10.768.335	Residente de Interventoría 2	$ 4.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO NACIONAL ET	$ 4.400.000	$ 306.300	V	NUEVA EPS	7936378204	$ 176.000	COLFONDOS	7936378204	$ 704.000	$ 176.000	$ -	$ -	
4	CARLOS ANDRES VALETA REVOLLO	1.102.799.748	Residente de Interventoría 3	$ 4.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO NACIONAL ET	$ 4.400.000	$ 306.300	V	SALUD TOTAL	7936378204	$ 176.000	PORVENIR	7936378204	$ 704.000	$ 176.000	$ -	$ -	
5	EDUARDO DE JESUS HERNANDEZ MESTRA	1.067.956.940	Ingeniero Auxiliar 1	$ 2.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO NACIONAL ET	$ 2.600.000	$ 181.000	V	SALUD TOTAL	7936378204	$ 104.000	COLFONDOS	7936378204	$ 416.100	$ 140.000	$ -	$ -	
6	JUAN CAMILO MARTINEZ PEREZ	1.067.892.011	Ingeniero Auxiliar 2	$ 2.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO NACIONAL ET	$ 2.600.000	$ 181.000	V	NUEVA EPS	7936378204	$ 104.000	COLFONDOS	7936378204	$ 416.100	$ 104.000	$ -	$ -	
7	ERIKA PAOLA RUIZ BELTRAN	52.266.454	Especialista Ambiental	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X	40%	ELSA TORRES ARENALES	$ 2.500.000	$ 174.000	V	COMPENSAR	7936378204	$ 312.500	COLPENSIONES	7936378204	$ 400.000	$ 174.000	$ -	$ -	
8	LUZ ANGELA PERDOMO MORALES	1.069.493.826	Profesional Social	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO NACIONAL ET	$ 3.500.000	$ 243.600	V	NUEVA EPS	7936378204	$ 140.000	PROTECCION	7936378204	$ 560.000	$ 140.000	$ -	$ -	
9	YUDY DIREY ROSALES MUÑOZ	25.707.927	Inspector SST	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO NACIONAL ET	$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA EPS	7936378204	$ 88.000	PORVENIR	7936378204	$ 352.000	$ 88.000	$ -	$ -	
10	MAYRA ALEJANDRA BERRIO	1.067.951.382	Secretaria	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO NACIONAL ET	$ 1.300.000	$ 6.800	I	SALUD TOTAL	7936378204	$ 52.000	PORVENIR	7936378204	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$33.900.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha N.A. a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 68202 45346 STD

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información financiera del contrato de interventoría se reposta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA.

En este formato se lleva el control financiero y presupuestal del contrato de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2274-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NACIONAL ET

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3.

CONTRATO DE OBRA No:	199 - 2021	**CONTRATISTA:**	INVERSIONES PSAVZ SAS
CONTRATO DE OBRA No:	L.P.I.T. 008 - 2022	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC
CONTRATO DE OBRA No:	LP-009-2021	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO TERRÓN
CONTRATO DE OBRA No:	LP-010-2021	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VIAL LA MADERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1088821	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	54	Nación	Contrato Principal 2274 de 2021	$ 216.000.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 16.000.000	$ -
2022	279422	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	Nación		$ 2.172.561.357	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 100.000.000	$ -
2022	1131522	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	Nación	Adición No. 1	$ 787.480.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 63.000.000	$ -
2023	977723	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	Nación	Adición No. 2	$ 144.000.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 6.000.000	$ -
2023	1351523	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONALL	11	Nación	Adición No. 3	$ 20.000.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 180.000.000	$ -
2024	426424	C-2402-0600-12-51102A-2402112-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	11	Nación	Adición No. 4	$ 55.000.000	$ -
		C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS				$ 495.000.000	$ 219.661.690
			TOTAL			$ 4.255.041.357	$ 219.661.690

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.255.041.357**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**ene-22**	$ 1.977.300	$ 375.687	**$ 2.352.987**	**NA**	**$ 2.352.987**	**NA**	No. de Registro 1088821 de fecha 2021-12-31	$ 229.647.013	**$ 2.502.208.370**		
2	**feb-22**	$ 51.484.600	$ 9.782.074	**$ 61.266.674**	**NA**	**$ 61.266.674**	**NA**	No. de Registro 1088821 de fecha 2021-12-31	$ 168.380.339	**$ 2.440.941.696**		
3	**mar-22**	$ 70.027.840	$ 13.305.290	**$ 83.333.130**	**NA**	**$ 83.333.130**	**NA**	No. de Registro 1088821 de fecha 2021-12-31	$ 85.047.209	**$ 2.357.608.566**		
4	**abr-22**	$ 101.395.060	$ 19.265.061	**$ 120.660.121**	**NA**	**$ 85.047.209**	**NA**	No. de Registro 1088821 de fecha 2021-12-31	$ -	**$ 2.236.948.445**		
						$ 35.612.912		No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 2.236.948.445			
5	**may-22**	$ 100.529.350	$ 19.100.577	**$ 119.629.927**	**NA**	**$ 119.629.927**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 2.117.318.518	**$ 2.117.318.518**		
6	**jun-22**	$ 102.582.000	$ 19.490.580	**$ 122.072.580**	**NA**	**$ 122.072.580**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 1.995.245.938	**$ 1.995.245.938**		
7	**jul-22**	$ 102.317.000	$ 19.440.230	**$ 121.757.230**	**NA**	**$ 121.757.230**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 1.873.488.708	**$ 1.873.488.708**		
8	**ago-22**	$ 131.410.000	$ 24.967.900	**$ 156.377.900**	**NA**	**$ 156.377.900**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 1.717.110.808	**$ 1.717.110.808**		
9	**sep-22**	$ 125.944.800	$ 23.929.512	**$ 149.874.312**	**NA**	**$ 149.874.312**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 1.567.236.496	**$ 1.567.236.496**		
10	**oct-22**	$ 126.114.000	$ 23.961.660	**$ 150.075.660**	**NA**	**$ 150.075.660**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 1.417.160.836	**$ 2.267.640.836**		
11	**nov-22**	$ 137.312.000	$ 26.089.280	**$ 163.401.280**	**NA**	**$ 163.401.280**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 1.253.759.556	**$ 2.104.239.556**		
12	**dic-22**	$ 137.128.700	$ 26.054.453	**$ 163.183.153**	**NA**	**$ 163.183.153**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 1.090.576.403	**$ 1.941.056.403**		
14	**ene-23**	$ 137.312.000	$ 26.089.280	**$ 163.401.280**	**NA**	**$ 163.401.280**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 927.175.123	**$ 1.777.655.123**		
14	**feb-23**	$ 147.124.000	$ 27.953.560	**$ 175.077.560**	**NA**	**$ 175.077.560**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 752.097.563	**$ 1.602.577.563**		
15	**mar-23**	$ 140.942.700	$ 26.779.113	**$ 167.721.813**	**NA**	**$ 167.721.813**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 584.375.750	**$ 1.434.855.750**		
16	**abr-23**	$ 138.556.500	$ 26.325.735	**$ 164.882.235**	**NA**	**$ 164.882.235**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 419.493.515	**$ 1.269.973.515**		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
17	**may-23**	$ 121.705.000	$ 23.123.950	**$ 144.828.950**	**NA**	**$ 144.828.950**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 274.664.565	**$ 1.125.144.565**		
18	**jun-23**	$ 122.093.000	$ 23.197.670	**$ 145.290.670**	**NA**	**$ 145.290.670**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ 129.373.895	**$ 979.853.895**		
19	**jul-23**	$ 124.999.000	$ 23.749.810	**$ 148.748.810**	**NA**	**$ 129.373.895**	**NA**	No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23	$ -	**$ 831.105.085**		
					NA	**$ 19.374.915**	**NA**	No. de Registro 1131522 de fecha 2022-10-24	$ 831.105.085			
20	**ago-23**	$ 132.250.000	$ 25.127.500	**$ 157.377.500**	**NA**	**$ 157.377.500**	**NA**	No. de Registro 1131522 de fecha 2022-10-24	$ 673.727.585	**$ 823.727.585**		
21	**sep-23**	$ 132.250.000	$ 25.127.500	**$ 157.377.500**	**NA**	**$ 157.377.500**	**NA**	No. de Registro 1131522 de fecha 2022-10-24	$ 516.350.085	**$ 666.350.085**		
22	**oct-23**	$ 143.526.000	$ 27.269.940	**$ 170.795.940**	**NA**	**$ 170.795.940**	**NA**	No. de Registro 1131522 de fecha 2022-10-24	$ 345.554.145	**$ 495.554.145**		
23	**nov-23**	$ 144.191.000	$ 27.396.290	**$ 171.587.290**	**NA**	**$ 171.587.290**	**NA**	No. de Registro 1131522 de fecha 2022-10-24	$ 173.966.855	**$ 323.966.855**		
24	**dic-23**	$ 146.922.000	$ 27.915.180	**$ 174.837.180**	**NA**	**$ 173.966.855**	**NA**	No. de Registro 1131522 de fecha 2022-10-24	$ -	**$ 149.129.675**		
						$ 870.325	**NA**	No. de Registro 63023 de fecha 2023-03-16	$ 149.129.675			
25	**ene-24**	$ 78.644.000	$ 14.942.360	**$ 93.586.360**	**NA**	**$ 93.586.360**	**NA**	No. de Registro 63023 de fecha 2023-03-16	$ 55.543.315	**$ 255.543.315**		
26	**feb-24**	$ 78.644.000	$ 14.942.360	**$ 93.586.360**	**NA**	**$ 55.543.315**	**NA**	No. de Registro 63023 de fecha 2023-03-16	$ -	**$ 200.000.000**		
						$ 38.043.045		No. de Registro 63023 de fecha 2023-03-16	$ 161.956.955	**$ 161.956.955**		
27	**mar-24**	$ 74.783.000	$ 14.208.770	**$ 88.991.770**	**NA**	**$ 88.991.770**	**NA**	No. de Registro 63023 de fecha 2023-03-16	$ 72.965.185	**$ 72.965.185**		
28	**abr-24**	$ 38.050.500	$ 7.229.595	**$ 45.280.095**	**NA**	**$ 45.280.095**	**NA**	No. de Registro 63023 de fecha 2023-03-16	$ 27.685.090	**$ 27.685.090**		
29	**may-24**	$ 98.713.000	$ 18.755.470	**$ 117.468.470**	**NA**	**$ 27.685.090**	**NA**	No. de Registro 426424 de fecha 2024-05-16	$ -	**$ 460.216.620**		
						$ 89.783.380		No. de Registro 426424 de fecha 2024-05-16	$ 460.216.620			
30	**jun-24**	$ 102.661.000	$ 19.505.590	**$ 122.166.590**	**NA**	**$ 122.166.590**	**NA**	No. de Registro 426424 de fecha 2024-05-16	$ 338.050.030	**$ 338.050.030**		
31	**jul-24**	$ 99.486.000	$ 18.902.340	**$ 118.388.340**	**NA**	**$ 118.388.340**	**NA**	No. de Registro 426424 de fecha 2024-05-16	$ 219.661.690	**$ 219.661.690**		
	TOTALES	**$ 3.391.075.350**	**$ 644.304.317**	**$ 4.035.379.667**	**$ -**	**$ 4.035.379.667**	**$ -**	**$ -**	**$ 219.661.690**	**$ 219.661.690**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 2.641.707.900	$ 501.924.501	$ 3.143.632.401
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 749.367.450	$ 142.379.816	$ 891.747.266
*			
VALOR TOTAL	$ 3.391.075.350	$ 644.304.317	$ 4.035.379.667

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 68202-45346 STD

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El seguimiento a la garantía y seguros del contrato de interventoría se reporta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA, adicionalmente se adjunta copia de las pólizas correspondientes.

En este formato se relacionan las pólizas de cumplimiento del contrato de Interventoría, se realizan el seguimiento a las garantías del contrato y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad. Se adjunta la carta de aprobación de las pólizas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2274-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NACIONAL ET

OBJETO DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 27/01/2022

PLAZO INICIAL: AL 31/07/2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.504.561.357,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.255.041.357,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	10%	$ 425.504.135,70	30	12	2021	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	50%	$ 1.308.268.603,64	30	12	2021	30	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	20%	$ 851.008.271,40	30	12	2021	30	10	2027
Calidad del servicio	30%	$ 1.276.512.407,10	31	7	2022	31	7	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101143194

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 14/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 68202-45346 STD

Firma

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101143194	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	05	2024	30	12	2021	00:00	31	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO NACIONAL ET	NIT: 901.551.949-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 49 A NRO. 94 - 76 OFC. 601	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7446234

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO No. 2274 DE 2021, REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 3.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	30/04/2025	$425,504,135.70	$425,504,135.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	30/10/2024	$1,308,268,603.64	$1,308,268,603.64
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	31/10/2027	$851,008,271.40	$851,008,271.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$1,276,512,407.10	$1,276,512,407.10

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN PRORROGA No. 4 ADICION No. 4 AL CONTRATO No. 2274 DE 2021, SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS Y SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE AJUSTARA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,154,106.00	$ *******8,000.00	$ *****220,800.00	$ *********1,382,906.00	$ ****3,861,293,417.84	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101143194

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101143194**	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	**05**	**2024**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**10**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO NACIONAL ET		**NIT: 901.551.949-6**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
CR 49 A NRO. 94 - 76 OFC. 601		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7446234	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
CARRERA 59 NO.26-60		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7056000	

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,154,106.00	$ *******8,000.00	$ *****220,800.00	$ *********1,382,906.00	$ ****3,861,293,417.84	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002115621859(3900)000001382906(96)20221230

REFERENCIA PAGO:

1100211562185-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101143194	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	05	2024	30	12	2021	00:00	31	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO NACIONAL ET		**NIT: 901.551.949-6**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 49 A NRO. 94 - 76 OFC. 601		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7446234

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CARRERA 59 NO.26-60		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
TORRES ARENALES ELSA	63323375	50.00
RT - TERRA S.A.S.	900579055-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101143194

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101143194, anexo 11, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de MAYO de 2024

14-44-101143194

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670055418 11

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000055418112

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
02/05/2024 02:31p.m.

RECIBIMOS DE: AMAYA J. & CIA. LTDA. NIT. 900.710.161

LA SUMA DE: Tres millones doscientos noventa y cuatro mil trescientos treinta y dos pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000055418112

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHAPINERO-44-101143194-10-1	$1,606,240.00		$305,186.00	$1,911,426.00
CHAPINERO-44-101143194-11-1	$1,162,106.00		$220,800.00	$1,382,906.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 3,294,332.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 3,294,332.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005541811

TOTAL: $3,294,332.00

CAJERO: PAGUESTADO

5/2/2024 2:36:47PM

172.16.10.23

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

14-44-101143194

Número de anexo:

11

Fecha de expedición:

jueves, 2 de mayo de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Tomador:

CONSORCIO NACIONAL ET

Inicio de vigencia:

jueves, 30 de diciembre de 2021

Fin vigencia:

domingo, 31 de octubre de 2027

Valor total asegurado:

$ 3.861.293.418

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

· Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.

· Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

· Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

· Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

· Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

· Pólizas ramo **SOAT**: (601) 432 4102 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com

- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2274-2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO NACIONAL ET

FECHA DE INICIO: 27/01/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/07/2022 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No:	199 - 2021 (Indicar número y año)	**CONTRATISTA:**	INVERSIONES PSAVZ SAS
CONTRATO DE OBRA No:	L.P.I.T. 008 - 2022 (Indicar número y año)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC
CONTRATO DE OBRA No:	LP-009-2021 (Indicar número y año)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO TERRÓN
CONTRATO DE OBRA No:	LP-010-2021 (Indicar número y año)	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VIAL LA MADERA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: **21/04/2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X — No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X — No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-45346 STD

Firma
Nombre: NA
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Seguimiento a la inversión del Anticipo

El CONSORCIO NACIONAL ET no ha realizado la solicitud del Anticipo que se otorga al contrato de interventoría, por lo anterior no se presentan el seguimiento ni los formatos MEPI-MN1-IN-3-FR-1 y MEPI-MN1-IN-3-FR-2.

Plan de Cargas o Reprogramación del Plan de Cargas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021
CONSORCIO NACIONAL ET
MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PLANILLA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CARGAS

PLAN DE CARGAS TRIMESTRAL DE LA OBRA

CÓDIGO	MEPI-FM01-IN-APP-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 17/09/2020 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

FECHA:
PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** 0
(Diligenciar el número de la Reprogramación de Cantidades respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2074-2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3

INTERVENTOR: CONSORCIO NACIONAL IET
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR EUDARO LEMUS VILLADIEGO
RESOLUCIÓN No.: 668 DE 17/02/2020 (Día/mes/año)

CONTRATO No. OBRA: 1906 - 2019
CONTRATO No. OBRA: 1 - 1 - 20191220 0945
CONTRATO DE OBRA No.: LP-009-2021
CONTRATO DE OBRA No.: LP-010-2021
CONTRATO DE OBRA No.: LP-011-2021
CONTRATO No. OBRA: 2074-2021
CONTRATO No. OBRA: 1906-2019

CONTRATISTA: MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A.S.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL NORTE
CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LA MADERA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE CORDOBA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR MUNICIPIOS
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORES RURALES 2019

PLAZO INICIAL: 6.3 (En meses con dos (2) decimales como máximo)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/01/2022 (Día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/04/2024 (Dejar en suspensión para corregir/incluir en periodo de vista)
VALOR INICIAL (Incluido AIU): $ 2.506.387.307,00 (Dejar en blanco)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (Incluido AIU): $ 4.266.561.367,00

PLAZO ACUMULADO: 33.2 (En meses con dos (2) decimales como máximo y en suspensión)
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/10/2024 (Incluida la suspensión. Máximo diciembre)
FECHA DE REANUDACIÓN: 29/04/2024 (Máximo diciembre)
VALOR APROPIADO (Incluido AIU): $ 1.760.000.000,00

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha _____ | | | 2022 | | | |

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Interventoría 2274 de 2021, suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) y el CONSORCIO NACIONAL ET, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3; se presentó el Informe Mensual de Interventoría No 30, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2024.

- En el presente Informe Mensual de Interventoría se relacionan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el período comprendido del 1 y el 30 de julio de 2024, teniendo en cuenta aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales.

- Para lo cual el CONSORCIO NACIONAL ET dispuso en obra durante el Mes de julio de 2024 a personal y equipo para llevar de forma adecuada el control y registro de actividades realizadas por el Contratista paralelamente a la labor administrativa relacionada con el desarrollo del contrato de Interventoría.

- Durante el mes de julio de 2024 el CONSORCIO NACIONAL ET realizó revisión de información documental del proyecto, actualización de bitácora. Realizó requerimientos al Contratista de carácter técnico, administrativo, seguridad y salud en el trabajo. Dejando constancia de los resultados de la revisión en comités de obras y oficios remitidos al Contratista, Municipio de Sahagún y Entidad Contratante.

- El CONSORCIO NACIONAL ET durante el Mes de julio de 2024 prestó apoyo al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) para atender los requerimientos del Contratista de Obra en el periodo, en el marco de sus funciones como Interventor. Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2024, el CONSORCIO NACIONAL ET presentó al Instituto Nacional de Vías - INVIAS- dos informes semanales y el presente informe Mensual de Interventoría

8 ANEXOS

8.1 CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1955	05/07/2024	Alcaldia	Reiteracion de solicitud de remisión de los rendimientos financieros del convenio
ET-2274-1957	10/07/2024	Alcaldía	Actualización de la información en la plataforma transaccional secop II de los contratos relacionados
ET-2274-1978	8/07/2024	Contratista	Balance ambiental a la terminación del contrato de obra
ET-2274-1979	8/07/2024	Contratista	Observaciones a informes área social
ET-2274-1981	17/07/2024	Contratista	Requerimiento reparación de losas fisuradas y sellado de juntas de pavimento.
ET-2274-1983	18/07/2024	Contratista	No conformidades área SST, área ambiental, plan de manejo vial
ET-2274-1984	19/07/2024	Alcaldía	Respuesta oficio CCRBV-036
ET-2274-1987	22/07/2024	Contratista/Alcaldía	Recorrido en obra con INVIAS
ET-2274-1991	22/07/2024	contratista	Solicitud documentos del área SST para cierre de proyecto
ET-2274-1995	22/07/2024	Contratista	Solicitud requerimientos para finalización del proceso de terminación de contrato en la gestión social
ET-2274-2006	31/07/2024	contratista	Plano récord y caracterización vial

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
	12/07/2024	Interventoría	Adecuación acceso del centro de salud el Olivo

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Se anexa registro fotográfico respectivo.

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA No 178 DE 31 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL"

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3





D D – l d Drd D r r dD

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3





D D – ru d d d d D

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3





D D – r d Dr

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3





D D – u d d D d D rr d r D

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3





D D l d Drd D r r dD

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3





D D D l D r r Dr

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3






D D – R D d d r D r d D

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3



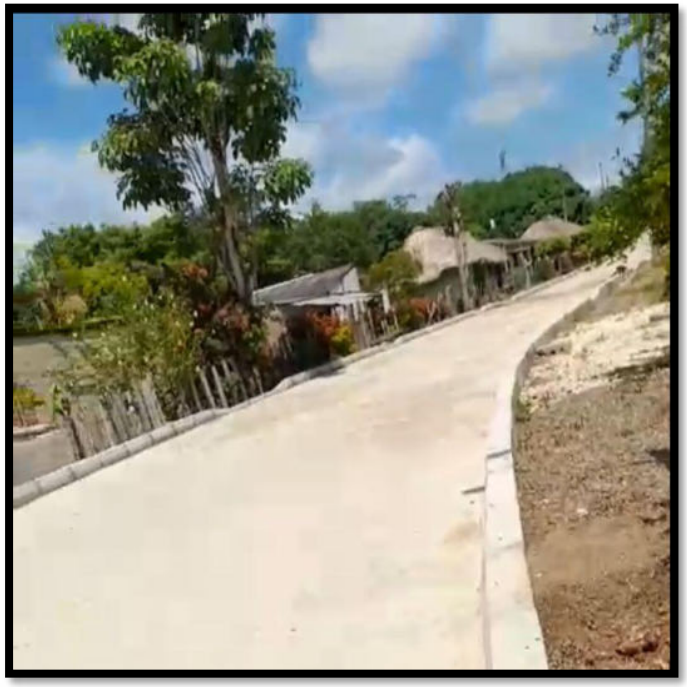

D D – r D r

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3





D D r D r

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y SOSTENIBILIDAD

Se anexa registro fotográfico respectivo.

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES SOCIALES ,AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD

CONTRATO DE OBRA No 178-2023
OBJETO. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL"

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3



D D



r d r jD

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3





D D "u d u D d D r

CONTRATO No. 2274 - 2021
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3





D D D u D d

8.4 BITACORA

Se anexa bitácora respectiva del mes de julio de 2024.

K3+406,4 hasta K3+320 carril izquierdo, se instala acero de refuerzo transversal, se toman muestras de concreto en viguetas para revisar su resistencia, una vez tenga su tiempo de secado se realizan cortes de las juntas transversales.
* Se recomienda señalizar adecuadamente areas de trabajo y material en la vía.

FIRMA CONTRATISTA

Liceth Corrales M.
FIRMA INTERVENTOR

Lunes 01 de julio 2024
Estado del tiempo: Lluvia moderadas desde 11:30 am
Equipo en obra: (1) residente, (1) siso, (2) Topografía, (2) opiciales, (5) ayudantes.
Actividad en obra:
* Limpieza de rieles, organización de terreno desde abscisa K3+320 – K3+300, se instalan rieles.
* Instalación de bordillos prefabricados en tramo 2.

FIRMA CONTRATISTA

Liceth Corrales M.
FIRMA INTERVENTOR.

Martes 02 de julio 2024
Estado del tiempo: Soleado
Equipo en obra: (1) residente, (1) siso, (2) Topografia, (3) opiciales, (11) ayudantes
Actividades en Obra:
* Se organiza terreno entre abscisas K3+680 hasta K3+600 carril derecho.
* Se continua instalando bordillos prefabricados en todo el tramo.
* se organiza terreno y se instalan rieles en tramo comprendido entre K3+300 hasta K3+200 carril izquierdo.

Powered by CamScanner

* Se realiza sello de juntas de pavimento.
* Se recomienda al contratista intervenir lo antes posible las placas que se encuentran fisuradas.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

Miercoles 03 de Julio 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: (1) Residente, (1) siso, (1) Maestro (2) Topografia, (5) oficiales, (11) ayudantes.
Actividades en obra:
* Se continua organizando terreno en tramo K3+300 – K3+200 carril izquierdo.
* Se trabaja en excavaciones manual para la instalación de bordillos prefabricados.
* Se realiza limpieza de juntas longitudinal y transversal de losas del pavimento y se aplica el sello de este.
* Se recomienda al contratista instalar señalización preventiva en cada cuadrilla de trabajo, para evitar incidentes.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA

Jueves 04 de Julio 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: (1) residente, (1) siso, (5) oficiales (11 ayudantes, 1 Maestro)
Actividades en Obra:
* Se realizon densidades en campo en tramo comprendido entre K3+320 hasta K3+260 estas fueron aprobadas y liberada para fundido. (carril izquierdo).
* Se realiza fundida de losas de pavimento en concreto MR38, Tramo comprendido entre abscisas

Powered by CamScanner

K3+320 hasta K3+260 carril izquierdo, se instala acero de refuerzo transversal, se toman muestras de concreto en viguetas para revisar su resistencia, una vez tenga su tiempo de secado se realizan cortes de las juntas transversales.
* Se continúa actividad de instalación de bordillos prefabricados.
* Se recomienda señalizar adecuadamente áreas de trabajo y material en la vía.

Jaime Corralles.
FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONTRATISTA

Viernes 05 de Julio 2024
Estado del tiempo: Lluvias moderas durante la mañana. (2 horas aproximadamente)
Personal en la obra: (1) Residente, (1) SISO, (5) oficiales, (11) ayudantes.
Actividad en obra:
* Se realiza fundida de losas de pavimento en concreto MR38, tramo comprendido entre abscisas K3+260 – K3+250 carril izquierdo, se instala acero de refuerzo transversal; se suspendio la fundida porque se presentó lluvizmos.
* Se suspendieron las actividades de excavación manual para bordillos e instalación de ellos por la lluvia presentada.
* Se recomienda al contratista una vez termine las fundidas recoger bolsas de cemento utilizadas y disponer en el lugar autorizado en el PAGA.

FIRMA CONTRATISTA

Jaime Corralles.
FIRMA INTERVENTOR

Powered by CamScanner

Sabado 6 de julio 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: (1) residente, (1) siso, (1) Maestro (11) ayudantes, (5) oficiales.
Actividades en obra:
* Instalación de bordillos prefabricados.
* Fundido de losas de pavimento en concreto MR 38, Tramo comprendido entre abscisas K3+250 - K3+214 carril izquierdo, se instala acero de refuerzo transversal, se toman muestras de concreto en viguetas para revisar su resistencia, una vez tenga su tiempo de secado se realizan cortes de las junta transversales.
* Se recomienda señalizar muy bien las areas donde hay materiales sobre la vía.

FIRMA CONTRATISTA

Liliana Cornelio M.
FIRMA INTERVENTOR.

Domingo 7 de julio 2024
No se realizó ninguna actividad en obra.

FIRMA CONTRATISTA

Liliana Cornelio M.
FIRMA INTERVENTOR.

Lunes 8 de julio 2024
Estado del tiempo: Nublado, lluvia en madrugada
Personal en obra: (1) Residente, (1) siso, (3) oficiales (9) ayudantes, Topografos (2).
Actividades en obra:
* Se organiza terreno de tramo K3+680 — K3+600 carril derecho, se instalan rieles.
* Se realiza excavación manual para instalación de bordillos prefabricados.
* Se recomienda al contratista iniciar con la actividad de arreglo de losas fisuradas.

Powered by CamScanner

* Señalizar areas de trabajo oportunamente, y materiales puestos sobre la vía.

FIRMA CONTRATISTA — FIRMA INTERVENTOR

Martes 9 de Julio 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: (1) residente, siso (1), Maestro (1), Topografo (2), Oficiales (5), ayudantes (11).
Actividades ejecutadas:
* se continua organizando terreno e instalando rieles para pavimento en el tramo comprendido entre K3+680 - K3+600 carril derecho.
* se realiza fundida de losas de pavimento en concreto MR38, tramo comprendido entre abscisas K3+244 hasta K3+200 carril izquierdo para culminar este carril; se instala acero de refuerzo transversal, se toman muestras del concreto utilizado para revisar su resistencia; se realiza cortes transversales a las placas una vez se encuentren aptas para soportar el peso de la cortadora.
* se realiza sello de juntos longitudinales y transversales en el pavimento ya terminado.

FIRMA CONTRATISTA — FIRMA INTERVENTOR

Miercedes 10 de julio 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: (1) residente, (1) siso,

Powered by CamScanner

(2) comisión topográfica, (5) oficiales, (11) oyudantes.
Actividades ejecutados en obra:
* Verificación de niveles en rieles instalados en tramo K3+680 - K3+600 carril derecho, por comisión topográfico de la interventoría está aprobó su instalación y libero tramo para la realización de densidades en campo.
* se realizan densidades en campo para verificar % de compactación de la subbase instalada y espesor de la misma; equipo de la interventoría aprueba estas densidades y libera tramo para fundida de losas de concreto MR 38.
* se realiza fundida de losas de pavimento en concreto MR8, Tramo comprendido entre K3+680 - K3+668 carril derecho, se instala acero de refuerzo transversal, se toman muestras del concreto en viguetas para realizar pruebas para verificación de su resistencia, se realizan cortes de los juntos transversales una vez se encuentre seco el concreto.
* Se recomiendo señalizar adecuadamente áreas de trabajo.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA

Jueves 11 de Julio 2024
Estado del tiempo: Lluvia presentados en la madrugada - día nublado.
Personal en obra: (1) residente, (1) siso) (3) oficiales y (2) oyudantes; Topografia (2)
Actividades ejecutados:
* Se organiza nuevamente tramo desde

Powered by CamScanner

abscisa K3+668 hasta K3+600 por motivo de lluvia lo subbase se lavó y se removela nuevamente.

* Se realiza excavación manel para instalación de bordillos prefabricados. Luego se instalan sobre una capa de solado de concreto clase F 2000 psi.
* Se organiza más terreno y se instalan rieles desde Tramo comprendido entre K3+600 - K3+520 carril derecho.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

Viernes 12 de Julio 2024
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) siso, (1) Maestro, (2) Topografo, (5) oficiales, (11) oyudantes.
Actividades en obra:
* Se realizo fundida de losas de pavimento en concreto MR38, Tramo comprendido entre K3+668 - K3+628 carril derecho, se instala acero de refuerzo transversal, se toman muestras del concreto en viguetas para realizar pruebas para verificación de su resistencia. Se realizan cortes a las juntas transversales una vez se encuentre seco el concreto.
* Se verifican los rieles instalados desde abscisas K3+600 - K3+520 carril derecho, ubicación de descole: se recomiendo en este punto colocarle piedra pegada para que no se sorove por el flujo de agua que le va a llegar; el punto o ubicación del descole fue aprobado por la comunidad

Powered by CamScanner

dado que este punto en específico ha sido siempre uno de los desdes de vía.
El contratista se comprometio en este punto colocar el bordillo a 8cm del pavimento para darle solido al agua, y colocarle piedra pegada para protegerlo de socavaciones futuras.
*se libera instalación de rieles desde K3+600 – K3+520 carril derecho para densidades en campo.
*Instalación de bordillos prefabricados en carril izquierdo.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

Sabado 13 de Julio 2024
Estado del tiempo: soleado
Personal en Obra: (1) residente, (1) siso, (1) Maestro Opriciales (5), oyudantes (11)
Actividades en Obra:
*Se realizan densidades de campo para verificar el porcentaje de compactación del terreno en tramo carril derecho de K3+600 – K3+520, estos son aprobados por interventoria.
*Se realiza fundida de losas de pavimento en concreto MR38, Tramo comprendido entre K3+628 hasta K3+596 carril derecho, se instala acero de refuerzo transversal, se toman muestras del concreto en viguetas para realizar pruebas para verificación de su resistencia, se realizan los cortes de los juntos transversales una vez se encuentre seco el concreto.
*Se realiza excavación manual para la instalación de bordillos prefabricados.

Powered by CamScanner

* se recomienda al contratista señalizar areas de trabajo, material sobre la vía y demás obstaculos que puedan ser causantes de accidentes.

FIRMA CONTRATISTA — FIRMA INTERVENTOR.

Domingo, 14 de Julio 2024.
Estado del tiempo: soleado.
El día de hoy no se realizó ninguna actividad de campo.

FIRMA CONTRATISTA — FIRMA INTERVENTOR

Lunes, 15 de Julio 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: (1) Residente, (1) SISO (5) oficiales y (11) ayudantes.
Actividades en obra:
* Fundida de losas de pavimento en concreto MR 38, Tramo comprendido entre abscisas K3+596 - K3+567 carril derecho, se instala acero de refuerzo transversal, se toman muestras de concreto en viguetas para la realización de ensayos de laboratorio para verificar la resistencia obtenida, se realizan los cortes de juntas transversales una vez se encuentre seco el concreto.
* Se realiza instalación de bordillos prefabricados en carril derecho.
* Se le recomienda al contratista señalizar los areas de trabajo y materiales sobre la vía.
* Se le recuerda al contratista hacer las

Powered by CamScanner

reparaciones de las placas fisuradas en el tramo de Santa Cecilia y en tramo el Olivo.
* Se encontró varios bordillos instalados en cuneta izquierda desalineados, fueron golpeados por llantas de vehículos tipo camión, se le solicita al contratista organizarlos y rellenar los espaldares de estos elementos para evitar futuros Volcamientos.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

Martes, 16 de Julio 2024
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: (1) residente, (1) siso (3) oficiales, (5) oyudantes.
Actividades en Obra:
* se continúa con la instalación de cordon y sello de juntas del pavimento, transversal y longitudinal.
* Se realiza excavación manual para la instalación de bordillos prefabricados.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR.

Miercoles, 17 de Julio 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: (1) residente, (1) siso, (3) oficiales, (5) oyudantes.
Actividades en obra:
* Se Finaliza la Fundida de losas de pavimento MR 38 en cuneta derecha, tramo comprendido entre K3+967 hasta K3+520, se instala acero de refuerzo transversal

Powered by CamScanner

se toman muestras del concreto en viguetas,
se realizan los cortes de las juntas transversales una vez se encuentre seco el concreto.
* se continúa con la instalación de bordillos prefabricados en carril derecho.
* se realiza descole en bordillos frente al cementerio de el olivo, carril derecho.

FIRMA CONTRATISTA

Juliana Gonzalez.
FIRMA INTERVENTOR

Jueves, 18 de Julio 2024
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: (1) residente, (1) siso, (2) operarios y (5) oyudantes.
Actividades en obra:
* se realiza excavación manual para la instalación de bordillos prefabricados.
* Se instalan bordillos prefabricados en carril derecho de la vía, se sellan juntas entre bordillo y bordillo instalados con mortero 1:3.
* Se le solicita al contratista reparar las losas fisuradas encontradas en el tramo de santa cecilia y el olivo.

FIRMA CONTRATISTA

Juliana Gonzalez Castaño
FIRMA INTERVENTORIA

Viernes, 19 de Julio 2024
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en Obra: (1) residente, (1) siso, (2) operarios y (5) oyudantes.
Actividades en obra:
* Se realizan descoles en la vía con bordillos prefabricados, uno ubicado cerca del cementerio

Powered by CamScanner

y otro en cercanías al antiguo colegio de el Olivo ambos en el carril derecho.
* Se continúa con la instalación de bordillos prefabricados en carril derecho, se toman juntas de dilatación entre bordillo y bordillo con mortero 1:3.
* Se recomienda al contratista señalizar áreas de trabajo para evitar incidentes con la comunidad y personal que transita sobre este tramo.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

Sabado, 20 de Julio 2024
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra : (1) Residente, (1) SISO)
(3) ayudantes, (1) oficial.
Actividades en Obra:
*Se realiza sello de juntas de pavimento en carril derecho, juntas transversales y longitudinal.
* Se realiza excavación manual para instalación de bordillos prefabricados.
* Señalizar adecuadamente las áreas de trabajo y materiales sobre la vía, para evitar accidentes.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

Domingo, 21 de Julio 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en Obra: No se realizó ninguna actividad el día de hoy por tal motivo

Powered by CamScanner

no se encuentra personal en obra.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

Lunes, 22 de Julio 2024.
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: (1) residente, (1) siso, (5) oficiales, (10) oyudantes.
Actividades en obra:
* La desinstalación de bordillos afectados por llantas de camión y la nueva instalación se inicia el día de hoy.
* Se continúa con el sello de juntas de losas del pavimento transversal como longitudinal.
* Instalación de bordillos prefabricados en carril derecho.
* Relleno con material seleccionado de espaldones de bordillos.
* Se reitera al contratista el arreglo de las placas fisuras en el tramo 1 y Tramo 2; se le recuerda que este concreto no se aceptará para efectos de recibo final de obra si no son reparadas.
* Se le recomienda al contratista el inicio de las actividades de pintura de líneas de demarcación en tramo 1 y 2; y la caracterización vial.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

Martes 23 de julio 2024.
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: (1) residente, (1) siso (5) oficiales y (10) oyudantes.

Powered by CamScanner

Actividad en obra:
* Se realiza relleno de espaldares de bordillos prefabricados instalados en tramo 1 y 2.
* Se continúa con la instalación de bordillos prefabricados en carril derecho.
* Se finaliza el sello de juntas transversales y longitudinales del pavimento.
* Se continúa con la desinstalación de bordillos afectados por llantas de vehículo tipo camión y la nueva instalación de los mismos, se va rellenando el espaldar de estos con mortero seleccionado.
* Se inicia con la limpieza general en Obra.

FIRMA CONTRATISTA — FIRMA INTERVENTOR.

Miercoles, 24 de Julio 2024
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: (1) residente, (1) siso, (3) oficiales, (5) oyudantes.
Actividades en obra:
* Se realizo relleno de espalduras de bordillos prefabricados instalados en tramo 1.
* Se finaliza la instalación de bordillos prefabricados en tramo 1 en ambos carriles.
* Se toman juntas de dilatación entre bordillo y bordillo instalado con mortero 1:3.
* Limpieza general en Obra.

FIRMA CONTRATISTA — FIRMA INTERVENTOR

Jueves, 25 de Julio 2024
Estado del tiempo: Soleado.

Powered by CamScanner

Personal en Obra: (1) residente, (1) siso, (4) oficiales, (5) ayudantes.
Actividades en Obra:
* Se toman juntas de dilatación entre bordillo y bordillo instalado con mortero 1:3.
* se realiza relleno de espaldares de bordillos prefabricados con material seleccionado.
* Limpieza general en obra.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

Viernes, 26 de Julio 2024
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: (1) residente, (1) siso, (2) oficiales, (4) oyudantes; (2) Topografo.
Actividades en obra:
* Se inicia levantamiento topografico para plano record.
* Se finaliza el sello de juntas de dilatación entre bordillo y bordillo instalado con mortero 1:3.
* se Termino el relleno de espaldares de bordillos prefabricados con material seleccionado.
* Limpieza general en Obra.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

Sabado, 27 de Julio 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en Obra: (2) Topografia, (4) oyudantes
Actividades en Obra:
* Levantamiento topografico para plano record.
* Limpieza general en Obra.
* Se reitero al contratista el arreglo de

Powered by CamScanner

Las placas fisuradas en tramo 1 y 2 ¡estas no se recibiran si no se realiza la reparación correspondiente en cada caso.
* Aún no se realiza la pintura de demarcación en los dos tramos, se le recuerda al contratista que faltan 4 días para la culminación de este contrato.

FIRMA CONTRATISTA

Juana Corrales.
FIRMA INTERVENTORA

Domingo, 28 de Julio 2024
Estado del tiempo: Soleado.
No se realizó ninguna actividad en Obra.

FIRMA CONTRATISTA

Juana Corrales.
FIRMA INTERVENTOR

Lunes, 29 de Julio 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) oficial y (4) oyudantes.
Actividades en obra:
* Se realizan accesos en concreto a tramo 1 y 2.
* Limpieza General en Obra.
* El contratista manifiesta que los señales verticales a instalar ya estan en producción y seran instalados al finalizar la semana, igualmente la pintura de las lineas de demarcación tambien se realizaron al finalizar la semana.

FIRMA CONTRATISTA

Juana Corrales.
FIRMA INTERVENTORA

Powered by CamScanner

Martes 30 de Julio 2024
Estado del tiempo : Soleado.
Personal en Obra: (1) residente, (1) Oficial y (3) ayudantes.
Actividades en Obra:
* Finaliza la construcción de accesos a los tramos 1 y 2 en concreto.
* Finaliza limpieza general en Obra.
* Se deja relacionado en esta bitacora que el contratista aun no ha realizado las reparaciones de las placas fisuradas en tramo 1 y 2; se compromete a ejecutar y entregar esta misma semana.
* la instalación de señales verticales de transito y la Lineas de demarcación en la vía, tambien se compromete a realizar esta misma semana.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

Powered by CamScanner
