INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA

INFORME MENSUAL 14
1 A 28 DE FEBRERO DE 2023

CERETE, CÓRDOBA

FENRERO 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 2276-2021

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA

INFORME MENSUAL 14
1 A 28 DE FEBRERO DE 2023

CERETE, CÓRDOBA

FEBRERO 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 172 DE 2021 **Contratista:** DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

Contrato de Interventoría No. 2276 del 2021 **Interventoría:** CONSORCIO ACI-3B

Objeto Contrato de Obra:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

INFORME MENSUAL No. 14 **MES O PERIODO:** FEBRERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	4
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		17
3.1	Información general del contrato		17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		18
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		21
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		21
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		22
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	23
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	23
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	23
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	24
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	24
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	24
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	24
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		24
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	24
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	24
	• Seguimiento Programa de Obra		24
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	24
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	24
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	24
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	24
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		25
5.1	Información general del contrato		25
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		25
5.3	Informes especialistas y profesionales		26
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		26
5.5	Informe matriz de riesgos.		26
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		26
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		26
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		27
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	27
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	27
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	27
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	27
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	27
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		27
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	27
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	27
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	28
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	28
7	**Conclusiones y recomendaciones**		29
8	**Anexos**		30
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		30
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		30
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		35
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		35

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: NESTROR LEMUS VILLADIEGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No.558 de fecha 17 de febrero de 2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 28/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: 172 DE 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 31/01/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/03/2023
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 5.685.110.960,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 190.989.040,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 5.876.100.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	4388
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	0	3488
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

1630

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	5.636.522.432,00		5.636.522.432,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	15.928.400,00	3.026.396,00	18.954.796,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	29.633.731,90		29.633.731,90
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			5.685.110.960,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 226.795.925,50		226.795.925,50	5.740.297.851,85
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	15.928.400,00	$ 3.026.396,00	18.954.796,00	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				5.740.297.851,85

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	5.060.105.163,40
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	5.084.777.511,14
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,51%	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	9
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**24**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía San Antonio - Los cedros, Instalación de señales verticales K1+520



Vía San Antonio - Los cedros, Conformacion de espaldar de bordillos k1+990

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre Miguel Armando Diaz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN.

Con el objeto de mejorar la calidad de la infraestructura vial de nuestro país, el Gobierno Nacional viene implementado diferentes estrategias encaminadas al logro de ese objetivo, es así como en el sector de la red terciaria, dentro el programa "Colombia rural" por medio de INVIAS, se suscribieron convenios con los municipios del país con el objeto de ejecutar actividades de mejoramiento, conservación y mantenimiento a sus diferentes vías, donde la entidad aporta los recursos que se requieren para su ejecución que atienda los documentos técnicos, normas y especificaciones requeridas.

Para esto los municipios tenían la responsabilidad de contratar las empresas encargadas de ejecutar estas actividades, mediante licitación pública o selección abreviada según sea el caso para cada municipio, proceso constructivo que atenderá los diseños, alcances especificaciones y normas que defina INVIAS

La necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se encuentra en los estudios previos suscritos por el subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales forman parte del presente documento.

INVIAS adjudicó el contrato No. 2276 de 2021 al CONSORCIO ACI-3B, cuyo objeto es **"**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA**".**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia. El municipio de Cereté limita por el norte con los municipios de San Pelayo y Chima, porel este con el municipio de Ciénaga de Oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con los municipios de San Carlos y Montería.


El proyecto en estudio se localiza en zona rural del municipio de Cereté en el corregimiento de Rabolargo en el sector San Antonio – El Cedro, en la siguiente tabla se muestran las características de las vías. Nomenclatura Catastral Ancho de calzada (m) Bordillo (m) Longitud del tramo (m) Funcionalidad Tipo de terreno.

Nomenclatura Catastral	Ancho de calzada (m)	Bordillo (m)	Longitud del tramo (m)	Funcionalidad	Tipo de Terreno
San Antonio -El Cedro	5.50	0.2	3488.76	Terciaria	Plano

El material que se va a utilizar en este proyecto será suministrado por la cantera Villa Carmen la cual cuenta con licencia ambiental otorgada por la CAR del departamento. Es preciso aclarar que no será necesario montaje de plantas de asfalto y/o concreto, dicho material será suministrado por Plantas ya establecidas que cuenten con los permisos requeridos por la Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge – CVS. Asimismo, para el caso de material de arrastre, la explotación de dicho material no se hará en la zona, sino que será suministrado por canteras legalizadas.

A continuación, se muestra una imagen general y especifica de la ubicación de la vía en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.

Figura 1 Localización General del Proyecto.

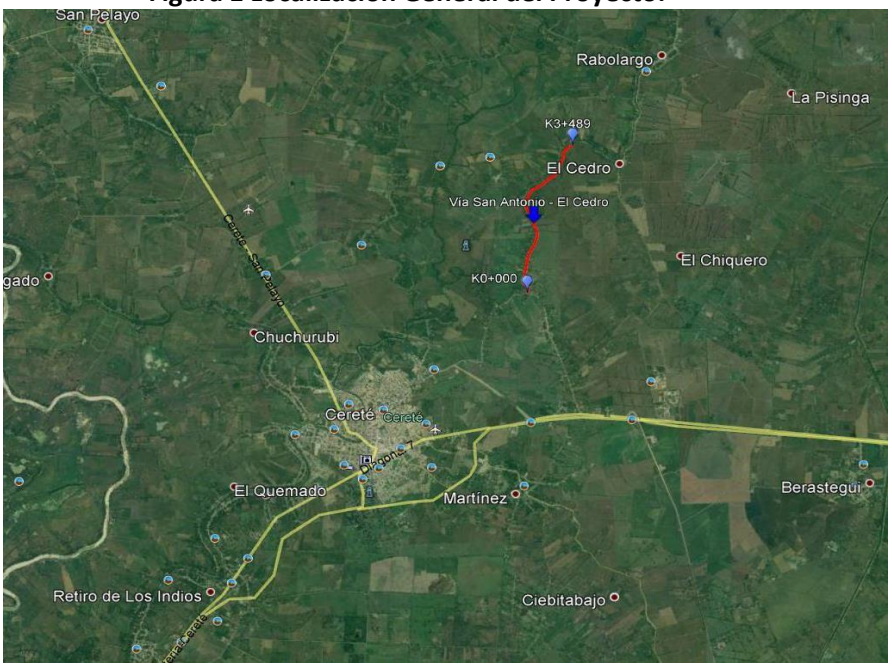

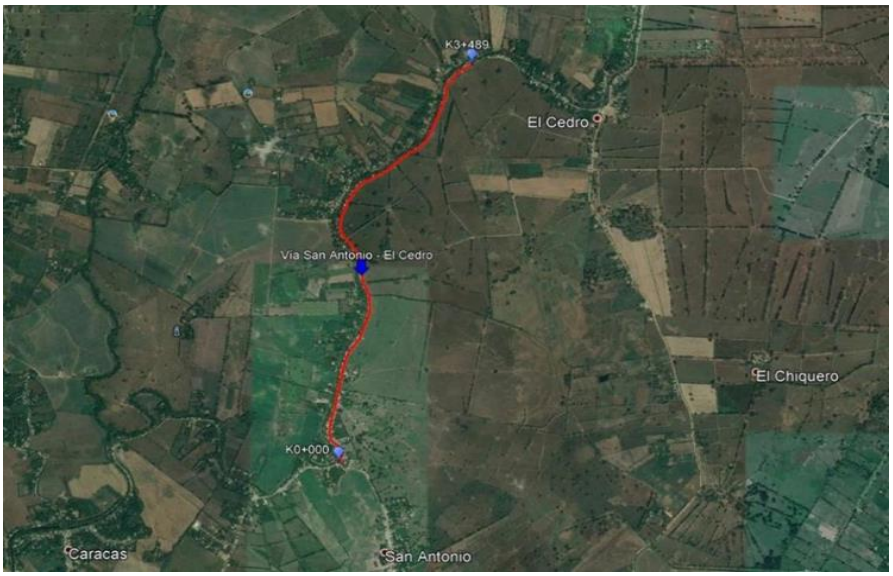


Figura 2 Localización específica de la vía a diseño

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Este proyecto cuenta con varios municipios que hacen parte de la zona de influencia, limitando al norte con el municipio de San Pelayo, por el este con el municipio de Ciénaga de oro, por el osete con el municipio de Montería y por el sur con el municipio de San Carlos,

Los cuales se ven beneficiados con la realización de este proyecto, ya que estos permiten la unión

entre las cabeceras municipales, de esta manera se potencia el intercambio comercial y se fortalece la economía nacional, reduciendo también los costos operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando en tiempo y contaminación del ambiente y en consecuencia brindando más impulso económico de la zona por donde atraviesa dicho proyecto.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR:

Actualmente esta vía se encuentra en afirmado en regulares condiciones, ya que su capa de rodadura se ha desgastado por la falta de mantenimiento periódico y rutinario, no se han atendido los puntos críticos aunado al tránsito de vehículos pesados, lo que conlleva a daño en vehículos particulares, baja transitabilidad y largos periodos de desplazamiento; notándose deterioros generalizados como ondulaciones, ahuellamiento, perdida de grava, baches.

	
San Antonio – Cedro, vía con afirmado K0+510	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K0+510**

	
San Antonio – Cedro, vía con afirmado, K0+580	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K0+580**

2.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto en general consiste en la construcción de 3.488,76 metros lineales pavimento, ubicados en la zona rural del Municipio de Cereté, como seguidamente se anota:


Alineamiento/Nomenclatura Catastral	PR Inicial	PR Final	Coordenadas PR Inicial		Coordenadas PR Final	
			Este	Norte	Este	Norte
Vía San Antonio - El Cedro	K0+000.00	K3+488.76	1144304.298	1477322.493	1145169.775	1480292.632


Características propuestas de diseño geométrico de la vía

Longitud:	K3+488.76
Tipo de terreno:	Plano
Velocidad de diseño:	40 Km/h
Ancho de Calzada:	5.50 m
Ancho de Carril:	2.75 m
Bombeo Normal:	2.00%
Emax	4%


SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA

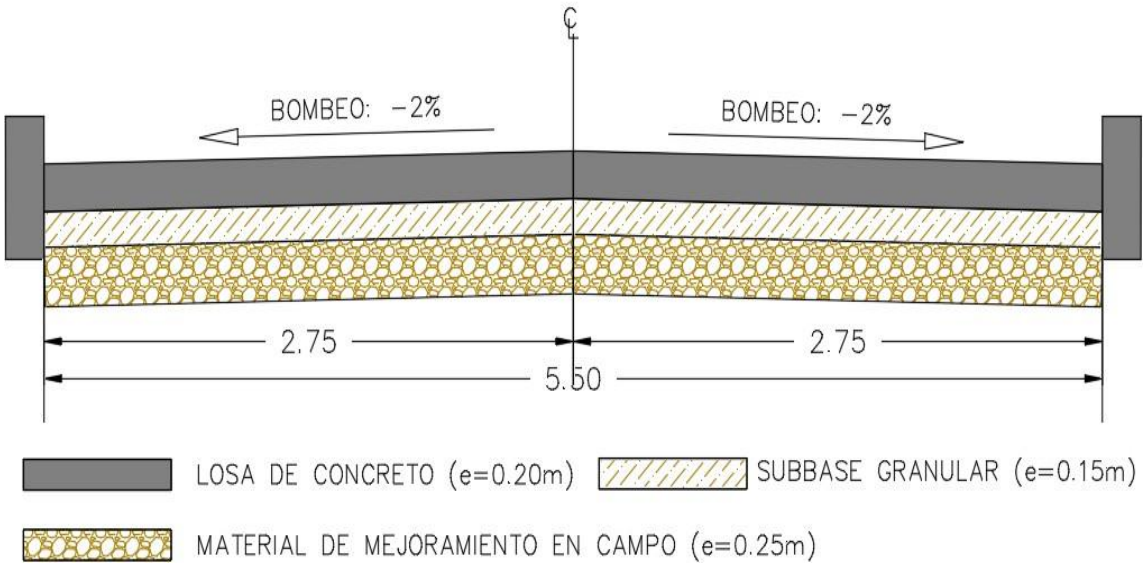

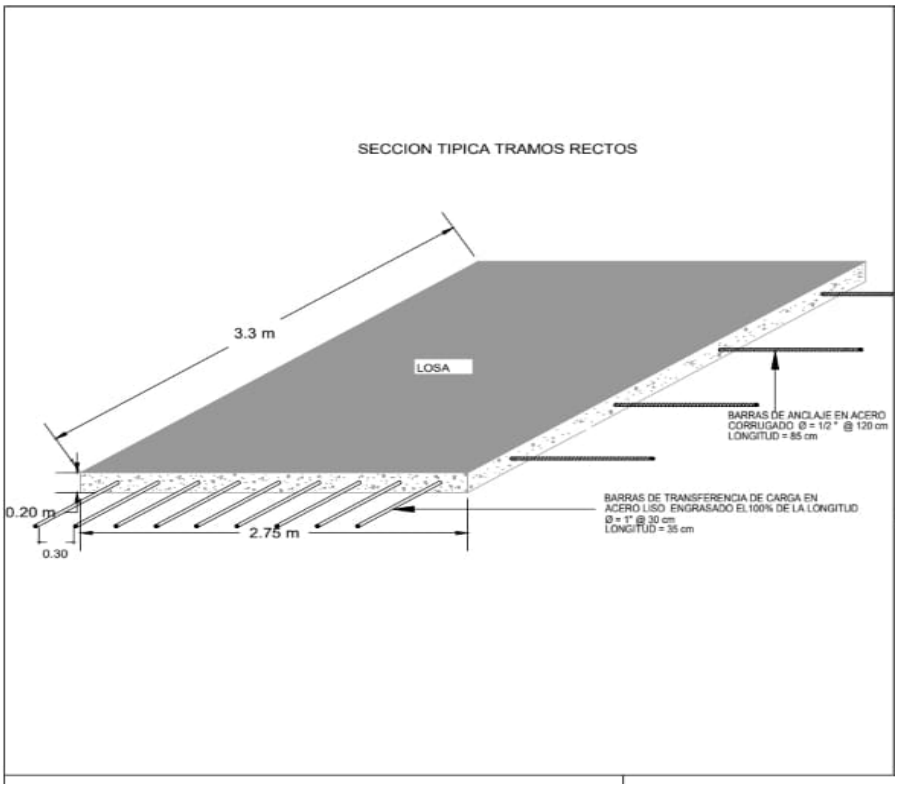

SECCION TIPICA TRAMOS RECTOS
3.3 m
LOSA
BARRAS DE ANCLAJE EN ACERO CORRUGADO Ø = 1/2 " @ 120 cm
LONGITUD = 85 cm
BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA EN ACERO LISO ENGRASADO EL 100% DE LA LONGITUD
Ø = 1" @ 30 cm
LONGITUD = 35 cm
0.20 m
2.75 m
0.30

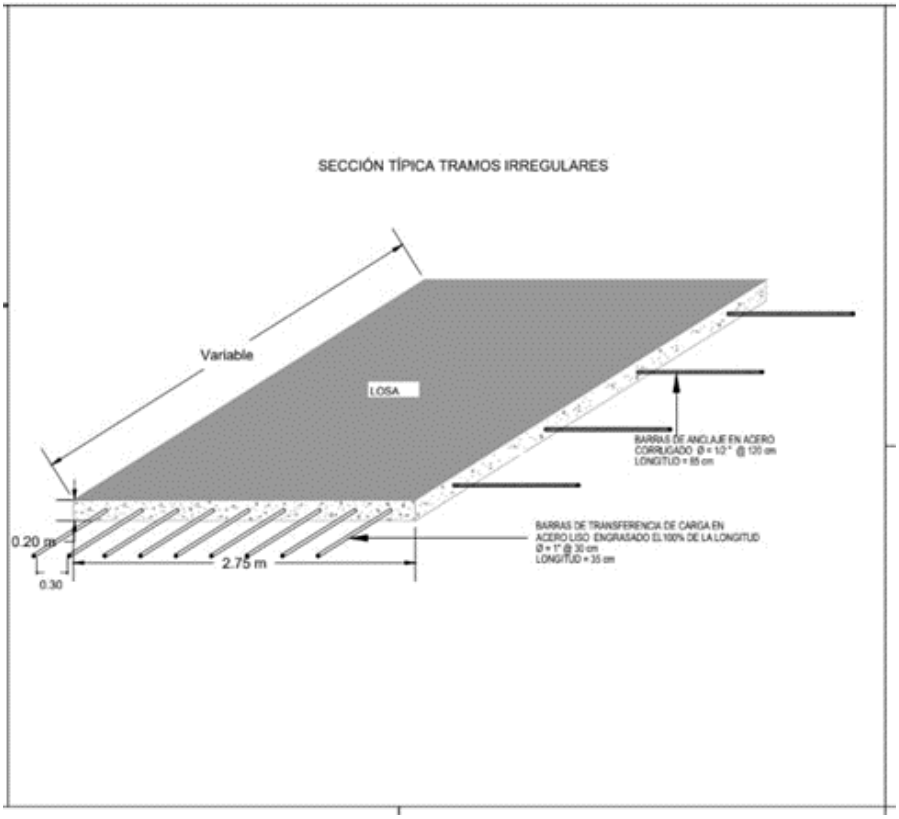
SECCIÓN TÍPICA TRAMOS IRREGULARES
Variable
LOSA
BARRAS DE ANCLAJE EN ACERO CORRUGADO Ø = 1/2 " @ 120 cm
LONGITUD = 85 cm
BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA EN ACERO LISO ENGRASADO EL 100% DE LA LONGITUD
Ø = 1" @ 30 cm
LONGITUD = 35 cm
0.20 m
2.75 m
0.30


ISOMETRICO INSTALACIÓN BARRAS DE TRANFERENCIA

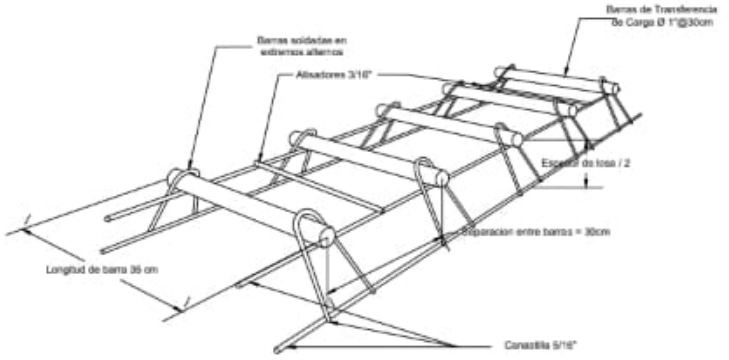


PLANTA INSTALACIÓN BARRAS DE TRANSFERENCIA

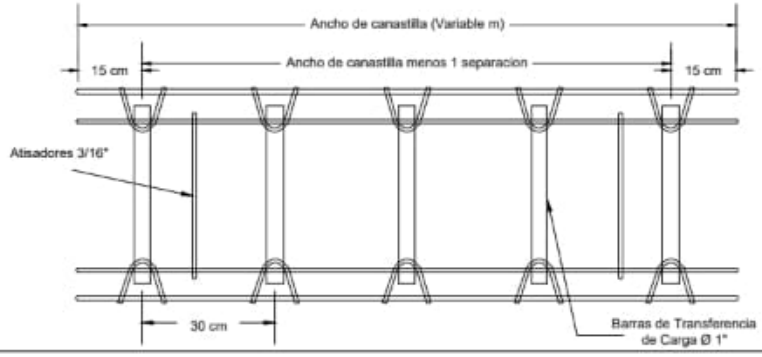


CORTE INSTALACIÓN BARRAS DE TRANSFERENCIA

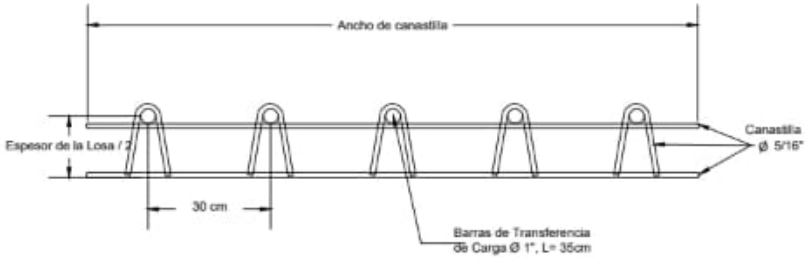


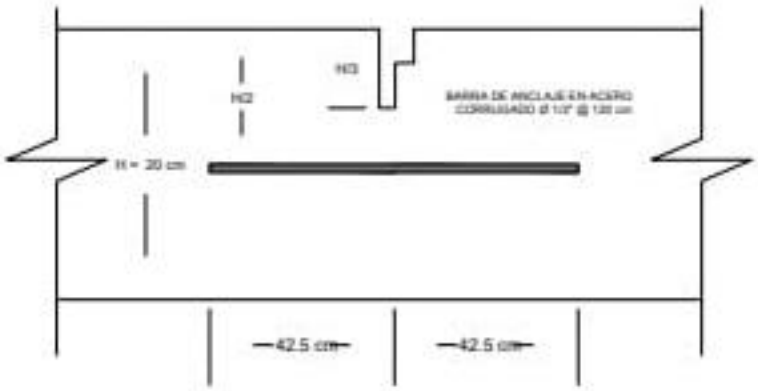


DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA LONGITUDINAL

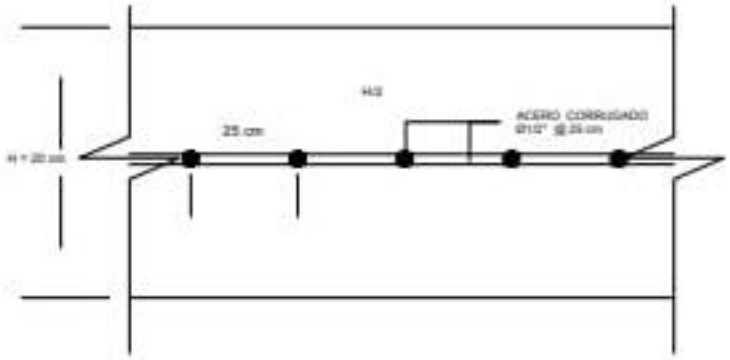


DETALLE CONSTRUCTIVO LOSA REFORZADA

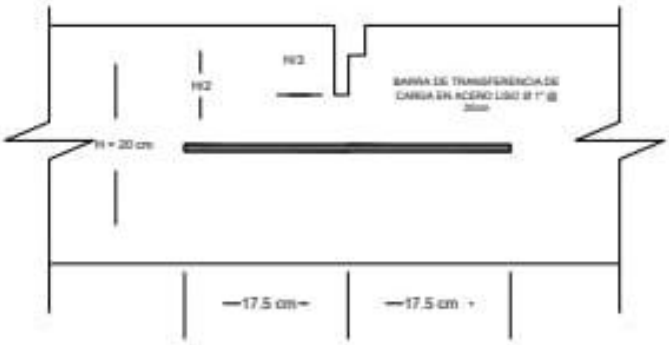


DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA TRANSVERSAL

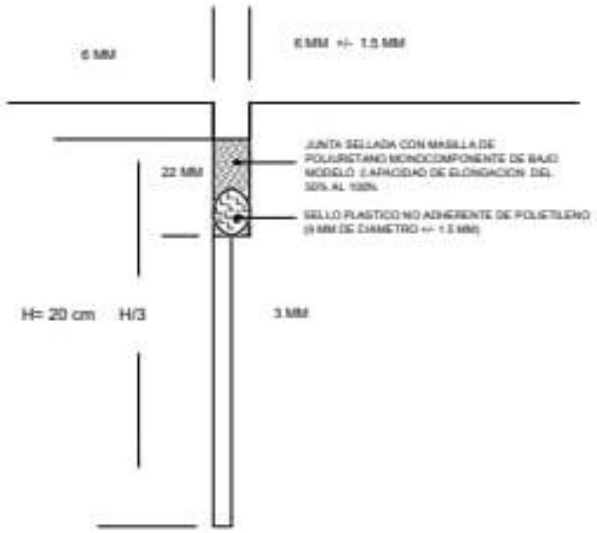

DETALLE CONSTRUCCION JUNTA TRANSVERSAL

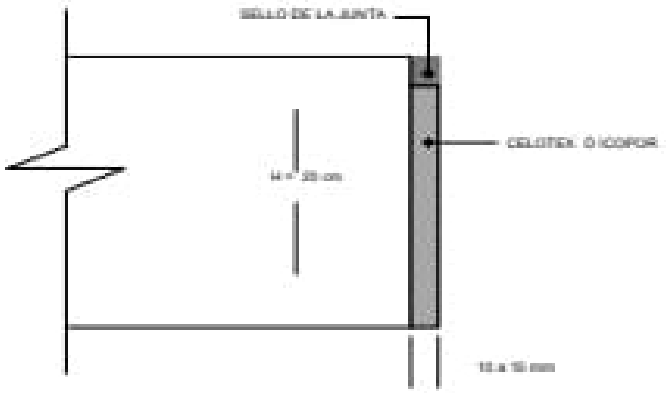

DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA DE EXPANSIÓN

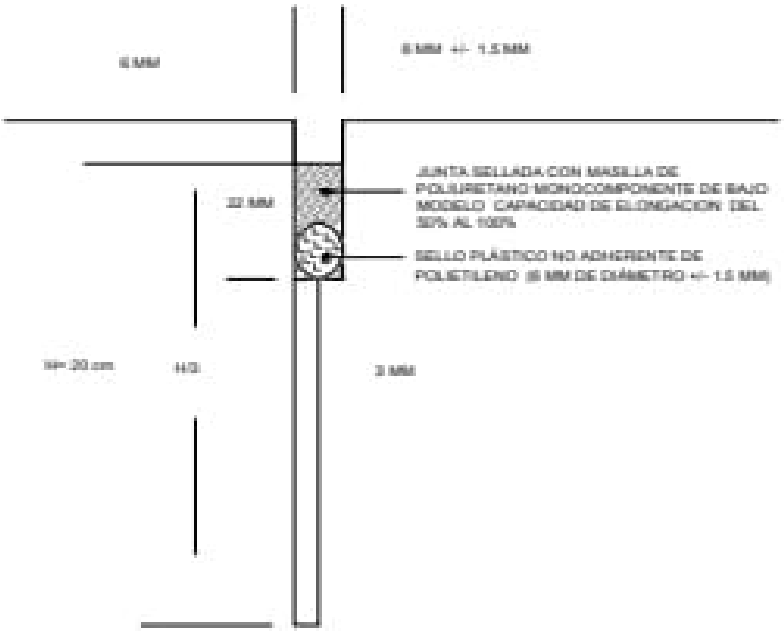

DETALLE CONSTRUCCION JUNTA LONGITUDINAL

Igualmente, de conformidad con el convenio suscrito por el Municipio de Cereté e INVIAS del cual se deriva la presente contratación se adelantará una etapa de revisión, ajustes y/o actualización de losestudios y diseños de las obras a ejecutados.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

A continuación, se presenta la información general del contrato de obra No 172 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
CONTRATO DE OBRA	N0. 172 DE 2021
CONTRATISTA	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA 100% DE PARTICIPACIÓN
NIT CONTRATISTA	10784359
DIRECCIÓN	CRA 6 N0. 65-24 PLACES MALL RECRO OFICINA 319.
TELEFONO	3103585668
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA:	6 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:	31 DE ENERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA	31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE A PRORROGA N0.1	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE A PRORROGA N0.2	15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE A PRORROGA N0.2	15 DE MARZO DE 2023
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO):	$ 5.685.110.960.00

VALOR ADICIONES	$ 190.989.040,00
VALOR ACUMULADO	$ 5.876.100.000,00

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

- Excavación Mecánica: es remoción extracción de material natural, además del cargue, retiro y disposición de los materiales provenientes de dicha actividad, con el fin de alcanzar las cotas requeridas.

  El contratista realizo la excavación total desde el K0+000 al K3+488

- Instalación de Afirmado: es instalar una capa compactada de material granular natural o procesada, con gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener aglutinadas las partículas.

  El contratista termino la actividad de instalación de afirmado del K0+000 al K3+488.

- Transporte de material: es el transporte de los materiales provenientes de la excavación, el cual debe ir a un sitio de disposición de materiales autorizado.

  El Contratista retiro todo el material proveniente de las excavaciones del K0+000 al K3+488.

- Instalación de subbase: es instalar un material granular grueso compuesto por triturados, arena y material grueso, es altamente resistente a la erosión y permite el libre drenaje con el fin de prevenir el bombeo. Se somete a menores presiones que la base granular, se emplea como capa en la instalación de pavimentos asfálticos y de concreto.

  El contratista instalo toda la sub base del K3+488 hasta el K0+000.

- Instalación de concreto: Es aquel que fundamentalmente está constituido por una losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rígido.

El Contratista Instalo todo el pavimento del K3+488 al K0+000, realizando su respectivo corte de placas y sellando las juntas.

- Instalación de bordillos: Son piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén.

  El contratista instalo bordillos del k0+000 al k3+488, de los cuales 542 ml se fundieron in situ debido a que las condiciones del terreno no se prestaban para instalar bordillos prefabricados ya que en algunos tramos el nivel de la vía estaba muy por encima del novel de los potreros.

- línea de demarcación vial : se emplean para delimitar pistas y calzadas; para indicar zonas con y sin prohibición de adelantar o sobrepasar; zonas con prohibición de efectuar viraje a la izquierda o en “U”; zonas con prohibición de estacionar; y, para delimitar pistas de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos.

  El contratista realizo la actividad de demarcación lineal en su totalidad desde el K0+000 al K3+488.

- Instalación de señales verticales: Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de estas.

  El contratista instala 36 señales verticales a lo largo del K0+000 al K3+488.

- Conformación de espaldar de bordillos: La conformación de espaldar de bordillo con material seleccionado tipo afirmado, se necesita para garantizar estabilidad y función de los módulos prefabricados, evitando el volcamiento de estos. Además, es necesario el refuerzo del espaldar con material seleccionado para cumplir con la función de confinamiento de las losas de pavimento por lo cual se diseñaron.

El contratista ha instalado material para el confinamiento de bordillos del K3+388 al K3+488 y del K2+200 al K1+990.

- Obras de drenaje (Descoles) : Las obras de drenaje tienen como objetivo controlar y redirigir este exceso de caudal para evitar daños estructurales que puedan ocasionar interrupciones de tráfico, daños en el entorno.

  El contratista inicio con la construcción 5 de las 42 obras de drenaje que debe hacer al largo del K0+000 al K3+488.

  Además de lo anterior el contratista demolió y fundió nuevamente las placas que estaban fisuradas en el K1+520 y en el K2+450.

- El día 09 de febrero de 2023 se realiza acata de reunión No. 10 donde estuvieron presentes funcionarios de INVIAS, Contratista, funcionarios de la Secretaría de Planeación e Infraestructura e Interventoría, donde se trataron los siguientes temas.
  - Verificación de compromisos.
  - Avance de obra.
  - Gestión social y ambiental.
  - Temas varios.

- El día 17 de febrero de 2023 se realiza Comité de Obra 20 donde estuvieron presentes Contratista, funcionarios de INVIAS e Interventoría, donde se trataron los siguientes temas.
  - Revisión de compromisos
  - Avance de obra
  - Temas varios.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO(según ultima acta de modificación	VALOR EJECUTADO DEL MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
Subtotal básico de obras	$ 5.857.145.204,00		$ 226.795.925,50	$ 5.740.297.851,85	$ 135.802.148,15
Provisión	0				
IVA	0				
Estudios y diseños	$ 15.928.400,00			$ 15.928.400	
IVA estudios y diseños	$ 3.026.396,00			$ 3.026.396,00	
Gestión social, Gestión predial, Gestión ambiental					
Gestión de sostenibilidad					
otros	$ 0,00				
VALOR TOTAL	$ 5.876.100.000,00		$ 226.795.925,50	$ 5.759.252.647,85	$ 135.802.148,15

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.

Se realizaron Ítems no previstos en este contrato.

3.4 ESTADO DE AVANCES Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

A la fecha el Contratista según el programa de obra el debería llevar una inversión de obra acumulada de $ 5.763.162.595,42 equivalente a 98,08 % y ejecutado acumulado lleva $ 5.740.297.851,85 equivalente al 97,67%, lo cual indica que el Contratista presenta un atraso del 0,4 % lo anterior correspondiente a la ejecución de las siguiente actividad e instalación de bordillos.

La Interventoría como acciones a tomar para que no haya atrasos y el contrato de obra finalice en el tiempo estipulado le ha enviado al Contratista de los siguientes oficios (SAL-23-001563, SAL-23-000568, SAL-23-000567, SAL-22-018957, SAL-23-000567, SAL-22-022287, SAL-23-001266, SAL-23-001849, SAL-23-001849)

Donde solicitaba al Contratista presentar propuesta a tiempo de los ítems no previstos que se debían ejecutar para satisfacción del proyecto, también, se le informó que las actividades que faltaban por ejecutar y se les recordaba que la fecha de finalización de proyecto estaba próxima y que no alcanzarían a ejecutar a las actividades pendientes en los tiempos estipulados.

Se hacen seguimientos a los compromisos pactados en los Comités de Obra por parte del Contratista para que estos se cumplan a cabalidad en los tiempos estipulados.

* Se le solicito al Contratista presentar una propuesta de obras de protección de talud debido a que el nivel de la vía está por encima del nivel de los potreros para así evitar que la socavación que se viene presentando en varios puntos coloque en riesgo la estructura del pavimento.

* Teniendo en cuenta los imprevistos que se presentaron los cuales no permitieron que el contrato se ejecutara en el tipo estipulado, el contratista solicita una prórroga N0. 3, la cual finaliza el día 15 de marzo de 2023, esta es aprobada por la Interventoría con el fin que el contrato se ejecute a cabalidad.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

Se presenta el estado de avance, durante la etapa de construcción del proyecto mediante los formatos e información por el Instituto Nacional de Vías, como se indica a continuación.

4.1 INFORME SEMANAL.

El Consorcio ACI-3B en el mes de febrero de 2023, en desarrollo del proyecto hace entrega de los informes semanales de Interventoría donde se informa sobre el avance de las actividades programadas. Utilizando el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

Informe Semanal No.	Periodo	
1	03 al 09 de febrero de 2023	Ver Pág. 36
2	10 al 16 de febrero de 2023	Ver pág. 38
3	17 al 23 de febrero de 2023	Ver pág. 40
4	24 de febrero al 02 de marzo de 2023	Ver pág. 42

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATADO DE OBRA.

Se efectúa el control diario de equipo del Contratista durante el mes de febrero de 2023 y se realiza con base en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (Ver pág. 44)

MAQUINARIA Y EQUIPO			
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**
MOTONIVELADORA	CATERPILAR	12 TONELADA	SAN ANTONIO-CEDRO
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILAR	12 TONELADA	SAN ANTONIO-CEDRO
RETRO-CARGADOR	CATERPILAR	1,0 M3	SAN ANTONIO-CEDRO
VOLQUETAS	INTERNACIONAL	14 M3	SAN ANTONIO-CEDRO
VOLQUETAS	INTERNACIONAL	14 M3	SAN ANTONIO-CEDRO
MIXER	KENWORTH	8M3	SAN ANTONIO-CEDRO

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

Se relaciona el personal contratado directamente con el Contratista David Fernando Castro Gaviria: personal mano de obra (Constructora Terluz S.A.S), (Constructora Carranza S.A.S), operarios de maquinaria y conductores de volquetas (Soluciones de Ingeniería Nómadas S.A.S), en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, se relaciona el personal que laboró para el Contratista en la obra durante el mes de Febrero de 2023 (ver pág. 45)

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATADO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se relaciona el Estado Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra. (Ver pág. 46)

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, se muestra el estado general del tiempo acontecido en el presente periodo, para lo cual se llevó el aproximado de las horas de sol y lluvia que se presentaron durante cada día. (Ver pág. 47)

4.6 RESUMEN DE ENSAYO DE LABORATORIO.

El Contratista para el corte de este mes no presento ensayos de laboratorio debido a que no se ejecutaron actividades que lo necesitaran, no se relaciona en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Se relacionan las Garantía y Seguros del contrato de Obra, (Ver pág. 48).

4.8 SEGUMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA.

El Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14. Referente al seguimiento del Plan de Calidad se encuentra en ejecución.

4.9 OTROS DOCUMENTOS.

-SEGUIMIENTO A LA INVERSIO DE ANTICIPO.

Este proyecto no contempla anticipo.

-SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

Se anexa seguimiento al programa de obra del Contratista (ver pag.51)

SEGUIMIENTO PROPGRAMA DE INVERSIÓN.

Se anexa cuadro programa de inversión (ver pág.52)

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.

Se relaciona Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1(ver pág. 52)

ACTAS DE REUNION.

Se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2. (ver pág. 55)

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVAY FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA- GRUPO 4".
CONTRATO DE INTERVENTORIA	N0. 2276 DE 2021
INTERVENTORIA	CONSORCIO ACI-3B
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	ACI PROYECTOS S.A.S 50% 3B PROYECTOS S.A.S 50%
NIT DE INTERVENTORIA	90155192-6
TELEFONO	3134024184
DIRECCION	-CARRERA7 156-10 PISO 31 TORRE KRYSTAL-NORTH POINT -CARRERA 18 13ª04 AP 301 ED COLOSINA BARRIO VENUS II, CERETE, CORDOBA
PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	6 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	31 DE ENERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TREMINACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N0.1	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TREMINACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N0.1	30 DE JUNIO DE 2023
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO):	$1.930.530.773

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

- Ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato vigilando para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos

-Hacer seguimiento al programa de obra del Contratista.

-Revisión de la documentación entregada por el Contratista.

-Realizar control de calidad del material utilizado e instalado en obra

-Realizar pruebas de densidad y toma de vigas al concreto para efecto de calidad

-Verificación de afiliaciones del personal.

-Realizar comités de obra.

-Realizar los informes semanales.

-Realizar Informes mensuales.

-Llevar un control en la bitácora de las actividades diarias que el Contratista ejecuta.

-Requerimientos escritos al Contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales.

-Verificar la calidad de los materiales que el Contratista está instalando en obra.

-Inspección de las condiciones de seguridad y verificación de señalizaciones.

-Llevar un Control diario de los equipos que el Contratista tiene en obra.

-Control diario del personal del contratista en obra.

-Llevar un control diario del estado del tiempo

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.

En este periodo no se realizó visita de los Especialistas en este proyecto

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.

El informe de programa anual de caja –PAC Se encuentra en ejecución

5.5 . INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

El informe de Matriz de Riesgo se encuentra en ejecución en este mes.

5.6 INFORMACION DE OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE

CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.

Toda la información correspondiente al proyecto se viene guardando y actualizando con frecuencia en Drive.

6.REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. correspondiente equipo y vehículos contrato de Interventoría (ver pág. 58)

6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. (Ver pág. 60)

6.3 INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 S. (Ver pág. 61)

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver pág. 63)

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA.

No se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. Debido a que el Plan de Calidad se encuentra en elaboración.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** El Contrato de Interventoría no contempla anticipo.

- **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO:** Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2. (Ver pág. 66)
- **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGA:** Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-3

7. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES.

* A la fecha el Contratista según el programa de obra el debería llevar una inversión de obra acumulada de $ 5.763.162.595,42 equivalente a 98,08 % y ejecutado acumulado lleva $ 5.740.297.851,85 equivalente al 97,67%, lo cual indica que el Contratista presenta un atraso del 0,4 % lo anterior correspondiente a la ejecución de las siguiente actividad e instalación de bordillos.

La Interventoría como acciones a tomar para que no haya atrasos y el contrato de obra finalice en el tiempo estipulado le ha enviado al Contratista de los siguientes oficios (SAL-23-001563, SAL-23-000568, SAL-23-000567, SAL-22-018957, SAL-23-000567, SAL-22-022287, SAL-23-001266, SAL-23-001849, SAL-23-001849)

Donde solicitaba al Contratista presentar propuesta a tiempo de los ítems no previstos que se debían ejecutar para satisfacción del proyecto, también, se le informó que las actividades que faltaban por ejecutar y se les recordaba que la fecha de finalización de proyecto estaba próxima y que no alcanzarían a ejecutar a las actividades pendientes en los tiempos estipulados.

Se hacen seguimientos a los compromisos pactados en los comités de obra por parte del Contratista para que estos se cumplan a cabalidad en los tiempos estipulados.

* Se le solicito al Contratista presentar una propuesta de obras de protección de talud debido a que el nivel de la vía está por encima del nivel de los potreros para así evitar que la socavación que se viene presentando en varios puntos coloque en riesgo la estructura del pavimento.

* Teniendo en cuenta los imprevistos que se presentaron los cuales no permitieron que el contrato se ejecutara en el tipo estipulado, el Contratista solicita una prórroga N0. 3, la cual finaliza el día 15 de marzo de 2023, esta es aprobada por la Interventoría con el fin que el contrato se ejecute a cabalidad.

ANEXOS.

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR.

Se anexa cuadro relación de correspondencia Contratista e Interventoría (Ver pág. 67)

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.

REGISTRO FOTOGRAFICO.



Instalación de hierro y formaletas para fundir bordillos in situ



Fundida de bordillos in situ



Bordillos fundidos in situ



línea de demarcación



Líneas centrales y laterales de demarcación vial



Lleno de espaldar de bordillos con material selecionado



humectación de material para confinamiento de espaldar de bordillos



Señalización vertical



Comité de obra

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS (CUANDO EL CONTRATO TENGA QUE ADELANTAR ESTAS GESTIONES).

Se presenta registro fotográfico.



Cierre actas de vecindad

8.4 BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.

Se anexa evidencia de bitácora correspondiente al mes de febrero de 2023. (Ver pág. 94)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/02/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEVIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DELDEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4",

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 54 del 3/02/2023 al 9/02/2023 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING.NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DELA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : LA META FISICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K3+490 DE LA VIA SAN ANTONIO -EL CEDRO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCION TIPICA DE 5,50 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	172	VALOR INICIAL:	$ 5.685.110.960,00
FECHA DE INICIO:	31/01/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2022		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2276 del 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO:	28/01/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.685.110.960			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.930.530.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.636.522.432,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.611.932.145,60	98,71 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.561.330.596,52	97,82 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 50.601.549,08	0,9 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 10.288.039,75	0,18 %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.622.220.185,35	98,9 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.571.618.636,27	98,0 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 50.601.549,08	0,9 %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 59.604.945,40	0,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47.828.670,17	0,84 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 0
PERIODO FACTURADO: 01/09/2022 A 01/10/2022
VALOR FACTURA: $ 1.100.751.340,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.465.637.000,00	75,92 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.435.637.006,00	74,36 %
PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.700.478,00	0,50 %
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.821.230,00	0,41 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,0%
Meta Física Ejecutada % 100,0%
Avance o Atraso Físico % 0,0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Unidad	gl	2021		Prog	1,00			1,00	100,0%
					Ejec	1			1	100,0%
* Box-coulvert	mt		2021		Prog					
					Ejec					
* Pavimento concreto	mt	3488	2021		Prog	3488			3488	100,0%
					Ejec	3488			3488	100,0%
* Señalización	mi	2620	2021		Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retro excavadora	1	1
Motoniveladora	1	1
Minicargador	1	1
Volquetas	1	2
Carro tanque CAT	1	1
Nivel Ruide RL-C32	1	1
Total	6	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN: PLANTA VIASCON	PERMISO MINERO:	SI	X	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO		
UBICACIÓN: TRONCAL 2, VIA CERETE-SAN CARLOS, KILO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO		

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CL 2 RURAL - 80 VEREDA SAN ANTONIO

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza excavacion para instalacion de bordillos del K1+800 al K2+000 carril derecho y del K0+980 al K1+040 y del K1+900 al K1+620 Carril izquierdo
Se instalan bordillos del K1+800 al K2+000 carril derecho y del K0+980 al K1+040 y del K1+900 al K1+620 Carril izquierdo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La próxima semana El contratista debe continuar con la instalacion de bordillos, instalacion de señales verticales, instalcion de linea de demarcación vial

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

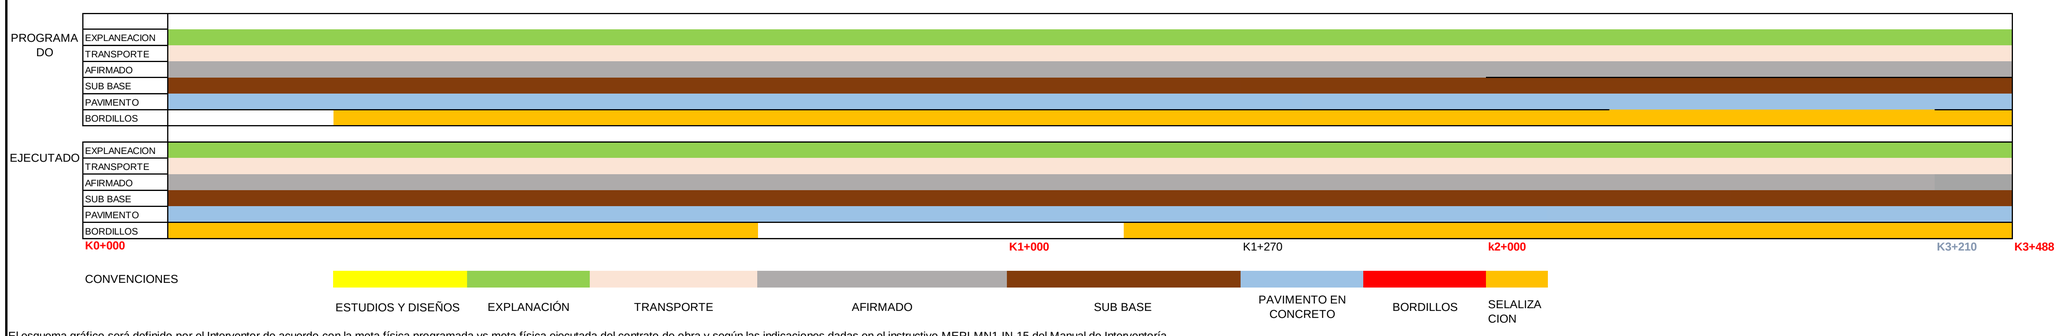

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía San Antonio - Los cedros, Bordillos instalados K1+200



Vía San Antonio - Los cedros, Fundida de bordillos in situ K0+020



Vía San Antonio - Los cedros, Reparación de losa fisurada K2+540

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES SE ESTEN CUMPLIENDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA, VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA REALICE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL UTILIZADO, SE REALIZAN LIBERACIONES POR PARTE DE LA TOPOGRAFIA EN AFIRMADO, SUB BASE Y NIVELACION DE RIELES SE TOMAN DENSIDADES Y MUESTRAS DE VIGUETAS DEL CONCRETO PARA EFECTO DE CALIDAD. SUPERVISAR QUE EL PERSONAL QUE ESTE EN OBRA CUMPLA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS SE LE REQUIRE AL CONTRATISTA ADECUAR LA VIA SAN ANTONIO-ZAPAL- CEDRO DEBIDO YA QUE ESTA SE ENCUENTRA INTRANSITABLE POR LAS FUERTES LLUVIAS Y EL PASO DE LAS VOLQUETAS CARGADAS DE MATERIAL PARA EL PROYECTO. EL CONTRATISTA PRESENTA UN ADELANTO DEL 0,9 % A LA FECHA.ESTE ATRASO SE DEBE A LAS ACTIVIDADES DE BORDILLOS QUE NO SE HAN INICIADO, VALGA ACLARAR QUE EL PAVIMENTO YA SE TERMINO EN SU TOTALIDAD	FIRMA NOMBRE: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/02/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEVÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DELDEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4",

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 55 (Numeración consecutiva) del 10/02/2023 al 16/02/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING.NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DELA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : LA META FISICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K3+490 DE LA VIA SAN ANTONIO -EL CEDRO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCION TIPICA DE 5,50 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	172	VALOR INICIAL:	$ 5.685.110.960,00
FECHA DE INICIO:	31/01/2022	VALOR ADICIONES:	$ 190.989.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 5.876.100.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/02/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2276 del 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO:	28/01/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.685.110.960			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.930.530.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.857.145.204,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.674.537.088,00	96,57 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.699.543.418,35	97,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (25.006.330,35)	-0,4 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.288.039,75	0,18 %
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.684.825.127,75	100,0 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.709.831.458,10	100,4 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (25.006.330,35)	-0,4 %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 62.604.942,40	0,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 138.212.821,00	2,43 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 0
PERIODO FACTURADO: 01/09/2022 A 01/10/2022
VALOR FACTURA: $ 1.100.751.340,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.475.337.478,00	76,42 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.443.458.236,00	74,77 %
PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.700.478,00	0,50 %
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.821.230,00	0,41 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 96,6%
Meta Física Ejecutada % 97,0%
Avance o Atraso Físico % 0,4%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Unidad	gl	2021		Prog	1,00			1,00	100,0%
					Ejec	1			1	100,0%
* Box-coulvert	mt		2021		Prog					
					Ejec					
* Pavimento concreto	mt	3488	2021		Prog	3488			3488	100,0%
					Ejec	3488			3488	100,0%
* Señalización	mi	3488	2021		Prog	3488			3488	100,0%
					Ejec	3484			3470	99,5%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retro excavadora	1	1
Motoniveladora	1	1
Minicargador	1	1
Volquetas	1	2
Carro tanque CAT	1	1
Nivel Ruide RL-C32	1	1
Total	6	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN: PLANTA VIASCON	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO	
UBICACIÓN: TRONCAL 2, VIA CERETE-SAN CARLOS, KILOMET	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CL 2 RURAL - 80 VEREDA SAN ANTONIO

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza excavación para instalación de bordillos del K2+000 al K2+800 carril derecho y del K1+900 al K2+540 Carril izquierdo,
Se instalan bordillos del K2+000 al K2+800 carril derecho y del K1+900 al K2+540 Carril izquierdo,
Se realiza demarcación lineal del K0+000 al K3+488
Se inicia con la instalación de señales verticales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La próxima semana El contratista debe continuar con la instalación de bordillos, instalación de señales verticales, construcción obra protección de talud.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

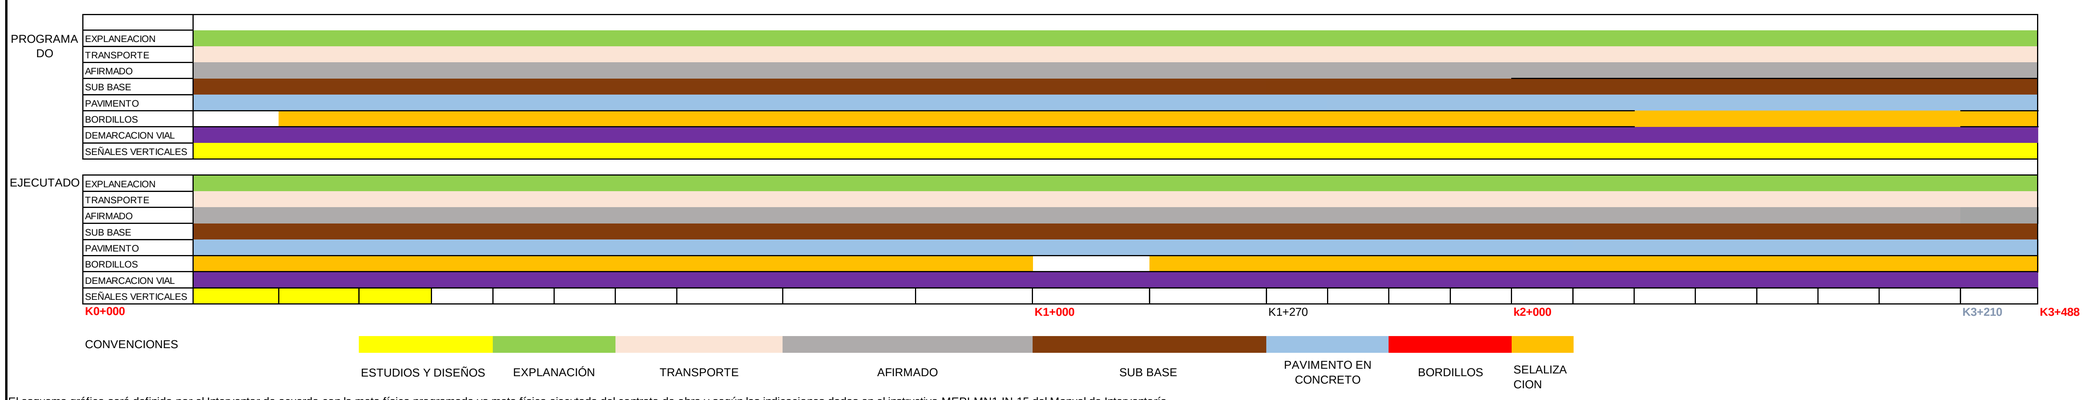

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía San Antonio - Los cedros, Demarcación vial K0+320



Vía San Antonio - Los cedros, Toma de juntas entre bordillos K1+720

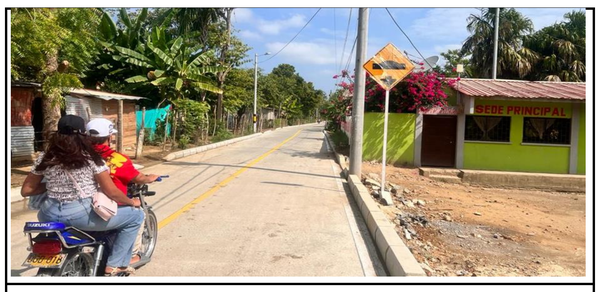

Vía San Antonio - Los cedros, Instalación de señales verticales K0+540

72

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES SE ESTEN CUMPLIENDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA, VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA REALICE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL UTILIZADO, SE REALIZAN LIBERACIONES POR PARTE DE LA TOPOGRAFIA EN AFIRMADO, SUB BASE Y NIVELACION DE RIELES SE TOMAN DENSIDADES Y MUESTRAS DE VIGUETAS DEL CONCRETO PARA EFECTO DE CALIDAD. SUPERVISAR QUE EL PERSONAL QUE ESTE EN OBRA CUMPLA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS SE LE REQUIRE AL CONTRATISTA ADECUAR LA VIA SAN ANTONIO-ZAPAL- CEDRO DEBIDO YA QUE ESTA SE ENCUENTRA INTRANSITABLE POR LAS FUERTES LLUVIAS Y EL PASO DE LAS VOLQUETAS CARGADAS DE MATERIAL PARA EL PROYECTO. EL CONTRATISTA PRESENTA UN ADELANTO DEL 0,4 % A LA FECHA.ESTE ATRASO SE DEBE A LAS ACTIVIDADES DE BORDILLOS QUE NO SE HAN INICIADO, VALGA ACLARAR QUE EL PAVIMENTO YA SE TERMINO EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO A LA ADICION.	FIRMA NOMBRE: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/02/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEVÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DELDEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4",

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 56 (Numeración consecutiva) del 17/02/2023 al 23/02/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING.NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DELA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : LA META FISICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K3+490 DE LA VIA SAN ANTONIO -EL CEDRO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCION TIPICA DE 5,50 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	172	VALOR INICIAL:	$ 5.685.110.960,00
FECHA DE INICIO:	31/01/2022	VALOR ADICIONES:	$ 190.989.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 5.876.100.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/02/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2276 del 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO:	28/01/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.685.110.960			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.930.530.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.857.145.204,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.745.849.841,71	97,78 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.723.192.423,35	97,40 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 22.657.418,36	0,4 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.288.039,75	0,18 %
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.756.137.881,46	101,2 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.733.480.463,10	100,9 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 22.657.418,36	0,4 %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 71.312.753,71	0,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ (5.723.192.423,35)	-100,67 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 0
PERIODO FACTURADO: 01/09/2022 A 01/10/2022
VALOR FACTURA: $ 1.100.751.340,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.485.037.956,00	76,92 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.451.279.466,00	75,18 %
PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.700.478,00	0,50 %
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.821.230,00	0,41 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 97,8%
Meta Física Ejecutada % 97,4%
Avance o Atraso Físico % -0,4%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Unidad	gl	2021		Prog	1,00			1,00	100,0%
					Ejec	1			1	100,0%
* Box-coulvert	mt		2021		Prog					
					Ejec					
* Pavimento concreto	mt	3488	2021		Prog	3488			3488	100,0%
					Ejec	3488			3488	100,0%
* Señalización	mi	3488	2021		Prog	3488			3488	100,0%
					Ejec	3484			3470	99,5%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retro excavadora	1	1
Motoniveladora	1	1
Minicargador	1	1
Volquetas	1	2
Carro tanque CAT	1	1
Nivel Ruide RL-C32	1	1
Total	6	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN: PLANTA VIASCON	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO	
UBICACIÓN: TRONCAL 2, VIA CERETE-SAN CARLOS, KILOMET	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CL 2 RURAL - 80 VEREDA SAN ANTONIO

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza excavación para instalación de bordillos del k2+800 al k2+880 y del K3+340 al K3+360 Carril izquierdo,
Se instalan bordillos del k2+800 al k2+880 y del K3+340 al K3+360 Carril izquierdo
Se continua con la instalación de señales verticales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La próxima semana El contratista debe iniciar construcción obra protección de talud y conformacion de espaldar de bordillos.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

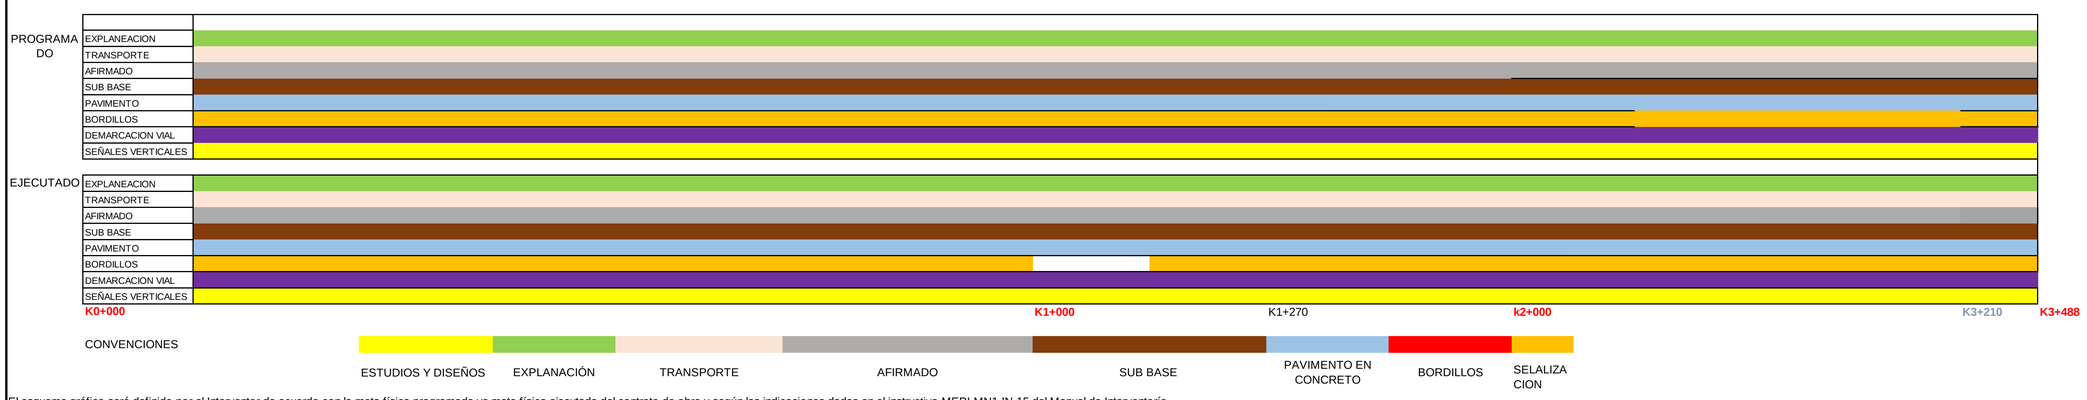

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía San Antonio - Los cedros, Instalación de señales verticales K1+520



Vía San Antonio - Los cedros, Toma de juntas entre bordillos K3+340



Vía San Antonio - Los cedros, Instalación de señales verticales K2+300

72

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES SE ESTEN CUMPLIENDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA, VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA REALICE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL UTILIZADO, SE REALIZAN LIBERACIONES POR PARTE DE LA TOPOGRAFIA EN AFIRMADO, SUB BASE Y NIVELACION DE RIELES SE TOMAN DENSIDADES Y MUESTRAS DE VIGUETAS DEL CONCRETO PARA EFECTO DE CALIDAD. SUPERVISAR QUE EL PERSONAL QUE ESTE EN OBRA CUMPLA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS SE LE REQUIRE AL CONTRATISTA ADECUAR LA VIA SAN ANTONIO-ZAPAL- CEDRO DEBIDO YA QUE ESTA SE ENCUENTRA INTRANSITABLE POR LAS FUERTES LLUVIAS Y EL PASO DE LAS VOLQUETAS CARGADAS DE MATERIAL PARA EL PROYECTO. EL CONTRATISTA PRESENTA UN ATRASO DEL 0,4 % A LA FECHA.ESTE ATRASO SE DEBE A LAS ACTIVIDADES DE BORDILLOS QUE NO SE HAN INICIADO, VALGA ACLARAR QUE EL PAVIMENTO YA SE TERMINO EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO A LA ADICION.	FIRMA NOMBRE: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/03/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEVÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DELDEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4",

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 57 (Numeración consecutiva) del 24/02/2023 al 2/03/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING.NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DELA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : LA META FISICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K3+490 DE LA VIA SAN ANTONIO -EL CEDRO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCION TIPICA DE 5,50 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	172	VALOR INICIAL:	$ 5.685.110.960,00
FECHA DE INICIO:	31/01/2022	VALOR ADICIONES:	$ 190.989.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 5.876.100.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/02/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2276 del 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO:	28/01/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.685.110.960			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.930.530.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.857.145.204,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.763.162.595,42	98,08 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.740.297.851,85	97,69 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 22.864.743,57	0,4 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.288.039,75	0,18 %
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.773.450.635,17	101,6 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.750.585.891,60	101,2 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 22.864.743,57	0,4 %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.312.753,71	0,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.105.428,50	0,30 %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 0
PERIODO FACTURADO: 01/10/2022 A 03/02/2023
VALOR FACTURA: $ 704.130.378,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.494.738.434,00	77,43 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.459.100.696,00	75,58 %
PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.700.478,00	0,50 %
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.821.230,00	0,41 %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 99,0%
Meta Física Ejecutada %: 97,69%
Avance o Atraso Físico %: -1,3%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Unidad	gl	2021		Prog	1,00			1,00	100,0%
					Ejec	1			1	100,0%
* Box-coulvert	mt		2021		Prog					
					Ejec					
* Pavimento concreto	mt	3488	2021		Prog	3488			3488	100,0%
					Ejec	3488			3488	100,0%
* Señalización	mi	3488	2021		Prog	3488			3488	100,0%
					Ejec	3484			3488	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retro excavadora	1	1
Motoniveladora	1	1
Minicargador	1	1
Volquetas	1	2
Carro tanque CAT	1	1
Nivel Ruide RL-C32	1	1
Total	6	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN: PLANTA VIASCON	PERMISO MINERO:	SI	X	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO		
UBICACIÓN: TRONCAL 2, VIA CERETE-SAN CARLOS, KILOMET	PERMISO MINERO:	SI	X	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO		

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CL 2 RURAL - 80 VEREDA SAN ANTONIO

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza conformación de espaldar de bordillos del K3+488 al K3+388 y del K2+200 al K1+990
Se inicia con la contruccion de obras de drenaja (descoles)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La próxima semana El contratista debe continuar con la conformación de espaldar de bordillos, obras de drenaje (descoles) e iniciar con la construcción obra protección de talud.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

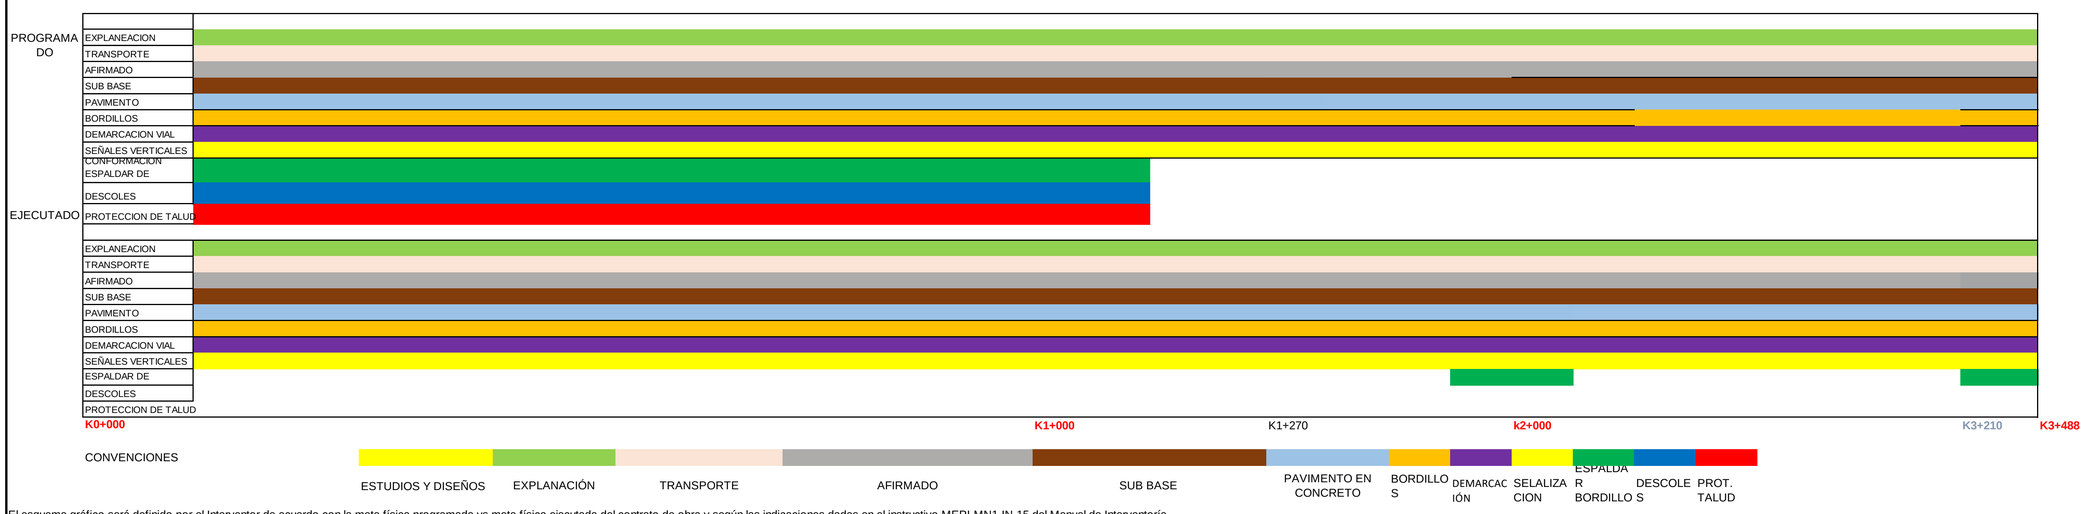

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía San Antonio - Los cedros, Lleno espaldar de bordillos K1+990



Vía San Antonio - Los cedros, Humectación a material de conformación espaldar de bordillo K1+990



Vía San Antonio - Los cedros, Compactación con rana a material seleccionado de conformación a espaldar de bordillos K2+000

72

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES SE ESTEN CUMPLIENDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA, VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA REALICE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL UTILIZADO, SE REALIZAN LIBERACIONES POR PARTE DE LA TOPOGRAFIA EN AFIRMADO, SUB BASE Y NIVELACION DE RIELES SE TOMAN DENSIDADES Y MUESTRAS DE VIGUETAS DEL CONCRETO PARA EFECTO DE CALIDAD. SUPERVISAR QUE EL PERSONAL QUE ESTE EN OBRA CUMPLA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS SE APRUEBA PRORROGA N0. 3, LA CUAL FINALIZA EL DIA 15 DE MARZO DE 2023 EL CONTRATISTA PRESENTA UN ATRASO DEL 0,4 % A LA FECHA.ESTE ATRASO SE DEBE A LAS ACTIVIDADES DE BORDILLOS QUE NO SE HAN INICIADO, VALGA ACLARAR QUE EL PAVIMENTO YA SE TERMINO EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO A LA ADICION.	FIRMA NOMBRE: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 28/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2023

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO No. 172 DE 2021

CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ACI-3B

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
MINICARGADOR	CAT 236B	8,84 TON	SAN ANTONIO CEDRO	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A			
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1			
			TOTAL ACTIVO	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1			
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0			
			TOTAL INACTIVO	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0			

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	23	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Jesús Alberto Zapa Pérez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:22202286336COR

Firma
Nombre: Carmelina Oviedo Ramos
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: .22202193598 CÓR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	28/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 172 DE 2021 **CONTRATISTA:** DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEVÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DELDEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4",

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 del 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 28/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 172 DE 2021 **CONTRATISTA:** DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	000967	C-172/2021	507	NACION	PRINCIPAL	$ 600.000.000	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 5.685.110.960,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-22			$ 1.710.382.032	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 3.974.728.928				
2	OBRA	ago-22			$ 779.709.163	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 3.195.019.765				
3	OBRA	sep-22			$ 984.797.510	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 2.210.222.255				
4	OBRA	oct-22			$ 1.109.470.915	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 1.100.751.340				
5	OBRA	feb-23			$ 704.130.378						$ 704.130.378				
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE OBRA N0. 1			**$ 1.710.382.032**
ACTA DE OBRA N0. 2			**$ 779.709.163**
ACTA DE OBRA N0. 3			**$ 984.797.510**
ACTA DE OBRA N0. 4			**$ 1.109.470.915**
ACTA DE OBRA N0. 5			**$ 704.130.378**
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Orlando Isaac Castellon Marrugo
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: :13202120629BLV

Firma
Nombre: Miguel Armando Diaz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 28/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 172 DE 2021 **CONTRATISTA:** DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4",

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**				**Total**
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				28
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Jesus Alberto Zapa Perez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:22202286336COR

Firma
Nombre: Carmelina Oviedo Ramos
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: .22202193598 CÓR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 28/02/2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 172 DE 2021 **CONTRATISTA:** DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15 DE MARZO DE 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5.685.110.960,00

VALOR ACUMULADO: $ 5.876.100.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 568.511.096,00	31/1/2022	31/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.705.533.288,00	31/1/2023	31/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.137.022.192,00	31/1/2024	30/6/2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 4.778.520,00	31/8/2022	31/8/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.705.533.288,00	31/8/2022	31/8/2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101366414

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: CASTRO GAVIRIA DAVIR FERNANDO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 454.263.000,00	31/1/2022	30/6/2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101175283 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: CASTRO GAVIRIA DAVID FERNANDO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA 28/02/2022
(Día) (Mes) (Año)

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 568.511.096.00	31	1	2022	30/09/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.705.533.288.00	31	1	2022	30/09/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.137.022.192.0	31	1	2022	31	3	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 4.778.520.0	31	8	2022	31	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.705.533.288,00	31	8	2022	31	8	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101366414

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 454.263.000.0	31	1	2022	31	1	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101175283 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Miguel Armando Diaz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ALCALDIA CERETÉ

ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2022 (Año)

ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE — **SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL** — **PROGRAMA DE INVERSIONES**

(Indicar con una X) ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 172- 2021

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIDA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA — **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** VEREDA EL CEDRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: — **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI 3B

PLAZO INICIAL: hasta 31 de julio de 2022 — **PLAZO ACUMULADO:** hasta 15 de febrero de 2023

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 31/01/2022 — **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** hasta 15 de febrero de 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: — **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ - — **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 190.989.040,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022	Abril de 2022	Mayo de 2023	Junio de 2022	Julio de 2022	Agosto de 2022	Septiembre de 2022	Octubre de 2022	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	ene-23	feb-23
I. EXPLANACIONES	$ 91.270.150,18	1,56%	$ 120.646.163,00	1,56%			0,52%	0,52%	0,52%									
				$ 120.646.163,00			$30.423.383	$30.423.383	$30.423.384									
				$ 120.646.163,00						$91.270.150								
IV. PAVIMENTO RÍGIDO	$ 5.184.630.064,70	88,52%	$ 4.643.002.570,00	1,56%														
				88,52%				2,84%	7,44%	13,83%	9,18%	9,53%	9,18%	9,18%	18,10%	4,91%	3,77%	0,57%
				$ 5.184.630.064,70				$166.227.695	$435.502.085	$809.776.511	$537.719.576	$558.401.098	$537.719.576	$537.719.576	$1.059.936.453	$287.570.094,43	$220.918.757,40	$33.138.643
				$ 4.643.002.570,00						$1.291.809.886		$779.709.163	$984.797.510					
				29,22%						22,06%		13,31%	16,81%					
V. TRANSPORTE	$ 212.982.891,19	3,64%	$ 281.533.107,00	3,64%				1,16%	1,16%	0,87%								
				$ 281.533.107,00			$25.800.000	$68.000.000	$68.000.000	$51.182.891,19								
				$ 281.533.107,00						$279.739.715								
				3,64%						4,78%								
VI. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VÍAL	$ 40.716.552,00	0,70%		0,70%													0,30%	0,39%
				$ -													$17.749.101,60	$22.967.450
				$ -														
VII. CARACTERIZACIÓN VÍAL	$ 2.362.918,46	0,04%		0,00%														
				0,04%														0,04%
				$ 2.362.918,46														$2.362.918
				$ -														
NP	$ 325.182.627,47	5,55%	$ 19.228.692,00	0,00%														
				5,55%										0,33%				5,22%
				$ 325.182.627,47										$19.228.692				$305.953.935
				$ 19.228.692,00														
				5,55%														
				% P														
				$ P														
				$ E														
				% E														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 5.857.145.204,00	100%	$ 5.064.410.532,00															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																		

		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,96%**	**4,52%**	**9,12%**	**14,70%**	**9,18%**	**9,53%**	**9,18%**	**9,51%**	**18,10%**	**4,91%**	**4,07%**	**6,22%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$56.223.383**	**$264.651.078**	**$533.925.469**	**$860.959.402**	**$537.719.576**	**$558.401.098**	**$537.719.576**	**$556.948.268**	**$1.059.936.453**	**$287.570.094**	**$238.867.859**	**$364.422.947**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,96%**	**5,48%**	**14,59%**	**29,29%**	**38,47%**	**48,01%**	**57,19%**	**66,70%**	**84,79%**	**89,70%**	**93,78%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$56.223.383**	**$320.874.461**	**$854.799.930**	**$1.715.759.332**	**$2.253.478.908**	**$2.811.880.007**	**$3.349.599.583**	**$3.906.547.851**	**$4.966.484.303**	**$5.254.054.397,80**	**$5.492.722.256,80**	**$5.857.145.204,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%						**28,39%**		**13,31%**	**16,81%**	**18,94%**				**12%**
	VALOR (Miles de Pesos)						**$1.662.819.751**		**$779.709.163**	**$984.797.510**	**$1.109.470.915**				**$ 704.130.378**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%						**28,39%**		**41,70%**	**58,52%**	**77,46%**				**89,48%**
	VALOR (Miles de Pesos)						**$1.662.819.751**		**$2.442.528.914**	**$3.427.326.424**	**$4.536.797.339**				**$ 5.240.927.717**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$0
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$0
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$15.928.650
IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$3.026.598
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$0
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$0
	$0
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$18.954.798
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$5.876.100.000**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma: DAVID FDO CASTRO

Nombre: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula Profesional No.: 2220215274COR

Aprueba Firma:

Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoria
CONSORCIO ACI 3B

Aprueba Firma

Nombre: OLIVIA JIMENEZ FABRA
Secretaria de planeacion e infraestrutura - Cereté
Matricula No.:

ALCALDIA DE CÉRETE
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
REPROGRAMACION PRORROGA N° 3

BALANCE	03	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	viernes, 13 de enero de 2023
CONTRATO DE OBRA No :	172-2021	**CONTRATANTE:** ALCALDIA MUNICIPAL DE CÉRETE	
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."		
CONTRATISTA:	DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO ACI-3B	

PLAZO INICIAL (meses): 6 Meses	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 5.685.110.960,00
FECHA DE INICIO: 31-01-2022	**VALOR TOTAL ACUMULADO:**	$ 5.876.100.000,00
PLAZO ACTUALIZADO DE TERMINACIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2023		

		CONDICIONES ORIGINALES						**BALANCE 2**		**MODIFICACIONES**						**CONDICIONES FINALES**		**PORCENTAJE DE AVANCE**		**X EJECUTAR**		**COMPARATIVO**	**FEBRERO 2023**	**MARZO 2023**			
Nº	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**VALOR**	**(-)**	**VALOR**			**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**		**SEMANA 4 16/2/23 - 23/3/23**	**SEMANA 1 24/2/23 AL 2/3/23**	**SEMANA 2 3/3/23 AL 9/3/23**	**SEMANA 3 10/3/23 AL 15/3/23**	
		GENERAL	**PARTICULAR**								**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**														
				VEREDA SAN ANTONIO - VEREDA EL CEDRO																								
I				**EXPLANACIONES**																								
1	600.2.3	600,00		Excavaciones varias en material común en seco.	m3	209,30	$ 35.699,00	$ 7.471.801,00	-	$ -						$ -		$ -	$ -		$ -						
2	210.2.2	210,00		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	5.233,00	$ 11.719,00	$ 61.325.527,00	10.294,92	$ 120.646.163,00			2.506,70	$ 29.376.012,61	7.788,22	$ 91.270.150,18	7.788,22	$ 91.270.150,18	-	$ -						
Subtotal								**$ 68.797.328,00**		**$ 120.646.163,00**						**$ 91.270.150,18**		**$ 91.270.150,18**		**$ -**						
II				**PAVIMENTOS ,AFIRMADO, SUBBASES Y BASES**																								
3	320.3	320,00		Subbase Granular Clase C.	m3	3.402,00	$ 219.776,00	$ 747.677.952,00	3.139,00	$ 689.876.864,00						$ 689.876.864,00	3.139,00	$ 689.876.864,00	-	$ -						
4	311,10	311,00		Afirmado (Material para Mejoramiento)	m3	5.233,00	$ 139.018,00	$ 727.481.194,00	5.232,00	$ 727.342.176,00						$ 727.342.176,00	5.232,00	$ 727.342.176,00	-	$ -						
5	500,10	500,00		Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa	m3	3.837,60	$ 767.435,00	$ 2.945.108.556,00	3.836,80	$ 2.944.494.608,00						$ 2.944.494.608,00	3.836,80	$ 2.944.494.608,00	-	$ -						
6	640.1	640,00		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	55.680,60	$ 8.294,00	$ 461.814.896,00	33.914,75	$ 281.288.922,00	3.887,30	$ 32.241.280,30				$ 313.530.202,70	37.802,05	$ 313.530.202,70	-	$ -						
7	672.4	672,00		Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m	6.978,00	$ 79.171,00	$ 552.455.238,00	6.976,00	$ 552.296.896,00			542,00	$ 42.910.682,00	6.434,00	$ 509.386.214,00	6.334,00	$ 501.469.114,00	100,00	$ 7.917.100,00	$ 7.917.100,00	$ 1.979.275,00	$ 1.979.275,00	$ 1.979.275,00	$ 1.979.275,00	
Subtotal								**$ 5.434.537.836,00**		**$ 5.195.299.466,00**						**$ 5.184.630.064,70**		**$ 5.176.712.964,70**		**$ 7.917.100,00**						
III				**TRANSPORTE**																								
8	900.2	900,00		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	52.330,00	$ 1.753,00	$ 91.734.490,00	160.600,75	$ 281.533.107,00			39.104,52	$ 68.550.216,13	121.496,23	$ 212.982.891,19	121.496,23	$ 212.982.891,19	-	$ -						
Subtotal								**$ 91.734.490,00**		**$ 281.533.107,00**						**$ 212.982.891,19**		**$ 212.982.891,19**		**$ -**						
IV				**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**																								
9	710.1	710,00		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	33,00	$ 543.578,00	$ 17.938.074,00	33,00	$ 17.938.074,00	3,00	$ 1.630.734,00		$ -	36,00	$ 19.568.808,00	18,00	$ 9.784.404,00	18,00	$ 9.784.404,00	$ 9.784.404,00	$ 2.446.101,00	$ 2.446.101,00	$ 2.446.101,00	$ 2.446.101,00	
10	700.1	700,00		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	m	10.466,00	$ 2.021,00	$ 21.151.786,00	10.464,00	$ 21.147.744,00					10.464,00	$ 21.147.744,00	10.464,00	$ 21.147.744,00	-	$ -						
Subtotal								**$ 39.089.860,00**		**$ 39.085.818,00**						**$ 40.716.552,00**		**$ 30.932.148,00**		**$ 9.784.404,00**						
V				**CARACTERIZACIÓN VIAL**																								
11				Caracterización del corredor	km	3,49	$ 677.054,00	$ 2.362.918,00	3,49	$ 2.362.918,00					3,49	$ 2.362.918,46	-	$ -	3,49	$ 2.362.918,46	$ 2.362.918,46	$ 590.729,62	$ 590.729,62	$ 590.729,62	$ 590.729,62	
Subtotal								**$ 2.362.918,00**		**$ 2.362.918,00**						**$ 2.362.918,46**		**$ -**		**$ 2.362.918,46**						
NP				**ITEMS NO PREVISTOS / ITEMS ADICIONALES**																								
NP1	311,00			PIEDRA RAJÓN (Mejoramiento Subrasante)	m3		$ 198.247,00		65,13	$ 12.910.836,00					65,13	$ 12.911.827,11	65,13	$ 12.911.827,11	-	$ -						
NP2	630,40			Construccion de carcamo en concreto clase D (210 kg/m2 o 3000 psi) para proteccion de tuberia de gas diametro según diseño.	ml		$ 526.488,00		12,00	$ 6.317.856,00					12,00	$ 6.317.856,00	12,00	$ 6.317.856,00	-	$ -						
NP3	672,10			Bordillo de concreto vaciado en situ de 0.20mx0.50m, no incluye la reparación de la superficie de apoyo	ml		$ 168.456,00				542,00	$ 91.303.152,00			542,00	$ 91.303.152,00	242,00	$ 40.766.352,00	300,00	$ 50.536.800,00	$ 50.536.800,00	$ 12.634.200,00	$ 12.634.200,00	$ 12.634.200,00	$ 12.634.200,00	
NP4				Conformación de espaldar de bordillo con afirmado, para garantizar estabilidad del bordillo, Incluye compactación con compactador tipo RANA	m3		$ 137.393,00				1.323,30	$ 181.812.698,84			1.323,30	$ 181.812.698,84	-	$ -	1.323,30	$ 181.812.698,84	$ 181.812.698,84	$ 45.453.174,71	$ 45.453.174,71	$ 45.453.174,71	$ 45.453.174,71	
NP5				Estructutra de drenaje tipo descole	UND		$ 393.857,00				42,00	$ 16.541.994,00			42,00	$ 16.541.994,00	0,00	$ -	42,00	$ 16.541.994,00	$ 16.541.994,00	$ 4.135.498,50	$ 4.135.498,50	$ 4.135.498,50	$ 4.135.498,50	
NP6			812 - P	Protección talud en piedra pegada	m2		$ 105.826,00				140,52	$ 14.870.669,52			140,52	$ 14.870.669,52	0,00	$ -	140,52	$ 14.870.669,52	$ 14.870.669,52	$ 3.717.667,38	$ 3.717.667,38	$ 3.717.667,38	$ 3.717.667,38	
NP7				Viga de confinamiento en concreto reforzado 0.10 X 0.15 m	ml		$ 47.481,00				30,00	$ 1.424.430,00			30,00	$ 1.424.430,00	0,00	$ -	30,00	$ 1.424.430,00	$ 1.424.430,00	$ 356.107,50	$ 356.107,50	$ 356.107,50	$ 356.107,50	
								$ 19.228.692,00								**$ 325.182.627,47**		**$ 59.996.035,11**		**$ 265.186.592,36**						
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.636.522.432,00**		**$ 5.658.156.164,00**				**SUBTOTAL OBRAS**		**$ 5.857.145.204,00**		**$ 5.571.894.189,18**		**$ 285.251.014,82**						

PROGRAMACION	$ 71.312.753,71	$ 71.312.753,71	$ 71.312.753,71	$ 71.312.753,71
% PROGRAMACION	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%
ACUM. PROGRAMADO	$ 71.312.753,71	$ 142.625.507,41	$ 213.938.261,12	$ 285.251.014,82
% ACUM. PROGRAMADO	1,21%	2,43%	3,64%	**4,85%**

OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 29.633.731,90		$ 8.000.000,00	$ -	
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 15.928.400,00		$ 15.928.400,00	$ 15.928.400,00	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.026.396,00		$ 3.026.396,00	$ 3.026.396,00	$ -
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 5.685.110.960,00**		**$ 5.685.110.960,00**	**$ 5.876.100.000,00**	**$ 285.251.014,82**
VALOR TOTAL	**$ 5.685.110.960,00**		**$ 5.685.110.960,00**	**$ 5.876.100.000,00**	**$ 285.251.014,82**

VALOR TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20,0%
	IMPREVISTO	**I=**	5,0%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**UTILIDAD**	**U=**	5,0%
NOTA 4: El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista.	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	30,0%
NOTA 5: Se cuenta con el análisis de costos para la revisión y/o ajustes a estudios y diseños			
NOTA 6: Los presupuestos fueron elaborados por la Subdirección de la Red Terciaria y Ferrea del INVIAS			
NOTA 7: Los costos de bioseguridad se encuentran incluidos en los gastos administrativos del contratista.			

PROCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA DE LA REPROGRAMACION	**95,15%**	**PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR**	**4,85%**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 17/02/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 172 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
Programación de bordillos	viernes, 27 de enero de 2023	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
Procedimiento de reparación de losas	viernes, 27 de enero de 2023	CUMPLIÓ
Arreglo de placas	miércoles, 1 de febrero de 2023	NO CUMPLIÓ
Protección de taludes	lunes, 6 de febrero de 2023	NO CUMPLIÓ
Instalación de espaldar de bordillos	lunes, 30 de enero de 2023	NO CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Revisión de compromisos
Avance de obra
Observaciones área SST

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 3
		FECHA	17/02/2023 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director de interventoría inicia el comité realizando la observación de que se citó a los directores de obra y no asistieron, así mismo se les ha pedido presencia en obra y tampoco se han presentado. Se revisan los compromisos pactados en el comité de obra anterior.

El ingeniero director de interventoría hace las siguientes observaciones:
Se tiene porcentaje de obra programado del 96,57%, ejecutado de 97% y adelanto del 0,4%
Se instalaron 100 m de pavimento para el espaldar de bordillos, pero no se ha continuado con esta actividad, se le solicita seguir con esta actividad. Se están instalando las señales verticales. Se debe realizar el arreglo de los bordillos volcados, también se encuentran bordillos fisurados que se deben retirar y no se está colocando mortero en la junta entre el pavimento y el bordillo, corregir esto. Se debe realizar la caracterización vial. Se solicita tener bandereros y señalización. En el frente de obra se instalaran señales verticales de resalto porque la Alcaldía Municipal queda con el compromiso de instalarlos. El contratista debe entregar el acta de pendientes firmada, se le ha hecho en varias ocasiones la solicitud y han hecho caso omiso.
La profesional social de la interventoría indica que están pendiente las actas de cierre de los predios donde aún se deben realizar los arreglos pertinentes, el contratista ya puede pedir las certificaciones de la personería.
La comunidad en la más reciente reunión de veeduría realizó unas peticiones sobre adecuación de la plaza del colegio, el arreglo del empalme entre Cedro y Cepillo y la propuesta de la ventosa, el contratista indicó que se le notificó a Aqualia sin obtener respuestas, pero la comunidad le informó al contratista de su existencia, la limpieza de la placa huella que está en la vía al Cedro. Se le solicita al contratista enviar la documentación faltante para el cierre social.
La profesional amibiental de la interventoría indica que se está adelantando el cierre ambiental y se está compilando la información para el informe trimestral.

La inspectora SST de la interventoría indica que realizando inspección en el frente se encontró con material sin señalizar, bordillos en la vía

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

FECHA: 17/02/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Arreglo de placas		Contratista
Protección de taludes		Contratista
Instalación de espaldar de bordillos		Contratista
Señales verticales		Contratista
Arreglo bordillos volcados		Contratista
Caracterización vial	martes, 28 de febrero de 2023	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
KATHERINE LOPESIERRA	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO ACI - 3B	
CLAUDIA BENITEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO ACI - 3B	
MARIA TEHERÁN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	MARIA TEHERAN
CESAR HERNANDEZ	REPRESENTANTE CONTRATISTA	DAVID CASTRO	
JUAN CARLOS MARTINEZ	SUPERVISOR DE CONTRATO	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/02/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 172 DE 2021, CONVENIO 1114-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento contractual Convenio 1114 - 2021

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Verificación compromisos reunión anterior.

Gestión social y ambiental (PAGA, SOCIALIZACIÓN, VEEDURÍAS, VALLA)

Avance de obra

Temas varios

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	9/02/2022
	(Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El presente comité de seguimiento inicia con la lectura y verificación de los compromisos pactados en la anterior reunión.

1. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR

Recorrido contratista e interventoría para identificar puntos de protección de talud y losas lavadas	jueves, 29 de diciembre de 2022	CUMPLIÓ
Reparación de losas		CUMPLIÓ

2. GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA, SOCIALIZACIÓN, VEEDURÍAS, VALLA)

Los informes del PAGA están al día y ya se inició el cierre ambiental y social. Se están realizando las actas de vecindad de cierre y el día de hoy se estará realizando el cierre de veeduría.

3. AVANCE DE OBRA

El proyecto presenta porcentaje de obra programado de 98,71%, porcentaje de obra ejecutado de 97,82% y un porcentaje de atraso del 0,9%.

Falta por ejecutar 288 m de bordillos in situ y 500 m de bordillos prefabricados, falta colocar el espaldar de bordillos, instalar la señalización vertical, realizar la caracterización vial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	9/02/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Protección de talud	viernes, 10 de febrero de 2023	Contratista
Reparación de losas lavadas	lunes, 13 de febrero de 2023	Contratista
Señalización horizontal	lunes, 13 de febrero de 2023	Contratista
Señalización vertical	sábado, 11 de febrero de 2023	Contratista
Instalación de espaldar de bordillos	martes, 14 de febrero de 2023	Contratista
Caracterización vial	miércoles, 15 de febrero de 2023	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Lemus Villadiego	Supervisor contrato de interventoria	INVIAS	
Miguel Diaz	Director de interventoria	Consorcio ACI - 3B	
Claudia Benitez	Profesional Ambiental	Consorcio ACI - 3B	
Katherine Lopesierra	Profesional Social	Consorcio ACI - 3B	
Cesar Hernández	Contratista	David Castro	
Liliana Uparela	Apoyo a la supervisión de los contratos	Alcaldía de Cereté	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 28-feb-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO

PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ACI-3B

CONTRATO DE OBRA No. 172-180-181 DE 2021, 001 DE 2022

CONTRATISTA: ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIOEYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
CAMIONETA	CAMIONETA DOBLE CABINA, PLACA UGU681, MARCA TOYOTA, CILINDRAJE 2494, MODELO 2015	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A			
ESTACIÓN PARA TOPOGRAFÍA	MARCA SOKKIA SET 6 SERIE D22852	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A			
NIVEL	MARCA TOPCOM, MODELO AT-B4, SERIE MZ 9945	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A			
MOTOCICLETA	MARCA AKT ENDURO, PLACA ASX-48G, CILINDRAJE 200, MODELO 2022	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A			
MOTOCICLETA	PLACA - VXI-8F	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A			
MOTOCICLETA	PLACA - MTI-73F	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A			
MOTOCICLETA	PLACA - WZK-74E	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A			
MOTOCICLETA	PLACA - WKD-48F	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A			
MAQUINA ENSAYOS A LA COMPRESIÓN	MARCA RYR, MODELO SG-BM, SERIE 162070	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A			
DIAL ANALOGO BAKER	MARCA BAKER, MODELO ANALOGO, SERIE UDD996, UTK308	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A			
HUMEDOMETRO TIPO SPEEDY PINZUAR	MARCA PINZUAR, MODELO TYPE D1	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A			
BALANZA DIGITAL TRUMAX	MARCA TRUMAX, MODELO MIX-A, YS 202725	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A			

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 28-feb-23 (Día / Mes / Año)

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: Mantenimiento vehículo: 163.195 km

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula No. :22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	28-feb-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2023 **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE OBRA No: 172-180-181 DE 2021, 001 DE 2022 **CONTRATISTA:** ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIOEYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Miguel Armando Diaz Rivera	79.153.481	Director de Interventoría	$ 6.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100	ACI	$ 6.500.000	$ 452.400	V	NUEVA EPS	9442335840	$ 260.000	PORVENIR	1736939109	$ 1.040.000	$ 260.000	$ -	$ -	
2	Carmelina Rosa Oviedo Ramos	30.581.482	Ingeniero Residente de Interventoría - El Cedro	$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100	ACI	$ 4.600.000	$ 288.200	V	NUEVA EPS	9442335840	$ 182.000	PORVENIR	1736939109	$ 727.900	$ 177.900	$ -	$ -	
3	Sergio Javier Solano Almanza	78.760.291	Ingeniero Residente de Interventoría El Cepillo	$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100	ACI	$ 4.600.000	$ 320.200	V	NUEVA EPS	9442335840	$ 184.000	PORVENIR	1736939109	$ 736.000	$ 184.000	$ -	$ -	
4	Carlos Milan Carvajal Pinto	1.047.387.270	Ingeniero Residente de Interventoría - Martinez	$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100	ACI	$ 4.600.000	$ 320.200	V	SANITAS	9442335840	$ 184.000	COLPENSIONES	1736939109	$ 736.000	$ 184.000	$ -	$ -	
5	Libardo Arteaga Hernandez	78.077.318	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100	ACI	$ 4.600.000	$ 320.200	V	NUEVA EPS	9442335840	$ 184.000	PROTECCION	1736939109	$ 736.000	$ 184.000	$ -	$ -	
6	Nohemi Sofia Padron Torres	1.065.004.889	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100	ACI	$ 4.600.000	$ 202.800	V	NUEVA EPS	9442335840	$ 116.600	PORVENIR	1736939109	$ 466.200	$ 116.600	$ -	$ -	
6	Said Mauricio Soto Martinez	1.071.357.798	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100	ACI	$ 3.200.000	$ 222.800	V	SALUD TOTAL	9442335840	$ 128.000	PROTECCION	1736939109	$ 512.000	$ 128.000	$ -	$ -	
7	Lina Ramos	1.065.004.889	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100	ACI	$ 3.200.000	$ 222.800	V	MUTUAL SER	9442335840	$ 128.000	PORVENIR	1736939109	$ 512.000	$ 128.000	$ -	$ -	
8	Katerine Paola Lopesierra Arteaga	1.073.815.505	Profesional Social	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100	ACI	$ 3.500.000	$ 40.600	V	NUEVA EPS	9442335840	$ 23.400	PORVENIR	1736939109	$ 93.400	$ 23.400	$ -	$ -	
9	Claudia Marcela Benitez Camacho	1.067.937.483	Profesional Ambiental	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100	ACI	$ 4.000.000	$ 92.800	V	EPS SURA	9442335840	$ 53.400	COLFONDOS	1736939109	$ 213.400	$ 53.400	$ -	$ -	
12	María José Teheraán Guerra	1.101.819.235	Inspector SST	$ 2.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100	ACI	$ 2.100.000	$ 146.200	V	NUEVA EPS	9442335840	$ 84.000	PORVENIR	1736939109	$ 336.000	$ 84.000			
13	Ivanna Rocio Charrasquiel Rivero	1.065.007.803	Secretaria	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100	ACI	$ 1.160.000	$ 3.600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9442335840	$ 40.500	PORVENIR	1736939109	$ 161.800	$ 40.600			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 46.660.000																																		$ 46.660.000	$ 2.632.800				$ 1.567.900			$ 6.270.700	$ 1.563.900	$ -	$ -	

El Interventor adjunta la certificación de fecha feb-23 a la que se refiere la nota 09 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 28-feb-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE OBRA No: 172-180-181 DE 2021, 001 DE 2022 **CONTRATISTA:** ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIOEYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1084921	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 242.430.000	
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11			$ 1.588.100.773	
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11			$ 100.000.000	
2023	1197722	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	NACION	PRINCIPAL	$ 965.265.286	
TOTAL						$ 2.895.796.059	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.895.796.059**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 242.430.000,00			
	Anticipo											
1	ENERO - 2022	$ 456.300,00	$ 86.697,00	$ 542.997,00	$ -	$ 542.997,00	$ -	1084921 - 30/12/2021	$ 241.887.003,00	**$ 2.895.253.062**		
2	FEBRERO - 2022	$ 39.956.820,00	$ 7.591.796,00	$ 47.548.616,00	$ -	$ 47.548.616,00	$ -	1084921 - 30/12/2021	$ 194.338.387	**$ 2.847.704.446**		
3	MARZO - 2022	$ 61.066.163,00	$ 11.602.571,00	$ 72.668.734,00	$ -	$ 72.668.734,00		1084921 - 30/12/2021	$ 121.669.653	**$ 2.775.035.712**		
4	ABRIL - 2022	$ 88.928.160,00	$ 16.896.350,00	$ 105.824.510,00	$ -	$ 105.824.510,00		1084921 - 30/12/2021	$ 15.845.143	**$ 2.669.211.202**		
	MAYO - 2022	$ 13.315.246,00	$ 2.529.897,00	$ 15.845.143,00		$ 15.845.143,00		1084921 - 30/12/2021	$ -	**$ 2.653.366.059**		
5		$ 78.131.354,00	$ 14.844.957,00	$ 92.976.311,00		$ 92.976.311,00		280222 - 23/02/2022	$ 7.023.689	**$ 2.560.389.748**		
5		$ 5.902.260,00	$ 1.121.429,00	$ 7.023.689,00		$ 7.023.689,00		280222 - 23/02/2022		**$ 2.553.366.059**		
6	JUNIO	$ 94.536.797,00	$ 17.961.992,00	$ 112.498.789,00		$ 112.498.789,00		280222 - 23/02/2022	$ 1.475.601.984	**$ 2.440.867.270**		
6	JULIO - 2022	$ 101.134.200,00	$ 19.215.498,00	$ 120.349.698,00		$ 120.349.698,00		280222 - 23/02/2022	$ 1.355.252.286	**$ 2.320.517.572**		
8	AGOTO - 2022	$ 113.107.700,00	$ 21.490.463,00	$ 134.598.163,00		$ 134.598.163,00		280222 - 23/02/2022	$ 1.220.654.123	**$ 2.185.919.409**		
9	SEPTIEMBRE - 2022	$ 105.579.070,00	$ 20.060.023,00	$ 125.639.093,00		$ 125.639.093,00		280222 - 23/02/2022	$ 1.095.015.030	**$ 2.060.280.316**		
10	OCTUBRE	$ 121.465.020,00	$ 23.078.354,00	$ 144.543.374,00		$ 144.543.374,00		280222 - 23/02/2023	$ 950.471.656	**$ 1.915.736.942**		
11	NOVIEMBRE	$ 125.440.700,00	$ 23.833.733,00	$ 149.274.433,00		$ 149.274.433,00		280222 - 23/02/2023	$ 801.197.223	**$ 1.766.462.509**		
12	DICIEMBRE	$ 125.440.700,00	$ 23.833.733,00	$ 149.274.433,00		$ 149.274.433,00		2802220- 23/02/2023	$ 651.922.790	**$ 1.617.188.076**		
13	ene-23	$ 125.412.700,00	$ 23.828.413,00	$ 149.241.113,00		$ 149.241.113,00		280222-23/02/2023	$ 502.681.677	**$ 1.467.946.963**		
14	feb-23	$ 126.362.881,00	$ 24.008.947,00	$ 150.371.828,00		$ 150.371.828,00		280222-23/02/2024	$ 352.309.849	**$ 1.317.575.135**		
TOTALES		**$ 1.199.873.190,00**	**$ 227.975.906,00**	**$ 1.427.849.096,00**	**$ -**	**$ 149.241.113,00**	**$ -**		**$ 352.309.849,00**	**$ 1.317.575.135,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS PERSONAL	$ 1.129.255.920	$ 214.558.624	$ 1.343.814.544
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 197.012.450	$ 37.432.366	$ 234.444.816
*			
VALOR TOTAL	$ 1.326.268.370	$ 251.990.990	$ 1.578.259.360

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-12786 CND

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. : 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÌAS CONTRATO DE INTERVENTORÌA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 28-feb-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.930.530.773,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 811.147.384,00	27	ENE	2022	1	MAR	2023
Calidad del servicio		$ 579.159.232,00	29	AGOS	2022	29	AGOS	2027
Cumplimiento de Servicio		$ 193.053.077,00	27	ENE	2022	1	MAR	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 386.106.155,00	27	ENE	2022	29	AGOS	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551–6

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÌAS CONTRATO DE INTERVENTORÌA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	28-feb-23 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÌAS CONTRATO DE INTERVENTORÌA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 28-feb-23
(Día / Mes / Año)

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 289.579.212,00	27	1	2022	30/12/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 811.147.384,00	27	1	2022	30/12/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 579.159.212,00	27	1	2022	30	6	2026
Calidad del servicio		$ 868.738.818,00	31	12	2022	30	6	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-12786 CND

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FS-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	03/03/2023 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL ☒
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ No. 3 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

2276 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA – GRUPO 4.

CONSORCIO ACI - 39

SSA

NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
17/02/2022
(Indicar día/mes/año)

CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA - CONSORCIO EVR 016 - CONSORCIO CRT PROGRESA - CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de Julio de 2022 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/01/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) ($): $ 1.990.030.773,00 (Según contrato principal)
Valor OP APU PAEV APU Suscrito (Pesos): $ 2.895.796.059,00

PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Junio de 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) ($): $ 965.265.286,00

CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 01 DE OCTUBRE DE 2022		AÑO 2022																		AÑO 2023										TOTAL
	Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		TOTAL
									H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																											
PERSONAL PROFESIONAL																																											
Director de Interventoría	$ 9.300.000,00		9,00	$ 58.500.000,00			11,03	$ 71.695.000,00	0,00	$ 186.000,00	1,00	$ 4.186.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	1,00	$ 4.650.000,00	17,03	$ 110.695.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00		9,00	$ 41.400.000,00			10,43	$ 47.978.000,00	0,00	$ -	0,93	$ 4.278.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	0,80	$ 4.140.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 2.300.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	11,93	$ 54.878.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00		9,00	$ 41.400.000,00			9,80	$ 45.080.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,80	$ 3.680.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ -	1,00	$ -	1,00	$ -	1,00	$ -	1,00	$ -	9,80	$ 45.080.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00		9,00	$ 41.400.000,00			9,53	$ 43.838.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	9,53	$ 71.838.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00		9,00	$ 41.400.000,00			7,20	$ 33.120.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 920.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	10,20	$ 69.720.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00		0,00	$ -			3,00	$ 13.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	1,00	$ 4.600.000,00	9,00	$ 41.400

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Radicación relacionada	No. Salida	Fecha Radicado	Asunto / Tema Asociado	Destinatario	Tipo de Comunicación	Días Hábiles Otorgados	Fecha límite de respuesta	Estado del oficio	INDICADOR	Radicado de respuesta	Radicado de respuesta del contratista
	SAL-23-001897	2023-02-01	Requerimiento retiro de material sobrante de la instalación de bordillos.	David Fernando Castro Gaviria	Solicitud	1	2023-02-02	Sin Respuesta	VENCIDA	-	
	SAL-23-002143	2023-02-04	PERMANENCIA EN CAMPO DE AUXILIAR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	David Fernando Castro Gaviria	Solicitud	2	2023-02-07	Sin Respuesta	VENCIDA	-	
ENT-23-002610	SAL-23-002145	2023-02-04	Respuesta a oficios SAL-23-001848- SAL-23-000793- Requerimiento entrega programa de inversiones y flujo de caja de acuerdo con la prórroga N0. 2.	David Fernando Castro Gaviria	Respuesta	-		Sin Respuesta	VENCIDA	-	
	SAL-23-002241	2023-02-06	Reunión de cierre de veeduría	David Fernando Castro Gaviria	Informativo	-		Cerrado	CERRADO	-	
	SAL-23-002330	2023-02-07	Solicitud de faltantes para informes sociales	David Fernando Castro Gaviria	Solicitud	5	2023-02-13	Sin Respuesta	VENCIDA	-	
	SAL-23-002648	2023-02-10	Solicitud para finalizar actividades pendientes en el tiempo contractual del contrato.	David Fernando Castro Gaviria	Solicitud	-	2023-02-15	Sin Respuesta	VENCIDA	-	
	SAL-23-002943	2023-02-15	Solicitud cambio de bordillos por anomalías.	David Fernando Castro Gaviria	Solicitud	-		Sin Respuesta	VENCIDA	-	
	SAL-23-002990	2023-02-15	Requerimiento #1 a solicitud de faltantes para informes sociales	David Fernando Castro Gaviria	Solicitud	3		Abierto	VENCIDA	ENT-23-004072	OFIC-DFCG-119
	SAL-23-003004	2023-02-15	Remisión de solicitud de JAC. El Carmen del Zapal de fecha 13 de feb/2023	David Fernando Castro Gaviria	Reporte	5		Sin Respuesta	VENCIDA		
	SAL-23-003208	2023-02-18	Entrega de copias de PQRS con sus respectivos cierres	David Fernando Castro Gaviria	Solicitud	5	2023-02-24		VENCIDA		
ENT-23-004072	SAL-23-003302	2023-02-20	Respuesta a oficio SAL-23-002990- Requerimiento #1 a solicitud de faltantes para informes sociales.	David Fernando Castro Gaviria	Informativo	-		Cerrado	CERRADO		
	SAL-23-003313	2023-02-20	Observaciones a bordillos fundidos In situ.	David Fernando Castro Gaviria	Solicitud	-		Sin Respuesta	VENCIDA		
	SAL-23-003368	2023-02-21	Solicitud de documentación para cierre social	David Fernando Castro Gaviria	Solicitud	3	2023-02-24	Sin Respuesta	VENCIDA		
	SAL-23-003541	2023-02-22	Requerimiento arreglo empalme de bordillos de los proyectos San Antonio Cedro y San Antonio Cepillo.	David Fernando Castro Gaviria	Solicitud	4	2023-02-27		VENCIDA		
	SAL-23-003606	2023-02-23	Notificación de seguimiento a actas de vecindad	David Fernando Castro Gaviria	Notificación	-		Cerrado	CERRADO		
	SAL-23-003777	2023-02-25	Aprobación de Reprogramación No. 3 San Antonio - Cedro.	David Fernando Castro Gaviria	Informativo	-		Cerrado	CERRADO		

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-001897
2023-02-01 11:08:38 a. m.

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 1 de febrero de 2023

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
davidfcastrog01@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Requerimiento retiro de material sobrante de la instalación de bordillos.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro seguimiento y Control que realiza esta Interventoría a su Contrato de Obra No 172 de 2021, nos permitimos reiterar la siguiente solicitud:

El día 18 de enero de 2023, se le solicito al contratista **David Fernando Castro Gaviria**, por medio de oficio con radicado N°SAL-23-000986 el retiro del material sobrante que se utiliza para la instalación de los bordillos, el cual está siendo dejado sobre el pavimento en varios puntos de la vía.

Se evidencio que el contratista inicio con la limpieza que se le solicito, pero en recorrido realizado por esta interventoría se evidencia material acumulado en K1+780, cabe resaltar que este material se encuentra en este lugar desde hace aproximadamente 3 semanas motivo por el cual se envió el oficio anterior.

Anexo registro fotográfico.

CONSORCIO ACI-3B



Teniendo en cuenta lo anterior se le requiere al contratista **David Fernando Castro Gaviria,** realizar la limpieza correspondiente a esta actividad en todo el tramo de la vía, en un tiempo no mayor a un (01) día del recibido de este comunicado.

Cordialmente,

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-001897
2023-02-01 11:08:38 a. m.

CONSORCIO ACI-3B



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
1/02/2023 11:08:39 a. m.

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos:

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-002143
2023-02-04 04:34:12 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 4 de febrero de 2023

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
davidfcastrog01@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: PERMANENCIA EN CAMPO DE AUXILIAR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro seguimiento y control que realiza esta Interventoría a su Contrato de Obra No 172 de 2021, nos permitimos realizar el siguiente requerimiento:

Se solicita la presencia del Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo con una permanencia del 100% en campo, para vigilar las actividades que se desarrollan durante la jornada laboral, debido a que se ha evidenciado durante estos últimos días la asistencia del profesional solo el 50% incumpliendo con la permanencia necesaria.

Por lo tanto esta interventoría solicita atender dicha solicitud en un plazo no mayor a (02) dos días del recibido de dicho comunicado.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-002143
2023-02-04 04:34:12 p. m.

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
4/02/2023 4:34:12 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-002145
2023-02-04 04:45:26 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Radicación relacionada: ENT-23-002610

Bogotá D.C., 4 de febrero de 2023

Señor(a)
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
CL 58 11 92 ED FLORENCIA AP 604
davidfcastrog01@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Respuesta a oficios SAL-23-001848- SAL-23-000793- Requerimiento entrega programa de inversiones y flujo de caja de acuerdo con la prórroga N0. 2.

REFERENCIA: REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

Revisando el programa de inversiones entregado por usted se observa que este no se realizó teniendo en cuenta el programa de inversiones correspondiente a la prorroga N0. 1 ya que realizaron cambios cambios desde el mes de marzo de 2022 los cuales no debieron realizarse, además de esto este debe llevar el valor de la inversión ejecutada.

Por lo anterior se le solicita al contratista DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA realizar el programa de inversiones correspondiente a la prórroga N0. 2 partiendo del programa de inversiones correspondiente a al prorroga No. Con su respectiva inversión de obra ejecutada

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-002145
2023-02-04 04:45:26 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
4/02/2023 4:45:27 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-002241
2023-02-06 08:49:42 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 6 de febrero de 2023

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
davidfcastrog01@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: : Reunión de cierre de veeduría

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente el Consorcio ACI-3B ejerciendo sus funciones de interventoría al contrato de obra N° 172-2021, requiere la asistencia de su equipo de trabajo (Director de obra, ingeniero residente y profesional social) a la reunión de cierre de veeduría, lo anterior teniendo en cuenta que es importante que participe de estos encuentros que son vitales para solucionar los inconvenientes que se han desencadenado como consecuencia del desarrollo de las actividades constructivas del proyecto.

Fecha: jueves 9 de febrero de 2023

Hora: 4:00PM

Lugar: Casa del Sr. Amílkar Rodríguez – Vereda El Cedro.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-002241
2023-02-06 08:49:42 p. m.

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
6/02/2023 8:49:42 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-002330
2023-02-07 05:58:14 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 7 de febrero de 2023

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
davidfcastrog01@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Solicitud de faltantes para informes sociales

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente el Consorcio ACI-3B ejerciendo sus funciones de interventoría al contrato de obra N° 172-2021, desde el área social se requieren los siguientes documentos:

- Formatos de registros fotográficos de los meses de marzo y abril de 2022.

Del mismo modo se solicita que en caso de que al inicio del proyecto se hayan realizado gestiones ante el Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia sean enviadas junto a los documentos solicitados anteriormente.

Lo anterior teniendo en cuenta que se están corrigiendo los informes mensuales, por lo tanto se solicita adjuntar lo requerido en un plazo no superior a 5 días contados a partir de la fecha de recepción del presente documento.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
7/02/2023 5:58:15 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-002330
2023-02-07 05:58:14 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-002648
2023-02-10 08:59:49 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2023

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
davidfcastrog01@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Solicitud para finalizar actividades pendientes en el tiempo contractual del contrato.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

Haciendo el respectivo seguimiento a la programación de obra entrega por usted se observa que hay un atraso en algunas actividades las cuales deberían estar ejecutándose como los son:

- Instalación de señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva
- Línea de Demarcación con Pintura en Frío.
- Caracterización vial
- Protección de talud.

Actividades que a la fecha el contratista aun no ha iniciado, además de esto le falta por finalizar con la instalación de bordillos prefabricados, construcción de bordillos y fundidos in situ, se le recuerda al contratista DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA que las actividades antes nombradas se debe ejecutar en el tiempo establecido el cual es hasta el 15 de febrero de 2023.

Cordialmente,

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-002648
2023-02-10 08:59:49 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
10/02/2023 8:59:49 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-002943
2023-02-15 02:18:35 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2023

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
davidfcastrog01@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Solicitud cambio de bordillos por anomalías.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

En recorrido realizado por parte de esta interventoría, se evidencia que el contratista está instalando bordillos fisura dos, es importante aclarar que al contratista ya se le había informado por medio oficio con radicado SAL-22-021756 del 13 de diciembre, que los bordillos instalados deben cumplir con las especificaciones técnicas, debido a que se observó que habían bordillos desalineados.

Además de esto se evidencia que la junta entre el bordillo y la losa se está presentando un desprendimiento, lo que hace que el espacio que se origina se llene de partículas y agua, ocasionado socavación por debajo de la losa y daños a la estructura del pavimento, también se evidencia que para realizar esta junta inician llenándola con arena y cemento, por último colocando una capa de mezcla. Este procedimiento es erróneo ya que toda la junta se deben llenar en su totalidad con la respectiva mezcla, la cual ayuda a que estos no se desprendan.

Se anexa registro fotográfico.

CONSORCIO ACI-3B





Por lo anterior se le solicita al contratista DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA realizar una inspección de los bordillos instalados y los que presentes fisuras o no cumplan con el alineamiento correspondiente, cambiarlos por bordillos que, si cumplan, aparte retirar la junta que se ha desprendido e instalarla nuevamente, lo anterior se debe realizar teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del INVIAS, de no ser así, estos no serán recibido por parte de esta interventoría.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
15/02/2023 2:18:35 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-002990
2023-02-15 05:44:41 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2023

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
davidfcastrog01@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Requerimiento #1 a solicitud de faltantes para informes sociales

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente el Consorcio ACI-3B ejerciendo sus funciones de interventoría al contrato de obra N° 172-2021, desde el área social se requieren los siguientes documentos:

- Formatos de registros fotográficos de los meses de marzo y abril de 2022.

Del mismo modo se solicita que en caso de que al inicio del proyecto se hayan realizado gestiones ante el Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia sean enviadas junto a los documentos solicitados anteriormente.

Lo anterior teniendo en cuenta que se están corrigiendo los informes mensuales, por lo tanto se solicita adjuntar lo requerido en un plazo no superior a 3 días contados a partir de la fecha de recepción del presente documento.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
15/02/2023 5:44:42 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-002990
2023-02-15 05:44:41 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-003004
2023-02-15 06:56:33 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2023

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
davidfcastrog01@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Remisión de solicitud de JAC. El Carmen del Zapal de fecha 13 de feb/2023

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente el Consorcio ACI-3B ejerciendo sus funciones de interventoría al contrato de obra N° 172-2021, remite la solicitud hecha por la Junta de Acción Comunal del Carmen del Zapal, la cual indica:

"… El año pasado solicitamos al consorcio la pavimentación del espacio entre la bajada del puente peatonal y la carretera."

Lo anterior entendiendo que antes de pavimentar, las aguas lluvias iban dirigidas hacia la finca ubicada frente al puente, sin embargo con la pavimentación, las aguas quedan estancadas y no tienen hacia donde desaguar.
Por tal razón se hace necesaria respuesta del contratista para la solución de dicha problemática en un plazo no superior a 5 días, teniendo en cuenta que este asunto es de su conocimiento desde el pasado 15 de noviembre de 2022.

Se adjuntan oficios entregados por la Junta de Acción Comunal.

Cordialmente,

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-003004
2023-02-15 06:56:33 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
15/02/2023 6:56:34 p. m.

Folios: 2
Anexo: 1
Nombre anexos: Oficios JAC Zapal.pdf

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-003208
2023-02-18 11:48:25 a. m.

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 18 de febrero de 2023

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
davidfcastrog01@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Entrega de copias de PQRS con sus respectivos cierres

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente el Consorcio ACI-3B ejerciendo sus funciones de interventoría al contrato de obra N° 172-2021, solicita que se remitan las copias de las PQRS recibidas en el transcurso del proyecto con sus respectivos cierres. En caso de que se hayan recibido de forma verbal, se solicita un consolidado que indique motivo de la PQRS y tramite de cierre.

Para lo anterior se solicita adjuntar lo requerido en un plazo no superior a 5 días contados a partir de la fecha de recepción del presente documento

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
18/02/2023 11:48:25 a. m.

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-003302
2023-02-20 04:13:51 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Radicación relacionada: ENT-23-004072

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2023

Señor(a)
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
CL 58 11 92 ED FLORENCIA AP 604
davidfcastrog01@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Respuesta a oficio SAL-23-002990- Requerimiento #1 a solicitud de faltantes para informes sociales.

REFERENCIA: REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente el Consorcio ACI-3B ejerciendo sus funciones de interventoría al contrato de obra N° 172-2021, desde el área social recibe a satisfacción la documentación enviada a través del oficio OFIC-DFCG-119, que correspondía a información social faltante de los informes mensuales.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
20/02/2023 4:13:52 p. m.

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos:

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-003313
2023-02-20 05:32:27 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2023

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
davidfcastrog01@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Observaciones a bordillos fundidos In situ.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

Existe en obra algunas novedades en cuanto a la ejecución de la actividad de instalación de bordillos fundido in situ, las cuales han sido reiteradas al contratista DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, por medio de correspondencias radicadas con la siguiente numeración:

SAL-22-021756 del 13 de diciembre de 2022

SAL-23-002943 del 15 de febrero de 2023

En tales correspondencias se solicita que, al momento de ejecutar dicha actividad, los bordillos deben estar debidamente alineados y sin fisuras, cumpliendo con las especificaciones técnicas. De no darse de tal modo, esta actividad no sería recibida por esta interventoría.

Es preocupante que el contratista no tenga en cuenta las observaciones emitidas, ya que en recorrido realizado el día de hoy se evidencia que los bordillos fundidos in situ entre el K2+614 al K2+626, del K2+606 al K2+597 y del K2+863 al K2+875, se encuentran desalineados.

Se anexa evidencia fotográfica.

CONSORCIO ACI-3B



Por todo lo anterior, se requiere realizar un recorrido en conjunto con la interventoría el día de mañana 21 de febrero para verificar en campo la situación y de este modo buscar soluciones inmediatamente. De no existir corrección para estos, tendrán que ser demolidos y posteriormente reemplazados.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
20/02/2023 5:32:28 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-003368
2023-02-21 03:04:23 p. m.

Bogotá D.C., 21 de febrero de 2023

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
davidfcastrog01@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Solicitud de documentación para cierre social

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio del presente el Consorcio ACI-3B ejerciendo sus funciones de interventoría al contrato de obra N°172-2021, solicita los siguientes documentos con el fin de realizar el cierre social, lo anterior teniendo en cuenta que contractualmente finalizaron las actividades de obra el pasado 15 de febrero de 2023.

- Consolidado de actas de vecindad de inicio y cierre
- Certificación de la personería de no pasivos sociales

En caso de que aún no se tenga respuesta a la solicitud de la certificación por parte de la personería, se recomienda enviar las actas de vecindad para ir adelantando el cierre social.
Se solicita adjuntar lo requerido en un plazo no superior a 3 días contados a partir de la fecha de recepción del presente documento.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
21/02/2023 3:04:24 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-003368
2023-02-21 03:04:23 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

31 de enero de 2023 (Martes)

Tiempo: Seco
Equipo en obra: Minicargador - Herramientas menores
Personal en obra: SST - Resto de obra - Ayudante(s) operador(a)
Actividad en obra: Se instalan bordillos prefabricados

01 de febrero de 2023 (Miércoles)

Tiempo: Seco
Equipo: minicargador - Herramientas menores
Personal: SST - Resto de obra - Ayudantes operador
Actividad en obra: Se instalan bordillos prefabricados
Cierre actos de Vecindad.

02 de febrero de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco
Equipo: minicargador - Herramientas menores
Personal: Resto de obra - SST - Ayudante(s) operador(a)
Actividad: Se hacen excavaciones para instalar bordillos.
- Se instalan bordillos prefabricados
- Se funden bordillos in situ

03 de febrero de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco
Equipo: minicargador - Herramientos menores

Powered by CamScanner

147

personal: Res de obra - SST - Ayudantes(s) operador(3)
Actividad: Se instala bordillos prefabricados
Cierre costos de Seguridad.

04 de febrero de 2023 (Sabado)

Tiempo: Seco
equipo: Minicargador — Herramientas menores
Personal: Res de obra — SST - Ayudantes(s) operador
Actividad: Se continua con la instalación de bordillos - Cierre actos de Seguridad

05 de febrero de 2023 (Domingo)

No se realiza actividad en obra

06 de febrero de 2023 (Lunes)

Tiempo: Seco
Equipo: Minicargador - Herramientas menores
Personal: Res de obra - SST - Social.
Actividad: Cierre actos de Seguridad
- Instalacion de bordillos prefabricados

07 de febrero de 2023 (Marte

Tiempo: Seco
Equipo: Minicargador — Herramientas menores

Powered by CamScanner

148

08 de febrero de 2023 (Miercoles)

Tiempo: Seco
equipo: Herramientos menores minicargador
personal: Res de obra - SST - operador - Ayudante
Actividad: Instalación de bordillos prefabricados
- Se fundan placas que estuban fisuradas
- Se funden bordillos in sito.

09 de febrero de 2023 (Jueves)

tiempo: Seco
equipo: Minicargador - Herramientos menores
personal: Res de obra - SST - operador
Ayudantes
Actividad: Instalacion de bordillos prefabricados

10 de febrero de 2023 (Viernes)

Temp: Seco
equipo: minicargador - Herramientos menores
personal: Res de obra - SST - Ayudante - operador
Actividad: Instalacion de bordillos prefabricados.

11 de febrero de 2023 (Sabado)

Tiempo: Seco
Equipo: minicargador - Herramientos menores

Powered by CamScanner

personal: Res de obra - SST - Ayudantes (2) operador (1)
Actividad: Se instalan bordillos prefabricados.
-se realiza limpieza en la via para realizar la demarcación vial

12 de febrero de 2023 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

13 de febrero de 2023 (Lunes)

Tiempo: Seco
Equipo: Minicargador - Herramientas menores-
Personal: Res de obra - SST - operador - Ayudante (s)
Actividad: Continuan con la instalacion de bordillos prefabricados y bordillos fundidos In sitio
-se inicia con la demarcacion lineal.
Linea central.
OBSERVACIÓN: Se le recomienda al contratista corregir los placas lavadas del Ko+540 al Ko+600 antes de realizar la demarcación ala que el Contratista responde que lo hara posteriormente y en caso de realizar demarcación nuevamente en ese tramo lo hara.

14 de febrero de 2023 (Martes)

Tiempo: Seco
Equipo: minicargador - Herramientas menores
Personal: Res de obra - operador - Ayudante
Actividad: Se instalan bordillos prefabricados

Powered by CamScanner

Se continua con la demarcacion lineal lateral(e)

x

15 de febrero de 2023 (Miercoles)

Tiempo: Seco
Equipo: Herramientas menores minicargador
Actividad: Se continua con la instalación de bordillos prefabricado
- Se instalan sonatas verticales

16 de febrero de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco
Equipo: Herramientas menores - Minicargador
Actividad: Se continua con la instalación de bordillo prefabricado
Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (8)

17 de febrero de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco
Equipo: Minicargador - Herramientas menores
Personal en obra: Res de obra - operador - Ayudant
Actividad: Instalacion de bordillos Prefabricados
- Se instalan sonatas verticales

18 de febrero de 2023 (Sabado)

Powered by CamScanner

Tiempo: Seco
Personal: Res de obra - SST - Ayudante CS) operador
Actividad: Se instalan Señales Verticales
- Se instalan bordillos prefabricados
Equipo: minicargador - Herramientos menores

19 de febrero de 2023 (Domingo)

No Se realizan actividades en obra.

20 de febrero de 2023 (Lunes).

Tiempo: Seco.
Personal en obra: Res de obra - SST - Ayudantes - operador
Equipo: Herramientos menores minicargador
OBSERVACIÓN: Se aprueba prorroga N-3 por parte de la administración municipal con fecha de 15 de feb/23.
Actividad: Se toman juntas entre bordillos
Se intala bordillos prefabricados.
OBSERVACIÓN: Se le informa al contratista que hay bordillos desalineados los cuales deben ser corregidos

21 de febrero de 2023 (Martes)

Tiempo: Seco
Equipo: minicargador Herramientos menores.
Personal: Res de obra - Ayudantes (2) SST operador
Actividad: Se continua con el sello de juntas entre bordillos

Powered by CamScanner

22 de febrero de 2023 (Miercoles)

Tiempo: Seco
Equipo: minicargador - Herramientas menores
Personal: Res de obra - SST - Ayudantes/ operador
Actividad: Se organizan bordillos volcados por los vehiculos
- se toman fotos de bordillos
OBSERVACIÓN: Se le solicita al contratista arreglar las juntas entre bordillo y la losa y colocar mezcla en su totalidad
- Se le solicita al contratista arreglar el empalme de bordillos entre los proyectos Centro y Capilla

23 de febrero de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco
Equipo: minicargador - Herramientas menores
Personal: Res de obra - SST - Ayudantes operador
Actividad: Se toman fotos entre bordillos
- Se arreglan bordillos levantados

24 de febrero de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco
Equipo: Minicargador - Herramientas menores
Personal en obra: Res de obra - operador
Ayudantes con - SST
Actividad: Se instalan bordillos prefabricado
- Se arreglan bordillos deselineados

Powered by CamScanner

25 de febrero de 2023 (Sabado)

Tiempo: Seco
Equipo: minicargador - Herramientas menores
Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (4) operador
Actividad: Se realiza confinamiento de espaldar de bordillos con material Seleccionado.

26 de febrero de 2023 (Domingo)

No se realiza actividad en obra

27 de febrero de 2023 (Lunes)

Tiempo: Seco
Equipo: minicargador - Herramientas menores.
Personal en obra: Res. de obra - SST - Ayudantes (4).
operador (1)
Actividad en obra: Se continua con el confinamiento de espaldar de bordillos con material Seleccionado
OBSERVACIÓN: Se le recuerda al contratista que el confinamiento de espaldar de bordillos con material Seleccionado debe ser compactado como figura en el item

y

28 de febrero de 2023 (Martes

Tiempo: Seco

Powered by CamScanner

Equipo: Minicargador - Vibro Compactador
Personal en obra: Res. de Obra - SST
Ayudantes (4) operador (1)
Actividad en obra: Se continua con la conformacion de espaldar de bordillos con material seleccionado
OBSERVACION: Se le solicita al contratista arreglar juntas entre bordillos y placas. y hacerlas segun las especificaciones Tecnicas
