	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 078 DE 2022 **Contratista:** UNION TEMPORAL CR FASE 2

Contrato de Interventoría No. 2066 DE 2023 **Interventoría:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Objeto Contrato de Obra:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** FEBRERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		11
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		14
3.1	Información general del contrato		14
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		16
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		18
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	18
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	18
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	18
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	19
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	19
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	19
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	19
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	19
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		19
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	19
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	20
	• Seguimiento Programa de Obra		20
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	20
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	20
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	20
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	20
	Conclusiones y recomendaciones		21
5	**Anexos**		22
5.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		22
5.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		22
5.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		22
5.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		22

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: JAVIER JESUS SOLARTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. ____45___ de fecha __10 DE JULIO DE 2023_____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: 078 DE 2022

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CR FASE 2

PLAZO INICIAL: 4 meses y 14 dias
FECHA DE INICIO: 18/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/03/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/08/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 16 MESES Y 14 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.939.011.755,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.939.011.755,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 775.604.702,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 280.133.787,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2066-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JESUS JAVIER SOLARTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	1522
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		KM	9
Otros (Especificar cuales)	OBRA TRANSVERSAL (ALCANTARILLA)	UND	3

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml	395	742
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		ml		2151,1
Otros (Especificar cuales)	OBRA TRANSVERSAL (ALCANTARILLA)	UND	1	3

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.912.961.155,00		1.912.961.155,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 26.050.600,00		26.050.600,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.939.011.755,00		1.939.011.755,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 201.855.812,94		$ 201.855.812,94	$ 1.547.698.280,19
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 26.050.600,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 201.855.812,94	$ -	$ 201.855.812,94	$ 1.573.748.880,19

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA 1/03/2024
(Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	1.939.011.755,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	1.573.748.880,19
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		81,16%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**18**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA - PLACA HUELLA SECTOR LA PICA





SUB BASE GRANULAR - ACERO DE REFUERZO DE PLACA HUELLAS Y CUNETA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INGENIERA CIVIL
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES - DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No.7

MUNICIPIO DE PUEBLORRICO FASE 2

PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2066 DE 2023

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 01 al 29 febrero del 2024 por UNION TEMPORAL CR FASE ejecutor del Contrato de No. 078 con número de proceso en SECOP I: LP-001-2022. cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUI ", generado por el Municipio de Pueblorrico como entidad contratante a través del Convenio Interadministrativo No. 1898 de 2020 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías – INVIAS y el Municipio de Pueblorrico, Departamento de Antioquia para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa "Colombia Rural"", contrato que fue adjudicado mediante resolución No. 3 Resolución No. 3.0.29.10 – 094, del 23 de junio del 2022 a través de la licitación pública No. LP-001- 2022 y está bajo la supervisión de Wilmar Orozco De Ávila, secretario de planeación e infraestructura por parte del Municipio. La interventoría del Contrato de obra la realiza con la persona natural ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ bajo el contrato No. 2066 del 2023 con proceso de selección de mínima cuantía No.IP-DT-ANT-006-2023, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE FREDONIA Y PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", generado por Instituto Nacional de Vías - INVIAS como entidad contratante y adjudicado mediante resolución No. 2892 del 29 de septiembre del 2021 a través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DO-SRT-072-2021, este contrato está bajo la supervisión del Ing. Javier Jesús Solarte Portilla designado por INVIAS mediante Resolución No. 3664 del 23 de noviembre del 2021.

El objetivo principal de este informe, es presentar el avance técnico, administrativo y financiero ejecutado hasta la fecha en desarrollo del Contrato de Obra e Interventoría antes descritos, proyecto que hace parte del programa "Colombia Rural" que busca ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en los corredores viales que permitan incrementar la productividad del campo y la calidad de vida en las regiones.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como fin mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, vereda Castalia, La Pica, Indígena (Resguardo Bernandino Panchí), La Unión entre otros del municipio de Pueblorrico, dotando de unas vías en excelentes condiciones estructurales para el desarrollo y movilidad vehicular a lo largo y ancho del municipio.

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El municipio de Pueblorrico está localizado en la subregión Suroeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Tarso, por el este con el municipio de Jericó, por el sur con el municipio de Andes y por el oeste con los municipios de Hispania, Bolívar y Salgar. Su economía se caracteriza por Agricultura: café, plátano, yuca, panela, maíz y fríjol, Ganadería tanto vacuna como porcina y equina, comercio.

La vía a intervenir es un acceso veredal a un corredor productivo LA CASTALIA - LA PICA donde concurren algunos ramales de vías terciarias que comunican las veredas o zonas productivas Vía La Castalia Código de vía: 05576VT19, Vía La Castalia – Indígena (Resguardo Bernandino Panchí)- Código de vía: 05576VT21, vía la Castalia - - La Unión. Código de vía: 05576VT22, vía La castalia – La Pica Código de vía: 05576VT04. Sección propia de la vía Pueblorrico-La aguada. Carretera que no ha sido anteriormente categorizada según el Sistema Integral Nacional de Información de carreteras (SINC).



Ilustración 1. Localización de Pueblorrico en Colombia.

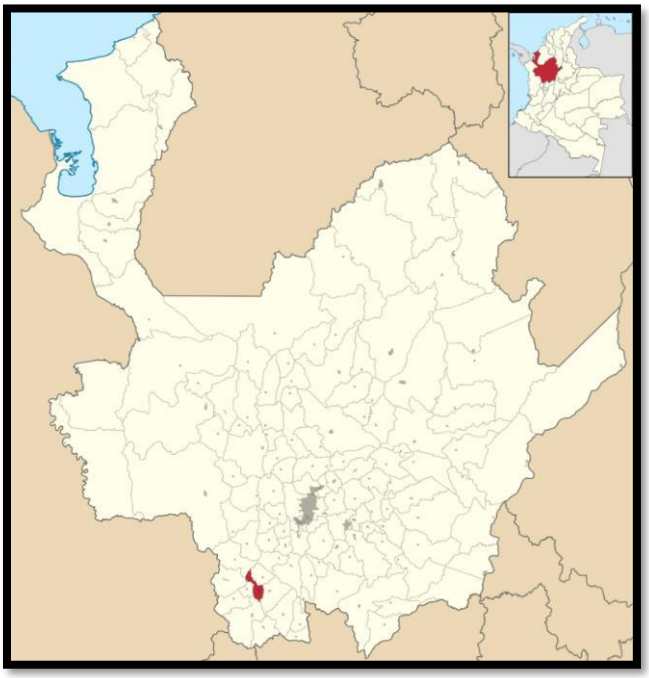


Ilustración 2. Localización de Pueblorrico en Antioquia.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias



Ilustración 3. Localización de la vía a intervenir.

2.2 Municipios de la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El principal beneficio del proyecto es la calidad vial que obtendrán los ciudadanos del municipio de Pueblorrico, el cual podrán acceder mejor a los víveres, comercio y vida cotidiana por medio de la reparación de la vía.

Con el proyecto que se pretende contratar traerá los siguientes beneficios al municipio:

- ✓ Mejorar la competitividad y transitabilidad de los corredores productivos.
- ✓ Mayor integración y comunicación entre las localidades del ámbito de influencia.
- ✓ Brindar alternativas estables de ingresos, empleo y valorización patrimonial a las familias y comunidades campesinas del área de influencia del proyecto.
- ✓ Disminución de costos del producción, transporte y comercialización agrícola.
- ✓ Oportuno acceso a los servicio médicos y educativos.
- ✓ Mayor flujo de bienes y servicios que reduzcan la brecha entre la ciudad y el campo y dignificar a los habitantes de las zonas rurales.
- ✓ Fortalecer la acción comunal y general organización en el campo colombiano

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El sector priorizado es el corredor productivo CASTALIA- LA PICA en donde concurren algunos ramales de vías terciaria que comunican las veredas o zonas productivas-Vía La Castalia. - Vía La Castalia – Indígena (Resguardo Bernandino Panchí). -vía la Castalia -- La Unión. - vía La castalia – La Pica.

Durante el recorrido a la vía terciaria Castalia - La Pica en el municipio de Pueblorrico, se observan varios tramos de placa huella construidos, tramos de afirmado en regulares condiciones y en la pendiente de acceso al resguardo indígena Bernandino Panchi se observa suelo en tierra malo con CBR por debajo del 3%. La mayoría de los sitios críticos se encuentran en el anillo vial de la vereda la Pica, los cuales requieren mantenimiento con conformación, afirmado, desmonte y rocería en zonas no boscosas, limpieza de alcantarillas, etc.

Se observaron varias obras transversales de 24" a lo largo de la vía terciaria que se encuentran colmatadas y/o en regular estado, por lo que se hace necesario la construcción de nuevas alcantarillas en los PR 0+900, PR 1+200, PR 1+400, PR4+350 del anillo vial.

A continuación, se presentan fotografías que permiten identificar el estado inicial de la vía:



Ilustración 4. Estado inicial de la vía.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias



Ilustración 5. Estado inicial de la vía.



Ilustración 6. Estado de la vía.



Ilustración 7. Estado de la vía.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias



Ilustración 8. Estado de la vía.

2.4 Características técnicas del proyecto

A continuación, se relaciona la información técnica y general del tramo a intervenir en el proyecto:

La obra se llevará a cabo en el Departamento de Antioquia, Municipio de Pueblorrico, Sobre el corredor productivo Castalia-la pica-Resguardo Bernandino Pachi, en donde se ejecutará por priorización del municipio y de acuerdo a la ficha técnica realizada en los procesos de licitación el tramo a intervenir es la vía que da al resguardo indígena, vía castalia, vía castalia la unión, castalia-la pica el cual tiene una pendiente del 12% y una longitud de 9 Km, sus coordenadas son:

CORREDOR PRODUCTIVO VIA CASTALIA-LA PICA FASE 2	
COORDENADA INICIO TRAMO IZQUIERDO	5° 46´16,362" , -75°50´20,174"
COORDENADA FINAL TRAMO IZQUIERDO	5° 45´48,446" , -75°50´0,145"
COORDENADA INICIO ANILLO VIAL	5°45´52.683" , -75°50´11.79"
COORDENADA FINAL ANILLO VIAL	5°45´52.683" ,-75°50´11.79"
PUNTO DE REFERENCIA INICIAL TRAMO IZQUIERDO	Partidas Castalia - La Pica
PUNTO DE REFERENCIA FINAL TRAMO IZQUIERDO	Resguardo Indígena Bernandino Panchí
PUNTO DE REFERENCIA INICIAL ANILLO VIAL	La Y
PUNTO DE REFERENCIA FINAL ANILLO VIAL	Vereda la Pica

Tabla 1. Coordenadas Vía Castalia – La Pica. Fuente: Ficha técnica diagnóstico de vías – Pueblorrico / Fecha: 24/03/2021.

Teniendo en cuenta los documentos adjuntos según oficio INVIAS-1699-2021-0550 radicado por la interventoría CONSORCIO MANTENIMEINTO 2021 al contratista UNION TEMPORAL CR FASE 2 con copia al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS en el cual su asunto consiste en Remisión acta de aprobación parcial de la revisión y ajustes a estudios y diseños en donde manifiestan, ***"Por medio del presente, nos referimos al contrato de obra del asunto, el cual tiene por objeto "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SEGÚN CONVENIO 1898-2020". Para remitir el ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE LA REVISIÓN Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS y emitir nuestras observaciones, una vez revisados los documentos adjuntos vía correo electrónico desde 19 de septiembre de 2022 al 18 de octubre de 2022. Vale la pena aclarar que esta interventoría ha hecho su revisión tomando como referencia la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa Colombia Rural."***

De esta manera llegaron bajo comité de obra virtual las partes llegaron a la siguiente conclusión descrita en el ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE LA REVISIÓN Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS efectuada el día 15 de octubre de 2022 en donde cita:

Componente Geotécnico – Caracterización de suelo: La interventoría mediante el oficio INVIAS-1699-2021-0493 con fecha del 26 de septiembre de 2022 y dando el alcance correspondiente de acuerdo a las subsanaciones entregadas por el contratista. Existen observaciones de forma dentro del documento que deben ser corregidas.
Se ejecutaron ensayos de PDC y el cálculo correspondiente de CBR a partir de ellos, se observa que los tramos a intervenir no poseen como minimo de 3%,. Se resalta que el contratista informa mediante formulas y concepto geotecnico estipula 10 cm de material granular (afirmado) con el fin de darle cumplimiento a lo estipulado en la Cartilla de Obra Menor (CAPITULO 8, PAGINA 155).
Criterios de mejoramiento de la Subrasante: En la Tabla 18 se incluyen valores de espesores de mejoramiento correspondiente a ESPECIFICACIONES invias y metodos de ecuaciones avalada geotecnicamente.
En el estudio de transito se observa que para el tramo que corresponde al empalme de Fase 2 con Fase 1; en donde se busca empalmar la construccion de una placa huella construida en un proyecto anterioer se tiene: Se aprueba estructura planteada en el plano 126, equivalente a vehiculos semipesados y pesados (c2 -c3) TRAMO 2 K0+875 A K1+590.
Por tener CBR menores a 3% se aprueba un espesor de 10 cm de afirmado con el fin de garantizar un CBR MAYOR O IGUAL DE 3%.
El refuerzo transversal de la placa huella debe ser #3 y longitudinales de #4. Ver Cartilla de Colombia Rural.
El refuerzo transversal en los estribos de la viga riostra debe ser #4 estribo de #3. Ver Cartilla de Colombia Rural.
DADAS LAS CONDICIONES QUE PRESENTA EL CORREDOR, TOPOGRAFIA, LAS CONDICONES DE COSECHA DE CAFE ; LA INTERVENTORIA LUEGO DE SU REVISION A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS PARA SU EVALUACION, REVISION Y APROBACION; ESTIPULA QUE LA MEJOR OPCION DE MEJORAMIENTO PARA TRAMO 1 ENTRE LA ABCISAS K0+000 A K0875 ES DE UN PAVIMENTO RIGIDO CONSIDERADO:
1.Se solicita revisar el cálculo del Tránsito Promedio Diario y el cálculo del Número de Ejes Equivalentes NEE.ya que se realiza con el valor estipulado de la cartilla, se debe presentar el calculo de acuerdo al aforo realizado en sitio de trabajo; por lo cual el número de ejes equivalentes no está adecuadamente soportado. Por otra parte, se solicita corregir el documento y verificar que el cálculo de los ejes equivalentes sea correcto y se encuentre debidamente soportado

2. Luego de los resultados obtenidos de CBR se leen valores menores de 3%, sin embargo, el Contratista tasa mediante soporte de calculo un CBR MAYOR DEL 3%. Se solicita aclarar cuál es el CBR de diseño y soportarlo adecuadamente.

3. Finalmente, el Contratista propone una estructura de pavimento conformada por una Subbase Granular de 15 centímetros, una losa de concreto con MR 3,8 ica de 20 centímetros, lo cual parece bastante razonable, sin embargo, se solicita atender los comentarios frente al Número de Ejes Equivalentes y al CBR de Diseño.

4. Paralelamente se verificó la estructura de pavimento de acuerdo con la Cartilla de Colombia Rural y CHEQUEO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO POR METODO DE LA AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS (AASHTO) Y LA PORTLANT CEMENT ASSOCIATION
(PCA).
NOTA. Se debe presentar el informe de caracterizacion de suelo faltante dentro del componente geotecnico. Adicional este informe deb venir respaldo por el especiliasta.

Ilustración 9. Componente geotécnico – caracterización de suelo, pagina 1 de acta de aprobación de la revisión y ajustes a estudios y diseños.

Cabe resaltar que estos estudios y diseños fueron aprobados por la interventoría CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 para efecto del pago correspondiente al acta parcial No1 con corte del día 31 de marzo de 2023 por lo cual con base a las mismas consideraciones dadas por los especialistas quienes aprobaron estos estudios, nosotros como interventoría cuyo contrato es 2066 de 2023 retoma estas especificaciones dadas para proceder adelantar la supervisión técnica a la ejecución del tramo a intervenir en el sector El Resguardo, en virtud de que dichos diseños fueron objeto de reconocimiento de pago al contratista.

NOTA: No se tiene a la fecha planos con sección transversal de la estructura según observaciones dadas en el ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE LA REVISIÓN Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS entregada por la interventoría CM2021.

Esta interventoría en cabeza de la persona natural ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ solicita al instituto nacional de vías – INVIAS la entrega de estudios y diseños con las consideraciones dadas en el ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE LA REVISIÓN Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS del 15 de noviembre de 2022.

De igual manera esta interventoria deja constancia que la actividad de revisión de estudios y diseños fue revisada, aprobada y reconocida para pago por parte de la interventoría Consorcio Mantenimiento 2021 y por ende esta nueva interventoria hará seguimiento y control al tramo de 350 ml a por construir en el sector del resguardo de acuerdo con esos estudios y diseños. Para el tramo de la Pica se requiere que el contratista presente APU de estudios y diseños junto con sus debidas cotizaciones de las actividades de geotecnia, en virtud a que los diseños iniciales contemplo 1500 ml de placa huella en el tramo de La Castalia al Resguardo, estando el sector de la Pica sin diseños, esta interventoria solicito al contratista que haga uso de los insumos de los aforos y estudio de trafico del tramo de La Castalia en virtud que es la vía de ingreso para La Pica y son insumos que deben utilizarse.

3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION BASICA CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO No.	078 DE 2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CR FASE 2
R/L	FABIO RICARDO ORTIZ REVELO
NIT	901.609.482-0
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.939.011.755,00
ANTICIPO 40%	$ 775.604.702,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	$ 700.334.467,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$ 280.133.787,00
VALOR NETO A PAGAR ACTA PARCIAL #1	$ 420.200.680,00
SALDO POR PAGAR	$ 524.060.831,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCCIÓN	CUATRO (4) MESES, CATORCE (14) DIAS
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DIIEMBRE DE 2022
PRORROGA N° 1	CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS
PRORROGA N° 2	TREINTA Y UN (31) DIAS
PRORROGA N° 3	CUATRO (4) MES
SUSPENCION	30 DE MARZO 2023
REINICIO No.1	01 DE AGOSTO DE 2023
PRORROGA N° 4	TREINTA Y UN (31) DIAS
PRORROGA N° 5	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE ABRIL 2024

3.2 Descripción de las actividades realizadas en el mes.

Se viene realizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental del contrato de obra, el cual se ha venido ejecutando a pesar de las adversidades que se han venido presentando.

Así mismo se adelantan las siguientes actividades relacionadas:

- Transporte, suministro e instalación de tubería en concreto de diámetro 36".
- Se lleva a cabo la fundida de concreto clase D cuya resistencia es de 3000 psi para placa huellas en áreas de obras transversales, cunetas – bordillos y vigas.
- Se adelantan comités de obra para el adelantar el balance de obra y evaluar el avance ejecutado con respecto al programado.
- Se lleva a cabo fundida de concreto clase D para muros y aletas de obra transversal.
- Suministro, figurado y corte de acero de refuerzo para obras transversales.
- Mantenimiento vial sobre sector la pica teniendo en cuenta las características dadas por el instituto para el mantenimiento de un corredor vial.

3.3 Seguimiento ítems No Previstos.

En el momento no se presenta seguimiento a ítems no previstos en el contrato, sin embargo, dentro del acta modificatoria aprobada por la interventoría 1699 del 2021 fueron aprobados ítem no previstos los cuales a la fecha no se están ejecutando.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

3.4.1 Estado de avance

A continuación, se relaciona estado de avance, informe semanal No. 31.64

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y Diseños	Unidad	1,0	Prog	$ 31.000.214,00	$ 31.000.214,00	1,60%
			Ejec	$ 31.000.214,00	$ 31.000.214,00	1,60%
PLACA HUELLA 4,10 m	ml	761,37	Prog	$ 536.762.521,00	$ 536.762.521,00	27,68%
			Ejec	$ 502.296.494,07	$ 502.296.494,07	25,90%
PLACA HUELLA 5m	ml	761,37	Prog	$ 377.332.176,00	$ 377.332.176,00	19,46%
			Ejec	$ 317.257.484,00	$ 317.257.484,00	16,36%
OBRA TRANSVERSAL 5m	Unidad	2	Prog	$ 28.390.121,00	$ 28.390.121,00	1,46%
			Ejec	$ 28.390.121,00	$ 28.390.121,00	1,46%
OBRA TRANSVERSAL 4,10m	Unidad	1	Prog	$ 13.419.784,00	$ 13.419.784,00	0,69%
			Ejec	$ 13.419.784,00	$ 13.419.784,00	0,69%
CARACTERIZACION VIAL	km	9	Prog	$ 6.103.440,00	$ 6.103.440,00	0,31%
			Ejec	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
FILTRO	ml	753	Prog	$ 102.485.312,00	$ 102.485.312,00	5,29%
			Ejec	$ 87.527.767,52	$ 87.527.767,52	4,51%
MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS	Gl.	1,0	Prog	$ 381.477.606,00	$ 381.477.606,00	19,67%
			Ejec	$ 260.303.975,00	$ 260.303.975,00	13,42%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y COMPLEMENTARIAS	Gl.	1,0	Prog	$ 402.172.054,00	$ 402.172.054,00	20,74%
			Ejec	$ 315.903.613,60	$ 315.903.613,60	16,29%
ACTIVIDADES NO PREVISTA	Gl.	1,0	Prog	$ 38.837.253,00	$ 38.837.253,00	2,00%
			Ejec	$ 17.649.427,00	$ 17.649.427,00	0,91%
Obras de Compensación Ambiental (PAGA)	Unidad	1,0	Prog	$ 21.031.274,00	$ 21.031.274,00	1,08%
			Ejec		$ 0,00	0,00%

Ilustración N°16. Informe semanal No.27.60 de interventoría.

Meta Física Programada %	84,80%
Meta Física Ejecutada %	81,16%

Avance o Atraso Físico %		-3,64%

Ilustración N°17. Informe semanal No.31.64 de interventoría.

3.4.2 Acciones a seguir por parte de interventoría

De acuerdo con las actividades realizadas por parte del contratista de obra:

• Remitir oficios recordando los compromisos adquiridos en la entrega de la programación para continuar los trabajos de campo en la etapa de preconstrucción.
• Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial del contratista para su evaluación, revisión y vb de la misma.
• Entrega planilla de seguridad por parte del contratista.
• Seguimiento y verificación de las actividades a realizar en la programación.
• Seguimiento y control de ejecución de obras, meta física e inversión semanal.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DE CONTRATO DE OBRA

4.1 Informes semanales

SEMANA	No. REPORTE	DESDE	HASTA
34	1.34	01/08/2023	03/08/2023
35	2.35	04/08/2023	10/08/2023
36	3.36	11/08/2023	17/08/2023
37	4.37	18/08/2023	24/08/2023
38	5.38	25/08/2023	31/08/2023
39	6.39	01/09/2023	07/09/2023
40	7.40	08/09/2023	14/09/2023
41	8.41	15/09/2023	21/09/2023
42	9.42	22/09/2023	28/09/2023
43	10.43	29/09/2023	05/10/2023
44	11.44	06/10/2023	12/10/2023
45	12.45	13/10/2023	19/10/2023
46	13.46	20/10/2023	26/10/2023
47	14.47	27/10/2023	02/11/2023
48	15.48	03/11/2023	09/11/2023
49	16.49	10/11/2023	16/11/2023
50	17.50	17/11/2023	23/11/2023
51	18.51	24/11/2023	30/11/2023
52	19.52	01/12/2023	07/12/2023
53	20.53	08/12/2023	14/12/2023
54	21.54	15/12/2023	21/12/2023
55	22.55	22/12/2023	28/12/2023
56	23.56	29/12/2023	04/01/2024
57	24.57	05/01/2024	11/01/2024
58	25.58	12/01/2024	18/01/2024
59	26.59	19/01/2024	25/01/2024
60	27.60	26/01//2024	01/02/2024
61	28.61	02/02/2024	08/02/2024
62	29.62	09/02/2024	15/02/2024
63	30.63	16/02/2024	22/02/2024
64	31.64	23/02/2024	29/02/2024

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

Se adjunta la información de maquinaria y equipo de obra ver anexo 4.2 maquinaria y equipo de obra.

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

La información referente al personal, control aportes y seguridad social contrato de

obra se ha venido recibiendo las respectivas afiliaciones del personal mínimo.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

La información financiera y presupuestal del contrato de obra se presenta con base al pago de acta parcial #1 cancelada y aprobada por la interventoría CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 (interventoría saliente), pago efectuado en el transcurso del mes de septiembre.

Además, la interventoría 2066 de 2023 adelanto la aprobación de acta parcial #2 la cual fue aprobada y cancelada al contratista.

4.5 Estado general del tiempo

La información referente al estado del tiempo se adjunta en el anexo 4.5 Estado general del tiempo.

4.6 Resumen ensayos de laboratorio

La información referente a los ensayos de laboratorio se adjunta en el anexo 4.6 Resumen de ensayos de laboratorio.

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

La información sobre las garantías y seguros del contrato de obra se adjunta en el anexo 4.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

4.8 Seguimiento al plan de calidad contrato de obra

NO APLICA. Esta interventoría no cuenta con personal para dicha actividad.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 Seguimiento a la inversión del anticipo

No aplica para el presente informe en virtud a que, de acuerdo a lo manifestado por el INVIAS, MUNICIPIO, interventoria CM2021 y contratista de obra, la inversión del anticipo fue ejecutada hasta el 30 de marzo de 2023 tiempo en el que eta interventoria no ejercía el control por tal motivo es responsabilidad de CM 2021 su correcta inversión y ejecución y serán ellos quienes entreguen el respectivo informe.

4.9.2 Seguimiento programa de obra

Se ha venido presentando un retraso en el avance de obra el cual se le notificó al contratista bajo comité de obra y se genera la entrega de un plan de contingencia para sub sanar el retraso significativo que se vine presentando.

Meta Física Programada %	84,80%
Meta Física Ejecutada %	81,16%

Avance o Atraso Físico %		-3,64%

4.9.3 Seguimiento programa de inversiones

El seguimiento de programa de inversiones fue presentado por el contratista y la interventoría en su defecto lo aprobó, pero a la fecha del presente informe se encuentra un retraso en su ejecución y seguimiento. Anexo 4.9.3.

4.9.4 Actas de comité de obra

Durante el periodo del presente informe se presentan actas de comité ver anexo 4.9.4 Actas de comité de obra.

4.9.5 Actas de reunión de obra.

Durante el periodo del presente informe se efectuó un acta de reunión de obra, anexo 4.9.5.

4.9.6 . Informe Matriz de Riesgo.

Se identifico riesgo 11, eventos causados por la naturaleza que tienen impacto sobre la ejecución del contrato, circunstancias naturales que ocasiona retrasos o dificultades en la ejecución, esta caracterizado por ser un riesgo medio, responsable del tratamiento supervisor y contratista.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza seguimiento y verificación de la información tipo gerencial del contratista para su evaluación, revisión y vb de la misma.
- Presentar plan de contingencia para las actividades restantes por ejecutar teniendo en cuenta que se presenta un retraso del 3,64% del valor del contrato.
- Ejecutar las actividades que no se han iniciado según programación de obra.
- Continuar con las actividades programadas para el mejoramiento de vía en el sector de la PICA.

5. ANEXOS

5.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

En los anexos, se encontrará el formato de relación de correspondencia en el cual se incluye los oficios y documentos compartidos entre el contratista y la interventoría.

5.2 Bitácora de obra

Se agrega bitácora física correspondiente al contrato de obra 078 de 2022, con la respectiva descripción de las actividades desarrolladas durante el periodo del presente informe, reporte diario del clima, personal en obra, maquinaria y equipos. Demas información que se crea conveniente relacionar por la interventoría.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL

CONTRATO DE OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4.1 INFORMES SEMANALES

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 61 del 2/02/2024 al 8/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 1.939.011.755,00	$ -	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 1.452.278.646,78	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 486.733.108,22	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ 200.000.000	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.939.011.755,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.547.719.182,84	79,82%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.421.278.432,78	73,30%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 126.440.750,06	-6,52%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 31.000.214,00	1,60%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.547.719.182,84	79,82%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.452.278.646,78	74,90%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 95.440.536,06	-4,92%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38.392.432,75	1,98%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.000.000,00	0,62%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
En revisión de los avances financieros
Saldo pendiente de cobro Valor Básico de Obra + Otras Inversiones
Anticipo otorgado $ 775.604.702,00 (40% del valor del contrato); Saldo pendiente del contrato $ 1.163.407.053,00
La presente interventoria inicia con una ejecucion de obra ya ejecutada, recibida y en tramite de pago por parte de la inteventoria saliente contrato INVIAS No 1699 de2021
Correspondiente a una ejecucion del 36,32% que se evidencia en el acta de recibo parcial No 1 por valor de $704.268.138,00.
*La interventoria 2066 adelanta aprobacion de pago de acta parcial #2 por un valor de $220.033.315,2 correspondiente al 28,37%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 158.982.487,80	79,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
La interventoria tiene orden de inicio de fecha 10 de julio, pero no hubo ejecucion ni gastos de recursos de interventoria por cuanto el contratista de obra manifesto que no firmaba acta de reinicio hasta el 1 de agosto, por ende en el mes de julio la factura de interventoria corresponde a valor de cero ($0)

ANTICIPOS	
Otorgado $	775.604.702,00
Amortizado $	500.167.102,20
Saldo $	275.437.599,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,050
Acumulado:	2,050

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	79,82%
Meta Física Ejecutada %	75,59%

Avance o Atraso Físico %		-4,23%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	Estudios y Diseños	Unidad	1,0			Prog	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
						Ejec	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
*	PLACA HUELLA 4,10 m	ml	761,37			Prog	$ 536.762.521,00			$ 536.762.521,00	27,68%
						Ejec	$ 446.912.864,26			$ 446.912.864,26	23,05%
	PLACA HUELLA 5m	ml	761,37			Prog	$ 377.332.176,00			$ 377.332.176,00	19,46%
						Ejec	$ 317.257.484,00			$ 317.257.484,00	16,36%
*	OBRA TRANSVERSAL 5m	Unidad	2			Prog	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
						Ejec	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
	OBRA TRANSVERSAL 4,10m	Unidad	1			Prog	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
						Ejec	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
*	CARACTERIZACION VIAL	km	9			Prog	$ 6.103.440,00			$ 6.103.440,00	0,31%
						Ejec	$ 0,00			$ 0,00	0,00%
*	FILTRO	ml	753			Prog	$ 102.485.312,00			$ 102.485.312,00	5,29%
						Ejec	$ 87.527.767,52			$ 87.527.767,52	4,51%
*	MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 381.477.606,00			$ 381.477.606,00	19,67%
						Ejec	$ 260.303.975,00			$ 260.303.975,00	13,42%
*	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y COMPLEMENTARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 402.172.054,00			$ 402.172.054,00	20,74%
						Ejec	$ 263.236.794,00			$ 263.236.794,00	13,58%
*	ACTIVIDADES NO PREVISTA	Gl.	1,0			Prog	$ 38.837.253,00			$ 38.837.253,00	2,00%
						Ejec	$ 17.649.427,00			$ 17.649.427,00	0,91%
*	Obras de Compensación Ambiental (PAGA)	Unidad	1,0			Prog	$ 21.031.274,00			$ 21.031.274,00	1,08%
						Ejec				$ 0,00	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CASTALIA — TRAMO Y/O SECTOR 2: VIA EL RESGUARDO
TRAMO Y/O SECTOR 3: LA PICA

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Canguro	1	1
Mezcladora	1	1
volqueta 6m3	1	1
benitin de 2,5 ton	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Corregimiento Peñalisa, Salgar / Antioquia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADOS PEÑALISA S.A.	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El proyecto se encuentra en Etapa de Construcción; continuación del acopio de materiales de construcción procedentes de la fuente aprobada.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A		
EMISIONES:	SI	NO X	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A		

OBSERVACIONES:
Seguimiento y control durante el descargue y acopio temporal de materiales de construcción; señalización vertical; protección con plástico de los acopios de materiales; disposición de residuos especiales; disposición de residuos líquidos; protección de zonas verdes y árboles.
Seguimiento del estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contratista de obra.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de Gestión Durante La Ejecución

OBSERVACIONES:
Remitido a la Subdirección de Sostenibilidad con No. Rad. Interna INVIAS-71109-2021-0800. Verificación y control de los instrumentos ambientales y planes de manejo por parte de la Interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Campamento

OBSERVACIONES:
Atención, información y divulgación a la comunidad.
El Contratista de Obra cuenta con mano de obra calificada y no calificada, para el desarrollo de actividades constructivas.
La Interventoría cuenta con personal calificado para el seguimiento técnico y administrativo de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 61 del 2/02/2024 al 8/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado
CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES:
El proyecto no contempla adquisición de predio para garantizar el objeto del contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Se adelanta actividades de mantenimiento de via en el sector de la PICA con la Conformación de la calzada existente, actividad desarrollada con motoniveladora, vibro compatador y sistema de riego considerando las condiciones tecnicas de manual de mantenimiento vial del instituto nacional de vias INVIAS.
*Se lleva a cabo el suministro e instalacion de material afirmado para el mantenimiento vial sobre el sector de la PICA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Continuar con las actividadas por ejecutar en el desarrollo del contrato de obra 078 de 2022.
* Iniciar con las diferentes actividades de mejoramiento en el sector de la PICA.
*Continuar con las actividades de mantenimiento y mejoramiento de via en el sector de la PICA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

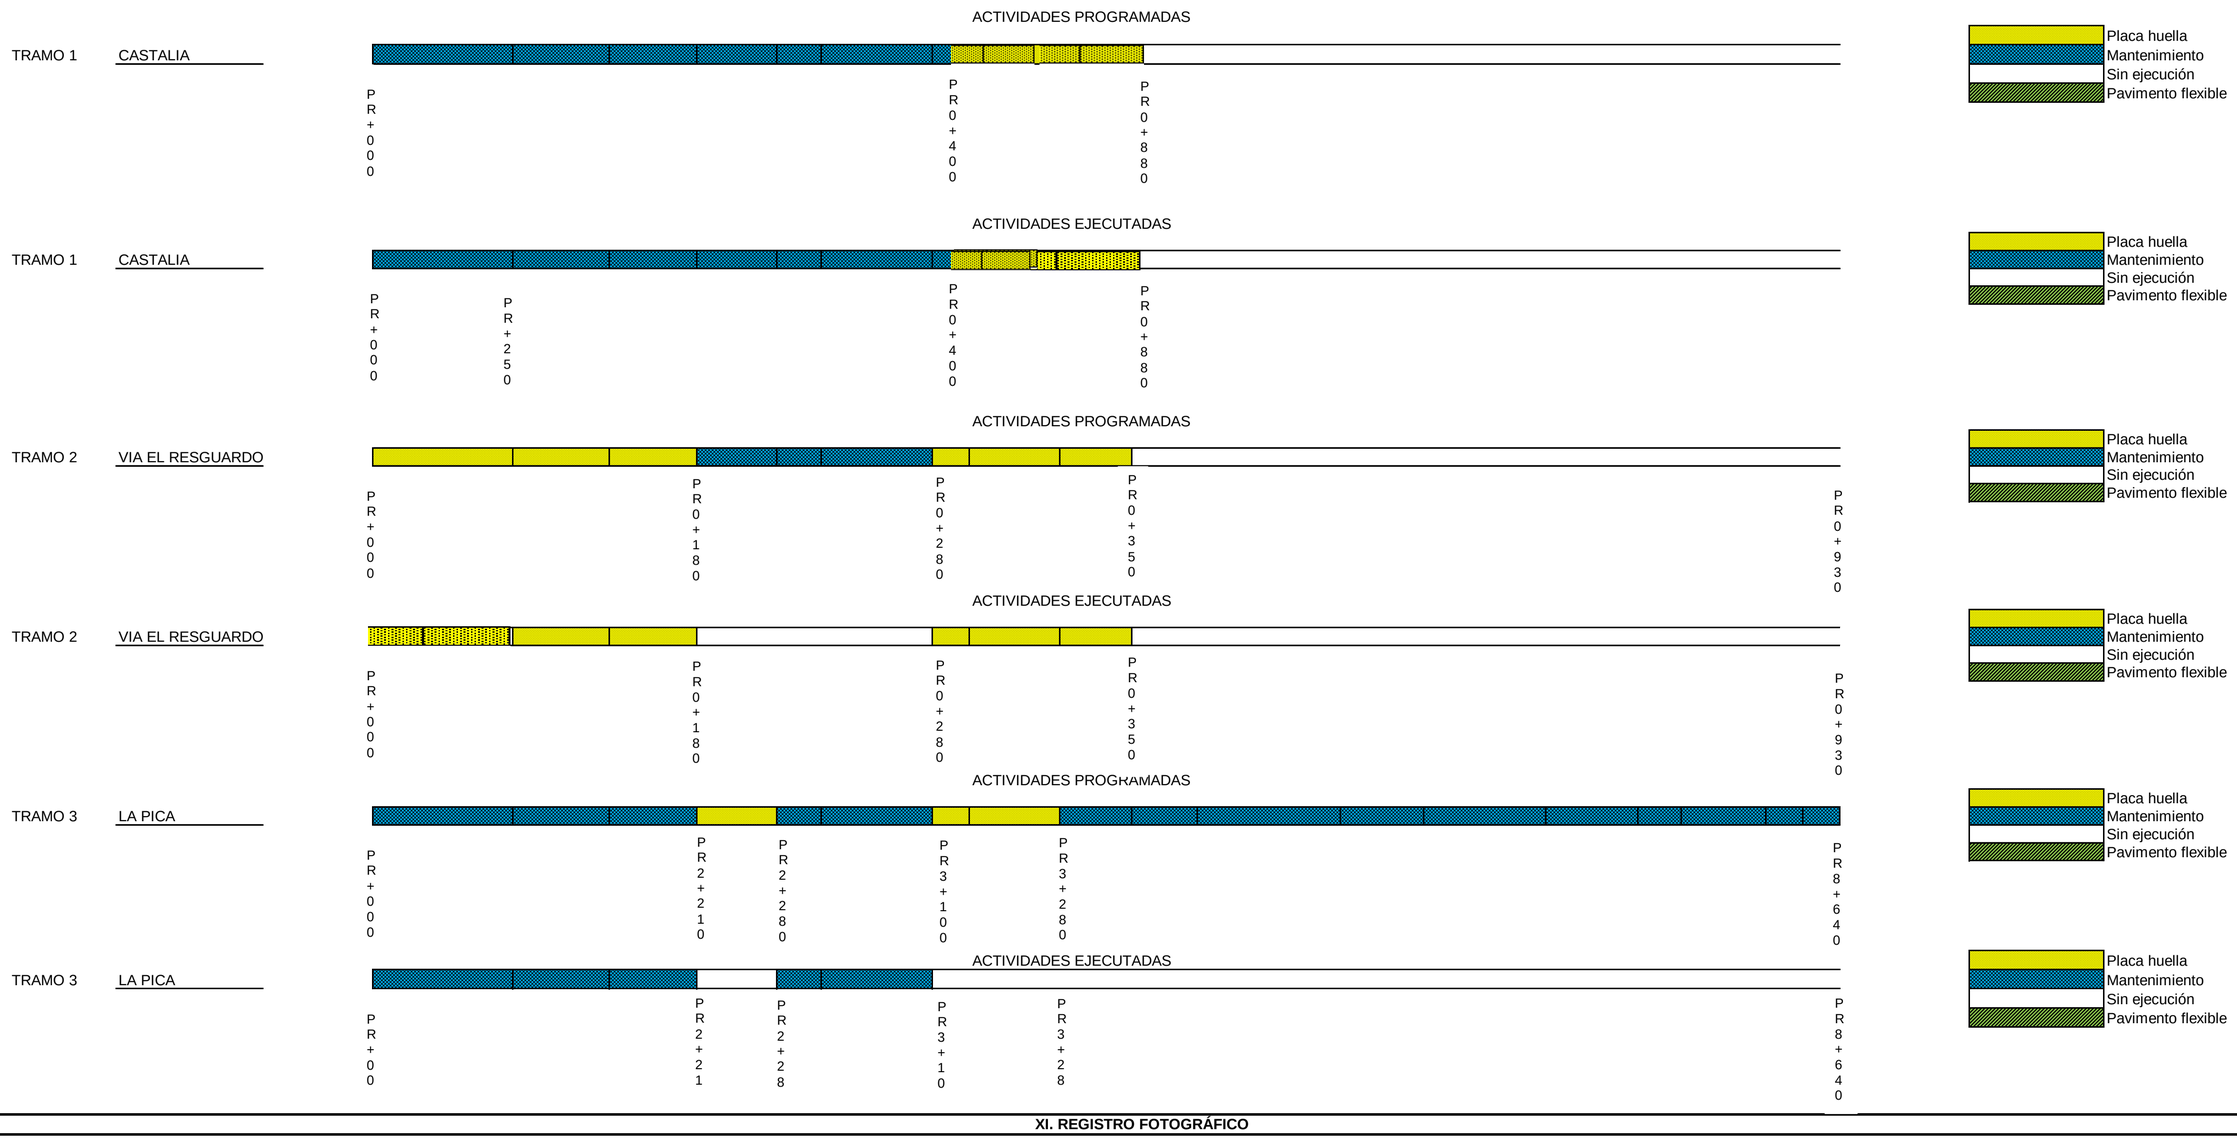

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE MATERIAL AFRIMADO



SUMINISTRO DE MATERIAL AFIRMADO



MANTENIMIENTO VIAL

NOTA: Se le informa al contratista el retraso presentado a la fecha del 4,23%, Se le soliita al contratista presentar un plan de contingencia para evaluar el retraso presentado a la fecha.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial del contratista para su evaluación, revisión y vb de la misma. Seguimiento y verificación de la planilla de seguridad por parte del contratista. Seguimiento y verificación de la información de los ajustes de los diseños. Seguimiento y verificación de las actividades a realizar programado en la programación. Seguimiento y control de ejecución de obras, meta física e inversión semanal. Se realiza comité de seguimiento de actividades de orden administrativo del convenio y de actividades de obra.	FIRMA NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 62 del 9/02/2024 al 15/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 1.939.011.755,00	$ -	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 1.473.450.164,58	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 465.561.590,42	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ 200.000.000	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.939.011.755,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.607.246.843,72	82,89%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.442.449.950,58	74,39%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 164.796.893,14	-8,50%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 31.000.214,00	1,60%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.607.246.843,72	82,89%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.473.450.164,58	75,99%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 133.796.679,14	-6,90%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38.392.432,75	1,98%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.171.517,80	1,09%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
En revisión de los avances financieros
Saldo pendiente de cobro Valor Básico de Obra + Otras Inversiones
Anticipo otorgado $ 775.604.702,00 (40% del valor del contrato); Saldo pendiente del contrato $ 1.163.407.053,00
La presente interventoria inicia con una ejecucion de obra ya ejecutada, recibida y en tramite de pago por parte de la inteventoria saliente contrato INVIAS No 1699 de2021
Correspondiente a una ejecucion del 36,32% que se evidencia en el acta de recibo parcial No 1 por valor de $704.268.138,00.
*La interventoria 2066 adelanta aprobacion de pago de acta parcial #2 por un valor de $220.033.315,2 correspondiente al 28,37%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 168.738.585,37	84,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
La interventoria tiene orden de inicio de fecha 10 de julio, pero no hubo ejecucion ni gastos de recursos de interventoria por cuanto el contratista de obra manifesto que no firmaba acta de reinicio hasta el 1 de agosto, por ende en el mes de julio la factura de interventoria corresponde a valor de cero ($0)

ANTICIPOS	
Otorgado $	775.604.702,00
Amortizado $	500.167.102,20
Saldo $	275.437.599,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,116
Acumulado:	2,116

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	82,89%
Meta Física Ejecutada %	76,68%

Avance o Atraso Físico %		-6,21%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
* Estudios y Diseños	Unidad	1,0			Prog	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
					Ejec	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
* PLACA HUELLA 4,10 m	ml	761,37			Prog	$ 536.762.521,00			$ 536.762.521,00	27,68%
					Ejec	$ 468.084.382,06			$ 468.084.382,06	24,14%
PLACA HUELLA 5m	ml	761,37			Prog	$ 377.332.176,00			$ 377.332.176,00	19,46%
					Ejec	$ 317.257.484,00			$ 317.257.484,00	16,36%
* OBRA TRANSVERSAL 5m	Unidad	2			Prog	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
					Ejec	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
OBRA TRANSVERSAL 4,10m	Unidad	1			Prog	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
					Ejec	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
* CARACTERIZACION VIAL	km	9			Prog	$ 6.103.440,00			$ 6.103.440,00	0,31%
					Ejec	$ 0,00			$ 0,00	0,00%
* FILTRO	ml	753			Prog	$ 102.485.312,00			$ 102.485.312,00	5,29%
					Ejec	$ 87.527.767,52			$ 87.527.767,52	4,51%
* MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 381.477.606,00			$ 381.477.606,00	19,67%
					Ejec	$ 260.303.975,00			$ 260.303.975,00	13,42%
* ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y COMPLEMENTARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 402.172.054,00			$ 402.172.054,00	20,74%
					Ejec	$ 263.236.794,00			$ 263.236.794,00	13,58%
* ACTIVIDADES NO PREVISTA	Gl.	1,0			Prog	$ 38.837.253,00			$ 38.837.253,00	2,00%
					Ejec	$ 17.649.427,00			$ 17.649.427,00	0,91%
* Obras de Compensación Ambiental (PAGA)	Unidad	1,0			Prog	$ 21.031.274,00			$ 21.031.274,00	1,08%
					Ejec				$ 0,00	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CASTALIA — TRAMO Y/O SECTOR 2: VIA EL RESGUARDO
TRAMO Y/O SECTOR 3: LA PICA

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Canguro	1	1
Mezcladora	1	1
volqueta 6m3	1	1
benitin de 2,5 ton	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento Peñalisa, Salgar / Antioquia	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	TRITURADOS PEÑALISA S.A.	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:
El proyecto se encuentra en Etapa de Construcción; continuación del acopio de materiales de construcción procedentes de la fuente aprobada.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:
Seguimiento y control durante el descargue y acopio temporal de materiales de construcción; señalización vertical; protección con plástico de los acopios de materiales; disposición de residuos especiales; disposición de residuos líquidos; protección de zonas verdes y árboles.
Seguimiento del estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contratista de obra.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de Gestión Durante La Ejecución

OBSERVACIONES:
Remitido a la Subdirección de Sostenibilidad con No. Rad. Interna INVIAS-71109-2021-0800. Verificación y control de los instrumentos ambientales y planes de manejo por parte de la Interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Campamento

OBSERVACIONES:
Atención, información y divulgación a la comunidad.
El Contratista de Obra cuenta con mano de obra calificada y no calificada, para el desarrollo de actividades constructivas.
La Interventoría cuenta con personal calificado para el seguimiento técnico y administrativo de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 62 del 9/02/2024 al 15/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES:
El proyecto no contempla adquisición de predio para garantizar el objeto del contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Se adelanta suministro, corte y figurado de acero de refuerzo para placa huella en el sector de la PICA. TRAMO 2.
*Se suministra e instala capa de 10 cm de sub base granular en el tramo 2 de la PICA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Continuar con las actividadas por ejecutar en el desarrollo del contrato de obra 078 de 2022.
*Continuar con las diferentes actividades de mejoramiento en el sector de la PICA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

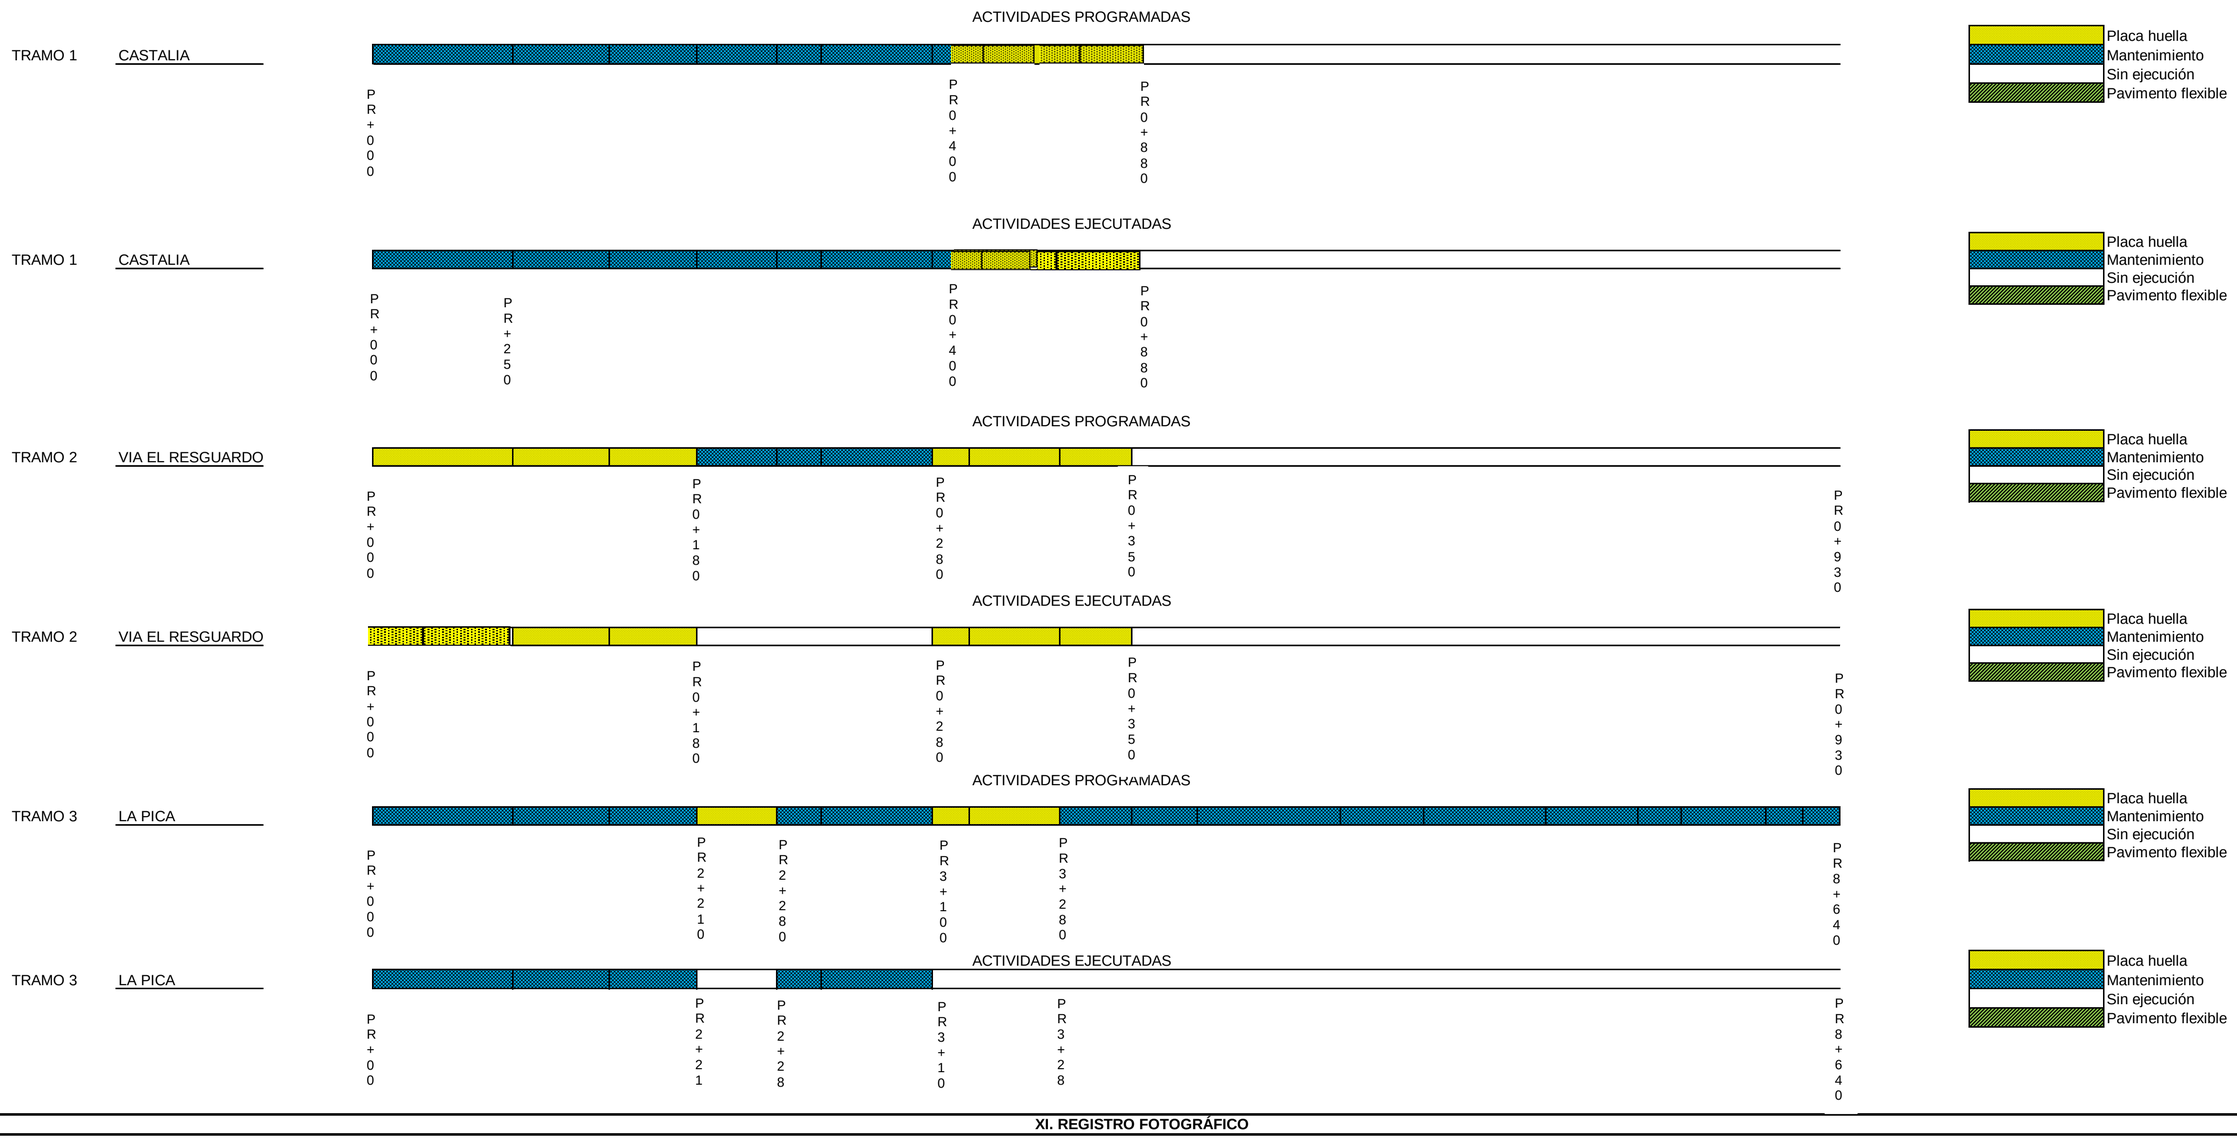

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SISTEMA DE RIEGO



COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR



CORTE Y FIDURADO DE ACERO

NOTA: Se le informa al contratista el retraso presentado a la fecha del 6,21%, Se le soliita al contratista presentar un plan de contingencia para evaluar el retraso presentado a la fecha.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial del contratista para su evaluación, revisión y vb de la misma. Seguimiento y verificación de la planilla de seguridad por parte del contratista. Seguimiento y verificación de la información de los ajustes de los diseños. Seguimiento y verificación de las actividades a realizar programado en la programación. Seguimiento y control de ejecución de obras, meta física e inversión semanal. Se realiza comité de seguimiento de actividades de orden administrativo del convenio y de actividades de obra.	FIRMA NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 63 del 16/02/2024 al 22/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 1.939.011.755,00	$ -	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 1.539.536.768,18	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 399.474.986,82	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ 200.000.000	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.939.011.755,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.632.453.996,53	84,19%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.508.536.554,18	77,80%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 123.917.442,35	-6,39%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 31.000.214,00	1,60%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.632.453.996,53	84,19%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.539.536.768,18	79,40%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 92.917.228,35	-4,79%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.451.105,80	0,90%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 52.666.819,60	2,72%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

En revisión de los avances financieros
Saldo pendiente de cobro Valor Básico de Obra + Otras Inversiones
Anticipo otorgado $ 775.604.702,00 (40% del valor del contrato); Saldo pendiente del contrato $ 1.163.407.053,00
La presente interventoria inicia con una ejecucion de obra ya ejecutada, recibida y en tramite de pago por parte de la inteventoria saliente contrato INVIAS No 1699 de2021
Correspondiente a una ejecucion del 36,32% que se evidencia en el acta de recibo parcial No 1 por valor de $704.268.138,00.
*La interventoria 2066 adelanta aprobacion de pago de acta parcial #2 por un valor de $220.033.315,2 correspondiente al 28,37%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 178.494.682,93	89,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

La interventoria tiene orden de inicio de fecha 10 de julio, pero no hubo ejecucion ni gastos de recursos de interventoria por cuanto el contratista de obra manifesto que no firmaba acta de reinicio hasta el 1 de agosto, por ende en el mes de julio la factura de interventoria corresponde a valor de cero ($0)

ANTICIPOS	
Otorgado $	775.604.702,00
Amortizado $	500.167.102,20
Saldo $	275.437.599,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,062
Acumulado:	2,062

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	84,19%
Meta Física Ejecutada %	79,40%

Avance o Atraso Físico %		-4,79%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	Estudios y Diseños	Unidad	1,0			Prog	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
						Ejec	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
*	PLACA HUELLA 4,10 m	ml	761,37			Prog	$ 536.762.521,00			$ 536.762.521,00	27,68%
						Ejec	$ 468.084.382,06			$ 468.084.382,06	24,14%
	PLACA HUELLA 5m	ml	761,37			Prog	$ 377.332.176,00			$ 377.332.176,00	19,46%
						Ejec	$ 317.257.484,00			$ 317.257.484,00	16,36%
*	OBRA TRANSVERSAL 5m	Unidad	2			Prog	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
						Ejec	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
	OBRA TRANSVERSAL 4,10m	Unidad	1			Prog	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
						Ejec	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
*	CARACTERIZACION VIAL	km	9			Prog	$ 6.103.440,00			$ 6.103.440,00	0,31%
						Ejec	$ 0,00			$ 0,00	0,00%
*	FILTRO	ml	753			Prog	$ 102.485.312,00			$ 102.485.312,00	5,29%
						Ejec	$ 87.527.767,52			$ 87.527.767,52	4,51%
*	MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 381.477.606,00			$ 381.477.606,00	19,67%
						Ejec	$ 260.303.975,00			$ 260.303.975,00	13,42%
*	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y COMPLEMENTARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 402.172.054,00			$ 402.172.054,00	20,74%
						Ejec	$ 315.903.613,60			$ 315.903.613,60	16,29%
*	ACTIVIDADES NO PREVISTA	Gl.	1,0			Prog	$ 38.837.253,00			$ 38.837.253,00	2,00%
						Ejec	$ 17.649.427,00			$ 17.649.427,00	0,91%
*	Obras de Compensación Ambiental (PAGA)	Unidad	1,0			Prog	$ 21.031.274,00			$ 21.031.274,00	1,08%
						Ejec				$ 0,00	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CASTALIA — TRAMO Y/O SECTOR 2: VIA EL RESGUARDO
TRAMO Y/O SECTOR 3: LA PICA

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Canguro	1	1
Mezcladora	1	1
volqueta 6m3	1	1
benitin de 2,5 ton	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento Peñalisa, Salgar / Antioquia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	TRITURADOS PEÑALISA S.A.	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
El proyecto se encuentra en Etapa de Construcción; continuación del acopio de materiales de construcción procedentes de la fuente aprobada.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:
Seguimiento y control durante el descargue y acopio temporal de materiales de construcción; señalización vertical; protección con plástico de los acopios de materiales; disposición de residuos especiales; disposición de residuos líquidos; protección de zonas verdes y árboles.
Seguimiento del estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contratista de obra.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de Gestión Durante La Ejecución

OBSERVACIONES:
Remitido a la Subdirección de Sostenibilidad con No. Rad. Interna INVIAS-71109-2021-0800. Verificación y control de los instrumentos ambientales y planes de manejo por parte de la Interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Campamento

OBSERVACIONES:
Atención, información y divulgación a la comunidad.
El Contratista de Obra cuenta con mano de obra calificada y no calificada, para el desarrollo de actividades constructivas.
La Interventoría cuenta con personal calificado para el seguimiento técnico y administrativo de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 63 del 16/02/2024 al 22/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado
CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES:
El proyecto no contempla adquisición de predio para garantizar el objeto del contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Se adelanta suministro, corte y figurado de acero de refuerzo para placa huella en el sector de la PICA. TRAMO 2.
*Se suministra e instala capa de 10 cm de sub base granular en el tramo 2 de la PICA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Continuar con las actividadas por ejecutar en el desarrollo del contrato de obra 078 de 2022.
*Continuar con las diferentes actividades de mejoramiento en el sector de la PICA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

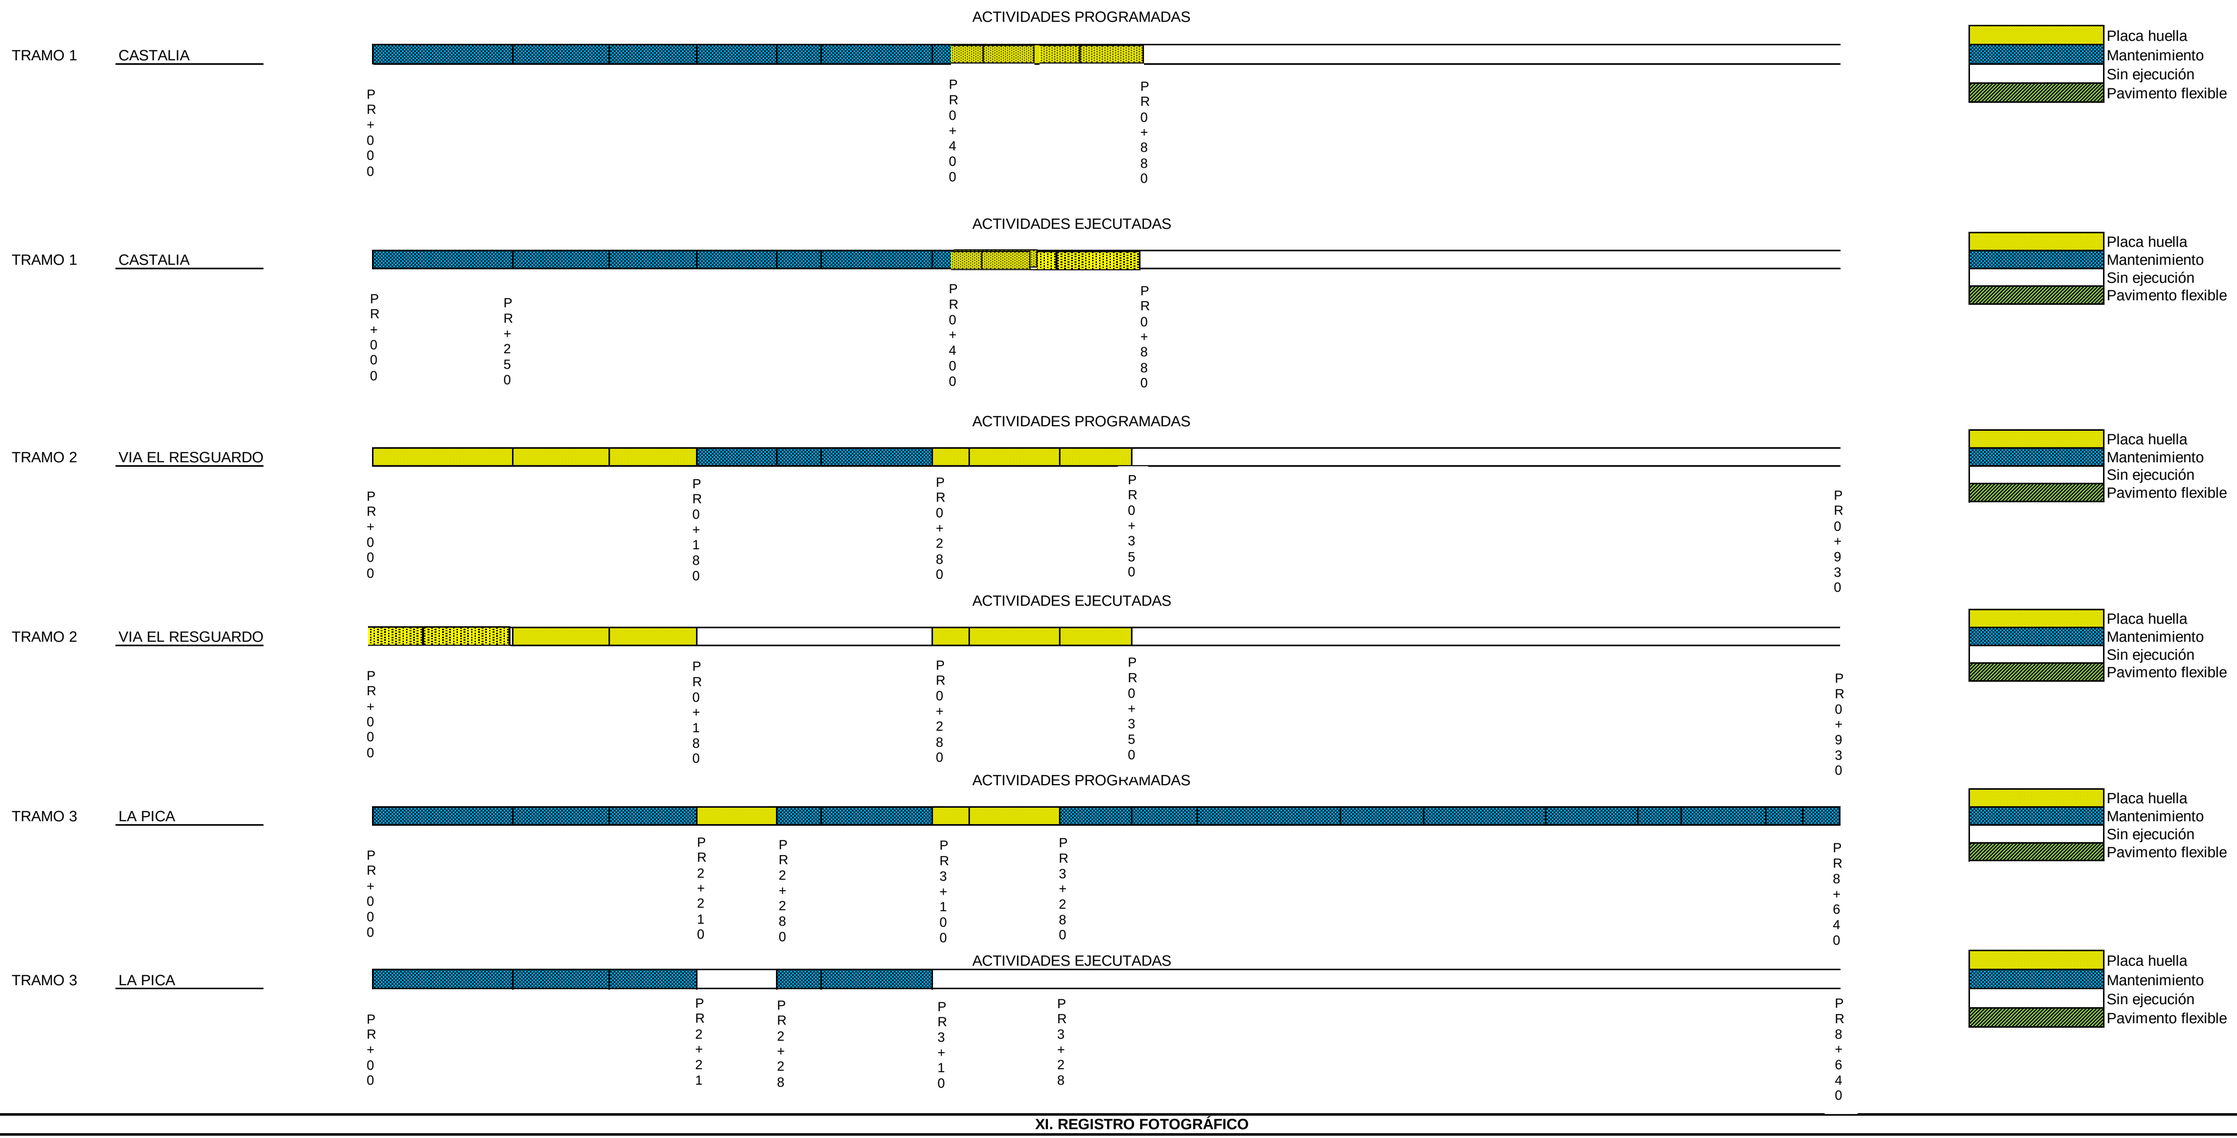

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARA PLACA HUELLAS



CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO



SUMIISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR

NOTA: Se le informa al contratista el retraso presentado a la fecha del 4,79%, Se le soliita al contratista presentar un plan de contingencia para evaluar el retraso presentado a la fecha.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial del contratista para su evaluación, revisión y vb de la misma. Seguimiento y verificación de la planilla de seguridad por parte del contratista. Seguimiento y verificación de la información de los ajustes de los diseños. Seguimiento y verificación de las actividades a realizar programado en la programación. Seguimiento y control de ejecución de obras, meta física e inversión semanal. Se realiza comité de seguimiento de actividades de orden administrativo del convenio y de actividades de obra.	FIRMA NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 64 del 23/02/2024 al 29/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 1.939.011.755,00	$ -	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 1.573.748.880,19	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 365.262.874,81	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ 200.000.000	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.939.011.755,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.644.281.968,24	84,80%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.542.748.666,19	79,56%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 101.533.302,05	-5,24%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 31.000.214,00	1,60%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.644.281.968,24	84,80%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.573.748.880,19	81,16%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 70.533.088,05	-3,64%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.827.971,71	0,61%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34.212.112,01	1,76%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
En revisión de los avances financieros
Saldo pendiente de cobro Valor Básico de Obra + Otras Inversiones
Anticipo otorgado $ 775.604.702,00 (40% del valor del contrato); Saldo pendiente del contrato $ 1.163.407.053,00
La presente interventoria inicia con una ejecucion de obra ya ejecutada, recibida y en tramite de pago por parte de la inteventoria saliente contrato INVIAS No 1699 de2021
Correspondiente a una ejecucion del 36,32% que se evidencia en el acta de recibo parcial No 1 por valor de $704.268.138,00.
*La interventoria 2066 adelanta aprobacion de pago de acta parcial #2 por un valor de $220.033.315,2 correspondiente al 28,37%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 188.250.780,49	94,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
La interventoria tiene orden de inicio de fecha 10 de julio, pero no hubo ejecucion ni gastos de recursos de interventoria por cuanto el contratista de obra manifesto que no firmaba acta de reinicio hasta el 1 de agosto, por ende en el mes de julio la factura de interventoria corresponde a valor de cero ($0)

ANTICIPOS	
Otorgado $	775.604.702,00
Amortizado $	500.167.102,20
Saldo $	275.437.599,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,090
Acumulado:	2,090

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	84,80%
Meta Física Ejecutada %	81,16%

Avance o Atraso Físico %		-3,64%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	Estudios y Diseños	Unidad	1,0			Prog	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
						Ejec	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
*	PLACA HUELLA 4,10 m	ml	761,37			Prog	$ 536.762.521,00			$ 536.762.521,00	27,68%
						Ejec	$ 502.296.494,07			$ 502.296.494,07	25,90%
	PLACA HUELLA 5m	ml	761,37			Prog	$ 377.332.176,00			$ 377.332.176,00	19,46%
						Ejec	$ 317.257.484,00			$ 317.257.484,00	16,36%
*	OBRA TRANSVERSAL 5m	Unidad	2			Prog	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
						Ejec	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
	OBRA TRANSVERSAL 4,10m	Unidad	1			Prog	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
						Ejec	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
*	CARACTERIZACION VIAL	km	9			Prog	$ 6.103.440,00			$ 6.103.440,00	0,31%
						Ejec	$ 0,00			$ 0,00	0,00%
*	FILTRO	ml	753			Prog	$ 102.485.312,00			$ 102.485.312,00	5,29%
						Ejec	$ 87.527.767,52			$ 87.527.767,52	4,51%
*	MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 381.477.606,00			$ 381.477.606,00	19,67%
						Ejec	$ 260.303.975,00			$ 260.303.975,00	13,42%
*	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y COMPLEMENTARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 402.172.054,00			$ 402.172.054,00	20,74%
						Ejec	$ 315.903.613,60			$ 315.903.613,60	16,29%
*	ACTIVIDADES NO PREVISTA	Gl.	1,0			Prog	$ 38.837.253,00			$ 38.837.253,00	2,00%
						Ejec	$ 17.649.427,00			$ 17.649.427,00	0,91%
*	Obras de Compensación Ambiental (PAGA)	Unidad	1,0			Prog	$ 21.031.274,00			$ 21.031.274,00	1,08%
						Ejec				$ 0,00	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CASTALIA — TRAMO Y/O SECTOR 2: VIA EL RESGUARDO
TRAMO Y/O SECTOR 3: LA PICA

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Canguro	1	1
Mezcladora	1	1
volqueta 6m3	1	1
benitin de 2,5 ton	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Corregimiento Peñalisa, Salgar / Antioquia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	TRITURADOS PEÑALISA S.A.	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El proyecto se encuentra en Etapa de Construcción; continuación del acopio de materiales de construcción procedentes de la fuente aprobada.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:
Seguimiento y control durante el descargue y acopio temporal de materiales de construcción; señalización vertical; protección con plástico de los acopios de materiales; disposición de residuos especiales; disposición de residuos líquidos; protección de zonas verdes y árboles.
Seguimiento del estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contratista de obra.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de Gestión Durante La Ejecución

OBSERVACIONES:
Remitido a la Subdirección de Sostenibilidad con No. Rad. Interna INVIAS-71109-2021-0800. Verificación y control de los instrumentos ambientales y planes de manejo por parte de la Interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Campamento

OBSERVACIONES:
Atención, información y divulgación a la comunidad.
El Contratista de Obra cuenta con mano de obra calificada y no calificada, para el desarrollo de actividades constructivas.
La Interventoría cuenta con personal calificado para el seguimiento técnico y administrativo de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 64 del 23/02/2024 al 29/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado
CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES:
El proyecto no contempla adquisición de predio para garantizar el objeto del contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Se adelanta excavacion varias sin clasificar para vigas contemplando una altura de 10 cm y un ancho de 20 cm.
*Se lleva a cabo fundida de concreto clase D para VIGAS, CUNETAS Y PLACA HUELLAS en el tramo 2 sectro LA PICA, generandose un avane de 12 secciones completas de 3,2m.
*Se suministra e instala acero de refuerzo grado 60 para vigas, cunetas y placa huellas.
*Se lleva a cabo la fundida de concreto ciclopeo en el eje de via contemplando un ancho de 0,9m, espesor de 0,15m y una longitud de seccion de 3m promedio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Continuar con las actividadas por ejecutar en el desarrollo del contrato de obra 078 de 2022.
*Continuar con las diferentes actividades de mejoramiento en el sector de la PICA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

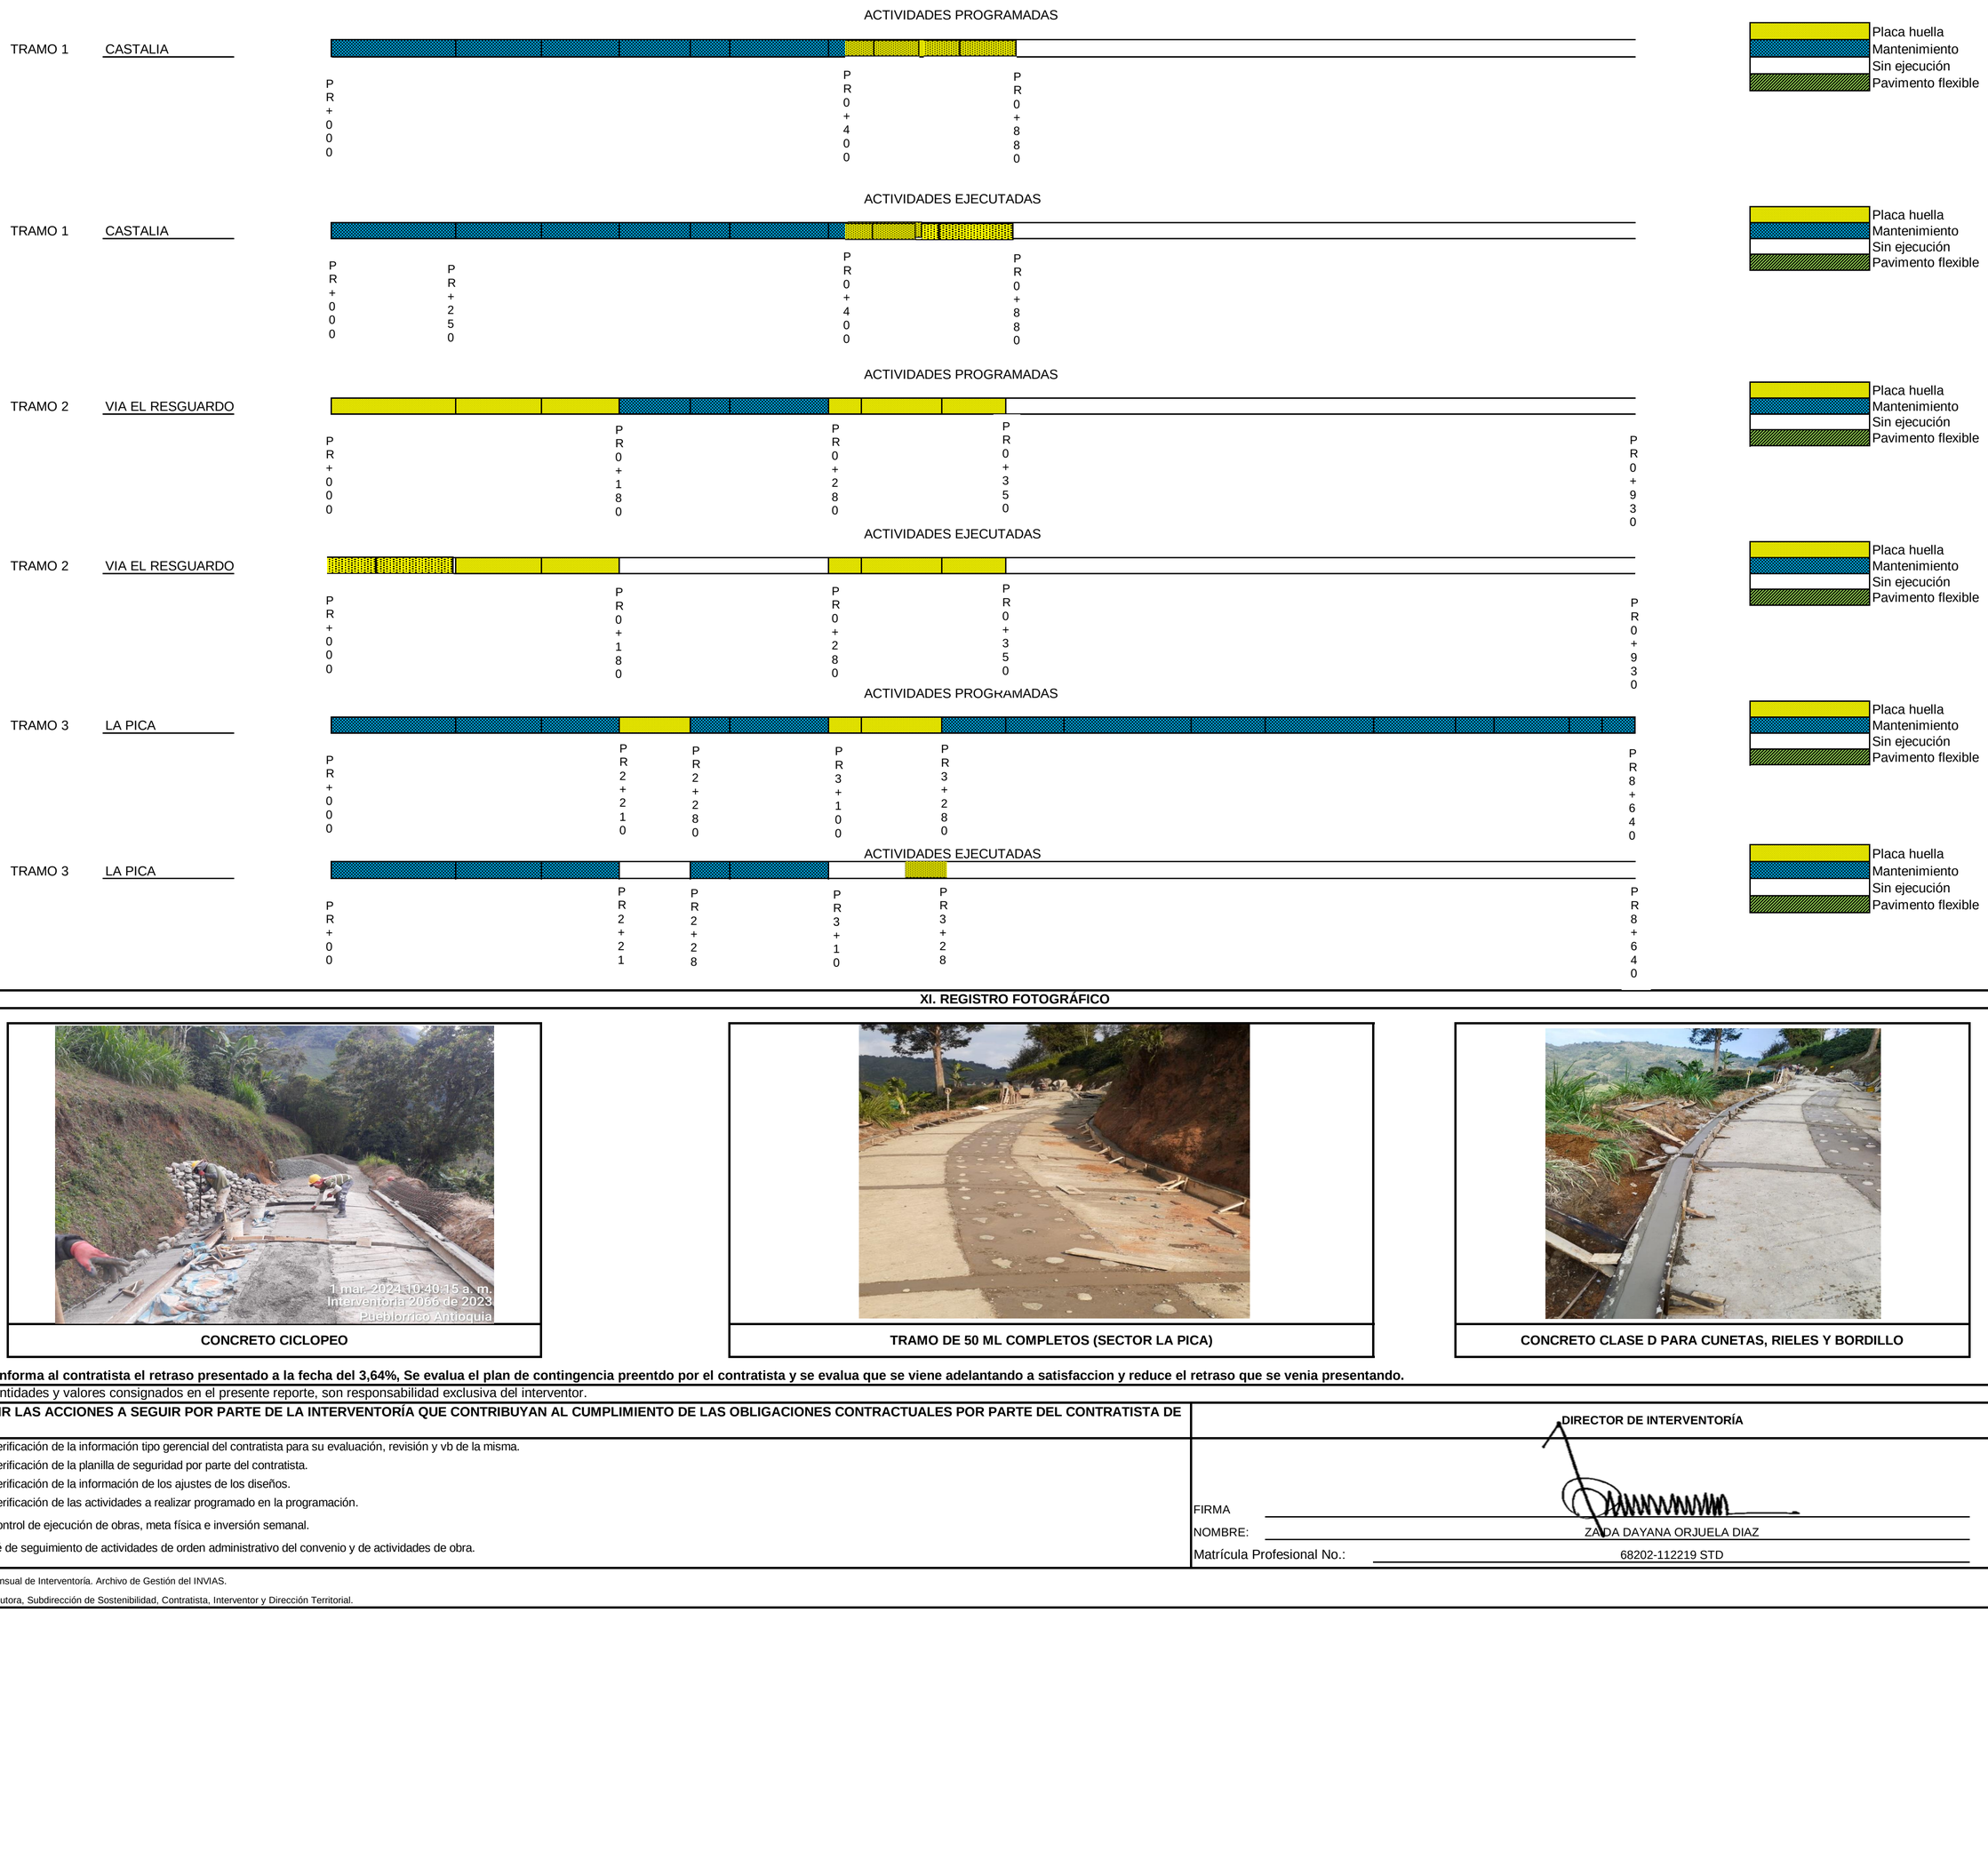

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONCRETO CICLOPEO

TRAMO DE 50 ML COMPLETOS (SECTOR LA PICA)

CONCRETO CLASE D PARA CUNETAS, RIELES Y BORDILLO

NOTA: Se le informa al contratista el retraso presentado a la fecha del 3,64%, Se evalua el plan de contingencia preentdo por el contratista y se evalua que se viene adelantando a satisfaccion y reduce el retraso que se venia presentando.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial del contratista para su evaluación, revisión y vb de la misma.
Seguimiento y verificación de la planilla de seguridad por parte del contratista.
Seguimiento y verificación de la información de los ajustes de los diseños.
Seguimiento y verificación de las actividades a realizar programado en la programación.
Seguimiento y control de ejecución de obras, meta física e inversión semanal.
Se realiza comité de seguimiento de actividades de orden administrativo del convenio y de actividades de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/03/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO No. 078-2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CR FASE 2

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2066 de 2023

INTERVENTORÍA: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MINI CARGADOR	BOCAT	S570	CASTALIA-LA PICA-RESGUARDO BERNANDINO PANCHI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
VOLQUETA 6M3	MERCEDES BENZ	8M3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MEZCLADORA DE CONCRETO	YAMAHA	2 bultos		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
CANGURO	ENAR DEEP	54cm		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
BENITIN DOBLE ROD.	MQ MULTIQUIP	2.5 T		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
COMPACTADOR	CAT	7 Tn		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																		
MOTONIVELADORA	CAT 120G	16 TN		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																					
RETROEXCAVADORA	NEW HOLAND	LB75B		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																					
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
TOTAL ACTIVO				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
TOTAL EN REPARACIÓN				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL INACTIVO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	7	87,5
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	12,5

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): EL MINICARGADOR SE DAÑO Y NO SE ENCUENTRA ACTIVO A PARTIR DEL DIA 21 DE OCTUBRE, POR OTRO LUGAR EL VIBRO COMPACTDOR Y LA RETRO EXCAVADORA FUERON RETIRADAS POR QUE NO SE PUEDE CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES EN LA ZONA.

OBSERVACIONES:

LA INTERVENTORÍA NO CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: FABIO RICARDO ORTIZ REVELO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202167742 ANT

Firma
Nombre: DAYRO EDUARDO RIOS MARIÑO
Ingeniero Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: MP15202-334277BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 078-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL CR FASE 2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1699 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

NOMBRE ARL: IPS SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ANDRY JULIETH ARAQUE PANQUEVA	1057587460	PROFESIONAL S.S.T.	$ 1.160.000																													*				UNION TEMPORAL CR FASE II	$ 1.160.000	$ 300	V	NUEVA EPS	68811568	$ 1.800	PORVENIR	68811568	$ 7.000	$ -	$ -	$ -	
2	JOSE ALEJANDRO ARBOLEDA RUA	1038514154	AYUDANTE	$ 1.160.000																			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				$ 1.160.000	$ 33.200	V	COOSALUD EPS	9464372494	$ 19.100	PORVENIR	9464372494	$ 76.300	$ -	$ -	$ -	
3	JUAN CARLOS ZEA MATEUS	79578936	RESIDENTE	$ 1.160.000																													*				$ 1.160.000	$ 300	V	SOS EPS	68811568	$ 1.800	PORVENIR	68811568	$ 7.000	$ -	$ -	$ -	
4	LUIS MIGUEL BAQUIAZA SAIGAMA	1039421714	AYUDANTE	$ 1.160.000															*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 45.300	V	SALUD TOTAL	9464372494	$ 26.000	PROTECCION	9464372494	$ 104.000	$ -	$ -	$ -	
5	FERNANDO ANDERSON LOPEZ MONTOYA	98634270	AYUDANTE	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 90.500	V	EPS SURA	68811568	$ 52.000	PROTECCION	68811568	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
6	FABIO RICARDO ORTIZ REVELO	98766424	DIRECTOR	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 140.900	V	EPS SANITAS	75219933	$ 253.100	PROTECCION	75219933	$ 323.900	$ -	$ -	$ -	
7	JHON JAIRO OVIEDO ROMO	7710064	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 300	V	NUEVA EPS	68811568	$ 1.800	PROTECCION	68811568	$ 7.000	$ -	$ -	$ -	
8	OCTAVIO DE JESUS BUSTAMANTE HERRERA	700033626	OFICIAL	$ 1.160.000															*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 45.300	V	COOSALUD MOVILIDAD	9464372494	$ 26.000	PORVENIR	9464372494	$ 104.000	$ -	$ -	$ -	
9	DIOMEDES CARUPIA GONZALEZ	1027883726	OFICIAL	$ 1.160.000															*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 45.300	V	COOSALUD MOVILIDAD	9464372494	$ 26.000	COLPENSIONES	9464372494	$ 104.000	$ -	$ -	$ -	
10	YARLINZO CARUPIA TASCON	1003929648	AYUDANTE	$ 1.160.000															*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 45.300	V	SAVIA SALUD	9464372494	$ 26.000	PORVENIR	9464372494	$ 104.000	$ -	$ -	$ -	
11	JUAN SEBASTIAN GARCIA TASCON	1001617986	AYUDANTE	$ 1.160.000															*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 45.300	V	SAVIA SALUD	9464372494	$ 26.000	PORVENIR	9464372494	$ 104.000	$ -	$ -	$ -	
12	YEISON ALEJANDRO GARCIA TASCON	1001617950	AYUDANTE	$ 1.160.000															*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				$ 1.160.000	$ 45.300	V	SAVIA SALUD	9464372494	$ 26.000	PORVENIR	9464372494	$ 104.000	$ -	$ -	$ -	
13	DIONICIO DE JESUS ÁNCHI GUTIERREZ	15531436	OFICIAL	$ 1.160.000															*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				$ 1.160.000	$ 45.300	V	SAVIA SALUD	9464372494	$ 26.000	COLPENSIONES	9464372494	$ 104.000	$ -	$ -	$ -	
14	DANILO SUCRE LLEGARI	1033646173	AYUDANTE	$ 1.160.000																					*	*	*	*	*	*	*	*	*				$ 1.160.000	$ 27.200	V	SAVIA SALUD	9464372494	$ 15.600	PORVENIR	9464372494	$ 62.400	$ -	$ -	$ -	
15	BERNARDO ANTONIO VAQUIAZA PANCHI	1039421140	OFICIAL	$ 1.160.000															*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				$ 1.160.000	$ 45.300	V	SALUD TOTAL	9464372494	$ 26.000	PORVENIR	9464372494	$ 104.000	$ -	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha FEBRERO a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FABIO RICARDO ORTIZ REVELO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202167742 ANT

Firma
Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría:
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-05-09, 07:17:56 PM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Número Planilla:** 70742154

Nro Planilla Corregida: 69183494 **Periodo Cotización:** febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

Fecha limite de pago: 2024-03-20

GUARDADA 09/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL CR FASE 2				
Documento	NI901609482	**Dirección**	CL 10A #47 - 74 TORRE 9 OF 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3114093696		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	PASTO	**Departamento**	NARINO		
Representante Legal	ORTIZ REVELO FABIO RICARDO	**Identificación**	CC98766424		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7710064	OVIEDO ROMO JHON JAIRO	01	00								C								0	0	0	0	0	PROTECCION	$ 0	$ 0	NUEVA EPS	$ 0	$ 0	ARL SURA	$ 0	$ 83.700	COMFAMILIAR NARIÑO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.700	$ 3.600	$ 87.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-09, 04:34:26 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 69183494

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 28/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
Documento	NI901609482	**Dirección**	CL 10A #47 - 74 TORRE 9 OF 202
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3114093696
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PASTO	**Departamento**	NARINO
Representante Legal	ORTIZ REVELO FABIO RICARDO	**Identificación**	CC 98766424
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7710064	JHON JAIRO OVIEDO ROMO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 98634270	FERNANDO ANDERSON LOPEZ MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 104.000	$ 97.300	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721.300	$ 24.800	$ 746.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-04, 09:24:17 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 69280389

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 04/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAM CONTRUCCIONES S A S	**Nombre Sucursal**	LAM FAC	**Código Sucursal**	004
Documento	NI900356860	**Dirección**	CL 36 SUR #35 - 46		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3336337		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	VILLAMIZAR SALCEDO JAIRO	**Identificación**	CC 84034926		
Total Afiliados	15	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003079929	JAIME ANDRES BLANCO ALMANZA	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 1063724410	HERIBERTO PEREZ HERNANDEZ	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 1070952606	LUIS ANDRES HERNANDEZ CARRILLO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 86.667	$ 13.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 1087422363	LUIS EDUARDO AGUIRRE SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1111770369	YINNER JAVIER CASTILLO RIVAS	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 216.667	$ 34.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 216.667	$ 8.700	6,960	$ 216.667	$ 15.100	(CCF04) COMFAMA	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200
CC 1144044682	JOHN DAVID CARABALI CAMILO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 1193201081	ERMY ORTIZ RIVERA	01	00	X																0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 216.667	$ 34.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 216.667	$ 8.700	6,960	$ 216.667	$ 15.100	(CCF04) COMFAMA	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200
CC 14471511	JAMINTON ANGULO	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 216.667	$ 34.700	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 216.667	$ 8.700	6,960	$ 216.667	$ 15.100	(CCF04) COMFAMA	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200
CC 16498518	OSCAR SINISTERRA MINA	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 216.667	$ 34.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 216.667	$ 8.700	6,960	$ 216.667	$ 15.100	(CCF04) COMFAMA	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200
CC 5161901	JELEN JESUS SOLANO MORA	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 86.667	$ 13.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 72283808	DAVID GABRIEL DE LOS RIOS DIAZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 216.667	$ 34.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 216.667	$ 8.700	6,960	$ 216.667	$ 15.100	(CCF04) COMFAMA	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200
CC 72284576	JHON JAIRO SANCHEZ PACHECO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 86.667	$ 13.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 79578936	JUAN CARLOS ZEA MATEUS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 93376988	SAMUEL GUILLERMO SANCHEZ QUINTERO	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 83.334	$ 13.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 83.334	$ 3.400	6,960	$ 83.334	$ 5.900	(CCF04) COMFAMA	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.100
CC 94503184	JHON EDGAR REYES TALERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.986.671	$ 8.986.671	$ 8.986.671	$ 8.986.671	$ 1.438.300	$ 359.900	$ 626.100	$ 359.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.784.200	$ 0	$ 2.784.200

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 14/03/2024, el empleador UNION TEMPORAL CR FASE 2 identificado con NIT número 901609482 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6927843	14/03/2024	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1057587460	ANDRYJULIETH ARAQUE PANQUEVA	1300000	TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL	2024-03-14

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Marzo del año 2024.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Medellín, 14 de March de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL CR FASE 2.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL ANTIOQUIA PUEBLORRICO	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %		
C1057587460	ARAQUE PANQUEVA ANDRY JULIETH	15/03/2024		25229183	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/03/2024 15:24:06 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.88.4.219, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	98766424	FABIO RICARDO ORTIZ REVELO	CL 10 A 47 74 TO 9 AP 202	3188510428	frortiz0@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	IPIALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	12/03/2024	75219933	$717.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	252.000	0		0		0	5	1.100	0	253.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	322.500	0	0	0	0	5	1.400	0	323.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	140.300		0	0	140.300	5	600	140.900		0	1.403	140.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	252.000	253.100
Pensión	1	322.500	323.900
Riesgos Laborales	1	140.300	140.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	714.800	717.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	98766424	FABIO RICARDO ORTIZ REVELO		CL 10 A 47 74 TO 9 AP 202	3188510428	frortiz0@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	IPIALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	12/03/2024	75219933	$717.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	98766424	ORTIZ REVELO FABIO RICARDO	57	0			N																	230201	2.015.480	322.500	0	0	0	0	EPS005	2.015.480	252.000	14-11	2.015.480	5	140.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901313329	1	GRUPO XAD	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTIOQUIA	calle 26 n 23-45	PUEBLORRICO-ANTIOQUIA	3104677513	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	517556195	9464372494	E	2024/03/08	2024/03/18	BANCOLOMBIA	10	$1,895,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1038514154	ARBOLEDA RUA JOSE ALEJANDRO	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS042	11	$476,667	$19,100	CCF03	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0	Si	$147,700
2	CC	1039421714	BAQUIAZA SAIGAMA LUIS MIGUEL	X																	230201	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF03	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
3	CC	70003626	BUSTAMANTE HERRERA OCTAVIO DE JESUS	X																	230301	15	$650,000	$104,000	ESSC24	15	$650,000	$26,000	CCF03	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
4	CC	1027883726	CARUPIA GONZALEZ DIOMEDES	X																	25-14	15	$650,000	$104,000	ESSC24	15	$650,000	$26,000	CCF03	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
5	CC	1003929648	CARUPIA TASCON YARLINZO	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS040	15	$650,000	$26,000	CCF03	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
6	CC	1001617686	GARCIA TASCON JUAN SEBASTIAN	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS040	15	$650,000	$26,000	CCF03	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
7	CC	1001617950	GARCIA TASCON YEISON ALEJANDRO	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS040	15	$650,000	$26,000	CCF03	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
8	CC	15531436	PANCHI GUTIERREZ DIONICIO DE JESUS	X																	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS040	15	$650,000	$26,000	CCF03	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
9	CC	1033646173	SUCRE LLEGARI DANILO	X																	230301	9	$390,000	$62,400	EPS040	9	$390,000	$15,600	CCF03	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0	Si	$120,800
10	CC	1039421140	VAQUIAZA PANCHI BERNARDO ANTONIO	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF03	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
Total	**Afiliados(10)**																					$6,066,667	$970,700			$6,066,667	$242,700			$6,066,667	$242,700			$6,066,667	$422,800		$0	$0		$1,878,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901313329	1	GRUPO XAD	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTIOQUIA	calle 26 n 23-45	PUEBLORRICO-ANTIOQUIA	3104677513	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	517556195	9464372494	E	2024/03/08	2024/03/18	BANCOLOMBIA	10	$1,895,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$970,700	$8,400	$0	$979,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$208,000	$1,800	$0	$209,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$658,700	$5,700	$0	$664,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$104,000	$900	$0	$104,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$422,800	$3,700	$0	$426,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$422,800	$3,700	$0	$426,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$242,700	$2,100	$0	$244,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	$242,700	$2,100	$0	$244,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$242,700	$2,300	$0	$245,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$19,100	$200	$0	$19,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$52,000	$500	$0	$52,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$52,000	$500	$0	$52,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$119,600	$1,100	$0	$120,700
TOTAL				**10**	**$1,878,900**	**$16,500**	**$0**	**$1,895,400**

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 078-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL CR FASE 2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2066 de 2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	19	24	24	24	24	22	24	24	24	21	24	24	24	24	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24			681
Lluvias moderadas											2																					2
Lluvias intensas						5									3					5												13
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	**696**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Debido a las precipitaciones que se han presentado en la zona a intervenir se presentan retrasos en las actividades a realizar.

Firma
Nombre: FABIO RICARDO ORTIZ REVELO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202167742 ANT

Firma
Nombre: DAYRO EDUARDO RIOS MARIÑO
Ingeniero residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202- 334277

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Solicitud de información Pluviométrica,

Ing. Zaida D. Orjuela D. <interventoria2066invias@gmail.com> mar, 7 nov, 16:24 (hace 12 días)

para atencionalciudadano

Buenas Tardes señores IDEAM, adjunto envió oficio solicitando información sobre precipitaciones del municipio de Pueblorrico solicitud del instituto INVIAS.

Feliz día

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail



PDF 2066-23-INVIAS-...

Responder Reenviar

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 1/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL**: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No.: 078-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL CR FASE 2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL FEBRERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2066 de 2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	23/01/2024	ALETAS Y BASE OBRA	NTC 673-ASTMC39-94	OBRA TRANSVERSAL K0+905 RESGUARDO	1	21mpa	219 KG/CM2	si	SE FALLA 1 MUESTRA A LOS 28 DIAS DE CURADO
2	17/02/2024	ALETAS Y BASE OBRA	NTC 673-ASTMC39-94	OBRA TRANSVERSAL K0+905 UNION	1	21mpa	142 KG/CM2	si	SE FALLA 1 MUESTRA A LOS 7 DIAS DE CURADO
3	28/02/2024	CUNETAS Y RIELES IZQUIERDA	NTC 673-ASTMC39-94	TRAMO 2 SECTOR LA PICA K3+032- K3+212	1	21mpa			AUN NO SE FALLAN MUESTRAS
4	29/02/2024	CUNETAS Y RIELES DERECHA	NTC 673-ASTMC39-95	TRAMO 2 SECTOR LA PICA K3+032- K3+212	1	14 mpa			AUN NO SE FALLAN MUESTRAS
5	26/02/2024	ENSAYO DE DENSIDAD, HUMEDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN TERRENO POR EL METODO DE CONO Y ARENA	INV E–161–13	TRAMO 2 SECTOR LA PICA K3+032- K3+212	3	>95%	98,87%-97,89%-97,49%	Si	SE REALIZA LA TOMA DE DENSIDAD EN CAMPO A LA SUBBASE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: FABIO RICARDO ORTIZ REVELO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202167742 ANT

Firma

Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría:
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.


Triturados Peñalisa S.A.	**ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN**	**Versión:** 1.0
		Fecha: 01/05/2021

Norma Invias:	INV E 142-13
Desripción:	SUBBASE GRANULAR
Localización:	PLANTA PEÑALISA (SCORPION)
Fecha:	6-oct-23

P.Martillo lbs	10	V. Molde	2161	P. Molde	5993

MOLDE No:	1	1	1	1
PESO MOLDE + MUESTRA H.	10615	10824	10899	10846
PESO MUESTRA SIN MOLDE	4622	4831	4906	4853
PESO UNITARIO HUMEDO g/cm^3	2,139	2,236	2,270	2,246
PESO UNITARIO SECO g/cm^3	2,087	2,147	2,139	2,089

CONTENIDO DE HUMEDAD				
TARA No:	1	1	1	1
PESO MUESTRA HUMEDA + TARA	554,0	613,0	607,0	743,0
PESO MUESTRA SECA + TARA	542,0	591,0	575,0	695,0
CANTIDAD DE AGUA	12,0	22,0	32,0	48,0
PESO DE LA TARA	54,1	54,5	55,5	54,2
PESOS SUELO SECO SIN TARA	487,9	536,5	519,5	640,8
% DE HUMEDAD	2,5	4,1	6,2	7,5

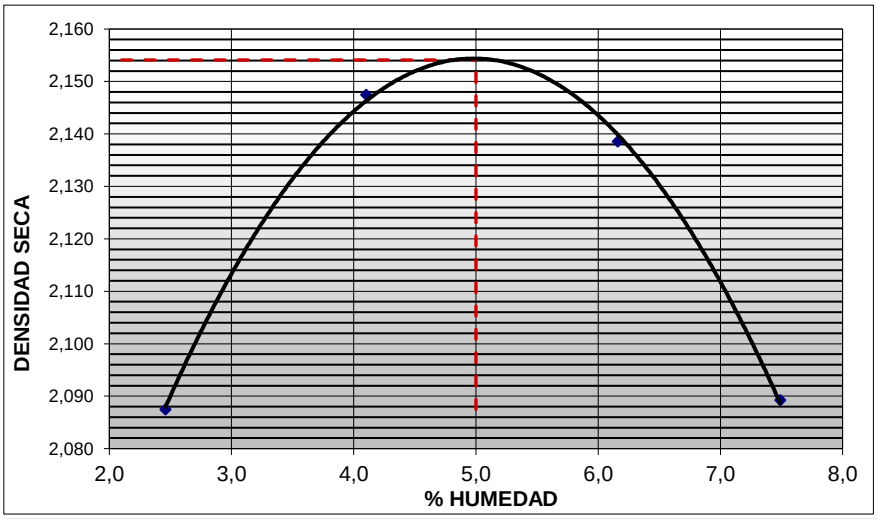

Peso unitario seco maximo g/cm^3
2,154

Humedad optima %
5,0

OBSERVACIONES		
Equipo utilizado	Marca	Fecha Calibración
Balanza 20kg	Ohaus	13/06/2023

EJECUTÓ	REVISÓ	APROBO
Wilder Cano		
Wilder Cano	Jorge Silva	Jairo E.Perez
Cargo: Laboratorista	Cargo: Jefe producción	Cargo: Director


UNION TEMPORAL CR FASE 2		ENSAYO DE DENSIDAD, HUMEDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN TERRENO POR EL METODO DE CONO Y ARENA INV E-161-13		
PROYECTO		OBJETIVO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA DE ENSAYO		26/02/2024		
TRAMO 2 PLACA HUELLA LA PICA		TRAMO 2 (180 ML)		
ABSCISA		K3+032	K3+092	K3+152
MARGEN		izquierda	centro	derecha
CAPA		SUBBASE CLASE C	SUBBASE CLASE C	SUBBASE CLASE C
PROFUNDIDAD(m)		0.3	0.3	0.3
ORIGEN DEL MATERIAL - PEÑALISA				
P. INICIAL ARENA + FRASCO (Wfca1)	gr.	7,038.00	7,037.00	7,036.00
P. FINAL ARENA + FRASCO (Wfca2)	gr.	2,166.00	2,207.00	2,190.00
P. ARENA EN CONO Y PLACA (Wc)	gr.	1,301.00	1,301.00	1,301.00
P. UNITARIO ARENA (γd) -DENSIDAD ARENA GUAMO	gr/cm3	1.44	1.44	1.44
P. ARENA EN EL HUECO (We) CONSTANTE DEL CONO	gr.	3,571.00	3,529.00	3,545.00
VOLUMEN HUECO (V)	cm3	2,479.86	2,450.69	2,461.81
RECIPIENTE N°		D	D	D
P. TOTAL HUMEDO(Wth)	gr.	5,723.00	5,629.00	5,660.00
P. RECIPIENTE (t)	gr.	27.00	27.00	27.00
MATERIAL RETENIDO EN LA MALLA No 3/4	gr.	675.00	790.00	899.00
PESO DE LA MUESTRA CORREGIDA	gr.	5,048.00	4,839.00	4,761.00
GRAVEDAD ESPECIFICA DE LA GRAVA	gr.	2.74	2.74	2.74
VOLUMEN DE LA GRAVA	cm3	246.35	288.32	328.10
P. SUELO HÚMEDO (Wh) CORREGIDO	gr.	5,021.00	4,812.00	4,734.00
VOLUMEN SUELO HÚMEDO (Vh) CORREGIDO	cm3	2,233.51	2,162.37	2,133.70
DENS. SUELO HUMEDO (γh) CORREGIDA	gr/cm3	**2.25**	**2.23**	**2.22**
CONTENIDO DE HUMEDAD				
RECIPIENTE (Capsula) N°		G	G	G
P. TOTAL HÚMEDO (Wth)	gr.	351.70	348.80	365.70
P-. TOTAL SECO (Wts)	gr.	336.50	333.80	349.50
P. RECIPIENTE (t) (Capsula)	gr.	63.20	63.20	63.20
P. AGUA (Ww)	gr.	15.20	15.00	16.20
P. SUELO SECO (Ws)	gr.	273.30	270.60	286.30
% HUMEDAD SUELO (%w)	%	**5.56**	**5.54**	**5.66**
% PORCENTAJE HUMEDAD OPTIMO	%	**5.00**	**5.00**	**5.00**
DENS. SUELO SECO (γd)	gr/cm3	**2.13**	**2.11**	**2.10**
DENS. MAX. PROCTOR (γdmax) PEÑALISA	gr/cm3	**2.154**	**2.154**	**2.154**
PORCENTAJE EXIGIDO COMPACTACION	%	**95.00**	**95.00**	**95.00**
PORCENTAJE ALCANZADO COMPACTACION	%	**98.87**	**97.89**	**97.49**

UNION TEMPORAL CR FASE 2		ENSAYO DE DENSIDAD, HUMEDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN TERRENO POR EL METODO DE CONO Y ARENA INV E-161-13					
PROYECTO		OBJETIVO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
FECHA DE ENSAYO		09/02/2024					
ABSCISA K3+212-K3+712		3212	3312	3412	3512	3612	3712
MARGEN		derecha	centro	izquierda	derecha	centro	izquierda
CAPA		AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
PROFUNDIDAD(m)		0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127
ORIGEN DEL MATERIAL - PEÑALISA							
P. INICIAL ARENA + FRASCO (Wfca1)	gr.	7,138.00	7,135.00	7,135.00	7,132.00	7,131.00	7,129.00
P. FINAL ARENA + FRASCO (Wfca2)	gr.	2,168.00	2,212.00	2,194.00	2,155.00	2,178.00	2,171.00
P. ARENA EN CONO Y PLACA (Wc)	gr.	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00
P. UNITARIO ARENA (γd) -DENSIDAD ARENA GUAMO	gr/cm3	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
P. ARENA EN EL HUECO (We) CONSTANTE DEL CONO	gr.	3,667.00	3,620.00	3,638.00	3,674.00	3,650.00	3,655.00
VOLUMEN HUECO (V)	cm3	2,546.53	2,513.89	2,526.39	2,551.39	2,534.72	2,538.19
RECIPIENTE N°		D	D	D	D	D	D
P. TOTAL HUMEDO(Wth)	gr.	5,743.00	5,652.00	5,682.00	5,815.00	5,702.00	5,688.00
P. RECIPIENTE (t)	gr.	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
MATERIAL RETENIDO EN LA MALLA No 3/4	gr.	675.00	794.00	900.00	975.00	680.00	695.00
PESO DE LA MUESTRA CORREGIDA	gr.	5,068.00	4,858.00	4,782.00	4,840.00	5,022.00	4,993.00
GRAVEDAD ESPECIFICA DE LA GRAVA	gr.	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74
VOLUMEN DE LA GRAVA	cm3	246.35	289.78	328.47	355.84	248.18	253.65
P. SUELO HÚMEDO (Wh) CORREGIDO	gr.	5,041.00	4,831.00	4,755.00	4,813.00	4,995.00	4,966.00
VOLUMEN SUELO HÚMEDO (Vh) CORREGIDO	cm3	2,300.18	2,224.11	2,197.92	2,195.55	2,286.55	2,284.54
DENS. SUELO HUMEDO (γh) CORREGIDA	gr/cm3	**2.19**	**2.17**	**2.16**	**2.19**	**2.18**	**2.17**
CONTENIDO DE HUMEDAD							
RECIPIENTE (Capsula) N°		G	G	G	G	G	G
P. TOTAL HÚMEDO (Wth)	gr.	345.70	346.80	360.70	364.80	355.60	349.80
P-. TOTAL SECO (Wts)	gr.	331.50	332.80	345.50	348.50	339.10	335.30
P. RECIPIENTE (t) (Capsula)	gr.	63.20	63.20	63.20	63.20	63.20	63.20
P. AGUA (Ww)	gr.	14.20	14.00	15.20	16.30	16.50	14.50
P. SUELO SECO (Ws)	gr.	268.30	269.60	282.30	285.30	275.90	272.10
% HUMEDAD SUELO (%w)	%	**5.29**	**5.19**	**5.38**	**5.71**	**5.98**	**5.33**
% PORCENTAJE HUMEDAD OPTIMO	%	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**
DENS. SUELO SECO (γd)	gr/cm3	**2.08**	**2.06**	**2.05**	**2.07**	**2.06**	**2.06**
DENS. MAX. PROCTOR (γdmax) PEÑALISA	gr/cm3						
PORCENTAJE EXIGIDO COMPACTACION	%	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**95.00**
PORCENTAJE ALCANZADO COMPACTACION	%						

UNION TEMPORAL CR FASE 2		ENSAYO DE DENSIDAD, HUMEDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN TERRENO POR EL METODO DE CONO Y ARENA INV E-161-13					
PROYECTO		OBJETIVO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
FECHA DE ENSAYO		11/02/2024					
ABSCISA K3+372-K4+312		3812	3912	4012	4112	4212	4312
MARGEN		derecha	centro	izquierda	derecha	centro	izquierda
CAPA		AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
PROFUNDIDAD(m)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ORIGEN DEL MATERIAL - PEÑALISA							
P. INICIAL ARENA + FRASCO (Wfca1)	gr.	7,129.00	7,129.00	7,128.00	7,128.00	7,128.00	7,127.00
P. FINAL ARENA + FRASCO (Wfca2)	gr.	2,167.00	2,213.00	2,191.00	2,152.00	2,177.00	2,172.00
P. ARENA EN CONO Y PLACA (Wc)	gr.	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00
P. UNITARIO ARENA (γd) -DENSIDAD ARENA GUAMO	gr/cm3	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
P. ARENA EN EL HUECO (We) CONSTANTE DEL CONO	gr.	3,659.00	3,613.00	3,634.00	3,673.00	3,648.00	3,652.00
VOLUMEN HUECO (V)	cm3	2,540.97	2,509.03	2,523.61	2,550.69	2,533.33	2,536.11
RECIPIENTE N°		D	D	D	D	D	D
P. TOTAL HUMEDO(Wth)	gr.	5,742.00	5,653.00	5,679.00	5,812.00	5,701.00	5,689.00
P. RECIPIENTE (t)	gr.	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
MATERIAL RETENIDO EN LA MALLA No 3/4	gr.	675.00	794.00	900.00	975.00	680.00	695.00
PESO DE LA MUESTRA CORREGIDA	gr.	5,067.00	4,859.00	4,779.00	4,837.00	5,021.00	4,994.00
GRAVEDAD ESPECIFICA DE LA GRAVA	gr.	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74
VOLUMEN DE LA GRAVA	cm3	246.35	289.78	328.47	355.84	248.18	253.65
P. SUELO HÚMEDO (Wh) CORREGIDO	gr.	5,040.00	4,832.00	4,752.00	4,810.00	4,994.00	4,967.00
VOLUMEN SUELO HÚMEDO (Vh) CORREGIDO	cm3	2,294.62	2,219.25	2,195.14	2,194.86	2,285.16	2,282.46
DENS. SUELO HUMEDO (γh) CORREGIDA	gr/cm3	**2.20**	**2.18**	**2.16**	**2.19**	**2.19**	**2.18**
CONTENIDO DE HUMEDAD							
RECIPIENTE (Capsula) N°		G	G	G	G	G	G
P. TOTAL HÚMEDO (Wth)	gr.	349.70	352.80	362.70	368.80	359.60	353.80
P-. TOTAL SECO (Wts)	gr.	333.50	335.80	346.50	350.50	341.10	337.30
P. RECIPIENTE (t) (Capsula)	gr.	63.20	63.20	63.20	63.20	63.20	63.20
P. AGUA (Ww)	gr.	16.20	17.00	16.20	18.30	18.50	16.50
P. SUELO SECO (Ws)	gr.	270.30	272.60	283.30	287.30	277.90	274.10
% HUMEDAD SUELO (%w)	%	**5.99**	**6.24**	**5.72**	**6.37**	**6.66**	**6.02**
% PORCENTAJE HUMEDAD OPTIMO	%	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**
DENS. SUELO SECO (γd)	gr/cm3	**2.07**	**2.05**	**2.05**	**2.06**	**2.05**	**2.05**
DENS. MAX. PROCTOR (γdmax) PEÑALISA	gr/cm3						
PORCENTAJE EXIGIDO COMPACTACION	%	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**95.00**
PORCENTAJE ALCANZADO COMPACTACION	%						

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente:	UNION TEMPORAL CR FASE 2
Obra:	PLACA HUELLA CASTALIA PUEBLORR.
Dirección:	CASTALIA PUEBLORRICO ANT.
Teléfonos:	3188510428
N.I.T.#:	901.609.482-0
Dirección de la Obra :	PUEBLORRICO SECTOR RESGUARDO LA UNION Y LA PICA

Características:	K0+905 y	K3+122
Agregado Fino:	ARENA	PEÑALISA
Agregado Grueso:	TRITURADO	PEÑALISA
Cemento:	ALION	
Dosificación:	3000PSI	2000PSI
Interventor:	ZAIDA	ORJUELA DIAZ

Fecha de Informe:	9 DE MAR 2024
Contacto:	FABIO ORTIZ
Factor de Proyección. 3 días :	
Factor de Proyección. 7 días :	X0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días :	

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm2)	Altura (cm)	Volumen (cm3)	Ast (cm)	Densidad (g/cm3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm2)	Resistencia A 28 días (Kg/cm2)
		Vaciado	Prueba											
1	ALETAS Y BASE OBRA K0+905 UNION (ALCANTARILLA)	17/02/2024	23/02/2024	7	15.2	13047	181	30.5	5521		2.363	57256	142	
2	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA LA PICA	28/02/2024	06/03/2024	7	15.2	12993	181	30.5	5521		2.354	60394	150	
3	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN DERECHA LA PICA	29/02/2024	07/03/2024	7	15.2	12950	181	30.5	5521		2.346	57779	144	
4	CICLOPEO PLACA HUELLA NUCLEO CENTRAL LA PICA	01/03/2024	08/03/2024	7	15.2	12948	181	30.5	5521		2.345	24641	61	

ENSAYADO POR: _____

Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales


ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 ensaseauxiliar@hotmail.com

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente:	UNION TEMPORAL CR FASE 2 _	**Características:**	K0+905 y K1+180
Obra:	PLACA HUELLA CASTALIA PUEBLORR.	**Agregado Fino:**	ARENA PEÑALISA
		Agregado Grueso:	TRITURADO PEÑALISA
Dirección:	CASTALIA PUEBLORRICO ANT.	**Cemento:**	ALION
Teléfonos:	31164093696	**Dosificación:**	3000 PSI
N.I.T.#:	901.609.482-0	**Interventor:**	ZAIDA ORJUELA DIAZ
Dirección de la Obra :	PUEBLORRICO SECTOR RESGUARDO LA UNION Y LA PICA		

Fecha de Informe:	14 DE MAR 2024
Contacto:	FABIO ORTIZ
Factor de Proyección. 3 días :	
Factor de Proyección. 7 días :	
Factor de Proyección. 14 días :	X0.9633 + 29.30

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm2)	Altura (cm)	Volumen (cm3)	Ast (cm)	Densidad (g/cm3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm2)	Resistencia A 28 días (Kg/cm2)
		Vaciado	Prueba											
1	ALETAS Y BASE OBRA K0+905 UNION (ALCANTARILLA)	17/02/2024	01/03/2024	14	15.2	13047	181	30.5	5521		2.363	80002	199	
2	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA LA PICA	28/02/2024	13/03/2024	14	15.2	12993	181	30.5	5521		2.354	85070	212	

ENSAYADO POR: _____

Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente:	UNION TEMPORAL CR FASE 2 _	**Características:**	K1+180
Obra:	PLACA HUELLA CASTALIA PUEBLORR.	**Agregado Fino:**	ARENA PEÑALISA
		Agregado Grueso:	TRITURADO PEÑALISA
Dirección:	CASTALIA PUEBLORRICO ANT.	**Cemento:**	ALION
Teléfonos:	31164093696	**Dosificación:**	3000 PSI
N.I.T.#:	901.609.482-0	**Interventor:**	ZAIDA ORJUELA DIAZ
Dirección de la Obra :	PUEBLORRICO SECTOR RESGUARDO INDIGENA		

Fecha de Informe:	9 DE MAR 2024
Contacto:	FABIO ORTIZ
Factor de Proyección. 3 días :	
Factor de Proyección. 7 días :	
Factor de Proyección. 14 días :	X0.9633 + 29.30

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm2)	Altura (cm)	Volumen (cm3)	Ast (cm)	Densidad (g/cm3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm2)	Resistencia A 28 días (Kg/cm2)
		Vaciado	Prueba											
1	ALETAS Y BASE OBRA K0+905 RESGUARDO	23/01/2024	12/02/2024	28	15.2	13047	181	30.5	5521		2.363	219		219
	``													

ENSAYADO POR: _____
Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 3 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 078 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL CR FASE 2

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO: 18/08/2022

PLAZO INICIAL: 4,5 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.939.011.755,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.939.011.755,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 31.000.204,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 31.000.204,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2066 DE 2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 193.901.175,50	1	8	2023	30	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40,00%	$ 775.604.702,00	1	8	2023	30	3	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 387.802.065,00	1	8	2023	30	11	2026
Calidad de Estudios y Diseños	0,48%	$ 9.300.065,00	30	11	2023	30	11	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 581.703.526,50	30	11	2023	30	11	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100047218

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		$ 348.052.610,02	$ 348.052.610,02	$ 348.052.610,02
PATRONAL		$ 104.415.783,00	$ 104.415.783,00	$ 104.415.783,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$ 104.415.783,00	$ 104.415.784,00	$ 104.415.784,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$ 104.415.783,00	$ 104.415.785,00	$ 104.415.785,00
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100011640 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	3 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 193.901.175,50	26	12	2023	30	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40,00%	$ 775.604.702,00	26	12	2023	30	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 387.802.065,00	26	12	2023	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños	0,48%	$ 9.300.065,00	30	4	2024	30	4	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 581.703.526,50	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100047218

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 348.052.610,00	18	8	2023	30	4	2024
Patronal		$ 104.415.783,00	18	8	2023	30	4	2024
Contratista y subcontratistas		$ 104.415.783,00	18	8	2023	30	4	2024
Vehiculos propios y no propios		$ 104.415.783,00	18	8	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-1000116400 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Z0yvPt5eDj2KznI26iUkCw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-100047218	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	10285300	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/08/2022	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL CR FASE 2	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.482-0
DIRECCIÓN	CL 10A 47 74 TO 9 OF 202	**TELÉFONO**	3114093696
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA - INVIAS NIT. 800.215.807.2	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.981.105-2
DIRECCIÓN	CRA 31 NRO 30 41	**TELÉFONO**	3246558377
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA - INVIAS NIT. 800.215.807.2	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.981.105-2
DIRECCIÓN	CRA 31 NRO 30 41	**TELÉFONO**	3246558377

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA OTRO SI NO.5 FECHADO EL 26/12/2023 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES DE LA PÓLIZA Y NO MODIFICADOS BAJO EL PRESENTE ANEXO. CONTINÚAN VIGENTES.

EL OBJETO ES:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.078 - 2022, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA - LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/12/2023	24:00 Horas Del 30/08/2024	193.901.175,50	116.659,45
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 26/12/2023	24:00 Horas Del 30/08/2024	775.604.702,00	466.637,79
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/12/2023	24:00 Horas Del 30/04/2027	387.802.351,00	192.838,70
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	9.300.065,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	581.703.526,50	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.948.311.820,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	776.135,94
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	776.135,94
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	147.465,83
TOTAL A PAGAR	$	923.601,77

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-100047218	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	10285300	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/08/2022	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
GRUPO SERVING SAS - NIT: 900392994 (PART. 5,0 %)
CONSTRUCTORA SEINCIVIL SAS - NIT: 901304858 (PART. 95,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL UNION TEMPORAL CR FASE 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **C-100047218** y endoso, **9** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL CR FASE 2** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA - INVIAS NIT. 800.215.807.2 / MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA - INVIAS NIT. 800.215.807.2** , expedida por la Compañía en **28/12/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CALI a los **28** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023**.



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: U39+AD8FOd1cjb9sxZ97Hg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	C-100011640	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	10285302	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/08/2022	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL CR FASE 2	No. DOC. IDENTIDAD	901.609.482-0
DIRECCIÓN	CL 10A 47 74 TO 9 OF 202	TELÉFONO	3114093696
ASEGURADO	UNION TEMPORAL CR FASE 2	No. DOC. IDENTIDAD	901.609.482-0
DIRECCIÓN	CL 10A 47 74 TO 9 OF 202	TELÉFONO	3114093696
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA OTRO SI NO.5 FECHADO EL 26/12/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES DE LA PÓLIZA Y NO MODIFICADOS BAJO EL PRESENTE ANEXO. CONTINÚAN VIGENTES.

EL OBJETO ES:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.078 - 2022, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA - LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	348.052.610,00	348.052.610,00	348.052.610,02	232.670,79
PATRONAL	104.415.783,00	104.415.783,00	104.415.783,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	104.415.783,00	104.415.783,00	104.415.783,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	104.415.783,00	104.415.783,00	104.415.783,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 348.052.610,02	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	232.670,79
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	232.670,79
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	44.207,45
TOTAL A PAGAR	$	276.878,24

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	C-100011640	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	10285302	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/08/2022	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
GRUPO SERVING SAS - NIT: 900392994 (PART. 5,0 %)
CONSTRUCTORA SEINCIVIL SAS - NIT: 901304858 (PART. 95,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL UNION TEMPORAL CR FASE 2.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA- INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL CR FASE 2, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA- INVIAS

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA- INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF


4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4.9.2. PROGRAMACION DE OBRA


Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

Id	Modo de tarea	Texto	Nombre	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1			**1. PLACA HUELLA A= 4m; H= 0,18m**	**$0.00**			
2		1.1	Excavaciones en material común en seco a mano	$356,376.35	80 días	mié 10/01/24	mar 23/04/24
3		1.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) -	$69,372,119.54	80 días	mié 10/01/24	mar 23/04/24
4		1.5	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) -	$17,057,130.86	80 días	mié 10/01/24	mar 23/04/24
5		1.6	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) -	$61,899,414.51	80 días	mié 10/01/24	mar 23/04/24
6		1.7	Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclópeo)	$49,484,252.09	80 días	mié 10/01/24	mar 23/04/24
7		1.8	Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	$82,160,942.65	80 días	mié 10/01/24	mar 23/04/24
8			**2. PLACA HUELLA A= 5m; H= 0,15m**	**$0.00**			
9		2.1	Excavaciones en material común en seco a mano	$75,168.00	45 días	vie 01/03/24	lun 29/04/24
10		2.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) -	$0.00	45 días	vie 01/03/24	lun 29/04/24
11		2.5	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) -	$0.00	45 días	vie 01/03/24	lun 29/04/24
12		2.6	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) -	$16,985,225.00	45 días	vie 01/03/24	lun 29/04/24
13		2.7	Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclópeo)	$16,003,737.00	45 días	vie 01/03/24	lun 29/04/24
14		2.8	Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	$25,329,149.00	45 días	vie 01/03/24	lun 29/04/24
15			**3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L= 5m**	**$0.00**			
16		3.3	Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	$0.00			
17		3.4	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	$0.00			
18		3.5	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	$0.00			
19		3.6	Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	$0.00			
20			**4. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L= 4m**	**$0.00**			
21		4.3	Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	$11,536,736.00	25 días	mié 10/01/24	lun 12/02/24
22		4.4	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	$1,626,939.00	25 días	mié 10/01/24	lun 12/02/24

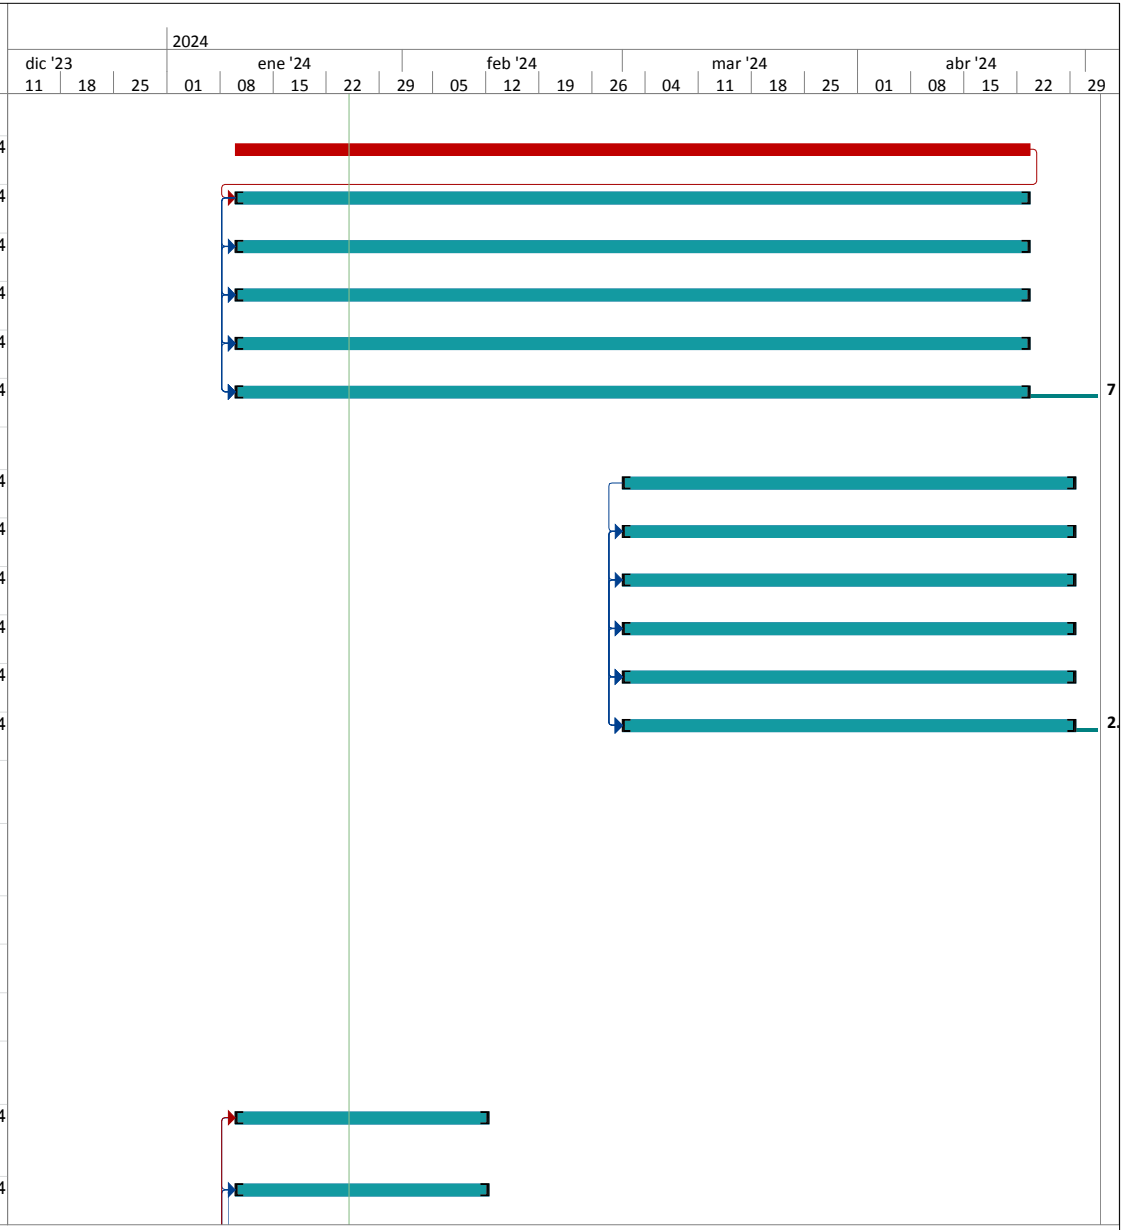


Tareas críticas		Atraso		Hito externo		Informe de resumen manual	
División crítica		Resumen		Tarea inactiva		Resumen manual	
Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
División		Tarea crítica resumida		Resumen inactivo		Sólo fin	
Hito		División crítica resumida		Tarea manual		Fecha límite	
Margen de demora		Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Modo de tarea	Texto	Nombre	Costo	Duración	Comienzo	Fin
23		4.5	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	$19,371,390.00	25 días	mié 10/01/24	lun 12/02/24
24		4.6	Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	$13,195,447.00	25 días	mié 10/01/24	lun 12/02/24
25			**5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE FILTRO**	**$0.00**			
26		5.2	Geotextil NT 2500 o Similar	$0.00			
27		5.3	Material granular drenante	$0.00			
28		5.4	Suministro, transporte y colocación de tubería de 4", perforada para filtros	$0.00			
29			**6. CARACTERIZACIÓN VI**	**$0.00**			
30		6.1	Caracaterización del corred	$6,103,440.00	25 días	jue 01/02/24	mar 05/03/24
31			**OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O**	**$0.00**			
32			**TOTALESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE**	**$0.00**			
33			**7. MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA**	**$0.00**			
34		7.1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	$0.00			
35		7.2	Conformación de la calzada existente	$3,950,521.00	21.22 días	lun 15/01/24	vie 09/02/24
36		7.3	Afirmado	$51,494,452.00	21.22 días	lun 15/01/24	vie 09/02/24
37		7.4	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm - incluye	$2,828,865.00	15 días	lun 15/01/24	vie 02/02/24
38			**8. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y COMPLEMENTARIAS A PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y**	**$0.00**			
39		8.1	Conformación de la calzada existente	$0.00			
40		8.2	Subbase granular clase C.	$86,209,250.00	65 días	jue 01/02/24	jue 25/04/24
41		8.3	Excavaciones varias sin clasificar.	$1,781,670.00	65 días	jue 01/02/24	jue 25/04/24
42		8.4	Excavaciones varias sin clasificar (sin transporte)	$950,272.00	65 días	jue 01/02/24	jue 25/04/24
43		8.5	Relleno para Estructuras con material del sitio	$445,532.00	65 días	jue 01/02/24	jue 25/04/24
44		8.6	Relleno para Estructuras con recebo	$4,453,745.00	65 días	jue 01/02/24	jue 25/04/24

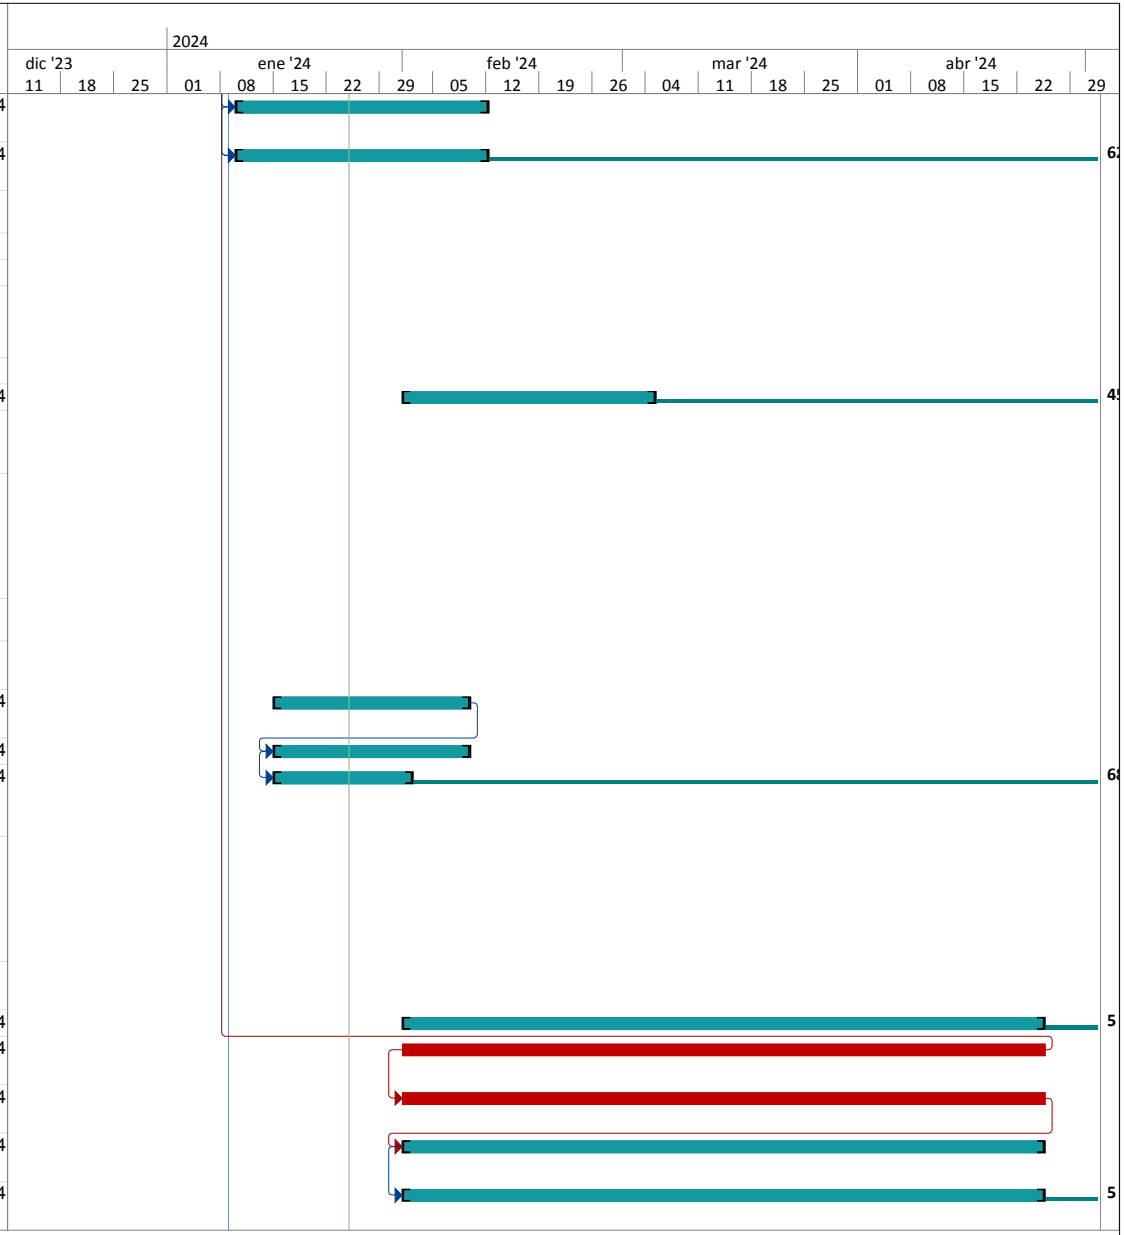



Tareas críticas		Atraso		Hito externo		Informe de resumen manual	
División crítica		Resumen		Tarea inactiva		Resumen manual	
Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
División		Tarea crítica resumida		Resumen inactivo		Sólo fin	
Hito		División crítica resumida		Tarea manual		Fecha límite	
Margen de demora		Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


Id	Modo de tarea	Texto	Nombre	Costo	Duración	Comienzo	Fin
45			**ACTIVIDADES NO PREVISTA**	**$0.00**			
46		NP1	SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE TUBERIA SANITARIA DE 24" DE DIÁMETRO INTERIOR PARA MEJORAMIENTO DE OBRA DE ARTE. Incluye todo lo necesario para su instalacion	$4,900,200.00	25 días	lun 01/04/24	jue 02/05/24
47		NP2	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) PLACA HUELLA INCLUYE ACELERANTE PARA CONCRETO PROPORCION 3% DEL PESO DE CEMENTO, RESISTENCIA	$31,112,707.00	25 días	lun 01/04/24	jue 02/05/24
48			**OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O**	**$0.00**			

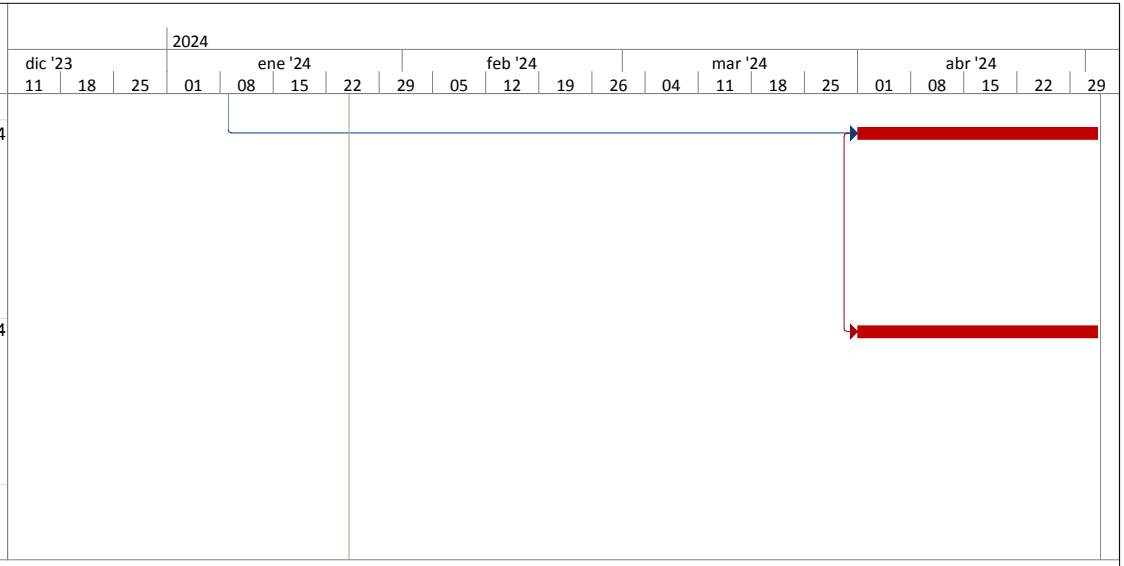

Tareas críticas	Atraso	Hito externo	Informe de resumen manual
División crítica	Resumen	Tarea inactiva	Resumen manual
Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Sólo el comienzo
División	Tarea crítica resumida	Resumen inactivo	Sólo fin
Hito	División crítica resumida	Tarea manual	Fecha límite
Margen de demora	Tareas externas	Sólo duración	Progreso

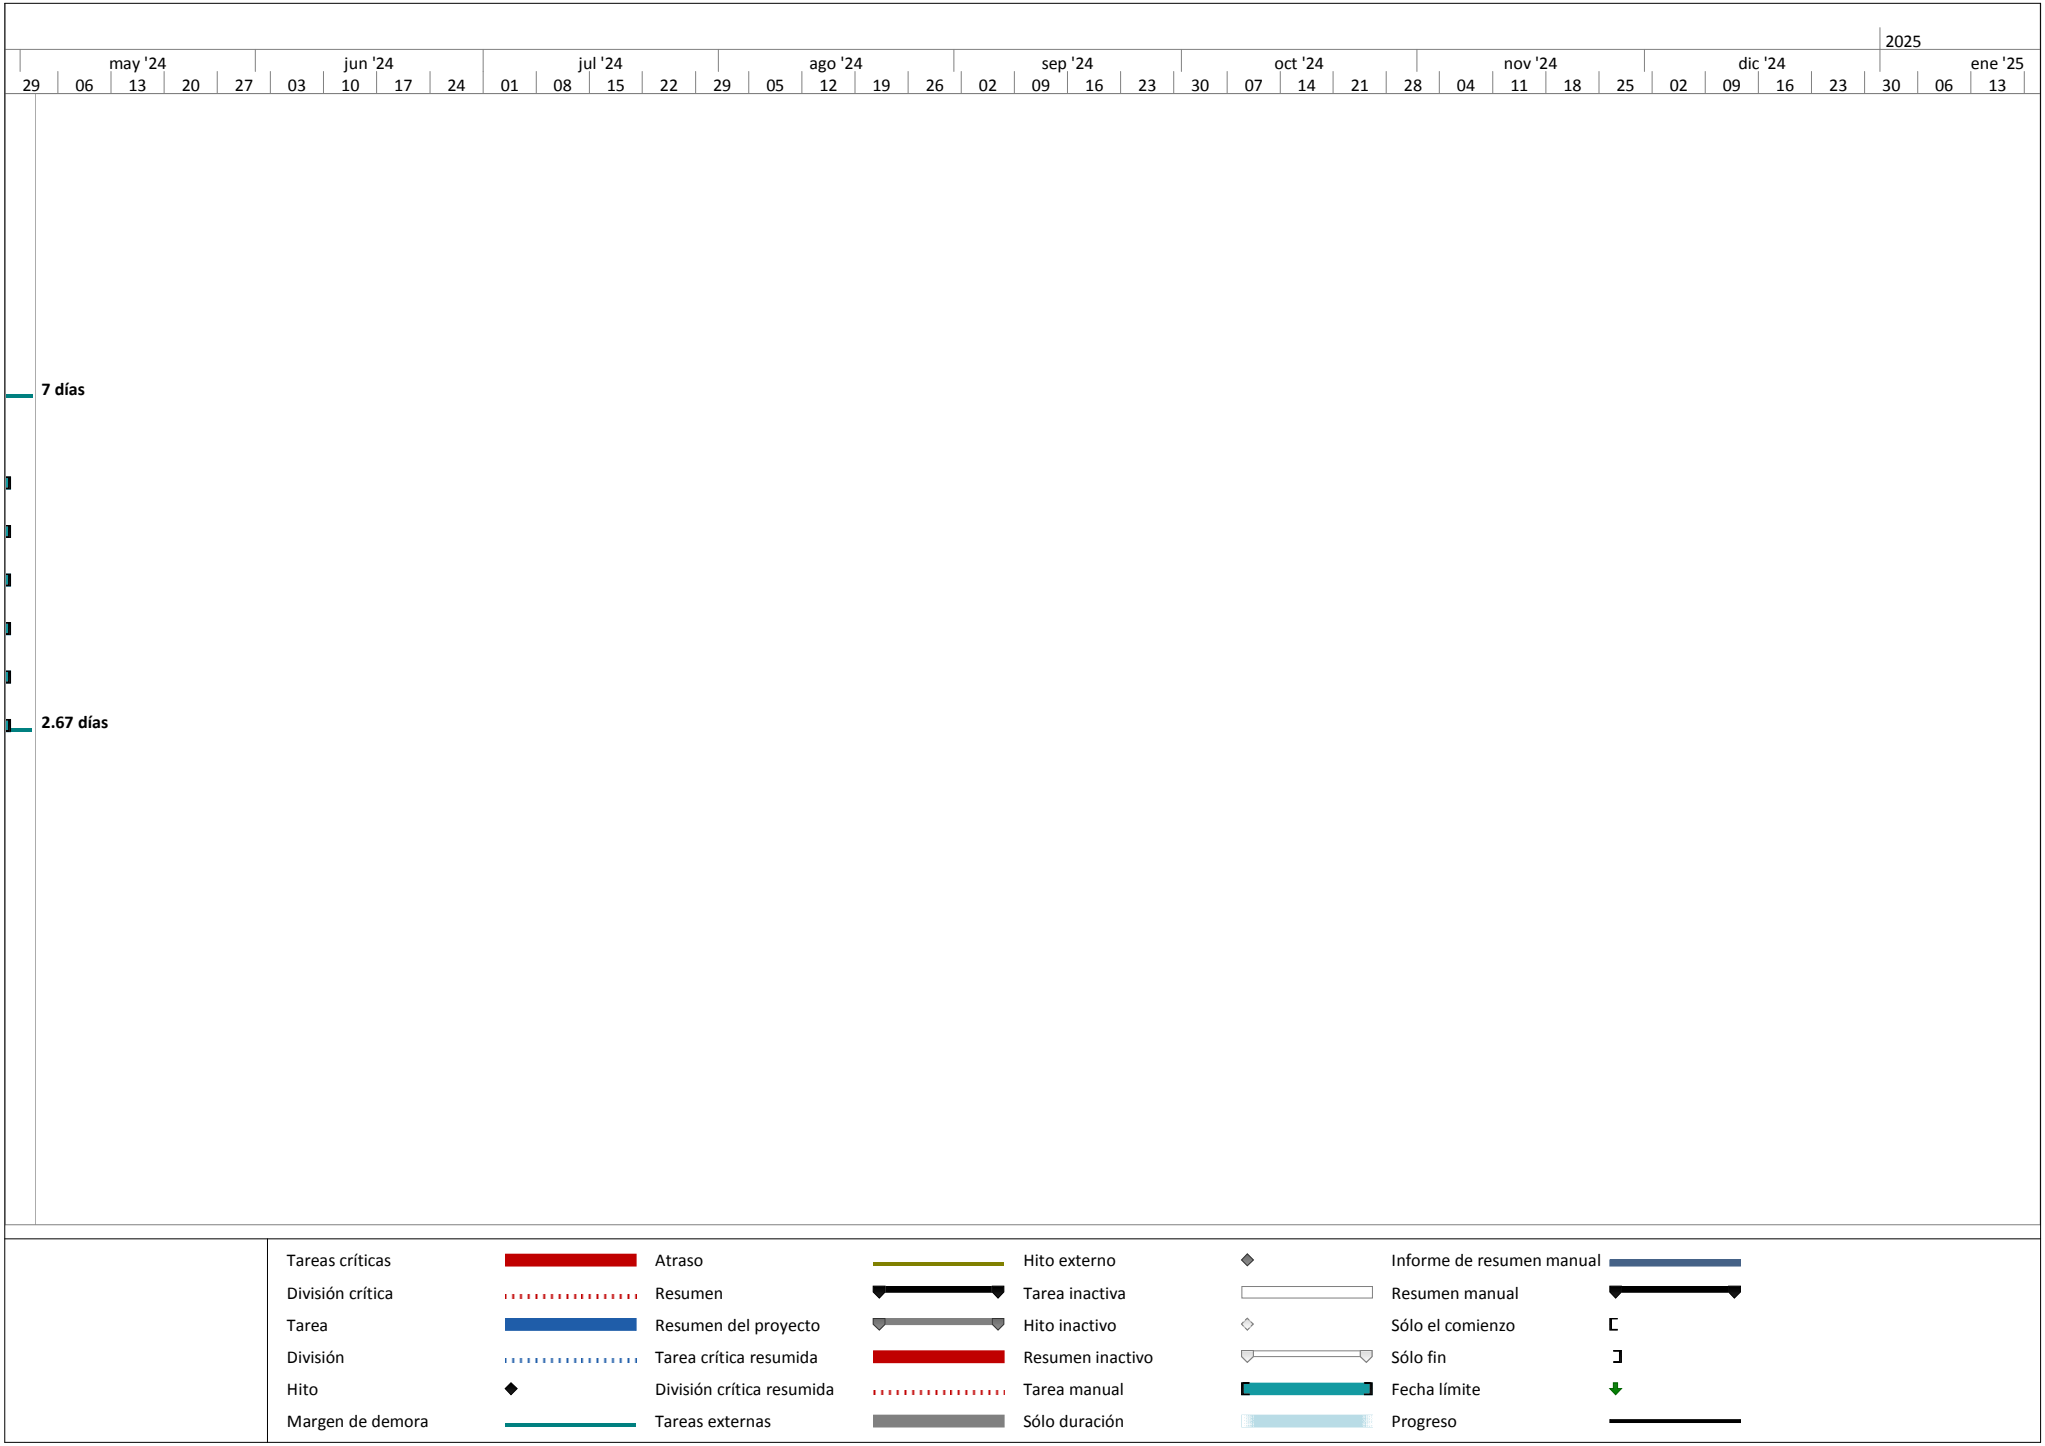
2025
may '24
jun '24
jul '24
ago '24
sep '24
oct '24
nov '24
dic '24
ene '25
29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13
7 días
2.67 días
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso

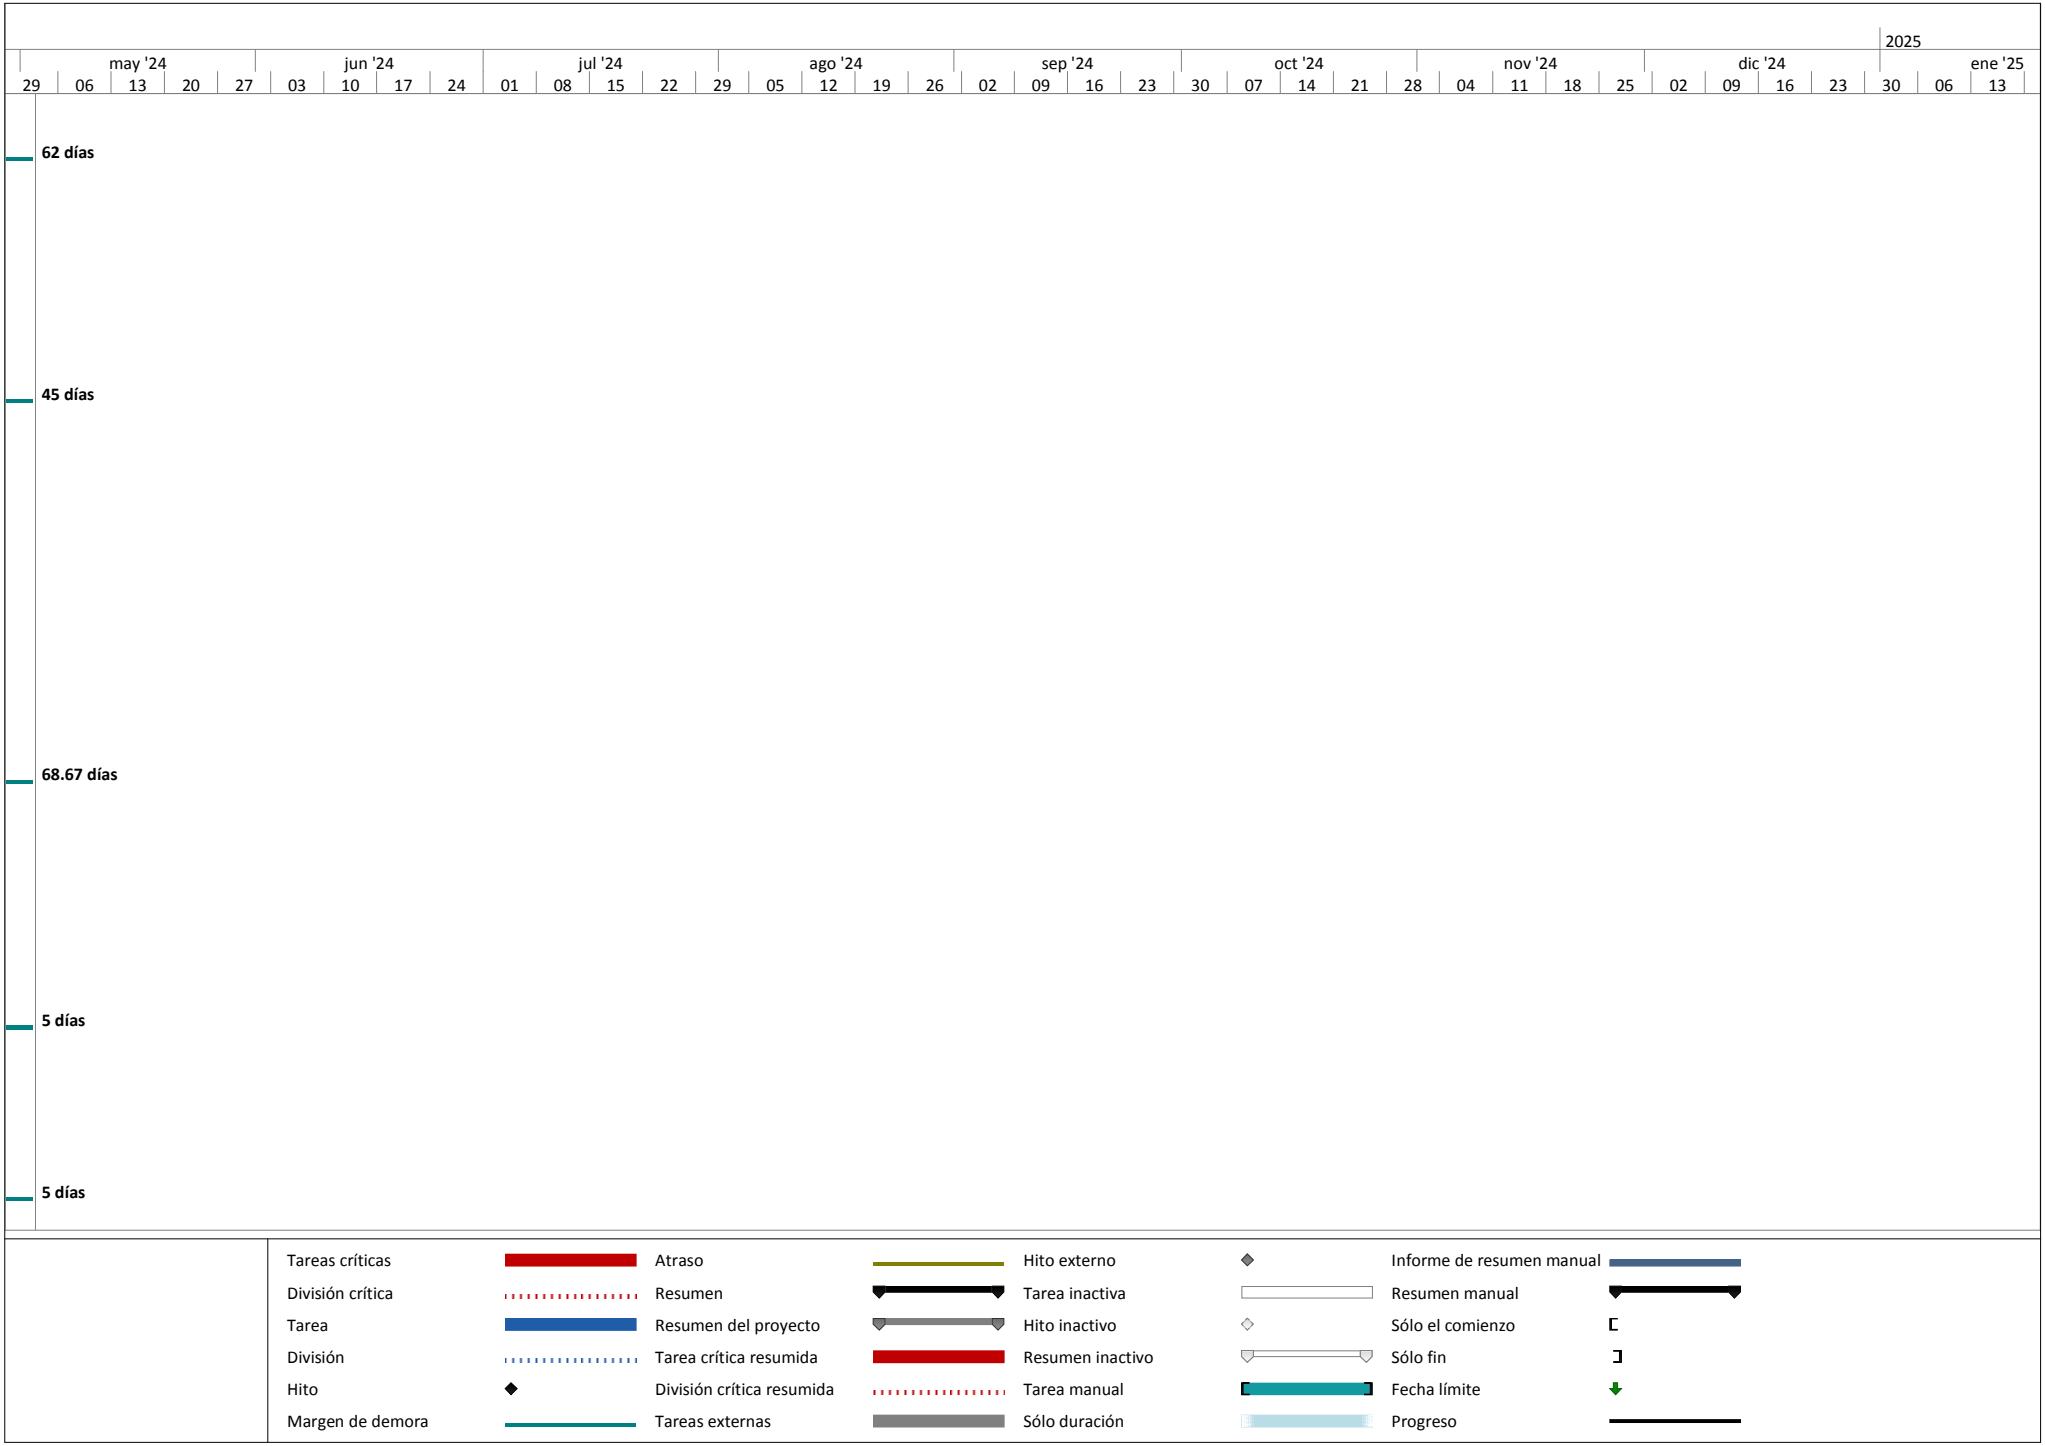
2025
may '24
jun '24
jul '24
ago '24
sep '24
oct '24
nov '24
dic '24
ene '25
29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13
62 días
45 días
68.67 días
5 días
5 días
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso

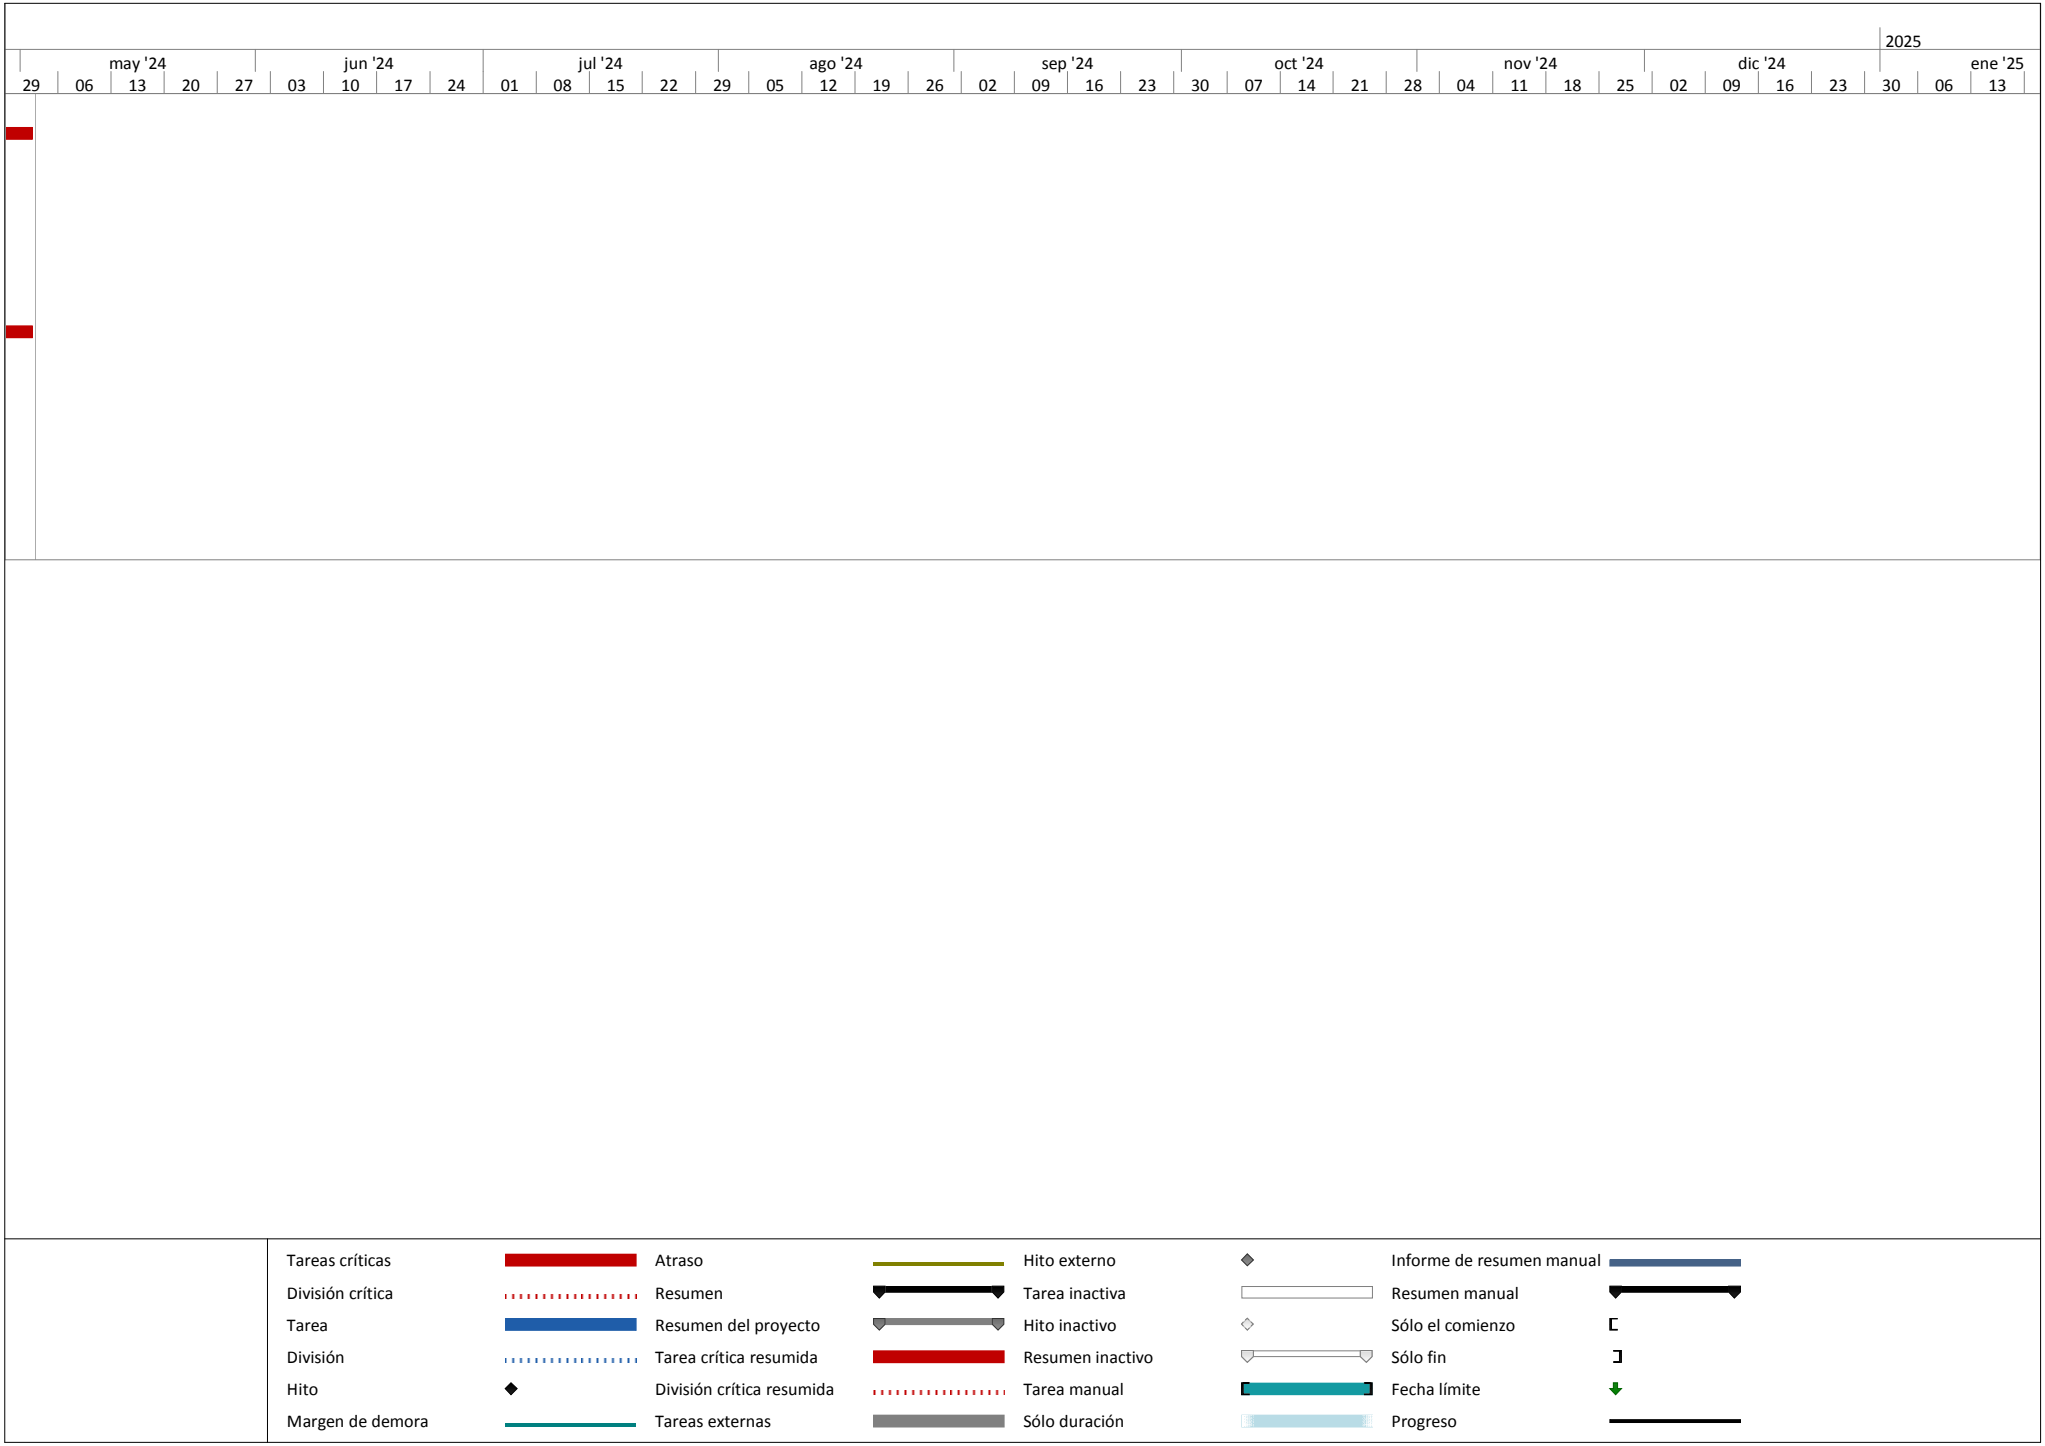
2025
may '24
jun '24
jul '24
ago '24
sep '24
oct '24
nov '24
dic '24
ene '25
29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13
Tareas críticas
Atraso
Hito externo
Informe de resumen manual
División crítica
Resumen
Tarea inactiva
Resumen manual
Tarea
Resumen del proyecto
Hito inactivo
Sólo el comienzo
División
Tarea crítica resumida
Resumen inactivo
Sólo fin
Hito
División crítica resumida
Tarea manual
Fecha límite
Margen de demora
Tareas externas
Sólo duración
Progreso

4.9.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO					MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN					1
PÁGINA					

FECHA: 01/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 078-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CASTALIA -LA PICA (FASE2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CR FASE 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2066-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

PLAZO INICIAL: 4,5 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 17 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.939.011,76 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.939.011,76

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA ACTA DE MODIFICACION 2 Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1 (18 AGO. A 17 AGO.)-2022	MES 2 (18 SEP. A 17 OCT.)-2022	MES 3 (18 OCT. A 17 NOV.)-2022	MES 4 (28 NOV. A 30 NOV .)-2022	MES 5 (1 DIC. A 31 DIC .)-2022	PRORROGA N1 (MES 1) MES 6 (1 ENE. A 31 ENE .)-2023	PRORROGA N1 (MES 2) MES 7 (1 FEB. A 28 FEB .)-2023	PRORROGA N2 (MES 1) MES 8 (1 MAR. A 31 MAR .)-2023	PRORROGA N3 (MES 2) MES 9 (1 AGO. A 31 AGO.)-2023	PRORROGA N3 (MES 3) MES 10 (1 SEP. A 30 SEP .)-2023	PRORROGA N3 (MES 4) MES 11 (1 OCT. A 31 OCT.)-2023	PRORROGA N4 (MES 5) MES 12 (1 NOV. A 30 NOV .)-2023	PRORROGA N3 (MES 6) MES 13 (1 dic. A 31 DIC .)-2023	PRORROGA N5 (MES 1) MES 14 (1 ENE A 31 ENE)-2024	PRORROGA N3 (MES 2) MES 15 (1 FEB A 29 FEB)-2024	PRORROGA N3 (MES 3) MES 16 (1 MAR A 31 MAR)-2024	PRORROGA N3 (MES 4) MES 17 (1 ABR A 30)-2024	
1. PLACA HUELLA A= 4m; H= 0,18m	$ 577.054,38	30,24%	0,00%	% P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,44%	14,44%		2,23%	15,59%	4,45%	7,97%	12,42%	2,58%	4,55%	4,55%	4,55%	%
				$ P		$0	$0	$0	$0	$272.453	$272.453		$42.500	$297.500	$85.000	$152.054	$237.054	$38.299	$88.299	$88.299	$88.299	
ITEMS (1.1.1,4.1.5,1.6,1.7,1.8)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
2. PLACA HUELLA A= 5m; H= 0,15m	$ 375.650,76	19,69%	0,00%	% P		6,09%	6,07%	6,07%	1,71%	11,45%	11,45%	16,63%				3,06%	3,06%			1,51%	1,51%	
				$ P		$116.227	$115.843	$115.843	$32.581	$216.058	$216.058	$317.257				$58.393	$58.393			$29.197	$29.197	
ITEMS (2.1,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L= 5m	$ -	0,00%	0,00%	% P		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-	0,76%	0,76%			0,00%								
				$ P		$263.215	$262.194	$206.552		$14.335	$14.335			$0								
ITEMS (3.3,3.4,3.5,3.6)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
4. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L= 4m	$ 45.730,51	2,40%	0,00%	% P		0,80%	0,64%	0,06%		0,82%	0,82%					2,40%	2,40%	1,18%				
				$ P		$15.301	$12.257	$1.113		$15.459	$15.459					$45.731	$45.731	$22.865				
ITEMS (4.3,4.4,4.5,4.6)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE FILTRO	109.349,13	5,73%	0,00%	% P		1,12%	0,93%			2,56%	2,56%	3,63%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	1,05%					%
				$ P		$21.375	$17.721			$48.236	$48.236	$69.169	$10.045	$10.045	$10.045	$10.045	$20.090					
ITEMS (5.2,5.3,5.4)	$ -	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
6. CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 6.103,44	0,32%	0,00%	% P		0,95%	0,39%	0,00%		0,16%	0,16%		0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,16%		0,31%			
				$ P		$18.220	$7.402	$0		$3.052	$3.052		$1.526	$4.578	$3.052	-$3.052	$0,00		$6.103,44			
ITEMS (6.1)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
7. MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA	$ 371.245,42	19,46%	0,00%	% P				0,06%	0,00%	8,73%	8,73%	5,05%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	7,20%	1,80%	1,20%			
				$ P				$1.221	$0	$164.803	$164.803	$96.378	$68.717	$68.717	$68.717	$68.717	$137.434	$34.964	$23.310			
ITEMS (7.1,7.2,7.3,7.4)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
8. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y COMPLEMENTARIAS A PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y FILTROS	385.508,37	20,20%	0,00%	% P		0,00%	0,00%	14,29%	5,71%	8,33%	8,33%	8,85%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	5,68%		1,61%	1,61%	1,61%	
				$ P		$0	$0	$272.581	$108.897	$157.222	$157.222	$168.880	$54.157	$54.157	$54.157	$54.157	$108.314		$31.280	$31.280	$31.280	
ITEMS (8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
9.ACTIVIDADES NO PREVISTAS (9.1,9.2)	37.369,53	1,96%	0,00%	% P								0,93%				1,03%	1,03%				1,86%	
				$ P								$17.649				$19.720	$19.720				$36.013	
	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.908.011,54**	**100%**	**0%**																			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																						

Reprogramación No.1 · Reprogramación No.2 · Reprogramación No.3 · Reprogramación No.4 · Reprogramación No.5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7,41%	47,25%	47,25%	35,08%	9,27%	22,64%	11,50%	21,51%	69,55%	5,56%	7,68%	7,67%	9,53%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 434.337,35	$ 415.416,99	$ 597.309,03	$ 141.477,93	$ 891.618,70	$ 891.618,70	$ 574.451,11	$ 255.058,13	$ 434.996,47	$ 220.970,61	$ 405.765,45	$ 626.736,06	$ 96.128,43	$ 148.992,00	$ 148.775,67	$ 184.788,58			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	47,25%	94,50%	35,08%	44,35%	66,99%	78,49%	0,00%	69,55%	75,11%	82,80%	90,47%	100,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 434.337,35	$ 849.754,34	$ 1.447.063,37	$ 1.588.541,31	$ 995.361,57	$ 1.886.980,27	$ 1.048.866,84	$ 906.361,11	$ 1.341.357,59	$ 1.562.328,20	$ -	$ 626.736,06	$ 96.128,43	$ 245.120,44	$ 393.896,10	$ 578.684,68			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	5,44%	0%	25%	35,08%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00%	69,55%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 103.742,87	$ -	$ -	$ 474.415,73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,44%	5,44%	30,30%	34,14%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00%	69,55%	69,55%	69,55%	69,55%	69,55%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 103.742,87	$ -	$ -	$ 474.415,73	$ 651.302,98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
TOTALESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 31.000,21	$ -	0%
	$ -	$ -	
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 31.000,21	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -	$ -	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.939.011,76**	**$ -**	**100%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ -**	**$ -**	**$ -**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES						
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO					EJECUTADO
BARRAS	$ Valor					$ Valor
CURVAS						

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: FABIO RICARDO ORTIZ REVELO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:05202167742 ANT.

Firma:
Nombre:ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Representante Legal o su Apoderado
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: WILMAR OROZCO DE AVILA
SUPERVISOR DEL PROYECTO
Municipio de Pueblorrico
Matrícula Profesional No.: 13202150310 BLV

al: Archivo de Gestión del INVIAS.
dora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	01/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA
PROGRAMA DE INVERSIONES ☐
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 078-2022
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CASTALIA -LA PICA (FASE2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CR FASE 2
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2066-2023
INTERVENTOR: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

PLAZO INICIAL: 4.5 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 17 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.939.011,76 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.939.011,76

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA ACTA DE MODIFICACION 2 Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES 1 (18 AGO. A 17 AGO.)-2022	MES 2 (18 SEP. A 17 OCT.)-2022	MES 3 (18 OCT. A 17 NOV.)-2022	MES 4 (28 NOV. A 30 NOV .)-2022	MES 5 (1 DIC. A 31 DIC .)-2022	PRORROGA N1 (MES 1) MES 6 (1 ENE. A 31 ENE .)-2023	PRORROGA N1 (MES 2) MES 7 (1 FEB. A 28 FEB .)-2023	PRORROGA N2 (MES 1) MES 8 (1 MAR. A 31 MAR .)-2023	PRORROGA N3 (MES 2) MES 9 (1 AGO. A 31 AGO.)-2023	PRORROGA N3 (MES 3) MES 10 (1 SEP. A 30 SEP .)-2023	PRORROGA N3 (MES 4) MES 11 (1 OCT. A 31 OCT.)-2023	PRORROGA N4 (MES 5) MES 12 (1 NOV. A 30 NOV .)-2023	PRORROGA N3 (MES 6) MES 13 (1 dic. A 31 DIC .)-2023	PRORROGA N5 (MES 1) MES 14 (1 ENE A 31 ENE)-2024	PRORROGA N3 (MES 2) MES 15 (1 FEB A 29 FEB)-2024	PRORROGA N3 (MES 3) MES 16 (1 MAR A 31 MAR)-2024	PRORROGA N3 (MES 4) MES 17 (1 ABR A 30)-2024	
1. PLACA HUELLA A= 4m; H= 0,18m	$ 577.054,38	30,24%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	14,29%		14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	100%
ITEMS (1.1.1,4.1.5,1.6,1.7,1.8)	$0	0,00%	$0	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$277.453	$277.453		$277.453	$277.453	$277.453	$277.453	$277.453	$277.453	$277.453	$277.453	$277.453	
				$ E																		
				% E																		
2. PLACA HUELLA A= 5m; H= 0,15m	$ 375.650,76	19,69%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,71%	11,45%	11,45%	11,45%	16,63%				3,08%	3,08%		1,51%	1,51%	1,51%	
ITEMS (2.1,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8)	$0	0,00%	$0	$ P	$43.027	$132.942	$132.942	$32.093	$211.052	$211.052	$211.052	$307.457				$56.969	$56.969		$28.107	$28.107	$28.107	
				$ E																		
				% E																		
3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L= 5m	$ -	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			0,00%								
ITEMS (3.3,3.4,3.5,3.6)	$0	0,00%	$0	$ P	$0	$0	$0	-		$14.705	$14.705			$0								
				$ E																		
				% E																		
4. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L= 4m	$ 45.730,51	2,40%	0,00%	% P	0,80%	0,64%	0,96%			0,82%	0,82%					2,40%	2,40%	1,18%				
ITEMS (4.3,4.4,4.5,4.6)	$0	0,00%	$0	$ P	$15.301	$12.257	$18.313			$15.459	$15.459					$45.731	$45.731	$22.555				
				$ E																		
				% E																		
5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE FILTRO	109.349,13	5,73%	0,00%	% P	1,31%	0,00%				2,56%	2,56%	3,63%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	1,05%					50%
ITEMS (5.2,5.3,5.4)	$ -	0,00%	$0	$ P	$24.975	$17.023				$48.736	$48.736	$69.199	$10.106	$10.106	$10.106	$10.106	$20.207					
				$ E																		
				% E																		
6. CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 6.103,44	0,32%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,16%	0,16%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%		0,31%			
ITEMS (6.1)	$0	0,00%	$0	$ P	$15.220	$7.452	$0	$0		$3.052	$3.052		$15.274	$15.274	$15.052	$15.052	$0		$6.102,44			
				$ E																		
				% E																		
7. MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA	$ 371.245,42	19,46%	0,00%	% P				0,00%	0,00%	8,33%	8,33%		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	7,29%	1,80%	1,52%			
ITEMS (7.1,7.2,7.3,7.4)	$0	0,00%	$0	$ P				$1.221	$0	$104.803	$104.803		$68.717	$68.717	$68.717	$68.717	$137.434	$34.964	$21.310			
				$ E																		
				% E																		
8. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y COMPLEMENTARIAS A PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y FILTROS	385.508,37	20,20%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	14,29%	5,71%	8,33%	8,33%	8,33%	8,85%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	5,68%		1,61%	1,61%	1,61%	
				$ P	$0	$0	$272.581	$108.897	$157.222	$157.222	$157.222	$168.880	$54.157	$54.157	$54.157	$54.157	$108.314		$31.280	$31.280	$31.280	
ITEMS (8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
				% P												1,03%	1,03%				1,80%	
9.ACTIVIDADES NO PREVISTAS (9.1,9.2)	37.369,53	1,96%	0,00%	$ P								0,93%				$20.726	$20.726				$35.017	
	$0	0,00%	$0	$ E								$17.839										
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.908.011,54**	**100%**	**0%**																			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																						

Reprogramación No.1 | Reprogramación No.2 | Reprogramación No.3 | Reprogramación No.4 | Reprogramación No.5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	8,97%	8,03%	20,48%	7,41%	47,25%	47,25%	35,08%	9,27%	22,64%	11,50%	21,51%	69,55%	5,56%	7,69%	7,67%	9,53%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 171.122,37	$ 153.222,83	$ 390.756,99	$ 141.477,93	$ 891.616,70	$ 891.616,70	$ 574.451,11	$ 255.058,13	$ 434.998,47	$ 220.970,01	$ 405.765,45	$ 826.736,06	$ 96.128,43	$ 148.992,00	$ 148.775,87	$ 184.788,58				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	8,97%	17,00%	37,48%	44,89%	47,25%	94,50%	35,08%	44,35%	66,99%	78,49%	58,81%	69,55%	75,11%	82,80%	90,47%	100,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 171.122,37	$ 324.344,99	$ 715.101,98	$ 856.579,91	$ 995.361,57	$ 1.886.980,27	$ 1.048.866,84	$ 906.361,11	$ 1.341.357,59	$ 1.562.328,20	$ 1.122.101,59	$ 826.736,06	$ 96.128,43	$ 245.120,44	$ 393.896,10	$ 578.684,68				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	5,44%	0%	25%	35,08%	3,58%	3,72%	9,66%	7,71%	9,32%	0,84%	6,19%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 69.510,28	$ 72.131,24	$ 187.308,54	$ 149.497,81	$ 180.715,90	$ 132.628,40	$ 120.024,83	$ -	$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,44%	5,44%	30,30%	34,14%	37,72%	41,44%	51,10%	58,81%	68,13%	74,97%	81,16%	81,16%	81,16%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 103.742,87	$ -	$ 474.415,73	$ 651.302,98	$ 720.813,26	$ 792.944,50	$ 980.253,03	$ 1.129.750,84	$ 1.310.466,73	$ 1.443.095,14	$ 1.563.119,96	$ -	$ -				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
TOTALESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 31.000,21	$ 31.000,21	100%
	$ -	$ -	
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) :	$ 31.000,21	$ 31.000,21	100%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -	$ -	0%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.939.011,76**	**$ 31.000,21**	**100%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -	$ -	$ -

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES						
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO					EJECUTADO
BARRAS	% Valor					$ Valor
CURVAS	- - - - - -					———

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: FABIO RICARDO ORTIZ BEVELO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:0520216742 ANT.

Firma:
Nombre:ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Representante Legal o su Apoderado
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

nal: Archivo de Gestión del INVIAS.
ora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.4. ACTAS DE COMITE DE OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSP MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 10/02/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. ....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia
Regionales

CONTRATO DE OBRA 078 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión temporal CR Fase 2

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Reunión informativa con el reguardo indigena y los veedores del Sector del Reguardo

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2066 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Zaida Dayana Orjuela Diaz

Desarrollo de la Reunion:

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da inicio al recorrido con los representantes del reguardo indigena Bernandino Panchira el supervisor del invias del contrato de obra, interventoria y el contratista. Este recorrido se desarrolla con el proposito de revisar las intervenciones efectuadas en el sector y resolver las inquietudes del alcance y caracteristicas de las intervenciones por parte del reguardo.
Adelantando el recorrido se genera un compromiso con el reguardo para adelantar las actividades de lleno con material comun en la parte trasera del bordillo con el fin de evitar socavaciones a futuro.

Powered by CamScanner

y de esta manera no alterar el presupuesto del contrato de obra.

Se genera un segundo compromiso que es realizar los 250 mts de mantenimiento para empalmar, la placa huella de la fase 1 con la construccion de la placa huella fase 2. (conformacion).

El contratista debe adelantar reparaciones en la estructura del pavimento indicados por la interventoria, ademas, reparar bardillos y concreto de alcantarillas ya que se evidencia armigueo en concreto.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSP MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 10/02/2024 (Día / Mes / Año)

Johana Gómez	43996521		
José Anyel Tejada	1039920710		
Wilmar Orozco D.A.	9.146606		
DAYRO RIOS M.	1.118 551364		INT. 2066-2023
Javier Solarte	5292458		INVIAS
ZAIDA ORDUEÑA	52709618		Interventoria
Edwin Ospina	98766?2.		RUTCEFZ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

FECHA: 27/02/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 078-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CR FASE 2

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2066 - 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

*SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

*ESTADO DE EJECUCION
*AVANCE DE OBRA (PROGRAMADO VS EJECUTADO)
*RENDIMIENTOS FINANCIEROS
*PLAN DE CONTINGENCIA
*BALANCE DE CONTRATO DE OBRA.
*ACTUALIZACION DE PLATAFORMA SECOP.

FECHA	27/02/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

*Se inicia reunion con la presencia del ingeniero JAVIER SOLARTE por parte del instituto nacional de vias, el ingeniero profesional de apoyo del municipio de Pueblorrico, ademas la presencia del Director de obra Ing. Fabio Ortiz, asi mismo los profesionales de interventoria Ing. Zaida Dayana Orjuela Directora de interventoria 2066, el ingeniero Dayro Eduardo Rios residente de interventoria; reunion la cual tiene como origen el seguimiento tencnico, administrativo y financiero del proyecto en desarrollo, evaluandose el estado del proyecto y el avance desarrollado en el trascurso de la ultima semana.
*Se inicia el comite con el tema 1 correspodiente al avance desarrollado a la fecha describiendo el ingeniero residente de interventoria un avance de 79,40% con respecto a un avance programdo de 84,19% el cual nos arroja un retraso significativo de 4,79%, la interventoria viene analizando el plan de contingencia presentado por el contratista para el desarrollo de las actividades restantes por ejecutar y de esta manera poder culminar proceso constructivo dentro de los tiempos estipulados. *Se solicita a la administracion la reiterada solicitud de adelantar los rendimientos financieros del convenio y de esta manera cumplir con las obligaciones que contiene el convenio. *El contratista debe complir a cabalidad el plan de contingencia presentado con la especificacion de las cuadrillas a implementar por actividad por ejecutar, rendimiento y equipos a utilizar. Todo con base a una fecha de inicio y terminacion por actividad.
*Teniendo en cuenta que se requiere un cierre del alcance fisico de las actividades en desarrollo el supervisor del convenio ing. Javier Solarte solicita a la interventoria en conjunto con el contratista adelantar un balance del contrato para de esta manera concretar un alcance de meta fisica consolidada. *Dentro de las obligaciones dentro del convenio por parte de la administracion municipal y el instituto nacional de vias se genero el compromiso de llevar a cabo la actualizacion de la plataforma de contratacion SECOP de tal manera que se encuentra todo acto administrativo de forma paralela a la celebracion de cada acto administrativo, teneindo en cuenta que aun se encuentran mucha informacion por subir a la plataforma, se reitera la solicitud al municipio de dar cumplimiento a sus obligaciones del convenio.

FECHA: 27/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA	martes, 5 de marzo de 2024	INTERVENTORIA - CONTRATISTA
RENDIMIENTOS FINANCIERO PSE	martes, 5 de marzo de 2024	MUNICIPIO
ACTUALIZACION DE INFORMACION EN EL SECOP	martes, 5 de marzo de 2024	MUNICIPIO
BALANCE DEL PROYECTO	martes, 5 de marzo de 2024	INTERVENTORIA - CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.


2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.


3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:


NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DAYRO EDUARDO RIOS MARIÑO	INGENIERO RESIDENTE	ZAIDA DAYANA ORJUELA	
FABIO ORTIZ	DIRECTOR DE OBRA (Especialista)	UNION TEMPORAL FASE 2	
PROFESIONAL DE APOYO	SECRETARIO DE PLANEACION	ALCALDIA PUEBLORRICO	
ZAIDA DAYANA ORJUELA	DIRECTORA DE INTERVENTORI	ZAIDA DAYANA ORJUELA	
JAVIER SOLARTE	SUPERVISOR	INVIAS	
JAHIRA MILENA GOMEZ	SOCIO AMBIENTAL	ZAIDA DAYANA ORJUELA	


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

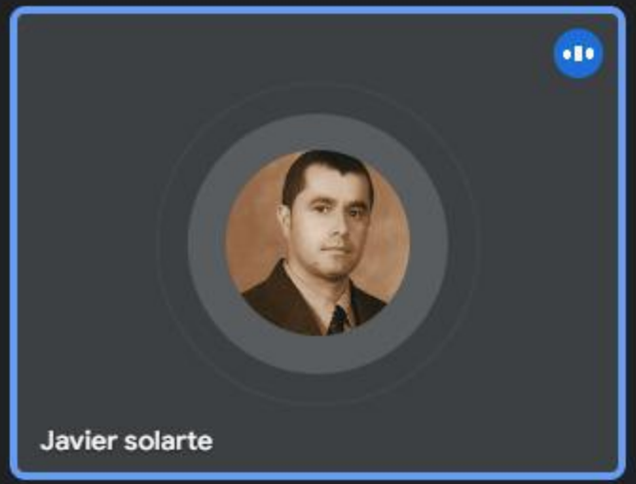


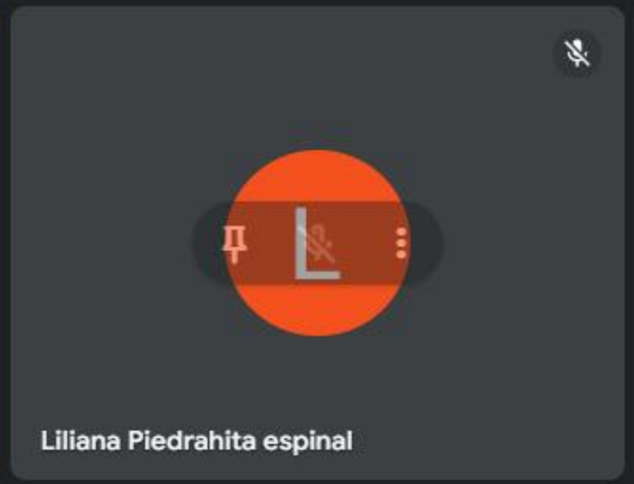




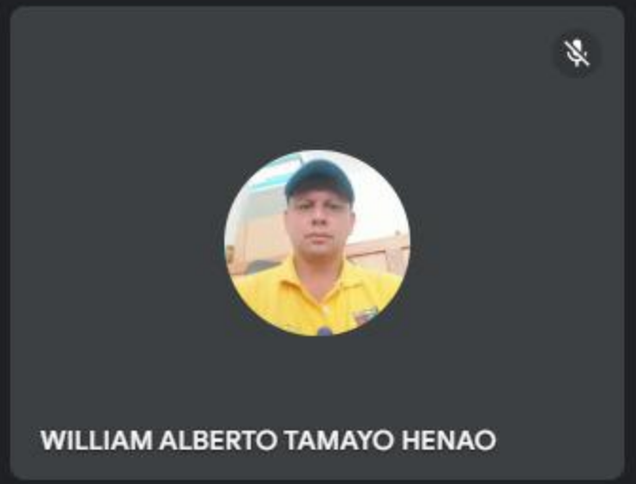

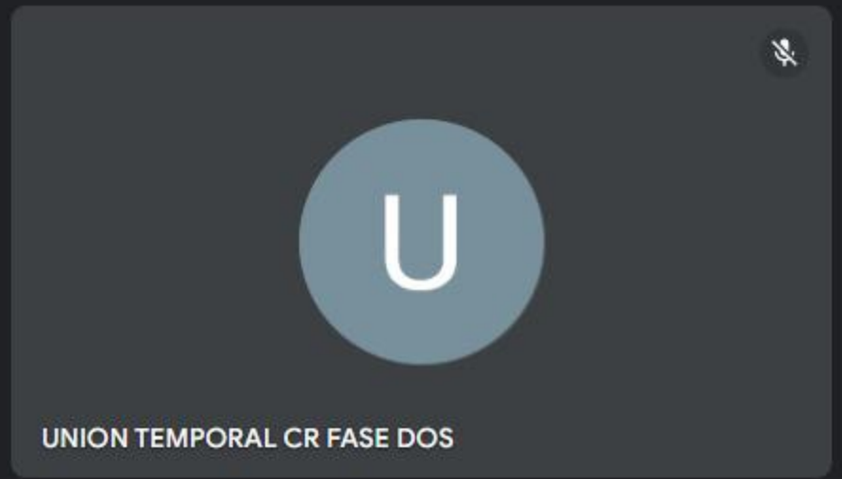

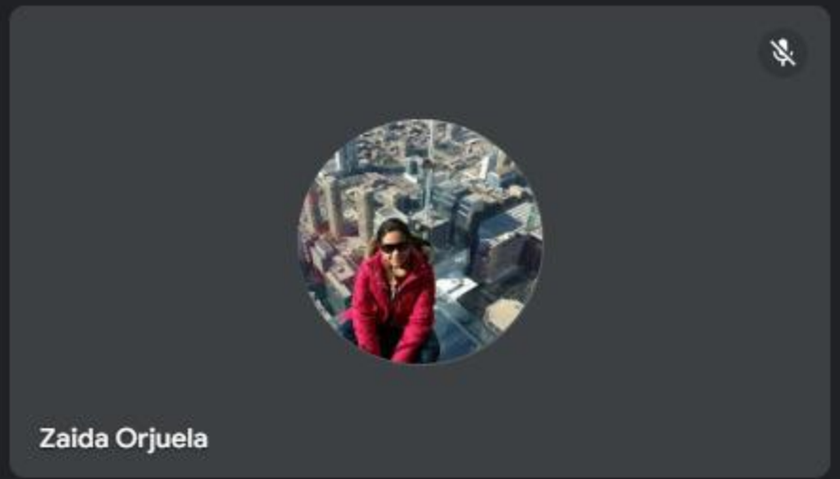

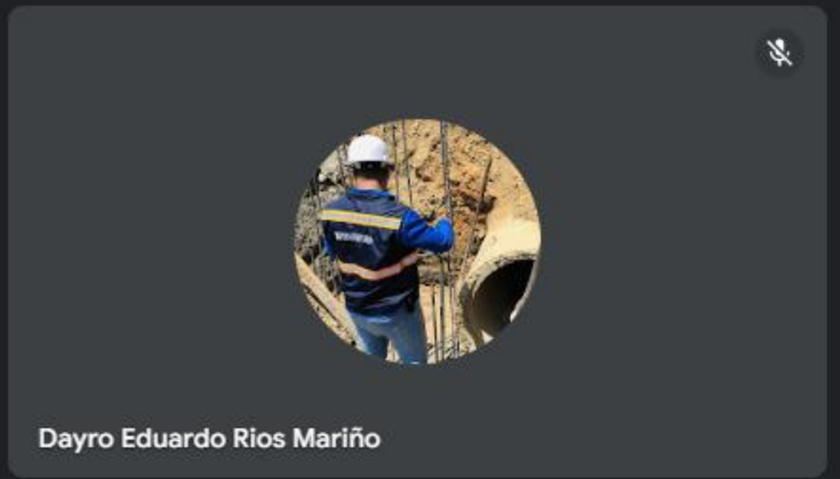

15:43 | iag-bxho-cdc

7

Buscar

ESP

3:43 p. m.
27/02/2024

FECHA: 20/02/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 078-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CR FASE 2

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2066 - 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

*SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

*ESTADO DE EJECUCION
*AVANCE DE OBRA (PROGRAMADO VS EJECUTADO)
*RENDIMINTOS FINANCIEROS
*PLAN DE CONTINGENCIA
*BALANCE DE CONTRATO DE OBRA.
*ACTUALIZACION DE PLATAFORMA SECOP.

FECHA	20/02/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

*Se inicia reunion con la presencia de los ingenier@s CLAUDIA LOPEZ y JAVIER SOLARTE por parte del instituto nacional de vias, el ingeniero WILMAR OROZCO secretario de planeacion del municipio de Pueblorrico, ademas la presencia del Director de obra Ing. Fabio Ortiz, asi mismo los profesionales de interventoria Ing. Zaida Dayana Orjuela Directora de interventoria 2066, el ingeniero Dayro Eduardo Rios residente de interventoria; reunion la cual tiene como origen el seguimiento tencnico, administrativo y financiero del proyecto en desarrollo, evaluandose el estado del proyecto y el avance desarrollado en el trascurso de la ultima semana.

*Se inicia el comite con el tema 1 correspodiente al avance desarrollado a la fecha describiendo el ingeniero residente de interventoria un avance de 76,68% con respecto a un avance programdo de 82,89% el cual nos arroja un retraso significativo de 6,21%, generando esto la solicitud inmediata de la interventoria al señor contratista de implementar un plan de contingencia de forma inmediata para el desarollo de las actividades restantes por ejecutar y de esta manera poder culminar proceso contructivo dentro de los tiempos estipulados.

*Se solicita a la administracion la reiterada solicitud de adelantar los rendimientos financieros del convenio y de esta manera cumplir con las obligaciones que contiene el convenio.

*El contratista debe presentar un plan de contingencia detallado especificando las cuadrillas a implementar por actividad por ejecutar, rendimiento y equipos a utilizar. Todo con base a una fecha de inicio y terminacion por actividad.

*Teniendo en cuenta que se requiere un cierre del alcance fisico de las actividades en desarrollo el supervisor del convenio ing. Javier Solarte solicita a la interventoria en conjunto con el contratista adelantar un balance del contrato para de esta manera concretar un alcance de meta fisica consolidada.

*Dentro de las obligaciones dentro del convenio por parte de la administracion municipal y el instituto nacional de vias se genero el compromiso de llevar a cabo la actualizacion de la plataforma de contratacion SECOP de tal manera que se encuentra todo acto administrativo de forma paralela a la celebracion de cada acto administrativo, teneindo en cuenta que aun se encuentran mucha informacion por subir a la plataforma, se reitera la solicitud al municipio de dar cumplimiento a sus obligaciones del convenio.

FECHA: 20/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
PLAN DE CONTINGENCIA	viernes, 23 de febrero de 2024	CONTRATISTA
INGRESO DE PERSONAL DE OBRA	miércoles, 21 de febrero de 2024	CONTRATISTA
RENDIMIENTOS FINANCIERO PSE	martes, 27 de febrero de 2024	MUNICIPIO
ACTUALIZACION DE INFORMACION EN EL SECOP	martes, 27 de febrero de 2024	MUNICIPIO
BALANCE DEL PROYECTO	martes, 27 de febrero de 2024	INTERVENTORIA - CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 27/02/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.


2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DAYRO EDUARDO RIOS MARIÑO	INGENIERO RESIDENTE	ZAIDA DAYANA ORJUELA	
FABIO ORTIZ	DIRECTOR DE OBRA (Especialista)	UNION TEMPORAL FASE 2	
WILMAR OROZCO	SECRETARIO DE PLANEACION	ALCALDIA PUEBLORRICO	
CLAUDIA LOPEZ	SUPERVISORA	INVIAS	
JAVIER SOLARTE	SUPERVISOR	INVIAS	
ZAIDA DAYANA ORJUELA	DIRECTORA DE INTERVENTORI	ZAIDA DAYANA ORJUELA	
JAHIRA MILENA GOMEZ	SOCIO AMBIENTAL	ZAIDA DAYANA ORJUELA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

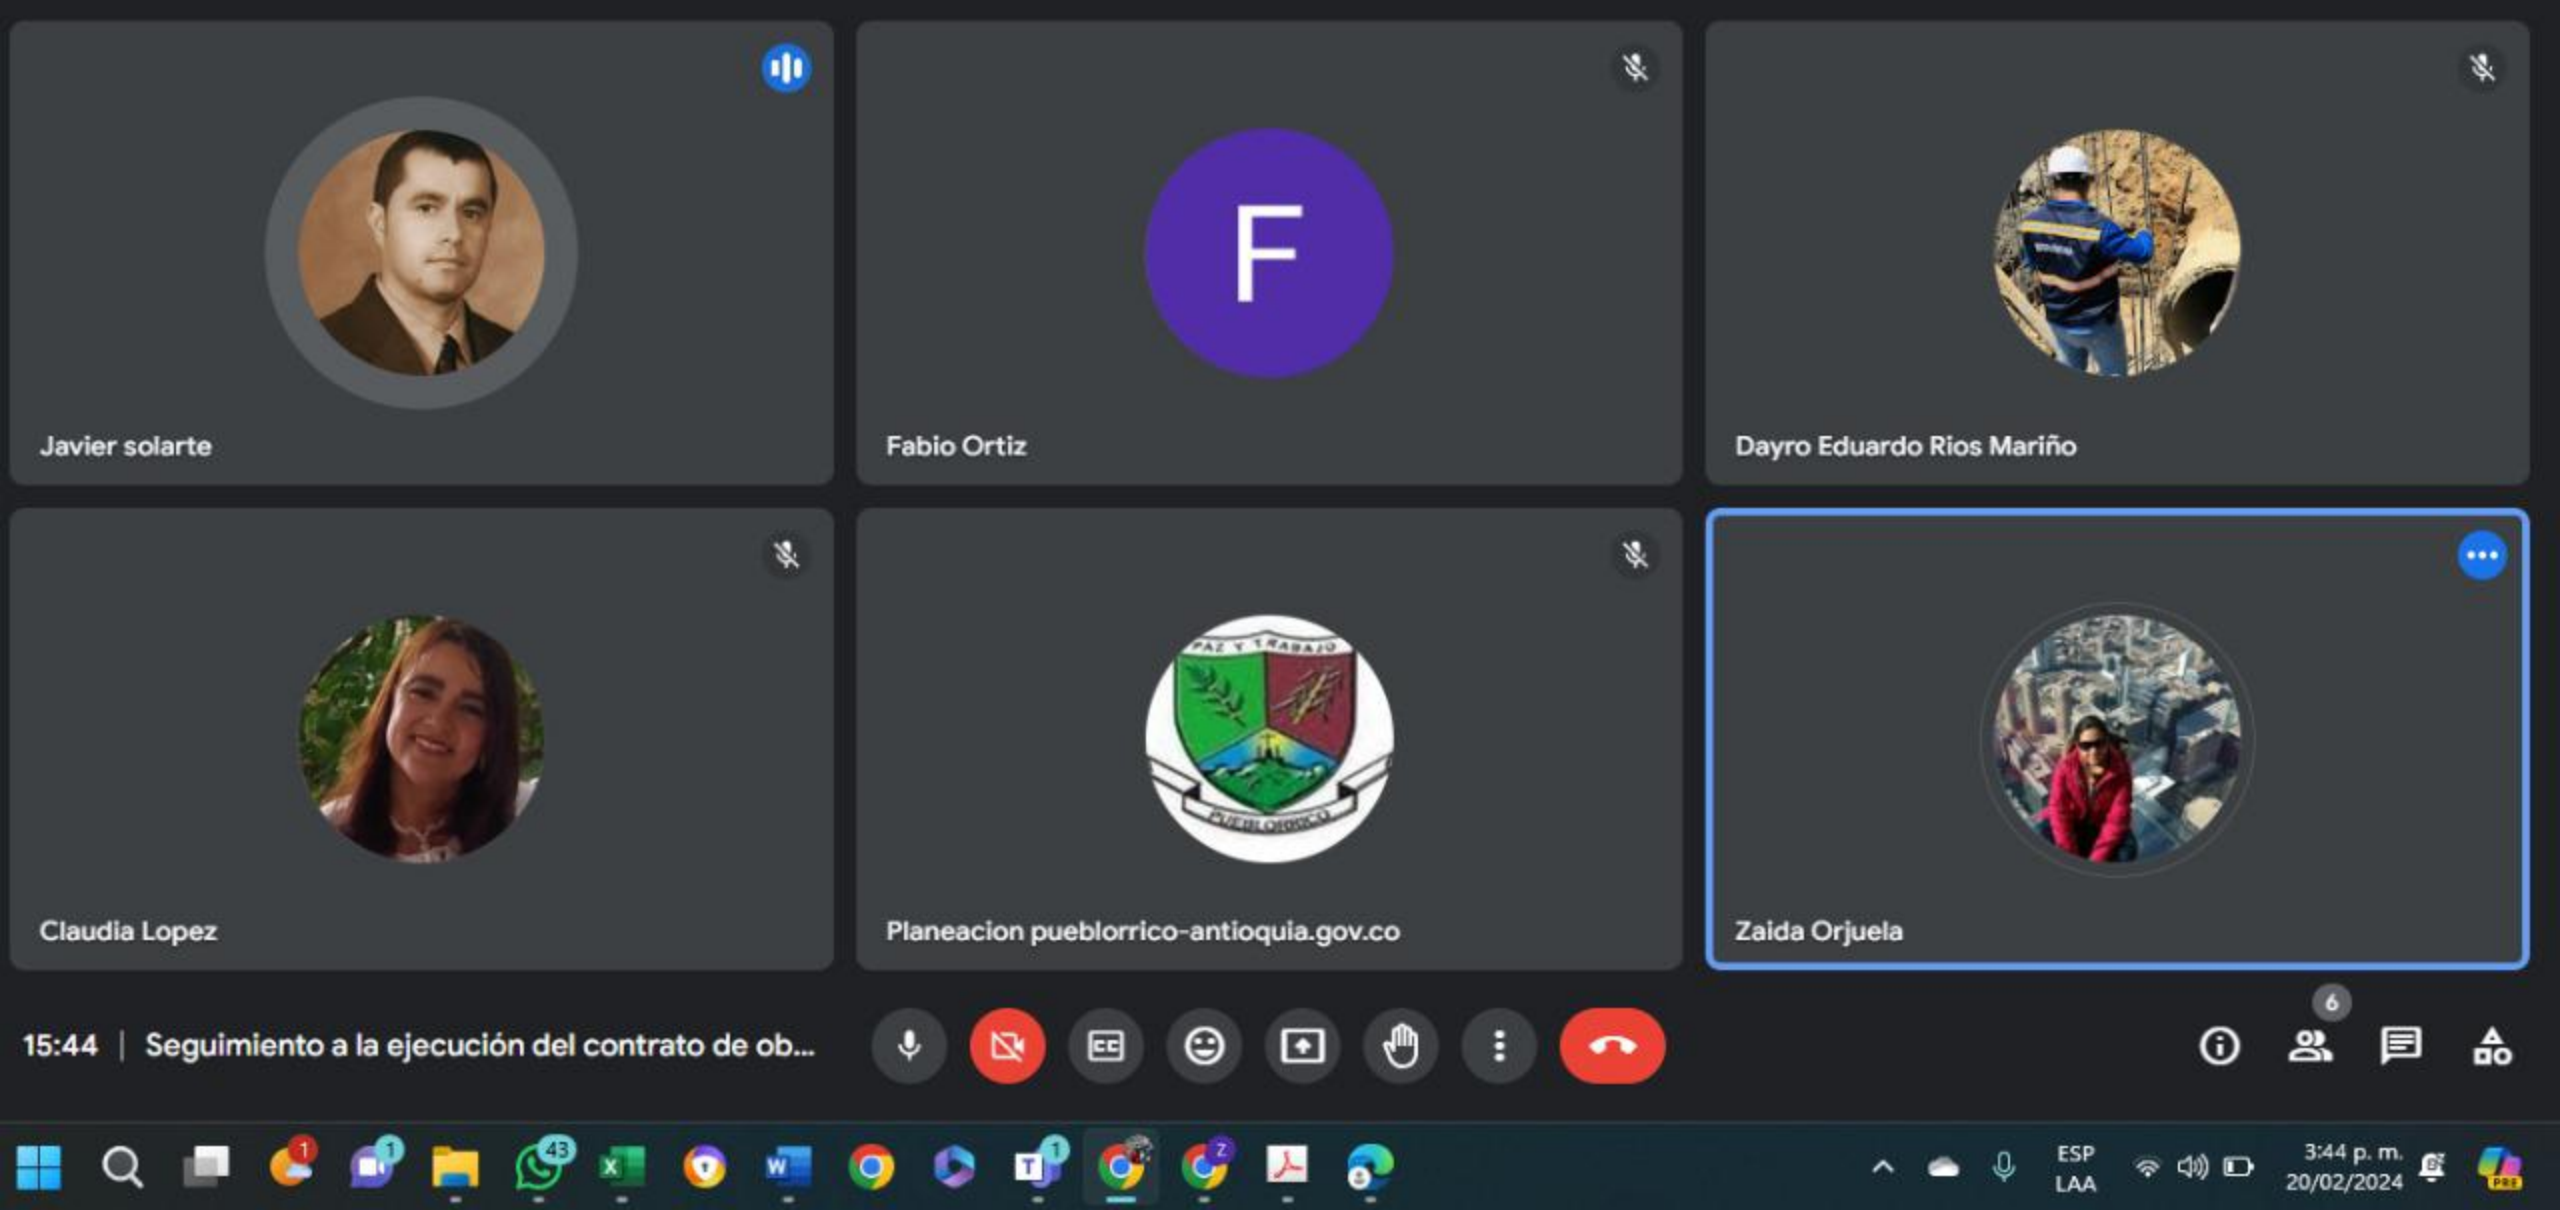
Javier solarte
Fabio Ortiz
Dayro Eduardo Rios Mariño
Claudia Lopez
Planeacion pueblorrico-antioquia.gov.co
Zaida Orjuela
15:44 | Seguimiento a la ejecución del contrato de ob...
6
ESP
LAA
3:44 p. m.
20/02/2024

5. ANEXOS

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

5.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

CORRESPONDENCIA ENVIADA CONTRATO DE INTERVENTORIA 2066 DE 2023 ANTIOQUIA				
CONSEC	**FECHA**	**EMPRESA**	**FUNCIONARIO**	**REFERENCIA**
REF: INFORME DE MANTENIMIENTO DE VIA (PUEBLORRICO)	1/02/2024	INVIAS	Javier Jesús Solarte Portilla	REF: INFORME DE MANTENIMIENTO DE VIA (PUEBLORRICO)
2066-23-INVIAS-ANT- PR-029	1/02/2024	ALCALDIA DE PUEBLORRICO	SECRETARIA DE HACIENDA	Solicitud Devolución rendimientos financieros y remisión de extractos bancarios
2066-23-INVIAS-ANT- FR-022	2/02/2024	MUNICIPIO DE FREDONIA	ALDUBAR DE JESUS VANEGAS MARIN	Solicitud visita para recibo de obras.
Ref: INFORME SEMANALES ENERO - FEBRERO 2023	18/02/2024	INVIAS	Javier Jesús Solarte Portilla	Ref: INFORME SEMANALES ENERO -FEBRERO 2023
2066-23-INVIAS-ANT- PR-029	27/01/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 2	FABIO ORTIZ	llamado de atención por incumplimiento.
2066-23-INVIAS-ANT- PR-030	27/01/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 2	FABIO ORTIZ	Solicitud de hoja de vida de ingeniero residente.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATO DE INTERVENTORIA 2066 DE 2023 ANTIOQUIA				
CONSEC	**FECHA**	**EMPRESA**	**FUNCIONARIO**	**REFERENCIA**
ACTA DE APROBACION DE POLIZAS CONTRATO N° 078-2022	1/02/2024	ALCALDIA DE PUEBLORRICO	planeacion@pueblorrico-antioquia.gov	ACTA DE APROBACION DE POLIZAS CONTRATO N° 078-2022
RE: REF: INFORME DE MANTENIMIENTO DE VIA (PUEBLORRICO)	1/02/2024	INVIAS	JAVIER SOLARTE	RE: REF: INFORME DE MANTENIMIENTO DE VIA (PUEBLORRICO)
Revisión Pagos Mantenimiento y Balance De Obra Pueblorrico	6/02/2024	INVIAS	JAVIER SOLARTE	Revisión Pagos Mantenimiento y Balance De Obra Pueblorrico
Fwd: INFORME DE RENDIMIENTOS - 31340 P.A ANTICIPO UT CR FASE 2	9/02/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 2	FABIO ORTIZ	Fwd: INFORME DE RENDIMIENTOS - 31340 P.A ANTICIPO UT CR FASE 2
Fwd: INFORME DICIEMBRE SST	9/02/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 2	FABIO ORTIZ	Fwd: INFORME DICIEMBRE SST
RV: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2023-CTO 2066 DE 2023	13/02/2024	INVIAS	JAVIER SOLARTE	RV: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2023-CTO 2066 DE 2023
Re: ACTA DE COBRO #2	16/02/2024	ALCALDIA DE FREDONIA	secretariadeplaneacion@fredonia-antioquia.gov.co	Re: ACTA DE COBRO #2
RE: Ref: INFORME SEMANALES ENERO -FEBRERO 2023	19/02/2024	INVIAS	JAVIER SOLARTE	RE: Ref: INFORME SEMANALES ENERO - FEBRERO 2023
Seguimiento a la ejecución del contrato de obra (Fase II)	19/02/2024	INVIAS	JAVIER SOLARTE	INVITACION A REUNION DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 078 DE 2022
Re: Oficio No.11. solicitud de entrega de informes trimestrales No.2.	19/02/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 2	FABIO ORTIZ	Re: Oficio No.11. solicitud de entrega de informes trimestrales No.2.
Fwd: caracterizacion fredonia.	22/02/2024	MAVICON INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA	VIVIANA MARIN	Fwd: caracterizacion fredonia.
infome y radicado caracterizacion fredonia	22/02/2024	MAVICON INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA	VIVIANA MARIN	Fwd: caracterizacion fredonia.
Seguimiento a la ejecución del contrato de obra (Fase II)	26/02/2024	INVIAS	JAVIER SOLARTE	INVITACION A REUNION DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 078 DE 2022
COMPROMISOS ACTA DE REUNION 20/02/2024 PLAN DE CONTINGENCIA Y ENSAYOS DE LABORATORIO OBRAS DE DRENAJE	27/02/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 2	FABIO ORTIZ	COMPROMISOS ACTA DE REUNION 20/02/2024 PLAN DE CONTINGENCIA Y ENSAYOS DE LABORATORIO OBRAS DE DRENAJE

5.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INGENIERA CIVIL
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

INFORME MENSUAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORMACIÓN GENERAL							
FECHA DE INFORME	01 DE MARZO DE 2024	**INFORME No.**	7	**DEL**	1/02/2024	**AL**	29/02/2024
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE FREDONIA Y PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"						







Firma:

ING. DAYRO EDUARDO RIOS MARIÑO
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

5.4 BITACORA DE OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO 1
- OFICIALES 2.
- AYUDANTES 5.
- RESIDENTE DE OBRA 1.
- SISO 1.
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- 1 MINICARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA
- BENTIN 2,5 TON.
- RETROEXCAVADORA.
- MOTONIVELADORA.
- COMPACTADOR 7 TON.

Nota: Se instala. espesores variables de apisonado > 8cm No hay topografia. y se renivela subrasante. muy Profunda

DIR Obra
Fabio Obj

JUEVES, 1 DE FEBRERO 2024.

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN EL SECTOR DE LA PICA CON LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO EN UNA LONGITUD DE 400 M CONTEMPLANDO UN ANCHO DE VIA DE 3,8 m. Y UN ESPESOR DE MATERIA DE 0,8 m.

TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DADAS POR LA INTERVENTORIA SE LE LLEVA A CABO AJUSTE DE MANTENIMIENTO ADELANTADO EN EL SECTOR DE LA PICA YA QUE SE PRESENTA DETERIORO DEL MISMO POR EL ALTO TRAFICO DE VOLQUETAS CON CARGA.

SE LLEVA A CABO RELLENO CON MATERIAL COMUN ALREDEDOR DEL PERIMETRO DE ALETAS DE OBRA TRANSVERSAL UBICADA EN EL SECTOR

DE LA UNION.
SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA VINCULAR MAYOR PERSONAL EN OBRA TENIENDO EN CUENTA QUE SE PRESENTA UN RETRASO A LA FECHA DE 1,78 %.
CLIMA: SECO 7 AM - 5pm
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO 1
- OFICIALES 2
- AYUDANTES 5.
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1.
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- 1 MINI CARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON.
- RETROEXCAVADORA
- MOTONIVELADORA
- COMPACTADOR 7 TON.

Pedro
DIR. OBRA

Nota: Se instalan y suministra. aprox. de Espesor variable min 8cm.

VIERNES 2 DE FEBRERO 2024
SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AFIRMADO EN LOS TRAMOS CON AVANCE DE CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.
LA INTERVENTORIA EN EL SEGUIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD ADELANTA APIQUES PARA LA VERIFICACION DE ESPESORES DE AFIRMADO CORRESPONDIENTES. SE PRESENTAN INCONVENIENTES POR LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN EL DIA GENERANDO RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

CLIMA- SECO 7AM- 1pm.
LLUVIAS INTENSAS. 1pm- 5pm
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO 1
- OFICIALES 2
- AYUNANTES 5
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1.
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- 1 MINICARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR.
- COMPACTADOR TIPO CANGURO
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON.
- RETRO EXCAVADORA
- COMPACTADOR 3 TON.
- MOTONIVELADORA

Espesores de afirmado Variable min 8cm.

Por ahora

SABADO 3 DE FEBLERO 2024
SE RETOMAN ACTIVIDADES COMO LO ES COMUN 7:00 AM CON EL MANTENIMIENTO EN EL SECTOR DE LA PICA. SUMINISTRANDO E INSTALACIÓN MATERIAL AFIRMADO.
SE PRESENTAN PRESIPITACIONES LAS CUALES AFECTAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ADEMAS, UNA VOLQUETA DE LAS CUALES VIENE SUMINISTRANDO MATERIAL SE VARO- GENERANDO CIERRE DE VIA PARA EL INGRESO DE MATERIAL Y GENERANDO MAS RETRASO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
CLIMA- LLUVIAS MODERADAS 7AM - 10 AM
SECO 10 AM - 12 PM

Nota
Espesores Variables de afirmado debido a que no hay topografía
min 8cm.

PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO.
- MAESTRO 1
- OFICIALES 2
- AYUDANTES 5.
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- 1 MINICARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR.
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA. SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON.
- RETROEXCAVADORA
- MOTONIVELADORA.
- COMPACTADOR 7 TON.

Director Obra


DOMINGO 4 DE FEBRERO 2024.
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

LUNES 5 DE FEBRERO 2024.
SE PRESENTAN LLUVIAS CONSTANTES, POR LO CUAL AFECTA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CONFORMACION DE VIA GENERANDO ESTO LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR EL RESTO DEL DIA.
CLIMA: LLUVIAS INTENSAS. 7AM - 5pm
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO
- MAESTRO 1.
- OFICIALES 2
- AYUDANTES 5

- RESIDENTE DE OBRA 1.
- SISO 1.
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- 1 MINICARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA
- BENTIN 2,5 TON.
- RETROEXCAVADORA
- MOTONIVELADORA
- COMPACTADOR 3 TON

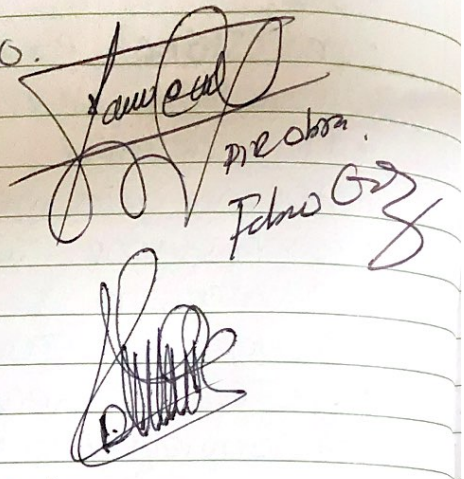

MARTES 6 DE FEBRERO 2024

SE RETOMAN ACTIVIDADES CON LA REORGANIZACIÓN DE LOS TRAMOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS. Y SE CONFORMAN 250 METRO. MAS CONTEMPLANDO EL ANCHO. PREVISTO DE 3,8 m.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES CONSTRUCCION DE OBRA TRANSVERSAL TIPO ALCANTARILLA EN EL SECTOR DEL RESGUARDO CONTEMPLANDO. LAS ESPECIFICACIONES DAS EN EL DISEÑO DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL.

CLIMA: SECO 7AM - 5pm

PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO.

- MAESTRO 1.
- OFICIALES 2
- AYUDANTES 5.
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- 1 MINICARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR

Nota: Se inicia la instalación de 250 ml adicionales de acuerdo a comité virtuales con Interventoría, Invías, y Secretaría de Obras Suministro e instalación de efirmado con equipo completo se instalan espesores variables debido a que no hay comisión Topográfica espesor min 8cm.

- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON
- RETROEXCAVADORA
- MOTONIVELADORA
- COMPACTADOR 7 TON

DIR. OBRA

MIERCOLES. 7 DE FEBRERO 2024
SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL MANTENIMIENTO. EN LOS TRAMOS AFECTADOS POR LLUVIAS. PRESENTADAS EL DIA LUNES; ASI MISMO SE ADELANTA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO EN EL SECTOR DE LA PICA. SE DA INGRESO A RETROEXCAVADORA. PARA EL APOYO DE DE ESTENDIDA DE MATERIAL ACOPIADO. POR LLUVIAS. EL DIA ANTERIOR. Y SE EXTIENDE Y CERRA CON MOTONIVELADORA, CONSIDERANDO UN ESPESOR DE 0,08 m.
SE ADELANTA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO PARA RESISTENCIA DE CONCRETO. DE OBRA TRANSVERSA EN EL TRAMO 2 DEL SECTOR DEL RESGUARDO.
CLIMA: SECO 7 AM - 3 pm
LLUVIAS INTENSAS - 3 pm - 5 pm.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVOS
- MAESTRO 1
- OFICIALES 2
- AYUDANTES 5.
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- 1 MINI CARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR

Nota: Se continua. con instalación y suministro de afirmado. adicional a los 1000 mts proyectados como conformación de calzada y afirmado en zona de modificación N°2.
Sin topografia de acuerdo a Nivel de terreno existente.

DIR. OBRA

- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON.
- RETROEXCAVADORA
- MOTONIVELADORA

Pedro Director Obra

JUEVES 8 DE FEBRERO 2024.
SE ADELANTA ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE UN TRAMO DE 100 METROS, POSTERIORMENTE SE SUMINISTRÓ E INSTALO MATERIAL AFIRMADO CON MOTONIVELADORA LUEGO SE COMPACTO Y SELLADO CON VIBRO COMPACTADOR DE 7 TON. DE ESTA MANERA SE DA UN ALCANCE. 1250 METROS DE CONFORMACIÓN Y AFIRMADO. EN EL SECTOR DE LA PICA, LUEGO DEL SECTOR 2 A INTERVENIR CON PLACA HUELLA.
SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA. INGRESAR MAYOR PERSONAL PARA INTERVENCIÓN DE OBRAS. TRANSVERSALES. Y PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE LA PICA.
CLIMA: SECO 7AM - 5PM.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:

- MAESTRO 1
- OFICIALES 2
- AYUDANTES 5.
- RESIDENTE DE OBRA 1.
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- MINI CARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO
- 1 VOLQUETA SENCILLA

Nota: Se continua con. Suministro e instalación de afirmado adicional. y se escarpa e instala afirmado espesores variables min 8 cm.

Total afirmado 220 mt aprox.
conformacion 150 mL

- BENITIN. 2,5 TON.
- RETRO EXCAVADORA
- COMPACTADOR 7 TON



Viernes, 9 Febrero 2024

Se inician actividades con el suministro e instalación de material afirmado en el tramo conformado por la motoniveladora el día de ayer y de esta manera se procedió a compactar y sellar con vibro compactador de 7 ton. Se realizan tomas de densidades en el afirmado en los primeros 700 ml. instalados y compactados.

Se presenta un imprevisto con la motoniveladora y el propietario la retira por problemas técnicos. teniendo en cuenta el volumen del material retirado por el descapote y conformación de vía se retira este material con la volqueta que posee el contratista

Clima: seco 7 am - 5 pm


Personal de obra y administrativo:

- maestro: 1
- Oficiales: 2
- Ayudantes: 5
- Residente de obra: 1
- SISO: 1
- Profesional ambiental: 1

Equipos y herramientas

- 1 mini cargador
- Herramienta menor
- Compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Benitin 2,5 ton
- Retroexcavadora
- motoniveladora

- Compactador 7 ton



Sabado, 10 de Febrero 2024
Se continua con el mantenimiento vial avantado con el suministro de material afirmado adelantándose el sendado de forma manual y la compactación con el compactador de 7 ton.
Se lleva a cabo visita de obra por parte de la supervisión del convenio, supervisor del municipio, interventoría. y contratista donde seda el seguimiento a las actividades desarrolladas con respecto a las actividades programadas, dándose a unos compromisos por parte del contratista, comunidades e interventoría, en dicho recorrido se atendió a la comunidad del resguardo el cual presento una solicitud de adelantarse un mantenimiento vial sobre los tramos intervenidos entre la fase 1 y Fase 2 del convenio contemplando una longitud de 250m y un ancho promedio de 4m, actividad que seva evaluar por parte de la supervisión si es posible ejecutar teniendo en cuenta el presupuesto del trayecto y de esta manera poder colaborarle a esta comunidad.
Clima: seco 7 am - 12 Pm
Personal de obra y administrativo:
- maestro 1
- Oficiales 2
- Ayudantes 5
- Residente de obra 1
- Director de obra 1
- Siso 1
- Profesional ambiental 1

equipos y herramientas
- 1 mini cargador
- herramienta menor
- compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Bentlin 2,5 ton
- compactador 7 ton



Domingo, 11 de Febrero 2024
No se realizan actividades de avance



Lunes, 12 de Febrero 2024
se retoman actividades de mejoramiento en el sector la pica con la instalación y suministro de sub base en el tramo 2 que competen a 180 metros de placa huella y se compacta con el vibro compactador de 7 ton.
Además, se adelanta relleno con subbase al rededor de la obra transversal del tramo 2 del resguardo indígena para que de esta manera se inicie con la fundida de concreto clase D de esas placas al rededor de la obra.
Se realiza toma de densidades en el mantenimiento Sector la Pica.
Clima: Seco 7 am- 5 pm
Personal de obra y administrativo:
- Maestro 1
- Ayudantes 5
- Oficiales 2

- Residente de obra 1
- SISO 1
- Profesional ambiental 1

Equipos y herramientas

- 1 mini cargador
- Herramienta menor.
- compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Bentin 2,5 ton
- Compactador 7 ton



Martes, 13 de Febrero 2024

Se inician actividades en el sector del resguardo con la continuidad de las actividades de mejoramiento con la instalacion de Formaleta para Sobre anchos en el área de obra transversal contemplando cunetas y filetes, así mismo se Suministra e instala el acero para estos. Además, Se lleva a cabo la excavación en la obra transversal ubicada en el sector de la unión para las aletas del descole, base y muro.

Clima: seco 7 am 5pm

Personal de obra y administrativo:

- maestro 1
- Oficiales: 2
- Ayudantes: 5
- Residente de Obra: 1
- Director de Obra: 1
- SISO: 1
- Personal ambiental: 1

equipos y herramientas

- 1 mini cargador

- Herramienta menor
- Compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Bentin 2,5 ton
- Compactador 7 ton



Miércoles 14 de Febrero 2024
se inician actividades en el sector del resguardo con la continuidad del mejoramiento culminando la instalación de concreto clase D para el tramo faltante de sobre anchos, cunetas y rieles en el area de obra transversal del tramo 2.
se lleva a cabo el suministro de acero a utilizar para placa huella en el sector la pica, adecuación de la zona y construcción de campamento para el corte y figurado del mismo.
Clima: seco 7 am- 5 pm.
Personal de obra administrativo:
- Maestro: 1
- Oficiales: 2
- Ayudantes: 5
- Residente de obra: 1
- Director de obra: 1
- SISO 1
- Profesional ambiental: 1

Equipos y herramientas
- 1 mini cargador
- Herramienta menor
- compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Betin 2,5 ton






Jueves, 15 de Febrero 2024
Se inician actividades como es común en el sector la pica con la continuidad de la instalación de subbase en el tramo 2 dándole niveles y espesor de diseño además de la respectiva compactación para alcanzar densidad requerida.
Así mismo se adelantan actividades en el sector de la unión con la fundida de solado de la base, además se inicia con el corte y figurado de acero de refuerzo para esta misma obra transversal.
En este día se adelantó visita de obra por parte del municipio, interventoría y contratista para efectuar la inspección y levantamiento de áreas y espesores efectuados en el mantenimiento cancelado en el acta parcial 2.
Clima seco 7 am- 5pm
Personal de obra y administrativo:
- Maestro: 1
- Oficiales: 2
- Ayudantes: 5
- Residente de obra: 1
- Director de obra: 1
- SISO: 1
- Profesional ambiental 1

Equipos y herramientas
- 1 mini cargador
- Herramienta menor
- compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla

- Bentin 2,5 ton.



Viernes 16 de Febrero 2024
Se retoma la visita de obra por parte de municipio, interventoría y contratita para la verificación de áreas y espesores del mantenimiento cancelados en el acta parcial 2 y de esta manera dar cumplimiento a la solicitud dada por el supervisor del convenio.
Así mismo se continuo con el desarrollo de actividades de construcción de obra transversal en el sector de la unión.
Clima: seco 7am - 5 pm
Personal de obra y administrativo:
- maestro 1
- oficiales 2
- Ayudantes 5
- Residentes de obra 1
- Director de obra 1
- SISO 1
- profesional ambiental 1


Equipos y herramientas
- 1 mini cargador
- Herramienta menor
- compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Bentin 2,5 ton



Sábado, 17 de Febrero 2024
Se inician actividades como lo es común 7:00Am

con el Suministro e instalación de acero de refuerzo Para obra transversal (descole), Posteriormente a la instalación de acero se Funde concreto Clase D para placa base, e concreto de Fábrica de manera mecánica Co metcladora de 1,5 bultos y se toma muestras de probetas de concreto.
Clima: seco 7 am - 12 pm
Personal de obra y administrativo:
- maestro 1
- oficiales 2
- Ayudantes 5
- Residente de obra 1
- Director de obra 1
- SISO 1
- Profesional ambiental 1

Equipos y herramientas
- 1 mini cargador
- Herramienta menor
- compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Bentin 2,5 ton




Domingo, 18 de Febrero 2024
No se realizan actividades de avance



Lunes, 19 de Febrero 2024
Se retoman actividades de mejoramiento en el sector la Pica iniciando con el corte, Figurado


y amarre de acero de refuerzo para cunetas, placa huellas y vigas. Además, se suministra madera para el encofrado de la placa huella en este sector.
se instala acero de refuerzo horizontal para muros en alcantarilla ubicada en el sector de la unión.
Clima seco 7am - 5 pm
personal de obra y administrativo:
- Maestro 1
- oficiales 2
- Ayudantes 5
- Residente de obra 1
- Siso 1
- Profesional ambiental 1
Equipos y herramientas
- 1 Mini Cargador
- Herramienta menor
- Compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Benitin 2,5 ton



martes, 20 de febrero 2024
Se inican actividades con la comunidad de corte, Figurado y amarre de acero para placa huellas, cunetas y vigas. Así mismo se continua. con la instalación de sub base granular para que de esta manera Se cumpla con el espesor dado en diseño de 30 cm.
Además, en el sector de la unión se inicia con el encofrado de muro, Aletas del descole de la obra transversal.

Clima seco 7am- 5pm
Personal de obra y administrativo:
- maestro 1
- oficiales 2
- Ayudantes 5
- Residente de obra: 1
- SISO 1
- Profesional ambiental 1

Equipos y Herramientas
- 1 mini cargador
- Herramienta menor
- Compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Bentin 2,5 ton



Miércoles, 21 de Febrero 2024
Se inician actividades con el Suministro e instalación de Sub base granular en el tramo 2 sector la pica, la interventoría en el seguimiento técnico del contrato adelanta apiques para la verificación de espesores de sub brase granular instalados. esta compactación se efectúa de manera mecánica y se hace riego con tanques de 1000lt sobre la volqueta.
Además, se continua con el corte, Figurado y amarre de acero de refuerzo para placa huella y también se continúa con la limpieza y mantenimiento de la formaleta.
Clima seco 7 am- 5 pm
personal de obra y administrativo
- maestro 1
- oficiales 2

- Ayudantes 5
- Residente de obra 1
- SISO 1
- Profesional ambiental 1

Equipos y herramientas


- 1 mini cargador
- Herramienta menor
- Compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Retrotin 2,5 ton



Jueves 22 de Febrero de 2024
continuando con actividades de mejoramiento en el sector de la unión realizándose suministro de cemento para adelantar el vaciado de concreto clase D para aletas y muro, además se adelantan rellenos con material de sitio alrededor de las obras transversal tanto de resguardo como el encole de la obra de la unión. En el sector de la pica se continúa con el corte, figurado y amarre de acero de refuerto, además se viene adelantando el suministro de material de agregados para concreto (arena, triturado y piedra gavión)
Clima: seco 7am - 5pm
Personal administrativo

- maestro 1
- oficiales 2
- Ayudantes 5
- Residente de obra 1
- SISO 1
- profesional ambiental 1

. Equipos y herramientas
- 1 mini cargador
- Herramienta menor
- compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla



Viernes 23 de Febrero de 2024
Se inician actividades con la continuidad de corte figurado de acero de refuerzo para bordillo creando las s de amarre el acero longitudinal de la cuneta con el longitudinal del bordillo. También se viene adelantando el suministro y compactación sub base granular. Se continua con el suministro de agregados para concreto y asfalto en el sector de la unión Se adelanta la fundida de aletas y muro del descole de la obra transversal.
Se lleva a cabo charla de seguridad y salud en el trabajo encabezada por la profesional sst con los ayudantes y oficiales de obra tocando temas del buen uso de herramientas e implementación de accesorios como el casco, guantes, gafas y otros.
Clima: Seco 7 am - 5pm
Personal de obra y administrativo:
- maestro 1
- oficiales 2
- ayudantes 5
- Residente de obra 1
- SISO 1
- Profesional ambiental 1
- Equipos y herramientas


- 1 mini cargador
- Herramienta menor
- compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Behitin 2,5 ton




Sabado 24 de Febrero 2024
Se inician actividades con el lleno en zanja existente en el tramo 2 sector la pica, realizándose el lleno en 200ml de zanja en material Fimado y compactación con canguro. esta actividad se realiza con base a lo solicitado por el Supervisor del convenio debido a que se pegue la cuneta al talud y de esta manera recibir el volumen de agua que baja de escorrentia Superficial de la montaña y de esta manera no realizar Filtro solicitando por el contratista. Además, se adelanta el Suministro de materiales requeridos para la fundida de concretos como es el cemento, arena y triturado.
Clima seco 7am - 12 pm
personal de obra y administrativo:
- maestro 1
- Oficiales 2
- Ayudantes 5
- Residente de obra 1
- SISO 1
- Profesional ambiental 1

Equipos y herramientas:
- 1 mini cargador
- Herramienta menor
- compactador tipo canguro

- Volqueta sencilla
- Bentin 2,5 ton



Domingo 25 de Febrero 2024
Hoy se realizan actividades de avance



Lunes 26 de Febrero de 2024
Se retoman actividades con la toma de densidad
para la sub base granular instalada en los
180ml y así mismo se procede a instalar formaleta
para cuneta y placa huella en un tramo de 50ml
ademas se instala acero de refuerzo y se
inicia con la excavación manual para vigas
contemplando un ancho de 20cm y un espesor de 1
Clima seco 7am - 5pm
Personal de obra y administrativo:
- Maestro 1
- Oficiales 2
- Ayudantes 5
- Residente de obra 1
- SISO 1
- Profesional ambiental 1

Equipos y herramientas
- 1 Mini cargador
- Herramienta menor
- Compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Bentin 2,5 ton




martes, 27 de Febrero 2024
Se continua con el encofar un tramo de 50m1 de Placa huella y cuneta, se continúa con la excavación de vigas nostrals y se instala el acero de refuerzo de las vigas.
Teniendo en cuenta el inicio de las actividades placa huella en el sector de la pica, la profesional SST adelanta Charla de seguridad y Salud en el trabajo teniendo en cuenta las actividades a desarrollar y encontrando los diferentes incidentes que se pueden presentar para evitar a futuro accidentes en el area de trabajo
Clima seco 7 am- 5pm
-Persona de obra y administrativo
- Maestro 1
- Oficiales 3
- Ayudantes 4
- Residente de obra 1
- Siso 1
- Profesional ambiental 1
Equipos y herramientas:
- 1 mini cargador
- Herramienta menor
- Compactador tipo canguro
- 1 volqueta Sencilla
- Bentin 2,5 ton

Miercoles 28 de Febrero 2024
Se inician actividades de concreto clase D Placa huella y cuneta, generandose un avance 14 secciones de 3m y asi con la placa huella

en el sector dela pica.
La interventoria adelanta toma de cilindros de concreto para el seguimiento técnico a los concretos usados en este día y de esta manera tomar la calidad del mismo ya que para esta actividad su Resistencia debe ser de 3000 psi.
Clima Seco 7am - 5pm
Personal de obra y administrativo:
- Maestro 1
- Oficiales: 2
- Ayudantes: 5
- Residente de Obra: 1
- SISO: 1
- Profesional ambiental: 1

Equipos y herramientas
- 1 Mini Cargador
- Herramienta menor
- Compactador tipo canguro
- 1 volqueta Sencilla
- Bethlin 2,5 ton.



jueves 29 febrero 2024
Se inician actividades como lo es común 7:00 AM con la instalacion de piedra yalon para concreto ciclópeo, instalación de acero de refuerzo para placa huella, cuneta y vigas Así mismo se continua con la Fundida de concreto clase D para las secciones instaladas y de esta manera cumplir con el plan de contingencia que se presentó a la interventoria en el cual indica un avance

de 45 ml de placa huella 100% cada 7 días.


Clima seco 7 am - 5 pm.

personal de obra y administrativo:

- maestro: 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 7
- Residente de obra: 1
- SISO 1
- Profesional ambiental: 1

EQUIPOS Y herramientas

- 1 mini cargador
- Herramienta menor
- compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Bentlin 2,5 ton.



ING. RESIDENTE INT.

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INGENIERA CIVIL
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

SOPORTE CIFRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

Reporte Semanal - Informacion general del contrato			
Contrato No.	078	Año	2022
Proyecto	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA - LA PICA (FASE2) EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	Programa	COLOMBIA RURAL
Dirección Territorial	Dirección Territorial Antioquia	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
Supervisor del Contrato de Interventoría	Javier Jesús - Solarte Portilla	Gestor Técnico de Proyecto	Rolando Arturo - Espitia Buitrago
Objeto Contrato Obra	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -ADICIÓN No. 2		

|◄◄ ◄◄ 1 2 3 4 ►► ►►|

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
30	30	2024-02-16	2024-02-22	2024-02-22	2024-03-07 16:38			TERMINADO		
29	29	2024-02-09	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-07 16:29			TERMINADO		
28	28	2024-02-02	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-07 16:14			TERMINADO		
27	27	2024-01-26	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-27 10:44	2024-03-04 17:52		TERMINADO		
26	26	2024-01-19	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-26 17:41	2024-03-04 17:48		TERMINADO		
25	25	2024-01-12	2024-01-18	2024-01-18	2024-02-26 17:00	2024-03-04 16:37		TERMINADO		
24	24	2024-01-05	2024-01-11	2024-01-11	2024-02-26 16:29	2024-03-04 16:16		TERMINADO		
23	23	2023-12-29	2024-01-04	2024-01-04	2024-02-26 16:04	2024-03-04 16:11		TERMINADO		
22	22	2023-12-22	2023-12-28	2023-12-28	2024-01-17 11:00	2024-02-19 18:02		TERMINADO		
21	21	2023-12-15	2023-12-21	2023-12-21	2024-01-17 10:49	2024-02-19 17:59		TERMINADO		

|◄◄ ◄◄ 1 2 3 4 ►► ►►|

Regresar

Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	078	Año	2022
Proyecto	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA - LA PICA (FASE2) EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	Programa	COLOMBIA RURAL
Dirección Territorial	Dirección Territorial Antioquia	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
Supervisor del Contrato de Interventoría	Javier Jesús - Solarte Portilla	Gestor Técnico de Proyecto	Rolando Arturo - Espitia Buitrago
Objeto Contrato Obra	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -ADICIÓN No. 2		

1 2 3 4

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
40	40	2024-04-26	2024-05-02	2024-05-02				PROCESO		
39	39	2024-04-19	2024-04-25	2024-04-25				PROCESO		
38	38	2024-04-12	2024-04-18	2024-04-18				PROCESO		
37	37	2024-04-05	2024-04-11	2024-04-11				PROCESO		
36	36	2024-03-29	2024-04-04	2024-04-04				PROCESO		
35	35	2024-03-22	2024-03-28	2024-03-28				PROCESO		
34	34	2024-03-15	2024-03-21	2024-03-21				PROCESO		
33	33	2024-03-08	2024-03-14	2024-03-14	2024-03-19 14:35					
32	32	2024-03-01	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-19 14:25					
31	31	2024-02-23	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-07 16:46	2024-03-18 14:53				

1 2 3 4

Regresar
