INFORME	PERIÓDICO: __X__ UNICO : ____	No.03
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 28 /10/2024 hasta 26/12/2024	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	**$2.975.000.oo (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS) M/CTE**	

CONTRATO No. y FECHA:	2557 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024
NO. PROCESO EN SECOP II	AI-MC-38-2024
SECRETARIA EJECUTORA:	ADMINISTRATIVA
CONTRATISTA:	UPS Y SUMINISTRO AR NIT 33815328 – 9 SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REPUESTOS Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LAS UPS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 28.055.916 VEINTICOHO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. IVA INCLUIDO.
PLAZO	**SESENTA DIAS (60) CALENDARIOS**
VALOR ADICIONAL 01:	$13.506.024.oo (**TRECE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS**)
PRORROGA 01	
FECHA DE ACTA DE INICIO:	28 de Octubre de 2024
FECHA TERMINACION	26 de Diciembre de 2024

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO

El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: 28/10/2024 hasta 26/12/2024, en consecuencia acredita que SI___ NO_X__, se materializo los riesgos del proceso.

RIESGO: No aplica			
CLASE: No aplica	FUENTE: No aplica	ETAPA: No aplica	TIPO: No aplica
CONTROL:	No Aplica		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: No aplica	SE EJECUTA:	SI____	NO____
	ES EFICAZ:	SI____	NO____
	ES EFICIENTE:	SI____	NO____
CONSECUENCIA:	No aplica		
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	No aplica		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

FRECUENCIA:	No aplica
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? No aplica	No aplica
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO_X____ ¿CUÁL?

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma enero 07 de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Jaime Orlando Jaramillo Jaramillo

CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional Universitario

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

ANEXO TECNICO INFORME SUPERVISION

CONTRATO No. y FECHA:	2557 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024
NO. PROCESO EN SECOP II	AI-MC-38-2024
SECRETARIA EJECUTORA:	ADMINISTRATIVA
CONTRATISTA:	UPS Y SUMINISTRO AR NIT 33815328 – 9 SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REPUESTOS Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LAS UPS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 28.055.916 VEINTICOHO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. IVA INCLUIDO.
PLAZO	**SESENTA DIAS (60) CALENDARIOS**
VALOR ADICIONAL 01:	$13.506.024.oo (**TRECE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS**)
PRORROGA 01	N/A
FECHA DE ACTA DE INICIO:	28 de Octubre de 2024
FECHA TERMINACION	26 de Diciembre de 2024

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

De la ejecución del presente contrato para el periodo, correspondiente al tercer pago comprendido entre el 28 de Octubre al 26 Diciembre de 2024, destaca el supervisor que el contratista realizo todas las actividades, correspondientes a la instalación de baterías en las UPS que conforman la **Tabla 02 suministro de baterías** y el mantenimiento a todas las UPS, contenidas en la **Tabla 01 Mantenimiento - UPS de propiedad Administración Municipal,** como soporte de ejecución de la actividad se anexan las ordenes de soporte del contratista de fecha 17 y 18 de Diciembre de 2024. De acuerdo a lo anterior el contratista aporta factura número FEV966 por valor **$2.975.000.oo** (Dos millones novecientos setenta y cinco mil pesos) Iva incluido. Valor que se encuentra aceptado por la supervisión del contrato.

Por lo anterior se firma enero 07 de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Jaime Orlando Jaramillo Jaramillo

CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional Universitario

FIRMA DEL SUPERVISOR:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

ORDEN DE SERVICIO **2732**

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	18 Dic 2024	MARCA	APC
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	20KVA
UBICACIÓN	Transito	MODELO	—
CONTACTO	Jaime Jaramillo	SERIE	—
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	115847

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Bueno

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 123	F2 124	F3 121	N-T 0.1
CORRIENTES	F1 15.4	F2 16.8	F3 20.1	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 120	F2 120	F3 120	N-T 0.1
CORRIENTES	F1 14.0	F2 15.5	F3 18.2	

BATERIAS

MARCA: Ucti ón

REF.: 12 - 7

CANTIDAD: 64

VOLT.Bco. BATERIAS: 212

VOLT. FLOTACIÓN: 214.

MODULO DE POTENCIA: _____

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se hace limpieza interna y Externa ups. Se hacen pruebas de autonomía con carga presentando buen funcionamiento
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:	HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO

PROTOCOLO UPS

FECHA	18 Dic 2024	MARCA	titan
CLIENTE	Alcaldia Ibague	POTENCIA	10 KVA.
UBICACIÓN	Casa de justicia	MODELO	Powest 10 KVA.
CONTACTO	Jaime yaramillo	SERIE	131219-44270012
CIUDAD	Ibague.	PLACA	

TRABAJOS A REALIZAR

Mantenimiento Preventivo

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Dañado

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión			
Tablero Eléctrico			
Bornera de Conexión			
Carcasa			
Display			
Breakers			
Bypass Interno			
Bypass Externo			
Limpieza del Equipo			
Ventilación			
Iluminación			
Refrigeración			

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

BATERIAS

MARCA: _____

REF.: _____

CANTIDAD: _____

VOLT.Bco. BATERIAS: _____

VOLT. FLOTACIÓN: _____

TEMPERATURA: _____

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se encontra ups. fuera de servicio Se recomienda Cambio de Equipo por tiempo cumplido de vida util. Se le hace limpieza interna y Externa.
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:	HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO **2737**

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	17 - DIC 2024	MARCA	TITAN
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	10KVA
UBICACIÓN	SISTEMAS	MODELO	
CONTACTO		SERIE	140115-11820024
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Apagado.

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión			
Tablero Eléctrico			
Bornera de Conexión			
Carcasa			
Display			
Breakers			
Bypass Interno			
Bypass Externo			
Limpieza del Equipo			
Ventilación			
Iluminación			
Refrigeración			

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

BATERIAS

MARCA

REF

CANTIDAD

VOLT Bco BATERIAS

VOLT FLOTACION

MODULO DE POTENCIA

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se hace limpieza interna y Externa. UPS fuera de servicio, Se recomienda Cambio de Equipo por pieza Util. Presenta daño en Potencia, Cargador, Baterias.
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:	HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2724

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	17 OIC 2024	MARCA	PEI
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	15KVA
UBICACIÓN	ALCALDIA	MODELO	
CONTACTO		SERIE	U1512086624323625
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	

TRABAJOS A REALIZAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Apagado.

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión			
Tablero Eléctrico			
Bornera de Conexión			
Carcasa			
Display			
Breakers			
Bypass Interno			
Bypass Externo			
Limpieza del Equipo			
Ventilación			
Iluminacion			
Refrigeración			

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

BATERIAS

MARCA

REF

CANTIDAD

VOLT Eco BATERIAS

VOLT FLOTACION

MODULO DE POTENCIA

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se encuentra UPS fuera de Servicio; se le hace limpieza interna y externa, se recomienda cambio de equipo ya cumplio su vida Util
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:	HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
.Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2736

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	17 DIC 2024	MARCA	TITAN
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	30KVA
UBICACIÓN	Alcaldia	MODELO	POWEST
CONTACTO		SERIE	B202130017A01
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Bueno

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	110	F2	112	F3	115	N-T
CORRIENTES	F1		F2		F3		07

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	120	F2	120	F3	120	N-T
CORRIENTES	F1		F2		F3		0,1

BATERIAS

MARCA Vetion

REF 12-55

CANTIDAD 40

VOLT Bco BATERIAS 480

VOLT FLOTACION 274

MODULO DE POTENCIA

ACTIVIDADES REALIZADAS Se hace limpieza interna y Externa UPS se hacen pruebas de autonomia con carga presentando buen funcionamiento.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CONTRATISTA

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406

Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75

E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO

PROTOCOLO UPS

FECHA	17 Dic 2024	**MARCA**	Nicomar
CLIENTE	Alcaldia Ibague	**POTENCIA**	20 kva
UBICACIÓN	Alcaldia	**MODELO**	5120r
CONTACTO	Jaime Jaramillo	**SERIE**	13702B0013A0f
CIUDAD	Ibague	**PLACA**	110247

TRABAJOS A REALIZAR

Mantenimiento Preventivo

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Apagado

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión			
Tablero Eléctrico			
Bornera de Conexión			
Carcasa			
Display			
Breakers			
Bypass Interno			
Bypass Externo			
Limpieza del Equipo			
Ventilación			
Iluminación			
Refrigeración			

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

BATERIAS

MARCA: _____

REF.: _____

CANTIDAD: _____

VOLT.Bco. BATERIAS: _____

VOLT. FLOTACIÓN: _____

TEMPERATURA: _____

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se encuentra UPS. fuera de Servicio se hace limpieza interna y Externa. Se recomienda Cambio de equipo ya cumplio vida util.
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:	**HORA:**

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO

PROTOCOLO UPS

FECHA	17 dic 2024	MARCA	PEI
CLIENTE	Alcaldia Ibague	POTENCIA	15 KVA
UBICACIÓN	Rentas	MODELO	—
CONTACTO	Jaime Jaramillo	SERIE	015170B 662432 3635
CIUDAD	Ibague	PLACA	112588

TRABAJOS A REALIZAR

Mantenimiento Preventivo

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Apagado

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión			
Tablero Eléctrico			
Bornera de Conexión			
Carcasa			
Display			
Breakers			
Bypass Interno			
Bypass Externo			
Limpieza del Equipo			
Ventilación			
Iluminación			
Refrigeración			

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

BATERIAS

MARCA: _____

REF.: _____

CANTIDAD: _____

VOLT.Bco. BATERIAS: _____

VOLT. FLOTACIÓN: _____

TEMPERATURA: _____

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se encuentra UPS. fuera de servicio se le hace limpieza interna y externa se recomienda cambio de equipo ya cumplio su vida util

RECOMENDACIONES TÉCNICAS:

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO 2727

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	17 Dic 2024	MARCA	NETION
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	10KVA
UBICACIÓN	SISBEN	MODELO	EA901011RS
CONTACTO	Jaime Jaramillo	SERIE	900102012100156
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	115664

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Bueno

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	124	F2	123	F3	/	N-T 0.1
CORRIENTES	F1	10.4	F2	8.5	F3	/	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	120	F2	120	F3	/	N-T 0.1
CORRIENTES	F1	01.5	F2	7 5	F3	/	

BATERIAS

MARCA: Netion

REF.: 12-7

CANTIDAD: 26

VOLT.Bco. BATERIAS: 196

VOLT. FLOTACIÓN: 214

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se hace limpieza interna y Externa ups. Se hacen pruebas de autonomia, con carga presentando buen funcionamiento
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:	HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO **2731**

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	17 Dic 2024	MARCA	APC
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	10KVA
UBICACIÓN	Alcaldia	MODELO	SMART 10000
CONTACTO	Jaime Jaramillo	SERIE	
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: buen o

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración			

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	126	F2	124	F3	/	N-T 0.1
CORRIENTES	F1	7.4	F2	7.8	F3	/	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	120	F2	120	F3	/	N-T 0.1
CORRIENTES	F1	6.3	F2	6.4	F3	/	

BATERIAS

MARCA: Netron

REF.: 12.5

CANTIDAD: 32

VOLT.Bco. BATERIAS: 196

VOLT. FLOTACIÓN: 217

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Se hace limpieza interna y externa ups. Se hacen pruebas de autonomia con carga presentando buen funcionamiento

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO **2735**

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	17 Dic. 2024	**MARCA**	FENTON
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	**POTENCIA**	3KVA
UBICACIÓN	vivelab San Pedro Alejandrino	**MODELO**	—
CONTACTO	Salma Jaramillo	**SERIE**	500110110266E8100055
CIUDAD	IBAGUE	**PLACA**	115476

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: buena

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	—		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 125	F2 /	F3 /	N-T 0.1
CORRIENTES	F1 3.1	F2 /	F3 /	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 120	F2 /	F3 /	N-T 0.1
CORRIENTES	F1 2.7	F2 /	F3 /	

BATERIAS

MARCA: Nelson

REF.: 12-7

CANTIDAD: 8

VOLT.Bco. BATERIAS: 96

VOLT. FLOTACIÓN: 115

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Se hace limpieza interna y Externa ups. Se hacen pruebas de autonomia con carga presentando buen funcionamiento

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO **2726**

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	17 - Dic - 2024	**MARCA**	TITAN
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	**POTENCIA**	20KVA
UBICACIÓN	POT	**MODELO**	EA9920
CONTACTO	Jaime Jaramillo	**SERIE**	1142006251
CIUDAD	IBAGUE	**PLACA**	114035

TRABAJOS A REALIZAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Bueno

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	125	F2	124	F3 122	N-T 0.1
CORRIENTES	F1	10.8	F2	11.5	F3 12.3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	120	F2	120	F3 120	N-T 0.1
CORRIENTES	F1	9.2	F2	10.5	F3 11.1	

BATERIAS

MARCA: Nelson

REF.: 12. 55

CANTIDAD: 40

VOLT.Bco. BATERIAS: 120

VOLT. FLOTACIÓN: 132

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se hace limpieza interna y externa UPS Se hacen pruebas de autonomia, con Carga presentando buen funcionamiento
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406

Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75

E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2022

ORDEN DE SERVICIO **2730**

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	17 - Dic - 2024	MARCA	TITAN
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	6KVA
UBICACIÓN	Cultura	MODELO	Titan 6 KVA.
CONTACTO	Jaime Jaramillo	SERIE	161013-90520007
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	115965

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Bueno

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	123	F2	122	F3	/	N-T 0.1
CORRIENTES	F1	6.3	F2	5.1	F3	/	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	120	F2	120	F3	/	N-T 0.1
CORRIENTES	F1	5.8	F2	4.6	F3	/	

BATERIAS

MARCA: Nelson

REF.: 12-7

CANTIDAD: 20

VOLT.Bco. BATERIAS: 240

VOLT. FLOTACIÓN: 271

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Se hace limpieza interna y Externa ups. se hacen pruebas de autonomia, Con Carga presentando buen funcionamiento

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO **2733**

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	17 - Dic - 2024	MARCA	CDP
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	3KVA
UBICACIÓN	vivelab Ferias	MODELO	
CONTACTO	Jaime Saramillo	SERIE	
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	115633

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Bueno

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración			

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	124	F2	/	F3	/	N-T 0,1
CORRIENTES	F1	2,4	F2	/	F3	/	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	120	F2	/	F3	/	N-T 0,1
CORRIENTES	F1	2,1	F2	/	F3	/	

BATERIAS

MARCA: Nation

REF.: 12-7.

CANTIDAD: 6

VOLT.Bco. BATERIAS: 72

VOLT. FLOTACIÓN: 81

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se hace limpieza interna y Externa ups. Se hacen pruebas de autonomia con carga presentando buen funcionamiento
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

VERSION: 01
FECHA: 28/03/2022

ORDEN DE SERVICIO **2734**

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	18 - Dic 2024	MARCA	FENTON
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	3KVA
UBICACIÓN	vivelab PVP JORDAN	MODELO	
CONTACTO	Jaime Jaramillo	SERIE	500110110 26E88200
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	115438

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Bueno

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 121	F2 /	F3 /	N-T 0,1
CORRIENTES	F1 3.6	F2 /	F3 /	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 120	F2 /	F3 /	N-T 0.1
CORRIENTES	F1 3.2	F2 /	F3 /	

BATERIAS

MARCA: Nation

REF.: 12-7

CANTIDAD: 8

VOLT.Bco. BATERIAS: 96

VOLT. FLOTACIÓN: 110

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se hace limpieza interna y Externa UPS. Se hacen pruebas de autonomia con carga presentando buen funcionamiento
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:	HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

VERSION: 01
FECHA: 28/03/2022

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO

PROTOCOLO UPS

FECHA	17 Dic 2024.	**MARCA**	DEI
CLIENTE	Alcaldia Ibague	**POTENCIA**	15 KVA.
UBICACIÓN	Alcaldia	**MODELO**	
CONTACTO	Jaime Jaramillo	**SERIE**	U15120866243236 25
CIUDAD		**PLACA**	

TRABAJOS A REALIZAR

Mantenimiento Preventivo

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Apagado

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión			
Tablero Eléctrico			
Bornera de Conexión			
Carcasa			
Display			
Breakers			
Bypass Interno			
Bypass Externo			
Limpieza del Equipo			
Ventilación			
Iluminación			
Refrigeración			

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

BATERIAS

MARCA: _____

REF: _____

CANTIDAD: _____

VOLT.Bco. BATERIAS: _____

VOLT. FLOTACIÓN: _____

TEMPERATURA: _____

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se encuentra ups. fuera de servicio se le hace limpieza interna y externa se recomienda cambio de equipo este ya cumplio su vida util
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:	**HORA:**

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO [ ]

PROTOCOLO UPS

FECHA	17 Dic 2024	**MARCA**	Netron
CLIENTE	Alcaldia Ibague	**POTENCIA**	10 KVA.
UBICACIÓN	Educacion	**MODELO**	—
CONTACTO	Jaime Jaramillo	**SERIE**	—
CIUDAD	Ibague.	**PLACA**	110370

TRABAJOS A REALIZAR

Mantenimiento Preventivo

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Bueno

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración			

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 124	F2 123	F3 /	N-T 0.1
CORRIENTES	F1 12.6	F2 14.5	F3 /	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 120	F2 120	F3 /	N-T 0.1
CORRIENTES	F1 12.1	F2 13.8	F3 /	

BATERIAS

MARCA: Netron

REF.: 12-7

CANTIDAD: 16

VOLT.Bco. BATERIAS: 196

VOLT. FLOTACIÓN: 217

TEMPERATURA: —

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se hace limpieza interna y externa ups. Se hacen pruebas de autonomia con carga pero da muy poca por agotamiento bateprios
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	Se sugiere Cambio 16 baterias Ref 12.7.

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:	HORA:
—	

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO **2723**

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	17. Dic 2024	MARCA	TITAN
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	3KVA
UBICACIÓN	UAO	MODELO	Titan 3 kva.
CONTACTO	Jaime Jaramillo	SERIE	091211-10480025
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	

TRABAJOS A REALIZAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Bueno

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	123	F2	/	F3	N-T	0.2
CORRIENTES	F1	4.2	F2	/	F3		

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	120	F2	/	F3	N-T	0.1
CORRIENTES	F1	3.6	F2	/	F3		

BATERIAS

MARCA: Vetion

REF.: 12. 7

CANTIDAD: 6

VOLT.Bco. BATERIAS: 72

VOLT. FLOTACIÓN: 81

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se hace limpieza interna y externa ups. Se hacen pruebas de autonomia con carga presentando buen funcionamiento
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:	HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO **2722**

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	17. Dic 2024	MARCA	TITAN
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	3KVA
UBICACIÓN	UAO	MODELO	titan 3 kva
CONTACTO	Jaime Jaramillo	SERIE	091211-10480026
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	

TRABAJOS A REALIZAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Bueno

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración			

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	122	F2	/	F3	/	N-T 0,2
CORRIENTES	F1	3.1	F2	/	F3	/	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	120	F2	/	F3	/	N-T 0,2
CORRIENTES	F1	2.9	F2	/	F3	/	

BATERIAS

MARCA: Vetion.

REF.: 12-7

CANTIDAD: 8

VOLT.Bco. BATERIAS: 104.

VOLT. FLOTACIÓN: 110

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se hace limpieza interna y Externa ups. Se hacen pruebas de autonomía con carga presentando buen funcionamiento
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio


FIRMA Y SELLO CLIENTE	HORA:


Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

ACOMPAÑAMIENTO A SERIVIVIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UPS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA

ALCALDÍA PALACIO



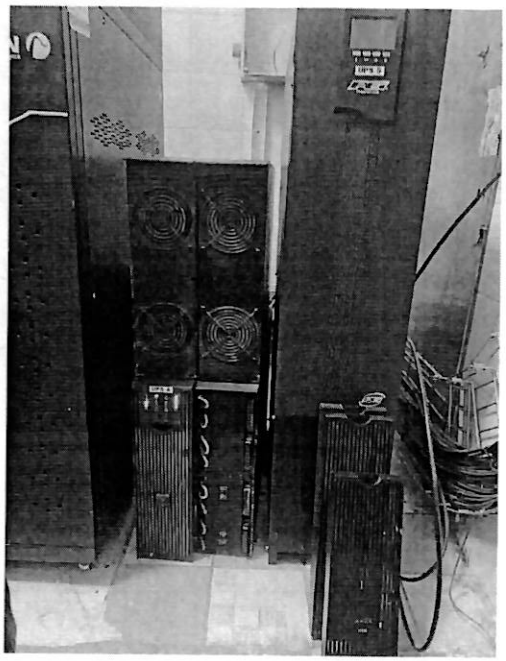


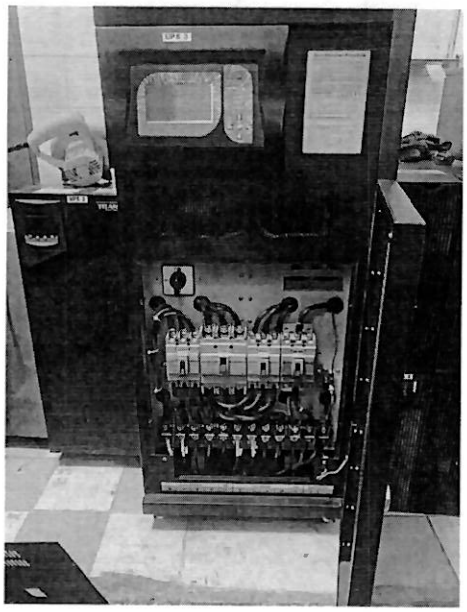






ALCALDÍA PALACIO

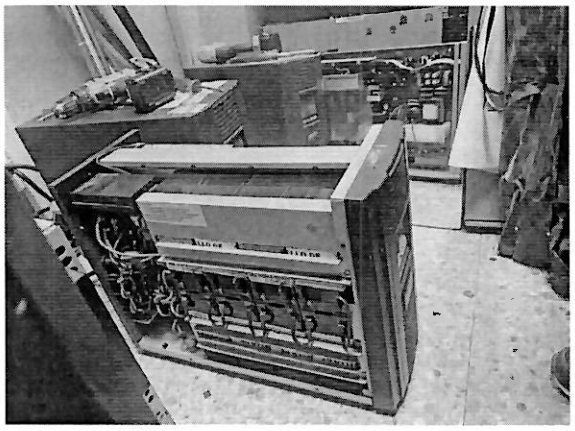


UAO




UAO

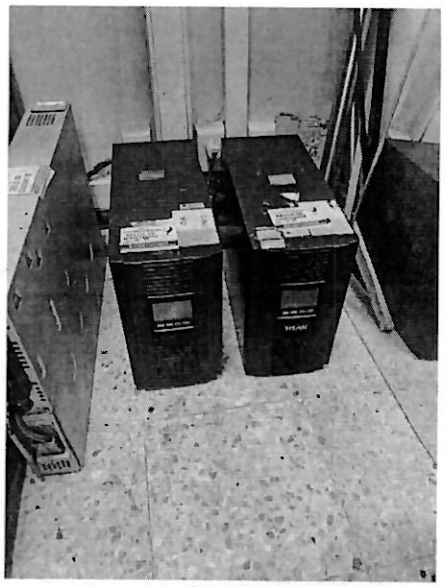

UAO

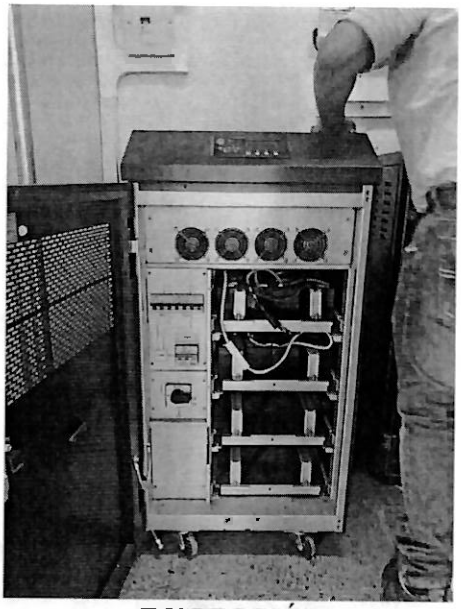

INSPECCIÓN 1

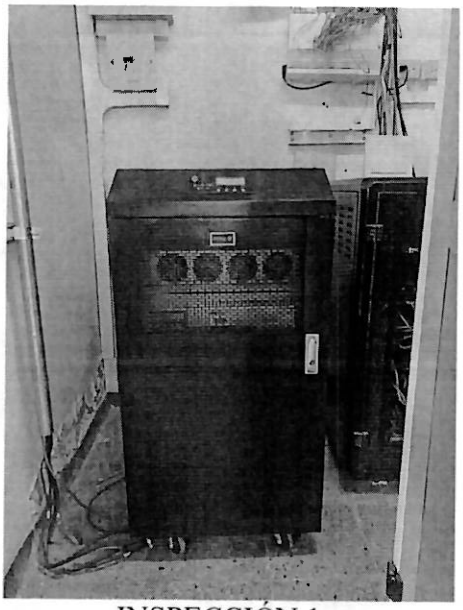

INSPECCIÓN 1




CULTURA




CULTURA



CULTURA

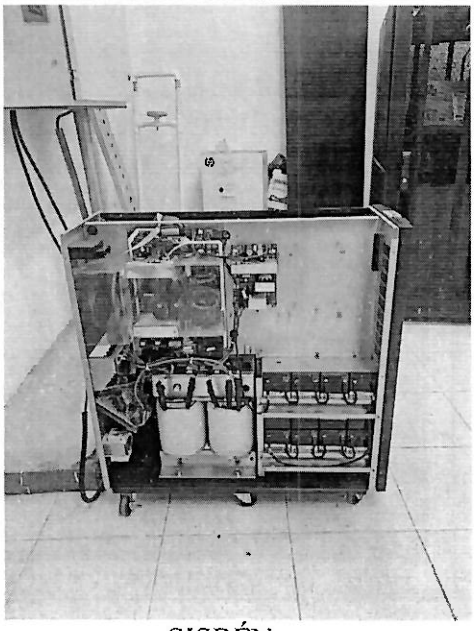


SISBÉN

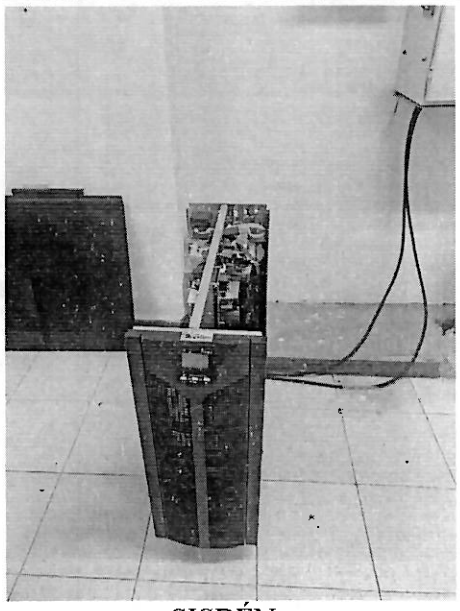


SISBÉN



SISBÉN

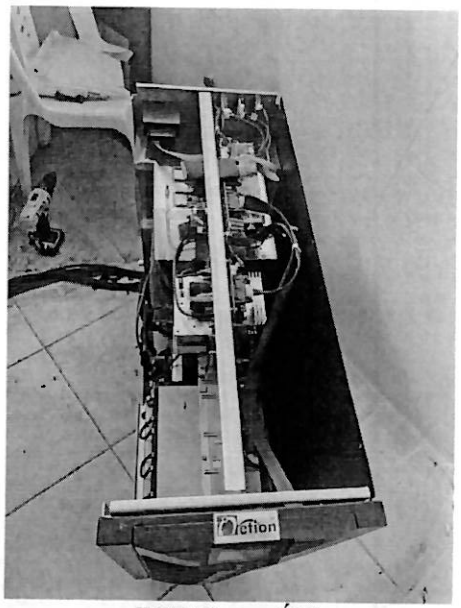


EDUCACIÓN

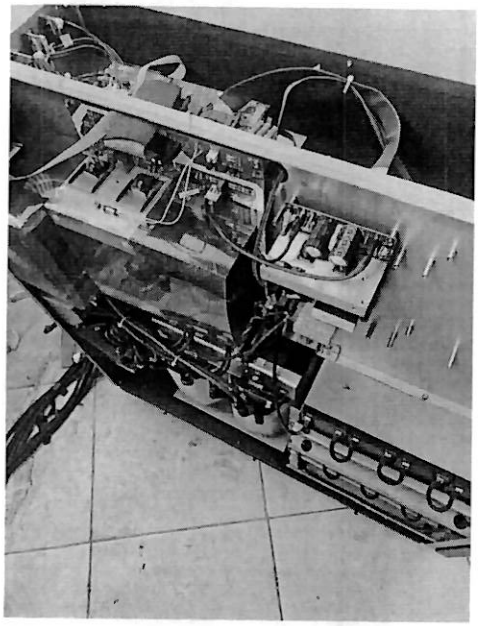


EDUCACIÓN




EDUCACIÓN

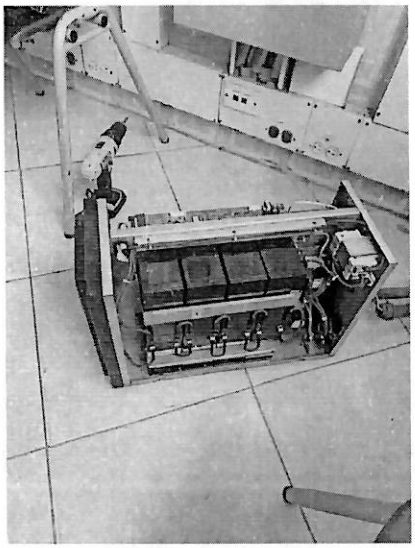


SAN PEDRO ALEJANDRINO

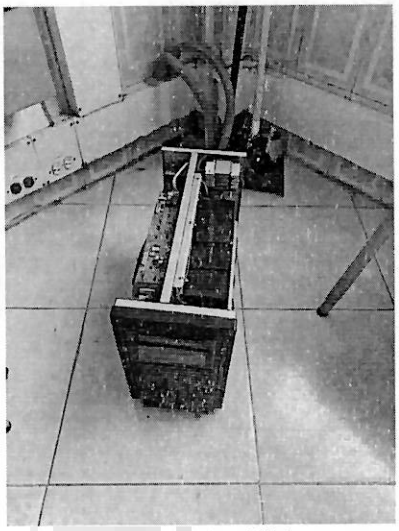


SAN PEDRO ALEJANDRINO

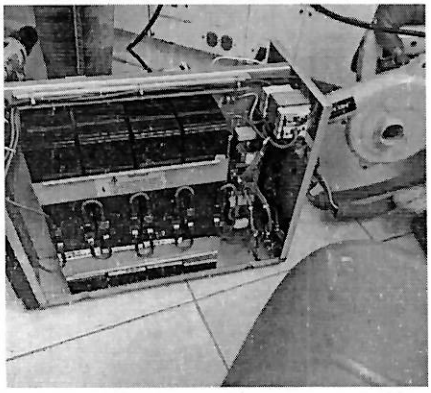


SAN PEDRO ALEJANDRINO

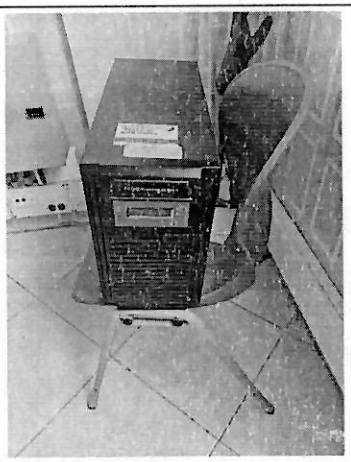

SAN PEDRO ALEJANDRINO

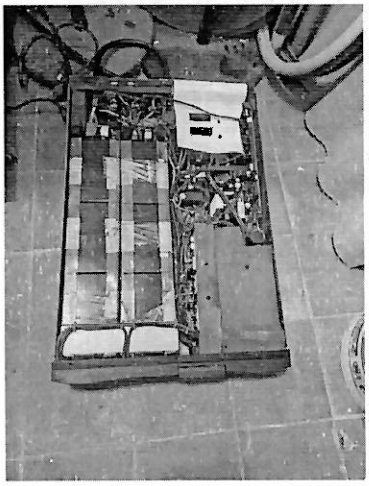

LAS FERIAS

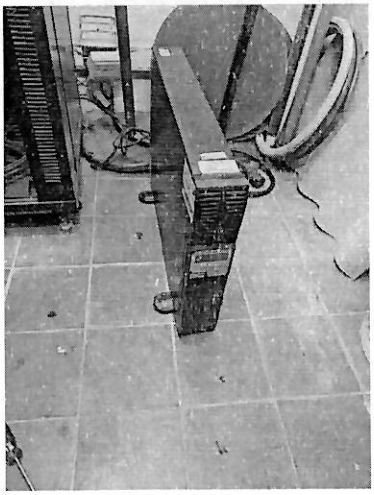

LAS FERIAS
