	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 078 DE 2022 **Contratista:** UNION TEMPORAL CR FASE 2

Contrato de Interventoría No. 2066 DE 2023 **Interventoría:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Objeto Contrato de Obra:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INFORME MENSUAL No. 8 **MES O PERIODO:** MARZO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		11
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		14
3.1	Información general del contrato		14
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		16
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		18
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	18
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	18
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	18
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	19
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	19
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	19
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	19
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	19
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		19
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	19
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	20
	• Seguimiento Programa de Obra		20
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	20
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	20
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	20
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	20
	Conclusiones y recomendaciones		21
5	**Anexos**		22
5.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		22
5.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		22
5.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		22
5.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		22

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: JAVIER JESUS SOLARTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. ____45___ de fecha __10 DE JULIO DE 2023_____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** MARZO

CONTRATO DE OBRA No.: 078 DE 2022

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CR FASE 2

PLAZO INICIAL: 4 meses y 14 dias
FECHA DE INICIO: 18/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/03/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/08/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 16 MESES Y 14 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.939.011.755,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.939.011.755,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 775.604.702,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 280.133.787,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2066-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JESUS JAVIER SOLARTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	1522
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		KM	9
Otros (Especificar cuales)	OBRA TRANSVERSAL (ALCANTARILLA)	UND	3

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml	445	792
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		ml		2151,1
Otros (Especificar cuales)	OBRA TRANSVERSAL (ALCANTARILLA)	UND	1	3

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.912.961.155,00		1.912.961.155,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 26.050.600,00		26.050.600,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.939.011.755,00		1.939.011.755,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 187.714.486,00		$ 187.714.486,00	$ 1.735.412.774,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 26.050.600,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 187.714.486,00	$ -	$ 187.714.486,00	$ 1.761.463.374,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA 1/04/2024
(Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	1.939.011.755,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	1.761.463.374,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		90,84%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**18**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS - CONCRETO CICLOPEO





PLACA HUELLA TRAMO 2 SECTOR LA PICA - INSPECCION DE INTERVENTORIA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INGENIERA CIVIL
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES - DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No.8

MUNICIPIO DE PUEBLORRICO FASE 2

PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2066 DE 2023

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 01 al 31 marzo del 2024 por UNION TEMPORAL CR FASE ejecutor del Contrato de No. 078 con número de proceso en SECOP I: LP-001-2022. cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUI ", generado por el Municipio de Pueblorrico como entidad contratante a través del Convenio Interadministrativo No. 1898 de 2020 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías – INVIAS y el Municipio de Pueblorrico, Departamento de Antioquia para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa "Colombia Rural"", contrato que fue adjudicado mediante resolución No. 3 Resolución No. 3.0.29.10 – 094, del 23 de junio del 2022 a través de la licitación pública No. LP-001- 2022 y está bajo la supervisión de Wilmar Orozco De Ávila, secretario de planeación e infraestructura por parte del Municipio. La interventoría del Contrato de obra la realiza con la persona natural ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ bajo el contrato No. 2066 del 2023 con proceso de selección de mínima cuantía No.IP-DT-ANT-006-2023, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE FREDONIA Y PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", generado por Instituto Nacional de Vías - INVIAS como entidad contratante y adjudicado mediante resolución No. 2892 del 29 de septiembre del 2021 a través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DO-SRT-072-2021, este contrato está bajo la supervisión del Ing. Javier Jesús Solarte Portilla designado por INVIAS mediante Resolución No. 3664 del 23 de noviembre del 2021.

El objetivo principal de este informe, es presentar el avance técnico, administrativo y financiero ejecutado hasta la fecha en desarrollo del Contrato de Obra e Interventoría antes descritos, proyecto que hace parte del programa "Colombia Rural" que busca ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en los corredores viales que permitan incrementar la productividad del campo y la calidad de vida en las regiones.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como fin mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, vereda Castalia, La Pica, Indígena (Resguardo Bernandino Panchí), La Unión entre otros del municipio de Pueblorrico, dotando de unas vías en excelentes condiciones estructurales para el desarrollo y movilidad vehicular a lo largo y ancho del municipio.

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El municipio de Pueblorrico está localizado en la subregión Suroeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Tarso, por el este con el municipio de Jericó, por el sur con el municipio de Andes y por el oeste con los municipios de Hispania, Bolívar y Salgar. Su economía se caracteriza por Agricultura: café, plátano, yuca, panela, maíz y fríjol, Ganadería tanto vacuna como porcina y equina, comercio.

La vía a intervenir es un acceso veredal a un corredor productivo LA CASTALIA - LA PICA donde concurren algunos ramales de vías terciarias que comunican las veredas o zonas productivas Vía La Castalia Código de vía: 05576VT19, Vía La Castalia – Indígena (Resguardo Bernandino Panchí)- Código de vía: 05576VT21, vía la Castalia - - La Unión. Código de vía: 05576VT22, vía La castalia – La Pica Código de vía: 05576VT04. Sección propia de la vía Pueblorrico-La aguada. Carretera que no ha sido anteriormente categorizada según el Sistema Integral Nacional de Información de carreteras (SINC).



Ilustración 1. Localización de Pueblorrico en Colombia.

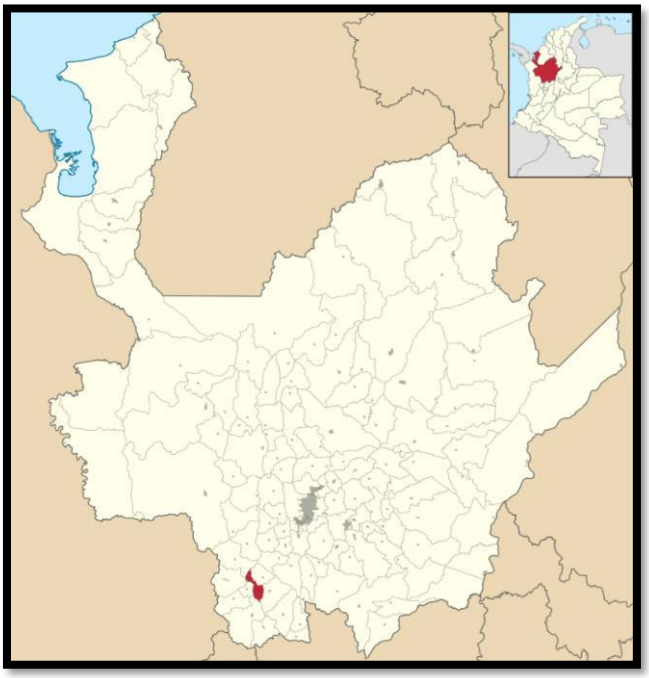


Ilustración 2. Localización de Pueblorrico en Antioquia.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias



Ilustración 3. Localización de la vía a intervenir.

2.2 Municipios de la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El principal beneficio del proyecto es la calidad vial que obtendrán los ciudadanos del municipio de Pueblorrico, el cual podrán acceder mejor a los víveres, comercio y vida cotidiana por medio de la reparación de la vía.

Con el proyecto que se pretende contratar traerá los siguientes beneficios al municipio:

- ✓ Mejorar la competitividad y transitabilidad de los corredores productivos.
- ✓ Mayor integración y comunicación entre las localidades del ámbito de influencia.
- ✓ Brindar alternativas estables de ingresos, empleo y valorización patrimonial a las familias y comunidades campesinas del área de influencia del proyecto.
- ✓ Disminución de costos del producción, transporte y comercialización agrícola.
- ✓ Oportuno acceso a los servicio médicos y educativos.
- ✓ Mayor flujo de bienes y servicios que reduzcan la brecha entre la ciudad y el campo y dignificar a los habitantes de las zonas rurales.
- ✓ Fortalecer la acción comunal y general organización en el campo colombiano

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El sector priorizado es el corredor productivo CASTALIA- LA PICA en donde concurren algunos ramales de vías terciaria que comunican las veredas o zonas productivas-Vía La Castalia. - Vía La Castalia – Indígena (Resguardo Bernandino Panchí). -vía la Castalia -- La Unión. - vía La castalia – La Pica.

Durante el recorrido a la vía terciaria Castalia - La Pica en el municipio de Pueblorrico, se observan varios tramos de placa huella construidos, tramos de afirmado en regulares condiciones y en la pendiente de acceso al resguardo indígena Bernandino Panchi se observa suelo en tierra malo con CBR por debajo del 3%. La mayoría de los sitios críticos se encuentran en el anillo vial de la vereda la Pica, los cuales requieren mantenimiento con conformación, afirmado, desmonte y rocería en zonas no boscosas, limpieza de alcantarillas, etc.

Se observaron varias obras transversales de 24" a lo largo de la vía terciaria que se encuentran colmatadas y/o en regular estado, por lo que se hace necesario la construcción de nuevas alcantarillas en los PR 0+900, PR 1+200, PR 1+400, PR4+350 del anillo vial.

A continuación, se presentan fotografías que permiten identificar el estado inicial de la vía:



Ilustración 4. Estado inicial de la vía.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias



Ilustración 5. Estado inicial de la vía.



Ilustración 6. Estado de la vía.



Ilustración 7. Estado de la vía.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias



Ilustración 8. Estado de la vía.

2.4 Características técnicas del proyecto

A continuación, se relaciona la información técnica y general del tramo a intervenir en el proyecto:

La obra se llevará a cabo en el Departamento de Antioquia, Municipio de Pueblorrico, Sobre el corredor productivo Castalia-la pica-Resguardo Bernandino Pachi, en donde se ejecutará por priorización del municipio y de acuerdo a la ficha técnica realizada en los procesos de licitación el tramo a intervenir es la vía que da al resguardo indígena, vía castalia, vía castalia la unión, castalia-la pica el cual tiene una pendiente del 12% y una longitud de 9 Km, sus coordenadas son:

CORREDOR PRODUCTIVO VIA CASTALIA-LA PICA FASE 2	
COORDENADA INICIO TRAMO IZQUIERDO	5° 46´16,362" , -75°50´20,174"
COORDENADA FINAL TRAMO IZQUIERDO	5° 45´48,446" , -75°50´0,145"
COORDENADA INICIO ANILLO VIAL	5°45´52.683" , -75°50´11.79"
COORDENADA FINAL ANILLO VIAL	5°45´52.683" ,-75°50´11.79"
PUNTO DE REFERENCIA INICIAL TRAMO IZQUIERDO	Partidas Castalia - La Pica
PUNTO DE REFERENCIA FINAL TRAMO IZQUIERDO	Resguardo Indígena Bernandino Panchí
PUNTO DE REFERENCIA INICIAL ANILLO VIAL	La Y
PUNTO DE REFERENCIA FINAL ANILLO VIAL	Vereda la Pica

Tabla 1. Coordenadas Vía Castalia – La Pica. Fuente: Ficha técnica diagnóstico de vías – Pueblorrico / Fecha: 24/03/2021.

Teniendo en cuenta los documentos adjuntos según oficio INVIAS-1699-2021-0550 radicado por la interventoría CONSORCIO MANTENIMEINTO 2021 al contratista UNION TEMPORAL CR FASE 2 con copia al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS en el cual su asunto consiste en Remisión acta de aprobación parcial de la revisión y ajustes a estudios y diseños en donde manifiestan, ***"Por medio del presente, nos referimos al contrato de obra del asunto, el cual tiene por objeto "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SEGÚN CONVENIO 1898-2020". Para remitir el ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE LA REVISIÓN Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS y emitir nuestras observaciones, una vez revisados los documentos adjuntos vía correo electrónico desde 19 de septiembre de 2022 al 18 de octubre de 2022. Vale la pena aclarar que esta interventoría ha hecho su revisión tomando como referencia la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del programa Colombia Rural."***

De esta manera llegaron bajo comité de obra virtual las partes llegaron a la siguiente conclusión descrita en el ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE LA REVISIÓN Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS efectuada el día 15 de octubre de 2022 en donde cita:

Componente Geotécnico – Caracterización de suelo: La interventoría mediante el oficio INVIAS-1699-2021-0493 con fecha del 26 de septiembre de 2022 y dando el alcance correspondiente de acuerdo a las subsanaciones entregadas por el contratista. Existen observaciones de forma dentro del documento que deben ser corregidas.
Se ejecutaron ensayos de PDC y el cálculo correspondiente de CBR a partir de ellos, se observa que los tramos a intervenir no poseen como minimo de 3%,. Se resalta que el contratista informa mediante formulas y concepto geotecnico estipula 10 cm de material granular (afirmado) con el fin de darle cumplimiento a lo estipulado en la Cartilla de Obra Menor (CAPITULO 8, PAGINA 155).
Criterios de mejoramiento de la Subrasante: En la Tabla 18 se incluyen valores de espesores de mejoramiento correspondiente a ESPECIFICACIONES invias y metodos de ecuaciones avalada geotecnicamente.
En el estudio de transito se observa que para el tramo que corresponde al empalme de Fase 2 con Fase 1; en donde se busca empalmar la construccion de una placa huella construida en un proyecto anterioer se tiene: Se aprueba estructura planteada en el plano 126, equivalente a vehiculos semipesados y pesados (c2 -c3) TRAMO 2 K0+875 A K1+590.
Por tener CBR menores a 3% se aprueba un espesor de 10 cm de afirmado con el fin de garantizar un CBR MAYOR O IGUAL DE 3%.
El refuerzo transversal de la placa huella debe ser #3 y longitudinales de #4. Ver Cartilla de Colombia Rural.
El refuerzo transversal en los estribos de la viga riostra debe ser #4 estribo de #3. Ver Cartilla de Colombia Rural.
DADAS LAS CONDICIONES QUE PRESENTA EL CORREDOR, TOPOGRAFIA, LAS CONDICONES DE COSECHA DE CAFE ; LA INTERVENTORIA LUEGO DE SU REVISION A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS PARA SU EVALUACION, REVISION Y APROBACION; ESTIPULA QUE LA MEJOR OPCION DE MEJORAMIENTO PARA TRAMO 1 ENTRE LA ABCISAS K0+000 A K0875 ES DE UN PAVIMENTO RIGIDO CONSIDERADO:
1.Se solicita revisar el cálculo del Tránsito Promedio Diario y el cálculo del Número de Ejes Equivalentes NEE.ya que se realiza con el valor estipulado de la cartilla, se debe presentar el calculo de acuerdo al aforo realizado en sitio de trabajo; por lo cual el número de ejes equivalentes no está adecuadamente soportado. Por otra parte, se solicita corregir el documento y verificar que el cálculo de los ejes equivalentes sea correcto y se encuentre debidamente soportado

2. Luego de los resultados obtenidos de CBR se leen valores menores de 3%, sin embargo, el Contratista tasa mediante soporte de calculo un CBR MAYOR DEL 3%. Se solicita aclarar cuál es el CBR de diseño y soportarlo adecuadamente.

3. Finalmente, el Contratista propone una estructura de pavimento conformada por una Subbase Granular de 15 centímetros, una losa de concreto con MR 3,8 ica de 20 centímetros, lo cual parece bastante razonable, sin embargo, se solicita atender los comentarios frente al Número de Ejes Equivalentes y al CBR de Diseño.

4. Paralelamente se verificó la estructura de pavimento de acuerdo con la Cartilla de Colombia Rural y CHEQUEO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO POR METODO DE LA AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS (AASHTO) Y LA PORTLANT CEMENT ASSOCIATION
(PCA).
NOTA. Se debe presentar el informe de caracterizacion de suelo faltante dentro del componente geotecnico. Adicional este informe deb venir respaldo por el especiliasta.

Ilustración 9. Componente geotécnico – caracterización de suelo, pagina 1 de acta de aprobación de la revisión y ajustes a estudios y diseños.

Cabe resaltar que estos estudios y diseños fueron aprobados por la interventoría CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 para efecto del pago correspondiente al acta parcial No1 con corte del día 31 de marzo de 2023 por lo cual con base a las mismas consideraciones dadas por los especialistas quienes aprobaron estos estudios, nosotros como interventoría cuyo contrato es 2066 de 2023 retoma estas especificaciones dadas para proceder adelantar la supervisión técnica a la ejecución del tramo a intervenir en el sector El Resguardo, en virtud de que dichos diseños fueron objeto de reconocimiento de pago al contratista.

NOTA: No se tiene a la fecha planos con sección transversal de la estructura según observaciones dadas en el ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE LA REVISIÓN Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS entregada por la interventoría CM2021.

Esta interventoría en cabeza de la persona natural ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ solicita al instituto nacional de vías – INVIAS la entrega de estudios y diseños con las consideraciones dadas en el ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE LA REVISIÓN Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS del 15 de noviembre de 2022.

De igual manera esta interventoria deja constancia que la actividad de revisión de estudios y diseños fue revisada, aprobada y reconocida para pago por parte de la interventoría Consorcio Mantenimiento 2021 y por ende esta nueva interventoria hará seguimiento y control al tramo de 350 ml a por construir en el sector del resguardo de acuerdo con esos estudios y diseños. Para el tramo de la Pica se requiere que el contratista presente APU de estudios y diseños junto con sus debidas cotizaciones de las actividades de geotecnia, en virtud a que los diseños iniciales contemplo 1500 ml de placa huella en el tramo de La Castalia al Resguardo, estando el sector de la Pica sin diseños, esta interventoria solicito al contratista que haga uso de los insumos de los aforos y estudio de trafico del tramo de La Castalia en virtud que es la vía de ingreso para La Pica y son insumos que deben utilizarse.

3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION BASICA CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO No.	078 DE 2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CR FASE 2
R/L	FABIO RICARDO ORTIZ REVELO
NIT	901.609.482-0
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.939.011.755,00
ANTICIPO 40%	$ 775.604.702,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	$ 700.334.467,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$ 280.133.787,00
VALOR NETO A PAGAR ACTA PARCIAL #1	$ 420.200.680,00
SALDO POR PAGAR	$ 524.060.831,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCCIÓN	CUATRO (4) MESES, CATORCE (14) DIAS
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DIIEMBRE DE 2022
PRORROGA N° 1	CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS
PRORROGA N° 2	TREINTA Y UN (31) DIAS
PRORROGA N° 3	CUATRO (4) MES
SUSPENCION	30 DE MARZO 2023
REINICIO No.1	01 DE AGOSTO DE 2023
PRORROGA N° 4	TREINTA Y UN (31) DIAS
PRORROGA N° 5	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE ABRIL 2024

3.2 Descripción de las actividades realizadas en el mes.

Se viene realizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental del contrato de obra, el cual se ha venido ejecutando a pesar de las adversidades que se han venido presentando.

Así mismo se adelantan las siguientes actividades relacionadas:

- Transporte, suministro e instalación de tubería en concreto de diámetro 36".
- Se lleva a cabo la fundida de concreto clase D cuya resistencia es de 3000 psi para placa huellas en áreas de obras transversales, cunetas – bordillos y vigas.
- Se adelantan comités de obra para el adelantar el balance de obra y evaluar el avance ejecutado con respecto al programado.
- Se lleva a cabo fundida de concreto clase D para muros y aletas de obra transversal.
- Suministro, figurado y corte de acero de refuerzo para obras transversales.
- Mantenimiento vial sobre sector la pica teniendo en cuenta las características dadas por el instituto para el mantenimiento de un corredor vial.

3.3 Seguimiento ítems No Previstos.

En el momento no se presenta seguimiento a ítems no previstos en el contrato, sin embargo, dentro del acta modificatoria aprobada por la interventoría 1699 del 2021 fueron aprobados ítem no previstos los cuales a la fecha no se están ejecutando.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

3.4.1 Estado de avance

A continuación, se relaciona estado de avance, informe semanal No. 35.68

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Total**	**%**
Estudios y Diseños	Unidad	1,0	Prog	$ 31.000.214,00	$ 31.000.214,00	1,60%
			Ejec	$ 31.000.214,00	$ 31.000.214,00	1,60%
PLACA HUELLA 4,10 m	ml	761,37	Prog	$ 536.762.521,00	$ 536.762.521,00	27,68%
			Ejec	$ 536.762.521,00	$ 536.762.521,00	27,68%
PLACA HUELLA 5m	ml	761,37	Prog	$ 377.332.176,00	$ 377.332.176,00	19,46%
			Ejec	$ 357.962.115,26	$ 357.962.115,26	18,46%
OBRA TRANSVERSAL 5m	Unidad	2	Prog	$ 28.390.121,00	$ 28.390.121,00	1,46%
			Ejec	$ 28.390.121,00	$ 28.390.121,00	1,46%
OBRA TRANSVERSAL 4,10m	Unidad	1	Prog	$ 13.419.784,00	$ 13.419.784,00	0,69%
			Ejec	$ 13.419.784,00	$ 13.419.784,00	0,69%
CARACTERIZACION VIAL	km	9	Prog	$ 6.103.440,00	$ 6.103.440,00	0,31%
			Ejec	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
FILTRO	ml	753	Prog	$ 102.485.312,00	$ 102.485.312,00	5,29%
			Ejec	$ 87.527.767,52	$ 87.527.767,52	4,51%
MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS	Gl.	1,0	Prog	$ 381.477.606,00	$ 381.477.606,00	19,67%
			Ejec	$ 300.303.975,00	$ 300.303.975,00	15,49%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y COMPLEMENTARIAS	Gl.	1,0	Prog	$ 402.172.054,00	$ 402.172.054,00	20,74%
			Ejec	$ 388.447.449,88	$ 388.447.449,88	20,03%
ACTIVIDADES NO PREVISTA	Gl.	1,0	Prog	$ 38.837.253,00	$ 38.837.253,00	2,00%
			Ejec	$ 17.649.427,00	$ 17.649.427,00	0,91%
Obras de Compensación Ambiental (PAGA)	Unidad	1,0	Prog	$ 21.031.274,00	$ 21.031.274,00	1,08%
			Ejec		$ 0,00	0,00%

Ilustración N°16. Informe semanal No.35.68 de interventoría.

Meta Física Programada %		90,47%
Meta Física Ejecutada %		90,84%

Avance o Atraso Físico %	0,37%

Ilustración N°17. Informe semanal No.35.68 de interventoría.

3.4.2 Acciones a seguir por parte de interventoría

De acuerdo con las actividades realizadas por parte del contratista de obra:

• Remitir oficios recordando los compromisos adquiridos en la entrega de la programación para continuar los trabajos de campo en la etapa de preconstrucción.
• Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial del contratista para su evaluación, revisión y vb de la misma.
• Entrega planilla de seguridad por parte del contratista.
• Seguimiento y verificación de las actividades a realizar en la programación.
• Seguimiento y control de ejecución de obras, meta física e inversión semanal.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DE CONTRATO DE OBRA

4.1 Informes semanales

SEMANA	No. REPORTE	DESDE	HASTA
34	1.34	01/08/2023	03/08/2023
35	2.35	04/08/2023	10/08/2023
36	3.36	11/08/2023	17/08/2023
37	4.37	18/08/2023	24/08/2023
38	5.38	25/08/2023	31/08/2023
39	6.39	01/09/2023	07/09/2023
40	7.40	08/09/2023	14/09/2023
41	8.41	15/09/2023	21/09/2023
42	9.42	22/09/2023	28/09/2023
43	10.43	29/09/2023	05/10/2023
44	11.44	06/10/2023	12/10/2023
45	12.45	13/10/2023	19/10/2023
46	13.46	20/10/2023	26/10/2023
47	14.47	27/10/2023	02/11/2023
48	15.48	03/11/2023	09/11/2023
49	16.49	10/11/2023	16/11/2023
50	17.50	17/11/2023	23/11/2023
51	18.51	24/11/2023	30/11/2023
52	19.52	01/12/2023	07/12/2023
53	20.53	08/12/2023	14/12/2023
54	21.54	15/12/2023	21/12/2023
55	22.55	22/12/2023	28/12/2023
56	23.56	29/12/2023	04/01/2024
57	24.57	05/01/2024	11/01/2024
58	25.58	12/01/2024	18/01/2024
59	26.59	19/01/2024	25/01/2024
60	27.60	26/01//2024	01/02/2024
61	28.61	02/02/2024	08/02/2024
62	29.62	09/02/2024	15/02/2024
63	30.63	16/02/2024	22/02/2024
64	31.64	23/02/2024	29/02/2024
65	32.65	01/03/2024	07/03/2024
66	33.66	08/03/2024	14/03/2024
67	34.67	15/03/2024	21/03/2024
68	35.68	22/03/2024	28/03/2024

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

Se adjunta la información de maquinaria y equipo de obra ver anexo 4.2 maquinaria y equipo de obra.

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

La información referente al personal, control aportes y seguridad social contrato de obra se ha venido recibiendo las respectivas afiliaciones del personal mínimo.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

La información financiera y presupuestal del contrato de obra se presenta con base al pago de acta parcial #1 cancelada y aprobada por la interventoría CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 (interventoría saliente), pago efectuado en el transcurso del mes de septiembre.

Además, la interventoría 2066 de 2023 adelanto la aprobación de acta parcial #2 la cual fue aprobada y cancelada al contratista.

4.5 Estado general del tiempo

La información referente al estado del tiempo se adjunta en el anexo 4.5 Estado general del tiempo.

4.6 Resumen ensayos de laboratorio

La información referente a los ensayos de laboratorio se adjunta en el anexo 4.6 Resumen de ensayos de laboratorio.

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

La información sobre las garantías y seguros del contrato de obra se adjunta en el anexo 4.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

4.8 Seguimiento al plan de calidad contrato de obra

NO APLICA. Esta interventoría no cuenta con personal para dicha actividad.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 Seguimiento a la inversión del anticipo

No aplica para el presente informe en virtud a que, de acuerdo a lo manifestado por el INVIAS, MUNICIPIO, interventoria CM2021 y contratista de obra, la inversión del anticipo fue ejecutada hasta el 30 de marzo de 2023 tiempo en el que eta interventoria no ejercía el control por tal motivo es responsabilidad de CM 2021 su correcta inversión y ejecución y serán ellos quienes entreguen el respectivo informe.

4.9.2 Seguimiento programa de obra

Se ha venido presentando un retraso en el avance de obra el cual se le notificó al contratista bajo comité de obra y se genera la entrega de un plan de contingencia para sub sanar el retraso significativo que se vine presentando.

Meta Física Programada %		90,47%
Meta Física Ejecutada %		90,84%

Avance o Atraso Físico %			0,37%

4.9.3 Seguimiento programa de inversiones

El seguimiento de programa de inversiones fue presentado por el contratista y la interventoría en su defecto lo aprobó, pero a la fecha del presente informe se encuentra un retraso en su ejecución y seguimiento. Anexo 4.9.3.

4.9.4 Actas de comité de obra

Durante el periodo del presente informe se presentan actas de comité ver anexo 4.9.4 Actas de comité de obra.

4.9.5 Actas de reunión de obra.

Durante el periodo del presente informe se efectuó un acta de reunión de obra, anexo 4.9.5.

4.9.6 . Informe Matriz de Riesgo.

Se identifico riesgo 11, eventos causados por la naturaleza que tienen impacto sobre la ejecución del contrato, circunstancias naturales que ocasiona retrasos o dificultades en la ejecución, esta caracterizado por ser un riesgo medio, responsable del tratamiento supervisor y contratista.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza seguimiento y verificación de la información tipo gerencial del contratista para su evaluación, revisión y vb de la misma.
- Presentar plan de contingencia para las actividades restantes por ejecutar teniendo en cuenta que se presenta un retraso del 0,37% del valor del contrato.
- Ejecutar las actividades que no se han iniciado según programación de obra.
- Continuar con las actividades programadas para el mejoramiento de vía en el sector de la PICA.

5. ANEXOS

5.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

En los anexos, se encontrará el formato de relación de correspondencia en el cual se incluye los oficios y documentos compartidos entre el contratista y la interventoría.

5.2 Bitácora de obra

Se agrega bitácora física correspondiente al contrato de obra 078 de 2022, con la respectiva descripción de las actividades desarrolladas durante el periodo del presente informe, reporte diario del clima, personal en obra, maquinaria y equipos. Demas información que se crea conveniente relacionar por la interventoría.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL

CONTRATO DE OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4.1 INFORMES SEMANALES

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 65 del 1/03/2024 al 7/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 1.939.011.755,00	$ -	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 1.609.633.109,20	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 329.378.645,80	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ 200.000.000	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.939.011.755,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.655.916.038,77	85,40%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.578.632.895,20	81,41%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 77.283.143,57	-3,99%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 31.000.214,00	1,60%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.655.916.038,77	85,40%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.609.633.109,20	83,01%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 46.282.929,57	-2,39%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.634.070,53	0,60%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35.884.229,01	1,85%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
En revisión de los avances financieros
Saldo pendiente de cobro Valor Básico de Obra + Otras Inversiones
Anticipo otorgado $ 775.604.702,00 (40% del valor del contrato); Saldo pendiente del contrato $ 1.163.407.053,00
La presente interventoria inicia con una ejecucion de obra ya ejecutada, recibida y en tramite de pago por parte de la inteventoria saliente contrato INVIAS No 1699 de2021
Correspondiente a una ejecucion del 36,32% que se evidencia en el acta de recibo parcial No 1 por valor de $704.268.138,00.
*La interventoria 2066 adelanta aprobacion de pago de acta parcial #2 por un valor de $220.033.315,2 correspondiente al 28,37%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 188.250.780,49	94,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
La interventoria tiene orden de inicio de fecha 10 de julio, pero no hubo ejecucion ni gastos de recursos de interventoria por cuanto el contratista de obra manifesto que no firmaba acta de reinicio hasta el 1 de agosto, por ende en el mes de julio la factura de interventoria corresponde a valor de cero ($0)

ANTICIPOS	
Otorgado $	775.604.702,00
Amortizado $	500.167.102,20
Saldo $	275.437.599,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,007
Acumulado:	2,007

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	85,40%
Meta Física Ejecutada %	83,01%

Avance o Atraso Físico %		-2,39%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	Estudios y Diseños	Unidad	1,0			Prog	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
						Ejec	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
*	PLACA HUELLA 4,10 m	ml	761,37			Prog	$ 536.762.521,00			$ 536.762.521,00	27,68%
						Ejec	$ 536.762.521,00			$ 536.762.521,00	27,68%
	PLACA HUELLA 5m	ml	761,37			Prog	$ 377.332.176,00			$ 377.332.176,00	19,46%
						Ejec	$ 318.675.686,08			$ 318.675.686,08	16,43%
*	OBRA TRANSVERSAL 5m	Unidad	2			Prog	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
						Ejec	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
	OBRA TRANSVERSAL 4,10m	Unidad	1			Prog	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
						Ejec	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
*	CARACTERIZACION VIAL	km	9			Prog	$ 6.103.440,00			$ 6.103.440,00	0,31%
						Ejec	$ 0,00			$ 0,00	0,00%
*	FILTRO	ml	753			Prog	$ 102.485.312,00			$ 102.485.312,00	5,29%
						Ejec	$ 87.527.767,52			$ 87.527.767,52	4,51%
*	MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 381.477.606,00			$ 381.477.606,00	19,67%
						Ejec	$ 260.303.975,00			$ 260.303.975,00	13,42%
*	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y COMPLEMENTARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 402.172.054,00			$ 402.172.054,00	20,74%
						Ejec	$ 315.903.613,60			$ 315.903.613,60	16,29%
*	ACTIVIDADES NO PREVISTA	Gl.	1,0			Prog	$ 38.837.253,00			$ 38.837.253,00	2,00%
						Ejec	$ 17.649.427,00			$ 17.649.427,00	0,91%
*	Obras de Compensación Ambiental (PAGA)	Unidad	1,0			Prog	$ 21.031.274,00			$ 21.031.274,00	1,08%
						Ejec				$ 0,00	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CASTALIA — TRAMO Y/O SECTOR 2: VIA EL RESGUARDO
TRAMO Y/O SECTOR 3: LA PICA

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Canguro	1	1
Mezcladora	1	1
volqueta 6m3	1	1
benitin de 2,5 ton	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Corregimiento Peñalisa, Salgar / Antioquia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	TRITURADOS PEÑALISA S.A.	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El proyecto se encuentra en Etapa de Construcción; continuación del acopio de materiales de construcción procedentes de la fuente aprobada.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:
Seguimiento y control durante el descargue y acopio temporal de materiales de construcción; señalización vertical; protección con plástico de los acopios de materiales; disposición de residuos especiales; disposición de residuos líquidos; protección de zonas verdes y árboles.
Seguimiento del estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contratista de obra.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de Gestión Durante La Ejecución

OBSERVACIONES:
Remitido a la Subdirección de Sostenibilidad con No. Rad. Interna INVIAS-71109-2021-0800. Verificación y control de los instrumentos ambientales y planes de manejo por parte de la Interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Campamento

OBSERVACIONES:
Atención, información y divulgación a la comunidad.
El Contratista de Obra cuenta con mano de obra calificada y no calificada, para el desarrollo de actividades constructivas.
La Interventoría cuenta con personal calificado para el seguimiento técnico y administrativo de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 65 del 1/03/2024 al 7/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado
CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES:
El proyecto no contempla adquisición de predio para garantizar el objeto del contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Se adelanta excavacion varias sin clasificar para vigas contemplando una altura de 10 cm y un ancho de 20 cm.
*Se lleva a cabo fundida de concreto clase D para VIGAS, CUNETAS Y PLACA HUELLAS en el tramo 2 sectro LA PICA, generandose un avane de 18 secciones completas de 3,2m.
*Se suministra e instala acero de refuerzo grado 60 para vigas, cunetas y placa huellas.
*Se lleva a cabo la fundida de concreto ciclopeo en el eje de via contemplando un ancho de 0,9m, espesor de 0,15m y una longitud de seccion de 3m promedio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Continuar con las actividadas por ejecutar en el desarrollo del contrato de obra 078 de 2022.
*Continuar con las diferentes actividades de mejoramiento en el sector de la PICA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO

CONCRETO CLASE D PARA PLACA HUELLA Y CUNETAS

CONCRETO CLASE D PARA CUNETAS, RIELES Y BORDILLO

NOTA: Se le informa al contratista el retraso presentado a la fecha del 2,39%, Se evalua el plan de contingencia presentado por el contratista y se evalua que se viene adelantando a satisfaccion y reduce el retraso que se venia presentando.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial del contratista para su evaluación, revisión y vb de la misma.
Seguimiento y verificación de la planilla de seguridad por parte del contratista.
Seguimiento y verificación de la información de los ajustes de los diseños.
Seguimiento y verificación de las actividades a realizar programado en la programación.
Seguimiento y control de ejecución de obras, meta física e inversión semanal.
Se realiza comité de seguimiento de actividades de orden administrativo del convenio y de actividades de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 66 del 8/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 1.939.011.755,00	$ -	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 1.648.919.538,38	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 290.092.216,62	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ 200.000.000	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.939.011.755,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.667.550.109,30	86,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.617.919.324,38	83,44%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 49.630.784,92	-2,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 31.000.214,00	1,60%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.667.550.109,30	86,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.648.919.538,38	85,04%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 18.630.570,92	-0,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.634.070,53	0,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.286.429,18	2,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
En revisión de los avances financieros
Saldo pendiente de cobro Valor Básico de Obra + Otras Inversiones
Anticipo otorgado $ 775.604.702,00 (40% del valor del contrato); Saldo pendiente del contrato $ 1.163.407.053,00
La presente interventoria inicia con una ejecucion de obra ya ejecutada, recibida y en tramite de pago por parte de la inteventoria saliente contrato INVIAS No 1699 de2021
Correspondiente a una ejecucion del 36,32% que se evidencia en el acta de recibo parcial No 1 por valor de $704.268.138,00.
*La interventoria 2066 adelanta aprobacion de pago de acta parcial #2 por un valor de $220.033.315,2 correspondiente al 28,37%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 198.006.878,05	99,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
La interventoria tiene orden de inicio de fecha 10 de julio, pero no hubo ejecucion ni gastos de recursos de interventoria por cuanto el contratista de obra manifesto que no firmaba acta de reinicio hasta el 1 de agosto, por ende en el mes de julio la factura de interventoria corresponde a valor de cero ($0)

ANTICIPOS	
Otorgado $	775.604.702,00
Amortizado $	500.167.102,20
Saldo $	275.437.599,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,024
Acumulado:	2,024

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	86,00%
Meta Física Ejecutada %	85,04%

Avance o Atraso Físico %		-0,96%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	Estudios y Diseños	Unidad	1,0			Prog	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
						Ejec	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
*	PLACA HUELLA 4,10 m	ml	761,37			Prog	$ 536.762.521,00			$ 536.762.521,00	27,68%
						Ejec	$ 536.762.521,00			$ 536.762.521,00	27,68%
	PLACA HUELLA 5m	ml	761,37			Prog	$ 377.332.176,00			$ 377.332.176,00	19,46%
						Ejec	$ 357.962.115,26			$ 357.962.115,26	18,46%
*	OBRA TRANSVERSAL 5m	Unidad	2			Prog	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
						Ejec	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
	OBRA TRANSVERSAL 4,10m	Unidad	1			Prog	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
						Ejec	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
*	CARACTERIZACION VIAL	km	9			Prog	$ 6.103.440,00			$ 6.103.440,00	0,31%
						Ejec	$ 0,00			$ 0,00	0,00%
*	FILTRO	ml	753			Prog	$ 102.485.312,00			$ 102.485.312,00	5,29%
						Ejec	$ 87.527.767,52			$ 87.527.767,52	4,51%
*	MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 381.477.606,00			$ 381.477.606,00	19,67%
						Ejec	$ 260.303.975,00			$ 260.303.975,00	13,42%
*	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y COMPLEMENTARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 402.172.054,00			$ 402.172.054,00	20,74%
						Ejec	$ 315.903.613,60			$ 315.903.613,60	16,29%
*	ACTIVIDADES NO PREVISTA	Gl.	1,0			Prog	$ 38.837.253,00			$ 38.837.253,00	2,00%
						Ejec	$ 17.649.427,00			$ 17.649.427,00	0,91%
*	Obras de Compensación Ambiental (PAGA)	Unidad	1,0			Prog	$ 21.031.274,00			$ 21.031.274,00	1,08%
						Ejec				$ 0,00	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CASTALIA — TRAMO Y/O SECTOR 2: VIA EL RESGUARDO
TRAMO Y/O SECTOR 3: LA PICA

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Canguro	1	1
Mezcladora	1	1
volqueta 6m3	1	1
benitin de 2,5 ton	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Corregimiento Peñalisa, Salgar / Antioquia	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	TRITURADOS PEÑALISA S.A.	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:
El proyecto se encuentra en Etapa de Construcción; continuación del acopio de materiales de construcción procedentes de la fuente aprobada.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:
Seguimiento y control durante el descargue y acopio temporal de materiales de construcción; señalización vertical; protección con plástico de los acopios de materiales; disposición de residuos especiales; disposición de residuos líquidos; protección de zonas verdes y árboles.
Seguimiento del estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contratista de obra.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de Gestión Durante La Ejecución

OBSERVACIONES:
Remitido a la Subdirección de Sostenibilidad con No. Rad. Interna INVIAS-71109-2021-0800. Verificación y control de los instrumentos ambientales y planes de manejo por parte de la Interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Campamento

OBSERVACIONES:
Atención, información y divulgación a la comunidad.
El Contratista de Obra cuenta con mano de obra calificada y no calificada, para el desarrollo de actividades constructivas.
La Interventoría cuenta con personal calificado para el seguimiento técnico y administrativo de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 66 del 8/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado
CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES:
El proyecto no contempla adquisición de predio para garantizar el objeto del contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Se adelanta excavacion varias sin clasificar para vigas contemplando una altura de 10 cm y un ancho de 20 cm.
*Se lleva a cabo fundida de concreto clase D para VIGAS, CUNETAS Y PLACA HUELLAS en el tramo 2 sectro LA PICA, generandose un avane de 25 secciones completas de 3,2m.
*Se suministra e instala acero de refuerzo grado 60 para vigas, cunetas y placa huellas.
*Se lleva a cabo la fundida de concreto ciclopeo en el eje de via contemplando un ancho de 0,9m, espesor de 0,15m y una longitud de seccion de 3m promedio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Continuar con las actividadas por ejecutar en el desarrollo del contrato de obra 078 de 2022.
*Continuar con las diferentes actividades de mejoramiento en el sector de la PICA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

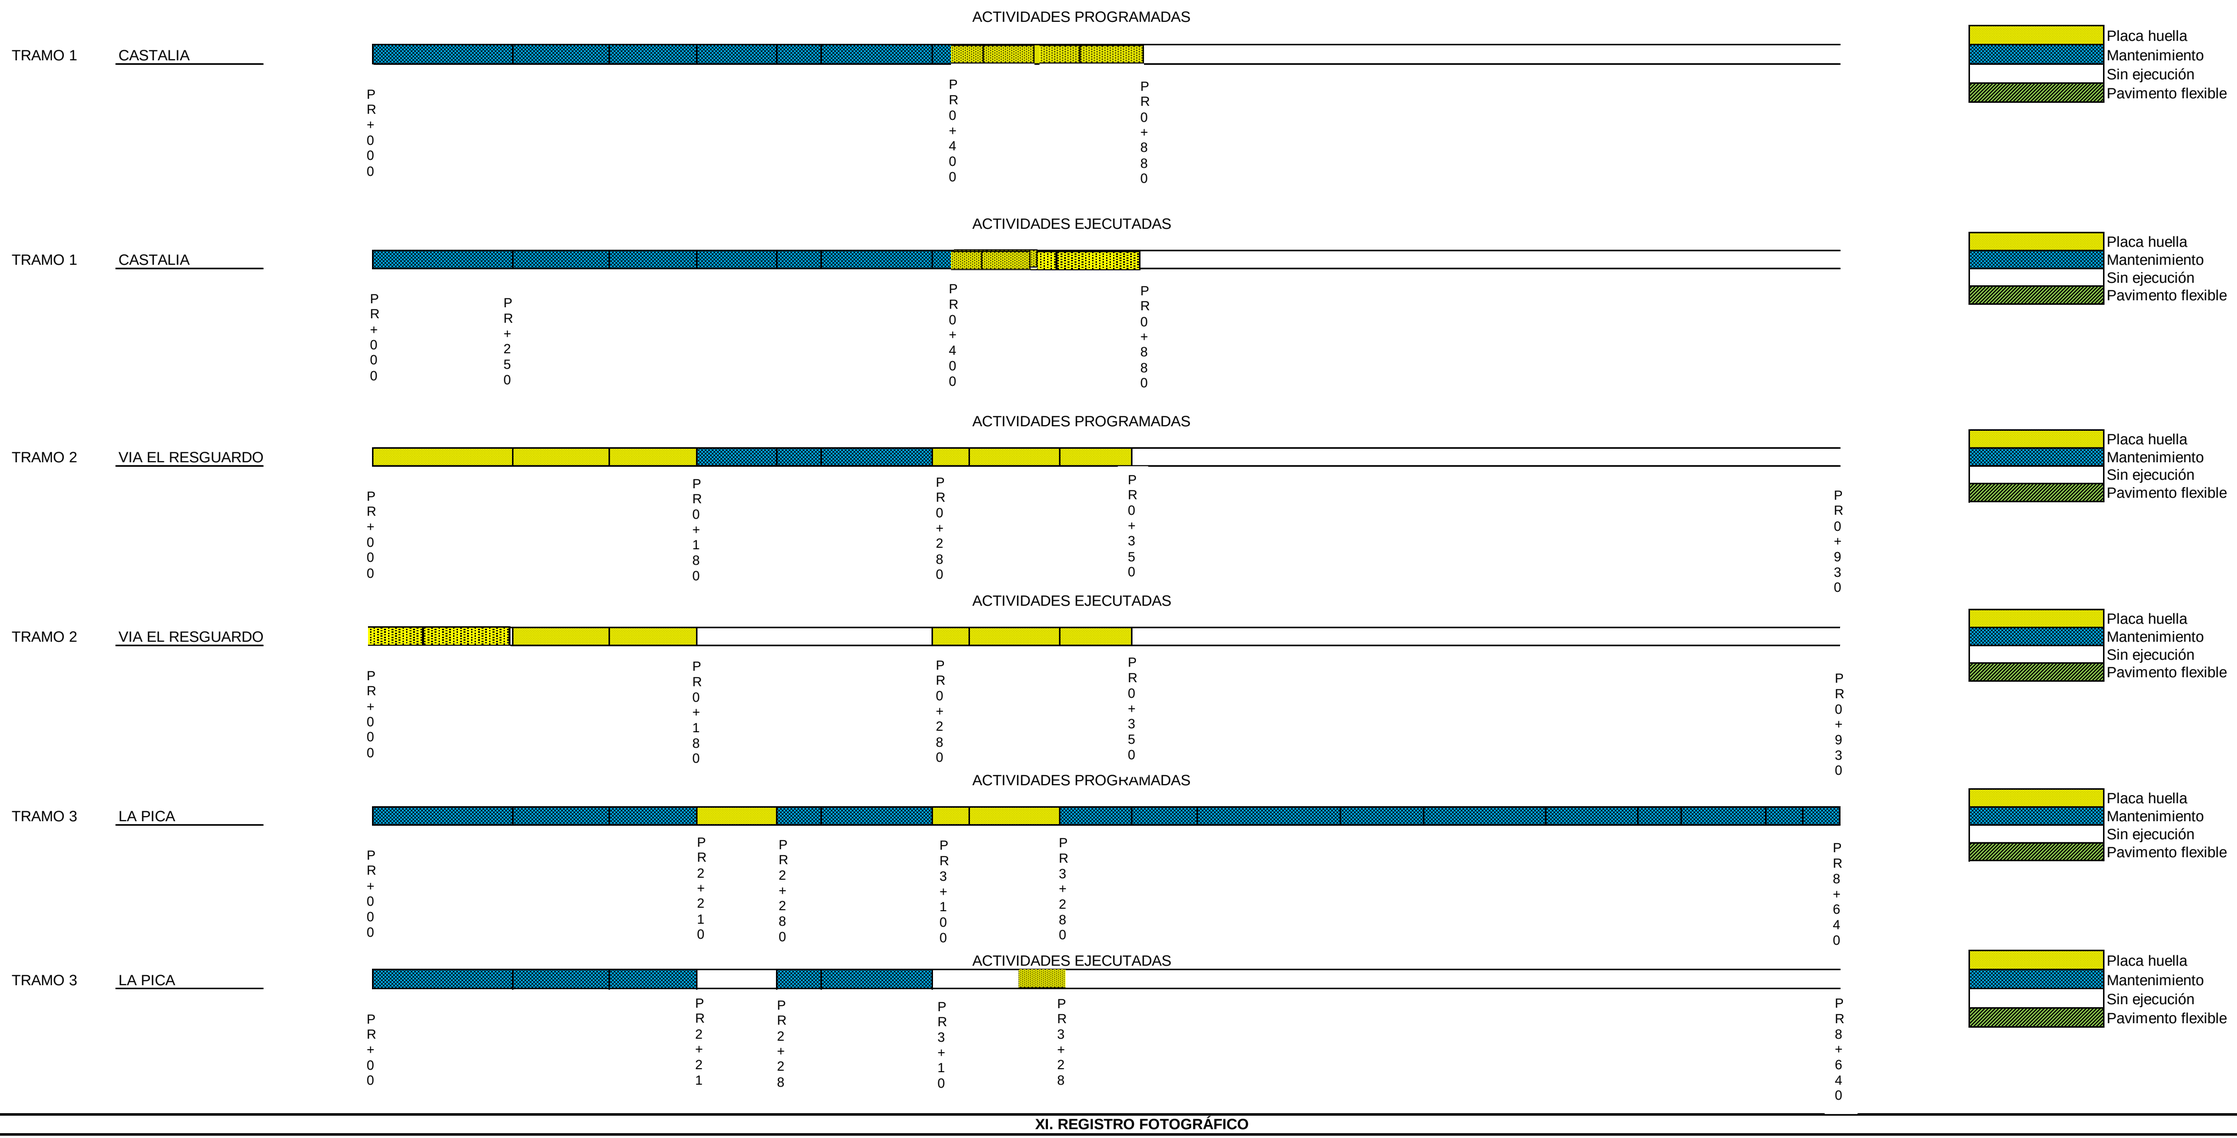

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION A MANO DE AREA DE VIGAS RIOSTRAS



FUNDIDA DE CONCRETO CLASE D



EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS RIOSTRAS

NOTA: Se le informa al contratista el retraso presentado a la fecha del 0,96%, Se evalua el plan de contingencia presentado por el contratista y se evalua que se viene adelantando a satisfaccion y reduce el retraso que se venia presentando.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial del contratista para su evaluación, revisión y vb de la misma.
Seguimiento y verificación de la planilla de seguridad por parte del contratista.
Seguimiento y verificación de la información de los ajustes de los diseños.
Seguimiento y verificación de las actividades a realizar programado en la programación.
Seguimiento y control de ejecución de obras, meta física e inversión semanal.
Se realiza comité de seguimiento de actividades de orden administrativo del convenio y de actividades de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 67 del 15/03/2024 al 21/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 1.939.011.755,00	$ -	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 1.717.462.573,98	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 221.549.181,02	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ 200.000.000	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.939.011.755,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.704.585.233,82	87,91%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.686.462.359,98	86,98%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 18.122.873,84	-0,93%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 31.000.214,00	1,60%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.704.585.233,82	87,91%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.717.462.573,98	88,57%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 12.877.340,16	0,66%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37.035.124,52	1,91%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 58.543.035,60	3,02%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
En revisión de los avances financieros
Saldo pendiente de cobro Valor Básico de Obra + Otras Inversiones
Anticipo otorgado $ 775.604.702,00 (40% del valor del contrato); Saldo pendiente del contrato $ 1.163.407.053,00
La presente interventoria inicia con una ejecucion de obra ya ejecutada, recibida y en tramite de pago por parte de la inteventoria saliente contrato INVIAS No 1699 de2021
Correspondiente a una ejecucion del 36,32% que se evidencia en el acta de recibo parcial No 1 por valor de $704.268.138,00.
*La interventoria 2066 adelanta aprobacion de pago de acta parcial #2 por un valor de $220.033.315,2 correspondiente al 28,37%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 188.250.780,49	94,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
La interventoria tiene orden de inicio de fecha 10 de julio, pero no hubo ejecucion ni gastos de recursos de interventoria por cuanto el contratista de obra manifesto que no firmaba acta de reinicio hasta el 1 de agosto, por ende en el mes de julio la factura de interventoria corresponde a valor de cero ($0)

ANTICIPOS	
Otorgado $	775.604.702,00
Amortizado $	500.167.102,20
Saldo $	275.437.599,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,794
Acumulado:	1,794

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	87,91%
Meta Física Ejecutada %	88,57%

Avance o Atraso Físico %		0,66%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	Estudios y Diseños	Unidad	1,0			Prog	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
						Ejec	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
*	PLACA HUELLA 4,10 m	ml	761,37			Prog	$ 536.762.521,00			$ 536.762.521,00	27,68%
						Ejec	$ 536.762.521,00			$ 536.762.521,00	27,68%
	PLACA HUELLA 5m	ml	761,37			Prog	$ 377.332.176,00			$ 377.332.176,00	19,46%
						Ejec	$ 357.962.115,26			$ 357.962.115,26	18,46%
*	OBRA TRANSVERSAL 5m	Unidad	2			Prog	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
						Ejec	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
	OBRA TRANSVERSAL 4,10m	Unidad	1			Prog	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
						Ejec	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
*	CARACTERIZACION VIAL	km	9			Prog	$ 6.103.440,00			$ 6.103.440,00	0,31%
						Ejec	$ 0,00			$ 0,00	0,00%
*	FILTRO	ml	753			Prog	$ 102.485.312,00			$ 102.485.312,00	5,29%
						Ejec	$ 87.527.767,52			$ 87.527.767,52	4,51%
*	MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 381.477.606,00			$ 381.477.606,00	19,67%
						Ejec	$ 300.303.975,00			$ 300.303.975,00	15,49%
*	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y COMPLEMENTARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 402.172.054,00			$ 402.172.054,00	20,74%
						Ejec	$ 344.446.649,20			$ 344.446.649,20	17,76%
*	ACTIVIDADES NO PREVISTA	Gl.	1,0			Prog	$ 38.837.253,00			$ 38.837.253,00	2,00%
						Ejec	$ 17.649.427,00			$ 17.649.427,00	0,91%
*	Obras de Compensación Ambiental (PAGA)	Unidad	1,0			Prog	$ 21.031.274,00			$ 21.031.274,00	1,08%
						Ejec				$ 0,00	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CASTALIA — TRAMO Y/O SECTOR 2: VIA EL RESGUARDO
TRAMO Y/O SECTOR 3: LA PICA

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Canguro	1	1
Mezcladora	1	1
volqueta 6m3	1	1
benitin de 2,5 ton	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento Peñalisa, Salgar / Antioquia	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	TRITURADOS PEÑALISA S.A.	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:
El proyecto se encuentra en Etapa de Construcción; continuación del acopio de materiales de construcción procedentes de la fuente aprobada.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:
Seguimiento y control durante el descargue y acopio temporal de materiales de construcción; señalización vertical; protección con plástico de los acopios de materiales; disposición de residuos especiales; disposición de residuos líquidos; protección de zonas verdes y árboles.
Seguimiento del estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contratista de obra.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de Gestión Durante La Ejecución

OBSERVACIONES:
Remitido a la Subdirección de Sostenibilidad con No. Rad. Interna INVIAS-71109-2021-0800. Verificación y control de los instrumentos ambientales y planes de manejo por parte de la Interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Campamento

OBSERVACIONES:
Atención, información y divulgación a la comunidad.
El Contratista de Obra cuenta con mano de obra calificada y no calificada, para el desarrollo de actividades constructivas.
La Interventoría cuenta con personal calificado para el seguimiento técnico y administrativo de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 67 del 15/03/2024 al 21/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm”; Refuerzo longitudinal 1/2” cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36”.
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES:
El proyecto no contempla adquisición de predio para garantizar el objeto del contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Se adelanta excavacion varias sin clasificar para vigas contemplando una altura de 10 cm y un ancho de 20 cm.
*Se lleva a cabo el suministro e instalacion de sub base granular en el area del tramo 1 sector la PICA, posteriormente se toman densidades para garantizar la compactacion requerida en diseño y de esta manera brindar estabilidad a la obra.
*Se lleo a cabo el traslado de equipos, campamento y herramientas al tramo 1 del sector LA PICA para que de esta manera se inicie labores de encofrado para placa huellas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Continuar con las actividadas por ejecutar en el desarrollo del contrato de obra 078 de 2022.
*Continuar con las diferentes actividades de mejoramiento en el sector de la PICA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

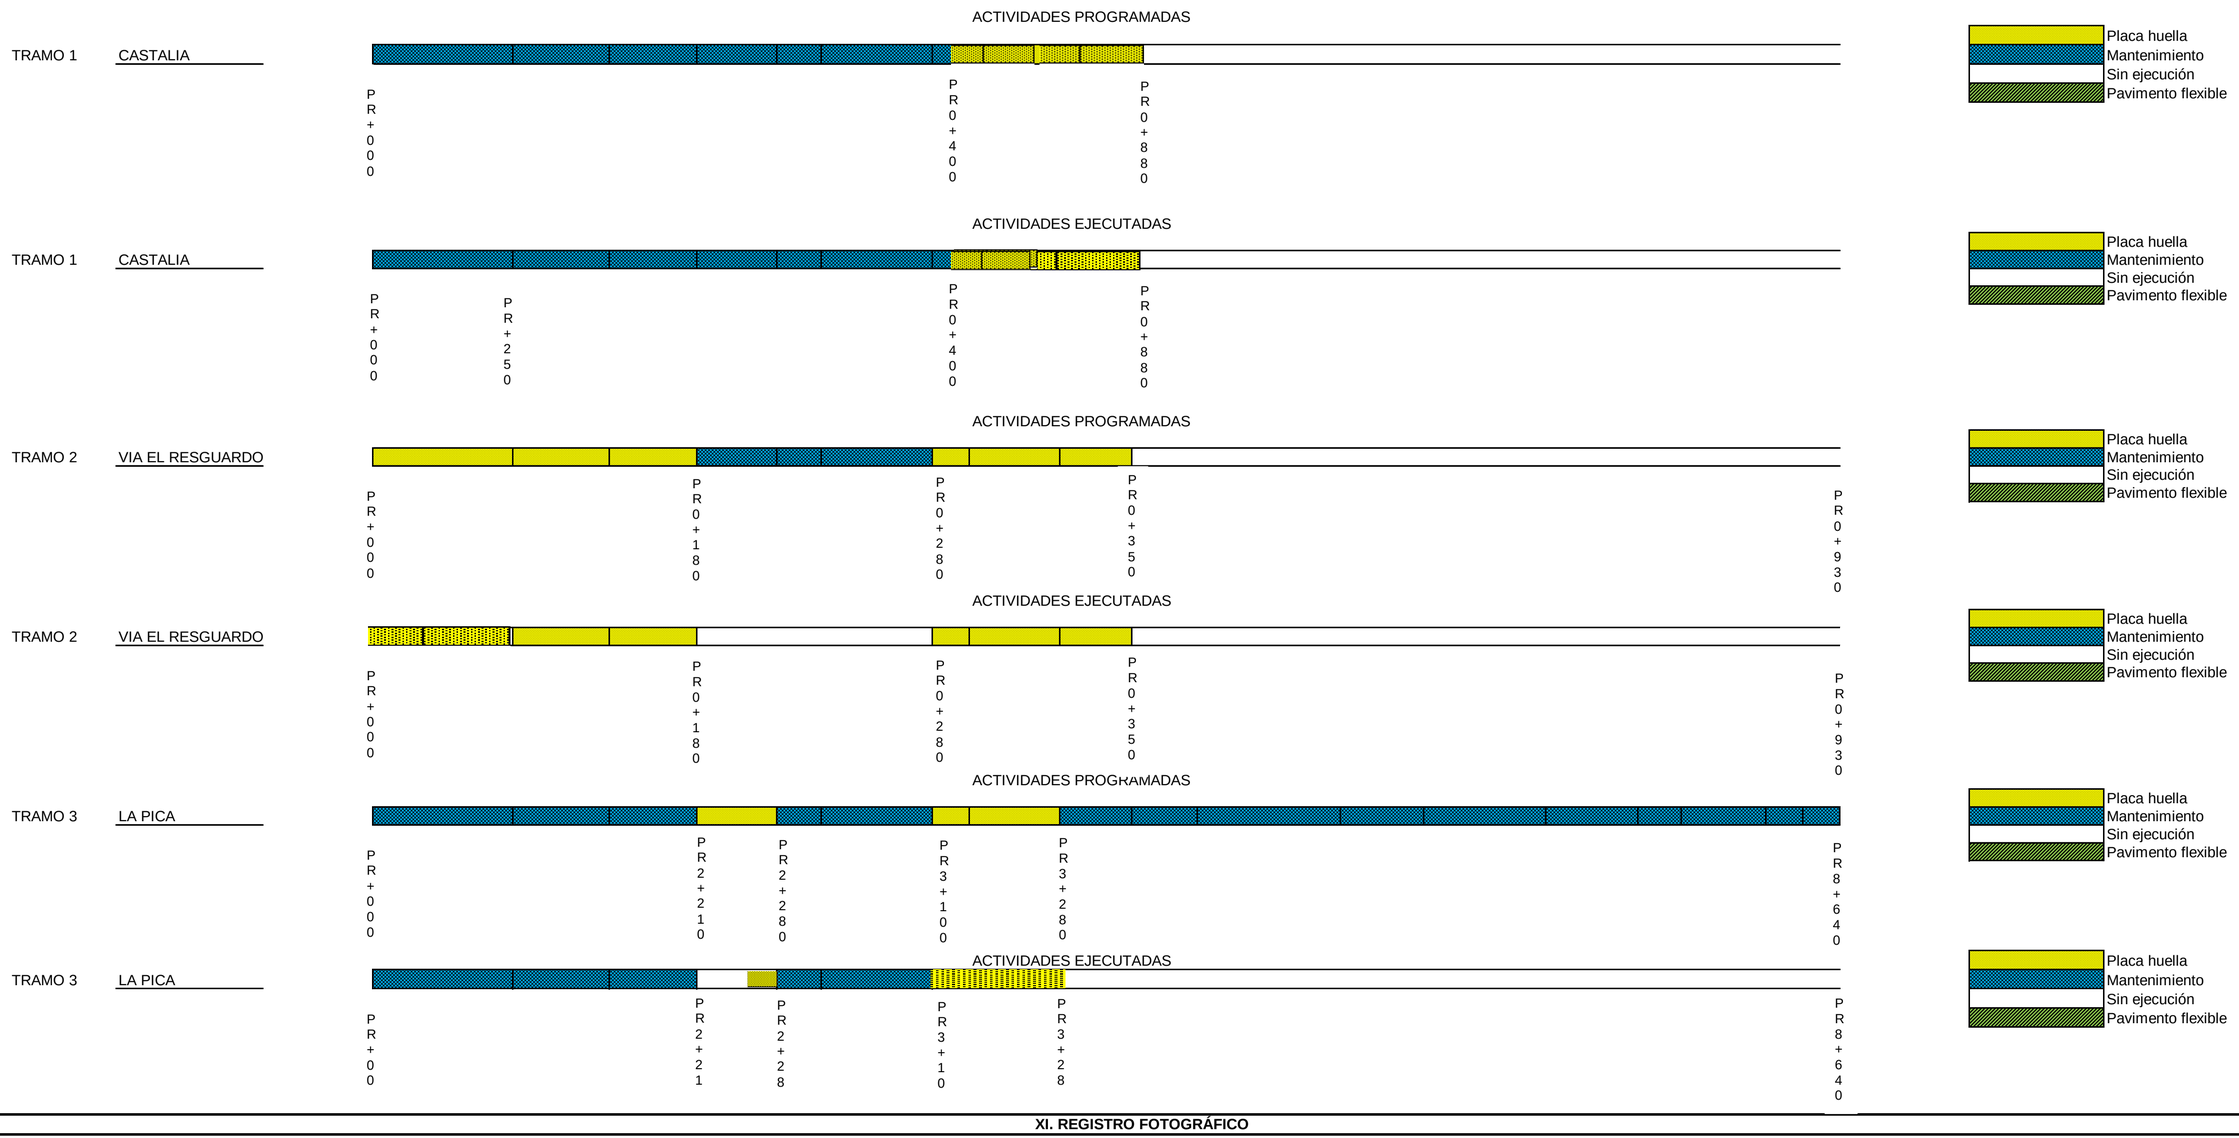

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA HUELLA TRAMO 2 SECTOR LA PICA



INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR



LOSA DE TRANSICION TRAMO 2 LA PICA

NOTA: No se presenta retraso en la obra eniendo en cuenta que el contratista viene superando el plan de contingencia presentado.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial del contratista para su evaluación, revisión y vb de la misma. Seguimiento y verificación de la planilla de seguridad por parte del contratista. Seguimiento y verificación de la información de los ajustes de los diseños. Seguimiento y verificación de las actividades a realizar programado en la programación. Seguimiento y control de ejecución de obras, meta física e inversión semanal. Se realiza comité de seguimiento de actividades de orden administrativo del convenio y de actividades de obra.	FIRMA NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 68 del 22/03/2024 al 28/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 1.939.011.755,00	$ -	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 1.761.463.374,65	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 177.548.380,35	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ 200.000.000	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.939.011.755,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.754.223.934,75	90,47%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.730.463.160,65	89,24%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 23.760.774,09	-1,23%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 31.000.214,00	1,60%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.754.223.934,75	90,47%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.761.463.374,65	90,84%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 7.239.439,91	0,37%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 49.638.700,93	2,56%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 44.000.800,68	2,27%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
En revisión de los avances financieros
Saldo pendiente de cobro Valor Básico de Obra + Otras Inversiones
Anticipo otorgado $ 775.604.702,00 (40% del valor del contrato); Saldo pendiente del contrato $ 1.163.407.053,00
La presente interventoria inicia con una ejecucion de obra ya ejecutada, recibida y en tramite de pago por parte de la inteventoria saliente contrato INVIAS No 1699 de2021
Correspondiente a una ejecucion del 36,32% que se evidencia en el acta de recibo parcial No 1 por valor de $704.268.138,00.
*La interventoria 2066 adelanta aprobacion de pago de acta parcial #2 por un valor de $220.033.315,2 correspondiente al 28,37%.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 188.250.780,49	94,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.756.097,56	4,88%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -

PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ 0,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
La interventoria tiene orden de inicio de fecha 10 de julio, pero no hubo ejecucion ni gastos de recursos de interventoria por cuanto el contratista de obra manifesto que no firmaba acta de reinicio hasta el 1 de agosto, por ende en el mes de julio la factura de interventoria corresponde a valor de cero ($0)

ANTICIPOS	
Otorgado $	775.604.702,00
Amortizado $	500.167.102,20
Saldo $	275.437.599,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,720
Acumulado:	1,720

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	90,47%
Meta Física Ejecutada %	90,84%

Avance o Atraso Físico %		0,37%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	Estudios y Diseños	Unidad	1,0			Prog	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
						Ejec	$ 31.000.214,00			$ 31.000.214,00	1,60%
*	PLACA HUELLA 4,10 m	ml	761,37			Prog	$ 536.762.521,00			$ 536.762.521,00	27,68%
						Ejec	$ 536.762.521,00			$ 536.762.521,00	27,68%
	PLACA HUELLA 5m	ml	761,37			Prog	$ 377.332.176,00			$ 377.332.176,00	19,46%
						Ejec	$ 357.962.115,26			$ 357.962.115,26	18,46%
*	OBRA TRANSVERSAL 5m	Unidad	2			Prog	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
						Ejec	$ 28.390.121,00			$ 28.390.121,00	1,46%
	OBRA TRANSVERSAL 4,10m	Unidad	1			Prog	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
						Ejec	$ 13.419.784,00			$ 13.419.784,00	0,69%
*	CARACTERIZACION VIAL	km	9			Prog	$ 6.103.440,00			$ 6.103.440,00	0,31%
						Ejec	$ 0,00			$ 0,00	0,00%
*	FILTRO	ml	753			Prog	$ 102.485.312,00			$ 102.485.312,00	5,29%
						Ejec	$ 87.527.767,52			$ 87.527.767,52	4,51%
*	MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 381.477.606,00			$ 381.477.606,00	19,67%
						Ejec	$ 300.303.975,00			$ 300.303.975,00	15,49%
*	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y COMPLEMENTARIAS	Gl.	1,0			Prog	$ 402.172.054,00			$ 402.172.054,00	20,74%
						Ejec	$ 388.447.449,88			$ 388.447.449,88	20,03%
*	ACTIVIDADES NO PREVISTA	Gl.	1,0			Prog	$ 38.837.253,00			$ 38.837.253,00	2,00%
						Ejec	$ 17.649.427,00			$ 17.649.427,00	0,91%
*	Obras de Compensación Ambiental (PAGA)	Unidad	1,0			Prog	$ 21.031.274,00			$ 21.031.274,00	1,08%
						Ejec				$ 0,00	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CASTALIA — TRAMO Y/O SECTOR 2: VIA EL RESGUARDO
TRAMO Y/O SECTOR 3: LA PICA

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Canguro	1	1
Mezcladora	1	1
volqueta 6m3	1	1
benitin de 2,5 ton	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento Peñalisa, Salgar / Antioquia	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	TRITURADOS PEÑALISA S.A.	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:
El proyecto se encuentra en Etapa de Construcción; continuación del acopio de materiales de construcción procedentes de la fuente aprobada.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:
Seguimiento y control durante el descargue y acopio temporal de materiales de construcción; señalización vertical; protección con plástico de los acopios de materiales; disposición de residuos especiales; disposición de residuos líquidos; protección de zonas verdes y árboles.
Seguimiento del estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contratista de obra.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Etapa de Gestión Durante La Ejecución

OBSERVACIONES:
Remitido a la Subdirección de Sostenibilidad con No. Rad. Interna INVIAS-71109-2021-0800. Verificación y control de los instrumentos ambientales y planes de manejo por parte de la Interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Campamento

OBSERVACIONES:
Atención, información y divulgación a la comunidad.
El Contratista de Obra cuenta con mano de obra calificada y no calificada, para el desarrollo de actividades constructivas.
La Interventoría cuenta con personal calificado para el seguimiento técnico y administrativo de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 68 del 22/03/2024 al 28/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER JESÚS SOLARTE PORTILLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LOPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto abarca la construcción de placa huella y mejoramiento rutinario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en los corredores productivo del Municipio de Pueblorrico. En este caso el corredor a intervenir esta denominado
CASTALIA - LA PICA
Longitud De Corredor 9km.
El Proyecto Abarca Actividades De Mejoramiento Y Actividades De Mantenimiento Periódico.
Estructuras de Placa Huella:
Ancho de placa huella: 5 m a 4m.
Espesor de subbase: 30 cm; Espesor de Placa: 15 cm; Refuerzo transversal 3/8 cada 20 cm"; Refuerzo longitudinal 1/2" cada 20 cm.
Concreto clase D: 3000 psi. (cunetas, vigas riostras, placa huella).
Concreto clase G: 2000 psi. (ciclópeo).

Obra Transversal:
Alcantarilla con tubería de concreto reforzado clase D. Diámetro 36".
Concreto clase D: 3000 psi.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2		
INTEGRANTES:	GRUPO SERVING SAS 5% - CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
CONTRATO No.	078-2022	VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE INICIO:	18/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.939.011.755,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
INTEGRANTES:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ		
CONTRATO No.	2066	VALOR INICIAL:	$ 90.854.000,00
FECHA DE INICIO:	10/07/2023	VALOR ADICIONES:	$ 109.146.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES:
El proyecto no contempla adquisición de predio para garantizar el objeto del contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Se adelanta excavacion varias sin clasificar para vigas contemplando una altura de 10 cm y un ancho de 20 cm.
*Se lleva a cabo el suministro e instalacion de sub base granular en el area del tramo 1 sector la PICA, posteriormente se toman densidades para garantizar la compactacion requerida en diseño y de esta manera brindar estabilidad a la obra.
*Se adelanta la instalacion de acero de refuerzo para vigas, placa huella y cunetas en un tramo comprendido de 90 ml.
*Se desarrolla la actividad de concreto clase D para vigas, cunetas y placa huella en un tramo de 90ml, asi mismo se funde concreto ciclopeo para eje de via contemplando un ancho de diseño de 0,9m y un espesor de 0,15 con un porcentaje de 60% -40% de piedra bolo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Continuar con las actividadas por ejecutar en el desarrollo del contrato de obra 078 de 2022.
*Continuar con las diferentes actividades de mejoramiento en el sector de la PICA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

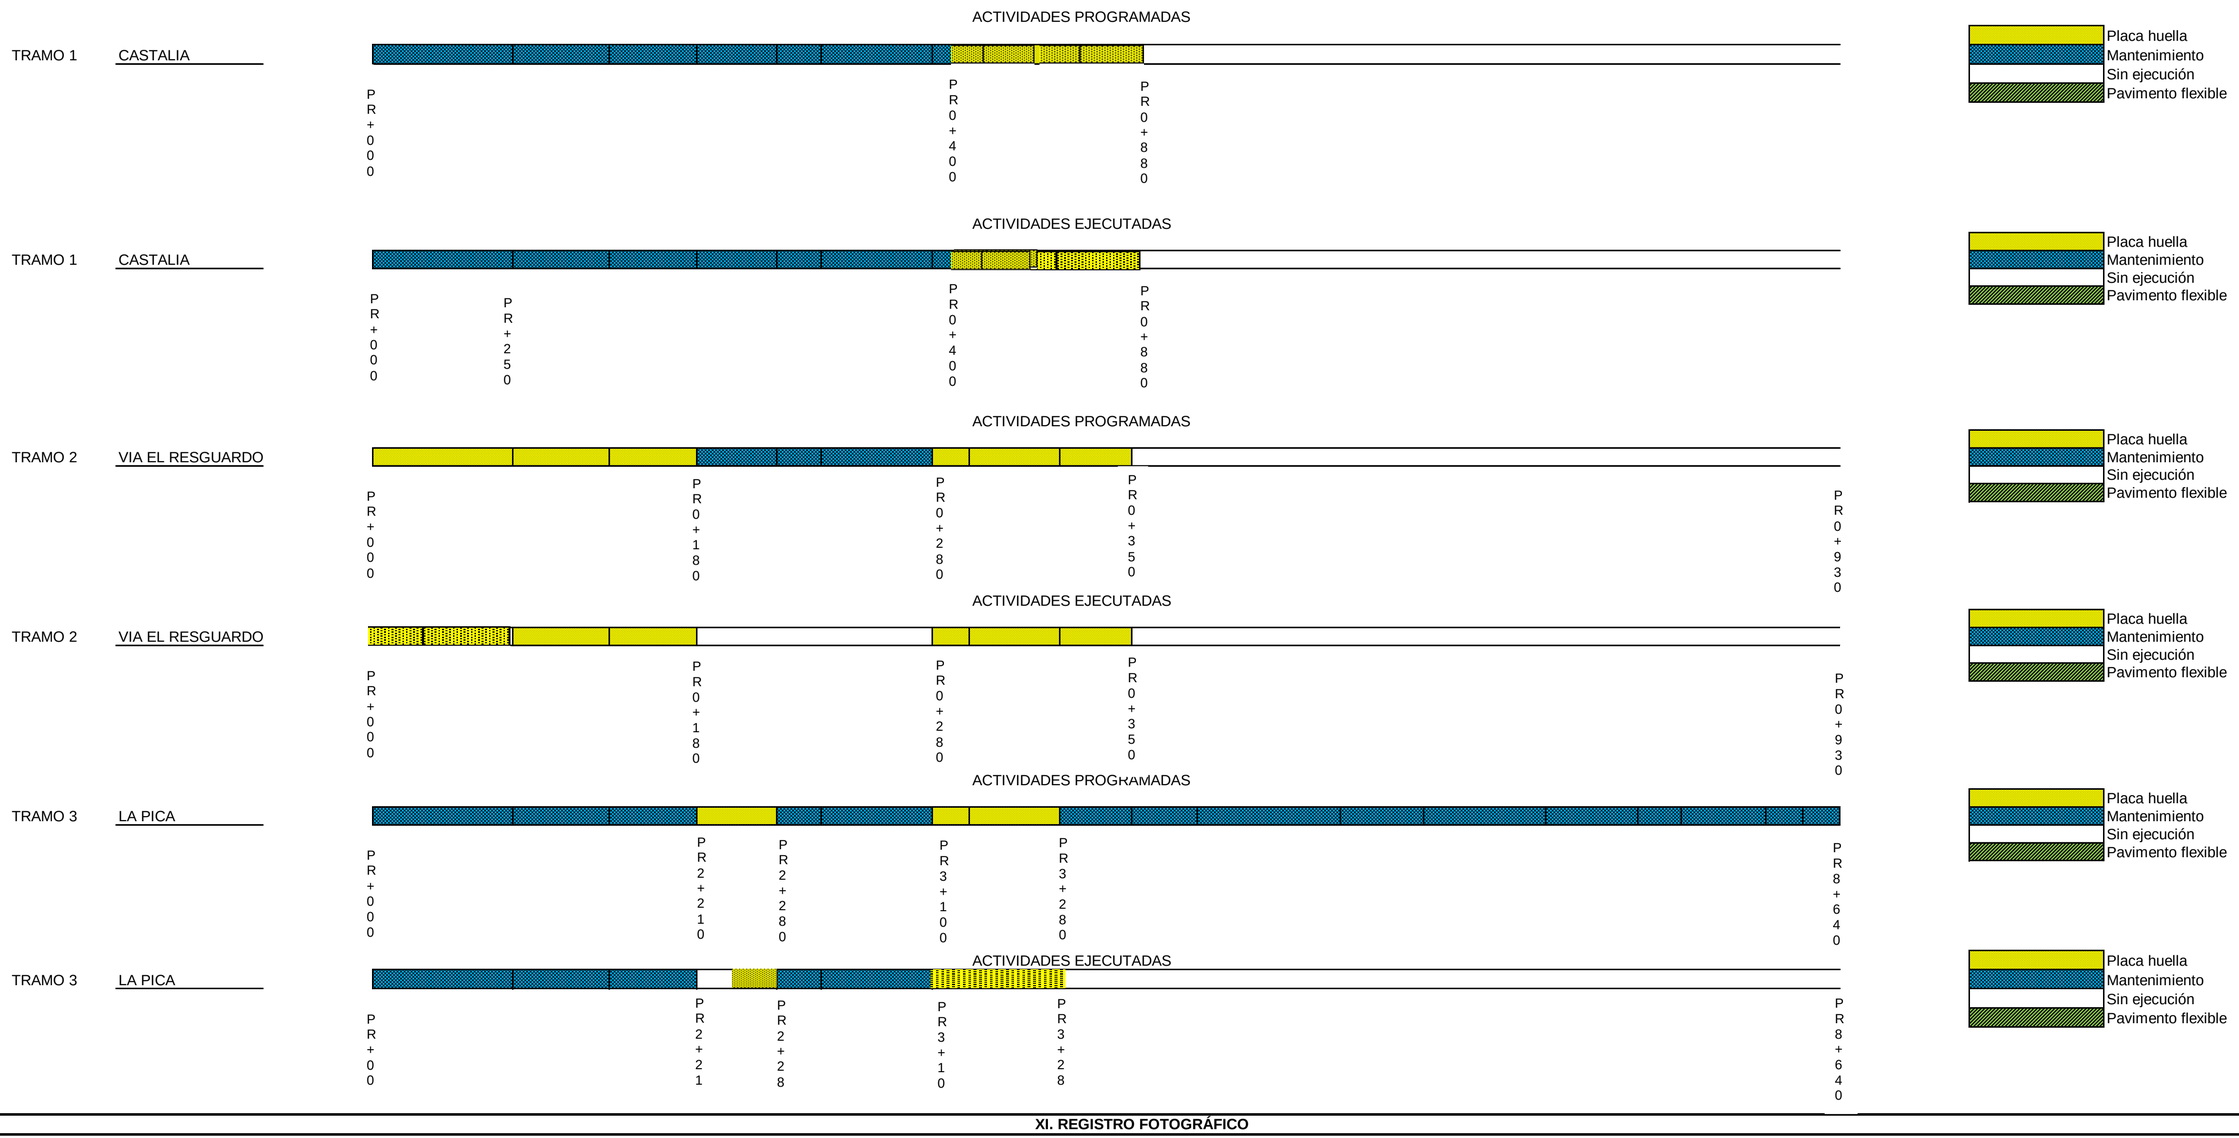

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA HUELLA TRAMO 1 SECTOR LA PICA



LOSA DE TRANSICION Y DESCOLE A OBRA TRANVERSAL.



SECION DE PLACA HUELLA Y CUNETA

NOTA: No se presenta retraso en la obra teniendo en cuenta que el contratista viene superando el plan de contingencia presentado.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial del contratista para su evaluación, revisión y vb de la misma.	
Seguimiento y verificación de la planilla de seguridad por parte del contratista.	
Seguimiento y verificación de la información de los ajustes de los diseños.	
Seguimiento y verificación de las actividades a realizar programado en la programación.	FIRMA
Seguimiento y control de ejecución de obras, meta física e inversión semanal.	NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Se realiza comité de seguimiento de actividades de orden administrativo del convenio y de actividades de obra.	Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/04/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO No. 078-2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CR FASE 2

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2066 de 2023

INTERVENTORÍA: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				**DÍAS DEL MES**																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MINI CARGADOR	BOCAT	S570	CASTALIA-LA PICA-RESGUARDO BERNANDINO PANCHI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA 6M3	MERCEDES BENZ	8M3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MEZCLADORA DE CONCRETO	YAMAHA	2 bultos		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CANGURO	ENAR DEEP	54cm		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BENITIN DOBLE ROD.	MQ MULTIQUIP	2.5 T		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPACTADOR	CAT	7 Tn		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA	CAT 120G	16 TN																																
RETROEXCAVADORA	NEW HOLAND	LB75B																																
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL ACTIVO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL EN REPARACIÓN				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL INACTIVO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5	83,33333
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	16,66667
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	16,66667

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): EL MINICARGADOR SE DAÑO Y NO SE ENCUENTRA ACTIVO A PARTIR DEL DIA 21 DE OCTUBRE, POR OTRO LUGAR EL VIBRO COMPACTDOR Y LA RETRO EXCAVADORA FUERON RETIRADAS POR QUE NO SE PUEDE CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES EN LA ZONA.

OBSERVACIONES:

LA INTERVENTORÍA NO CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: FABIO RICARDO ORTIZ REVELO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202167742 ANT

Firma

Nombre: DAYRO EDUARDO RIOS MARIÑO
Ingeniero Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: MP15202-334277BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 078-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL CR FASE 2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1699 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

NOMBRE ARL: IPS SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ANDRY JULIETH ARAQUE PANQUEVA	1057587460	PROFESIONAL S.S.T.	$ 1.160.000														*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		UNION TEMPORAL CR FASE II	$ 1.160.000	$ 51.300	V	NUEVA EPS	68811568	$ 29.500	PORVENIR	68811568	$ 117.900	$ -	$ -	$ -	
2	JOSE ALEJANDRO ARBOLEDA RUA	1038514154	AYUDANTE	$ 1.160.000																*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 45.300	V	COOSALUD EPS	9464372494	$ 26.000	PORVENIR	9464372494	$ 104.000	$ -	$ -	$ -	
3	JUAN CARLOS ZEA MATEUS	79578936	RESIDENTE	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 174.000	V	SOS EPS	68811568	$ 100.000	PORVENIR	68811568	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	
4	LUIS MIGUEL BAQUIAZA SAIGAMA	1039421714	AYUDANTE	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	9464372494	$ 52.000	PROTECCION	9464372494	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
5	FERNANDO ANDERSON LOPEZ MONTOYA	98634270	AYUDANTE	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 90.500	V	EPS SURA	68811568	$ 52.000	PROTECCION	68811568	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
6	FABIO RICARDO ORTIZ REVELO	98766424	DIRECTOR	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 141.500	V	EPS SANITAS	75219933	$ 252.000	PROTECCION	75219933	$ 322.500	$ -	$ -	$ -	
7	JHON JAIRO OVIEDO ROMO	7710064	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 6.800	V	NUEVA EPS	68811568	$ 52.000	PROTECCION	68811568	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
8	OCTAVIO DE JESUS BUSTAMANTE HERRERA	700033626	OFICIAL	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 90.500	V	COOSALUD MOVILIDAD	9464372494	$ 52.000	PORVENIR	9464372494	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
9	DIOMEDES CARUPIA GONZALEZ	1027883726	OFICIAL	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 90.500	V	COOSALUD MOVILIDAD	9464372494	$ 52.000	COLPENSIONES	9464372494	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
10	YARLINZO CARUPIA TASCON	1003929648	AYUDANTE	$ 1.160.000																						*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 24.200	V	SAVIA SALUD	9464372494	$ 13.900	PORVENIR	9464372494	$ 55.500	$ -	$ -	$ -	
11	JUAN SEBASTIAN GARCIA TASCON	1001617986	AYUDANTE	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 90.500	V	SAVIA SALUD	9464372494	$ 52.000	PORVENIR	9464372494	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
12	YEISON ALEJANDRO GARCIA TASCON	1001617950	AYUDANTE	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 90.500	V	SAVIA SALUD	9464372494	$ 52.000	PORVENIR	9464372494	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
13	DIONICIO DE JESUS ÁNCHI GUTIERREZ	15531436	OFICIAL	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 90.500	V	SAVIA SALUD	9464372494	$ 52.000	COLPENSIONES	9464372494	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
14	DANILO SUCRE LLEGARI	1033646173	AYUDANTE	$ 1.160.000																						*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 24.200	V	SAVIA SALUD	9464372494	$ 13.900	PORVENIR	9464372494	$ 55.500	$ -	$ -	$ -	
15	BERNARDO ANTONIO VAQUIAZA PANCHI	1039421140	OFICIAL	$ 1.160.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			$ 1.160.000	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	9464372494	$ 52.000	PORVENIR	9464372494	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha MARZO a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FABIO RICARDO ORTIZ REVELO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202167742 ANT

Firma
Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría:
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MARZO

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-02, 02:55:58 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 69911670

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 02/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAM CONTRUCCIONES S A S	**Nombre Sucursal**	LAM FAC	**Código Sucursal**	004
Documento	NI900356860	**Dirección**	CL 36 SUR #35 - 46		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3336337		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	VILLAMIZAR SALCEDO JAIRO	**Identificación**	CC 84034926		
Total Afiliados	15	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007463606	GABRIEL ANDRES DE LOS RIOS BALAGUERA	01	00	X																0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 520.000	$ 83.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 520.000	$ 20.800	6,960	$ 520.000	$ 36.200	(CCF04) COMFAMA	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.000
CC 1070952606	LUIS ANDRES HERNANDEZ CARRILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1082997978	MAIRO MANUEL ROMERO MEDINA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1087422363	LUIS EDUARDO AGUIRRE SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1111770369	YINNER JAVIER CASTILLO RIVAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1111793175	MIGUEL FELIPE RIOS CEBALLOS	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1193201081	ERMY ORTIZ RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 12915795	LUIS ALBERTO ARBOLEDA ALEGRIA	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 14471511	JAMINTON ANGULO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 16498518	OSCAR SINISTERRA MINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 16749868	FRANCISCO ANTONIO MORALES	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 72055786	SERGIO MANUEL ALTAMIRANDA ARIZA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 72283808	DAVID GABRIEL DE LOS RIOS DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 79578936	JUAN CARLOS ZEA MATEUS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 94503184	JHON EDGAR REYES TALERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 22.120.000	$ 22.120.000	$ 22.120.000	$ 22.120.000	$ 3.539.200	$ 884.800	$ 1.539.800	$ 884.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.848.600	$ 0	$ 6.848.600

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	98766424-0	FABIO RICARDO ORTIZ REVELO	CL 10 A 47 74 TO 9 AP 202	3188510428	frortiz0@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	IPIALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	15/04/2024	76190902	$721.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	252.000	0		0		0	10	2.200	0	254.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	322.500	0	0	0	0	10	2.800	0	325.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	140.300				140.300	10	1.200	141.500			1.403	141.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	252.000	254.200
Pensión	1	322.500	325.300
Riesgos Laborales	1	140.300	141.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	714.800	721.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	98766424-0	FABIO RICARDO ORTIZ REVELO		CL 10 A 47 74 TO 9 AP 202	3188510428	frortiz0@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	IPIALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	15/04/2024	76190902	$721.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	98766424	ORTIZ REVELO FABIO RICARDO	57	0			N																	230201	2.015.480	322.500	0	0	0	0	EPS005	2.015.480	252.000	14-11	2.015.480	5	140.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901313329	1	GRUPO XAD	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTIOQUIA	calle 26 n 23-45	PUEBLORRICO-ANTIOQUIA	3104677513	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	590309243	9465940095	E	2024/04/08	2024/04/22	BANCOLOMBIA	14	$4,440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1038514154	ARBOLEDA RUA JOSE ALEJANDRO		X																230301	15	$650,000	$104,000	ESSC24	15	$650,000	$26,000	CCF03	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
2	CC	1001617472	BAQUIAZA VAQUIAZA JUAN CAMILO	X	X																230301	5	$216,667	$34,700	ESSC24	5	$216,667	$8,700	CCF03	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	Si	$67,200
3	CC	1039421714	BAQUIAZA SAIGAMA LUIS MIGUEL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	70003626	BUSTAMANTE HERRERA OCTAVIO DE JESUS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	1193044183	CANO GARCIA RUBEN DARIO	X																	230301	17	$736,667	$117,900	ESSC24	17	$736,667	$29,500	CCF03	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0	Si	$228,200
6	CC	1027883726	CARUPIA GONZALEZ DIOMEDES																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
7	CC	1003929648	CARUPIA TASCON YARLINZO		X																230301	8	$346,667	$55,500	EPS040	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-23	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0	Si	$107,500
8	CC	1001617686	GARCIA TASCON JUAN SEBASTIAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	1001617950	GARCIA TASCON YEISON ALEJANDRO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
10	CC	1193071827	OSPINA ARBOLEDA LUIS MIGUEL	X	X																230201	2	$86,667	$13,900	ESSC24	2	$86,667	$3,500	CCF03	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
11	CC	15531436	PANCHI GUTIERREZ DIONICIO DE JESUS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	1033646173	SUCRE LLEGARI DANILO		X																230301	8	$346,667	$55,500	EPS040	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-23	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0	Si	$107,500
13	CC	1013556063	TASCON JUAN GUILLERMO	X																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	1041531767	TEQUIA MURILLO LUIS FELIPE	X	X																230301	2	$86,667	$13,900	EPS040	2	$86,667	$3,500	CCF03	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
15	CC	1039421140	VAQUIAZA PANCHI BERNARDO ANTONIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
16	CC	1001617582	VASQUEZ PANCHI JUAN MIGUEL	X																	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(16)**																					$14,170,002	$2,267,400			$14,170,002	$567,000			$14,170,002	$567,000			$14,170,002	$986,800		$0	$0		$4,388,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901313329	1	GRUPO XAD	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTIOQUIA	calle 26 n 23-45	PUEBLORRICO-ANTIOQUIA	3104677513	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	590309243	9465940095	E	2024/04/08	2024/04/22	BANCOLOMBIA	14	$4,440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$2,267,400	$27,200	$0	$2,294,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$624,000	$7,500	$0	$631,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,421,500	$17,000	$0	$1,438,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$221,900	$2,700	$0	$224,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$986,800	$11,800	$0	$998,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$986,800	$11,800	$0	$998,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$567,000	$6,800	$0	$573,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	16	$567,000	$6,800	$0	$573,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$567,000	$6,900	$0	$573,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$275,700	$3,300	$0	$279,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$1,300	$0	$105,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	$187,300	$2,300	$0	$189,600
TOTAL				16	$4,388,200	$52,700	$0	$4,440,900

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 14/03/2024, el empleador UNION TEMPORAL CR FASE 2 identificado con NIT número 901609482 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6927843	14/03/2024	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1057587460	ANDRYJULIETH ARAQUE PANQUEVA	1300000	TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL	2024-03-14

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Marzo del año 2024.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Medellín, 14 de March de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL CR FASE 2.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL ANTIOQUIA PUEBLORRICO	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %		
C1057587460	ARAQUE PANQUEVA ANDRY JULIETH	15/03/2024		25229183	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/03/2024 15:24:06 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.88.4.219, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ANDRY JULIETH ARAQUE PANQUEVA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.057.587.460**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Marzo del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-05-02, 02:15:52 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 70449848

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

Fecha limite de pago: 2024-04-18

GUARDADA 29/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL CR FASE 2				
Documento	NI901609482	**Dirección**	CL 10A #47 - 74 TORRE 9 OF 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3114093696		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	PASTO	**Departamento**	NARINO		
Representante Legal	ORTIZ REVELO FABIO RICARDO	**Identificación**	CC98766424		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7710064	OVIEDO ROMO JHON JAIRO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 6.800	COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 98634270	LOPEZ MONTOYA FERNANDO ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 90.500	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1057587460	ARAQUE PANQUEVA ANDRY JULIETH	01	00	X															0	17	17	17	17	PORVENIR	$ 736.667	$ 117.900	NUEVA EPS	$ 736.667	$ 29.500	ARL SURA	$ 736.667	$ 51.300	COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 736.667	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 3.336.667	$ 3.336.667	$ 3.336.667	$ 3.336.667	$ 533.900	$ 0	$ 0	$ 133.500	$ 148.600	$ 133.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 949.500	$ 11.600	$ 961.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 078-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL CR FASE 2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2066 de 2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		720
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	**720**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Debido a las precipitaciones que se han presentado en la zona a intervenir se presentan retrasos en las actividades a realizar.

Firma
Nombre: FABIO RICARDO ORTIZ REVELO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202167742 ANT

Firma
Nombre: DAYRO EDUARDO RIOS MARIÑO
Ingeniero residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202- 334277

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Solicitud de información Pluviométrica,

Ing. Zaida D. Orjuela D. <interventoria2066invias@gmail.com> mar, 7 mar, 16:24 (hace 12 días)
para atencionalciudadano

Buenas Tardes señores IDEAM, adjunto envió oficio solicitando información sobre precipitaciones del municipio de Pueblorrico solicitud del instituto INVIAS.

Feliz día

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail



2066-23-INVIAS-...

Responder Reenviar

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 1/04/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL**: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No.: 078-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL CR FASE 2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL MARZO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2066 de 2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	6/03/2024	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA LA PICA	NTC 673-ASTMC39-94	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA LA PICA	1	21mpa	150 KG/CM2	si	SE FALLA 1 MUESTRA A LOS 7 DIAS DE CURADO
2	7/03/2024	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN DERECHA LA PICA	NTC 673-ASTMC39-94	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN DERECHA LA PICA	1	21mpa	144 KG/CM2	si	SE FALLA 1 MUESTRA A LOS 7 DIAS DE CURADO
3	8/03/2024	CONCRETO CICLOPEO EJE CENTRAL LA PICA	NTC 673-ASTMC39-94	CONCRETO CICLOPEO EJE CENTRAL LA PICA	1	14mpa	61 KG/CM2	si	SE FALLA 1 MUESTRA A LOS 7 DIAS DE CURADO
4	1/03/2024	ALETAS Y BASE OBRA K0+905 UNION (ALCANTARILLA)	NTC 673-ASTMC39-95	ALETAS Y BASE OBRA K0+905 UNION (ALCANTARILLA)	2	21 mpa	149 KG/CM2	SI	SE FALLA 2 MUESTRA A LOS 14 DIAS DE CURADO
5	13/03/2024	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA LA PICA	NTC 673-ASTMC39-95	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA LA PICA	2	>95%	212 KG/CM2	Si	SE FALLA 2 MUESTRA A LOS 14 DIAS DE CURADO
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: FABIO RICARDO ORTIZ REVELO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202167742 ANT


Firma

Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría:
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente:	UNION TEMPORAL CR FASE 2
Obra:	PLACA HUELLA CASTALIA PUEBLORR.
Dirección:	CASTALIA PUEBLORRICO ANT.
Teléfonos:	3188510428
N.I.T.#:	901.609.482-0
Dirección de la Obra :	PUEBLORRICO SECTOR RESGUARDO LA UNION Y LA PICA

Características:	K0+905 y	K3+122
Agregado Fino:	ARENA	PEÑALISA
Agregado Grueso:	TRITURADO	PEÑALISA
Cemento:	ALION	
Dosificación:	3000PSI	2000PSI
Interventor:	ZAIDA	ORJUELA DIAZ

Fecha de Informe:	9 DE MAR 2024
Contacto:	FABIO ORTIZ
Factor de Proyección. 3 días :	
Factor de Proyección. 7 días :	X0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días :	

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm2)	Altura (cm)	Volumen (cm3)	Ast (cm)	Densidad (g/cm3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm2)	Resistencia A 28 días (Kg/cm2)
		Vaciado	Prueba											
1	ALETAS Y BASE OBRA K0+905 UNION (ALCANTARILLA)	17/02/2024	23/02/2024	7	15.2	13047	181	30.5	5521		2.363	57256	142	
2	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA LA PICA	28/02/2024	06/03/2024	7	15.2	12993	181	30.5	5521		2.354	60394	150	
3	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN DERECHA LA PICA	29/02/2024	07/03/2024	7	15.2	12950	181	30.5	5521		2.346	57779	144	
4	CICLOPEO PLACA HUELLA NUCLEO CENTRAL LA PICA	01/03/2024	08/03/2024	7	15.2	12948	181	30.5	5521		2.345	24641	61	

ENSAYADO POR: _____

Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales


ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 ensaseauxiliar@hotmail.com

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente:	UNION TEMPORAL CR FASE 2 _	**Características:**	K0+905 y K1+180
Obra:	PLACA HUELLA CASTALIA PUEBLORR.	**Agregado Fino:**	ARENA PEÑALISA
		Agregado Grueso:	TRITURADO PEÑALISA
Dirección:	CASTALIA PUEBLORRICO ANT.	**Cemento:**	ALION
Teléfonos:	31164093696	**Dosificación:**	3000 PSI
N.I.T.#:	901.609.482-0	**Interventor:**	ZAIDA ORJUELA DIAZ
Dirección de la Obra :	PUEBLORRICO SECTOR RESGUARDO LA UNION Y LA PICA		

Fecha de Informe:	14 DE MAR 2024
Contacto:	FABIO ORTIZ
Factor de Proyección. 3 días :	
Factor de Proyección. 7 días :	
Factor de Proyección. 14 días :	X0.9633 + 29.30

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm2)	Altura (cm)	Volumen (cm3)	Ast (cm)	Densidad (g/cm3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm2)	Resistencia A 28 días (Kg/cm2)
		Vaciado	Prueba											
1	ALETAS Y BASE OBRA K0+905 UNION (ALCANTARILLA)	17/02/2024	01/03/2024	14	15.2	13047	181	30.5	5521		2.363	80002	199	
2	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA LA PICA	28/02/2024	13/03/2024	14	15.2	12993	181	30.5	5521		2.354	85070	212	

ENSAYADO POR: _____

Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente:	UNION TEMPORAL CR FASE 2 _	**Características:**	K1+180
Obra:	PLACA HUELLA CASTALIA PUEBLORR.	**Agregado Fino:**	ARENA PEÑALISA
		Agregado Grueso:	TRITURADO PEÑALISA
Dirección:	CASTALIA PUEBLORRICO ANT.	**Cemento:**	ALION
Teléfonos:	31164093696	**Dosificación:**	3000 PSI
N.I.T.#:	901.609.482-0	**Interventor:**	ZAIDA ORJUELA DIAZ
Dirección de la Obra :	PUEBLORRICO SECTOR RESGUARDO INDIGENA		

Fecha de Informe:	9 DE MAR 2024
Contacto:	FABIO ORTIZ
Factor de Proyección. 3 días :	
Factor de Proyección. 7 días :	
Factor de Proyección. 14 días :	X0.9633 + 29.30

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm2)	Altura (cm)	Volumen (cm3)	Ast (cm)	Densidad (g/cm3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm2)	Resistencia A 28 días (Kg/cm2)
		Vaciado	Prueba											
1	ALETAS Y BASE OBRA K0+905 RESGUARDO	23/01/2024	12/02/2024	28	15.2	13047	181	30.5	5521		2.363	219		219
	``													


ENSAYADO POR: _____
Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente:	UNION TEMPORAL CR FASE 2	**Características:**	K2+065 y K3+152
Obra:	PLACA HUELLA CASTALIA PUEBLORR.	**Agregado Fino:**	ARENA PEÑALISA
		Agregado Grueso:	TRITURADO PEÑALISA
Dirección:	CASTALIA PUEBLORRICO ANT.	**Cemento:**	ALION
Teléfonos:	3188510428	**Dosificación:**	3000PSI 2000PSI
N.I.T.#:	901.609.482-0	**Interventor:**	ZAIDA ORJUELA DIAZ
Dirección de la Obra :	PUEBLORRICO SECTOR LA PICA		

Fecha de Informe:	27 DE MAR 2024
Contacto:	FABIO ORTIZ
Factor de Proyección. 3 días :	
Factor de Proyección. 7 días :	X0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días :	

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área (cm2)	Altura (cm)	Volumen (cm3)	Asta (cm)	Densidad (g/cm3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm2)	Resistencia A 28 días (Kg/cm2)
		Vaciado	Prueba											
1	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA LA PICA	08/03/2024	14/03/2024	7	15,2	13044	181	30,5	5521		2,363	56995	142	
2	CICLOPEO PLACA HUELLA NUCLEO CENTRAL LA PICA	11/03/2024	18/03/2024	7	15,2	12990	181	30,5	5521		2,353	38171	95	
3	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN DERECHA LA PICA	22/03/2024	29/03/2024	7	15,2	12947	181	30,5	5521		2,345	58302	145	
4	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN IZQUIERDA LA PICA BORDILLOS	09/04/2024	15/04/2024	7	15,2	12948	181	30,5	5521		2,345	60132	150	
5	CICLOPEO PLACA HUELLA NUCLEO CENTRAL LA PICA	10/04/2024	16/04/2024	7	15,2	12945	181	30,5	5521		2,345	37909	94	
6	RIEL Y CUNETA PLACA HUELLA MARGEN DERECHA BORDILLOS LA PICA	20/04/2024	27/03/2024	7	15,2	12948	181	30,5	5521		2,345	60917	151	

ENSAYADO POR: _____

Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	4 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 078 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL CR FASE 2

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO: 18/08/2022

PLAZO INICIAL: 4,5 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.939.011.755,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.939.011.755,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 31.000.204,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 31.000.204,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2066 DE 2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 193.901.175,50	1	8	2023	30	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40,00%	$ 775.604.702,00	1	8	2023	30	3	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 387.802.065,00	1	8	2023	30	11	2026
Calidad de Estudios y Diseños	0,48%	$ 9.300.065,00	30	11	2023	30	11	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 581.703.526,50	30	11	2023	30	11	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100047218

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 348.052.610,00	18	8	2022	30	4	2024
Patronal		$ 104.415.783,00	18	8	2022	30	4	2024
Contratista y subcontratistas		$ 104.415.783,00	18	8	2022	30	4	2024
Vehiculos propios y no propios		$ 104.415.783,00	18	8	2022	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100011640 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	4 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 193.901.175,50	1	8	2023	30	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40,00%	$ 775.604.702,00	1	8	2023	30	3	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 387.802.065,00	1	8	2023	30	11	2026
Calidad de Estudios y Diseños	0,48%	$ 9.300.065,00	30	11	2023	30	11	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 581.703.526,50	30	11	2023	30	11	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100047218

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 348.052.610,00	18	8	2022	30	4	2024
Patronal		$ 104.415.783,00	18	8	2022	30	4	2024
Contratista y subcontratistas		$ 104.415.783,00	18	8	2022	30	4	2024
Vehiculos propios y no propios		$ 104.415.783,00	18	8	2022	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100011640 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Z0yvPt5eDj2KznI26iUkCw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-100047218	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	10285300	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/08/2022	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL CR FASE 2	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.482-0
DIRECCIÓN	CL 10A 47 74 TO 9 OF 202	**TELÉFONO**	3114093696
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA - INVIAS NIT. 800.215.807.2	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.981.105-2
DIRECCIÓN	CRA 31 NRO 30 41	**TELÉFONO**	3246558377
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA - INVIAS NIT. 800.215.807.2	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.981.105-2
DIRECCIÓN	CRA 31 NRO 30 41	**TELÉFONO**	3246558377

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA OTRO SI NO.5 FECHADO EL 26/12/2023 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES DE LA PÓLIZA Y NO MODIFICADOS BAJO EL PRESENTE ANEXO. CONTINÚAN VIGENTES.

EL OBJETO ES:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.078 - 2022, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA - LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/12/2023	24:00 Horas Del 30/08/2024	193.901.175,50	116.659,45
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 26/12/2023	24:00 Horas Del 30/08/2024	775.604.702,00	466.637,79
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/12/2023	24:00 Horas Del 30/04/2027	387.802.351,00	192.838,70
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	9.300.065,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	581.703.526,50	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.948.311.820,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	776.135,94
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	776.135,94
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	147.465,83
TOTAL A PAGAR	$	923.601,77

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-100047218	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	10285300	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/08/2022	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
GRUPO SERVING SAS - NIT: 900392994 (PART. 5,0 %)
CONSTRUCTORA SEINCIVIL SAS - NIT: 901304858 (PART. 95,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL UNION TEMPORAL CR FASE 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **C-100047218** y endoso, **9** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL CR FASE 2** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA - INVIAS NIT. 800.215.807.2 / MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA - INVIAS NIT. 800.215.807.2** , expedida por la Compañía en **28/12/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CALI a los **28** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023**.



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	10285300

Fecha de Facturación	28/12/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	C–100047218
Periodo Facturado	18/08/2022 — 30/04/2029

Fecha Límite de Pago	27/01/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	776.135,94
IVA	147.465,83
VALOR TOTAL A PAGAR $	923.601,77

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL CR FASE 2
CL 10A 47 74 TO 9 OF 202	901609482
Intermediario	DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **27/01/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	10285300

Fecha de Facturación	28/12/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	C–100047218
Periodo Facturado	18/08/2022 — 30/04/2029

Fecha Límite de Pago	27/01/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	776.135,94
IVA	147.465,83
VALOR TOTAL A PAGAR $	923.601,77

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL CR FASE 2
CL 10A 47 74 TO 9 OF 202	901609482
Intermediario	DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000010285300(3900)000000923601(96)20240127

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299001028530(3900)000000923601(96)20240127

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: U39+AD8FOd1cjb9sxZ97Hg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	C-100011640	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	10285302	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/08/2022	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL CR FASE 2	No. DOC. IDENTIDAD	901.609.482-0
DIRECCIÓN	CL 10A 47 74 TO 9 OF 202	TELÉFONO	3114093696
ASEGURADO	UNION TEMPORAL CR FASE 2	No. DOC. IDENTIDAD	901.609.482-0
DIRECCIÓN	CL 10A 47 74 TO 9 OF 202	TELÉFONO	3114093696
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA OTRO SI NO.5 FECHADO EL 26/12/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES DE LA PÓLIZA Y NO MODIFICADOS BAJO EL PRESENTE ANEXO. CONTINÚAN VIGENTES.

EL OBJETO ES:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.078 - 2022, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA - LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	348.052.610,00	348.052.610,00	348.052.610,02	232.670,79
PATRONAL	104.415.783,00	104.415.783,00	104.415.783,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	104.415.783,00	104.415.783,00	104.415.783,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	104.415.783,00	104.415.783,00	104.415.783,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 348.052.610,02	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	232.670,79
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	232.670,79
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	44.207,45
TOTAL A PAGAR	$	276.878,24

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	C-100011640	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	10285302	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/08/2022	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
GRUPO SERVING SAS - NIT: 900392994 (PART. 5,0 %)
CONSTRUCTORA SEINCIVIL SAS - NIT: 901304858 (PART. 95,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL UNION TEMPORAL CR FASE 2.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA- INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL CR FASE 2, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA- INVIAS

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA- INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	10285302

Fecha de Facturación	28/12/2023		**Fecha Límite de Pago**	27/01/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	232.670,79
Póliza No.	C–100011640		**IVA**	44.207,45
Periodo Facturado	18/08/2022	30/04/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	276.878,24

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL CR FASE 2	
CL 10A 47 74 TO 9 OF 202		901609482
Intermediario	DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **27/01/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	10285302

Fecha de Facturación	28/12/2023		**Fecha Límite de Pago**	27/01/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	232.670,79
Póliza No.	C–100011640		**IVA**	44.207,45
Periodo Facturado	18/08/2022	30/04/2024	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	276.878,24

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL CR FASE 2	
CL 10A 47 74 TO 9 OF 202		901609482
Intermediario	DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000010285302(3900)000000276878(96)20240127

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990010285302(3900)000000276878(96)20240127

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre


4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4.9.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA


Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

Id	Modo de tarea	Texto	Nombre	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1			**1. PLACA HUELLA A= 4m; H= 0,18m**	**$0.00**			
2		1.1	Excavaciones en material común en seco a mano	$356,376.35	80 días	mié 10/01/24	mar 23/04/24
3		1.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) -	$69,372,119.54	80 días	mié 10/01/24	mar 23/04/24
4		1.5	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) -	$17,057,130.86	80 días	mié 10/01/24	mar 23/04/24
5		1.6	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) -	$61,899,414.51	80 días	mié 10/01/24	mar 23/04/24
6		1.7	Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclópeo)	$49,484,252.09	80 días	mié 10/01/24	mar 23/04/24
7		1.8	Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	$82,160,942.65	80 días	mié 10/01/24	mar 23/04/24
8			**2. PLACA HUELLA A= 5m; H= 0,15m**	**$0.00**			
9		2.1	Excavaciones en material común en seco a mano	$75,168.00	45 días	vie 01/03/24	lun 29/04/24
10		2.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) -	$0.00	45 días	vie 01/03/24	lun 29/04/24
11		2.5	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) -	$0.00	45 días	vie 01/03/24	lun 29/04/24
12		2.6	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) -	$16,985,225.00	45 días	vie 01/03/24	lun 29/04/24
13		2.7	Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclópeo)	$16,003,737.00	45 días	vie 01/03/24	lun 29/04/24
14		2.8	Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	$25,329,149.00	45 días	vie 01/03/24	lun 29/04/24
15			**3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L= 5m**	**$0.00**			
16		3.3	Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	$0.00			
17		3.4	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	$0.00			
18		3.5	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	$0.00			
19		3.6	Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	$0.00			
20			**4. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L= 4m**	**$0.00**			
21		4.3	Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	$11,536,736.00	25 días	mié 10/01/24	lun 12/02/24
22		4.4	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	$1,626,939.00	25 días	mié 10/01/24	lun 12/02/24

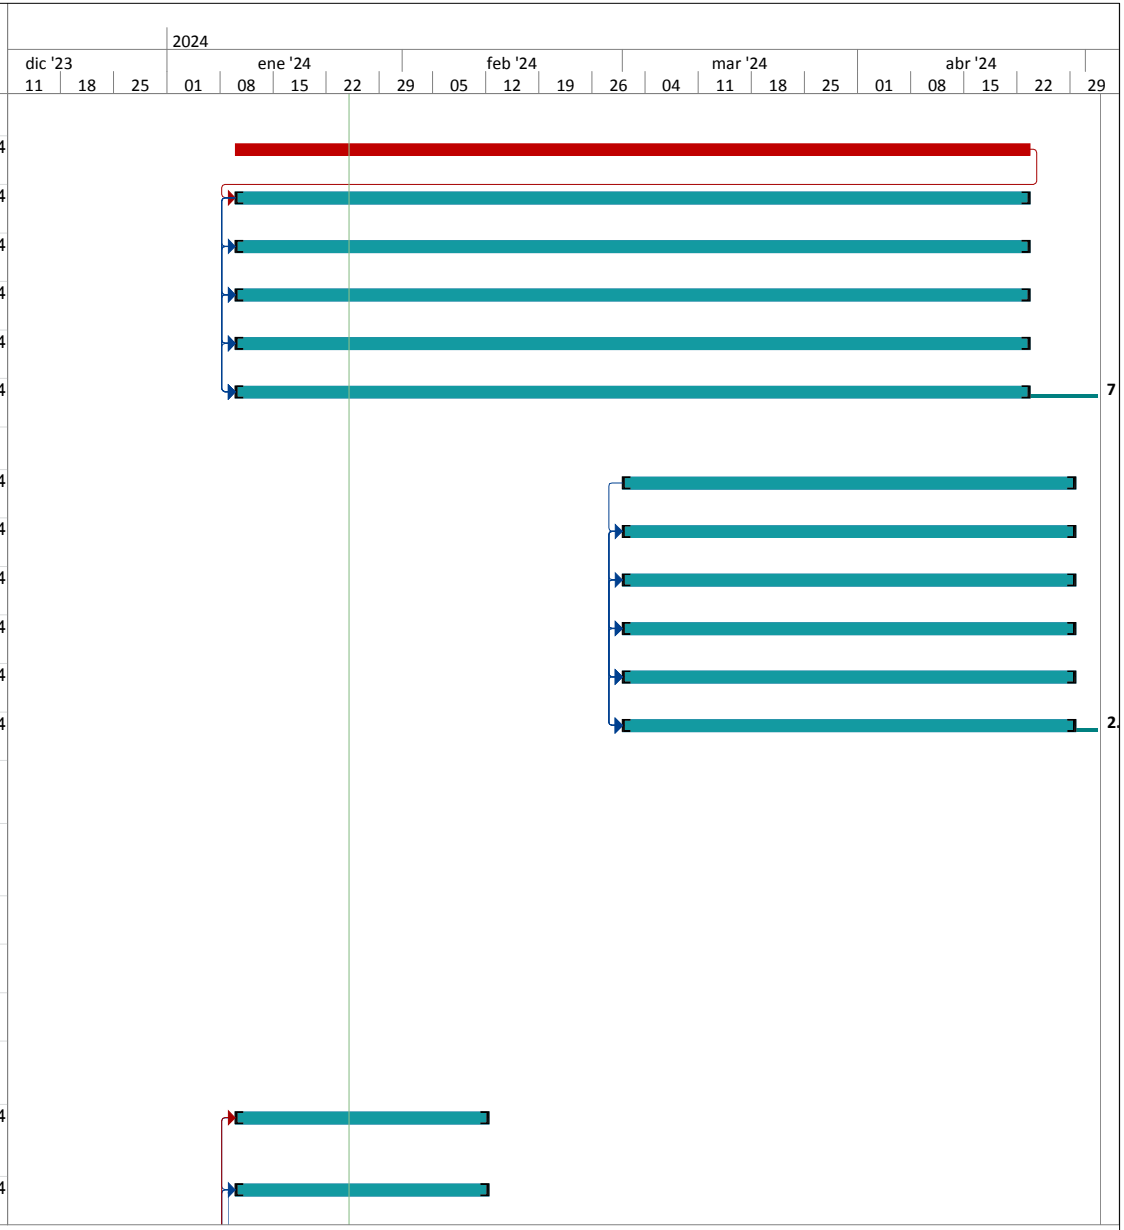


Tareas críticas		Atraso		Hito externo		Informe de resumen manual	
División crítica		Resumen		Tarea inactiva		Resumen manual	
Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
División		Tarea crítica resumida		Resumen inactivo		Sólo fin	
Hito		División crítica resumida		Tarea manual		Fecha límite	
Margen de demora		Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Modo de tarea	Texto	Nombre	Costo	Duración	Comienzo	Fin
23		4.5	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	$19,371,390.00	25 días	mié 10/01/24	lun 12/02/24
24		4.6	Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	$13,195,447.00	25 días	mié 10/01/24	lun 12/02/24
25			**5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE FILTRO**	**$0.00**			
26		5.2	Geotextil NT 2500 o Similar	$0.00			
27		5.3	Material granular drenante	$0.00			
28		5.4	Suministro, transporte y colocación de tubería de 4", perforada para filtros	$0.00			
29			**6. CARACTERIZACIÓN VI**	**$0.00**			
30		6.1	Caracaterización del corred	$6,103,440.00	25 días	jue 01/02/24	mar 05/03/24
31			**OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O**	**$0.00**			
32			**TOTALESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE**	**$0.00**			
33			**7. MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA**	**$0.00**			
34		7.1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	$0.00			
35		7.2	Conformación de la calzada existente	$3,950,521.00	21.22 días	lun 15/01/24	vie 09/02/24
36		7.3	Afirmado	$51,494,452.00	21.22 días	lun 15/01/24	vie 09/02/24
37		7.4	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm - incluye	$2,828,865.00	15 días	lun 15/01/24	vie 02/02/24
38			**8. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y COMPLEMENTARIAS A PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y**	**$0.00**			
39		8.1	Conformación de la calzada existente	$0.00			
40		8.2	Subbase granular clase C.	$86,209,250.00	65 días	jue 01/02/24	jue 25/04/24
41		8.3	Excavaciones varias sin clasificar.	$1,781,670.00	65 días	jue 01/02/24	jue 25/04/24
42		8.4	Excavaciones varias sin clasificar (sin transporte)	$950,272.00	65 días	jue 01/02/24	jue 25/04/24
43		8.5	Relleno para Estructuras con material del sitio	$445,532.00	65 días	jue 01/02/24	jue 25/04/24
44		8.6	Relleno para Estructuras con recebo	$4,453,745.00	65 días	jue 01/02/24	jue 25/04/24

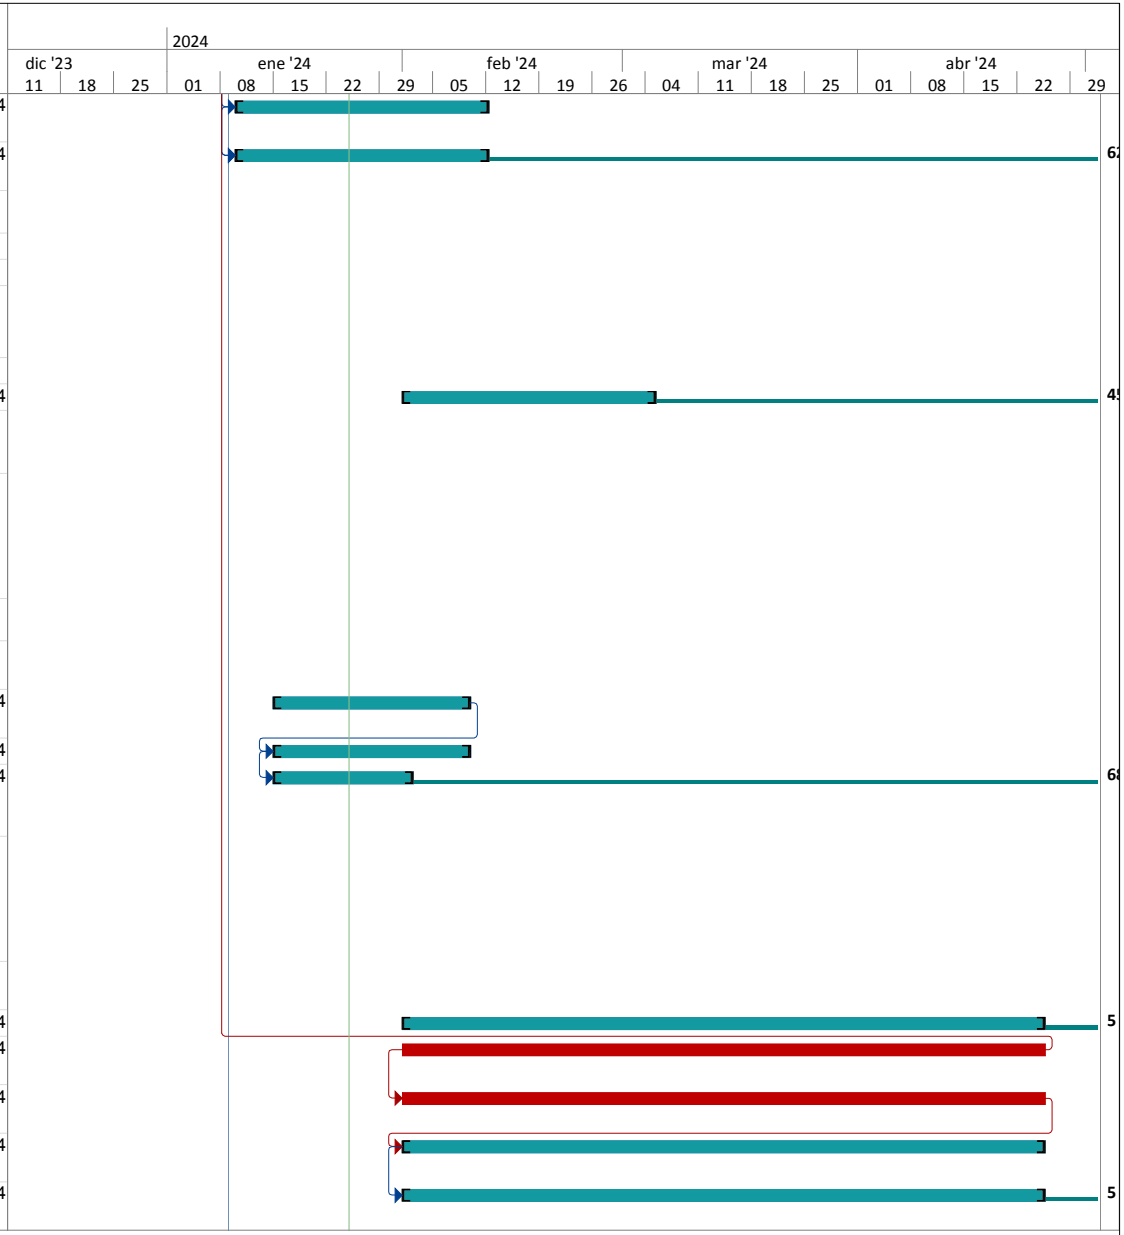



Tareas críticas		Atraso		Hito externo		Informe de resumen manual	
División crítica		Resumen		Tarea inactiva		Resumen manual	
Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
División		Tarea crítica resumida		Resumen inactivo		Sólo fin	
Hito		División crítica resumida		Tarea manual		Fecha límite	
Margen de demora		Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


Id	Modo de tarea	Texto	Nombre	Costo	Duración	Comienzo	Fin
45			**ACTIVIDADES NO PREVISTA**	**$0.00**			
46		NP1	SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE TUBERIA SANITARIA DE 24" DE DIÁMETRO INTERIOR PARA MEJORAMIENTO DE OBRA DE ARTE. Incluye todo lo necesario para su instalacion	$4,900,200.00	25 días	lun 01/04/24	jue 02/05/24
47		NP2	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) PLACA HUELLA INCLUYE ACELERANTE PARA CONCRETO PROPORCION 3% DEL PESO DE CEMENTO, RESISTENCIA	$31,112,707.00	25 días	lun 01/04/24	jue 02/05/24
48			**OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O**	**$0.00**			

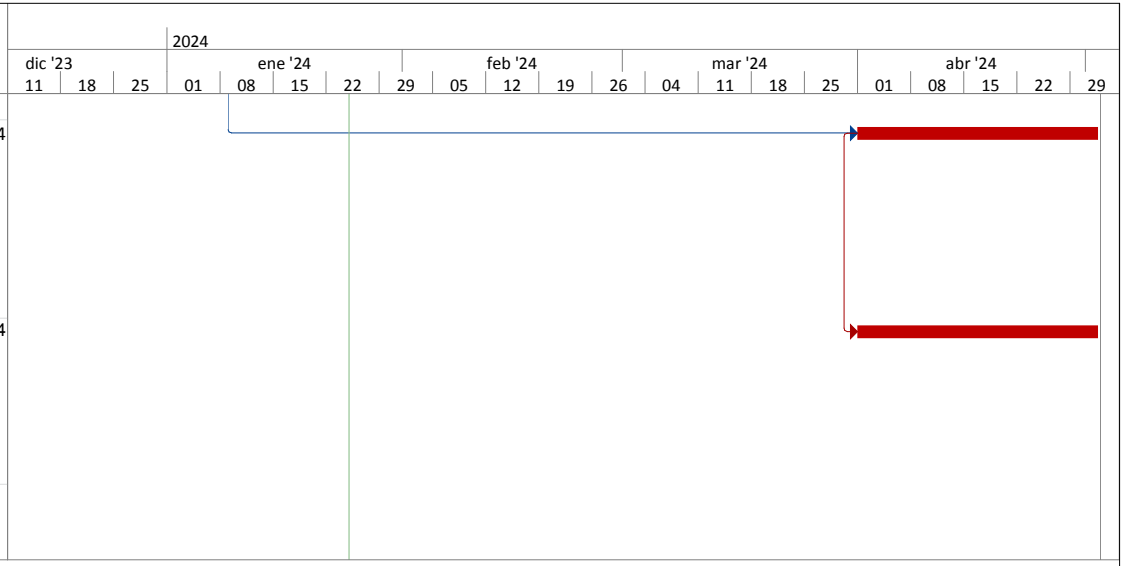

Tareas críticas	Atraso	Hito externo	Informe de resumen manual
División crítica	Resumen	Tarea inactiva	Resumen manual
Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Sólo el comienzo
División	Tarea crítica resumida	Resumen inactivo	Sólo fin
Hito	División crítica resumida	Tarea manual	Fecha límite
Margen de demora	Tareas externas	Sólo duración	Progreso

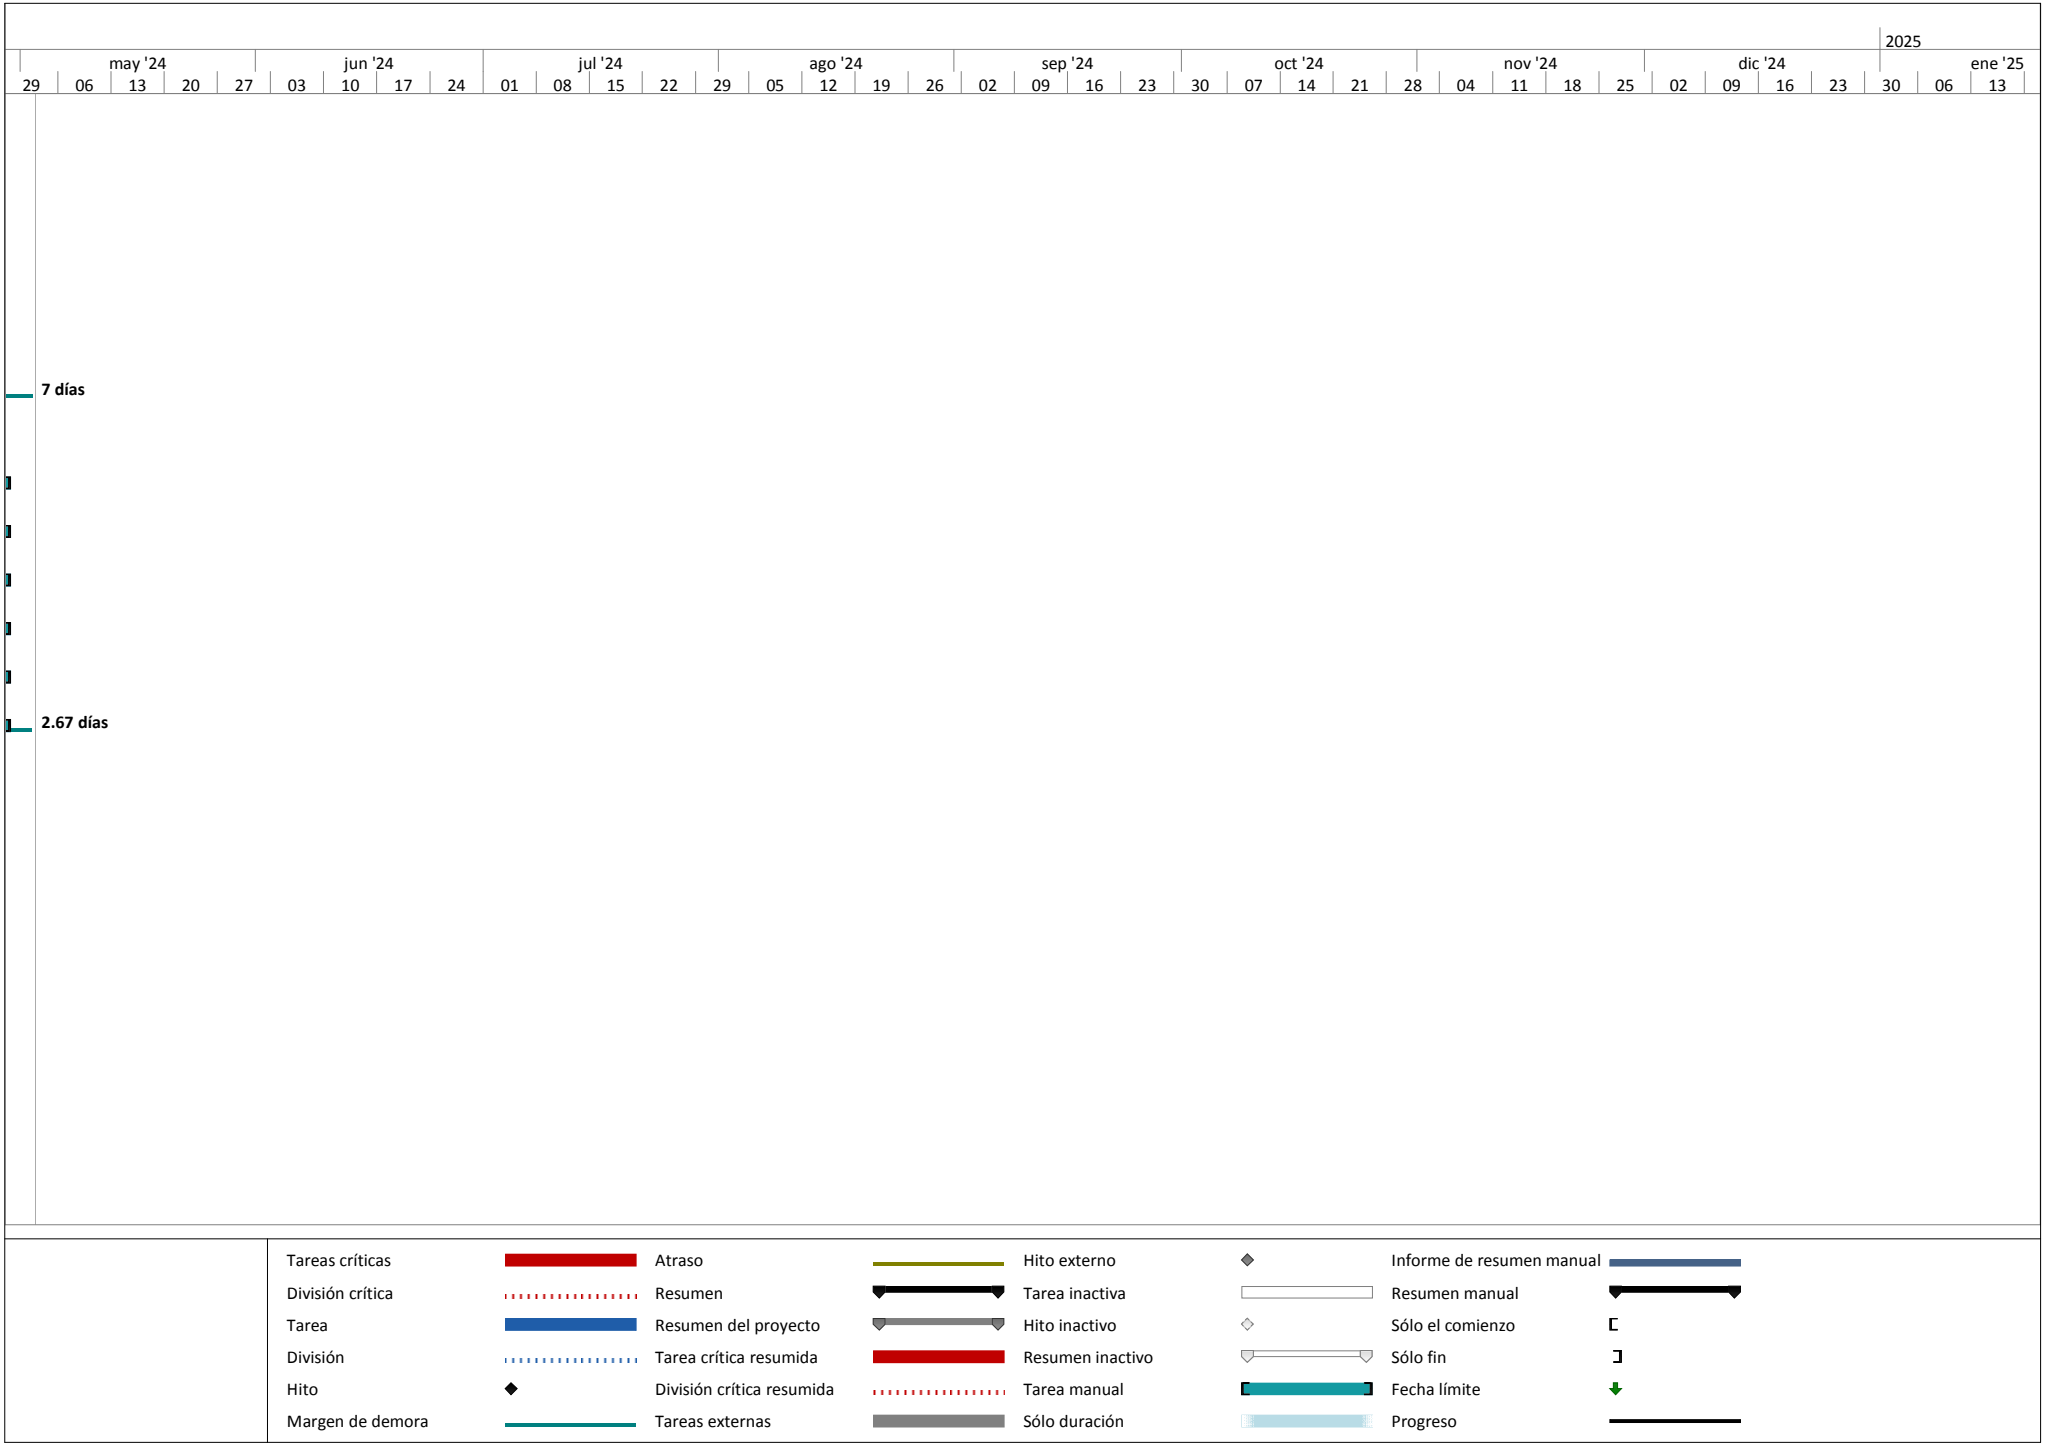
2025
may '24
jun '24
jul '24
ago '24
sep '24
oct '24
nov '24
dic '24
ene '25
29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13
7 días
2.67 días
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso

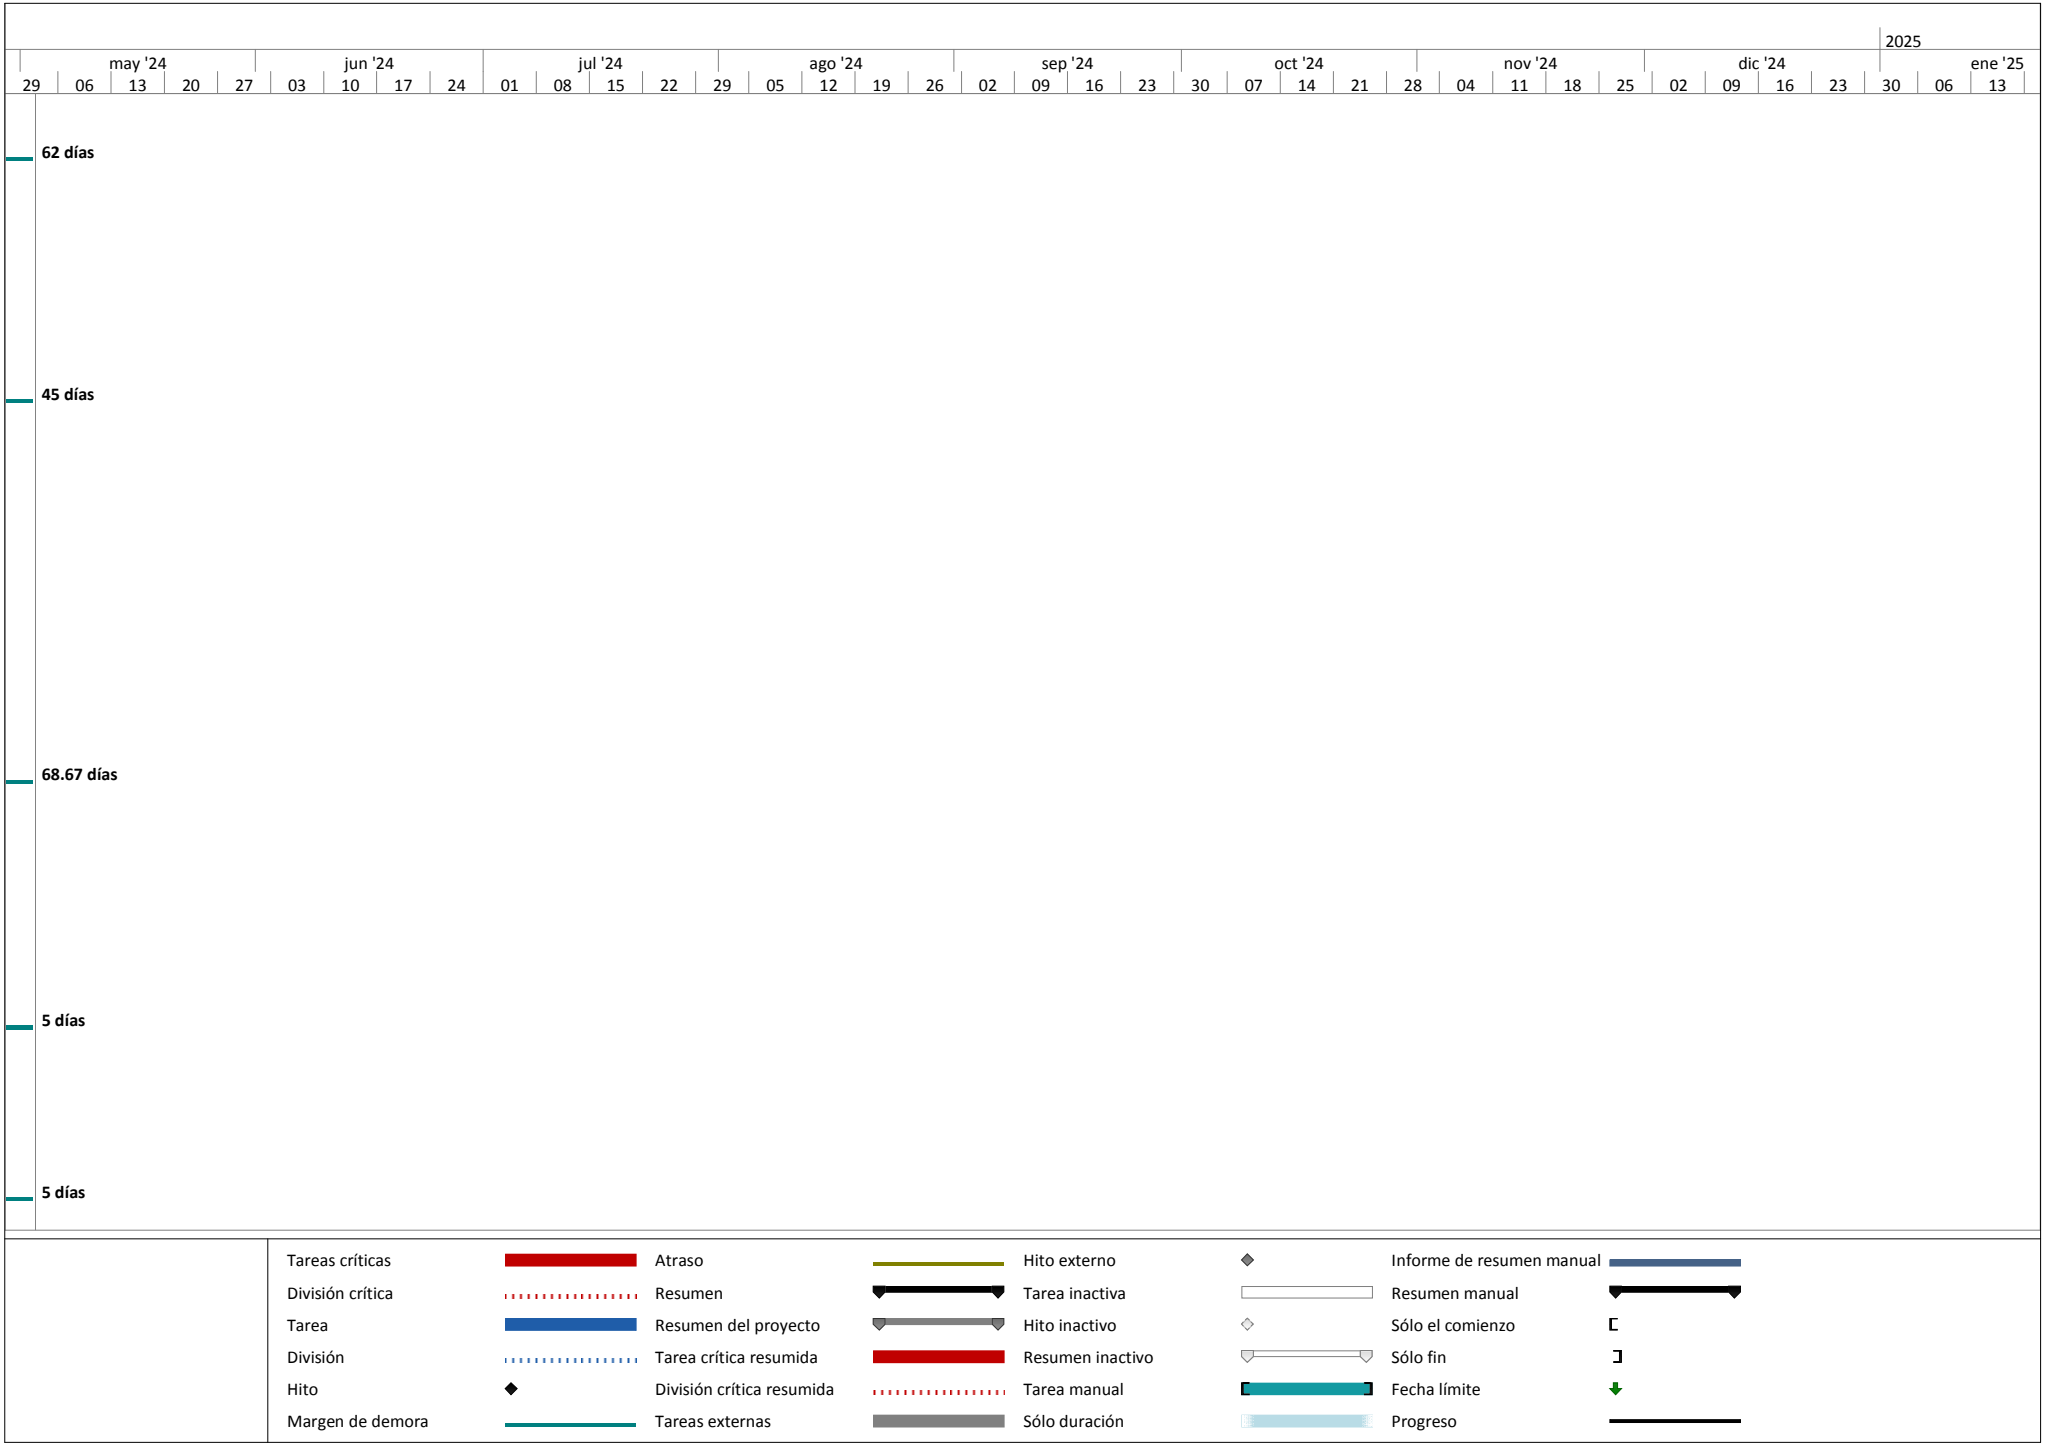
2025
may '24
jun '24
jul '24
ago '24
sep '24
oct '24
nov '24
dic '24
ene '25
29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13
62 días
45 días
68.67 días
5 días
5 días
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso

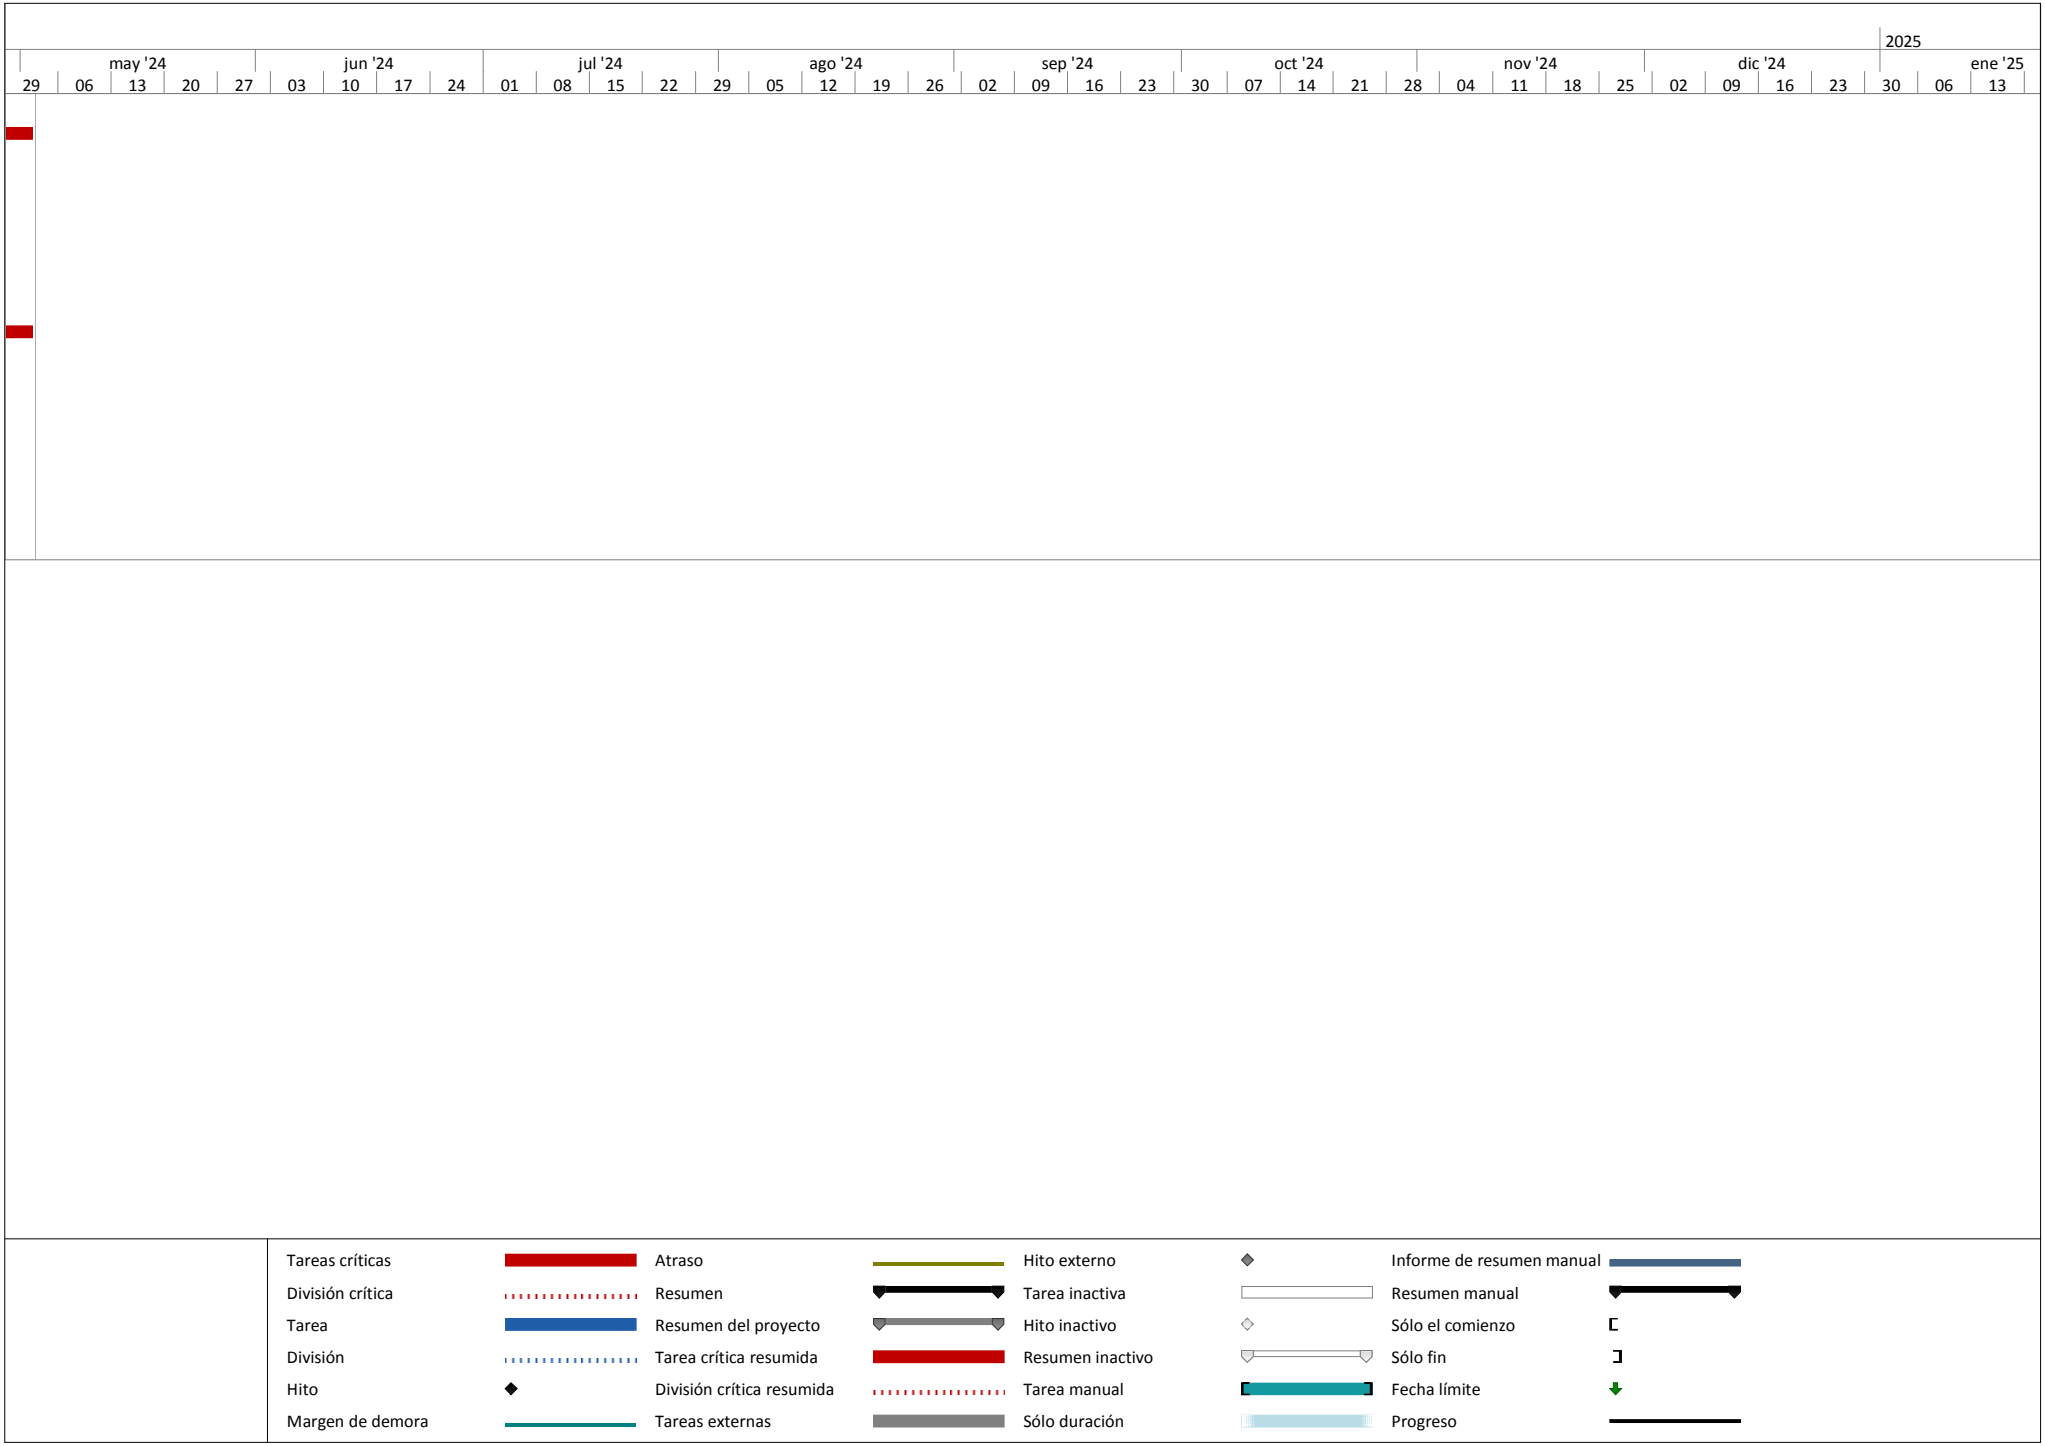
2025
may '24
jun '24
jul '24
ago '24
sep '24
oct '24
nov '24
dic '24
ene '25
29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13
Tareas críticas
Atraso
Hito externo
Informe de resumen manual
División crítica
Resumen
Tarea inactiva
Resumen manual
Tarea
Resumen del proyecto
Hito inactivo
Sólo el comienzo
División
Tarea crítica resumida
Resumen inactivo
Sólo fin
Hito
División crítica resumida
Tarea manual
Fecha límite
Margen de demora
Tareas externas
Sólo duración
Progreso

4.9.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO					MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN					1
PÁGINA					

FECHA: 01/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 078-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CASTALIA -LA PICA (FASE2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CR FASE 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2066-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

PLAZO INICIAL: 4,5 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 17 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/08/2022 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.939.011,76 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.939.011,76

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA ACTA DE MODIFICACION 2 Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 / MES 1 (18 AGO. A 17 AGO.)-2022	2 / MES 2 (18 SEP. A 17 OCT.)-2022	3 / MES 3 (18 OCT. A 17 NOV.)-2022	4 / MES 4 (28 NOV. A 30 NOV .)-2022	5 / MES 5 (1 DIC. A 31 DIC .)-2022	6 / PRORROGA N1 (MES 1) MES 6 (1 ENE. A 31 ENE .)-2023	7 / PRORROGA N1 (MES 2) MES 7 (1 FEB. A 28 FEB .)-2023	8 / PRORROGA N2 (MES 1) MES 8 (1 MAR. A 31 MAR .)-2023	9 / PRORROGA N3 (MES 2) MES 9 (1 AGO. A 31 AGO.)-2023	10 / PRORROGA N3 (MES 3) MES 10 (1 SEP. A 30 SEP .)-2023	11 / PRORROGA N3 (MES 4) MES 11 (1 OCT. A 31 OCT.)-2023	12 / PRORROGA N4 (MES 5) MES 12 (1 NOV. A 30 NOV .)-2023	13 / PRORROGA N3 (MES 6) MES 13 (1 dic. A 31 DIC .)-2023	14 / PRORROGA N5 (MES 1) MES 14 (1 ENE A 31 ENE)-2024	15 / PRORROGA N3 (MES 2) MES 15 (1 FEB A 29 FEB)-2024	16 / PRORROGA N3 (MES 3) MES 16 (1 MAR A 31 MAR)-2024	14 / PRORROGA N3 (MES 4) MES 17 (1 ABR A 30)-2024	
1. PLACA HUELLA A= 4m; H= 0,18m	$ 577.054,38	30,24%	0,00%	% P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,44%	14,44%		2,23%	15,59%	4,45%	7,97%	12,42%	2,58%	4,55%	4,55%	4,55%	100%
				$ P		$0	$0	$0	$0	$272.453	$272.453		$42.500	$297.500	$85.000	$152.054	$237.054	$38.299	$88.299	$88.299	$88.299	
ITEMS (1.1.1,4.1,5.1,6.1,7.1,8)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
2. PLACA HUELLA A= 5m; H= 0,15m	$ 375.650,76	19,69%	0,00%	% P		6,09%	6,07%	6,07%	1,71%	11,45%	11,45%	16,63%				3,06%	3,06%			1,51%	1,51%	
				$ P		$116.227	$115.843	$115.843	$32.581	$216.058	$216.058	$317.257				$58.393	$58.393			$29.197	$29.197	
ITEMS (2.1,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L= 5m	$ -	0,00%	0,00%	% P		0,00%	0,00%	0,00%		0,76%	0,76%			0,00%								
				$ P		$0	$0	$0		$14.335	$14.335			$0								
ITEMS (3.3,3.4,3.5,3.6)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
4. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L= 4m	$ 45.730,51	2,40%	0,00%	% P		0,80%	0,64%	0,06%		0,82%	0,82%					2,40%	2,40%	1,18%				
				$ P		$15.301	$12.257	$1.113		$15.459	$15.459					$45.731	$45.731	$22.865				
ITEMS (4.3,4.4,4.5,4.6)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE FILTRO	109.349,13	5,73%	0,00%	% P		1,12%	0,93%			2,56%	2,56%	3,63%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	1,05%					50%
				$ P		$21.375	$17.721			$48.236	$48.236	$69.169	$10.045	$10.045	$10.045	$10.045	$20.090					
ITEMS (5.2,5.3,5.4)	$ -	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
6. CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 6.103,44	0,32%	0,00%	% P		0,95%	0,39%	0,00%		0,16%	0,16%		0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,16%		0,31%			
				$ P		$18.220	$7.402	$0		$3.052	$3.052		$1.526	$4.578	$3.052	$3.052	$0,00		$6.103,44			
ITEMS (6.1)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
7. MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA	$ 371.245,42	19,46%	0,00%	% P				0,00%	0,00%	8,73%	8,73%	5,05%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	7,20%	1,80%	1,20%			
				$ P				$1.221	$0	$164.803	$164.803	$96.378	$68.717	$68.717	$68.717	$68.717	$137.434	$34.964	$23.310			
ITEMS (7.1,7.2,7.3,7.4)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
8. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y COMPLEMENTARIAS A PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y FILTROS	385.508,37	20,20%	0,00%	% P		0,00%	0,00%	14,29%	5,71%	8,33%	8,33%	8,85%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	5,68%		1,61%	1,61%	1,61%	
				$ P		$0	$0	$272.581	$108.897	$157.222	$157.222	$168.880	$54.157	$54.157	$54.157	$54.157	$108.314		$31.280	$31.280	$31.280	
ITEMS (8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
9.ACTIVIDADES NO PREVISTAS (9.1,9.2)	37.369,53	1,96%	0,00%	% P								0,93%				1,03%	1,03%				1,86%	
				$ P								$17.649				$19.720	$19.720				$36.013	
	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.908.011,54**	**100%**	**0%**																			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																						

Reprogramación No.1 · Reprogramación No.2 · Reprogramación No.3 · Reprogramación No.4 · Reprogramación No.5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	8,97%	8,03%	20,48%	7,41%	47,25%	47,25%	35,08%	9,27%	22,64%	11,50%	21,51%	69,55%	5,56%	7,68%	7,67%	9,53%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 171.122,37	$ 153.222,63	$ 390.756,99	$ 141.477,93	$ 891.618,70	$ 891.618,70	$ 574.451,11	$ 255.058,13	$ 434.996,47	$ 220.970,61	$ 405.765,45	$ 626.736,06	$ 96.128,43	$ 148.992,00	$ 148.775,67	$ 184.788,58	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	8,97%	17,00%	37,48%	44,89%	47,25%	94,50%	35,08%	44,35%	66,99%	78,49%	0,00%	69,55%	75,11%	82,80%	90,47%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 171.122,37	$ 324.344,99	$ 715.101,98	$ 856.579,91	$ 1.886.980,27	$ 995.361,57	$ 1.048.866,84	$ 906.361,11	$ 1.341.357,59	$ 1.562.328,20	$ -	$ 626.736,06	$ 96.128,43	$ 245.120,44	$ 393.896,10	$ 578.684,68	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	5,44%	0%	25%	35,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,55%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,44%	5,44%	30,30%	34,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,55%	69,55%	69,55%	69,55%	69,55%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 103.742,87	$ -	$ 474.415,73	$ 651.302,98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
TOTALESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 31.000,21	$ -	0%
	$ -	$ -	
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 31.000,21	$ 31.000,21	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -	$ -	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.939.011,76**	**$ 1.542.748,66**	**79,56%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ -**	**$ -**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES						
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO					EJECUTADO
BARRAS	$ Valor					$ Valor
CURVAS						

OBSERVACIONES:

Firma:

Nombre: FABIO RICARDO ORTIZ REVELO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:05202167742 ANT.

Firma:

Nombre:ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Representante Legal o su Apoderado
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

al: Archivo de Gestión del INVIAS.
ora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 078-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CASTALIA -LA PICA (FASE2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CR FASE 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2066-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

PLAZO INICIAL: 4,5 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 17 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/08/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.939.011,76 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.939.011,76

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA ACTA DE MODIFICACION 2 Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES 1 (18 AGO. A 17 AGO.)-2022	MES 2 (18 SEP. A 17 OCT.)-2022	MES 3 (18 OCT. A 17 NOV.)-2022	MES 4 (28 NOV. A 30 NOV .)-2022	MES 5 (1 DIC. A 31 DIC .)-2022	PRORROGA N1 (MES 1) MES 6 (1 ENE. A 31 ENE .)-2023	PRORROGA N1 (MES 2) MES 7 (1 FEB. A 28 FEB .)-2023	PRORROGA N2 (MES 1) MES 8 (1 MAR. A 31 MAR .)-2023	PRORROGA N3 (MES 2) MES 9 (1 AGO. A 31 AGO.)-2023	PRORROGA N3 (MES 3) MES 10 (1 SEP. A 30 SEP .)-2023	PRORROGA N3 (MES 4) MES 11 (1 OCT. A 31 OCT.)-2023	PRORROGA N4 (MES 5) MES 12 (1 NOV. A 30 NOV .)-2023	PRORROGA N3 (MES 6) MES 13 (1 dic. A 31 DIC .)-2023	PRORROGA N5 (MES 1) MES 14 (1 ENE A 31 ENE)-2024	PRORROGA N3 (MES 2) MES 15 (1 FEB A 29 FEB)-2024	PRORROGA N3 (MES 3) MES 16 (1 MAR A 31 MAR)-2024	PRORROGA N3 (MES 4) MES 17 (1 ABR A 30)-2024	100%
1. PLACA HUELLA A= 4m; H= 0,18m	$ 577.054,38	30,24%	0,00%	% P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,44%	14,44%		2,23%	15,59%	4,45%	7,97%	12,42%	2,58%	4,50%	4,55%	4,55%		
				$ P		$0	$0	$0	$0	$272.453	$272.453		$42.500	$297.500	$85.000	$152.054	$237.054	$38.299	$88.299	$88.299	$88.299		
				$ E																		
ITEMS (1.1,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8)	$0	0,00%	$0	% E																		
				% P																		
2. PLACA HUELLA A= 5m; H= 0,15m	$ 375.650,76	19,69%	0,00%	$ P		6,09%	6,07%	6,07%	1,71%	11,45%	11,45%	16,63%				3,06%	3,06%			1,51%	1,51%		
				$ E		$116.227	$115.843	$115.843	$32.581	$216.058	$216.058	$317.257				$58.393	$58.393			$29.197	$29.197		
ITEMS (2.1,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8)	$0	0,00%	$0	% E																		
3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L= 5m	$ -	0,00%	0,00%	% P		0,00%	0,00%	0,00%		0,76%	0,76%			0,00%								
				$ P		$0	$0	$0		$14.535	$14.535			$0								
ITEMS (3.3,3.4,3.5,3.6)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
4. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L= 4m	$ 45.730,51	2,40%	0,00%	% P		0,80%	0,64%	0,06%		0,82%	0,82%					2,40%	2,40%	1,18%				
				$ P		$15.301	$12.257	$1.113		$15.459	$15.459					$45.731	$45.731	$22.865				
ITEMS (4.3,4.4,4.5,4.6)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE FILTRO	109.349,13	5,73%	0,00%	% P		1,12%	0,93%			2,59%	2,59%	3,63%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	1,06%						50%
				$ P		$21.375	$17.721			$48.236	$48.236	$69.169	$10.045	$10.045	$10.045	$10.045	$20.090						
ITEMS (5.2,5.3,5.4)	$ -	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
6. CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 6.103,44	0,32%	0,00%	% P		0,95%	0,39%	0,00%		0,16%	0,16%		0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,16%		0,31%				
				$ P		$18.220	$7.402	$0		$3.052	$3.052		$1.526	$4.578	$3.052	$3.052	$0,00		$6.103,44				
ITEMS (6.1)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
7. MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA	$ 371.245,42	19,46%	0,00%	% P				0,06%	0,00%	8,73%	8,73%	5,05%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	7,20%	1,80%	1,20%				
				$ P				$1.221	$0	$164.803	$164.803	$96.378	$68.717	$68.717	$68.717	$68.717	$137.434	$34.964	$23.310				
ITEMS (7.1,7.2,7.3,7.4)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
				% P		0,00%	0,00%	14,29%	5,71%	8,33%	8,33%	8,85%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	5,68%		1,61%	1,61%	1,61%		
8. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y COMPLEMENTARIAS A PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y FILTROS	385.508,37	20,20%	0,00%	$ P		$0	$0	$272.581	$108.897	$157.222	$157.222	$168.880	$54.157	$54.157	$54.157	$54.157	$108.314		$31.280	$31.280	$31.280		
ITEMS (8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6)	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
	37.369,53	1,96%	0,00%	% P								0,93%				1,03%	1,03%				1,86%	
9.ACTIVIDADES NO PREVISTAS (9.1,9.2)				$ P								$17.649				$19.726	$19.720				$36.013	
	$0	0,00%	$0	$ E																		
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.908.011,54**	**100%**	**0%**																			0%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																						

Reprogramación No.1 · Reprogramación No.2 · Reprogramación No.3 · Reprogramación No.4 · Reprogramación No.5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	8,97%	8,03%	20,48%	7,41%	47,25%	47,25%	35,08%	9,27%	22,64%	11,50%	21,51%	69,55%	5,56%	7,68%	7,67%	9,53%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 171.122,37	$ 153.222,63	$ 390.756,99	$ 141.477,93	$ 891.618,70	$ 891.618,70	$ 574.451,11	$ 255.058,13	$ 434.996,47	$ 220.970,61	$ 405.765,45	$ 626.736,06	$ 96.128,43	$ 148.992,00	$ 148.775,67	$ 184.788,58				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	8,97%	17,00%	37,48%	44,89%	47,25%	94,50%	35,08%	44,35%	66,99%	78,49%	58,81%	69,55%	75,11%	82,80%	90,47%	100,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 171.122,37	$ 324.344,99	$ 715.101,98	$ 856.579,91	$ 1.748.198,61	$ 1.886.980,27	$ 1.048.866,84	$ 906.361,11	$ 1.341.357,59	$ 1.562.328,20	$ 1.122.101,59	$ 626.736,06	$ 96.128,43	$ 245.120,44	$ 393.896,10	$ 578.684,68				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	5,44%	0%	25%	35,08%	3,58%	3,72%	9,66%	7,71%	9,32%	6,84%	6,19%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 103.742,87	$ -	$ 474.415,73	$ 651.302,98	$ 69.510,28	$ 72.131,24	$ 187.308,54	$ 149.497,81	$ 180.715,90	$ 132.628,40	$ 120.024,83	$ -	$ -				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,44%	5,44%	30,30%	34,14%	37,72%	41,44%	51,10%	58,81%	68,13%	74,97%	81,16%	81,16%	81,16%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 103.742,87	$ -	$ 474.415,73	$ 651.302,98	$ 720.813,26	$ 792.944,50	$ 980.253,03	$ 1.129.750,84	$ 1.310.466,73	$ 1.443.095,14	$ 1.563.119,96	$ -	$ -				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
TOTALESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 31.000,21	$ 31.000,21	100%
	$ -	$ -	
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
*	$ -	$ -	
	$ -	$ -	%
*	$ -	$ -	
	$ -	$ -	%
*	$ -	$ -	
	$ -	$ -	%
*	$ -	$ -	
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 31.000,21	$ 31.000,21	100%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -	$ -	0%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.939.011,76**	**$ 31.000,21**	**100%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ -**	**$ -**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES						
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO					EJECUTADO
BARRAS	$ Valor					$ Valor
CURVAS	- - - - -					———

OBSERVACIONES:

Firma:

Nombre: FERNANDO RICARDO ORTIZ REVELO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:05202167742 ANT.

Firma:

Nombre:ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Representante Legal o su Apoderado
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

4.9.4. ACTAS DE COMITE DE OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

FECHA: 19/03/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 078-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CR FASE 2

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2066 - 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

*SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA
*ACTUALIZACION DE PLATAFORMA SECOP.
*BALANCE DE CONTRATO DE OBRA.
*RENDIMIENTOS FINANCIEROS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

*ESTADO DE EJECUCION
*AVANCE DE OBRA (PROGRAMADO VS EJECUTADO)
*RENDIMIENTOS FINANCIEROS
*SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA
*BALANCE DE CONTRATO DE OBRA.
*ACTUALIZACION DE PLATAFORMA SECOP.
*ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL A SOSTENIBILIDAD.

FECHA	19/03/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

*Se inicia reunión con la presencia del ingeniero JAVIER SOLARTE por parte del instituto nacional de vías, además la presencia del Director de obra Ing. Fabio Ortiz, por parte del municipio la ingeniera Evelin y el doctor Carlos Andres Taborda secretario de hacienda, así mismo los profesionales de interventoría Ing. Zaida Dayana Orjuela Directora de interventoría 2066, el ingeniero Dayro Eduardo Ríos residente de interventoría y la profesional socio- ambiental Jahira Gomez; reunión la cual tiene como origen el seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto en desarrollo, evaluándose el estado del proyecto y el avance desarrollado en el trascurso de la última semana.

*Se inicia el comité con el tema 1 correspondiente al avance desarrollado a la fecha describiendo el ingeniero residente de interventoría un avance de 85,04% con respecto a un avance programado de 86% el cual nos arroja un retraso significativo de 0,96%.

*Teniendo en cuenta la presencia del doctor Carlos secrtario de hacienda del municipio se inicia la reunion con su intervencion para dar claridad del avance de los compromisos generados correspondientes a los rendimientos finncieron del convenio, lo cual el doctor Carlos intervino manifestando que ya viene adelantando estos rendimientos por lo cual se compromete para el proximo comite de obra haber diligenciado estos rendimiento y estar al dia con los compromisos generados.

*El contratista durante esta semana cumplió y supero a cabalidad el plan de contingencia presentado con la especificación de las cuadrillas a implementar por actividad por ejecutar, rendimiento y equipos a utilizar, llegando a un avance de 180 ml de placa huella 100%.

*Teniendo en cuenta que se requiere un cierre del alcance físico de las actividades en desarrollo el supervisor del convenio ing. Javier Solarte solicita a la interventoría finalizar en conjunto con el contratista el balance del contrato para de esta manera concretar un alcance de meta física consolidada.

*Dentro de las obligaciones dentro del convenio por parte de la administración municipal y el instituto nacional de vías se generó el compromiso de llevar a cabo la actualización de la plataforma de contratación SECOP de tal manera que se encuentre todo acto administrativo de forma paralela a la celebración del mismo, teniendo en cuenta que a la fecha aún no se encuentra actualizada esta información la supervisión del convenio en cabeza del ingeniero Javier Solarte solicita generar un nuevo compromisos para el proximo comite a desarrollar que la administracion tenga actualizada la plataforma o de lo contrario se iniciara llamado de atenion por incumplimiento a las obligaciones del convenio.

*Se adelanta la intervencion a un nuevo a tema a tratar en el comite el cual es el seguimiento AMBIENTAL al contrato de obra 078 en el cual se genera el comprmisos de la interventoria de enviar al area de sostenibilidad los informes trimestrales pertinentes a la fecha del contrato de obra e interventoria, actividad a desarrollar en cabeza de la lider social y ambiental de interventoria Jahira Gomez.

FECHA: 19/03/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA	martes, 2 de abril de 2024	INTERVENTORIA - CONTRATISTA
RENDIMIENTOS FINANCIERO PSE	martes, 2 de abril de 2024	MUNICIPIO
ACTUALIZACION DE INFORMACION EN EL SECOP	martes, 2 de abril de 2024	MUNICIPIO
BALANCE DEL PROYECTO	martes, 2 de abril de 2024	INTERVENTORIA - CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 2/04/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DAYRO EDUARDO RIOS MARIÑO	INGENIERO RESIDENTE	ZAIDA DAYANA ORJUELA	
FABIO ORTIZ	DIRECTOR DE OBRA (Especialista)	UNION TEMPORAL FASE 2	
ZAIDA DAYANA ORJUELA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	ZAIDA DAYANA ORJUELA	
JAVIER SOLARTE	SUPERVISOR	INVIAS	
JAHIRA MILENA GOMEZ	SOCIO AMBIENTAL	ZAIDA DAYANA ORJUELA	
CARLOS TABORDA	SECRETARIO DE HACIENDA	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	
INGENIERA EVELIN	INGENIERA AUXILIAR PLANEAC	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio. Activar

22:58

Chat | Gente 8 | Participar | Reaccionar | Vista | Más | Cámara | Micro | Compartir | Salir

Javier Jesús Solarte Portilla

J

Jg (No comprobado)

U2

UNION TEMPORAL CR FASE ...

SI

SECRETARIA DE PLANEACIÓ...

FO

FABIO ORTIZ (No comprobad...

ZO

Zaida Orjuela (No comproba...

CR

carlos andres taborda rodrig...

IR

Buscar

ESP 2:57 p. m. 19/03/2024

FECHA: 5/03/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 078-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CR FASE 2

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2066 - 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

*SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

*ESTADO DE EJECUCION
*AVANCE DE OBRA (PROGRAMADO VS EJECUTADO)
*RENDIMIENTOS FINANCIEROS
*SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA
*BALANCE DE CONTRATO DE OBRA.
*ACTUALIZACION DE PLATAFORMA SECOP.

FECHA	5/03/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

*Se inicia reunión con la presencia del ingeniero JAVIER SOLARTE por parte del instituto nacional de vías, además la presencia del Director de obra Ing. Fabio Ortiz, así mismo los profesionales de interventoría Ing. Zaida Dayana Orjuela Directora de interventoría 2066, el ingeniero Dayro Eduardo Ríos residente de interventoría; reunión la cual tiene como origen el seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto en desarrollo, evaluándose el estado del proyecto y el avance desarrollado en el trascurso de la última semana.

*Se inicia el comité con el tema 1 correspondiente al avance desarrollado a la fecha describiendo el ingeniero residente de interventoría un avance de 81,16% con respecto a un avance programado de 84,80% el cual nos arroja un retraso significativo de 3,64%.

*Teniendo en cuenta la falta de presencia del municipio en el presente comité se solicita a la administración la reiterada solicitud de adelantar los rendimientos financieros del convenio y de esta manera cumplir con las obligaciones que contiene el convenio.

*El contratista durante esta semana cumplió y supero a cabalidad el plan de contingencia presentado con la especificación de las cuadrillas a implementar por actividad por ejecutar, rendimiento y equipos a utilizar, llegando a un avance de 50 ml 100%.

*Teniendo en cuenta que se requiere un cierre del alcance físico de las actividades en desarrollo el supervisor del convenio ing. Javier Solarte solicita a la interventoría finalizar en conjunto con el contratista el balance del contrato para de esta manera concretar un alcance de meta física consolidada.

*Dentro de las obligaciones dentro del convenio por parte de la administración municipal y el instituto nacional de vías se generó el compromiso de llevar a cabo la actualización de la plataforma de contratación SECOP de tal manera que se encuentre todo acto administrativo de forma paralela a la celebración del mismo, teniendo en cuenta que a la fecha aún no se encuentra actualizada esta información la supervisión del convenio en cabeza del ingeniero Javier Solarte solicita la asistencia al próximo comité de obra a adelantar el día 12 de marzo de 2024 al honorable Alcalde del municipio de Pueblorrico y del señor secretario de hacienda para hacer efectivo los compromisos plasmados en el comité presencial el día 10 de febrero en los establecimientos del municipio de Pueblorrico.

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA	martes, 12 de marzo de 2024	INTERVENTORIA - CONTRATISTA
RENDIMIENTOS FINANCIERO PSE	martes, 12 de marzo de 2024	MUNICIPIO
ACTUALIZACION DE INFORMACION EN EL SECOP	martes, 12 de marzo de 2024	MUNICIPIO
BALANCE DEL PROYECTO	martes, 12 de marzo de 2024	INTERVENTORIA - CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 12/03/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DAYRO EDUARDO RIOS MARIÑO	INGENIERO RESIDENTE	ZAIDA DAYANA ORJUELA	
FABIO ORTIZ	DIRECTOR DE OBRA (Especialista)	UNION TEMPORAL FASE 2	
ZAIDA DAYANA ORJUELA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	ZAIDA DAYANA ORJUELA	
JAVIER SOLARTE	SUPERVISOR	INVIAS	
JAHIRA MILENA GOMEZ	SOCIO AMBIENTAL	ZAIDA DAYANA ORJUELA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5. ANEXOS

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

5.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

CORRESPONDENCIA ENVIADA CONTRATO DE INTERVENTORIA 2066 DE 2023 ANTIOQUIA				
CONSEC	**FECHA**	**EMPRESA**	**FUNCIONARIO**	**REFERENCIA**
71 de 230 REF: INFORMES SEMANALES 30.63, 31.64 (PUEBLORRICO)	4/03/2024	INVIAS	Javier Jesús Solarte Portilla	Ref: INFORME SEMANALES FEBRERO 2024
70 de 230 Re: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2023-CTO 2066 DE 2023	5/03/2024	INVIAS	Javier Jesús Solarte Portilla	Ref: INFORMEMENSUAL
Ref: INFORME MENSUAL ENERO (PUEBLORRICO)	6/03/2024	INVIAS	Javier Jesús Solarte Portilla	Ref: INFORMEMENSUAL
2066-23-INVIAS-ANT- FR-025 - APROBACIÓN CARACTERIZACIÓN VIAL CORREDOR VIAL RURAL MURRAPAL - EL MOLINO	12/03/2024	ALCALDIA DE FREDONIA	secretariadeplaneacion@fredonia-antioquia.gov.co	APROBACIÓN CARACTERIZACIÓN VIAL CORREDOR VIAL RURAL MURRAPAL - EL MOLINO
Red: solicitud de comprobante de pago de actas parciales contrato de obra 078 de 2022	12/03/2024	ALCALDIA DE PUEBLORRICO	hacienda@pueblorrico-antioquia.gob.co	solicitud de comprobante de pago de actas parciales
Ref: Informe semanales 32.65 y 33.66 de PUEBLORRICO	14/03/2024	INVIAS	Javier Jesús Solarte Portilla	Ref: INFORME SEMANALES MARZO 2024
ACTA DE COBRO #2 CONTRATO 193 DE 2021	15/03/2024	ALCALDIA DE FREDONIA	secretariadeplaneacion@fredonia-antioquia.gov.co	
2066-23-INVIAS-ANT- PR-033	15/03/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 2	FABIO ORTIZ	Solicitud de ajuste de planillas de seguridad social.
CORRECCIONES - INFORME MENSUAL ENERO (PUEBLORRICO)	19/03/2024	INVIAS	Javier Jesús Solarte Portilla	INFORMES MENSUALES
Informe trimestral No.2. - Pueblorrico	19/03/2024	INVIAS	atencionciudadano@invias.gov.co	

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATO DE INTERVENTORIA 2066 DE 2023 ANTIOQUIA				
CONSEC	**FECHA**	**EMPRESA**	**FUNCIONARIO**	**REFERENCIA**
RV: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2023-CTO 2066 DE 2023	4/03/2024	INVIAS	JAVIER SOLARTE	
Fwd: APUS PENDIENTES DE CONFOEMACION, AFIRMADO Y SUBBASE CTO 078-2022	6/03/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 2	FABIO ORTIZ	
anexo acta numero 2	8/03/2024	MAVICON INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA	luis miguel uribe	
Fwd: INFORME DE RENDIMIENTOS - 31340 P.A ANTICIPO UT CR FASE 2HOJAS DE VIDA DIRECTOR Y RESIDENTE DE OBRA CTO 078-2022	13/03/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 2	FABIO ORTIZ	UT-CTO-078-2022 -077-2024
UT-CTO-078-2022 -077-2024	14/03/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 3	FABIO ORTIZ	ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO DENSIDADES Y PROBETAS DE CONCRETO CTO 078-2022
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MINIMO Y TECNICO DE OBRA CTO 078-2022	15/03/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 4	FABIO ORTIZ	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MINIMO Y TECNICO DE OBRA CTO 078-2022
Seguimiento a la ejecución del contrato de obra (Fase II) - Derivado del convenio 1898 - 2020 - Pueblorrico Recibidos	4/03/2024	INVIAS	JAVIER SOLARTE	COMITÉ DE OBRA
ACTA PARCIAL 3 Y BALNACE CTO 078/2022	19/03/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 4	FABIO ORTIZ	ACTA PARCIAL 3 Y BALNACE CTO 078/2022
Resultado Radicación de Solicitud	22/03/2024	INVIAS	enviorespuestas@invias.gov.co	INFORME TRIMESTRAL.

5.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INGENIERA CIVIL
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

INFORME MENSUAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORMACIÓN GENERAL							
FECHA DE INFORME	01 DE ABRIL DE 2024	**INFORME No.**	8	**DEL**	1/032/2024	**AL**	31/03/2024
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE FREDONIA Y PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"						













Firma: _____

ING. DAYRO EDUARDO RIOS MARIÑO
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA


5.4 BITACORA DE OBRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

de 45 ml de placa huella 100% cada 7 días.
Clima seco 7 am - 5 pm.
Personal de obra y administrativo:
- maestro: 1
- oficiales: 3
- Ayudantes: 7
- Residente de obra: 1
- SISO 1
- Profesional ambiental: 1

EQUIPOS Y herramientas
- 1 mini cargador
- Herramienta menor
- compactador tipo canguro
- 1 volqueta sencilla
- Bentlin 2,5 ton.





ING. RESIDENTE INT.

VIERNES 1 DE MARZO 2024.
SE INICIA ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN EL TRAMO 2 DE LA PICA CON LA VACIADA DE CONCRETO CICLÓPEO EN EJE DE VIA, ASI MISMO SE ADELANTA EL ENCOFRADO PARA VIGAS Y BORDILLOS.
SE ADELANTA LA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO CICLÓPEO DE 2000 PSI. ADEMÁS, SE FUNDE CONCRETO CLASE D. PARA VIGAS Y BORDILLOS.
CLIMA: SECO 7AM - 5 PM.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO
- MAESTRO 1.
- OFICIALES. 3
- AYUDANTES. 7
- RESIDENTE DE OBRA. 1
- SISO 1

•PROFESIONAL AMBIENTAL 1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
• 1 MINI CARGADOR
• HERRAMIENTA MENOR
• COMPACTADOR TIPO CANGURO
• 1 VOLQUETA SENCILLA
• BENITIN 2,5 TON

SABADO 2 DE MARZO 2024
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN EL TRAMO 2 SECTOR LA PICA COMO SON EL ENCOFRADO DE PLACA HUELLA Y CUNETAS TAMBIÉN SE HACE RELLENO DE ZANJA CON AFIRMADO EN EL AREA DE FILTRO Y SE ADELANTA LA COMPACTACIÓN MECANICA CON COMPACTADOR TIPO CANGURO.
CLIMA: SECO 7AM - 12 pm.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
•MAESTRO 1.
• OFICIALES. 3
• AYUDANTES. 8
• RESIDENTE DE OBRA 1
• SISO 1.
• PROFESIONAL AMBIENTAL 1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
• 1 MINI CARGADOR
• HERRAMIENTA MENOR
• COMPACTADOR TIPO CANGURO
• 1 VOLQUETA SENCILLA.
• BENITIN 2,5 TON

DAYRO R.S

DOMINGO 3 DE MARZO 2024.
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES. DE AVANCE

LUNES 4 DE MARZO 2024.
EL DIA DE HOY SE PROCEDIÓ. CON LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO EN EL SECTOR DE LA PICA -TRAMO 2 CON. EL ENCOFRADO VIGAS Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN PLACA HUELLA Y CUNETAS, TAMBIEN. SE CONTINUA CON EL RELLENO AFIRMADO. EN ZANJA Y COMPACTACION DEL MISMO.
CLIMA: SECO 7AM - 5 pm.
PERSONAL DE OBRA YADMINISTRATIVO.:
- MAESTRO 1.
- OFICIALES. 3
- AYUDANTES. 8
- RESIDENTE DE OBRA 1.
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- 1 MINI CARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR.
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON

MARTES 5 DE MARZO. 2024.
SE AVANZA CON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN EL. TRAMO 2 DEL SECTOR LA PICA CONTINUANDO ENCOFRADO PLACA HUELLA, CUNETAS Y VIGAS PARA ADELANTAR EL VACIADO DE CONCRETO CLASE D, TAMBIEN SE CONTINUA COMPACTANDO AFIRMADO EN ZANJA CON EL COMPACTADOR

Tipo CANGURO.
CLIMA: SECO 7AM - 5pm
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO 1
- OFICIALES 3
- AYUDANTES 8
- RESIDENTE DE OBRA. 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
- 1 MINICARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON.

MIERCOLES 6 DE MARZO 2024
SE INICIAN LABORES. COMO ES COMUN CON LA FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO, TAMBIEN SE ADELANTA EL CORTE Y FIGURADO DE REFUERZO PARA VIGAS.
ASI MISMO SE LLEVA A CABO LA FUNDIDA DE VIGAS, EN CONCRETO CLASE D, ADEMAS SE CONTINUA CON EL ENCOFRADO PARA BORDILLO Y DE ESTA MANERA IR CERRANDO LOS TRAMOS QUE SE VIENEN. INTERVINIENDO DE FORMA CONJUNTA.
CLIMA: SECO 7 AM - 5 PM
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO
- MAESTRO 1
- OFICIALES. 3
- AYUDANTES. 8
- RESIDENTE DE OBRA. 1
- SISO.
- PROFESIONAL AMBIENTAL

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- 1 MINI CARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR.
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON.

JUEVES. 7 DE MARZO 2024.
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN EL SECTOR LA PICA - TRAMO 2 CON LA FUNDIDA DE BORDILLO Y EL ENCOFRADO DE CUNETAS, PLACA HUELLA COMO TAMBIEN SE INSTALA EL ACERO DE REFUERZO DE CUNETAS. Y PLACA HUELLA. SE CONTINUA CON EL CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARD EL TRAMO 1 DEL SECTOR DE LA PICA, ASI MISMO SE REALIZAN. EXCAVACION MANUAL EN EL ÁREA DE VIGAS RIOSTRAS EN EL TRAMO 2.
CLIMA: SECO 7AM - 5 PM.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO. 1
- OFICIALES 3
- AYUDANTES 8
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1.
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- 1 MINI CARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR.
- COMPACTADOR TIPO CANGURO
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON.

VIERNES 8 DE MARZO 2024.
SE RETOMAN ACTIVIDADES COMO LO ES COMUN 7:00 AM CON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO REALIZANDO EL ENCOFRADO. DE CUNETAS Y PLACA HUELLA, TAMBIEN SE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS RIOSTRAS. SE ADELANTA LA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA PLACA HUELLA Y CUNETAS COMO TAMBIEN. SE REALIZA EL CORTE, Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO. PARA EL TRAMO 1 DEL SECTOR LA PICA. EN HORAS DE LA TARDE SE ADELANTA NACIADO DE CUNETAS. Y RIELES ENCOFRADOS EN LA MAÑANA, PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CALIDAD PARA CONCRETO CLASE D. SE EFECTÚA TOMA DE CILINDROS PARA LABORATORIO:
CLIMA: SECO 7AM - 5 PM
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO 1
- OFICIALES. 3
- AYUDANTES. 8
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL. 1.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- 1 MINICARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR.
- COMPACTADOR TIPO CANGURO
- 1 VOLQUETA SENCILLA
- BENITIN 2,5 TON

SABADO 9 DE MARZO 2024.
SE REALIZA ACTIVIDADES. HASTA MEDIA REALIZANDO EL VACIADO DE CONCRETO CLASE D PARA CUNETAS Y PLACA HUELLA Y SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO

DE PIEDRA PARA CONCRETO CICLÓPEO.
CLIMA: SECO 7AM - 12 PM.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO 1
- OFICIALES 3
- AYUDANTES 8
- RESIDENTE DE OBRA. 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- 1 MINICARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR.
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON.

DOMINGO 10 DE MARZO 2024.
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE AVANCE

LUNES 11 DE MARZO 2024
SE LLEVA A CABO CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MELANTADA POR LA PROFESIONAL SST Y EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DE OBRA EN DONDE SE BRINDA INFORMACION ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
EN ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN EL TRAMO 2 DEL SECTOR LA PILA SE CONTINUA CON EL DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE VIGAS PARA SER FUNDIDAS CONTEMPLANDO EL ESPESOR DE DISEÑO, ASI MISMO SE EFECTUA EL VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO EN EJE DE VIA Y EL CURTE, FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO

PARA PLACA HUELLA EN EL TRAMO 1 SECTOR LA PICA.
SE ADELANTA TOMA DE CILINDROS DE CONCRETO CLASE F.
CLIMA= SECO 7AM - 5pm.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO. 1
- OFICIALES. 3
- AYUDANTES 8
- RESIDENTE DE OBRA. 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
- 1 MINI CARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON.






MARTES 12 DE MARZO 2024.
SE INICIAN LABORES CON EL SUMINISTRO, CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CUNETAS Y RIELES, SE REALIZA ENCOFRADO PARA CUNETAS Y RIELES EN EL TRAMO 2 EN EL SECTOR LA PICA.
EN EL TRAMO 1 SE ADELANTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS. Y SU RESPECTIVA COMPACTACIÓN.
SE REALIZA EL FIGURADO DE ESTRIBOS PARA VIGAS.
CLIMA= SECO 7AM - 5pm.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO 1
- OFICIALES 3
- AYUDANTES. 8
- RESIDENTE DE OBRA 1

- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- 1 MINI CARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA
- BENITIN 2,5 TON.





MIERCOLES. 13 DE MARZO 2024.

SE INICIAN ACTIVIDADES. EN EL SECTOR 1A PICA-TRAMO 2 CON 1A. CONTINUIDAD CON EL ENCOFRADO DE CUNETAS Y PLACA HUELLA, ASI MISMO. SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO. CLASE D PARA CUNETAS Y PLACA HUELLA, EN EL TRAMO 1 SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR SUBBASE TIPO INVIAS.


CLIMA: SOL 7AM- 5 PM


PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO

- MAESTRO 1.
- OFICIALES 3
- AYUDANTES. 8
- RESIDENTE DE OBRA 1.
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- 1 MINI CARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR.
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON.






JUEVES 14 DE MARZO 2024
SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO EN EL SECTOR LA PICA TRAMO 2 CON LA INSTALACION DE PIEDRA BOLO CONCRETO DE 200 PSI PARA CICLÓPEO EN EJE DE VIA. ADEMAS SE INSTALA ACERO DE REFUERZO DE VIGAS Y ASI MISMO SE ADELANTA EL VACIADO DE LAS MISMAS. ASI MISMO SE CONTINUA CON EL ENCOFRADO DE BORDILLO.
CLIMA: SECO 7 AM - 5 PM.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO 1
- OFICIALES 3
- AYUDANTES. 8
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL. 1


EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
- 1 MINI CARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGUEO
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON

VIERNES 15 DE MARZO 2024.
EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR LA PICA TRAMO 2. SE CONTINUA CON EL VACIADO DE CONCRETO CLASE D PARA BORDILLOS, ADEMAS SE HACE EXCAVACIÓN PARA LOSA DE TRANSICIÓN Y SE INSTALA ACERO DE REFUERZO PARA LA MISMA, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA DE HACER SOBREANCHO PARA EL DESCOLE EN LA OBRA TRANSVERSAL DE ESTE TRAMO. PARA EL TRAMO 1 DEL SECTOR LA PICA SE CONTINÚA CON EL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBBASE TIPO INVIAS. Y SU RESPECTIVA COMPACTACIÓN.
CLIMA: SECO 7 AM - 5 pm
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO 1.
- OFICIALES. 3
- AYUDANTES 8
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
- 1 MINI CARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2.5 TON







SABADO. 16 MARZO 2024
SE INICIA ACTIVIDADES CON EL ENCOFRADO. DOS SECCIONES DE PLACA HUELLA Y CUNETAS EN EL TRAMO 2 DE LA PLACA DANDO CIERRE AL TRAMO 2 DE PLACA HUELLA, TAMBIEN SE SUMINISTRA PIEDRA BOLO PARA CONCRETO CICLÓPEO DE EJE DE VIA, ADEMAS SE INSTALA ACERO DE REFUERZO EN VIGAS Y BORDILLO.
CLIMA: SECO 7 AM - 12 pm.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO 1
- OFICIALES. 3
- AYUDANTES. 8
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- 1 MINI CARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR.
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENTIN 215 TON




DOMINGO 17 DE MARZO. 2024
NO SE REALIZA ACTIVIDADES DE AVANCE



LUNES. 18 DE MARZO 2024.
SE RETOMAN ACTIVIDADES CON EL CIERRE DE VACIADO PLACA HUELLA Y CUNETAS EN EL TRAMO 2 DEL SECTOR LA PICA, ASI MISMO SE REALIZA VACIADO. DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS., ADEMAS SE ADELANTA EL VACIADO DE LOSA DE TRANSICIÓN Y VIGAS RIOSTRAS EN LA PARTE INFERIOR DEL TRAMO 2. POR OTRO LADO EN EL TRAMO 1 SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBBASE SE HACE CON LA VOLQUETA CON 2 TANQUES DE AGUA DE 1000 LITROS.
Clima: SECO 7AM-5 pm.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO 1
- OFICIALES 3
- AYUDANTES 8
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
- 1 MINI CARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO

- 1 VOLQUETA SENCILLA
- BENITIN 2,5 TON




MARTES 19 DE MARZO 2024
SE ADELANTA ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN EL TRAMO 1 DE LA PICA CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR CONTEMPLANDO. EL ESPESOR DE DISEÑO DE 30CM Y EL ANCHO DE VIA CONSIDERADO. DE 4,1 M SE COMPACTA CON BENITIN. DE DOBLE RODILLO Y SISTEMA DE RIEGO CON VOLQUETA. SENCILLA.
CLIMA: SECO 7AM- 5PM
PERSONAL DE OBRA Y APMINISTRATIVO:

- MAESTRO 1
- OFICIALES. 3
- AYUDANTES. 8
- RESIDENTE DE OBRA 1.
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- 1 MINI CARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA
- BENITIN 2,5 TON.




MIERCOLES 20 DE MARZO 2024
SE CONTINUA ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN EL TRAMO 1 DEL SECTOR LA PICA, SUMINISTRANDO Y COMPACTANDO SUBBASE GRANULAR.
CLIMA: SECO 7AM - 5PM
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:

- MAESTRO 1
- OFICIALES 3
- AYUDANTES 7
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- 1 MINI CARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR.
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON





JUEVES 21 DE MARZO 2024

SE INICIA ACTIVIDADES CON EL CONTROL Y CALIDAD. DE LAS ACTIVIDADES EN DESARROLLO. COMO LO ES LA TOMA DE DENSIDADES EN SUBBASE GRANULAR INSTALADA EN LOS PRIMEROS 90 METROS DEL TRAMO Y DE LA EN EL SECTOR LA PICA, ADEMAS SE VIENE ADELANTANDO EL ENCOFRADO. DE PLACA HUELLA Y CUNETAS.

SE REALIZA UNA SOCIALIZACIÓN DE PARTE DEL INGENIERO AMBIENTAL HACIA LOS TRABAJADORES. HABLANDO DE LA IMPORTANCIA DEL ASEO Y BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS QUE DEJAN LAS. CONSTRUCCIONES.

CLIMA: SECO 7AM - 5 PM.


PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:

- MAESTRO 1.
- OFICIALES. 3
- AYUDANTES 7
- RESIDENTE DE OBRA 1.
- SISO 1.

PROFESIONAL AMBIENTAL 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- 1 MINI CARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR.
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA
- BENITIN 2,5 TON.





VIERNES 22 DE MARZO 2024

SE INICIAN ACTIVIDADES. CON LA FUNDIDA DE LAS PRIMERAS. PLACA HUELLAS Y CUNETAS CONSIDERANDO EL ESPESOR. DE DISEÑO DE 15 CM Y UNA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 3000 PSI, ASI MISMO SE SUMINISTRO E INSTALADO ACERO DE REFUERZO. PARA ESTAS SECCIONES FUNDIDAS SIEMPRE CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN EL DISEÑO Y EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PROFESIONAL DE LA INTERVENTORIA Y OBRA. ADEMAS SE ADELANTA EL ACOPIO DE MATERIAL AGREGADOS. PARA CONCRETO.

CLIMA: SECO 9 AM - 5 PM.


PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:

- MAESTRO 1.
- OFICIALES 3
- AYUDANTES. 7
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- 1 MINI CARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR.
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA.
- BENITIN 2,5 TON





SABADO 23 DE MARZO DE 2024.
TENIENDO EN CUENTA LA PROGRAMACIÓN DE OBRA. ADA SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO 1 DEL SECTOR LA PICA. CON EL ENCOFRADO DE PLACA HUELLA, CUNETAS Y TAMBIEN. CON LA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. PARA LAS MISMAS, ADEMAS. SE CONTINUA CON EL VACIADO DE CONCRETO CLASE D. PARA CUNETAS Y PLACA HUELLA. SE REALIZA TAMBIEN LA EXCAVACIÓN E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS. COMO TAMBIEN SE REALIZA. INGRESO DE MATERIAL GRANULAR. SUBBASE TIPO INVIAS.
EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EL INGRESO DE MATERIAL SE VE SUSPENDIDO A PARTIR DEL LUNES. 25 DE MARZO HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2024 POR LA FESTIVIDAD DE LA SEMANA MAYOR.
Clima: SECO 7AM - 12pm.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO.
- MAESTRO 1
- OFICIALES 3
- AYUDANTES 7
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- 1 MINICARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA
- BENTIN 25 TON

DOMINGO. 24 DE MARZO 2024
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE AVANCE

LUNES 25 DE MARZO 2024
SE RETOMAN ACTIVIDADES COMO LO ES COMÚN 7:00 AM. CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO. EN EL TRAMO 1 SECTOR LA PICA, CON ACTIVIDADES DE ENCOFRADO PARA VIGAS Y CICLÓPEO, SE REALIZA TAMBIEN. ACTIVIDADES DE EXCAVACION PARA VIGAS, SE REALIZA EL VACIADO DE CONCRETO PARA CICLÓPEO, SE ENCOFRA BORDILLOS. SE REALIZA EXCAVACIÓN DE LOSA DE TRANSICIÓN SE INSTALA SUBBASE PARA LA LOSA DE TRANSICIÓN.
CLIMA: SECO 7 AM - 5pm.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO
- MAESTRO 1
- OFICIALES 3
- AYUDANTES. 7
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
- 1 MINI CARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO
- 1 VOLQUETA SENCILLA
- BENTIN. 2,5 TON

MARTES 26 DE MARZO 2024.
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO. EN EL SECTOR LA PICA CON LA EXCAVACIÓN DE VIGAS, ENCOFRA PLACA HUELLA, CUNETAS, INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. DE LAS MISMAS SE REALIZA EL VACIADO DE CONCRETO CLASE O PARA BORDILLOS, TAMBIEN. SE INSTALA ACERO DE REFUERZO PARA

LA LOSA DE TRANSICIÓN Y SE HACE EL VACIADO DE CONCRETO CLASE D PARA ESTA.
CLIMA. SECO 7AM - 5PM.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO:
- MAESTRO 1
- OFICIALES 3
- AYUDANTES 8
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- 1 MINICARGADOR
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO
- 1 VOLQUETA SENCILLA
- BENTIN 2,5 TON

MIERCOLES. 27 DE MARZO 2024
SE INICIAN ACTIVIDADES CON. EL ENCOFRADO DE LA PLACA HUELLA. E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS, ADEMAS SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO CLASE D. PARA VIGAS, PLACA HUELLA Y CUNETAS. PARALELO SE VIENE ADELANTANDO EL SUMINISTRO DE PIEDRA PARA CICLÓPEO.
CLIMA SECO 7 AM - 3 PM
LLUVIAS MODERADAS 3 PM - 5 PM.
PERSONAL DE OBRA Y ADMINSTRATIVO:
- MAESTRO 1
- OFICIALES 3
- AYUDANTES 8
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;
- 1 MINI CARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR TIPO CANGURO
- 1 VOLQUETA SENCILLA
- BENITIN 2,5 TON

JUEVES 28 DE MARZO 2024
SE INICIAN ACTIVIDADES CON UNA CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DIRIGIDA POR LA PROFESIONAL SST DE LA UNION TEMPORAL CR FASE 2, CHARLA LA CUAL DIRECCIONA LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROCTECIÓN PERSONAL AL DESARROLLAR TODO EL TIEMPO LAS ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE TRABAJO.
TAMBIEN SE DA INFORMACION DE QUE NO SE TRABAJARA HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2024.
POR OTRO LUGAR SE ADELANTA ACTIVIDADES COMO LA FUNDIDA DE CONCRETO CICLÓPEO EN EJE DE VIA, ADEMAS FUNDIDA DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOSTRAS.
CLIMA: SECO 7AM-5PM
PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIO:
- MAESTRO 1
- OFICIALES 3
- AYUDANTES. 8
- RESIDENTE DE OBRA 1
- SISO 1.
- PROFESIONAL AMBIENTAL 1.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- 1 MINI CARGADOR.
- HERRAMIENTA MENOR.
- COMPACTADOR TIPO CANGURO.
- 1 VOLQUETA SENCILLA
- BENITIN 2,5 TON.

VIERNES. 29 DE MARZO 2024.
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

SABADO 30 DE MARZO 2024.
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

DOMINGO 31 DE MARZO 2024
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES.

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INGENIERA CIVIL
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

SOPORTE CIFRA

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
Interventoria2066invias@gmail.com
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

Reporte Semanal - Información general del contrato

Contrato No.	078	Año	2022
Proyecto	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA - LA PICA (FASE2) EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	Programa	COLOMBIA RURAL
Dirección Territorial	Dirección Territorial Antioquia	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
Supervisor del Contrato de Interventoría	Javier Jesús - Solarte Portilla	Gestor Técnico de Proyecto	Rolando Arturo - Espitia Buitrago
Objeto Contrato Obra	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -ADICIÓN No. 2		

|◀ ◀◀ 1 2 3 4 5 6 ▶▶ ▶|

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
36	36	2024-03-29	2024-04-04	2024-04-04	2024-06-07 00:54	2024-08-08 10:50		TERMINADO		
35	35	2024-03-22	2024-03-28	2024-03-28	2024-06-07 00:37	2024-08-08 10:41		TERMINADO		
34	34	2024-03-15	2024-03-21	2024-03-21	2024-06-07 00:16	2024-08-08 10:33		TERMINADO		
33	33	2024-03-08	2024-03-14	2024-03-14	2024-03-19 14:35	2024-05-27 08:46		TERMINADO		
32	32	2024-03-01	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-19 14:25	2024-05-27 08:43		TERMINADO		
31	31	2024-02-23	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-07 16:46	2024-03-18 14:53		TERMINADO		
30	30	2024-02-16	2024-02-22	2024-02-22	2024-03-07 16:38	2024-03-18 14:46		TERMINADO		
29	29	2024-02-09	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-07 16:29	2024-03-18 14:44		TERMINADO		
28	28	2024-02-02	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-07 16:14	2024-03-18 14:39		TERMINADO		
27	27	2024-01-26	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-27 10:44	2024-03-04 17:52		TERMINADO		
