INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME MENSUAL IM-12

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CERETÉ, CÓRDOBA

JUNIO DE 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATO 2276 de 2021

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME MENSUAL IM-12

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ACI-3B

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022

CERETÉ, CÓRDOBA

JUNIO DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 104-2022 **Contratista:** CONSORCIO CORDOBA 2022

Contrato de Interventoría No. 2276-2021 **Interventoría:** CONSORCIO ACI-3B

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

INFORME MENSUAL No. 12 **MES O PERIODO:** JUNIO de 2023

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	4
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		14
3.1	Información general del contrato		14
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		17
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		17
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		18
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	18
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	18
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	19
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	21
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	21
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	21
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	21
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	23
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		23
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	23
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	23
	• Seguimiento Programa de Obra		23
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	23
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	23
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	23
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	23
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		23
5.1	Información general del contrato		23
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		25
5.3	Informes especialistas y profesionales		25
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		25
5.5	Informe matriz de riesgos.		25
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		25
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		25
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		26
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	26
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	26
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	27
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	27
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	27
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		27
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	27
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	27
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	27
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	27
7	**Conclusiones y recomendaciones**		28
8	**Anexos**		29
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		29
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		29
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		29
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		29

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 558 de fecha 17 de febrero de 2022

Revisó Jesus D Salgado H

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30-jun-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 104-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
FECHA DE REANUDACIÓN: NA
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE JUNIO DE 2023
PLAZO ACUMULADO: 30 DE JUNIO DE 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 16.321.717.210,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 16.321.717.210,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 4.896.515.163,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.189.938.197,99

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	7673,35
	Mejoramiento	ML	7673,35
	Rehabilitación	ML	7673,35
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	230	2988
	Mejoramiento	ML	260	3018
	Rehabilitación	ML	260	3018
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	16.225.955.882,00		16.225.955.882,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	31.856.800,00	6.052.792,00	37.909.592,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	57.851.736,00		57.851.736,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	16.315.664.418,00	6.052.792,00	16.321.717.210,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	437.355.198,60		437.355.198,60	6.375.685.754,79
AJUSTES	0,00		0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00		0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00		0,00	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	31.856.800,00	6.052.792,00	37.909.592,00	37.909.592,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	437.355.198,60		1,049,062,656,7	6.375.685.754,79

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 16.321.717.210,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.564.057.830,09
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	40,22%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	12
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	20
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	35

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1.Pavimento hasta el PR 0+110 Martinez - Tramo T2



Foto 2. Pvimento hasta el PR 0+380 20 de julio - Tramo A3



Foto 3.Instalacion de Bordillos hasta el PR 0+100 Martinez - Tramo T5



Foto 4. Instalación de Bordillos hasta el PR 0+000 Martinez- Tramo T4

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El día 28 de noviembre mediante oficio SAL-22-020762 esta interventoría solicitó a la alcaldía municipal de cereté que se dé inicio al procedimiento establecido en la Cláusula Quince Para la Aplicación de la Cláusula Penal Contrato de la Referencia, para la imposición al CONSORCIO CÓRDOBA 2022 de las sanciones pactadas en el Contrato No. 104 DE 2022, por el incumplimiento total de las obligaciones contractuales. Adicionalmente, a fin de mes se bajó el rendimiento en las actividades de obra, lo que representó a la fecha un atraso del -16.03%., por lo que se proceció con requerimiento, y de acuerdo al último comité de obra, quedó el compromiso para el día 31/03/2023 de entrega de plan de contingencia y reprogramación de obra, de no cumplirlo se procederá con apremio y posterior solicitud de apertura de proceso administrativo o informe de presunto incumplimiento.

Firma

Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Con el objeto de mejorar la calidad de la infraestructura vial de nuestro país, el Gobierno Nacional viene implementado diferentes estrategias encaminadas al logro de ese objetivo, es así como en el sector de la red terciaria, dentro el programa "Colombia Rural" por medio de INVIAS, se suscribieron convenios con los municipios del país con el objeto de ejecutar actividades de mejoramiento, conservación y mantenimiento a sus diferentes vías, donde la entidad aporta los recursos que se requieren para su ejecución que atienda los documentos técnicos, normas y especificaciones requeridas.

La necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se encuentra en los Estudios Previos suscritos por el subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales forman parte del presente documento.

El Instituto Nacional de vías INVIAS mediante Resolución Número 4218 del 21 de diciembre de 2021, realizó la apertura del Concurso de Méritos No. CMA-DO-SRT-167-2021 para contratar la Interventoría cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

El presente documento contiene el informe Mensual de Interventoría No. 12, el cual tiene por objeto describir en forma detallada cada una de las actividades realizadas tanto por el Contratista de obra como por la Interventoría, durante el período comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia. El municipio de Cereté limita por el norte con los municipios de San Pelayo y Chima, por el este con el municipio de Ciénaga de Oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con los municipios de San Carlos y Montería.

El proyecto en estudio se localiza en zona rural del municipio de Cereté en el corregimiento de Martínez (barrio Alberto Saibis, 20 de julio, la lucha y Chuchurubí).

El material que se va a utilizar en este proyecto, será suministrado por la cantera Villa Carmen la cual cuenta con licencia ambiental otorgada por la CAR del departamento y se encuentra ubicada en la vía hacia Planeta Rica.

Es preciso aclarar que no será necesario montaje de plantas de asfalto y/o concreto, dicho material será suministrado por plantas ya establecidas que cuenten con los permisos requeridos por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS. Así mismo, para el caso de material de arrastre, la explotación de dicho material no se hará en la zona, sino que será suministrado por canteras legalizadas

A continuación, se muestra una imagen general y especifica de la ubicación de la vía en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba



Figura 1 Localización General del Proyecto.

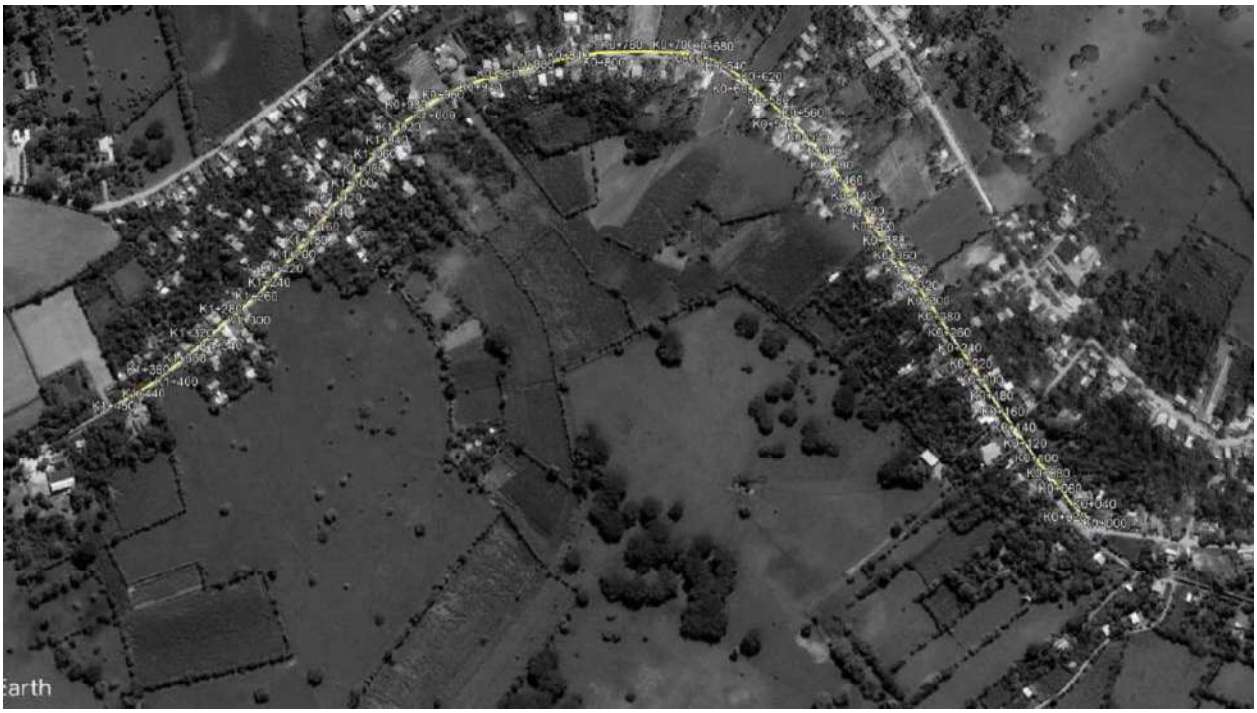


Figura 2 Localización específica de la vía a diseñar sector Chuchurubí.



Figura 3 Localización específica de la vía a diseñar sector Martínez.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto cuenta con varios municipios que hacen parte de la zona de influencia, limitando al norte con el municipio de San Pelayo, por el este con el municipio de Ciénaga de oro, por el oeste con el municipio de Montería y por el sur con el municipio de San Carlos, los cuales se ven beneficiados con la realización de este proyecto, ya que estos permiten la unión entre las cabeceras municipales.

De esta manera se potencia el intercambio comercial y se fortalece la economía nacional, reduciendo también los costos operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando en tiempo y contaminación del ambiente y en consecuencia brindando más impulso económico de la zona por donde atraviesa dicho proyecto.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DE LA VÍA

Actualmente esta vía se encuentra en afirmado en regulares condiciones, ya que su capa de rodadura se ha desgastado por la falta de mantenimiento periódico y rutinario, no se han atendido los puntos críticos aunado al tránsito de vehículos pesados, lo que conlleva a daño en vehículos particulares, baja transitabilidad y largos periodos de desplazamiento; notándose deterioros generalizados como ondulaciones, ahuellamiento, perdida de grava, baches.

	
PR K0+818 al K0+830 Sector Chuchurubí	PR K0+092 Sector Martínez. Calle 8 vía media tapa.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto en general consiste en la construcción de 7673,35 metros lineales de pavimento de 20 cm de espesor y 38Mpa, la estructura con anchos de diseño de 5.50 m, 5.00 m, 4.50 m, y 4.00 m con bombeos normales del 2% y bombeos transicionales ajustados a las condiciones actuales de drenaje y empalmes viales, con bordillo prefabricados en ambos lados, una capa en afirmado con un espesor de 0.25 metros para el tramo 1 y 3 y 0.45 metros para el tramo 2; y subbase granular con un espesor de 0.15 metros para los 3 tramos.

Los 7673,35 metros lineales de pavimento están distribuidos de la siguiente forma en los 3 sectores:

SECTOR	No.	Nomenclatura Catastral	Ancho de calzada (m)	Longitud del tramo (m)	Espesor de Concreto (m)	Espesor de Subbase (m)	Espesor de Mejoramiento (m)	Bordillo Prefabricado (cm)
ALBERTO SAIBIS	1	A1 - CRA 7aB ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aE	5,50	244,17	20	15	25	20x80x60
	2	A2 - CRA 7aB ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aE	5,50	242,73				
20 DE JULIO	3	A3 - CARRERA 7AC ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2	5,50	455,67	20	15	25	
	4	A4 - DIAGONAL 3 ENTRE CARRERA 7AC Y CARRERA 7a	5,00	410,50				
	5	A7 - CALLE 2aE ENTRE CARRERA 7aC Y CARRERA 7aA	5,50	168,16				
LA LUCHA	6	T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10	5,00	420,48	20	15	25	
	7	T19 - VARIANTE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2aA	5,00	25,37				
MARTINEZ	8	T12 - CARRERA 5 ENTRE CALLE 10 Y FIN DE TRAMO	4,50	151,38	20	15	25	
	9	T13 - CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y CALLE 10	4,00	231,13				
MARTINEZ	10	T1 - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA	6,00	1858,30	20	15	45	20x80x60
	11	T2 - CARRERA 3 VIA LA CEIBITA HASTA LA Y	6,00	240,00				
	12	T2' - VARIANTE ENTRE CALLE 8 Y LA CARRERA 3	6,00	15,52				
	14	T4 - CARRERA 6 ENTRE CALLE 10 ENTRE TRANSVERSAL 5	6,00	75,19				
	15	T5 - CARRERA 5 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y CALLE 10	6,00	261,10				
	16	T6 - CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6	4--5	163,00				
	17	T7 - CALLE 7 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3	5,00	137,75				
	18	T8 - TRANSVERSAL 4 ENTRE CALLE 7A Y TRANSVERSAL 4A	4,00	105,62				
	19	T9 - TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLE 7A Y CARRERA 4	5,00	177,12				
	20	T10 - CALLE 7 ENTRE TRANVERSAL 4 Y CARRERA 4	5,00	101,37				
	21	T14 - CARRERA 5A ENTRE CALLE 7A SECTOR MATAPERRO	4,00	200,00				
	22	T15 - CALLE 7A ENTRE CARRERA 6 Y TRANSVERSAL 4	5,00	344,18				
	23	T16 - TRANSVERSAL 4 ENTRE CARRERA 5C Y CALLE 7A	5,00	172,64				
	24	T17 - CARRERA 5 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	5,00	21,97				
CHUCHURUBI	25	P14 - CARRERA 27 VIA PRINCIPAL	5,00	1450,00	20	15	25	20x80x60
				7673,35				

Parámetros de Diseño

Longitud:	**K7+673,35**
Tipo de terreno:	**Plano**
Velocidad de diseño:	**30 Km/h**
Ancho de Calzada:	**4.00m - 4.50m - 5.00m - 5.50m - 6.0m**
Ancho de Carril:	**2.00m - 2.25m - 2.50m - 2.75m - 3.00m**
Bombeo Normal:	**2,00%**
Peralte Maximo	**-**

Adicionalmente se construirán 4 box culvert de sección transversal de 1mx1m ubicados así:

TRAMO	SECTOR	NOMENCLATURA	ABSCISA
A3	20 DE JULIO	CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2	K0+310
T1	MEDIA TAPA	CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA	K0+922
			K1+467
T18	LA LUCHA	CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10	K0+420

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

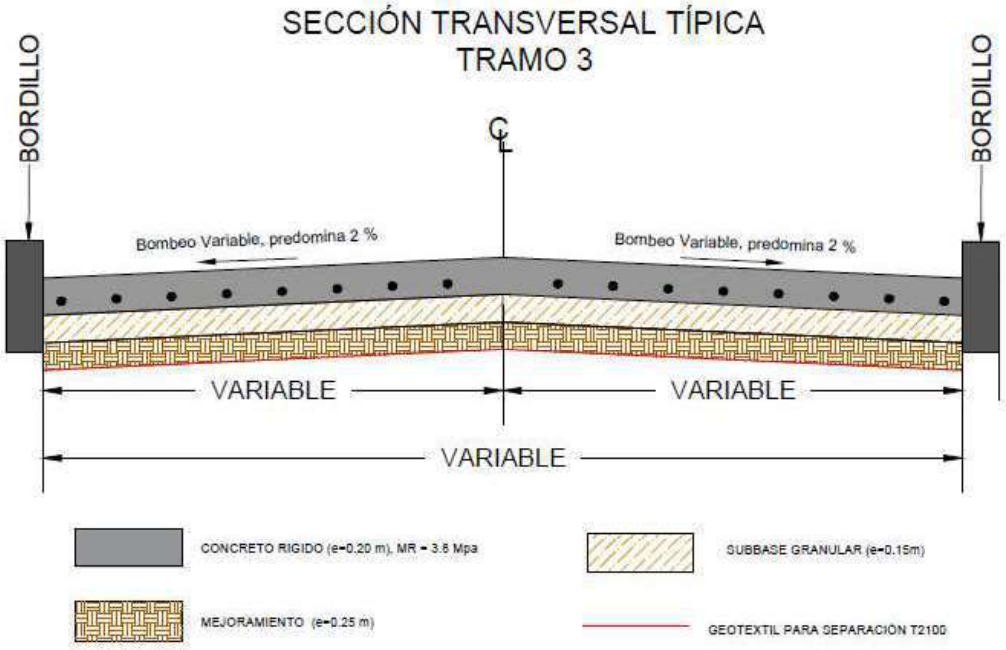


Figura 4. Tramo 1 y Tramo 3

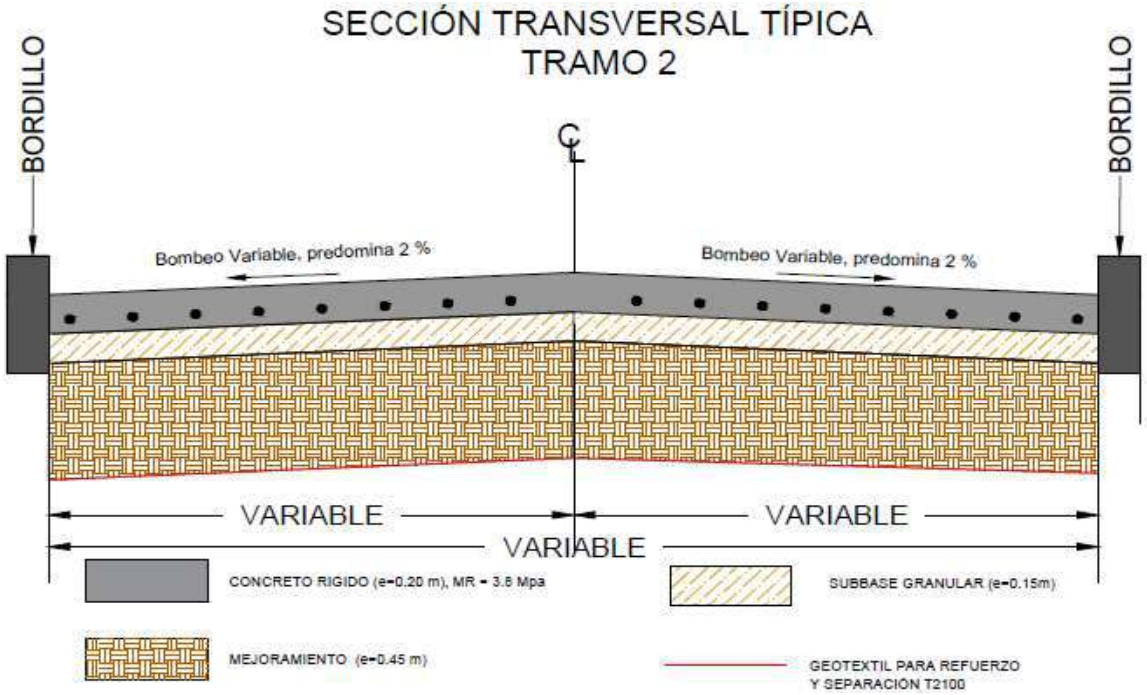


Figura 5. Tramo 2

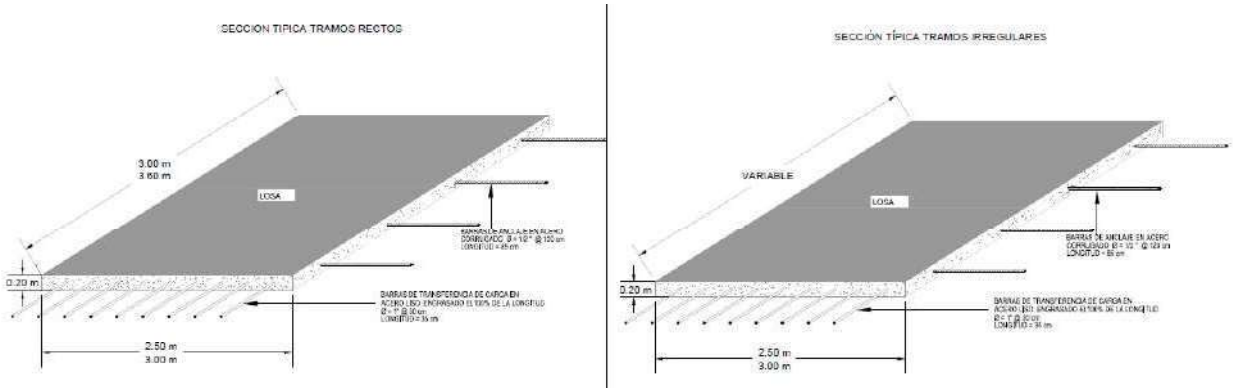


Figura 6. Sección típica

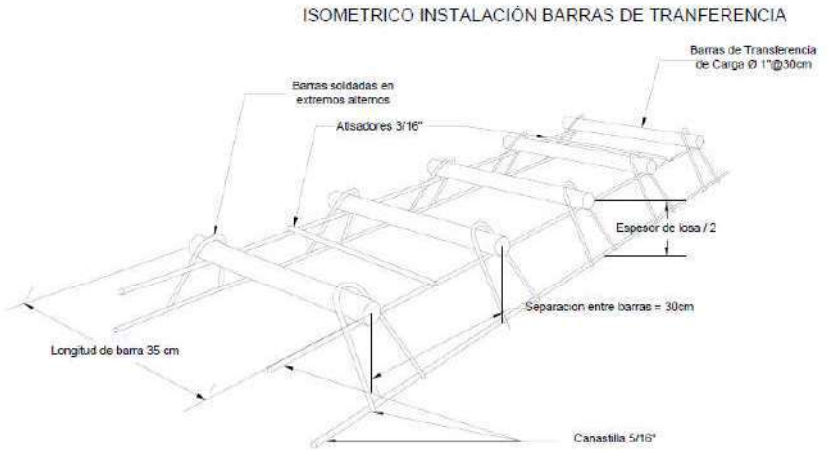


Figura 7. Canastillas de Instalación de barras de transferencia.

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CERETE – CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL RURAL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL"
CONTRATO DE OBRA No	No. 104-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO CÓRDOBA 2022 INTEGRANTES: CONSTRULATINA S.A.S Nit No. 829002616-3 (95%) LUIS JOSE DUMAR PERDOMO cc No. 6.640.311 (5%)
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ CC 15.370.151
NIT	901598916-6
DIRECCIÓN	Carrera 6#65-24 OFIC 317 Montería
TELÉFONO	3185162227
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	25 DE JULIO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA SEGÚN PRORROGA No 2	30 DE JUNIO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 16.321.717.210,00

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

* Se Finalizaron las actividades de instalación de bordillos prefabricados en ambos lados entre PR 0+075.19 y el PR -0+000 en el Tramo T4 de Martínez, en este frente falta por ejecutar el sellado de juntas del pavimento, relleno de espaldar de bordillos y descoles para aguas lluvias.

*También se dio inicio a las actividades de instalación de bordillos prefabricados entre PR 0+261.1 y el PR -0+190 ambos lados en el Tramo T5 de Martínez. En este tramo falta por terminar de ejecutar instalación de bordillos, relleno de espaldar de bordillos, los descoles para aguas lluvias y los sellos de juntas a pavimento.

* Se tomaron densidades en campo por parte del contratista, tanto al material de afirmado como al material de subbase en el tramo T2 de Martínez y en el tramo A3 sector 20 de julio.

*Se realizaron trabajos de topografía por parte de interventoría verificando cotas de excavación, afirmado, subbase y rieles en los tramos T2 Martínez y en el tramo A3 de 20 de julio.

*Se iniciaron con las actividades de instalación de bordillos prefabricados en Chuchurubí en ambos lados de la vía iniciando en el PR 1+450, falta por entregar los diseños para construcción de sobre ancho del empalme en el PR 0+040, terminar sello de juntas del PR 0+370 al PR 0+000 y construir los descoles.

*Se ha requerido iniciar con la instalación de bordillos y sello de juntas en el sector de media tapa Martínez.

*Se continuo con la excavación mecánica en el tramo A3 del sector 20 de julio entre absc K0+360 a la K0+340, también se realizó instalación de material afirmado y sub base granular entre absc K0+445 a la K0+340, se realizó fundida de pavimento hidráulico entre abscisas K0+445 a la K0+340.

*Se dio inicio con la excavación mecánica en el tramo T2 del sector Martínez entre absc K0+240 a la K0+100. También se realizó instalación de material afirmado y sub base granular entre abscisas K0+240 a la K0+110, se realizó fundida de pavimento hidráulico entre abscisas K0+240 a la K0+110.

* En el sector 20 de julio el terreno a salido con mucha humedad y material podrido por estas razones el contratista debe coger fallos puntuales en esta zona, y también viene afectando las lluvias que se vienen presentando en la zona.

*Se realizo prorroga #3 al contrato la cual se solicitó por el contratista a partir del 01 de julio al 31 de diciembre debido a que el tiempo de ejecución no le alcanza para ejecutar el alcance del proyecto.

*Se realizo excavación en tramo A4 sector 20 de julio entre abscisas K0+410.5 a la K0+390, también se realizó instalación de material afirmado y sub base granular entre abscisas K0+410.5 a la K0+390, y se realizó fundida de pavimento entre abscisas K0+410.5 a la K0+390 tramo A4 sector 20 de julio. En este sector no se ha podido seguir las actividades debido al mal estado de la sub rasante y debido a las lluvias que se vienen presentando en la zona.

CANTIDAD MES DE JUNIO 2023

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	437.355.198,60		437.355.198,60	6.375.685.754,79
AJUSTES	0,00		0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00		0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE	0,00		0,00	0,00

LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	31.856.800,00	6.052.792,00	37.909.592,00	37.909.592,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	437.355.198,60		437.355.198,60	6.375.685.754,79

3.3 ÍTEMS NO PREVISTOS

- Conformación de espaldar de Bordillos – NP-1
- Rejilla metálica y/o tapa metálica (sumidero canal de paso) – NP-2
- Mejoramiento de la sub rasante con adición de material (Piedra Rajón) – NP-3
- Resalto Plástico – NP-4

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

* Se realizan actas de reunión y actas de comités de obra para pactar compromisos de ambas partes.

* Se continúa haciendo estricto seguimiento a los compromisos y obligaciones del Contratista, tal como lo establece el contrato de obra y sus pliegos de condiciones.

* Se realiza toma de densidades de afirmado y subbase como control de calidad por parte de la Interventoría, y chequeo de espesores con topografía.

* Se realizan levantamientos topográficos en conjunto con el contratista e interventoría en tramos antes de iniciar excavaciones para así llevar un mejor control de los volúmenes ejecutados.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se realizaron cuatro (04) informes semanales correspondientes al periodo en mención, los cuales se encuentra relacionados en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3. (Ver página 30-37)

INFORMES SEMANALES	FECHA
46	DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2023
47	DEL 09 AL 15 DE JUNIO DE 2023
48	DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2023
49	DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2023

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se relacionan la maquinaria y los equipos en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (ver página 38)

MAQUINARIA Y EQUIPO			
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**
ESTACIÓN TOTAL	GOWIN	Alcance 2000m	Chuchurubí/Martínez
Volqueta doble troque	International	14 m3	Chuchurubí/Martínez
Vibro compactador	Caterpillar	12 ton	Chuchurubí
Motoniveladora	Caterpillar	12 Ton	Chuchurubí
Minicargador	Caterpillar 236B	0,9ton	Chuchurubí
Pajarita	Caterpillar 420E	11ton	Chuchurubí/Martínez
Vibro compactador	Caterpillar	0.96m3	Martínez
Motoniveladora	Caterpillar	8 Ton	Martínez
Minicargador	Caterpillar 236B	0,9ton	Martínez

Cortadora de concreto	MT - CNMT	13 HP	Martínez/Chuchurubi
Vibrador de aguja	EQUIPMASTER	3.1HP	Martínez/Chuchurubí
Planta eléctrica	BAUKER	2200 W	Martínez/Chuchurubí
Mezcladora de concreto	EQUIPMASTER	2 BTOS / 390 LTS	Martínez

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO DE OBRA

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se relaciona el personal de este período. (ver página 39-41)

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE
1	Director de Obra	ORLANDO CASTELLÓN
2	Residente de obra	MARCELA QUIROZ
3	Topógrafo	CARLOS PRETELT
4	Oficios Varios	HERRERA CRISTOBAL
5	Auxiliar Hseq	LUIS EUSE
6	Cadenero 2	GABRIEL MEDELLIN
7	Oficios Varios	GABRIEL GARCIA
8	Ing Auxiliar Residente	JOVER ALEAN
9	Auxiliar Hseq En Obra	ANYI GUERRA
10	Operador	JORGE FLOREZ
11	Plomero	LUIS ESPINOSA
12	Ayudante	JUAN DURANGO
13	Ayudante	LUIS PADILLA

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE
14	Cadenero 1	JOSE DIAZ
15	SST	ANA BERRIO
16	Ayudante	KEVIN DIAZ
17	Ayudante	DARIO GHISAYS
18	Trabajadora Social Auxiliar	YULLIA PADILLA
19	Topógrafo	ANGEL OROZCO
20	Trabajadora Social	DANIELA MONTERROZA
21	Celador	JHEYCER MESTRA
22	Contadora	JAYDIS MAUSSA
23	Ayudante	PEDRO PADILLA

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se relaciona el Estado Financiero y Presupuestal del Contrato de Obra (ver página 42)

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se relacionan el estado general del tiempo del presente mes. (Ver página 43)

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En este período se realizaron toma de densidades por parte de la Interventoría y Contratista de obra. Se relacionan ensayos de laboratorio realizados en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11. (Ver página 44-55)

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se relacionan el Seguimientos Garantías y Seguros Contrato de Obra se adjuntan en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Ver página 56-67)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	31/05/2022	31/05/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	31/05/2022	31/01/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	31/05/2022	31/07/2025
Estabilidad y Calidad de la Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	

Calidad de la revisión de estudios y diseños.	30%	$ 9.557.040,00	31/05/2022	31/05/2027
Predios, labores y operaciones		$ 816.085.860,00	31/05/2022	31/07/2022
Contratistas y subcontratistas		$ 816.085.860,00	31/05/2022	31/07/2022
Vehículos propios y no propios		$ 326.434.344,00	31/05/2022	31/07/2022

Pólizas actualizadas por prórroga 1:

Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	100%	$ 443.142.106,00	25/07/2022	30/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.329.426.318,00	25/07/2022	30/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 886.284.212,00	25/07/2022	31/12/2025
Estabilidad y Calidad de la Obra	100%	$ 1.329.426.318,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	100%	$ 4.778.556,00	25/07/2022	25/07/2027

Pólizas actualizadas por prórroga 2:

Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	100%	$ 1.632.171.721,00	25/07/2022	30/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25/07/2022	30/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 3.264.343.442,00	25/07/2022	30/06/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	100%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir del Recibo y Aprobación del Acta Final y Recibo a Satisfacción de la Entidad Contratante	
Calidad del Servicio	100%	$9,557,040.00	25/07/2022	25/07/2027

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha el Contratista hizo entrega del Plan de calidad correspondiente, se adjunta en el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14. (Ver Paginas 68 – 76)

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Seguimiento a la inversión del Anticipo: a este contrato le desembolsado al Contratista el anticipo asignado según contrato del 30%. Adjunto se anexa (Ver Página 77-78).

Seguimiento Programa de Obra: Se ha hecho control semanal y mensual a los avances de obras, teniendo en cuenta que fue aprobada la prórroga No 2 se realiza un nuevo seguimiento a dicha reprogramación. (Ver Paginas 79-80).

Seguimiento Programa de Inversiones: Teniendo en cuenta que el Contrato fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2023, se solicitó al Contratista presentar el Programa de Inversiones actualizado, el cual no ha sido entregado y hay oficios de solicitud y requerimientos del asunto, razón por la cual no se relaciona su seguimiento en los formatos MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité de Obra: en el presente mes se realizaron dos (02) Comité de Obra, por lo cual se relacionan en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1 (ver página 81-86)

Actas de Reunión: en el presente mes se realizó un (01) actas de reunión por lo cual se relaciona en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2. 1 (ver página 87-89)

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ACI-3B INTEGRADO POR: ACI PROYECTOS SAS CON NIT. 860.059.851-6 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50 % Y 3B PROYECTOS SAS CON NIT. 900.504.398-4 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%
NIT	901.551.292-6
TELÉFONO	601-74060460
DIRECCIÓN	Oficina. Carrera 7 156 -10 Piso 31 Torre Krystal – North Point
CONTRATO No	2276 DE 2021
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4"
LOCALIZACIÓN:	"CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (BARRIO ALBERTO SAIBIS, 20 DE JULIO, LA LUCHA Y CHUCHURUBÍ) CERETÉ CÓRDOBA"
VALOR DEL CONTRATO:	$1.930.530.773
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 2	30 DE JUNIO DE 2023

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Revisión de la documentación entregada por el Contratista.
- Seguimiento de las actividades de excavación, retiro y colocación de material de afirmado.
- Verificación de afiliaciones del personal.
- Realización de Comités de obra.
- Realización de informes semanales y mensuales
- Requerimientos escritos al Contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Seguimiento al avance de obra registrado en el período
- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

En este mes no se relaciona informe de especialista. (ver pág.)

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

El Informe de Matriz de Riesgo se encuentra en ejecución por parte de la Interventoría.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

El Informe de Matriz de Riesgo se encuentra en ejecución por parte de la Interventoría

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

La Interventoría se encuentra recopilando y actualizando los documentos electrónicos en la plataforma CIFRA de acuerdo al Sistema de Gestión Documental implementado por INVIAS.

6. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se encuentran relacionados los equipos y vehículos para este período. (Ver página 90-102)

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Ver página 103-118)

PERSONAL DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE Y APELLIDO	**CARGO**
Leonardo Toro Niño	Director de Obra
María José Teherán Guerra	Inspector SST
Ivanna Rocío Charrasquiel Rivero	Secretaria
Claudia Marcela Benítez Camacho	Ing. Ambiental
Katherine Paola Lopesierra Arteaga	Profesional Social
Nohemí Sofía Padrón Torres	Ing. Residente de Interventoría
Carmelina Rosa Oviedo Ramos	Ing. Residente de Interventoría
Carlos Milán Carvajal Pinto	Ing. Residente de Interventoría
Libardo Antonio Arteaga Hernández	Ing. Residente de Interventoría
Said Mauricio Soto Martínez	Ing. Auxiliar
Lina María Ramos Benavides	Ing. Auxiliar

Darío Enrique Cantero Mendoza	Conductor
Deimer Enrique López Medina	Cadenero
Luis Miguel Orozco Olivares	Topógrafo

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver página 119-120)

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver página 121-122)

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo del Anticipo	27/01/2022	01/03/2023	$ 811.147.384
Calidad de Servicio	29/08/2022	29/08/2027	$ 579.159.232
Cumplimiento	27/01/2022	01/03/2023	$193.053.077
Salarios y prestaciones Sociales	27/01/2022	29/08/2025	$ 386.106.155

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Interventoría, se encuentra en elaboración del Plan de Calidad. En el presente informe no se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Seguimiento a la inversión del Anticipo: el Contrato de Interventoría no contempla anticipo.

Plan de Cargas se encuentra relacionado en el formato. MEPI-MN-IN-9-FR-2 (Ver Página 123)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para junio de 2023, se tenía previsto una Inversión Programada Acumulada de $16.321.717.210 la cual representa un porcentaje del 94,32% versus una Inversión Ejecutada Acumulada de $6.375.685.754,794 la cual representa un porcentaje del 39,06 % para un atraso del 55,26%.
- Se requirió al Contratista mediante oficios mejorar los acabados en el pavimento en el los tramos T2 y A3.
- El contratista inicio la instalación de bordillos en chuchurubi, falta por terminar las actividades, sellado de juntas hasta el PR 0+000, construcción de descoles y construcción de sobre ancho de curva del empalme en el PR 0+040.
- Se requirió al contratista iniciar las actividades de sello de juntas e instalación de bordillos, construcción de cuneta y descoles del tramo media tapa Martínez.
- Continúan los trabajos en los tramos A4 y A3 en 20 de julio, pero estos se han visto afectados por las fuertes lluvias que se vienen presentando en la zona, además el terreno tiene el nivel freático muy cerca y el terreno está bastante podrido, por estas razones el contratista está mejorando la sub rasante con piedra rajón en puntos puntuales. Los avances se han visto afectados por estas razones.
- El contratista presento prorroga #3, la cual fue aprobada, debido a que el tiempo que tenía no le alcanzaba para terminar el objeto contractual, esto se debe a las lluvias, diseños y a terceros, la prórroga inicia el día 01 de julio hasta el 31 de diciembre del presente año.
- Se le recomienda al contratista abrir otro frente de obra con equipos diferentes para así poder avanzar y darle buen avance al proyecto.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Se adjunta correspondencia recibida por parte del Contratista de obra y enviada por parte de Interventoría. (Ver página 124-130).

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Se adjunta registro fotográfico de las actividades de obra ejecutadas. (Ver página 131-141)

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

Se adjunta registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad. (Ver página).

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se adjunta la Bitácora de Obra, libro donde se registran todas las actividades que se realizaron durante el periodo. (Ver página 142-176).

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/06/23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 46 (Numeración consecutiva) del 2-jun al 8-jun — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO + BORDILLOS PREFABRICADOS DE 7673,35 ML EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (B/ 20 DE JULIO, B/CHUCHURUBÍ, B/ALBERTO SAIBIS Y B/LA LUCHA) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 38Mpa Y 20CM DE ESPESOR + BORDILLOS PREFABRICADOS, CON ANCHOS DIFERENTES POR TRAMOS DE 5.50m, 5.00m, 4.50m, y 4.00m, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO DE 25CM PARA TRAMO Y TRAMO 3 Y 45CM PARA TRAMO 2, MÁS 15 CM DE SUBBASE PARA LOS TRES TRAMOS; ADEMÁS DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTEGRANTES: ANDRES ALBERTO PICO GUERRERO 100%
CONTRATO No. 104 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 16.321.717.210,00
FECHA DE INICIO: 25/07/22 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 16.321.717.210,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/23
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B
INTEGRANTES: ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 50%
CONTRATO No. 2276 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO: 28/01/22 — VALOR ADICIONES: $ 965.265.286,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 2.895.796.059,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/23 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 16.321.717.210	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 2.776.522.462	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 13.545.194.748	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 2.895.796.059	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 2.105.977.118	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 789.818.942	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.321.717.210,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 13.539.997.297,87	82,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.955.419.707,77	24,23%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9.584.577.590,10)	-58,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 37.909.582,00	0,23%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.612.757.253,76	82,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.939.058.356,21	36,39%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (6.673.698.897,55)	-40,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 875.231.633,20	5,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 90.744.486,76	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: HASTA 31/01/2023
VALOR FACTURA: $ 2.776.522.462,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.770.984.753,50	95,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.105.977.117,50	72,73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 41.603.768,50	1,44%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37.604.267,75	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.896.515.163,00
Amortizado $	$ 1.189.938.197,99
Saldo $	$ 3.706.576.965,01

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,41
Acumulado:	0,35

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 82,96%
Meta Física Ejecutada %: 36,99%
Avance o Atraso Físico %: -46,57%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	1	1		1	100,0%
					Ejec	1	1		1	100,0%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizaron las socializaciones de los proyectos: el día 05/09/2022 en martinez y el día 06/09/2022 en chuchurubi

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MARTINEZ-TRAMO T5: No se realizo ninguna actividad. TRAMO LA LUCHA: No se realizo ninguna actividad TRAMO 20 DE JULIO: No se realizo excavacion mecanica en el tramo A4 hasta la abscisa K0+380, Se realizo instalacion de material afirmado y sub base en el tramo A4 hasta la abscisa K0+390, Se realizo fundida de pavimento en el tramo A4 hasta la abscisa K0+390, No se realizo excavacion mecanica en el tramo 20 de julio hasta el PR0+330, No se suministro de material afirmado hasta absc K0+300 estas actividades estan siendo afectada por las lluvias en la zona. TRAMO CHCUCHURUBI :se dio inicio con el suministro de bordillos y excavacion para instalacion de los mismos en el tramo chuchurubi hasta la abscisa K1+230 lado derecho. TRAMO T2 MARTINEZ : Se dio inicio con la excavacion mecanica hasta la abscisa K0+180.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MARTÍNEZ- TRAMO T5: Se tiene previsto continuar con la instalacion de bordillos y sellado de junta. MARTINEZ TRAMO T4: Se tiene previsto el sello de juntas, instalacion de bordillos MARTINEZ 20 DE JULIO: Se tiene previsto continuar con las excavaciones mecanicas, instalacion de material afirmado, sub base granular,fundida de concreto y mejoramiento con piedra rajon TRAMO T2 MARTINEZ: Se tiene previsto continuar con la excavacion mecanica, instalacion e material afirmado, sub bse y fundida de concreto. TRAMO CHUCHURUBI: Se tiene previsto la instalacion de bordillos prefabricados

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

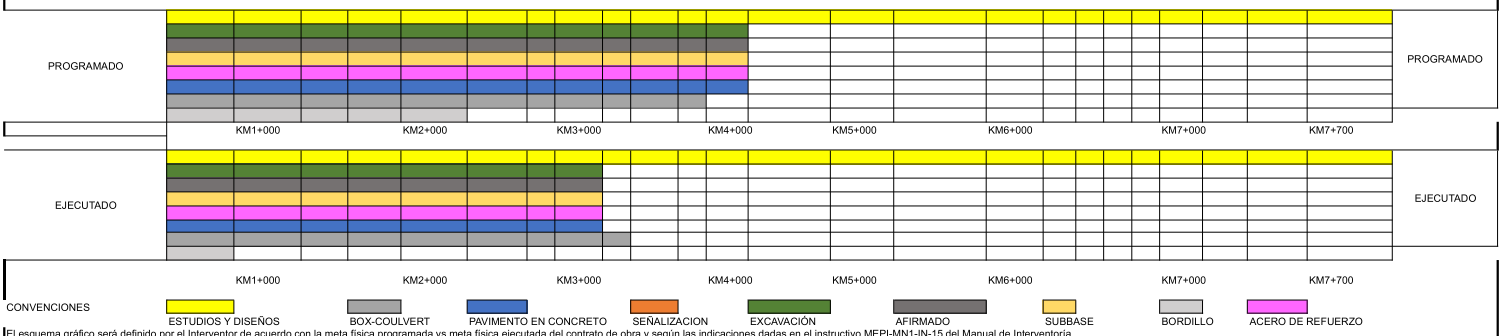

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Excavacion Mecanica hasta el PR 0+180 TRAMO T2 SECTOR - MARTINEZ



Foto 2. Instalacion de Sub base granular hasta el PR 0+390 TRAMO A4 20 DE JULIO



Foto 3. Fundida de Pavimento hasta el PR 0+390 TRAMO A4 20 DE JULIO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

En esta semana el contratista de nuevo aumento el atraso debido a su bajo rendimiento en las actividades y tambien se vio afectado por las fuertes lluvias que se estan presentando en la zona,lo que representa aumento del atraso del -40,89% al -46.41%, Se le pide celeridad al contratista en las actividades para asi seguir contrarestando el atraso que llevan.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: LEONARDO TORO NIÑO

Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/06/23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 47 del 9-jun al 15-jun (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO + BORDILLOS PREFABRICADOS DE 7673,35 ML EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (B/ 20 DE JULIO, B/CHUCHURUBÍ, B/ALBERTO SAIBIS Y B/LA LUCHA) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 38Mpa Y 20CM DE ESPESOR + BORDILLOS PREFABRICADOS, CON ANCHOS DIFERENTES POR TRAMOS DE 5.50m, 5.00m, 4.50m, y 4.00m, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO DE 25CM PARA TRAMO Y TRAMO 3 Y 45CM PARA TRAMO 2, MÁS 15 CM DE SUBBASE PARA LOS TRES TRAMOS; ADEMÁS DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CÓRDOBA 2022		
INTEGRANTES:	ANDRES ALBERTO PICO GUERRERO 100%		
CONTRATO No.	104 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.321.717.210,00
FECHA DE INICIO:	25/07/22	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/22	VALOR ACUMULADO:	$ 16.321.717.210,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/23	$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-3B		
INTEGRANTES:	ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 50%		
CONTRATO No.	2276 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO:	28/01/22	VALOR ADICIONES:	$ 965.265.286,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/22	VALOR ACUMULADO:	$ 2.895.796.059,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/23	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 16.321.717.210	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 2.776.522.462	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 13.545.194.748	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 2.895.796.059	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 2.143.581.385	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 752.214.674	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.321.717.210,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 14.457.237.231,88	88,64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.047.513.704,17	49,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (6.409.723.527,71)	-39,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 37.909.582,00	0,23%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.612.757.253,76	88,64%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.939.058.356,21	36,39%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (6.409.723.527,71)	-39,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 675.231.633,20	6,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 90.744.486,76	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: HASTA 31/01/2023
VALOR FACTURA: $ 2.776.522.462,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.812.598.522,00	97,13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.143.581.385,25	74,02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 41.603.768,50	1,44%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37.604.267,75	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.896.515.163,00
Amortizado $	$ 1.189.938.197,99
Saldo $	$ 3.706.576.965,01

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,41
Acumulado:	0,36

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 88,64%
Meta Física Ejecutada %: 36,39%
Avance o Atraso Físico %: -52,25%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	1	1		1	100,0%
					Ejec	1	1		1	100,0%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizaron las socializaciones de los proyectos: el día 05/09/2022 en martinez y el día 06/09/2022 en chuchurubi

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MARTINEZ-TRAMO T5: No se realizo ninguna actividad. TRAMO LA LUCHA: No se realizo ninguna actividad TRAMO 20 DE JULIO: No se realizo excavacion mecanica en el tramo A4 hasta la abscisa K0+380, Se realizo instalacion de material afirmado y sub base en el tramo A3 hasta la abscisa K0+420, No se realizo excavacion mecanica en el tramo 20 de julio hasta el PR0+330, No se suministro de material afirmado hasta absc K0+300 estas actividades estan siendo afectada por las lluvias en la zona, TRAMO CHCUCHURUBI :se continuo con el suministro de bordillos y excavacion para instalacion de los mismos en el tramo chuchurubi hasta la abscisa K1+200 lado derecho. TRAMO T2 MARTINEZ : Se continuo con la excavacion mecanica hasta la abscisa K0+160, se realizo instalacion de material afirmado hasta la absc K0+200, tambien se instalo material sub base hasta absc K0+205 y se realizo fundida de pavimento hasta la absc K0+205

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MARTÍNEZ- TRAMO T5: Se tiene previsto continuar con la instalacion de bordillos y sellado de junta. MARTINEZ TRAMO T4: Se tiene previsto el sello de juntas, instalacion de bordillos MARTINEZ 20 DE JULIO: Se tiene previsto continuar con las excavaciones mecanicas, instalacion de material afirmado, sub base granular,fundida de concreto y mejoramiento con piedra rajon TRAMO T2 MARTINEZ: Se tiene previsto continuar con la excavacion mecanica, instalacion e material afirmado, sub bse y fundida de concreto. TRAMO CHUCHURUBI: Se tiene previsto la instalacion de bordillos prefabricados

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

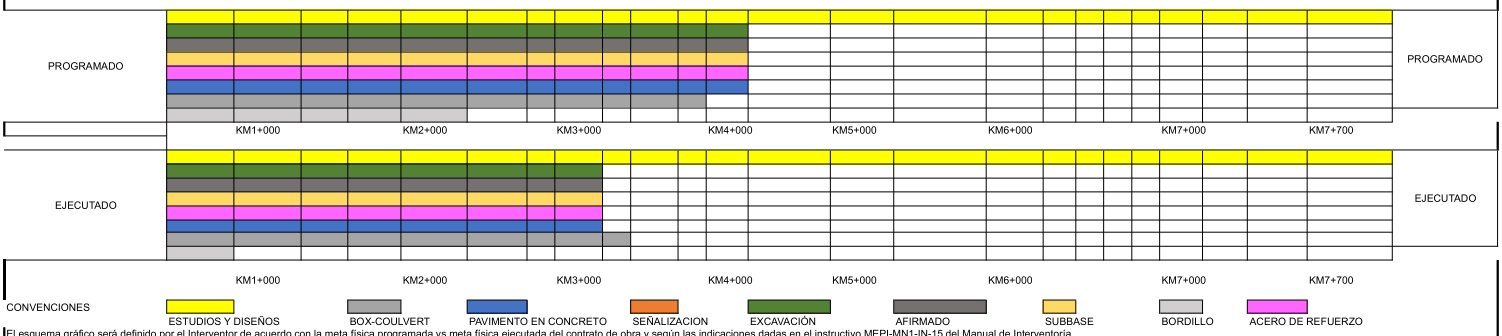

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Instalacion material afirmado hasta el PR 0+420 TRAMO A3 SECTOR - 20 DE JULIO



Foto 2. Suministro de bordillos PR 1+450 TRAMO CHUCHURUBI



Foto 3. Fundida de Pavimento hasta el PR 0+205 TRAMO T2 - MARTINEZ

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

En esta semana el contratista de nuevo aumento el atraso debido a su bajo rendimiento en las actividades y tambien se vio afectado por las fuertes lluvias que se estan presentando en la zona,lo que representa aumento del atraso del -46.41% al -51.71%, Se le pide celeridad al contratista en las actividades para asi seguir contrarestando el atraso que llevan.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: LEONARDO TORO NIÑO

Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/06/23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 48 (Numeración consecutiva) del 16-jun al 22-jun — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO + BORDILLOS PREFABRICADOS DE 7673,35 ML EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (B/ 20 DE JULIO, B/CHUCHURUBÍ, B/ALBERTO SAIBIS Y B/LA LUCHA) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 38Mpa Y 20CM DE ESPESOR + BORDILLOS PREFABRICADOS, CON ANCHOS DIFERENTES POR TRAMOS DE 5.50m, 5.00m, 4.50m, y 4.00m, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO DE 25CM PARA TRAMO Y TRAMO 3 Y 45CM PARA TRAMO 2, MÁS 15 CM DE SUBBASE PARA LOS TRES TRAMOS; ADEMÁS DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTEGRANTES: ANDRES ALBERTO PICO GUERRERO 100%
CONTRATO No. 104 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 16.321.717.210,00
FECHA DE INICIO: 25/07/22 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 16.321.717.210,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/23
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B
INTEGRANTES: ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 50%
CONTRATO No. 2276 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO: 28/01/22 — VALOR ADICIONES: $ 965.265.286,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 2.895.796.059,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/23 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 16.321.717.210	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 2.776.522.462	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 13.545.194.748	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 2.895.796.059	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 2.181.185.653	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 714.610.406	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.321.717.210,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 15.394.477.998,94	94,32%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.191.974.841,37	56,33%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 6.202.503.157,57	37,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 37.909.582,00	0,23%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.612.757.253,76	94,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.195.866.233,55	37,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 6.416.890.979,99	56,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 875.231.633,20	6,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 90.744.486,76	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: HASTA 31/01/2023
VALOR FACTURA: $ 2.776.522.462,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.864.192.290,50	98,66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.181.185.653,00	75,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 41.603.768,50	1,44%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37.604.267,75	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.896.515.163,00
Amortizado $	$ 1.189.938.197,99
Saldo $	$ 3.706.576.965,01

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,41
Acumulado:	0,35

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 94,32%
Meta Física Ejecutada %: 37,96%
Avance o Atraso Físico %: -56,36%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	1	1		1	100,0%
					Ejec	1	1		1	100,0%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizaron las socializaciones de los proyectos: el día 05/09/2022 en martinez y el día 06/09/2022 en chuchurubi

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MARTINEZ-TRAMO T4: En el tramo T4 se realizo la instalacion total de los bordillos prefabricados desde absc K0+75,19 a la K0+000 em ambos lados, y con su respectivo sello de juntas.
MARTINEZ TRAMO T5: En el tramo T5 se dio inicio con el suministro e instalacion de bordillos prefabricados hasta abscisa K0+190 lado izquierdo.
TRAMO 20 DE JULIO: No se realizo excavacion mecanica en el tramo A4 hasta la abscisa K0+380, Se realizo instalacion de material afirmado y sub base en el tramo A3 hasta la abscisa K0+420, No se realizo excavacion mecanica en el tramo 20 de julio hasta el PR0+330, No se suministro de material afirmado hasta absc K0+300 estas actividades estan siendo afectada por las lluvias en la zona. TRAMO CHCUCHURUBI :se continuo con el suministro de bordillos y excavacion para instalacion de los mismos en el tramo chuchurubi hasta la abscisa K1+200 ambos lados. TRAMO T2 MARTINEZ : Se continuo con la excavacion mecanica hasta la abscisa K0+150, se realizo instalacion de material afirmado hasta la absc K0+150, tambien se instalo material sub base hasta absc K0+150 y se realizo fundida de pavimento hasta la absc K0+150

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MARTÍNEZ- TRAMO T5: Se tiene previsto continuar con la instalacion de bordillos y sellado de junta.
MARTINEZ TRAMO T4: Se tiene previsto el sello de juntas. MARTINEZ 20 DE JULIO: Se tiene previsto continuar con las excavaciones mecanicas, instalacion de material afirmado, sub base granular,fundida de concreto y mejoramiento con piedra rajon
TRAMO T2 MARTINEZ: Se tiene previsto continuar con la excavacion mecanica, instalacion e material afirmado, sub bse y fundida de concreto. TRAMO CHUCHURUBI: Se tiene previsto la instalacion de bordillos prefabricados

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

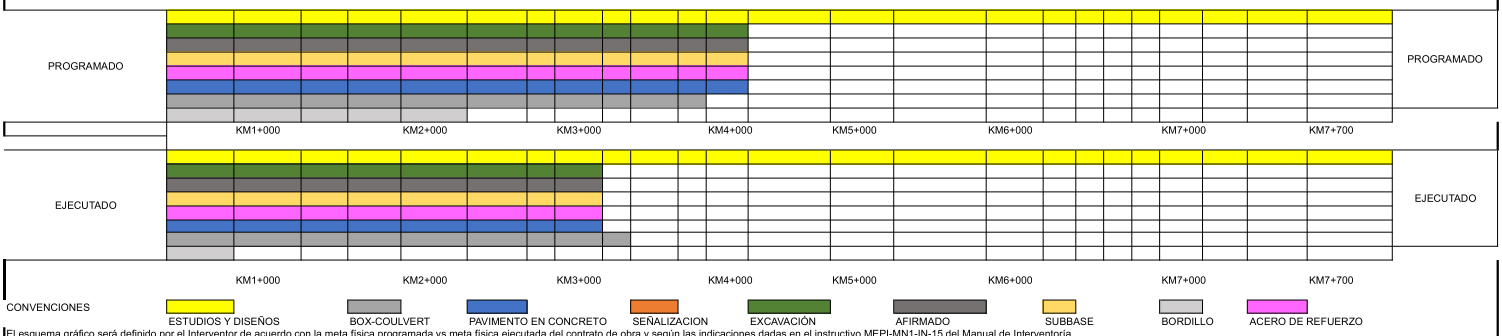

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Instalacion material Piedra Rajon para fallosen el TRAMO A3 Y A4 SECTOR - 20 DE JULIO



Foto 2. Suministro de bordillos PR 0+190 TRAMO T5 MARTINEZ



Foto 3. Fundida de Pavimento hasta el PR 0+150 TRAMO T2 - MARTINEZ

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

En esta semana el contratista de nuevo aumento el atraso debido a su bajo rendimiento en las actividades y tambien se vio afectado por las fuertes lluvias que se estan presentando en la zona,lo que representa aumento del atraso del -51.71% al -56.59%, Se le pide celeridad al contratista en las actividades para asi seguir contrarestando el atraso que llevan.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE LEONARDO TORO NIÑO
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — SEMANA No.: 49 (Numeración consecutiva) del 23-jun al 29-jun — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO + BORDILLOS PREFABRICADOS DE 7673,35 ML EN EL CORREGIMIENTO DE MARTÍNEZ (B/ 20 DE JULIO, B/CHUCHURUBÍ, B/ALBERTO SAIBIS Y B/LA LUCHA) EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 38Mpa Y 20CM DE ESPESOR + BORDILLOS PREFABRICADOS, CON ANCHOS DIFERENTES POR TRAMOS DE 5.50m, 5.00m, 4.50m, y 4.00m, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO DE 25CM PARA TRAMO Y TRAMO 3 Y 45CM PARA TRAMO 2, MÁS 15 CM DE SUBBASE PARA LOS TRES TRAMOS; ADEMÁS DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO (04) BOX CULVERT DE SECCIÓN 1MX1M Y L=7M UBICADOS EN SECTOR 20 DE JULIO - TRAMO A3 - CARRERA 7C ENTRE DIAGONAL 3 Y CARRERA 2 - K0+310, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K0+922, SECTOR MEDIA TAPA - CALLE 8 VIA A MEDIA TAPA- TRAMO T1 - K1+467 Y EN SECTOR LA LUCHA - TRAMO T18 - CALLE 2aA ENTRE TRONCAL CERETE CIENAGA DE ORO Y CALLE 10 - K0+420; Y OBRAS DE ARTE COMO DESCOLES, CUNETAS Y/O DISIPADORES PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022
INTEGRANTES: ANDRES ALBERTO PICO GUERRERO 100%
CONTRATO No. 104 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 16.321.717.210,00
FECHA DE INICIO: 25/07/22 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 16.321.717.210,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/23
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B
INTEGRANTES: ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 3B PROYECTOS S.A.S CON 50%
CONTRATO No. 2276 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO: 28/01/22 — VALOR ADICIONES: $ 965.265.286,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/22 — VALOR ACUMULADO: $ 2.895.796.059,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/23 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 16.321.717.210	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 2.776.522.462	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16.321.717.210,00	$ 13.545.194.748	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 2.895.796.059	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 2.218.789.921	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.930.530.773	$ 677.006.138	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.321.717.210,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 15.394.477.998,94	94,32%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.157.976.841,57	56,11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 6.236.501.157,37	38,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 37.909.582,00	0,23%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16.321.717.210,00	94,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.375.665.754,79	39,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 9.946.051.455,21	55,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 675.231.633,20	4,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 90.744.486,79	0,58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: HASTA 31/01/2023
VALOR FACTURA: $ 2.776.522.462,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.889.971.531,41	99,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.218.789.920,75	76,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 41.603.768,50	1,44%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37.604.267,75	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.896.515.163,00
Amortizado $	$ 1.189.938.197,99
Saldo $	$ 3.706.576.965,01

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,41
Acumulado:	0,36

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 94,32%
Meta Física Ejecutada %: 39,66%
Avance o Atraso Físico %: -55,26%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	1	1		1	100,0%
					Ejec	1	1		1	100,0%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizaron las socializaciones de los proyectos: el día 05/09/2022 en martinez y el día 06/09/2022 en chuchurubi

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

MARTINEZ-TRAMO T4: No se realizo ninguna actividad, se espera el sellado de juntas. MARTINEZ
TRAMO T5: En el tramo T5 se continuo con el suministro e instalacion de bordillos prefabricados ambos lados hasta abscisa K0+160.
TRAMO 20 DE JULIO: Se realizo instalacion de material afirmado y sub base en el tramo A3 hasta la abscisa K0+340, se realizo fundida de pavimento hidraulico hasta la absc K0+340 en el tramo A3, en el tramo A4 no se reaqlizo ninguna actividad el terreno se ha visto afectado por las lluvias.
TRAMO CHCUCHURUBI :se continuo con el suministro de bordillos y excavacion para instalacion de los mismos en el tramo chuchurubi hasta la abscisa K1+200 ambos lados. TRAMO T2 MARTINEZ : Se continuo con la excavacion mecanica hasta la abscisa K0+100, se realizo instalacion de material afirmado hasta la absc K0+110, tambien se instalo material sub base hasta absc K0+110 y se realizo fundida de pavimento hasta la absc K0+110.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

MARTÍNEZ- TRAMO T5: Se tiene previsto continuar con la instalacion de bordillos y sellado de junta.
MARTINEZ TRAMO T4: Se tiene previsto el sello de juntas. MARTINEZ 20 DE JULIO: Se tiene previsto continuar con las excavaciones mecanicas, instalacion de material afirmado, sub base granular,fundida de concreto y mejoramiento con piedra rajon.
TRAMO T2 MARTINEZ: Se tiene previsto continuar con la excavacion mecanica, instalacion e material afirmado, sub bse y fundida de concreto. TRAMO CHUCHURUBI: Se tiene previsto la instalacion de bordillos prefabricados

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

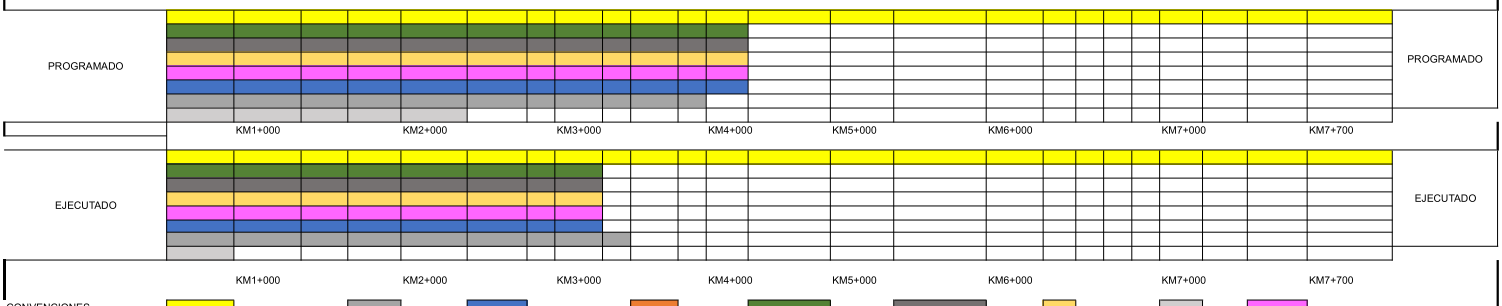

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Corte de Juntas en pavimento TRAMO A3 hasta absc K0+340 SECTOR - 20 DE JULIO



Foto 2. Toma de juntas de bordillos PR 0+200 TRAMO CHUCHURUBI



Foto 3. Fundida de Pavimento hasta el PR 0+100 TRAMO T2 - MARTINEZ

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

En esta semana el contratista disminuyo el atraso debido a que su rendimiento aumento en las actividades, aunque las lluvias continuan, afectaron un poco el rendimiento pero sin embargo el rendimiento mejoro,lo que mantiene el atraso del -56.59% al -55.26%, Se le pide celeridad al contratista en las actividades para asi seguir contrarestando el atraso que llevan.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: EDMARDO [illegible]
Matrícula Profesional N.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30-jun-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4",

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO

CONTRATO No. 104 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ACI-3B

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
ESTACION TOTAL	GOWIN	Alcance 2000m	Chuchurubí/Martínez	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
Volqueta dobletroque	International	14 m3	Chuchurubí	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
Vibrocompactador	Caterpillar	12 ton	Chuchurubí	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
Motoniveladora	Caterpillar	12 Ton	Chuchurubí	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
Minicargador	Caterpillar 236B	0,9ton	Chuchurubí	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
Recicladora	Caterpillar RM-350B	4,5ton	Chuchurubí	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO	6	6	6		6	6	6	6	6	6			6	6	6	6	6			6	6	6	6	6		6	6	6	6	6
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO				6							6	6						6	6						6					

RESUMEN PERÍODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	144	80,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	36	20,00%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Los días inactivos corresponden a los días que no se realizaron trabajos en obra por ser dominical y/o feriado.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Marcela Quiroz Chaverra
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-404918

Firma
Nombre: Libardo Arteaga Hernandez
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202-273816 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30-jun-23 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 104-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2023

PROYECTO: P65- INTERVENTORIA VIAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	INDICE DE RIESGO CONSOLIDADO (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ANA BERRIO	1.100.547.989	AUXILIAR SST	$ 1.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 102.100	V	Salud Total	9446658820	$ 58.700	Porvenir	9446658820	$ 234.700	$ 58.700	$ -	$ -	
2	JUAN DURANGO	1.067.939.423	OFICIOS VARIOS	$ 1.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 76.600	V	Cajacopi Atlántico	9446658820	$ 44.000	Porvenir	9446658820	$ 176.000	$ 44.000	$ -	$ -	
3	LUIS EUSE.	1.064.977.109	AUXILIAR SST	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Salud Total	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
4	JOVER ALEAN.	1.068.493.792	INGENIERO R.	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 104.400	V	Mutual Ser	9446658820	$ 60.000	Protección	9446658820	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	
5	LUIS ESPINOZA	78.029.892	PLOMERO	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 104.400	V	Salud Total	9446658820	$ 60.000	Colpensiones	9446658820	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	
6	CARLOS PRETEL	1.065.006.166	TOPOGRAFO	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 76.600	V	Nueva Eps	9446658820	$ 44.000	Porvenir	9446658820	$ 176.000	$ 44.000	$ -	$ -	
7	JOSE DIAZ.	78.030.929	CADENERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 90.500	V	Cajacopi	9446658820	$ 52.000	sin afp	9446658820	$ -	$ 52.000	$ -	$ -	
8	KEVIN DIAZ	92.527.941	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Coosalud	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
9	JORGE FLOREZ	1.067.840.601	OPERADOR	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Mutual Ser	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
10	GABRIEL GARCIA	78.032.739	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Salud Total	9446658820	$ 40.000	Protección	9446658820	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
11	DARIO GHISAYS	1.032.371.247	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Copi atlántico	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
12	ANYI GUERRA	1.063.286.399	AUXILIAR SST	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 90.500	V	Cajacopi	9446658820	$ 52.000	sin afp	9446658820	$ -	$ 52.000	$ -	$ -	
13	CRISTOBAL HERRERA	78.034.018	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO CORDOBA 2022	30	$ 69.600	V	Coosalud	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000				
14	JAIDYS MAUSSA	34.998.916	CONTADORA	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Mutual Ser	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000			
15	GABRIEL MEDELLIN	1.003.193.364	CADENERO 2	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Salud Total	9446658820	$ 40.000	Protección	9446658820	$ 160.000	$ 40.000			
16	JHEYCER MESTRA	1.095.006.285	CELADOR	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Copi atlántico	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000			
17	DANIELA MONTERROZA	1.104.422.240	TRABAJADORA SOCIAL	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Mutual Ser	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000			
18	ANGEL OROZCO	1.064.996.706	TOPOGRAFO	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Copi atlántico	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000			
19	LUIS PADILLA	1.064.992.268	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Copi atlántico	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000			
20	ORLANDO CASTELLON	73.196.326	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Copi atlántico	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000			
21	MARCELA QUIROZ	100.626.216	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Copi atlántico	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000			
22	PEDRO PADILLA	2.786.734	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Copi atlántico	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000			
23	YULLIA PADILLA	1.064.992.327	TRABAJADORA SOCIAL AUXILIAR	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			30	$ 69.600	V	Copi atlántico	9446658820	$ 40.000	Porvenir	9446658820	$ 160.000	$ 40.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/06/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoria verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoria relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoria la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los dias que prestó el servicio.

Firma

Nombre: ORLANDO ISAAC CASTELLON MARRUGO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 13202-120629 BLV

Firma

Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598916	6	CONSORCIO CORDOBA 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 12 45	CERETE-CORDOBA	3185162227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	50870770	9453579460	E	2023/07/07	2023/07/17	BANCOLOMBIA	10	$15,624,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (23 Afiliados)						$34,736,668	$5,558,000			$34,736,668	$4,342,500			$34,736,668	$1,389,600			$34,736,668	$2,418,900		$34,736,668	$1,737,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (23 Afiliados)						$34,736,668	$5,558,000			$34,736,668	$4,342,500			$34,736,668	$1,389,600			$34,736,668	$2,418,900		$34,736,668	$1,737,200
Ciudad: CERETE Depto: CORDOBA (23 Afiliados)						$34,736,668	$5,558,000			$34,736,668	$4,342,500			$34,736,668	$1,389,600			$34,736,668	$2,418,900		$34,736,668	$1,737,200
1	CC	1069493792	ALEAN JOVER	230301	30	$3,350,000	$536,000	EPS005	30	$3,350,000	$418,800	CCF16	30	$3,350,000	$134,000	14-11	30	$3,350,000	$233,200	30	$3,350,000	$167,500
2	CC	1100547989	BERRIO ANA	230301	30	$1,650,000	$264,000	ESSC07	30	$1,650,000	$206,300	CCF16	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	$114,900	30	$1,650,000	$82,500
3	CC	73196326	CASTELLON ORLANDO	230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS002	30	$2,450,000	$306,300	CCF16	30	$2,450,000	$98,000	14-11	30	$2,450,000	$170,600	30	$2,450,000	$122,500
4	CC	78030929	DIAZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
5	CC	92527941	DIAZ KEVIN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
6	CC	1067939423	DURANGO JUAN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
7	CC	78029892	ESPINOSA LUIS	231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
8	CC	1064977109	EUSE LUIS	231001	22	$1,210,000	$193,600	EPS002	22	$1,210,000	$151,300	CCF16	22	$1,210,000	$48,400	14-11	22	$1,210,000	$84,300	22	$1,210,000	$60,500
9	CC	1067840601	FLOREZ JORGE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
10	CC	78032739	GARCIA GABRIEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
11	CC	1032371247	GHISAYS DARIO	231001	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$287,500	CCF16	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$2,300,000	$115,000
12	CC	1063289399	GUERRA ANYI	230201	27	$1,485,000	$237,600	EPS002	27	$1,485,000	$185,700	CCF16	27	$1,485,000	$59,400	14-11	27	$1,485,000	$103,400	27	$1,485,000	$74,300
13	CC	78034018	HERRERA CRISTOBAL	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
14	CC	34998916	MAUSSA JAIDYS	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000
15	CC	1003193364	MEDELLIN GABRIEL	230301	30	$1,650,000	$264,000	CCFC55	30	$1,650,000	$206,300	CCF16	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	$114,900	30	$1,650,000	$82,500
16	CC	1065006285	MESTRA JHEYCER	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
17	CC	1104422240	MONTERROZA DANIELA	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$287,500	CCF16	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$2,300,000	$115,000
18	CC	1064996706	OROZCO ANGEL	231001	5	$275,000	$44,000	ESSC07	5	$275,000	$34,400	CCF16	5	$275,000	$11,000	14-11	5	$275,000	$19,200	5	$275,000	$13,800
19	CC	1064992268	PADILLA LUIS	230301	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$24,200	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$193,334	$9,800
20	CC	2786734	PADILLA PEDRO	230301	5	$193,334	$31,000	ESSC07	5	$193,334	$24,200	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$193,334	$9,800
21	CC	1064992327	PADILLA YULLIA	231001	30	$1,700,000	$272,000	ESSC07	30	$1,700,000	$212,500	CCF16	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$118,400	30	$1,700,000	$85,000
22	CC	1065006168	PRETELT CARLOS	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$275,000	CCF16	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$2,200,000	$110,000
23	CC	1100628216	QUIROZ MARCELA	230301	30	$2,500,000	$400,000	ESSC07	30	$2,500,000	$312,500	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$2,500,000	$125,000
Total		**Afiliados(23)**				$34,736,668	$5,558,000			$34,736,668	$4,342,500			$34,736,668	$1,389,600			$34,736,668	$2,418,900		$34,736,668	$1,737,200

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598916	6	CONSORCIO CORDOBA 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 12 45	CERETE-CORDOBA	3185162227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	50870770	9453579460	E	2023/07/07	2023/07/17	BANCOLOMBIA	10	$15,624,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$5,558,000	$63,900	$0	$5,621,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,383,200	$15,900	$0	$1,399,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$556,800	$6,400	$0	$563,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,009,200	$34,600	$0	$3,043,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$608,800	$7,000	$0	$615,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,418,900	$27,800	$0	$2,446,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$2,418,900	$27,800	$0	$2,446,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,389,600	$16,000	$0	$1,405,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	23	$1,389,600	$16,000	$0	$1,405,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	$4,342,500	$50,100	$0	$4,392,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$206,300	$2,400	$0	$208,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$1,700	$0	$146,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$1,224,900	$14,100	$0	$1,239,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$1,700	$0	$146,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$1,700	$0	$146,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$1,625,000	$18,700	$0	$1,643,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$851,300	$9,800	$0	$861,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,042,400	$12,000	$0	$1,054,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	23	$1,042,400	$12,000	$0	$1,054,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$694,800	$8,000	$0	$702,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	23	$694,800	$8,000	$0	$702,800
TOTAL				**23**	**$15,446,200**	**$177,800**	**$0**	**$15,624,000**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-Jun-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 104-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2023 **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	457	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL	207	Otras transferencias de capital - convenio Invías 924	104 de 2022	$ 16.321.717.210	$ 16.321.717.210
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 16.321.717.210,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	ene-23	$ 3,966,460,659.98		$ 3,966,460,659.98	$ 1,189,938,198	$ 2,776,522,462	$ 3,706,576,965.01	457	$ 8,648,679,585	$ 8,648,679,585				
2	Parcial	may-23	$ 1,960,457,514.28		$ 1,960,457,514	$ 588,137,254	$ 1,372,320,260	$ 3,118,439,710.72		$ 7,276,359,325	$ 7,276,359,325				
TOTALES			$ 5.926.918.174		$ 5.926.918.174	$ 1.778.075.452	$ 4.148.842.722	$ 3.118.439.711		$ 15.925.038.910	$ 15.925.038.910				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 16,225,955,882	$ -	$ 16,225,955,882
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 31,856,800	$ 6,052,792	$ 37,909,592
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 57,851,736	$ -	$ 57.851.736
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	$ -	$ -
*			
*			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	$ 16.321.717.210

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ORLANDO ISAAC CASTELLON MARRUGO
Director de Obra
Matricula Profesional No.: 13202-120629 BLV

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matricula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-jun-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 104-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2023 **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	18	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		710
Lluvias moderadas								2									2															4
Lluvias intensas	6																															6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		720

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Marcela Quiroz Chaverra
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-404918

Firma
Nombre: Libardo Arteaga Hernandez
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202-273816 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA: 30-Jun-23 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 104 DE 2022 — CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2023 — PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 — INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-2B

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
348	20/05/2023	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA	INV-161-13	AFIRMADO	2	>=90%	90,00%	SI	Afirmado Tramo T5 Pr 0+150 LI y Pr 0+135 LD
349	22/05/2023	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA	INV-161-13	SUBBASE	2	>=95%	95,00%	SI	Sub base Tramo T5 Pr 0+150 LI y Pr 0+135 LD
350	13/06/2023	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA	INV-161-13	AFIRMADO	4	>=90%	90,00%	SI	Afirmado Tramo T5 Pr 0+110 LD, Pr 0+085 LI Pr 0+045 LD y Pr 0+010 LI
351	13/06/2023	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA	INV-161-13	AFIRMADO	2	>=90%	90,00%	SI	Afirmado Tramo T2 Pr 0+240 LI y Pr 0+200 LD
352	16/06/2023	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA	INV-161-13	SUBBASE	2	>=95%	95,00%	SI	Subbase Tramo T2 Pr 0+240 LI y Pr 0+200 LD
353	17/06/2023	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA	INV-161-13	AFIRMADO	4	>=90%	90,00%	SI	Afirmado Tramo T2 Pr 0+180 LD, Pr 0+150 LI Pr 0+130 LD y Pr 0+110 LI
354	23/06/2023	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA	INV-161-13	SUBBASE	4	>=95%	95,00%	SI	Sub base Tramo T2 Pr 0+180 LD, Pr 0+150 LI, Pr 0+130 LD y Pr 0+110 LI
355	22/06/2023	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA	INV-161-13	AFIRMADO	4	>=90%	90,00%	SI	Afirmado Tramo T2 Pr 0+090 LD, Pr 0+070 LI Pr 0+040 LD y Pr 0+010 LI
356	30/06/2023	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA	INV-161-13	SUBBASE	4	>=95%	95,00%	SI	Sub base Tramo T2 Pr 0+090 LI, Pr 0+070 LD, Pr 0+040 LI y Pr 0+010 LD
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
F-ED-RC-012	13/06/2023	RESISTENCIA CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI	INV E-410-14	RESISTENCIA	3	3000 PSI	106,00%	SI	MUESTRAS TOMADAS EN BOX COULVERT TRAMO LA LUCHA
F-ED-RF-002	16/06/2023	RESISTENCIA PARA CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2	INV E-410-13	RESISTENCIA	3	38 KG/M2	129,10%	SI	Tramo T 4 Pr 0+075 - Pr 0+000, Tramo T5 Pr 0+190 - Pr 0+135

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: ORLANDO ISAAC CASTELLON MARRUGO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202-120629 BLV

Firma

Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

VIASCON	**PESO UNITARIO DE SUELO EN TERRENO (CONO DE ARENA)**	Código:	FLB-017
		Versión:	1
		Fecha:	

EMPRESA: CONSORCIO CORDOBA 2022

OBRA: CONTRATO No 104 DE 2022 "MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIODE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL"

DESCRIPCIÓN: AFIRMADO
FUENTE: JOMEVE
FECHA DE TOMA Y ENSAYO: 20 DE MAYO DE 2023
LOCALIZACIÓN: MARTÍNEZ - T 5

MUESTRA No:
SOLICITUD No:

ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO

NORMA DE ENSAYO: I.N.V.E - 161

PARAMETROS	UNIDAD	ABSCISA					
		K0+150	K0+135				
PROFUNDIDAD	Centimetros	10	10				
CALZADA		IZQ	DER				
MATERIAL	Descripcion						
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL	Gramos	6325	6295				
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	Gramos	2680	2725				
CONSTANTE DEL CONO	Gramos	1516	1626				
PESO ARENA TOTAL USADA	Gramos	2019	1954				
DENSIDAD DE LA ARENA	Gramos/cc	1,389	1,379				
VOLUMEN DEL HUECO	Gramos/cc	1464	1437				
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO	Gramos	2960	2825				
HUMEDAD	%	6	5,6				
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO	Gramos	2792	2675				
DENSIDAD DEL MATERIAL	Gramos/cc	1,91	1,89				
DENSIDAD DEL MATERIAL	Libras/pie3	119,0	117,91				
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	Libras/pie3	130	130				
HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO	%	6,8	6,8				
COMPACTACION DEL TERRENO	%	91,55	90,62				
COMPACTACION ESPECIFICADA	%	92	94				
CUMPLE SI O NO		SI	SI				

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES
ENSAYOS ASOCIADOS:
RESPONSABLE DE ENSAYOS:

OSWALDO A. JIMENEZ CASTILLO
LABORATORISTA

DAYANE OBAJI BERNAL
INGENIERO DE CALIDAD

VoBo
Residente del proyecto

	PESO UNITARIO DE SUELO EN TERRENO (CONO DE ARENA)	Código:	FLB-017
VIASCON		Versión:	1
		Fecha:	

EMPRESA: CONSORCIO CORDOBA 2022

OBRA: CONTRATO No 104 DE 2022 "MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIODE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL"

DESCRIPCIÓN: SUB-BASE
FUENTE: JOMEVE
FECHA DE TOMA Y ENSAYO: 22 DE MAYO DE 2023
LOCALIZACIÓN: MARTINEZ - T5

MUESTRA No:
SOLICITUD No:

ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO

NORMA DE ENSAYO: I.N.V.E - 161

PARAMETROS	UNIDAD	ABSCISA					
		K0+150	K0+135				
PROFUNDIDAD	Centimetros	10	10				
CALZADA		IZQ	DER				
MATERIAL	Descripcion						
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL	Gramos	6245	6235				
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	Gramos	2665	2500				
CONSTANTE DEL CONO	Gramos	1616	1616				
PESO ARENA TOTAL USADA	Gramos	1964	2119				
DENSIDAD DE LA ARENA	Gramos/cc	1,379	1,379				
VOLUMEN DEL HUECO	Gramos/cc	1424,22	1536,62				
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO	Gramos	3140	3385				
HUMEDAD	%	6	6,2				
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO	Gramos	2962,26	3187,38				
DENSIDAD DEL MATERIAL	Gramos/cc	2,08	2,07				
DENSIDAD DEL MATERIAL	Libras/pie3	129,79	129,44				
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	Libras/pie3	135,8	135,8				
HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO	%	6,5	6,5				
COMPACTACION DEL TERRENO	%	95,57	95,31				
COMPACTACION ESPECIFICADA	%	90	90				
CUMPLE SI O NO		SI	SI				

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES
ENSAYOS ASOCIADOS:
RESPONSABLE DE ENSAYOS:

OSWALDO A. JIMENEZ CASTILLO
LABORATORISTA

DAYANE OBAJI BERNAL
INGENIERO DE CALIDAD

VoBo
Residente del proyecto

	PESO UNITARIO DE SUELO EN TERRENO (CONO DE ARENA)	Código:	FLB-017
VIASCON		Versión:	1
		Fecha:	

EMPRESA: CONSORCIO CORDOBA 2022

OBRA: CONTRATO No 104 DE 2022 "MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIODE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL"

DESCRIPCIÓN: AFIRMADO — **MUESTRA No:**

FUENTE: JOMEVE — **SOLICITUD No:**

FECHA DE TOMA Y ENSAYO: 25 DE MAYO DE 2023

LOCALIZACIÓN: MARTINEZ - T5

ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO

NORMA DE ENSAYO: I.N.V.E - 161

PARAMETROS	UNIDAD	ABSCISA					
		K0+110	K0+085	K0+045	K0+010		
PROFUNDIDAD	Centimetros	10	10	10	10		
CALZADA		DER	IZQ	DER	IZQ		
MATERIAL	Descripcion						
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL	Gramos	6210	6195	6325	6295		
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	Gramos	2480	2490	2680	2725		
CONSTANTE DEL CONO	Gramos	1646	1616	1516	1626		
PESO ARENA TOTAL USADA	Gramos	2214	2099	2019	1854		
DENSIDAD DE LA ARENA	Gramos/cc	1,379	1,389	1,389	1,379		
VOLUMEN DEL HUECO	Gramos/cc	1726	1542	1464	1537		
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO	Gramos	3260	3044	2960	2835		
HUMEDAD	%	6,6	6,5	6	5,6		
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO	Gramos	3059	2854	2792	2575		
DENSIDAD DEL MATERIAL	Gramos/cc	1,90	1,88	1,91	1,89		
DENSIDAD DEL MATERIAL	Libras/pie3	11879	117,02	119,0	117,91		
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	Libras/pie3	130	130	130	130		
HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO	%	6,8	6,8	6,8	6,8		
COMPACTACION DEL TERRENO	%	91,43	90,02	91,55	90,62		
COMPACTACION ESPECIFICADA	%	96	95	92	95		
CUMPLE SI O NO		SI	SI	SI	SI		

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES

ENSAYOS ASOCIADOS:

RESPONSABLE DE ENSAYOS:

OSWALDO A. JIMENEZ CASTILLO
LABORATORISTA

DAYANE OBAJI BERNAL
INGENIERO DE CALIDAD

VoBo
Residente del proyecto

	PESO UNITARIO DE SUELO EN TERRENO (CONO DE ARENA)	Código:	FLB-017
VIASCON		Versión:	1
		Fecha:	

EMPRESA: CONSORCIO CORDOBA 2022

OBRA: CONTRATO No 104 DE 2022 "MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIODE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL"

DESCRIPCIÓN: AFIRMADO
FUENTE: JOMEVE
FECHA DE TOMA Y ENSAYO: 13 DE JUNIO DE 2023
LOCALIZACIÓN: MARTÍNEZ - T2

MUESTRA No:
SOLICITUD No:

ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO							
NORMA DE ENSAYO: I.N.V.E - 161							
PARAMETROS	UNIDAD	ABSCISA					
		K0+240	K0+200				
PROFUNDIDAD	Centimetros	10	10				
CALZADA		IZQ	DER				
MATERIAL	Descripcion						
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL	Gramos	6325	6295				
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	Gramos	2680	2725				
CONSTANTE DEL CONO	Gramos	1516	1626				
PESO ARENA TOTAL USADA	Gramos	2019	1954				
DENSIDAD DE LA ARENA	Gramos/cc	1,389	1,379				
VOLUMEN DEL HUECO	Gramos/cc	1464	1437				
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO	Gramos	2960	2825				
HUMEDAD	%	6	5,6				
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO	Gramos	2792	2675				
DENSIDAD DEL MATERIAL	Gramos/cc	1,91	1,89				
DENSIDAD DEL MATERIAL	Libras/pie3	119,0	117,91				
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	Libras/pie3	130	130				
HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO	%	6,8	6,8				
COMPACTACION DEL TERRENO	%	91,55	90,62				
COMPACTACION ESPECIFICADA	%	92	94				
CUMPLE SI O NO		SI	SI				

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES
ENSAYOS ASOCIADOS:
RESPONSABLE DE ENSAYOS:

OSWALDO A. JIMENEZ CASTILLO
LABORATORISTA

DAYANE OBAJI BERNAL
INGENIERO DE CALIDAD

VoBo
Residente del proyecto

	PESO UNITARIO DE SUELO EN TERRENO (CONO DE ARENA)	Código:	FLB-017
VIASCON		Versión:	1
		Fecha:	

EMPRESA: CONSORCIO CORDOBA 2022

OBRA: CONTRATO No 104 DE 2022 "MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIODE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL"

DESCRIPCIÓN: SUB-BASE
FUENTE: JOMEVE
FECHA DE TOMA Y ENSAYO: 16 DE JUNIO DE 2023
LOCALIZACIÓN: MARTINEZ - T2

MUESTRA No:
SOLICITUD No:

ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO

NORMA DE ENSAYO: I.N.V.E - 161

PARAMETROS	UNIDAD	ABSCISA					
		K0+240	K0+200				
PROFUNDIDAD	Centimetros	10	10				
CALZADA		IZQ	DER				
MATERIAL	Descripcion						
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL	Gramos	6245	6235				
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	Gramos	2665	2500				
CONSTANTE DEL CONO	Gramos	1616	1616				
PESO ARENA TOTAL USADA	Gramos	1964	2119				
DENSIDAD DE LA ARENA	Gramos/cc	1,379	1,379				
VOLUMEN DEL HUECO	Gramos/cc	1424,22	1536,62				
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO	Gramos	3140	3385				
HUMEDAD	%	6	6,2				
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO	Gramos	2962,26	3187,38				
DENSIDAD DEL MATERIAL	Gramos/cc	2,08	2,07				
DENSIDAD DEL MATERIAL	Libras/pie3	129,79	129,44				
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	Libras/pie3	135,8	135,8				
HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO	%	6,5	6,5				
COMPACTACION DEL TERRENO	%	95,57	95,31				
COMPACTACION ESPECIFICADA	%	90	90				
CUMPLE SI O NO		SI	SI				

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES
ENSAYOS ASOCIADOS:
RESPONSABLE DE ENSAYOS:

OSWALDO A. JIMENEZ CASTILLO
LABORATORISTA

DAYANE OBAJI BERNAL
INGENIERO DE CALIDAD

VoBo
Residente del proyecto

VIASCON	**PESO UNITARIO DE SUELO EN TERRENO (CONO DE ARENA)**	Código:	FLB-017
		Versión:	1
		Fecha:	

EMPRESA: CONSORCIO CORDOBA 2022

OBRA: CONTRATO No 104 DE 2022 "MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIODE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL"

DESCRIPCIÓN: AFIRMADO — **MUESTRA No:**

FUENTE: JOMEVE — **SOLICITUD No:**

FECHA DE TOMA Y ENSAYO: 17 DE JUNIO DE 2023

LOCALIZACIÓN: MARTINEZ - T2

ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO

NORMA DE ENSAYO: I.N.V.E - 161

PARAMETROS	UNIDAD	ABSCISA					
		K0+180	K0+150	K0+130	K0+110		
PROFUNDIDAD	Centimetros	10	10	10	10		
CALZADA		DER	IZQ	DER	IZQ		
MATERIAL	Descripcion						
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL	Gramos	6200	6195	6325	6295		
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	Gramos	2380	2490	2680	2725		
CONSTANTE DEL CONO	Gramos	1636	1616	1516	1626		
PESO ARENA TOTAL USADA	Gramos	2214	2099	2019	1954		
DENSIDAD DE LA ARENA	Gramos/cc	1,379	1,389	1,389	1,379		
VOLUMEN DEL HUECO	Gramos/cc	1626	1542	1464	1437		
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO	Gramos	3260	3044	2960	2825		
HUMEDAD	%	6,6	6,5	6	5,6		
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO	Gramos	3059	2854	2792	2675		
DENSIDAD DEL MATERIAL	Gramos/cc	1,90	1,88	1,91	1,89		
DENSIDAD DEL MATERIAL	Libras/pie3	11879	117,02	119,0	117,91		
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	Libras/pie3	130	130	130	130		
HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO	%	6,8	6,8	6,8	6,8		
COMPACTACION DEL TERRENO	%	91,43	90,02	91,55	90,62		
COMPACTACION ESPECIFICADA	%	93	95	92	94		
CUMPLE SI O NO		SI	SI	SI	SI		

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES

ENSAYOS ASOCIADOS:

RESPONSABLE DE ENSAYOS:

OSWALDO A. JIMENEZ CASTILLO
LABORATORISTA

DAYANE OBAJI BERNAL
INGENIERO DE CALIDAD

VoBo
Residente del proyecto

	PESO UNITARIO DE SUELO EN TERRENO (CONO DE ARENA)	Código:	FLB-017
VIASCON		Versión:	1
		Fecha:	

EMPRESA: CONSORCIO CORDOBA 2022

OBRA: CONTRATO No 104 DE 2022 "MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIODE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL"

DESCRIPCIÓN: SUB-BASE
FUENTE: JOMEVE
FECHA DE TOMA Y ENSAYO: 23 DE JUNIO DE 2023
LOCALIZACIÓN: MARTINEZ - T2

MUESTRA No:
SOLICITUD No:

ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO

NORMA DE ENSAYO: I.N.V.E - 161

PARAMETROS	UNIDAD	ABSCISA					
		K0+180	K0+150	K0+130	K0+110		
PROFUNDIDAD	Centimetros	10	10	10	10		
CALZADA		IZQ	DER	IZQ	DER		
MATERIAL	Descripcion						
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL	Gramos	6225	6235	6225	6235		
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	Gramos	2765	2500	2765	2500		
CONSTANTE DEL CONO	Gramos	1626	1616	1626			
PESO ARENA TOTAL USADA	Gramos	1964	2119	1964			
DENSIDAD DE LA ARENA	Gramos/cc	1,379	1,379	1,379			
VOLUMEN DEL HUECO	Gramos/cc	1424,22	1536,62	1424,22	1536,62		
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO	Gramos	3140	3385	3140	3385		
HUMEDAD	%	6	6,2	6	6,2		
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO	Gramos	2962,26	3187,38	2962,26	3187,38		
DENSIDAD DEL MATERIAL	Gramos/cc	2,08	2,07	2,08	2,07		
DENSIDAD DEL MATERIAL	Libras/pie3	129,79	129,44	129,79	129,44		
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	Libras/pie3	135,8	135,8	135,8	135,8		
HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO	%	6,5	6,5	6,5	6,5		
COMPACTACION DEL TERRENO	%	95,57	95,31	95,57	95,31		
COMPACTACION ESPECIFICADA	%	90	90	90	90		
CUMPLE SI O NO		SI	SI	SI	SI		

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES
ENSAYOS ASOCIADOS:
RESPONSABLE DE ENSAYOS:

OSWALDO A. JIMENEZ CASTILLO
LABORATORISTA

DAYANE OBAJI BERNAL
INGENIERO DE CALIDAD

VoBo
Residente del proyecto

	PESO UNITARIO DE SUELO EN TERRENO (CONO DE ARENA)	Código:	FLB-017
VIASCON		Versión:	1
		Fecha:	

EMPRESA: CONSORCIO CORDOBA 2022

OBRA: CONTRATO No 104 DE 2022 "MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIODE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL"

DESCRIPCIÓN: AFIRMADO — **MUESTRA No:**

FUENTE: JOMEVE — **SOLICITUD No:**

FECHA DE TOMA Y ENSAYO: 22 DE JUNIO DE 2023

LOCALIZACIÓN: MARTINEZ - T2

ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO

NORMA DE ENSAYO: I.N.V.E - 161

PARAMETROS	UNIDAD	ABSCISA					
		K0+090	K0+070	K0+040	K0+010		
PROFUNDIDAD	Centimetros	10	10	10	10		
CALZADA		DER	IZQ	DER	IZQ		
MATERIAL	Descripcion						
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL	Gramos	6200	6195	6325	6295		
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	Gramos	2380	2490	2680	2725		
CONSTANTE DEL CONO	Gramos	1636	1616	1516	1626		
PESO ARENA TOTAL USADA	Gramos	2214	2099	2019	1954		
DENSIDAD DE LA ARENA	Gramos/cc	1,379	1,389	1,389	1,379		
VOLUMEN DEL HUECO	Gramos/cc	1626	1542	1464	1437		
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO	Gramos	3260	3044	2960	2825		
HUMEDAD	%	6,6	6,5	6	5,6		
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO	Gramos	3059	2854	2792	2675		
DENSIDAD DEL MATERIAL	Gramos/cc	1,90	1,88	1,91	1,89		
DENSIDAD DEL MATERIAL	Libras/pie3	11879	117,02	119,0	117,91		
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	Libras/pie3	130	130	130	130		
HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO	%	6,8	6,8	6,8	6,8		
COMPACTACION DEL TERRENO	%	91,43	90,02	91,55	90,62		
COMPACTACION ESPECIFICADA	%	93	95	92	94		
CUMPLE SI O NO		SI	SI	SI	SI		

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES

ENSAYOS ASOCIADOS:

RESPONSABLE DE ENSAYOS:

OSWALDO A. JIMENEZ CASTILLO
LABORATORISTA

DAYANE OBAJI BERNAL
INGENIERO DE CALIDAD

VoBo
Residente del proyecto

	PESO UNITARIO DE SUELO EN TERRENO (CONO DE ARENA)	Código:	FLB-017
VIASCON		Versión:	1
		Fecha:	

EMPRESA: CONSORCIO CORDOBA 2022

OBRA: CONTRATO No 104 DE 2022 "MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIODE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL"

DESCRIPCIÓN: SUB-BASE
FUENTE: JOMEVE
FECHA DE TOMA Y ENSAYO: 30 DE JUNIO DE 2023
LOCALIZACIÓN: MARTINEZ - T2

MUESTRA No:
SOLICITUD No:

ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO

NORMA DE ENSAYO: I.N.V.E - 161

PARAMETROS	UNIDAD	ABSCISA					
		K0+090	K0+070	K0+040	K0+010		
PROFUNDIDAD	Centimetros	10	10	10	10		
CALZADA		IZQ	DER	IZQ	DER		
MATERIAL	Descripcion						
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL	Gramos	6225	6235	6225	6235		
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE	Gramos	2765	2500	2765	2500		
CONSTANTE DEL CONO	Gramos	1626	1616	1626			
PESO ARENA TOTAL USADA	Gramos	1964	2119	1964			
DENSIDAD DE LA ARENA	Gramos/cc	1,379	1,379	1,379			
VOLUMEN DEL HUECO	Gramos/cc	1424,22	1536,62	1424,22	1536,62		
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO	Gramos	3140	3385	3140	3385		
HUMEDAD	%	6	6,2	6	6,2		
PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO	Gramos	2962,26	3187,38	2962,26	3187,38		
DENSIDAD DEL MATERIAL	Gramos/cc	2,08	2,07	2,08	2,07		
DENSIDAD DEL MATERIAL	Libras/pie3	129,79	129,44	129,79	129,44		
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	Libras/pie3	135,8	135,8	135,8	135,8		
HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO	%	6,5	6,5	6,5	6,5		
COMPACTACION DEL TERRENO	%	95,57	95,31	95,57	95,31		
COMPACTACION ESPECIFICADA	%	90	90	90	90		
CUMPLE SI O NO		SI	SI	SI	SI		

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES
ENSAYOS ASOCIADOS:
RESPONSABLE DE ENSAYOS:

OSWALDO A. JIMENEZ CASTILLO
LABORATORISTA

DAYANE OBAJI BERNAL
INGENIERO DE CALIDAD

VoBo
Residente del proyecto

GEOTECNOLOGÍA S.A.S ingeniería y control

Fecha: 16/06/2023

F-ED-RF-002

Pag. 1 de 1

Geotecnologia Ingenieria y Control S.A.S
Nit: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones-Montería, Córdoba

Tel. (604)7973746 Cel. 3135563977 – 3162324365

CONSORCIO ACI-3B
Nit: 901.551.292-7

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point

Tel: - 7460460

Proyecto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - GRUPO 4 DERIVADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS No. CNA-DOSRT-167-2021.**

Ubicación de la Obra: **Corregimiento Martinez, Vereda Media Tapa, Municipio de Cereté, Dpto. de Córdoba**

Tipo de Concreto: **CONCRETO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO MR:38 Kg/cm²**

Resultados de los Ensayos

Resistencía a la Flexión del Concreto Usando una Viga Simplemente Apoyada y Cargada en los Tercios de la Luz Libre

Norma de Ensayo: INV E-414-13

Especificación: INV Art. 500-13

Muestra N°	Descripcion	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Dias)	Altura (cm) d	Distancia entre Apoyos (cm) L	Ancho (cm) b	Carga (KN)	Modulo de Rotura (Kg/cm²)		
									Edad (Dias)		
									7	28	
ED-RF-RM-M-028-1	Km 0+075 - Km 0+000 Tramo-4	06/05/2023	13/05/2023	7	15,0	45,0	15,0	32,5	44,2		
ED-RF-RM-M-028-2		06/05/2023	03/06/2023	28	15,5	45,0	15,5	40,1		49,4	
ED-RF-RM-M-029-1	Km 0+190 - Km 0+135 Tramo-5	15/05/2023	22/05/2023	7	15,0	45,0	15,0	30,1	40,9		
ED-RF-RM-M-029-2		15/05/2023	12/06/2023	28	15,6	45,0	15,5	41,1		50,0	
ED-RF-RM-M-030-1	Km 0+190 - Km 0+135 Tramo-5	18/05/2023	25/05/2023	7	15,0	45,0	15,0	32,6	44,3		
ED-RF-RM-M-030-2		18/05/2023	15/06/2023	28	15,5	45,0	15,6	39,0		47,7	
								RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm²)	**42,6**	**49,1**	**-**
								RESISTENCIA NOMINAL (Kg/cm²)	**38**		
								PORCENTAJE DE RESISTENCIA	**112,0**	**129,1**	**-**

OBSERVACIONES :

Fredy Rodriguez Rubio
Geotecnologo
Mat. N° 19516-00111 CPSL

Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantia de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

GEOTECNOLOGÍA S.A.S
ingeniería y control

Fecha: 13/06/2023

F-ED-RC-012

Geotecnologia Ingenieria y Control S.A.S
Nit: 900.950.052-3

Calle. 2B 12-18 B. Los Garzones, Montería Córdoba

(604)Cel. 3135563977 – 3162324365

CONSORCIO ACI-3B
Nit: 901.551.292-6

Carrera 7 N° 156-10 Piso 31 Edf. Torre Krystal North Point

Tel: - 7460460

Proyecto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMENTO Y MEJORAMIENTO D VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL**

Tipo de Concreto: **Concreto Hidraulico, 3000 psi (210 Kg/cm²)**

Localización de la Obra: **Corregimiento Martinez, Vereda Media Tapa, Municipio de Cereté, Dpto. de Córdoba**


Resultados de los Ensayos

Resistencía a la Compresión de Cilindros de Concreto

Norma de Ensayo: INV E-410-14

Especificación: INV Art. 630-13

Muestra N°	Descripcion	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Dias)	Altura (cm)	Diametro (cm)	Carga (KN)	RELACION L/D	PATRON DE FALLA	Resistencia (Kg/cm²) Edad (Dias) 7		28
RESIST-M-005-16	Boxcoulbert	15/05/2023	22/05/2023	7	30,0	15,0	277,0	2,00	Tipo-5	159,8		
RESIST-M-005-17		15/05/2023	12/06/2023	28	30,0	15,0	382,1	2,00	Tipo-5			220,5
RESIST-M-005-18		15/05/2023	12/06/2023	28	30,0	15,0	390,2	2,00	Tipo-4			225,2
									Resistencía Obtenida	kg/cm²	**159,8**	**222,8**
									Resistencía Obtenida	Mpa	**15,7**	**21,9**
									Resistencía Obtenida	Psi	**2273**	**3169**
									Resistencía de Diseño	Psi	**3000**	
									Porcentaje de resistencia	%	**76**	**106**
									Criterio de Aceptación		**CUMPLE**	**CUMPLE**



TIPO 1 **TIPO 2** **TIPO 3** **TIPO 4** **TIPO 5** **TIPO 6**

Fredy Rodriguez Rubio
Geotecnologo
Mat. N° 19510-00111 CPSL

Fredy Rodriguez Rubio
Jefe de Laboratorio

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantia de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 104-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2022

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 16.321.717.210,00

VALOR ACUMULADO: $ 16.321.717.210,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 37.909.592,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 37.909.592,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	31 5 2022	31 5 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	31 5 2022	31 1 2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	31 5 2022	31 7 2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	31 5 2022	31 5 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta recibo satisfacción	5 años a partir de acta recibo satisfacción

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	31 5 2022	31 7 2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25 7 2022	27 3 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25 7 2022	27 3 2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25 7 2022	24 9 2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	5 años a partir de acta de entrega	5 años a partir de acta de entrega
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega	5 años a partir de acta de entrega

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	25 7 2022	24 9 2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25 7 2022	27 3 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25 7 2022	27 3 2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25 7 2022	24 9 2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25 7 2022	25 7 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega	5 años a partir de acta de entrega

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	25	7	2022	24	9	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25	7	2022	30	6	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25	7	2022	30	6	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25	7	2022	31	12	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25	7	2022	25	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega			5 años a partir de acta de entrega		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.632.171.721,00	25	7	2022	30	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.896.515.163,00	25	7	2022	30	12	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.264.343.442,00	25	7	2022	30	6	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.557.040,00	25	7	2022	25	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 4.896.515.163,00	5 años a partir de acta de entrega			5 años a partir de acta de entrega		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101172752

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 816.085.860,50	25	7	2022	30	6	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061054 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	10	2022	25	07	2022	00:00	24	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022	NIT: 901.598.916-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 17 B NRO. 62 - 29	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE	NIT: 800.096.744-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 12 N 12 37	CERETE, CORDOBA	7746037

ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, Y LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2022	30/06/2023	$1,632,171,721.00	$1,632,171,721.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25/07/2022	30/06/2023	$4,896,515,163.00	$4,896,515,163.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2022	31/12/2025	$3,264,343,442.00	$3,264,343,442.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$4,896,515,163.00	$4,896,515,163.00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/07/2022	25/07/2027	$9,557,040.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO A LA PRORROGA No.01 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCA DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,378,691.00	$ *******8,000.00	$ *****833,471.00	$ *********5,220,163.00	$ ***14,699,102,529.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101172752	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	10	2022	25	07	2022	00:00	24	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CORDOBA 2022		NIT: 901.598.916-6
DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELEFONO:** 3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE CERETE		NIT: 800.096.744-5
DIRECCIÓN: CALLE 12 N 12 37	**CIUDAD:** CERETE, CORDOBA	**TELÉFONO:** 7746037

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101172752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE CERETÉ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
NIT: 800.096.744-5

DE CORAZÓN con la gente

OFICINA ASESORA JURÍDICA
CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA No. 96-44-101172752 **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 21/10/2022

INICIAL: [ ] **MODIFICACION:** [X]

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022.

NIT: No. 901598916-6.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($16.321.717.210,00).

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	(%)	CONDICIONES	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	Por el término del contrato y 6 meses más (hasta la liquidación del contrato).	$1.632.171.721,00	25/07/2022	30/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	$4.896.515.163,00	25/07/2022	30/06/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20%	Por el término del contrato y 3 años más.	$3.264.343.442,00	25/07/2022	31/12/2025

ALCALDÍA DE CERETÉ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
NIT: 800.096.744-5

DE CORAZÓN con la gente

OFICINA ASESORA JURÍDICA
CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

RIESGO	(%)	CONDICIONES	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	Por el término de 5 años, contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo definitivo de obra	$4.896.515.163,00	Por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras.	
Calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	30% del valor del ítem de Calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	Por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras.	$9.557.040,00	25/07/2022	25/07/2027

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes a la modificación de la póliza de Seguro de Cumplimiento No. 96-44-101172752, se aprueba la garantía por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, para el Contrato de Obra No. 104 de fecha de Mayo 31 de 2022, ASEGURADO/BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE CERETÉ NIT: 800096744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS NIT: 800215807-2, de conformidad con la Prórroga No. 01 de fecha 29 de Julio de 2022.

Se aprueba en el Municipio de Cereté, el día 21 de Octubre de 2022.

EVER ENRIQUE DIAZ BEDOYA
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: Lidubina M.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	10	2022	25	07	2022	00:00	31	12	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CONSORCIO CORDOBA 2022** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29 — CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER — TELÉFONO: 3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CERETE** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN: CALLE 12 N 12 37 — CIUDAD: CERETE, CORDOBA — TELÉFONO 7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL TOMADOR CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA POR LESIONES Y/O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 104 DE FECHA 31 DEMAYO DEL 2022, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL.

.

TAMBIEN SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ASEURADOS Y BENEFICIARIO ASI: MUNICIPIO DE CERETE NIT 800.096.744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Nit. No. 800.215.807-2 Y CONSORCIO CORDOBA 2022 NIT 901.598.916-6 Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2022	$816,085,860.50	$816,085,860.50
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2022	$816,085,860.50	$816,085,860.50
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2022	$326,434,344.20	$326,434,344.20

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO A LA PRORROGA No.01 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE PRORROGA LA VIGENCA DE LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,051,744.00	$ *******3,000.00	$ *****200,401.00	$ *********1,255,146.00	$ ******816,085,860.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zaranta R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	10	2022	25	07	2022	00:00	31	12	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO CORDOBA 2022 — **IDENTIFICACIÓN** NIT: 901.598.916-6

DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29 — **CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER — **TELÉFONO:** 3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE — **IDENTIFICACIÓN** NIT: 800.096.744-5

DIRECCIÓN: CALLE 12 N 12 37 — **CIUDAD:** CERETE, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2022	$816,085,860.50	$816,085,860.50
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2022	$326,434,344.20	$326,434,344.20
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2022	$816,085,860.50	$816,085,860.50
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2022	$816,085,860.50	$816,085,860.50
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2022	31/12/2022	$816,085,860.50	$816,085,860.50

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061054	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	10	2022	25	07	2022	00:00	31	12	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO CORDOBA 2022 — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.598.916-6**

DIRECCIÓN: CR 17 B NRO. 62 - 29 — **CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER — **TELÉFONO:** 3185162227

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CERETE — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.096.744-5**

DIRECCIÓN: CALLE 12 N 12 37 — **CIUDAD:** CERETE, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7746037

BENEFICIARIO: 800096744 - MUNICIPIO DE CERETE

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUMAR PERDOMO LUIS JOSE	6640311-3	5.00
CONSTRULATINA S.A.S.	829002616-3	95.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061054

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SHIRLEYRICO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE CERETÉ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
NIT: 800.096.744-5

DE CORAZÓN con la gente

OFICINA ASESORA JURÍDICA

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA No. 96-40-101061054 **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 21/10/2022

INICIAL: [ ] **MODIFICACION:** [x]

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022.

NIT: No. 901598916-6.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($16.321.717.210,00).

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
PREDIOS – LABORES Y OPERACIONES	$816.085.860,50	25/07/2022	31/12/2022
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$816.085.860,50	25/07/2022	31/12/2022
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$326.434.344,20	25/07/2022	31/12/2022
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$816.085.860,50	25/07/2022	31/12/2022
GASTOS MÉDICOS	$326.434.344,20	25/07/2022	31/12/2022
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$816.085.860,50	25/07/2022	31/12/2022
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$816.085.860,50	25/07/2022	31/12/2022
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$816.085.860,50	25/07/2022	31/12/2022

Revisada los amparos y hecha la verificación y análisis correspondientes a la modificación de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-40-101061054, se aprueba la garantía por reunir los requisitos exigidos por el MUNICIPIO DE CERETÉ, para el Contrato de Obra No. 104 de fecha de Mayo 31 de 2022, ASEGURADO/BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE CERETÉ NIT: 800096744-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS NIT: 800215807-2, de conformidad con la Prórroga No. 01 de fecha 29 de Julio de 2022.

Se aprueba en el Municipio de Cereté, el día 21 de Octubre de 2022.

EVER ENRIQUE DIAZ BEDOYA
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: Lidubina M.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA 30/06/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 104-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022

FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 DE JUNIO DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 del 2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ..... **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ..... **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ..... **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA 30/06/2023 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA	GORWIN	SF0992-K	11/07/2022	11/07/2022	10/01/2023	

OBSERVACIONES:

LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PRESENTAN SUS CERTIFICACIONES DE CALIBRACION Y PRESENTAN BUEN ESTADO

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Orlando Isaac Castellon Marrugo
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:13202-120629 BLV

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Leonardo Toro Niño
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE

ESTACION TOTAL

No. ET5782062

Este documento no acredita la propiedad del equipo.

DATOS GENERALES

Fecha Exp: 11-jul-22 **Vence:** 10-ene-23 **Propiedad:** **CONSTRUCTORA TERLUZ S.AS**

Dirección: CC PLACES MALL OF 317 MONTERIA **Tel.** 3116607834 **Id:** 901407951-6

DATOS DEL EQUIPO

Marca: GOWIN **Modelo:** TKS-202 **Serie:** SF0992-K

Lectura angular mínima: 1" **Alcance con un prisma** 2000m **Lugar y fecha Ultimo Trabajo: EQUIPO NUEVO**

Aproximación a distancia: 2 mm+2ppmXD **Aumento del telescopio** 30X

DATOS DEL AJUSTE

Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento al laboratorio y así mismo si requirió alguna corrección en cualquiera de sus partes inspeccionadas:

A: Correcto B: Falla corregida C: No corregida D: No aplica

limpieza exterior	**A**
Mantenimiento	**A**
Base nivelante	**A**
Nivel tubular y esférico	**A**
Ajuste eje vertical y horizontal	**A**
Verticalidad	**A**
Óptica general	**A**
Frenos y tornillos movimientos lentos	**A**
Plomada óptica y laser	**A**
Sistema de compensación electrónica	**A**
Colimación Vertical	**A**
Colimación Horizontal	**A**
Alineación infrarrojo con respecto a retículo	**A**
Teclado	**A**
Display	**A**
Ajuste mirillas de puntería	**A**
Ajuste distanciometro	**A**

AJUSTE CON COLIMADOR

DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Punto 0 compensador	<10"	<10"	Colimación vertical	<10"	<10"
Nivel tubular	<15"	<15"	Verticalidad	<20"	<20"
Nivel circular	<5'	<5'	Plomada óptica o laser	<1mm	<1mm
colimación horizontal	<10"	<10"			

TEMPERATURA Y PRESION ATMOSFERICA.

TEMPRATURA	PRESION
29°C	760MMHG

DATOS OBTENIDOS EN LA INSPECCION INICIAL.

VERTICAL		HORIZONTAL		DISTANCIA	
Etapa 1	90	Etapa 1	0	Etapa 1	21 626
Etapa 2	270°00'15"	Etapa 2	180°00´16"	Etapa 2	21 626
Residuo	0°00'15"	Residuo	0°00´16"	Residuo	0.0002
Tolerancia	(+/-0.0002)	Tolerancia	(+/-0.0002)	Tolerancia	(+/-0.0001)
Patrón	360	Patrón	180	Patrón	21 624
Error	0°00'13"	Error	0°00'14"	Error	0.0001

DATOS OBTENIDOS DESPUES DE LAS CALIBRACION.

VERTICAL		HORIZONTAL		DISTANCIA	
Etapa 1	90	Etapa 1	0	Etapa 1	21 624
Etapa 2	270	Etapa 2	180	Etapa 2	21 624
Residuo	0	Residuo	0	Residuo	0
Tolerancia	(+/-0.0002)	Tolerancia	(+/-0.0002)	Tolerancia	(+/-0.0001)
Patrón	360	Patrón	180	Patrón	21 624
Error	0	Error	0	Error	0

Certificamos que el equipo ha sido verificado y ajustado de acuerdo a las especificaciones técnicas de los manuales del fabricante de esta marca amparado en la NTC-ISO/IEC 17025/10012

Certificamos que el equipo luego de realizadas todas las pruebas, chequeos y ajustes de acuerdo a las normas establecidas según las caracteristicas técnicas para estos instrumentos se encuentran en óptimas condiciones de trabajo, pero no eximen al

PATRONES UTILIZADOS: (TEODOLITO OPTOMECANICO FOIF J2-2 No. SERIAL:117579 Y UN NIVEL AUTOMATICO FOIF DSZ2 SERIAL: 314441)

APROBÓ

Maale

ING. MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO

ESPECIALISTA EN INGENIERIA Y GESTION DE CALIDAD

T.P. 0822 8137947 ATL

ELABORÓ

DUVAN FELIPE MONTERO PABON

TECNICO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

NIT: 901.039.489-5
Calle 79B No.42-352 Piso 2
Barranquilla-Colombia
Cel.3176606492

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre FRANKLIN MARCELO PAZOS PAZOS

Cédula: **98,400,053**

Licencia Profesional No: **01-13785**

Resolución: **02-3786 - 26/07/2012**

* Experiencia o fecha de grado: **30/03/2001**

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
CESMAG - PASTO



Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución Motivada y el Certificado de Vigencia
la documentación integral acredita al titular para ejercer la profesión
de TOPÓGRAFO en la República de Colombia de acuerdo a la
Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

***La experiencia se contará a partir de la fecha de grado para Los efectos de posesión de cargos públicos únicamente.**

RUTH ELENA ACUÑA AGUDELO
PRESIDENTE

HENRY ISAIAS CARRILLO RODRIGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Email: info@cpnt.org. calle 33 No.7-27 Of.502 Tel:2881490

Topoequipos sa
soluciones integrales en geomática

Calle 62 No. 37-42 Bogotá Colombia
http://www.topoequipos.com
comercial@topoequipos.com
(601) 338 1226 – (601) 531 9839

Empresa líder a nivel nacional en Topografía - Geomática desde el 1 de febrero de 1982

Bogotá D.C 07 de febrero de 2023 No. 1741

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ESTACIÓN TOTAL

Equipo: Estación Marca: South REF: N6+ Serial: S164348

Cliente: CONSTRUCTORA TERLUZ SAS Dirección: CC plazas centro comercial de 317 cl 6 65-24
Teléfono: Celular: 3202528767
NIT: 901407951-6 Email: hgarzong@euroconsult.es

La revisión y calibración se efectúa siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos
DIAGNOSTICO Y AJUSTE

Base nivelante	6	Lente interno	6
Tornillos nivelantes	6	Base del retículo	6
Movimiento horizontal	6	Retículo	6
Movimiento vertical	6	Objetivo	6
Displays	6	Teclados	6
Plomada Láser	6	Verticalidad	6
Plomada óptica	N/A	Compensador	6
Nivel circular	6	Batería	6
Nivel tubular	6	Cargador	N/A

1.Cambio de grasas 2.Ajuste 3. Limpieza 4. Reparación 5.Cambio 6.En buen estado (O.K)
Otros:

Parámetro o componente	**Error permitido**	**Ajuste**
Plomada óptica o láser	1mm o menos	Si _____ no __x__
Nivel tubular	¼ o menos de los limites Extremos de la escala de nivel	Si _____ no __x__
Nivel del circular	1/3 o menos de la escala del nivel	Si _____ no __x__
Perpendicularidad de la línea de la Plomada	10” o menos	Si _____ no __x__
Doble Centrado	10” o menos	Si _____ no __x__
Mira de colimación	20´	Si _____ no __x__
Excentricidad entre el standard y el circulo de vertical	10” o menos	Si _____ no __x__
Posición de instalación del circulo	+ o – 3 grados desde el “o”	Si _____ no __x__
Vertical Compensador	Posición Punto cero + o – 3” exactitud + 00.03´00”	Si _____ no __x__

Topoequipos sa
soluciones integrales en geomática

Calle 62 No. 37-42 Bogotá Colombia
http://www.topoequipos.com
comercial@topoequipos.com
(601) 338 1226 – (601) 531 9839

Empresa líder a nivel nacional en Topografía - Geomática desde el 1 de febrero de 1982

TEST DE EXACTITUD ANGULO HORIZONTAL

Error antes de la calibración ángulo Horizontal: 10”

Referencia	**A**
P1	00.00´00”
P2	180.00´00”
Error	00.00´00”

TEST DE EXACTITUD ANGULO VERTICAL

Error antes de la calibración ángulo Vertical: 15”

P1	90.00´00”
P2	270.00´00”
Error	00.00´00”

Error máximo permitido 10” respectivamente

TEST DE EXACTITUD DEL DISTANCIOMETRO

Pista patrón (m)	M1	M2	M3	M4	M5	Promedio	Error	Ajuste	Distancia final
5.080	5.079	5.079	5.079	5.079	5.079	5.079	1mm	---------	5.079

Tolerancia permitida: +/- (2mm + 2ppm)
Patrón utilizado: Colimador marca South LF-3C y pistas patronadas
Nota: Este equipo es nuevo y sale en óptimas condiciones operativas y de funcionamiento.

La validez de este certificado es de 6 meses a partir de la fecha de expedición
Fecha de Caducidad: Agosto 07 de 2023

BELSY PULIDO LOZANO
VICEPRESIDENTE COMERCIAL

EXPERIENCIA 40 AÑOS EXPERIENCIA

INGEMANCA S.A.S.

Aliado en tus proyectos

CERTIFICADO N°3881

Fecha de calibración: 12-05-2023
Próxima revisión sugerida: 11-11-2023

NIVEL DE PRECISION

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION

DATOS GENERALES

Propiedad: PERDRO LUIS LICONA	NIT/CC: 1067870062
TELEFONO: 3013253904	DIRECCION: CALLE 45 No.18A80

DATOS DEL EQUIPO

NIVEL DE PRECISION	MARCA EQUIPO: FOIF	MODELO EQUIPO: DSZ3	SERIAL: 168823
DESVIACION ESTANDAR: 2.0 mm	MINIMA DISTANCIA FOCAL: 20 mm	RELACION DE ESTADIA: 10	MAGNIFICACION: 24X
APERTURA DEL OBJETO: 32 mm	EXACTITUD COMPENSADOR: 0.5	RANGO DEL COMPENSADOR: +/- 15	TIPO DE IMAGEN: DIRECTA

Los resultados de este certificado solo están relacionados con el equipo ajustado en el momento y en las condiciones en las cuales se realizaron las mediciones.

INGEMANCA SAS no se hace responsable de los daños que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una errónea interpretación de los resultados del ajuste aquí declarados.

Es responsabilidad del usuario hacer chequeos al instrumento en períodos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base en las características del trabajo y el tiempo de uso del instrumento.

PROCEDIMIENTO EMPLEADO

Procedimiento de Ajuste de equipos de medición de dirección horizontal, ángulo vertical y Distancia.

El Ajuste se realiza mediante el análisis de la precisión del equipo con respecto a varios puntos enfocados al infinito en tubos colimadores (según norma ISO 17123-2), y del análisis de la exactitud con respecto al concepto geométrico de la vuelta de campana sobre un mismo punto establecido enfocado al infinito en un tubo colimador. El Distanciometro se evalúa con la precisión y exactitud de la medición comparativa de una estación total patrón.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales de temperatura y humedad referente, son registradas en el laboratorio al inicio y final del ajuste del equipo con un termohigrómetro.

TEMPERATURA AMBIENTE INICIAL: 24.2 °C	TEMPERATURA AMBIENTE FINAL: 24.2 °C
HUMEDAD RELATIVA INICIAL: 49.2 %HR	HUMEDAD RELATIVA FINAL: 52.9 %HR

INGEMANCA S.A.S.

Aliado en tus proyectos

CERTIFICADO N°3881

Fecha de calibración: 12-05-2023
Próxima revisión sugerida: 11-11-2023

VALORACION DE LA INCERTIDUMBRE

La Incertidumbre adquirida en los resultados del ajuste corresponden a la Incertidumbre Expandida con un coeficiente de cobertura K=2, para un nivel de confianza del 95,01%.
No considerándose la estabilidad del instrumento a más largo plazo.
Para la valoración de la incertidumbre se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: la desviación estándar de los datos en la prueba de precisión, la división de escala del equipo y la resolución de retículo del tubo del colimador.

TRAZABILIDAD

El laboratorio afirma la trazabilidad de las mediciones y de sus patrones al sistema internacional de unidades SI, por medio del ajuste de sus equipos a intervalos precisos con laboratorios externos.

EQUIPO: ESTACION TOTAL	MARCA: GEOMAX	MODELO: ZIPP 10R PRO
SERIE: 2103828	FECHA CALIBRACION: 19/02/2020	
LABORATORIO DE CALIBRACION: SENA LACET	CERTIFICADO DE CALIBRACION: CAL-2020-0005	

EQUIPO: NIVEL PRECISION	MARCA: GEOMAX	MODELO: ZAL132
SERIE: 303507	FECHA CALIBRACION: 19/02/2020	
LABORATORIO DE CALIBRACION: SENA LACET	CERTIFICADO DE CALIBRACION: CAL-2020-0004	

EQUIPO: FIVE TUBES COLLIMATOR	MARCA: SUNWAY	MODELO: W550-5
SERIE: 1130	FECHA CALIBRACION: 20/11/2019	

Este certificado se Emite de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y Su trazabilidad.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin el consentimiento por escrito del laboratorio que lo expida.

INSPECCION OPTOMECANICA

BASE NIVELANTE:	PERFECTO ESTADO
HORIZONTABILIDAD:	PERFECTO ESTADO
OPTICA GENERAL:	PERFECTO ESTADO
MOVIMIENTO TANGENCIAL:	PERFECTO ESTADO
NIVELES TUBULARES Y ESFERICOS:	PERFECTO ESTADO

INGEMANCA S.A.S.

Aliado en tus proyectos

CERTIFICADO N°3881

Fecha de calibración: 12-05-2023
Próxima revisión sugerida: 11-11-2023

INSPECCION SISTEMA ANGULAR COLIMADORES DE 5 TUBOS MODELO DEL EQUIPO W550-5

COMPENSADOR ELECTRONICO:	VERIFICADO Y AJUSTADO
COMPENSADOR OPTICO MECANICO:	VERIFICADO Y AJUSTADO
HORIZONTABILIDAD DE RETICULA:	VERIFICADO Y AJUSTADO
LOS COMPENSADOR ESTAN EN OPTIMAS CONDICIONES	

L1:			L2			ERROR:
T1	T2	T1-T2	T1	T2	T1-T2	L1-L2
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm
402 mm	393 mm	9 mm	500 mm	491 mm	9 mm	0 mm
					SUMA	**0 mm**
					PROMEDIO	**0 mm**
					DESVIACION	**0 mm**
					VARIANZA	**0 mm**

INGEMANCA S.A.S certifica que el instrumento y sus accesorios se entregan en óptimas condiciones de funcionamiento y los errores encontrados al ingreso del equipo han sido corregidos de acuerdo con los parámetros de tolerancia establecidos por el fabricante, pero no exime al operador de efectuar controles periódicos.

Es importante aclarar que este documento por sí solo, no es una fuente confiable para corroborar la veracidad del certificado; es por ello que INGEMANCA S.A.S le ofrece al interesado la posibilidad de verificarlo, ingresando al QR.

LIBARDO ÁLVAREZ

TECNICO DE INGEMANCA S.A.S.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETE
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 1 DE 1

FECHA 31 (Día) 7 (Mes) 2022 (Año)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETE — SECRETARÍA DE PLANEACION MUNICIPAL — PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X) — REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ___ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 104-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.

CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2022 — **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276-2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI 3B

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/07/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 16,321,717,210.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 16,321,717,210.00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 Julio de 2022	2 Agosto de 2022	3 Septiembre de 2022	4 Octubre de 2022	5 Noviembre de 2022	6 Diciembre de 2022	7 Enero de 2023	8 Febrero de 2023	9 Marzo de 2023	10 Abril de 2023	11 Mayo de 2023	12 Junio de 2023	
I. EXPLANACIONES	$ 632,336,442.01	3.90%	0.00%	% P	0.03%	0.12%	0.11%	0.11%	1.41%	2.13%							
				$ P	$ 4,167,913.16	$ 16,755,609.24	$ 18,060,957.05	$ 17,057,570.55	$ 228,284,038.17	$ 346,000,353.84							
				$ E													
				% E													
II. ESTRUTURA PAVIMENTO RIGIDO	$ 13,954,348,647.00	86.00%	0.00%	% P		1.54%	1.99%	1.71%	10.70%	70.05%							
				$ P		$ 249,723,978.24	$ 323,560,503.89	$ 278,213,428.87	$ 1,736,935,929.73	$ 11,365,914,805.27							
				$ E													
				% E													
III. TRANSPORTE	$ 1,265,518,558.00	7.80%	0.00%	% P	0.06%	0.26%	0.27%	0.26%	2.77%	4.15%							
				$ P	$ 10,255,797.62	$ 46,151,089.30	$ 44,441,789.70	$ 41,972,801.38	$ 449,651,636.63	$ 673,045,443.37							
				$ E													
				% E													
IV. ESTRUCTURAS DE DRENAJE	$ 176,509,816.00	1.09%	0.00%	% P					0.12%	0.97%							
				$ P					$ 19,097,179.02	$ 157,417,636.98							
				$ E													
				% E													
V. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	$ 191,866,419.00	1.18%	0.00%	% P						1.18%							
				$ P						$ 191,866,419.00							
				$ E													
				% E													
VI. CARACTERIZACION VIAL	$ 5,376,000.00	0.03%	0.00%	% P						0.03%							
				$ P						$ 5,376,000.00							
				$ E													
				% E													
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 16,225,955,882.01	100%	0.00%														
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.09%	1.24%	3.38%	2.08%	15.00%	78.51%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$14,423,711	$214,630,678	$580,663,251	$337,243,801	$2,433,873,784	$12,739,626,658					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.09%	1.33%	4.71%	6.79%	21.79%	100.00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$14,423,711	$229,054,389	$719,117,639	$1,052,361,440	$3,486,235,224	$16,225,955,882					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$0
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$0
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$31,856,800
IVA – REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$6,052,792
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$0
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$57,851,736
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$95,761,328
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$16,321,717,210**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE GRÁFICO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **ANDRES PICO GUERRERO**
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO CORDOBA 2022

Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Director de Interventoria
CONSORCIO ACI 3B

Aprueba Firma
Nombre: SUGHEIDY MONTIEL PATIÑO
Secretaria de planeacion e infraestrutura - Cereté
Matrícula No.:

ALCALDÍA DE CERETÉ

República de Colombia

MUNICIPIO DE CERETE
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 800096744

DE CORAZÓN con la gente

VERSIÓN	1			
PÁGINA	1	DE	1	
FECHA	22	9	2022	

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE CERETE

DATOS GENERALES

CONTRATO I 104 **DE** 2022 **PLAN INICIAL** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐

OBJETO DEL CONTRATO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI - 3B
SUPERVISOR DE CONTRATO:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAZO:	POR DEFINIR
PRESUPUESTO:	$16.321.717.210,00
ANTICIPO 30%	$4.896.515.163,00

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se debe invertir en forma directa y de manera de inequívoca en el objeto contractual con sujeción a este plan de manejo e inversión.

No.	DESCRIPCIÓN	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR TOTAL	%
1	Movimiento de tierra y suministro de agregados	$ 500.000.000,00	$ 200.000.000,00					$ 700.000.000,00	14,3%
2	Compra de Materiales	$ 1.000.000.000,00	$ 550.000.000,00					$ 1.550.000.000,00	31,7%
3	Obras en concreto Hidraulico para estructuras y suministro e instalacion de pavimento	$ 1.550.000.000,00	$ 1.096.515.163,00					$ 2.646.515.163,00	54,05%
	TOTAL	**$ 3.050.000.000,00**	**$ 1.846.515.163,00**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.896.515.163,00**	**100,00%**


NOTAS:


a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

b) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15 %) del anticipo para compra de equipo y respuestos

(Firma)
Contratista:ANDRES ALBERTO PICO GUERRERO
CONSORCIO CORDOBA 2022
Contratista

(Firma)
Interventoria:MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
CONSORCIO CORDOBA 2022
Director de interventoria

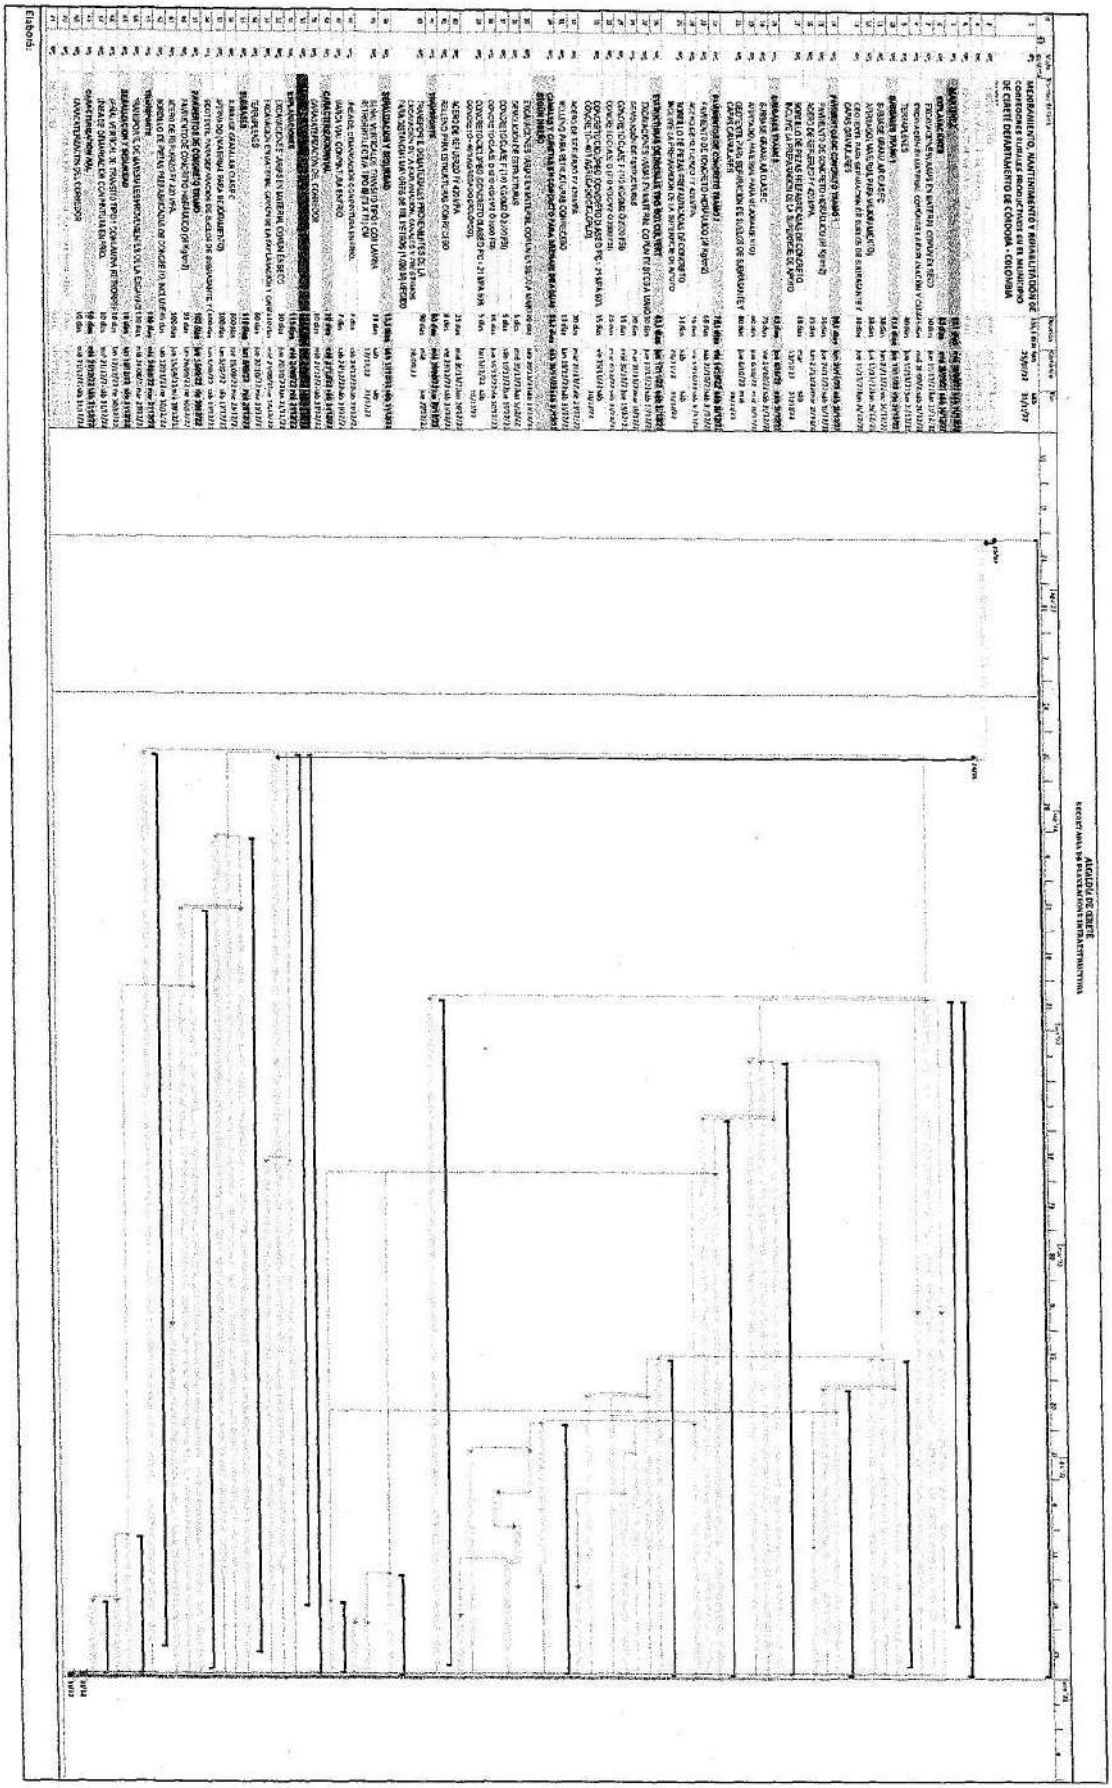

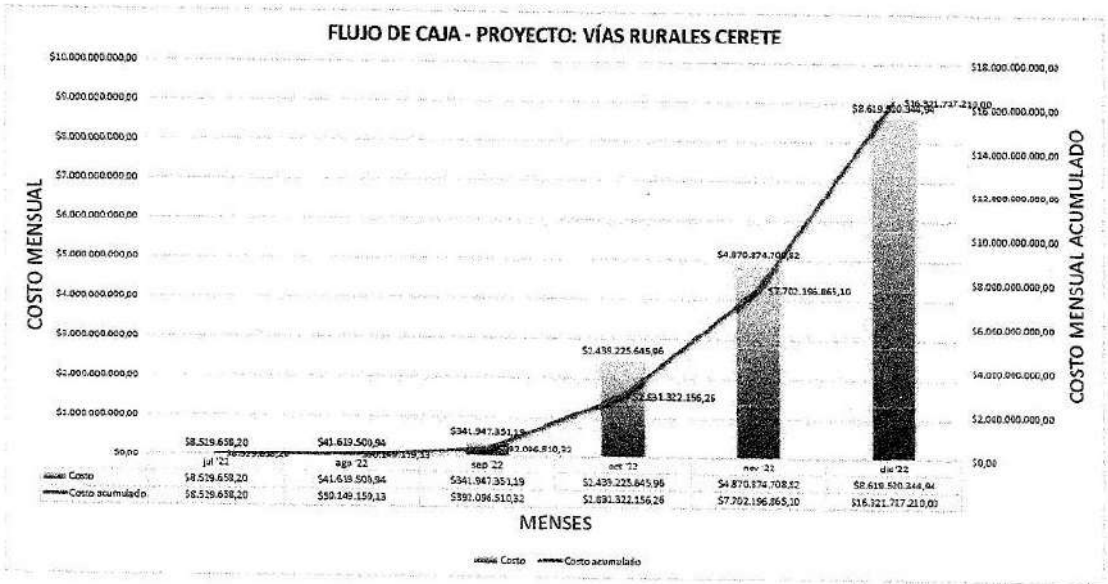

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión Mensual	$ 8.529.658,20	$ 41.619.500,94	$ 341.947.351,19	$ 2.439.225.645,96	$ 4.870.874.708,82	$ 8.619.520.344,94
Inversión Acumulada	$ 8.529.658,20	$ 50.149.159,14	$ 392.096.510,33	$ 2.831.322.156,29	$ 7.702.196.865,11	$ 16.321.717.210
% Avance MES	0,05%	0,25%	2,10%	14,94%	29,84%	52,81%
% Avance ACUM	0,05%	0,31%	2,40%	17,35%	47,19%	100,00%

Vr. Contrato $ 16.321.717.210,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 21/06/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 104 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega de aprobación de estudios y diseños de los Box Culvert de Media Tapa	martes, 13 de junio de 2023	NO CUMPLIÓ
Plan de trabajo obras hidráulicas (Media Tapa)	miércoles, 14 de junio de 2023	CUMPLIÓ
Inicio de actividades de Instalación de señalización y demarcación	Según programación contratista	CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

Observaciones del área SST, ambiental y social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 3

FECHA: 21/06/2023 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director de interventoría inicia revisando los compromisos pactados en el comité de obra anterior que se realizó en la Alcaldía Municipal de Cereté.

El ingeniero director de interventoría realiza las siguientes observaciones:
Programado del 88,64%, ejecutado 36,93% y atraso del 51,71%.

El contratista se ha visto afectado debido a las constantes lluvias que se han presentado en la zona, en los frentes de Martinez el nivel freático está muy superficial, el director de interventoría indica que se debe evaluar la posibilidad de utilizar geotextil para poder instalar la subbase y poder fundir los tramo en cuestión.

Se presenta el problema en el descargue de las aguas del sector del 20 de julio, no se han terminado de otorgar los permisos para dirigir esas aguas. La comunidad pide que se inicie la pavimentación porque cuando llueve las calles se vuelven intransitables, pero el contratista indica que no se ha podido avanzar debido a las mismas lluvias.

Se le solicita al contratista iniciar con el sello de juntas en los tramos que ya están pavimentados sectores T4, T5 y Media Tapa.

La inspectora SST de la interventoría indica que se están tardando mucho en la entrega de la planilla de seguridad social y que se tenga en cuenta el uso de la dotación.

La profesional ambiental de la interventoría presenta observaciones en los informes mensuales que se le envían debido a que indican que no se ejecutan actividades en obra lo cual no es coherente porque si se están realizando, se le solicita prestar atención a esto y corregirlos.

La profesional social solicita al contratista la entrega del formato de inclusión social cuando envíen el informe del mes de junio. También indica que se debe realizar una capacitación sobre seguridad vial en la zona del colegio Alberto Saibis antes de que los niños entren nuevamente a clases.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

FECHA: 21/06/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de aprobación de estudios y diseños de los Box Culvert de Media Tapa		
Plan de trabajo obras hidráulicas (Media Tapa)	miércoles, 21 de junio de 2023	Contratista
Sello de juntas en T4, T5 y Media Tapa	martes, 4 de julio de 2023	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEONARDO TORO	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
LINA RAMOS	INGENIERA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
CLAUDIA BENITEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO ACI - 3B	
KATHERINE LOPESIERRA	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO ACI - 3B	
MARIA TEHERÁN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	
CESAR HERNANDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO CÓRDOBA 2022	
DIONICIO RICARDO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	ALCALDÍA DE CERETÉ	
PILAR PUCHE	SUPERVISORA DEL CONTRATO	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ALCALDÍA DE CERETÉ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
NIT: 800.096.744-5

DE CORAZÓN con la gente

ACTA COMITÉ DE OBRA
FECHA: 9 DE JUNIO DE 2023
CERETE – CORDOBA

DEPARTAMENTO: CORDOBA / MUNICIPIO: CERETE

FECHA: 09 DE JUNIO DE 2023

HORA: 9:43 A.M.

LUGAR: OFICINA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO:

SEGUIMIENTO TECNICO AL contrato de obra 104 de 2022, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIÓN DE LOS CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

ASISTENTES: ( ) LISTA DE ASISTENTES ADJUNTA. ( ) FOLIOS

ORDEN DEL DIA:

	TEMA	RESPONSABLE
1	REVISION DE COMPROMISOS	INTERVENTORIA
2	TEMAS VARIOS	

1/3

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. Teniendo en cuenta el compromiso adquirido en el comité anterior sobre la presentación del Balance de obra No. 1, Se cumplió y se suscribió el balance de obra No. 1, sin embargo, se hacer énfasis en que este balance es susceptible a cambios de acuerdo con las realidades en campo.

2. En el tramo de 20 de julio, actualmente se vienen presentado lluvias repetitivas que han afectado el correcto desarrollo de las actividades, debido a que el terreno de este frente es un material de propiedades negativas que dificulta la maniobrabilidad cuando se encuentra expuesta a las lluvias, por tal razón el contratista informa que el rendimiento de estas actividades es muy bajo.

3. Plan de trabajo obras hidráulicas (media tapa), este compromiso sigue sin cumplirse, se insta al contratista a entregar a la mayor brevedad.

4. Se reitera la necesidad de:

- **Realizar sello de Jutas:** se reitera al contratista la necesidad de realizar el sello de juntas a la mayor brevedad.

  Teniendo en cuenta que ya se inició la temporada invernal y debe garantizarse la estabilidad de la estructura de pavimento.

  Se dio de inicio de la ejecución de actividad relacionada con la instalación de bordillo, de la siguiente manera:

  Frente de Chuchurubi: se inició el suministro de bordillos y las excavaciones el día 6 de junio.

  Frente de media tapa: se programa iniciar el suministro de bordillos para el 13 de junio y el día 20 de junio se iniciará la instalación.

- Se solicita a la interventoría allegar a la entidad contratante la aprobación de los estudios y diseños y la verificación de la pertinencia de los box coulverts construidos en el tramo de media tapa, con el fin de validar y verificar la pertinencia y funcionalidad de los mismos – este compromiso debe ser cumplido por la interventoría a la mayor brevedad.

2/3

Powered by CamScanner

- Instalación de señalización y demarcación: se sugiere realizar esta actividad en los tramos que ya se encuentran completos, con el fin de realizar entregas de tramos terminados.

COMPROMISOS

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entrega de aprobación de estudios y diseños de los box coulver de media tapa.	Contratista Fecha de cumplimiento: 13-06-2023
2	Plan de trabajo obras hidráulicas (media tapa).	Contratista Fecha de cumplimiento: 14-06-2023
3	Inicio de actividades de Instalación de señalización y demarcación	Contratista Fecha de cumplimiento: Según programación del contratista

SE CUMPLIO EL OBJETIVO: SI __X__ NO_____

Los asistentes a dicha reunión están de acuerdo con los compromisos adquiridos en esta acta y manifiestan su buena voluntad de ejecutar las actividades estipuladas en ella.

ASISTENTE.

NOMBRE Y APELLIDO	Nº DE IDENTIFICACION	FIRMA
Oscar Hernandez	1537015	
Gibardo Arteaga H.	78.077.318.	
Pilar Puche Pero	38.117.130	
Division D. Burgos	78.017.406	
Leonardo Toro Niño	84253.792	
Katia Ramos	1063162789	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/06/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 104 DE 2022, CONVENIO 924-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CÓRDOBA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento contractual Convenio 924 - 2021

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Verificación compromisos reunión anterior.

Gestión social y ambiental (PAGA, SOCIALIZACIÓN, VEEDURÍAS, VALLA)

Avance de obra

Temas varios

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28/06/2023
	(Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El presente comité de seguimiento inicia con la lectura y verificación de los compromisos pactados en la anterior reunión.

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR

Plan de construcción obras hidráulicos	viernes, 2 de junio de 2023	CUMPLIÓ
Inicio de instalación de bordillos	lunes, 12 de junio de 2023	CUMPLIÓ
Acercamiento para permisos prediales en los tramos T12 y T13, por parte de alcaldía	viernes, 2 de junio de 2023	NO CUMPLIÓ
Apertura de otros frentes de trabajo	lunes, 19 de junio de 2023	CUMPLIÓ PARCIALMENTE.

AVANCE DE OBRA

El proyecto presenta un porcentaje de obra programado del 94,32%, porcentaje de obra ejecutado de 39%, con un atraso de 56,59%.

El supervisor por parte de Invias y la Alcaldía Municipal solicitan al contratista nuevamente abrir más frentes de trabajo con un nuevo banco de maquinaria operativa para poder mejorar los rendimientos y poder cumplir con la meta del proyecto en el tiempo estipulado.

No se han otorgado los permisos prediales en los tramos T12, T13 y 20 de julio, esto está a cargo del Secretario de Planeación del Municipio que debe hacer la gestión para proceder en la intervención de estos tramos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	28/06/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Inicio construcción obras hidráulicos en Media Tapa	sábado, 15 de julio de 2023	Contratista
Acercamiento para permisos prediales en los tramos T12, T13 y 20 de julio por parte de alcaldía	sábado, 15 de julio de 2023	Alcaldía Municipal
Apertura de otros frentes de trabajo	lunes, 24 de julio de 2023	Contratista




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Lemus Villadiego	Supervisor contrato de interventoria	INVIAS	
Leonardo Toro	Director de Interventoría	Consorcio ACI - 3B	
Cesar Hernandez	Representante Legal	Consorcio Córdoba 2022	
Dionisio Ricardo Doria	Secretario Planeación Municipal	Alcaldía Municipal de Cereté	
Pilar Puche	Apoyo a la Supervisión	Alcaldía Municipal de Cereté	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30-jun-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ACI-3B

CONTRATO DE OBRA No. 172-180-181 DE 2021, 001 DE 2022 **CONTRATISTA:** ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIOEYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CAMIONETA	CAMIONETA DOBLE CABINA, PLACA JLP - 991, MARCA CHEVROLET-DMAX, CILINDRAJE 2500, MODELO 2020	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
ESTACIÓN PARA TOPOGRAFÍA	MARCA SOKKIA SET 6 SERIE D22852	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
NIVEL	MARCA TOPCOM, MODELO AT-B4, SERIE MZ 9945	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	MARCA AKT ENDURO, PLACA ASX-48G, CILINDRAJE 200, MODELO 2022	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	PLACA - VXI-8F	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	PLACA - MTI-73F	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	PLACA - WZK-74E	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	PLACA - WKD-48F	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
MAQUINA ENSAYOS A LA COMPRESIÓN	MARCA RYR, MODELO SG-BM, SERIE 162070	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
DIAL ANALOGO BAKER	MARCA BAKER, MODELO ANALOGO, SERIE UDD996, UTK308	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
HUMEDOMETRO TIPO SPEEDY PINZUAR	MARCA PINZUAR, MODELO TYPE D1	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
BALANZA DIGITAL TRUMAX	MARCA TRUMAX, MODELO MIX-A, YS 202725	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30-jun-23 (Día / Mes / Año)

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: Mantenimiento vehículo: 163.195 km

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.



Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS



Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula No. :22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30-jun-23 (Día / Mes / Año)

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: Mantenimiento vehículo: 163.195 km

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.



Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. :22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONTRATO INVIAS 2276 DE 2021
SOPORTE ACTAS DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO ACI - 3B

SOPORTES VEHICULOS

CONSORCIO ACI - 3B

Bogotá, 05 de Julio de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ACI - 3B
NIT 901.551.292-6

LA SUMA DE: $ 4.960.000.oo

POR CONCEPTO ALQUILER DE VEHICULO, para el contrato 2276 de 2021 que tiene por objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4.

Período de ejecución: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.



LEONARDO TORO NIÑO
REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO

CONSORCIO ACI - 3B

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4

Camioneta o campero de más de 2.000 c.c. (incluye peajes y combustible)
JUNIO DE 2023

				DEDICACIÓN				
No.	ALQUILER DE CAMIONETA	VALOR	PLACA	INGRESO	INICIO	FIN	DÍAS	TOTAL
1	CHEVROLET DMAX 2020	$ 4.960.000,00	JLP991	14/02/2022	1/06/2023	30/06/2023	30,00	$ 4.960.000,00
2								$ -
	TOTAL COSTO VEHÍCULO							$ 4.960.000,00
	TARIFA CONTRACTUAL (por vehículo)							$ 4.960.000,00
	CANTIDAD TOTAL							1,00
	TOTAL A FACTURAR VEHÍCULO							$ 4.960.000,00

Información general del vehículo

MARCA:	**CHEVROLET**	LÍNEA:	**DMAX**
MODELO:	**2020**	COLOR:	**PLATA ESCUNA**
NÚMERO DE SERIE:	**8LBETF3W2L0003700**	NÚMERO DE MOTOR:	**UJ0522**
NÚMERO DE CHASIS:	**8LBETF3W2L0003700**	NÚMERO DE VIN:	**8LBETF3W2L0003700**
CILINDRAJE:	**2500**	TIPO DE CARROCERÍA:	**DOBLE CABINA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**DIESEL**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**03/03/2020**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**SDM - BOGOTA D.C.**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**4**

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2022-08-24	2022-08-28	2023-08-27

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
10458500008090	JLP991	CAMPEROS O CAMIONET	PARTICULAR	2500	2020

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICUL	CARROCERÍA
5	CHEVROLET	DMAX	DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
UJ0522	8LBETF3W2L0003700	8LBETF3W2L0003700	0.70

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BBVA COLOMBIA SA	3112810838	NIT	8600030201	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	11	977092	0	BOGOTA D.C

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 512200	$ 266300	$ 1900

TOTAL A PAGAR

$ 780400

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

Como consumidor financiero obrando a nombre propio o de un tercero debidamente facultado para ello, autorizo de manera previa, expresa e informada a SEGUROS DEL ESTADO S.A Y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. (las Aseguradoras) para que mis datos personales y sensibles sean tratados con las siguientes finalidades:

a) La gestión y ejecución integral del contrato de seguros al vincularme como cliente; hacer transferencia nacional o internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio.

b) Recibir, procesar y compartir mi información con su grupo empresarial, filiales o subsidiarias, centrales de riesgo, proveedores, intermediarios de Seguros, canales de comercialización y otros encargados del tratamiento que resulten necesarios para la celebración, ejecución o extinción de seguros, estadísticas y/o solicitud o reporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, financieras o crediticias a centrales de información y de riesgos.

c) Para las demás contempladas en las disposiciones legales vigentes y en la política de Tratamiento de Datos de las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, beneficios, ofertas de productos, incluida su prórroga, recordar el vencimiento de la póliza, renovación o modificación, fines comerciales y para ser contactado directamente o a través de sus canales de comercialización.

Será facultativa la autorización de las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles o de menores de edad. Como Titular de mis datos personales tengo derecho a conocerlos, actualizarlos, revocarlos, y solicitar la supresión cuando proceda, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Datos publicadas en las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com Los responsables del tratamiento de sus datos son las ASEGURADORAS.

El Titular podrá ejercer sus derechos a través de cualquiera de los canales establecidos para tal fin, como lo son:
- Oficinas de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional
- Sitio web: A través de las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com
- Contáctenos. Correo electrónico: info@segurosdelestado.com

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020419557

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JLP991	CHEVROLET	DMAX	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.500	PLATA ESCUNA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	700 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
UJ0522	N	8LBETF3W2L0003700

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8LBETF3W2L0003700	N	8LBETF3W2L0003700	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CO

IDENTIFICACIÓN
NIT 860003020

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
882020000011657

I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	10/02/2020	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
03/03/2020	05/03/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SDM - BOGOTA D.C.

LT06002833205


JLP 991

INVERACTIVOS S.A.S

CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS CELEBRADO ENTRE

CONSORCIO ACI-3B E INVERACTIVOS S.A.S.

No. INV- 348-22

CONDICIONES GENERALES

ARRENDADOR:	**INVERACTIVOS S.A.S.**
NIT:	**900.318.273-5**
DOMICILIO:	**BOGOTÁ D.C.**
DIRECCION:	**Carrera 7 156 -10 Piso 31 Torre Krystal**
ARRENDATARIO:	**CONSORCIO ACI-3B**
NIT:	**901.551.292-6**
CENTRO DE COSTO:	**P65**
DOMICILIO:	**BOGOTÁ**
DIRECCIÓN:	**Carrera 7 156 -10 Piso 31 Torre Krystal**
PLAZO:	**9 MESES**
FECHA:	**14 DE FEBRERO DE 2022**
VALOR:	**TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($3.100.000) MÁS IVA, POR CADA VEHÍCULO ALQUILADO DE LA LINEA TOYOTA HILUX.**

EL ARRENDADOR da en arriendo **AL ARRENDATARIO** una (1) Camioneta Toyota Hilux Modelo 2015, para ser usada en el Proyecto **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4" CO P65.** El detalle del o los vehículos quedará registrado en (las) acta (s) de entrega. El valor del canon se liquidará mensualmente de acuerdo a un acta que se hará mensualmente la cual estará autorizada por el ordenador del gasto del proyecto.

Entre las partes, han convenido celebrar un Contrato de Alquiler de Vehículos que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas, por las normas del Derecho Civil, Comercial o las normas supletivas que regulen la materia.

INVERACTIVOS S.A.S

PRIMERA – OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR: a) Proporcionar los vehículos descritos en las condiciones generales, en perfecto estado mecánico y de funcionamiento, b) Suministrar inmediatamente otro vehículo de las mismas condiciones, si por cualquier circunstancia el vehículo que **EL ARRENDADOR** suministró no estuviere mecánicamente apto para prestar el servicio de manera continua. c) Cumplir estrictamente todas las normas y reglamentos de seguridad industrial existentes y que se apliquen al servicio que presta, reguladas en todo por el Código Nacional de Transporte y normas especiales adoptadas por el Ministerio de Transportes o la Secretaría de la Movilidad, las que **EL ARRENDADOR** declara conocer expresamente. d) Entregar **AL ARRENDATARIO** fotocopia auténtica de los documentos que acrediten la propiedad del Vehículo que se alquila, e) Mantener vigente el seguro obligatorio contra lesiones a terceros. f) Mantener vigente el seguro todo riesgo del vehículo. g) Dar aviso a la aseguradora que ampare el riesgo general del vehículo (todo riesgo), sobre la destinación del mismo y la zona en que será arrendado, para lo cual debe allegar la certificación de la aseguradora en la que manifieste conocer el hecho. h) Efectuar a su costa, las reparaciones a que haya lugar para mantener en perfecto estado el vehículo, los lubricantes, repuestos, llantas y mantenimiento general. i) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El vehículo se entregará al **ARRENDATARIO** en la ciudad de Bogotá y el **ARRENDATARIO** deberá devolver dicho vehículo, al finalizar este acuerdo contractual, en la misma ciudad. **SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO:** a) Pagar al **ARRENDADOR** oportunamente el valor pactado. b) Informar al **ARRENDADOR** sobre cualquier daño o accidente que sufra el vehículo. c) Asumir los costos de combustible, peajes y salarios, prestaciones sociales y seguridad social del conductor. d) Mantener un botiquín (que debe contener como mínimo los elementos exigidos por las autoridades que regulan el tránsito y transporte), equipo de carretera y extintor e) Cubrir el 100% de los gastos que se generan por deducibles en caso de reclamación al seguro por daño o pérdida del vehículo. f) En caso de accidente deberá enviarle a **El ARRENDADOR** la información y documentación que se considere necesaria, teniendo en cuenta que la administración de los siniestros es ejecutada por la compañía de seguros de **El ARRENDADOR TERCERA.- RESPONSABILIDADES POR DAÑOS:** a) **El ARRENDATARIO** será responsable y en consecuencia está obligado a cubrir los gastos o pérdida alguna a **EL ARRENDADOR**, en caso de deterioro, daños o hurtos menores que pueda sufrir el vehículo objeto del presente contrato y que no sean cubiertos por la póliza de seguros. B) **EL ARRENDATARIO** no será responsable y en consecuencia no está obligado a cubrir gasto o pérdida alguna a **EL ARRENDADOR**, en caso de deterioro, daño o hurto mayor del vehículo objeto del presente Contrato. **CUARTA.- DURACIÓN**. La duración del contrato se encuentra definida de acuerdo con lo descrito en el plazo del contrato, sin embargo cualquiera de las partes podrá darlo por terminado mediante comunicación escrita, que debe ser recibida por la parte o su representante, con una antelación no menor de cinco (5) días a la fecha en que pretenda darse por terminado el contrato, sin que se genere indemnización alguna a favor de las partes. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El contrato se prorrogará, por un periodo igual al inicialmente pactado, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. **QUINTA.- FORMA DE PAGO. EL ARRENDATARIO** se obliga a pagar el valor del alquiler de los vehículos con previa presentación de la cuenta de cobro o factura respectiva, que cumpla con todas las exigencias legales para hacerla valer y recibo a satisfacción del servicio por el supervisor del contrato, en la que se defina el número de vehículos y el tiempo en días de servicio para cada caso. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para el efecto la factura o cuenta de cobro debe ser presentada dentro del

INVERACTIVOS S.A.S

mismo mes de la prestación del servicio, si hay lugar a alguna observación y/o cambio del periodo proyectado, este ajuste se realizara el siguiente mes, los pagos se realizarán 30 días calendario posterior a la radicación de la factura o cuenta de cobro con todos los soportes necesarios. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Cuando el servicio no sea prestado efectivamente, convienen las partes en que se prorrateé el valor mensual acordado y se descuenten los días en que no se preste el servicio efectivamente. **SEXTA. INCUMPLIMIENTO**. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en este Contrato, **EL ARRENDATARIO** podrá darlo por terminado inmediatamente **AL ARRENDADOR** sin que medie indemnización alguna y sin necesidad de requerimiento alguno, con el solo aviso por escrito. **SÉPTIMA. GARANTÍAS. El ARRENDADOR** tomará con una compañia de seguros debidamente establecida en Colombia, un seguro de todo riesgo a favor de **EL ARRENDADOR. PARÁGRAFO PRIMERO:** El **ARRENDADOR** se compromete a mantener vigente el seguro durante toda la ejecución del contrato y su incumplimiento acarreará la responsabilidad individual a su cargo. Además se comprometerá a no revocar sin el consentimiento del **ARRENDATARIO**. **PARAGRAFO SEGUNDO:** La garantía todo riesgo que se constituya, deberá contener por lo menos los siguientes amparos correspondientes a la responsabilidad civil extracontractual: 1. Por daños a bienes de terceros SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000) M/CTE. 2. Por muerte o lesión a una persona SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000) M/CTE. 3. Por muerte o lesión a dos o más personas MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) M/CTE. **OCTAVA. GASTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO.** Los gastos que represente la legalización del presente Contrato, incluidos el impuesto de timbre, serán a cargo de **EL ARRENDADOR. NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL**. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá. De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2022.

ARRENDADOR
SANDRA PATRICIA BARRERO U.
Representante Legal
INVERACTIVOS S.A.S

ARRENDATARIO
Representante Legal
CONSORCIO ACI-3B

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que DARIO ENRIQUE CANTERO MENDOZA identificado(a) con CC 15645442 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,160,000	$185,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,160,000	$80,800
CCF	COMFACOR	30	4%	$1,160,000	$46,400
EPS	MUTUAL SER	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPL-MN-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	30-jun-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2023 **PROYECTO:** P65: INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE OBRA No: 172-180-181 DE 2021, 001 DE 2022 **CONTRATISTA:** ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIOEYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes																												% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Leonardo Toro Niño	88.253.792	Director de Interventoría	$ 6.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	ACI	$ 3.250.000	$ 226.200	V	SANITAS	9442335840	$ 130.000	PORVENIR	1736939109	$ 520.000	$ 130.000			
2	Carmelina Rosa Oviedo Ramos	30.581.482	Ingeniero Residente de Interventoría - El Cedro	$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	ACI	$ 4.600.000	$ 288.200	V	NUEVA EPS	9442335840	$ 182.000	PORVENIR	1736939109	$ 727.900	$ 177.900	$ -	$ -	
3	Carlos Milan Carvajal Pinto	1.047.387.270	Ingeniero Residente de Interventoría - Martinez	$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	ACI	$ 4.600.000	$ 320.200	V	SANITAS	9442335840	$ 184.000	COLPENSIONES	1736939109	$ 736.000	$ 184.000	$ -	$ -	
4	Libardo Arteaga Hernandez	78.077.318	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	ACI	$ 4.600.000	$ 320.200	V	NUEVA EPS	9442335840	$ 184.000	PROTECCION	1736939109	$ 736.000	$ 184.000	$ -	$ -	
5	Nohemi Sofia Padron Torres	1.065.004.889	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	ACI	$ 4.600.000	$ 202.800	V	NUEVA EPS	9442335840	$ 116.600	PORVENIR	1736939109	$ 466.200	$ 116.600	$ -	$ -	
6	Said Mauricio Soto Martinez	1.071.357.798	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	ACI	$ 3.200.000	$ 222.800	V	SALUD TOTAL	9442335840	$ 128.000	PROTECCION	1736939109	$ 512.000	$ 128.000	$ -	$ -	
7	Lina Ramos	1.065.004.889	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	ACI	$ 3.200.000	$ 222.800	V	MUTUAL SER	9442335840	$ 128.000	PORVENIR	1736939109	$ 512.000	$ 128.000	$ -	$ -	
8	Katerine Paola Lopesierra Arteaga	1.073.815.505	Profesional Social	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	ACI	$ 3.500.000	$ 40.600	V	NUEVA EPS	9442335840	$ 23.400	PORVENIR	1736939109	$ 93.400	$ 23.400	$ -	$ -	
9	Claudia Marcela Benitez Camacho	1.067.937.483	Profesional Ambiental	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	ACI	$ 4.000.000	$ 92.800	V	EPS SURA	9442335840	$ 53.400	COLFONDOS	1736939109	$ 213.400	$ 53.400	$ -	$ -	
10	María José Teheraán Guerra	1.101.819.235	Inspector SST	$ 2.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	ACI	$ 2.100.000	$ 146.200	V	NUEVA EPS	9442335840	$ 84.000	PORVENIR	1736939109	$ 336.000	$ 84.000			
11	Ivanna Rocio Charrasquiel Rivero	1.065.007.803	Secretaria	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	ACI	$ 1.160.000	$ 3.600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9442335840	$ 40.500	PORVENIR	1736939109	$ 161.800	$ 40.600			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPL-MN-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30-jun-23 (Día / Mes / Año)

| | | |

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que LIBARDO ANTONIO ARTEAGA HERNANDEZ identificado(a) con CC 78077318 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$4,600,000	$736,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$4,600,000	$320,200
CCF	COMFACOR	30	4%	$4,600,000	$184,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$4,600,000	$184,000

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que CLAUDIA MARCELA BENITEZ CAMACHO identificado(a) con CC 1067937483 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$4,000,000	$640,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$4,000,000	$278,400
CCF	COMFACOR	30	4%	$4,000,000	$160,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$4,000,000	$160,000

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que DARIO ENRIQUE CANTERO MENDOZA identificado(a) con CC 15645442 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,160,000	$185,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,160,000	$80,800
CCF	COMFACOR	30	4%	$1,160,000	$46,400
EPS	MUTUAL SER	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que CARLOS MILAN CARVAJAL PINTO identificado(a) con CC 1047387270 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$4,600,000	$736,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$4,600,000	$320,200
CCF	COMFACOR	30	4%	$4,600,000	$184,000
EPS	SANITAS	30	4%	$4,600,000	$184,000

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que IVANA ROCIO CHARRASQUIEL RIVERO identificado(a) con CC 1065007803 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,160,000	$185,600
ARL	ARL SURA	30	0.522%	$1,160,000	$6,100
CCF	COMFACOR	30	4%	$1,160,000	$46,400
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que KATHERINE PAOLA LOPESIERRA ARTEAGA identificado(a) con CC 1073815505 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,500,000	$560,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,500,000	$243,600
CCF	COMFACOR	30	4%	$3,500,000	$140,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$3,500,000	$140,000

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que DEIMER ENRIQUE LOPEZ MEDINA identificado(a) con CC 1003192904 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,160,000	$185,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,160,000	$80,800
CCF	COMFACOR	30	4%	$1,160,000	$46,400
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que LUIS MIGUEL OROZCO OLIVARES identificado(a) con CC 1064981342 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,800,000	$288,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,800,000	$125,300
CCF	COMFACOR	30	4%	$1,800,000	$72,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,800,000	$72,000

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que CARMELINA ROSA OVIEDO RAMOS identificado(a) con CC 30581482 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$4,600,000	$736,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$4,600,000	$320,200
CCF	COMFACOR	30	4%	$4,600,000	$184,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$4,600,000	$184,000

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que NOHEMI SOFIA PADRON TORRES identificado(a) con CC 1065004889 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07												X					

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$4,600,000	$736,000
ARL	ARL SURA	30	0%	$4,600,000	$0
CCF	COMFACOR	30	0%	$4,600,000	$0
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$4,600,000	$184,000

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que LINA MARIA RAMOS BENAVIDES identificado(a) con CC 1071355692 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,200,000	$512,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,200,000	$222,800
CCF	COMFACOR	30	4%	$3,200,000	$128,000
EPS	MUTUAL SER	30	4%	$3,200,000	$128,000

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que SAID MAURICIO SOTO MARTINEZ identificado(a) con CC 1071357798 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$3,200,000	$512,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,200,000	$222,800
CCF	COMFACOR	30	4%	$3,200,000	$128,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$3,200,000	$128,000

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que MARIA JOSE TEHERAN GUERRA identificado(a) con CC 1101819235 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,100,000	$336,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,100,000	$146,200
CCF	COMFACOR	30	4%	$2,100,000	$84,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,100,000	$84,000

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que LEONARDO TORO NINO identificado(a) con CC 88253792 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	32763539	9453367938	E	2023-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$6,500,000	$1,040,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$6,500,000	$32,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$6,500,000	$32,500
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$6,500,000	$452,400
CCF	COMFACOR	30	4%	$6,500,000	$260,000
EPS	SANITAS	30	4%	$6,500,000	$260,000

Este certificado se expide el día 2023-07-07 a las 03:07.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30-jun-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B

MES INFORME MENSUAL: JUNIO

PROYECTO: P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO DE OBRA No: 172-180-181 DE 2021, 001 DE 2022

CONTRATISTA: ING.DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, CONSORCIOEYR019, CONSORCIO CRT PROGRESA, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1084921	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	NACION	PRINCIPAL	$ 242.430.000	
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11			$ 1.588.100.773	
2022	280222	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11			$ 100.000.000	
2023	1197722	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	NACION	ADICIONAL N°.1	$ 730.945.286	
2023	1197722	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	ADICIONAL N°.1	$ 109.747.200	
2023	1197722	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	ADICIONAL N°.1	$ 124.572.800	
TOTAL						$ 2.895.796.059	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.895.796.059

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 242.430.000,00			
	Anticipo											
1	ENERO - 2022	$ 456.300,00	$ 86.697,00	$ 542.997,00	$ -	$ 542.997,00	$ -	1084921 - 30/12/2021	$ 241.887.003,00	**$ 2.895.253.062**		
2	FEBRERO - 2022	$ 39.956.820,00	$ 7.591.796,00	$ 47.548.616,00	$ -	$ 47.548.616,00	$ -	1084921 - 30/12/2021	$ 194.338.387	**$ 2.847.704.446**		
3	MARZO - 2022	$ 61.066.163,00	$ 11.602.571,00	$ 72.668.734,00	$ -	$ 72.668.734,00		1084921 - 30/12/2021	$ 121.669.653	**$ 2.775.035.712**		
4	ABRIL - 2022	$ 88.928.160,00	$ 16.896.350,00	$ 105.824.510,00	$ -	$ 105.824.510,00		1084921 - 30/12/2021	$ 15.845.143	**$ 2.669.211.202**		
5	MAYO - 2022	$ 13.315.246,00	$ 2.529.897,00	$ 15.845.143,00		$ 15.845.143,00		1084921 - 30/12/2021	$ -	**$ 2.653.366.059**		
		$ 78.131.354,00	$ 14.844.957,00	$ 92.976.311,00		$ 92.976.311,00		280222 - 23/02/2022	$ 7.023.689	**$ 2.560.389.748**		
5		$ 5.902.260,00	$ 1.121.429,00	$ 7.023.689,00		$ 7.023.689,00		280222 - 23/02/2022		**$ 2.553.366.059**		
6	JUNIO	$ 94.536.797,00	$ 17.961.992,00	$ 112.498.789,00		$ 112.498.789,00		280222 - 23/02/2022	$ 1.475.601.984	**$ 2.440.867.270**		
6	JULIO - 2022	$ 101.134.200,00	$ 19.215.498,00	$ 120.349.698,00		$ 120.349.698,00		280222 - 23/02/2022	$ 1.355.252.286	**$ 2.320.517.572**		
8	AGOTO - 2022	$ 113.107.700,00	$ 21.490.463,00	$ 134.598.163,00		$ 134.598.163,00		280222 - 23/02/2022	$ 1.220.654.123	**$ 2.185.919.409**		
9	SEPTIEMBRE - 2022	$ 105.579.070,00	$ 20.060.023,00	$ 125.639.093,00		$ 125.639.093,00		280222 - 23/02/2022	$ 1.095.015.030	**$ 2.060.280.316**		
10	OCTUBRE	$ 121.465.020,00	$ 23.078.354,00	$ 144.543.374,00		$ 144.543.374,00		280222 - 23/02/2022	$ 950.471.656	**$ 1.915.736.942**		
11	NOVIEMBRE	$ 125.440.700,00	$ 23.833.733,00	$ 149.274.433,00		$ 149.274.433,00		280222 - 23/02/2022	$ 801.197.223	**$ 1.766.462.509**		
12	DICIEMBRE	$ 125.440.700,00	$ 23.833.733,00	$ 149.274.433,00		$ 149.274.433,00		280222- 23/02/2022	$ 651.922.790	**$ 1.617.188.076**		
13	ene-23	$ 125.412.700,00	$ 23.828.413,00	$ 149.241.113,00		$ 149.241.113,00		280222-23/02/2022	$ 502.681.677	**$ 1.467.946.963**		
14	feb-23	$ 126.773.730,00	$ 24.087.009,00	$ 150.860.739,00		$ 150.860.739,00		280222-23/02/2022	$ 351.820.938	**$ 1.317.086.224**		
15	mar-23	$ 127.781.080,00	$ 24.278.406,00	$ 152.059.486,00		$ 152.059.486,00		280222-23/02/2022	$ 199.761.451	**$ 1.165.026.737**		
16	abr-23	$ 126.132.000,00	$ 23.965.080,00	$ 150.097.080,00		$ 150.097.080,00		280222-23/02/2022	$ 49.664.371	**$ 1.014.929.657**		
17	may-23	$ 41.734.765,00	$ 7.929.606,00	$ 49.664.371,00		$ 49.664.371,00		280222-23/02/2022	$ -	**$ 965.265.286**		
	C-2402-0600-12-0-2402041-02								**$ 109.747.200**			
17	may-23	$ 73.088.732,77	$ 13.886.859,23	$ 86.975.592,00		$ 86.975.592,00		1197722 -16/11/2022	$ 22.771.608	**$ 878.289.694**		
18	jun-23	$ 19.135.805,04	$ 3.635.802,96	$ 22.771.608,00		$ 22.771.608,00		1197722 -16/11/2022	$ -	**$ 855.518.086**		
	C-2402-0600-12-0-2402112-02								**$ 124.572.800**			
18	jun-23	$ 95.687.694,96	$ 18.180.662,05	$ 113.868.357,00		$ 113.868.357,00			$ 10.704.443	**$ 741.649.729**		
	TOTALES	**$ 1.810.206.997,77**	**$ 343.939.331,24**	**$ 2.154.146.329,00**	**$ -**	**$ 136.639.963,00**	**$ -**		**$ 22.771.608,00**	**$ 878.289.694,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS PERSONAL	$ 1.546.191.270	$ 293.776.341	$ 1.839.967.611
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 266.759.280	$ 50.684.263	$ 317.443.543
*			
VALOR TOTAL	$ 1.812.950.550	$ 344.460.604	$ 2.157.411.154

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoria
Matricula No. 54202-145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. : 22202097095 COR

Original Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccion Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 30-jun-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.930.530.773,00

VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 811.147.384,00	27	ENE	2022	1	MAR	2023
Calidad del servicio		$ 579.159.232,00	29	AGOS	2022	29	AGOS	2027
Cumplimiento de Servicio		$ 193.053.077,00	27	ENE	2022	1	MAR	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 386.106.155,00	27	ENE	2022	29	AGOS	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551–6

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 30-jun-23 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 289.579.212,00	27	1	2022	30/12/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 811.147.384,00	27	1	2022	30/12/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 579.159.212,00	27	1	2022	30	6	2026
Calidad del servicio		$ 868.738.818,00	31	12	2022	30	6	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLAN DE CARGUE Y REPROGRAMACIÓN DE MANO DE OBRA

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA

PLAN DE CARGUE INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGUE ☐ No. ___
PLAN DE CARGUE FINAL ☐

PROYECTO: [illegible] — DIRECCIÓN TERRITORIAL: [illegible]

CONTRATO: [illegible] — PLAZO INICIAL: [illegible] — PLAZO ACUMULADO: [illegible]
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: [illegible] — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: [illegible]
FECHA DE SUSPENSIÓN: [illegible] — FECHA DE REANUDACIÓN: [illegible]
VALOR INICIAL: [illegible] — VALOR ACTIVIDADES: [illegible]
VALOR ACUMULADO ADICIONES: [illegible]
[illegible] — [illegible]

CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TIEMPOS				CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 01 DE OCTUBRE DE 2022				AÑO 2022												AÑO 2023						TOTAL
	Costo de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Horas/Mes)	Valor Total ($)	Costo de Personal	Prima Regional	Participación (meses)	Valor Total ($)	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		
									H-01	VALOR	H-02	VALOR	H-03	VALOR	H-04	VALOR	H-05	VALOR	H-06	VALOR	H-07	VALOR	H-08	VALOR	H-09	VALOR	H-10	VALOR	H-11	VALOR	H-12	VALOR	H-01	VALOR	H-02	VALOR	H-03	VALOR	H-04	VALOR	H-05	VALOR	H-06	VALOR	
PERSONAL DIRECTO																																											
PERSONAL PROFESIONAL																																											
Director de Interventoría	$ 4,000,000.00		100	$ 400,000,000			11.00	$ 71,400,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	11.00	$ 71,400,000.00
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,000,000.00		100	$ 400,000,000			10.43	$ 67,779,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	10.43	$ 67,779,000.00
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,000,000.00		100	$ 400,000,000			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,000,000.00		100	$ 400,000,000			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,000,000.00		100	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,000,000.00		100	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Ingeniero Auxiliar	$ 3,000,000.00		100	$ 300,000,000			9.30	$ 29,790,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 930,000.00	1.00	$ 3,255,000.00	1.00	$ 3,255,000.00	1.00	$ 3,255,000.00	1.00	$ 3,255,000.00	1.00	$ 3,255,000.00	1.00	$ 3,255,000.00	1.00	$ 3,255,000.00	1.00	$ 3,255,000.00	1.00	$ 3,255,000.00	1.00	$ 3,255,000.00	1.00	$ 3,255,000.00	1.00	$ 3,255,000.00	1.00	$ 3,255,000.00	9.30	$ 29,790,000.00
Ingeniero Auxiliar	$ 3,000,000.00		100	$ 300,000,000			9.30	$ 29,790,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Ingeniero Auxiliar	$ 3,000,000.00		100	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Profesional Social	$ 3,000,000.00			$ -			9.17	$ 27,510,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 1,500,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.17	$ 510,000.00
Profesional Ambiental	$ 3,000,000.00			$ -			8.33	$ 25,020,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 1,500,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.33	$ 1,020,000.00
Profesional Predial	$ 3,000,000.00			$ -			8.33	$ 25,020,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 1,500,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.33	$ 1,020,000.00
Profesional Predial	$ 3,000,000.00			$ -			8.33	$ 25,020,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 1,500,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 3,000,000.00	0.33	$ 1,020,000.00
Técnico Ambiental Permisos y/o Permisos	$ 2,000,000.00		220	$ 440,000,000			2.00	$ 12,240,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Cartógrafo Topógrafo Auxiliar Topógrafo	$ 2,000,000.00		220	$ 440,000,000			0.33	$ 2,040,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 340,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Cartógrafo Topógrafo Auxiliar Topógrafo	$ 2,000,000.00		220	$ 440,000,000			2.00	$ 12,240,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 1,020,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00	2.00	$ 12,240,000.00
Cartógrafo Topógrafo Auxiliar Topógrafo	$ 2,000,000.00		220	$ 440,000,000			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
PERSONAL ADMINISTRATIVO																																											
Secretaria	$ 1,500,000.00		100	$ 300,000,000			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 300,000,000				$ 1,200,000.00		$ 300,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 2,040,000.00		$ 1,200,000.00
FACTOR MULTIPLICADOR				2.50				2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50
TOTAL COSTOS PERSONAL				$ 600,000,000				$ 1,200,000.00		$ 750,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 5,100,000.00		$ 1,200,000.00

CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2022																								AÑO 2023						TOTAL
									Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		
									H-01	VALOR	H-02	VALOR	H-03	VALOR	H-04	VALOR	H-05	VALOR	H-06	VALOR	H-07	VALOR	H-08	VALOR	H-09	VALOR	H-10	VALOR	H-11	VALOR	H-12	VALOR	H-01	VALOR	H-02	VALOR	H-03	VALOR	H-04	VALOR	H-05	VALOR	H-06	VALOR	
OTROS COSTOS DIRECTOS																																											
VIAJES																																											
Viajes de la mano profesional	180,000.00	Día	77.00	$ 13,860,000.00				$ 13,860,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00	11.00	$ 1,980,000.00
OTROS COSTOS DIRECTOS (O)																																											
Camioneta o camper de más de 2000 c.c., modelo 2010 o 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 900,000.00	Mes	900	$ 162,000,000			9.05	$ 16,177,500.00	0.00	$ -	0.00	$ 1,710,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	10.95	$ 19,710,000.00
Camioneta o camper de más de 2000 c.c., modelo 2010 o 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 900,000.00	Mes	900	$ -			2.50	$ 12,420,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 900,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	7.00	$ 10,710,000.00
Motos Linea ≥150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y peajes (MOM)	$ 600,000.00	Mes	900	$ 600,000.00			9.50	$ 6,300,000.00	0.00	$ -	0.33	$ 200,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	10.83	$ 6,200,000.00
Motos Linea ≥150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y peajes (MOM)	$ 600,000.00	Mes	900	$ 600,000.00			9.83	$ 6,500,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000.00	10.83	$ 7,100

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENTRE CONTRATISTA E ITERVENTOR JUNIO

FECHA DE RECIBO	*ASUNTO*	*RADICADO*
2023-06-01	Requerimiento de Solicitud de Certificados de Calibración de Equipos Topográficos	SAL-23-009489
2023-06-14	Mejoramiento Calidad Acabado en Pavimento	SAL-23-010208
2023-06-16	Solicitar la entrega de la planilla de seguridad social del Consorcio Córdoba 2022	SAL-23-010359
2023-06-20	Respuesta a oficio SAL-23-010359	OFIC-CC2022-091

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-009489
2023-06-01 11:16:45 a. m.

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 1 de junio de 2023

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmil.com

Asunto: Requerimiento de Solicitud de Certificados de Calibracion de Equipos Topograficos

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo;

En nuestro seguimiento de supervisión y control al Contrato No. 104 de 2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL." Esta interventoría solicita lo siguiente:

El pasado 25 de mayo de 2023 mediante oficio SAL-23-009020 se realizó la solicitud de los certificados de calibración de equipos de topografía al Consorcio Córdoba 2022.

Como se puede observar el contratista hasta la fecha no se ha pronunciado ni ha enviado los certificados de calibración para su respectiva revisión por esta interventoría, incumplió con la entrega de esta. Ya que estos equipos no pueden estar sin su respectiva calibración, si el contratista no hace la entrega esta interventoría no les hará mas liberaciones en campo hasta que no estén calibrados para así mantener y entregar resultados exactos.

Por lo anterior esta interventoría solicita remitir la información requerida en un plazo no mayor a (2) días del recibido de este comunicado, de no tener respuesta en el tiempo solicitado se procederá a iniciar proceso sancionatorio.

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director De Interventoría

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
1/06/2023 11:16:48 a. m.

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-009489
2023-06-01 11:16:45 a. m.

CONSORCIO ACI-3B

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-010208
2023-06-14 03:25:31 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 14 de junio de 2023

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
cordobaconsorcio2022@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Mejoramiento Calidad Acabado en Pavimento

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a ustedes Consorcio Córdoba 2022 como contratistas de la obra en referencia, con el fin de hacer un llamado a la mejora de la calidad del acabado del pavimento ya que en la fundida realizada el día 13 de junio de 2023 en las horas de la noche entre absc K0+240 a la K0+210 en el tramo T2 de martínez se presentaron situaciones al momento de realizar el rayado del mismo, el cual está quedando mal acabado si no es muy profundo, es muy superficial, cabe indicar que se están haciendo fundidas en la horas de la noche y las condiciones de iluminación no son las mejores ni las mas óptimas para realizar esta actividad.

Adjunto registro fotográfico del acabado del pavimento entre absc K0+240 a la K0+210 tramo T2 sector martínez





Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-010208
2023-06-14 03:25:31 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Por lo anterior le solicitamos al Consorcio Córdoba 2022, mejoren estas situaciones y así seguir con el buen curso de la obra, sobretodo cumpliendo las especificaciones y los acabados.

Agradecemos la atención prestada y su pronta respuesta

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
14/06/2023 3:25:33 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - LUIS ANTONIO RHENALS OTERO - ALCALDE MUNICIPAL DE CERETE - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co,katiamilenaramosdoria@gmail.com

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-010359
2023-06-16 02:54:49 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 16 de junio de 2023

Ingeniero
CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
R/L
CONSORCIO CORDOBA 2022
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Solicitar la entrega de la planilla de seguridad social del Consorcio Córdoba 2022

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro seguimiento y control que realiza esta Interventoría a su contrato de obra No 104 de 2022, nos permitimos realizar la siguiente solicitud:

Señor contratista Consorcio Córdoba 2022, mediante la presente esta interventoría en el ejercicio de seguimiento y control del contrato en mención solicita la entrega de la planilla de seguridad, la cual tuvo como fecha límite de pago el día 10 de junio del presente año y no se ha recibido soporte alguno de su parte.

De acuerdo a lo anterior se solicita que sea presentado el soporte a más tardar al finalizar el día, de lo contrario se tomaran acciones con respecto a la presencia en obra de los trabajadores relacionados en dichas planillas.

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director De Interventoría

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos:

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
16/06/2023 2:54:50 p. m.

Montería, 20 de junio de 2023

OFIC-CC2022-091

Doctora
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
R/L CONSORCIO ACI-3B
L. C.

ING. LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría.

Ref.: CONTRATO No: 104-2022 **CUYO OBJETO ES**: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL."

Asunto: Respuesta a oficio SAL-23-010359

Muy comedidamente por medio de la presente, dando respuesta al oficio SAL-23-010359, me dirijo a ustedes con el fin de hacer entrega de la planilla de seguridad social del contrato de la referencia.

Atentamente,

CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RL CONSORCIO CORDOBA 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO JUNIO 2023

ÍTEMS EJECUTADOS EXCAVACION TRAMO T2 MARTINEZ	
	
FOTO No. 1 Excavación Tramo T2 Martínez entre absc K0+240 a la K0+110	**FOTO No. 2** Excavación Tramo T2 Martínez entre absc K0+240 a la K0+110
	
FOTO No. 3 Excavación Tramo T2 Martínez entre absc K0+240 a la K0+110	**FOTO No. 4** Excavación Tramo T2 Martínez entre absc K0+240 a la K0+110

ÍTEMS EJECUTADOS INSTALACION DE MATERIAL AFIRMADO TRAMO A4 20 DE JULIO



FOTO No. 5 Instalación material afirmado Tramo A4 20 de julio entre absc K0+410.1 a la K0+390



FOTO No. 6 Instalación material afirmado Tramo A4 20 de julio entre absc K0+410.1 a la K0+390



FOTO No. 7 Instalación material afirmado Tramo A4 20 de julio entre absc K0+410.1 a la K0+390



FOTO No. 8 Instalación material afirmado Tramo A4 20 de julio entre absc K0+410.1 a la K0+390

ÍTEMS EJECUTADOS INSTALACION AFIRMADO Y COMPACTACION TRAMO A3 20 DE JULIO



FOTO No. 9 Instalación de material afirmado en tramo A3 20 de julio entre absc K0+445 a la K0+390



FOTO No. 10 Instalación de material afirmado en tramo A3 20 de julio entre absc K0+445 a la K0+390



FOTO No. 11 Compactación a material afirmado en tramo A3 20 de julio entre absc K0+445 a la K0+390



FOTO No. 12 Compactación a material afirmado en tramo A3 20 de julio entre absc K0+445 a la K0+390

ÍTEMS EJECUTADOS FUNDIDA DE PAVIMENTO TRAMO A4 20 DE JULIO



FOTO No. 13 Fundida de pavimento entre absc K0+410 a al K0+390



FOTO No. 14 Fundida de pavimento entre absc K0+410 a al K0+390



FOTO No. 15 Fundida de pavimento entre absc K0+410 a al K0+390



FOTO No. 16 Fundida de pavimento entre absc K0+410 a al K0+390

ÍTEMS EJECUTADOS FUNDIDA DE PAVIMENTO TRAMO A3 20 DE JULIO



FOTO No. 17 Fundida de Pavimento entre absc K0+455 a la K0+380 tramo A3



FOTO No. 18 Fundida de Pavimento entre absc K0+455 a la K0+380 tramo A3



FOTO No. 19 Fundida de Pavimento entre absc K0+455 a la K0+380 tramo A3



FOTO No. 20 Fundida de Pavimento entre absc K0+455 a la K0+380 tramo A3

ÍTEMS EJECUTADOS FUNDIDA DE PAVIMENTO TRAMO T2 MARTINEZ



FOTO No. 21 Fundida de Concreto entre absc K0+240 a la K0+110 tramo T2



FOTO No. 22 Fundida de Concreto entre absc K0+240 a la K0+110 tramo T2



FOTO No. 23 Fundida de Concreto entre absc K0+240 a la K0+110 tramo T2



FOTO No. 24 Fundida de Concreto entre absc K0+240 a la K0+110 tramo T2

ÍTEMS EJECUTADOS INSTALACION DE BORDILLOS CHUCHURUBI



FOTO No. 25 Instalación de bordillos prefabricados tramo chuchurubi ambos lados



FOTO No. 26 Instalación de bordillos prefabricados tramo chuchurubi ambos lados



FOTO No. 27 Instalación de bordillos ambos lados tramo chuchurubi



FOTO No. 28 Instalación de bordillos ambos lados tramo chuchurubi

ÍTEMS EJECUTADOS INSTALACION DE BORDILLOS TRAMO T4



FOTO No. 29 Instalación de bordillos Tramo T4 ambos lados



FOTO No. 30 Instalación de bordillos Tramo T4 ambos lados



FOTO No. 31 Instalación de bordillos Tramo T4 ambos lados



FOTO No. 32 Instalación de bordillos Tramo T4 ambos lados

ÍTEMS EJECUTADOS INSTALACION DE BORDILLOS TRAMO T5



FOTO No. 33 Instalación de bordillos tramo T5 ambos lados



FOTO No. 34 Instalación de bordillos tramo T5 ambos lados



FOTO No. 35 Instalación de bordillos tramo T5 ambos lados



FOTO No. 36 Instalación de bordillos tramo T5 ambos lados

ÍTEMS EJECUTADOS RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION TRAMO T2



FOTO No. 37 Retiro de material producto de la excavación tramo T2 Martínez



FOTO No. 38 Retiro de material producto de la excavación tramo T2 Martínez



FOTO No. 39 Retiro de material producto de la excavación tramo T2 Martínez



FOTO No. 40 Retiro de material producto de la excavación tramo T2 Martínez

ÍTEMS EJECUTADOS TOMA DE DENSIDADES TRAMO T2



FOTO No.41 Toma de densidades a capa sub base granular tramo T2 entre absc K0+240 la K0+110



FOTO No. 42 Toma de densidades a capa sub base granular tramo T2 entre absc K0+240 la K0+110



FOTO No. 43 Toma de densidades a capa sub base granular tramo T2 entre absc K0+240 la K0+110



FOTO No. 44 Toma de densidades a capa sub base granular tramo T2 entre absc K0+240 la K0+110

* Jueves 1 de junio de 2023.

Frente Chuchurubi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Llovio toda la Mañana - Tarde Nublada.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Fiso, 4 oficios Varios, 2 oper Bobcat, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Vibro Compactador, 1 Comision Topografica.

Equipos: 1 Retroexcavadora, 2 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Motobomba, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy Solo se realizo evacuación de aguas Lluvias producto de las lluvias presentadas en la Mañana - esto en los frentes. A3 y A5. del Sector 20 de julio.

+ - Maria Ozle.

Frente Media Tapa.

Este frente Continua abandonado, no se ha realizado ningun tipo de actividad, este pendiente el Sellado de juntas, instalacion de bordillos, Construccion de Canal y descoles.

Se le pide Celeridad al Contratista en estas actividades.

+ Maria Ozle.

Frentes Tramo Martinez T4 y T5.

Estos frentes Continuan abandonados sin realizar ningun tipo de actividad, estan pendientes por Sellado de juntas, instalación de bordillos.

Se le pide celeridad al Contratista en estas actividades.

+ Maria Ozle.

Frente Tramo La Lucha.

Este frente se encuentra abandonado, no se ha realizado ningun tipo de actividad Solo se Construyo el Box-Coulvert en la dosificacion, y falta el relleno del mismo.

Se le pide al Contratista realice relleno del Box lo antes posible para evitar socavaciones ya que las lluvias estan siendo fuertes en la zona.

+ Maria Ozle

Powered by CamScanner

* Viernes 2 de junio de 2023.

Frente chuchurubí y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en Obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comision Topografica, 4 Oficios Varios, 2 oper Bobcat, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Vibro Compactador.

Equipos: 1 Retroexcavadora, 2 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo limpieza a excavacion de mejoramiento con piedra rajon entre absc. Ko+349 - Ko+355.

- Se realizo Suministro e instalacion de piedra rajon en mejoramiento de Sub rasante. Con piedra rajon fallo entre absc Ko+349 - Ko+355. en el tramo ~~1~~ Sector 20 de julio. el cual quedo Superado el fallo.

Frente Media Tapa.

Este frente Continua abandonado, no se ha realizado ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades.

Frente tramo Martinez T4 y T5

En estos frentes no se ha realizado ningun tipo de actividad, este Pendiente por ejecutar el Sellado de juntas y inst. de bordillos, se le Pide celeridad al Contratista en las actividades.

Frente tramo la lucha

Este frente se encuentra abandonado, no se este realizando ningun tipo de actividad, falta relleno del Box-Coulvert Ko+010 de la lucha.

Powered by CamScanner

* Sabado 3 de junio de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 4 oficios Varios, 1 Comision Topografica, 1 oper Bobcat.

Equipos:

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación.

Actividades: El dia de hoy se realizo Mejoramiento Con Piedra rajon a fallos presentados en el tramo A3. Sector 20 de julio. entre absc K0+450 a K0+435.6.

Frente Medio Tapes.

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se le Solicita Celeridad al Contratista en las actividades Pendientes por ejecutar.

Frentes Tramo Martinez T4 y T5.

En estos frentes no se ha realizado ningun tipo de actividad, se le Solicita al Contratista Celeridad en las actividades Pendientes por ejecutar.

Frente Tramo la lucha.

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se le Solicita al Contratista Celeridad en las actividades.

Powered by CamScanner

* Domingo 4 de junio de 2023
No se realizo ningun tipo de actividad.

* Lunes 5 de junio de 2023.

Frentes chuchurubí y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado - lluvias por la noche.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 4 oficios Varios, 1 oper Retroexcav, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 1 oper Motoniveladora, 1 Comision Topografica, 1 Sso.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Retroexcavadora, 1 Motobomba, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo excavacion de aguas lluvias en los tramos A3 y A4 del Sector 20 de julio esto debido a las fuertes lluvias presentadas en la noche del dia domingo.

Frente Medio Tapa
Este frente Continua sin realizar ningun tipo de actividad, ademas se vio afectado por las lluvias presentadas en la zona. el dia domingo.

Frentes Martines Tramos T4 y T5.
Estos frentes Continuan sin realizar ningun tipo de actividad tambien se presentaron lluvias el dia domingo. por la noche.

Powered by CamScanner

Frente Tramo la lucha

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, Se Presentaron lluvias el domingo Por la noche.

* Martes 6 de junio de 2023.

Frentes chuchurubi y 20 de julio

Estado del Tiempo: Dia Soleado.

Personal en Obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 1 Comision Topografica, 4 ofiaos Varios, 1 operador Retroexcavadora, 1 oper Bobcat, 1 oper vibro Compactador, 1 oper Motoniveladora.

Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estacion, 1 Motobomba, Herramientas Menores

Actividades: Se dio inicio Con el Suministro de bordillos en el tramo chuchurubi.

- Se realizo liberación por topografia de interventoria en excavacion mecanica en el tramo A4 entre absc Km+390 a la Km 410,5. Sector 20 de julio.
- Se realizo Suministro e instalacion de Material afirmado entre absc Km 390 a la Km+410,5 tramo A4 Sector 20 de julio.
- En el tramo A3 no se realizo ningun tipo de actividad ya que este tramo se encuentra Saturado de las aguas lluvias y las que las casas aledaños echan a la via.

Frente Media tapa.

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad. Se le pide Calendad al Contratista en las actividades Pendientes Por ejecutar.

Powered by CamScanner

Frentes Tramo Martinez T4 y T5

Estos frentes continuan sin realizar ninguna tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades Pendientes por ejecutar.

Frente Tramo Martinez. T2 T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 comision topografica.

Equipos: 1 Nivel, 1 Estación.

Actividades: El dia de hoy se dio inicio con el replanteo y Trazado en Conjunto con la topografia del Contratista y la Interventoria en los tramos T2, T2' y T7.

* Miercoles 7 de Junio de 2023.

Frentes chuchunbi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Sso, 4 oficios Varios, 8 ayudantes, 1 oper Bobcat, 1 oper Retroexcavadora, 1 Vibro Compactador, 1 Comisión topografica,

Equipos: 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: Se realizo instalación de Sub base granular entre absc K0+390 a la K0+410,5 en el tramo A4 del Sector 20 de julio.

- Se realizo Topografia de la Interventoria por niveles y sub base entre absc K0+390 a la K0+410,5 en el tramo A4.
- Se realizo fundida de pavimento entre absc K0+390 a la K0+410,5 en el tramo A4 Seccion 5mts. Sector 20 de julio

- Se Continvo Con el Suministro de bordillos en el tramo chuchurubi.
- tambien se dio inicio con la excavacion manual para instalacion de bordillos entre abse K0+450 a la K1+320 lado derecho en el tramo chuchurubi.

Frente Media Tapa.

Este frente Continva sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en los actividades pendientes por ejecutar.

Frentes Tramo Martinez T4 y T5

Estos frentes Continuan sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en los actividades Pendientes Como son: Sellado de juntas, instalacion de bordillos Prefabricados y desoles.

Frentes Tramo Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 sso, 1 ing Residente, 1 oper motoniveladora, 2 peloteros, 1 oper Bobcat, 1 Comision Topografica.

Equipos: 1 motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estacion.

Actividades: El dia de hoy se dio inicio con la excavacion Mecanica entre abse K0+240 a la K0+180 en el tramo T2. Sector Martinez.

Powered by CamScanner

* Jueves 8 de Junio de 2023.

Frentes chuchurubí y 20 de julio.

Estado del tiempo: Lluvias en la mañana de 10-12pm - Tarde Nublada.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 6 ayudantes, 2 oficios Varios, 1 Siso, 1 operador vibro compactador.

Equipos: 1 vibro Compactador, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se realizo Corte de juntas entre absc. K+1390 a la K+1410,5 tramo A4 sector 20 de julio.

- Se realizo excavacion de aguas lluvias con motobomba en el tramo A3 sector 20 de julio.
- Se Continuo con el suministro de bordillos en el tramo Chuchurubi.
- Tambien se realizo excavación Manual para instalacion de bordillos entre absc K1+320 a la K1+230 lado derecho tramo chuchurubi.

Frente Media tapa.

Este frente continua Sin realizar ningun tipo de actividad. Se le pide Celeridad al Contratista en las actividades Pendientes por ejecutar.

Frentes Tramo Martinez T4 y T5.

Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad, Se le Solicita al Contratista celeridad en las actividades Pendientes por ejecutar.

Powered by CamScanner

Tramos Martinez T2, T2' y T7

Estado del tiempo: lluvias en la mañana de 10-12 pm - tarde Nublada.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 Camion topografica, 2 paleteros, 2 oficios Varios

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la excavacion Mecanica entre absc Ko+240 a la Ko+180 en el tramo T2 Sector Martinez.

* Viernes 9 de Junio de 2023.

Frentes chuchurubi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 4 capitanes, 2 oficios Varios, 1 Siso.

Equipos: 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: Se realizo evacuación de aguas lluvias en los tramos A3 y A4 del Sector 20 de julio esto debido a las lluvias del dia de ayer.

- Se continuo con el Suministro de bordillos al tramo chuchurubi.
- Se continuo con la excavacion mecanica para instalacion de bordillos entre abs K0+230 a la K0+084 lado en el tramo chuchurubi.

Frente Media Tapa

Este frente continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se le Solicita al Contratista celeridad en las actividades pendientes por ejecutar.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5
Estos frentes continuan Sin raliazr ningun tipo de actividad.

Frentes Tramo Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 2 paleteros, 2 ofiaes Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 Comision topografica,
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy Se Continuo con la excavación Mecanica entre absc Kot 240 a la Ko + 180 tramo T2 Sector Martinez.

* Sabado 10 de Junio de 2023

Frentes Tramos Martinez ~~T2~~ y T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 oper Motoniveladora, 4 ofiaes Varios, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador 1 ayudantes, 1 Comision topografica.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy Se realizo liberacion por topografia de interventoria a excavacion mecanica entre absc Kot 240 a la Kot 200. tramo T2 martinez.
- Tambien Se realizo Suministro e instalacion de Material afirmado en Primera y Segunda Capa entre abs Kot 240 a la Kot 200 tramo T2 martinez.

Powered by CamScanner

- Se continuo excavación Mecanica entre absc Ka+200 a la Ka+160. tramo T2 Martinez.

+.

Frentes chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1ing Residente, 1sso, 4ayudantes., 20 fierros Varios.
Equipos: 1 Motobomba, Herramientas menores.

Actividades: En los frentes A3 y A4 no se realizo ningun tipo de actividad debido a que el terreno Presenta mucha humedad debido a las fuertes lluvias que se han venido Presentando en la zona, ademas de eso la Comunidad no para de evacuar las aguas de Sus Casas a la via la Cual esta en ejecución.

- En el tramo de chuchurubi se Continuo Con el Suministro de bordillos y excavación Para instalacion de bordillos entre absc K1+084 a la K0+970. lado derecho. Sector Chuchurubi.

+.

Frente Medio tapa.
Este frente Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad, Se Solicito al Contratista celeridad en las actividades pendientes. Por ejecutar.

+

Frentes tramos Martinez T4 y T5.
Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad.

+

Powered by CamScanner

* Domingo 11 de junio de 2023.
No se realizo ningun tipo de actividad

+.

* Lunes 12 de junio de 2023. F-
Nose realizo ningun tipo de actividad.

+.

* Martes 13 de junio de 2023.

Frentes chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Día soleado.
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 siso, 2 oficios Varios, 1 opr Bobcat.
Equipos: 1 Bobcat, herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo el suministro de material afirmado en el tramo A3 sector 20 de julio.
- Se continuo con el suministro de Bordillos en el tramo de chuchurubi.

+.

Frente Media Tapa
Este frente continua sin realizar ningun tipo de actividad se le pide celeridad al contratista en las actividades pendientes por ejecutar.

+

Frentes Herdina tramos T4 y T5.
Estos frentes continuan sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al contratista en las actividades pendientes por ejecutar.

+.

Powered by CamScanner

Frentes Tramos Marítima T2, T2' y T7.
Estado del Tiempo: Día Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 3 oficios Varios, 6 ayudantes,
1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compact,
1 Comisión Topográfica.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel,
1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se realizo Cerco y liberacion por topografia de interventoria a Capa de afirmado entre abs Ko+240 a la Ko+200.
- Se realizo toma de densidad por Parte del Contratista en la abs Ko+210 la Cual Cumplio 92,2% en Capa afirmado. T2
- Se realizo instalacion de material Sub base granular entre abs Ko+240 a la Ko+200. T2
- Se realizo toma de densidades por Parte del Contratista en la abs Ko+225 la Cual Cumplio en 96% en Capa de Sub base T2
- Se realizo liberación por Parte de la topografia de la interventoria a Sub base y cunetas entre abs Ko+240 a la Ko+200, T2.
- Se realizo fundida de Pavimento entre abs Ko+240 a la Ko+210. en el tramo T2 Martinete.
- Se realizaron 2 Muestras para resistencia del Concreto. T2.

Miércoles 14 de Junio de 2023


Frentes Tramo: La Lustra
Estado del tiempo: Día Soleado
Personal en obra: 1 Siso, 1 oficios Varios, 2 ayudantes.
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy no realizo ninguna tipo de actividad en este tramo, se le solicita al Contratista celeridad en las actividades pendientes por ejecutar.

Powered by CamScanner


Frente Media Tapa.

Este frente Continua sin realizar ningun tipo de actividad, Se le pide celeridad al Contratista en las actividades Pendientes por Ejecutar.



Frentes Tramos Martinez T4 y T5.

Estos frentes Continuan Sin realizar ningun tipo de actividad se le Solicita al Contratista Celeridad en las actividades Pendientes, por ejecutar.




Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 3 oficios Varios,

Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Corte de juntas en el tramo T2 permanto, entre absc Ko+240 a la Ko+210.



Frentes: Chuchurubí y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comision topografica, 3 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper. Bobcat, 1 oper Vibro Compactador.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Sureo de Material afirmado entre abs Ko+455.67 al Ko+420 tramo A3.

Powered by CamScanner

- Se realizo liberación por topografia de Interventoria a Capa de enfirmado entre obsc K0+445,67 a la K0+420 tramo A3.
- Se realizo toma de densidades por Parte del Contratista en la abs K0+ la Cual dio 90% Cumpliendo.
- Se realizo Suministro e instalacion de material Sub base granular entre obsc K0+445,67 a la K0+420 tramo A3.
- Se realizo toma de densidades por Parte del Contratista en la obsc K0+ la Cual dio % Cumpliendo
- Se realizo Suministro de bordillos en tramo chuchurubi.

* jueves 15 de junio de 2023.

Frente chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Nublado.
Personal en obra: 1ing Residente, 1 Sso, 1 Comision Topografica, 2 oficios varios, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, 1 Motobomba, Herramientas Menores.


Actividades: El dia de hoy se realizo instalacion de bordillos entre obsc K1+350 a la K1+250 lado derecho Chuchurubi.
- En el tramo A3 y A4 del Sector 20 de julio se realizo evacuación de aguas debido a las fuertes lluvias presentadas en la noche en la zona, esto impidio el avance de las actividades.

Frente Media Tapa
Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide claridad al Contratista en las actividades pendientes por ejecutar.

Powered by CamScanner


Frentes tramo Martinez T4 y T5.
Estado del tiempo: Dia Nublado
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 fisq, 1 insp. de Obra, 1 oficial
Equipos: Herramientas Menores, 1 Bobcat.

Actividades: El dia de hoy se dio inicio con el Suministro de bordillos en el tramo T4 de Martinez.



Frentes Martinez tramos T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Nublado
Personal en obra: 2 oficios Varios, 1 fisio.
Equipos: 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo evacuacion de aguas Pluviales debido a los fuertes lluvias Presentados en la noche en la zona impidiendo el avance de las actividades.



* Viernes 16 de Junio de 2023

Frentes chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 ing Residente, 4 ayudantes, 1 insp de obras, 1 fisio, 20 oficios Varios.

Equipos: Herramientas Menores, 1 Motobomba.

Actividades: El dia de hoy en el tramo A3 y A4 del Sector 20 de julio. se continuo con la evacuacion de aguas, esto debido a las lluvias Presentadas en la zona el dia Miercoles. Tambien debido aque el terreno esta muy Saturado ya que el nivel freatico esta muy Cerca.

Powered by CamScanner

- Se Continuo Con la instalación de bordillos entre abs K1+290 a la K1+140 lado derecho Sector churubi.

+ -

Frente Media tapa.

Este frente Continua Sin realizar ninguna tipo de actividad, se le Pide celeridad al Contratista en las actividades pendientes por ejecutar.

+ .

Frentes tramo Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Día Soleado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 8 ayudantes, 1 Inp. Obra.

Equipos: Herramientas Menores, 1 Bobcat

Actividades: El día de hoy se Continuo Con el Suministro e instalacion de bordillos en el tramo T4 lado izquierdo entre abs K0+075,19 a la K0+050 - .

+ .

Frentes Martinez tramos T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Día Soleado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 oper Bobcat, 1 oper. Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 Comision topografica, 3 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Motobomba, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo liberacion por topografia de interventoria a excavacion entre abs K0+200 a la K0+180

- Se realizo Suministro e instalacion de Material afirmado entre abs K0+200 a la K0+180 tramo T2.

+

Powered by CamScanner

* Sabado 17 de Junio de 2023.

Frentes chuchurubí y 20 de Julio.
Estado del tiempo: Mañana Soleada - lluvias en la tarde.
Personal en obra: 1 Inspector de obra, 1 SISO, 4 ayudantes, 1 oficiales Varios.
Equipos: Herramientas Menores, 1 Motobomba.

Actividades: El día de hoy se realizo excavación de aguas lluvias en los tramos A3 y A4 del Sector 20 de julio debido a las fuertes lluvias presentadas en la noche del viernes. afectando las actividades.
- Se continuo con la instalación de bordillos prefabricados entre absc K0+140 a la K1+120. tramo chuchurubí lado derecho.

Frente Media Tapa:
Este frente continua sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide claridad al Contratista en las actividades pendientes por ejecutar.

Frentes tramos Hortmoz T4 y T5.
Estado del tiempo: Mañana Soleada - lluvias por la tarde.
Personal en obra: 1 insp. de Obra, 1 SISO, 2 oficios Varios, 8 ayudantes, 1 oper Bobcat.
Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se continuo con la instalacion de Bordillos prefabricados en el tramo T4 en ambos lados entre absc K0+075,19 - K0+030
- tambien se continuo con el suministro de bordillos en tramo T5.

Powered by CamScanner

Frentes Martinez Tramos T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Mañana Soleada, lluvias por la tarde.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 SISO, 1 Comisión Topografica, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Motoniveladora 2 oficios Varios, 8 ayudantes.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo liberación de Capa afirmado por topografia a la interventoria entre absc Ko+200 a la ko+180. T2
- Se realizo Suministro e instalacion de Material Sub base granular entre absc Ko+200 a la ko+190. tramo T2
- Se realizo liberación por topografia a Sub base y Filos entre absc Ko+200 a la ko+190 Interventoria tramo T2.
- Se realizo fundida de Pavimento entre absc Ko+210 a la Ko+190. tramo T2 Martinez.
- Se realizaron 2 Muestras de toma de resistencia.

* Domingo 18 de junio de 2023
No se realizo ningun tipo de actividad.

* Lunes 19 de junio de 2023. F.
No se realizo ningun tipo de actividad.

Powered by CamScanner

* Martes. 20 de junio de 2023.

Frentes chuchunbi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en Obra: 1 ing Residente, 1 Sso, 2 oficios Varios, 4 ayudantes
1 inspector de obras.
Equipos: Herramientas Menores, Motobomba.

Actividades: El dia de hoy se realizaron excavación de aguas del tramo A3 sector 20 de julio, el cual el producto de aguas lluvias y aguas del nivel freatico, estas actividades se han visto afectados. sus rendimientos.
- Se Continua con la instalación de bordillos Prefabricados en el tramo chuchunbi lado derecho desde Km +1[illegible]0. y lado izquierdo desde Km +450 a la Km +350.

Frente Media tapa
Este frente Continua sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades pendientes por ejecutar.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 insp. de obra, 1 Siso, 8 ayudantes, 1 oper Bobcat.
Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menr.

Actividades: El dia de hoy se inicio excavacion Manual para instalacion de bordillos en el tramo T5 martinez.
- tambien se Continuo con el Suministro de bordillos.
En el tramo T4 se Continuo con la pega de juntas. a bordillos de ambos lados.

Powered by CamScanner

Frentes frentes Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comisión topografica,
2 oficiales Varios, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat,
1 oper Motoniveladora.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel,
1 estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la excavación Mecanica entre abs Km+180 a la Km+150 frente T2.

* Miercoles 21 de Junio de 2023

Frentes chuchurubi y 20 de julio.
Estado del Tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 inspector de Obras, 4 ayudantes, 2 oficiales Varios,
1 oper. Bobcat,
Equipos: 1 Bobcat, 1 Motobomba, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo evacuación de aguas en el Sector A3 20 de julio, y se retiro material lodo.
- En el frente de chuchurubi no se realizo ningun tipo de actividad. Se le pide celeridad al Contratista en las actividades.

Frente Media Tapa.
Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, Se le pide Celeridad al Contratista en las actividades Pendientes Por ejecutar Como Son: instalación de bordillos, sellado de juntas, Construccion de Cunetas y desvios.

Frentes Tramos Martinez T4 y T5

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 insp. de obra, 8 ayudantes, 1 Siso, 1 oper Bobcat, 1 oficios Varios.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo y finalizo Con la instalacion de bordillos en el tramo T4, y sus respectivas Pegas de juntas.
- En el tramo T5 se Continuo Con el Suministro e instalacion de bordillos prefabricados.

Frentes Tramos Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 1 Comision topografica, 2 oficios Varios, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compct, 1 oper Motoniveladora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se recibio por topografia de la interventoria nivel de excavación entre obsc K0+180 a la K0+150.
- Tambien se realizo Suministro e instalación de material afirmado en primera capa entre obsc K0+180 a la K0+150 tramo T2. martinez.

* Jueves 22 de Junio de 2023

Frentes chuchumbi y 20 de Julio.

Estado del tiempo: Dia Nublado


Personal en obra: 1 insp. de Obra, 1 Siso, 6 ayudantes, 20 oficios Varios, 1 oper Bobcat,

Powered by CamScanner

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.


Actividades: El día de hoy se realizo Suministro e instalacion de Material Sub base entre obra Ko+455,67 a la Ko+420.

- Se realizo instalación de geotextil en el tramo A3 entre obra Ko+370 a la Ko+350 con todo el ancho de la via, y se Suministro e instalo Material afirmado.
- En el tramo de Chuchurubi & Continuo Con la instalación de bordillos prefabricados en el lado izquierdo.



Frente Media tapa.

Este frente Continua Sin realizar ningun tipo de actividad, se le Pide Celeridad al Contratista en las actividades faltantes por ejecutar.




Frentes tramos Martinez T4 y T5

Estado del tiempo: Dia Nublado

Personal en obra: 1 resp. de obra, 8 ayudantes, 1 Bobcat oper, 1 oficios Varios.

Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con el Suministro e instalación de bordillos Prefabricados en el tramo T5 lado izquierdo.



Frentes tramos Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Nublado

Personal en obra: 1 ing Residente, 1 Siso, 1 comision Topografica, 2 oficios Varios, 8 ayudantes, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Motoniveladora,

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Powered by CamScanner

Actividades: Se Continuo y fudizo con la extension y Suministro de Material afirmado en Segundo Capa entre obsc Ko+180 a la Ko+150. tramo T2 martinez

- Se Realizo toma de densidad a afirmado por el Contratista en la abs Kot160. la Cual dio 94.7% Cumpliendo. tramo T2
- Se recibio por Parte de la interventoria a Capa de afirmado entre abs Kot180 a la Ko+150.
- Se realizo Suministro e instalación de Sub base granulares entre abs Ko+180 a la Ko+150. en tramo T2.
- Se recibio por Parte de la interventoria a capa de Sub base y riebs entre obsc Ko+190 a la Ko+150.
- Se realizo fundida de Pavimento en tramo T2 entre obsc Ko+190 a la Ko+150.
- Se tomaron 2 Vigas Para resistucia del Concreto.
- Se tomo densidad en Sub base en la abs Ko+150 la Cual dio 98.6% Cumplio

* Viernes 23 de Junio de 2023.

frentes chuchumbi y 20 de Julio.

Estado del tiempo: Dia Nublado

Personal en obra: 8 ayudantes, 1 insp de obras, 1 Sisa, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 1 Comisionntopografia

Equipos: 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores.


Actividades: El dia de hoy se realizo Compactacion a Sub base granular en el tramo A3 del 20 de julio entre obsc Kot455,67 a la Ko+420.

- Se Continuo con la instalacion de bordillos en el tramo chuchumbi Lado izquierdo
- las actividades se vieron afectadas debido a las fuertes lluvias presentadas en la noche.

iniciando actividades despues de medio dia.


Powered by CamScanner

Frente Media tepe.
Este frente continua sin realizar ningun tipo de actividad.



Frentes Tramo Martinez T4 y T5.
Estado del tiempo: Dia Nublado
Personal en obra: 1 insp. de obra, 1 fiel, 2 ayudantes, 1 oficial Varios.
Equipos: Herramientas menores.


Actividades: El dia de hoy se continuo con la instalacion de bordillos lado izquierdo tramo T5.



Frentes Tramo Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Nublado
Personal en obra: 1 ing Residente, 1 fiel, 1 Comision topografica, 2 oficiales Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 Bobcat, 2 ayudantes.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Corte de puntas a nivel entre absc K0+190 a K0+170. tramo T2.
- Tambien se Continuo con la excavacion mecanica entre absc K0+150 a la K0+100.
- Estas actividades se vieron afectadas por las lluvias presentadas en la noche ya que iniciaron despues de medio dia las labores de excavación.



*Sabado 24 de Julio de 2023.

Frente chuchurubí y 20 de julio.
Estado del tiempo: Día Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 Comision topografica, 20 focos Varios, 12 ayudantes, 1 insp de obras, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat.

Equipos: 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.


Actividades: El día de hoy se recibio por Parte de la topografia de interventoria nivel de riegos y Sub base granular entre abs Kot 455,67 a la Ko+420 en el tramo A3.
- tambien se realizo toma de densidad por Parte del Contratista en la abs Kot de Cap Sub base la Cual dio Cumpliendo.
- Se realizo finalde de Pavimento hidraulico entre abs Kot 455,67 a la Ko+425. en el tramo A3.
- Se continuo con el Suministro e instalacion de bordillos en el tramo chuchurubi lado izquierdo.

Frente Media tapa.
En este frente no se este realizado ningun tipo de actividad. Se le Solicita al Contratista calendar en las actividades pendientes x ejecutar.

Frentes tramos Martinez T4 y T5
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 6 ayudantes, 1 insp de obra, 1 siso


Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se continuo con el Suministro e instalación de bordillos Prefabricados en el lado izquierdo tramo T5. Martinez.




Frentes tramos Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 SISO, 2 oficios Varios, 1 oper Motoniveladora, 1 Comision topografica.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Nivel, 1 Estacion, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se continuo con la excavación Mecanica en el tramo T2 entre absc K0+150 a la K0+100.



* Domingo 25 de junio de 2023
No se realizo ningun tipo de actividad.



* Lunes 26 de junio de 2023

Frentes chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Nublado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 SISO, 1 Comision Topografica, 1 oper Bobcat, 1 Insp. de Obra, 4 ayudantes, 3 oficios Varios, 1 oper Vibro Compactador.


Equipos: 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación,

Powered by CamScanner

1 Motobomba, Herramientas Menores.


Actividades: El día de hoy se realizo excavacion manual para instalacion de bordillos en el tramo de chuchurubi.

- En el tramo A3. sector 20 de julio en la mañana se realizo evacuacion de aguas debido a las lluvias presentadas en la noche, por la tarde se retiro el material lodo y se suministro y extendio material afirmado entre absc Ko+420 a la Ko+375.



Frente Media Tapa.

En este frente se continua sin realizar ningun tipo de actividad.




Frente Tramo Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Nublado

Personal en obra: 1 insp. de obra, 1 oper Bobcat, 8 ayudantes, 1 Chofer.


Equipos: 1 Bobcat, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se continuo con la instalacion de bordillos lado derecho en el tramo T5 martinez.



Frente tramo Martinez T2, T2' y T7.

El dia de hoy no se realizo ningun tipo de actividad en este frente, se realizo evacuacion de aguas debido a las lluvias presentadas en la noche del domingo.



Powered by CamScanner

* Martes 27 de junio de 2023

Frentes chuchurubi y 20 de julio.

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en Obra: 1 Ing Residente, 1 Inso, 1 Comision Topografica, 1 oper. Vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 8 ayudantes, 2 oficios Varios, 1 insp de Obra, 4 ayudantes bordillos.

Equipos: 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas menores.

Actividades: Se Continuo Con la excavación e instalación de bordillos en el frente chuchurubi ambos lados.

- El dia de hoy Se realizo liberación a nivel de afirmado Por topografia de interventoria entre absc Ko+420 a la Ko+385 en el frente A3 de 20 de julio.
- Se realizo instalacion de Sub base granular entre abs- Ko+420 - K+385 en el frente A3. de 20 de julio.
- Se realizo liberación a nivel de Sub base y niveles Por topografia de interventoria entre absc Ko+420 a la Ko+385 en el frente A3 de 20 de julio.
- Se realizaron toma de densidades en Capa de afirmado en la absc Ko+390. la Cual dio 70,2% Cumpliendo.
- Se realizo toma de densidades en Capa de Sub base en la absc. Ko+390. la Cual dio 96,5% Cumpliendo.
- Se realizo fundida de Pavimento hidraulico entre absc Ko+425 a la Ko+385. en el frente A3 de 20 de julio.

Frente Media Tapa.

En este frente se Continua sin realizar ningun tipo de actividad.

Powered by CamScanner

Frente tramo Martinez T4 y T5
Estado del Tiempo: Día Soleado
Personal en obra: 1 insp. de obra, 6 ayudantes, 1 fiso.
Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El obra de hoy se Continuo con la instalacion de bordillos prefabricados lado derecho tramo T5 martinez.

Frente tramo Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Día Soleado
Personal en obra: 1 Oper. Motoniveladora, 1 ing Residente, 1 fiso.
1 Comisión topografica, 1 oper Bobcat, 1 oper Vibro.
1 oficios Varios.
Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel,
1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se recibio excavación por topografia de interventoria entre absc K0+150 a la K0+110.
- Se realizo Suministro e instalación de Material afirmado en primera y Segunda capa entre absc K0+150 a la K0+110. tramo T2. Martinez.

* Miercoles 28 de junio de 2023.


Frentes chuchembi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Día Soleado
Personal en obra: 1 insp de obra, 1 fiso, 6 ayudantes, 1 oficios Varios,
1 oper Bobcat, 1 Comision topografica, 1 ing Residente
Equipos: Herramientas Menores; 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación.

Actividades: El día de hoy se Continuo con la excavacion e instalacion de bordillos Prefabricados en ambos lados en el tramo.

Powered by CamScanner


de Chuchurubi.

- Se Continuo con el Suministro e instalacion de Material afirmado en el tramo A3 20 de julio entre absc Ko+380 a la Ko+340.



Frente Media Tapa.

En este frente se Continua sin realizar ninguna tipo de actividad.



Frente Tramo Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 insp de obra, 4 ayudantes, 1 Siso

Equipos: Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con el Suministro e instalacion de bordillos prefabricados lado izquierdo tramo T5 Martinez.

- Nota: Se le solicita al SST del Contratista que señalice los bordillos que se encuentran al lado de la via para asi evitar un accidente.



Frente Tramo Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Oper Motoniveladora, 1 ing Residente, 1 oper Vibro Compactador, 1 Siso, 1 Comision topografica, 6 ayudantes, 20 fincas Veños. 1 oper Bobcat.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se recibio a Capa de afirmado por topografia de interventoria entre abscs Ko+150 a la Ko+110, tramo T2

- Se realizo toma de densidad por Parte del Contratista a Capa de afirmado la Cual dio 94,7% en la absc Ko+130. la Cual Cumplio.
- Se realizo Suministro e instalacion de Material Sub base granular entre absc Ko+150 a la Ko+110 tramo T2. nuevamente.

Powered by CamScanner

- Se recibio capa de sub base granular y niveles a nivel por topografia de interventoria entre absc Ko+150 a la Ko+110 en tramo T2. Martinez.
- Se realizo toma de densidades a capa de sub base granular por parte del Contratista en la absc Ko+125. la Cual dio 98,1% Cumplido.
- Se realizo fundida de pavimento hidraulico entre absc Ko+150 a la Ko+110 tramo T2. Martinez.
- Se tomaron 2 vigas para resistencia de Concretos.

* Jueves 29 de junio de 2023.

Frentes Chuchurubi y 20 de julio.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 oper Bobcat, 1 ing Residente, 12 ayudantes, 2 oficios Varios, 1 Comision topografica, 1 oper Vibro Compactador,

Equipos: 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continua Con la excavacion e instalacion de Bordillos prefabricados en el lado derecho tramo Chuchurubi.
- Se realizo liberación de Capa afirmado por interventoria topografia entre abs Kot 310 a la Ko+340.
- Se tomo densidad por parte del Contratista en la absc Ko+350 en Capa de afirmado la Cual dio 94.0% Cumpliendo.
- Se realizo Suministro e instalación de Material Sub base granular y su debida Compactación entre absc Ko+380 a la Ko+340.
- Se tomo densidad por parte del Contratista en la abs Ko+ en Capa Sub base granular. la cual dio % Cumpliendo.
- Se realizo liberación a Sub base granular y niveles por interventoria topografia entre abse Kot 380 a la Ko+340.
- Se realizo fundida de pavimento hidraulico entre abs Kot 385 a Ko+340 tramo A3 20 de julio.

Powered by CamScanner

Frente Media tapa.

En este frente se Continua sin realizar ningun tipo de actividad, se le pide celeridad al Contratista en las actividades Pendientes por ejecutar.

+ .

Frente tramo Martinez T4 y T5.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 insp. de obras, 6 ayudantes, 1 Sisa.

Equipos: Herramientas Menors.

Actividades: El dia de hoy se Continua Con la instalacion de bordillos prefabricados lado Izquierdo tramo T5. Martinez.

+ .

Frente tramo Martinez T2, T2' y T7.

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing. Residente, 1 SSO, 1 oper Motoniveladora, 1 oper. Bobcat, 1 Comision Topografica, 2 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estacas, Herramientas Menors.

Actividades: El dia de hoy se Continua con la excavacion Mecanica entre absc Ko+100 a la Ko+060. tramo T2 Martinez.

+ .

* Viernes 30 de junio de 2023.

Frentes chuchurubí y 20 de julio.
Estado del tiempo: Día Soleado.
Personal en obra: 1 insp. de obras, 1 Siso, 5 ayudantes, 1 ofic. Varios, 2 ayudantes, 1 Comisión topográfica.
Equipos: Herramientas Menores, 1 nivel, 1 Estación.

Actividades: El día de hoy se continuo con la toma de juntas y excavación para instalación de bordillos prefabricados en el frente de chuchurubí.
- Se realizo Corte de junta a pavimento entre abs Km 345 a la Km 340 frente A3 sector 20 de julio.

Frente Media Tapa.
Este frente continua sin realizar ningun tipo de actividad.

Frente frente Martinez T4 y T5.
Estado del tiempo: Día Soleado
Personal en obra: 1 insp. de obra, 6 ayudantes, 1 Siso.
Equipos: Herramientas Menores.


Actividad: El dia de hoy se continuo con la instalacion de bordillos prefabricados todo izquierdo en el frente T5. martinez.


Powered by CamScanner

Frente Tramo Martinez T2, T2' y T7.
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 oper Motoniveladora, 1 oper Vibro Compactador, 1 oper Bobcat, 1 Comision Topografica, 2 oficios Varios.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat, 1 Nivel, 1 Estación, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se Continuo con la excavacion Mecanica entre abs Km 100 a la Km 000 en el frente T2 Martinez.





* Sabado 1 de julio de 2023.

Frentes Chuchurubí y 20 de Julio
Estado del tiempo:

Powered by CamScanner
