INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INFORME MENSUAL IM- 22

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CERETE, CÓRDOBA

OCTUBRE DE 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATO 001 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME MENSUAL IM- 22

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ACI-3B

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES

COTORRA 2021

CERETE, CÓRDOBA

OCTUBRE DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 001 de 2022 **Contratista:** CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

Contrato de Interventoría No. 2276 DE 2021 **Interventoría:** CONSORCIO ACI-3B

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

INFORME MENSUAL No. 22 **MES O PERIODO:** OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Portada Informe		1
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	5
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		18
3.1	Información general del contrato		18
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		19
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		20
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		20
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		21
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	22
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	22
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	23
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	23
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	23
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	24
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	24
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		24
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	24
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	24
	• Seguimiento Programa de Obra		24
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	24
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	24
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	24
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	24
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		25
5.1	Información general del contrato		25
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		26
5.3	Informes especialistas y profesionales		26
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		26
5.5	Informe matriz de riesgos.		26
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		27
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		27
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		27
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	27
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	27
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	28
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	28
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	28
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		28
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	28
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	28
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	28
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	28
7	**Conclusiones y recomendaciones**		29
8	**Anexos**		30
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		30
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		30
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		30
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		30

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 558 de fecha 17 de Febrero del 2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Revisó Jesus D Salgado H
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	31-oct-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 001 de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 17/02/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2023
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.847.000.210
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 1.423.000.105,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 4.270.500.315,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	2240
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	0	1630
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.220.888.630		$ 4.220.888.630
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.928.400	$ 3.026.396,00	18.954.796,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 30.656.889		$ 30.656.889
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.267.473.919	$ 3.026.396	4.270.500.315,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 318.038.962,20		318.038.962,20	3.211.693.768,20
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 18.954.796,00		$ 18.954.796,00	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 336.993.758,20		$ 336.993.758,20	$ 3.211.693.768,20

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 3.204.168.688
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 3.211.693.768,20
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,18%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 6

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Vía paso de las flores - Villa nueva. Se realizan excavaciones Tramo nuevo k0+380 al K0+140	**Vía paso de las flores - Villa nueva. Se extiende material de sub base del k0+300 al K0+000**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Con el objeto de mejorar la calidad de la infraestructura vial de nuestro país, el Gobierno Nacional viene implementado diferentes estrategias encaminadas al logro de ese objetivo, es así como en el sector de la red terciaria, dentro del programa "Colombia Rural" por medio de INVIAS, se suscribieron convenios con los municipios del país con el objeto de ejecutar actividades de mejoramiento, conservación y mantenimiento a sus diferentes vías, donde la entidad aporta los recursos que se requieren para su ejecución que atienda los documentos técnicos, normas y especificaciones requeridas.

La necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se encuentra en los Estudios Previos suscritos por el subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales forman parte del presente documento.

El instituto Nacional de Vías INVIAS mediante Resolución Número 4218 del 21 de diciembre de 2021, realizo la apertura del Concurso de Méritos No. CMA-DO-SRT-167-2021 para contratar la interventoría cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el mejoramiento, de vías terciarias del Programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Córdoba".

El presente documento contiene el informe Mensual de Interventoría No. 16, el cual tiene por objeto describir en forma detallada cada una de las actividades realizadas tanto por el contratista de obra como por la Interventoría, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Cotorra está localizado en el norte del departamento de Córdoba, en un relieve constituido por suelo de formación fluvio-lacustre correspondiente al complejo lagunal de la zona baja de la cuenca hidrográfica del rio Sinú.

Su superficie abarca una extensión de territorial de 8778.55 hectáreas, con coordenadas 9º 2’ 21.35’’ latitud norte y 75º 47’ 25.84’’ longitud oeste, respecto al Meridiano de Greenwich. Aproximadamente, solo 665 Ha del territorio pertenece al área urbana, el resto (8113 Ha) pertenece a suelo rural distribuidos en 8 corregimientos: Abrojal, El paso de las Flores, La Culebra, Las Arepas, Los Cedros, Los Gómez, Moralito y Trementino.

El municipio de Cotorra limita al norte y al occidente con el municipio Santa Cruz de Lorica; al sur con San Pelayo y al oriente con San Pelayo y Chima. Cotorra está situado a 45 km de Montería, la capital departamental.

Se localiza en zona rural del municipio de Cotorra en el corregimiento paso de las Flores en el sector Guayabal como se muestra en la siguiente imagen. El material que se va a utilizar en este proyecto será suministrado por la cantera las Balsas de Ciénaga de Oro. a continuación, se muestra una imagen general y especifica de la ubicación de la vía en el municipio de Cotorra, departamento de Córdoba

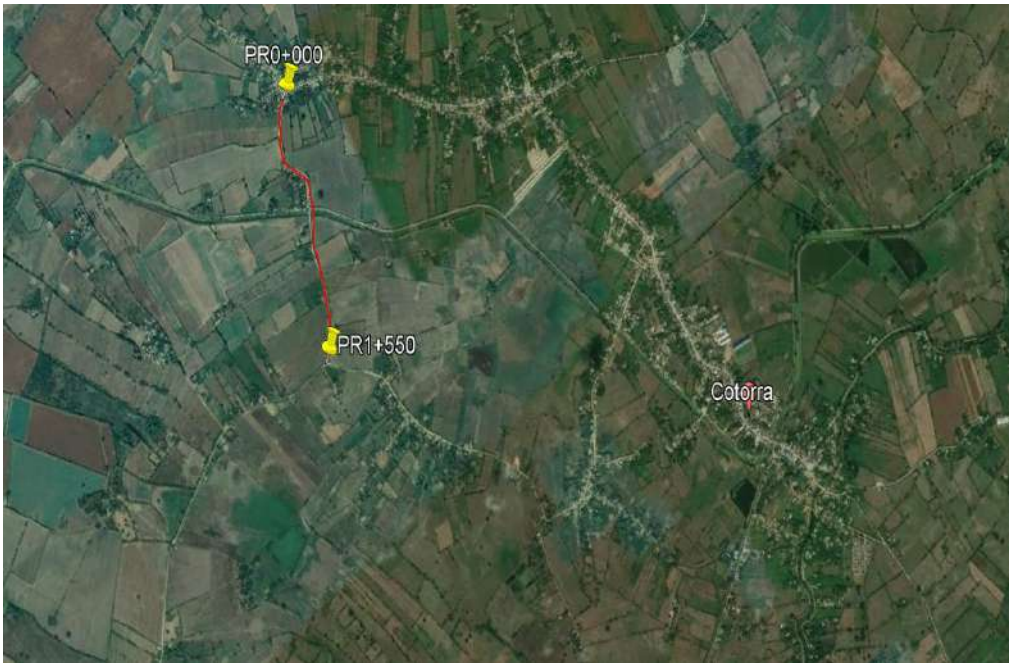


Figura 1 Localización General del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia

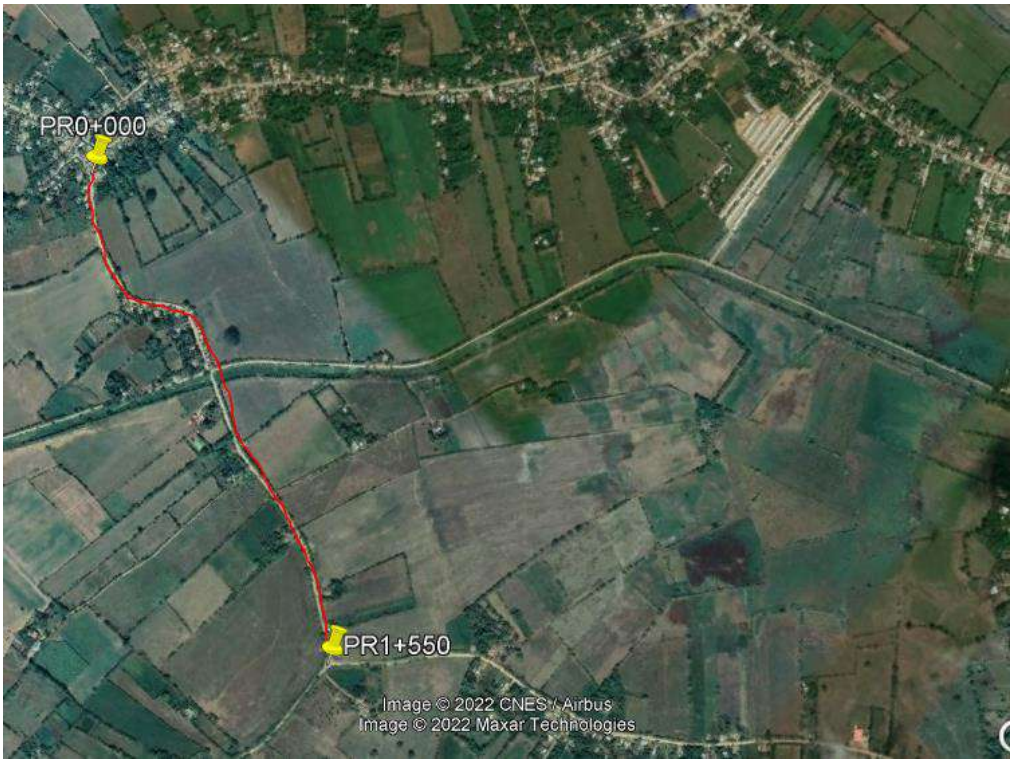


Figura 2 Localización específica de la vía a diseñar.
Fuente: Elaboración propia

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCÍON DEL PROYECTO.

Este proyecto cuenta con varios municipios que hacen parte de la zona de influencia, limitando al norte y noroeste con Lorica, al sur y el oeste con San Pelayo y por el noroeste con Chima, Los cuales se ven beneficiados con la realización de este proyecto, ya que estos permiten la unión entre las cabeceras municipales.

De esta manera se potencia el intercambio comercial y se fortalece la economía nacional, reduciendo también los costos operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando en tiempo y contaminación del ambiente y en consecuencia brindando más impulso económico de la zona por donde atraviesa dicho proyecto.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La vía se encuentra en afirmado en regulares condiciones, debido a que su capa de rodadura se ha desgastado por la falta de mantenimiento periódico y rutinario, no se han atendido los puntos críticos aunado al tránsito de vehículos pesados, lo que conlleva a daño en vehículos particulares, baja transpirabilidad y largos periodos de desplazamiento; notándose deterioros generalizados como ondulaciones, ahuellamiento, pérdida de grava y baches.

Tabla 1.

	
El paso de las flores y villa nueva, vía solo con actividad de excavación K0+500	El paso de las flores y villa nueva, Vía con sub base K0+ 500
	
El paso de las flores y villa nueva, vía solo actividad de excavación K0+420	El paso de las flores y villa nueva, Vía con material de sub base K0+420

Fuente: Elaboración propia

2.4 CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto en general consiste en la construcción de dos tramos en pavimento rígido de 1550 ml más 1140 ml de adición con ancho de estructura de 6m, con bordillos prefabricados en ambos lados, una capa de afirmado con un espesor de 0.3 m y subbase con un espesor de 0.20 m como se muestra en la siguiente imagen.

Tabla 2.

Localización de los tramos de pavimento.

LOCALIZACIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO			
TRAMO	**LONGITUD DE VIA (m)**	**INICIO DE TRAMO (ABSCISA)**	**FIN DEL TRAMO (ABSCISA)**
1	440	K0+000	K0+440
2	640	K0+800	K1+460

A continuación, se visualizan el espesor de cada capa.

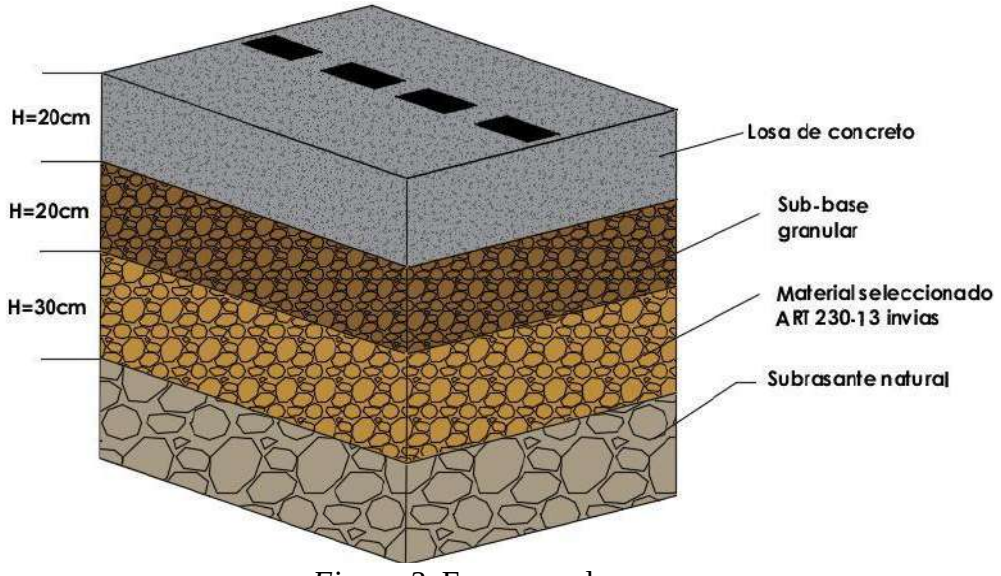


Figura 3. Espesores de capas
Fuente: Diseños

Tabla 3.
Especificaciones de proyecto

Nomenclatura Catastral	**Ancho de calzada (m)**	**Bordillo (m)**	**Longitud del tramo (m)**	**Funcionalidad**	**Tipo de terreno**
Paso de las Flores - Villa nueva	6	0.2	1550	Terciaria	Plano

Fuente:

En este proyecto se presentó un CBR<3%, lo cual indica que necesita material seleccionado para mejorar su capacidad portante, para ello se recomiendan capas de mejoramiento en los dos tramos de 30 cm**,** sobre toda el área del tramo correspondiente del proyecto cumpliendo la condición establecida por la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural.

Además, contrarrestaría la posible expansión de los suelos encontrados en condiciones de saturación.

Tabla 4.
Análisis de mejoramiento para cada tramo.

TRAMO	LONGITUD DE VIA (m)	MATERIAL DE MEJORAMIENTO
1	440	30 cm
2	640	30 cm

Fuente:

La valoración de los esfuerzos internos y de bordes, así como el control de esfuerzos por cambio uniforme de temperatura, se consideran adecuados y que cumplen con un proceso de diseño. Se considera losas de concreto de 3.0 metros de ancho por 3.00 metros de largo.

REVISIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEFINIDOS PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO.

Tabla 5.
Características Geométricas

CARACTERÍSTICA	DEFINIDO	OBSERVACIÓN
Tipo de vía	Terciaria	**¡Cumple!**
Tipo de Terreno	Plano	**¡Cumple!**
Velocidad de diseño	40 km/h	**¡Cumple!** Considerando la categoría de la carretera, el tipo de terreno y aplicando la tabla 2.1 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras de INVIAS.
Peralte Máximo	6%	**¡Cumple!**

Fuente:

Tabla 6.
Parámetros de diseño en planta

PARÁMETRO	DEFINIDO	REVISIÓ
Radio Mínimo (Vd= 40 K/h)	43 m.	**¡Cumple!**
Entretangencia mínima curvas de distinto sentido	Cinco (5) segundos a la velocidad específica.	**¡Cumple!**
Entretangencia Mínima Curvas del mismo sentido	Quince (15) segundos a la velocidad específica.	**¡Cumple!**

Fuente:

Tabla 7.
Parámetros de Diseño en Perfil

PARÁMETRO	DEFINIDO	REVISIÓ
Pendiente longitudinal mínima	0.50%	**¡Cumple!**
Pendiente media máxima	7%	**¡Cumple!**
K mínimo curvas cóncavas	4	**¡Cumple!**
K mínimo curvas cóncavas	9	**¡Cumple!**

Fuente:

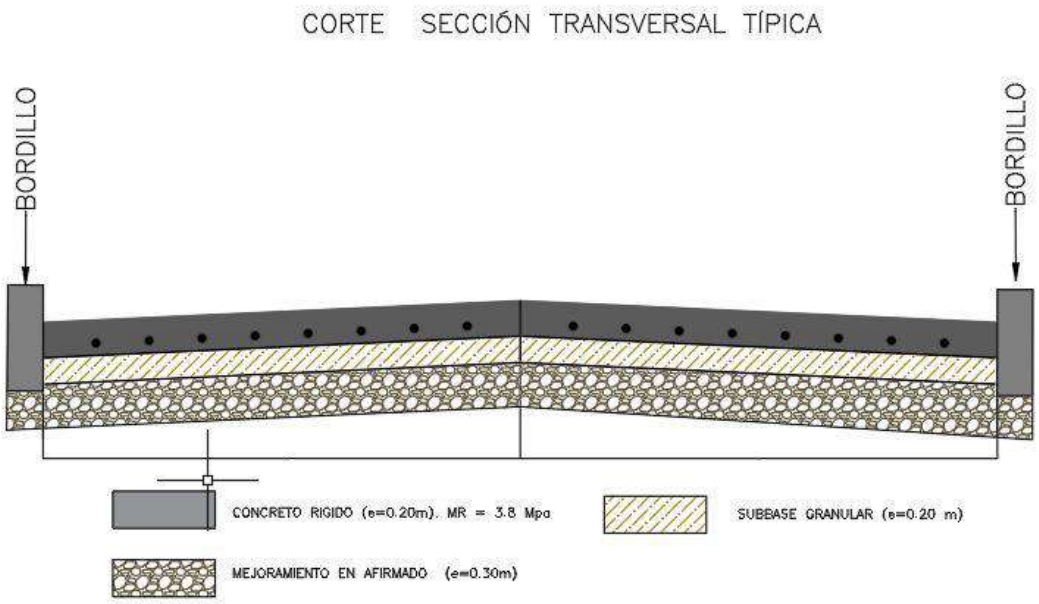


Figura 4. Sección Trasversal de la Vía
Fuente:

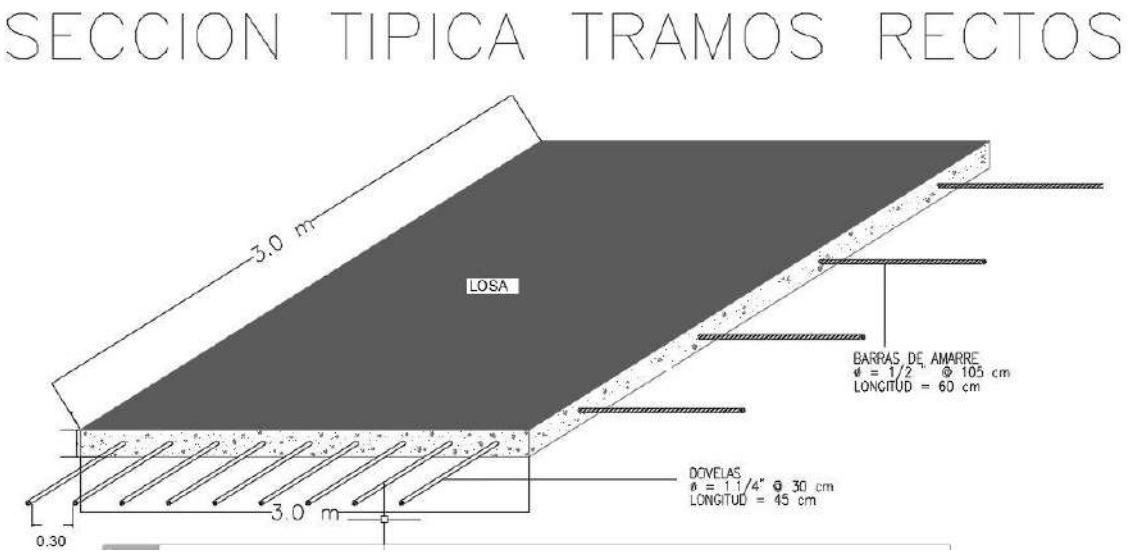


Figura 5. Sección Típica de Tramos Rectos
Fuente:

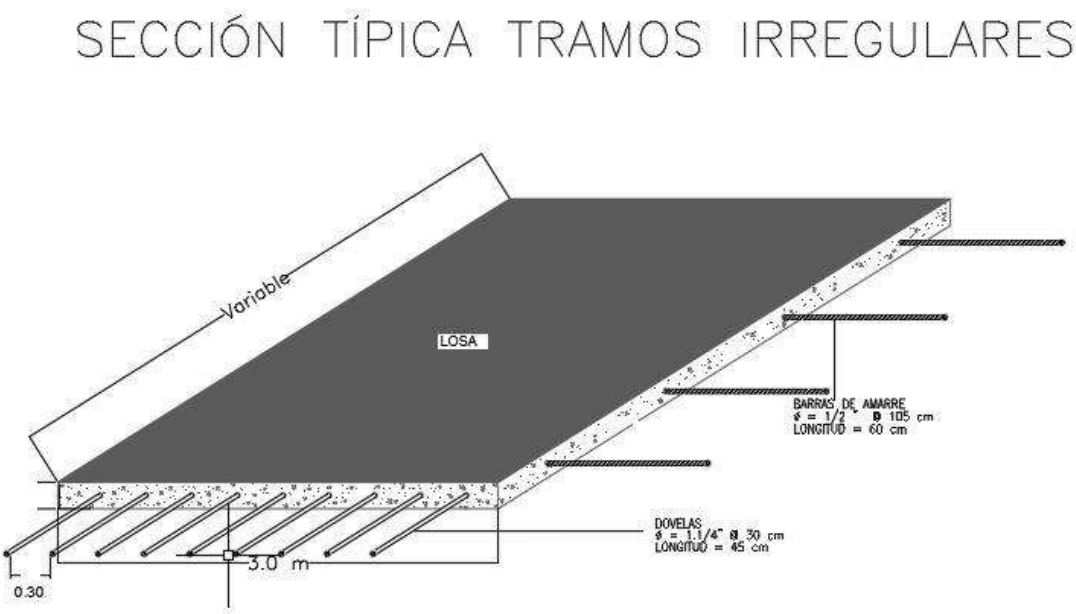


Figura 6. Sección Típica de Tramos Irregulares
Fuente:



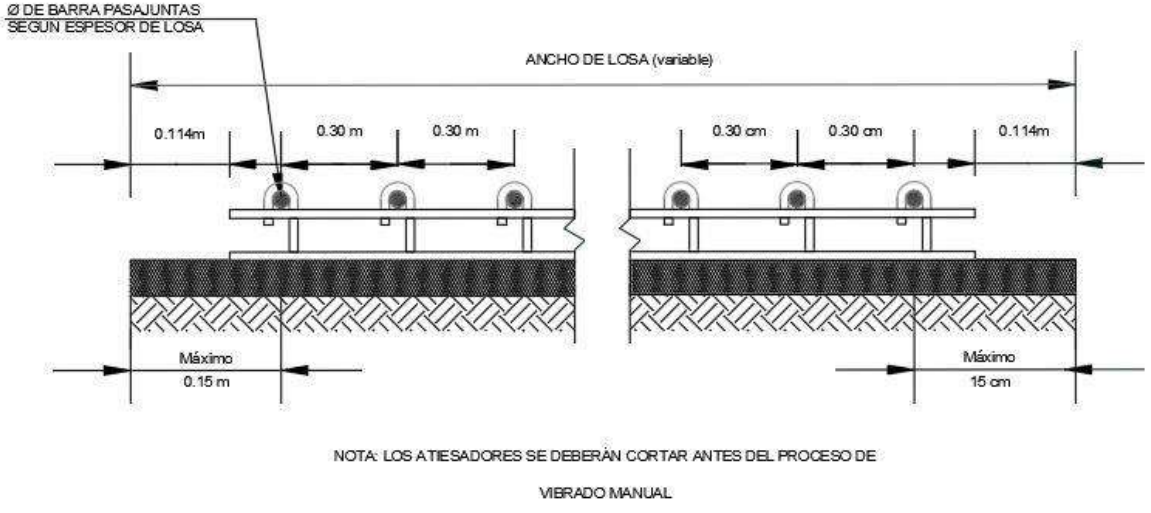


Figura 7. Detalles de Canastillas
Fuente:

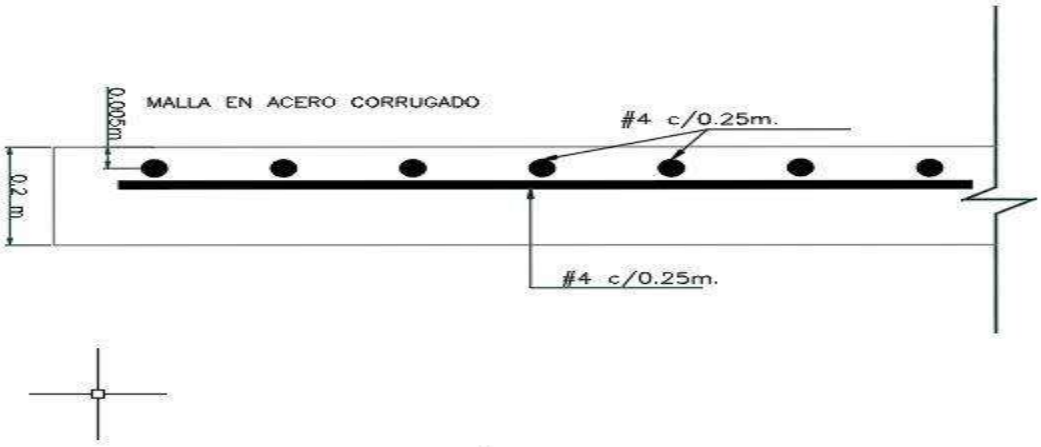

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA MALLA BIDIRECCIONAL
LOSAS IRREGULARES O TRATAMIENTOS ESPECIALES

Figura 8. Detalle de Malla en Losas Irregulares
Fuente:

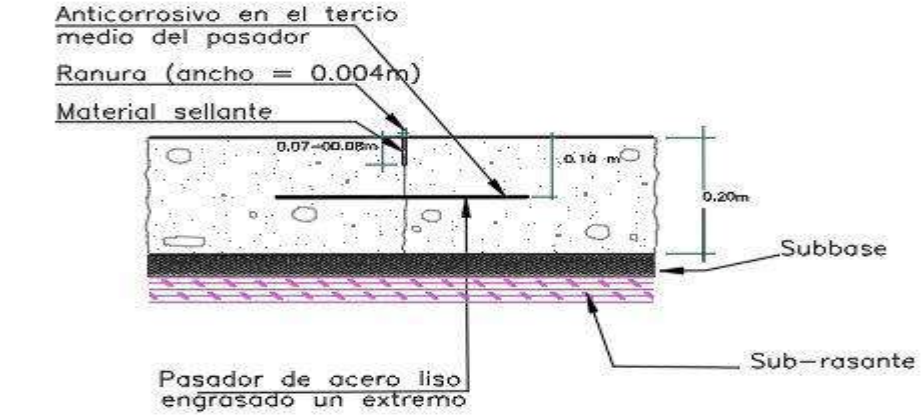

Ø=1" L=35cm @30 cm – Para losas con espesor de 20 cm

DETALLE DE JUNTA TRANSVERSAL CON PASADORES SEGÚN MODELACIÓN

Figura 9. Detalle de juntas transversal con pasadores
Fuente:

Tabla 8.

Parámetros de transición de peralte

PARÁMETRO	DEFINIDO	REVISIÓN
Sección transversal típica	2 carriles de 3.00 m de ancho con bordillos en todo el recorrido.	**¡Cumple!** Considerando la categoría de la carretera, el tipo de terreno y aplicando la tabla 5.2 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras de
		INVIAS.
Berma		No se considera debido a las limitaciones topográficas.
Peralte máximo	6%	**¡Cumple!**
Pendiente máxima de la rampa de peralte	0.96	**¡Cumple!**
Pendiente mínima de la rampa de peralte	0.1xa	**¡Cumple!**

Fuente:

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 9.

Localización del proyecto:	Corregimiento de el paso de las flores y villa nueva
Plazo del contrato de obra:	6 meses
Fecha de inicio del contrato de obra:	17de enero de 2022
Fecha de vencimiento del contrato de obra	31 de julio de 2022
Prorroga No. 1	5 meses
Fecha de vencimiento actualizada del contrato de obra	31 de diciembre de 2022
Prorroga No. 2	6 meses
Fecha de Vencimiento actualizada del contrato de obra	30 de junio de 2023
Prorroga No. 3	6 meses
Fecha de Vencimiento actualizada del contrato de obra	31 de diciembre de 2023
Valor total contrato inicial (IVA incluido):	$ 2.847.000.210
Valor adición del contrato	$ 1.423.000.105
Valor total contrato de obra (IVA incluido)	$ 4.270.500.315,00
Número del proceso de selección	LP - 03- 2021
Integrantes, NIT y porcentajes de participación	4l Ingeniería S.A.S: con el 40% de participación y NIT: 901144628-1 AZ Civil S.A.S: con el 60% de participación y NIT: 900.849.836-1
Fecha de suscripción	
Campamento	Finca la lucha
Dirección contratista	35 # 8ª-04 municipio de montería córdoba
Número de teléfono del contratista	3232862727
Número de contrato	001 de 2022
NIT	901.558.600-3
Contratista de obra:	consorcio vial corredores rurales cotorra 2021
Objeto del contrato de obra	Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos en el municipio de cotorra departamento de córdoba.

Fuente:

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- Excavación Mecánica: Es el conjunto de actividades de excavar, remover, cargar transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación, canales. En el presente mes se continua con excavación de cortes a la explanación entre K0+560 a k0+000 tramo nuevo
- Afirmado: es el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de afirmado sobre la subrasante terminada o sobre un afirmado existente. Se instala material de afirmado del K0+560 a k0+000.
- Transporte: consiste, única y exclusivamente, en el transporte de los materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales. Este material ha sido en su mayoría regalado a la comunidad aferente al proyecto, son muy pocos los viajes llevados al botadero autorizado por la Alcaldía.
- Subbase: Es el suministro, transporte, colocación, humedecimiento, extensión y conformación, compactación y terminado del material de subbase granular aprobada sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. En el presente mes se realizó suministro e instalación de material subbase granular del K1+560 al K0+000
- Concreto Pavimento Hidráulico: Se refiere a la construcción de pavimento de concreto hidráulico con juntas; y consiste en la elaboración, el transporte y el vibrado de una mezcla de concreto hidráulico en forma de losas, con o sin refuerzo; la ejecución y el sellado de juntas; el acabado, el curado y las demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento de concreto hidráulico de acuerdo con los alineamientos, pendientes y

dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecido por el Interventor. Obteniendo en esta actividad una la longitud acumulada hasta la fecha es de 1680 ml.

- Instalación de Bordillos Prefabricados: Los bordillos prefabricados se deben elaborar en piezas de longitud mínima de un metro (1,0 m) y con las formas y demás dimensiones establecidas en los documentos del proyecto. Las piezas se deben asentar sobre el lecho de mortero, siguiendo el alineamiento previsto y se deben colocar dejando entre ellas un espacio de, aproximadamente, cinco milímetros (5 mm), el cual se debe rellenar con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. En el caso de requerir anclajes, estos se deben ceñir a los documentos del proyecto o a lo aprobado por el interventor. En el presente mes no se instalaron bordillos.

A continuación, se presentan las cantidades de obra ejecutadas al corte de este informe.

Tabla 10.

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 318.038.962,20		318.038.962,20	3.211.693.768,20
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 18.954.796,00		$ 18.954.796,00	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 336.993.758,20		$ 336.993.758,20	$ 3.211.693.768,20

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Actualmente el contrato no requiere de actividades no previstas.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Se ha solicitado al Contratista:

- Entrega de las Observaciones del PAGA, el cual el contratista entrego y a la interventoría le realizo unas observaciones la cuales no ha sido subsanadas.
- Retomar actividades de instalación de bordillos.
- Entrega de planillas de seguridad social.
- Entrega de cierre financiero de la fiducia.
- Se le ha manifestado al contratista por medio de oficios el cumplimiento con respecto al personal mínimo requerido en obra.
- Se le solicito al contratista iniciar con el arreglo de las placas fisuradas.
- Responder los oficios y asistir a los comités de obras citados por la Interventoría.

  La acción de la Interventoría es seguir el control y supervisión para que las actividades ejecutadas se hagan bajo las especificaciones técnicas requeridas y así darle buena ejecución a la obra.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se realizaron 5 informes semanales como se indica en el siguiente cuadro (Ver página 31-40).

Tabla 11.

INFORME SEMANAL	FECHA	PAGINA
Informe Semanal 85	Del 29 de septiembre al 05 de octubre de 2023	Pág. 31
Informe. Semanal 86	Del 06 al 12 de octubre de 2023	Pág.33
Informe Semanal 87	Del 13 al 19 de octubre de 2023	Pág.35
Informe Semanal 88	Del 20 al 26 de octubre de 2023	Pág.37
Informe Semanal 89	Del 27 de octubre al 02 de noviembre	Pág. 39

Fuente: Elaboración propia.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Tabla 12.

DESCRIPCION	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACION
MOTONIVELADORA	CHAMPIOM 710A	12 TONELADAS	EL PASO DE LAS FLORES VILLA NUEVA
RETROEXCAVADORA	HITACHI 200 EX	22 TONELADAS	EL PASO DE LAS FLORES VILLA NUEVA
VIBROCOMPACTADOR	XXXXXXXX	8 TONELADAS	EL PASO DE LAS FLORES VILLA NUEVA
MINICARGADOR	CAT 246B	1 TONELADA	EL PASO DE LAS FLORES VILLA NUEVA
VOLQUETAS	INTERNATIONAL	18 M3	EL PASO DE LAS FLORES VILLA NUEVA
VOLQUETAS	INTERNATIONAL	7 M3	EL PASO DE LAS FLORES VILLA NUEVA

Fuente: Elaboración propia

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-4 se encuentra relacionada (Ver página 41).

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Tabla 13.

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA	1067915714	DIRECTOR
2	CARLOS ANDRÉS BAUTISTA FIGUEROA	1065006669	INGENIERO AMBIENTAL
3	RODRIGO ANTONIO MORENO PÁEZ	79506681	INGENIERO RESIDENTE
4	YASBLEIDI ESTER ESPITIA CANTERO	1062675166	SISO
5	YESID RAFAEL PETRO ESPITIA	1062682520	INGENIERO AUXILIAR
6	MARLA DIAZ VEGA	1069499321	TOPOGRAFA

7	GERMÁN GABRIEL GALEANO JULIO	15028290	OPERADOR MOTONIVELAD
8	EDER BORJA PEÑATA	11035460	OPRRADOR RETROEXCAVADORA - VIBRO

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se encuentra relacionada (Ver página 42).

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se relaciona el Estado Financiero y Presupuestal del contrato de obra de las actividades que se programó y se ejecutaron en el mes de marzo, donde el Contratista a la fecha presenta un adelanto, esto debido a que ellos en la reprogramación tienen actividades de excavaciones, instalación de subbase y afirmado y fundida de pavimento y a la fecha están ejecutando actividades de instalación de subbase y fundida de pavimento.

El Contratista ya ha presentado cuatro Actas de Obra No.1, No. 2, No. 3, No. 4, N0. 5, N0.6, N0.7 y N0.8 lleva el 76,09 % en ejecución de la obra. (Ver página 45).

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-10, se encuentra relacionada (Ver página 46).

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En este periodo no se realizaron ensayos de laboratorio, por tal motivo no se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-12 se encuentra relacionada (Ver página 47).

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se relacionan el Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra, pero se adjuntan el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14, se encuentra relacionado (Ver página 49).

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** este contrato si contempla anticipo.
- **FLUJO DE INVERSION:** la inversión se puede ver página (52).
- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA:** El seguimiento al programa de obra se puede ver en la página (51)
- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES:** en octubre de 2023, se tenía previsto una inversión programada de $ 3.204.168.687,62 la cual representa un porcentaje del 75,91% versus una Inversión Ejecutada de $ 3.211.693.768,20 la cual representa un porcentaje del 76,09%, representa un adelanto del 0,18%, de acuerdo con su programación de obra.
- **ACTAS DE COMITÉ DE OBRA:** el Contratista asistió Comité de Obra realizado este mes, esta información se presenta en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1(Ver página 53).
- **ACTAS DE REUNIÓN:** Acta de reunión, en este periodo no se realizaron actas de reunión por lo cual no se relaciona en el Formato MEPI-MN1-IN-14-FR- 2

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	INVIAS
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ACI-3B
CONTRATO No.:	2276 DE 2021
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVAY FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA-GRUPO 4"
LOCALIZACIÓN:	"SAN ANTONIO EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA"
CONTRATISTA	INTERVENTOR CONSORCIO ACI – 3B CON NIT. 901.551.292-6 (INTEGRADO POR ACI PROYECTOS SAS CON NIT. 860.059.851-6 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50 % Y 3B PROYECTOS SAS CON NIT. 900.504.398-4 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%).
DIRECCIÓN Y NUMERO DE TELÉFONO	CR 18 13A 04 APT 301 COLOSINA, BARRIO VENUS ll, CERETÉ, CÓRDOBA / MÓVIL**:** 3134024184
VALOR DEL CONTRATO:	$1.930.530.773
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2022
PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA ACTUALIZADA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA No. 2	6 MESES
FECHA ACTUALIZADA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA No**. 3**	6 MESES
FECHA ACTUALIZADA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR ADICION	$ 965.265.286

VALOR ACUMULADO	$ 2.895.796.059

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La Interventoría realizo las siguientes actividades

- Revisión de la documentación entregada por el Contratista.
- Seguimiento a la instalación de material subbase granular, afirmado, excavación y fundida de pavimento hidráulico.
- Seguimiento al avance de obras registrado en el periodo.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial como el uso de la dotación del personal y control de la señalización en obra.
- Verificación de afiliaciones de personal.
- Realizar informes semanales.
- Llevar control en la bitácora de las actividades diarias.
- Control de equipos del Contratista en obra.
- Control diario del personal en obra.
- Llevar control del estado del tiempo diario.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Debido a las actividades realizadas este mes no se encuentra informe ejecutivo de los profesionales y especialistas.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

El informe de programa anual de CAJA- PAC se encuentra en ejecución.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGO

El Informe de matriz de riesgo se encuentra en ejecución por parte de la Interventoría.

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORA.

De acuerdo con el Sistema de Gestión Documental implementado por INVIAS a través de las fuentes de información que maneja los documentos electrónicos, a la fecha se encuentra en actualización la plataforma CIFRA, por otro lado, la interventoría cuenta toda la información recopilada el DRIVE respecto este contrato.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 15.

DESCRIPCION	MARCA/MODELO
CAMIONETA	DOBLE CABINA, PLACA UGU681, MARCA TOYOTA, CILINDRAJE 2494, MODELO 2015
NIVEL TOPOGRAFICO	MARCA TOPCOM, MODELO AT-B4, SERIE MZ 9945
ESTACION TOPOGRAFICA	MARCA SOKKIA SET 6 SERIE D22852

Fuente:

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se encuentra relacionada (Ver pág.56).

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 16.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
LEONARDO TORO NIÑO	DIRECTOR
CARMELINA OVIEDO RAMOS	RESIDENTE
MARÍA JOSÉ TEHERÁN GUERRA	INSPECTOR SISO
LUIS OROZCO	TOPOGRAFO
DEIMER LOPEZ	CADENERO

DARIO ENRRIQUE CANTERO MENDOZA	CONDUCTOR

Fuente:

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se encuentra relacionada (Ver página 58).

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información correspondiente al MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se encuentra relacionada (Ver página 59).

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información correspondiente MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se encuentra relacionada (Ver página 63).

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se realizó ninguna actividad respecto al MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- Seguimiento a la inversión del anticipo: el contrato de Interventoría no contempla anticipo.
- Plan de cargas o reprogramación al Plan de Cargas Aprobado: Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, la información correspondiste se encuentra anexada. (Ver página 65)
- Seguimiento al Plan de Cargas: Esta información se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN-IN-9-FR-3, sin embargo, no se encuentra anexada.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El día 30 junio de 2023, se le otorgo prorroga al contrato de obra N0. 002 de 2022 por un periodo de 6 meses el cual inicia desde el 01 de julio de 2023 y finaliza el 31 de diciembre de 2023. De acuerdo con la programación entregada por el contratista este tenía previsto una inversión programada de $ 3.204.168.687,62 la cual representa un porcentaje del 75,91% versus una Inversión Ejecutada de $ 3.211.693.768,20 la cual representa un porcentaje del 76,09%, representa un adelanto del 0,18%, de acuerdo con su programación de obra.

- Se le solicita al contratista por medio de oficios y también se ha dejado consignado en los diferentes comités de obra la entrega de un informe de buen manejo de anticipo firmado, rendimientos financieros y un informe de cierre financiero de la fiducia y anexos.
- Se ha reiterado al contratista mediante varias comunicaciones el incumplimiento del personal mínimo del contrato según el anexo técnico contractual, por lo anterior se pasó un informe de incumplimiento para el contratista, se solicita al municipio por medio de oficios y también se ha tocado el tema en el comité de obra N0.16, iniciar proceso sancionatorio al contratista, por el incumplimiento del personal mínimo del contrato según el anexo técnico contractual,
- Se le solicita al contratista por medio de oficios reiniciar con las actividades de bordillos a la menor brevedad posible.
- Se solicitó al Contratista entregar documentación de cierre financiero con la fiducia.
- Se le solicito al contratista presentar a esta interventoría una propuesta para el arreglo de las placas que presentan fisuras y grietas, la cual a la fecha no ha sido presentada.
- Se le informa al contratista que el porcentaje de avance de obra esta disminuyendo por tal motivo de deben tomar medidas para evitar futuros atrasos.
- También se le informa al contratista por medio de oficios que se ha se evidenciada ausencia de personal y cese de actividades en obra.

8.ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

Los documentos anexos de la correspondencia se encuentran relacionada (Ver página 66).

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

Se adjunta registro fotográfico del avance de las actividades ejecutadas en obra (Ver página 73)

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS.

En este periodo no se realizaron actividades sociales ni ambientales.

8.4 BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se encuentra anexada desde la (página 85)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6-oct-23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 85 (Numeración consecutiva) del 29-sept-23 al 5-oct-23

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING.NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRRA DPARTAMENTO DE CORDOBA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : LA META FISICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K21+120 DE LA VIA EL PASO DE LAS FLORES Y VILLANUEVA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCION TIPICA DE 6,0 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL COREDORES RURALES COTORRA 2021		
INTEGRANTES:	4i INGENIERIA S.A.S CON EL 40% DE PARTICIPACIÓN Y NIT: 901144628-1 / AZ CIVIL S.A.S CON EL 60% DE PARTICIPACION Y NIT:900849836-1		
CONTRATO No.	001 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2,847,000,000.00
FECHA DE INICIO:	17/02/22	VALOR ADICIONES:	$ 1,423,000,105
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/22	VALOR ACUMULADO:	$ 4,270,930,515.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/23		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI 36		
INTEGRANTES:	ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 36 PROYECTOS S.A.S CON 50%		
CONTRATO No.	2276 del 2021	VALOR INICIAL:	$ 1,930,530,773.00
FECHA DE INICIO:	28/01/22	VALOR ADICIONES:	$ 965,265,286.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ 2,895,796,059.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,847,000,000.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,930,530,773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4,220,888,630.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2,794,392,321.63	66,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2,943,129,526.00	69,73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (100,258,199.37)	-3,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 15,928,551.00	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,794,392,321.63	66,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,915,577,072.00	69,07%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (121,184,750.37)	-2,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 106,850,988.56	2,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 43,491,007.00	1,03%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,561,664,296.00	88,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,561,664,296.00	88,46%
PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25,472,214.44	0,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25,472,214.44	0,88%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 131,982,551.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 66,20%
Meta Física Ejecutada % 69,73%
Avance o Atraso Físico % 3,52%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)
Estudios y diseños	Unidad	gl	2021	
Box-coulvert	mt	0	2021	
Pavimento concreto	mt	2240	2021	
Señalización	mt		2021	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,00				
Ejec	1,00				
Prog	0			0	
Ejec	0			0	
Prog	1450,0			1500,00	66,20%
Ejec	1650,00			1640,00	68,70%
Prog	0			0	
Ejec	0			0	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
VOLQUETAS	5	5
MINI CARGADOR BOBCAT	1	1
CORTADORA DE PAVIMENTO	1	1
Total	10	10

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PLANTA CANTERA JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	TRONCAL 2 VIA CERETE - CIENAGA DE ORO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CON OBSERVACIONES

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA.	1	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se relazan excavaciones y retiro de material proveniente de estas del K0+560 al K0+380, se instala afirmado del K0+560 al K0+460,Se instala sub base del K+560 al K0+510

El Contratista lleva acumulada las siguientes actividades:

Excavación Mecánica: desde el k0+800 hasta el K1+400 y entre el K0+000 hasta el K0+638; k0+670 a k0+720, K0+720 hasta el K0+800-- Tramo nuevo K0+980 a k0+840, K1+140 a K0+980, K0+840 a K0+740, K0+740 al K0+560, K0+560 al K0+380

Relleno con Material de Afirmado entre el k0+820 a la K1+400 , entre el K0+000 a la K0+640 y entre K0+720 al K0+820 ----Tramo nuevo K0+980 a k0+840,K1+140 a K0+980, K0+840 a K0+740, K0+740 al k0+650, K0+650 al K0+560, K0+560 al K0+460.


Instalación de Material Sub Base Granular: entre el K0+940 a la K1+400 y entre el K0+000 a la K0+640;----- Tramo nuevo K1+140 al K0+940, K0+940 al K0+800, K0+800 al k0+560, K0+560 al K0+510.

Instalación de pavimento hidráulico: entre el K0+940 a la K1+400; y entre K0+000 a la K0+400, K0+440 al K0+420, k0+630 a la K0+610, K0+610 a la K0+540,k0+460 a k0+540,K0+460 al K0+400, k0+580 al K0+583.---- Tramo Nuevo K0+990 al K0+880.k0+990 al K1+140, K0+890 al K0+640, K0+640 al K0+620, K0+620 al K0+600.

Instalación de Bordillos Prefabricados entre abscisas K0+020 a la K0+400 lado izquierdo; entre k0+020 a la k0+120 lado derecho, k0+120 al k0+170 lado derecho, K0+170 al k0+220 derecho, K0+170 al k0+220 lado izquierdo, K0+220 al K0,300 lado derecho, K0+300 al K0+340, k1+400 al K1+470, del K1+300 al K1+370

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las Actividades de excavación, cargue de material proveniente de las excavaciones e instalación de afirmado, sub base y pavimento.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vía paso de las flores - Villa nueva. El contratista realiza localización y replanteo Tramo nuevo K0+000 al K0+500



Vía paso de las flores - Villa nueva. Se realizan excavaciones Tramo nuevo K0+560 al K0+460



Vía paso de las flores - Villa nueva. Se realiza extiende material de afirmado Tramo nuevo K0+560 al K0+460

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría le reitera al contratista que debe hacer entrega de las observaciones del PAGA, cumplir con el personal mínimo requerido en obra, por el cual se inició un proceso de incumplimiento, el contratista presenta un adelanto del 2,49 %, también se le ha venido solicitando al contratista hacer entrega de los documentos del cierre financiero con la fiducia, continuar con el sello de juntas, arreglo de placas que presentan fisura y reiniciar con la actividad de instalación de bordillos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: LEONARDO JORO NIÑO

Matricula Profesional No. 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13-oct-23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 86 (Numeración consecutiva) del 6-oct-23 al 12-oct-23

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING.NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRRA DPARTAMENTO DE CORDOBA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : LA META FISICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K21+120 DE LA VIA EL PASO DE LAS FLORES Y VILLANUEVA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCION TIPICA DE 6,0 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-36
INTEGRANTES:	4 INGENIERIA S.A.S CON EL 40% DE PARTICIPACION Y NIT: 901144026-1 / AZ CIVIL S.A.S CON EL 60% DE PARTICIPACION Y NIT:900649836-1	INTEGRANTES:	ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 36 PROYECTOS S.A.S CON 50%
CONTRATO No.	001 DE 2022	CONTRATO No.	2276 del 2021
FECHA DE INICIO:	17/02/22	FECHA DE INICIO:	28/01/22
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/22	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/23	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	
VALOR INICIAL:	$ 2.847.000.000,00	VALOR INICIAL:	$ 1.930.530.773,00
VALOR ADICIONES:	$ 1.423.000,105	VALOR ADICIONES:	$ 965.265.286,00
VALOR ACUMULADO:	$ 4.270.500.315,00	VALOR ACUMULADO:	$ 2.895.796.059,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.847.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.930.530.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.220.888.630,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.855.970.465,39	67,66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.122.754.481,20	73,98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (100.258.196,57)	-6,32%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 15.928.551,00	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.794.392.321,63	66,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.915.577.072,00	69,07%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (121.184.750,37)	-2,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 61.478.143,76	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 179.624.953,20	4,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.587.136.511,00	89,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.587.136.511,00	89,34%
PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.472.214,44	0,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.472.214,44	0,88%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 131.982.551,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 67,66%
Meta Física Ejecutada % 73,98%
Avance o Atraso Físico % 6,32%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)
Estudios y diseños	Unidad	gl	2021	
Box-coulvert	mt	0	2021	
Pavimento concreto	mt	2240	2021	
Señalización	mt		2021	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,00				
Ejec	1,00				
Prog	0			0	
Ejec	0			0	
Prog	1450,0			1600,00	67,66%
Ejec	1650,00			1740,00	73,98%
Prog				0	
Ejec	0			0	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
VOLQUETAS	5	5
MINI CARGADOR BOBCAT	1	1
CORTADORA DE PAVIMENTO	1	1
Total	10	10

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PLANTA CANTERA JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	TRONCAL 2 VIA CERETE - CIENAGA DE ORO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CON OBSERVACIONES

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se relazan excavaciones y retiro de material proveniente de estas del k0+380 al K0+140, se instala afirmado del k0+460 al K0+220.,Se instala sub base del.k0+510 al k0+310,Se instala concreto para pavimento del k0+600 al K0+540

El Contratista lleva acumulada las siguientes actividades:

Excavación Mecánica: desde el k0+800 hasta el K1+400 y entre el K0+000 hasta el K0+638; k0+670 a k0+720, K0+720 hasta el K0+800-- Tramo nuevo K0+980 a k0+840, K1+140 a K0+980, K0+840 a K0+740, K0+740 al K0+560, K0+560 al K0+380, k0+380 al K0+140

Relleno con Material de Afirmado entre el k0+820 a la K1+400 , entre el K0+000 a la K0+640 y entre K0+720 al K0+820 ----Tramo nuevo K0+980 a k0+840,K1+140 a K0+980, K0+840 a K0+740, K0+740 al k0+650, K0+650 al K0+560, K0+560 al K0+460, k0+460 al K0+220.


Instalación de Material Sub Base Granular: entre el K0+940 a la K1+400 y entre el K0+000 a la K0+640;----- Tramo nuevo K1+140 al K0+940, K0+940 al K0+800, K0+800 al k0+560, K0+560 al K0+510.k0+510 al k0+310

Instalación de pavimento hidráulico: entre el K0+940 a la K1+400; y entre K0+000 a la K0+400, K0+440 al K0+420, k0+630 a la K0+610, K0+610 a la K0+540,k0+460 a k0+540,K0+460 al K0+400, k0+580 al K0+583.---- Tramo Nuevo K0+990 al K0+880.k0+990 al K1+140, K0+890 al K0+640, K0+640 al K0+620, K0+620 al K0+600.k0+600 al K0+540

Instalación de Bordillos Prefabricados entre abscisas K0+020 a la K0+400 lado izquierdo; entre k0+020 a la k0+120 lado derecho, k0+120 al k0+170 lado derecho, K0+170 al k0+220 derecho, K0+170 al k0+220 lado izquierdo, K0+220 al K0,300 lado derecho, K0+300 al K0+340, k1+400 al K1+470, del K1+300 al k1+370

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las Actividades de excavación, cargue de material proveniente de las excavaciones e instalación de afirmado, sub base y pavimento.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Via paso de las flores - Villa nueva. Se realizan excavaciones Tramo nuevo k0+380 al K0+140



Via paso de las flores - Villa nueva. Se realiza extiende material de afirmado Tramo nuevo k0+460 al K0+220.



Via paso de las flores - Villa nueva. Se realiza instala concreto para paviemento Tramo nuevok0+600 al K0+540

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría le reitera al contratista que debe hacer entrega de las observaciones del PAGA, cumplir con el personal mínimo requerido en obra, por el cual se inició un proceso de incumplimiento, el contratista presenta un adelanto del 6,32 %, también se le ha venido solicitando al contratista hacer entrega de los documentos del cierre financiero con la fiducia, continuar con el sello de juntas, arreglo de placas que presentan fisura y reiniciar con la actividad de instalación de bordillos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: LEONARDO TORO NIÑO

Matricula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20-oct-23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 87 (Numeración consecutiva) del 13-oct-23 al 19-oct-23

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING.NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRRA DPARTAMENTO DE CORDOBA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : LA META FISICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K21+120 DE LA VIA EL PASO DE LAS FLORES Y VILLANUEVA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCION TIPICA DE 6,0 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021		
INTEGRANTES:	4 INGENIERIA S.A.S CON EL 40% DE PARTICIPACION Y NIT: 901144026-1 / AZ CIVIL S.A.S CON EL 60% DE PARTICIPACION Y NIT:900649836-1		
CONTRATO No.	001 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.847.000.000,00
FECHA DE INICIO:	17/02/22	VALOR ADICIONES:	$ 1.423.000,105
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/22	VALOR ACUMULADO:	$ 4.270.500.315,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/23		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-38		
INTEGRANTES:	ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 38 PROYECTOS S.A.S CON 50%		
CONTRATO No.	2276 del 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.930.530.773,00
FECHA DE INICIO:	28/01/22	VALOR ADICIONES:	$ 965.265.286,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ 2.895.796.059,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.847.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.930.530.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.220.888.630,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.917.348.809,14	69,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.141.882.834,20	74,43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (100.258.196,57)	-5,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 15.928.551,00	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.794.392.321,63	66,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.915.577.072,00	69,07%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (121.184.750,37)	-2,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 61.478.143,76	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.928.353,00	0,45%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.604.967.061,00	89,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.604.967.061,00	89,96%
PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.924.993,00	0,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.924.993,00	0,79%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 131.982.551,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 69,12%
Meta Física Ejecutada % 74,43%
Avance o Atraso Físico % 5,31%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños	Unidad	gl	2021	
Box-coulvert	mt	0	2021	
Pavimento concreto	mt	2240	2021	
Señalización	mt		2021	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,00				
Ejec	1,00				
Prog	0			0	
Ejec	0			0	
Prog	1450,0			1600,00	69,12%
Ejec	1650,00			1740,00	74,43%
Prog	0			0	
Ejec	0			0	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
VOLQUETAS	5	5
MINI CARGADOR BOBCAT	1	1
CORTADORA DE PAVIMENTO	1	1
Total	10	10

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PLANTA CANTERA JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	TRONCAL 2 VIA CERETE - CIENAGA DE ORO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CON OBSERVACIONES

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA.	1	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se relazan excavaciones y retiro de material proveniente de estas del k0+140 al K0+000, se instala afirmado del k0+220 al K0+170.

El Contratista lleva acumulada las siguientes actividades:

Excavación Mecánica: desde el k0+800 hasta el K1+400 y entre el K0+000 hasta el K0+638; k0+670 a k0+720, K0+720 hasta el K0+800-- Tramo nuevo K0+980 a k0+840, K1+140 a K0+980, K0+840 a K0+740, K0+740 al K0+560, K0+560 al K0+380, k0+380 al K0+140, k0+140 al K0+000

Relleno con Material de Afirmado entre el k0+820 a la K1+400 , entre el K0+000 a la K0+640 y entre K0+720 al K0+820 ----Tramo nuevo K0+980 a k0+840,K1+140 a K0+980, K0+840 a K0+740, K0+740 al k0+650, K0+650 al K0+560, K0+560 al K0+460, k0+460 al K0+220. k0+220 al K0+170.


Instalación de Material Sub Base Granular: entre el K0+940 a la K1+400 y entre el K0+000 a la K0+640;----- Tramo nuevo K1+140 al K0+940, K0+940 al K0+800, K0+800 al k0+560, K0+560 al K0+510.k0+510 al k0+310

Instalación de pavimento hidráulico: entre el K0+940 a la K1+400; y entre K0+000 a la K0+400, K0+440 al K0+420, k0+630 a la K0+610, K0+610 a la K0+540,k0+460 a k0+540,K0+460 al K0+400, k0+580 al K0+583.---- Tramo Nuevo K0+990 al K0+880.k0+990 al K1+140, K0+890 al K0+640, K0+640 al K0+620, K0+620 al K0+600.k0+600 al K0+540

Instalación de Bordillos Prefabricados entre abscisas K0+020 a la K0+400 lado izquierdo; entre k0+020 a la k0+120 lado derecho, k0+120 al k0+170 lado derecho, K0+170 al k0+220 derecho, K0+170 al k0+220 lado izquierdo, K0+220 al K0,300 lado derecho, K0+300 al K0+340, k1+400 al K1+470, del K1+300 al k1+370

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las Actividades de excavación, cargue de material proveniente de las excavaciones e instalación de afirmado, sub base y pavimento.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Via paso de las flores - Villa nueva. Se realizan excavaciones Tramo nuevo k0+140 al K0+000



Via paso de las flores - Villa nueva. Se realiza cargue de material proveniente de las excavaciones Tramo nuevo k0+140 al K0+000



Via paso de las flores - Villa nueva. Se realiza extiende material de afirmado Tramo nuevo k0+220 al K0+170.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría le reitera al contratista que debe hacer entrega de las observaciones del PAGA, cumplir con el personal mínimo requerido en obra, por el cual se inició un proceso de incumplimiento, el contratista presenta un adelanto del 5,31 %, también se le ha venido solicitando al contratista hacer entrega de los documentos del cierre financiero con la fiducia, continuar con el sello de juntas, arreglo de placas que presentan fisura y reiniciar con la actividad de instalación de bordillos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: LEONARDO TORO NIÑO

Matricula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27-oct-23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 88 (Numeración consecutiva) del 20-oct-23 al 26-oct-23

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING.NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRRA DPARTAMENTO DE CORDOBA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : LA META FISICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K21+120 DE LA VIA EL PASO DE LAS FLORES Y VILLANUEVA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCION TIPICA DE 6,0 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-36
INTEGRANTES:	4 INGENIERIA S.A.S CON EL 40% DE PARTICIPACION Y NIT: 901144026-1 / AZ CIVIL S.A.S CON EL 60% DE PARTICIPACION Y NIT:900649836-1	INTEGRANTES:	ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 36 PROYECTOS S.A.S CON 50%
CONTRATO No.	001 DE 2022	CONTRATO No.	2276 del 2021
FECHA DE INICIO:	17/02/22	FECHA DE INICIO:	28/01/22
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/22	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/23	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	
VALOR INICIAL:	$ 2.847.000.000,00	VALOR INICIAL:	$ 1.930.530.773,00
VALOR ADICIONES:	$ 1.423.000,105	VALOR ADICIONES:	$ 965.265.286,00
VALOR ACUMULADO:	$ 4.270.500.315,00	VALOR ACUMULADO:	$ 2.895.796.059,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.847.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.930.530.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.220.888.630,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.091.497.720,26	73,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.141.682.834,20	74,43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (100.258.166,57)	1,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 15.928.551,00	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.091.497.720,26	73,24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.141.682.834,20	74,43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (121.184.750,57)	-2,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 174.149.111,12	4,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.627.892.054,00	90,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.627.892.054,00	90,75%
PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.924.993,00	0,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.924.993,00	0,79%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 131.982.551,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 73,24%
Meta Física Ejecutada % 74,43%
Avance o Atraso Físico % 1,19%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Unidad	gl	2021		Prog	1,00				
					Ejec	1,00				
Box-coulvert	mt	0	2021		Prog	0			0	
					Ejec	0			0	
Pavimento concreto	mt	2240	2021		Prog	1450,0			1600,00	73,24%
					Ejec	1650,00			1650,00	74,34%
Señalización	mt		2021		Prog				0	
					Ejec	0			0	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
VOLQUETAS	5	5
MINI CARGADOR BOBCAT	1	1
CORTADORA DE PAVIMENTO	1	1
Total	10	10

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PLANTA CANTERA JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	TRONCAL 2 VIA CERETE - CIENAGA DE ORO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CON OBSERVACIONES

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Por las lluvias presentadas los días viernes, lunes y miércoles de la semana, el contratista evacua aguas estancadas y realizo retiro de material saturado para ser remplazado por material seco, con ayuda de maquinaria

El Contratista lleva acumulada las siguientes actividades:

Excavación Mecánica: desde el k0+800 hasta el K1+400 y entre el K0+000 hasta el K0+638; k0+670 a k0+720, K0+720 hasta el K0+800-- Tramo nuevo K0+980 a k0+840, K1+140 a K0+980, K0+840 a K0+740, K0+740 al K0+560, K0+560 al K0+380, k0+380 al K0+140, k0+140 al K0+000

Relleno con Material de Afirmado entre el k0+820 a la K1+400 , entre el K0+000 a la K0+640 y entre K0+720 al K0+820 ----Tramo nuevo K0+980 a k0+840,K1+140 a K0+980, K0+840 a K0+740, K0+740 al k0+650, K0+650 al K0+560, K0+560 al K0+460, k0+460 al K0+220. k0+220 al K0+170.


Instalación de Material Sub Base Granular: entre el K0+940 a la K1+400 y entre el K0+000 a la K0+640;----- Tramo nuevo K1+140 al K0+940, K0+940 al K0+800, K0+800 al k0+560, K0+560 al K0+510.k0+510 al k0+310

Instalación de pavimento hidráulico: entre el K0+940 a la K1+400; y entre K0+000 a la K0+400, K0+440 al K0+420, k0+630 a la K0+610, K0+610 a la K0+540,k0+460 a k0+540,K0+460 al K0+400, k0+580 al K0+583.---- Tramo Nuevo K0+990 al K0+880.k0+990 al K1+140, K0+890 al K0+640, K0+640 al K0+620, K0+620 al K0+600.k0+600 al K0+540

Instalación de Bordillos Prefabricados entre abscisas K0+020 a la K0+400 lado izquierdo; entre k0+020 a la k0+120 lado derecho, k0+120 al k0+170 lado derecho, K0+170 al k0+220 derecho, K0+170 al k0+220 lado izquierdo, K0+220 al K0,300 lado derecho, K0+300 al K0+340, k1+400 al K1+470, del K1+300 al k1+370

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las Actividades de excavación, cargue de material proveniente de las excavaciones e instalación de afirmado, sub base y pavimento.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vía paso de las flores - Villa nueva. Aguas estancadas a lo largo del Tramo nuevo k0+500 al K0+000



Vía paso de las flores - Villa nueva. Se evacuan aguas estancadas por las lluvias presentadas en la semana Tramo nuevo k0+500 al K0+000



Vía paso de las flores - Villa nueva. Se realiza retiro de material saturado por las lluvias presentadas en la semana Tramo nuevo k0+500 al K0+000.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría le reitera al contratista que debe hacer entrega de las observaciones del PAGA, cumplir con el personal mínimo requerido en obra, por el cual se inició un proceso de incumplimiento, el contratista presenta un adelanto del 1,19 %, también se le ha venido solicitando al contratista hacer entrega de los documentos del cierre financiero con la fiducia, continuar con el sello de juntas, arreglo de placas que presentan fisura y reiniciar con la actividad de instalación de bordillos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: LEOBARDO TORO NIÑO

Matricula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3-nov-23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 89 (Numeración consecutiva) del 27-oct-23 al 2-nov-23

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING.NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRRA DPARTAMENTO DE CORDOBA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : LA META FISICA A EJECUTAR ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LOS K21+120 DE LA VIA EL PASO DE LAS FLORES Y VILLANUEVA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO, CON UNA SECCION TIPICA DE 6,0 DE ANCHO POR 20CM DE ESPESOR, CON UNA ESTRUCTURA DE AFIRMADO Y 20 CM DE SUBBASE, CON LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO PREFABRICADO Y LA SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ACI-36
INTEGRANTES:	4 INGENIERIA S.A.S CON EL 40% DE PARTICIPACION Y NIT: 901144026-1 / AZ CIVIL S.A.S CON EL 60% DE PARTICIPACION Y NIT:900649836-1	INTEGRANTES:	ACI PROYECTOS S.A.S CON 50% - 36 PROYECTOS S.A.S CON 50%
CONTRATO No.	001 DE 2022	CONTRATO No.	2276 del 2021
FECHA DE INICIO:	17/02/22	FECHA DE INICIO:	28/01/22
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/22	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/23	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	
VALOR INICIAL:	$ 2.847.000.000,00	VALOR INICIAL:	$ 1.930.530.773,00
VALOR ADICIONES:	$ 1.423.000,105	VALOR ADICIONES:	$ 965.265.286,00
VALOR ACUMULADO:	$ 4.270.500.315,00	VALOR ACUMULADO:	$ 2.895.796.059,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.847.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.930.530.773			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.220.888.630,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.204.198.687,62	75,91%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.211.693.768,20	76,09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (100.256.199,57)	-0,18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 15.928.551,00	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.204.198.687,62	75,91%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.211.693.768,20	76,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (121.184.750,57)	-2,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 112.670.967,36	2,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 70.010.934,00	1,66%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.650.817.047,00	91,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.650.817.047,00	91,54%
PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.924.993,00	0,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.924.993,00	0,79%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 131.982.551,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 75,91%
Meta Física Ejecutada % 76,09%
Avance o Atraso Físico % 0,18%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Unidad	gl	2021		Prog	1,00				
					Ejec	1,00				
Box-coulvert	mt	0	2021		Prog	0			0	
					Ejec	0			0	
Pavimento concreto	mt	2240	2021		Prog	1450,0			1600,00	75,91%
					Ejec	1650,00			1650,00	76,09%
Señalización	mt		2021		Prog	0			0	
					Ejec	0			0	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
VOLQUETAS	5	5
MINI CARGADOR BOBCAT	1	1
CORTADORA DE PAVIMENTO	1	1
Total	10	10

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PLANTA CANTERA JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	TRONCAL 2 VIA CERETE - CIENAGA DE ORO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: CON OBSERVACIONES

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana el contratista Instalo y compacto material (sub base) del K0+300 al K0+000

El Contratista lleva acumulada las siguientes actividades:

Excavación Mecánica: desde el k0+800 hasta el K1+400 y entre el K0+000 hasta el K0+638; k0+670 a k0+720, K0+720 hasta el K0+800-- Tramo nuevo K0+980 a k0+840, K1+140 a K0+980, K0+840 a K0+740, K0+740 al K0+560, K0+560 al K0+380, k0+380 al K0+140, k0+140 al K0+000

Relleno con Material de Afirmado entre el k0+820 a la K1+400 , entre el K0+000 a la K0+640 y entre K0+720 al K0+820 ----Tramo nuevo K0+980 a k0+840,K1+140 a K0+980, K0+840 a K0+740, K0+740 al k0+650, K0+650 al K0+560, K0+560 al K0+460, k0+460 al K0+220. k0+220 al K0+170, k0170 al k0+000


Instalación de Material Sub Base Granular: entre el K0+940 a la K1+400 y entre el K0+000 a la K0+640;----- Tramo nuevo K1+140 al K0+940, K0+940 al K0+800, K0+800 al k0+560, K0+560 al K0+510.k0+510 al k0+300, K0+300 al K0+000

Instalación de pavimento hidráulico: entre el K0+940 a la K1+400; y entre K0+000 a la K0+400, K0+440 al K0+420, k0+630 a la K0+610, K0+610 a la K0+540,k0+460 a k0+540,K0+460 al K0+400, k0+580 al K0+583.---- Tramo Nuevo K0+990 al K0+880.k0+990 al K1+140, K0+890 al K0+640, K0+640 al K0+610.

Instalación de Bordillos Prefabricados entre abscisas K0+020 a la K0+400 lado izquierdo; entre k0+020 a la k0+120 lado derecho, k0+120 al k0+170 lado derecho, K0+170 al k0+220 derecho, K0+170 al k0+220 lado izquierdo, K0+220 al K0,300 lado derecho, K0+300 al K0+340, k1+400 al K1+470, del K1+300 al k1+370

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las Actividades de excavación, cargue de material proveniente de las excavaciones e instalación de afirmado, sub base y pavimento.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía paso de las flores - Villa nueva. Se extiende material de sub base del k0+300 al K0+000



Vía paso de las flores - Villa nueva. Se extiende material de sub base del k0+300 al K0+000



Vía paso de las flores - Villa nueva. Material sub base compactado del K0+300al K0+000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría le reitera al contratista que debe hacer entrega de las observaciones del PAGA, cumplir con el personal mínimo requerido en obra, por el cual se inició un proceso de incumplimiento, el contratista presenta un adelanto del 0,18%, también se le ha venido solicitando al contratista hacer entrega de los documentos del cierre financiero con la fiducia, continuar con el sello de juntas, arreglo de placas que presentan fisura y reiniciar con la actividad de instalación de bordillos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: LEONARDO LEDO NIÑO
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4",

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023

CONTRATO No. 001 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ACI-3B

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CHAMPIONS 710A		EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	A	A	A	A	A	A	A		A	I	A	A	I	A			A	A	A	I	A		I	A	I	I	I	A		I	A
RETRO EXCAVADORA	CAT 246B		EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	A	A	A	A	A	A	A		A																						
VIBRO COMPACTADOR	VIBRO COMPACTADOR	8 TONELADAS	EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	A	A	A	A	A	A	A		A	I	A	A	I	A			A	A	A	I	A		I	A	I	I	I	A		I	A
NIVEL TOPOGRAFICO	ESTACION		EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA -COTORRA	A	A	A	A	A	A	A		A	I	A	A	I	A			A	A	A	I	A		I	A	I	I	I	A		I	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	4	4	4	4	4	4	4		4	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3
			TOTAL ACTIVO	4	4	4	4	4	4	4		4	0	3	3	0	3			3	3	3	0	3		0	3	0	0	0	3		0	3
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0		0	3	0	0	3	0			0	0	0	3	0		3	0	3	3	3	0		3	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	86	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	62	72%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	24	28%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: los dias 10,13,20,23,25 y 30 los equipos estuvieron inactivos por las lluvias que se presentaron estos dias, del 26 al 28 de octubre los equipos estuvieron inactivo debido a que en esos dias no se realizaron actividades en obra.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Roberto Antonio Moreno Paez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520250945CND

Firma

Nombre: Carmelina Oviedo Ramos
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202193598 CÓR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1
		FECHA	30/09/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 001 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA	1067915714	DIRECTOR	$ 1.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 87.000		NUEVA EPS	9458945143	$ 52.000	PORVENIR	9458945143	$ 208.000	$ 52.000			
2	CARLOS ANDRES BAUTISTA FIGUEROA	1065006669	INGENIERO AMBIENTAL	$ 1.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 87.000	V	SALUD TOTAL	9458945143	$ 46.600	PORVENIR	9458945143	$ 200.000	$ 46.600			
3	YASBLEIDI ESPITIA CANTERO	1062675166	AUXILIAR SISO	$ 1.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 87.000	V	MUTUAL SER	9458945143	$ 50.000	PORVENIR	9458945143	$ 200.000	$ 50.000			
4	RODRIGO MORENO PAEZ	79506681	ING RESIDENTE DE OBRAS	$ 1.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 87.000	V	SANITAS	9458945143	$ 50.000	PORVENIR	9458945143	$ 200.000	$ 50.000			
5	YESID PETRO ESPITIA	1073813104	INGENIERO AUXILIAR	$ 1.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 87.000	V	SALUD TOTAL	9458945143	$ 50.000	PORVENIR	9458945143	$ 200.000	$ 50.000			
6	MARLA DIAZ VEGA	1069499321	TOPOGRAFA	$ 1.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 87.000	V	NUEVA EPS	9458945143	$ 50.000	PORVENIR	9458945143	$ 200.000	$ 50.000			
7	GERMÁN GABRIEL GALEANO	15028290	OPERADOR	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 21.600	V	MUTUAL SER	9458945143	$ 46.400	PORVENIR	9458945143	$ 185.600	$ 46.400			
8	EDER BORJA PEÑATA	11035460	OBRERO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 21.600	V	NUEVA EPS	9458945143	$ 46.400	PORVENIR	9458945143	$ 185.600	$ 46.400			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

En este periodo el contratista no presento personal en obra numero en obra.

El contratista adjunta la certificación de fecha OCTUBRE a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Jesus Martinez - Rep Legal
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202 - 181579COR

Firma
Nombre: Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901558600	3	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO VIAL	CL 35 8 04	MONTERIA-CORDOBA	3232882727	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	278667563	9458945143	E	2023/11/02	2023/11/15	BANCOLOMBIA	13	$3,095,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065006669	BAUTISTA FIGUEROA CARLOS ANDRES																		230301	30	$1,250,000	$200,000	EPS002	30	$1,250,000	$50,000	CCF16	30	$1,250,000	$50,000	14-4	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0	Si	$387,000
2	CC	11035460	BORJA PEÑATA EDER	X	X																230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1069499321	DIAZ VEGA MARLA																		230301	30	$1,250,000	$200,000	EPS037	30	$1,250,000	$50,000	CCF16	30	$1,250,000	$50,000	14-4	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0	Si	$387,000
4	CC	1062675166	ESPITIA CANTERO YASBLEIDI ESTER																		230301	30	$1,250,000	$200,000	ESSC07	30	$1,250,000	$50,000	CCF16	30	$1,250,000	$50,000	14-4	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0	Si	$387,000
5	CC	15028290	GALEANO JULIO GERMAN GABRIEL	X	X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1067915714	MARTINEZ PADILLA JESUS ALBERTO	X																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
7	CC	79506681	MORENO PAEZ RODRIGO ANTONIO																		230301	30	$1,250,000	$200,000	EPS005	30	$1,250,000	$50,000	CCF16	30	$1,250,000	$50,000	14-4	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0	Si	$387,000
8	CC	1062682520	PETRO ESPITIA YESID RAFAEL																		230301	30	$1,250,000	$200,000	EPS002	30	$1,250,000	$50,000	CCF16	30	$1,250,000	$50,000	14-4	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0	Si	$387,000
Total	**Afiliados(8)**																						$9,870,000	$1,579,200			$9,870,000	$394,800			$9,870,000	$394,800			$9,870,000	$687,100		$0	$0		$3,055,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901558600	3	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO VIAL	CL 35 8 04	MONTERIA-CORDOBA	3232882727	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	278667563	9458945143	E	2023/11/02	2023/11/15	BANCOLOMBIA	13	$3,095,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,579,200	$20,400	$0	$1,599,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,393,600	$18,000	$0	$1,411,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$2,400	$0	$188,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$687,100	$8,900	$0	$696,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$687,100	$8,900	$0	$696,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$394,800	$5,100	$0	$399,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	$394,800	$5,100	$0	$399,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$394,800	$5,300	$0	$400,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$96,400	$1,300	$0	$97,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$148,400	$2,000	$0	$150,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$100,000	$1,300	$0	$101,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$50,000	$700	$0	$50,700
TOTAL				**8**	**$3,055,900**	**$39,700**	**$0**	**$3,095,600**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 31/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 001 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 4"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	20220027	CPC 53211	1.3.3	NACION	PRINCIPAL	$ 4.270.500.315	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.270.500.315

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1	OBRAS	jun-22	$ 18.954.796		$ 18.954.796	$ -					$ 4.251.545.519				
2	OBRAS	jul-22	$ 195.890.321		$ 195.890.321	$ -					$ 4.055.655.198				
3	OBRAS	ago-22	$ 554.065.978		$ 595.769.869	$ -					$ 3.459.885.329				
4	OBRAS	mar-23	$ 845.242.776		$ 845.242.776						$ 2.614.642.553				
5	OBRAS	jun-23	$ 332.484.294		$ 332.484.294						$ 2.282.158.259				
6	OBRAS	ago-23	$ 324.674.101		$ 324.674.101						$ 1.957.484.158				
7	OBRAS	sep-23	$ 538.271.332		$ 538.271.332						$ 1.419.212.826				
8	OBRAS	oct-23	$ 261.026.726		$ 261.026.726						$ 1.158.186.100				
TOTALES			**$ 3.112.314.215**		**$ 3.112.314.215**						**$ 1.158.186.100**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA 1	$ 18.954.796		**$ 18.954.796**
ACTA 2	$ 195.890.321		**$ 195.890.321**
ACTA 3	$ 595.769.869		**$ 595.769.869**
ACTA 4	$ 845.242.776		**$ 845.242.776**
ACTA 5	$ 332.484.294		**$ 332.484.294**
ACTA 6	$ 324.674.101		**$ 324.674.101**
ACTA 7	$ 538.271.332		**$ 538.271.332**
ACTA 8	$ 261.026.726		**$ 261.026.726**
VALOR TOTAL	$ 3.112.314.215		**$ 3.112.314.215**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:Jesus Martinez - Rep Legal
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202 - 181579COR

Firma
Nombre: Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 001 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4",

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X		X	25
Lluvias moderadas													X							X										X		3
Lluvias intensas										X													X		X							3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	2	24	24	3	24	24	24	24	24	24	2	24	24	3	24	1	24	24	24	24	2	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Roberto Antonio Moreno Paez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520250945CND

Firma
Nombre:Carmelina Oviedo Ramos
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202193598 CÓR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA 31/10/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 001 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA DE INICIO: 17 DE FEBRERODE 2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE JUNIO DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.847.000.210

VALOR ACUMULADO: $ 4.270.500.315,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 del 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 284.700.021,00	1	2	2022	30/11/2022		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 199.290.014,70	1	2	2022	30/11/2022		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 569.400.042,00	1	2	2022	31	7	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 5.686.439,00	31	7	2022	31	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 854.100.063,00	1	2	2022	1	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101019943

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 300.000.000,00	1	2	2022	31	7	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101006855 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA 31/10/2023 (Día) (Mes) (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 427.050.031,00	11	2	2022	30/04/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 199.290.014.70	11	2	2022	30/10/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 854.100.063,00	11	2	2022	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 8.529.470,00	10	8	2022	10	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.281.150.094,50	10	8	2022	10	8	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101019943

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	300,000,000,00	11	2	2022	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101006855 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 31/10/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 001 de 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

FECHA DE INICIO: 17 DE FEBRERO DE 2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2276 del 2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ------ FECHA DE VERSIÓN: ------

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ------ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ------

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ------ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: ------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ------ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ------

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ------ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ------

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ------

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ------ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ------

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ------ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ------

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ------ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ------

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA 31/10/2023 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).


No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOPOGRAFICA	SOUTH -NTS-360R	S58040	3/09/2023	3/09/2023	3/09/2024	
1	NIVEL TOPOGRAFICO	SOKKIA -B40	D10385	3/09/2023	3/09/2023	3/09/2024	

OBSERVACIONES:

LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PRESENTAN SUS CERTIFICACIONES DE CALIBRACION Y PRESENTAN BUEN ESTADO

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre:Jesus Martinez - Rep Legal
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:22202 - 181579COR

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:




Firma
Nombre: Leonardo Toro Niño
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Programación 2023_A

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**EXPLANACIONES**	**116 días**	**lun 24/07/23**	**lun 11/12/23**
2	Excavaciones varias en material común en seco.	6,75 días	lun 13/11/23	lun 20/11/23
3	Excavación en material común de la explanación y canales	74 días	lun 24/07/23	vie 20/10/23
4	Terraplenes	29,75 días	lun 6/11/23	lun 11/12/23
5	**PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO PLACAS 3x3**	**116 días**	**lun 31/07/23**	**lun 18/12/23**
6	Subbase Granular Clase C.	80,5 días	lun 14/08/23	sáb 18/11/23
7	Afirmado (Material para Mejoramiento)	66,25 días	lun 31/07/23	mié 18/10/23
8	Pavimento de concreto hidraulico modulo de rotura 38 MPa	30 días	vie 3/11/23	sáb 9/12/23
9	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	30 días	vie 3/11/23	sáb 9/12/23
10	Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la superficie de apoyo	47 días	lun 23/10/23	lun 18/12/23
11	**TRANSPORTE**	**78,35 días**	**lun 14/08/23**	**jue 16/11/23**
12	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	24 días	lun 14/08/23	jue 16/11/23
13	**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**124,75 días**	**mar 1/08/23**	**vie 29/12/23**
14	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	2 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23
15	Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	5,75 días	lun 18/12/23	sáb 23/12/23
16	**CARACTERIZACIÓN VIAL**	**3 días**	**mié 27/12/23**	**sáb 30/12/23**
17	Caracaterización del corredor	3 días	mié 27/12/23	sáb 30/12/23
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49		1,75 días	sáb 1/10/22	lun 3/10/22

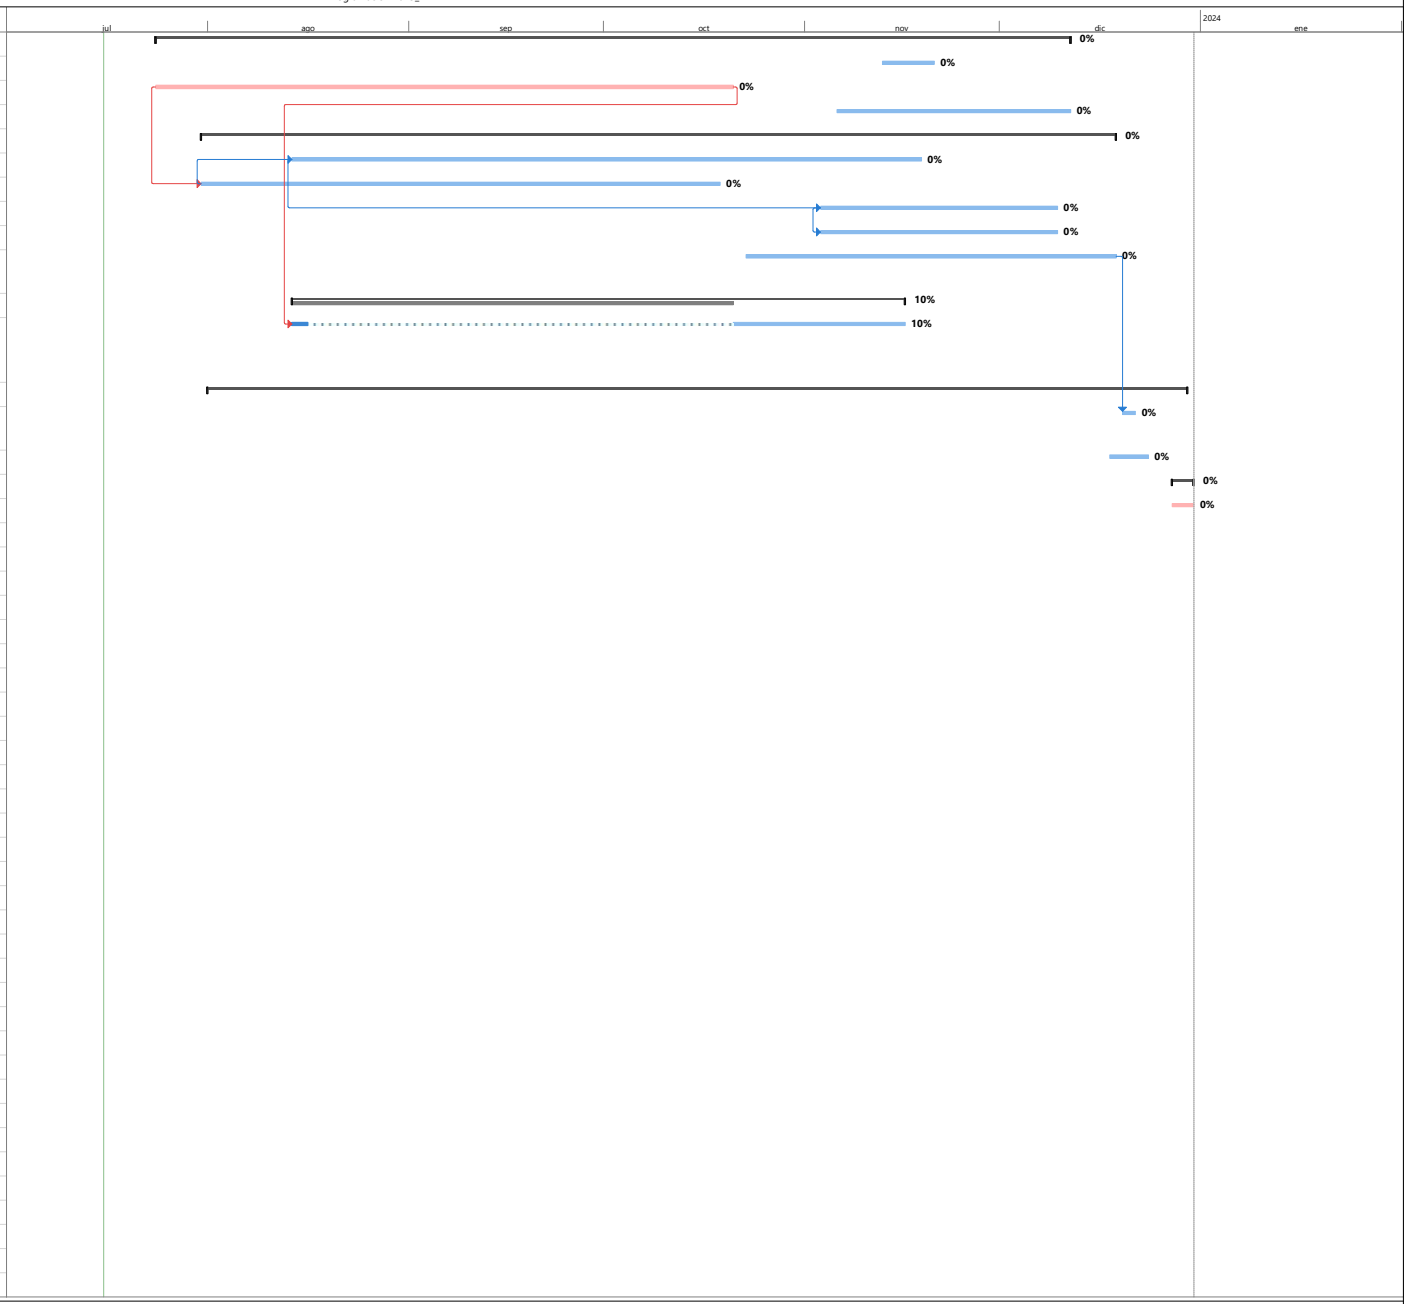

Tareas críticas | Tarea | Tarea manual | solo duración | Hito de línea base | Resumen | Tareas externas | Hito inactivo
División crítica | División | solo el comienzo | Línea base | Hito | Resumen manual | Hito externo | Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | solo fin | División de la línea base | Progreso del resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Fecha límite

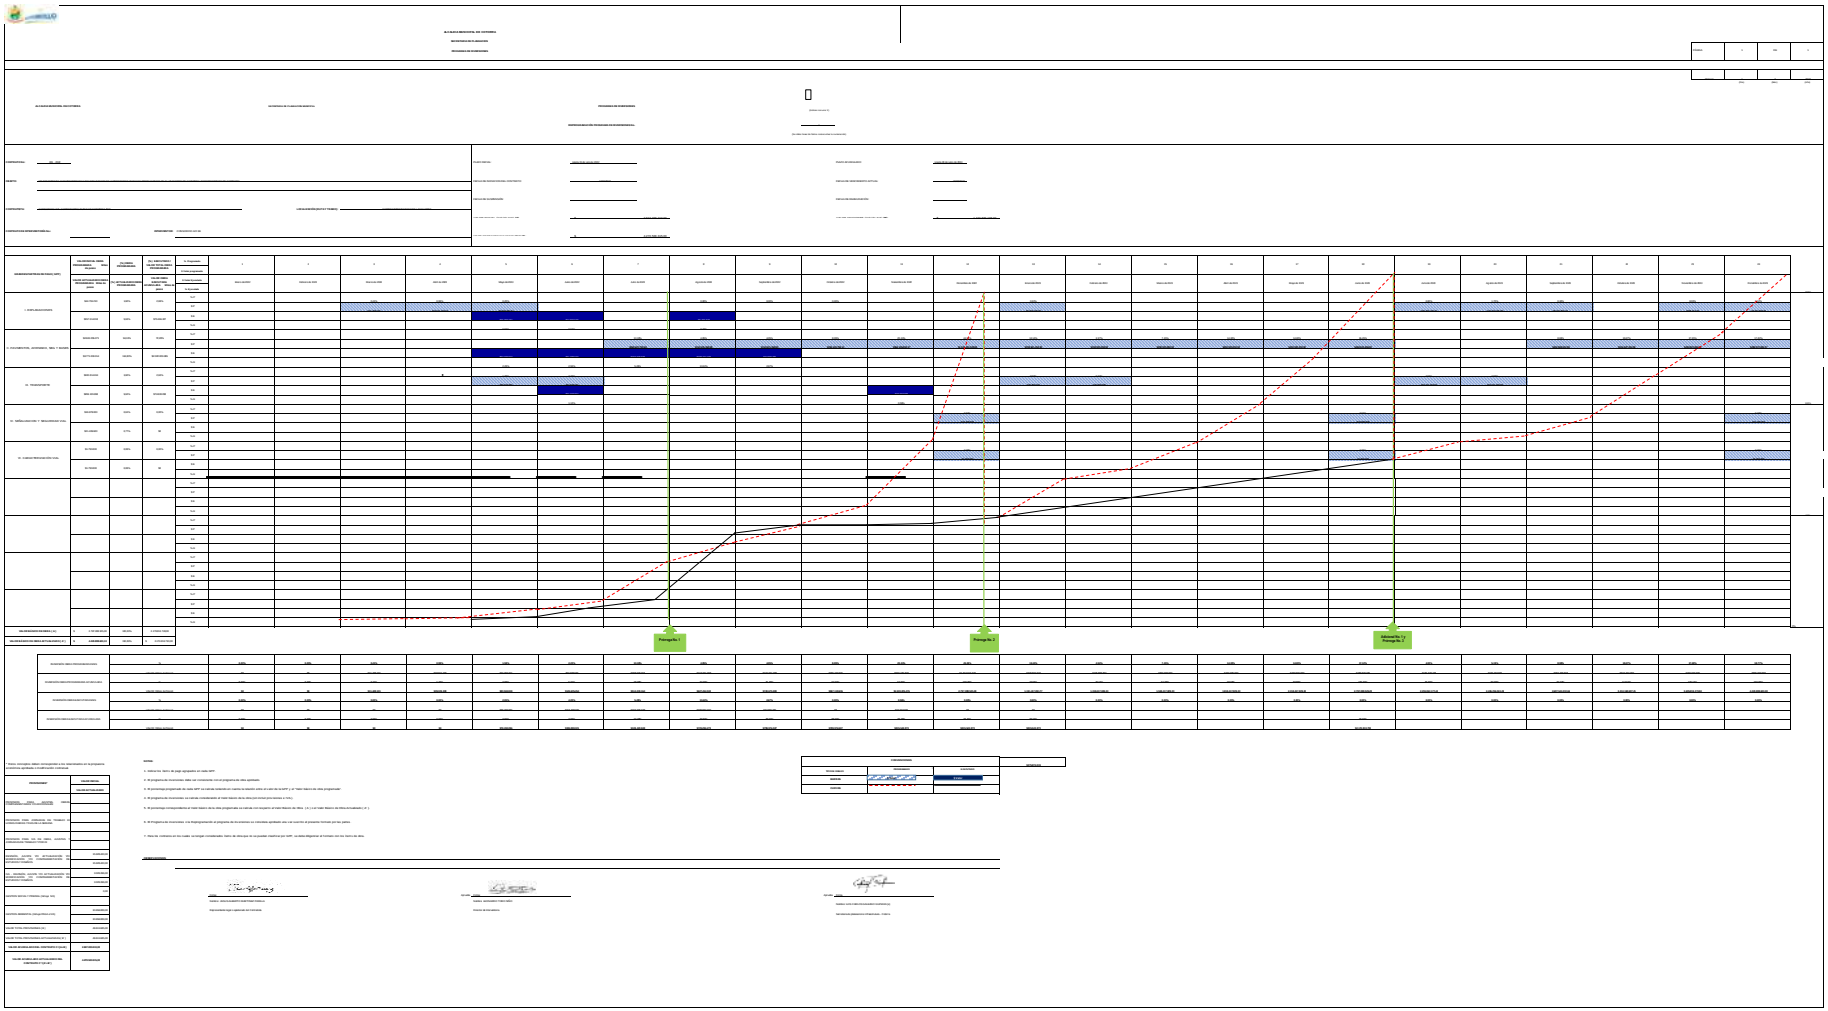
Prórroga No. 1
Prórroga No. 2
Prórroga No. 1 y Prórroga No. 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 6/10/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
Instalación de bordillos	Jueves,14 de Septiembre de 2023	NO CUMPLIÓ
Entrega de planillas de seguridad social	Viernes,08 de Septiembre de 2023	CUMPLIÓ
Entrega del cierre financiero del anticipo	Jueves,14 de Septiembre de 2023	NO CUMPLIÓ
Entrega de observaciones del PAGA	Jueves,14 de Septiembre de 2023	NO CUMPLIÓ
Entrega de APUs no previstos para balance	Jueves,14 de Septiembre de 2023	NO CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Revisión de compromisos
Avance de obra
Reinicio de actividad instalación de bordillos
Observaciones área SST, social y ambiental
Cierre financiero del anticipo
Informe de incumplimiento

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 3

FECHA: 6/10/2023 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se inicia el comité de obra revisando los compromisos pactados en el acta anterior.

El avance de obra que se tiene es: Porcentaje de obra programado: 66,29; porcentaje de obra ejecutado: 68,70; avance: 2,47%

Para el compromiso del reinicio de instalación de bordillos, Se revisaron los APUs del presupuesto oficial y las dimensiones del bordillo no se ajustan las necesidades de la estructura, por lo cual el contratista presentara el APUs corregido con las dimensiones que se ajustan al proyecto.

Observaciones área SST, social y ambiental:

-Las observaciones del PAGA, el contratista hace entrega en este comité de la resolución para el uso de aguas quedando pendiente los permisos ambientales de la planta de concreto.

-Se le solicita al contratista la entrega de las actas de vecindad del tramo nuevo y que se haga la socialización de dicho tramo.

Entrega del cierre financiero del anticipo: El contratista continua realizando la solicitud a la fiduciaria para la entrega de la información.

La alcaldía manifiesta que el informe de incumplimiento por falta de personal en obra está en revisión

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

FECHA: 6/10/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Reinicio de instalación de bordillos	martes, 17 de octubre de 2023	Contratista
Entrega del cierre financiero del anticipo	martes, 17 de octubre de 2023	Contratista
Entrega de observaciones del PAGA	viernes, 13 de octubre de 2023	Contratista
Entrega de APUs no previstos para balance No 2	viernes, 13 de octubre de 2023	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEONARDO TORO NIÑO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI-3B	
CARMELINA OVIEDO	INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI-3B	
JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA	DIRECTOR DE OBRAS	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	
RODRIGO MORENO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021	
LUIS CARLOS GALEANO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	ALCALDÍA DE COTORRA	
GUILLERMO LLORENTE	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA DE COTORRA	

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1-nov-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE **PROYECTO:** P65- INTERVENTORÍA VÍAS CÓRDOBA - GRUPO 4

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ACI-3B

CONTRATO DE OBRA No. 104 DE 2022, 001 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022, CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	CAMIONETA DOBLE CABINA, PLACA JLP-991, MARCA CHEVROLET - DMAX, CILINDRAJE 2500, MODELO 2020	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
ESTACIÓN PARA TOPOGRAFÍA	MARCA SOKKIA SET 6 SERIE D22852	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
NIVEL	MARCA TOPCOM, MODELO AT-B4, SERIE MZ 9945	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
MOTOCICLETA	PLACA - VXI-8F	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
MOTOCICLETA	PLACA - XIA-17E	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
MOTOCICLETA	PLACA - WZK-74E	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
MOTOCICLETA	PLACA - WKD-48F	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
MAQUINA ENSAYOS A LA COMPRESIÓN	MARCA RYR, MODELO SG-BM, SERIE 162070	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
DIAL ANALOGO BAKER	MARCA BAKER, MODELO ANALOGO, SERIE UDD996, UTK308	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
HUMEDOMETRO TIPO SPEEDY PINZUAR	MARCA PINZUAR, MODELO TYPE D1	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
BALANZA DIGITAL TRUMAX	MARCA TRUMAX, MODELO MIX-A, YS 202725	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: Mantenimiento vehículo: 163.195 km

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 1-nov-23
(Día / Mes / Año)

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula No. :22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI - 3B

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-nov-23 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4

CONTRATO DE OBRA No.: 180 DE 2021 Y 001 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022 - CONSORCIO CRT PROGRESA - CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Leonardo Toro Niño	88.253.792	Director de Interventoría	$ 6.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%		$ 6.500.000,00	$ 452.400	V	SANITAS	9458666902	$ 260.000,00	PORVENIR	9458666902	$ 1.040.000	$ 260.000			
2	Carmelina Rosa Oviedo Ramos	30.581.482	Ingeniero Residente de Interventoría - Cotorra	$ 4.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%		$ 4.600.000,00	$ 320.200	V	NUEVA EPS	9458666902	$ 184.000,00	PORVENIR	9458666902	$ 736.000	$ 184.000			
4	Libardo Antonio Arteaga Hernandez	78.077.318	Ingeniero Residente de Interventoría- Martinez 104	$ 4.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%		$ 4.600.000,00	$ 320.200	V	NUEVA EPS	9458666902	$ 184.000,00	PROTECCION	9458666902	$ 736.000	$ 184.000			
5	Nohemi Sofia Padron Torres	1.065.004.889	Ingeniero Residente de Interventoría-Martinez 104	$ 4.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%		$ 4.600.000,00	$ 320.200	V	NUEVA EPS	9458666902	$ 190.200,00	PORVENIR	9458666902	$ 760.600	$ 190.200			
6	Said Mauricio Soto Martinez	1.071.357.798	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%		$ 3.200.000,00	$ 222.800	V	SALUD TOTAL	9458666902	$ 128.000,00	PROTECCION	9458666902	$ 512.000	$ 128.000			
7	Lina Maria Ramos Benavides	1.071.355.692	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%		$ 3.200.000,00	$ 222.800	V	MUTUAL SER	9458666902	$ 128.000,00	PORVENIR	9458666902	$ 512.000	$ 128.000			
8	Katherine Paola Lopesierra Arteaga	1.073.815.505	Profesional Social	$ 3.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%		$ 3.500.000,00	$ 243.600	V	NUEVA EPS	9458666902	$ 140.000,00	PORVENIR	9458666902	$ 560.000	$ 140.000			
9	Claudia Marcela Benitez Camacho	1.067.937.483	Profesional Ambiental	$ 4.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%		$ 4.000.000,00	$ 278.400	V	EPS SURA	9458666902	$ 160.000,00	COLFONDOS	9458666902	$ 640.000	$ 160.000			
15	María José Teheraán Guerra	1.101.819.235	Inspector SST	$ 2.100.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%		$ 2.100.000,00	$ 146.200	V	NUEVA EPS	9458666902	$ 84.000,00	PORVENIR	9458666902	$ 336.000	$ 84.000			
16	Ivanna Rocio Charrasquiel Rivero	1.065.007.803	Secretaria	$ 1.015.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%		$ 1.015.000,00	$ 3.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9458666902	$ 46.400,00	PORVENIR	9458666902	$ 185.600	$ 49.500			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 37.315.000,00																																	$ 37.315.000,00	$ 3.736.500,00				$ 3.899.600,00			$ 9.203.800,00	$ 2.067.700,00			

El Interventor adjunta la certificación de fecha nov-23 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los dias no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los dias que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 54202- 145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2202297095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO:	MEPI-MNI-IN-15-FR-7
VERSIÓN:	1
PÁGINA	

FECHA: 3/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI - 3B

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-nov-23 — **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 4

CONTRATO DE OBRA No.: 180 DE 2021 Y 001 DE 2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORDOBA 2022 - CONSORCIO CRT PROGRESA - CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021

NOMBRE ARL: ARL SURA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Leonardo Toro Niño	88.253.792	Director de Interventoría	$ 6.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 6.500.000,00	$ 452.400	V	SANITAS	9458666902	$ 260.000,00	PORVENIR	9458666902	$ 1.040.000	$ 260.000			
2	Carmelina Rosa Oviedo Ramos	30.581.482	Ingeniero Residente de Interventoría - Cotorra	$ 4.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 4.600.000,00	$ 320.200	V	NUEVA EPS	9458666902	$ 184.000,00	PORVENIR	9458666902	$ 736.000	$ 184.000			
4	Libardo Antonio Arteaga Hernandez	78.077.318	Ingeniero Residente de Interventoría- Martinez 104	$ 4.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 4.600.000,00	$ 320.200	V	NUEVA EPS	9458666902	$ 184.000,00	PROTECCION	9458666902	$ 736.000	$ 184.000			
5	Nohemi Sofia Padron Torres	1.065.004.889	Ingeniero Residente de Interventoría-Martinez 104	$ 4.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 4.600.000,00	$ 320.200	V	NUEVA EPS	9458666902	$ 190.200,00	PORVENIR	9458666902	$ 760.600	$ 190.200			
6	Said Mauricio Soto Martinez	1.071.357.798	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 3.200.000,00	$ 222.800	V	SALUD TOTAL	9458666902	$ 128.000,00	PROTECCION	9458666902	$ 512.000	$ 128.000			
7	Lina Maria Ramos Benavides	1.071.355.692	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 3.200.000,00	$ 222.800	V	MUTUAL SER	9458666902	$ 128.000,00	PORVENIR	9458666902	$ 512.000	$ 128.000			
8	Katherine Paola Lopesierra Arteaga	1.073.815.505	Profesional Social	$ 3.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 3.500.000,00	$ 243.600	V	NUEVA EPS	9458666902	$ 140.000,00	PORVENIR	9458666902	$ 560.000	$ 140.000			
9	Claudia Marcela Benitez Camacho	1.067.937.483	Profesional Ambiental	$ 4.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 4.000.000,00	$ 278.400	V	EPS SURA	9458666902	$ 160.000,00	COLFONDOS	9458666902	$ 640.000	$ 160.000			
15	María José Teheraán Guerra	1.101.819.235	Inspector SST	$ 2.100.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 2.100.000,00	$ 146.200	V	NUEVA EPS	9458666902	$ 84.000,00	PORVENIR	9458666902	$ 336.000	$ 84.000			
16	Ivanna Rocio Charrasquiel Rivero	1.065.007.803	Secretaria	$ 1.015.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1.015.000,00	$ 3.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9458666902	$ 46.400,00	PORVENIR	9458666902	$ 185.600	$ 49.500			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 37.315.000,00																																	$ 37.315.000,00	$ 3.736.500,00				$ 3.899.600,00			$ 9.203.800,00	$ 2.067.700,00			

El Interventor adjunta la certificación de fecha nov-23 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los dias no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los dias que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 54202- 145218 NTS

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2202297095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 31-oct-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2276 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI-3B

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- GRUPO 4

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DEDICIEMBRE DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.930.530.773,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.895.796.059,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27	ENE	2022	1	MAR	2023
Calidad del servicio	30%	$ 579.159.232,00	29	AGOS	2022	29	AGOS	2027
Cumplimiento de Servicio	10%	$ 193.053.077,00	27	ENE	2022	1	MAR	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 386.106.155,00	27	ENE	2022	29	AGOS	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551–6

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 31-oct-23 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 289.579.212,00	27 1 2022	1/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 811.147.384,00	27 1 2022	10/07/20254
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 579.159.212,00	27 1 2022	31 12 2026
Calidad del servicio	30%	$ 868.738.818,00	31 7 2023	31 12 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3237551-6

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-145218 NTS

Firma

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO: MEP-FR-009-INVIAS-012
VERSIÓN: 1
PÁGINA:
FECHA: 20/09/2022 (DD/MM/AAAA)

VINCULACIÓN No.: [redacted] | [redacted] | [redacted]

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☒ No. [redacted]
(La numeración se debe llevar de forma secuencial conforme al Acta No.)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: [redacted]
OBJETO: [redacted]
INTERVENTOR: [redacted]
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: [redacted]
FISCALIZACIÓN No.: [redacted]
CONTRATO DE OBRA No.: 180 DC 2021, 181 DC 2022 y 164 DC 2022
CONTRATISTA: CONSORCIO VIA TRANSVERSAL CONSORCIO VIAL CORREDORES VERDES (CONSORCIO CORREDOR VIAL)

PLAZO INICIAL: [redacted] | PLAZO ADICIONADO: [redacted]
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: [redacted] | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: [redacted]
FECHA DE SUSPENSIÓN: [redacted] (indique fecha de inicio y fecha de finalización del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: [redacted] | TIEMPO DE SUSPENSIÓN: [redacted]
VALOR INICIAL (incluido IVA) [A]: [redacted] | VALOR ADICIONES (incluido IVA) [B]: [redacted]
VALOR ACUMULADO (Adición No)[C=A+B]: [redacted]

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS			CONDICIONES ACTA_ANTERIOR No. 3 de fecha 31 DE DICIEMBRE DE 2022	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		TOTAL
			Costos de Personal	Pickup Regional	Total Desplazamiento (Viáticos y Mov.)	Valor Total ($)	Periodo	Costos de Personal	Pickup Regional	Participación (horas)	Valor Total ($)																																											
		PERSONAL PROFESIONAL	1.172			1.172																																												
1.A	1	Director de Interventoría	$ 6.500.000,00		0,00	$ 39.585.000,00	2022	$ 6.500.000,00		17,00	$ 110.695.000,00	0,00	$ 199.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	23,83	$ 149.689.000,00
2.A	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00		0,00	$ 41.400.000,00	2022	$ 4.600.000,00		11,83	$ 54.418.000,00	0,00	$ 142.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ 97.176.000,00
3.A	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00		0,00	$ 41.400.000,00	2022	$ 4.600.000,00		9,00	$ 45.080.000,00	0,00	$ 199.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ 100.280.000,00
4.A	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00		0,00	$ 41.400.000,00	2022	$ 4.600.000,00		9,00	$ 45.080.000,00	0,00	$ 199.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ 100.280.000,00
A.A	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00		0,00	$ 41.400.000,00	2022	$ 4.600.000,00		15,50	$ 71.486.000,00	0,00	$ -	0,83	$ 2.448.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	0,83	$ 2.448.000,00	21,83	$ 95.038.000,00
S.E.	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00		0,00	$ 41.400.000,00	2022	$ 4.600.000,00		13,00	$ 60.720.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 920.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ 85.920.000,00
N.A.	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00		0,00	$ -	2022	$ 4.600.000,00		9,00	$ 41.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.999.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	1	$ 4.600.000,00	0,83	$ 3.799.000,00	9,83	$ 39.999.000,00
N.T.A.	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.600.000,00		0,00	$ -	2022	$ 4.600.000,00		1,00	$ 4.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
A.A	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000,00		0,00	$ 28.880.000,00	2022	$ 3.200.000,00		15,00	$ 48.560.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ 960.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ 48.160.000,00
7.A	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000,00		0,00	$ 28.880.000,00	2022	$ 3.200.000,00		12,00	$ 39.040.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ 640.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ 41.440.000,00
N.A.A.	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.200.000,00		0,00	$ -	2022	$ 3.200.000,00		0,00	$ 20.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.T.A.	1	Profesional Social	$ 3.500.000,00		0,00	$ -	2022	$ 3.500.000,00		9,33	$ 31.990.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,17	$ 595.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	0,17	$ 595.000,00	10,33	$ 42.563.000,00
N.C.A.	1	Profesional Ambiental	$ 4.000.000,00		0,00	$ -	2022	$ 4.000.000,00		8,33	$ 31.320.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,33	$ 1.320.000,00	1	$ 4.000.000,00	1	$ 4.000.000,00	1	$ 4.000.000,00	1	$ 4.000.000,00	1	$ 4.000.000,00	1	$ 4.000.000,00	1	$ 4.000.000,00	1	$ 4.000.000,00	1	$ 4.000.000,00	1	$ 4.000.000,00	0,33	$ 1.320.000,00	10,33	$ 41.320.000,00
S.A.	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 3.200.000,00	3,75	$ 14.175.000,00	$ 52.895.000,00	2022	$ 3.200.000,00		3,25	$ 16.880.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.600.000,00	2,00	$ 7.080.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ 1.600.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	3,25	$ 16.880.000,00
S.A.	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 3.200.000,00	3,75	$ 14.175.000,00	$ 52.895.000,00	2022	$ 3.200.000,00		3,25	$ 16.880.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.600.000,00	2,00	$ 7.080.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ 1.600.000,00	1	$ 3.200.000,00	1	$ 3.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	3,25	$ 16.880.000,00
S.A.	1	Especialista en Estructuras

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-015667
2023-10-05 08:06:36 a. m.

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 5 de octubre de 2023

Ingeniero
JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA
R/L
CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021.
consorciovialcotorra2021@gmail.com,ramp345@hotmail.com,4lingsas@gmail.com

Asunto: REINICIO DE ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Con base en nuestros compromisos de seguimiento del contrato de obra No 001 de 2022, solicitamos se retomen las actividades de excavación para estructura de pavimento, en obra se encuentra el equipo pero no laboro el día de ayer y a esta hora no se han iniciado las labores respectivas, si bien presentan un avance con respecto a la reprogramacion aprobada; cabe resaltar que en el Municipio existe un proceso de incumplimiento por los atrasos presentados anteriormente. Por este motivo esta interventoria sugiere no perder el avance logrado y continuar con los trabajos pendientes.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
5/10/2023 8:06:37 a. m.

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE COTORRA - GUILLERMO LLORENTE PETRO - ALCALDE MUNICIPAL DE COTORRA - alcalde@cotorra-cordoba.gov.co,contactenos@cotorra-cordoba.gov.co,planeacion@cotorra-cordoba.gov.co
Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-016426
2023-10-23 03:24:30 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 23 de octubre de 2023

Ingeniero
JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA
R/L
CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021.
consorciovialcotorra2021@gmail.com,ramp345@hotmail.com,4lingsas@gmail.com

Asunto: Solicitud de cumplimiento de compromiso pactados en acta de comité de obra N0. 16.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

En nuestra calidad de interventores al Contrato de la referencia N0. 001 de 2022 me permito informar que el CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021 a la fecha, se evidencia presunto incumplimiento en lo que atañe a los siguientes compromisos los cuales se pactaron el día 15 de agosto de 2023 en acta de reunión N0.11, el cual se realizó en las oficinas de la interventoría donde estuvieron presente funcionarios de invias, contratista e interventoría.

A continuación, hago referencia a dichos compromisos:

- Reinicio de instalación de bordillos, esta actividad debía reiniciar el martes, 17 de octubre de 2023.
- Entrega del cierre financiero del anticipo, este se debía entregar el martes, 17 de octubre de 2023.
- Entrega de observaciones del PAGA, este debía ser entregado el viernes, 13 de octubre de 2023.
- Entrega de APUs no previstos para balance No 2, este debía ser entregado el viernes, 13 de octubre de 2023

Teniendo en cuenta que a la fecha el CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021 no ha cumplido con los compromisos antes mentado esta interventoría solicita dar cumplimiento a estos compromisos en la menor brevedad posible.

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
23/10/2023 3:24:31 p. m.

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-016557
2023-10-25 06:32:02 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 25 de octubre de 2023

Ingeniero
JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA
R/L
CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021.
consorciovialcotorra2021@gmail.com,ramp345@hotmail.com,4lingsas@gmail.com

Asunto: Ausencia de personal y cese de actividades en obra

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 001 de 2022, nos permitimos manifestar lo siguiente:

En recorrido a obra realizado el día de hoy 25 de octubre por esta interventoría, se evidencia que no se estaban ejecutando actividades y tampoco había personal en obra, lo cual es preocupante teniendo en cuenta que este contrato de obra finaliza el día 31 de diciembre de 2023 y que por motivos de lluvias presentadas las últimas semanas se ha visto afectada la programación de obra.

Aunque el contratista a la fecha no presente atraso, es necesario aprovechar los días soleados para cumplir con la programación, evitar atraso de obra futuros y finalizar el contrato en el tiempo estipulado.

Por lo anterior se solicita al CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021 tomar las medidas pertinentes, reanudando las actividades en obra en la menor brevedad posible y cumpliendo con el personal mínimo requerido en obra.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
25/10/2023 6:32:04 p. m.

Folios: 2
Anexo:

CONSORCIO ACI-3B

Nombre anexos:

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE COTORRA - GUILLERMO LLORENTE PETRO - ALCALDE MUNICIPAL DE COTORRA - alcalde@cotorra-cordoba.gov.co,contactenos@cotorra-cordoba.gov.co,planeacion@cotorra-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA G4
Radicado No. SAL-23-016558
2023-10-25 06:35:31 p. m.

CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 25 de octubre de 2023

Ingeniero
JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA
R/L
CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021.
consorciovialcotorra2021@gmail.com,ramp345@hotmail.com,4lingsas@gmail.com

Asunto: SOLICITUD INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS ACTA 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Y 8

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 001 de 2022, nos permitimos manifestarle lo siguiente:

Esta interventoría solicita al CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021 hacer entrega del informe correspondiente a los imprevistos (I) pagados en las actas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se le recuerda al contratista que el informe a entregar debe contener: por cada acta un cuadro de relación de gastos equivalente al valor del imprevisto pagado, fotos de evidencia de los gastos relacionados, facturas y demás soportes que haya lugar para justificar el rubro.

Así mismo, se le aclara al contratista que debe enviarse el mismo informe como soporte de revisión de futuras actas.

Cordialmente,

Leonardo Toro Niño
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
25/10/2023 6:35:33 p. m.

Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE COTORRA - GUILLERMO LLORENTE PETRO - ALCALDE MUNICIPAL DE COTORRA - alcalde@cotorra-cordoba.gov.co,contactenos@cotorra-cordoba.gov.co,planeacion@cotorra-cordoba.gov.co

Copia interna:
Ivana Rocio Charrasquiel Rivero - Secretaria

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS



Foto1. Vía paso de las flores – Villanueva: Se realizan excavaciones.



Foto2. Vía paso de las flores – Villanueva: Se realizan excavaciones.



Foto 3 vía paso de las flores – Villanueva: Se realizan excavaciones.



FOTO 4. Vía paso de las flores – Villanueva Se realizan excavaciones.



Foto 5. Vía paso de las flores – Villanueva: Se realizan excavaciones.



Foto 6. Vía paso de las flores – Villanueva: Se realizan excavaciones.



Foto 7. Vía paso de las flores – Villa nueva: Cargue y retiro de material proveniente de las excavaciones.



Foto 8. Vía paso de las flores – Villanueva: Cargue y retiro de material proveniente de las excavaciones.



Foto 9. Vía paso de las flores – Villanueva: Chequeo de niveles en sub base.



Foto 10. Vía paso de las flores – Villanueva: Chequeo de niveles en sub base.



Foto 11. Vía paso de las flores – Villanueva: Chequeo de niveles en sub base..



Foto 13. Vía paso de las flores – Villanueva: Instalación material de afirmado.



Foto 13. Vía paso de las flores – Villanueva: Instalación material de afirmado.



Foto 13. Vía paso de las flores – Villanueva: Instalación material de afirmado.



Foto 14. Vía paso de las flores – Villanueva: Retiro de material suturado debido a las lluvias presentadas los últimos días.



Foto 15. Vía paso de las flores – Villanueva: Descargue de sub base.



Foto 16. Vía paso de las flores – Villanueva: Instalación de sub base.



Foto 17. Vía paso de las flores – Villanueva: Instalación de sub base.



Foto 17. Vía paso de las flores – Villanueva: Instalación de sub base.



Foto 17. Vía paso de las flores – Villanueva: Instalación de sub base.



Foto 17. Vía paso de las flores – Villanueva: Cereo de sub base.



Foto 17. Vía paso de las flores – Villanueva: Cereo de sub base.



Foto 17. Vía paso de las flores – Villanueva: Compactación de sub base.



Foto 17. Vía paso de las flores – Villanueva: Sub base compactada.

01 de octubre de 2023 (Domingo)

No se realiza actividad en obra.

Jesus Martinez

02 de octubre de 2023 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Retro excavadora -motoniveladora
Estacion nivel
Personal en obra: Ayudante de obra Director de obra
Actividad en obra: Se realizan excavaciones del Ko+500 al Ko+400.

Jesus Martinez

03 de octubre de 2023 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Retro excavadora -motoniveladora Nivel.
Personal en obra: Resident Ayudante topografo operador Director de obra
Actividad en obra: Se realiza excavacion del Ko+400 al Ko+310.
-Se realiza Corregue y retiro de material de excavacion.

Jesus Martinez

04 de octubre de 2023 (Miercoles)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la tarde de 03:00 pm a 04: pm.

- Equipo en obra: Retro excavadora - Nivel estación
Herramientas menores

- Personal en obra: Aux Residente obra Ayudantes( ) Director operador Comisión topografico (2)

Actividad en obra: Se continua Con los Excavaciones del Ko+310 al Ko+210.
- Se carga material de excavación
- Se instala afirmado Ko+500 al Ko+450

x Jesus Martinez

05 de octubre de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Retro excavadora - Motoniveladora - Vibro Compactador

Personal en obra: Director de obra - Auxiliar de obra Ayudantes - operador
Actividad en obra: Se Continua Con la actividad de Excavación del Ko+210 al Ko+090.
- Se instala material de afirmado Ko+450 al Ko+400

x Jesus Martinez

06 de octubre de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo en obra:
Personal en obra: Director Ayudante, operador Aux. de obra. Topografos
Actividad en obra: Se Continua Con los excavaciones y Cargue de material de estos Ko+090 al Ko+000
Se instala afirmado: Ko+400 al Ko+200
Se instala Sub base Ko+610 al Ko+500

07 de octubre de 2023 (Sabado)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Motoniveladora - Vibrocompactador

Personal en obra: Ayudante de obra
Ayudante operador Topografo - Director

Actividad en obra: Se instala afirmado Ko+200 ko+000,
Se instala Sub base: Ko+500 al Ko+200

Jesus Martinez

08 de octubre de 2023 (Domingo)

NO Se realiza actividad en obra

x Jesus Martinez

09 de octubre de 2023 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Motoniveladora . Vibro. Compactador equipo Topograficos.

Personal en obra: Ayudante de obra

Actividad en obra: El Contratista realiza Corte en afirmado para llegar a nivel.
Se instala Sub base de Ko+200 al Ko+000

x Jesus Martinez

10 de octubre de 2023 (Martes)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:30 am a 09:30

Equipo en obra: Motoniveladora

Personal en obra: Ayudante de obra ayudantes topografo - Director de obra

Actividad en obra: debido a las lluvias presentadas en la mañana el suelo presenta saturacion. motivo por el cual no se puede cumplir con la programacion para el dia de hoy

x Jesus Martinez

11 de octubre de 2023 (Miercoles)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: motoniveladora - vibro compactador

Personal en obra: Residente de obra Ayudante - Director operador topografo - Director

Actividad en obra: Se retira material Saturado el cual es remplazado por material Seco.

x Jesus Martinez

12 de octubre (Jueves) de 2023

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Motoniveladora - vibro Compactador Equipo topograficos

Personal en obra: Residente de obra - Ayudantes operador Director

60

Actividad en obra: Se Continua Con el Cero q material afirmado para llegar a nivel

* Jesus Martinez

13 de octubre de 2023 (Viernes)

* Tiempo: Se presentaron fuertes lluvias de 07:00 am a 10:00 am
Equipo en obra Motoniveladora.

Personal en obra: Res de obra - Ayudantes. (2)
Director
Actividad en obra:- Debido a las lluvias Presentadas el Contratista evacua aguas estancadas

* Jesus Martinez.

14 de octubre de 2023 (Sabado)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: motoniveladora

Personal en obra: Se retira material saturado. (Afirmado) y remplazado por material Seco

* Jesus Martinez

15 de octubre de 2023 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

* Jesus Martinez

16 de octubre de 2023 (Jones-festivo)

No se realizan actividades en obra

Jesus Martinez

17 de octubre de 2023 (Martes)

Tiempo: seco.

Equipo en obra: Motoniveladora- Vibro Compactador
Equipos de topografia

Personal en obra: Aux Residente de obra Ayudantes (2)
topografo - Director de obra

Actividad en obra: Se extiende material de sub base Km 0+300 al Km 0+250.
Se Compacta material de sub base.

Jesus Martinez

18 de octubre de 2023 (Miercoles)

Tiempo: seco

Equipo en obra: Motoniveladora- Vibro Compactador
equipos topograficos

Personal en obra: AUX. Residente de obra - Ayudantes
topografo. operador(a) - Director de obra

Actividad en obra: Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base del Km 0+250 al Km 0+200

Jesus Martinez

19 de octubre de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Motoniveladora - Vibrocompactador
Equipos de topografia

Personal en obra: Auxiliar de obra -
Ayudantes topografo (1) - Director de obra

Actividad en obra: Se continuo con la extendida y Compactacion de sub base del Km 0+200 al Km 0+150.

Y Jesus Martinez

20 de octubre de 2023 (Viernes)

- Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 ama 08:00 y en la tarde de 02:00pm a 03 pm.

Equipo: Motoniveladora - Vibrocompactador - Herramientas menores - Nivel

Personal en obra: Aux Resid. de obra
Ayudantes Topografo - Director

Actividad en obra: Por los lluvias presentados el Contratista no pudo realizar actividades. el dia de hoy

Y Jesus Martinez

63

21 de octubre de 2023 (Sabado)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Motoniveladora - vibro Compactador

Personal en obra: Aux Residente de obra
Ayudantes: Topografo - Director

Actividad en obra: Se retira material Saturado y se remplaza por material seco

Y Jesus Martinez

22 de octubre de 2023 (Domingo)

No se realiza actividad en obra

Y Jesus Martinez

23 de octubre de 2023 (Lunes)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 08:00 a 11 am.

Equipo en obra: Motoniveladora - Vibro Compactador - Equipos Topograficos

Personal en obra: Aux Residente de obra
Ayudante Topografo operador - Director

Actividad en obra: por las lluvias presentadas en la mañana no se puede ejecutar actividad en obra ya que el material se encuentra saturado

Y Jesus Martinez

24 de Octubre de 2023 (martes)

Tiempo: Parcialmente nublado.

Equipo en obra = Motoniveladora - equipos topograficos - Vibro compactador

Personal en obra: Res de obra - Ayudante operador topografo - Director de obra

Actividad en obra: Se retira material saturado de asbalso y Se remplaza por material Seco

° Jesus Martinez

25 de octubre de 2023 (Miercoles)

° Tiempo: Llovios de 08:30 a 09:30 am

Equipo en obra: Motoniveladora - Vibro Compactador

Personal en obra: Res de obra - Ayudante operador topografo Director de obra

Actividad: El Contratista en horas de la tarde retira material saturado por los lluvias presentados

° Jesus Martinez

26 de octubre de 2023 (Jueves)

Tiempo: Solo

Personal en obra: Ninguno

Equipo en obra: Ninguno.

Actividad en obra: No se realiza ninguna actividad en obra.

OBservación: Se realiza Comité en instalaciones de la administración donde el Contratista argumenta que el día de hoy no se ejecutaron actividades en obra y no habrá personal en ella por motivo el orden público cuando los equipos y maquinaria ya que había recibido amenazas contra la maquinaria y que estos estaban guardados en un lugar seguro hasta que pasaran las elecciones las cuales son el 29 de octubre de 2023

x Jesus Martinez

27 de octubre de 2023 (viernes)

Tiempo: Sol

Equipo en obra: Ninguno
Personal en obra: Ninguno
Actividad en obra: Ninguna.

x Jesus Martinez

28 de octubre de 2023 (Sabado)

Tiempo: Sol
Equipo en obra: Ninguno
Personal en obra: Ninguno
Actividad en obra: Ninguna

x Jesus Martinez

Powered by CamScanner

29 de octubre de 2023 (Domingo)

No se realiza actividad en obra

x Jesus Martinez

30 de octubre de 2023 (Lunes)

- Tiempo: Llovio en horas de la mañana de 07:30 a 09:30 am

Equipo en obra: Motoniveladora - Vibro Compactador

Personal en obra: Dos de obra Ayudante operador topografo.

Actividad en obra: Se realizo algos trabajos por los lluvias presentados.

x Jesus Martinez

31 de octubre de 2023

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Motoniveladora - Vibro Compactador Nivel.

Personal en obra: Dos de obra Ayudante operador

Actividad: Se realizo y Compactado sobre del terreno al terreno

x Jesus Martinez
