

| Id | Modo de tarea | Ítem | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **CONTRATO DE OBRA 1935 DE 2024 SNR PTO TEJADA** | **306 días** | **jue 18/07/24** | **vie 30/05/25** | **$ 1.313.636.085,00** |
| 2 | | | INICIO | 0 días | jue 18/07/24 | jue 18/07/24 | $ 0,00 |
| 3 | | | actividades de logistica y entrega de inmueble | 12 días | jue 18/07/24 | mar 30/07/24 | $ 0,00 |
| 4 | | **1.00** | **PRELIMINARES** | **294 días** | **mar 30/07/24** | **vie 30/05/25** | **$ 108.499.230,00** |
| 5 | | 1.01 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA EN TELA FIBRA TEJIDA H: 2.1 | 5 días | mar 30/07/24 | lun 5/08/24 | $ 145.188,00 |
| 6 | | 1.02 | CAMPAMENTO TABLA 18 m² | 10 días | lun 5/08/24 | mié 14/08/24 | $ 3.298.577,00 |
| 7 | | 1.03 | INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO | 6 días | mié 4/09/24 | mié 11/09/24 | $ 123.975,00 |
| 8 | | 1.04 | INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA | 6 días | mié 4/09/24 | mié 11/09/24 | $ 165.301,00 |
| 9 | | 1.05 | BAÑO PORTATIL (1UND) INC ASEO 2/SEMANA | 294 días | mar 30/07/24 | vie 30/05/25 | $ 721.293,00 |
| 10 | | 1.06 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | 3 días | lun 2/09/24 | mié 4/09/24 | $ 2.180.592,00 |
| 11 | | 1.07 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS,Y LAVAMANOS | 15 días | jue 15/08/24 | vie 30/08/24 | $ 116.730,00 |
| 12 | | 1.08 | DESMONTE CIELORRASO. | 15 días | jue 15/08/24 | vie 30/08/24 | $ 2.934.089,00 |
| 13 | | 1.09 | DESMONTE CUBIERTA. | 15 días | jue 15/08/24 | vie 30/08/24 | $ 1.741.130,00 |
| 14 | | 1.10 | DESMONTE PUERTAS (MET Y MAD). INC MARCOS | 15 días | jue 15/08/24 | vie 30/08/24 | $ 858.832,00 |
| 15 | | 1.11 | DESMONTE VENTANAS (MET Y MAD). INC MARCOS | 15 días | jue 15/08/24 | vie 30/08/24 | $ 210.298,00 |
| 16 | | 1.12 | DEMOLICION PLACA CONTRAPISO E=10 - 15cm | 15 días | jue 15/08/24 | vie 30/08/24 | $ 16.036.629,00 |
| 17 | | 1.13 | DEMOLICION MUROS (E=15 -25cm) | 15 días | jue 15/08/24 | vie 30/08/24 | $ 23.023.088,00 |
| 18 | | 1.14 | DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15M Y ALIGERADAS 0.25 - 0.45m + ACABADOS | 15 días | jue 15/08/24 | vie 30/08/24 | $ 15.101.495,00 |
| 19 | | 1.15 | DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS + ACABADOS | 15 días | jue 15/08/24 | vie 30/08/24 | $ 8.097.584,00 |
| 20 | | 1.16 | DEMOLICION CIMENTACION EN CONCRETO | 15 días | jue 15/08/24 | vie 30/08/24 | $ 4.778.756,00 |
| 21 | | 1.17 | DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO ( E=8-13cm) | 15 días | jue 15/08/24 | vie 30/08/24 | $ 284.337,00 |
| 22 | | 1.18 | DEMOLICION DE ESCALERAS + ACABADOS | 15 días | jue 15/08/24 | vie 30/08/24 | $ 835.250,00 |
| 23 | | 1.19 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE DEMOLICIONES,DESMONTES Y SOBRANTES | 2 días | vie 30/08/24 | lun 2/09/24 | $ 27.846.086,00 |
| 24 | | **2.00** | **MOVIMIENTOS DE TIERRA** | **155,25 días** | **lun 9/09/24** | **sáb 15/02/25** | **$ 46.324.844,00** |
| 25 | | 2.01 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (h<=1,5m) | 10 días | mié 11/09/24 | vie 20/09/24 | $ 11.532.097,00 |
| 26 | | 2.02 | LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO | 59,63 días | lun 9/09/24 | sáb 15/02/25 | $ 19.685.056,00 |
| 27 | | 2.03 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACIONES Y SOBRANTES | 3 días | sáb 21/09/24 | mar 24/09/24 | $ 15.107.691,00 |
| 28 | | **3.00** | **CIMENTACION** | **30,25 días** | **mar 24/09/24** | **jue 24/10/24** | **$ 83.489.476,00** |
| 29 | | 3.01 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI | 20 días | mar 24/09/24 | lun 14/10/24 | $ 16.169.150,00 |
| 30 | | 3.02 | ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI | 20 días | mar 24/09/24 | lun 14/10/24 | $ 17.396.475,00 |
| 31 | | 3.03 | PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E= 10cm | 10 días | mar 15/10/24 | jue 24/10/24 | $ 19.467.838,00 |
| 32 | | 3.04 | REFUERZO HIERRO 60.000 PSI | 30 días | mar 24/09/24 | jue 24/10/24 | $ 26.258.513,00 |
| 33 | | 3.05 | MALLA ELECTROSOLDADA | 30 días | mar 24/09/24 | jue 24/10/24 | $ 4.197.500,00 |
| 34 | | **4.00** | **ESTRUCTURAS** | **84,38 días** | **mar 3/12/24** | **jue 27/02/25** | **$ 174.053.199,00** |
| 35 | | 4.01 | COLUMNA EN CONCRETO 4000 PSI | 50 días | jue 19/12/24 | sáb 8/02/25 | $ 22.188.602,00 |
| 36 | | 4.02 | VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI | 60 días | sáb 21/12/24 | vie 21/02/25 | $ 36.505.040,00 |
| 37 | | 4.03 | LOSA CONCRETO MACIZA 3000 PSI E:0.10m | 0 días | mar 3/12/24 | mar 3/12/24 | $ 0,00 |
| 38 | | 4.04 | ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI | 20 días | lun 3/02/25 | sáb 22/02/25 | $ 4.658.216,00 |
| 39 | | 4.05 | REFUERZO HIERRO 60.000 PSI | 60 días | vie 27/12/24 | jue 27/02/25 | $ 96.633.347,00 |
| 40 | | 4.06 | MALLA ELECTROSOLDADA | 60 días | vie 27/12/24 | jue 27/02/25 | $ 14.067.994,00 |
| 41 | | **5.00** | **PISOS BASES Y ACABADOS** | **76,5 días** | **lun 10/02/25** | **mié 30/04/25** | **$ 21.438.628,00** |
| 42 | | 5.01 | ALISTADO DE PISO 3cm | 5,63 días | lun 17/03/25 | vie 21/03/25 | $ 8.533.341,00 |
| 43 | | 5.02 | ALISTADO DE PISO 3cm Impermeabilizado | 21,38 días | mar 18/03/25 | mar 8/04/25 | $ 4.405.608,00 |
| 44 | | 5.03 | PISO EN CERÁMICA 30x30 GRAVILLA BLANCA DUROPISO TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE | 0 días | lun 24/02/25 | lun 24/02/25 | $ 0,00 |
| 45 | | 5.04 | PISO TABLETA RETAL DE MARMOL 60X60cm | 0 días | lun 24/02/25 | lun 24/02/25 | $ 0,00 |
| 46 | | 5.05 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO TABLETA 60X60cm | 0 días | mar 11/03/25 | mar 11/03/25 | $ 0,00 |
| 47 | | 5.06 | MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO h:7-10cm | 14 días | mié 16/04/25 | mié 30/04/25 | $ 5.902.516,00 |
| 48 | | 5.07 | PISO EXTERIOR TERRAZA 20X120cm. | 0 días | sáb 22/02/25 | sáb 22/02/25 | $ 0,00 |
| 49 | | 5.08 | PASOS ESCALERA EN CONCRETO ESMALTADO A:30cm E:3cm | 0 días | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | $ 0,00 |
| 50 | | 5.09 | ALLANADO MECANICO ESMALTADO GRIS | 25,88 días | mié 19/02/25 | vie 11/04/25 | $ 1.620.407,00 |
| 51 | | 5.10 | BANCA EN CONCRETO, ACABADO DECK | 0 días | lun 24/02/25 | lun 24/02/25 | $ 0,00 |
| 52 | | 5.11 | MATERA CONCRETO [U] | 0 días | mié 5/03/25 | mié 5/03/25 | $ 0,00 |
| 53 | | 5.12 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA EN MORTERO.1:3 IMP | 4 días | mar 1/04/25 | vie 4/04/25 | $ 976.756,00 |
| 54 | | **6.00** | **MAMPOSTERIA** | **102,38 días** | **lun 30/12/24** | **lun 14/04/25** | **$ 141.572.635,00** |
| 55 | | 6.01 | MURO BLOQUE ESTRUCTURAL PV No 5 | 61,88 días | lun 10/02/25 | lun 14/04/25 | $ 141.572.635,00 |
| 56 | | 6.02 | MURO PARAPETO FACHADA BLOQUE PV No 5 H:0.90m | 0 días | lun 30/12/24 | lun 30/12/24 | $ 0,00 |
| 57 | | 6.03 | MESÓN EN CONCRETO 2.500 PSI | 0 días | lun 30/12/24 | lun 30/12/24 | $ 0,00 |
| 58 | | **7.00** | **INSTALACIONES RED ELECTRICA - VOZ Y DATOS** | **103,5 días** | **mié 29/01/25** | **jue 15/05/25** | **$ 142.608.961,00** |
| 59 | | 7.01 | SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO PVC | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 8.964.540,00 |
| 60 | | 7.02 | SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO PVC | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 526.484,00 |
| 61 | | 7.03 | SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO EMT | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 1.339.740,00 |
| 62 | | 7.04 | SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO EMT | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 243.266,00 |
| 63 | | 7.05 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 2.207.436,00 |
| 64 | | 7.06 | SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 30.269.376,00 |
| 65 | | 7.07 | LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 8.629.253,00 |
| 66 | | 7.08 | LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 5.327.313,00 |
| 67 | | 7.09 | LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 2.353.929,00 |
| 68 | | 7.10 | TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 340.921,00 |
| 69 | | 7.11 | TUBERÍA EMT 3/4" DESCOLGADA | 65 días | lun 10/03/25 | jue 15/05/25 | $ 15.555.935,00 |
| 70 | | 7.12 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 281.197,00 |
| 71 | | 7.13 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 945.987,00 |
| 72 | | 7.14 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X15A | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 399.805,00 |
| 73 | | 7.15 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X30A | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 175.776,00 |
| 74 | | 7.16 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE3X30A | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 186.527,00 |
| 75 | | 7.17 | SENSOR DE MOVIMIENTO DE 360 GRADOS 120V | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 2.078.658,00 |
| 76 | | 7.18 | CANALETA PLASTICA LISA 100X45 MM | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 1.246.699,00 |
| 77 | | 7.19 | CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 619.851,00 |
| 78 | | 7.20 | TIERRA CAJA MEDIDOR | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 537.895,00 |
| 79 | | 7.21 | LUMINARIA EMERGENCIA | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 2.812.057,00 |
| 80 | | 7.22 | ARMARIO MEDIDOR (1 CUENTA TRIFÁSICA) | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 201.587,00 |
| 81 | | 7.23 | BYPASS UPS | 78 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 137.085,00 |
| 82 | | 7.24 | UPS 2KVA | 0 días | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 0,00 |
| 83 | | 7.25 | TOTALIZADOR 3X60 | 0 días | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 0,00 |
| 84 | | 7.26 | CABLE 2X12+1X12T | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 11.037.698,00 |
| 85 | | 7.27 | CABLE 3X8+1X8+1X8T | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 1.274.482,00 |
| 86 | | 7.28 | CABLE 3X10+1X10+1X10T | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 1.474.007,00 |
| 87 | | 7.29 | CABLE 3x6+1x6N+1x6T | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 1.825.208,00 |
| 88 | | 7.30 | CABLE 2x10+1x10N+1x10T | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 321.574,00 |
| 89 | | 7.31 | TUBERÍA EMT 1" DESCOLGADA | 103,5 días | mié 29/01/25 | jue 15/05/25 | $ 456.184,00 |
| 90 | | 7.32 | TUBERÍA EMT 1 1/4" DESCOLGADA | 103,5 días | mié 29/01/25 | jue 15/05/25 | $ 929.880,00 |

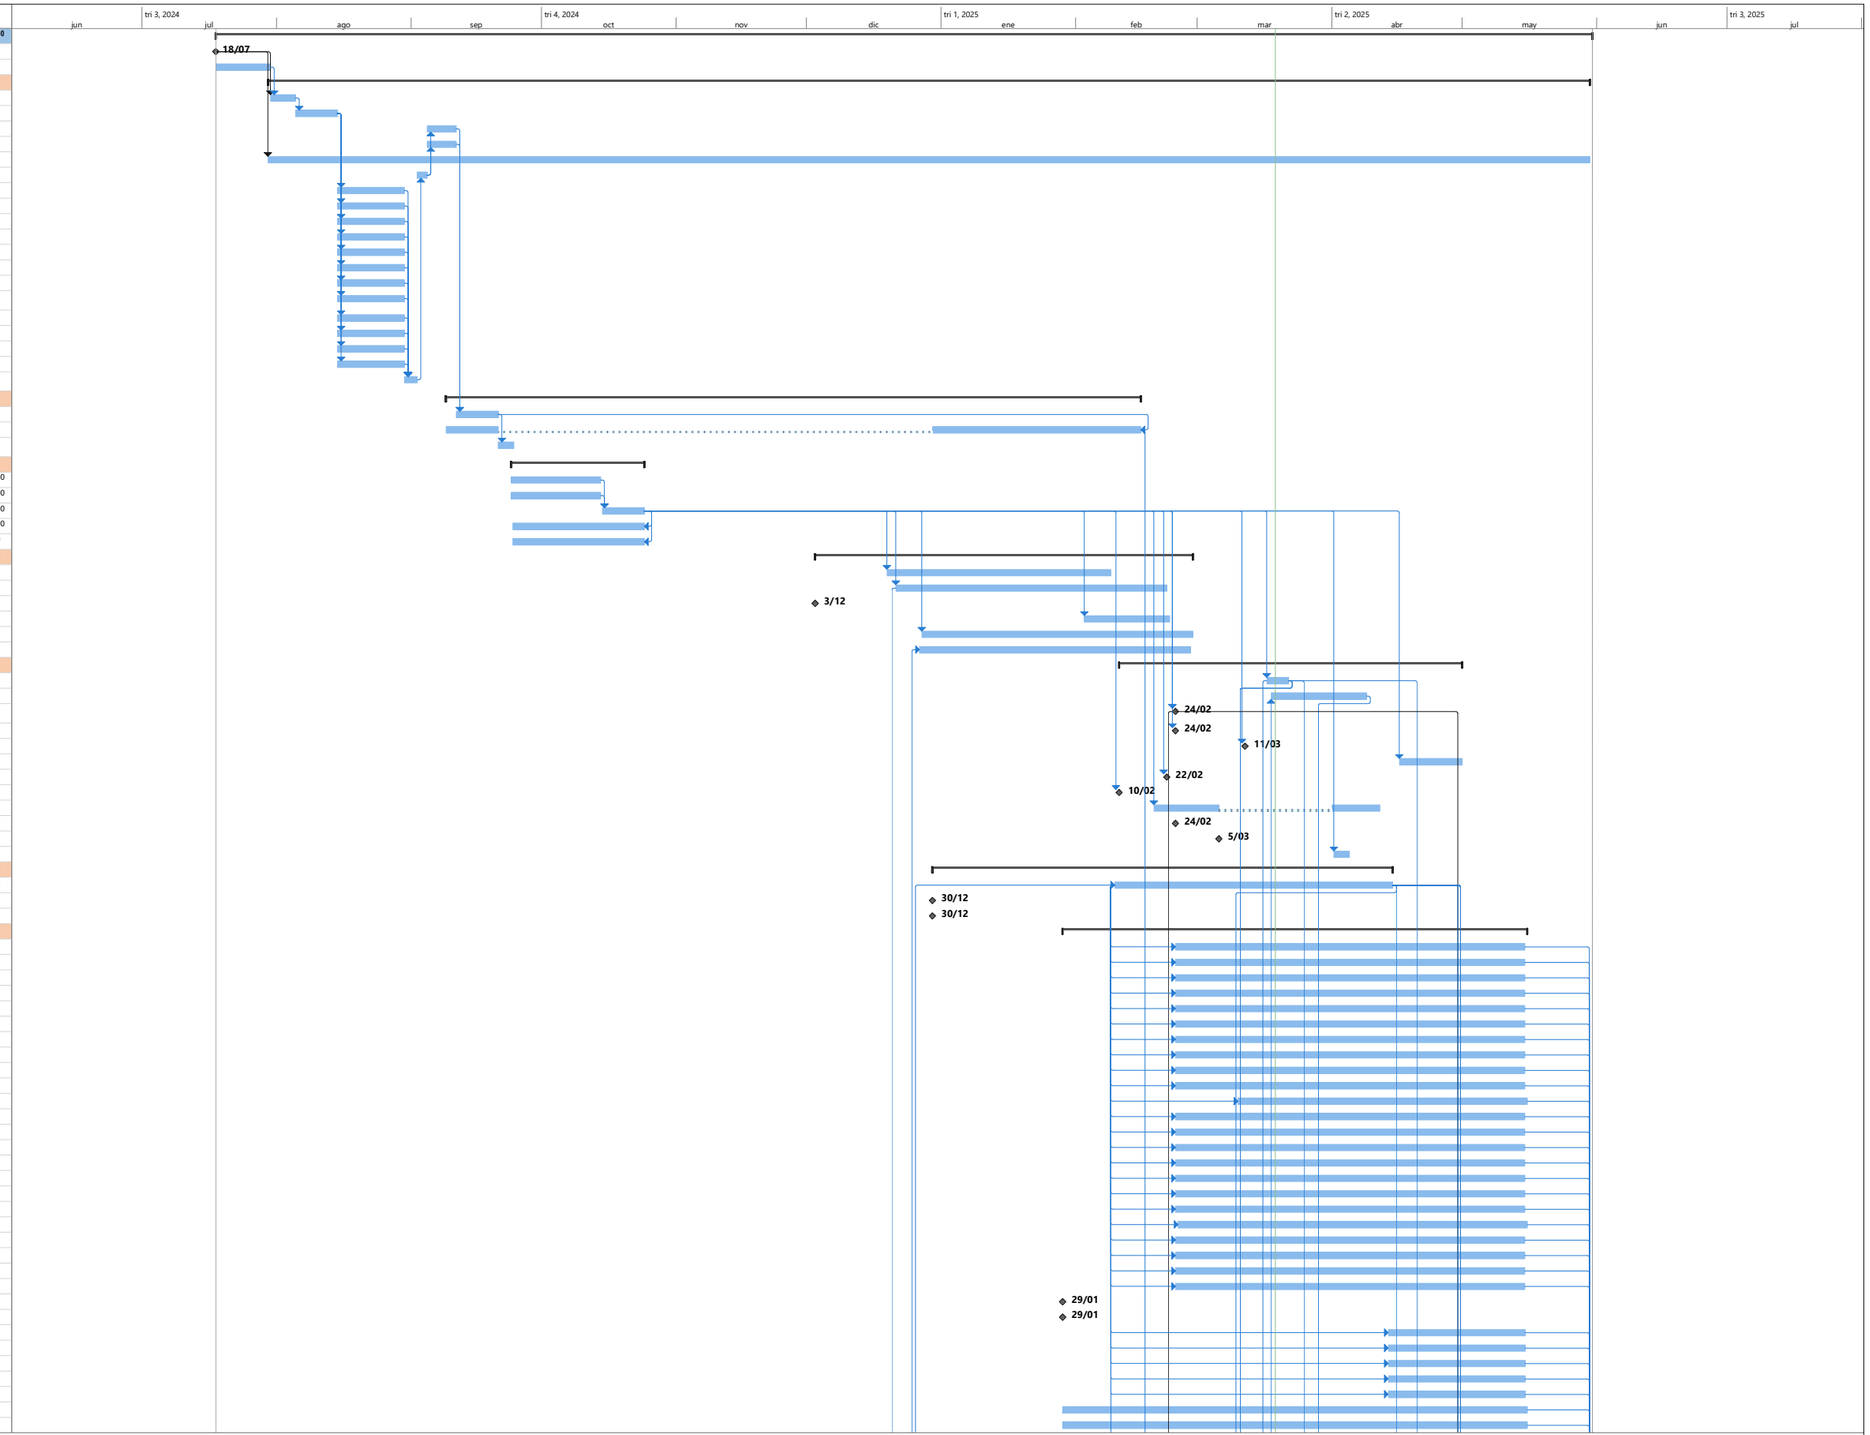


Proyecto: programacion SNR Pto Tejada V.2
Fecha: mié 19/03/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


| Id | Modo de tarea | ítem | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | | 7.33 | TABLERO TRIFÁSICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO TOTALIZADOR | 103 días | mié 29/01/25 | jue 15/05/25 | $ 475.859,00 |
| 92 | | 7.34 | TABLERO MONOFASICO 12 CIRCUITOS | 103 días | mié 29/01/25 | jue 15/05/25 | $ 185.163,00 |
| 93 | | 7.35 | BAJANTE TUBO GALVANIZADO 1 1/4 | 103 días | mié 29/01/25 | jue 15/05/25 | $ 187.655,00 |
| 94 | | 7.36 | CABLE ANTIFRAUDE 3x6+1x8N | 0 días | jue 15/05/25 | jue 15/05/25 | $ 0,00 |
| 95 | | 7.37 | PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 3.044.954,00 |
| 96 | | 7.38 | FACEPLATE RJ45-1 PUERTO+VENT.IDENTIF | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 920.392,00 |
| 97 | | 7.39 | PATCH CORD 10 PIES | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 453.243,00 |
| 98 | | 7.40 | ACCESS POINT | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 1.304.865,00 |
| 99 | | 7.41 | GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO" | 0 días | jue 15/05/25 | jue 15/05/25 | $ 0,00 |
| 100 | | 7.42 | PATCH CORD 5 PIES | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 408.120,00 |
| 101 | | 7.43 | CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT | 103,5 días | mié 29/01/25 | jue 15/05/25 | $ 698.271,00 |
| 102 | | 7.44 | ORGANIZADOR CABLES 19" | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 288.298,00 |
| 103 | | 7.45 | SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET | 0 días | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 0,00 |
| 104 | | 7.46 | CABLE DATOS UTP CAT 6A | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 3.047.247,00 |
| 105 | | 7.47 | TUBERIA EMT 3/4" DESCOLGADA | 103,5 días | mié 29/01/25 | jue 15/05/25 | $ 189.448,00 |
| 106 | | 7.48 | TUBERIA EMT 1" DESCOLGADA | 103,5 días | mié 29/01/25 | jue 15/05/25 | $ 2.733.024,00 |
| 107 | | 7.49 | ESTACIÓN MANUAL | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 902.960,00 |
| 108 | | 7.50 | SIRENA-ESTROBO | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 1.285.104,00 |
| 109 | | 7.51 | CAJA DE PASO 10X10 CM | 103,5 días | mié 29/01/25 | jue 15/05/25 | $ 51.039,00 |
| 110 | | 7.52 | SENSOR HUMO DIRECCIONABLE | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 4.561.590,00 |
| 111 | | 7.53 | SENSOR TÉRMICO DIRECCIONABLE | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 145.803,00 |
| 112 | | 7.54 | MODULO AISLAMIENTO (CORTO CIRCUITO) | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 1.439.505,00 |
| 113 | | 7.55 | TABLERO INTELIGENTE DIRECCIONABLE | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 9.793.847,00 |
| 114 | | 7.56 | CABLEADO FPL 2X18 AWG | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 1.506.934,00 |
| 115 | | 7.57 | CABLEADO FPL 2X16 AWG | 31 días | lun 14/04/25 | jue 15/05/25 | $ 684.180,00 |
| 116 | | 7.58 | TUBERIA EMT 3/4" DESCOLGADA | 103,5 días | mié 29/01/25 | jue 15/05/25 | $ 4.005.981,00 |
| 117 | | 7.59 | SALIDA EN TUBERIA EMT 3/4 3 M | 103,5 días | mié 29/01/25 | jue 15/05/25 | $ 1.489.632,00 |
| 118 | | 7.60 | PLANTA ELECTRICA 20.07Kva | 0 días | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 0,00 |
| 119 | | 7.61 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA (Según unifilar Pto Tejada) | 0 días | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 0,00 |
| 120 | | 7.62 | TUBERÍA PVC 1 1/4" | 103,5 días | mié 29/01/25 | jue 15/05/25 | $ 105.489,00 |
| 121 | | **8.00** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | **52,25 días** | **lun 10/02/25** | **vie 4/04/25** | **$ 23.992.581,00** |
| 122 | | 8.01 | PUNTO AF LAVAMANOS 1/2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 208.575,00 |
| 123 | | 8.02 | PUNTO AF SANITARIOS 1/2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 226.160,00 |
| 124 | | 8.03 | PUNTO AF ORINAL PVCP 1/2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 41.715,00 |
| 125 | | 8.04 | PUNTO AF LAVAPLATOS PVCP 1/2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 40.232,00 |
| 126 | | 8.05 | PUNTO AF POCETA DE ASEO PVCP 1/2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 45.479,00 |
| 127 | | 8.06 | PUNTO AF LLAVES MANGUERA 1/2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 147.404,00 |
| 128 | | 8.07 | TUBERIA PVC-P 1/2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 2.309.914,00 |
| 129 | | 8.08 | TUBERIA PVC-P 3/4" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 504.176,00 |
| 130 | | 8.09 | TUBERIA PVC-P 1" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 1.191.994,00 |
| 131 | | 8.10 | SALIDA SANITARIOS 4" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 524.545,00 |
| 132 | | 8.11 | SALIDA LAVAMANOS 2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 524.545,00 |
| 133 | | 8.12 | SALIDA ORINAL 2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 79.849,00 |
| 134 | | 8.13 | SALIDA LAVAPLATOS 2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 54.656,00 |
| 135 | | 8.14 | SALIDA POCETA DE ASEO 2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 54.656,00 |
| 136 | | 8.15 | SALIDA SIFON DE PISO 2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 572.896,00 |
| 137 | | 8.16 | SALIDA SIFON DE PISO AR 3" | 0 días | sáb 15/03/25 | sáb 15/03/25 | $ 0,00 |
| 138 | | 8.17 | SALIDA SIFON DE PISO ALL 3" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 1.009.840,00 |
| 139 | | 8.18 | SALIDA SIFON DRENAJE AIRE ACONDICIONADO 1.1/2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 375.696,00 |
| 140 | | 8.19 | TUBERIA PVC-S 2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 420.946,00 |
| 141 | | 8.20 | TUBERIA PVC-L 2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 330.935,00 |
| 142 | | 8.21 | TUBERIA PVC-S 4" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 2.473.171,00 |
| 143 | | 8.22 | TUBERIA PVC-S 1.1/2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 937.173,00 |
| 144 | | 8.23 | TUBERIA PVC-S 3" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 2.073.023,00 |
| 145 | | 8.24 | TUBERIA PVC-L 4" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 812.884,00 |
| 146 | | 8.25 | JUNTAS DE EXPANSION PVCS 4" | 0 días | mar 25/02/25 | mar 25/02/25 | $ 0,00 |
| 147 | | 8.26 | TRAGANTES TCI 3"-4" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 3.930.070,00 |
| 148 | | 8.27 | VALVULA TIPO BOLA 1/2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 466.158,00 |
| 149 | | 8.28 | VALVULA ANTIFRAUDE 1/2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 110.540,00 |
| 150 | | 8.29 | VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO 1/2" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 387.606,00 |
| 151 | | 8.30 | VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO 3/4" | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 75.825,00 |
| 152 | | 8.31 | TANQUE CÓNICO DE POLIETILENO DE 1000lt | 0 días | mar 25/02/25 | mar 25/02/25 | $ 0,00 |
| 153 | | 8.32 | CAJAS DE INSP. EN MAMPOSTERIA 60X60 cm Prof.Max=1,20m | 13 días | lun 10/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 3.370.326,00 |
| 154 | | 8.33 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (h<=1,5m) | 0 días | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | $ 0,00 |
| 155 | | 8.34 | LLENO MATERIAL DE SITIO | 0 días | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | $ 0,00 |
| 156 | | 8.35 | LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO | 0 días | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | $ 0,00 |
| 157 | | 8.36 | LLENO EN ARENA | 6,75 días | lun 17/02/25 | sáb 22/02/25 | $ 547.668,00 |
| 158 | | 8.37 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACIONES Y SOBRANTES | 0 días | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | $ 0,00 |
| 159 | | 8.38 | CAJILLA 1 MEDIDOR DE PISO | 5 días | lun 31/03/25 | vie 4/04/25 | $ 106.977,00 |
| 160 | | 8.39 | MONTAJE DE MEDIDORES AGUA FRIA(SIN SUMINISTRO) 1/2" | 5 días | lun 31/03/25 | vie 4/04/25 | $ 31.947,00 |
| 161 | | **9.00** | **INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIOS** | **11 días** | **mar 25/03/25** | **vie 4/04/25** | **$ 7.991.465,00** |
| 162 | | 9.01 | TUBERIA AN SCH 10 RANURADA 2" | 11 días | mar 25/03/25 | vie 4/04/25 | $ 273.569,00 |
| 163 | | 9.02 | TUBERIA AN SCH 10 RANURADA 3" | 11 días | mar 25/03/25 | vie 4/04/25 | $ 1.263.744,00 |
| 164 | | 9.03 | TUBERIA AN SCH 10 RANURADA 1 1/2" | 11 días | mar 25/03/25 | vie 4/04/25 | $ 721.299,00 |
| 165 | | 9.04 | GABINETE TIPO II SENCILLO (1 1/2") | 11 días | mar 25/03/25 | vie 4/04/25 | $ 4.291.977,00 |
| 166 | | 9.05 | SIAMESA ENTRADA 3X2 1/2"X2 1/2" | 11 días | mar 25/03/25 | vie 4/04/25 | $ 707.460,00 |
| 167 | | 9.06 | PINTURA ANTICORROSIVO + ESMALTE 1.1/2" | 11 días | mar 25/03/25 | vie 4/04/25 | $ 304.548,00 |
| 168 | | 9.07 | PINTURA ANTICORROSIVO + ESMALTE 3" | 11 días | mar 25/03/25 | vie 4/04/25 | $ 428.868,00 |
| 169 | | **10.00** | **INSTALACIONES SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA** | **23,75 días** | **sáb 12/04/25** | **mié 7/05/25** | **$ 80.828.305,00** |
| 170 | | 10.01 | UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE - condensación por aire de descarga horizontal, refrigerante R-410A, alimentación eléctrica 220V-3F-60Hz. Capacidad nominal 120.000 Btuh. Igual o similar al Modelo ARUN120BSS0 de Lge. | 7 días | mié 30/04/25 | mié 7/05/25 | $ 16.608.339,00 |
| 171 | | 10.02 | UNIDAD TIPO FANCOIL DE ALTA ESTATICA de refrigerante variable-refrigerante R-410A, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 36 KBtuh, Igual o similar al Modelo ARNU36GBGA4 de Lge. | 7 días | mié 30/04/25 | mié 7/05/25 | $ 4.004.381,00 |
| 172 | | 10.03 | UNIDAD TIPO FANCOIL DE ALTA ESTATICA de refrigerante variable-refrigerante R-410A, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 24 KBtuh, Igual o similar al Modelo ARNU24GBHA4 de Lge. | 7 días | mié 30/04/25 | mié 7/05/25 | $ 2.931.210,00 |
| 173 | | 10.04 | UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE DE 1 VÍA de refrigerante variable-refrigerante R-410A, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 18 KBtuh, Igual o similar al Modelo ARNU18GTTB4 de Lge. | 7 días | mié 30/04/25 | mié 7/05/25 | $ 3.172.375,00 |
| 174 | | 10.05 | UNIDAD FANCOIL TIPO UNIDAD DE MURO de refrigerante variable-refrigerante R-410A, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 18 KBtuh, Igual o similar al Modelo ARNU18GSKN4 de Lge. | 7 días | mié 30/04/25 | mié 7/05/25 | $ 2.660.518,00 |
| 175 | | 10.06 | UNIDAD FANCOIL TIPO UNIDAD DE MURO de refrigerante variable-refrigerante R-410A, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 15 KBtuh, Igual o similar al Modelo ARNU15GSJA4 de Lge. | 7 días | mié 30/04/25 | mié 7/05/25 | $ 2.576.497,00 |

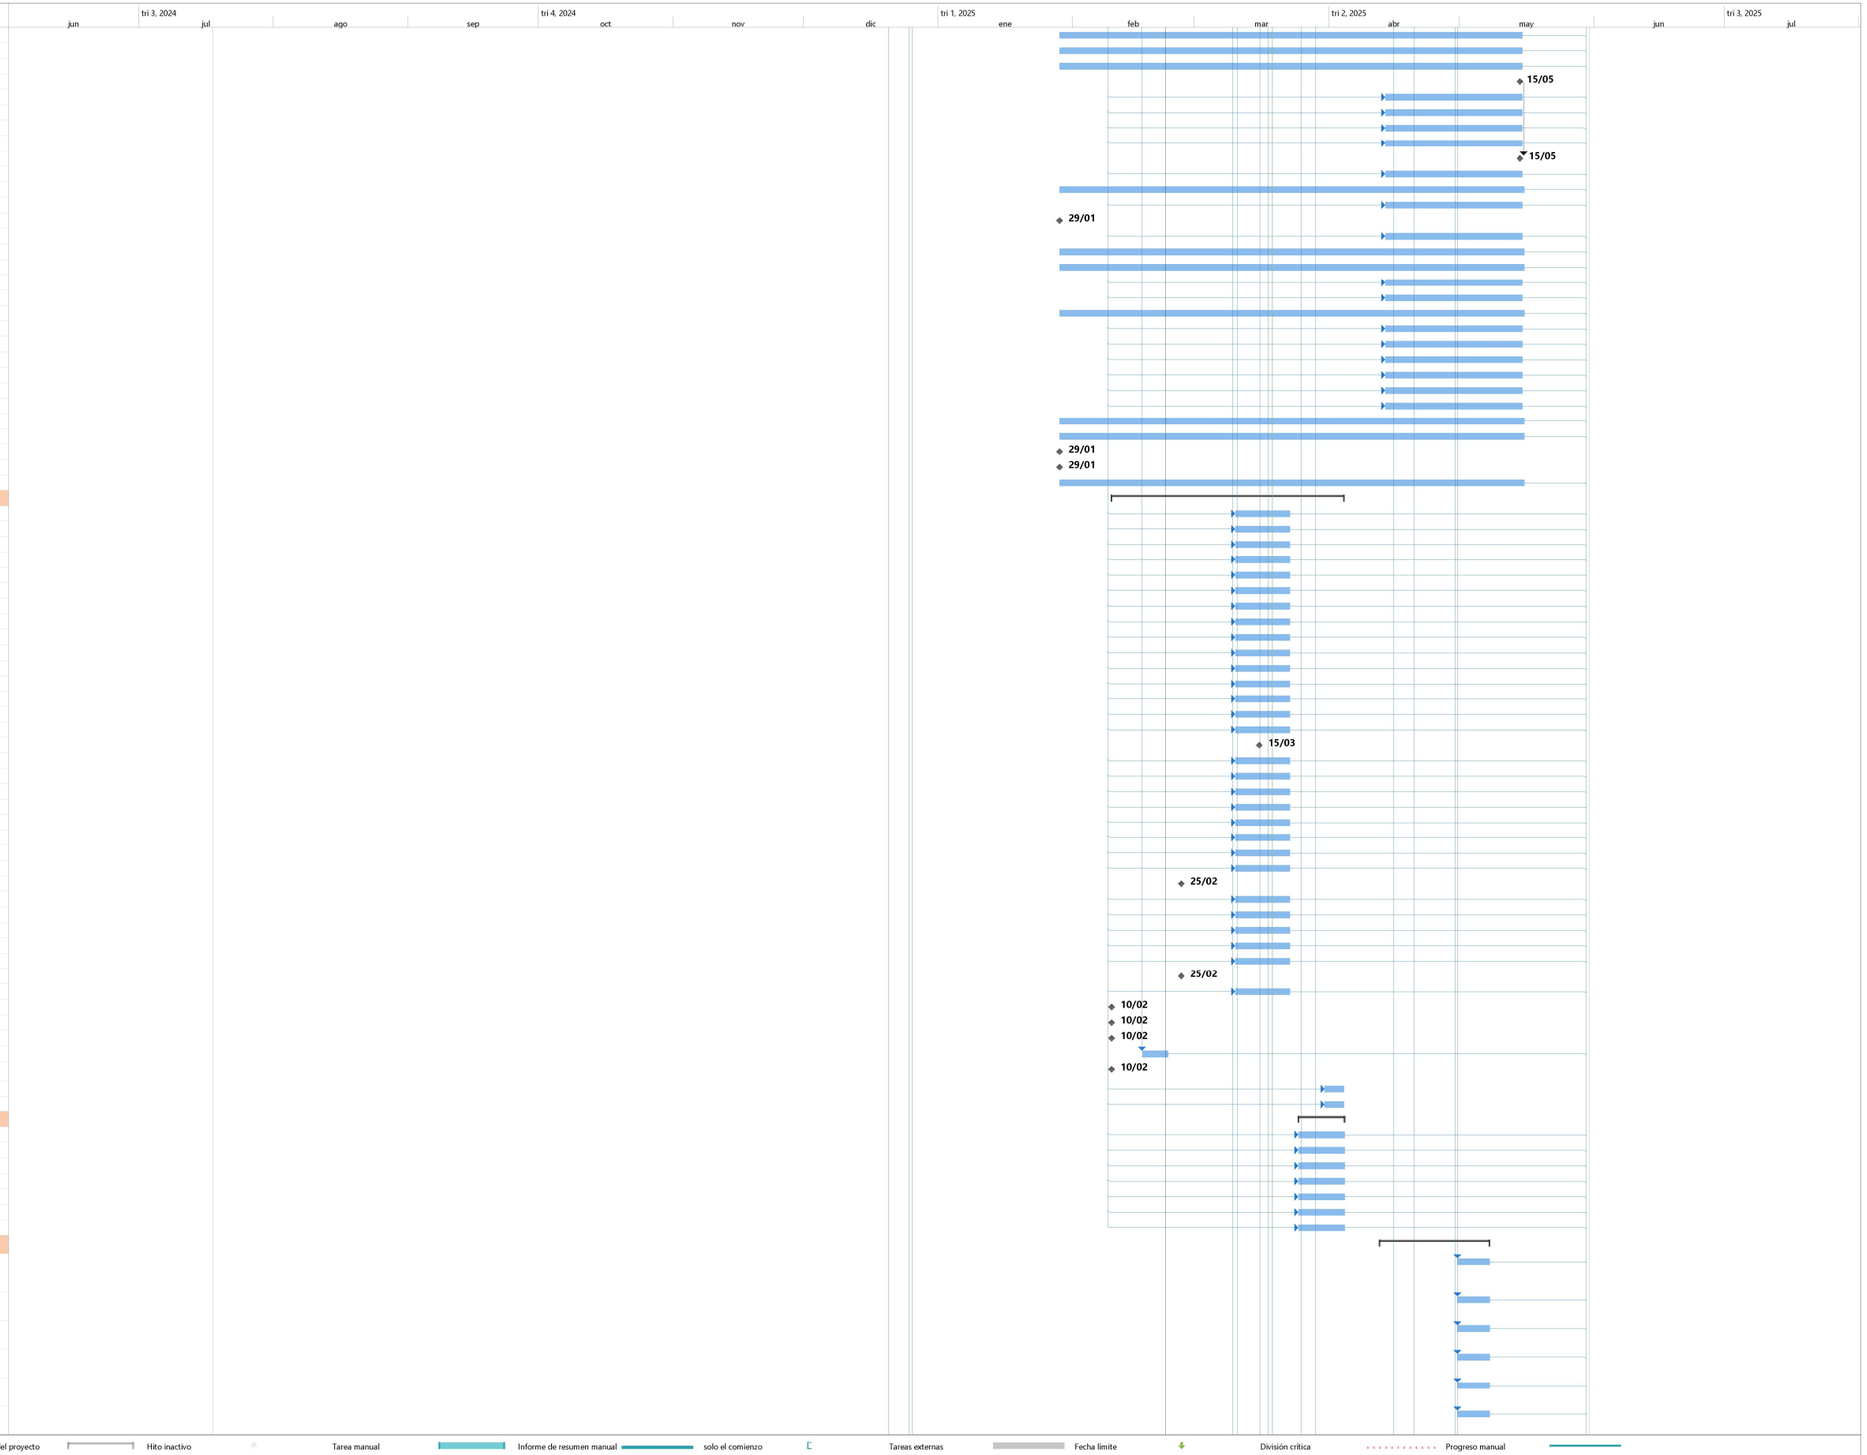


Proyecto: programacion SNR Pto Tejada V.2
Fecha: mié 19/03/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


| Id | Modo de tarea | Ítem | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | | 10,07 | UNIDAD FANCOIL TIPO UNIDAD DE MURO de refrigerante variable-refrigerante R-410A, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz. Capacidad nominal 12 KBtu/h, Igual o similar al Modelo ARNU12GSJA4 de Lge. | 7 días | mié 30/04/25 | mié 7/05/25 | $ 2.296.574,00 |
| 177 | | 10,08 | BOMBA DE CONDENSADO para unidades de muro, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 12L/h @ 0mcda, Igual o similar al Modelo Minibiano de la marca Aspen. | 7 días | mié 30/04/25 | mié 7/05/25 | $ 1.850.166,00 |
| 178 | | 10,09 | TUBERIA DE COBRE AISLADA - Tipo L aislado con rubatex de 3/8" de espesor. Diámetro 6.35 mm (1/4"). | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 559.247,00 |
| 179 | | 10,1 | TUBERIA DE COBRE AISLADA - Tipo L aislado con rubatex de 1/2" de espesor. Diámetro 9.52 mm (3/8") | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 1.721.454,00 |
| 180 | | 10,11 | TUBERIA DE COBRE AISLADA -Tipo L aislado con rubatex de 1/2" de espesor. Diámetro 12.7 mm (1/2") | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 1.076.280,00 |
| 181 | | 10,12 | TUBERIA DE COBRE AISLADA - Tipo L aislado con rubatex de 1/2" de espesor . Diámetro 15.88 mm (5/8") | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 1.327.410,00 |
| 182 | | 10,13 | TUBERIA DE COBRE AISLADA - Tipo L aislado con rubatex de 1/2" de espesor. Diámetro 19.05 mm (3/4") | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 601.881,00 |
| 183 | | 10,14 | TUBERIA DE COBRE AISLADA - Tipo L aislado con rubatex de 1/2" de espesor. Diámetro 22.2 mm (7/8") | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 808.641,00 |
| 184 | | 10,15 | TUBERIA DE COBRE AISLADA - Tipo K aislado con rubatex de 1/2" de espesor. Diámetro 28.6 mm (1 1/8") | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 2.739.450,00 |
| 185 | | 10,16 | REFRIGERANTE R-410A | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 413.820,00 |
| 186 | | 10,17 | DERIVACION PARA TUBERIA DE REFRIGERACION YBRANCH-Igual o similar al Modelo ARBLN01621 de Lge. | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 1.014.894,00 |
| 187 | | 10,18 | DERIVACION PARA TUBERIA DE REFRIGERACION YBRANCH-Igual o similar al Modelo ARBLN03321 de Lge. | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 883.510,00 |
| 188 | | 10,19 | VENTILADOR CENTRIFUGO DE FALSO PLAFON- 110V-1F-60Hz., Igual o similar al Modelo CFP 225 de la marca Soler y Palau. | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 5.094.128,00 |
| 189 | | 10,2 | TUBERIA PVC SANITARIA, Diametro 6" | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 465.668,00 |
| 190 | | 10,21 | DUCTERIA lamina galv calibre 24 | 0 días | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | $ 0,00 |
| 191 | | 10,22 | DUCTERIA en base de espuma rígida de poliosocianurato de espesor de 20mm recubierto con aluminio gofrado de 60 µm por ambas caras. | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 2.122.509,00 |
| 192 | | 10,23 | Manguera Flexible aislada en fibra de Vidrio 6" | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 165.764,00 |
| 193 | | 10,24 | Anillo en lámina galvanizada 8" con pestañas para Poliosocianurato. | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 119.816,00 |
| 194 | | 10,25 | DIFUSOR LINEAL dos ranuras de 1", con plenum aislado internamente con aercocr de 1", Igual o similar al Modelo L-SD-2R-1-CP L-D-Ø 8"-48X2-W de la marca Laminaire. | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 2.391.848,00 |
| 195 | | 10,26 | Transformación en lámina galvanizada de 6" x 6" a diametro 6" igual o similar al Modelo L-SR L-Ç Ø 6 6X6 GALVANIZADO de la marca | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 530.132,00 |
| 196 | | 10,27 | REJILLA TIPO LOUVER, Igual o similar al Modelo L-RA-LP-A 6X6 W de la marca Laminaire. | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 778.864,00 |
| 197 | | 10,28 | DIFUSOR DE 4 VIAS DE SUMINISTRO CON DAMPER, Igual o similar al Modelo L-2S-9" x 9"-DB de la marca Laminaire. | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 952.076,00 |
| 198 | | 10,29 | REJILLA DE RETORNO CON PORTAFILTRO, Igual o similar al Modelo L-RF-G-40" x 10" de la marca Laminaire. | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 380.378,00 |
| 199 | | 10,3 | REJILLA DE RETORNO CON PORTAFILTRO, Igual o similar al Modelo L-RF-G-44" x 14" de la marca Laminaire. | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 502.993,00 |
| 200 | | 10,31 | CABLE APANTALLADO 2 X18 AWG | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 4.401.900,00 |
| 201 | | 10,32 | Control Central con programador de horarios y protocolo Bacnet Modelo PACSAB000, AC SMART IV, CONTROL CENTRAL MAX. 128 IDU; PANTALLA TOUCH 10"; HORARIOS. 2 DI + 2 DO | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 14.018.110,00 |
| 202 | | 10,33 | Termostato alambrico para encendido y apagado de las unidades interiores tipo fancoil de alta estatica, Igual o similar al Modelo PQRCVCL0QW de la Marca Lg Electronics. | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 1.024.936,00 |
| 203 | | 10,34 | Control inalambrico para encendido y apagado de las unidades interiores, Igual o similar al Modelo PQWRHQ0FDB de la Marca Lg Electronics. | 8 días | sáb 12/04/25 | lun 21/04/25 | $ 632.536,00 |
| 204 | | **11.00** | **CARPINTERIA EN MADERA** | **0 días** | **sáb 22/03/25** | **sáb 22/03/25** | **$ 1.402.770,00** |
| 205 | | 11.01 | PUERTA EN MADERA 80cm-100cm | 0 días | sáb 22/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 0,00 |
| 206 | | 11.02 | PUERTA EN MADERA 60cm-70cm | 0 días | sáb 22/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 0,00 |
| 207 | | 11.03 | PUERTA CORREDIZA EN MADERA DE 100cm | 0 días | sáb 22/03/25 | sáb 22/03/25 | $ 1.402.770,00 |
| 208 | | **12.00** | **CARPINTERIA METALICA - VIDRIO** | **61,88 días** | **lun 10/03/25** | **lun 12/05/25** | **$ 23.980.811,00** |
| 209 | | 12.01 | PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED Cal. 16 | 0 días | jue 20/03/25 | jue 20/03/25 | $ 0,00 |
| 210 | | 12.02 | MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0.80m | 0 días | lun 10/03/25 | lun 10/03/25 | $ 0,00 |
| 211 | | 12.03 | PUERTA VENTANA ALUMINIO -VIDRIO | 0 días | jue 20/03/25 | jue 20/03/25 | $ 0,00 |
| 212 | | 12.04 | MARCO ALUMINIO PARA PUERTA DE 160cm | 0 días | jue 20/03/25 | jue 20/03/25 | $ 0,00 |
| 213 | | 12.05 | MARCO ALUMINIO PARA PUERTA DE 80cm-100cm | 0 días | jue 20/03/25 | jue 20/03/25 | $ 0,00 |
| 214 | | 12.06 | MARCO ALUMINIO PARA PUERTA DE 60cm-70cm | 0 días | jue 20/03/25 | jue 20/03/25 | $ 0,00 |
| 215 | | 12.07 | VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.7-44 | 3 días | mar 15/04/25 | jue 17/04/25 | $ 87.903,00 |
| 216 | | 12.08 | VENTANERIA FACHADA EN ALUMINIO , JUNTA PERDIDA CRISTAL LAMINADO 4+4. | 0 días | jue 20/03/25 | jue 20/03/25 | $ 0,00 |
| 217 | | 12.09 | PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DE 2" CONTRA MURO. | 13,5 días | lun 28/04/25 | sáb 10/05/25 | $ 6.310.197,00 |
| 218 | | 12.10 | BARANDA ESCALERA ACERO INOXIDABLE DE 2". | 5 días | mié 7/05/25 | lun 12/05/25 | $ 17.582.711,00 |
| 219 | | **13.00** | **CIELOS RASOS** | **24,75 días** | **jue 3/04/25** | **lun 28/04/25** | **$ 18.424.690,00** |
| 220 | | 13.01 | CIELORASO PLANO EN DRYWALL 1/2" | 20,25 días | jue 3/04/25 | mié 23/04/25 | $ 16.362.335,00 |
| 221 | | 13.02 | CIELORASO PLANO EN DRYWALL RH 1/2" | 4,5 días | jue 24/04/25 | lun 28/04/25 | $ 2.062.355,00 |
| 222 | | **14.00** | **CUBIERTAS** | **61,25 días** | **vie 14/03/25** | **vie 16/05/25** | **$ 9.980.526,00** |
| 223 | | 14.01 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS E=0.03M | 5 días | lun 14/04/25 | vie 18/04/25 | $ 1.754.903,00 |
| 224 | | 14.02 | TEJA POLICARBONATO TRASLUCIDO | 10 días | vie 14/03/25 | lun 24/03/25 | $ 2.536.925,00 |
| 225 | | 14.03 | CANAL EN LÁMINA Cal 26 | 5 días | lun 12/05/25 | vie 16/05/25 | $ 1.409.064,00 |
| 226 | | 14.04 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal 22 | 9 días | mar 18/03/25 | lun 12/05/25 | $ 4.279.634,00 |
| 227 | | **15.00** | **IMPERMEABILIZACION** | **8 días** | **vie 18/04/25** | **sáb 26/04/25** | **$ 4.608.320,00** |
| 228 | | 15.01 | MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO 3.6MM-FOIL ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO | 8 días | vie 18/04/25 | sáb 26/04/25 | $ 4.608.320,00 |
| 229 | | **16.00** | **PINTURAS** | **78,75 días** | **lun 24/02/25** | **jue 15/05/25** | **$ 79.808.696,00** |
| 230 | | 16.01 | VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS | 11,25 días | lun 5/05/25 | jue 15/05/25 | $ 4.608.678,00 |
| 231 | | 16.02 | VINILO TIPO 1 MUROS 3 MANOS. BASE EN ESTUCO + PAÑETE | 78,75 días | lun 24/02/25 | jue 15/05/25 | $ 50.325.239,00 |
| 232 | | 16.03 | PINTURA TIPO CORAZA 2M. BASE EN ESTUCO + PAÑETE | 65,25 días | lun 10/03/25 | jue 15/05/25 | $ 22.262.543,00 |
| 233 | | 16.04 | PINTURA EPOXICA. 3M BASE EN ESTUCO + PAÑETE | 33,75 días | vie 11/04/25 | jue 15/05/25 | $ 2.612.236,00 |
| 234 | | **17.00** | **ENCHAPES MUROS Y ACABADOS** | **23,63 días** | **jue 1/05/25** | **sáb 24/05/25** | **$ 12.788.721,00** |
| 235 | | 17.01 | CERAMICA FORMATO 30X60 | 23,63 días | jue 1/05/25 | sáb 24/05/25 | $ 12.430.792,00 |
| 236 | | 17.02 | POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO | 4,5 días | mar 6/05/25 | vie 9/05/25 | $ 357.929,00 |
| 237 | | **18,00** | **APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS** | **11,25 días** | **mar 6/05/25** | **vie 16/05/25** | **$ 9.079.991,00** |
| 238 | | 18,01 | SANITARIO PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) | 5 días | mar 6/05/25 | sáb 10/05/25 | $ 1.679.107,00 |
| 239 | | 18,02 | SANITARIO TIPO AHORRADOR | 5,63 días | mar 6/05/25 | sáb 10/05/25 | $ 3.343.728,00 |
| 240 | | 18,03 | LAVAMANOS PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) | 5,63 días | mar 6/05/25 | sáb 10/05/25 | $ 847.619,00 |
| 241 | | 18,04 | LAVAMANOS DE COLGAR | 5,63 días | mar 6/05/25 | sáb 10/05/25 | $ 1.637.780,00 |
| 242 | | 18,05 | BARRAS DE SEGURIDAD Y APOYO PMR EN ACERO INOXIDABLE | 5,63 días | mar 6/05/25 | sáb 10/05/25 | $ 936.120,00 |
| 243 | | 18,06 | LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE | 0 días | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | $ 0,00 |
| 244 | | 18,07 | ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO | 5,63 días | mar 6/05/25 | sáb 10/05/25 | $ 635.637,00 |
| 245 | | **19,00** | **URBANISMO** | **11,25 días** | **lun 5/05/25** | **jue 15/05/25** | **$ 1.836.928,00** |
| 246 | | 19,01 | ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI e=8cm | 11,25 días | lun 5/05/25 | jue 15/05/25 | $ 1.053.530,00 |
| 247 | | 19,02 | SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS | 11,25 días | lun 5/05/25 | jue 15/05/25 | $ 537.562,00 |
| 248 | | 19,03 | BORDILLO O SARDINEL EN CONCRETO 12x40cm | 11,25 días | lun 5/05/25 | jue 15/05/25 | $ 245.836,00 |
| 249 | | **20,00** | **ASEO Y SEÑALIZACIÓN** | **4,5 días** | **lun 26/05/25** | **jue 29/05/25** | **$ 7.909.864,00** |
| 250 | | 20,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | 4 días | lun 26/05/25 | jue 29/05/25 | $ 1.603.873,00 |
| 251 | | 20,02 | AVISO ORIP 2,60x1,00x0,15m | 4 días | lun 26/05/25 | jue 29/05/25 | $ 2.378.345,00 |
| 252 | | 20,03 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21x30cm | 4 días | lun 26/05/25 | jue 29/05/25 | $ 1.668.159,00 |
| 253 | | 20,04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE | 4 días | lun 26/05/25 | jue 29/05/25 | $ 2.259.487,00 |
| 254 | | | **ITEMS NO PREVISTOS** | **149,63 días** | **vie 27/12/24** | **vie 30/05/25** | **$ 313.015.444,00** |
| 255 | | NP 1.0 | TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 500 lt | 5 días | mar 22/04/25 | sáb 26/04/25 | $ 1.771.250,00 |
| 256 | | NP 2.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM PARA LLAVES DE PASO | 6,75 días | mié 30/04/25 | mar 6/05/25 | $ 222.462,00 |

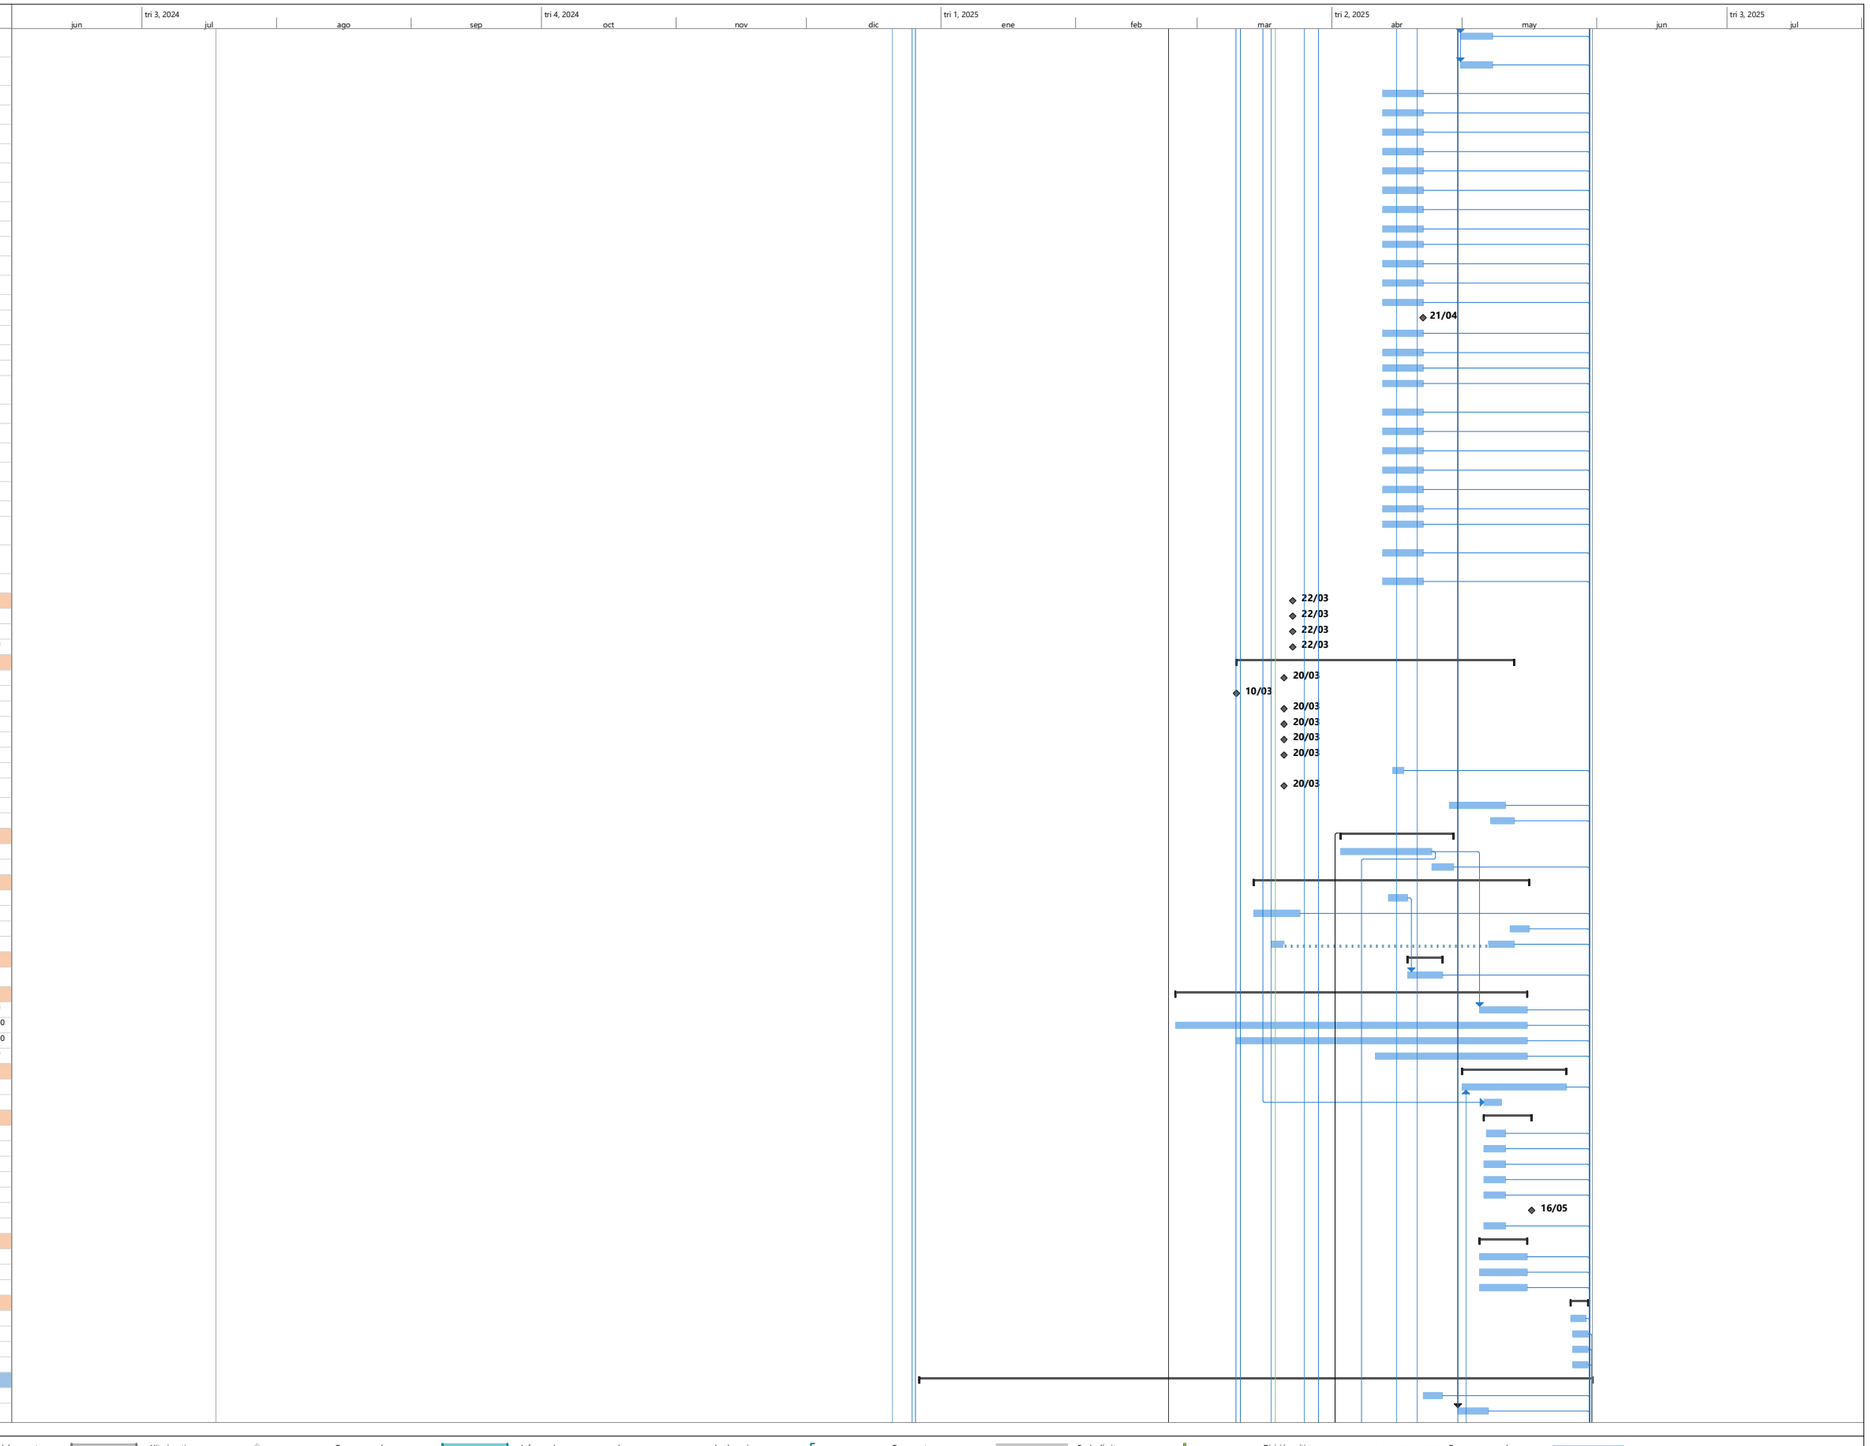


Proyecto: programacion SNR Pto Tejada V.2
Fecha: mié 19/03/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

| Id | Modo de tarea | Item | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | | NP 3.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN EN ALUMINIO EN REMATE DE PELDAÑOS GRADAS | 10 días | lun 21/04/25 | mié 30/04/25 | $ 784.215,00 |
| 258 | | NP 4.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE DE GRADAS CERÁMICA INCLUYE HUELLA Y CONTRAHUELLA | 0 días | vie 14/03/25 | vie 14/03/25 | $ 0,00 |
| 259 | | NP 5.0 | ALFAGIA CONCRETO ANCHO HASTA 40CM (INCLUYE ACERO DE RUERZO, TABICONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN) | 15 días | vie 25/04/25 | sáb 10/05/25 | $ 8.766.650,00 |
| 260 | | NP 6.0 | ANCLAJE EPOXICO PARA DOVELAS DIAMETRO 1/2" - 15 CM DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (INCLUYE PERFORACIÓN- LIMPIEZA -EPOXICO) | 28,13 días | lun 10/02/25 | lun 10/03/25 | $ 9.561.916,00 |
| 261 | | NP 7.0 | DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.09X0.20m PARA PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE ACERO) | 28,13 días | lun 10/02/25 | lun 10/03/25 | $ 1.296.544,00 |
| 262 | | NP 8.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTERAS PANEL YESO REGULAR ≤40 CM APROX. (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA | 10 días | mié 30/04/25 | vie 9/05/25 | $ 872.196,00 |
| 263 | | NP 9.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE INSPECCION PARA CIELO RASOS CON MARCO METALICO Y TAPA EN ALUMINO DE 60X60CM | 14 días | mié 9/04/25 | mié 23/04/25 | $ 2.286.330,00 |
| 264 | | NP 10 | CARTERA INTERIOR DE MUROS (INCLUYE VINILO TIPO 1 MUROS 3 MANOS. BASE EN ESTUCO + PAÑETE + FILOS 1:2 entre 25cm A 50cm E=2,5cms) | 30 días | mar 15/04/25 | jue 15/05/25 | $ 7.534.257,00 |
| 265 | | NP 11 | CARTERA INTERIOR DE MUROS (INCLUYE VINILO TIPO 1 MUROS 3 MANOS. BASE EN ESTUCO + PAÑETE + FILOS 1:2 entre 15cm A 24cm E=2,5cms) | 30 días | mar 15/04/25 | jue 15/05/25 | $ 4.167.705,00 |
| 266 | | NP 12 | CARTERA EXTERIOR DE MUROS (INLCUYE PINTURA TIPO CORAZA 2M. BASE EN ESTUCO + PAÑETE +FILOS 1:2 ≤ entre 25cm A 50cms | 30 días | mar 15/04/25 | jue 15/05/25 | $ 1.152.455,00 |
| 267 | | NP 13 | CARTERA EXTERIOR DE MUROS (INLCUYE PINTURA TIPO CORAZA 2M. BASE EN ESTUCO + PAÑETE +FILOS 1:2 ≤ entre 15cm a 24 cm | 30 días | mar 15/04/25 | jue 15/05/25 | $ 498.196,00 |
| 268 | | NP 14 | CARTERA INTERIOR DE MUROS (INCLUYE PINTURA EPOXICA. 3M BASE EN ESTUCO + PAÑETE +FILOS 1:2 ≤ A 50cms E=2,5cms) | 54 días | mar 4/03/25 | lun 28/04/25 | $ 190.723,00 |
| 269 | | NP 15 | REPELLO DE MUROS 1:2 PARA ENCHAPE MURO BAÑOS | 23,63 días | sáb 5/04/25 | mié 30/04/25 | $ 4.193.154,00 |
| 270 | | NP 16 | CARTERA REPELLO DE MUROS 1:2 PARA ENCHAPE MURO BAÑOS (INLCUYE PAÑETE +FILOS 1:2 ≤ A 50cms E=2,5cms) | 23,63 días | sáb 5/04/25 | mié 30/04/25 | $ 772.560,00 |
| 271 | | NP 17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METALICAS PARA SIFON 3"X 2" | 5 días | lun 19/05/25 | vie 23/05/25 | $ 167.517,00 |
| 272 | | NP 18 | LOSA CONCRETO MACIZA 4000 PSI E:0.10m, INCLUYE ENCOFRADO EN FORMALETA Y APUNTALAMIENTO MAS CASETONES PARA ALIGERAMIENTO + INCLUYE VIGAS (APROX.31.6M3) | 60 días | vie 27/12/24 | jue 27/02/25 | $ 50.976.497,00 |
| 273 | | NP 19 | BOMBA CENTRIFUGA 1HP 208V (Incluye accesorios de instalación, protección y arrancados) | 2 días | lun 21/04/25 | mar 22/04/25 | $ 1.336.886,00 |
| 274 | | NP 20 | CENEFA EN GRANITO PULIDO ancho 15cms longitud variable | 3 días | lun 12/05/25 | mié 14/05/25 | $ 3.392.446,00 |
| 275 | | NP 21 | TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.26 | 6,75 días | jue 1/05/25 | mié 7/05/25 | $ 681.740,00 |
| 276 | | NP 22 | ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE TANQUE DE AGUA , SOPORTE PARA FACHADA CON MICROPERFORADO . | 30 días | mar 15/04/25 | jue 15/05/25 | $ 20.243.588,00 |
| 277 | | | INSTALACIONES RED ELECTRICA | 80 días | vie 21/02/25 | jue 15/05/25 | $ 65.794.326,00 |
| 278 | | NP23 | PLANTA ELECTRICA 22 KVA | 10 días | lun 21/04/25 | mié 30/04/25 | $ 41.495.988,00 |
| 279 | | NP24 | SALIDA TOMA CORRIENTE TIERRA AISLADA DOBLE EN MURO PV | 80 días | vie 21/02/25 | jue 15/05/25 | $ 3.610.426,00 |
| 280 | | NP25 | MEDIDOR ELÉCTRICO 3F-4H 120/208V | 15 días | mié 30/04/25 | jue 15/05/25 | $ 452.812,00 |
| 281 | | NP26 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X40A | 12 días | sáb 3/05/25 | jue 15/05/25 | $ 240.640,00 |
| 282 | | NP27 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X80A | 14 días | jue 1/05/25 | jue 15/05/25 | $ 966.442,00 |
| 283 | | NP28 | CANALETA CON DIVISIÓN | 30 días | mar 15/04/25 | jue 15/05/25 | $ 1.949.643,00 |
| 284 | | NP29 | CERTIFICACIÓN RETIE/ RETILAP | 80 días | vie 21/02/25 | jue 15/05/25 | $ 6.623.824,00 |
| 285 | | NP30 | TUBERIA IMC 1 -1/2" | 80 días | vie 21/02/25 | jue 15/05/25 | $ 738.559,00 |
| 286 | | NP31 | CABLE ANTIFRAUDE 3XN°4 + 1XN°6 AWG XLPE COBRE 3 HILOS 220V - 90° (no incluye servicio de grúa de acuerdo a criterio del consultor de la entidad) | 20 días | vie 25/04/25 | jue 15/05/25 | $ 9.715.992,00 |
| 287 | | | ILUMINACION | 20 días | lun 21/04/25 | sáb 10/05/25 | $ 13.472.188,00 |
| 288 | | NP32 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC | 20 días | lun 21/04/25 | sáb 10/05/25 | $ 743.080,00 |
| 289 | | NP33 | SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC | 20 días | lun 21/04/25 | sáb 10/05/25 | $ 530.796,00 |
| 290 | | NP34 | ACOMETIDA ELÉCTRICA 2F (2#12+1#12) 3/4" | 20 días | lun 21/04/25 | sáb 10/05/25 | $ 6.499.944,00 |
| 291 | | NP35 | TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" | 20 días | lun 21/04/25 | sáb 10/05/25 | $ 2.797.440,00 |
| 292 | | NP36 | TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" | 20 días | lun 21/04/25 | sáb 10/05/25 | $ 2.900.928,00 |
| 293 | | | INSTALACIONES RED VYD | 60 días | vie 14/03/25 | jue 15/05/25 | $ 1.012.264,00 |
| 294 | | NP37 | CONECTOR RJ45 CAT 6A | 20 días | vie 25/04/25 | jue 15/05/25 | $ 754.578,00 |
| 295 | | NP38 | CERTIFICACION DE PUNTOS | 60 días | vie 14/03/25 | jue 15/05/25 | $ 257.686,00 |
| 296 | | | INSTALACIONES RED DETECCIÓN INCENDIO | 10 días | lun 21/04/25 | mié 30/04/25 | $ 2.628.461,00 |
| 297 | | NP39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA DE CARGA SECA + ELEMENTOS DE INSTALACIÓN | 10 días | lun 21/04/25 | mié 30/04/25 | $ 408.354,00 |
| 298 | | NP40 | CONEXIÓN PROGRAMACIÓN A PANEL DETECCIÓN | 10 días | lun 21/04/25 | mié 30/04/25 | $ 2.220.107,00 |
| 299 | | | **NP´s Modificatorio No.2** | **77,63 días** | **mié 12/03/25** | **vie 30/05/25** | **$ 109.238.918,00** |
| 300 | | NP41 | DILATACIONES PERIMETRALES EN CIELO FALSO TIPO Z | 16,88 días | lun 14/04/25 | mié 30/04/25 | $ 1.633.987,00 |
| 301 | | NP42 | MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM E=10CM 1 CARA | 9 días | jue 1/05/25 | vie 9/05/25 | $ 915.070,00 |
| 302 | | NP43 | CIELO RASO PLANO SUPERBOARD 8MM ALTURA 9.22M | 8 días | lun 14/04/25 | mar 22/04/25 | $ 645.764,00 |
| 303 | | NP44 | VIGA CINTA DE AMARRE 12X20CM | 18 días | mié 12/03/25 | sáb 29/03/25 | $ 8.466.365,00 |
| 304 | | NP45 | CARCAMO DE CONCRETO 3000PSI h=0.20 | 5 días | lun 14/04/25 | vie 18/04/25 | $ 196.463,00 |
| 305 | | NP46 | PUERTA EN MADERA 60cm-70cm INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SCHLADE SATINADO MANIJA | 14 días | mié 16/04/25 | mié 30/04/25 | $ 2.856.330,00 |
| 306 | | NP47 | PUERTA EN MADERA 80cm-100cm INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SCHLADE SATINADO MANIJA | 14 días | mié 16/04/25 | mié 30/04/25 | $ 1.738.314,00 |
| 307 | | NP48 | PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED Cal. 16 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA 987 70 MM LLAVE | 14 días | mié 16/04/25 | mié 30/04/25 | $ 2.515.239,00 |
| 308 | | NP49 | LAMINA Y SOPORTE FACHADA PRINCIPAL MICROPERFORADA | 25 días | mié 30/04/25 | lun 26/05/25 | $ 11.980.987,00 |
| 309 | | | | 0 días | mié 12/03/25 | mié 12/03/25 | $ 0,00 |
| 310 | | NP50 | (5.03) PISO CERAMICO MIKONOS ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 33.8*33.8 | 4,5 días | mié 26/03/25 | sáb 29/03/25 | $ 2.523.173,00 |
| 311 | | NP51 | (5.04) PISO VANCOUVER GRIS 60*60 TRAFICO COMERCIAL MODERADO | 30,38 días | jue 13/03/25 | sáb 12/04/25 | $ 20.514.272,00 |
| 312 | | NP52 | (5.05) GUARDAESCOBA EN CERAMICA VANCOUVER 60*60 | 30,38 días | jue 13/03/25 | sáb 12/04/25 | $ 7.137.763,00 |
| 313 | | NP53 | (5.07) PISO PORCELANATO BELFORT 23.8*119.2 EXTERIOR | 6,75 días | lun 31/03/25 | sáb 5/04/25 | $ 12.364.195,00 |
| 314 | | NP54 | (NP 04) SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE DE GRADAS VANCOUVER INCLUYE HUELLA Y CONTRAHUELLA | 9 días | lun 21/04/25 | mar 29/04/25 | $ 5.709.120,00 |
| 315 | | NP55 | VIDRIO 4+4 FACHADA INCOLORO PULIDO | 7,88 días | lun 21/04/25 | lun 28/04/25 | $ 1.557.242,00 |
| 316 | | NP56 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM INCOLORO PULIDO Y BRILLADO (INCLUYE MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES) | 14,63 días | mié 16/04/25 | mié 30/04/25 | $ 14.725.873,00 |
| 317 | | NP57 | MALLA ESLABONADA RESIDUOS-PLANTA | 5 días | lun 12/05/25 | vie 16/05/25 | $ 609.780,00 |
| 318 | | NP68 | VENTANA CON SISTEMA CORREDIZO EN ALUMINIO COLOR NEGRO CON VIDRIO 6MM CRUDO INCOLORO, CERRADURA Y REJILLA EXTERIOR | 14 días | mié 16/04/25 | mié 30/04/25 | $ 8.001.871,00 |
| 319 | | NP59 | VENTANA CON SISTEMA CORREDIZO EN ALUMINIO COLOR NEGRO CON VIDRIO 5MM CRUDO INCOLORO Y CERRADURA | 14 días | mié 16/04/25 | mié 30/04/25 | $ 2.397.254,00 |
| 320 | | NP60 | TRAMITE ANTE BOMBEROS | 58 días | mar 1/04/25 | vie 30/05/25 | $ 2.749.856,00 |
| 321 | | | **FIN** | **0 días** | **vie 30/05/25** | **vie 30/05/25** | **$ 0,00** |

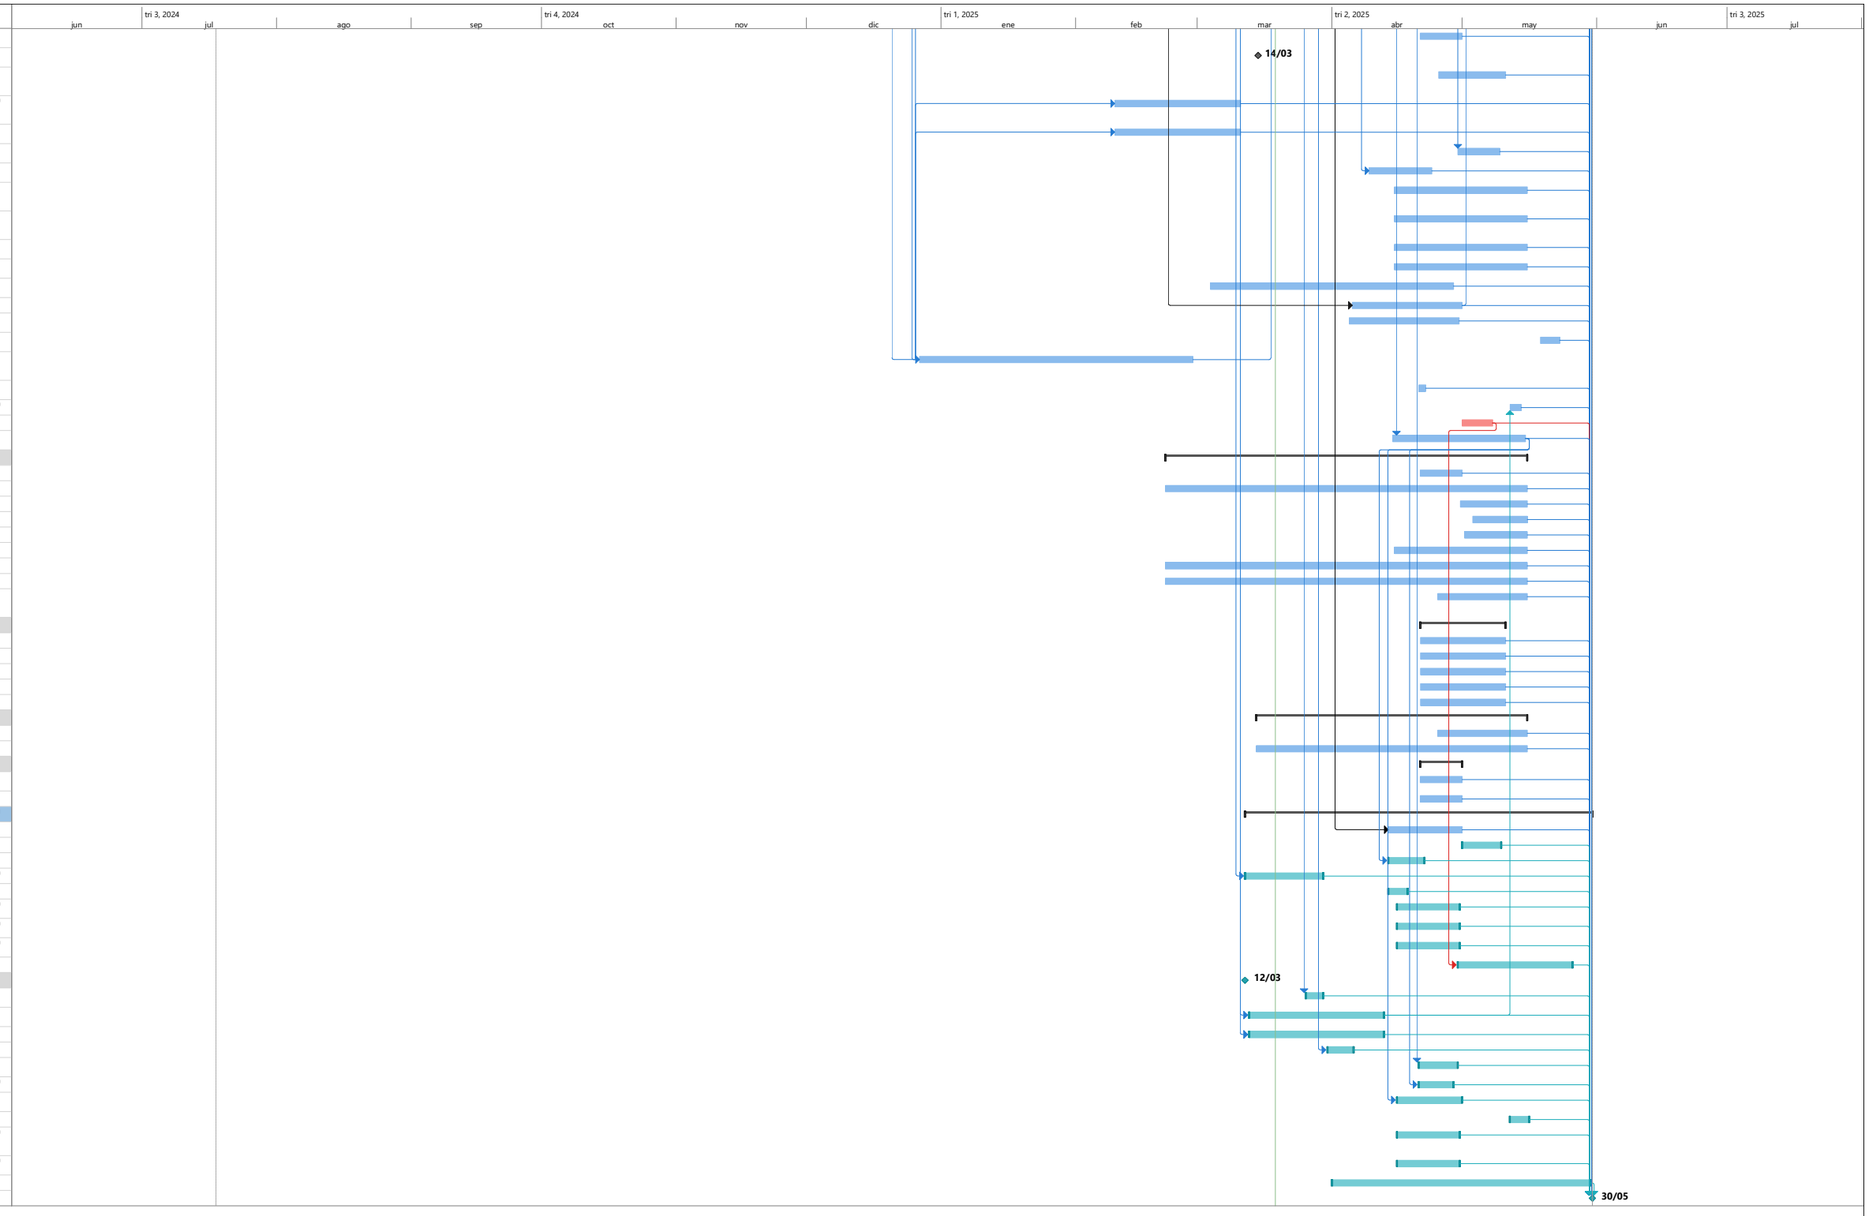


Proyecto: programacion SNR Pto Tejada V.2
Fecha: mié 19/03/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

UT SOLUCIONES
CONSORCIO 310
